IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3131 DE 2023
SOLIUN INGENIERÍA SAS
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

INFORME MENSUAL No 10 – COMPONENTE DE CALIDAD
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

TOMO __1___ DE _____

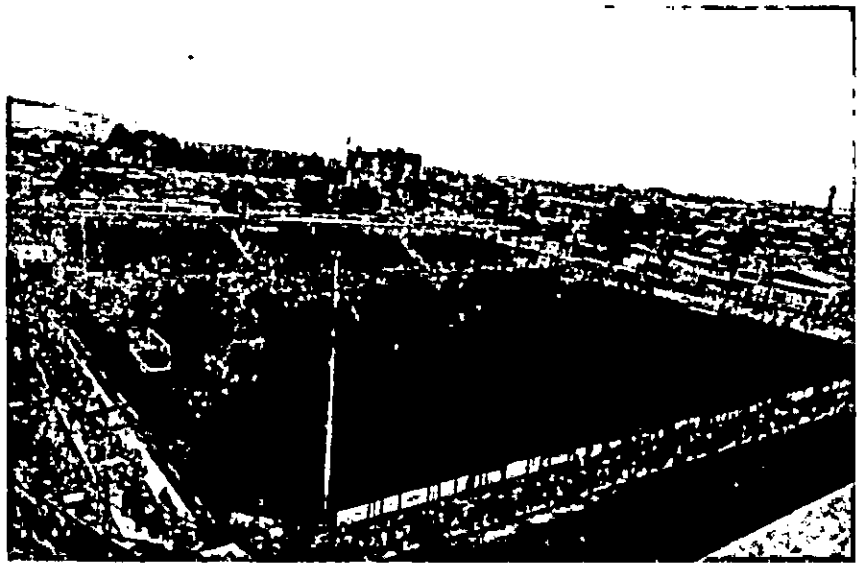


TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Vianney Leaño Urrego	Profesional de Calidad	
APROBÓ	Edna Constanza Cepeda Sánchez	Directora de Interventoría	

JUNIO DE 2023 / BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.07.26 11:58:14 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

302

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 10
3. INDICADORES DE GESTIÓN: 11
4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS: 15
4.1. PERSONAL DE INTERVENTORÍA 15
4.2. PERSONAL DE CONTRATISTA 17
5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD 18
5.1. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORÍA 18
5.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTA 18
6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES: 18
6.2. ACTAS DE COMITÉ 19
6.3. CORRESPONDENCIA 19
6.3.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORÍA 19
6.3.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA 21
6.3.2. CONTROL DE CORRESPONDENCIA CONTRATISTA 22
6.4. BITÁCORA 23
7. SEGUIMIENTO INFORMACIÓN DOCUMENTADA: 23
8. SEGUIMIENTO A LAS ADQUISICIONES 23
9. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN 23
10. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 24
10.2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - INTERVENTORÍA 24
10.3. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - CONTRATISTA 24
11. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 24
11.1. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – INTERVENTORÍA 24
11.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – CONTRATISTA 25
11.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES 25
12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 26
13. CONTROL DE CAMBIOS 46
14. SALIDAS NO CONFORMES 46
15. PROPIEDAD DEL CLIENTE 46
16. AUDITORIAS INTERNAS 47

LISTA DE ANEXOS

VER ANEXO 1. CONTROL CORRESPONDENCIA CONTRATISTA 22
VER ANEXO 2. LISTADO DE DOCUMENTOS DE INTERVENTORÍA 23
VER ANEXO 3. LISTADO DE DOCUMENTOS DE CONTRATISTA 23
VER ANEXO 4. PLAN DE ADQUISICIONES 23
VER ANEXO 5. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE CONTRATISTA 24
VER ANEXO 6. CONTOL EQUIPOS DE TOPOGRAFIA CONTRATISTA 25
VER ANEXO 7. CONTOL DE MATERIALES 25
VER ANEXO 8. CUADRO CONTROL DE CAMBIOS 46
VER ANEXO 9. SALIDAS NO CONFORMES CONTRATISTA 46

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Listado de Escenarios 10
Tabla 2. Indicadores de gestión interventoría 12
Tabla 3. Seguimiento a informes semanales 12
Tabla 4. Personal de interventoría 16
Tabla 5. Personal de Contratista 18
Tabla 6. Correspondencia enviada interventoría 19
Tabla 7. Correspondencia recibida interventoría 21
Tabla 8. Equipos de topografía de interventoría 25
Tabla 9. Equipos de topografía de Contratista 25

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 3131 de 2023 suscrito entre SOLIUN INGENIERÍA SAS y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO PARQUES BOG de acuerdo con el contrato No. 3099 de 2023.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al sexto mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 1 de **JUNIO** hasta el 30 de **JUNIO** del 2024, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra, a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

En el presenta periodo, el proyecto se desarrolla en Varios escenarios ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., que se describen a continuación:

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION
LA VIDA	01-012	USAQUEN	Calle 165 # 7-76
SERVITA	01-023	USAQUEN	Calle 165 No 14 - 62 *Calle 165 No 7-38
NUEVA AUTOPISTA	01-064	USAQUEN	Carrera 20 # 136- 91
ALTA BLANCA	01-075	USAQUEN	Carrera 8 A # 158- 04
EL COUNTRY	01-1000	USAQUEN	Avenida Calle 127 # 11 D -90
GUSTAVO URIBE	02-004	CHAPINERO	Carrera 1 # 70-11
CANAL EL VIRREY-EL CHICO	02-014	CHAPINERO	Calle 88 # 13 A -40
SUCRE O HIPPIES	02-019	CHAPINERO	Calle 60 # 7-49
LOS LACHES LA MINA	03-014	SANTAFE	Carrera 8 Este # 4B- 55
PARQUE NACIONAL	03-035	SANTAFE	Carrera 7 # 37 -04
SENDERO A MONSERRATE	03-051	SANTAFE	no tiene nomenclatura
LAS CRUCES	03-036	SANTAFE	Carrera 5A #1- 90
INDEPENDENCIA	03-039	SANTAFE	Calle 24 # 6A -01
TERCER MILENIO	03-085	SANTAFE	Avenida Jiménez hasta Caracas Calle 6 * Calle 6 Carrera 10
PLAZA DE TOROS	03-093	SANTAFE	Carrera 5 # 26B- 72
MORALBA	04-013	SAN CRISTOBAL	Carrera 16 B Este # 42 C -55 Sur
VILLA DE LOS ALPES	04-075	SAN CRISTOBAL	Carrera 3 B # 35 -04 Sur
GAITAN CORTES	04-103	SAN CRISTOBAL	Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E
LA VICTORIA	04-122	SAN CRISTOBAL	Calle 37A Bis Sur # 2A- 04
SAN CRISTOBAL	04-127	SAN CRISTOBAL	Calle 17A Sur # 2A- 50 E
CEFE SAN CRISTÓBAL			
DEPORTIVO PRIM MAYO	04-196	SAN CRISTOBAL	Calle 19 Sur # 5 -40

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION
LA AURORA II	05-002	USME	Diagonal 69 F Sur # 14U- 45
VALLES DE CAFAM	05-003	USME	Calle 92 Sur # 14D -87
LA ANDREA	05-004	USME	Calle 81 BIS Sur # 8A- 24
EL VIRREY SUR	05-016	USME	Calle 96 B Sur # 8- 10
FAMACO	05-086	USME	Calle 90 Sur # 6 -00
VILLA ALEMANA	05-087	USME	Calle 100 BIS Sur # 1 -17
SAN CAYETANO	05-236	USME	Carrera 15 Este # 74- 00 Sur
NUEVO MUZU	06-017	TUNJUELITO	Carrera 61 B # 52A -20 Sur
EL TUNAL	06-063	TUNJUELITO	Calle 48 C Sur # 22D -81
CEFE TUNAL			Calle 48 B Sur 22 A 70
LAURELES NARANJOS	07-035	BOSA	Calle 70 F S # 80 J- 50
CLARELANDIA	07-163	BOSA	Calle 58 J Sur # 80 D -10
PARQUE DEL RIO MARYLAND URBANIZADOR	07-164	BOSA	Carrera 86 # 74- 85 S
PALESTINA	07-165	BOSA	Calle 68 Sur No 9-05 / Calle 68sur No 81G-05 * Calle 68 Sur
EL RECREO	07-260	BOSA	Carrera 100 Calle 20
TIBANICA	07-274	BOSA	Calle 74 Sur # 77 I -31
PORVENIR	07-391	BOSA	Avenida Calle 54 S # 97-37
AUTOPISTA SUR (PAVCO)	07-152	BOSA	Carrera 72 # 57 H -20 S
LA ESPERANZA	07-273	BOSA	Pparte central Calle 75 BIS SUR Y CALLE 78 SUR Y ENTRE
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	07-036	BOSA	Carrera 68 D # 54 A -03 Sur
PATIO BONITO	08-034	KENNEDY	Carrera 101 Calle 34 Bis Sur / Carrera 101 No 34 Bis - 02
EL TINTAL	08-109	KENNEDY	Calle 6A # 86- 20
PORVENIR GIBRALTAR PREDIO	08-110	KENNEDY	Calle 49 Sur Con Prolongación De La Carrera 100b
BELLAVISTA-DINDALITO	08-144	KENNEDY	Carrera 96 # 41- 01 Sur
CASTILLA	08-200	KENNEDY	Carrera 75 # 8 A- 31
LA IGUALDAD	08-212	KENNEDY	Carrera 68 F # 3A -30
TIMIZA	08-219	KENNEDY	Calle 40 H Sur # 70A -81
CAYETANO CAÑIZARES	08-241	KENNEDY	Carrera 80 40 56 Sur
LA AMISTAD	08-355	KENNEDY	Transversal 79 No 41-10 Sur * Transv 78J No 41 - 10 Sur
GILMA GIMENEZ (LAS MARGARITAS)	08-552	KENNEDY	Calle 51 A Sur # 82 A- 16
SAN IGNACIO	08-791	KENNEDY	Cl 6c con cr 94

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION
MARSELLA	08-066	KENNEDY	Carrera 69 No 8-28
ESTADIO DE TECHO	08-554	KENNEDY	
CARMEN DE LA LAGUNA	09-020	FONTIBON	Diagonal 16 F Bis # 104A-15
CANAL BOYACA	09-050	FONTIBON	Calle 23 G # 73 F- 04
ATAHUALPA	09-104	FONTIBON	Avenida Calle 24 # 113-51
SAUZALITO	09-111	FONTIBON	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal
ZONA FRANCA	09-125	FONTIBON	Diagonal 12 C Carrera 109
VILLA LUZ	10-018	ENGATIVA	Carrera 77 A # 64 B- 03
VILLAS DE GRANADA	10-102	ENGATIVA	Calle 77 # 112 -50
EL CARMELO	10-169	ENGATIVA	Carrera 104 # 71 C- 23
JUAN AMARILLO	10-171	ENGATIVA	Avenida Calle 90 # 110- 06
TABORA	10-192	ENGATIVA	Calle 74 #76- 62
BONANZA	10-215	ENGATIVA	Carrera 70 F # 75 -80
LA SERENA	10-223	ENGATIVA	Calle 90 A # 85- 70
SAN ANDRES	10-234	ENGATIVA	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a -
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE SIMON BOLIV	10-290	ENGATIVA	Avenida Calle 63 # 68 -45
LA FLORIDA	10-311	ENGATIVA	Calle 64 # 128- 90
PTAR SALITRE	10-531	ENGATIVA	Av Calle 80 No 119-60
CANAL CORDOBA	11-003	SUBA	Avenida Carrera 55 # 116- 16
SAN JOSÉ DE BAVARIA	11-078	SUBA	Calle 170 # 67 -51
MORATO	11-113	SUBA	Calle 107 # 70A- 34
LA GAITANA	11-205	SUBA	Transversal 126 # 134- 88
TIBABUYES	11-212	SUBA	Calle 139 No 122-46 / Calle 139 No 127C - 48 * Calle 139 No
FONTANAR DEL RIO	11-368	SUBA	Diagonal 147 # 141A -42
CEFE Fontanar del Rio		SUBA	Dirección diagonal 145 # 138 a 10
ATABANZA	11-796	SUBA	ENTRE LA CALLE 126 A, LA AC 125 A Y LAS UNIDADES
CASA BLANCA	11-069	SUBA	Carrera 80 # 145-50
CIUDADELA CAFAM II	11-1101	SUBA	Carrera 146 No 142A 60
COMETAS	11-204	SUBA	Cerros de suba cuchilla
CEFE Cometas		SUBA	Cerros de suba cuchilla
CANAL RIO NEGRO	12-002	BARRIOS UNIDOS	Calle 90 # 60 B- 44
ALCAZARES	12-015	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 24 # 71 - 25

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION
GIMNASIO DEL NORTE	12-023	BARRIOS UNIDOS	Calle 6 3B # 27B - 70
PRD EL SALITRE - UCAD	12-091	BARRIOS UNIDOS	Carrera 60 # 63 -75
PISTA DE BMX PRD	12-117	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 63 # 60 -80
PARQUE DE LOS NOVIOS	12-092	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 - 10
COMPLEJO ACUATICO	12-1000	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45-10
PALACIO DE LOS DEPORTES	12-125	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 -10
PARQUE DE LOS NIÑOS	12-141	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 63 # 60 -80
LA ESTACION	12-093	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 72 No 23-40
NICOLAS DE FEDERMAN 3	13-038	TEUSAQUILLO	Carrera 36A # 58- 22
VIRGILIO BARCO	13-088	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 60 # 57- 60
SIMON BOLIVAR	13-089	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 68 # 53-36
ESTADIO NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN	13-122	TEUSAQUILLO	Calle 53 B # 28A- 10
EL CAMPINCITO-CEAD	13-123	TEUSAQUILLO	Calle 53 B # 28A- 10
SANTA ISABEL	14-009	MARTIRES	Avenida Carrera 27 # 1 G- 02
EDUARDO SANTOS	14-030	MARTIRES	Calle 4A Bis # 18 B- 30
EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO	14-036	MARTIRES	Avenida Calle 26 # 19 B - 55
RECONCILIACIÓN	14-037	MARTIRES	Calle 26 Carrera 20 Y 32
CIUDAD JARDIN	15-027	ANTONIO NARIÑO	Carrera 11 B # 11 -88 Sur
VILLA MAYOR CEMENTERIO	15-036	ANTONIO NARIÑO	Calle 31 Sur # 30- 99 Sur
LA FRAGUA	15-040	ANTONIO NARIÑO	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur
UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA	16-024	PUENTE ARANDA	Calle 43 Sur # 52- 20
MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	PUENTE ARANDA	Carrera 54 # 18- 23 Sur
CIUDAD MONTES	16-112	PUENTE ARANDA	Carrera 39 # 10- 75 Sur
EL JAZMIN	16-204	PUENTE ARANDA	Avenida Carrera 50 # 1 D- 28
VERAGUAS PREDIO	16-221	PUENTE ARANDA	Kr 34 3- 97
INDUSTRIAL LOS EJIDOS	16-416	PUENTE ARANDA	Calle 11A No 36-56
LA CONCORDIA	17-008	CANDELARIA	Calle 12 B Bis A # 0- 08
BOSQUE SAN CARLOS	18-028	RAFAEL URIBE	Carrera 12 D # 32- 44 Sur

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION
DIANA TURBAY	18-031	RAFAEL URIBE	Calle 48 X Sur # 2B -00 E
PIJAOS JORGE E. CABALIER	18-090	RAFAEL URIBE	Carrera 10 D # 34- 50 Sur
LOS MOLINOS II	18-162	RAFAEL URIBE	Calle 48 P Bis C Sur # 4-30
QUIROGA	18-205	RAFAEL URIBE	Calle 31B Sur No 22-07
PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA	18-207	RAFAEL URIBE	Calle 22 Sur # 21 -09
GIMNASIO DEL SURP ARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	18-452	RAFAEL URIBE	Carrera 22 Sur No 21-09 / Calle 22 sur hasta 27 Sur Avenida 19 * Carrera 21 No 25-35 Sur
SANTA LUCIA	18-073	RAFAEL URIBE	Diagonal 36 Sur Carrera 16 B
ARBORIZADORA ALTA	19-188	CIUDAD BOLIVAR	Diagonal 73 sur No 40-80
CANDELARIA LA NUEVA	19-189	CIUDAD BOLIVAR	Calle 62B Sur No 22-47 * Calle 62 Sur No 22l-27
ARBORIZADORA ALTA METRP	19-229	CIUDAD BOLIVAR	Diagonal 79 Bis Calle 72f Sur Transversal 34b
MEISSEN	19-230	CIUDAD BOLIVAR	Calle 62 Bis Sur # 18 C -32
LA ESTANCIA	19-231	CIUDAD BOLIVAR	Calle 59 A Sur # 86-00
ILLIMANI (PARAISO)	19-346	CIUDAD BOLIVAR	Calle 74 B Sur # 27 M- 06
LA JOYA	19-349	CIUDAD BOLIVAR	Carrera 18 H Bis A # 80 B- 13
EL TALLER	19-348	CIUDAD BOLIVAR	Avenida Calle 68 Sur # 70 D -11
BUENA VISTA PORVENIR	19-347	CIUDAD BOLIVAR	Carrera 17 H Bis # 74 B- 66 Sur
ALTOS DE LA ESTANCIA	19-756	CIUDAD BOLIVAR	Calle 68 Sur # 75 H -93
SIERRA MORENA	19-190	CIUDAD BOLIVAR	Calle 75 A Sur # 73- 08

Para la adición se priorizaron los siguientes parques para ser intervenidos:

PARQUE O ESCENARIO	CÓDIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
PLAZA DE ARTESANOS	12-110	BARRIOS UNIDOS	Av. La Esmeralda #63A-52, Bogotá
SIMÓN BOLÍVAR	13-089	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 68 # 53-36
PARQUE DE LOS NOVIOS	12-092	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 - 10
PRD EL SALITRE - UCAD	12-091	BARRIOS UNIDOS	Carrera 60 # 63 -75
PARQUE NACIONAL	03-035	SANTAFÉ	Carrera 7 # 37 -04
INDEPENDENCIA	03-039	SANTAFÉ	Calle 24 # 6A -01
EDUARDO SANTOS	14-030	MÁRTIRES	Calle 4A Bis # 18 B- 30
GAITAN CORTES	04-103	SAN CRISTOBAL	Cl. 18 #5 - 60 sur, San Cristóbal,
VILLA DE LOS ALPES	04-075	SAN CRISTÓBAL	Carrera 3 B # 35 -04 Sur
EL TUNAL	06-063	TUNJUELITO	Calle 48 C Sur # 22D -81

PARQUE O ESCENARIO	CÓDIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
VALLES DEL CAFAN	05-003	USME	Dg. 91a Sur #2d-10, Bogotá
LA FRAGUA	15-040	ANTONIO NARIÑO	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur
CAYETANO CAÑIZARES	08-241	KENNEDY	Carrera 80 40 56 Sur
CASTILLA	08-200	KENNEDY	Carrera 75 # 8 A- 31
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	07-036	BOSA	Carrera 68 D # 54 A -03 Sur
GILMA JIMÉNEZ (LAS MARGARITAS)	08-552	KENNEDY	Calle 51 A Sur # 82 A- 16
NUEVO MUZU	06-017	TUNJUELITO	Carrera 61 B # 52A -20 Sur
EL RECREO	07-260	BOSA	Carrera 100 Calle 20
UNIDAD DEPORTIVA ALQUERÍA	16-024	PUENTE ARANDA	Calle 43 Sur # 52- 20
PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA	18-207	RAFAEL URIBE	Calle 22 Sur # 21 -09
SAUZALITO	09-111	FONTIBÓN	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal
ATAHUALPA	09-104	FONTIBÓN	Avenida Calle 24 # 113-51
ZONA FRANCA	09-125	FONTIBÓN	Diagonal 12 C Carrera 109
EL CARMELO	10-169	ENGATIVÁ	Carrera 104 # 71 C- 23
SAN ANDRÉS	10-234	ENGATIVÁ	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a -
LA SERENA	10-223	ENGATIVÁ	Calle 90 A # 85- 70
JUAN AMARILLO	10-171	ENGATIVÁ	Avenida Calle 90 # 110- 06
CASA BLANCA	11-069	SUBA	Carrera 80 # 145-50
NIZA XII	11-191	SUBA	Avenida calle 127 – avenida suba
COMETAS	11-204	SUBA	Cerros de suba cuchilla
ATABANZA	11-796	SUBA	ENTRE LA CALLE 126 A, LA AC 125 A Y LAS UNIDADES

Tabla 1. Listado de Escenarios

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	3099 DE 2023
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO PARQUES BOG
Objeto	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
Etapa preliminar	QUINCE (15) DÍAS
Plazo de la ejecución etapa de obra	SEIS MESES (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Plazo total del contrato	SIETE (7) MESES.
Valor etapa de obra	$ 13.733.153.000,00
Valor total del contrato	$ 13.733.153.000,00

Adición	$ 6.866.576.500,00
Valor final total del contrato	$ 20.599.729.500,00
Fecha Inicio	12 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación del contrato:	11 de abril de 2024
Prorroga	CUATRO MESES (4) MESES
Nueva fecha de Terminación del contrato:	11 de agosto de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	3131 DE 2023
Contratista de Interventoría	SOLIUN INGENIERÍA SAS
Objeto	"Realizar la Interventoria técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
Etapa preliminar	QUINCE (15) DÍAS
Periodo etapa de obra	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$ 1.192.172.234,00
Valor total del contrato	$ 1.192.172.234,00
Adición	$ 596.086.117
Valor final total del contrato	$ 1.788.258.351
Fecha Inicio	12 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación inicial contrato:	11 de mayo de 2024
Prorroga	CUATRO MESES (4) MESES
Nueva fecha de Terminación del contrato:	11 de septiembre de 2024

3. INDICADORES DE GESTIÓN:

OBJETIVO	INDICADOR	N	MEDICIÓN				SEGUIMIENTO		
			Denominación	Formula	Meta	Frecuencia	Actividades	Responsable	Frecuencia
Garantizar el cumplimiento en la entrega de productos y servicios	Entrega de informes a satisfacción	1	Oportunidad	% De informes entregados a destiempo	100%	Mensual	Seguimiento permanente de ejecución de actividades e informe	Director de Interventoría	Durante la ejecución del proyecto
Realizar el control a los recursos del proyecto	Cumplimiento del Cronograma	2	Cronograma	Obra ejecutada *100 / Obra	>= 95%	Mensual	Seguimiento al cronograma de obra	Director de Interventoría	Durante la ejecución del proyecto

OBJETIVO	INDICADOR	N	MEDICIÓN				SEGUIMIENTO		
			Denominación	Formula	Meta	Frecuencia	Actividades	Responsable	Frecuencia
				proyectada					
	Ejecución del presupuesto	3	Presupuesto	Presupuesto ejecutado *100 / presupuesto presentado	>= 95%	Mensual	Seguimiento al Presupuesto	Director de Interventoría	Durante la ejecución del proyecto
Garantizar la competencia del personal en el cumplimiento de las metas del proyecto	Recurso humano competente	4	Recurso Humano	Contar con el personal mínimo requerido para el proyecto	>90%	Mensual	Disponibilidad de recurso humano de acuerdo a los requisitos del cliente	Director de Interventoría	Durante la ejecución del proyecto
Garantizar la satisfacción de nuestros clientes	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	5	Evaluación del servicio por parte del cliente	Calificación encuesta de satisfacción	90%	Al final del proyecto	Aplicar encuesta y tomar acciones según se requiera	Coordinador del proyecto	Al finalizar el proyecto
	Calidad de la prestación del servicio	6	Quejas y reclamos	Número de quejas y reclamos	<=2	Mensual	Seguimiento y cierre a quejas y reclamos presentados	Director de Interventoría	Durante la ejecución del proyecto
		7	Salida no conforme	N.º de S N.C.	<= 2	Mensual	Seguimiento a los hallazgos	Residente de Interventoría	Durante la ejecución del proyecto

Tabla 2. Indicadores de gestión interventoría

- **GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.**

Informes Semanales: Se cuenta con la presentación de los informes semanales, en los cuales se presenta el avance de la ejecución del proyecto relacionado las actividades realizadas de cada uno de los componentes: Anexo 4 Informe técnico

RELACIÓN DE INFORME SEMANALES

Número	Periodo
Informe semanal No. 39	2/06/2024 – 08/06/2024
Informe semanal No. 40	09/06/2024 – 15/06/2024
Informe semanal No. 41	16/06/2024 – 22/06/2024
Informe semanal No. 42	23/06/2024 – 29/06/2024

Tabla 3. Seguimiento a informes semanales

Informes mensuales: Una vez cumplido el periodo de ejecución cada uno de los profesionales por componente, elabora el informe de seguimiento mensual con base al avance de actividades, estos informes mensuales son radicados al IDRD, dentro de los tiempos establecidos dando cumplimiento. Se debe tener en cuenta que el seguimiento al indicador de entregas corresponde al periodo anterior, por tanto, la presentación del informe N°9 con el oficio IDRD-3131-2024-465 de cada uno de los componentes por parte de interventoría fueron presentados al IDRD dando cumplimiento a lo requerido por el cliente.

- **MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS**

  - **CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA**

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido el 1 de junio al 30 de junio del 2024; objeto del presente informe.

CONTRATO DE OBRA 3099 – 2023					
CONCEPTO	**PERIODO**	**VALOR BRUTO**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**VALOR NETO**	**% EJECUCIÓN**
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARCIAL 1 OBRA	12/09/2023 31/10/2023	$52.355.755,00	$16.745.804,00	$35.609.951,00	0.45%
PARCIAL 2 OBRA	01/11/2023 30/11/2023	$96.726.072,00	$30.937.493,00	$65.788.579,00	0.47%
PARCIAL 3 OBRA	01/12/2023 31/12/2023	$180.169.718,00	$57.626.649,00	$122.543.069,00	0.87%
PARCIAL 4 OBRA	01/01/2024 31/01/2024	$1.398.933.917,00	$447.444.080,00	$951.489.837,00	6.79%
PARCIAL 5 OBRA	01/02/2024 29/02/2024	$4.453.603.463,00	$1.780.586.704,00	$2.673.016.759,00	21.62%
PARCIAL 6 OBRA	01/03/2024 31/03/2024	$3.210.417.471,00	$2.059.159.830,00	$1.151.257.641,00	15.58%
PARCIAL 7 OBRA	01/04/2024 30/04/2024	$2.559.371.998,00	$0,00	$2.559.371.998,00	12.42%
PARCIAL 8 OBRA	01/05/2024 31/05/2024	$2.423.062.515,00	$0,00	$2.423.062.515,00	11.76%
PARCIAL 9 OBRA	01/06/2024 30/06/2024	$878.691.44700	$0,00	$878.691.44700	4.27%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.733.153.000,00				
ADICION	$ 6.866.576.500				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 20.599.729.500,00				
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	$ 6.225.088.591,00				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3131- 2023					
CONCEPTO	**PERIODO**	**VALOR BRUTO**	**IVA**	**VALOR NETO**	**% EJECUCIÓN**
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARCIAL 1 OBRA	12/09/2023 31/10/2023	$76.322.867,00	$12.186.004,00	$64.136.863,00	6.40%
PARCIAL 2 OBRA	01/11/2023 30/11/2023	$77.848.847,00	$12.429.648,00	$65.419.199,00	6.53%
PARCIAL 3 OBRA	01/12/2023 31/12/2023	$80.757.748,00	$12.894.094,00	$67.863.654,00	6.77%
PARCIAL 4 OBRA	01/01/2024 31/01/2024	$123.103.705,00	$19.655.213,00	$103.448.491,00	10.33%
PARCIAL 5 OBRA	01/02/2024 29/02/2024	$229.159.347,00	$36.588.467,00	$192.570.880,00	19.22%
PARCIAL 6 OBRA	01/03/2024 31/03/2024	$186.002.712,00	$29.697.912,00	$156.304.800,00	15.60%
PARCIAL 7 OBRA	01/04/2024 30/04/2024	$133.737.882,00	$21.353.107,00	$112.384.775,00	11.22%
PARCIAL 8 OBRA	01/05/2024 31/05/2024	$113.312.366,00	$18.091.890,00	$95.220.476,00	6.34%
PARCIAL 9 OBRA	01/06/2024 30/06/2024	$74.453.313,00	$14.146.129,00	$88.599.442,00	4.95%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.192.172.234,00				
ADICION	$ 596.086.117.00				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.788.258.351				
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	$ 679.413.435,00				

- **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

Durante el desarrollo del presente periodo, se continuó realizando verificación y control a presupuesto y programación. Por otra parte, se iniciaron y continuaron las actividades propias de obra en algunos de los escenarios ya priorizados.

De igual manera como se procedió en el periodo anterior, tanto el Contratista como la Interventoría y con el acompañamiento del Apoyo a la Supervisión del IDRD, se continuaron efectuando las revisiones preliminares de las actividades a ejecutar en cada zona de trabajo; se realizaron actividades de campo complementarias con las de oficina, tales como: medidas en terreno, inventarios, elaboración de presupuestos y programaciones de obra. Por parte de la Interventoría también se realizó acompañamiento permanente en terreno para todas estas las actividades mencionadas, así como la

coordinación de reuniones, mesas de trabajo, comités de obra; además, por la parte administrativa, se efectuó la revisión de documentos inherentes a los contratos; todo esto, para la marcha y el buen desempeño de las obras.

- **GARANTIZAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL ENFOCADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA ORGANIZACIÓN**

Como se evidencia en el numeral 4, se cuenta con la totalidad de los profesionales y personal mínimo requerido contractualmente.

- **GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES**

  - **EVALUACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CLIENTE**

    La medición de este indicador se realizará al finalizar el proyecto

  - **QUEJAS Y RECLAMOS**

    - Durante el periodo del presente informe no se presentaron Quejas y Reclamos.

  - **SALIDAS NO CONFORMES**

    Durante el periodo del presente informe no se presentaron para el proceso de interventoría.

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS:

Se realiza la presentación de los profesionales en cada una de las áreas del contratista y de la interventoría, relacionados a continuación:

4.1. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

PERSONAL INTERVENTORÍA				
CARGO A DESEMPEÑAR	**NOMBRE**	**% DEDICACIÓN**	**RADICADO**	**RADICADO IDRD**
DIRECTOR	EDNA CONSTANZA CEPEDA	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
RESIDENTE	LUIS ALBERTO MEDRANO BERMUDEZ	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
RESIDENTE	LUIS FERNANDO MONDRAGON CAMACHO	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842

PERSONAL INTERVENTORÍA				
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	% DEDICACIÓN	RADICADO	RADICADO IDRD
RESIDENTE	JOHN LIAN CUELLAR SALAMANCA	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
RESIDENTE	RONALD RICARDO LOZANO	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
INSPECTOR	GUILLERMO GOMEZ DUARTE	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
INSPECTOR	JEAN PAUL REYES MORALES	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
INSPECTOR	KAREN ADRIANA ALGECIRAS	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
INSPECTOR	DIEGO ANDRES GALE FUERTES	100%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
AMBIENTAL	SINDY NATALI ESPINOSA SIERRA	30%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
SST	YINETH CRUZ ARANZALEZ	40%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
CALIDAD	NANSLHY VIANNEY LEAÑO URREGO	40%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
ESTRUCTURAL	GERMAN CAMILO ALFONSO GONZALEZ	30%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
ELECTRICO	YENNY PAOLA REYES COSTILLA	40%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
TRANSITO	CARLOS ANDRES FIGUEROA AYALA	20%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
HIDRAULICO	ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA	30%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
SOCIAL	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS JUNCA	30%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
PRESUPESTOS	JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE	10%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
TOPOGRAFO	DIEGO VICENTE CORTES SALAZAR	30%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
CADENERO	RUBEN DARIO MARQUEZ ACUÑA	30%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
CADENERO	YENNIFER ALEXANDRA BERNAL DUARTE	30%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
SECRETARIA	LIZETH ALEIDA CASTILLO MORA	5%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
CONTADORA	SOLBEY MAYERLY DUQUE CADENA	5%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842
ABOGADO	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ COBOS	5%	IDRD-3131-2023-006	20232100320842

Tabla 4. Personal de interventoria

4.2. PERSONAL DE CONTRATISTA

PERSONAL CONTRATISTA				
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	% DEDICACIÓN	RADICADO	FECHA APROBACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ALFREDO GRANADOS DONADO	100%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
RESIDENTE DE OBRA	RODNEY RAMIRO GRANADOS DONADO	100%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
RESIDENTE DE OBRA	JOSE ORLANDO PEÑA BAEZ	100%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
RESIDENTE DE OBRA	LUZ STELLA QUINTERO RODRIGUEZ	100%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
INSPECTOR DE OBRA	MARY JULIETH CONTRERAS CONTRERAS	100%	IDRD-3131-2023-015	27-09-2023
INSPECTOR DE OBRA	EDILSON OSORIO PEREZ	100%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
INSPECTOR DE OBRA	CARLOS ANDRES ROJAS ROJAS	100%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
INSPECTOR DE OBRA	BRYAN STEVEN CASTRO MONCADA	100%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	INGRID CATHERINE BAEZ SANABRIA	40%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
PROFESIONAL AMBIENTAL	DIANA CAROLINA SANTAMARIA SEGURA	40%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
PROFESIONAL EN SISTEMA DE CALIDAD	CESAR SANCHEZ OSPINA	40%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
PROFESIONAL EN SISTEMA DE CALIDAD	MONICA RODRIGUEZ	40%	IDRD-3131-2023-152	21-12-2023
INGENIERO ESTRUCTURAL	YOHN EDISON POLO GARZON	30%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
INGENIERO ELECTRIICISTA O ELECTRICO	DIANA ALEJANDRA ARAGON	40%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
INGENIERO ELECTRIICISTA O ELECTRICO	WILLIAN MONTOYA	40%	IDRD-3131-2024-383	03-05-2024
INGENIERO DE TRANSITO	MARTHA ROCIO CASTILLO FERNANDEZ	20%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
INGENIERO HIDRAULICO	CESAR MAURICIO PRIETO GAMBOA	30%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
PROFESIONAL SOCIAL	YESICA AGUDELO GONZALEZ	30%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
PROFESIONAL PARA PRESUPUESTO Y POROGRAMACION	LAURA MARIA NATALIA AVILA CASTILLO	30%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
PROFESIONAL GERENCIA DE PROYECTOS	MARYORY PASACHIVA SANCHEZ	100%	IDRD-3131-2024-175	03-01-2024

PERSONAL CONTRATISTA				
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	% DEDICACIÓN	RADICADO	FECHA APROBACIÓN
TOPOGRAFO	HARVEY ENRIQUE TAVERA OCHOA	30%	IDRD-3131-2023-023	29-09-2023
CADENERO 1	ANDRES FELIPE OSPINA BELTRAN	30%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
CADENERO 2	DAVID JOEL MUETE HURTADO	30%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
SECRETARIA	MARICEL MARTINEZ PULIDO	5%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
CONTADOR	XIMENA PAOLA GARZON CASTILLO	5%	IDRD-3131-2023-008	20-09-2023
ABOGADO	NATALIA PARDO DEL TORO	5%	IDRD-3131-2023-015	27-09-2023

Tabla 5. Personal de Contratista

En el periodo se realiza la aprobación del profesional en gerencia de proyectos del contratista, quien cumple con el perfil requerido por el IDRD.

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD

5.1. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Calidad de interventoría y el seguimiento realizado en obra, como interventoría se da cumplimiento a los requisitos establecidos de acuerdo al avance actual del proyecto.

5.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTA

En el periodo se da aprobación de informe de calidad N°8 del contratista, el cual es radicado en el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE, por medio del oficio IDRD-3131-2024-414.

A la fecha del presente informe el contratista realiza la presentación del informe N°9, el cual no cuenta con la información mínima requerida para su aprobación y se emiten observaciones las cuales no han sido atendidas.

6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES:

Los mecanismos de comunicación con el cliente y el contratista son realizados por medio de actas de comité de obra, correspondencia enviada y recibida, correo electrónico y bitácora de obra.

Toda la correspondencia es controlada de tal forma que su trazabilidad y seguimiento se realice de forma adecuada y dentro de los tiempos requeridos, para esto la interventoría cuenta con formatos de control de correspondencia enviada y recibida, registros de actas de comité y bitácora de obra.

6.2. ACTAS DE COMITÉ

El control de las actas de comité se realiza por medio del seguimiento de los compromisos los cuales son consolidados por la interventoría para seguimiento en cada comité. **Anexo 3 Informe Técnico**

6.3. CORRESPONDENCIA

El control de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo se realiza por medio del cuadro de control de correspondencia a cada uno de los contratos.

6.3.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORÍA

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-3408-2022 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-3131-2024-445	martes, 4 de junio de 2024	Remisión acta de recibo parcial No. 8 de obra	IDRD
IDRD-3131-2024-446	martes, 4 de junio de 2024	Remisión acta de recibo parcial No. 8 interventoría	IDRD
IDRD-3131-2024-447	martes, 4 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-408 Geotecnia Villa de los Alpes	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-448	martes, 4 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-373 Entrega diseños fotométricos	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-449	martes, 4 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-383 Trabajos servitá	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-450	martes, 4 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-398 CONTROL DE MATERIAL DADO DE BAJA	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-451	martes, 4 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-402 Cronograma de ejecución de obras eléctricas.	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-452	martes, 4 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-403 Observaciones eléctricas	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-453	martes, 4 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-391 Manual de mantenimiento Naranjos	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-454	martes, 4 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-378 Resultado ensayos BG y SBG	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-455	martes, 4 de junio de 2024	Reiteración Inicio de Actividades de la Adición Parque Simón Bolívar.	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-456	martes, 4 de junio de 2024	Reiteración Inicio de Actividades de la Adición Parque Casa Blanca	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-457	jueves, 6 de junio de 2024	Remisión plan de manejo ambiental actualizado	IDRD
IDRD-3131-2024-458	jueves, 6 de junio de 2024	Remisión plan de gestión RCD actualizado	IDRD
IDRD-3131-2024-459	jueves, 6 de junio de 2024	Remisión informe semanal de interventoría No. 37	IDRD
IDRD-3131-2024-460	viernes, 7 de junio de 2024	Remisión informe semanal de interventoría No. 38	IDRD

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-3408-2022 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-3131-2024-461	sábado, 8 de junio de 2024	Observaciones items no previstos No 10	PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-462	martes, 11 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-405	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-463	martes, 11 de junio de 2024	REMISIÓN SUBSANACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 9	IDRD
IDRD-3131-2024-464	martes, 11 de junio de 2024	Inicio de Actividades de la Adición Parque Fontanar del Rio	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-465	miércoles, 12 de junio de 2024	Remisión informes mensuales de interventoria No. 9	IDRD
IDRD-3131-2024-466	miércoles, 12 de junio de 2024	Respuesta oficio CTO -IDRD-3099-2023-418- Reiteración inicio de actividades de la adición Parque Simón Bolívar.	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-467	miércoles, 12 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-417 Subsanación manual de mantenimiento Naranjos	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-468	miércoles, 12 de junio de 2024	Requerimiento remisión acta de recibo parcial No. 9 - COP 3099	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-469	viernes, 14 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-419 Subsanación parque Servitá	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-470	lunes, 17 de junio de 2024	ALCANCE COMUNICADO IDRD-3131-2024-463 REMISIÓN SUBSANACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 9	IDRD
IDRD-3131-2024-471	lunes, 17 de junio de 2024	REMISIÓN INFORME VISITA PRD - VOLEIBOL	IDRD
IDRD-3131-2024-472	martes, 18 de junio de 2024	Tercera Solicitud de Inicio de Actividades de la Adición Parque Casa Blanca	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-473	martes, 18 de junio de 2024	Requerimiento Inicio de Actividades de la Adición Parque Fontanar del Rio	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-474	martes, 18 de junio de 2024	Traslado comunicado CTO-IDRD-3099-2023-426 Presupuestos solicitados	IDRD
IDRD-3131-2024-475	martes, 18 de junio de 2024	Remision actas de vecindad incio Velodromo- servita	IDRD
IDRD-3131-2024-476	martes, 18 de junio de 2024	Remisión informes mensuales de obra No. 9	IDRD
IDRD-3131-2024-477	miércoles, 19 de junio de 2024	Remisión análisis de precios unitarios de cotización	IDRD
IDRD-3131-2024-478	miércoles, 19 de junio de 2024	Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 9	IDRD
IDRD-3131-2024-479	jueves, 20 de junio de 2024	plan de contingencia parque san andres, serena y juan amarillo	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-480	viernes, 21 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-436 Actividades adición Fontanar del Río	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-481	viernes, 21 de junio de 2024	Observaciones presupuesto contrato inicial y adición	CONSORCIO PARQUES BOG

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-3408-2022 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-3131-2024-482	viernes, 21 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-428 Cronograma entrega manuales de mantenimiento	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-483	viernes, 21 de junio de 2024	Legalización facturas	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-484	lunes, 24 de junio de 2024	Aclaracion Observaciones a Informe Plan de Gerencia	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-485	miércoles, 26 de junio de 2024	Remisión observaciones presupuesto contractual - componente eléctrico	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-486	lunes, 24 de junio de 2024	plan de contingencia parque san andres, serena y juan amarillo	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-487	lunes, 24 de junio de 2024	Requerimiento Por No Realizar el Mantenimiento de la Pista de Trote. Parque Fontanar del Rio.	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-488	martes, 25 de junio de 2024	Actividades a Ejecutar – Módulos de Baños - Parque El Porvenir.	IDRD
IDRD-3131-2024-489	martes, 25 de junio de 2024	Remisión informe semanal de interventoría No. 39	IDRD
IDRD-3131-2024-490	martes, 25 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-425 Control cambios	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-491	jueves, 27 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-433 Observaciones actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-492	jueves, 27 de junio de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-421	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-493	jueves, 27 de junio de 2024	Respuesta comunicados CTO-IDRD-3099-2023-431 y 444	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-494	viernes, 28 de junio de 2024	IDRD-3131-2024-494 - Documentacion necesaria para liquidacion del anticipo	CONSORCIO PARQUES BOG
IDRD-3131-2024-+A457:D507495	sábado, 29 de junio de 2024	Remisión de Observaciones Informe SST No.10	CONSORCIO PARQUES BOG

Tabla 6. Correspondencia enviada interventoría

6.3.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA RECIBIDA IDRD-3408-2022 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
CTO-IDRD-3099-2023-413	4/6/2024	Rta 425 balancines	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-414	4/6/2024	Inf parque San Juan	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-415	6/6/2024	Rta 431 ajuste acta NP 9	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-416	7/6/2024	Rta 432 observ legalización	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-417	7/6/2024	Rta 453 Subsan manual	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-418	7/6/2024	Rta 455 inicio de activ	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-419	11/6/2024	Rta 428 Subsanación	Se da respuesta a lo solicitado

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA RECIBIDA IDRD-3408-2022 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
CTO-IDRD-3099-2023-420	13/6/2024	Radicación PMT	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-421	14/6/2024	Rta estructura	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-422	17/6/2024	Actas vecindad Velódromo y Servita	Se remite para revisión y firma
CTO-IDRD-3099-2023-425	17/6/2024	Control cambios	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-426	17/6/2024	Diagnóstico presupuestos	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-423	17/6/2024	Inf No. 9	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-427	18/6/2024	Rta 450 control material	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-428	18/6/2024	Cronograma manuales mto	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-429	18/6/2024	Planos constructivos	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-430	18/6/2024	Rta 422 observ ppto	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-431	18/6/2024	Rta 471 Visita	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-432	18/6/2024	Módulos Sanitarios	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-433	18/6/2024	Entrega actas inspección	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-435	18/6/2024	Rta 436 rta ppto	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-436	19/6/2024	Rta 473 Inicio de actividades	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-437	19/6/2024	Rta 472 Solicitud inicio activi	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-438	20/6/2024	Planos constructivos	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-439	20/6/2024	Inf plan gerencia	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-440	21/06/2024	Radicación inf liquido	Se entrega informe de liquidación
CTO-IDRD-3099-2023-441	24/06/2024	Listado SNC pendientes	Se remite listado de pendientes
CTO-IDRD-3099-2023-442	24/06/2024	Resultado ensayos	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-443	24/06/2024	Rta observ plan adquisiciones	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-444	25/06/2024	Intervención pista patinaje	Se presenta prodedimiento
CTO-IDRD-3099-2023-445	25/06/2024	Rta 482 cronograma	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-446	25/06/2024	Rta 479 Plan contingencia	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-447	25/06/2023	Rta 441 observ informes	Se da respuesta a lo solicitado

Tabla 7. Correspondencia recibida interventoría

6.3.2. CONTROL DE CORRESPONDENCIA CONTRATISTA

El contratista realiza la implementación en obra de los formatos de control de la correspondencia enviada y recibida, lo cual permite se realice la trazabilidad de las comunicaciones enviadas y recibidas

VER ANEXO 1. CONTROL CORRESPONDENCIA CONTRATISTA

6.4. BITÁCORA

El registro diario de las actividades realizadas en cada uno de los frentes intervenidos es registrado en las bitácoras de obra.

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de junio al 30 de junio de 2024, objeto del presente informe se adjuntan copias de las bitácoras incluidas en el **Anexo 9 informe Técnico.**

7. SEGUIMIENTO INFORMACIÓN DOCUMENTADA:

El control de la información documentada se realiza por medio del listado documentos, este permite establecer la vigencia y cambios realizados a cada uno de los documentos que afectan e inciden en el proyecto.

A la fecha del presente informe no se ha realizado la actualización o cambio de algún documento relacionado con el proyecto, por tanto, el listado adjunto corresponde a los incluidos en el plan de calidad del proyecto.

VER ANEXO 2. LISTADO DE DOCUMENTOS DE INTERVENTORÍA

No se cuenta con el listado vigente del contratista dado a que la documentación entregada no se encuentra actualizada, incluyendo los documentos y registros correspondientes, lo cual se ha solicitado en las observaciones emitidas por la interventoría.

VER ANEXO 3. LISTADO DE DOCUMENTOS DE CONTRATISTA

8. SEGUIMIENTO A LAS ADQUISICIONES

El plan de adquisiciones del proyecto relacionado con los insumos críticos del mismo, fue solicitado al contratista, teniendo en cuenta que es con base a este documento que se realizará el seguimiento y cumplimiento a las adquisiciones críticas del proyecto; con base a las reuniones y mesas de trabajo realizadas el contratista realiza el ajuste al plan de adquisiciones para el proyecto en la etapa de adición y prorroga.

Se incluye el plan de adquisiciones presentado por el contratista, sobre el cual se presenta el seguimiento realizado.

VER ANEXO 4. PLAN DE ADQUISICIONES

9. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN

La interventoría cuenta con una oficina dotada con equipos de cómputo, impresora e internet para el control administrativo y técnico del proyecto en obra.

El manejo y control administrativo se adelanta desde la oficina principal ubicada en la Carrera 70C N° 48 – 55 Barrio Normandía, con los siguientes recursos:

- Equipos de cómputo para residentes e inspectores
- Impresora
- Internet
- Teléfonos celulares
- Baños

10. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

10.2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - INTERVENTORÍA

Dadas las actividades realizadas en el periodo, no se ha requerido realizar programación de toma de contramuestras, teniendo en cuenta la frecuencia planteada en el Plan de Inspección y Ensayo propuesto por interventoría se ha cumplido con la frecuencia del mismo, sin embargo, en caso de incertidumbre se programará la toma de contramuestras.

10.3. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - CONTRATISTA

Se incluye el seguimiento al Plan de Inspección y Ensayo propuesto por el contratista correspondiente al mes de mayo de 2024, en el cual se evidencia el seguimiento y control realizado a los materiales e insumos que inciden en la calidad del proyecto.

VER ANEXO 5. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE CONTRATISTA

11. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

11.1. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – INTERVENTORÍA

Para el desarrollo del proyecto se realizará el seguimiento a los equipos de inspección, medición y ensayo usados.

La interventoría contará con la contratación del laboratorio PSI Ingeniería para realizar las contra muestras de materiales cuando esto sea requerido, por frecuencia o por incertidumbre de los resultados recibidos del contratista, este laboratorio cuenta con la acreditación de sus métodos de ensayo por lo cual se anexa el certificado emitido por ONAC, la certificación de acreditación fue incluida en el anexo 4 del informe N°1.

Se presentan los certificados de verificación en laboratorio de los equipos de topografía de Interventoría incluido en anexo 5 del informe de calidad de interventoría N°1.

EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	FECHA VERIFICACIÓN
NIVEL AUTOMÁTICO	GANCE	1154266	DSZ3-32X	18-08-2023

Tabla 8. Equipos de topografía de interventoria

Para el periodo del presente informe no se realizan actividades de obra que requieran control topográfico por lo tanto no se presenta información correspondiente.

11.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – CONTRATISTA

El CONSORCIO ejecuta sus actividades de topografía asegurando la validez y fiabilidad de sus resultados, por lo cual hace seguimiento al estado de conformidad de los equipos de topografía, se presenta los certificados de calibración de los mismos; se realizó por parte de la interventoría que se realicen las verificaciones periódicas a los mismos en campo bajo el acompañamiento del equipo técnico de interventoría, para esto se solicitó realizar la documentación de acción correctiva dado a que estos chequeos periódicos no se están realizando.
El contratista realiza el chequeo de los equipos de topografía para este periodo los cuales se incluyen en el siguiente anexo:

Los equipos de topografía usados en obra se encuentran descritos en la siguiente tabla:

N°	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA CALIBRACION	N° CERTIFICADO
1	Estación total	TOPCON	GPT-3105W	8R0210	29/11/23	2023-3358
2	Nivel automático	TOPCON	AT-B4A	WP087044	29/11/23	2023-3359

Tabla 9. Equipos de topografía de Contratista

El contratista realiza la contratación del laboratorio INGEOVINF, aportando los certificados de calibración vigentes de los equipos usados para el ensayo de las muestras enviadas, estas certificaciones fueron incluidas en el anexo 7 del informe de calidad N°4 correspondiente al mes de diciembre de 2023.

VER ANEXO 6. CONTOL EQUIPOS DE TOPOGRAFIA CONTRATISTA

11.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES

La trazabilidad de los materiales ingresados a obra permite contar con la información oportuna y confiable, en el periodo evaluado en este informe, se realizará la solicitud al contratista de entrega de listado semanal de materiales ingresados a obra, soportado con las certificaciones que evidencien el cumplimiento de especificaciones técnicas generales y/o particulares.

El listado de materiales presentado por el contratista se encuentra incluido en el siguiente anexo.

VER ANEXO 7. CONTOL DE MATERIALES

12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades realizadas en el periodo las cuales han contado con el seguimiento y supervisión de la interventoría son las siguientes:

Semana N°39 del 2 de junio al 8 de junio de 2024

INFORME TÉCNICO ADICIÓN Y PRORROGA

• PARQUE TUNAL

- se avanza con mantenimiento de senderos costado lateral izquierdo en la zona de Ruta de la Vida ubicada cerca de pista de BMX, sentido oriente a occidente.
- Se demuelen y retiran placas en concreto que se encontraban en los senderos.
- Se inicia a fundir tramos en concreto de tapetes en la ruta de la vida cerca de pista de BMX.
- Se avanzan con trabajos hidrosanitarios en la portería # 2.

• PARQUE EDUARDO SANTOS

- Se avanza con la instalación del adoquín Nuevo, se inicia la fundida de cintas de confinamiento en concreto.

• PARQUE LA INDEPENDENCIA

- En avanza con el mantenimiento de la zona de gimnasio.
- Se hace acta de entrega a la administración de la zona de biosaludables.

PARQUE NACIONAL

- Se avanza con el mantenimiento Hidrosanitario a Baterías de Baños Zona Infantil.
- Se avanza con el desmonte de divisiones de baño deterioradas y arreglo de cubiertas.
- Se inicia mantenimiento Hidrosanitario de baños fiscales y arreglo de cubiertas y pisos.
-Se inician desmontes de cielo rasos deteriorados por goteras en el edificio de administración.

PARQUE VILLA DOE LOS ALPES

- Se avanza con la compactación del material existente de la base portante.
- Se instala manto geotextil 2100 y se procede a aplicar subbase compacta en capas según lo programado.

• PARQUE NUEVO MUZU

- Se termino el retiro, mantenimiento y reinstalación de luminarias de la cancha sintética de futbol ocho.

- Se terminan los trabajos de mantenimiento y reparación de cajas de paso, contempladas en el diagnóstico.

PARQUE CAYETANO

- Se termino el retiro, mantenimiento y reinstalación de luminarias de la cancha sintética, fachadas de edificios que dan al parqueadero interno.

• PARQUE PETAR SALITRE

- Se avanza con la pintura del portón de ingreso vehicular costado nor- occidental.
- Se realiza limpieza del acceso.

• PARQUE LA FRAGUA

- Se avanza con el suministro en instalación de baranda perimetral en contorno de la zona de juegos que se ubica frente al coliseo.

• PARQUE MIRADOR ILLIMANI

- Se realizo visita de verificación de las actividades diagnosticadas.
- Se realiza acta de socialización con la administración y la Interventoría.

• PARQUE GAITAN CORTES

- Se realizo visita de socialización de inicio de las actividades diagnosticadas con la administración el contratista y la interventoría.

• PARQUE CASTILLA

Se instala los 3 sillines del juego infantil M5
• el día 7 de junio realiza el acta de puesta en servicio del juego infantil M5 con la administración, interventoría y contratista
• se avanza con el mantenimiento del cerramiento costado occidental y oriental de la cancha futbol 8, aplicación de anticorrosivo y pintura.
• Se realiza el desmonte e instalación de malla eslabonada en cerramiento perimetral costado oriental y occidental de la cancha futbol 8, en puntos específicos
• Se avanza con la adecuación y limpieza de la placa de los juegos biosaludables para iniciar con el recubrimiento sintético.
• Se aplica 3 capas de recubrimiento sintético de resibase en la placa de los juegos biosaludables

• PARQUE GILMA JIMENEZ

- Durante la semana se realiza sondeo e instalación de cable para la conexión de una torre de alumbrado del sendero peatonal, costado sur de la cancha futbol 11

• PARQUE EL RECREO

- Se mantiene el Cerramiento con cinta de peligro de la zona que viene siendo intervenida
- Desmonte de adoquín y limpieza del mismo
- Compactación de base granular y cama de arena
- Reinstalación de adoquín
- Desmonte e instalación de cuneta prefabricada
- Desmonte e instalación de bordillo prefabricado
- Demolición de carpeta asfáltica
- Excavación de base granular
- Suministro de arena de peña y mixto
- Desmonte de juegos infantiles en zona infantil como M5 y juego múltiple

• PARQUE LA ALQUERIA

- Se avanza con los tramites de RETIE y RETILAP

• PARQUE OLAYA HERRERA

- En zona de juegos infantiles, las piezas se vienen fabricando en taller
- Pendiente instalar aro de baloncesto

• PARQUE EL CARMELO

- Durante la semana se avanza en mantenimiento de un juego balancín

• PARQUE SAN ANDRES

- Durante la semana se realiza acta de socialización entre administración del parque, interventoría y contratista

• PARQUE LA SERENA

- Durante la semana se realiza acta de socialización entre administración del parque, interventoría y contratista

• PARQUE JUAN AMARILLO

- No se ha iniciado las actividades priorizadas

• PARQUE COMETAS

- En este parque en particular se avanza con el mantenimiento del cerramiento perimetral
- En taller se avanza con el proceso de fabricación de algunos módulos del cerramiento según medidas tomadas en sitio.

- Se avanza con el desmonte e instalación de mallas eslabonadas en puntos específicos

• PARQUE ATABANZA

- Se continua con la demolición de senderos en mal estado.
- Se realiza compactación del suelo, instalación de malla electrosoldada y se funden placas en concreto a la entrada del Conjunto Atabanza 4.

• PARQUE SAUZALITO

- Se realizó el desmonte y retiro de luminarias alumbrado público.
- Se continuo con la instalación de cableado eléctrico.
- Se realizo el suministro de fotoceldas
- Se realizo la instalación de luminarias tipo Led.
- Se realizo el suministro de varillas cooper well
- Se realizó la instalación de luminarias alumbrado público.

• PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se terminaron los remates en las cajas eléctricas.
- Se fundieron las tapas de las cajas eléctricas.
- Se realizó la instalación de tubería EMT
- Se realizó la instalación del cable eléctrico
- Se instalaron los tableros totalizadores.

• PARQUE SIMON BOLIVAR

- Se iniciaron actividades de mantenimiento, adecuación o recuperación en las zonas a intervenir.
- Se realizo el cerramiento de la zona de los columpios M-5.
- Se inicio el mantenimiento de los columpios M-5. (lijada de los columpios

• PARQUE CASA BLANCA

- No se han iniciado actividades de mantenimiento, adecuación o recuperación en las zonas a intervenir, el contratista manifiesta que este parque se inicia según programación el 24-06-2024.
- Se envía oficio al contratista IDRD-3131-2023-456 –Reiteración Inicio de Actividades de la Adición - Parque Casa Blanca, ya que en este parque se pueden iniciar actividades de mantenimiento.

• PARQUE PLAZA DE LOS ARTESANOS

- Se realizo visita en conjunto entre Contratista de Obra e Interventoría (07-06-2024).
- Se realizo recorrido en las plazas donde se evidenciaron las actividades a realizar en las baterías sanitarias y zonas deportivas.
- Se realizo Acta de Visita.
- Se solcito al Contratista realizar el respectivo presupuesto para iniciar los trabajos inmediatamente.

• PARQUE DE LOS NIÑOS

Se realizo el arreglo de los tubos del xilófono.
Se instalaron las cuerdas que estaban en mal estado y dañadas en los juegos de los rodaderos.
Se reviso y se apretaron tornillos sueltos en los juegos.
Se arreglo piso en caucho de color azul en la zona de los columpios infantiles
Se arreglo la figura del gato

• PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se realizó el desmonte el vinilo existente en módulo de baños.
- Se realizó la instalación del vinilo en módulo de baños.
- Se realizo fundida placa de concreto al lado del módulo de baños.
- Se realizó la lijada, pintura anticorrosiva y pintura en la baranda del módulo de baños.

• PARQUE CANAL RIO NEGRO

- No se han iniciado actividades de mantenimiento, adecuación o recuperación en las zonas a intervenir, el contratista manifiesta que este parque se inicia según programación el 02-07-2024.

• PARQUE ZONA FRANCA

- Se realizo el desmonte del piso caucho el cual se encontraba en mal estado y dañado.
- Se inicio el lijado de la baranda metálica.

• PARQUE VALLES DE CAFAM

- Se terminan los mantenimientos, Desmonte, reinstalación, pintura general con arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables.
- Se termina mantenimiento y pintura de estructura de señalética y se instala banner informativo.
- Se realiza acta de entrega y puesta en servicio de todo lo diagnosticado.

FRENTES DE TRABAJO ADICON:

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Valle de Cafam=100%, Parque Eduardo Santos=70%, Parque Independencia=80%, Parque Villas de los Alpes=37%, Parque Tunal=29%, Parque Nuevo Muzu=95% Parque Nacional=22%, Cayetano=90%, Parque La Fragua=10%, Parque Gaitán Cortes=10%, Ptar Salitre=85%

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Castilla=15,91%, Parque Gilma Jiménez=22,48%, Parque la Alquería=

95%, Parque Olaya Herrera=71%, Parque el Recreo=1,47%, Parque Timiza Villa del Rio=28,23%, Parque Cometas=18,22%. Parque Carmelo= 6,58%.

FRENTE 3 Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Atabanza=1,44%, Parque Sauzalito= 80,50%, Parque Velódromo 1 de Mayo=85%, Parque los Niños=35%, Parque Simón Bolívar=0,14%, Parque Zona Franca=4,67%, Parque de los Novios=4,91%

Semana N°40 del 9 de junio al 15 de junio

INFORME TÉCNICO ADICIÓN Y PRORROGA

• PARQUE TUNAL

- Se avanzan los trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín y concreto, costado lateral de la ruta de la vida en dirección a puerta # 6.
- Se atienden trabajos hidrosanitarios en los baños del coliseo y se dejan listos para enchapar.
- Se atienden mantenimientos hidrosanitarios en baños de puerta # 2 tenis,

• PARQUE EDUARDO SANTOS

- Se avanza con los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín zona posterior al coliseo, se funden cintas y se instalan piezas de adoquín.

• PARQUE LA INDEPENDENCIA

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de las maquinas del gimnasio. se instalan vallas informativas de biosaludables y del gimnasio, se reparan y aseguran bancas de madera.

PARQUE NACIONAL

- Se avanza con las actividades de mantenimiento de baterías de baños infantiles, batería de baños fiscales, se desmontan todos los enchapes existentes en batería de baños fiscales de piso y pared, se procede a alistar nuevamente para el enchape nuevo.
- Se avanza con el mantenimiento de cubiertas de zona de baños fiscales y de la zona de administración.

PARQUE VILLA DOE LOS ALPES

- Se avanza con la instalación de manto geotextil 2100, y subbase certificada, compactada mecánicamente, se verifican niveles de subrasantes y sellados del suelo de sustento

• PARQUE NUEVO MUZU

- Se terminan actividades y se programa entrega a la administración el próximo martes 18 de junio.

• PARQUE PETAR SALITRE

- Se hace acta de puesta en servicio del carreteable de ingreso la zona de evacuación de la petar, ya que la administración del parque necesita darle uso. se avanza con la pintura del portón de acceso vehicular solicitado por la entidad.

• PARQUE LA FRAGUA

- En esta semana no se realizaron actividades en este parque, así lo estipularon en la programación y están cumpliendo con ella.

• PARQUE MIRADOR ILLIMANI

- Se avanza con los remates para la entrega final del módulo de baños.

• PARQUE GAITAN CORTES

- Se realiza reunión y acta de inicio de actividades con la administración y el contratista.

• VALLES DE CAFAM

- se termina mantenimiento y pintura de máquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables se hace entrega y puesta en servicio definitiva.

• PARQUE VILLA DE LOS ALPES

- Se avanza con la instalación de manto geotextil 2100, y subbase certificada, compactada mecánicamente, se verifican niveles de subrasantes y sellados del suelo de sustento

• PARQUE GILMA JIMENEZ

- Durante la semana se realiza mantenimiento de juego infantil de la canasta la cual se había soltado de su rodamiento.
- Falta realizar excavación e instalación de ductos eléctricos

• PARQUE EL RECREO

- Se mantiene el Cerramiento con cinta de peligro de la zona que viene siendo intervenida
- Compactación de base granular y cama de arena
- Reinstalación de adoquín
- Compactación de base granular
- Suministro de adoquín para reemplazar adoquín desportillado en mal estado
- Se realiza cinta de ajuste
- El avance se ha visto afectado por falta de material

- Retiro de escombros
- Localización y replanteo de dados de nuevos juegos infantiles

• PARQUE LA ALQUERIA

- Se avanza con los tramites de RETIE y RETILAP

• PARQUE OLAYA HERRERA

- Se instala y pinta pieza en maquina grecorromana
- Se instala aro de baloncesto
- Mantenimiento de cuerdas y tensores de juego infantil piramidal

• PARQUE EL CARMELO

- Se inicia con el cerramiento de zona de juegos de madera
- Se inicia con el desmonte de juegos infantiles de madera

• PARQUE SAN ANDRES

- Durante la semana no se realizó ninguna actividad

• PARQUE LA SERENA

- Durante la semana no se realizó ninguna actividad

• PARQUE JUAN AMARILLO

- Durante la semana no se avanza ninguna actividad

• PARQUE COMETAS

- En este parque en particular se avanza con el mantenimiento del cerramiento perimetral
- En taller se avanza con el proceso de fabricación de algunos módulos del cerramiento según medidas tomadas en sitio.
- Se avanza con el desmonte e instalación de mallas eslabonadas en puntos específicos

PARQUE CASTILLA

- Se realiza cerramiento de la zona infantil
- Se avanza con el mantenimiento del cerramiento costado occidental y oriental de la cancha futbol 8, aplicación de anticorrosivo y pintura.
- Se realiza el desmonte e instalación de malla eslabonada en cerramiento perimetral costado oriental y occidental de la cancha futbol 8, en puntos específicos

- Se realiza desmonte de juegos infantiles existentes en zona infantil
- Se inicia con el mantenimiento y lijado de la malla contra impacto costado norte y sur

PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO

- Compactación de rasante y cama de arena
- Desmonte e instalación de tabletas prefabricadas
- Estuco en camerinos
- Mantenimiento de máquinas de la ruta de la vida
- Mantenimiento de máquinas grecorromanas
- Construcción de cintas de ajuste en sendero peatonal
- Pintura listones bancas en madera

• PARQUE ATABANZA

- Se continua con la demolición de concreto en senderos en mal estado.
- Se realiza compactación del suelo, instalación de malla electrosoldada y se funden placa en concreto a la entrada del Conjunto Atabanza 4.
- Se realiza descapote y excavación manual en zona de juegos infantiles

• PARQUE SAUZALITO

- Se termino la instalación de cableado eléctrico.
- Se realizaron la revisión de las luminarias instaladas en horas nocturnas.

• PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se terminaron los remates en las cajas eléctricas.
- Se fundieron las tapas de las cajas eléctricas.
- Se realizó la instalación de tubería EMT
- Se realizó la instalación del cable eléctrico
- Se instalaron los tableros totalizadores

• PARQUE SIMON BOLIVAR

- Se continua con el mantenimiento de los columpios M-5. (lijada de las estructuras de los columpios).

• PARQUE CASA BLANCA

- No se han iniciado actividades de mantenimiento, adecuación o recuperación en las zonas a intervenir, el contratista manifiesta que este parque se inicia según programación el 24-06-2024.

- Se envía oficio al contratista IDRD-3131-2023-472 – Tercera solicitud de Inicio de Actividades de la Adición - Parque Casa Blanca, ya que en este parque se pueden iniciar actividades de mantenimiento. (zona grecoromanos y zona infantil).

• PARQUE PLAZA DE LOS ARTESANOS

- Se realizo visita en conjunto entre Contratista de Obra, Interventoría y Supervisión del contrato (17-06-2024).
- Se realizo recorrido en las plazas donde se evidenciaron las actividades a realizar en las baterías sanitarias y zonas deportivas.
- Se realiza Acta de Visita.
- Se solcito al Contratista realizar el respectivo presupuesto para iniciar los trabajos inmediatamente.

• PARQUE DE LOS NIÑOS

- Se revisaron nuevamente los arreglos realizados por el Contratista
- Se realizo el mantenimiento de los tubos del xilófono.
- Se instalaron las cuerdas que estaban en mal estado y dañadas en los juegos de los rodaderos de la arenera.
- Se reviso y se apretaron tornillos sueltos en los columpios.
- Se instalaron las cuerdas que estaban en mal estado y dañadas en los juegos de los rodaderos del piso en caucho.
- Se arreglo piso en caucho de color azul en la zona de los columpios infantiles
- Se arreglo la figura del gato.
- Se realizo el mantenimiento de cuerdas en el juego del bombero.
- Se realizan observaciones al contratista para ser subsanadas.

• PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se revisó el andén fundido en concreto que conecta al módulo de baños.
- Se realizó aseo en los módulos de baños.
- Se realizan observaciones por parte de interventoría.
- Se termino de realizar el desmonte del vinilo existente en módulo de baños.
- Se realizó la instalación del vinilo en módulo de baños.

• PARQUE CANAL RIO NEGRO

- Se realiza cerramiento con polisombra.
- Se inicia lijada de baranda.
- Se inicia lijada de juego M3 –A, se aplica anticorrosivo se inicia la pintada del juego.

• PARQUE ZONA FRANCA

- Se continua con la lijada e inicio de la pintura de la baranda.
- Se termino el desmonte del piso caucho el cual se encontraba en mal estado y dañado.

- Se inicio el mantenimiento de los biosaludables.

PARQUE FONTANAR

- No se han iniciado actividades de mantenimiento, adecuación o recuperación en las zonas a intervenir.
- Se envía oficio al contratista IDRD-3131-2023-473 – -Requerimiento Inicio de Actividades de la Adición Parque Fontanar del, ya que en este parque se pueden iniciar actividades de mantenimiento. (zona grecoromanos y zona Biosaludables).

FRENTES DE TRABAJO ADICON:

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Valle de Cafam=100%, Parque Eduardo Santos=90%, Parque Independencia=90%, Parque Villas de los Alpes=42%, Parque Tunal=34,14%, Parque Nuevo Muzu=95% Parque Nacional=26%, Cayetano=90%, Parque La Fragua=10%, Parque Gaitán Cortes=10%, Ptar Salitre=85%

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Castilla=16,69%, Parque Gilma Jiménez=22,62%, Parque la Alquería= 95%, Parque Olaya Herrera=71,32%, Parque el Recreo=1,89%, Parque Timiza Villa del Rio=30,51%, Parque Cometas=26,86%. Parque Carmelo= 6,63%.

FRENTE 3 Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Atabanza=1,44%, Parque Sauzalito= 100,00%, Parque Velódromo 1 de Mayo=85%, Parque los Niños=55%, Parque Simón Bolívar=0,34%, Parque Zona Franca=10,40%, Parque de los Novios=6,79%, Parque Canal Rio Negro= 4,44%

Semana N°41 del 16 de junio al 22 de junio de 2024

INFORME TÉCNICO ADICIÓN Y PRORROGA

• PARQUE TUNAL

- se inicia demolición y retiro de placas en concreto y adoquín en mal estado del sendero frente a parkour.
- se inicia la instalación de adoquín nuevo, en los senderos del costado lateral de la ruta de la vida en dirección a puerta # 6.
- se avanza con la excavación para la instalación del bicicletero en el lateral del ingreso a la pista de box.

• PARQUE EDUARDO SANTOS

- se terminan los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín zona posterior al coliseo, se funden cintas y se evacuan observaciones de la interventoría para entrega y puesta en servicio.

• PARQUE LA INDEPENDENCIA

- se avanza con el mantenimiento y pintura de las maquinas del gimnasio. se instalan vallas informativas de biosaludables y del gimnasio, se reparan y aseguran bancas de madera.

• PARQUE NACIONAL

- se avanza con las actividades de mantenimiento hidrosanitario de baterías de baños infantiles, batería de baños fiscales, se desmontan todos los enchapes existentes en batería de baños fiscales de piso y pared, se procede a alistar con afinado de muros y pisos nuevamente para el enchape nuevo.
- se avanza con el mantenimiento de cubiertas de zona de baños infantiles, fiscales y de la zona de administración.

• PARQUE VILLA DOE LOS ALPES

- se termina la instalación de manto geotextil 2100, y subbase certificada, compactada mecánicamente, se verifican niveles de subrasantes y sellados del suelo de sustento, se instala bases granulares hasta los niveles establecidos y se compacta mecánicamente, se compactan bordes de perímetro.

• PARQUE NUEVO MUZU

- se terminan actividades eléctricas y se hace entrega a la administración.

• PARQUE PETAR SALITRE

- se terminan actividades del carreteable y del portón vehicular de ingreso se hace acta de puesta en servicio.

• PARQUE LA FRAGUA

-en esta semana no se realizaron actividades en este parque, así lo estipularon en la programación y están cumpliendo con ella.

• PARQUE MIRADOR ILLIMANI

- se avanza con los remates para la entrega final del módulo de baños, se reubica caneca y bolardo que estaban mal instalados.

• PARQUE GAITAN CORTES

- se inician actividades de mantenimiento y pintura de máquinas de gimnasio y biosaludables

PARQUE PETAR SALITRE

- Se terminan actividades del carreteable y del portón vehicular de ingreso se hace acta de puesta en servicio

• PARQUE GILMA JIMENEZ

- Falta realizar excavación e instalación de ductos eléctricos para el mástil que no tiene energía y no se avanza en otra actividad correspondiente a temas eléctricos.

PARQUE CASTILLA

- Se mantiene cerramiento de la zona infantil
- Se realiza el desmonte e instalación de malla eslabonada en cerramiento perimetral costado oriental y occidental de la cancha futbol 8, en puntos específicos
- Se realiza replanteo y excavación de dados de nuevos juegos infantiles en zona infantil
- Se inicia con el mantenimiento, lijado y aplicación de anticorrosivo de la malla contra impacto costado norte y sur
- Fundición de dados en concreto para nuevos juegos infantiles
- Se realiza mantenimiento a la placa de concreto del juego m5
- Zona de biosaludables en uso por la comunidad
- Instalación de vinilo adhesivo en señal informativa

• PARQUE EL RECREO

- Se mantiene el Cerramiento con cinta de peligro de la zona que viene siendo intervenida
- Excavación de capa de recebo, por fallo en la rasante
- Construcción de cintas de ajuste
- Excavación manual de dados de nuevos juegos infantiles
- Construcción de regata perimetral de la zona infantil, para confinamiento del piso caucho
- Suministro e instalación de módulos de la baranda m83
- Se inicia con el mantenimiento de las máquinas de la ruta de la vida
- Se desmontan las superficies de abdomen en ruta de la vida por estar defectuosas

• PARQUE LA ALQUERIA

- Se avanza con los tramites de RETIE y RETILAP

• PARQUE OLAYA HERRERA

- Se instala un carrusel

PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO

- Estuco en camerinos
- Se termina el mantenimiento de máquinas de la ruta de la vida, y se realiza de puesta en servicio entre interventoría y contratista, por motivo que no fue posible la ubicación del administrador. Anotando que hace falta instalar una pieza a una máquina de la ruta de la vida
- Mantenimiento, Lijado, anticorrosivo y pintura de máquinas grecorromanas
- Construcción de cintas de ajuste en sendero peatonal
- Pintura listones bancas en madera
- Demarcación de 3 canchas de microfutbol

• PARQUE EL CARMELO

- se desmonta el cerramiento de zona de juegos de madera, una vez terminado el desmonte de juegos
- Se termina con el desmonte de juegos infantiles de madera
- Se nivela la zona donde estaban los juegos de madera, tapando los huecos e instalando capa de tierra negra
- Se realiza desmonte de caneca en mal estado

• PARQUE SAN ANDRES

- Durante la semana no se realizó ninguna actividad

• PARQUE LA SERENA

- Durante la semana no se realizó ninguna actividad

• PARQUE JUAN AMARILLO

- Durante la semana no se avanza ninguna actividad

• PARQUE COMETAS

- En este parque en particular se avanza con el mantenimiento del cerramiento perimetral
- En taller se avanza con el proceso de fabricación de algunos módulos del cerramiento según medidas tomadas en sitio.
- Se avanza con el desmonte e instalación de mallas eslabonadas en puntos específicos
- Se realiza prueba de tintas en puntos específicos, para verificar las soldaduras que se vienen ejecutando, apreciando en sitio que cumplen

• PARQUE ATABANZA

- Se continua con la excavación manual en zona de juegos infantiles.
- Se funde placa en concreto.

• PARQUE SAUZALITO

- Se realizaron la revisión de las luminarias instaladas en horas nocturnas.
- Se realizo la puesta en servicio y el acta final de entrega.

• PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se realizaron la revisión de las luminarias instaladas en horas nocturnas.
- Se realizo la puesta en servicio y el acta final de entrega.

• PARQUE SIMON BOLIVAR

- Se continua con el mantenimiento de los columpios M-5. (lijada de las estructuras de los columpios).
- Se realizo desmonte de piso caucho en mal estado zona B.

• PARQUE CASA BLANCA

- Zona Cancha de baloncesto: Suministro e instalación de rejillas prefabricado.
- Zona Infantil: Se inicio el lijada, pintura anticorrosiva y pintura en baranda.

• PARQUE PLAZA DE LOS ARTESANOS

- Se realizo visita en conjunto entre Contratista de Obra, Interventoría y Supervisión del contrato (17-06-2024).
- Se realizo recorrido en las plazas donde se evidenciaron las actividades a realizar en las baterías sanitarias y zonas deportivas.
- Se realiza Acta de Visita.
- Se solcito al Contratista realizar el respectivo presupuesto para iniciar los trabajos inmediatamente.

• PARQUE DE LOS NIÑOS

- Se revisan observaciones por parte de interventoría.
- Se realizo la entrega de los elementos de la cancha de arena (Equipamiento canchas móviles, manuales).
- Se realizó el acta de puesta en servicio de la cancha de deportes de arena.

• PARQUE DE LOS NOVIOS

- Actividades terminadas.
- Se revisaron las observaciones solicitadas por interventoría en pintura.
- Se realizó aseo en los módulos de baños.

• PARQUE CANAL RIO NEGRO

- Se termina las actividades de pintura en el Módulo M3 A y Baranda
- Pendiente instalación del rodadero.
- Se continua con el cerramiento con polisombra

• PARQUE ZONA FRANCA

-- Se continua con el mantenimiento de los módulos biosaludables.

PARQUE FONTANAR

- Se realiza mantenimiento en los Módulos Biosaludables.

Semana N°42 del 23 de junio al 29 de junio de 2024

INFORME TÉCNICO ADICIÓN Y PRORROGA

• PARQUE TUNAL

- Se avanza con la instalación de adoquín nuevo y piezas en el sendero, costado lateral izquierdo en la zona de Ruta de la Vida ubicada cerca de pista de BMX, sentido oriente a occidente,
- Se inicia la instalación del bicicletero junto a ingreso de BMX.
- Se terminan los tramos de senderos reparados en las zonas laterales de la ruta de la vida.
- Se funden placas en concreto nuevas en zona de senderos y plazoleta.
- Se inician actividades de retiro y demolición de senderos frente a parkour
- Se instala señal informativa en parkour.

• PARQUE EDUARDO SANTOS

- Se termina de atender las observaciones de la interventoría, se alista para puesta en servicio y entrega a la administración.

• PARQUE LA INDEPENDENCIA

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de bancas en madera y hierro, que es la única actividad pendiente de entrega

• PARQUE NACIONAL

- Se avanza con el mantenimiento Hidrosanitario a Baterías de Baños Fiscales 1 y 2.
- Se termina mantenimiento Hidrosanitario de baños fiscales, cambio de registros,
- Se continua con el afinado de muros y pisos, se avanza con el aseo y mantenimiento de cubiertas y canales.
- Se avanza con la fabricación de divisiones en acero de baños infantiles y fiscales.

• PARQUE VILLA D0E LOS ALPES

- Se termina la compactación del material suministrado y aplicado, bases, se compactan con equipo mecánico, se alista para toma de densidades.
- Se toman densidades en sitio

• PARQUE LA FRAGUA

- Se avanza con el suministro en instalación de baranda perimetral en contorno de la zona de juegos que se ubica frente al coliseo.

• PARQUE MIRADOR ILLIMANI

- Se avanza con las actividades de arreglo y mantenimiento de tapas, marcos en cajas de inspección.

• PARQUE GAITAN CORTES

- Se avanza con el mantenimiento de máquinas del gimnasio
- Se inicia la demolición de la placa asfáltica.

PARQUE VALLES DE CAFAM

- Se terminan los mantenimientos, Desmonte, reinstalación, pintura general con arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables.
- Se termina mantenimiento y pintura de estructura de señalética y se instala banner informativo.
- Se realiza acta de entrega y puesta en servicio de todo lo diagnosticado.

• PARQUE CAYETANO CAÑIZARES

- Se termino el retiro, mantenimiento y reinstalación de luminarias de la cancha sintética, fachadas de edificios que dan al parqueadero interno.
- Se realiza reunión de finalización de actividades y acta de puesta en servicio

• PARQUE NUEVO MUZU

- Se termino el retiro, mantenimiento y reinstalación de luminarias de la cancha sintética de futbol ocho.
- Se hace acta de entrega y puesta en servicio.

• PARQUE CASTILLA

- Se mantiene cerramiento de la zona infantil
- Se termina el desmonte e instalación de malla eslabonada en cerramiento perimetral costado oriental y occidental de la cancha futbol 8, en puntos específicos

- Se avanza con el mantenimiento, lijado y aplicación de anticorrosivo de la malla contra impacto costado norte y sur
- Se termina Fundición de dados en concreto para nuevos juegos infantiles
- Se realiza mantenimiento a la placa de concreto del juego m5
- Se aplica autonivelante a placa de zona infantil y m5
- Se inicia la instalación de piso caucho SBR según diseño aprobado por la supervisión

• PARQUE GILMA JIMENEZ

- Se realiza excavación e instalación de ductos eléctricos para el mástil que no tiene energía

• PARQUE EL RECREO

- Se mantiene el Cerramiento con cinta de peligro de la zona que viene siendo intervenida
- Excavación de capa de recebo, por fallo en la rasante
- Se termina Excavación manual de dados de nuevos juegos infantiles
- Se termina el Suministro e instalación de módulos de la baranda m83
- Se aplica anticorrosivo y pintura en baranda m83
- Se suministra y compact capa de base granular en fallo
- Se instala puerta de la baranda m83

PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO

- Se avanza con estuco en camerinos
- Se avanza con el Mantenimiento, Lijado, anticorrosivo y pintura de máquinas grecorromanas
- Construcción de cintas de ajuste en senderos peatonales
- Pintura listones bancas en madera
- Mantenimiento de cuerdas en juego infantil
- Desmonte e instalación de tabletas prefabricadas tipo IDU

PARQUE ALQUERIA

- Se avanza con los tramites de RETIE y RETILAP

PARQUE OLAYA

- Pendiente que lleguen piezas del juego del balancín.

• PARQUE EL CARMELO

- Se instala cerramiento en zona donde se va a realizar la excavación para drenaje de aguas lluvias de la zona del arenero
- Se realiza excavación manual para red de aguas lluvias
- Se suministra cárcamo prefabricado
- Se realiza mantenimiento al juego infantil existente araña

• PARQUE SAN ANDRES

- Durante la semana no se realizó ninguna actividad.

• PARQUE LA SERENA

- Durante la semana no se realizó ninguna actividad

• PARQUE JUAN AMARILLO

- • Durante la semana se avanza en mantenimiento de las maquinas grecorromanas

• PARQUE COMETAS

- En este parque en particular se avanza con el mantenimiento del cerramiento perimetral
- En taller se avanza con el proceso de fabricación de algunos módulos del cerramiento según medidas tomadas en sitio.
- Se avanza con el desmonte e instalación de mallas eslabonadas en puntos específicos

• PARQUE ATABANZA

- Se continua con la excavación manual en zona de juegos infantiles.
- Se realiza revisión tubería encontrada en la zona infantil
- Se alista piso (compactación), se coloca malla electrosoldada
- Se funde placa en concreto entrada Atabanza No.2.

• PARQUE SAUZALITO

- Se realizaron la revisión de las luminarias instaladas en horas nocturnas.
- Se realizo la puesta en servicio y el acta final de entrega.

• PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se realizo a la entrega de las luminarias de la zona del patinódromo, se realizó la instalación del tablero de control, el cual se verifico por interventoría el día viernes,
- Se realizo la capacitación de utilización de los tableros.

• PARQUE SIMON BOLIVAR

- Se continua con el mantenimiento de los columpios M-5. (lijada de las estructuras de los columpios).
- Se termina el desmonte del piso caucho.
- Se revisa pintura de Módulos de comida.

• PARQUE CASA BLANCA

- Zona Grecos: se inicia el mantenimiento de los módulos de los grecoromanos
- Zona Infantil: Se continua con el lijada, pintura anticorrosiva y pintura en baranda.

• PARQUE DE LOS NIÑOS

- Se realizo la entrega de los elementos de la cancha de arena (Equipamiento canchas móviles, manuales).
- Se realizó el acta de puesta en servicio de la cancha de deportes de arena.

• PARQUE DE LOS NOVIOS

- Actividades terminadas en el módulo de baños.

• PARQUE CANAL RIO NEGRO

- Se instala el rodadero pendiente
- Se terminan las actividades.
- Pendiente puesta en servicio y acta de terminación.

• PARQUE ZONA FRANCA

- Se realiza el mantenimiento del juego resortados.
- Se continua con el mantenimiento de los módulos biosaludables (Pintura anticorrosivo + pintura de los módulos).

• PARQUE FONTANAR

- Se continua con el mantenimiento en los Módulos Biosaludables .
- Se continua con el mantenimiento de la baranda en los Módulos Biosaludables

• PARQUE PLAZA DE LOS ARTESANOS

- El Contratista no ha iniciado actividades en este frente de obra.
- Se solicita al contratista comenzar actividades de manera urgente en este parque.

• PARQUE CANAL BOYACA

- Se realizo la entrega del parque a la comunidad.

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con diez (12) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Valle de Cafam=100%, Parque Eduardo Santos=100%, Parque Independencia=98%, Parque Villas de los Alpes=51,85%, Parque Tunal=50%, Parque Nuevo Muzu=95%, Parque Nacional=42%, Parque Cayetano=100%, Parque La Fragua=10%, Parque Gaitan Cortes=40%, Ptar Salitre=100%

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (11) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Castilla=20,38%, Parque Gilma Jlmenez=22,68%, Parque la Alqueria= 95,01%, Parque Olaya Herrera=79,61%, Parque el Recreo=6,66%, Parque Timiza Villa del Rio=44,13%, Parque Cometas=38,26%. Parque Carmelo= 10,62%.

FRENTE 3 Este frente cuenta con diez (14) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Atabanza=4,23%, Parque Sauzalito=100%, Parque Velodromo 1 de Mayo=100%, Parque los Niños=100%, Parque Simón Bolivar=1,10%, Parque Zona Franca=33,38%, Parque de los Novios=7,34%, Parque Canal Rio Negro=100%, Parque Casa Blanca=15,72%, Parque Fontanar del Rio=7,54%

El control y seguimiento de las actividades de obra por parte de la interventoría son soportadas con la liberación de actividades incluidas en el Anexo 6 Informe Técnico

13. CONTROL DE CAMBIOS

A la fecha de corte del presente informe se realiza el registro de control de cambios por parte del contratista, haciendo uso del formato de la entidad en el cual se registran los cambios producidos por la adición y prórroga del contrato de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inspección y Ensayo propuesto por el contratista.

VER ANEXO 8. CUADRO CONTROL DE CAMBIOS

14. SALIDAS NO CONFORMES

En el periodo no se registraron salidas no conformes correspondientes al proceso de interventoría.

En el proceso de seguimiento del contrato de obra, se han identificado por parte de interventoría SNC las cuales son documentadas y registradas por el contratista, su seguimiento y soportes se encuentra en el siguiente anexo:

VER ANEXO 9. SALIDAS NO CONFORMES CONTRATISTA

15. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Con el fin de contar con un control adecuado a la propiedad del cliente durante el desarrollo del contrato, esta interventoría realiza la solicitud al contratista de presentar las evidencias que permitan establecer este control. Para el periodo no se cuenta con registro correspondientes a propiedad del cliente.

16. AUDITORIAS INTERNAS

Se realiza la programación y ejecución de las auditorías internas al alcanzar un avance cercano al 30% y 70 % de avance, este proceso se surtió con el acompañamiento de Director de Obra, residentes y Profesional de calidad de contratista e interventoría, estos informes se presentaron al IDRD en los informes de calidad de la etapa contractual inicial.

ANEXO 1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES BOG	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	Código:FC-10 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 15-Dic-2023

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-jun Y EL 30-jun

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES BOG CONTRATO No. CO- IDRD 3099-2023

INTERVENTOR: SOLIUN INGENIERIA SAS CONTRATO No. CO-IDRD-3131-2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
4/06/2024	IDRD-3131-2023-447	Respuesta al comunicado CTO-IDRD-3099-2023-408- Geotecnia Villa de los Alpes	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
4/06/2024	IDRD-3131-2023-448	Respuesta al comunicado CTO-IDRD-3099-2023-373-Entrega diseños Fotométricos.	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
4/06/2024	IDRD-3131-2023-449	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-383 trabajos Servitá	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
4/06/2024	IDRD-3131-2023-450	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-398 Control de material dado de baja.	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
4/06/2024	IDRD-3131-2023-451	Respuesta al comunicado CTO-IDRD-3099-2023-402 Cronograma de ejecución de obras eléctricas.	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
4/06/2024	IDRD-3131-2023-452	Respuesta al comunicado CTO-IDRD-3099-2023-403 Observaciones eléctricas	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
4/06/2024	IDRD-3131-2023-453	Respuesta al comunicado CTO-IDRD-3099-2023-391 Manual de mantenimiento naranjos	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
4/06/2024	IDRD-3131-2023-454	Respuesta al comunicado CTO-IDRD-3099-2023-378 Resultados ensayos BG y SBG	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
6/06/2024	IDRD-3131-2023-455	Reiteración inicio de actividades de la adición parque Simón Bolivar	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
6/06/2024	IDRD-3131-2023-456	Reiteración Inicio de Actividades de la Adición Parque Casa Blanca	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
7/06/2024	IDRD-3131-2023-461	Observaciones ítems no previstos No 10	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
11/06/2024	IDRD-3131-2023-462	Respuesta al comunicado CTO-IDRD-3059-2023-405 Observaciones	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
12/06/2024	IDRD-3131-2023-464	Inicio de actividades de la adición parque Fontanar del rio.	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
12/06/2024	IDRD-3131-2023-466	Respuesta al comunicado CTO-IDRD-3059-2023-418 reiteración inicio de actividades de la adición parque simón bolivar.	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
12/06/2024	IDRD 3131-2023-467	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-417 Subsanación observaciones manual de mantenimiento naranjas.	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
12/06/2024	IDRD-3131-2023-468	Requerimiento entrega acta de recibo parcial No 9	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
12/06/2024	IDRD-3131-2023-469	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-419 Subsanación observaciones parque Servita.	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
18/06/2024	IDRD-3131-2023-472	Tercera solicitud de inicio de actividades de la adición parque casa blanca	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
18/06/2024	IDRD-3131-2023-473	Requerimiento inicio de actividades de la adición parque fontanar del rio	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
20/06/2024	IDRD-3131-2023-479	Plan de contingencia: Parque san Andrés, serena y juan amarillo.	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
21/06/2024	IDRD-3131-2023-480	Respuesta al comunicado CTO-IDRD-3099-2023-436 Actividades adición parque Fontanar del rio	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
21/06/2024	IDRD-3131-2023-481	Respuesta presupuestos etapa inicial y adición.	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
21/06/2024	IDRD-3131-2023-482	Respuesta comunicado CTO -IDRD-3099-2023-428 Cronograma Entrega manuales de mantenimiento	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
21/06/2024	IDRD-3131-2023-483	Legalización de facturas	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
24/06/2024	IDRD-3131-2023-484	Aclaración Observaciones a Informe Plan de Gerencia	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
24/06/2024	IDRD-3131-2023-485	Remisión observaciones presupuesto contractual- Componente eléctrico	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
24/06/2024	IDRD-3131-2023-486	Plan de contingencia Parque san Andrés serena y juan amarillo.	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
24/06/2024	IDRD-3131 2023-487	Requerimiento por no realizar el mantenimiento de la pista de trote fontanar del rio	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
25/06/2024	IDRD-3131-2023-488	Respuesta comunicado CTO -IDRD-3099-2023-432 Actividades a ejecutar- Módulos de baños Parque el porvenir	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONSORCIO PARQUES BOG
CORRESPONDENCIA ENVIADA				
4/06/2024	CTO IDRD-3099-2023-413	Respuesta al oficio IDRD-3131-2024-425-Balancines	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
4/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-414	Archivos de informe parque Juan Amarillo.	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
6/06/2024	CTO-IDRD 3099 2023 415	Respuesta al Oficio IDRD-3131-2024-431-Ajustes Acta No Previstos N°9	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
7/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-416	Respuesta oficio N° IDRD-3131-2024-432- Observaciones legalización de facturas Orden N° 3.	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
7/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-417	Respuesta oficio IDRD-3131-2024-453 Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-391- Subsanación manual de mantenimiento Naranjos.	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
7/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-418	Respuesta comunicado IDRD-3131-2024-455-Reiteración inicio de actividades de la adición parque Simón Bolivar.	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
11/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-419	Respuesta al Oficio IDRD-3131-2024-428 - Subsanación observaciones parque Servitá	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
13/06/2024	CTO-IDRD 3099-2023-420	Radicación de PMT-Parque Atabanza	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
14/06/2024	CTO IDRD-3099-2023-421	Respuesta Estructura Parque Villa de los Alpes (oficio IDRD-3131-2024-435) y Respuesta Comunicado CTO-IDRD-3099-2023-408 Geotecnia Villa de Los Alpes.	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
16/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-423	Informe Mensual No. 9	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
17/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-425	Control cambios para firma	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
17/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023 426	Diagnóstico de presupuestos solicitados por la supervisión del contrato	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
18/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-427	Respuesta Comunicado Idrd 3131-2024-450-Control De Material Dado De Baja	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
18/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-428	Cronograma entrega de manuales de mantenimiento.	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
18/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-429	Planos Constructivos Portones Parque Tunal.	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
18/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-430	Respuesta Comunicado IDRD-3131-2024-422 Observaciones Presupuesto V.13 – Componente Eléctrico	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
18/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-431	Respuesta Comunicado IDRD-3131-2024-417 Visita Parque Alta Blanca – Pista De Patinaje	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
18/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-432	Módulos Sanitarios Parque Porvenir	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
18/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-433	Entrega actas de inspección preliminar y elementos existentes Parques Adición	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
18/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-435	Respuesta oficio IDRD-3131-2024-436-Fespuesta presupuestos Etapa Inicial, Adición y cronograma adición	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
19/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-436	Respuesta comunicada IDRD-3131-2024-473 inicio de actividades de la adición Parque Fontanar del Río	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
19/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-437	Respuesta de comunicado IDRD-3131-2324-472 solicitud de inicio de actividades de la adición Parque Casa Blanca	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
20/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-438	Planos constructivos parque Tunal – Portón corredizo	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
20/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-439	Respuesta al oficio IDRD-3131-2024-400 Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-400 Informe plan de gerencia	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	Código:FC-10 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 15-Dic-2023

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-Jun Y EL 30-Jun

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES BOG CONTRATO No. CO- IDRD 3099-2023

INTERVENTOR: SOLIUN INGENIERIA SAS CONTRATO No. CO-IDRD-3131-2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
21/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-440	Radicación informe liquidación de anticipo	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
24/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-441	Listado SNC pendientes y estado de las mismas.	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
24/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-442	Respuesta oficio IDRD-3131-2024-454 Referencia: Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099- 2023-378 resultado ensayos BG y SBG	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
24/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-443	Respuesta a observaciones del Plan de Adquisiciones	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
25/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-444	Respuesta a observaciones del Plan de Adquisiciones	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
25/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-445	Respuesta comunicada IDRD-3099-2023-482-Cronograma de entrega de manuales de mantenimiento	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
25/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-446	Respuesta comunicada IDRD-3099-2023-479, Plan de contingencia Parque San Andrés, Serena y Juan Amarillo	CONSORCIO PARQUES BOG	SOLIUN INGENIERIA SAS
25/06/2024	CTO-IDRD-3099-2023-447	Respuesta comunicada IDRD-3131-2024-441 Observaciones informes fotométricos		

ANEXO 2. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERVENTORIA.

	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CÓDIGO	SGC-FR-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ELABORACIÓN	1/07/2023

Actualizado por: VIANNEY LEAÑO **Fecha Actualización:** 5/10/2023

Cargo: PROFESIONAL DE CALIDAD

CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACIÓN	TIEMPO DE CONSERVACION
SGI-FR-07	MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS	MATRIZ	2	15/08/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGI-FR-08	MATRIZ DE COMUNICACIONES	MATRIZ	3	25/08/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
OBR-FR-09	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO	FORMATO	4	4/08/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
PP-3131-2023	PLAN DE CALIDAD 3131-2023 INFRAESTRUCTURA	PLAN	1	18/09/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
ADM-FR-01	CORRESPONDENCIA ENVIADA	FORMATO	1	15/09/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
ADM-FR-02	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	FORMATO	1	15/09/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO

	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CÓDIGO	SGC-FR-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ELABORACIÓN	1/07/2023

Actualizado por: VIANNEY LEAÑO **Fecha Actualización:** 5/10/2023

Cargo: PROFESIONAL DE CALIDAD

CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACIÓN	TIEMPO DE CONSERVACION
DIR-FR-001	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	FORMATO	2	28/07/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
OBR-FR-01	TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE OBRA	FORMATO	4	20/09/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
OBR-FR-02	TRAZABILIDAD INSUMOS GRANULARES	FORMATO	3	11/07/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
OBR-FR-05	TRAZABILIDAD CONCRETO	FORMATO	2	11/07/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
OBR-FR-07	REGISTRO DE CLIMA	FORMATO	2	11/07/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
OBR-FR-10	VERIFICACIÓN DE MANUAL DE MANTENIMIENTO Y USO	FORMATO	1	22/08/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO

	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CÓDIGO	SGC-FR-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ELABORACIÓN	1/07/2023

Actualizado por: VIANNEY LEAÑO **Fecha Actualización:** 5/10/2023

Cargo: PROFESIONAL DE CALIDAD

CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACIÓN	TIEMPO DE CONSERVACION
OBR-FR-11	CONTROL DE ASFALTO	FORMATO	1	1/09/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-01	TRATAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS O DE MEJORA	FORMATO	1	10/11/2022	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-02	LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	FORMATO	2	1/07/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-03	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	FORMATO	3	1/07/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-04	INFORME DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/04/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-05	PLAN DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/04/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO

	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CÓDIGO	SGC-FR-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ELABORACIÓN	1/07/2023

Actualizado por: VIANNEY LEAÑO **Fecha Actualización:** 5/10/2023

Cargo: PROFESIONAL DE CALIDAD

CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACIÓN	TIEMPO DE CONSERVACION
SGC-FR-06	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/07/2023	G:\Mi unidad\CONTRATOS EN EJECUCION IDRD\IDRD-036-2023 - INFRAESTRUCTURA\CONT. INT 3131-2023\4. CALIDAD\PLAN DE CALIDAD	N/A	DURACION DEL PROYECTO

ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS CONTRATISTA

IDRD PARQUES DE BOG	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS								FC-01	
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO- IDRD 3093-2023								VERSION: 0 1	
Codigo	Version	Nombre del Documento (procedimiento, plan de calidad, instructivo, formato).	Ubicación	Fecha de aprobación	Generacion del documento	Requiere	Destino del documento	Revisa	Aprueba	Estado a corte de 17/06/24
DOCUMENTOS GESTIÓN DE CALIDAD										
PC-01	0,6	Plan de Calidad (con anexos como parte integral	Magnético	PC proyecto	Previo firma del contrato	IDRD e interventoria	Cupla Interventoria Cupla IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
PR-01	0	Control de documentos y registros	Magnético	PC proyecto	Durante la realizacion del plan de calidad y actua como documento maestro	La norma ISO 9001:2015 y 10005:2018	Cupla Interventoria Cupla IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
PR-02	0	Control de producto no conforme	Magnético	PC proyecto	Durante la realizacion del plan de calidad y actua como documento maestro	La norma ISO 9001:2015 y 10005:2018	Cupla Interventoria Cupla IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
PR 03	0	Comunicaciones	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
DOCUMENTOS TECNICOS										
CO- IDRD 3093-2023	n.a.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
N A	0,2	CRONOGRAMA GERAL	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
N A.	0,2	FLUJO DE INVERSION	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
15 307	1	PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
06-063	1	EL TUNAL	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
15 788	1	MIRADOR DE RUMAKI	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
06-017	1	NUEVO MUZU	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
07-035	1	LAURELES NARANJOS	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
07 191	1	PORVENIR	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
08 554	1	ESTADIO DE FECITO	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
15 043	1	LA FRAGUA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
16-112	1	CERRO MONTES	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
04 67 -	1	VILLA DE LOS ALPES	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
07 165	1	PALESTINA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
08 741	1	CAYETANO CARZANS	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
16 028	1	BOSQUE SAN CARLOS	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
16 706	1	UDS	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
12 091	1	PRO EL SALITRE - LICAD	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
12 141	1	PARQUE DE LOS NIÑOS	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
11 089	1	SIMON BOLIVAR	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
04-156	1	DEPORTIVO PRIMERO DE MAYO	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
14-030	1	EDUARDO SANTOS	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
01-023	1	SERVITA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
01 075	1	ALTA BLANCA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
02 014	1	CANAL EL VIRREY- EL CHICO	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
02 019	1	SUCRE - O HIPPIES	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
12 032	1	PARQUE DE LOS NOVIOS	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
04-122	1	LA VICTORIA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
05 016	1	EL VIRREY SUR	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
05-082	1	VILLA ALEMANA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
12 032	1	CANAL DEL RIO NEGRO	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
	1	CIUDAD JARDIN	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
11-366	1	FONTANAR DEL RIO	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
09 050	1	CANAL BOYACA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
03 035	1	PARQUE NACIONAL	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
04-103	1	SANTAN CORTES	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
11-873	1	SAN JOSE DE BAVARIA	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional en Gerencia	Director Obra	Vigente
DOCUMENTOS GESTION SST										
N/A	0,2	Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Magnético	PC proyecto	Etapa de diagnostico	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced Comunicaciones	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced Riesgo Biomecanico	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced EMO	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente

N/A	0	Programa Estilos de Vida y Trabajo Saludable	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Programa de inspecciones	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Cronograma actividades SST	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced IPERV	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Indicadores de Gestion	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Procd. Tareas Criticas	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Control de Documentos y Registros	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced Investigacion AT	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Plan de Emergencias	Magnético	PC proyecto	Etapa de diagnostico	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced Gestion del Cambio	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0	Proced Adquisiciones	Magnético	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
DOCUMENTOS GESTION AMBIENTAL										
N/A	0,4	Plan de Gestion Ambiental	Magnético	PC proyecto	Etapa de diagnostico	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
N/A	0,3	Plan gestion de RCD	Magnético	PC proyecto	Etapa de diagnostico	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente
DOCUMENTOS GESTION SOCIAL										
N/A	0,3	Plan de Gestion Social	Magnético	PC proyecto	Etapa de diagnostico	Partes interesadas	Partes interesadas	Profesional encargado segun area correspondiente	Profesional encargado segun area correspondiente	Vigente

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS							FC-01	
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO- IDRO 2023-2023							VERSION 0 1	
Nombre del Registro	Código	Medio (Físico o Magnético)	Almacenamiento y Recuperación (Donde se encuentra ubicado – Carpeta de Proyecto)	Conservación del documento	Responsable	Destino del documento	Revisa	Aprueba	Actualizado: 19/12/2024
TECNICO Y CALIDAD									
Acta de apertura en de contratistas no previstos	NA	Físico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Acta mayores y menores cantidades	NA	Físico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Analisis de Precios Unitarios	NA	Físico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Acta de liquidacion preliminar	NA	Físico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Acta de reunion	NA	Físico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Registro de diagnostico ambiental	NA	Físico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Liquidacion de Contratistas	NA	Físico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	IDRD e interventoria	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Listado maestro documentos registros	FC-01	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del plan de calidad	La norma ISO 9001:2015 y 19011:2018	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Tabulacion y evaluacion de propuestas	FC-02	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan de calidad	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Instructivo de pagos	FC-03	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan de calidad	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Control de No Conformidades	FC-04	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan de calidad	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Plan de Inspeccion y Ensaye	FC-05	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del plan de calidad	Normas vigentes aplicables a los materiales	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Programa Auditorias	FC-06	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del plan de calidad	Normas vigentes aplicables a los materiales	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Plan Auditoria	FC-07	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del plan de calidad	Normas vigentes aplicables a los materiales	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Informe Auditoria	FC-08	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del plan de calidad	Normas vigentes aplicables a los materiales	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Seguimiento a Hallazgos	FC-11	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del plan de calidad	Normas vigentes aplicables a los materiales	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Ubicacion de actividades	FC-12	Magnetico	PC proyecto	Durante la ejecucion del plan de calidad	Normas vigentes aplicables a los materiales	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
SST									
ENTREGA DE EPP REPOSICION	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
ENTREGA DE EPP	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
INSPECCIONES	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACION SST	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
MATRIZ IDENTIFICACION DE RIESGOS	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
INVESTIGACION DE ACCIDENTES	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
REGISTRO GESTION DEL CAMBIO	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATOS REUNION COPASST	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO REUNION COL	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATOS CONFORMACION COPASST	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO CONFORMACION COL	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
INSPECCION DE EXTINTORES	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO GESTION DEL CAMBIO	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO INVESTIGACION DE ACCIDENTES	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO ATS	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO INVESTIGACION DE ACCIDENTES	NA	Fisico	PC proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan SST	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
AMBIENTAL									
GESTION RCD	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
APROVECHAMIENTO IN SITU	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
CONSOLIDADO DE MATERIALES	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS							FYGBI	
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO-IDRD 3898-2023							VERSION 0 1	
Nombre del Registro	Código	Medio (Físico o Magnético)	Almacenamiento y Recuperación (Donde se encuentra almacenado – Carpeta de Proyecto)	Generación del documento	Responsable	Destino del documento	Revisa	Aprueba	Actualizado 23/12/2024
PLANILLA DE DISPOSICION DE ESCOMBROS	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
MEZCLA MODIFICADA CON DCR	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
CONTROL MATERIALES	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO RELACION VIAJES VOLQUETAS	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
INDICADORES	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
LISTADO DE ASISTENCIA INDUCCION AMBIENTAL	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
ACTA ENTREGA DE ELEMENTOS	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan RCD-PMA	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
SOCIAL									
Formato de acta de cumplimiento	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de acta de suspension parcial o	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de control de puntos sensibles de intervención	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de actas de reunion	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de acta de vecindad	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de asistencia a capacitaciones	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de atencion al ciudadano	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de control de entrega a usuarios	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de inventario de elementos existentes	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de planilla de inventario de predio de parqueo con vinculacion	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Formato de vinculacion a vecinos	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Planillas de presentismo	NA	Fisico	AZ proyecto	Etapa de diagnostico	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Volante de convocatoria	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Volantes informativos	NA	Fisico	AZ proyecto	Durante la ejecucion del contrato	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente
Manual de procedimientos	NA	Fisico	AZ proyecto	Previo ingreso de la obra	Cumplimiento al plan Gestion Social	Copia Interventoria Copia IDRD	Profesional encargado por parte de interventoria	Profesional encargado por parte de interventoria	Vigente

ANEXO 4. PLAN DE ADQUISICIONES

	PLAN DE ADQUISICIONES	FC-03
		VERSIÓN: 3
		8/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	FO-IDRD-XXX-2021
OBJETO	"CONSTRUIR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD. 2 ETAPA DE ADICIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	IDRD-DIM-3131-2023
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUIR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR		PARQUE DONDE SE USARÁ	CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDA						OBSERVACIONES	SOPORTES/COMENTARIOS
			Proceso de contratación	Proveedor y entregables	Instalación y capacitación asociada	Fecha de compra	Fecha de llegada a obra	Fecha de llegada a obra	Cumple SI/NO	
Luminarias importadas	LUMINARIA TIPO LED CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN TIPO PROYECTOR 200W	Capitolio Colsubsidio	Abril Mayo de 2024	LED LS Colombia SAS	Junio de 2024	Junio de 2024	17-may-24		SI	Ya se encuentran instaladas
	LUMINARIA TIPO LED CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN TIPO PROYECTOR 200W (SLAHOR)	Gilma Jimenez					17-may-24	28-may-24	SI	Ya se encuentran instaladas
	Luminaria led 100w marca(Aux - 117 Jardín gas - alfil (semáforo)						22-26 de julio de 2024			Ya se realizo orden de compra, se anexa. Entrega programada entre el 22 y 26 de julio de 2024
	Luminaria led 100w cantidad(3 - 117 Jardín gas - alfil (semáforo)						22-26 de julio de 2024			
	Luminaria Tipo Led características de iluminación de 40 - Digiflower Ref: BCP761 LUMINARIA 77W de	Bosquito					17-may-24	28-may-24	SI	Ya se encuentran instaladas
Materiales Ilustrativos		Capitolio Colsubsidio	Abril de 2024	William Rondón	Mayo, Junio, Julio, Agosto	Mayo, Junio, Julio Agosto	Mayo-junio	28-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material
		Parque Nor-Limal					Junio-Julio			Ya
		El Lombrillo					Junio-Julio			En proceso de negociación
		LYD					Junio-Julio			En proceso de negociación
		Parque de los Niños					Julio-Agosto			En proceso de negociación
		Suba-Pinos (planeta de mapa					Julio-Agosto	27-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material
		Cerro Alberto SENDEROS					Julio-Agosto	27-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material
		Gilma Jimenez Carrera Pueblo 11 y plaza de Palenque					Julio-Agosto			En proceso de negociación
		Nuevo Usme					Mayo	15-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material
		Unidad Deportiva Alquería					Mayo	15-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material
		Tercer Milenio					Junio	27-may-24	SI	Ya se encuentran instalado todo el material
		San Andrés					Junio			En proceso de negociación
		Rincón					Junio			En proceso de negociación
		La Serena					Junio			En proceso de negociación
Pino tratado	Pino SIBR	Simón Bolívar	Abril Mayo de 2024	DURAMOS SAS	Junio 08-Junio 15 de 2024	Junio de 2024	5-ago-24			Ya existe negociación con proveedor
		Contador					10-ago-24			Ya existe negociación con proveedor
		Hotheulips					5-ago-24			Ya existe negociación con proveedor
		Castilla					1-ago-24			Ya existe negociación con proveedor
		El Jardín					1-ago-24			Ya existe negociación con proveedor
		La Vega					5-ago-24			Ya existe negociación con proveedor
	Pino en madera EFOM importada	Simón Bolívar	Abril Mayo de 2024	Fenton	Junio 08-Junio 15 de 2024	Junio de 2024	5-ago-24			En Zon Franca. A espera de ser nacionalizado
		Contador					10-ago-24			En Zon Franca. A espera de ser nacionalizado
		Hotheulips					5-ago-24			En Zon Franca. A espera de ser nacionalizado
		Castilla					1-ago-24			En Zon Franca. A espera de ser nacionalizado
		El Jardín					1-ago-24			En Zon Franca. A espera de ser nacionalizado
		La Vega					5-ago-24			En Zon Franca. A espera de ser nacionalizado
Mobiliario urbano - Bancas	Banca en concreto	Villa de los Alpes	Mayo-Junio de 2024	Muebles y entretenimiento ROL SAS	Junio 01-Junio 22 de 2024	Junio de 2024	5-ago-24			Ya existe negociación con proveedor
		Tunal					11-ago-24			
		La Vega					3-ago-24			
		Castilla					11-ago-24			
		Hotheulips					10-ago-24			
		Rincón					11-ago-24			
		Juan Amarillo					3-jul-24			
		El Carmelo					16-jul-24			
Canecas	Canecas acero inoxidable	La Vega	Junio-Julio de 2024	Oscar Rodríguez	Julio01-Julio 30 de 2024	Julio de 2024	1-ago-24			Orden de compra 7882.
		Castilla					5-ago-24			
		Rincón					5-ago-24			
		El Carmelo					10-ago-24			
		Hotheulips					10-ago-24			
		Mallorquín					11-ago-24			
Mobiliario Urbano Canecones	Canecones malla antivandalo	Castilla					5-ago-24	17-jun-24	SI	Ya se estan instalando
		Timiza					23-jun-24			Comprado. En proceso de fabricación
		Carmenza					13-jul-24	28-may-24	SI	Ya llego a obra
	Portón Malla antivandalo	Tunal					5-ago-24			Comprado. En proceso de fabricación
	Barrera Contundente M 0.8	La Vega					5-ago-24	3-jun-24	SI	Comprado. En proceso de fabricación
		Hotheulips					27-jul-24			Comprado. En proceso de fabricación
	Módulo complementario para baranda	Rincón					1-ago-24			Comprado. En proceso de fabricación
		La Vega					11-ago-24	3-jun-24	SI	Comprado. En proceso de fabricación
	Baranda peatonal de 60	Rincón					27-jul-24			Comprado. En proceso de fabricación
	Cerramiento de mampostería 6 x 2.5 + pañetado/pintura	Juan Amarillo					16-ago-24	Actividad ejecutada	NA	Orden de compra en proceso de formalización del adjunto a tercero de mantenimiento contratado el día 30 de marzo de 2024
	Cerramiento perfilería malla de IDRD 6m 3 + (malla 6m)	Juan Amarillo					5-ago-24	Actividad ejecutada	NA	Orden de compra en proceso de formalización del adjunto a tercero de mantenimiento contratado el día 30 de marzo de 2024
Mobiliario Urbano Señales	Señalética de normas generales para áreas infantiles y zonas biosaludables 120x60 cm(3 caras) cuenta con anclaje e instalación	Simón Bolívar	Abril-Mayo-Junio-Julio	LYD	Mayo-Junio-Julio	Mayo-Junio-Julio	16-ago-24			Comprado. En proceso de fabricación
		Independencia					29-jun-24			Comprado. En proceso de fabricación
		Villa de los Alpes					5-ago-24			Comprado. En proceso de fabricación
		Castilla					8-ago-24			Comprado. En proceso de fabricación
		La Vega					5-ago-24			Comprado. En proceso de fabricación
		Timiza					23-jul-24			Comprado. En proceso de fabricación
		Rincón					16-ago-24			Comprado. En proceso de fabricación
		Hotheulips					11-ago-24			Comprado. En proceso de fabricación
		Mallorquín					11-ago-24			Comprado. En proceso de fabricación
		El Carmelo					16-ago-24			Comprado. En proceso de fabricación
	Señal IDO-8 1 CARA	Rincón					16-ago-24			Comprado. En proceso de fabricación
	Señal IDO-8 2 CARAS	El Carmelo					23-jul-24			Comprado. En proceso de fabricación
	SEÑAL BC-08 2 CARAS	El Carmelo					23-jul-24			Comprado. En proceso de fabricación

PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR		PARQUE DONDE SE USARÁ	CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN REQUERIDA							OBSERVACIONES	SOPORTES/COMENTARIOS
			% Proceso de contratación	% Proveedor seleccionado	% Elaboración y legalización contrato	Fecha de compra	Fecha programada de llegada o obra	% Fecha de llegada o obra	Cumplió SINO		
Estructuras deportivas Modulos		Villa de los Alpes	Abril-Mayo de 2024	LYD	Mayo-Junio de 2024	Junio de 2024	1-jul-24			Sin proceso de contratación	No aplica soporte
Mantenimiento correctivo y domiciliario		Villa de los Alpes	Abril de 2024	LYD	Mayo-Junio de 2024	Julio de 2024	5-ago-24			Producto ya se encuentra en Zona Franca. Adjuntos se envian documentos bien de planta de importadora. Se programa con proceso de mantenimiento según necesidad	Se ordenante dentro de fechas de programacion. # ACTUP 1 n° 2 NEW 111 envio a mar seguro. Se puede programar visita a Zona Franca en compañia de Interventoria el mismo momento
		Jose Francis					16-ago-24				
		Cundia					16-ago-24				
		Perla					16-ago-24				
		Fontanar del rio					29-jul-24				
		Aragon					11-ago-24				
		Quinta Camacho					11-ago-24				
Juegos Infantiles Importado	Bosque Bulevar	Juego Cuerdas Pequeño	Abril de 2024	Compra Cundinamarca Fiestas y Eventos	Junio Hasta 15 de 2024	Junio de 2024	6-ago-24			Ya se instalaron en semana del Bosque Bulevar, Canada Alpinistas Reinos, La Fragua, Carmelo, Alabastro	Se ordenante dentro de fechas de programacion. Ordenes de compra 17591 7515, 7558, 7565, 7586 7514, 7527) y confirmacion de orden 1279 // 127780 de BERLINEJA 2+PO3491 y 2+PO3+93 de CALIOPH. Facturas proforma de 30138 CUALI CITE y 2+719 de PUNTEC
		Juego Bulevar 4 Ala mas Juegos cap 7					9-ago-24				
		Juego Nueva Piramide plastica 2 Bulbos					8-ago-24				
		Juego Cuerdas pequeño					9-ago-24				
	Canada						6-ago-24				
	Alabastro	Juego cuerdas pequeño					11-ago-24				
		Juego Bulevar 4 Ala mas Juegos cap 7					11-ago-24				
		Juego Nueva Piramide plastica 2 Bulbos					11-ago-24				
	Castilla	Juego cuerdas pequeño					6-ago-24				
		Juego Bulevar 4 Ala mas Juegos cap 7					9-ago-24				
		Juego Nueva Piramide plastica 2 Bulbos					8-ago-24				
	El reposo	Juego cuerdas pequeño					9-ago-24				
		Juego Bulevar 4 Ala mas Juegos cap 7					5-ago-24				
		Juego Nueva Piramide plastica 2 Bulbos					9-ago-24				
	La fragua	Juego cuerdas pequeño					11-ago-24				
		Juego Bulevar 4 Ala mas Juegos cap 7					11-ago-24				
		Juego Nueva Piramide plastica 2 Bulbos					11-ago-24				
	Multiusos	Juego cuerdas pequeño					16-ago-24				
		Juego Bulevar 4 Ala mas Juegos cap 7					16-ago-24				
		Juego Nueva Piramide plastica 2 Bulbos					16-ago-24				
Mobiliario Peluquero		Parques de los Nobles, Canta Rito Negro	Mayo-Junio	LYD	Julio de 2024	Julio de 2024	Agosto de 2024			Ordenes de compra en proceso de aprobacion de solicitud e revision de requerimientos realizado el dia 30 de Mayo de 2024	
Mantenimiento Locativo		Alpinistas, PMD, Parque Nacional, Multiusos Cayetano, El Bosque, Mirador Bosque, El Remanso, Bulevar Niza, Alabastro, Fontanar del rio	Abril de 2024	Habilitados Al sitio	Mayo-Junio-Julio Agosto	Mayo-Junio-Julio Agosto	Mayo 2024-Agosto 2024			Ya existe negociación con proveedor	Se una misma negociacion de mayor valor del presente, se hacen pedidos a medida que van llegando materiales a partidas soportes en listado mensual de cubicaciones Ordenes de compra 7700 y 7706
Columpios (SIN Base Piojos Alimentos)	Sol Lucia Oriental	El Nogal Sotos	Junio-Julio de 2024	Habilitados Al sitio Instalacion Agosto	Junio-Julio de 2024	Junio-Julio de 2024	26-jun-24			Ordenes de compra 7702 y 7703	Se una misma negociacion de mayor valor del presente, se hacen pedidos a medida que van llegando materiales a partidas soportes en listado mensual de cubicaciones
		Tunal					10-jul-24				
		Alabastro					3-ago-24				
		Villa de los Alpes					7-jul-24				
	Bosque Oriental	Tunal	Junio-Julio de 2024	Habilitados Instalacion Agosto	Junio-Julio de 2024	Junio-Julio de 2024	11-ago-24				
		Alabastro					09-08-2024				
		Villa de los Alpes					15-jul-24				
	Pulso Lubrilla	Casa Blanca	Junio-Julio de 2024	Contratacion deportivos CRI SAS	Julio de 2024	Junio-Julio de 2024	12-jul-24				
		Fontanar del rio					5-ago-24				
	Rincones Alimados	Alabastro	Mayo de 2024	Habilitados Instalacion Agosto	Junio-Julio	Junio-Julio	5-ago-24				
Productos Julio	Antiguo Anglo	Bosque santos	Junio-Julio de 2024	Contratacion deportivos CRI SAS	Junio-Julio de 2024	Junio-Julio de 2024	31-jul-24			Ordenes de compra 7704, 7704, 7544 y 7478	Se una misma negociacion de mayor valor del presente, se hacen pedidos a medida que van llegando materiales a partidas soportes en listado mensual de cubicaciones
		Tunal					11-ago-24				
		Alabastro					16-ago-24				
	Lanzate	Tunal		Contratacion deportivos CRI SAS			16-ago-24				
	Carnaval	El carmelo					16-ago-24			Ya se compro, se encuentra en bodega y se entregaran con el requerimiento de la semana del 01-07-24. Orden de compra 7572	
	Rapto de carnaval	Parque Alta Blanca					17-jul-24			Ordenes de compra: 7704, 7704, 7544 y 7478	
	Bumpito A 02	Alabastro					6-jul-24				
Columpios 2MW a 3MW PM		Capitanes Calisanos	Mayo-Junio-Julio Agosto	Columpios y productos del ref SAS	Junio-Julio Agosto	Junio-Julio Agosto	16-ago-24			Ya existe negociación con proveedor	Se ordenante dentro de fechas de programacion. Se una misma negociacion de mayor valor del presente. No se ha vendo a la fecha
		Sierra Bolivar					23-jul-24			Ya existe negociación con proveedor	
		Antiguo Anglo					24-jul-24			Ya existe negociación con proveedor	
		Alabastro					6-ago-24			Ya existe negociación con proveedor	
		Orquideas Santos					29-jul-24			Ya existe negociación con proveedor	
		La Fragua					2-jul-24			Ya existe negociación con proveedor	
		Carmelo					11-jul-24			Ya existe negociación con proveedor	
		Aragon					26-jul-24			Ya existe negociación con proveedor	
		Alabastro					17-jul-24			Ya existe negociación con proveedor	
		El Carmelo					1-ago-24			Ya existe negociación con proveedor	
ARENA PELOAR		Multiusos	Junio de 2024	Columpios Instalacion Instalacion	Junio de 2024	Junio de 2024	1-ago-24			Ya existe negociación con proveedor	Se ordenante dentro de fechas de programacion. Se una misma negociacion de mayor valor del presente. No se ha vendo a la fecha
		Cabo Jaramillo					6-ago-24	30-may-24	SI	Recibido	Reporte en Listado de materiales
		El carmelo					23-jul-24			Ya existe negociación con proveedor	Se ordenante dentro de fechas de programacion. Se una misma negociacion de mayor valor del presente. No se ha vendo a la fecha
Adulto	Mobiliario Adulto	Quinta Camacho	Junio de 2024	Habilitados Instalacion Agosto	Junio de 2024	Junio de 2024	17-jul-24			Ya existe negociación con proveedor	Se ordenante dentro de fechas de programacion. Se una misma negociacion de mayor valor del presente. No se ha vendo a la fecha
		Alabastro					26-jul-24			Ya existe negociación con proveedor	
		Villa de los Alpes					23-jul-24			Ya existe negociación con proveedor	
		Tunal					5-jul-24			Ya existe negociación con proveedor	
Otros ref	Otros ref 72169	Villa de los Alpes	Junio de 2024	Otros Varios	Junio de 2024	Junio de 2024	3-jul-24	31-may-24	SI	En Obra	Reporte en Listado de materiales
		Alabastro					13-jul-24			Ordes de compra 7636	Se ordenante dentro de fechas de programacion. Se una misma negociacion de mayor valor del presente.

NOTAS GENERALES: Las fechas establecidas para entrega de insumos importados, se programan de acuerdo a los compromisos adquiridos por proveedores y en consecuencia no se puede adelantar a menos que el mismo proveedor adquiera un compromiso diferente
Los soportes de cumplimiento de este plan se irán actualizando en la medida que los diferentes etapas de los compras se cumplan, por ejemplo orden de compra, factura, documentos de salida de puerto, documentos de llegada a puerto, documentos de importacion, documentos de nacionalizacion, etc.
Este plan se realiza con base en la programación del proyecto e incluyen las holguras de la misma

JEFE CATEDU

JEFE OBRA

FECHA DE ELABORACION: 24 de abril de 2024
FECHA DE SEGUIMIENTO Y/O ACTUALIZACION: 24 de junio de 2024

INGENIERIA
CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos
NIT. 901.087.132-6

Bogotá D.C., 18 Junio de 2024

Señores:
Interventoría **Soliun**

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE CONTRATO

Respetados Señores

Con la presente Yo JUAN MANUEL SABOGAL CUERVO, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 80.757.973 de Bogotá actuando en representación de la empresa INGENIERIA CMC SAS con NIT. 901.087.132-6 certifico que se ha celebrado un contrato prestación de servicios para el mantenimiento rutinario de los campos de grama natural y sintética según contrato no. 3099-2023 IDRD con el CONTRATANTE LYD PROYECTOS SAS identificado con NIT 900.311.811-6 el cual tendrá la duración de 1 mes, contados a partir del 05 de Julio de 2024.

Agradecemos su atención prestada a esta solicitud

Cordialmente,

JUAN MANUEL SABOGAL CUERVO
REP LEGAL INGENIERIA CMC SAS

LYD
PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7727

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	900137138 1		ORDEN DE COMPRA (IDRD CASA BLANCA)
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Km 2 Vía Fusunga Vereda Pa	Soacha		

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
jueves, 20 de junio de 2024	HECTOR GIOVANY MONGUA ESCOBAR	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
REJICON40X40	REJILLA CONCRETO 40X40X6 IDRD CASABLANCA	77	Und.	25.600	1.971.200

Valor en Letras
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.971.200
DESCUENTO	0
IVA	374.528
TOTAL DOCUMENTO	2.345.728

Observaciones:

Firma Responsable_____

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia E-mail:
drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7716

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	WILLIAM JAIRO RAMIREZ GRIMALDO		POR CONCEPTO DE
NIT	1010197700 0		ORDEN DE COMPRA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 12 1494	Mosquera	3103251831	

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 5 de junio de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
1	BREAKER ENCHUFABLE BIFASICO 2x40 AMP	8	Mtr	$ 53.361	$ 426.888
2	BREAKER INDUSTRIAL DE 150-AMP	1	Und	$ 252.100	$ 252.100
3	CONECTOR DENTADO GRANDE TAYCO PARA 1/0	4	Und	$ 13.865	$ 55.460
4	DUCHA DUCHARIN BIFASICA 5AMP-220V	2	Und	$ 65.546	$ 131.092

Valor en Letras UN MILLON VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	SUBTOTAL	865.540
	DESCUENTO	0
	IVA	164.453
	TOTAL DOCUMENTO	1.029.993

Observaciones:

Firma Responsable _____

LYD PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7715

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	WILLIAM JAIRO RAMIREZ GRIMALDO		POR CONCEPTO DE
NIT	1010197700 0		ORDEN DE COMPRA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 12 1494	Mosquera	3103251831	

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 5 de junio de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
1	CABLE COBRE ENCAUCHETADO X12-CENTELSA	106	Mtr	$ 11.344	$ 1.202.464
2	CABLE COBRE THHN N6 PROCABLES	140	Und	$ 8.235	$ 1.152.900
3	VARILLA COBRE COOPERWELD 2.40x5/8	10	Und	$ 200.000	$ 2.000.000
4	CONECTOR BORNY COBRE	10	Und	$ 7.563	$ 75.630

Valor en Letras CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE	SUBTOTAL	4.430.994
	DESCUENTO	0
	IVA	841.889
	TOTAL DOCUMENTO	5.162.108

Observaciones:

Firma Responsable

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia E-mail:
drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7711

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	WILLIAM JAIRO RAMIREZ GRIMALDO		POR CONCEPTO DE
NIT	1010197700 0		ORDEN DE COMPRA (SAN CRISTOBAL)
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 12 1494	Mosquera	3103251831	

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 5 de junio de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
1	CABLE COBRE THHN 12 ROLLO-NEGRO	6	rollo	$ 231.092	$ 1.386.552
2	CABLE COBRE THHN 12 ROLLO-ROJO	6	rollo	$ 231.092	$ 1.386.552
3	CABLE COBRE THHN 12 ROLLO-VERDE	6	rollo	$ 231.092	$ 1.386.552
4	CABLE ALUMINIO AISLADO SERIE 8000 #2	1200	mtr	$ 4.831	$ 5.797.200
5	CABLE ALUMINIO AISLADO SERIE 8000 #4	400	mtr	$ 3.319	$ 1.327.600
6	FOTOCELDA CON BASE NADISA	48	und	$ 33.193	$ 1.593.264
7	BOMBILLO EN GLOBO 2W E27	10	und	$ 10.504	$ 105.040
8	VARILLA COBRE COOPERWELD 2.40x5/8	12	und	$ 200.000	$ 2.400.000
9	JUEGO DE EMPALME DE DERIVACIÓN 81-B 4xC	15	Jgo	$ 145.378	$ 2.180.670
10	BREAKER INDUSTRIAL 25-AMP	1	und	$ 142.857	$ 142.857
11	CINTA AISLANTE EMFLEX 3M VERDE,AMARILLA,AZUL,R	40	und	$ 6.302	$ 252.080
12	AMARRE PLASTICO 30CMS PAQUETE 100	10	und	$ 15.546	$ 155.460
13	CINTA AUTOFUNDENTE 3M-23	4	und	$ 53.613	$ 214.452
14	CINTA AUTOFUNDENTE 3M-23	10	und	$ 6.302	$ 63.020

Valor en Letras		
VEINTI UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINTCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE	SUBTOTAL	18.391.299
	DESCUENTO	0
	IVA	3.494.347
	TOTAL DOCUMENTO	21.425.863

Observaciones:	
	Firma Responsable_____

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia E-mail:
drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7713

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	WILLIAM JAIRO RAMIREZ GRIMALDO		POR CONCEPTO DE	
NIT	1010197700 0		ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CRA 12 1494	Mosquera	3103251831		

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 5 de junio de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
1	1 CABLEENCAUCHETADO3x12-PROCABLES	58	Mtr	$ 11.344	$ 657.952
2	CONECTORRESORTE3MROJO-AMARILLO	100	Und	$ 874	$ 87.400
3	TORNILLO DE 3/8x2 TUERCA ARANDELA,WASA EN ACERO INOZ	30	Und	$ 3.781	$ 113.430
4	AMARREPLASTICO30CM100UND	2	Und	$ 15.546	$ 31.092

Valor en Letras UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	889.874
	DESCUENTO	0
	IVA	169.076
	TOTAL DOCUMENTO	1.058.950

Observaciones:

Firma Responsable

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia E-mail:
drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7714

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	WILLIAM JAIRO RAMIREZ GRIMALDO		**POR CONCEPTO DE**
NIT	1010197700 0		ORDEN DE COMPRA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 12 1494	Mosquera	3103251831	

FECHA DOCUMENTO	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 5 de junio de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
1	RELAY TERMICO DE 7-10 AMP STECK	1	Mtr	$ 56.302	$ 56.302
2	CABLE COBRE MULTIFILAR No 4-AZUL	30	Und	$ 2.941	$ 88.230
3	TEMPORIZADOR SEMANARIO PROGRAMABLE MULTIVOLTAJE	3	Und	$ 79.831	$ 239.493
4	CABLE ENCAUCHETADO 3x10 CENTELSA	10	Und	$ 19.748	$ 197.480

Valor en Letras	**SUBTOTAL**	581.505
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE	**DESCUENTO**	0
	IVA	110.486
	TOTAL DOCUMENTO	691.991

Observaciones:

Firma Responsable

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia E-mail:
drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7712

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	WILLIAM JAIRO RAMIREZ GRIMALDO		**POR CONCEPTO DE**
NIT	1010197700 0		ORDEN DE COMPRA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 12 1494	Mosquera	3103251831	

FECHA DOCUMENTO	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 5 de junio de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
1	TUBO GALVANIZADO IMC 2	15	Und	$ 201.680	$ 3.025.200
2	TUBO EMT PESADO DE 2	21	Und	$ 114.285	$ 2.399.985
3	TUBO PVC 2 PESADO	3	Und	$ 15.378	$ 46.134
4	CURVA EMT 2	4	Und	$ 7.983	$ 31.932
5	UNION GALVANIZADA DE 2	6	Und	$ 5.882	$ 35.292
6	TERMINAL EMT DE 2	10	Und	$ 5.462	$ 54.620
7	UNION EMT 2	6	Und	$ 5.462	$ 32.772
8	JUEGO DE BOQUILLA DE 2	4	Und	$ 4.369	$ 17.476
9	CAJA DE INSPECCION 30x30-CONCRETO	1	Und	$ 92.436	$ 92.436
10	CABLE COBRE THHN No 1/0 AISLADO-PROCABLES	42	Mtr	$ 33.445	$ 1.404.690
11	CABLE COBRE THHN No 2 AISLADO-PROCABLES	14	Mtr	$ 19.915	$ 278.810
12	CABLE COBRE THHN No 12 VERDE-PROCABLES	30	Mtr	$ 2.436	$ 73.080
13	CABLE TRENZADO 3x4/0+2/0 ALUMINIO AISLADO SERIE	140	Mtr	$ 44.957	$ 6.293.980
14	BREAKER INDUSTRIAL DE 3x150 AMP	1	Und	$ 252.100	$ 252.100
15	VARILLA COBRE COOPER WELL 2.40x5/8	1	Und	$ 200.000	$ 200.000
16	TERMINAL ESTAÑO No 1/0	4	Und	$ 5.462	$ 21.848
17	TERMINAL ESTAÑO No 2	4	Und	$ 4.621	$ 18.484
18	CABLE COBRE DESNUDO No 4	2	Mtr	$ 15.546	$ 31.092
19	CONECTOR BORNY COBRE	1	Und	$ 7.563	$ 7.563
20	CAJA DE PASO 40x40x20 FEM	3	Und	$ 153.781	$ 461.343
21	ABRAZADERA GALVANIZADA DOBLE ALA 2	10	Und	$ 2.352	$ 23.520
22	CHAZO SUPRA DE 3/8x2 CON TORNILLO	30	Und	$ 840	$ 25.200
23	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M COLORES	5	Und	$ 6.302	$ 31.510
24	CONECTOR DENTADO PARA CABLE 4/0	4	Und	$ 13.865	$ 55.460
25	CAPACETE UNIVERSAL DE 2	1	Und	$ 26.302	$ 26.302
26	GRAPA DE RETENCION PARA RED TRENZADA	2	Und	$ 19.747	$ 39.494
27	ROLLO DE CINTA BANDIT 5/8 x 30 MTS	1	Und	$ 134.453	$ 134.453
28	HEBILLA BANDIT 5/8	5	Und	$ 2.352	$ 11.760
29	VARILLA COBRE COOPER WELL 2.40x5/8	4	Und	$ 23.109	$ 92.436

Valor en Letras
DIESCISIETE MILLONES SETECIENTOS TRINTA MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.218.972
DESCUENTO	0
IVA	2.891.605
TOTAL DOCUMENTO	17.730.102

Observaciones:

Firma Responsable

Bogotá 15-mayo 2024
Att: A Quién Pueda Interesar
Asunto: Órdenes de Compra # 7586, 7587, 7588, 7589, 7590

Por este medio LED LS Colombia SAS, con NIT 900.550.145-3 confirma recepción de las órdenes de compra # 7586, 7587, 7588, 7589, 7590 por parte de LyD Proyectos, con NIT 900.311.811-6 el día 15 de mayo por concepto de las siguientes referencias y cantidades:

# de Orden	Descripción	Cantidad	Proyecto	Fecha estimada de entrega
7586	Sky 90W 4000K	48	Sausalito	17-may
7587	Floodlight PFM 200W 5000K	24	Cayetano	17-may
7588	BVP384 LED700/757 580W SMB	22	Patinaje Cayetano	16-ago
7589	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	17	BMX Cayetano	25-may
	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	7		16-ago
7590	Floodlight PFM 200W 5000K	29	Senderos Gilma J	17-may

Dichas órdenes han sido compartidas directamente con fábrica para inicio de proceso de manufactura e importación.

Quedamos atentos a cualquier duda o información adicional requerida.

Mauricio Chiappe

Gerente de Producto y Logística

LYD
PROYECTOS

Nit:900.311.811-6

CALLE 74 # 53-47 Tel.:9370193 Bogotá, D.C. - Colombia

PURCHASE ORDER No.
7591

SUPPLIER FUNTEC SPORTS GMBH

CURRENCY	DATE	PAYMENT TERMS
EUR	15-may.-24	TRANSFER

NOTE: ORDEN DE COMPRA (ADICION IDRD)

CODE	DESCRIPTION	QTY		UNIT PRICE	TOTAL AMOUNT
113001B	BEACHHANDBALL COURT complete set for a handball court with freestanding goals (size: 3 x 2 m) with foldable rear net holders, including the nets and ground fixings comes with a 5 cm wide, blue courtline (27 x 12 m, freely adjustable), incl. penalty area lines. Shipping & Packaging	1	Und.		

Notes: **Incoterm:** EXW **Exchange Rate:** **Other:**	**SUB TOTAL**	
	DISCOUNT	
	GRAND TOTAL	

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7586

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	LED LS COLOMBIA SAS		
NIT	900550145 3		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 14 93 40 OF 302 303	Bogota D.C	63600566	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (SAUSALITO)

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
martes, 14 de mayo de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
LEDVAN90W 740	LEDVANCE SKY 90W 740 10Y	48	Und.		

Valor en Letras		
	SUBTOTAL	
	DESCUENTO	
	IVA	
	TOTAL DOCUMENTO	

Observaciones:

Firma Responsable_____

LYD PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7533

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	LED LS COLOMBIA SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	900550145 3		ORDEN DE COMPRA (ADICION IDRD)
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 14 93 40 OF 302 303	Bogota D.C	63600566	

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
lunes, 29 de abril de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
LED820SMB	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V Cancha de Fútbol 11 Gilma Jimenez	30	Und.		
LED820SMB	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V Pista de Patinaje Velodromo	18	Und.		
LED820S7	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V Pista de Patinaje Velodromo	8	Und.		

Valor en Letras	SUBTOTAL	
	DESCUENTO	
	IVA	
	TOTAL DOCUMENTO	

Observaciones:

Firma Responsable_____

LYD
PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7590

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	LED LS COLOMBIA SAS		
NIT	900550145 3		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 14 93 40 OF 302 303	Bogota D.C	63600566	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (ADICION IDRD SENDEROS GILMA JIMENEZ)

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 15 de mayo de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
LEDVAPFM200W	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 200W 5000K	29	Und.		

Valor en Letras	SUBTOTAL	
	DESCUENTO	
	IVA	
	TOTAL DOCUMENTO	

Observaciones:

Firma Responsable_____

LYD PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7589

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	LED LS COLOMBIA SAS		
NIT	900550145 3		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 14 93 40 OF 302 303	Bogota D.C	63600566	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (ADICION IDRD PISTA BMX CAYETANO)

FECHA DOCUMENTO	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 15 de mayo de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
LED820S7	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	17	Und.		
LED820SMB	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	7	Und.		

Valor en Letras	**SUBTOTAL**
	DESCUENTO
	IVA
	TOTAL DOCUMENTO

Observaciones:

Firma Responsable_____

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7588

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	LED LS COLOMBIA SAS		
NIT	900550145 3		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 14 93 40 OF 302 303	Bogota D.C	63600566	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (ADICION IDRD PARQUE PATINAJE CAYETANO)

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 15 de mayo de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
LED580WSMB	BVP384 LED700/757 580W SMB	22	Und.		

Valor en Letras	SUBTOTAL	
	DESCUENTO	
	IVA	
	TOTAL DOCUMENTO	

Observaciones:

Firma Responsable_____

LYD
PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7587

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	LED LS COLOMBIA SAS		
NIT	900550145 3		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 14 93 40 OF 302 303	Bogota D.C	63600566	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
martes, 14 de mayo de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
LEDVAPFM200W	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 200W 5000K	24	Und.		

Valor en Letras		
	SUBTOTAL	
	DESCUENTO	
	IVA	
	TOTAL DOCUMENTO	

Observaciones:

Firma Responsable_____

341

Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin
T + 49 (0)30 41 47 24-0
F + 49 (0)30 41 47 24-33
info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com

Berliner Seilfabrik · Lengeder Straße 2/4 · 13407 Berlin

LYD PROYECTOS SAS
Nit 900311811-6
Ms. Deysy Rubio
Calle 74 # 53-47
BOGOTÁ, D.C., 111221
Colombia

Confirmation of order 127747
Date 7. May 2024
Date of order 6. May 2024
by Ms. Deysy Rubio
Your Purchase Order 7558
Project no. P27187
Simón Bolivar, Colombia

Your Contact Information
Your Customer no.: 4796100
Your Address no.: 50015663
Fon +57 1 9370192
drubio@
lydonline.com

Your Local Consultant
Kolumbien

Your Contact in Berlin
Simone Gehring
Vertrieb International
+49 (0)30 414724-37
simone.gehring@
berliner-seilfabrik.com

Dear Ms. Rubio,
We thank you for your order and confirm as follows:

Pos.	No. / Description	Quantity	Unit of	Unit Price	Amount
	Taxfree export delivery				
1	**9010001000000** MARS 010 Astem TT_UK07/20 Tubes: RAL 6018 yellow green (glossy finish) Balls: RAL 1018 zinc yellow (glossy finish) Ropes: orange	1	piece		
	Standard Inground Installation with 400mm Fill Depth				
				Total EUR	

Payment terms	Payment with receipt of order
Delivery terms	ex works
Estimated dispatch date	To be announced

Berliner Seilfabrik GmbH & Co.

Berliner Seilfabrik GmbH & Co., Kommanditgesellschaft, Sitz: Berlin,
Amtsgericht Charlottenburg: HRA 26 727
Persönlich haftende Gesellschafterin: Berliner Seilfabrik Beteiligungs GmbH,
Amtsgericht Charlottenburg: HRB 55 756
USt-ID: DE 811 839 143, St-Nr: 30/142/02847
Geschäftsführer: Karl-Heinz Köhler, David Köhler, Ferry Girra

Berliner

Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin
T +49 (0)30 41 47 24-0
F +49 (0)30 41 47 24-33
info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com

Berliner Seilfabrik • Lengeder Straße 2/4 • 13407 Berlin

LYD PROYECTOS SAS
Nit 900311811-6
Ms. Deysy Rubio
Calle 74 # 53-47
BOGOTÁ, D.C., 111221
Colombia

Confirmation of order 127700

Date
Date of order 2. May 2024
by Ms. Deysy Rubio
Your Purchase Order 7515
Project no. P26427
IDRD Project Bogotá, Colombia

Your Contact Information	**Your Local Consultant**	**Your Contact in Berlin**
Your Customer no.: 4796100	Kolumbien	Simone Gehring
Your Address no.: 50015663		Vertrieb International
Fon +57 1 9370192		+49 (0)30 414724-37
drubio@ lydonline.com		simone.gehring@ berliner-seilfabrik.com

Dear Ms. Rubio,
We thank you for your order and confirm as follows:

Pos.	No. / Description	Quantity	Unit of	Unit Price	Amount
	Taxfree export delivery				
1	**9010001000000** MARS 010 Astem TT_UK07/20 Tubes: RAL 6018 yellow green (glossy finish) Balls: RAL 1018 zinc yellow (glossy finish) Ropes: orange	**2**	**piece**		
	Standard Inground Installation with 400mm Fill Depth				
				Total EUR	

Payment terms	Payment with receipt of order
Delivery terms	ex works
Estimated dispatch date	To be announced

Berliner Seilfabrik GmbH & Co.

Berliner Seilfabrik GmbH & Co., Kommanditgesellschaft, Sitz: Berlin,
Amtsgericht Charlottenburg: HRA 26 727
Persönlich haftende Gesellschafterin: Berliner Seilfabrik Beteiligungs GmbH,
Amtsgericht Charlottenburg: HRB 55 756
USt-ID: DE 811 839 143, St-Nr: 30/142/02847
Geschäftsführer: Karl-Heinz Köhler, David Köhler, Ferry Girra

BSFH

LYD
PROYECTOS

Nit:900.311.811-6

CALLE 74 # 53-47 Tel.:9370193 Bogotá, D.C. - Colombia

PURCHASE ORDER No.
7515

SUPPLIER BERLINER SEILFABRIK GMBH & CO

CURRENCY	DATE	PAYMENT TERMS
EUR	23-abr.-24	CREDIT TRANSFER

NOTE: ORDEN DE COMPRA (ADICION IDRD)

CODE	DESCRIPTION	QTY		UNIT PRICE	TOTAL AMOUNT
90.100.010	MARS ROPE ORANGE, TUBES RAL 6018 (LEMON YELLOW), NODES YELLOW  1- ATAHUALPA 1-CASTILLA	2	Und.		

Notes: Incoterm: Exchange Rate: Other:	SUB TOTAL DISCOUNT GRAND TOTAL	

YD PROYECTOS

Nit:900.311.811-6

CALLE 74 # 53-47 Tel.:9370193 Bogotá, D.C. - Colombia

PURCHASE ORDER No.
7558

SUPPLIER BERLINER SEILFABRIK GMBH & CO

CURRENCY	DATE	PAYMENT TERMS
EUR	06-may-24	CREDIT TRANSFER

NOTE: ORDEN DE COMPRA (ADICION IDRD - SIMON BOLIVAR)

CODE	DESCRIPTION	QTY		UNIT PRICE	TOTAL AMOUNT
90.100.010	MARS ROPE ORANGE, TUBES RAL 6018 (YELLOW GREEN), NODES YELLOW 	1	Und.		

Notes: Incoterm: CFR CTG Exchange Rate: Other:	SUB TOTAL	
	DISCOUNT	
	GRAND TOTAL	

LYD PROYECTOS

Nit:900.311.811-6


CALLE 74 # 53-47 Tel.:9370193 Bogotá, D.C. - Colombia

PURCHASE ORDER No.
7509

SUPPLIER GALOPIN

CURRENCY	DATE	PAYMENT TERMS
EUR	23-abr.-24	NSFER CREDIT 60 D

NOTE: ORDEN DE COMPRA (ADICION IDRD)

CODE	DESCRIPTION	QTY		UNIT PRICE	TOTAL AMOUNT
A10_SD	BALANCIN LA VAGONETA (MORADA)  1-ATAHUALPA 1-CASTILLA 1-RECREO	3	Und.		
R04_SBH	RED 4M CUERDA VERDE Y POSTE LACADO NARANJA 1-RECREO 	1	Und.		
ARC02_SBH/SDH	ROCODROMO RED Y PASITOS (POSTE COLOR NARANJA)  1-FRAGUA	1	Und.		
C203ALRT-004_SBA	COMBO 2  1- ATABANZA	1	Und.		

Notes: Incoterm: Exchange Rate: Other:	SUB TOTAL DISCOUNT GRAND TOTAL	

LYD
PROYECTOS

Nit:900.311.811-6

CALLE 74 # 53-47 Tel.:9370193 Bogotá, D.C. - Colombia

PURCHASE ORDER No.
7556

SUPPLIER GALOPIN

CURRENCY	DATE	PAYMENT TERMS
EUR	06-may-24	CREDIT TRANSFER

NOTE: ORDEN DE COMPRA (ADICION IDRD /SIMON BOLIVAR)

CODE	DESCRIPTION	QTY		UNIT PRICE	TOTAL AMOUNT
F504AL-c4_SDZ	BARCO PIRATA 	1	Und.		
CT004_PAL-c8_SDZ	CASITA TORCIDA CON TOBOGAN ROTOMOLDEADO Y RED 	1	Und.		
A10_SD	BALANCIN LA VAGONETA (MORADA) 	1	Und.		

Notes: **Incoterm:** **Exchange Rate:** **Other:**	**SUB TOTAL**	
	DISCOUNT	
	GRAND TOTAL	

CONFIRMACIÓN DE PEDIDO Nº: 24P000491

09:14 07/05/2024

Fecha Pedido: 07/05/2024

Referencia Cliente: OC7509 ADICIÓN IDR

Cliente:
LYD PROYECTOS SAS
CALLE 74# 53-47
-
COLOMBIA
NIF: 9003118116
Deysy Rubio

Dirección de Entrega:
LYD Proyectos SAS
CALLE 74 # 53-47
111211 Bogotá -
Colombia
ANDRES PULIDO Tel.: +57 311 827 3220

Condiciones de Pago: TRANSFERENCIA A 60 DIAS
Condiciones de Entrega: EXW (2020)

Condiciones Generales de Venta *Condiciones Generales de Venta*

Pos	Imagen	Uds	Descripción	ENTREGA	Precio unitario	Dt 1	Dt 2	Importe Pos
1		3,00	A10_SD Vagoneta					
3		1,00	R04-c5-5_SB Red 4 Metros (Cuerda Verde - Poste Naranja-RAL2008)					
4		1,00	ARC02-c5-1_SD Aro con Rocódromo, Red y Pasitos (Arco Naranja-RAL2008)					
5		1,00	C203ALRT-004_SBA Combo 2 ROT					

TOTAL NETO (EUR):	

IMPUESTOS NO INCLUÍDOS



Galopín
playing dreams

CONFIRMACIÓN DE PEDIDO Nº: 24P000493

09:39 07/05/2024

Fecha Pedido: 07/05/2024
Referencia Cliente: OC7556

Cliente:
LYD PROYECTOS SAS
CALLE 74# 53-47
-
COLOMBIA
NIF: 9003118116
Deysy Rubio

Dirección de Entrega:
LYD Proyectos SAS
CALLE 74 # 53-47
111211 Bogotá -
Colombia
ANDRES PULIDO Tel.: +57 311 827 3220

Condiciones de Pago: TRANSFERENCIA A 60 DIAS
Condiciones de Entrega: EXW (2020)

Condiciones Generales de Venta *Condiciones Generales de Venta*

Pos	Imagen	Uds	Descripción	ENTREGA	Precio unitario	Dt 1	Dt 2	Importe Pos
1		1,00	F504ALRT-004_SDZ Barco Pirata ROT					
2		1,00	CT004_PALRT-004_SDZ Casita Torcida con Tobogán y Red ROT					
3		1,00	A10_SD Vagoneta					

TOTAL NETO (EUR):	

IMPUESTOS NO INCLUÍDOS



LYD PROYECTOS

CALLE 74 # 53-47 Tel.:9370193 Bogotá, D.C. - Colombia

PURCHASE ORDER No.
7514

Nit:900.311.811-6

SUPPLIER QUALI-CITE

CURRENCY	DATE	PAYMENT TERMS
EUR	23-abr.-24	

NOTE: ORDEN DE COMPRA (ADICION IDRD)

CODE	DESCRIPTION	QTY		UNIT PRICE	TOTAL AMOUNT
CC 12-3016-99	CASTILLO MEDIEVAL INSTALLATION SURFACE 1-CASTILLA 1-RECREO 1-CARMELO 1-ATAHUALPA 1-FRAGUA 	5	Und.		
CC 12-3016-99	CASTILLO MEDIEVAL INSTALLATION INGROUND  1-ATABANZA	1	Und.		

Notes: Incoterm: Exchange Rate: Other:	SUB TOTAL DISCOUNT GRAND TOTAL	

LYD
PROYECTOS

Nit:900.311.811-6

CALLE 74 # 53-47 Tel.:9370193 Bogotá, D.C. - Colombia


PURCHASE ORDER No.
7557

SUPPLIER QUALI-CITE

CURRENCY	DATE	PAYMENT TERMS
EUR	06-may-24	CREDIT TRANSFER

NOTE: ORDEN DE COMPRA (ADICION IDRD- SIMON BOLIVAR)

CODE	DESCRIPTION	QTY		UNIT PRICE	TOTAL AMOUNT
CC 12-3016-99	CASTILLO MEDIEVAL INSTALLATION SURFACE	1	Und.		



Notes: Incoterm: Exchange Rate: Other:	SUB TOTAL	
	DISCOUNT	
	GRAND TOTAL	

QUALI Cité
Phone : +33 (0)2 97 42 84 39 - Fax : +33 (0)2 97 42 84 41
Website : www.quali-cite.com - email : v.petillon@quali-cite.com

P.A. du Moulin Neuf 3 - 56130 PEAULE (FRANCE)
S.A.S. au capital de 37 200,00€ - Code APE : 3240Z
N° TVA intrac : FR76 447 858 010 / SIRET 447 858 010 00021
N° EORI : FR44 785 8010 00021

REFERENCES TO MENTION FOR ANY PAYMENT

Code	Numéro	Date
LYD01	F-20530-1	07/05/2024

PROFORMA INVOICE

Delivery address
LYD PROYECTOS CALLE 74N 53 47 BOGOTA - COLOMBIA contact : Angela PULIDO - tel +57 (312) 288 6159

Client name
LYD PROYECTOS CALLE 74N 53 47 BOGOTA - COLOMBIA contact : Angela PULIDO - tel +57 (312) 288 6159

Your references	REG	Deadline
Orden de compra 7557 y 7514		Payment terms : 30% at order confirmation - balance before shipment
Our references		
CC20530 - Orden de compra 7557 y 7514		

Designation		Quantity	Unit price	Discount	Total excl. Taxes	CT
CC20530 - Orden de compra 7557 y 7514						
CC 12-3016-99-A	Structure City Castle - CC12-3016 - Medieval Theme - Anchoring to screw	6				
CC 12-3016-69-C	Structure City Castle - CC12-3016 - Medieval Theme - Anchoring 65 cm	1				
CCS-03	Certification fee - 3 floors	1				
For instalation :						
9-CLE-KST1512210	Clé mâle Torx percé KS, T55	1				
-DOUILLE	DOUILLE TOURNEVIS TORX PERCÉ L.55MM - T55	1			€	
TOTAL						
Incoterm : to be determined						
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of FRENCH preferential origin						
Pallet nimp15						
Custom code : 95069990						
No pre-assembly / delivery in kit						
QUALI-Cité P.A. du Moulin Neuf 3 56130 Péaule France						
7th of May 2024						
Signatory : Mrs LE MASSON Camille						
VAT exempt, article 262 I of the French tax code (Exonération de TVA, article 262 I du CGI)						

TOTAL EXCL. TAXES	VAT RATE	VAT AMOUNT	PACKAGING	TOTAL TO PAY
			30% at order confirmation	
			Balance before shipment	

FUNTEC
HOME OF SPORTS EQUIPMENT

FUNTEC Sports GmbH · Löhestraße 25 · 53773 Hennef

LyD Proyectos
Carrera 55 Nr. 74-36
111211 Bogotá
Colombia (CO)

PRELIMINARY INVOICE

CoO: 34719
Please note your new client number!
Client No: 20722
Order No: 7591
Please mention 34719-20722 with your payment!

Date: 16/05/2024
Ship via: Abholung ab Werk
Estimated ship date: 23/05/2024

Pos.	Art.-No.	Description	Qu	Unit	Price/Qu	Line Total
1	113001B	Beachhandball court, complete set complete set for a Beach Soccer court with freestanding goals (size: 3 x 2 m) with foldable rear net holders, including the nets and ground fixings comes with a 5 cm wide, blue courtline (27 x 12 m, freely adjustable)	1.00	set		
2		Shipping & Packaging: ex work/customer collection	1.00			

Total net value (0.00 %)
plus VAT (0.00 %) €0.00

Payment: Advance payment via bank transfer

FUNTEC Sports GmbH
Löhestr. 25 · 53773 Hennef
Tel: 02242 3231
E-Mail: info@funtec.de
www.funtec.de

Geschäftsführung:
Ralf Esser & Elisabeth Esser
Gorichtsstand: Siegburg HRB 6199
USt.-IdNr.: DE214666010
Steuernummer: 220/5731/0776

Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE97 3705 0299 0000 2464 05
BIC: COKSDE33XXX

LYD
PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7475

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	DURAMOS SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	806002911 8		ORDEN DE COMPRA (SBR SEM 16)
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
VIA ALTERNA KM 4 200 VDA	Santa Mart	4209656	

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
martes, 9 de abril de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
SBR	CAUCHO GRANULADO SBR	15000	Kg.	1.610	24.150.000

Valor en Letras
VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	24.150.000
DESCUENTO	0
IVA	4.588.500
TOTAL DOCUMENTO	28.738.500

Observaciones:

Firma Responsable_____

LYD
PROYECTOS

Nit:900.311.811-6

CALLE 74 # 53-47 Tel.:9370193 Bogotá, D.C. - Colombia

PURCHASE ORDER No.
7220

SUPPLIER FOSHAN LX COMMERCIAL CO LTD

CURRENCY	DATE	PAYMENT TERMS
USD	13-feb.-24	

NOTE: ORDEN DE COMPRA (STOCK TPV-RT COATING)

CODE	DESCRIPTION	QTY		UNIT PRICE	TOTAL AMOUNT
TPVGRBL	TPV GRANULES BLANCO	200	kg	1,12	224,00
TPVGR3017	TPV GRANULES 3017 ROJO VIVO	3.500	kg	1,12	3.920,00
TPVGR4005	TPV GRANULES 4005 MORADO	1.000	kg	1,12	1.120,00
TPVGR1026	TPV GRANULES 1026 AMARILLO	3.000	kg	1,12	3.360,00
TPVGR2008	TPV GRANULES 2008 NARANJA	3.500	Kg.	1,12	3.920,00
TPV 018	TPV GRANULES 6018 VERDE CLARO	3.300	Kg.	1,12	3.696,00
TPVGR5012	TPV GRANULES 5012 AZUL CLARO	3.000	Kg.	1,12	3.360,00
TPVGR5015	TPV GRANULES 5015 AZUL OSCURO	3.000	Kg.	1,12	3.360,00
TPVGR6016	TPV GRANULES 6016 VERDE OSCURO	2.500	Kg.	1,12	2.800,00
RTCOAZCL	RT COATING AZUL CLARO 05 FOSHAN	300	kg	4,65	1.395,00
RTCOVECL	RT COATING VERDE CLARO 03 FOSHAN	250	kg	4,65	1.162,50
RTCOAMA	RT COATING AMARILLO 07 FOSHAN	200	kg	4,65	930,00
RTCONA	RT COATING NARANJA 06 FOSHAN	250	Kg.	4,65	1.162,50
RTCOAZOS	RT COATING AZUL OSCURO 04 FOSHAN	250	kg	4,65	1.162,50
RT VI	RT COATIN ROJO VIVO 19 FOSHAN	400	kg	4,65	1.860,00
RTCOMO	RT COATING MORADO 15 FOSHAN	300	kg	4,65	1.395,00
RTCOVEROS	RT COATING VERDE OSCURO 02 FOSHAN	350	kg	4,65	1.627,50
RTCOTUR	RT COATING TURQUESA 21 FOSHAN	200	kg	4,65	930,00
RTCOCAF	RT COATING CAFÉ OSCURO 09 FOSHAN	100	kg	4,65	465,00
RTCOCACL	RT COATING CAFÉ CLARO 10 FOSHAN	100	kg	4,65	465,00
RTCOGRICL	RT COATING GRIS CLARO 12 FOSHAN	100	kg	4,65	465.00
RTCOMOZ	RT COATING MOSTAZA 08 FOSHAN	100	kg	4,65	465,00
RTCOGROS	RT COATING GRIS OSCURO 11 FOSHAN	100	kg	4,65	465,00

Notes:	SUB TOTAL	39.710,00
Incoterm: CIF BUN	DISCOUNT	0,00
Exchange Rate:	GRAND TOTAL	39.710,00
Other:		

allios
EXPORT

FACTURA N° 24030111
FECHA 26/03/2024

LYD PROYECTOS SAS
CALLE 74# 53-47
BOGOTA 11211
COLOMBIA

NIT.900.311.811-6
CTC Angela Pulido, Phone 312 2886159

description	Total Qty	UNIT PRICE EURO		TOTAL PRICE EURO
350 X 20 kg RESIBASE BP	7000 kg			
40 X 15 kg PRIMER ES40	600 kg			
40 X 15 kg PRIMER ES15	600 kg			
73 X 20 kg RESIBASE TRAFFIC GREEN	1460 kg			
23 X 20 kg RESIBASE AZUR BLUE	460 kg			
16 X 20 kg RESIBASE BRIGHT ORANGE	320 kg			
61 X 20 kg RESITOP TRAFFIC GREEN	1220 kg			
20 X 20 kg RESITOP AZURE BLUE	400 kg			
14 X 20 kg RESITOP BRIGHT ORANGE	280 kg			
70 X 20 kg COLOR TRAFFIC GREEN	1400 kg			
20 X 20 kg COLOR APPLE GREEN	400 kg			
20 X 20 kg COLOR TURQUOISE BLUE	400 kg			
45 X 20 kg COLOR AZURE BLUE	900 kg			
13 X 20 kg COLOR LAVENDER	260 kg			
45 X 20 kg COLOR BRIGHT ORANGE	900 kg			
30 X 20 kg COLOR MELLON YELLOW	600 kg			
30 X 20 kg COLOR TRAFFIC RED	600 kg			
25 X 4 kg LINES WHITE	100 kg			
13 X 4 kg LINES YELLOW	52 kg			
			TOTAL GOODS VALUE - EUROS	
			TOTAL FCA MARIGNANE (FR) - EUROS	
			CONTRAVALOR EN USD (fecha 25/03/2024)	

mercancia: RESINAS ACRILICAS COURTSOL PARA SUELOS DEPORTIVOS
doc adjuntado: lista de embalaje 24030111 (28 paletas en un 40HC)

lugar de expedición : France
destinación final : COLOMBIA

"Certificamos bajo juramento que los precios de esta factura son los que cargamos al cliente y que la mercancía que ella se refiere es originaria de Francia . En fé de lo expuesto, firmamos la presente declaración "

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera Nr FR003080/0079) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial FRANCIA.
"The exporter of the products covered by this document (customs authorisation Nr FR003080/0079) declares that, except otherwise clearly indicated, these products are of FRENCH preferential origin."

ALLIOS SAS
2648 RD 6007
06270 VILLENEUVE-LOUBET
FRANCE
TEL : +33 (0)4 92 02 66 66
FAX : +33 (0)4 92 02 66 59

EORI Nr : FR77556029500708
"éxonération de TVA, article 262-I du CGI"

GENERAL CONDITIONS OF SALE valid from 2021.10.01

1- **GENERAL:** These General Conditions of Sale constitute the sole basis of all commercial negotiations and apply to any order placed and / or receipt of delivered goods, notwithstanding any contrary clauses mentioned in the buyer's general conditions of purchase or any other document taking place. In accordance with the regulations in force, the seller reserves the right to derogate from certain clauses of these General Conditions of Sale, depending on the negotiations carried out with the buyer, by establishing Special Conditions of Sale. The buyer declares to have taken cognizance of these General Conditions of Sale, which are opposable to him in accordance with the terms of article 1119 of the French civil code, and to have accepted them before his immediate purchase or ordering the goods. This acceptance is recognition by the buyer that he has all the documents required for the use of products, in particular its declaration of performance "DoP" in the case of a construction product with the CE marking and Material Safety Data Sheet "MSDS", all available on the seller's website in accordance with the GENERAL CONDITIONS OF EMPLOYMENT given on the DATA SHEET of each product purchased (conditions that make reference to Article 7.3 RCP for the provision of the DoP of construction products covered).

2- **PRICES AND DISCOUNTS:** Our prices are stipulated subject to modifications in terms of increases which are regulated by the current economic situation or by our suppliers Unless agreed otherwise, the reviewed prices will be applicable without notice to the standard price list as well as on the special sales. Our prices are net and based on the buyer's potential, volume, unit deliveries, delivery conditions, technical or commercial assistance we may grant, the buyer's credit rating, the payment terms, etc... Proportional discounts, reductions or rebates can also be granted on an one-off or yearly basis if one of the basic elements of the standard negotiated price has been modified (exceptionally large delivery, huge work site, product launching, promotions, etc...).

3- **SHIPMENTS**: Our goods travel at consignee's risks. The carriage-paid deliveries are not an exemption to that rule. The weights and quantities shall be checked by the buyer or the consignee on receipt of the deliveries. Founded claims being raised by the buyer on receipt of the goods have to be notified in writing on the delivery note. According to the Article L 133-3 of the French Commercial Code, each notified claim should be confirmed by registered letter to the carrier within 3 days following the delivery day. All unforeseeable circumstances (case of force majeure) suspend by right our delivery commitments and eventually release us from them if the situation should become definitive. Any payment delay, from the buyer, will allow us to stop our deliveries without further notice. No return of product will be accepted without prior definite agreement from our commercial management (who fills a return order). After approval, if products are returned for any other reasons than a mistake or defect from us, the client will receive a credit note equivalent to the invoiced price of the products less the handling fees and eventually the processing costs. In that case, the products will have to be returned carriage paid by the client to our factory. Any other claims, not related to the transport conditions, have to be formulated by registered letter within a maximum delay of 8 days after the receipt of the goods.

4- **DELIVERY TIME:** For the Metropolitan France, the standard delivery time is 10 days after acceptance of the correct and complete purchase order. It is otherwise 15 days. However, special products, with low rotation, manufactured upon request or under a specific distributor's brand or any other label, can require extra delivery deadline negotiated on an one-off or yearly basis. The delivery time longer than the standard is communicated for information only. Whatever the cause might be, a delivery delay cannot be liable to a claim for a damage refund.

5- **CANCELLATION:** Our company is entitled to cancel the sale, either completely or partially, in a case of force majeure or specific events liable to stop or reduce the production or postpone the delivery of the goods, or to prevent the normal order processing, as well as in the case of a change of the debtor's situation, which could imperil our credits for any reasons. The buyer cannot cancel any firm order prior to our written approval. This cancellation, in case that we agree, implies that the buyer will be strictly obliged to pay, as a way of compensation, an allowance inclusively fixed at 15% of the amount of the order. These General Conditions of Sale expressly exclude the legal contingency regime provided for in article 1195 of the French civil code.

6- **CLAIMS:** The claims concerning defects which are not relative to the transport of the goods will be taken into account only if they are written within a period of 8 days from the delivery time. The buyer must join to this claim pertinent written proof, samples and packaging descriptions, with number and date of the invoice, as well as the references written on the packaging. If the buyer didn't check the goods within this period or even if he did it but used or sold the aforementioned goods, he is the only one to be responsible for the damages that could occur from their use. Each product making up the goods must be employed according to its recommendations for use which mainly aim the market of construction (building paints with a/particular function/s of protection which usually are primarily decorative paints, or related products, as resale product or not). The instructions specific to each product are available in the form of a DATA SHEET communicable on request, in particular to control that what could be already known of the buyer was not modified by a more recent edition. This sheet mentions the GENERAL CONDITIONS OF EMPLOYMENT of the product (knowing that these conditions may be presented differently for resale product). Use, transformation and application of these products are beyond the control of the seller and therefore are only under the responsibility of the buyer. No responsibility for the seller, manufacturer or not, can thus be committed on construction buildings or equipment done/to be done, like over their lifespan (according to definition of the Interpretative Documents "DIs" of the former European Construction Products Directive CPD 89/106/EEC modified or of the Regulation n° 305/2011 that replace it), when the application is not prescribed or is not made in accordance with codes of practice by a qualified professional, and that a checking by our care of the conditions of this application is not required for conventional durability higher than 2 years. The conditions must imperatively be recognized on a preliminary RECORD SHEET referring to the SPECIFIC CONDITIONS OF EMPLOYMENT attached to this type of process, and records the particular recommendations to respect for the intended use. This type of examination is normally possible only in Metropolitan France, as well as any checking relating to the execution of the coatings, which can relate only to surfaces of reference of reduced size, carefully located. Under no circumstances, the corresponding intervention, when it is asked for, could be comparable with a management or any supervision of the works, such as attached to the mission of a project manager, even in the event of specific intervention of a demonstrator to reveal the good applicability of the products according to their recommendations for use. Concerning the legal clauses suitable for estate construction in France, coatings carried out with products of the paintings family constitute elements (dissociable) that can raise to insurance construction, and to the guarantee of minimum two years good working or to the presumption of decennial responsibility owed by the manufacturers (and not the seller) for works completed. When they are not employed for construction, but for works of pure decoration for maintenance of construction facings or others (before/after delivery), sold through distributors in the "consumer market", to unprofessional consumers who use them directly, or professionals decorators delivering them installed properly, the products are subjected to the guarantee of 2 years conformity to be given by the seller for the resale of consumer goods in accordance with European Directive 99/44/EEC and with articles L211.1 to 17 of the French Consumer Code transposing it. Other products are subjected to the responsibility of common law unless agreed special warranty. Except for the varnishes which according to the exposure can require an annual regeneration, sold products, incorporated according to their recommendations of employment, answers these obligations, under normal conditions of use. A durability higher than 2 years implies a periodic maintenance of the coatings. After use, the purchaser manages to deal with the treatment of the residues and waste of packaging resulting from the sold goods in accordance with the environmental protection laws and regulations applicable. The provisions above apply to the products of our manufacture, as concretized by the mention of our corporate name and address on our packaging, or of our pre-packaging identification (1978-01-31 French Decree n° 78-166), and so sold under a brand name belonging to us or not, and which can be reserved to a retailer as sole distributor (in the absence of these indications and subject to article 7 mentioned below, the packaged product belongs upon receipt to the person who had ordered it with affixing of his brand and corporate names on the packaging, by taking over like this the responsibilities related to the manufacturing and marketing of the product, for which the elaboration in factory is then considered as subcontracting according to an agreed formulation subject to quality management procedure ; also, the receipt, maximum eight days after the delivery, involve with the transfer of property the transfer of all the risks related to the products purchased ; and in case of a failure, the liability of the seller will be strictly limited to the replacement value of the defect product). The conditions fixed here-above apply to related products (accompanying or others) resold.

7- **RETENTION OF TITLE** (French Law dated 12-05-80 and articles 115 et 122 of the French Law dated 01/25/1985): The seller keeps the property of the delivered goods until their complete settlement by the buyer. The sale will be sealed after payment of the whole price and additional costs. Cheques, bill of exchanges and transfers of debt are considered as proof of payment only from the date their collection is effective. If the goods are resold, seller's rights are carried over the selling revenue up to the remaining overdue amounts. In default of payment at the due date, all the other outstanding amounts become immediately payable even if those gave rise to the issuance of bills of exchange or promissory note. The buyer will be able to use the goods in conformity with their purpose for the needs of his company. However, the seller reserves the right to proscribe any modification, use or resale of the goods in case of receivership. The buyer will have to inform immediately the seller about any measure, action, seizure, levy, confiscation or any other kind, which could question his property rights on the goods. The goods travel at consignee's risks who shall take all the useful measures in order to guarantee the receipt, the maintenance and the perfect conservation, notwithstanding the retention of title. The buyer is liable to insure the sold goods against any risks that they could face or create from their departure point at the seller's factory. The non-observance of any of the above-mentioned measures or the non-payment at the due date of any overdue amount by the buyer would authorize the seller to legally cancel the sale by a simple notification sent by registered letter, to take back in stock the goods and to cease further deliveries. By putting this clause into practice, the products, even those already delivered, will retroactively become the seller's property. In case of receivership or liquidation, the seller will be able to revendicate the application of this clause.

8- **TERMS OF PAYMENT:** Except special agreement, payment of goods has to be done at the expiry date mentioned on the invoice. No claim or contesting allows the purchaser to defer the payment of the invoice. Neither any compensation nor any retention right is allowed regarding our debts. Only our credit notes can cancel partially or totally our invoices. If the terms of payment are not respected, even concerning only one date of payment, all the amounts then due are immediately payable. In case of payment after the due date indicated on the invoice, penalties will be payable without the necessity of a reminder. The applied rate will be equal to three times the legal rate of interest in France, prorata temporis. Furthermore, any professional in case of a late payment will be automatically debtor of a compensation for recovery costs with an amount of 40 Euros (art. D441-5 of the French Commercial Code). If the recovery costs are higher than this amount, the seller may charge a supplementary compensation upon justification. This legal arrangement will be applied in case of late and outstanding payments, or request for extra time of expiry date. Any late payment would also lead to the payability, by a way of damages and penalty clause, of compensation equal to 15% of the overdue amounts, as well as legal interests and possible legal charges. In case of payment before the due date mentioned in the current general conditions of sale, a discount will be granted to the buyer. The applied rate will be the basic one of the Banque de France: it will be based on the whole amount, tax free, for every month with effect from the due date mentioned on the invoice. The default of return of an acceptance bill within 15 days following the presentation at the bank will amount to an outstanding payment and the last sent notice will be equivalent to an injunction. In case of insufficient solvency of the buyer, the contractual terms of payment are no more applied and the deliveries will be executed against payment in advance.

9- **LAW AND JURISDICTION:** All disputes resulting from the interpretation or execution of these current general conditions of sale will be submitted to the law of France and will fall within the exclusive competence of the Commercial Court which has registered the seller's company, even if it concerns exported products. Claims based on a conventional durability of the coatings can be presented only in accordance with the documents of acknowledgement referred in the SPECIFIC CONDITIONS OF EMPLOYMENT of the corresponding products, obligatorily supplemented by the CERTIFICAT DE GUARANTIE which must establish them after acceptance of the works. The actions are exercised according to the law of sale. In the event of legal proceeding being instituted by any third parties against the buyer before another court, said buyer hereby waive all and any right to invoke any guarantee of our company before any other court than that referred to herein-above.

10- **VALIDITY:** Any modification of the above conditions is immediately applicable to the orders subsequent to the date of this modification. The current conditions can exceptionally be modified by a specific sale's agreement. As well as for the product description sheets, the current general conditions of sale are also available in French language. Any further information in

LYD
PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drublo@ lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No. 7669

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS		
NIT	900634159 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 68D 37 20 SUR	Bogota D.C	7868494	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (COMPRA ACERO 9)

FECHA DOCUMENTO	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 31 de mayo de 2024	TATIANA CORTES RAMIREZ	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
PLA12X12	PLATINA 12CMx12CM DE 1/ 8	50	Und.	14.950	747.500
PLATCIRCU30CM	PLATINA CIRCULAR DIAMETRO 30 CM	100	Und.	16.941	1.694.100
LAMGAL120X240CAL18	LAMINA GALVANIZADA 1,20X2,40 CAL 18	8	Und.	87.385	699.080
PLAT21/1	PLATINA DE 2 1/2 " X 1 /8	8	Und.	34.437	275.496
TUBAN315M	TUBO REDONDO 3" 1,5MM	8	Und.	86.200	689.600
ANG1/2X1/8	ANGULO 1 1/2 X1/8	80	Und.	38.084	3.046.720
PLA1/2X1/8	PLATINA 1/2X 1/8	70	Und.	6.024	421.680
TUBANRE2CL15	TUBO REDONDO 2 CL 1,5 MM	28	Und.	52.653	1.474.284

Valor en Letras

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**9.048.460**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.719.207**
TOTAL DOCUMENTO	**10.767.667**

Observaciones:

Firma Responsable_____

LYD
PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No. 7671

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	FERRELUGUE SAS		
NIT	800046125 2		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
AV 6 37 78	Bogota D.C	2019300	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (COMPRA ACERO))

FECHA DOCUMENTO	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 31 de mayo de 2024	TATIANA CORTES RAMIREZ	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
ANG1X1/8	ANGULO 1X1/8	100	Und.	21.788	2.178.800
ANG11/4X1/8	ANGULO 1 1/4 X 1/8	70	Und.	35.586	2.491.020
ANG21/8	ANGULO 2" X 1/8	6	Und.	57.353	344.118
ANG21/2	ANGULO 2 1/2" X 3/16"	5	Und.	108.333	541.665
[illegible]NRE11/2CL15	TUBO REDONDO 1 1/2 CL 1,5 MM	12	Und.	46.490	557.880
TUBCU3/4CAL18	TUBO CUADRADO 3/4 CL 18	30	Und.	15.238	457.140
TUBCAL183/4	TUBO CALIBRE 18 3/4"	4	Und.	24.950	99.800
MALEL4MM	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM X 2,35*6MT	11	Und.	69.597	765.567
VAR1/2	VARILLA 1/2	3	Und.	22.268	66.804

Valor en Letras
OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.502.794**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.425.531**
TOTAL DOCUMENTO	**8.928.325**

Observaciones:

Firma Responsable_____

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7674

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	MALLAS Y CERRAMIENTOS BOGOTA SAS		
NIT	901465526 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL12 16 60	Bogota D.C	3102204932	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
viernes, 31 de mayo de 2024	TATIANA CORTES RAMIREZ	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
MALLESCAL10	MALLA ESTABON CAL10.5 DE 2" HUECO 20 MLX 2.50	7	Und.	819.328	5.735.294

Valor en Letras
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.735.294
DESCUENTO	0
IVA	1.089.706
TOTAL DOCUMENTO	6.825.000

Observaciones:

Firma Responsable_____

LYD PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7682

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	MONTAJES Y MANTENIMIENTO LCM SAS		
NIT	901088160 7		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
TV 13G 32B SUR 08	Bogota D.C	3134388823	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (ADICION METROPOLITANO IDRD)

FECHA DOCUMENTO	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 5 de junio de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
BANMC	BANCA PREFABRICADA MC VILLA ALPES 3 TUNAL 3 FRAGUA 1 CASTILLA 2 RECREO 4 ATAHUALPA 2 JUAN AMARILLO 1	16	Und.	1.400.000	22.400.000
BANM31	BANCA PREFABRICADA M-31 CARMELO 1	1	Und.	250.000	250.000

Valor en Letras
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.650.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**22.650.000**

Observaciones:

Firma Responsable:_____

351

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7683

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	OSCAR HERNAN RODRIGUEZ GUTIERREZ		
NIT	80250285 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 22B 65B 53 SUR	Bogota D.C	3202484613	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (ADICION METROPOLITANO IDRD)

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 5 de junio de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
CANACIN	CANECA ACERO INOX M-121 FRAGUA 2 RECREO 2 ATAHUALPA 1 CARMELO 1 ATABANZA 1	7	Und.	470.000	3.290.000

Valor en Letras
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.290.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.290.000

Observaciones:

Firma Responsable_____

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7584

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	CERAMICAS GRANITO DE ORO LIMITADA		
NIT	830145980 7		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
LT EL GRANITO DE ORO VE	Bogota D.C		

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (EDUARDO SANTOS)

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
viernes, 10 de mayo de 2024	HECTOR GIOVANY MONGUA ESCOBAR	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
ADOARE	ADOQUIN ARCILLA 20X10X6 ESPAÑOL Eduardo Santos Adición Metropolitano IDRD	3000	Und.	740	2.220.000

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.220.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.220.000

Observaciones:

Firma Responsable_____

352.

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7638

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS EN INFRAESTRUCT		POR CONCEPTO DE
NIT	901368938 1		ORDEN DE COMPRA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 28 67 65	Bogota D.C	3112341769	

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
lunes, 27 de mayo de 2024	HECTOR GIOVANY MONGUA ESCOBAR	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
GEOHDPE20	GEOMEMBRANA HDPE 20 MILS 7M X 83M 1 Rollo x 100m2 Amarilo Norte	100	m²	6.878	687.800
733550	Servicio Transporte Fletes y Acarreos Costos 100m2 Transportados hacia Amarilo Norte	1	Und.	350.000	350.000
GEOT2100G	GEOTEXTIL T2100 GEOANDES ROLLO 3,85X140M 1 Rollo x 539m2 Villa Los Alpes	539	m²	3.060	1.649.340
GEOT2400GA	GEOTEXTIL T2400 3,85MX 120M GEOANDES 1 Rollo x 462m2 Flor Morado	462	m²	3.960	1.829.520
GEOT2100G	GEOTEXTIL T2100 GEOANDES ROLLO 3,85X140M 1 Rollo x 539m2 Flor Morado	539	m²	3.060	1.649.340

Valor en Letras
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.166.000
DESCUENTO	0
IVA	1.105.040
TOTAL DOCUMENTO	7.271.040

Observaciones:

Firma Responsable_____

LYD PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7615

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	TEKNOCOLOR J&C SAS		
NIT	901130207 3		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CLL 43 SUR 82-09	Bogota D.C	2642584	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (SEM 20)

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
martes, 21 de mayo de 2024	TATIANA CORTES RAMIREZ	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
PINTPOLIAM	PINTURA POLIURETANO AMARILLO	2	gal	268.907	537.814
PINTPOLI9002	PINTURA POLIURETANO GRIS RAL 9002	10	gal	268.908	2.689.080
PINTPOLI5002	PINTURA POLIURETANO AZUL RAL 5002	7	gal	268.908	1.882.356
PIN :OCA	PINTURA POLIURETANO ROJA CARDENAL	7	gal	268.908	1.882.356

Valor en Letras
OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.991.606
DESCUENTO	0
IVA	1.328.405
TOTAL DOCUMENTO	8.320.011

Observaciones:

Firma Responsable_____

353

LYD
PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drublo@ lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No. 7622

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS		
NIT	900634159 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 68D 37 20 SUR	Bogota D.C	7868494	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (COMPRA ACERO 8)

FECHA DOCUMENTO	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 22 de mayo de 2024	TATIANA CORTES RAMIREZ	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
PLA120X120	PLATINA 120X120X2,5MM HR PLATINA 12CMx12CM DE 1/ 8 (BASE DE COLUMNA)	60	Und.	14.950	897.000
PLATCIRCU30CM	PLATINA CIRCULAR DIAMETRO 30 CM	84	Und.	16.941	1.423.044
PLA1/2X1/8	PLATINA 1/2X 1/8	80	Und.	6.024	481.920
TUBEAN1.50	TUBO REDONDO 2 " ESP 1.50	22	Und.	52.653	1.158.366
ANG1/2X1/8	ANGULO 1 1/2 X1/8	70	Und.	38.084	2.665.880

Valor en Letras
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.626.210**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.258.980**
TOTAL DOCUMENTO	**7.885.190**

Observaciones:

Firma Responsable_____

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7624

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S A		POR CONCEPTO DE
NIT	860056971 8		ORDEN DE COMPRA (COMPRA ACERO 8)
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 16 11 35	Bogota D.C	2860562	

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 22 de mayo de 2024	TATIANA CORTES RAMIREZ	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
PLAT2X1/8	PLATINA 2 X 1/8 PLATINA DE 2 1/2 " X 1 /8" (CAJAS)	4	Und.	34.200	136.800
TUBRED7/8	TUBO REDONDO 7/8X1/8	3	Und.	16.880	50.640

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	187.440
DESCUENTO	0
IVA	35.614
TOTAL DOCUMENTO	223.054

Observaciones:

Firma Responsable_____

LYD
PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@ lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No. 7625

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	FERRELUGUE SAS		
NIT	800046125 2		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
AV 6 37 78	Bogota D.C	2019300	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (COMPRA ACERO 8)

FECHA DOCUMENTO	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 22 de mayo de 2024	TATIANA CORTES RAMIREZ	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
ANG1X1/8	ANGULO 1X1/8	68	Und.	21.788	1.481.584
ANG11/4X1/8	ANGULO 1 1/4 X 1/8	50	Und.	35.586	1.779.300
ANG21/8	ANGULO 2" X 1/8	4	Und.	57.353	229.412
LAMGAL120X240CAL18	LAMINA GALVANIZADA 1,20X2,40 CAL 18	4	Und.	120.915	483.660
TUBANRE11/2CL15	TUBO REDONDO 1 1/2 CL 1,5 MM	10	Und.	46.490	464.900
TUBCU3/4CAL18	TUBO CUADRADO 3/4 CL 18	28	Und.	15.238	426.664

Valor en Letras
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.865.520
DESCUENTO	0
IVA	924.449
TOTAL DOCUMENTO	5.789.969

Observaciones:

Firma Responsable_____

LYD PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7626

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	MALLAS Y CERRAMIENTOS BOGOTA SAS		
NIT	901465526 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL12 16 60	Bogota D.C	3102204932	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (COMPRA ACERO 8)

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 22 de mayo de 2024	TATIANA CORTES RAMIREZ	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
MALLESCAL10	MALLA ESTABON CAL10.5 DE 2" HUECO 20 MLX 2.50	8	Und.	819.328	6.554.622

Valor en Letras
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.554.622
DESCUENTO	0
IVA	1.245.378
TOTAL DOCUMENTO	7.800.000

Observaciones:

Firma Responsable_____

LYD PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7686

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	JUAN CARLOS GOMEZ		
NIT	74081153		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 74 No 53-47	Bogota D.C	3102570959	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 5 de junio de 2024	TATIANA CORTES RAMIREZ	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
PINTGRIAGU	PINTURA VINILO GRIS BASALTO A BASE DE AGUA	1	Und.	184.874	184.874

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	184.874
DESCUENTO	0
IVA	35.126
TOTAL DOCUMENTO	220.000

Observaciones:

Firma Responsable_____

LYD
PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No. 7669

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS		
NIT	900634159 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 68D 37 20 SUR	Bogota D.C	7868494	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (COMPRA ACERO 9)

FECHA DOCUMENTO	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 31 de mayo de 2024	TATIANA CORTES RAMIREZ	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
PLA12X12	PLATINA 12CMx12CM DE 1/ 8	50	Und.	14.950	747.500
PLATCIRCU30CM	PLATINA CIRCULAR DIAMETRO 30 CM	100	Und.	16.941	1.694.100
LAMGAL120X240CAL18	LAMINA GALVANIZADA 1,20X2,40 CAL 18	8	Und.	87.385	699.080
PLAT21/1	PLATINA DE 2 1/2 " X 1 /8	8	Und.	34.437	275.496
[illegible]N315M	TUBO REDONDO 3" 1,5MM	8	Und.	86.200	689.600
ANG1/2X1/8	ANGULO 1 1/2 X1/8	80	Und.	38.084	3.046.720
PLA1/2X1/8	PLATINA 1/2X 1/8	70	Und.	6.024	421.680
TUBANRE2CL15	TUBO REDONDO 2 CL 1,5 MM	28	Und.	52.653	1.474.284

Valor en Letras
DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**9.048.460**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.719.207**
TOTAL DOCUMENTO	**10.767.667**

Observaciones:

Firma Responsable_____

LYD
PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drublo@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No. 7671

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	FERRELUGUE SAS		
NIT	800046125 2		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
AV 6 37 78	Bogota D.C	2019300	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (COMPRA ACERO))

FECHA DOCUMENTO	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 31 de mayo de 2024	TATIANA CORTES RAMIREZ	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
ANG1X1/8	ANGULO 1X1/8	100	Und.	21.788	2.178.800
ANG11/4X1/8	ANGULO 1 1/4 X 1/8	70	Und.	35.586	2.491.020
ANG21/8	ANGULO 2" X 1/8	6	Und.	57.353	344.118
ANG21/2	ANGULO 2 1/2" X 3/16"	5	Und.	108.333	541.665
TUBANRE11/2CL15	TUBO REDONDO 1 1/2 CL 1,5 MM	12	Und.	46.490	557.880
TUBCU3/4CAL18	TUBO CUADRADO 3/4 CL 18	30	Und.	15.238	457.140
TUBCAL183/4	TUBO CALIBRE 18 3/4"	4	Und.	24.950	99.800
MALEL4MM	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM X 2,35*6MT	11	Und.	69.597	765.567
VAR1/2	VARILLA 1/2	3	Und.	22.268	66.804

Valor en Letras
OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.502.794**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.425.531**
TOTAL DOCUMENTO	**8.928.325**

Observaciones:

Firma Responsable_____

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7674

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	MALLAS Y CERRAMIENTOS BOGOTA SAS		
NIT	901465526 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL12 16 60	Bogota D.C	3102204932	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
viernes, 31 de mayo de 2024	TATIANA CORTES RAMIREZ	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
MALLESCAL10	MALLA ESTABON CAL10.5 DE 2" HUECO 20 MLX 2.50	7	Und.	819.328	5.735.294

Valor en Letras
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.735.294
DESCUENTO	0
IVA	1.089.706
TOTAL DOCUMENTO	6.825.000

Observaciones:

Firma Responsable_____

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7682

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	MONTAJES Y MANTENIMIENTO LCM SAS		
NIT	901088160 7		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
TV 13G 32B SUR 08	Bogota D.C	3134388823	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (ADICION METROPOLITANO IDRD)

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 5 de junio de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
BANMC	BANCA PREFABRICADA MC VILLA ALPES 3 TUNAL 3 FRAGUA 1 CASTILLA 2 RECREO 4 ATAHUALPA 2 JUAN AMARILLO 1	16	Und.	1.400.000	22.400.000
BANM31	BANCA PREFABRICADA M-31 CARMELO 1	1	Und.	250.000	250.000

Valor en Letras		
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	SUBTOTAL	22.650.000
	DESCUENTO	0
	IVA	0
	TOTAL DOCUMENTO	22.650.000

Observaciones:

Firma Responsable_____

LYD
PROYECTOS

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7683

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	OSCAR HERNAN RODRIGUEZ GUTIERREZ		
NIT	80250285 5		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 22B 65B 53 SUR	Bogota D.C	3202484613	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (ADICION METROPOLITANO IDRD)

FECHA DOCUMENTO	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 5 de junio de 2024	DEYSY JULIETH RUBIO PULIDO	Credito

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
CANACIN	CANECA ACERO INOX M-121 FRAGUA 2 RECREO 2 ATAHUALPA 1 CARMELO 1 ATABANZA 1	7	Und.	470.000	3.290.000

Valor en Letras		
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE	**SUBTOTAL**	**3.290.000**
	DESCUENTO	**0**
	IVA	**0**
	TOTAL DOCUMENTO	**3.290.000**

Observaciones:

Firma Responsable_____

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7479

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	900137138 1		ORDEN DE COMPRA (PARQUE DE LOS NIÑOS)
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Km 2 Via Fusunga Vereda Pa	Soacha		

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 10 de abril de 2024	HECTOR GIOVANY MONGUA ESCOBAR	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
LADRE	LADRILLO RECOCIDO IDRD Parque Niños	1000	Und.	680	680.000

Valor en Letras SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE	SUBTOTAL	680.000
	DESCUENTO	0
	IVA	0
	TOTAL DOCUMENTO	680.000

Observaciones:

Firma Responsable_____

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7526

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	900137138 1		ORDEN DE COMPRA (IDRD Parque de los Niños)
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Km 2 Vía Fusunga Vereda Pa	Soacha		

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
jueves, 25 de abril de 2024	HECTOR GIOVANY MONGUA ESCOBAR	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
SARPREA-10	SARDINEL PREFABRICADO A-10 A=0.20 H=0.50 L=0.8 IDRD Parque de los Niños	25	Und.	39.700	992.500

Valor en Letras		
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	SUBTOTAL	992.500
	DESCUENTO	0
	IVA	0
	TOTAL DOCUMENTO	992.500

Observaciones:

Firma Responsable_____

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7584

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	CERAMICAS GRANITO DE ORO LIMITADA		
NIT	830145980 7		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
LT EL GRANITO DE ORO VE	Bogota D.C		

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (EDUARDO SANTOS)

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
viernes, 10 de mayo de 2024	HECTOR GIOVANY MONGUA ESCOBAR	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
ADOARE	ADOQUIN ARCILLA 20X10X6 ESPAÑOL Eduardo Santos Adición Metropolitano IDRD	3000	Und.	740	2.220.000

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.220.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.220.000

Observaciones:

Firma Responsable_____

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7584

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	CERAMICAS GRANITO DE ORO LIMITADA		POR CONCEPTO DE
NIT	830145980 7		ORDEN DE COMPRA (EDUARDO SANTOS)
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
LT EL GRANITO DE ORO VE	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
viernes, 10 de mayo de 2024	HECTOR GIOVANY MONGUA ESCOBAR	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
ADOARE	ADOQUIN ARCILLA 20X10X6 ESPAÑOL Eduardo Santos Adición Metropolitano IDRD	3000	Und.	740	2.220.000

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.220.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.220.000

Observaciones:

Firma Responsable_____

360

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7704

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	CERAMICAS GRANITO DE ORO LIMITADA		
NIT	830145980 7		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
LT EL GRANITO DE ORO VE	Bogota D.C		

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (IDRD EL RECREO)

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
jueves, 6 de junio de 2024	HECTOR GIOVANY MONGUA ESCOBAR	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
ADOARE	ADOQUIN ARCILLA 20X10X6 ESPAÑOL 400 Und Adoquin de Arcilla IDRD El Recreo	400	Und.	640	256.000

Valor en Letras		
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE	SUBTOTAL	256.000
	DESCUENTO	0
	IVA	0
	TOTAL DOCUMENTO	256.000

Observaciones:

Firma Responsable_____

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7702

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900360954 1		ORDEN DE COMPRA (PTAR SALITRE IDRD)
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
KM 1.5 COSTADO SUR VIA	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
martes, 11 de junio de 2024	HECTOR GIOVANY MONGUA ESCOBAR	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
SUBGRTPEA	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA 28M3 PEA IDRD PTAR Salitre	28	m³	44.259	1.239.252

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.239.252**
DESCUENTO	**0**
IVA	**235.458**
TOTAL DOCUMENTO	**1.474.710**

Observaciones:

Firma Responsable_____

CRA 55 # 74-36 Tel.:3827182 Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: drubio@lydonline.com / www.lydonline.com

ORDEN DE COMPRA No.
7703

Nit:900.311.811-6

PROVEEDOR	AGGREMAX SAS		
NIT	901006154 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 12 50 45	Bogota D.C	3005144529	

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA (IDRD VILLAS DE LOS ALPES Y PTAR SALITRE)

FECHA DOCUMENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
sábado, 1 de junio de 2024	HECTOR GIOVANY MONGUA ESCOBAR	Contado

Referencia	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	Total
SUBGRTPEA	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA 135m3 PEA IDRD Villa de los Alpes	135	m³	46.500	6.277.500
SUBGRTPEA	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA 45m3 PEA PTAR Salitre	45	m³	46.500	2.092.500
BASEIDRD	BASE IDRD 30m3 BASE IDRD PTAR SALITRE	30	m³	47.000	1.410.000

Valor en Letras
ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.780.000
DESCUENTO	0
IVA	1.858.200
TOTAL DOCUMENTO	11.638.200

Observaciones:

Firma Responsable_____

ANEXO 5. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO DE CONTRATISTA

PLAN DE INSPECCION, MEDIDA Y ENSAYO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 3088-2023

PROCESO	DESCRIPCION	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	INSPECCION, MEDICION, EJECUCION Y ENSAYO							SEGUIMIENTO JUNIO 2024
			ENSAYOS, PRUEBAS	VARIABLES DE INSPECCION	RESPONSABLE	CRITERIO DE ACEPTACION	METODO DE CONTROL	FRECUENCIA	REGISTROS	
	EJECUCION EN ZONA DE TRABAJO									
PRELIMINARES DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS	Localizacion y Replanteo - Ubicación de elementos a demolir o desmontar o retirar, verificar ejecucion de la actividad de acuerdo al presupuesto	Planos existentes, esquemas nuevos, ajustados por parte de supervision o interventoria, presupuesto de obra, Especificacion IDRD, Capitulo preliminares	N.A.	Mediciones de obra, registro fotografico Localizacion con base a esquemas y levantamientos topograficos.	Residente de obra	Las demoliciones se podran realizar de forma manual, o con equipo demoledor según el elemento a demoler, las demoliciones ejecutadas deberán ser realizadas de acuerdo con las indicaciones suministradas por el interventor con el visto bueno del supervisor. Niveles+5mm Estructura + 0 Parametros + -- 1	Medicion Manual o con Equipo de Topografia	Antes de iniciar la actividad, una vez por actividad y cada vez que se realice una demolicion o un desmonte. Para cada paso o nivel se debe realizar el control antes y despues de cada actividad.	Registro fotografico, bitacora de obra	Ejecucion de actividades en parque de acuerdo a emergencias presentadas, se hace inspeccion de retiro de acopio de escombros y entrega de propiedad al cliente o se dan de baja elementos retirados según corresponda
	EJECUCION EN ZONA DE TRABAJO									
LIMPIEZA Y RECOLECCION DE ESCOMBROS	Verificación de los volquetes a retirar cuando se requiera el retiro de escombros y durante el estado inicial y final del area a intervenir y durante la ejecucion de las obras en general	Verificacion del area a intervenir cuando se realice limpieza	N.A.	Inspeccion visual, anotaciones de obra, registro fotografico	Residente de obra/ maestro de obra	Para el caso de las obras en general la limpieza del area antes de aplicar un material y para retiro de escombros se verifica visualmente, adicionalmente se deben actiagar los vales de la escombrera	Inspeccion visual y medicion de obra	Durante toda la ejecucion de las actividades, Antes de iniciar una actividad y de finalizarla	Registro fotografico	Se realiza recolección de escombros parques en intervención, seguimiento por parte del area ambiental
	EJECUCION EN ZONA DE TRABAJO									
EXCAVACION MANUAL	Excavaciones para instalacion de mobiliario, obras exteriores, de acuerdo al area a actuar se puede realizar de forma manual o mecanica.	Levantamientos topograficos existentes, planos, carteras de topografia.	Se realizaran en las canchas muestras del terreno antes de dar inicio a los procesos constructivos. Según niveles de diseño recomendados por geotecnista y especificaciones IDRD tabla 4.3	Mediciones de obra registro fotografico, revision de niveles y profundidades de excavacion según especificaciones tecnicas del IDRD tabla 4.3 y recomendaciones especialista en geotecnia.	Residente de obra/ maestro de obra	Nivelar con nivel con nivel y manguera o con equipo de topografia dependiendo del area a intervenir, La cota del fondo de la excavacion no debe diferir en mas de un cm las cotas de acabado definidas en obra o en los planos según sea el caso	Formato de PMA retiro de escombros, implementados en el plan ambiental y de RCD, se debe hacer la revision del terreno nivel antes de excavar y recantarizar las cotas de referencia para verificar volumenes finales de retiro de material con escombrera certificada.	Revision nivelacion inicial Verificacion final para dar liberacion a la actividad de excavacion Durante toda la ejecucion y la obra	Registro fotografico, carteras de topografia (según sea el caso)	Se ejecuta, ver numeral 12 informe 9 del componente calidad
	EJECUCION EN ZONA DE TRABAJO									
RELLENOS EN SUBBASE Y BASE GRANULAR	Rellenos en subbases para la construccion de obras de urbanismo; despues de hacer la revision en los niveles finales de excavacion y estar liberada esta actividad se procede a compactar la subrasante, instalacion de geotextil y extendida y compactacion de subbase granular	Especificaciones IDRD, Resultados de ensayos de laboratorio y certificados de calidad	Ensayo del limite liquido , indice de plasticidad, contenido de finos, tamaño maximo de agregados	Mediciones de obra, revision de niveles, ensayos torrados por el contratista del material a utilizar	Residente de obra/ maestro de obra	Limite liquido menor de 30%, Indice plastico	Resultados de laboratorio Certificados de Material expedido por la mina que distribuye los agregado con sus respectivas licencias ambientales.	Revision nivelacion inicial	Registro fotografico ensayos de laboratorio	Se ejecuta, ver numeral 12 informe 9 del componente calidad
			Verificacion metrica del espesor de la capa compactada, espesor de acuerdo a las recomendaciones del IDRD, compactacion mayor al 95%			Desgaste maquina de los angeles		La verificacion metrica diaria del espesor de cada capa a compactar		
			Verificacion de zonas mal compactadas por variacion de la humedad o por presencia de material plastico			contenido de finos (pasa tamiz N° 40) equivalente de arena mayor al 40%		Verificacion diaria de zonas mal compactadas		
			Ensayo de compactacion proctor modificado			Densidad minima del 95% del proctor modificado		limites de plasticidad y granulometria una vez por lote o material cada 1000		
			Aprobacion de niveles, acabado y resultados por parte de interventoria					Ensayos de densidad de la capa superior compactada cada 300 m2 con 3 tomas		
			En caso de encontrarse suelo de mala calidad se debe tener visto bueno del especialista del contratista o interventoria y tener en cuenta sus recomendaciones para el proceso constructivo.					Los ensayos se deben tomar cada vez que se cambia la cantera		

PLAN DE INSPECCIÓN, MEDIDA Y ENSAYO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ACECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

CONTRATO De OBRA PUBLICA 3099-2023

PROCESO	DESCRIPCION	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	INSPECCION, MEDICION, EJECUCION Y ENSAYO							SEGUIMIENTO JUNIO 2024
			ENSAYOS, PRUEBAS	VARIABLES DE INSPECCION	RESPONSABLE	CRITERIO DE ACEPTACION	METODO DE CONTROL	FRECUENCIA	REGISTROS	
GEOTEXTIL	Verificar materiales a utilizar según especificaciones del fabricante	Especificaciones del proveedor	Certificados de calidad del proveedor	Verificar la instalación según especificaciones del proveedor	Residente de obra/Inspector de obra/maestro	Cumplimiento de especificaciones Técnicas del proveedor	Medición de obra, verificación especificaciones	Llegada a obra	Certificados de calidad de los proveedores.	Se aprueba, ver numeral 12 informe 9 del componente calidad
ACERO	Verificar materiales a utilizar según especificaciones del fabricante	16819 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL IDRD	Certificados de calidad del proveedor	Cumplimiento de especificaciones y normas. Planos de obra.	Residente de obra/Inspector de obra/maestro	Cumplimiento con las especificaciones técnicas.	Medición de obra, verificación especificaciones	Llegada a obra	Certificados de calidad de los proveedores.	No se aprueba actividad en el periodo
ASFALTOS	Verificar material a utilizar según especificaciones técnicas	INV-E-710 746 INV-E-218 INV-E-168 NORMA INVIAS 2002 ART 450 PARA MEZCLA DENSA EN CALIENTE (CONCRETO ASFALTICO) NORMA INVIAS 2002 ART 450 PARA MEZCLA DENSA EN CALIENTE (CONCRETO ASFALTICO)	INSPECCION DE RETIRO DE ESCOMBROS GRANULOMETRIA PORCENTAJE DE ASFALTO COMPACTACION ESTABILIDAD FLUJO MINIMO FLUJO MAXIMO VACIOS EN LA MEZCLA VACIOS EN LOS AGREGADOS VACIOS LLENOS CON ASFALTO DESGASTE EQUIVALENTE EN ARENA SEPARACION TEMP. LLEGADA A OBRA TEMP. DE COMPACTACION SEGÚN TRAMO DE PRUEBA ESPESOR ACABADO DE LA SUPERFICIE NIVELACION	Mediciones de obra. Registro fotográfico. Cumplimiento de especificaciones y normas. Planos.	Residente de obra/Inspector de obra/maestro	Cumplimiento con las especificaciones técnicas.	Medición de obra, verificación especificaciones	ANTES DE DESCARGAR LA MEZCLA DEL VEHICULO, ANTES DE COMPACTAR, DURANTE LA APLICACION Y AL FINAL	CERTIFICACION DE CALIDAD DEL PROVEEDOR	No se aprueba actividad en el periodo
	EJECUCION EN ZONA DE TRABAJO									
CONCRETO (LOSAS, RAMPAS, MUROS ETC)	Fundida de elementos en concreto mayores a veinte m3 para otras estructuras y de un bulto/día, si el concreto se va a elaborar en obra se debe verificar antes de descargar la mezcla que la relación corresponda a la especificada, se verifica el pertrecho de mantenimiento, si el concreto se mezcla en obra tener en cuenta tener en cuenta las recomendaciones del reservista, controlar la instalación y plomo de formaletas para garantizar dimensiones y alineamientos., Estructuras de concreto 3000 PSI	Especificaciones IDRD.	Ensayos de resistencia a la compresión, el número de muestras depende de la cantidad de concreto a fundir (mínimo 3 máximo 4) Inspección y verificación de medidas, niveles, refuerzos, formaleta según diseño Aprobación de niveles, acabado y resultados por parte de interventoría	Mediciones de obra, medición de niveles, ensayos del proveedor, ensayos tomados por el contratista del material a UTILIZAR	Residente de obra/maestro de obra	Cuando la resistencia de la muestra ensayada a los 7 días, 14 días y 28 días sea mayor o igual a la resistencia especificada y requerida según especificaciones IDRD	Resultados de laboratorio rotura a los 7,14 y 28 días, copias concretera Certificado de calidad del concreto prefabricado emitido por el proveedor, verificación resistencia, si el concreto se mezclo en obra verificar las medidas de las mezcladas	De acuerdo a la cantidad de concreto se toman muestras y mismo cuanto de cada fundida realizada	Registro fotográfico ensayos de laboratorio Bracero de Obra	No se aprueba actividad en el periodo
CEMENTO PORTLAND	Verificar materiales a utilizar según especificaciones.	Especificaciones NTC 121, 121	Certificados de calidad del proveedor	Revisión con la siguiente información: "Nombre del cemento" "Marca del cemento y el lugar de fabricación "Tipo de cemento "Marca de las bolsas en kg.	Residente de obra/Inspector de obra	Cumplimiento de especificaciones del proveedor	Revisión por lote	Llegada a obra	Certificados de calidad de los proveedores. Registro fotográfico	No se aprueba actividad en el periodo
TUBERIA	Verificar materiales a utilizar según especificaciones.	Especificaciones del proveedor	Certificados de calidad del proveedor	Cumplimiento de marca especificaciones y normas	Residente de obra/Inspector de obra/maestro	Cumplimiento de especificaciones del proveedor	Revisión por partes del proyecto	Llegada a obra	Certificados de calidad de los proveedores. Registro fotográfico	Se aprueba, ver numeral 12 informe 9 del componente calidad
	EJECUCION EN ZONA DE TRABAJO									
PISOS EN CAUCHO RECICLADO Y EPDM	Verificación de materiales a utilizar, los cuales a instalar deben ser entregados por el interventor, verificar la limpieza de la superficie sobre la cual se va a instalar piso caucho dejar secar el caucho por mínimo 24 horas antes de dar uso	Especificaciones IDRD, Especificaciones del fabricante, recomendaciones del proveedor	Certificado de calidad del proveedor	Color y espesores a utilizar dependiendo de la capa a instalar la base de caucho reciclado varia de acuerdo al espesor a utilizar según especificaciones IDRD	Residente de obra/maestro de obra	Limpieza del producto sobre el cual se va a instalar el piso caucho, verificación del pegante a usar de la base, mezcla del caucho reciclado con resina, instalación de la capa de caucho SOBR antes de instalar la capa de color de espesor de 10cm, verificación y nivelación de la ultima capa	Medición de espesores y áreas en obra con flexometro.	A la llegada del material se debe verificar la calidad, inspeccion durante la instalacion y al final, verificar cada caja instalada	Certificados de calidad de los proveedores, registro fotográfico	Se aprueba, ver numeral 12 informe 9 del componente calidad

PLAN DE INSPECCION, MEDIDA Y ENSAYO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1069-2023

PROCESO	DESCRIPCION	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	INSPECCION, MEDICION, EJECUCION Y ENSAYO							SEGUIMIENTO JUNIO 2024
			ENSAYOS, PRUEBAS	VARIABLES DE INSPECCION	RESPONSABLE	CRITERIO DE ACEPTACION	METODO DE CONTROL	FRECUENCIA	REGISTROS	
	EJECUCION EN ZONA DE TRABAJO									
ADOQUINES LORETAS PREFABRICADAS, ELEMENTOS PREFABRICADOS TALES COMO BANCAS	Verificacion de materiales a utilizar, los cuales a intervenir deben ser autorizados por el interventor, verificar corte, armado y limpieza	Especificaciones IDRD, recomendaciones del proveedor	Certificaciones calidad del proveedor	Color y tipo de acuerdo al aprobado por la interventoria, instalacion y almacenaje conforme a las especificaciones del IDRD.	Residente de obra/ maestro de obra	Colores y tipo según especificaciones del IDRD y aprobadas por parte de interventoria o parametros de instalacion revelacion, alineamiento de juntas Ensayo a la compresion, minimo 3000 psi en promedio de cinco muestras y el menor resultado no puede ser menor a 2500 psi Certificados de calidad del proveedor	Medicion de obra con Rendimiento, certificados de calidad de materiales	A la llegada del material se debe verificar la calidad, inspeccion durante la instalacion y al final verificar cada parte instalada	Certificados de calidad de los proveedores, registro fotografico	No se ejecuta actividad en el periodo.
	EJECUCION EN ZONA DE TRABAJO									
PINTURA EN ESMALTE	Verificacion pintura de elementos y estructuras existentes de mobiliario urbano	Especificaciones IDRD, especificaciones del fabricante recomendaciones del proveedor	Certificaciones calidad del proveedor	Color y tipo Aplicacion y adherencia Dimension de los elementos Limpieza de las superficies y estructura	Residente de obra/ maestro de obra	Estudio, colores según especificacion o recomendacion del supervisor o interventor Cubrimiento homogeneo Cumplir con las medidas dadas por diseñadores y constatar en el modelamo Antes de pintar la estructura debe estar limpia sin residuos de grasa	Medicion en obra, Pruebas de adherencia y certificados de calidad de los materiales	La calidad de la pintura se debe verificar a la llegada del material, se verifica al inicio y durante el proceso de la pintura, la limpieza se debe verificar en cada elemento	Certificados de calidad de los proveedores, registro fotografico	Se ejecuta, ver numeral 12 informe 9 del componente calidad
	EJECUCION EN ZONA DE TRABAJO									
PINTURA DE DEMARCACION Y PINTURA ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	Verificacion pintura de las canchas existentes, baloncesto, microfutbol voleibol.	Especificaciones IDRD, Especificaciones del fabricante, recomendaciones del proveedor	Certificado de calidad del proveedor	Color y tipo Aplicacion y adherencia Dimension de los elementos Trazos perpendicularidades Anchos de linea, baloncesto, microfutbol, voleibol, Estructuras microfutbol, baloncesto y voleibol Limpieza de las superficies de estructura	Residente de obra/ maestro de obra	Pruebas tipo de colores segun la especificacion IDRD o especificacion del fabricante Cubrimiento homogeneo Cumplir con las medidas dadas por diseñadores y constatar en estructuras de canchas	Medicion de obra, certificados de calidad de los materiales.	La calidad de la pintura se debe verificar a la llegada del material, se verifica al inicio y durante el proceso de la pintura, la limpieza se debe verificar en cada elemento	Certificados de calidad de los proveedores, registro fotografico	Se ejecuta, ver numeral 12 informe 9 del componente calidad
	EJECUCION EN ZONA DE TRABAJO									
ACTIVIDADES, MOBILIARIO, REPARACIONES EN GENERAL, SUMINISTRO E INSTALACION	Verificacion de materiales a utilizar (si se realizara fresado para mantenimiento los elementos a intervenir deben ser autorizados por el interventor	Especificaciones IDRD, recomendaciones proveedor	Certificados de calidad,	Dimensiones y calidad de los materiales y elementos a instalar,	Residente de obra	Cumplimiento de especificacion y verificacion por parte de la interventoria,	Certificado de Calidad de mobiliario	A la llegada a obra	Certificados de calidad de los proveedores, registro fotografico	Se ejecuta, ver numeral 12 informe 9 del componente calidad
CANECA METALICA	Verificar materiales a utilizar según especificaciones IDRD	Especificaciones IDRD	Certificados de calidad,	verificar la instalacion, según especificaciones IDRD capitulo mobiliario	Residente de obra /	Cumplimiento de especificaciones de materiales y de instalacion	Verificacion en Obra y certificados de calidad	llegada a obra	Certificados de calidad de los proveedores, registro fotografico	No se ejecuta actividad en el periodo
VALLAS IDENTIFICACION Y SEÑALES CIVICAS	Verificar materiales a utilizar según especificaciones IDRD	Especificaciones IDRD	N.A.	Dimensiones según especificacion IDRD, verificar la instalacion	Residente de obra /	Cumplimiento de especificaciones de materiales y de instalacion	Medicion de obra, visita a taller de fabricacion, especificaciones IDRD	Medicion de obra	Certificados de calidad de los proveedores, registro fotografico	Se ejecuta, ver numeral 12 informe 9 del componente calidad
JUEGOS METALICOS, BIOSALUDABLES RUEDA GIRATORIA ETC.	Verificar materiales a utilizar segun especificaciones IDRD	Especificaciones IDRD	Certificados de calidad del proveedor	Verificar la instalacion según especificaciones IDRD capitulo mobiliario, verificar altura de caida de cada juego a instalar	Residente de obra	Cumplimiento de especificaciones Tecnicas IDRD de materiales y de instalacion	Medicion de obra, visita a taller de fabricacion, verificacion especificaciones IDRD	Llegada a obra	Certificados de calidad de los proveedores registro fotografico	Se ejecuta, ver numeral 12 informe 9 del componente calidad
BANCA M 31, M40	Verificar materiales a utilizar según especificaciones IDRD	Especificaciones IDRD	Certificados de calidad del proveedor	Cartilla Mobiliario Urbano IDRD	Residente de obra/inspector de obra/maestro	cumplimiento de medidas segun cartilla mobiliario urbano IDRD	Revision por foto	llegada a obra	Certificados de calidad de los proveedores. Registro fotografico	No se ejecuta actividad en el periodo
ESTRUCTURA BALONCESTO CON TABLERO ANTIVANDALICO	Verificar materiales a utilizar según especificaciones IDRD	Especificaciones IDRD	Certificados de calidad del proveedor	Cartilla Mobiliario Urbano IDRD	Residente de obra/inspector de obra/maestro	cumplimiento de medidas segun cartilla mobiliario urbano IDRD	Revision por foto	Llegada a obra	Certificados de calidad de los proveedores. Registro fotografico	No se ejecutaron actividades de este proceso en este periodo
PARALES DE VOLEIBOL	Verificar materiales a utilizar según especificaciones IDRD	Especificaciones IDRD	Certificados de calidad del proveedor	Cartilla Mobiliario Urbano IDRD	Residente de obra/inspector de obra/maestro	cumplimiento de medidas segun cartilla mobiliario urbano IDRD	Revision por foto	Llegada a obra	Certificados de calidad de los proveedores. Registro fotografico	No se ejecutaron actividades de este proceso en este periodo
MARCOS DE MICROFUTBOL	Verificar materiales a utilizar según especificaciones IDRD	Especificaciones IDRD	Certificados de calidad del proveedor	Cartilla Mobiliario Urbano IDRD	Residente de obra/inspector de obra/maestro	cumplimiento de medidas segun cartilla mobiliario urbano IDRD	Revision por foto	Llegada a obra	Certificados de calidad de los proveedores. Registro fotografico	Se ejecuta, ver numeral 12 informe 9 del componente calidad

CENTRAL DE ENSAYOS Y DISEÑOS LTDA

LABORATORIO DE SUELOS CONSRETOS Y PAVIMENTOS

FT-093-LAB
Fecha: 07/12/2007
Version: 01
Pag. 1 de

ENSAYOS DE LABORATORIO A LOS MATERIALES PARA ESPACIO PUBLICO Y/O UNIDADES DE MAMPOSTERIA

UNIDADES DE MAMPOSTERIA

NORMAS INV E-2849 // NTC2017 // NTC 3829

ENTIDAD CONTRATANTE: CERAMICAS GRANITO DE ORO — ORDEN N° 3190

PROYECTO: CONTROL INTERNO PLANTA — FECHA: febrero 25, 2024

APIQUE No.: N.D — MUESTRA No.: 1 — PROFUNDIDAD: N.D

DESCRIPCION MUESTRA: **ADOQUIN DE ARCILLA TIPO 1** — FUENTE: **PLANTA**

CALZADA: N.D — LADO: N.D — ABSCISA: N.D

COMPRESION

No.	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	CARGA TOTAL (kg.F)	DIMENSION DE LAS PROBETAS			RESISTENCIA A LA COMPRESION (Mpa.)		CUMPLE
					EJE MAYOR cm	EJE MENOR cm	ESPESOR cm	RESULTADO Mpa.	MIN. ESPECIFICADO Mpa.	
B1	N.D.	27-feb-24	N.D.	62320	10,0	10,0	6,0	61,1	55,2	CUMPLE
B2	N.D.	27-feb-24	N.D.	60230	10,0	10,0	6,0	59,1	55,2	CUMPLE
B2	N.D.	27-feb-24	N.D.	58720	10,0	10,0	6,0	57,6	55,2	CUMPLE
PROMEDIO COMPRESION:								**59,3**	**55,2**	**CUMPLE**

ABSORCION

No.	FECHA DE SECADO	FECHA DE INMERSION	TIEMPO DE SATURACION	PESO S.S.S gr.	PESO SECO gr.	DIMENSION DE PROBETAS			% DE ABSORCION	MAXIMO ESPECIFICADO	CUMPLE
						LARGO cm	ANCHO cm	ALTO cm			
B1	26-feb-24	27-feb-24	24 HORAS	2714,4	2516,6	20,0	10,0	6,0	7,9	8,0	CUMPLE
B2	26-feb-24	27-feb-24	24 HORAS	2722,1	2532,7	20,1	10,0	6,0	7,5	8,0	CUMPLE
B3	26-feb-24	27-feb-24	24 HORAS	2708,5	2547,2	20,0	10,0	6,0	6,3	8,0	CUMPLE
PROMEDIO ABSORCION:									**7,2**	**8,0**	**CUMPLE**

DESGASTE

No	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DIAS)	DIMENCION DE LAS PROBETAS			PERDIDA DE VOLUMEN POR ABRASION MAXIMA (Cm3/Cm2)	MAXIMO ESPECIFICADO (Cm3/Cm2)	CUMPLE
				EJE MAYOR cm	EJE MENOR cm	ESPESOR cm			
B1	N.D.	27-feb-24	N.D..	20,0	10,0	6,0	1,3	1,7	CUMPLE
B2	N.D.	27-feb-24	N.D..	20,1	10,0	6,0	1,3	1,7	CUMPLE
B3	N.D.	27-feb-24	N.D..	20,0	10,0	6,0	1,4	1,7	CUMPLE
PROMEDIO DESGASTE:							**1,3**	**1,7**	**CUMPLE**

INDICE DE ABRASION

							RESULTADO	MAXIMO ESPECIFICADO	CUMPLE
B1	27/02/2024	26-feb-24	N.D..	19,9	9,8	8,0	0,09	0,11	CUMPLE
B2	27/02/2024	26-feb-24	N.D..	20,0	9,9	7,9	0,09	0,11	CUMPLE
B3	27/02/2024	26-feb-24	N.D..	19,8	10,0	8,0	0,08	0,11	CUMPLE
PROMEDIO INDICE DE ABRASION							**0,08**	**0,11**	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

EJECUTO	JEFE DE LABORATORIO	Vo. Bo. RESIDENTE	FORMATO No.
MELKIS DANIEL LAGUNA G	MELKIS DANIEL LAGUNA G.	ING. CESAR MARTINEZ	*F-093 lab*

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-14743-2022/464

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	DESCRIPCIÓN
LUMINARIAS Y FUENTES LED	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A

Calle 578 Sur # 72 A – 23, Bogotá D.C.
IMPORTADOR
NIT: 800.127.132-2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 180540 del 30 de marzo de 2010. ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP) y sus modificaciones con la Resolución 181568 del 1 de septiembre de 2010, Resolución 182544 del 29 de diciembre de 2010, Resolución 180173 del 14 de febrero de 2011, Resolución 91872 del 28 de diciembre de 2012, Resolución 90980 del 15 de noviembre de 2013, Resolución 40122 del 8 de febrero de 2016. Sección 320, 305, 310.9

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de una (1) página.

Fecha de Emisión: 17 de Noviembre de 2022
Fecha próximo seguimiento: 16 de Noviembre de 2023**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.
**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Director de Certificación

Luis Alfredo Granados. Diana Aragon C

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

www.lenor.com.co Carrera 15 No. 93A – 62 Oficina 501 Tel: +57 1 744 65 44 Bogotá, D.C. Colombia

ANEXO No. 1 Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-14743-2022/464 LUMINARIAS Y FUENTES LED		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	LED PANEL SQ POTENCIAS 24W, 30W, 31W, 32W, 33W, 34W, 35W, 36W, 37W, 38W, 39W, 40W TENSIONES 85-265V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 110-277V, 120-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	LED PANEL SQ
2	LED PANEL RC POTENCIAS 24W, 30W, 31W, 32W, 33W, 34W, 35W, 36W, 37W, 38W, 39W, 40W TENSIONES 85-265V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 110-277V, 120-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	LED PANEL RC
3	TOLEDO DIM POTENCIAS 2W, 2.5W, 3W, 3.5W, 4W, 4.5W, 5W, 5.5W, 6W, 6.5W, 7W, 7.5W, 8W, 8.5W, 9W, 9.5W, 10W, 10.5W, 11W, 11.5W TENSIONES 120V, 100-240V, 100-277V, 85-265V, 110-240V, 120-240V, 110-277V, 120-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL) E27	TOLEDO DIM

FIN DEL ANEXO No. 1

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

CINTA DE VINILO AISLANTE ELÉCTRICA - CINTAS DE MASTIC Y CAMBRIC

Comercializado por **3M COLOMBIA S.A.**, en la **Avenida el Dorado No. 75 - 93, Bogotá;**
Celta Trade Park- Autopista Medellín Km. 7 Costado Occidental, Funza, Cundinamarca, Colombia
Trader by **3M COLOMBIA S.A.**, in the **Avenida el Dorado No. 75 - 93, Bogotá;**
Celta Trade Park- Autopista Medellín Km. 7 Costado Occidental, Funza, Cundinamarca, Colombia
Fabricado en las plantas descritas en el anexo:
"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"
Manufactured in described plants on the annex:
"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

UL 510 (2017)

Cinta aislante de caucho, Cloruro de polivinilo y polietileno
Polyvinyl Chloride, Polyethylene, and Rubber Insulating Tape

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado **CSC -CER706495**
Certificate

Fecha de Aprobación: 2019-08-16 **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** 2025-08-15
Renewal Date: Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:

ACREDITADO
ONAC

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado

ICONTEC INTERNACIONAL, carrera 37 #52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

3M COLOMBIA S.A.

UL 510 (2017)

Anexo Certificado *Certificate* CSC -CER706495

Fecha de Aprobación: *Approval Date:* 2019-08-16

Fecha Última Modificación: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: *Renewal Date:*

Fecha de Vencimiento: *Expiration Date:* 2025-08-15

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
3M	Cintas de vinilo aislante eléctrica	Cinta de vinilo aislante eléctrica	Scotch Super 33+, Scotch 35, Scotch 700, Scotch 22, Scotch 15,	Nivel de tensión, color, temperatura de operación, espesor, elongación, adhesión a acero, adhesión a si misma, resistencia a llama, resistencia dieléctrica, resistencia rayos UV	3M Company Hutchinson Tape Manufacturing 905 Adams Street SE Hutchinson Minnesota 55350 USA
3M	Cintas de vinilo aislante eléctrica	Cinta de vinilo aislante eléctrica	Temflex 1700, Temflex 1500, Temflex 1000	Nivel de tensión, color, temperatura de operación, espesor, elongación, adhesión a acero, adhesión a si misma, resistencia a llama, resistencia dieléctrica, resistencia rayos UV	No. ACHEM TECHNOLOGI CORPORATION No.15, Ln. 199, Sec. 2, Minfu Rd., Juiyuan Vil, Yangmei Dist., Taoyuan City 32663, Taiwan
3M	Cintas de vinilo aislante eléctrica	Cinta de vinilo aislante eléctrica	33+	Nivel de tensión, color, temperatura de operación, espesor, elongación,adhesión a acero, adhesión a si misma, resistencia a llama, resistencia dieléctrica, resistencia rayos UV	3M do brasil ltda. Sitio 1rod. Ribeirão pretoararaquara, km 07, 14001-970 - ribeirão preto/sp
3M	Cintas de caucho de media y baja tensión	Cintas de caucho de media y baja tensión	Scotch 130C, Scotch 70	Voltaje, color, temperatura de operación, espesor, elongación, tensión de ruptura,fusión, conductividad térmica resistencia al ozono resistencia dieléctrica, resistencia a rayos UV	3M Company Hutchinson Tape Manufacturing 905 Adams Street SE Hutchinson Minnesota 55350 USA
3M	Cintas de caucho de media y baja tensión	Cintas de caucho de media y baja tensión	Scotch 23, Scotch 13, Temflex 2155	Voltaje, color, temperatura de operación, espesor, elongación, tensión de ruptura, fusión, conductividad térmica resistencia al ozono resistencia dieléctrica, resistencia a rayos UV	3M do brasil ltda. Sitio 1rod. Ribeirão pretoararaquara, km 07, 14001-970 - ribeirão preto/sp
3M	Cintas de mastic y cambric	Cintas de mastic y cambric	Scotch 2229, Scotch 2228, Scotch 2210, Scotch 2510	Voltaje, color, temperatura de operación, adhesión a acero, adhesión a si misma, espesor, resistencia dieléctrica factor de disipación, absorción al agua resistencia al ozono, resistencia al calor, resistencia rayos UV	3M Company Hutchinson Tape Manufacturing 905 Adams Street SE Hutchinson Minnesota 55350 USA

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBO SANITARIO - TUBO VENTILACIÓN - TUBERÍA PRESIÓN AGUA POTABLE - TUBERÍA DE RIEGO AGRÍCOLA - TUBERÍAS Y ACCESORIOS CON UNIÓN ELASTOMÉRICA - ACCESORIOS PRESIÓN AGUA POTABLE - TUBO DUCTO CORRUGADO ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CPVC - ACCESORIOS PARA TUBERÍA SANITARIA Y VENTILACIÓN - TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO ACAMPANADA - ACCESORIOS PARA TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO - ACCESORIOS PARA TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO ACAMPANADA.

Fabricado por **PVC GERFOR S.A.**, en la **Autopista Medellín Kilómetro 2, 600 metros Vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia,** identificada con **número de NIT 860.502.509-1**

Manufactured by **PVC GERFOR S.A.**, in the **Autopista Medellín Kilómetro 2, 600 metros Vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia,** identified with **NIT number 860.502.509-1**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Reglamento técnico de tuberias y accesorios

Technical regulation about pipes and accessories

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSR -CER602683
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2018-04-13	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2023-03-31
Fecha de Renovación: Renewal Date:		**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2024-04-12

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB ACCREDITED
PRODUCT CERTIFICATION BODY
ID # 0677

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

ANEXO 6 TOPOGRAFIA CONTRATISTA

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO: 3099 - 2023 FECHA: 26 - Mayo - 2024

OBJETO: Verificación de equipos


CONTRATISTA: Consorcio Parques Bog INTERVENTORIA: Saliva

POR QUÉ: Nuevos

NIVEL AUTOMATICO

EQUIPO Nivel Topcon AT-B4A CODIGO WP087044

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de verificación? SI ☑ NO ☐

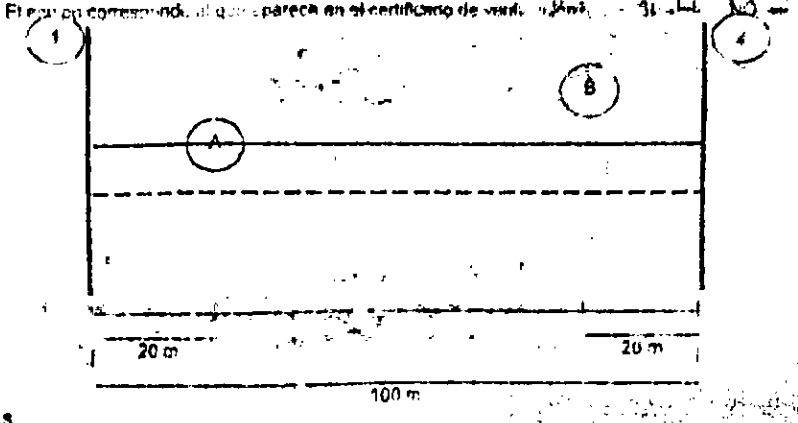

LECTURAS

A1: 2,33 mm	B1: 2,45 mm
A2: 2,131 mm	B2: 2,252 mm
A1 - A2: 0,199 mm	B1 - B2: 0,198 mm

DIFERENCIA PERMITIDA: 0,001 mm

APTO PARA TRABAJAR: SI ☑ NO ☐

COMPROBACION DE MIRAS

EQUIPO: Mira

PRECISIÓN: Milimetro

CÓDIGO:

MIRA	EQUIPO PATRONADO	DIFERENCIA
3,50	3,50	0

ESTADO ACTUAL

TIENE TODOS LOS CUERPOS	SI ☑	NO ☐
DOBLADA	SI ☐	NO ☑
LEGIBLE	SI ☑	NO ☐

APTO PARA TRABAJAR SI ☑ NO ☐

Giovanny Ortega
Topografo

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS S.A.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO N: 3099 - 2023 FECHA: 26 - Mayo - 2024

ESTACION TOPOGRAFICA


EQUIPO: Estacion Topcon GPT 3105N

PRECISIÓN: 5"

CÓDIGO: 330210

El equipo corresponde al que aparece en el citado acto de verificación? SI ☑ NO ☐

EN	HACIA	O OBSERVADO
1		
	3	00°00'00"
	2	105°24'31"
2		
	1	00°00'00"
	3	10°14'06"
3		
	2	00°00'00"
	1	54°21'22"
	S O DERECHO	

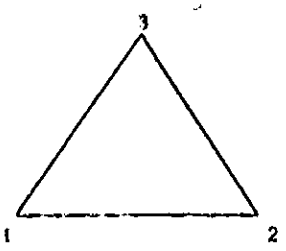

Sumatoria Observado		179°00'00"
n - 2	*	180° 00' 00"
Diferencia	=	00° 00' 01"
a ± a'r	=	00° 00'06"

a: Error angular posible
Precisión del equipo
Número de vértices
Distancia máxima 50 ml

APTO PARA TRABAJAR SI ☑ NO ☐

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

ELABORO
Firma
(Nombre) Giovanny Ospina
(Cargo) Topografo

Nota: Estos chequeos deben realizarse máximo cada 15 días, si el equipo no se considera apto para trabajar, no puede ser usado en obra.

Powered by CamScanner

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO No: 3099 - 2023 FECHA 15 - Mayo - 2024

OBJETO Verificación de equipos.


CONTRATISTA Consorcio Parques 806 INTERVENTORIA: Solun

PARQUE: Varios.

NIVEL AUTOMATICO

EQUIPO Nivel Topcon AT-B4A CODIGO WP087044

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de verificación? SI ☑ NO ☐

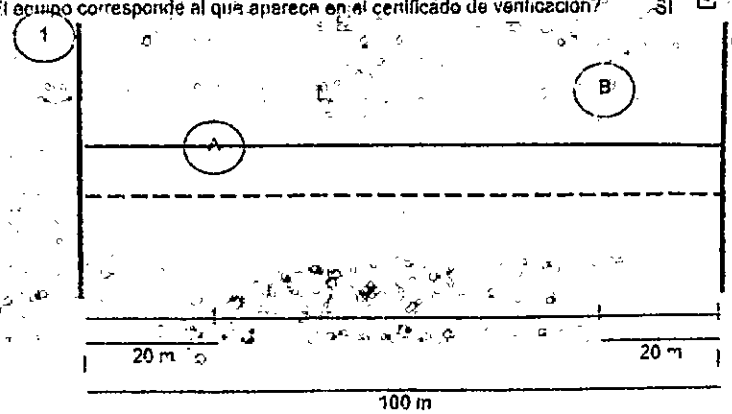

LECTURAS

A1= 1,50	mm	B1= 1,85	mm
A2= 1,30	mm	B2= 1,65	mm
A1 - A2= 0,20	mm	B1 - B2= 0,20	mm

DIFERENCIA DETECTADA 0.000. mm

APTO PARA TRABAJAR SI ☑ NO ☐

COMPROBACION DE MIRAS

EQUIPO Mira

PRECISIÓN Milimetro

CÓDIGO

MIRA	EQUIPO PATRONADO	DIFERENCIA
2,15	2,15	0.

ESTADO ACTUAL

TIENE TODOS LOS CUERPOS SI ☑ NO ☐

DOBLADA SI ☐ NO ☑

ILEGIBLE SI ☑ NO ☐

APTO PARA TRABAJAR SI ☑ NO ☐

Giovanny Ospina
Topografo.

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS V.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO N°: 3099- 2023 FECHA: 15 - Mayo - 2024

ESTACION TOPOGRAFICA


EQUIPO: Estación Topcon GPT3105w

PRECISION: 5"

CODIGO: SB0210

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de verificacion? SI ☑ NO ☑

EN	HACIA	D OBSERVADO
1		
	3	00°00'00"
	2	60° 19' 15"
2		
	1	00°00'00"
	3	36°08'35"
3		
	2	00°00'00
	1	83°37'09"
	S D DERECHO	



Suma de ángulos medidos	179°59'54"
n-2	180° 00' 00"
Diferencia	00° 00' 01"
e = ±n√i	00' 00' 06"

e: Error máximo permisible
n: número de vértices
i: precisión mínima 5d ml

APTO PARA TRABAJAR SI ☑ NO ☐

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

ELABORO: Firma

(Nombre) GIOVANNY OSPINA

(Cargo) Topografo

Nota: Estos chequeos deben realizarse máximo cada 15 días, si el equipo no se considera apto para trabajar, no pueda ser usado en obra.

Powered by CamScanner

CERTIFICADO
DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN

NIT.900.407.723-1

No. 2023-3358

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: DEVIGMAQ S.A.S
TELEFONO: 3144436273
CIUDAD: BOGOTA

INFOMACIÓN DEL INSTRUMENTO

MARCA: TOPCON
MODELO: GPT-3105W
No. SERIAL: 8R0210
PRECISIÓN : 5" Seg.

¿NUEVO? NO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 de noviembre de 2023
RECOMENDAMOS AJUSTAR: 29 de mayo de 2024

AJUSTES REALIZADOS

CODIGOS	
CORRECTO	1
FALLA CORREGIDA	2
NO CORREGIDA	3
NO APLICA	4

2	LIMPIEZA EXTERIOR	2	AJUSTE DEL NIVEL CIRCULAR
1	MANTENIMIENTO INTERNO	1	AJUSTE DEL SISTEMA DE ENFOQUE
1	MANTENIMIENTO DE BASE NIVELANTE	2	AJUSTE DEL RÉTICULO
1	PRENSA HORIZONTAL Y VERTICAL	1	AJUSTE DE VERTICALIDAD
1	TORNILLO DE MOVIMIENTO FINO V Y/O V	2	AJUSTE DE COLIMACIÓN
1	CHEQUEO DE TECLADO	2	AJUSTE DE PLOMADA ÓPTICA O LASER
1	AJUSTE DEL COMPENSADOR	2	AJUSTE DE MIRILLAS DE PUNTERÍA
2	AJUSTE DEL NIVEL TUBULAR	1	AJUSTE DE DISTANCIÓMETRO

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

PRESICIÓN ANGULAR	(DIN 18723) 5"
PRESICIÓN EN DISTANCIA	± (2mm+2ppmXD)
AUMENTO DEL TELESCOPIO	30X

ALCANCE CON DIANAS REFLECTIVAS	500m
ALCANCE CON PRISMA	3000m
ALCANCE SIN REFLECTOR	350m

Confirma la autenticidad del certificado ingresando a nuestra pagina web www.tecnirac.com o comunicandote con nosotros a los siguientes números: 3125152722-3002673158
E-mail: arodriguez.tecnirac@gmail.com Direccion: Cra. 38 No. 10-60 Ofc. 716 Bogotá D.C

CERTIFICADO
DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN

NIT.900.407.723-1

No. 2023-3358

DATOS OBTENIDOS DE LA INSPECCIÓN PRELIMINAR DE LECTURAS REALES

PTO.No.1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
V	90°	270°	10°	0.0001'	360°	0.01'39"
HZ	0°	180°	10°	0.0001'	180°	0.00'55"

DATOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LOS AJUSTES REALIZADOS

PTO.No.1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
V	90°	270°	0°	.+/-0.001"	360°	0.00000
HZ	0°	180°	0°	.+/-0.001"	180°	0.00000

TECNIRAC S.A.S ESTABLECE:

1. TECNIRAS S.A.S NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PREJUICIOS QUE PUEDE OCACIONAR EL USO INADECUADO DEL INSTRUMENTO VERIFICADO.
2. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DEL INSTRUMENTO Y USO DE ESTE CERTIFICADO.
3. LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARON LAS MEDICIONES.
4. LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TECNIRAC CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD, DE MODO QUE, TECNIRAC CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SE RECOMINEDA QUE EL OPERADOR REALICE LOS CHEQUEOS DE CAMPO RUTINARIOS.

REALIZADO POR
FABIÁN CARRILLO

TECNIRAC NIT:900407723-1

REVISADO POR
ANGEL RODRÍGUEZ

Confirma la autenticidad del certificado ingresando a nuestra pagina web www.tecnirac.com o comunicandote con nosotros a los siguientes números: 3125152722-3002673158

E-mail: arodriguez.tecnirac@gmail.com Direccion: Cra. 38 No. 10-60 Ofc. 716 Bogotá D.C

CERTIFICADO
DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN

NIT.900.407.723-1

No. 2023-3359

INFORMACIÓN DE CLIENTE

NOMBRE: DEVIGMAQ S.A.S
TELEFONO: 3144436273
CIUDAD: BOGOTA

INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO

EQUIPO: NIVEL AUTOMATICO TOPCON ¿NUEVO? No
MODELO: AT-B4A
No. SERIAL: WP087044 FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 de noviembre de 2023
PRECISIÓN: 2mm x Km doble de Nivelacion RECOMENDADOS AJUSTAR: 29 de mayo de 2024

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

DESVIACION ESTÁNDAR	0.2 MM	MINIMA DISTANCIA FOCAL	0.8M
TIPO DE IMAGEN	DIRECTA	RELACIÓN ESTANDAR	100
MAGNIFICACION	24X	RANGO DE COMPENSADOR	± 15'
APERTURA DEL OBJETIVO	32MM	EXACTITUD DEL COMPENSADOR	0.5"

CODIGOS	
CORRECTO	1
FALLA CORREGIDA	2
NO CORREGIDA	3
NO APLICA	4

2	LIMPIEZA GENERAL	2	AJUSTE DEL NIVEL CIRCULAR
1	ERROR DETECTADO	2	AJUSTE DEL SISTEMA DE ENFOQUE
1	MANTENIMIENTO INTERNO	2	AJUSTE DEL RÉTICULO
1	MANTENIMIENTO DE BASE NIVELANTE	2	AJUSTE DE COLIMACIÓN
1	TORNILLO DE MOVIMIENTO FINO V Y/O V	1	OPTICA GENERAL (LENTES Y OCULARES)
2	AJUSTE DEL COMPENSADOR	1	PERILLA DE ENFOQUE

TECNIRAC S.A.S ESTABLECE:

1. TECNIRAS S.A.S NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PREJUICIOS QUE PUEDE OCACIONAR EL USO INADECUADO DEL INSTRUMENTO VERIFICADO.
2. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DEL INSTRUMENTO Y USO DE ESTE CERTIFICADO.
3. LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARON LAS MEDICIONES.
4. LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TECNIRAC CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD, DE MODO QUE, TECNIRAC CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SE RECOMIENDA QUE EL OPERADOR REALICE LOS CHEQUEOS DE CAMPO RUTINARIOS.

REALIZADO POR
FABIÁN CARRILLO

REVISADO POR
ANGEL RODRÍGUEZ

Confirma la autenticidad del certificado ingresando a nuestra pagina web www.tecnirac.com o comunicandote con nosotros a los siguientes números: 3125152722-3002673158
E-mail: arodriguez.tecnirac@gmail.com Direccion: Cra. 38 # 10-60 Ofc. 716 Centro comercial Manhatan Bogotá D.C

ANEXO 7. CONTROL DE MATERIALES

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO: 3099 - 2023 FECHA: 26- Mayo - 2024

OBJETO: Verificación de equipos


CONTRATISTA: Consorcio Parques Bog INTERVENTOR: Soluv

PARQUE: Nariños

NIVEL AUTOMATICO

EQUIPO: Nivel Topcon AT-B4A CODIGO: WP087044

El equipo se encuentra dentro de la tolerancia en el comparador de dos miras? SI ☑ NO ☐

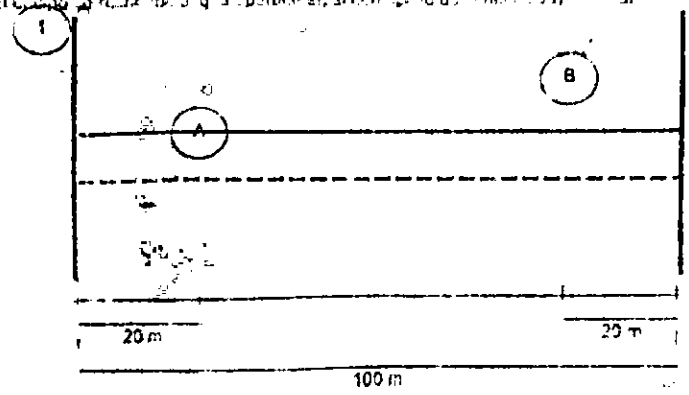

LECTURAS

A1= 2,133	mm	B1= 2,45	mm
A2= 2,131	mm	B2= 2,252	mm
A1 - A2= 0,199	mm	B1 - B2= 0,198	mm

DIFERENCIA DETECTADA: 0,001 mm

APTO PARA TRABAJAR SI ☑ NO ☐

COMPROBACION DE MIRAS

EQUIPO: M.R.A.

PRECISIÓN: Milimetro

CÓDIGO:

MIRA	EQUIPO PATRONADO	DIFERENCIA
3,50	3,50	0.

ESTADO ACTUAL

TIENE TODOS LOS CUERPOS	SI ☑	NO ☐
DOBLADA	SI ☐	NO ☑
LEGIBLE	SI ☑	NO ☐
APTO PARA TRABAJAR	SI ☑	NO ☐

Giovanny Ortiz
Topografo

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS V.

Powered by CamScanner

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

30-99 - 2023 26-Mayo-2024

ESTACION TOPOGRAFICA


EQUIPO Estacion Topcon GPT 3105W

PRECISION 5"

CODIGO 820210

El equipo cuenta con certificado para trabajos en obra? SI ☑ NO ☐

EN	HACIA	D OBSERVADO
1	3	00 00 00
	2	105° 24' 31"
1	2	00 00 00
	3	10° 14' 06"
2	1	00 00 00
	S D DERECHO	54° 21' 22"



	179° 00' 00"
	180° 00' 00"
	00° 00' 01"
	00° 00' 06"

APTO PARA TRABAJAR SI ☑ NO ☐

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

RESPONSABLE Firma

(Nombre) Giovanny OSPINA

(Cargo) Topografo

Nota: Estos chequeos deben realizarse máximo cada 15 días, si el equipo no se considera apto para trabajar, no puede ser usado en obra.

Powered by CamScanner

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO N° 3099 - 2023 FECHA 15 - Mayo - 2024

OBJETO Verificación de equipos


CONTRATISTA Consorcio Parques 806 INTERVENTORIA Solium

PARQUE Varios

NIVEL AUTOMATICO

EQUIPO Nivel Topcon AT-B4A CODIGO WP087044

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de calibración? SI ☑ NO ☐

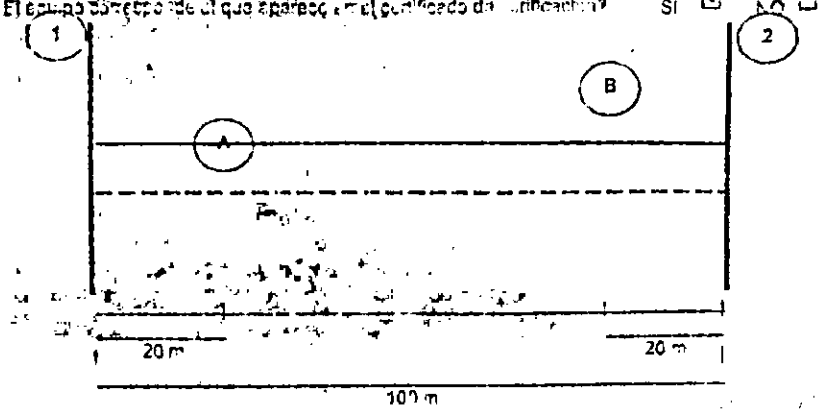

LECTURAS

A1= 1,50	mm	B1= 1,85	mm
A2= 1,30	mm	B2= 1,65	mm
A1 - A2= 0,20	mm	B1 - B2= 0,20	mm

DIFERENCIA DETECTADA 0.000 mm

APTO PARA TRABAJAR SI ☑ NO ☐

COMPROBACION DE MIRAS

EQUIPO Mira

PRECISIÓN Milimetro

CÓDIGO

MIRA	EQUIPO PATRONADO	DIFERENCIA
2,15	2,15	0.

ESTADO ACTUAL

TIENE TODOS LOS CUERPOS	SI ☑	NO ☐
DOBLADA	SI ☐	NO ☑
LEGIBLE	SI ☑	NO ☐
APTO PARA TRABAJAR	SI ☑	NO ☐

Giovanny Ospina
Topografo

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS V.I

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO No. 3099- 2023 FECHA 15-Mayo-2024

ESTACION TOPOGRAFICA


EQUIPO Estación TOPCON GPT3105w

PRECISIÓN 5"

CODIGO 800210

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de verificacion? SI ☑ NO ☑

EN	HACIA	Ø OBSERVADO
1		
	3	00°00'00"
	2	60° 19' 15"
2		
	1	00°00'00"
	3	36° 08' 35"
3		
	2	00°00'00"
	1	83° 31' 01"
	S Ø DERECHO	



Sumatoria Ø observadas	= 179° 59' 59"
α 2	= 180° 00' 00"
Diferencia	= 00° 00' 01"
e = a*n	= 00' 00' 06"

a: Error maximo permisible
n = Precisión del equipo
(# vertices)
(Distancia en mayor 60 mt)

APTO PARA TRABAJAR SI ☑ NO ☐

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

ELABORO: Firma _____

(Nombre) GIOVANNY OSPINA

(Cargo) Topografo

Nota: Estos chequeos deben realizarse máximo cada 15 dias, si el equipo no se considera apto para trabajar, no puede ser usado en obra.

Powered by CamScanner

CERTIFICADO
DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN

NIT.900.407.723-1

No. 2023-3358

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: DEVIGMAQ S.A.S
TELEFONO: 3144436273
CIUDAD: BOGOTA

INFOMACIÓN DEL INSTRUMENTO

MARCA: TOPCON ¿NUEVO? NO
MODELO: GPT-3105W
No. SERIAL: 8R0210 FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 de noviembre de 2023
PRECISIÓN : 5" Seg. RECOMENDAMOS AJUSTAR: 29 de mayo de 2024

AJUSTES REALIZADOS

CODIGOS	
CORRECTO	1
FALLA CORREGIDA	2
NO CORREGIDA	3
NO APLICA	4

2	LIMPIEZA EXTERIOR	2	AJUSTE DEL NIVEL CIRCULAR
1	MANTENIMIENTO INTERNO	1	AJUSTE DEL SISTEMA DE ENFOQUE
1	MANTENIMIENTO DE BASE NIVELANTE	2	AJUSTE DEL RÉTICULO
1	PRENSA HORIZONTAL Y VERTICAL	1	AJUSTE DE VERTICALIDAD
1	TORNILLO DE MOVIMIENTO FINO V Y/O V	2	AJUSTE DE COLIMACIÓN
1	CHEQUEO DE TECLADO	2	AJUSTE DE PLOMADA ÓPTICA O LASER
1	AJUSTE DEL COMPENSADOR	2	AJUSTE DE MIRILLAS DE PUNTERÍA
2	AJUSTE DEL NIVEL TUBULAR	1	AJUSTE DE DISTANCIÓMETRO

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

PRESICIÓN ANGULAR	(DIN 18723) 5"
PRESICIÓN EN DISTANCIA	± (2mm+2ppmXD)
AUMENTO DEL TELESCOPIO	30X

ALCANCE CON DIANAS REFLECTIVAS	500m
ALCANCE CON PRISMA	3000m
ALCANCE SIN REFLECTOR	350m

Confirma la autenticidad del certificado ingresando a nuestra pagina web www.tecnirac.com o comunicandote con nosotros a los siguientes números: 3125152722-3002673158
E-mail: arodriguez.tecnirac@gmail.com Direccion: Cra. 38 No. 10-60 Ofc. 716 Bogotá D.C

CERTIFICADO
DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN

NIT.900.407.723-1

No. 2023-3358

DATOS OBTENIDOS DE LA INSPECCIÓN PRELIMINAR DE LECTURAS REALES

PTO.No.1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
V	90°	270°	10°	0.0001'	360°	0.01'39"
HZ	0°	180°	10°	0.0001'	180°	0.00'55"

DATOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LOS AJUSTES REALIZADOS

PTO.No.1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
V	90°	270°	0°	.+/-0.001"	360°	0.00000
HZ	0°	180°	0°	.+/-0.001"	180°	0.00000

TECNIRAC S.A.S ESTABLECE:

1. TECNIRAS S.A.S NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PREJUICIOS QUE PUEDE OCACIONAR EL USO INADECUADO DEL INSTRUMENTO VERIFICADO.
2. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DEL INSTRUMENTO Y USO DE ESTE CERTIFICADO.
3. LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARON LAS MEDICIONES.
4. LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TECNIRAC CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD, DE MODO QUE, TECNIRAC CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SE RECOMIENDA QUE EL OPERADOR REALICE LOS CHEQUEOS DE CAMPO RUTINARIOS.

REALIZADO POR
FABIÁN CARRILLO

TECNIRAC NIT:900407723-1
REVISADO POR
ANGEL RODRÍGUEZ

Confirma la autenticidad del certificado ingresando a nuestra pagina web www.tecnirac.com o comunicandote con nosotros a los siguientes números: 3125152722-3002673158

E-mail: arodriguez.tecnirac@gmail.com Direccion: Cra. 38 No. 10-60 Ofc. 716 Bogotá D.C

CERTIFICADO
DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN

NIT.900.407.723-1

No. 2023-3359

INFORMACIÓN DE CLIENTE

NOMBRE: DEVIGMAQ S.A.S
TELEFONO: 3144436273
CIUDAD: BOGOTA

INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO

EQUIPO: NIVEL AUTOMATICO TOPCON ¿NUEVO? No
MODELO: AT-B4A
No. SERIAL: WP087044 FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 de noviembre de 2023
PRECISIÓN: 2mm x Km doble de Nivelacion RECOMENDADOS AJUSTAR: 29 de mayo de 2024

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

DESVIACION ESTÁNDAR	0.2 MM	**MINIMA DISTANCIA FOCAL**	0.8M
TIPO DE IMAGEN	DIRECTA	**RELACIÓN ESTANDAR**	100
MAGNIFICACION	24X	**RANGO DE COMPENSADOR**	± 15"
APERTURA DEL OBJETIVO	32MM	**EXACTITUD DEL COMPENSADOR**	0.5"

CODIGOS	
CORRECTO	1
FALLA CORREGIDA	2
NO CORREGIDA	3
NO APLICA	4

2	LIMPIEZA GENERAL	2	AJUSTE DEL NIVEL CIRCULAR
1	ERROR DETECTADO	2	AJUSTE DEL SISTEMA DE ENFOQUE
1	MANTENIMIENTO INTERNO	2	AJUSTE DEL RÉTICULO
1	MANTENIMIENTO DE BASE NIVELANTE	2	AJUSTE DE COLIMACIÓN
1	TORNILLO DE MOVIMIENTO FINO V Y/O V	1	OPTICA GENERAL (LENTES Y OCULARES)
2	AJUSTE DEL COMPENSADOR	1	PERILLA DE ENFOQUE

TECNIRAC S.A.S ESTABLECE:

1. TECNIRAS S.A.S NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PREJUICIOS QUE PUEDE OCACIONAR EL USO INADECUADO DEL INSTRUMENTO VERIFICADO.
2. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DEL INSTRUMENTO Y USO DE ESTE CERTIFICADO.
3. LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARON LAS MEDICIONES.
4. LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TECNIRAC CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD, DE MODO QUE, TECNIRAC CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SE RECOMIENDA QUE EL OPERADOR REALICE LOS CHEQUEOS DE CAMPO RUTINARIOS.

REALIZADO POR
FABIÁN CARRILLO

REVISADO POR
ANGEL RODRÍGUEZ

Confirma la autenticidad del certificado ingresando a nuestra pagina web www.tecnirac.com o comunicandote con nosotros a los siguientes números: 3125152722-3002673158
E-mail: arodriguez.tecnirac@gmail.com Direccion: Cra. 38 # 10-60 Ofc. 716 Centro comercial Manhatan Bogotá D.C

ANEXO 8. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

CONTROL DE CAMBIOS AL PROYECTO

DATOS GENERALES

PARQUE: Varios | FECHA: 12/04/2024 | CONSECUTIVO: 2

CODIGO (SI aplica): Varios | LOCALIDAD: Varios

DIRECCION: Varios

CONTRATO DE OBRA

N° DE CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL
CO- IDRD 3099-2023	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

SOLICITUD DEL CAMBIO

TIPO DE CAMBIO SOLICITADO

DISEÑO DEL PROYECTO (ALCANCE): | PROGRAMACION (PLAZO): X | PRESUPUESTO (COSTO):

MOTIVO DEL CAMBIO

SOLICITUD DEL CLIENTE: X | TECNICOS O DE GESTION: | NO PREVISTOS: | EN NORMATIVA / LEG.:

JUSTIFICACION DEL CAMBIO

Teniendo en cuenta la adicion y prorroga al contrato, se solitica modificar la programacion de obra de acuerdo con los nuevos parques incluidos en el alcance del contrato y nueva fecha de finalizacion.

PLANOS AFECTADOS: *No aplica*

ANEXOS: *No aplica*

"En caso de requerir un apoyo grafico, incluir la plantilla "Analisis grafico"

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE CAMBIO

Con carta del 7 de mayo de 2024, CTO-IDRD-3099-2023-357, el CONSORCIO PARQUES BOG presenta presupuesto y programa de obra para planear la adicion y prorrogra por parque y atencion de emergencias del sistema general de parques

PLANOS AFECTADOS: *No aplica*

ANEXOS: *Comunicado: CTO-IDRD-3099-2023-390, CTO-IDRD-3099-2023-357 y Cronograma de adicion del 20/05/24*

"En caso de requerir un apoyo grafico, incluir la plantilla "Analisis grafico"

IMPACTO DEL CAMBIO (COSTO, PLAZO, ALCANCE)

ALCANCE:

No aplica

PLAZO:

Cuatro (4) meses adiconales para un plazo total de once (11) meses y fecha de finalizacion 11 de agosto de 2024

COSTO:

Una adicion de ($6.866.576.500) para un presupuesto final de ($20.599.729.500)

UNA VEZ REVISADO Y VERIFICADO, INTERVENTORIA APRUEBA LA PROPUESTA ?: SI: | NO:

SOLICITA:

FECHA:

FIRMA: Luis Alfredo Granados

NOMBRE: LUIS ALFREDO GRANADOS

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

N°CONTRATO: CO- IDRD 3099-2023

CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: EDNA CONSTANZA CEPEDA

CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

N°CONTRATO: CO-IDRD-3131-2023

INTERVENTORIA

N° ANEXOS INCLUIDOS (Folios): *23*

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 23 de mayo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-390

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta comunicado IDRD-3131-2024-377-Ajustes solicitados.

Cordial Saludo

Atendiendo las observaciones réalizadas, queremos informarles que se realizaron los ajustes requeridos en el presupuesto, cronograma de obra y plan de adquisiciones. Estos documentos fueron remitidos por medio de correo electrónico hacia ustedes el día 22 de marzo del presente año. Quedamos atentos a su revisión.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72" No.11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal
Anexo: Cero (0) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 7 de mayo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-357

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta al Oficio **IDRD-3131-2024-380**-Cronograma adición.

Cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos dar respuesta al oficio del Asunto de fecha abril 30 de la siguiente forma:

1. Se hace envió del cronograma de obra para la etapa de la adición donde se presentan ajustes y fechas propuestas de arranque de obras en los diferentes frentes de obra.

2. Se presentará un cronograma adicional para dar claridad de las cuadrillas que atacaran los diferentes frentes en las diferentes etapas de las obras (obra civil, instalación de juegos, instalación de piso caucho, actividades de metalmecánica), para este se hará la entrega el dia 13 de mayo del 2024, ya que se requiere evaluar la organización y disposición del recurso humano del contratista.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No.11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com


CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal
Anexo: Trece (13) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 - Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

396.

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

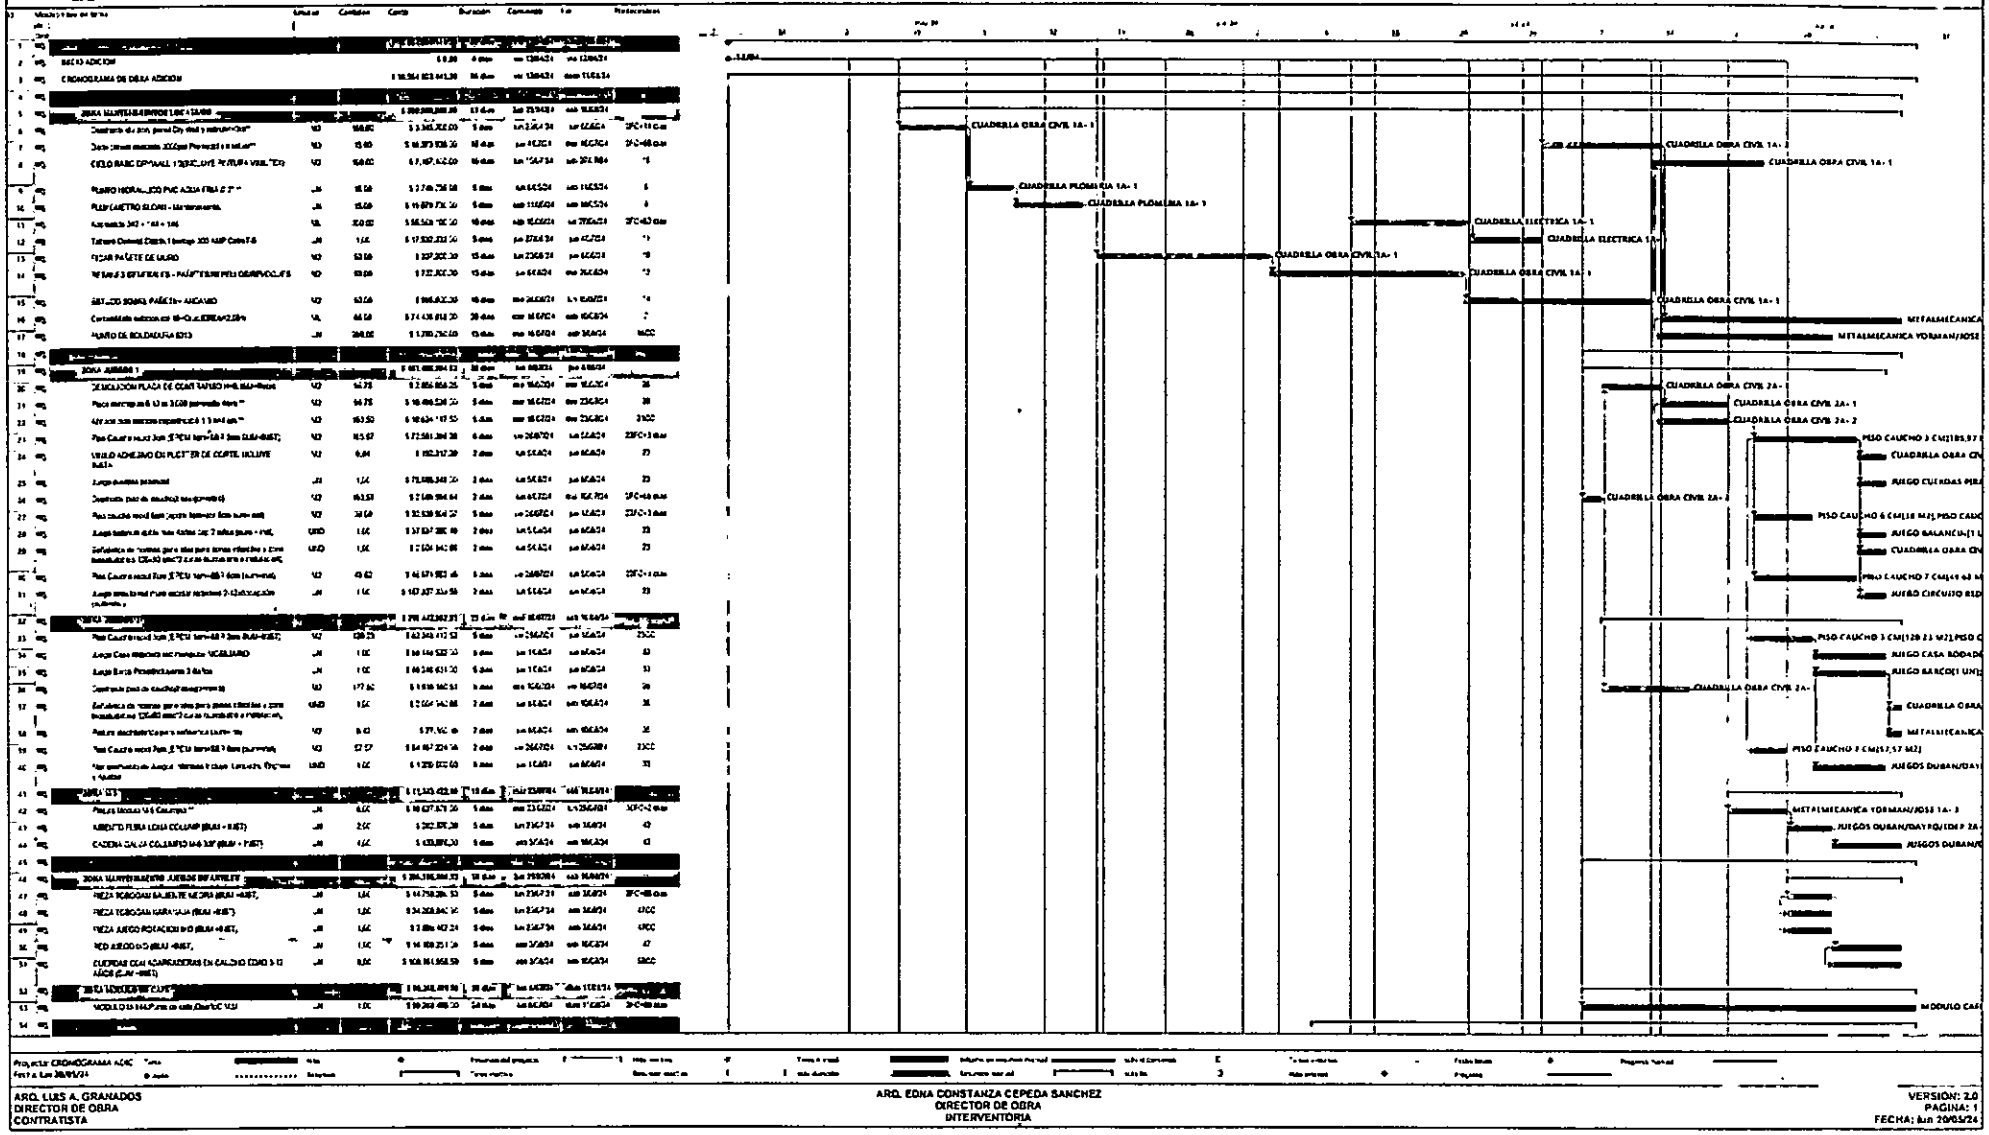


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 1
FECHA: lun 20/05/24

CONSORCIO PARQUES BOG

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

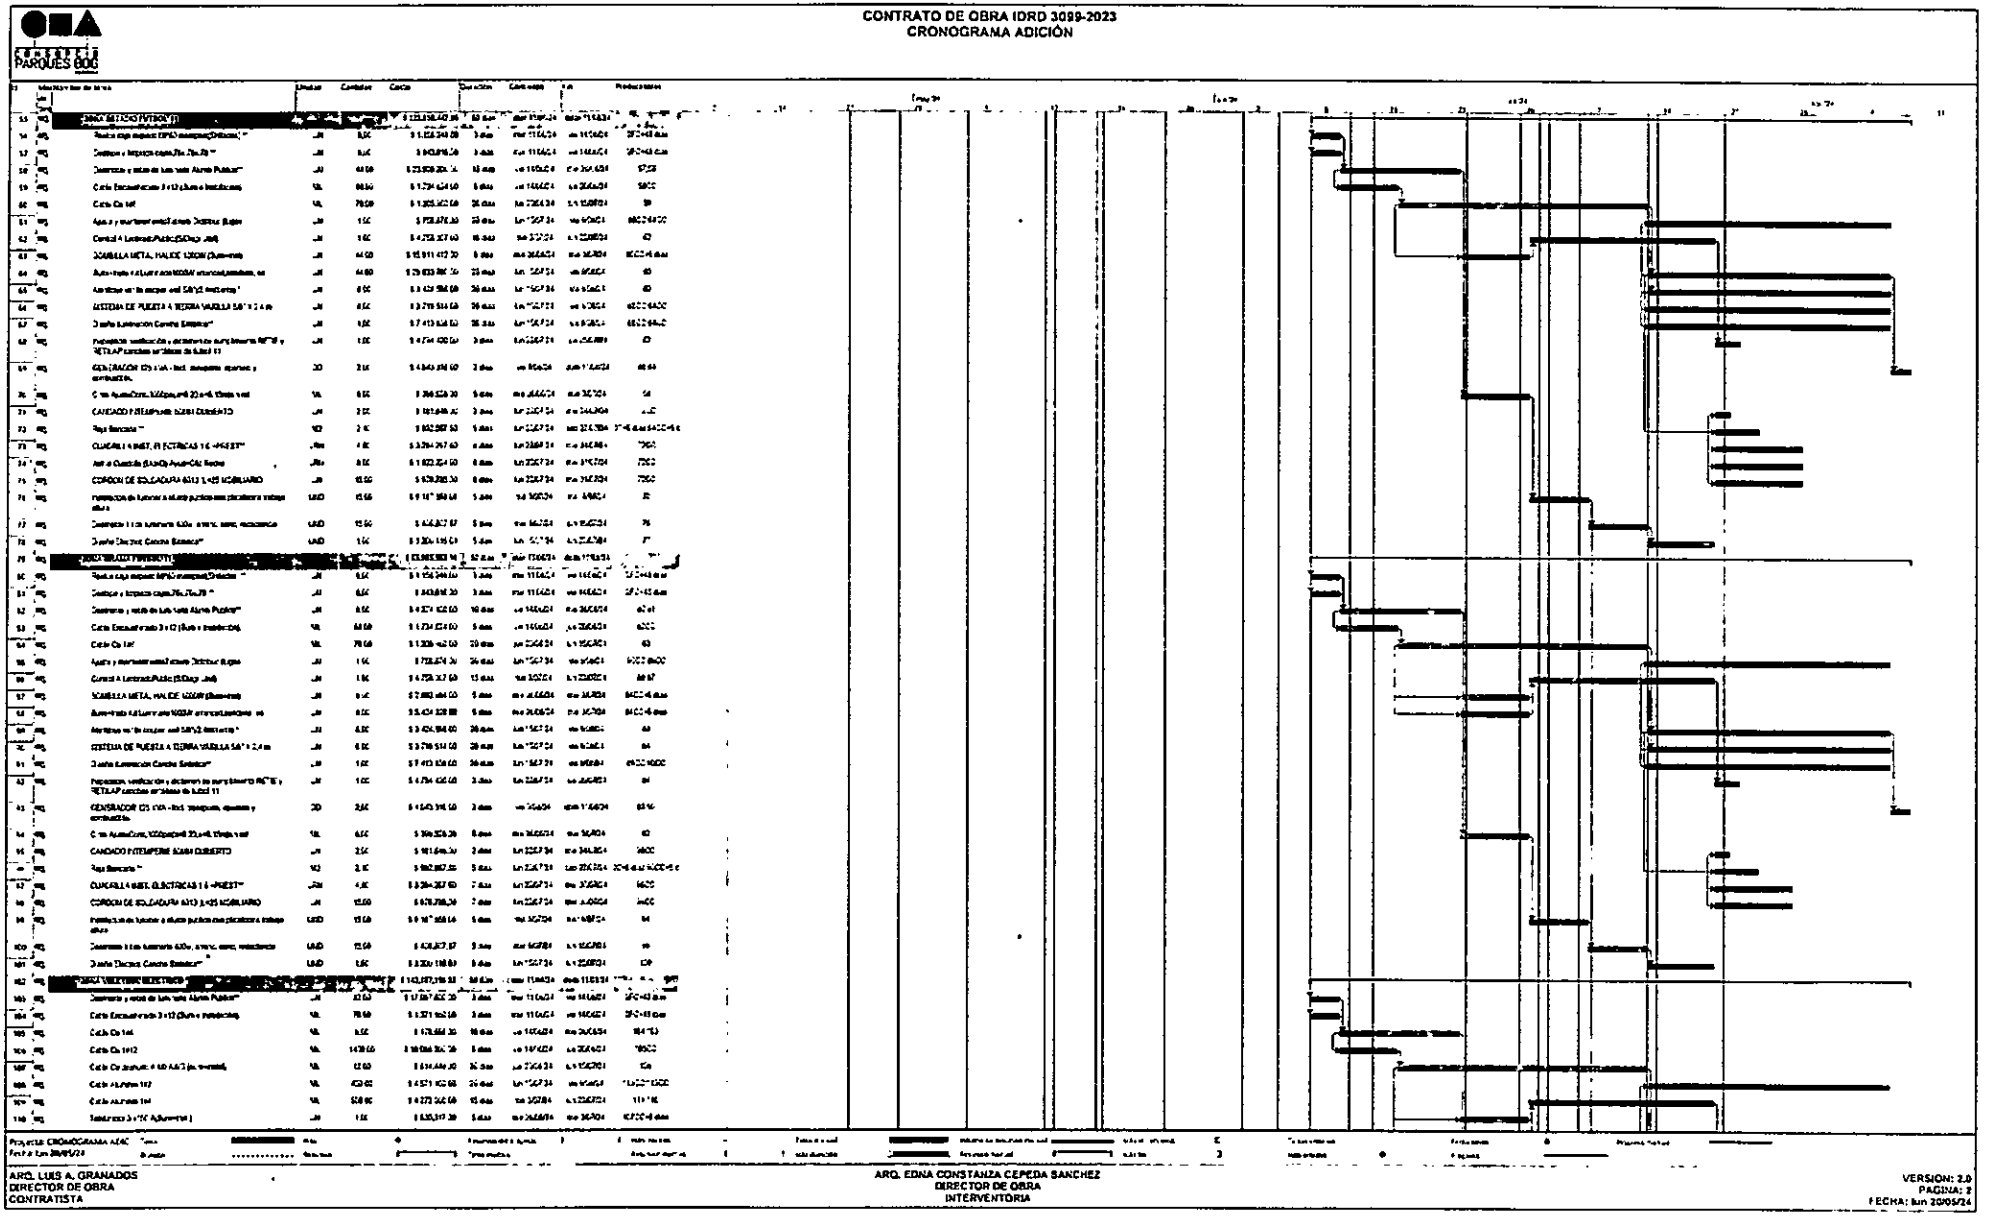


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 2
FECHA: lun 20/05/24

CONTRATO DE OBRA IDRD 3089-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

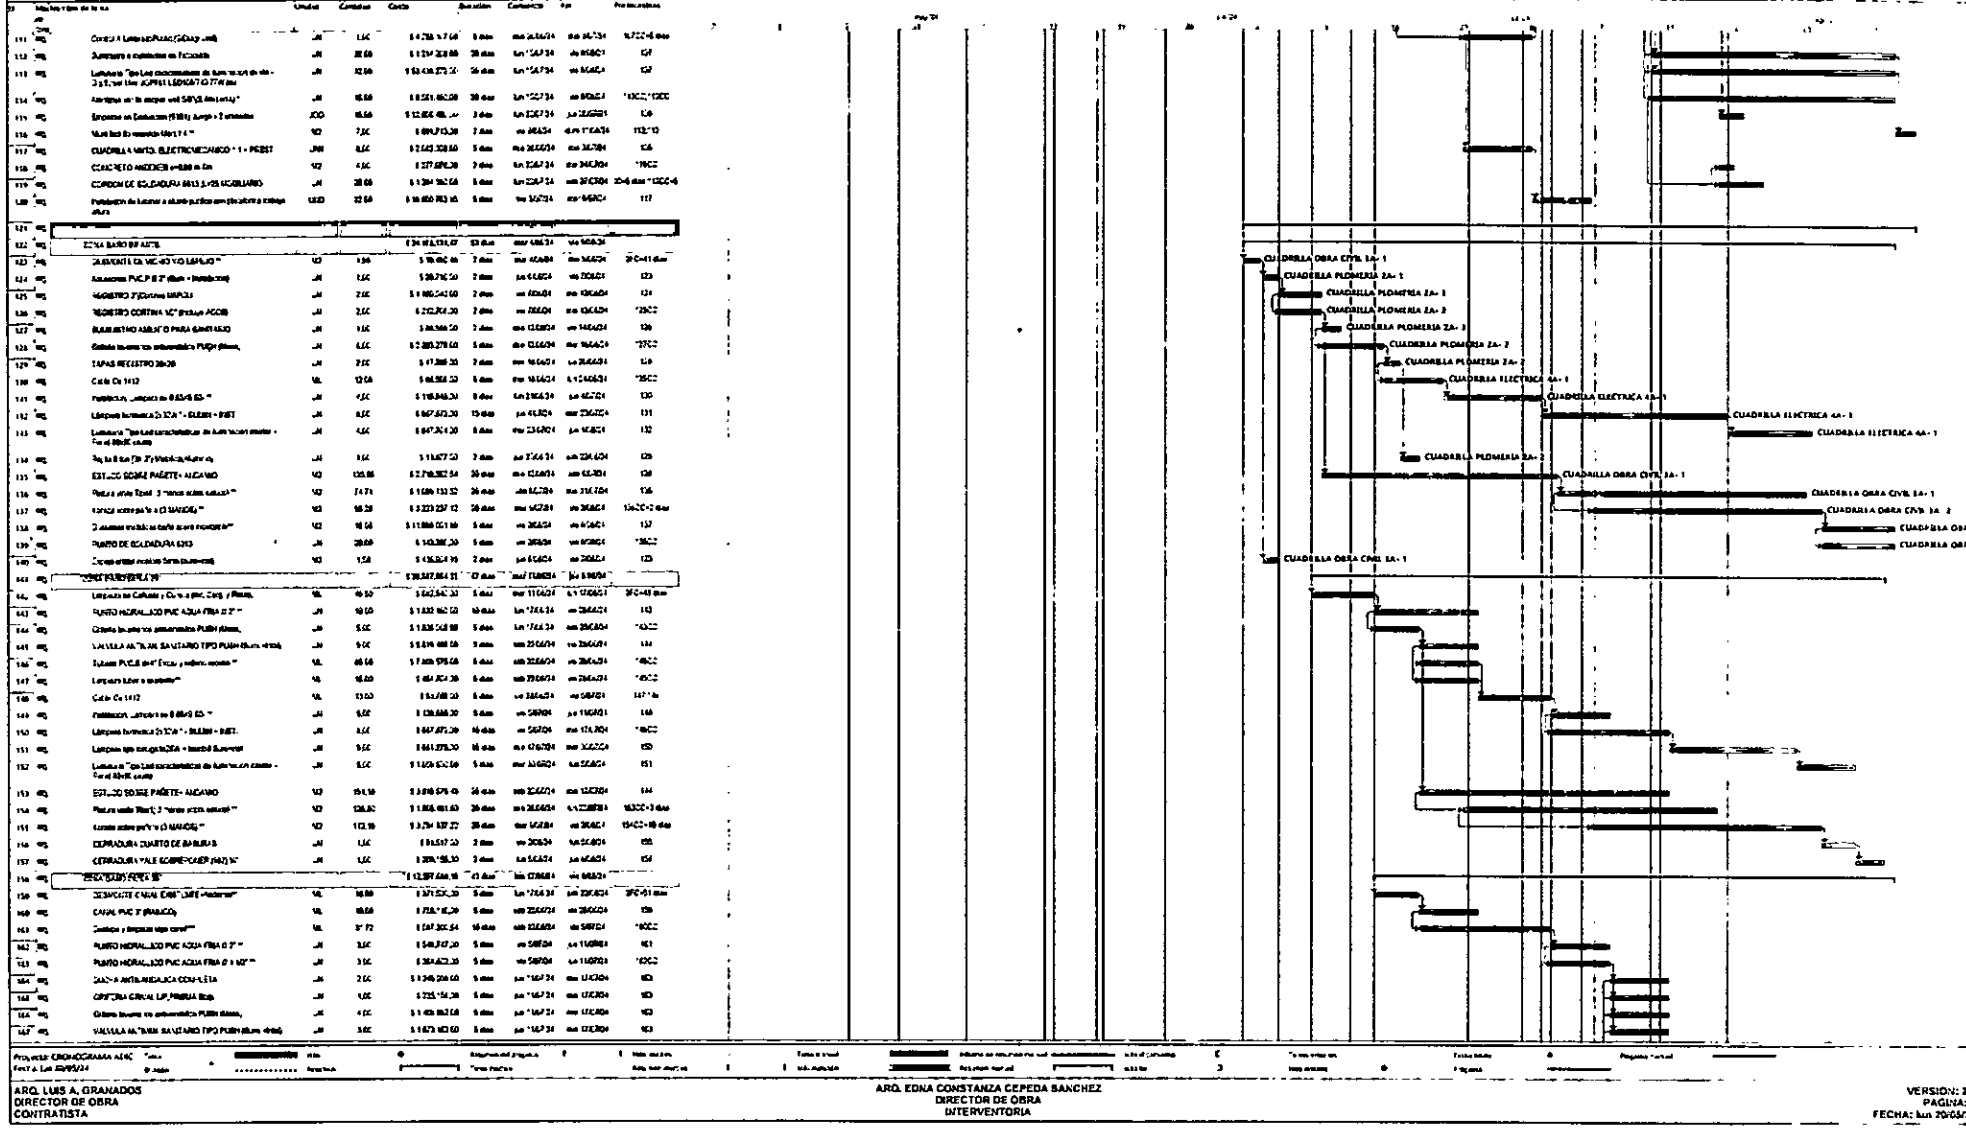


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 3
FECHA: lun 20/05/24

CONSORCIO PARQUES BOG

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

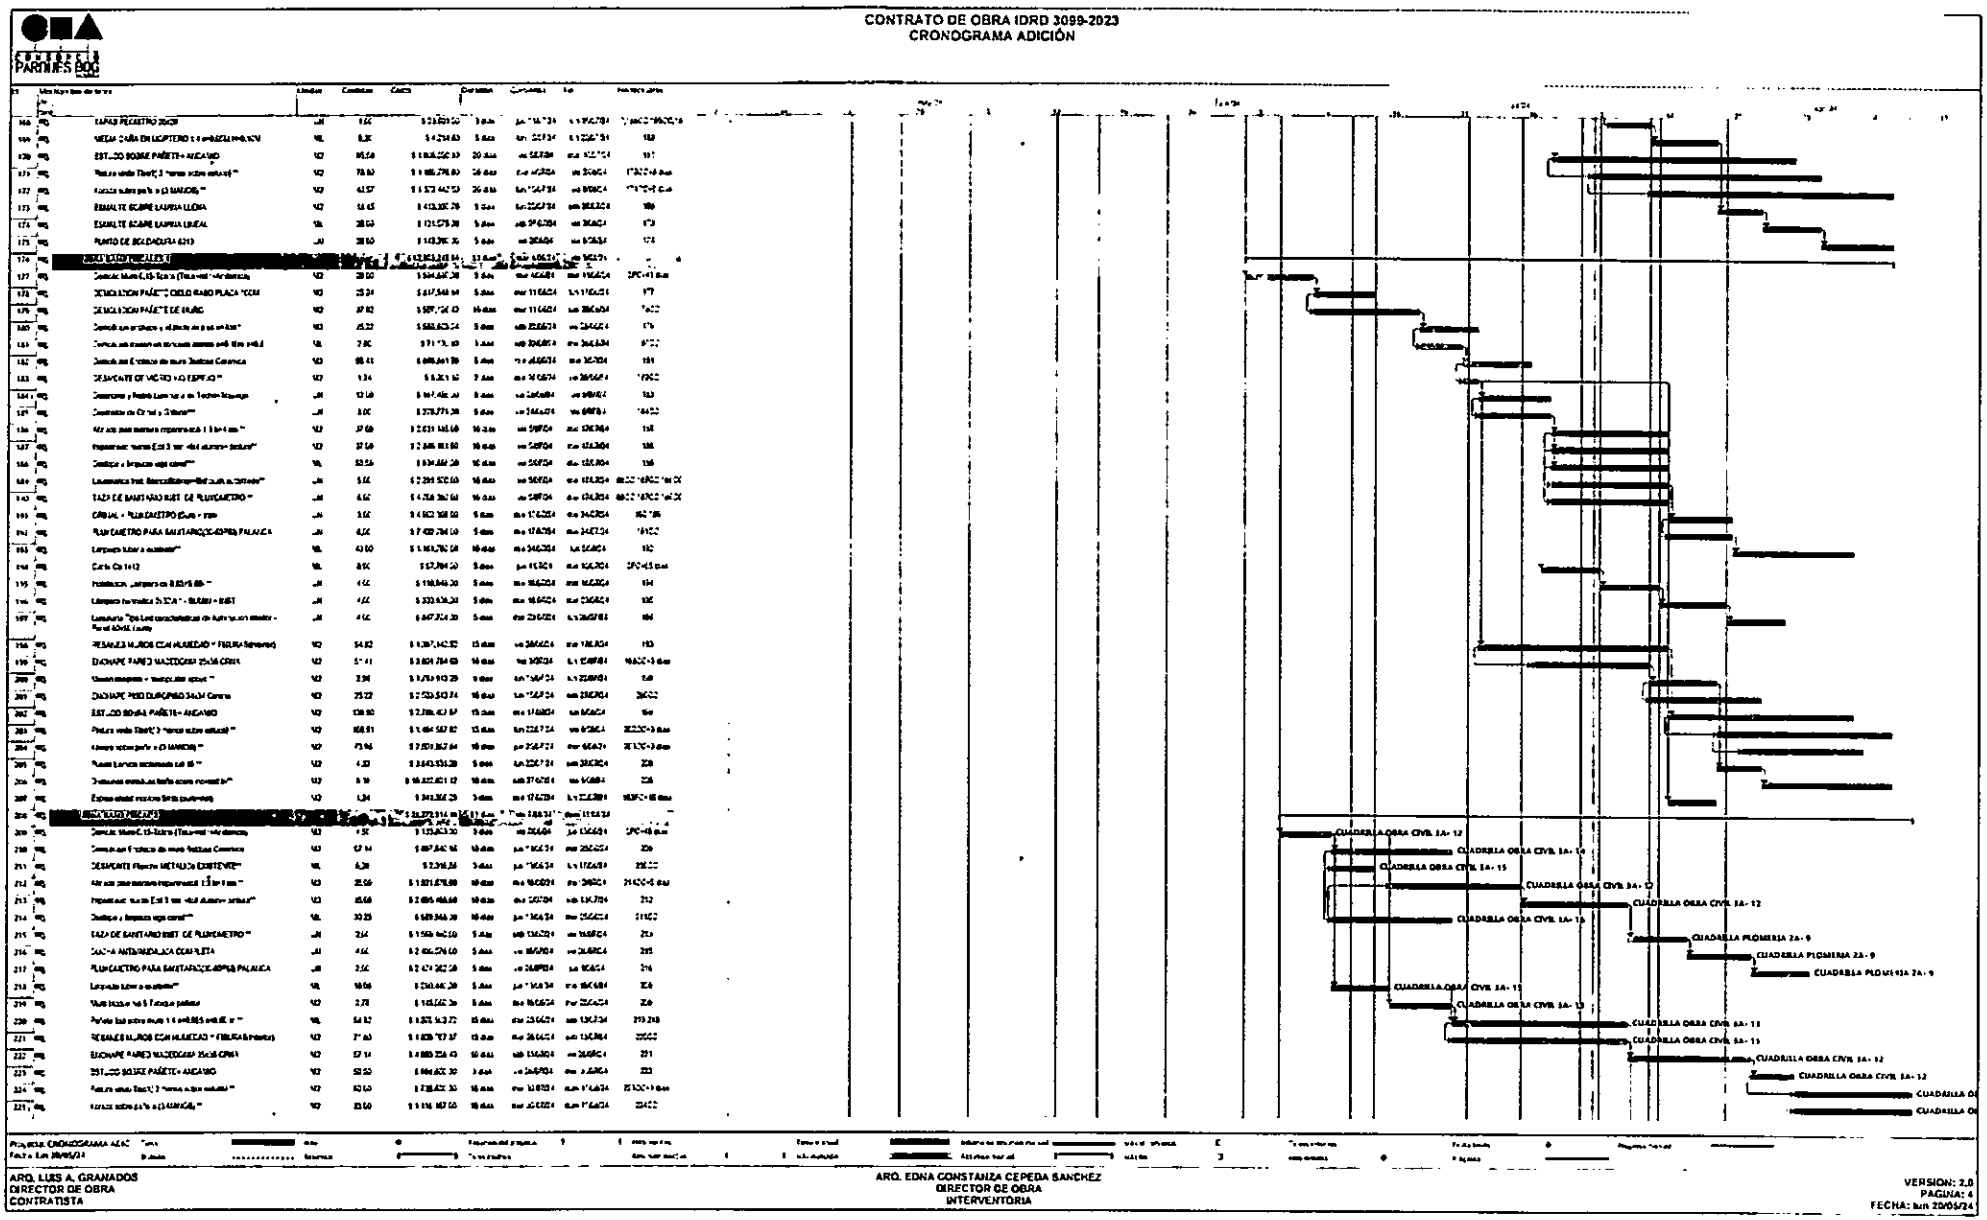


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 4
FECHA: lun 20/05/24

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

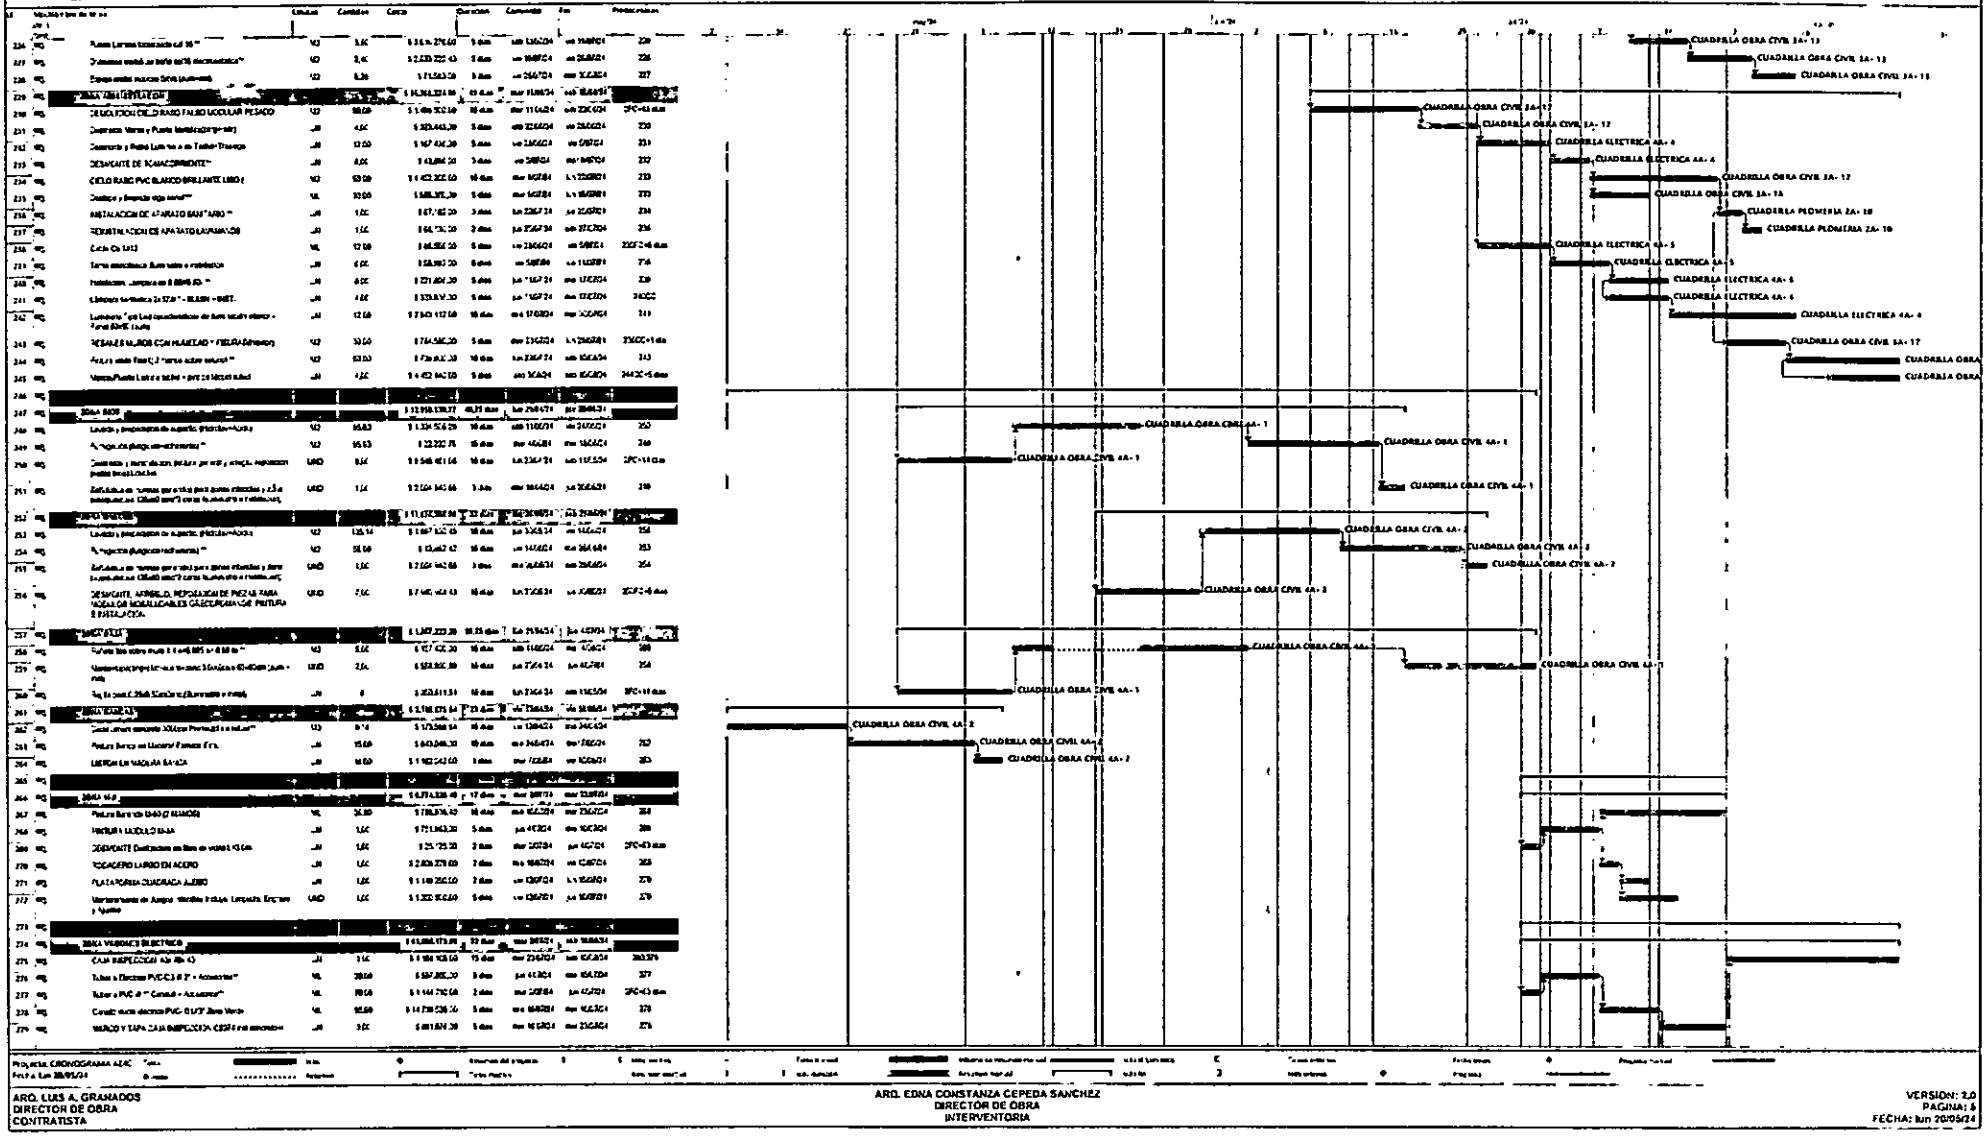


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 6
FECHA: lun 20/05/24

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

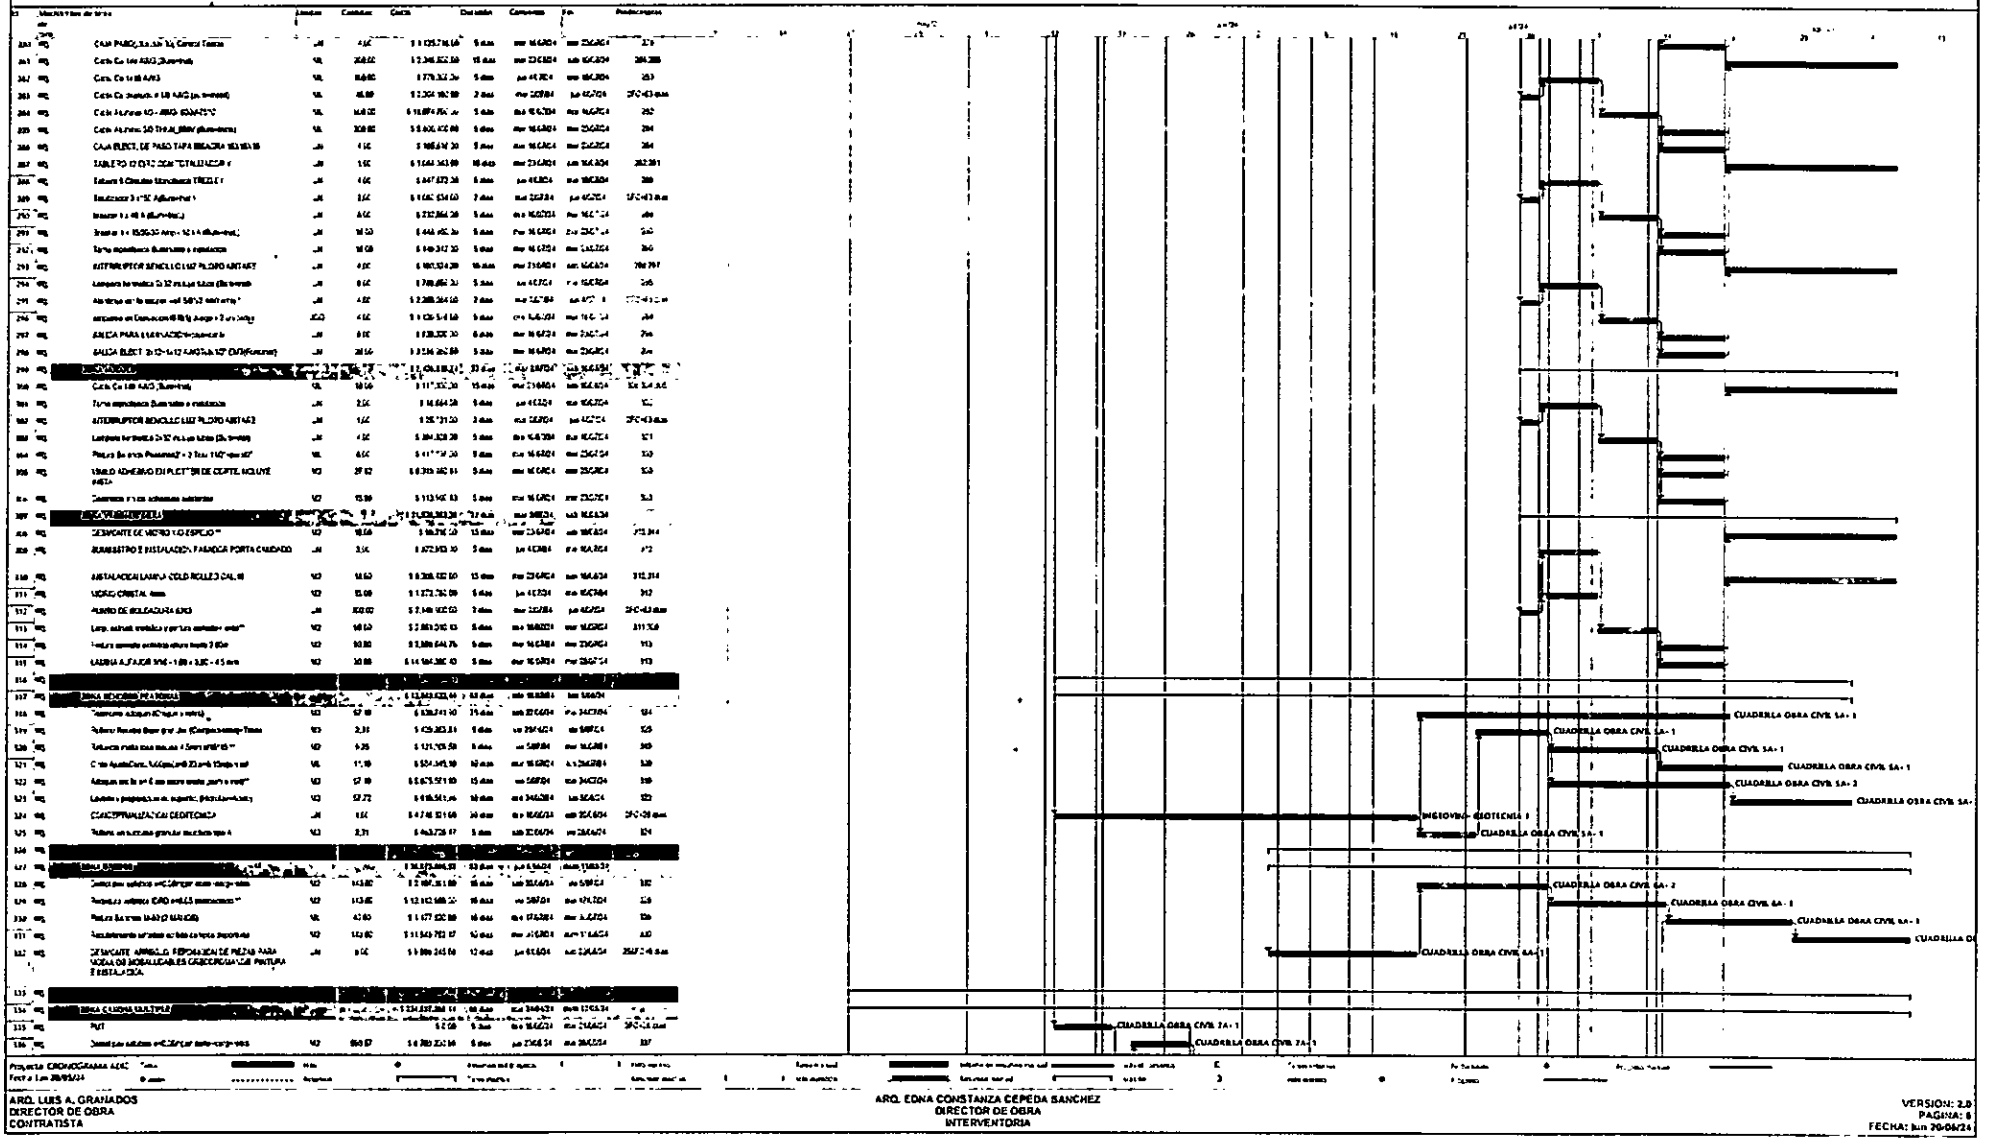


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 6
FECHA: lun 29/04/24

339

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

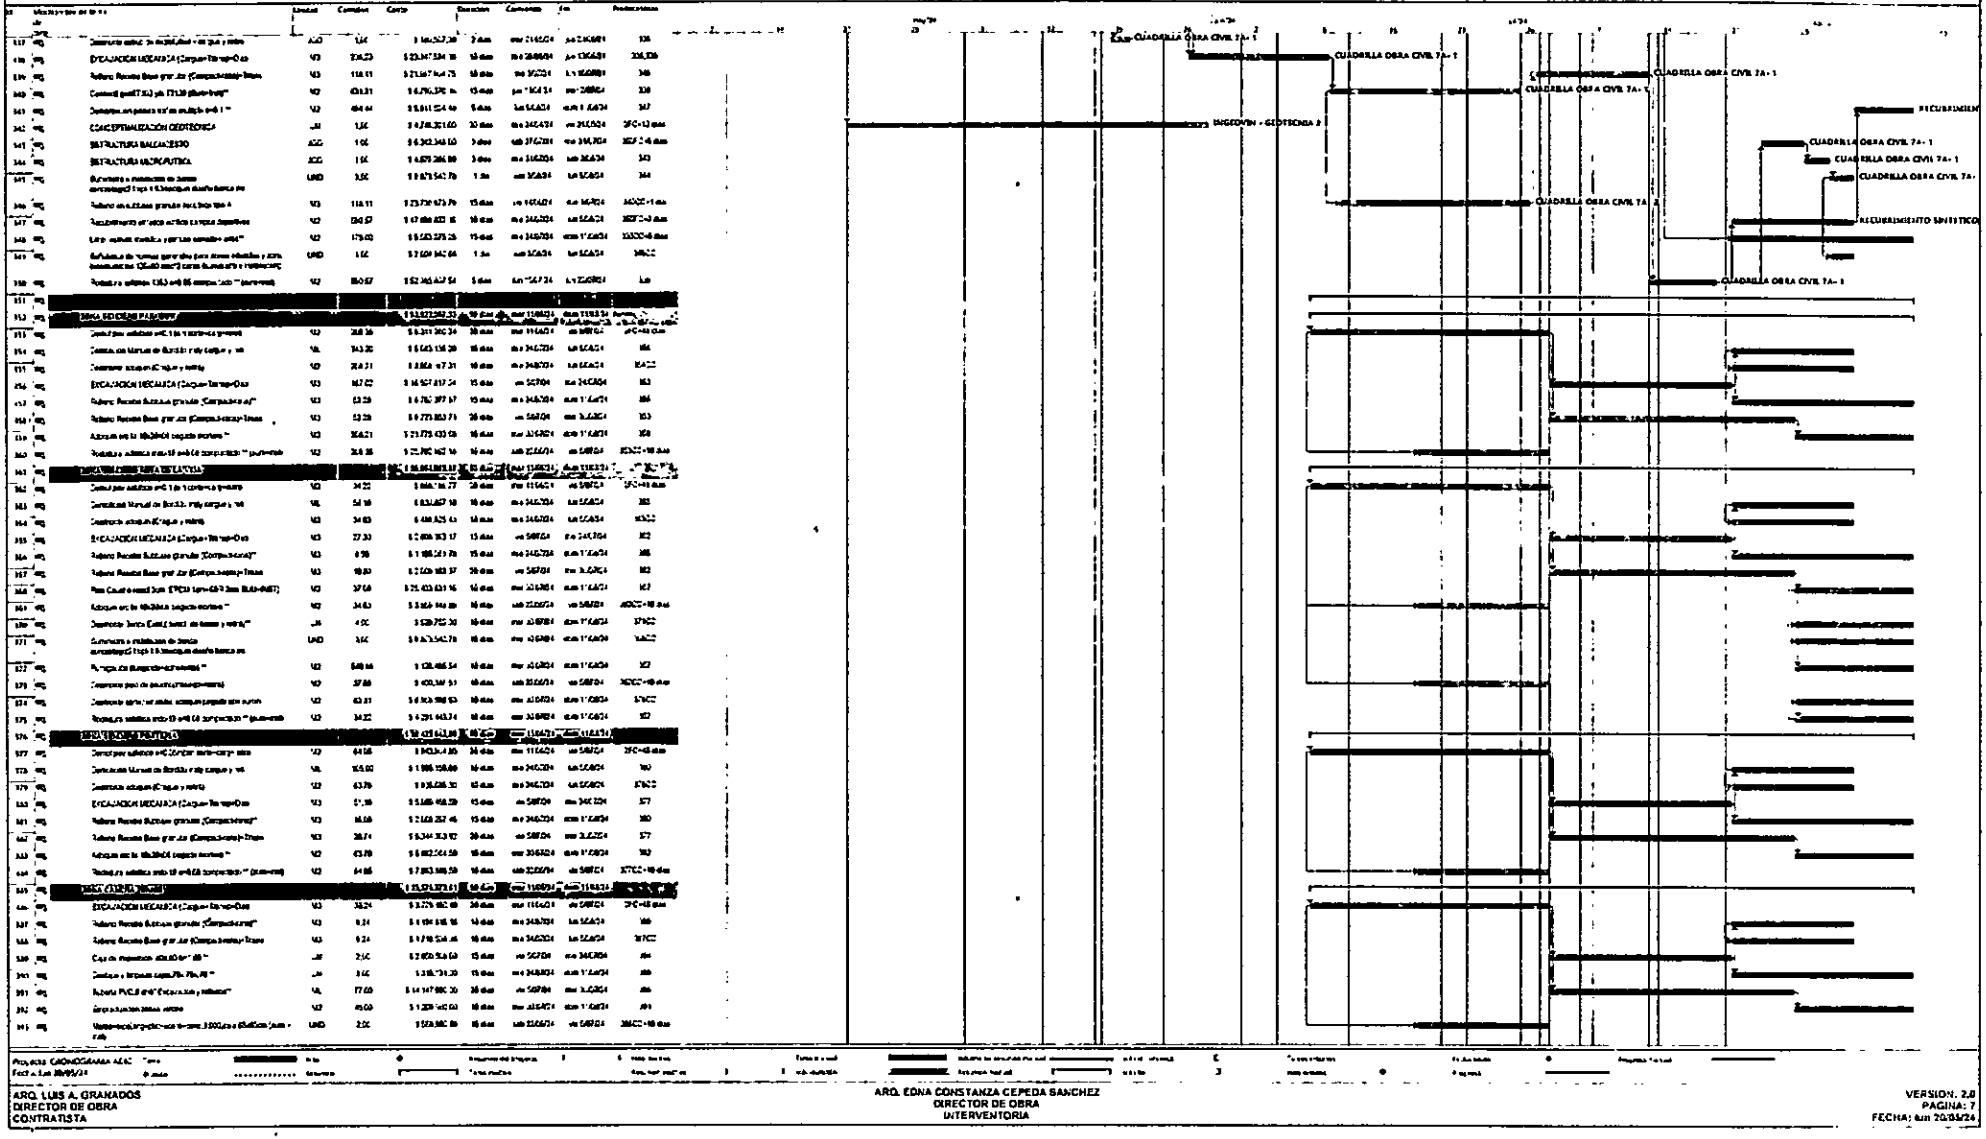


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 7
FECHA: 6m 20/05/24

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

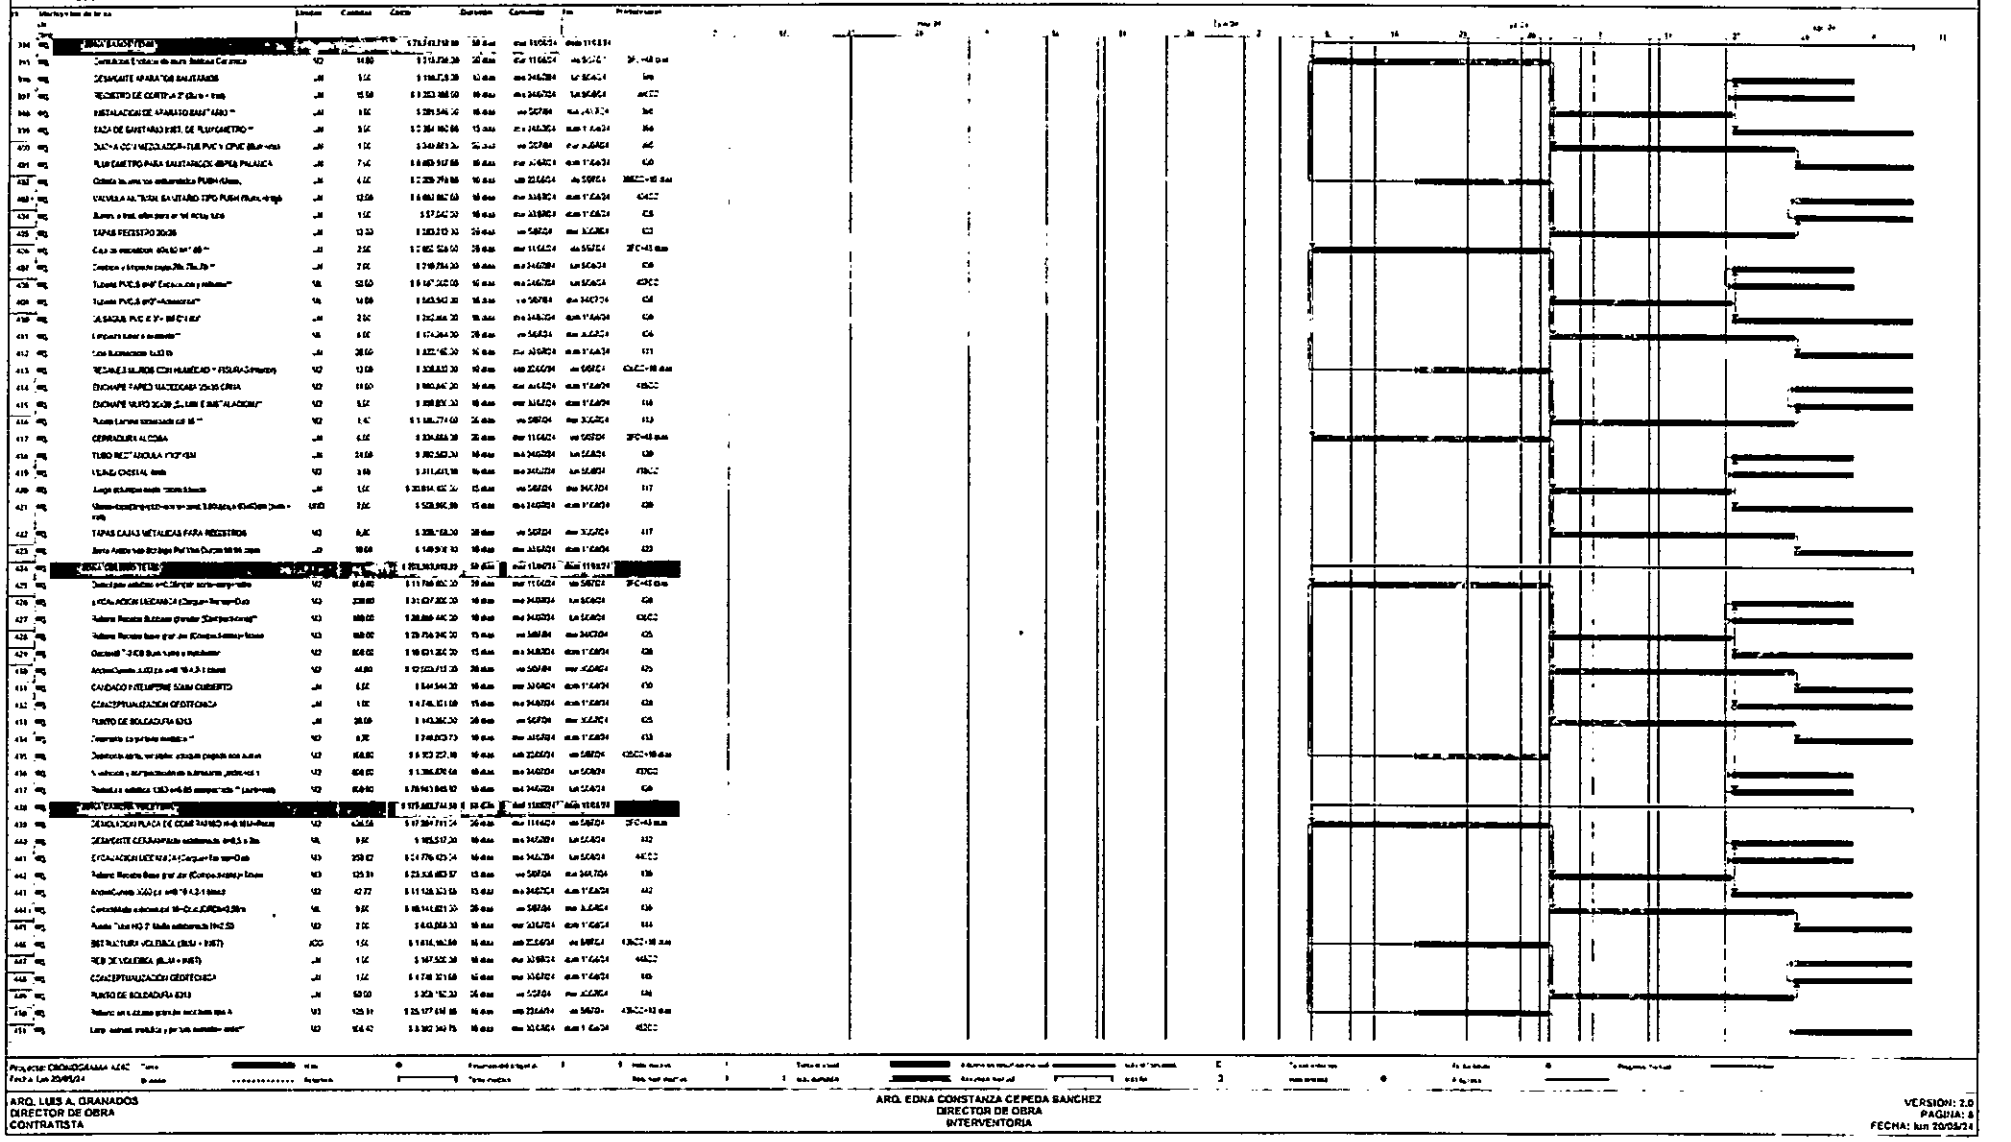


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 8
FECHA: lun 20/05/24

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

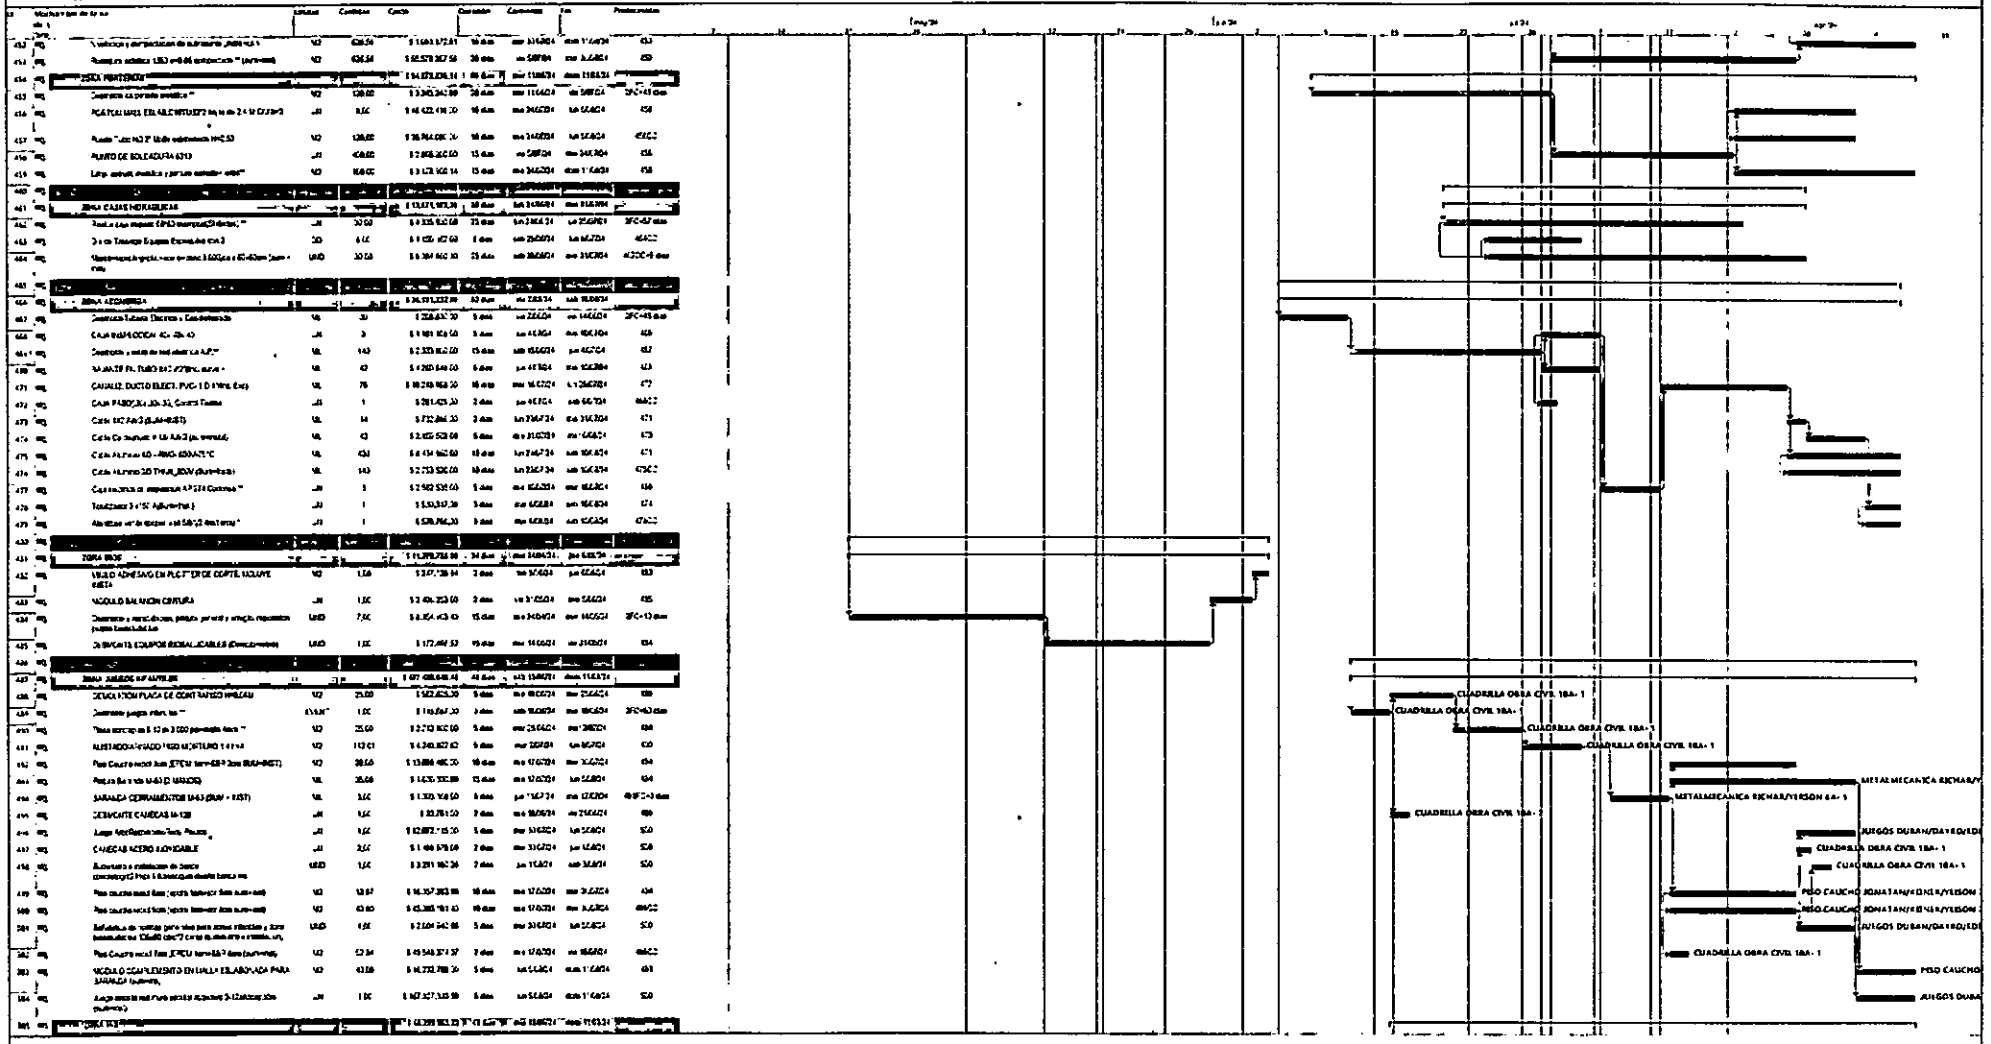


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSIÓN: 2.0
PAGINA: 9
FECHA: lun 20/05/24

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

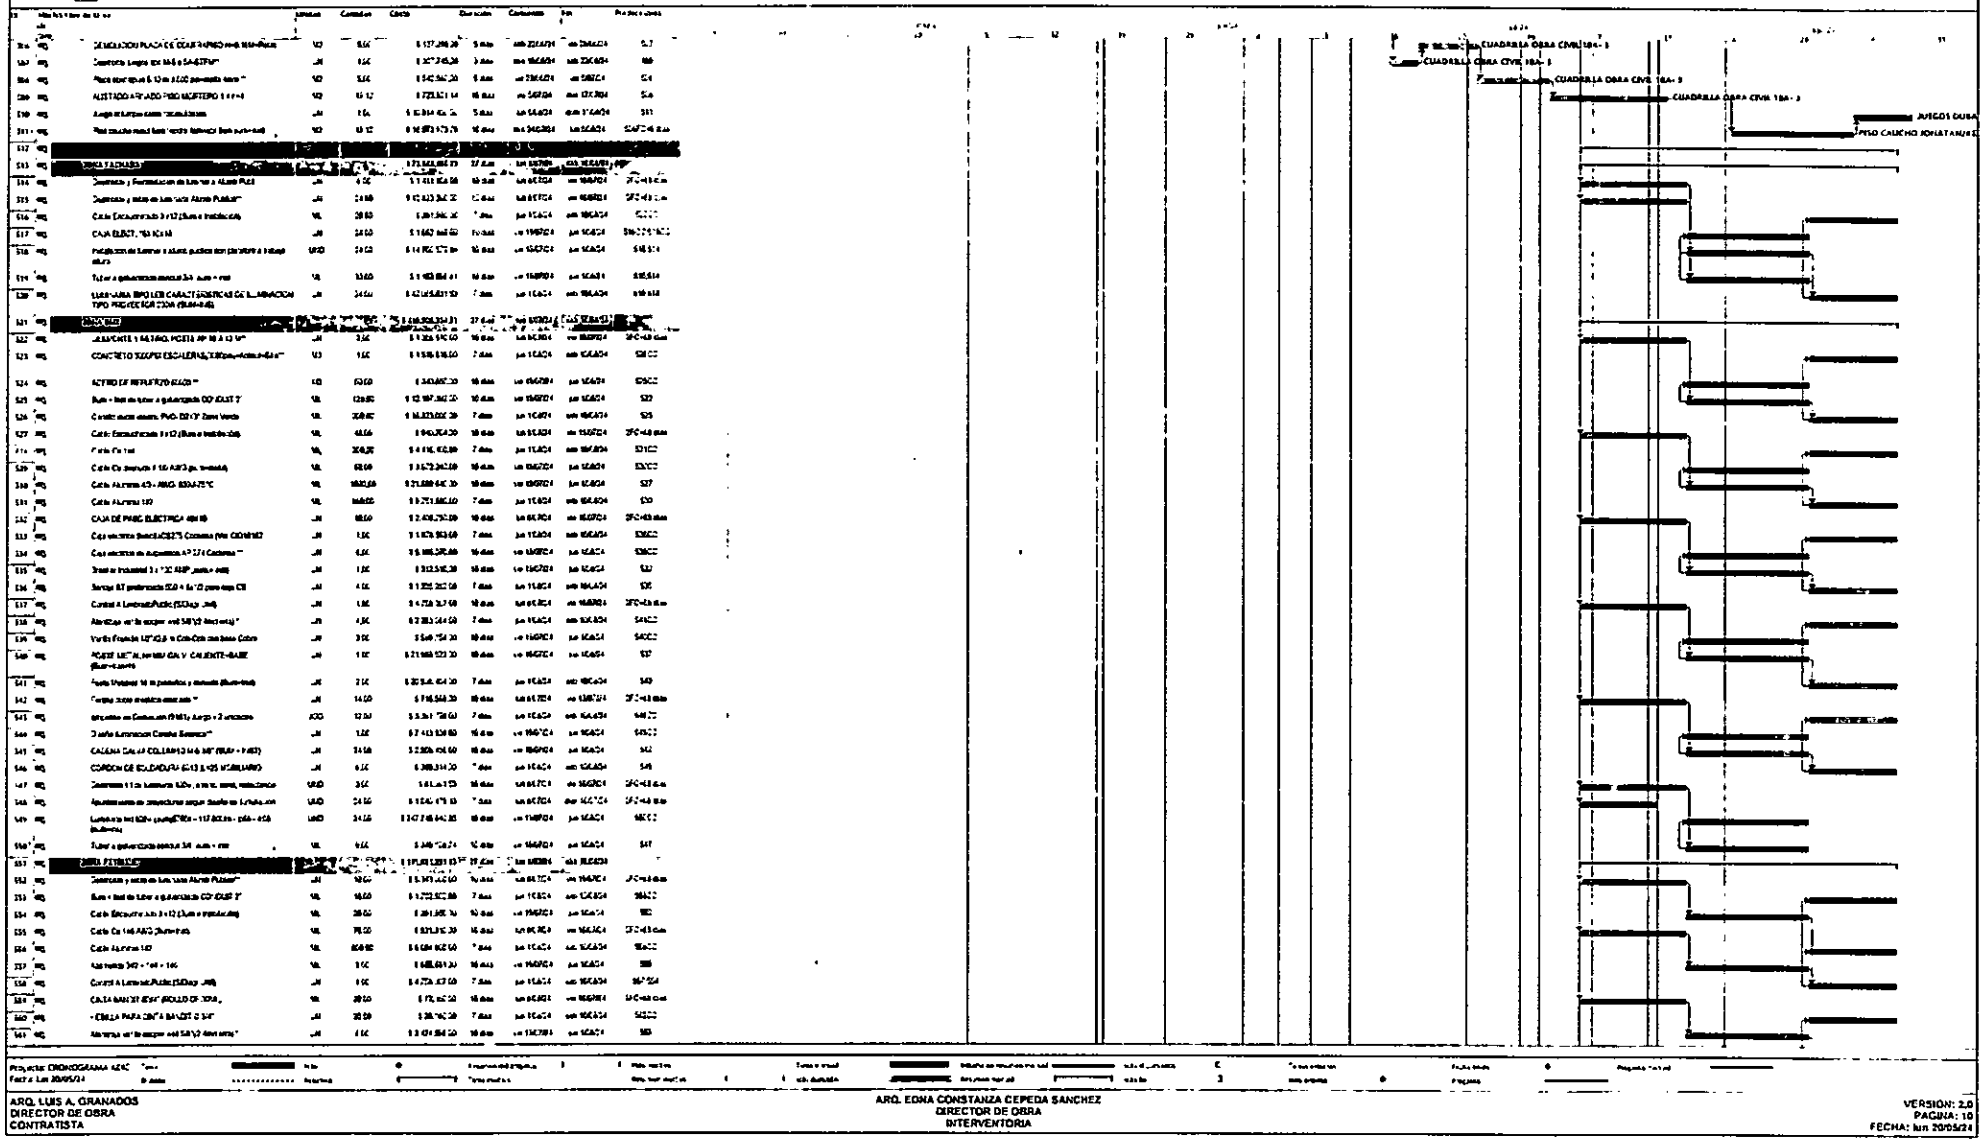


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 10
FECHA: lun 20/05/24

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

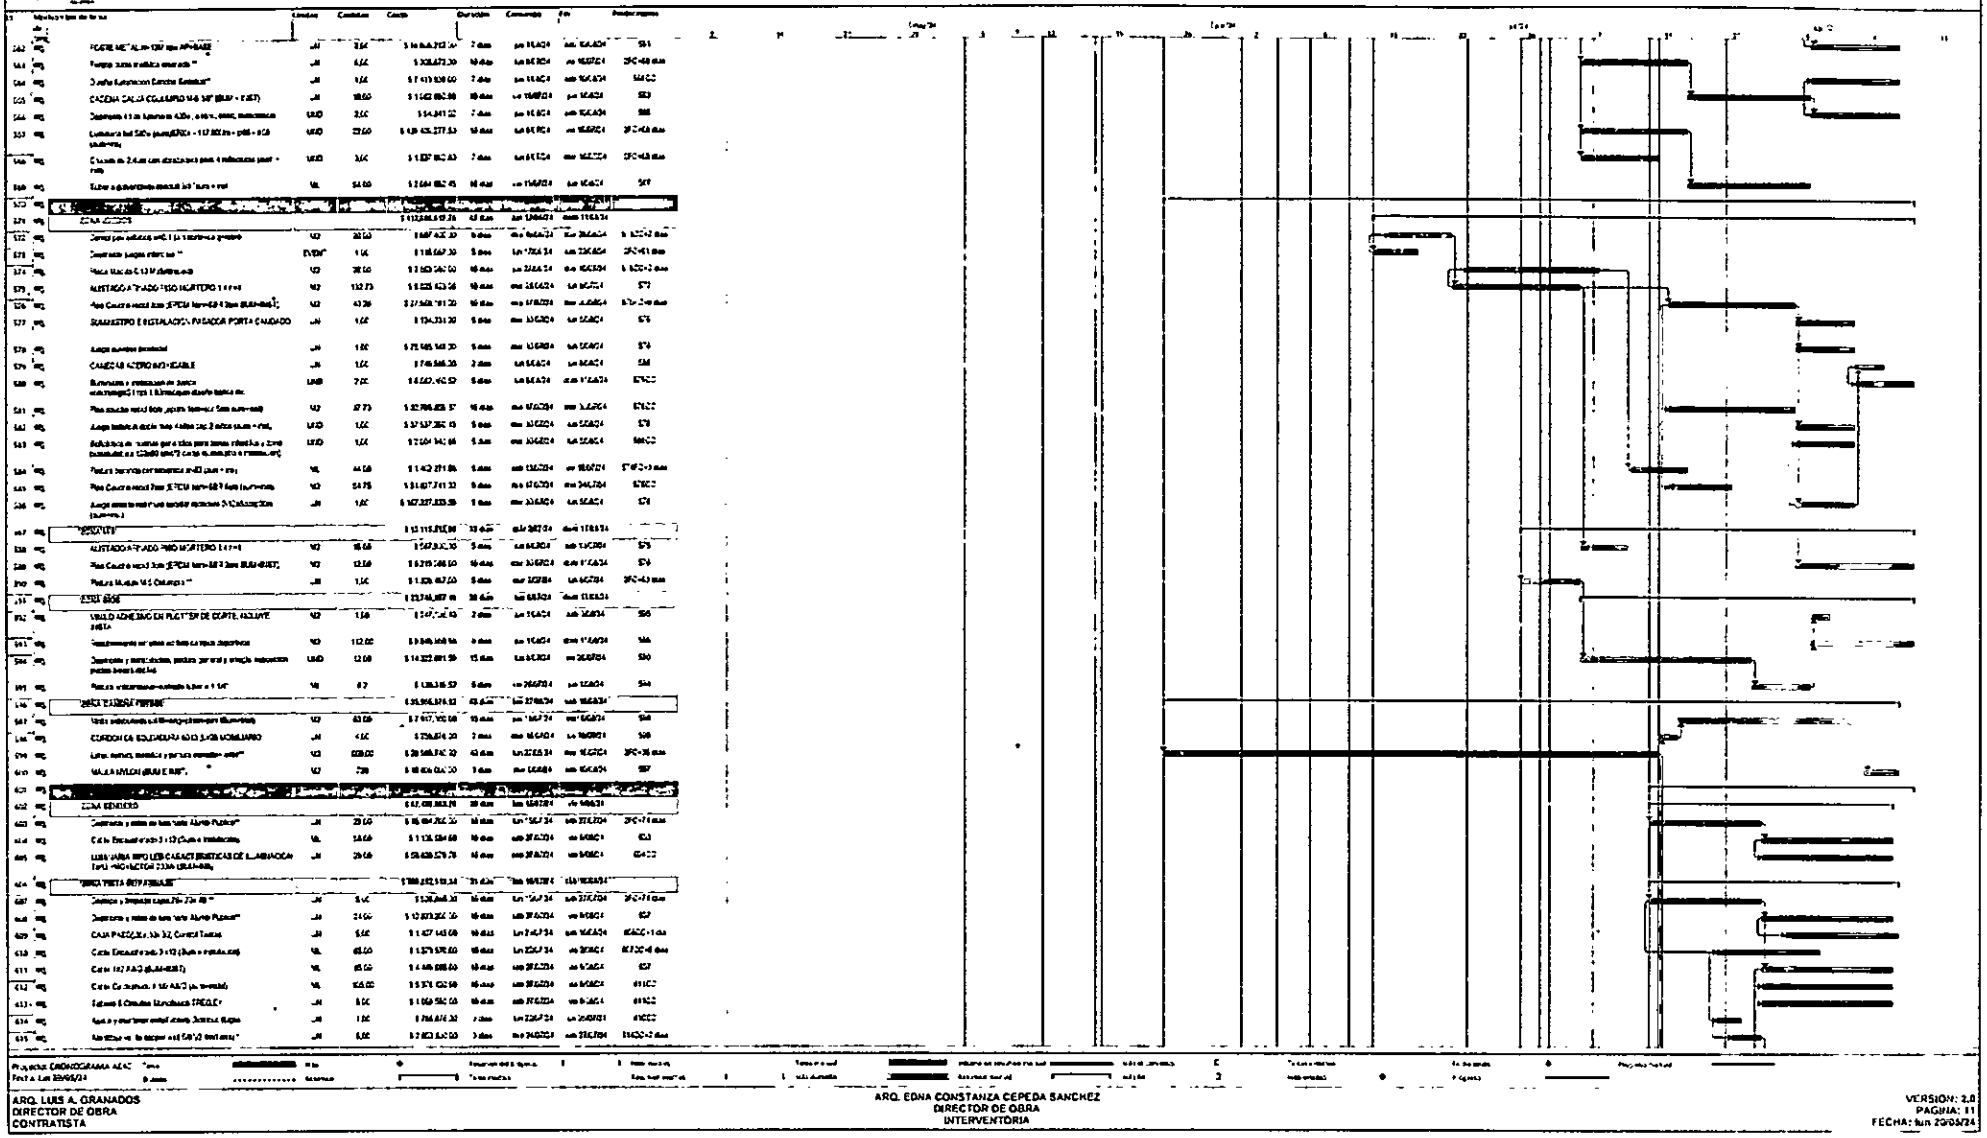


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 11
FECHA: lun 29/04/24

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

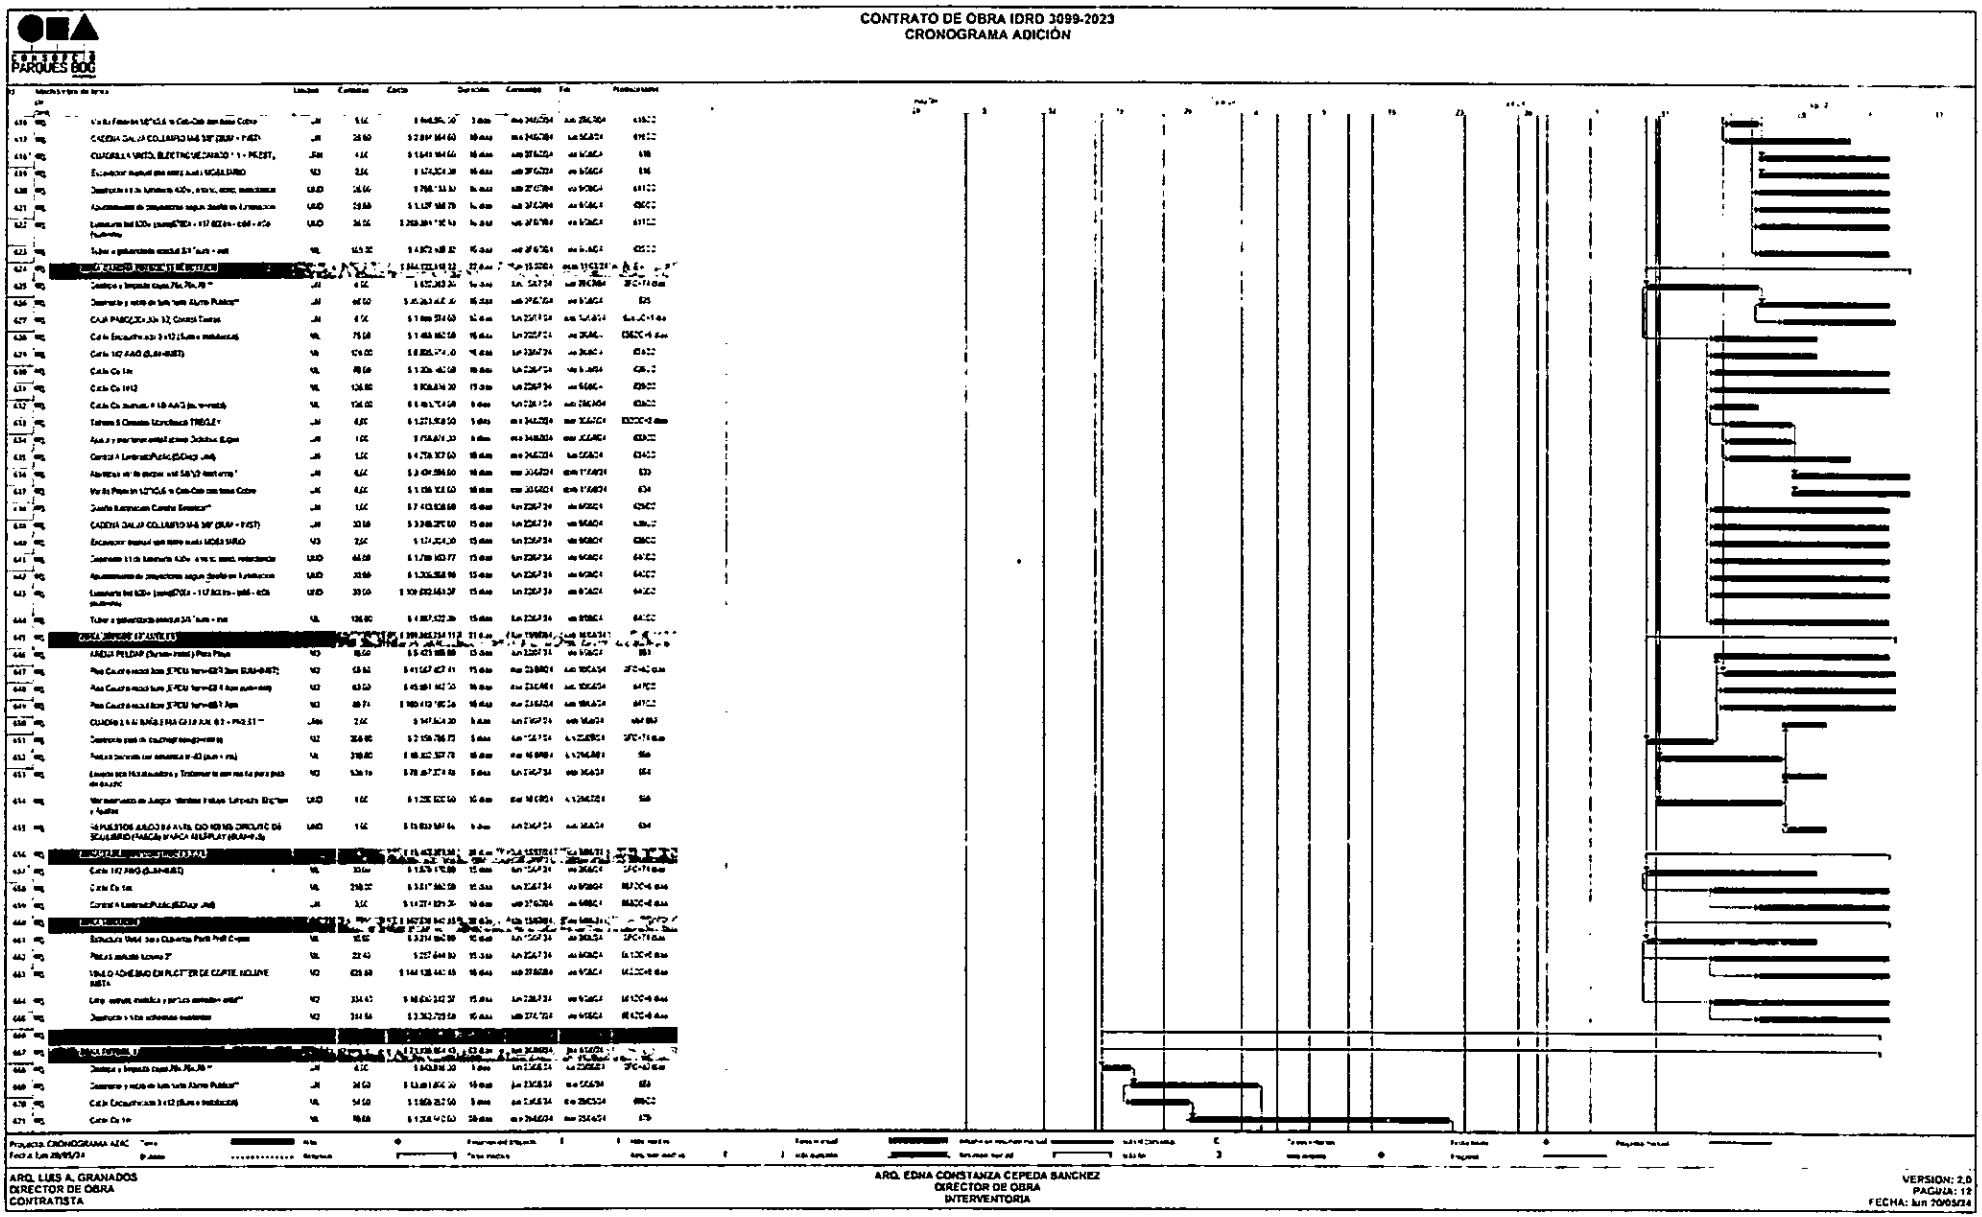


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 12
FECHA: lun 20/05/24

CONSTRUYE PARQUES BOG

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

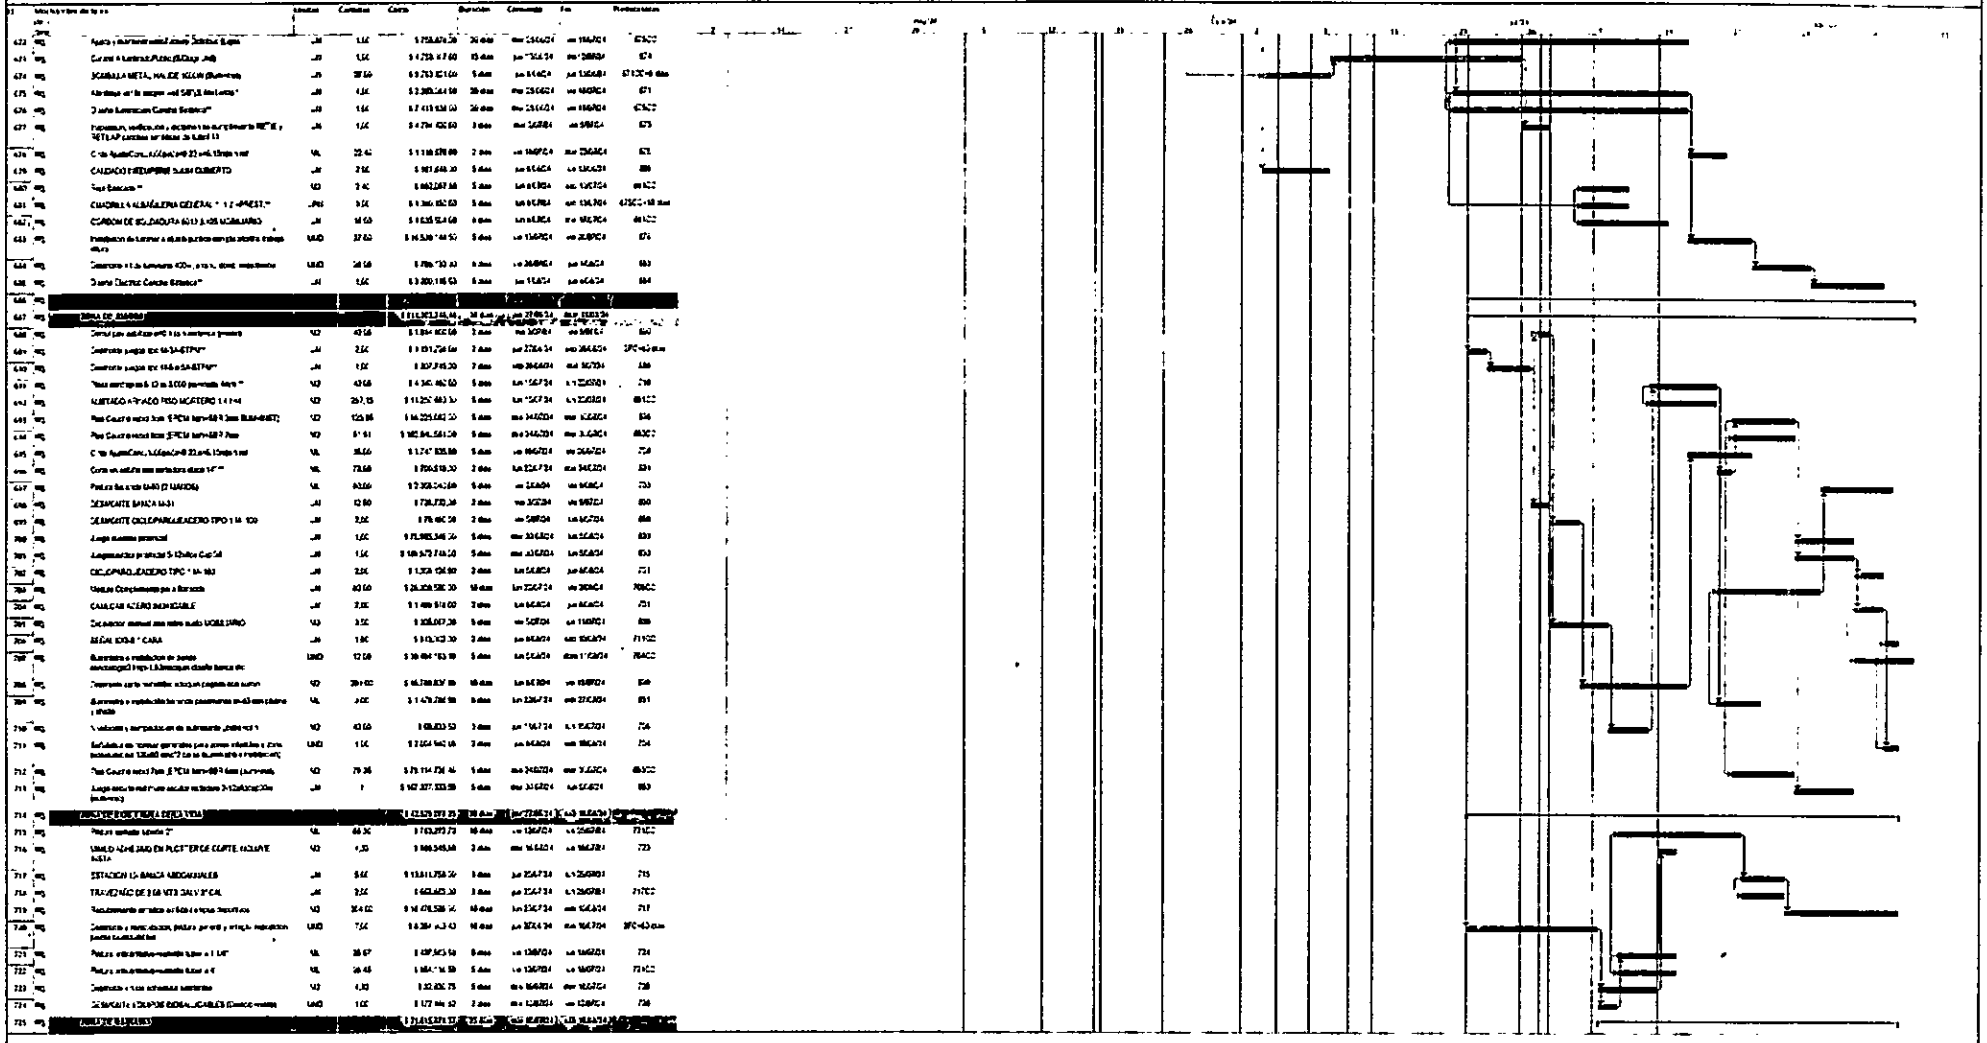


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 13
FECHA: Jun 20/05/24

CONSORCIO PARQUES BOG

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

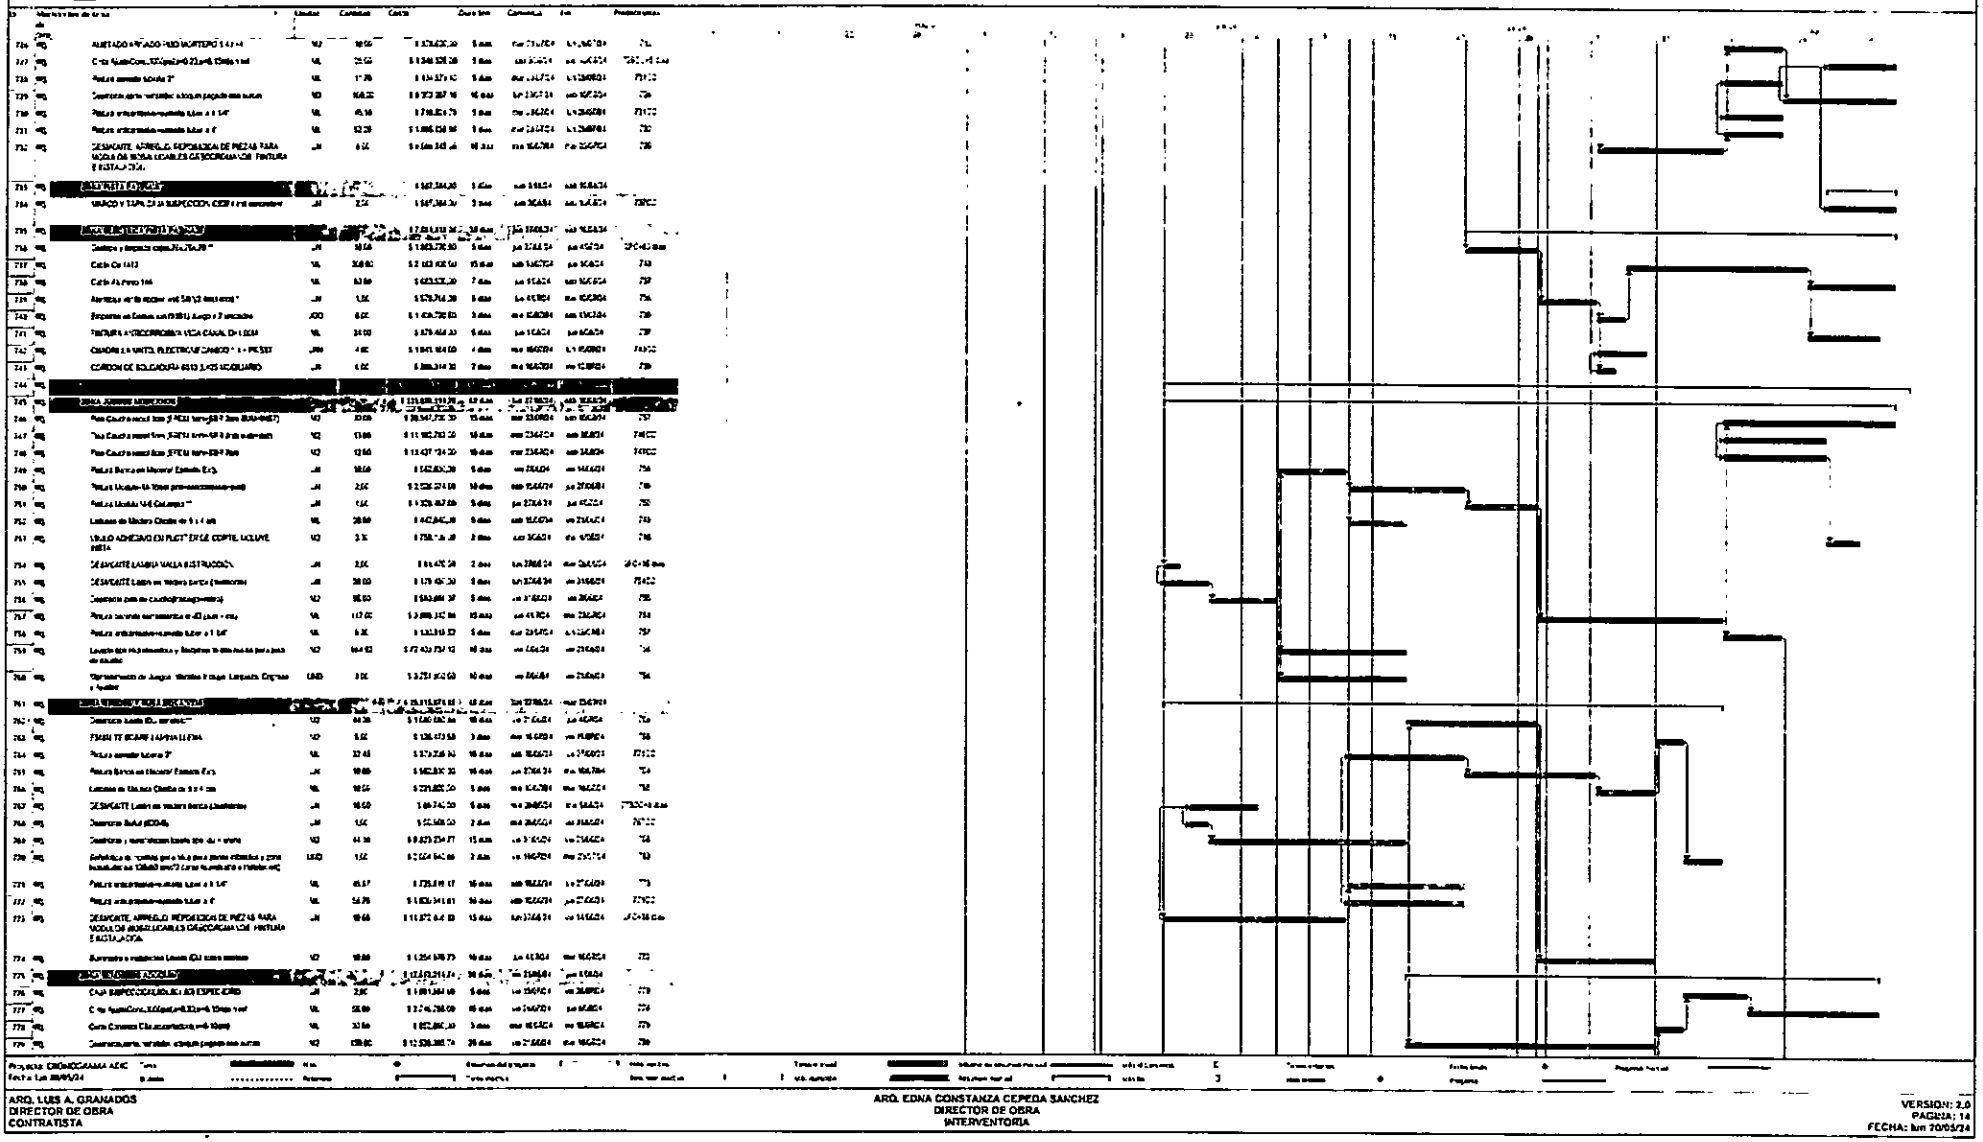


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 14
FECHA: lun 20/05/24

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

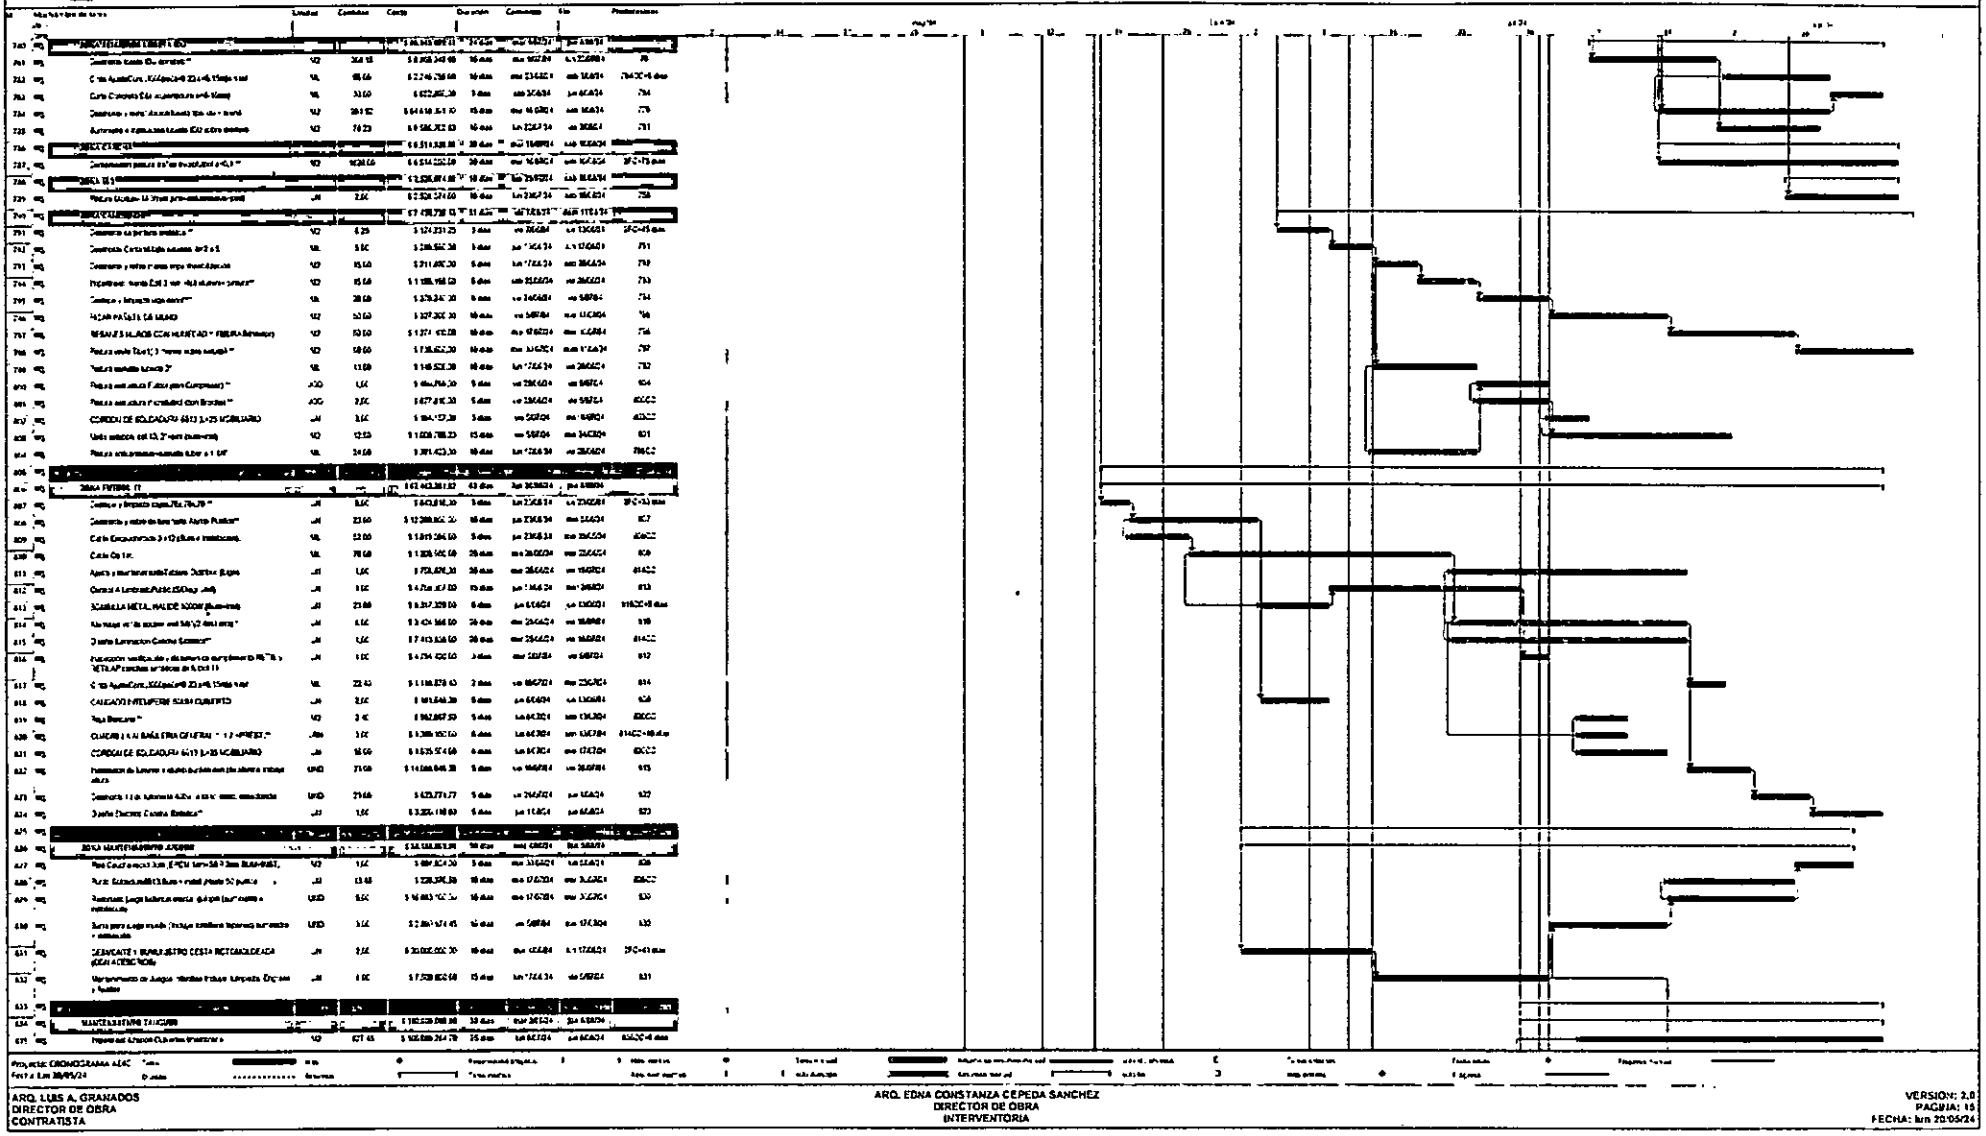


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 15
FECHA: lun 20/05/24

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

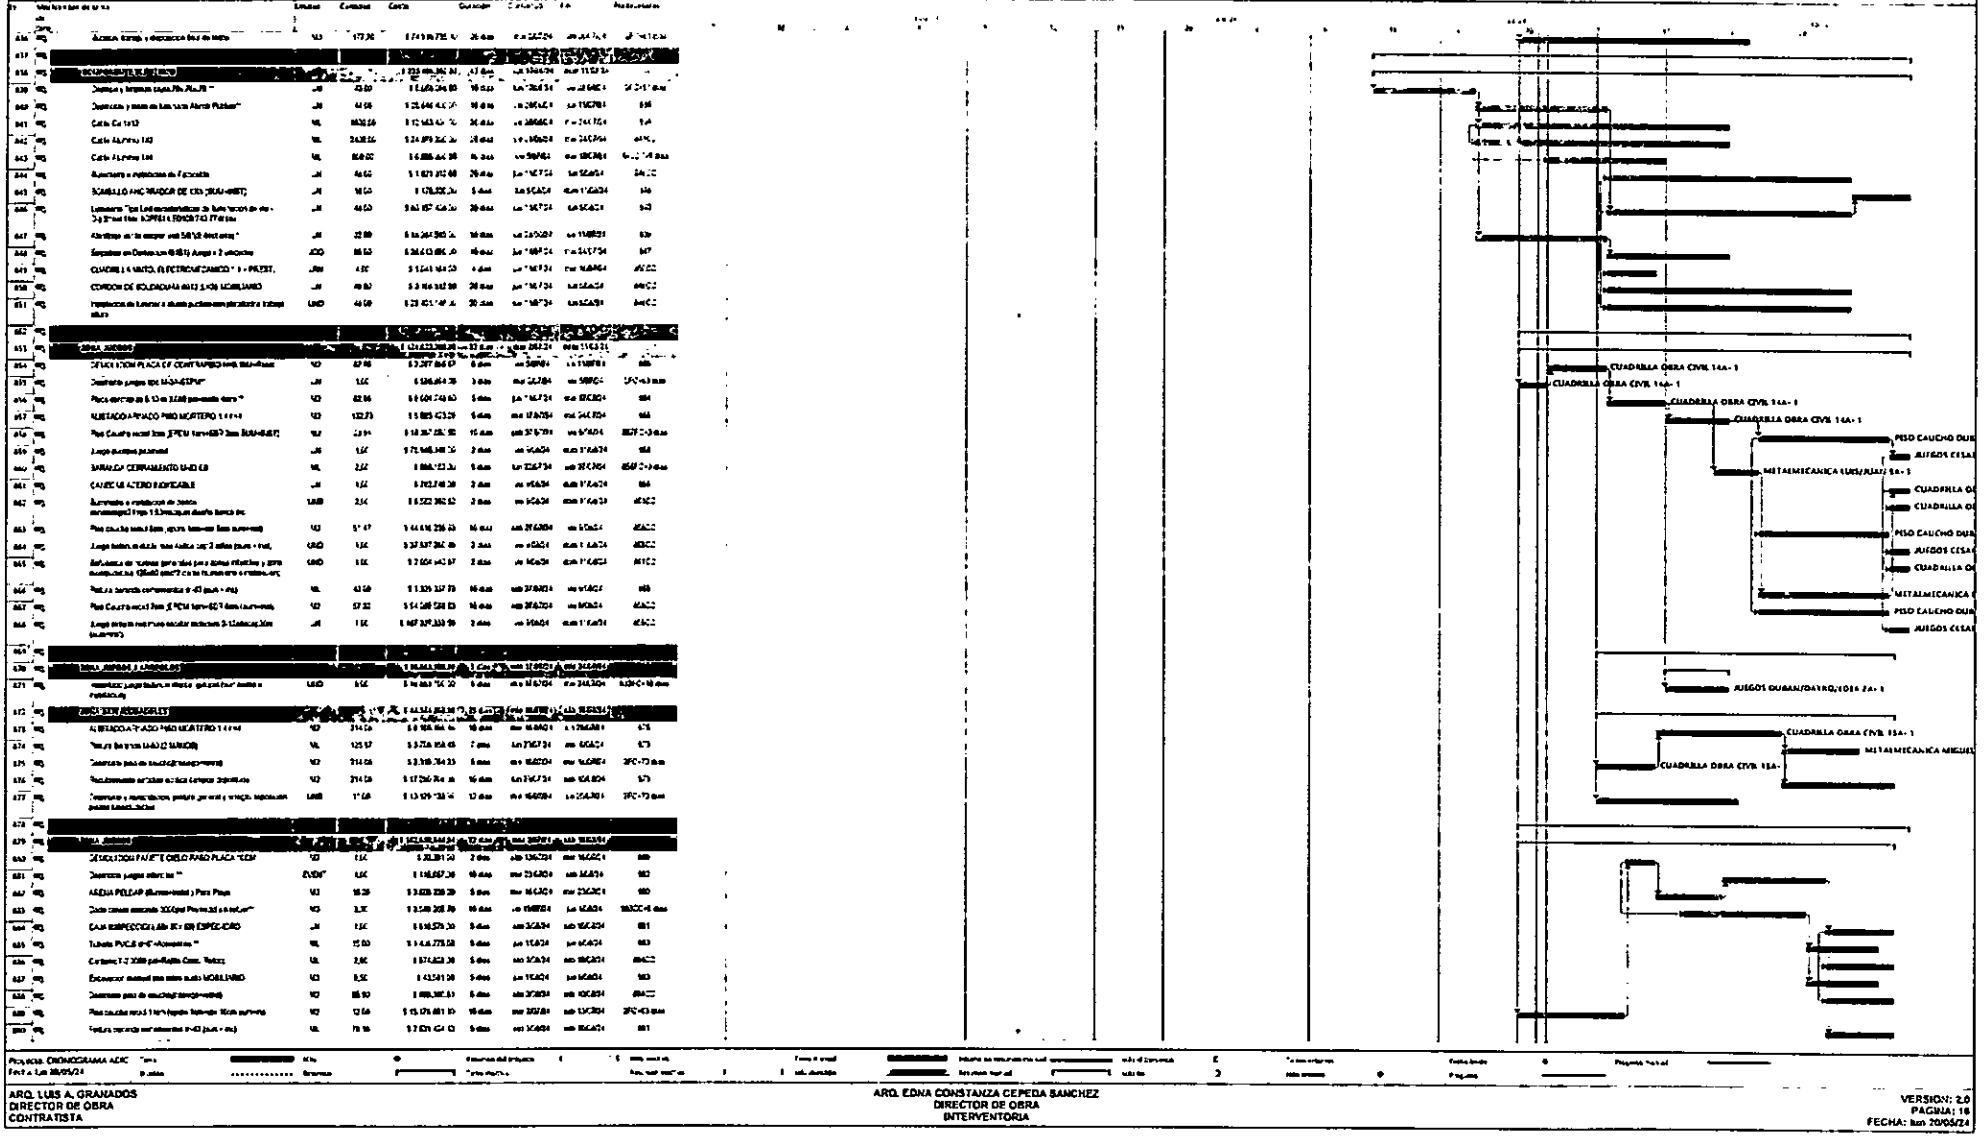


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 16
FECHA: lun 20/05/24

396

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

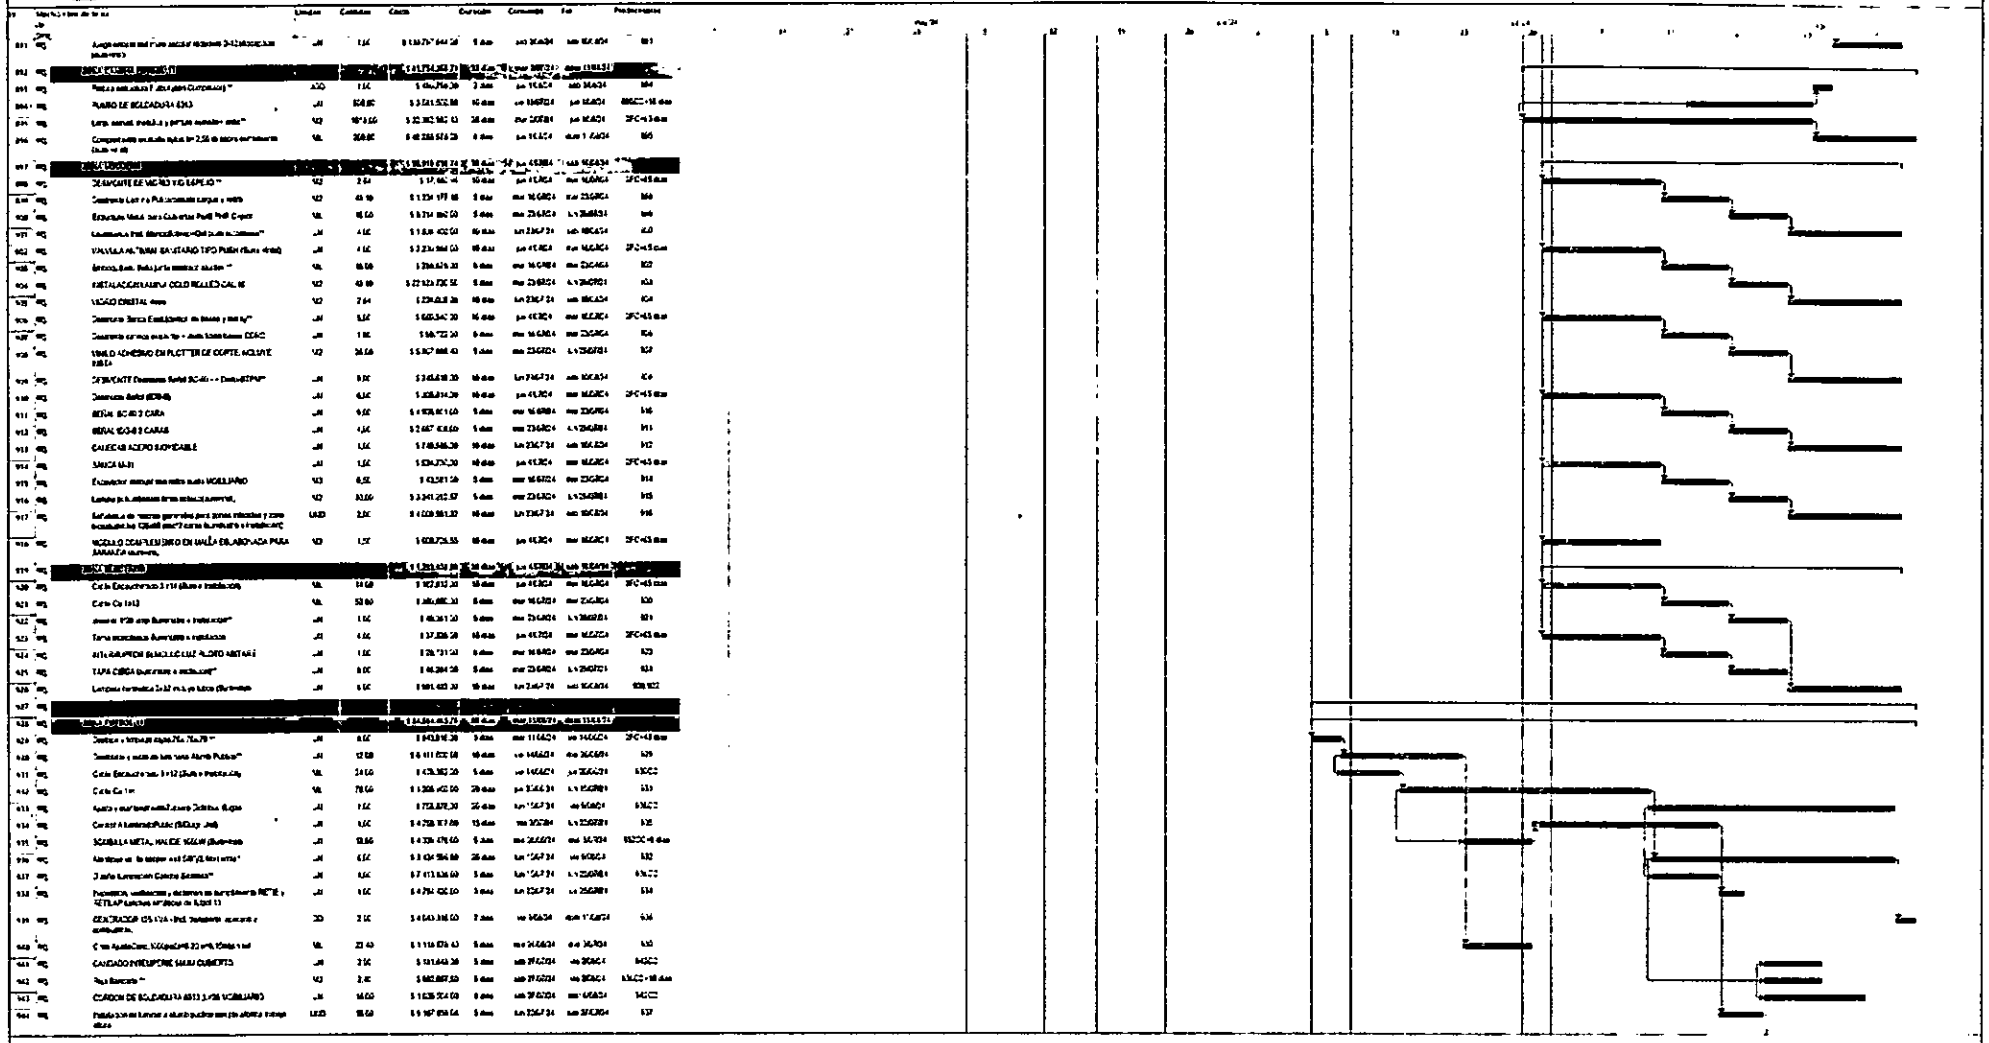


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 17
FECHA: lun 29/04/24

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

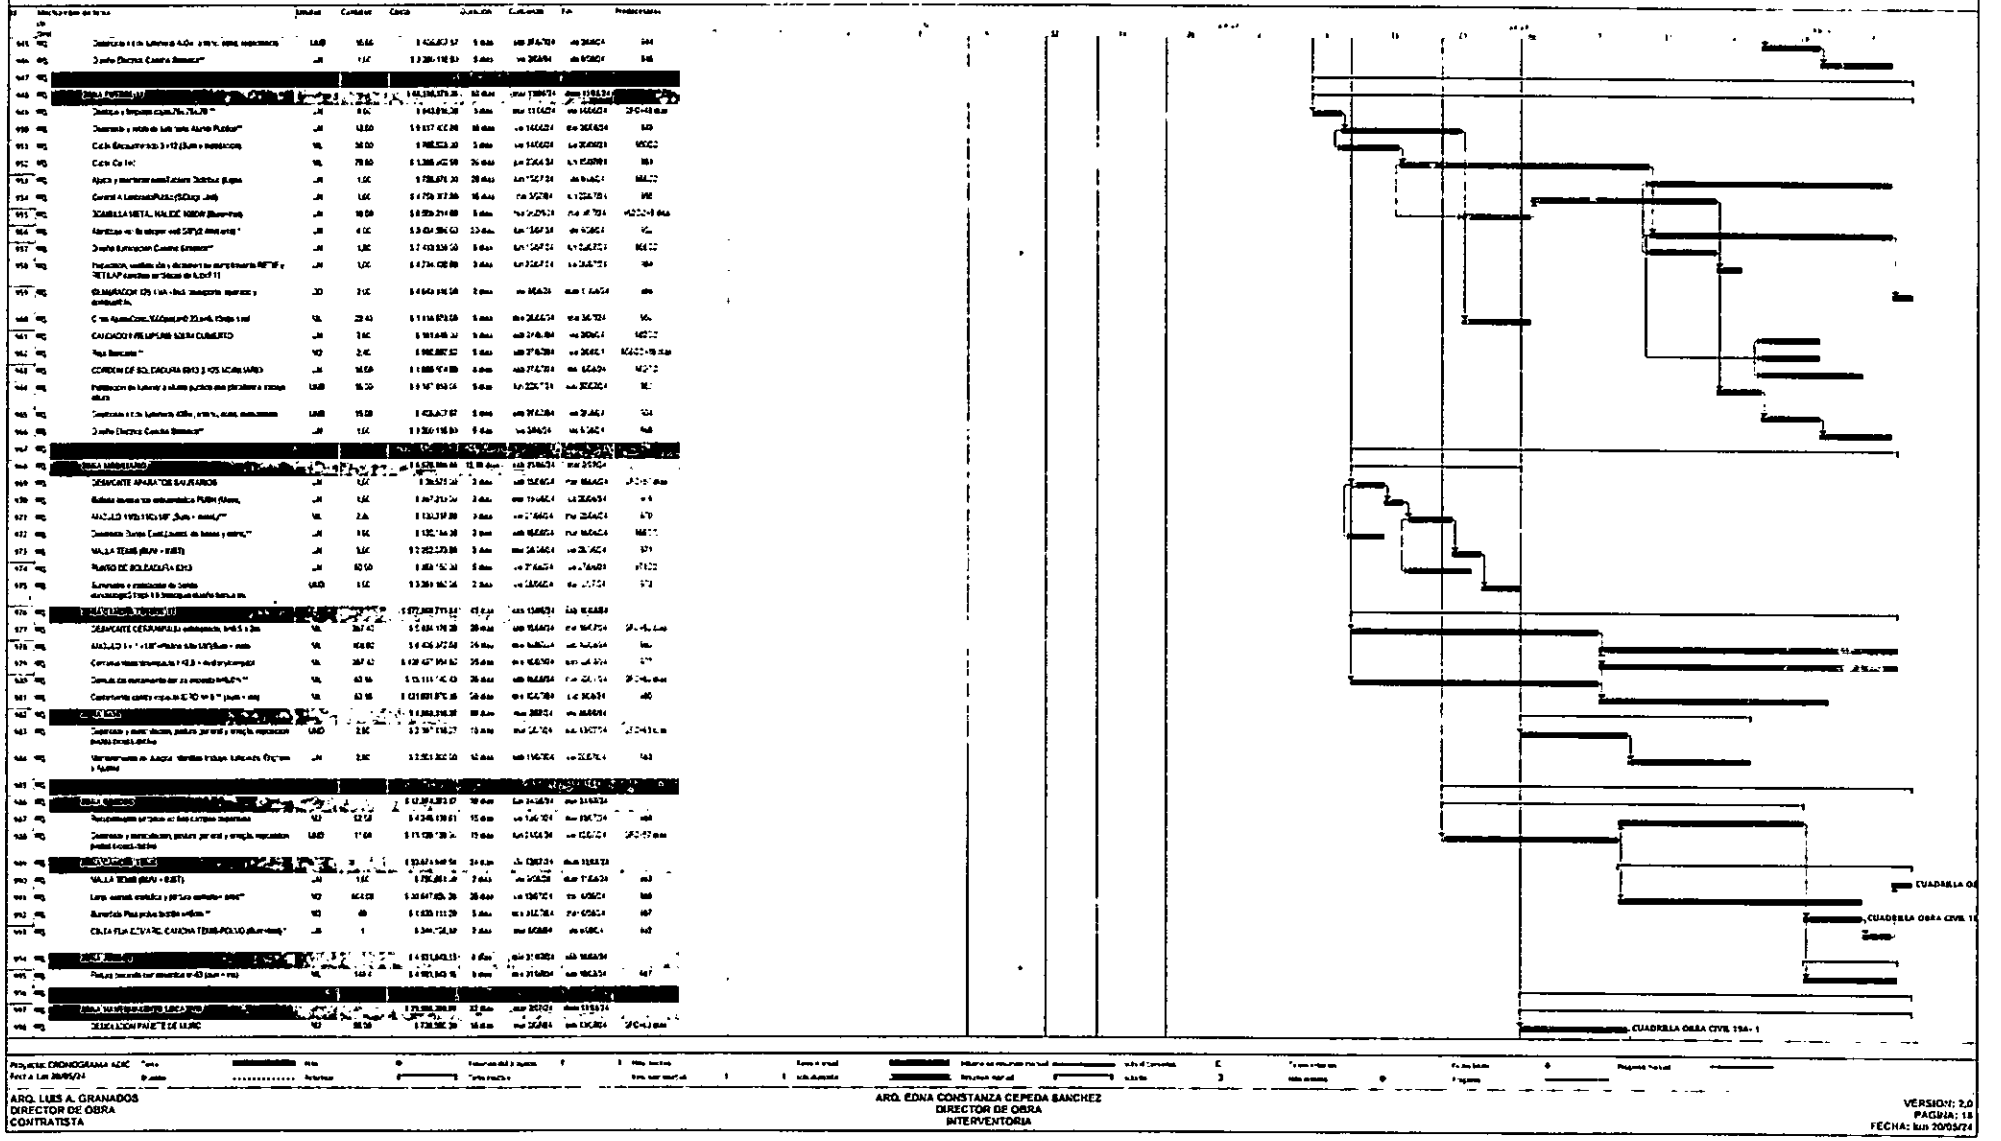


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 18
FECHA: lun 20/05/24

CONSTRUCTOR PARQUES BOG

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

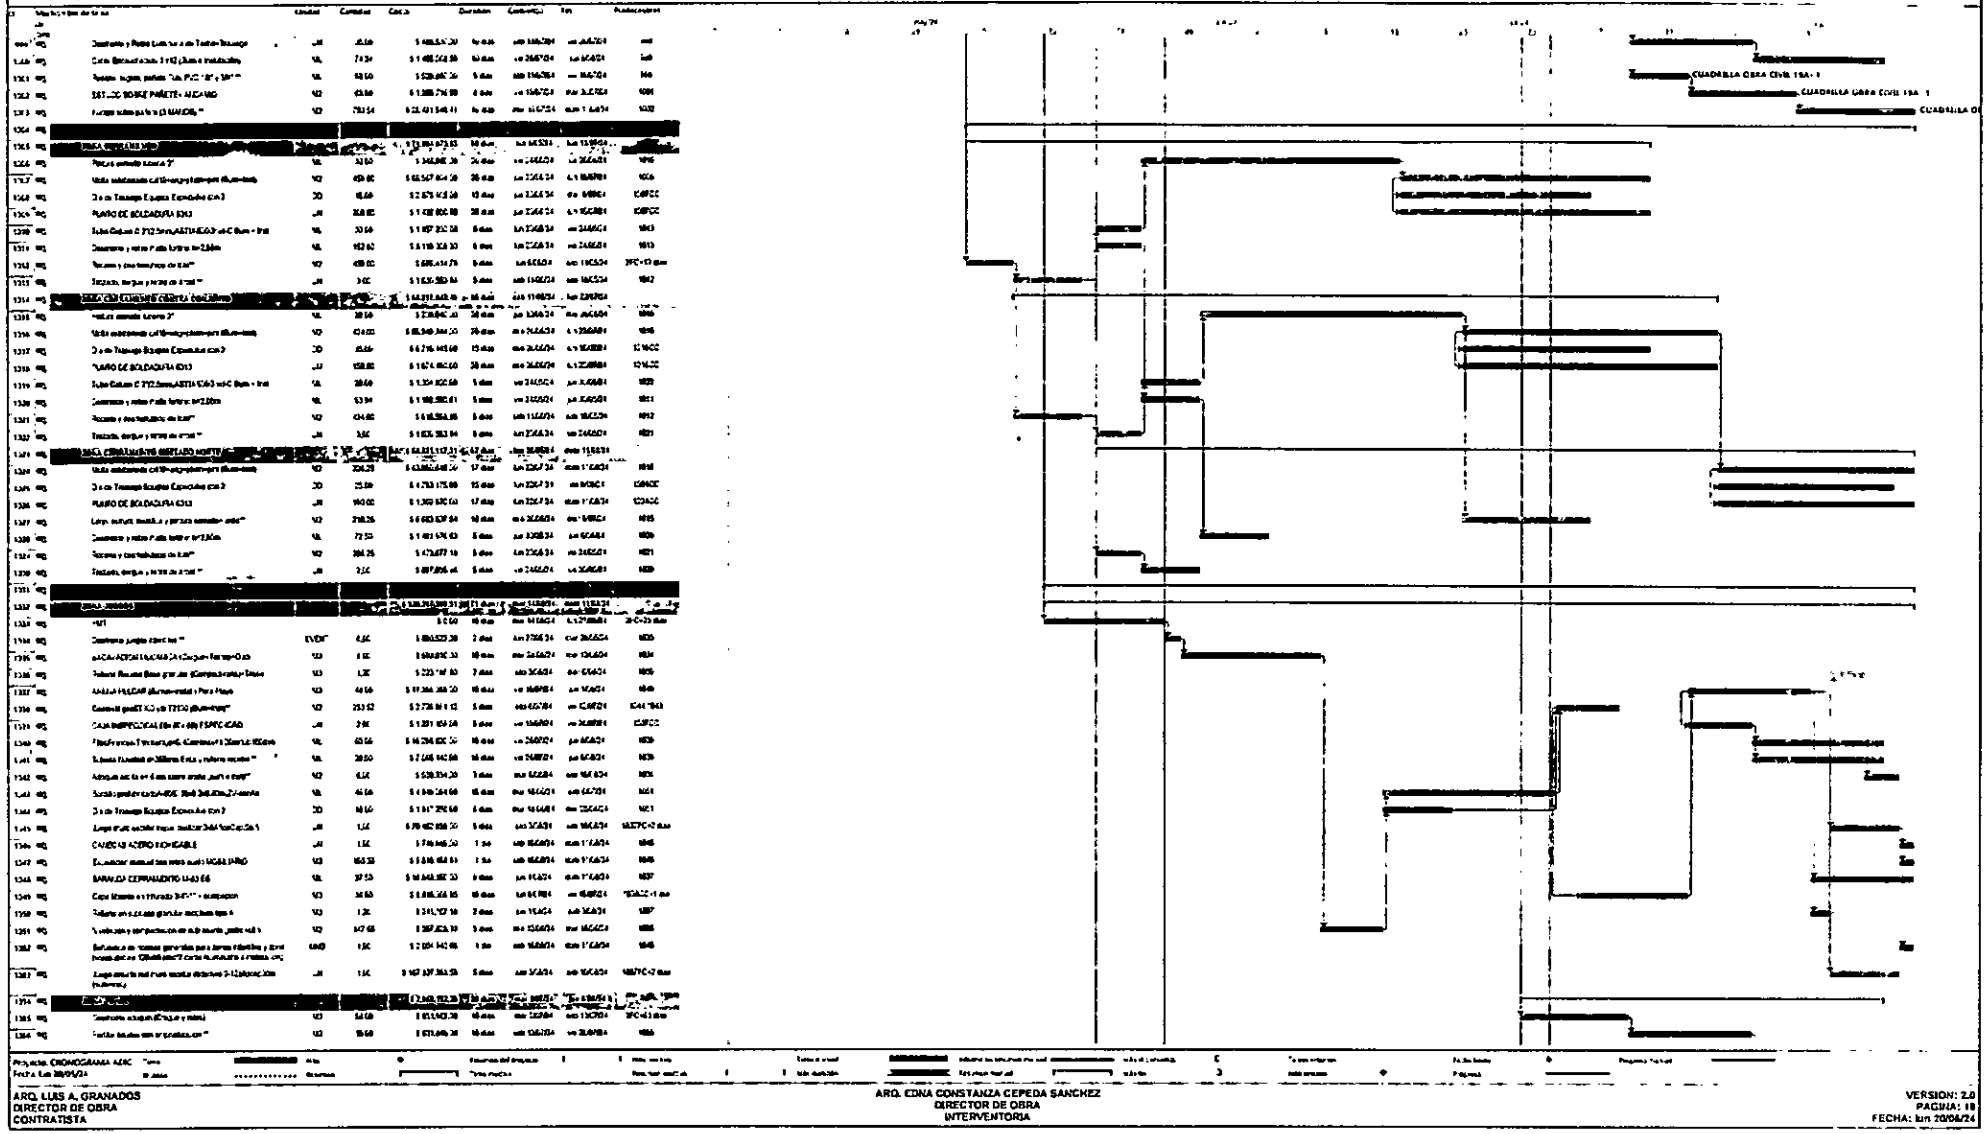


ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 1/1
FECHA: lun 7/05/24

CONTRATO DE OBRA IDRD 3099-2023
CRONOGRAMA ADICIÓN

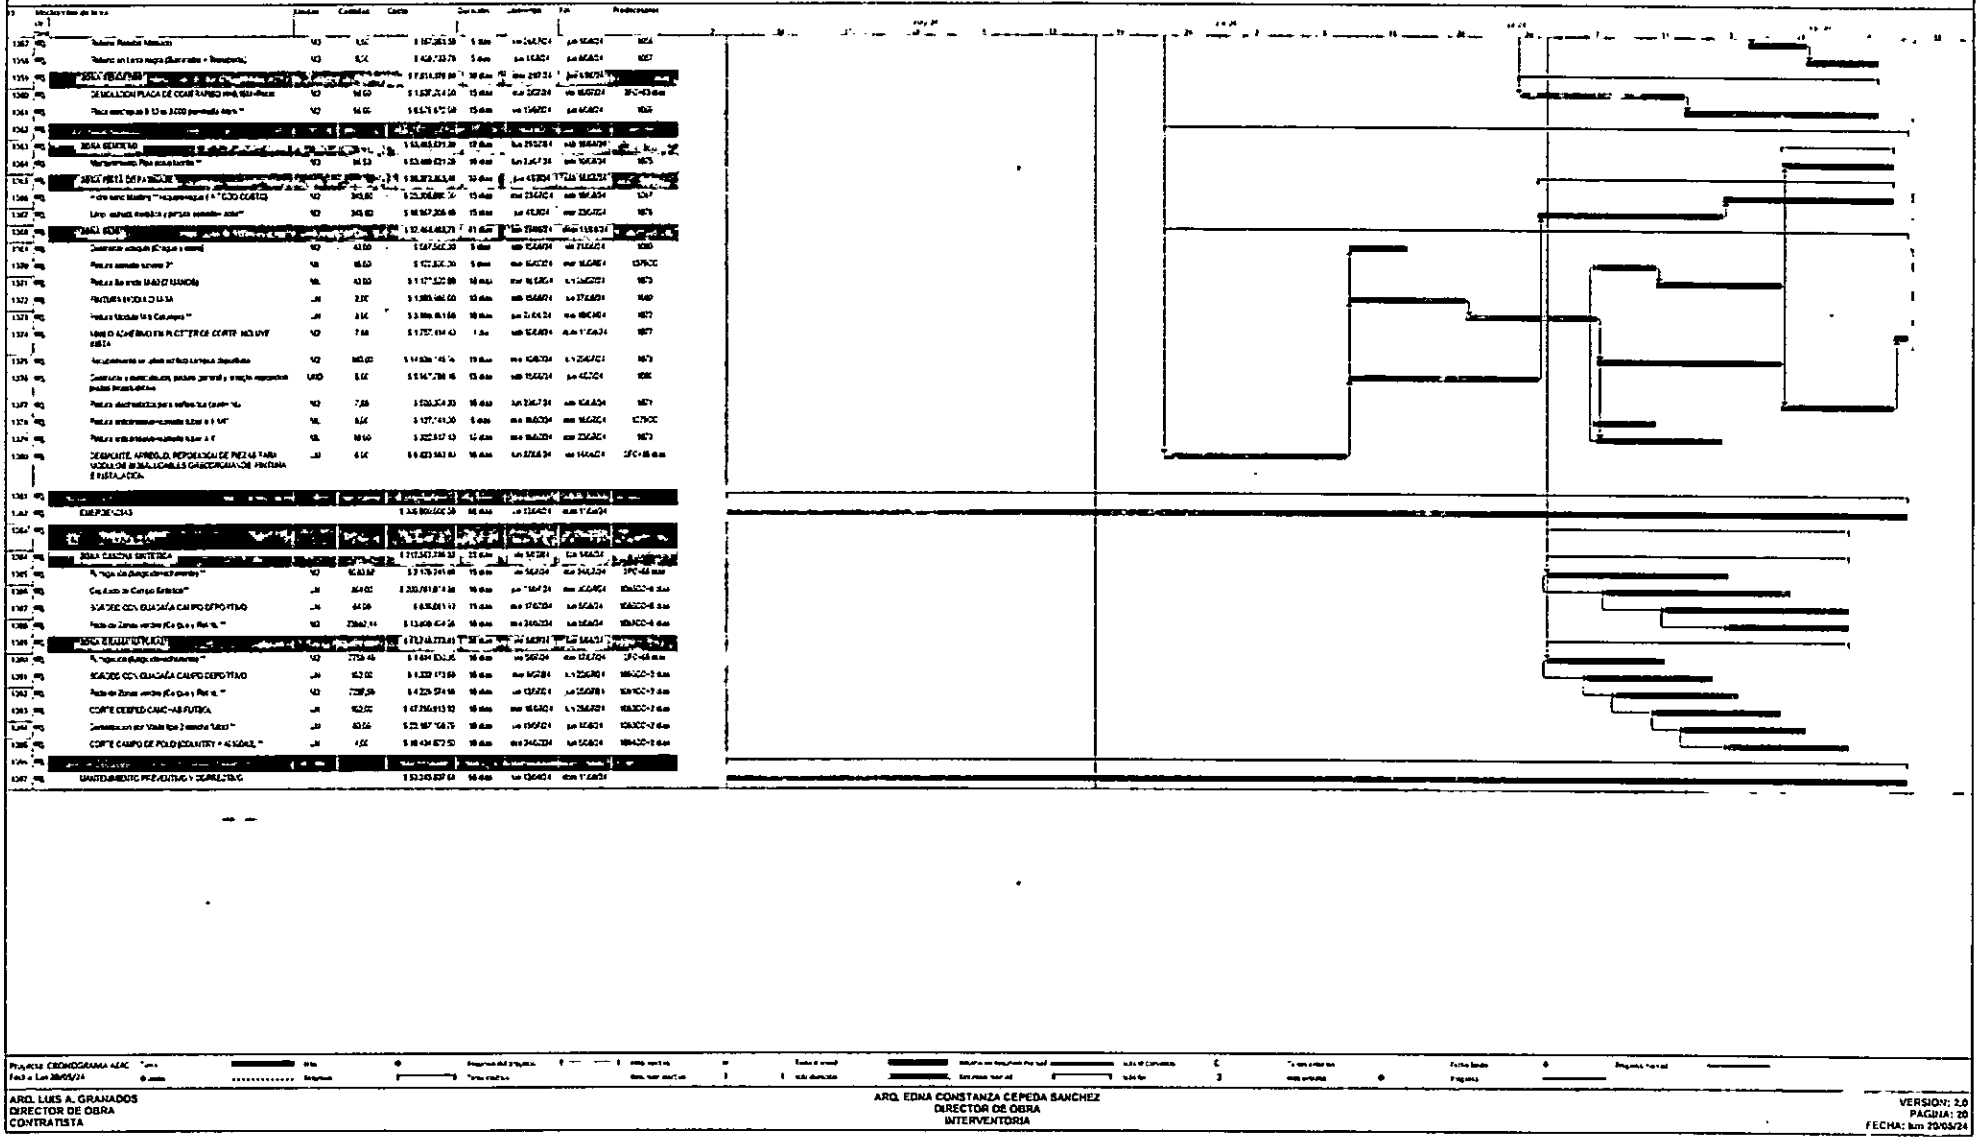

ARQ. LUIS A. GRANADOS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA

VERSION: 2.0
PAGINA: 20
FECHA: lun 20/05/24

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

CONTROL DE CAMBIOS AL PROYECTO

DATOS GENERALES

PARQUE: Varios | FECHA: 12/04/2024 | CONSECUTIVO: 3

CODIGO (Si aplica): Varios | LOCALIDAD: Varios

DIRECCION: Varios

CONTRATO DE OBRA

N° DE CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL
CO- IDRD 3099-2023	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

SOLICITUD DEL CAMBIO

TIPO DE CAMBIO SOLICITADO

DISEÑO DEL PROYECTO (ALCANCE) [ ] | PROGRAMACION (PLAZO) [ ] | PRESUPUESTO (COSTO) [X]

MOTIVO DEL CAMBIO

SOLICITUD DEL CLIENTE [X] | TECNICOS O DE GESTION [ ] | NO PREVISTOS [ ] | EN NORMATIVA / LEG. [ ]

JUSTIFICACION DEL CAMBIO

Teniendo en cuenta la adicion y prorroga al contrato, se solitica modificar el presupuesto general y por parque de acuerdo con los nuevos parques incluidos en el alcance del contrato y nueva fecha de finalizacion.

PLANOS AFECTADOS: *No aplica*

ANEXOS: *No aplica*

"En caso de requerir un apoyo grafico, incluir la plantilla "Analisis grafico"

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE CAMBIO

Con carta del 7 de mayo de 2024, CTO-IDRD-3099-2023-357, el CONSORCIO PARQUES BOG presenta presupuesto y programa de obra para planear la adicion y prorrogra por parque y atencion de emergencias del sistema general de parques

PLANOS AFECTADOS: *No aplica*

ANEXOS: *Comunicado: CTO-IDRD-3099-2023-390 y Cronograma de adicion del 20/05/24*

"En caso de requerir un apoyo grafico, incluir la plantilla "Analisis grafico"

IMPACTO DEL CAMBIO (COSTO, PLAZO, ALCANCE)

ALCANCE:

No aplica

PLAZO:

Cuatro (4) meses adiconales para un plazo total de once (11) meses y fecha de finalizacion 11 de agosto de 2024

COSTO:

Una adicion de ($6.866.576.500) para un presupuesto final de ($20.599.729.500)

UNA VEZ REVISADO Y VERIFICADO, INTERVENTORIA APRUEBA LA PROPUESTA ?: SI: [ ] NO: [ ]

SOLICITA:

FECHA:

FIRMA:	
NOMBRE:	LUIS ALFREDO GRANADOS
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
N°CONTRATO:	CO- IDRD 3099-2023
	CONTRATISTA

FIRMA:	
NOMBRE:	EDNA CONSTANZA CEPEDA
CARGO:	DIRECTORA DE INTERVENTORIA
N°CONTRATO:	CO-IDRD-3131-2023
	INTERVENTORIA

N° ANEXOS INCLUIDOS (Folios): 7

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 23 de mayo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-390

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta comunicado IDRD-3131-2024-377-Ajustes solicitados.

Cordial Saludo

Atendiendo las observaciones realizadas, queremos informarles que se realizaron los ajustes requeridos en el presupuesto, cronograma de obra y plan de adquisiciones. Estos documentos fueron remitidos por medio de correo electrónico hacia ustedes el día 22 de marzo del presente año. Quedamos atentos a su revisión.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal
Anexo: Cero (0) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

	SANTAFE	ZONA BAÑO INFANTIL	$ 24.178.131	$ 257.133.484,37	GRUPO 1
		ZONA BAÑO DE LA 36	$ 12.397.680		
		ZONA BAÑO FISCALES 1	$ 62.009.246		
		ZONA BAÑO FISCAL 2	$ 28.272.814		
		ZONA ADMINISTRACION	$ 16.368.324		
		ZONA ELECTRICO ACOMETIDAS	$ 100.406.228		
		ZONA ADMON ELEC	$ 13.501.061		
RIO	SANTAFE	ZONA BIOS	$ 12.910.131	$ 28.052.626,60	GRUPO 1
		ZONA GRECOS	$ 11.876.598		
		ZONA CAJA	$ 1.067.222		
		ZONA BANCAS	$ 2.198.676		
	SUBA	ZONA DE JUEGOS INFANTILES	$ 6.774.225	$ 6.774.225,40	GRUPO 1
	BARRIOS UNIDOS	ZONA VAGONES ELECTRICO	$ 61.606.175	$ 100.938.538,02	GRUPO 1
		ZONA MODULO	$ 7.406.011		
		ZONA VAGONES OBRA	$ 31.926.352		
	MARTIRES	ZONA SENDERO	$ 13.049.633	$ 13.049.633,44	GRUPO 2
	SAN CRISTOBAL	ZONA GRECOS	$ 36.075.897	$ 36.075.896,53	GRUPO 2
	SAN CRISTOBAL	ZONA CANCHA MULTIPLE	$ 224.087.266	$ 224.087.266,42	GRUPO 2
	TUNJUELITO	ZONA SENDERO RUTA DE LA VIDA	$ 59.064.095	$ 288.383.657,52	GRUPO 2
		ZONA SENDERO A PORTERIA	$ 30.423.642		
		ZONA TUB SANI CANCHA TENIS Y PORTERIA	$ 25.576.374		
		ZONA BAÑOS TENIS Y PORTERIA	$ 78.743.711		
		ZONA PORTERIAS	$ 94.575.836		
	CUIDAD BOLIVAR	CAJAS HIDRAULICAS	$ 13.871.152	$ 13.871.152,30	GRUPO 2
YO	SAN CRISTOBAL	ACOMETIDA TRANSFORMADOR	$ 36.191.232	$ 36.191.232,00	GRUPO 2
	USME	ZONA BIOS	$ 11.270.759	$ 11.270.759,35	GRUPO 3
	ANTONIO NARIÑO	ZONA ALFRENTE COLISEO JUEGOS	$ 407.403.648	$ 455.703.603,71	GRUPO 3
		ZONA M-5	$ 48.299.955		
	KENNEDY	ZONA FACHADA	$ 73.648.956	$ 73.648.956,22	GRUPO 3
	KENNEDY	ZONA JUEGOS	$ 412.086.618	$ 485.905.217,17	GRUPO 3
		ZONA M-5	$ 10.115.515		
		ZONA BIOS	$ 23.746.107		
		ZONA CANCHA FUTBOL	$ 39.956.977		

	RAFAEL URIBE	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	$ 58.188.869	$ 58.188.869,00	GRUPO 4
	FONTIBON	ZONA PARQUEADERO ELECTRICO	$ 190.254.470	$ 190.254.469,78	GRUPO 5
		ZONA PATINODROMO ELECTRICO			
		ZONA CANCHA MULTIPLE ELECTRICO			
		ZONA PISTA DETROTE ELECTRICO			
		ZONA PASILLO PISCINA ELECTRICO			
	FONTIBON	ZONA JUEGOS INFANTILES	$ 424.622.300	$ 424.622.299,68	GRUPO 5
	FONTIBON	ZONA JUEGOS ARREGLOS	$ 16.883.100	$ 61.427.359,51	GRUPO 5
		ZONA BIOSALUDADBLES	$ 44.544.260		
	ENGATIVA	ZONA JUEGOS	$ 162.690.845	$ 219.902.893,68	GRUPO 5
		ZONA MODULOS	$ 55.919.011		
		ZONA ELECTRICO	$ 1.293.038		
	ENGATIVA	ZONA FUTBOL 11 ELECTRICO (RETIE Y RETILAP)	$ 54.584.466	$ 54.584.465,76	GRUPO 5
	ENGATIVA	ZONA FUTBOL 11 ELECTRICO (RETIE Y RETILAP)	$ 60.195.180	$ 60.195.179,76	GRUPO 5
	ENGATIVA	ZONA MOBILIARIO	$ 6.570.697	$ 11.459.012,12	GRUPO 5
		ZONA BIOS	$ 4.888.315		
	SUBA	ZONA GRECOS	$ 17.374.274	$ 55.981.065,30	GRUPO 5
		ZONA CANCHA TENIS	$ 33.674.949		
		ZONA JUEGOS	$ 4.931.843		
	SUBA	MANTENIMIENTO LOCATIVO	$ 29.956.200	$ 29.956.200,00	GRUPO 5
etas	SUBA	ZONA CERRAMINETO	$ 71.994.873	$ 198.543.832,74	GRUPO 5
		ZONA CERRAMIENTO CONTRA CONJUNTO	$ 68.017.842		
		ZONA CERRAMIENTO COSTADO NORTE	$ 58.531.117		
za	SUBA	ZONA JUEGOS	$ 329.297.390	$ 338.971.958,79	GRUPO 5
		ZONA TUNEL	$ 2.060.192		
		ZONA SENDEROS	$ 7.614.376		
	SUBA	SENDERO DE TROTE	$ 53.489.621	$ 90.954.107,07	GRUPO 5
		ZONA BIOS Y GRECOS	$ 37.464.486		
		ZONA PORTON	$ 10.992.671	$ 10.992.671,00	GRUPO 4
	VARIAS	CUIDAD MONTES	$ 940.608	$ 55.085.196,17	GRUPO 4
		TERCER MILENIO	$ 5.310.987		
		LA GAITANA	$ 6.578.825		
		TUNAL	$ 1.735.820		
		BOSA RECREO	$ 4.615.316		
		PTRA SALITRE	$ 24.113.135		
		SAN CRISTOBAL	$ 1.429.185		
		CEFE SAN CRISTOBAL	$ 799.367		
		CUIDAD JARDIN	$ 4.673.106		
		CIELITA JIMENEZ	$ 226.647		
		TUNAL ELECTRICO	$ 1.980.000		

		ZONA GRADERIAS	$	55.354.327	
		ZONA FACHADA	$	15.511.611	
		ZONA CAMERINOS	$	16.268.122	
		ZONA PRENSA	$	4.084.959	
		ZONA COMIDAS	$	7.411.689	
		ZONA CERRAMIENTO	$	7.041.049	
		ZONA PALCOS	$	25.175.622	
207	PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA	ZONA PALCOS ELECTRICO	$	293.502.775	$
		ZONA POSTERIRO ESTADIO	$	1.110.141	
		ZONA BAÑOS	$	56.359.634	
		ZONA SEÑALES	$	65.247.554	
		ELECTRICO	$	41.772.022	
		ZONA ADMON	$	4.104.328	
		ZONA RECOGE PELOTAS	$	10.471.323	
		ZONA COLCHONETAS FORROS BAFLES	$	33.164.377	
		ZONA BIOS	$	18.741.029	
		ZONA SENDERO	$	167.059.699	
		ZONA GRECOS 1	$	26.548.693	
		ZONA GRECOS 2	$	35.058.895	
		ZONA RUTA DE LA VIDA	$	5.042.135	
		ZONA RUTA DE LA VIDA BMX	$	2.782.178	
		ZONA JUEGOS	$	62.499.214	
·063	EL TUNAL	ZONA CASA ADULTO MAYOR	$	56.920.823	$
		ZONA CASA ADULTO MAYOR ELECTRICO	$	8.794.343	
		ZONA PORTERIAS	$	90.066.222	
		ZONA BMX	$	235.579.015	
		ZONA CANCHA FUTBOL 11	$	51.585.047	
		ZONA PLAZOLETA EVENTOS	$	47.542.766	
		ZONA PLAZOLETA EVENTOS ELECTRICO	$	9.124.244	
		ZONA PROP PARKOUR 1	$	288.749.870	
		ZONA PLAZOLETA BOLIVAR	$	5.528.232	
		ZONA SKATE PARK	$	4.482.350	
		ZONA BIOS 1	$	2.460.809	
		ZONA CANCHA MICRO SINT	$	338.905	
788	MIRADOR DE ILIMANI	ZONA SENDERO	$	828.281	$
		ZONA MIRARDOR PIEDRA	$	832.871	
		ZONA DE BIOS 2	$	4.770.001	
		ZONA INFANTIL	$	7.273.132	
		ZONA MODULO BAÑOS Y CAFETERIA	$	199.704.526	
		ZONA COLISEO	$	30.525.159	
		ZONA ESP. PUBLICO	$	2.069.995	
·017	NUEVO MUZU	ZONA ADMINSTRACION	$	1.351.650	$
		ZONA JUEGOS	$	796.130.857	
		ZONA MODULO DE LECTURA	$	1.687.853	
		ZONA BAÑOS	$	12.419.121	
		ZONA CANCHA SINTETICA	$	3.659.841	
		ZONA CANCHA SINTETICA ELECTRICO	$	6.285.838	
035	LAURELES NARANJOS	ZONA BAÑOS	$	1.063.360	$
		ZONA GRECOS	$	11.372.806	
		ZONA CUBIERTA	$	1.525.875	
·391	PORVENIR	ZONA MODULO SANITARIO	$	16.876.094	$
		ZONA GRADERIA NORTE	$	3.198.524	
		ZONA GRADERIA ORIENTAL	$	7.681.828	
		ZONA CAMERINOS	$	329.121	
·554	ESTADIO DE TECHO	ZONA GRADERIAS OCC	$	9.547.044	$
		ZONA PALCOS	$	4.661.896	
		ZONA CAMERINO SUR	$	31.227.868	
		ZONA PUERTA PORTERIA	$	124.331	
		ZONA BAÑO OBRA CIVIL	$	12.734.940	
		ZONA COLISEO ELECTR	$	17.205.024	
		ZONA PISTA DE PATINAJE	$	192.369.179	
040	LA FRAGUA	ADMON ELECTRICO	$	7.131.893	$
		ZONA JUEGOS NUEVA	$	655.702.219	
		ZONA JUEGOS EXISTENTE	$	5.536.010	
		ZONA CERRAMIENTO	$	224.515.066	
		ZONA JUEGOS	$	1.489.257	
·112	CUIDAD MONTES	ZONA BIOS	$	29.272.142	$
		ZONA RUTA DE LA VIDA	$	13.455.782	
		ZONA FUENTE ELECTRICA	$	4.896.417	

-241	CAYETANO CAÑIZARES	ZONA FACHADA VERDE	$	77.133.802	$
		ZONA ELECTRICO	$	98.901.913	
028	BOSQUE SAN CARLOS	ZONA ADMON	$	17.785.424	$
		ZONA BAÑOS	$	39.470.505	
		ZONA BALONCESTO	$	10.656.415	
		ZONA CASA VERDE	$	2.298.029	
		ZONA JUEGOS 1	$	565.082.868	
		ZONA GIMANASIO 1	$	221.764.377	
		ZONA BIOSALUDABLES	$	21.504.484	
		ZONA JUEGOS 2	$	79.167.412	
		ZONA CASETA	$	38.958	
290	UDS	ZONA SOFTBOL (A)	$	414.513.404	$
		ZONA BESISBOL (B)	$	645.656.908	
		ZONA VELODROMO	$	16.373.891	
-091	PRD EL SALITRE -UCAD	ZONA TENIS	$	123.612.223	$
		ZONA COMIDAS	$	15.810.810	
		ZONA UCAD	$	161.274	
		ZONA OFICINAS	$	20.509.825	
		ZONA HOCKEY ELECTRICO	$	31.797.019	
		ZONA CANCHA	$	156.272.310	
		ZONA CANCHAS ARENA	$	8.087.224	
		ZONA ELECTRICO-SUBES_A_HOCKEY	$	22.857.340	
		ZONA POLICIA	$	9.785.085	
-141	PARQUE DE LOS NIÑOS	ZONA CANCHAS ARENA	$	1.200.017.358	$
		ZONA ARENEROS (MOBILUS+ ARENERO GRANDE)	$	3.165.970	
		ZONA BEBEDEROS	$	4.025.465	
		ZONA LAVA PIES	$	7.310.761	
		ZONA PARQUEADERO	$	166.748.548	
		ZONA ILUMINACION ELECTRICO	$	57.022.212	
		ZONA SEÑALES EMERGENCIA	$	3.623.829	
089	SIMON BOLIVAR	ZONA TANQUES	$	293.306.437	$
		ZONA BEBEDEROS	$	59.668.461	
		ZONA MOBILIARIO	$	46.964.940	
		ZONA KIOSKOS	$	96.649.177	
		ZONA COLUMPIOS	$	2.656.994	
		ZONA BARANDA LAGO	$	15.915.664	
		ZONA JUEGOS 2	$	4.734.072	
		ZONA TEMPLETE	$	27.189.966	
		ZONA BAÑOS	$	13.774.351	
		ZONA BAÑOS MANA	$	28.061.204	
-196	DEPORTIVO PRIMERO DE MAYO	ZONA BAÑOS VELODROMO	$	737.526	$
		ZONA BAÑOS COLISEO	$	2.603.519	
		ZONA COLISEO	$	13.928.117	
		ZONA VELODROMO	$	686.781.099	
030	EDUARDO SANTOS	ZONA CUBIERTA	$	3.051.824	$
		ZONA ESCALERA	$	2.619.227	
		ZONA BAÑOS	$	47.435.629	
		ZONA PUERTAS	$	2.690.836	
		ZONA CANCHA	$	241.557	
		ZONA BIOS	$	36.244.706	
		ELECTRICO	$	28.226.985	
023	SERVITA	ZONA BAÑOS	$	2.809.750	$
		ZONA ELECTRICO	$	595.694.587	
		ZONA MOBILIARIO	$	1.077.178	
075	ALTA BLANCA	ZONA CERRAMIENTO	$	6.692.690	$
		ZONA BAÑOS	$	1.861.483	
		ZONA PISTA DE PATINAJE VELOCIDAD	$	57.207.525	
		ZONA PISTA DE PATINAJE	$	478.466	
		ZONA SEÑALES	$	1.360.130	
		ZONA ADMON	$	66.848.066	
-014	CANAL EL VIRREY- EL CHICO	ZONA MOBILIARIO	$	25.643.068	$
		ZONA ADOQUIN	$	72.186.364	






092	PARQUE DE LOS NOVIOS	ZONA MOBILIARIO	$	12.233.052	$
		ZONA SEÑALES	$	10.060.889	
		ZONA JUEGOS	$	9.455.220	
		ZONA BAÑOS	$	50.569.347	
		ZONA TUNEL	$	22.180.649	
		ZONA ELECTRICO	$	1.466.114	
-122	LA VICTORIA	ZONA MODULO BAÑO	$	12.177.092	$
		ZONA MODULO ADMON	$	16.480.599	
		ZONA GRECOS	$	11.501.903	
-016	EL VIRREY SUR	ZONA PISCINA	$	13.469.197	$
		ZONA ADULTO MAYOR	$	2.206.813	
		ZONA BIOS	$	15.168.512	
		ZONA AJEDREZ	$	330.939	
		ZONA GRECOS	$	14.684.376	
		ZONA MOBILIARIO	$	20.021.353	
		ZONA JUEGOS	$	43.400.373	
		ZONA SEÑALES	$	1.199.069	
-087	VILLA ALEMANA	ZONA CERRAMINETO	$	20.402.574	$
		ZONA PROP. MURO	$	1.716.034	
		ZONA MOBILIARIO	$	9.864.138	
		ZONA SENDERO	$	2.030.651	
		ZONA PORTON	$	3.094.954	
002	CANAL DEL RIO NEGRO	ZONA RODADEROS	$	11.633.372	$
		ZONA CANCHA	$	31.476.452	
-552	GILMA JIMENEZ	CANCHA CINTETICA 5A, DE FUTBOL 5	$	39.434.469	$
		CANCHA CINTETICA 5B, DE FUTBOL 5	$	33.976.424	
		CANCHA CINTETICA DE FUTBOL 8	$	161.783.128	
		ACOMETIDA CANCHAS	$	96.726.160	
		PATINAJE	$	1.726.833	
368	FONTANAR DEL RIO	PROP PARKOUR 2	$	417.895.679	$
		ZONA MODULOS	$	44.056.094	
-050	CANAL BOYACA	ZONA JUEGOS P1	$	943.398.259	$
15	PARQUE NACIONAL	ZONA JUEGOS	$	41.685.116	$
-103	GAITAN CORTES	ZONA JUEGOS MANTENIMIENTO	$	6.496.950	$
078	SAN JOSE DE BAVARIA	ZONA RUTA DE LA VIDA	$	5.534.534	$
		ZONA BIOS 1	$	9.098.245	
		ZONA INFANTIL	$	3.982.824	
		ZONA BIOS 2	$	5.967.788	
RIOS	EMERGENCIAS EJECUTADAS	ATAHUALPA	$	28.696.819	$
		ESTADIO TABORA	$	15.603.586	
		CEFE TUNAL	$	1.328.600	
		LA SERENA	$	2.596.738	
		LA ESTACION	$	1.784.962	
		CANDELARIA LA NUEVA	$	205.948	
		POLIDEPORTIVO MEISSEN	$	123.568	
		PATIO BONITO	$	164.758	
		ESTADIO OLAYA HERRERA	$	21.671.647	
		CEFE SAN CRISTOBAL	$	2.195.613	
		TUNAL	$	2.661.314	
		GIMANASIO SUR OLAYA	$	3.959.659	
		CEFE FONTANAR DEL RIO	$	11.970.729	
		COMETAS	$	37.558.183	
		SAUZALITO	$	205.948	
		VIRREY SUR *	$	164.758	
		LA GAITANA*	$	1.033.528	
		LA AURORA	$	2.227.240	
		RENACIMIENTO	$	3.408.186	
		AUTOPISTA SUR PAVCO	$	82.378	
		SIMON BOLIVAR*	$	912.938	
		ESTADIO EL CAMPIN	$	3.659.175	
		SAN ANDRES	$	5.004.562	
		TECHO (ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL TECNICO)*	$	2.000.000	
		PRD(CERRAMIENTO CONTRACTUAL Y OTRO NP	$	21.222.787	




RIOS	VALLAS	VALLAS 6X3	$ 187.184.372	$
RIOS	MANTENIMIENTO ASCENSORES	Mantenimiento de ascensores con capacidad para 675 kg, de 2 a 3 paradas por ascensor (Schindler)	$ 31.817.350	$
		Mantenimiento de ascensores con capacidad DE 750 A 1000 kg, 2 paradas por ascensor (Schindler)	$ 53.962.850	
		Mantenimiento de ascensores con capacidad para 7 personas o 1000 kg por ascensor (Otis)	$ 12.500.998	
RIOS	VINILOS PISCINAS	VINILOS PISCINAS	$ 62.067.850,00	$


VALOR PRESUPUESTOS	$ 13.
VALOR DEL CONTRATO	$ 13.
DIFERENCIA	$

ANEXO 9. SALIDAS NO CONFORMES

:ENCIAL	Plan de Calidad	No se cumplió con la meta del indicador de "Entrega de informes documentales"" del 80%, teniéndose un resultado del 60% para el mes de noviembre de 2023	N/A	establecido. 2. ¿Por qué el equipo existente no pudo completa ea a tiempo? R:Falta de habilidades específicas: Al ser el pr nforme el equipo no contaba con la experiencia según los parámetros del IDRD. 3. ¿Por qué el equipo carecía de recursos suficientes? R: Se determina que el personal esta incapacitado por lo que se propone generar la búsqueda de personal de apoyo para la generación de informes a fin de cumplir a cabalidad el contrato.	ausencia del personal incapacitado. 2. Verificar las competencias y conocimiento del personal validado 3. Buscar profesionales que puedan desarrollar las funciones dentro del contrato y con conocimiento en contratos con el IDRD	Si
:STION :LIDAD	PROCEDIMIENTO -MANEJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Se ejecuta apertura de la no conformidad toda vez que se remitieron documentos desactualizados de certificados de calibración de los equipos de topografías y no se realizaron chequeos quincenales.	N/A	Se ejecuta un análisis de causas: 5 porque: 1. ¿Por qué no se consideró generar una revisión previa a los certificados antes del envío? R: Porque el consorcio considera la actualización de sus certificados mínimo una vez al año. 2. ¿Por qué los certificados de los equipos tienen fechas de vencimiento menor a un año? R: Porque el proveedor de calibración recomienda un ciclo de calibración semestral para los equipos. 3 ¿Por qué dentro del certificado se recomienda la calibración cada 6 meses? R: Porque los equipos o instrumentos específicos requieren una calibración más frecuente para mantener la precisión. 4 ¿Por qué no se consideró la recomendación del certificado de calibración? R: Porque no se consulto con el profesional de topografía. ¿Por qué no se tuvo en consideración preguntar al profesional de topografía sobre la necesidad de calibración? R: Porque no se han ejecutado pruebas de Topografía en el contrato por onde se omitió la consulta y revisiones adicionales.	Corrección: Solicitar la inmediata calibración de los equipos de calibración según la recomendación del certificado y según consulta al profesional de topografía y enviar la nueva documentación a la interventoría previamente revisada. Plan de accion:Generar una revisión adicional por parte de la persona encargada de la emisión de folios al canal. Realizar una capacitacion al topografo con relacion a los controles qie se deen realizar a estos equipos.	Si
MPRAS	PLAN DE CALIDAD	El plan de adqusiciones presentado en el informe No. 3 de Gestion de Calidad, no cumple con los parametros establecdios por el cliente para reralizar el seguimiento a las compras programadas durante la ejecuion del proyecto	Se incluye en anexo 5 plan de adquisiciones el cual corresponde a diciembre, periodo no correspondiente a este informe Se retira que el plan de adquisiciones permite realizar seguimiento a los insumos críticos de obra y su fecha de necesidad en campo(DOCUMENTO QUE PRESENTE LA PLANIFICACION DE LAS COMPRAS) el documento indicado en anexo 5 no presenta este seguimiento mes a mes ni describe los insumos críticos correspondientes al proyecto, con fecha de necesidad y el seguimiento mes a mes. Se debe realizar la documentacion de accion correctiva frente a este hallazgo y en informe N°4 se verificara cumplimiento, se debe presentar todos los soportes y seguimiento desde inicio de obra	Se ejecuta un análisis de causas: 5 porque: 1. ¿Por qué no se consideró necesario incluir todos los mese sen el seguimiento realizado? R: Porque el consorcio considero solo pasar las compras del mes. 2. ¿Por qué se presentaron solo las compras del mes? R: Porque se desconocian los requsitos para realizar el seguimiento. 3 ¿Por qué se desconocian los requsitos para realizar el seguimiento? R: Porque no se realizo capcitacion al responsable del proceso al respecto.	Corrección: Cambiar el registro de plan de adquisiciones y presentarlo a la interventporia para revision y aprobacion me diante oficio. Plan de accion:Realizar una acapcitacion a la responsable del proceso de compras acerca del seguimiento que se debe realizar a las compras y los soportes que se deben entregar mensualmente. Incluir seguimiento en el einforme de enero de todo el plan de adquisiciones desde septiembre. Aapartir de febrero incluir incluir el seguimiento por mes	Si
CNICO	PLAN DE CALIDAD	No se evidencia el uso de una herramienta formal para liberar las actividades que se ejecutan en el pryecto, aunque se cuenta con liberaciones en la bitacora.	Se debe presentar la evidencia de control y seguimiento, liberacion parcial o total por parte de la interventoria siendo coherente con lo especifo en el plan de calidad V 4, se realiza la documentación de acción correctiva frente a este hallazgo y se revisará su implementación y soportes en informe 4 Se presenta la evidencia de control y manejo de la propiedad del cliente se verificara en informe 4 la presentación del registro de IDRD firmado por las partes	Se ejecuta un análisis de causas: 5 porque: 1. ¿Por qué no se consideró necesario crear un formato para dejar evidencia de esta actividad? R: Porque se contemplo hacer liberaciones en bitácora. 2. ¿Por qué se contemplo hacer liberaciones en bitácora? R: Porque los residentes son responsables de realizar la liberación y la bitácora es un registro propio de obra. 3 ¿Por qué no fue suficiente la liberación en bitácora? R: Porque no se encuentra el registro de liberación de todas las actividades ejecutadas. 4 ¿Por qué no se encuentra el registro de liberación de todas las actividades ejecutadas? R: Porque se dificulta la liberación por la cantidad de frentes. ¿Por qué no se tuvo en consideración l cantidad de frentes? R: Porque aunque se cuenta con el personal requerido por el cliente, la	Corrección: Realizar un consolidado de las actividades liberadas en bitácora e incluirlas en el informe 4.. Plan de accion:Generar un listado de la totalidad de las actividades ejecutadas entre septiembre y diciembre y realizar una liberación general., incluirlo en el informe de enero. A partir de enero implementar un formato de liberación de actividades.	SI


CNICO	Ejecucion obra	Al realizar inspeccion en pista de patinaje en el Parque La Fragua, se evidencia afectacion de la subrasante		R: Porque no cumple con las especificaciones para continuar con la actividades. 2. ¿Por qué no cumple? R: Porque esta saturada. 3 ¿Por qué esta saturada? R: Por la cantidad de lluvia que se ha tenido en esta semana.	retirar el material, realizar nueva compactacion y nivelación. Plan de accion: Teniendo en cuenta la temporada de lluvias colocar un plastico para proteger el material.	Si
CNICO	Ejecucion obra	En fundida del 2 de febrero de placa zona infantil, se deterior el adoquin del sendero de acceso.		Se ejecuta un análisis de causas: 5 porque: 1. ¿Por qué se debe repara el adoquin de sendero? R: Porque se deterioro el dia que se fundio la placa.. 2. ¿Por qué se deterioro? R: Porque el minicaragador entro por el sendero para transportar el concreto al sitio de fundida. 3 ¿Por qué ingreso el minicargador popr el sendero? R: Por no hay mas acceso a la zona infantil.	Corrección: Levantar el adoquin fracurado y reemplazarlo. Plan de accion: Presentar a interventoria para revision.	Si
CURSO IMANO	Plan de Calidad	No se encontró documentación de soporte durante la inspección de los archivos de recursos humanos y gestión de calidad relacionados con la definición de competencias, habilidades, educación y experiencia requeridas para el cargo de Topógrafo, incumpliendo así lo estipulado en la cláusula 7.2 de la Norma ISO 9001:2015 sobre competencia		Se ejecuta un análisis de causas: 5 porque: 1. ¿Por qué no se encontro perfil fel topografo? R: Porque este cargo es contractual y esta definido por el cliente. 2. ¿Por qué no estan definidas los demas aspectos del cargo? R: Porque no se incluyo en el plan de calidad. 3 ¿Por qué no se incluyo en el plan de calidad? R: Porque no era requisito del cliente y el consorcio no cuenta con un SGC implementado.	Corrección: Organizar los registros de cumplimiento del perfil de cargo del topografo para facilitar su recuperacion. Plan de accion: Crear un formato para implementar en el consorcio donde se definan las competencias, habilidades, educación y experiencia requeridas para los principales catgos del proyecto .	Si
CNICO	Plan de Calidad	Se identifico en el recorrido la construcción de las cenefas de confinamiento del Parque El Tunal y no se cuenta con su correspondiente esquema de liberación. Esta falta de información crucial impide verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas y si los procedimientos de control y liberación cumplen con los estándares de calidad y seguridad establecidos		Se ejecuta un análisis de causas: 5 porque: 1. ¿Por qué no se consideró necesario crear un formato para dejar evidencia de esta actividad? R: Porque se contemplo hacer liberaciones en bitácora. 2. ¿Por qué se contemplo hacer liberaciones en bitácora? R: Porque los residentes son responsables de realizar la liberación y la bitácora es un registro propio de obra. 3 ¿Por qué no fue suficiente la liberación en bitácora? R: Porque no se encuentra el registro de liberación de todas las actividades ejecutadas. 4 ¿Por qué no se encuentra el registro de liberación de todas las actividades ejecutadas? R: Porque se dificulta la liberación por la cantidad de frentes. ¿Por qué no se tuvo en consideración la cantidad de frentes? R: Porque aunque se cuenta con el personal requerido por el cliente, la distancia entre frentes no permite el 100% en cada frente .	Corrección: Realizar un consolidado de las actividades liberadas en bitácora e incluirlas en el informe 7. Plan de accion:Generar un listado de la totalidad de las actividades ejecutadas entre septiembre y diciembre y realizar una liberación general, incluirlo en el informe de marzo.	Si
CNICO	Plan de Calidad	Durante la revisión de los documentos y registros relacionados con la instalación de las zonas de Biosaludables en el Parque San Carlos, se identificó la falta de evidencia sobre la obtención del aval del cliente respecto al uso de un producto no conforme identificado en dicho proyecto. Asimismo, no se han		Se ejecuta un análisis de causas: 5 porque: 1. ¿Por qué no se encontraron los soportes de notificacion y aprobacion de cambio de colores de los biosaludables? R: Porque no se tiene claridad de donde se registro esta informacion. 2. ¿Por qué no claridad de donde esta la informacion? R: Porque se desconoce el tratamiento de SNC. 3 ¿Por qué se desconoce el tratamiento de las SNC? R: Porque falta capaitacion en el proceso y repsc :s del mismo.	Corrección: Revisar las actas de comité y buscar los soportes de notificacion y aprobacion de los colores de los juegos del Parque San Carlos, registrar ela SNC. Plan de accion: Realizar una capacitacion a los residentes acerca del tratamiento de las SNC .	Si

CNICO	Ejecucion obra	La interventoria mediante carta IDRD-3131-2023-360 solicta subsanación daños causados por el paso de maquinaria en el Parque de Los Niños		1. ¿Por que se presentaron los danos? R: Porque los trabajadores que ejecutaron la ac no la precaucion al mover la maquinaria. 2. ¿Por qué no aplicaron las especificaciones? R: Porque falto supervision. 3 ¿Por qué falto supervision? R: Porque el residente se encontraba en otro frente dentro del mismo parque al momento de los desplazmientos de maquinaria.	Corrección: Ingresar una cuadrilla para renivela rel adoquin, reparar tuberia y modulos sueltos en baños.	si
CNICO	Ejecucion obra	El 18 de abril mediante nota 122 de la bitacora la Residente del parque La Fragua evidencia grietas en el asfalto de la pista de patinaje, el 18 de abril la Interventoria registra nota 123 solcitando la reparacion.		Se ejecuta un análisis de causas: 5 porque: 1. ¿Por qué se tiene mal acabado? R: Porque se realizo con una mezcla que deja mas espacio entre los agregados. 2. ¿Por qué se uso esta mexcla? R: Porque era la especificada en el item como reuqisto contractuakl.	Corrección: Aplicar sluring con emulsion asfaltica y revisar acabado antes de pintar.	En ejecucion
CNICO	Programa de obra	La interventoria mediante carta IDRD-3131-2023-367manifiesta NO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION Y CIERRA DE OBRAS EN EL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO/INICIO DE OBRAS FRENTES PRIORIZADOS EJECUCION EN TIEMPO PRORROGADO		Se ejecuta un análisis de causas: 5 porque: 1. ¿Por qué no se cumplio con los plazos en la etapa inicial? R: Porque los items con mayor peso son los insumos que vienen importando y se presento un problema en al proceso que no se puede solcuionar por parte del contratista. 2. ¿Por qué no Inicíaron los trabajos de la segunda etapa del contrato oportunamente? R: Porque la adicon y prorroga fue incierta hasta el ultimo dia y no fue posible realizar una planificacion adecuada por desconocimiento de los nuevos frentes a intervenir.. 3 ¿Por qué se desconocien los frentes? R: Porque falto planificacion.	Corrección: Inclusion de cuadrillas de obra y especializadas, incluison de maquinaria adicional, extencion de jornadas laborales, reprogramacion de actividades sin alterar fecha de terminacion contractual del proyecto y ajuste en los procedimietos de compras para tener holguras en la llegada de materiales y juegos.	En ejecucion
CNICO	Ejecucion obra	La interventoria en actas de comité No. 26 y 27 solcita atención de las siguientes SNC:				
		COMPONENTE ELECTRICO:				
		Resanar y limpiar cajas y cubrir tuberia expuesta - UDS beisbol		Se ejecuta un análisis de causas: 5 porque: 1. ¿Por qué se tiene mal acabado? R: Porque los trabajadores que ejecutaron la actividad no aplicaron las especificaciones. 2. ¿Por qué no aplicaron las especificaciones? R: Porque falto supervision. 3 ¿Por qué falto supervision? R: Porque no se reviso el acabado antes de entregar al cliente.	Corrección: Realizar las reparaciones y dejar evidencia fotografica de los arreglos.	Si
		Ajustar toma corriente - Eduardo Santos				Si
		Resane tuberia expuesta y ajustar caja de paso electrica-Novios				Si
		COMPONENTE TÉCNICO:				
		Rematar muretes de tablero electrico futbol 11 y colocar tapa de caja de paso BMX-tunal				Si
		Intalar rejillas de piso perdidas en coliseo - Eduardo Santos				Si

				trabajos de los otros parques.		
CNICO	Ejecucion obra	En oficio IDRD-3131-2023-416 del 17/05/24, la interventoria realiza observaciones en acabados superficial Pinturas sobre elementos metálicos en el parque Tunal		1. ¿Por qué se presentan observaciones a los acabados? R: Porque en recorrido la interventoría evidencio desprendimiento de pintura y zonas de estructuras mal terminadas 2. ¿Por qué se desprende la pintura? R: Porque después de pintar la estructura llovió, lo que no permitió el secado adecuado. 3 ¿Por qué se presentan malos acabados (soldaduras sin lijar, falta de topes, manchas en bases de estructuras)? R: Porque el contratista no atendido las observaciones que realizo el residente de obra al momento de recibirle los trabajos 4 ¿Por qué no atendio el contratista las reparaciones? R: Porque programo personal para realizar los trabajos sin interferir en los trabajos de los otros parques.	Corrección: Realizar un recorrido con el conrtratista y solcitar reparaciones punto a punto de cada SNC. Con el fin de noa fectar los trabajos de los otros parque se programan reparacion es a partir del 30 de mayo de 2024	Si


SNC 21


SALIDA NO CONFORME No.21: En oficio IDRD-3131-2023-416 del 17/05/24, la interventoría realiza observaciones en acabado superficial Pinturas sobre elementos metálicos en el parque Tunal como se muestra en la siguiente tabla:

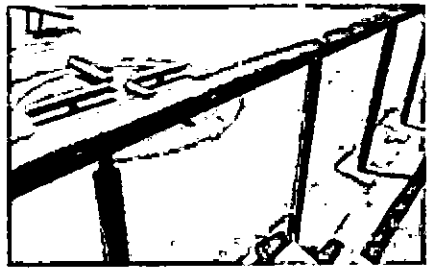HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
VERIFICACIÓN PINTURA EN SITIO. Durante recorrido al sitio de las obras, se evidencia que la pintura no tiene adherencia y se desprende al contacto. El color no corresponde al requerido en las especificaciones técnicas IDRD.  	13-05-24 al 15-05-24	     	Se considera eficaz el arreglo ya que a la fecha de cierre del informe no se han presentado más inconvenientes con el acabado de la estructura metálica

SNC 20


SALIDA NO CONFORME No.20: En oficio IDRD-3131-2023-415 del 17/05/24, la interventoría realiza observaciones en acabado superficial Pinturas sobre elementos metálicos en el parque Bosque San Carlos como se muestra en la siguiente tabla:


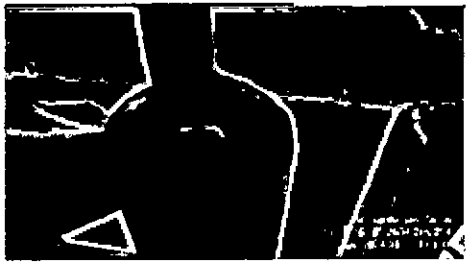
HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
VERIFICACIÓN PINTURA EN SITIO. Se trabajó sobre parales de baranda existente en una de las zonas de juegos infantiles del parque en forma de media luna, Durante recorrido al sitio de las obras, se evidencia que el tratamiento previo a la superficie no fue el adecuado, pues se evidencia oxidación en los tapones que sostienen la platina de la tubería horizontal de 3", esto se mantienen en el 90% de los parales. Lo anterior ocasiona que la pintura no se adhiera convenientemente al elemento metálico. 			actividades de reparacion programadas a partir de 30 de mayo de 2024, Seguimiento programado segunda semana de junio

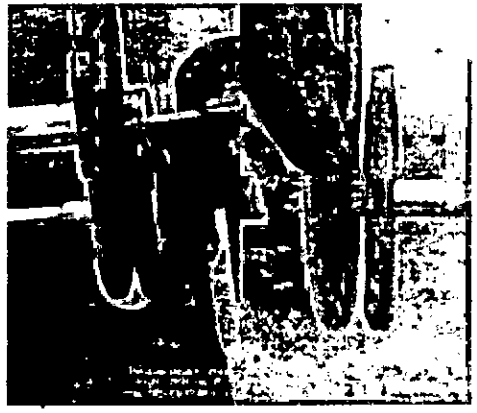
HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
VERIFICACIÓN PINTURA EN SITIO. Se realizó verificación en dos sitios, primero junto a Ruta de la vida zona sur del parque. Los equipos suministrados se tienen un combo de equipos nuevos y otro de equipos a los que se les está realizando mantenimiento. Para los equipos nuevos, en los platos de los contrapesos presentan oxidación prematura, se debe mejorar recubrimiento de la pintura para evitar deterioro prematuro 			


HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
Las platinas de soporte de tubería pasamanos horizontal no cuentan con un acabado adecuado, no se realizó limpieza adecuada a las superficies antes de aplicación de pintura y muestra mucha irregularidad.   La superficie de los elementos no es homogénea, se debe garantizar una superficie limpia y lisa. 			

HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
No se terminó de realizar aplicación de pintura en la base del paral de baranda y cuando se realizó la actividad mancharon con pintura el piso caucho instalado.   Paral desplomado, tiene una diferencia de 4 cm de desplome desde parte superior a la parte inferior del módulo de malla eslabonada. 			

HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
Para los equipos en mantenimiento, se debe tener cuidado en no foguear o manchar las superficies ya pintadas con colores distintos de otros componentes que se están pintando con un color diferente.  En la pintura del piso (Pintura tipo tráfico), se debe tener cuidado de no manchar los equipos, ni sus platinas de apoyo.  En esta misma zona, las placas de los pisos presentan acabado superficial en unos sectores con baja planicidad, se debe mejorar las irregularidades en la superficie. (más de 2mm) 			

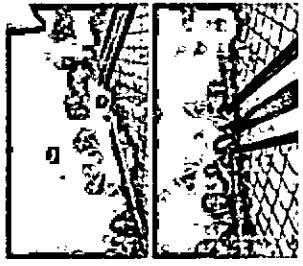HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
Barandas segunda Zona de Juegos infantiles Se presentan defectos por falta de limpieza, lijado y preparación en la superficie del sustrato donde se aplica la pintura.   Inadecuado manejo de residuos de pintura durante proceso de limpieza de equipos de pintura. 			

HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
Se realizó mantenimiento a equipos incluyendo realización de pintura, se evidencia que hay puntos en zona de tornillos donde se ve la pintura original del equipo, se debe detallar parches. Se requieren tapones de protección en los tornillos.  Se requiere tope y protección en tornillo pasante eje parte inferior izquierda.  En la base del equipo, en la platina no se evidencia aplicación de pintura, se requiere aplicación de pintura para garantizar durabilidad en el soporte de los equipos. 			


HALLAZGO	FECHA DE IMPLEMENTACION	EVIDENCIAS DE TRATAMIENTO	EFICACIA Y CIERRE
Desprendimiento prematuro de pintura, posible falta de limpieza durante pretratamiento.  Se requiere protector en base del tubo de asiento del equipo de ascenso, por inclinación de la placa, se está golpeando directamente sobre dicha placa, acortando vida útil del Biosaludables. 			

SNC 18


COMPONENTE ELÉCTRICO:

- UDS BEISBOL:

Resanar y limpiar cajas, cubrir tubería expuesta

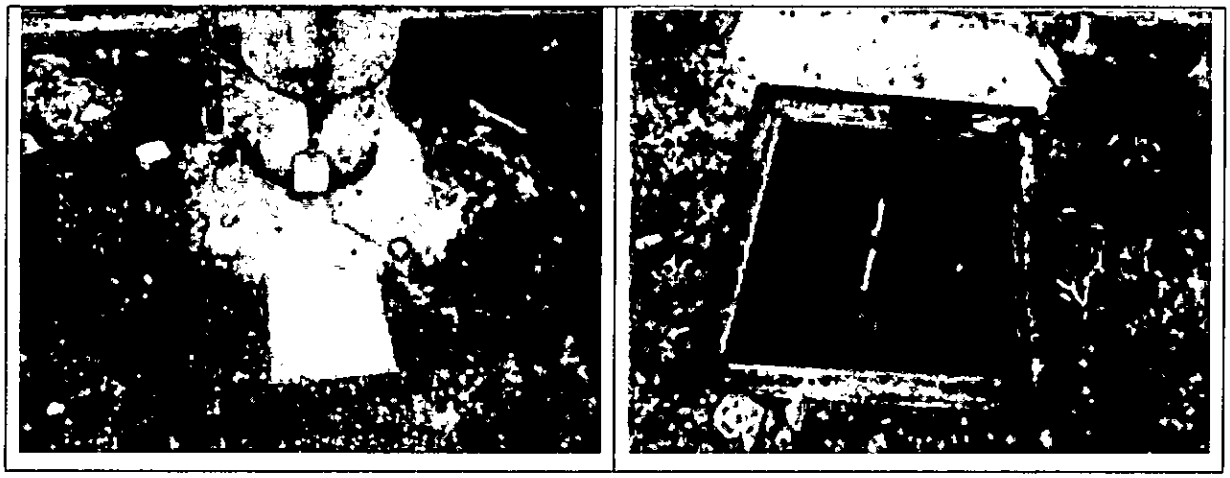

Respuesta: Reparación cajas y tubería expuesta, seguimiento 10 y 11 de mayo

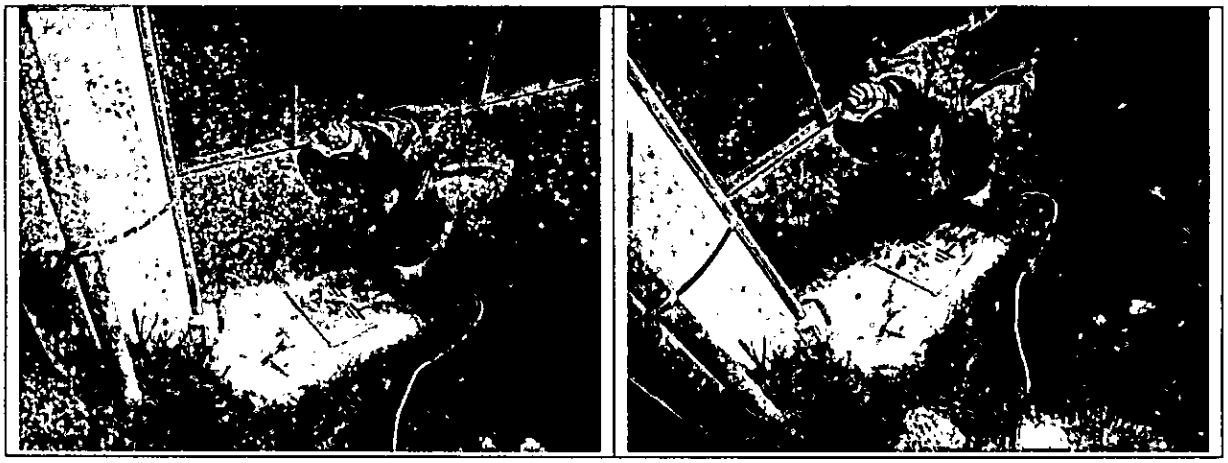





- **EDUARDO SANTOS:**


Ajustar toma corriente.




Respuesta: Se había realizado la reparación sin embargo, se volvió a presentar daño, entonces se dará un alcance de la reparación para el día 4 de junio de 2024

- **LOS NOVIOS:**

Resane tubería expuesta y ajustar caja de paso eléctrica

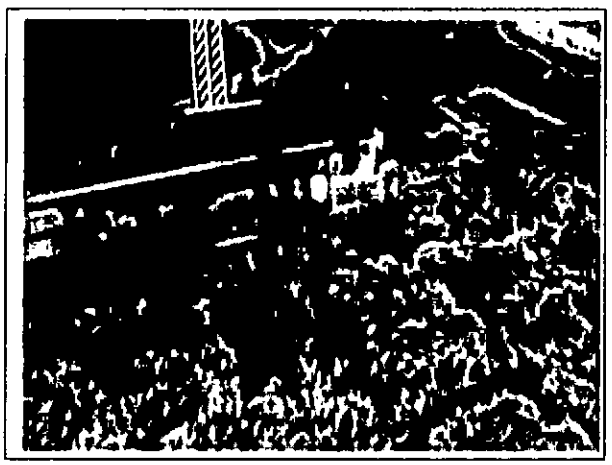

Respuesta: Reparación, seguimiento 8 de mayo

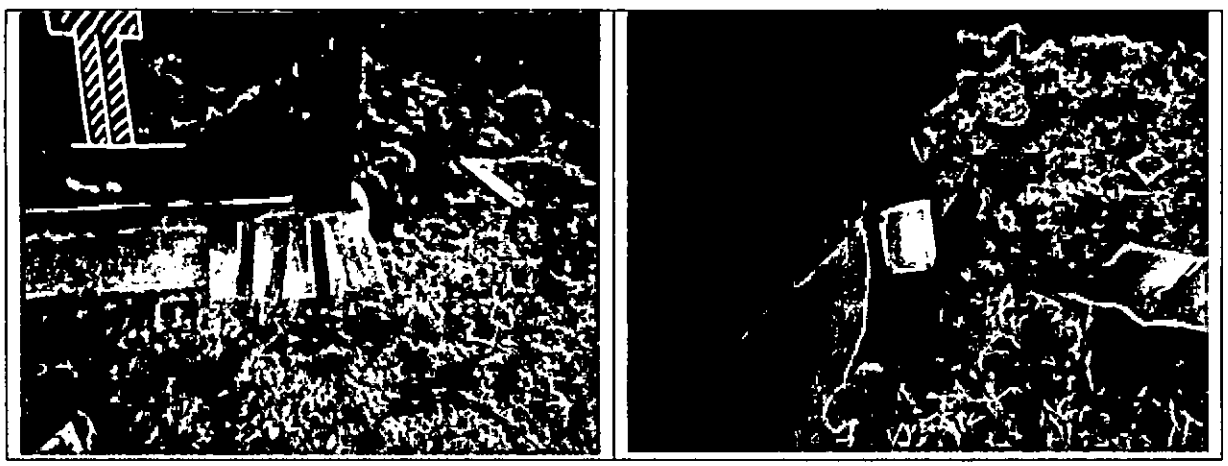


COMPONENTE DE OBRA CIVIL


- **EL TUNAL:**

Rematar muretes de tablero eléctrico futbol 11 y colocar tapa de caja de paso BMX.




Respuesta: Reparación remates muretes de tablero eléctrico fútbol 11, seguimiento 8 de mayo. Correspondiente a la tapa de la caja de paso, se encuentra en proceso de instalación, se dará alcance para el día 4 de junio de 2024.

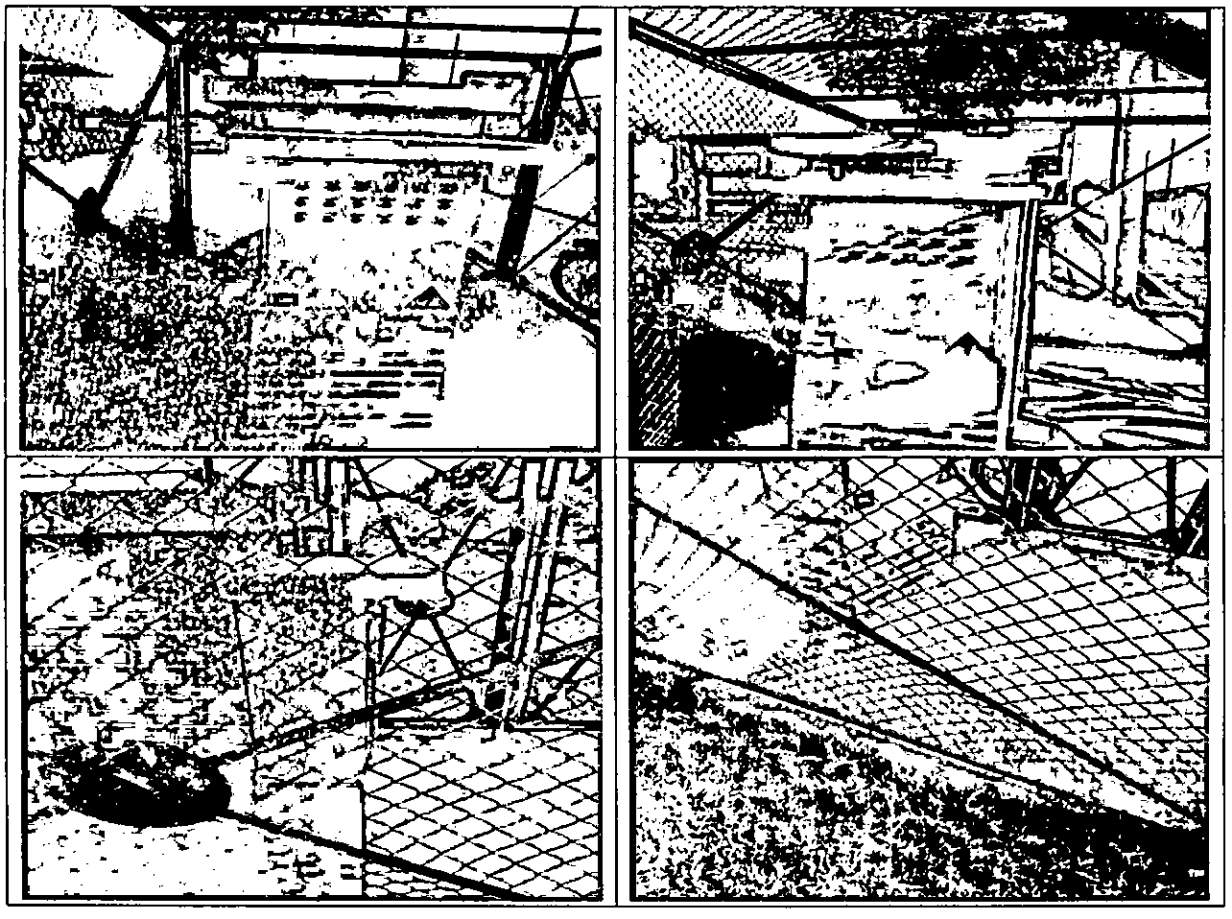

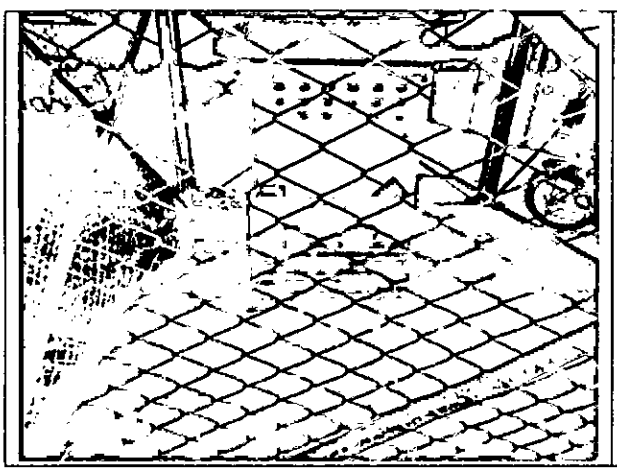	SIN FOTO

- **EDUARDO SANTOS:**

Instalar rejillas de piso perdidas en Coliseo.

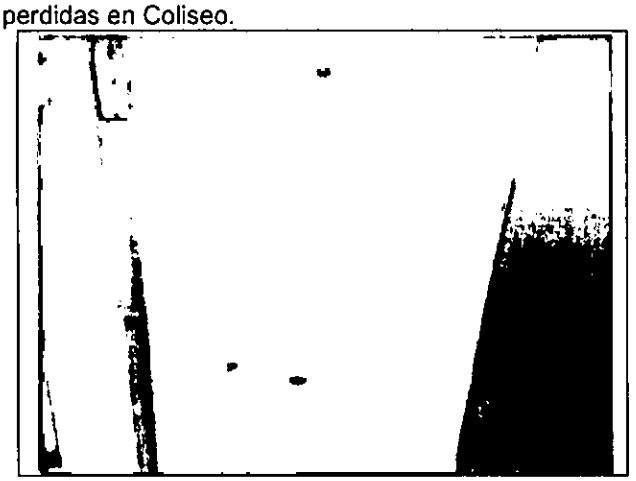

Respuesta: Instalación de rejillas.



NC 14

402

MYM ALTURAS

CENTRO DE FORMACION PARA EL EMPLEO S.A.S.
NIT 901.103.169-7

LIC. SST N°14956 del 28 de noviembre de 2018

Certificación NTC 6072:2014 otorgada por CELAC CERT N°30.502-1

Autorización de Min Trabajo N°08SE2019220000000006629 del 1 de marzo de 2019

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

YAS MIRANDA LEYDI BIBIANA

Cédula No. 1237688062

Cursó y aprobó la acción de formación

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL: COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS

Realizado del 5/7/2024 - 5/16/2024 en la ciudad de Bogotá D.C.
con una intensidad de 80 horas

Empresa: DISTRIBUCIONES PBB SAS

NIT: 901083232

Representante Legal: PULIDO OSPINA JORGE ANDRES

ARL: SURA

En testimonio de lo anterior se firma el presente en Bogotá a los 5/16/2024
Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Resolución 4272 del 27 de diciembre de 2021

Registro bajo consecutivo No.- C59EFE

BERONICA MAYA RODRIGUEZ
C.C. 52429692
Representante Legal

BERONICA MAYA RODRIGUEZ
C.C. 052429692
Lic. SST 7312-2019

ACCEI
Asociación Colombiana de Centros de Entrenamiento Integral
Asociado No. ACC-AS-012

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 18 de abril de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-334

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 cue tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta a comunicado IDRD-3131-2024-353-Componente SST

Cordial saludo,

Atendiendo al oficio citado en el asunto nos permitimos dar respuesta teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Es importante mencionar que la profesional en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al contrato cuenta con una disponibilidad del 40%, sin embargo, y al ver el alto volumen de trabajo y las priorizaciones entregadas por el IDRD, la distancia entre parques y las diferentes actividades la profesional cuenta con una dedicación mayor para el contrato.

2. Con relación al acompañamiento del coordinador de trabajo en alturas en las actividades que así lo requieran debido al alto flujo de labores que se deben adelantar por el componente la profesional SST realiza la inspección al iniciar la actividad y debida firma de los permisos necesarios para el desarrollo de la misma, se garantiza que un compañero se encuentre en piso en todo momento, lamentablemente al momento de realizar la visita por parte de interventoría el compañero se retiro sin la debida notificación a otro para continuar el acompañamiento por lo cual se realizará como acción correctiva una capacitación a todos los trabajadores en temas de autocuidado y acto inseguros y de esta manera garantizar que no se repita la situación.

3. Con relación a la entrega oportuna de los documentos de los trabajadores se está tomando las medidas correctivas para garantizar que el envío se realice oportunamente, sin embargo, con relación a la permanencia en obra de trabajadores sin documentación la misma fue subsanada el día 13 de abril de 2024 mediante comunicación electrónica desde el correo residentesst3099@gmail.com con destino al correo yinethsiso28@gmail.com y proyectos2@soliunsas.com sin recibir respuesta u observación al respecto por lo que se presume que todos los trabajadores se encuentran debidamente aprobados por la interventoría.

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

4. Todas estas actividades adelantadas por el componente de seguridad y salud en el trabajo son notificadas y soportadas mediante los informes mensuales o en su defecto bajo solicitud de la profesional de interventoría, tales como

   ➢ Permisos de Trabajos en Alturas Firmado ATS (Trabajador y Coordinador).
   ➢ Inspección de Arnés y equipos de Seguridad que se encuentren en buen estado de acuerdo con la normatividad vigente previo al inicio de actividades.
   ➢ Capacitación en temas (Actos inseguros y auto cuidado) de acuerdo al cronograma de capacitaciones.
   ➢ Establecer Comunicación entre los residentes técnicos, eléctrico con profesional SST aprobado para el contrato en cada uno de los frentes activos.

5. Con respecto al trabajador del parque Gilma Jiménez, y como se notificó vía telefónica a la profesional de interventoría los profesionales a cargo del parque (residente de obra, maestros) no tenian conocimiento del nombre o función del trabajador, no contaba con la dotación de la empresa por lo cual se presume que el mismo es un ciudadano trabajador de una obra circunvecina y estaba tomando un descanso cerca a las inmediaciones de las obras que se adelantan por el consorcio sin tener relación alguna con la obra.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que estos parques si bien es cierto se encuentran en obra los mismos están abiertos al público en general sin ninguna clase de restricción, como se evidencia en la fotografía adjunta por la interventoría el señor se encontraba en el área verde cercana a la obra mas no dentro del sector donde se adelantaban las actividades.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No.11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal
Anexo: (0) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

IDRD-3131-2024-353

Bogotá D.C., 15 de abril de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. **3099-2023** cuyo objeto es: ***"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **APREMIO POR INCUMPLIMIENTO NORMATIVA - COMPONENTE SST (Trabajos en Alturas).**

Dando cumplimiento a las directrices de norma establecidas para todo tipo de obra de construcción que actualmente rigen a nivel Distrital y Nacional, como interventoría evidenciamos que el Consorcio Parques BOG, viene presuntamente realizando actividades sin cumplir a cabalidad la normatividad vigente:

1. Realización de trabajos en alturas, sin el acompañamiento permanente del coordinador o profesional SST conforme se establece en la norma.
2. Entrega de la documentación requerida para el ingreso de personal conforme lo establece la ley y el contrato de la referencia.

RESOLUCIÓN 4272 DE 2021: Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. *Acompañamiento SST.*

El objetivo de esta resolución es que todas las organizaciones que hacen uso de andamios, escaleras o cualquier otro medio para el trabajo las alturas cumplan el artículo 348 del código sustantivo del trabajo, el cual obliga a los empleadores a suministrar y acondicionar el espacio y el equipo de trabajo con todos los medios que garantizan la seguridad y la salud del trabajador.

- Permisos de Trabajos en Alturas Firmado ATS (Trabajador y Coordinador).
- Inspección de Arnés y equipos de Seguridad que se encuentren en buen estado de acuerdo a la normatividad vigente previo al inicio de actividades.
- Capacitación en temas (Actos inseguros y auto cuidado).
- Establecer Comunicación entre los residentes técnicos, eléctrico con profesional SST aprobado para el contrato en cada uno de los frentes activos.



Lo antes mencionado esta evidenciado en:

1. No se han atendido a tiempo las observaciones reiteradamente requeridas por esta interventoría, en los diferentes frentes de obra, siendo la última situación la evidenciada el día viernes 12 de abril de 2024 en el frente de obra Parque Gilma Jiménez:




1.1 Personal trabajando en actividades en altura del componente eléctrico, sin ningún acompañamiento del coordinador SST o mínimamente en compañía de un compañero.

1.2 Personal que ingresó el contratista para adelantar labores de obra, que no contaba con la documentación establecida en la normativa vigente

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES OBSERVADAS EN EL COMPONENTE SST 12 DE ABRIL DE 2024 ELECTRICOS.

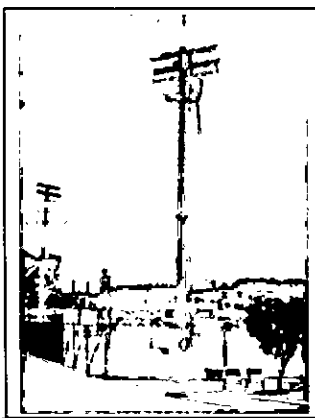			
Área sin demarcación y señalizar.	Trabajador sin acompañamiento del Componente SST.	Un señor de Visita en la cuadrilla de actividades.	Un trabajador sin reportar en el momento de la visita

Situaciones presentadas antes y observaciones manejadas por WhatsApp Parque de los Niños y PRD. Fechas 6 y 27 de marzo de 2024 Personal Eléctrico.

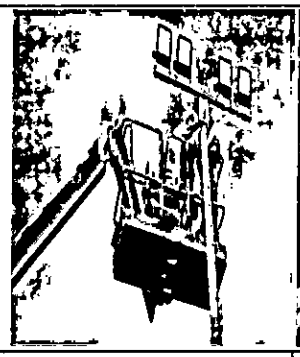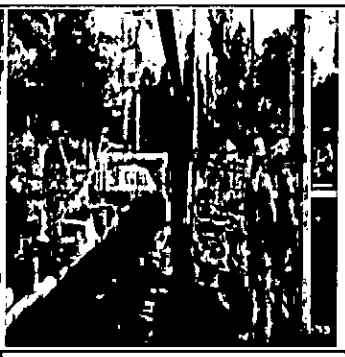			
Trabajador sin reportar documentos Maicol Delgado	Personal sin acompañamiento del Componente SST.	Área sin demarcación y señalizar.	Un trabajador sin reportar en el momento de la visita

De acuerdo a lo anterior se conmina al Consorcio Parques BOG, a dar cabal cumplimiento a sus obligaciones referentes a la normativa y se tomen las medidas correctivas de forma inmediata, de no ser atendidas y corregidas las malas prácticas que se han evidenciado, se informará a la entidad contratante del presunto incumplimiento que se conforma al no cumplir con las normas a las que está sujeto el contrato de la referencia y se determine por dicha entidad el procedimiento a adelantar en contra del consorcio contratista por infringir las normas vigentes de seguridad y que están colocando en riesgo, no solo al contrato de la referencia, si no la vida de las personas que adelantan las labores antes mencionadas.

Sin otro particular, quedamos atentos a las medidas correctivas requeridas.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal


Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: YCA
Revisó: ECCS

NC 7


:GUIMIENTO AL NC 7

Mes	# compromisos pactados	# compromisos cumplidos	% cumplimiento
	58	42	72%
ro	47	37	79%
	66	47	71%
	116	95	82%
	54	21	39%
/	51	34	67%

COMPROMISOS PACTADOS VRS. CUMPLIDOS

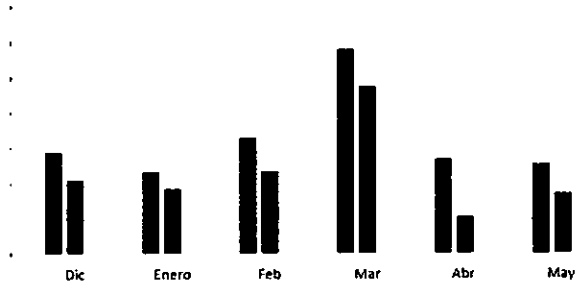

% cumplimiento

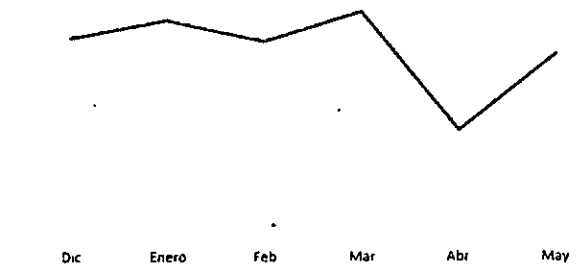

Teniendo en cuenta que para el presente periodo se presenta un porcentaje de cumplimiento de los compromisos de los comités del 72% y por solicitud de Interventoría, se abre AC para erradicar el no conforme, ver numeral 15 del presente informe.

28			Informe técnico mensual 4	Cumplido
29	Acta de Comité No 14	19-21-23	Paz y Salvo proveedores Fase V5	
30			Manfredi MDC12	
31			Actualización PAE	
32			Reunión Hippos	
33			Inicio pinturas Simón Bolívar	
34			Palomas y gatcheneles Olaya	
35			PPTO actualizado Bosque San Carlos	
36			PPTO y programación actualizado Ciudad Cafeteros	
37			Cronograma eléctrico	
38			Reunión PPP Nuevo Muzu	
39			Diseño pas Eduardo Santos	
40			PPTO actualizado Simori	
41			Inicio obras Verey Sur	
42			PPTO baterías Simón Bolívar	
43			Estructuras móviles estables y otros ítems	
44			Propuesta señalización Vitel Nevera	
45			Muestra otros ítems	
46			Penalización pico Alta Blanca	
47			Corrección informe Obras Modulos	
-	Pendiente entrega por parte de interventoría de acta 15.			

Como seguimiento al cierre del AC abierta por incumplimiento de compromisos se evidencia un 80% de cumplimiento, se continúa con seguimiento.

61	Acta de Comité No 12	22-05-24	Calidad – informe Gerencia etapa contractual 27-05-24	Seguimiento a estos compromisos en primera reunión del mes de junio
62			Ambiental – Coordinadas zonas Juan Amarillo 22-05-24	
63			Tanque del Tío – Visita 24-05-24	
64			Novena - Presupuesto invasión 23-05-24	
65			Niños- Puesta en servicio 24-05-24	
66			PRD - Entrega y puesta en servicio 24-05-24	
67			Cometas – obra cerramiento 31-05-24	
68			1 de mayo – Terminación obra civil 29-05-24	
69			1 de mayo – Terminación obras eléctricas 29-05-24	
70			Informe visita parques 29-05-24	
71			Villa de Granada – informe + pptp 24-05-24	
72			Acta fijación NP C10 27-05-24	
73			Subsanación NP construcción 22-05-24	

Como seguimiento al cierre del AC abierta por incumplimiento de compromisos se evidencia un 68% de cumplimiento, se continúa con seguimiento se revisa y actualiza plan de acción.

56			PRD – Finalización	Aplazado
58			PRD – Eléctrico – conexión Lobera y cubierta	Aplazado
57			Plaza de los artesanos – Recortido	Cumplido
58			San José de Bavaria – Poda	Cumplido
59			Ciudad Lourdes – Reunión entrega	Cumplido
60			Villa de los Alpes – Entrega	Cumplido
61			Verey Norte – Finalización	Cumplido
62			Tunal – Entrega obras, portería, cese del aduto	Cumplido
63			Tunal – Cancel demolición	Aplazado
64			Cayetano Cañizares – inicio eléctrico	Cumplido
65			Tunal – Cambio pabellones	Cumplido
66			Illimo Serrano – inicio	Cumplido

Como seguimiento al cierre del AC abierta por incumplimiento de compromisos se evidencia un 71% de cumplimiento, se continúa con seguimiento se revisa y actualiza plan de acción.

106	Acta de Comité No 24	27-03-24	Niños - Señalización 01-04-24	Seguimiento a cumplimiento en mes de abril
107			Delfino Fecha auditoría 70% 01-04-24	
108			Reunión componente calidad 03-04-24	
109			Cuadro de puestos en servicio y entrega 02-04-24	
110			Nuevo – Entrega propuesta diseño modulo baños 02-04-24	
111			Entrega mensual mantenimiento parques saneamiento pendiente 02-04-24	
112			Entrega informe avance 02-04-24	
113			Reunión virtual PPP 03-04-24	
114			1 Mayo – Puesta en servicio 01-04-24	
115			San José Bavaria – Puesta en servicio 02-04-24	
116			Niños – Terminación parte eléctrica 05-04-24	

Como seguimiento al cierre del AC abierta por incumplimiento de compromisos se evidencia un 82% de cumplimiento, se continúa con seguimiento se revisa y actualiza plan de acción.

Como seguimiento al cierre del AC abierta por incumplimiento de compromisos se evidencia un 61% de cumplimiento, se continúa con seguimiento se revisa y actualiza plan de acción.
