

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% físico comple
1		**PRESUPUESTO TEATRO SERVITA - Localidad de Usaquen**	**139 días**	**jue 14/09/23**	**mar 13/02/24**		**0%**
2		INICIO	0 días	jue 14/09/23	jue 14/09/23		100%
3		ETAPA DE DIAGNOSTICO	28 días	jue 14/09/23	sáb 14/10/23	2	100%
4		**PRELIMINARES**	**86,5 días**	**lun 16/10/23**	**jue 18/01/24**		**0%**
5		CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	23,63 días	lun 16/10/23	jue 9/11/23	3	80%
6		DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	8 días	mié 1/11/23	jue 9/11/23	5	0%
7		DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17,75 días	mié 1/11/23	jue 18/01/24	5	0%
8		DESMONTE DE PUERTAS INTERNAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	10 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23	5	100%
9		DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO: LAVAMANOS, SANITARIOS, ORINAL, ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	10 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23	8CC	100%
10		PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15CM, PROFUNDIDAD <= 10CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE	14 días	lun 13/11/23	mar 28/11/23	11	80%
11		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	11 días	mié 1/11/23	lun 13/11/23	9	100%
12		DESMONTE DE PISO	7 días	sáb 23/12/23	lun 1/01/24	64	0%
13		DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	6 días	vie 1/12/23	vie 8/12/23	15	0%
14		**MUROS TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	87,13 días	vie 20/10/23	mié 24/01/24		0%
15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO PARA MUROS	30 días	vie 20/10/23	vie 1/12/23	5	100%
16		ENCHAPE 25 X 35	21 días	lun 1/01/24	mié 24/01/24	27	30%
17		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**123,63 días**	**jue 14/09/23**	**sáb 27/01/24**		**0%**
18		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACION EP/ES, ASIENTO	3 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23		0%
19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	3 días	mié 24/01/24	sáb 27/01/24	16	0%
20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, BRAZO SOPORTE Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ACOPLE, SIFÓN EN P, DESAGÜE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	3 días	jue 14/09/23	sáb 16/09/23		0%
21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23		0%
22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS	2 días	mar 9/01/24	mié 10/01/24	35CC	0%
23		**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**102,63 días**	**jue 14/09/23**	**jue 4/01/24**		**0%**
24		REGISTRO CORTINA 3/4"	3 días	lun 1/01/24	jue 4/01/24	27	100%

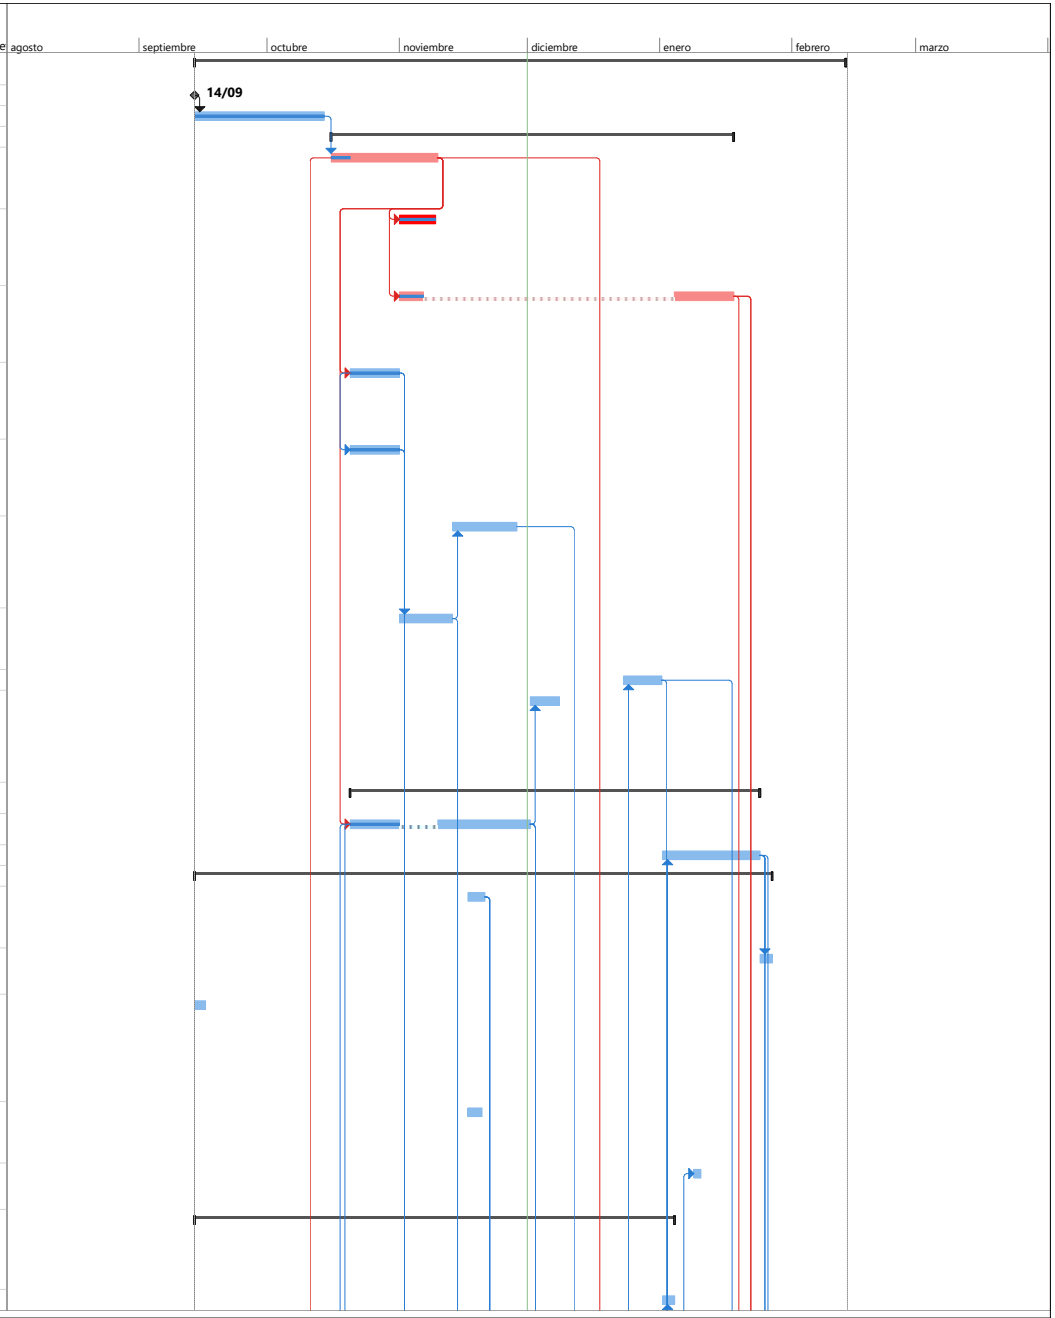

Proyecto: Programación Servita
Fecha: vie 1/12/23

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Hito de línea base
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	Resumen de línea base
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	Progreso
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Línea base	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% físico comple
25		PUNTO SANITARIO 2"	5 días	jue 14/09/23	mar 19/09/23		100%
26		TUBERIA PVCP RDE 9 DE ½" INCLUYE ACCESORIOS	10 días	mar 12/12/23	vie 22/12/23	10	100%
27		punto hidraulico de agua Fria de 1/2"	9 días	vie 22/12/23	lun 1/01/24	26	100%
28		**INSTALACIONES ELECTRICAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**7 días**	**vie 17/11/23**	**sáb 25/11/23**		**0%**
29		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	7 días	vie 17/11/23	sáb 25/11/23	44	50%
30		**PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**25 días**	**vie 1/12/23**	**vie 29/12/23**		**0%**
31		PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA ANTEPECHO DE FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS	3 días	lun 18/12/23	mié 20/12/23	5	0%
32		VINILO TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	25 días	vie 1/12/23	vie 29/12/23	15	15%
33		**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24,13 días**	**mar 19/12/23**	**sáb 13/01/24**		**0%**
34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, ANTIÁCIDO,	6 días	mar 19/12/23	lun 25/12/23		0%
35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30,	5 días	mar 9/01/24	sáb 13/01/24	27	0%
36		**SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA**	**4 días**	**jue 14/09/23**	**lun 18/09/23**		**0%**
37		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAL 20	4 días	jue 14/09/23	lun 18/09/23		0%
38		**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**40 días**	**vie 1/12/23**	**lun 15/01/24**		**0%**
39		CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS INCLUYE ESTRUCTURA DE ALISTADO Y	40 días	vie 1/12/23	lun 15/01/24	64CC	0%
40		**NO PREVISTOS**	**139 días**	**jue 14/09/23**	**mar 13/02/24**		**0%**
41		PAÑETES LISO MUROS 1:3 (e=0,03m)	12 días	lun 27/11/23	sáb 9/12/23	56	100%
42		DILATACIÓN PLASTICA EN Z	10 días	lun 18/09/23	vie 29/09/23	37	100%
43		MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, INCLUYE LAVADO CON RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO, APLICACIÓN DE HIDROFUGO 10 AÑOS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y	15 días	lun 18/12/23	mar 2/01/24	31CC	0%
44		DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS (CABLES, TOMAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS).	5 días	lun 13/11/23	vie 17/11/23	11	100%
45		DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LÁMPARA CUALQUIER TAMAÑO, (INCLUYE LIMPIEZA Y AJUSTE SI SE	4 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	32	50%
46		PUNTO SANITARIO PVC (4")	8 días	jue 14/09/23	vie 22/09/23		100%
47		DESMONTE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDOS EXISTENTES A DOBLE ALTURA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	40 días	mar 24/10/23	jue 7/12/23	59	50%
48		DESMONTE, INSTALADA, PULIDA, LACADA Y SELLADO DE GUARDA	10 días	jue 14/09/23	lun 25/09/23		0%
49		BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	4 días	mar 21/11/23	vie 24/11/23	18	0%
50		BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	2 días	mar 21/11/23	mié 22/11/23	18	0%
51		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA PRINCIPAL DE FACHADA.	4 días	jue 14/09/23	lun 18/09/23		0%

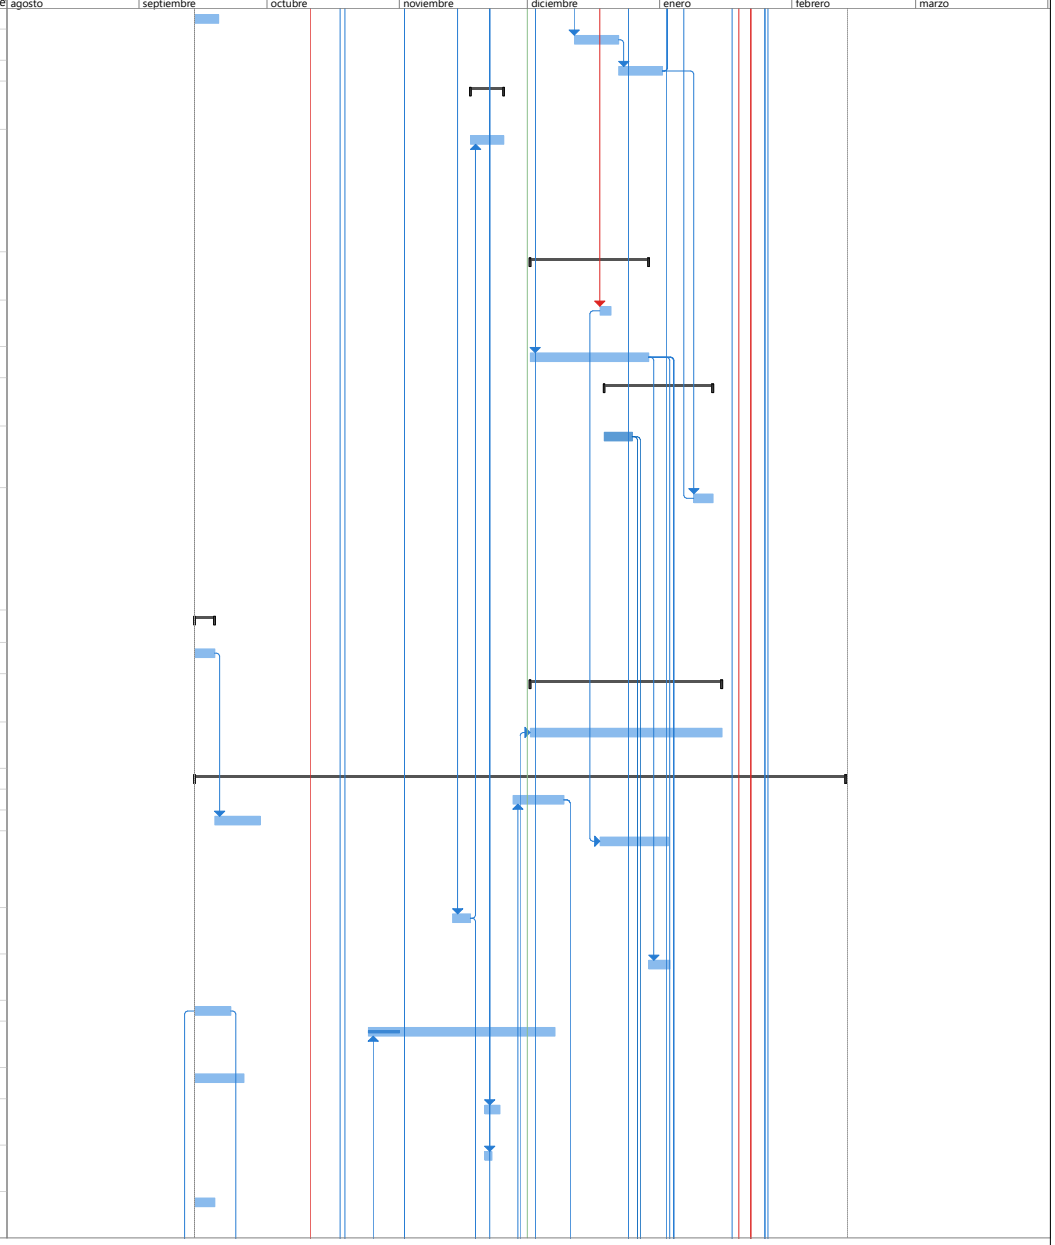

Proyecto: Programación Servita
Fecha: vie 1/12/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% físico comple
52		COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERIA. CONCRETO F'C 21 MPA - 0.12x0.15 M.	10 días	jue 14/09/23	lun 25/09/23		100%
53		DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE REINTALACIÓN DE SISTEMA DE SENSOR DE GRIFERIA)	8 días	jue 14/09/23	vie 22/09/23		50%
54		DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO E=4CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	6 días	mié 1/11/23	mar 7/11/23	9	100%
55		DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA 0.15M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	12 días	mié 1/11/23	mar 14/11/23	8	100%
56		MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12M	12 días	mar 14/11/23	lun 27/11/23	55	100%
57		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA, PISO CERAMICA (SEGUN PISO INSTALADO)	8 días	jue 14/09/23	vie 22/09/23		0%
58		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PVC COLOR	7 días	vie 1/12/23	sáb 9/12/23	15	0%
59		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTON CORRUGADO	10 días	vie 13/10/23	mar 24/10/23	5CC	80%
60		MEDIA CAÑA FUNDIDO EN SITIO Y PULIDO (GRANITO PULIDO a= 0,1 m)	6 días	jue 14/09/23	mié 20/09/23		0%
61		SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO PVC-S	6 días	jue 14/09/23	mié 20/09/23	46CC	100%
62		EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO SUELO BLANDO	8 días	mar 7/11/23	jue 16/11/23	54	100%
63		GRANITO ANCHO MAX 0.15(INCLUYE PULIDA)	5 días	mié 4/10/23	lun 9/10/23	70	0%
64		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TODO CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS	20 días	vie 1/12/23	sáb 23/12/23	15	40%
65		SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO TUBO PVC (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO+CABLE+CAJA)	10 días	lun 27/11/23	jue 7/12/23	56	50%
66		ESTRUCTURA METALICA PARA RECUBRIMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y TRATAMIENTO DE JUNTAS.	30 días	vie 20/10/23	mié 22/11/23	15CC	100%
67		SALIDA CON LUMINARIA PANEL LED RD 24 W	5 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	44	0%
68		DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO	5 días	mié 1/11/23	lun 6/11/23	8	100%
69		ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA E	5 días	mar 21/11/23	sáb 25/11/23	18	0%
70		ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h	10 días	vie 22/09/23	mar 3/10/23	46	60%
71		BASE PLACA CONCRETO POBRE 1500 PSI, ACELERANTE E IMPERMEABILIZANTE	8 días	lun 27/11/23	mié 6/12/23	56	0%
72		NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PULIDO, SELLADO, Y LACADO DE PISO EN MADERA NATURAL MACIZA GUAIMARO	3 días	jue 18/01/24	sáb 20/01/24	12	0%
73		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA MADERA NATURAL MACIZA GUAIMARO	5 días	vie 26/01/24	jue 1/02/24	72FC+5 días	0%
74		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO 3+3 (INCLUYE VENTANAS PARA TAQUILLA Y PERCIANAS DE BAÑOS)	10 días	lun 22/01/24	jue 1/02/24	7FC+3 días	0%
75		PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO NEGRO EN ALUMINIO (INCLUYE MANIJA Y CHAPAS DE SEGURIDAD).	10 días	lun 22/01/24	jue 1/02/24	7FC+3 días	0%
76		PAPEL VINILICO FROSTED PARA VENTANA	2 días	jue 1/02/24	sáb 3/02/24	75	0%
77		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	2 días	vie 26/01/24	lun 29/01/24	16FC+2 días	0%
78		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, BAÑO NIÑOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	2 días	jue 25/01/24	sáb 27/01/24	16FC+1 día	0%

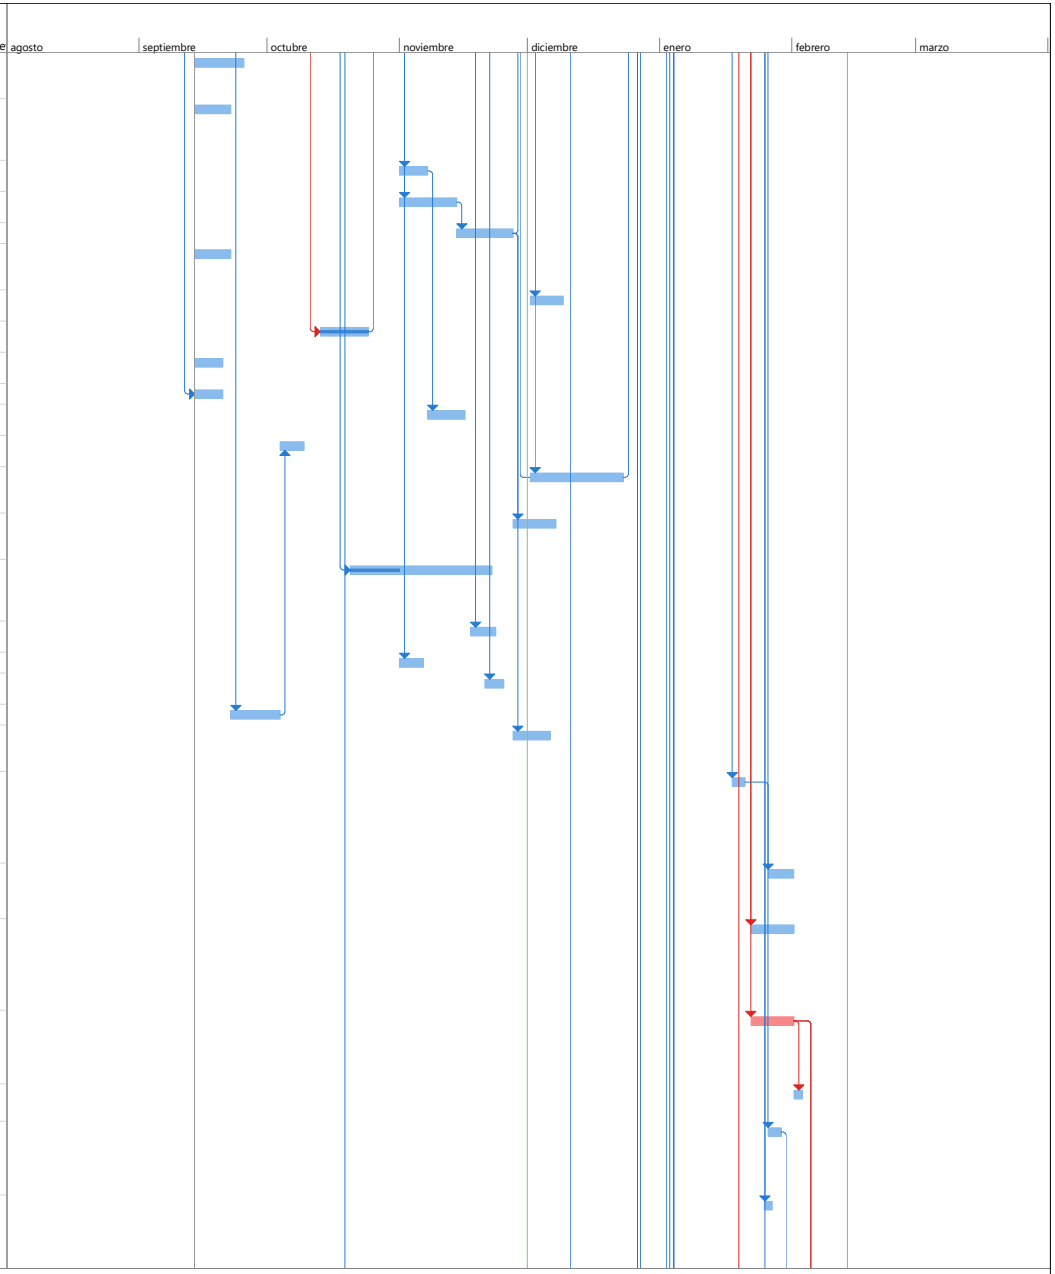

Proyecto: Programación Servita
Fecha: vie 1/12/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% físico comple
79		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA NIÑOS, (INCLUYE VALVULA DE DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	1 día	lun 29/01/24	mar 30/01/24	77	0%
80		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR PARA BEBES HORIZONTAL	2 días	mar 26/12/23	jue 28/12/23	34FC+1 día	0%
81		REPLANTEO, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y NIVELACIÓN DE SUELO BAJO TARIMA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	5 días	mar 2/01/24	lun 8/01/24	12FC+1 día	0%
82		CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 (SUM E INSTALACIÓN).	2 días	lun 11/12/23	mar 12/12/23	41	0%
83		ESTUCO SOBRE PAÑETE	4 días	lun 11/12/23	jue 14/12/23	41	0%
84		LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W (SUM E INSTALACIÓN).	4 días	mié 3/01/24	lun 8/01/24	32FC+4 días	0%
85		LAMPARA LED 6W TIPO TORTUGA (SUM E INSTALACIÓN).	4 días	jue 4/01/24	lun 8/01/24	32FC+4 días	0%
86		REFLECTOR LED (100W) (SUM+INSTALACIÓN) EN ALTURA	4 días	jue 4/01/24	lun 8/01/24	32FC+4 días	0%
87		REFLECTOR LED (50W) (SUM+INSTALACIÓN) EN ALTURA	4 días	jue 4/01/24	lun 8/01/24	32FC+4 días	0%
88		PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E=0.025 A<0.60 M **	3 días	jue 18/01/24	lun 22/01/24	7	0%
89		PERFIL PERFORADO ANGULO ESQUINERO	20 días	lun 6/11/23	mar 28/11/23	15CC+15 días	0%
90		PUERTA METÁLICA EN CALIBRE 18 CON PINTURA BLANCA, CON CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJAS, INSTALADA. BATIENTE	3 días	lun 5/02/24	jue 8/02/24	75FC+3 días	0%
91		PUERTA METÁLICA EN CALIBRE 18 CON PINTURA BLANCA, CON CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJAS, INSTALADA. CORREDIZA	3 días	lun 5/02/24	jue 8/02/24	75FC+3 días	0%
92		PISO CERAMICA, FORMATO 60 X 60 (COLORES VARIOS)	10 días	mié 24/01/24	lun 5/02/24	16	0%
93		MESON LAVAMANOS CORIAN	3 días	mié 27/12/23	sáb 30/12/23	34FC+2 días	0%
94		ASEO GENERAL	4 días	vie 9/02/24	mar 13/02/24	90FC+1 día	0%
95		FIN	0 días	mar 13/02/24	mar 13/02/24	94	0%

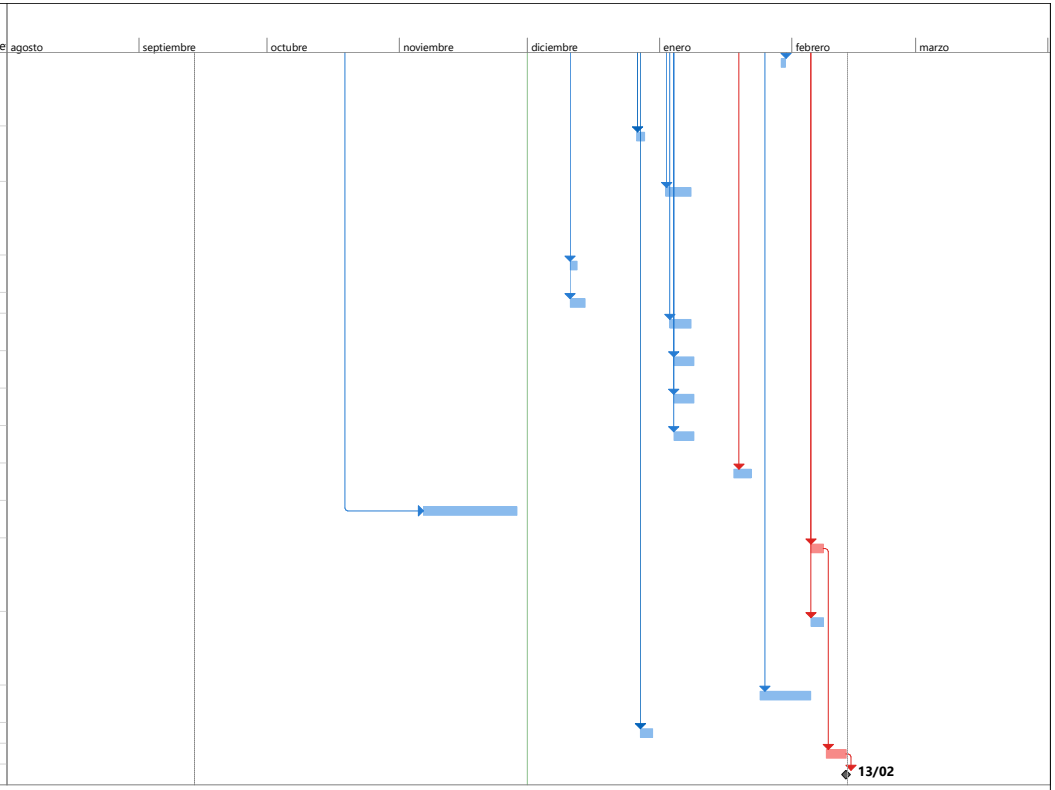

Proyecto: Programación Servita
Fecha: vie 1/12/23

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Hito de línea base
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	Resumen de línea base
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	Progreso
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Línea base	Progreso manual
