SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL 2

MUNICIPIO DE EL BAGRE

CONTRATISTAS DE OBRA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA
CONVENIO No. 3713 DE 2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BONGA
CONVENIO No. 3316 DE 2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LUIS CANO
CONVENIO No. 4379 DE 2023

INTERVENTORÍA:

INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S
CONTRATO No. 5023-2023

PERIODO:

DEL 1 DE ENERO AL 31 ENERO DE 2024

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 3713 DE 2023 — **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA
Contrato de Obra No. 3316 DE 2023 — **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BONGA
Contrato de Obra No. 4379 DE 2023 — **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LUIS CANO

Contrato de Interventoría No. 5023-2023 — **Interventoría:** INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BONGA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LUIS CANO, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 1 — **MES O PERIODO:** DICIEMBRE


No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		9
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		10
2.1	Localización		10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		13
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		14
2.4	Características técnicas del proyecto		15
3	**INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO**		17
3.1	Información general del contrato		17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		20
3.3	Seguimiento Items no previstos		21
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoria		21
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO**		21
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	22
4.2	Maquinaria y Equipo Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	22
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	22
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	22
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	22
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	23
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	23
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Convenio Solidario	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	NO APLICA
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		23
	- Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	NO APLICA
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	NO APLICA
	- Seguimiento Programa de Obra		23
	- Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	23
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	23
	- Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	23
	- Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	23
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		24
5.1	Información general del contrato		24
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		25
5.3	Informes especialistas y profesionales		25
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		25
5.5	Informe matriz de riesgos.		26
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoria		26
	- Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		26
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		26
6.1	Equipo y vehiculos Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	26
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	26
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	26
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	26
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	27
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		27
	- Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NO APLICA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NO APLICA
	- Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	27
	- Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	27
7	**Conclusiones y recomendaciones**		27
8	**Anexos**		28
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia,		28
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		28
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad		28
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		28

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 2 - RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
MEPI-MN1-IN-15-FR-2 – JAC LA PIZARRITA

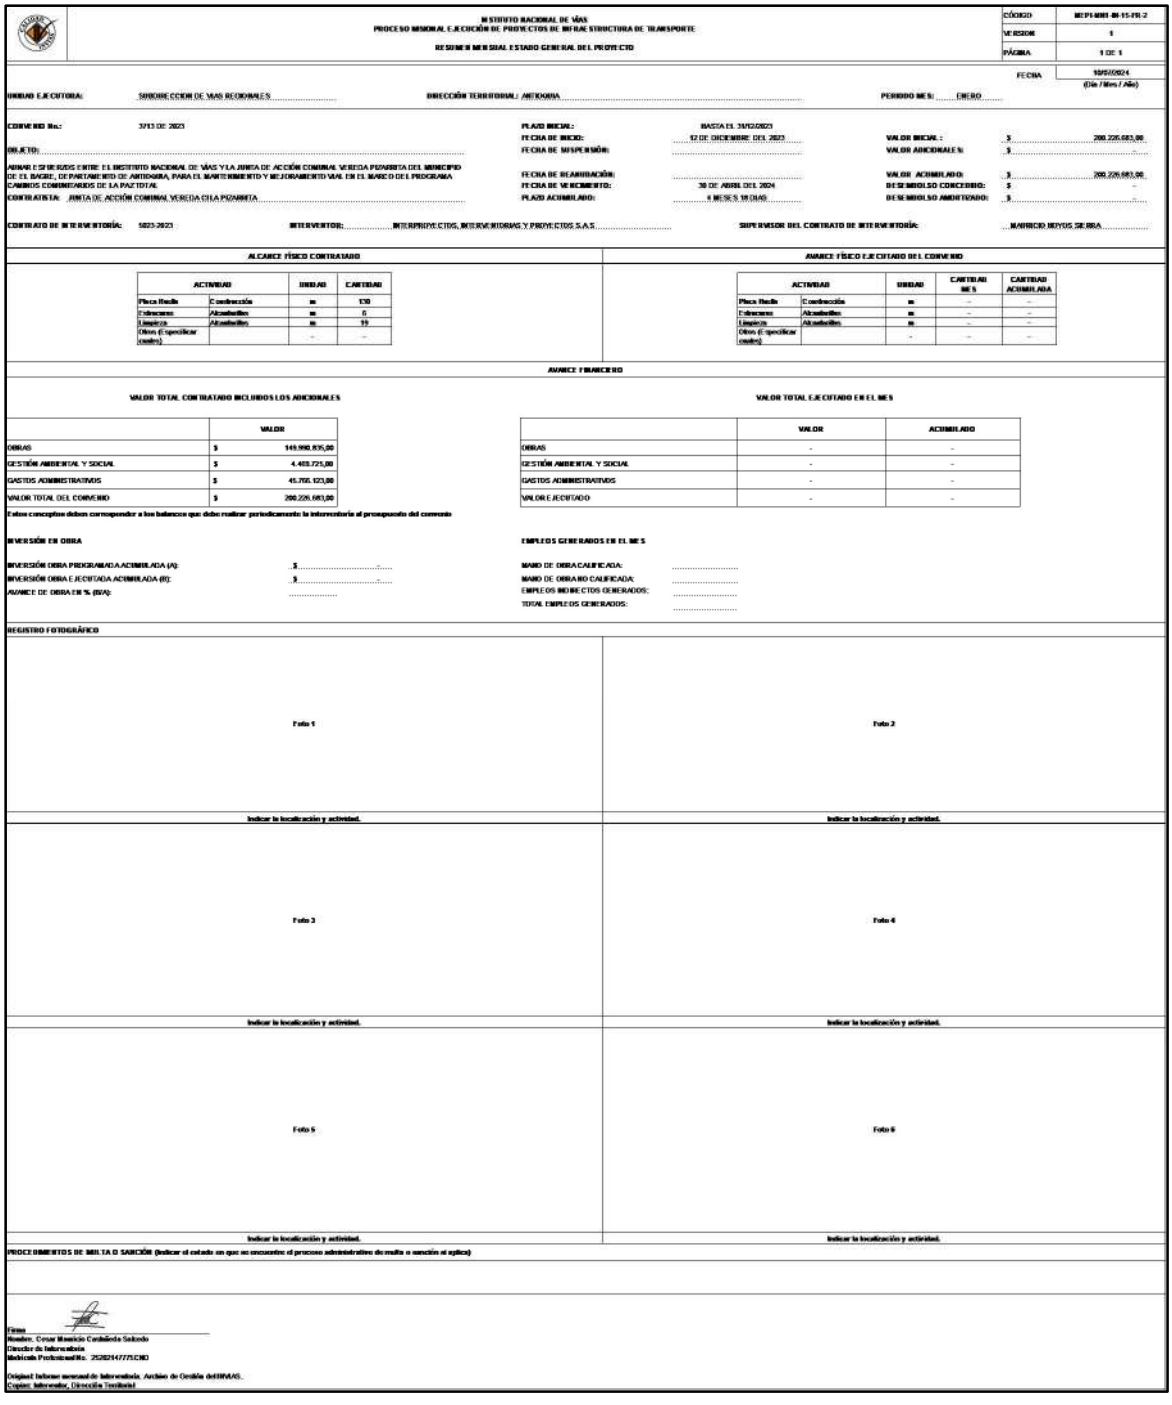

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	10/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — PERIODO MES: ENERO

CONVENIO No.: 3713 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PIZARRITA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ESTILA PIZARRITA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DEL 2024
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES 18 DIAS

VALOR INICIAL: $ 260.226.683,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 260.226.683,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5823-2023 — INTERVENTOR: INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S — SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Placa Huella	Construcción	m	130
Cunetones	Alcantarillas	m	6
Limpieza	Alcantarillas	m	19
Otros (Especificar cuales)		-	-

AVANCE FÍSICO EJECITADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Placa Huella	Construcción	m	-	-
Cunetones	Alcantarillas	m	-	-
Limpieza	Alcantarillas	m	-	-
Otros (Especificar cuales)		-	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 149.990.835,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.469.725,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.766.123,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 260.226.683,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECITADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
VALOR EJECITADO	-	-

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECITADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.
Foto 3	Foto 4
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.
Foto 5	Foto 6
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre. Cesar Mauricio Castañeda Salcedo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520214777-CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Interventor, Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-2 – JAC LA BONGA

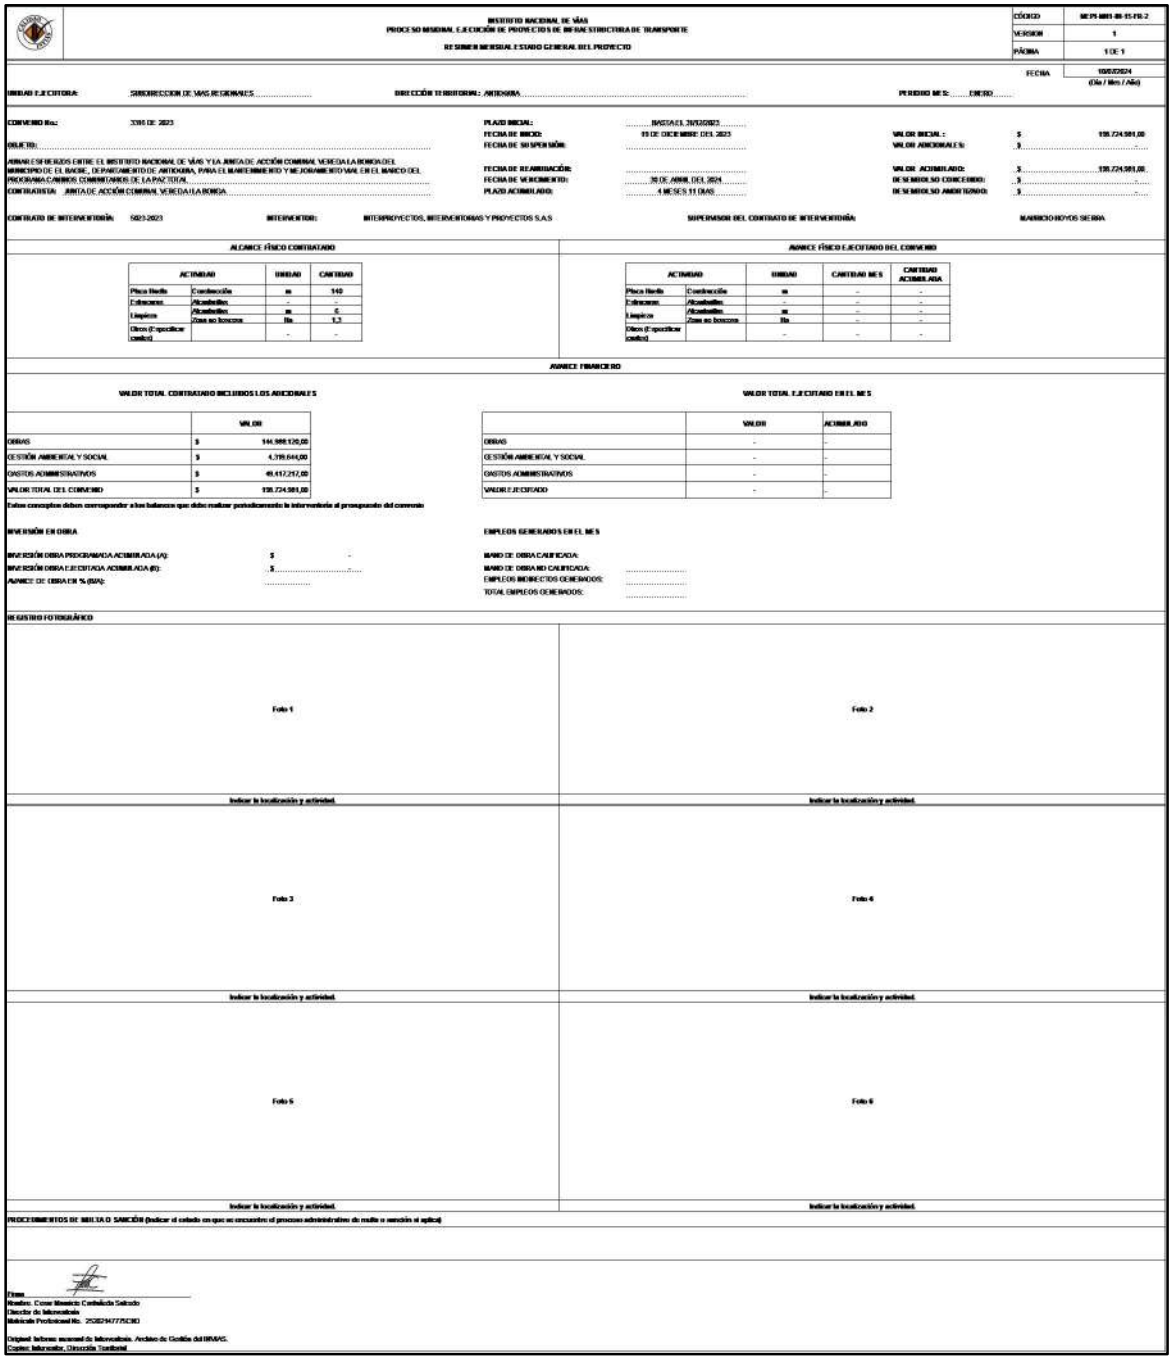

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	10/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — PERIODO MES: ENERO

CONVENIO No.: 3096 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BONGA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BONGA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 29/12/2023
FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DEL 2024
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES 15 DIAS

VALOR INICIAL: $ 139.724.581,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 139.724.581,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5823-2023 — INTERVENTOR: INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S — SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Placa Huella	Construcción	m	140
Cabezotes	Alcantarillas	-	-
Limpieza	Alcantarillas	m	6
	Zona no boscosa	Ha	1,3
Otros (Especificar cuales)		-	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Placa Huella	Construcción	m	-	-
Cabezotes	Alcantarillas	-	-	-
Limpieza	Alcantarillas	m	-	-
	Zona no boscosa	Ha	-	-
Otros (Especificar cuales)		-	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 114.988.120,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.778.644,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 19.417.217,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 139.724.581,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
VALOR EJECUTADO	-	-

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ .....
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): .....

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: .....
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: .....
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: .....
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: .....

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.
Foto 3	Foto 4
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.
Foto 5	Foto 6
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Cesar Mauricio Caballero Salcedo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520247775CBO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del IDIVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2 – JAC LUIS CANO

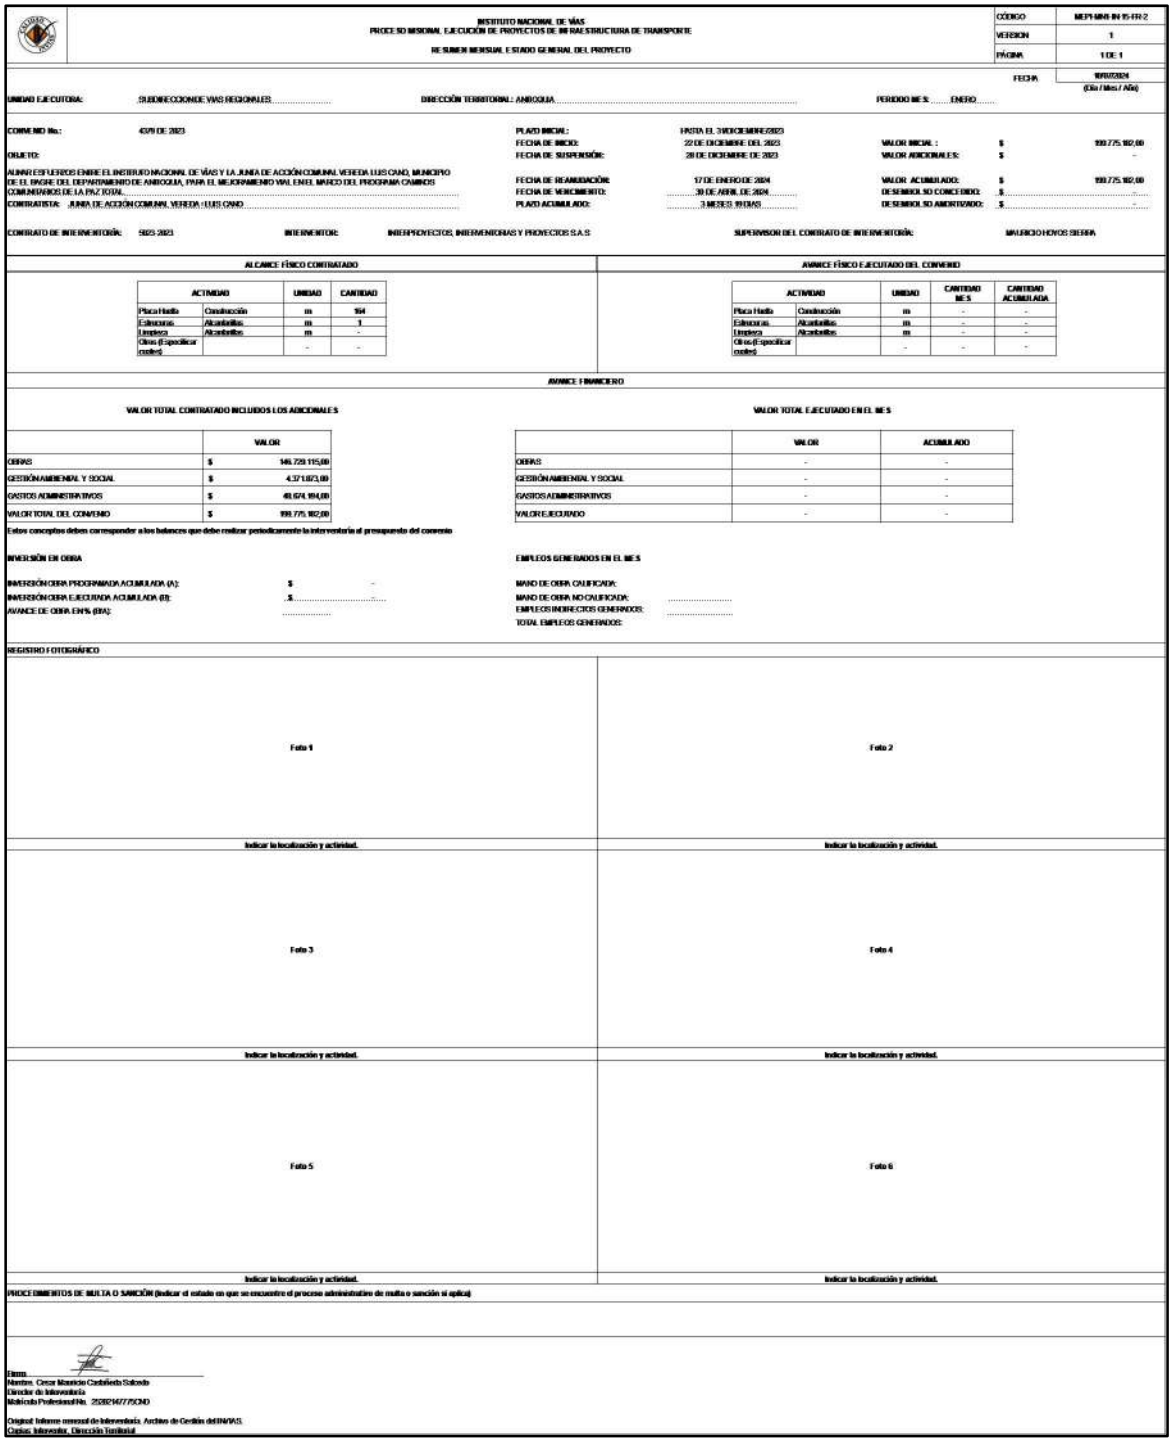

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 10/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA | PERIODO MES: ENERO

CONVENIO No.: 4379 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LUIS CANO, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LUIS CANO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31DICIEMBRE/2023
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17 DE ENERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES 13 DIAS

VALOR INICIAL : $ 199.775.182,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.775.182,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5025-2023 | INTERVENTOR: INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Placa Huella	Construcción	m	164
Estructuras	Alcantarillas	m	1
Limpieza	Alcantarillas	m	-
Otros (Especificar cuales)		-	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Placa Huella	Construcción	m	-	-
Estructuras	Alcantarillas	m	-	-
Limpieza	Alcantarillas	m	-	-
Otros (Especificar cuales)		-	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR	
OBRAS	$	146.729.115,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$	4.371.873,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$	48.674.194,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$	199.775.182,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
VALOR EJECUTADO	-	-

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 — Indicar la localización y actividad.
Foto 2 — Indicar la localización y actividad.
Foto 3 — Indicar la localización y actividad.
Foto 4 — Indicar la localización y actividad.
Foto 5 — Indicar la localización y actividad.
Foto 6 — Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre. Cesar Mauricio Castañeda Salcedo
Dirección de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520214777-CND

Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Interventor, Dirección Territorial

CONTROL DE APROBACIÓN

NOMBRE DEL DOCUMENTO:		Informe Mensual de interventoría No. 2 - Enero
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:		
VERSIÓN:	**2**	

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
ACTIVIDAD	**FECHA**	**NOMBRE DEL EJECUTOR**	**FIRMA**
Elaboración	10/07/2024	César Mauricio Castañeda	
Revisión			
Verificación			
Aprobación		Mauricio Hoyos Sierra	

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	**Cargo**	**Organización**
Mauricio Hoyos Sierra	Director Territorial Antioquia	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	**Fecha**	**Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior**
1	21/05/2024	N/A
2	10/07/2024	Ajuste de las observaciones realizadas por parte del INVIAS.

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 9

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10

2.1 LOCALIZACIÓN 10
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 13
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 14
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 15

3 INFORMACION CONVENIOS SOLIDARIOS 17

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS 17
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 20
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 21
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 21

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 21

4.1 INFORME SEMANAL 22
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO 22
4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 22
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO 22
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 22
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 22
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO 23
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO SOLIDARIO 23
4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 23

- *Seguimiento a la inversión de anticipo: 23*
- *Seguimiento Programa de Obra 23*
- *Seguimiento Programa de Inversiones 23*
- *Actas de Comité de obra 23*
- *Actas de reunión 23*

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 24

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 24

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR: 25

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 25

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC 25

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS. 26

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA. 26

- *Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad 26*

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 27

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 27

- *Seguimiento a la inversión del Anticipo 27*
- *Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado. 27*
- *Seguimiento al Plan de Cargas 27*

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27

8 ANEXOS 28

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 28

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 28

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS 28

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE. 28

LISTA DE TABLAS

Tabla 3.1- Información general del Convenio Solidario 3713 de 2023 - Vereda La Pizarrita 17
Tabla 3.2 - Información general del Convenio Solidario 3316 de 2023 - Vereda La Bonga 18
Tabla 3.3 - Información general del Convenio Solidario 4379 de 2023 - Vereda Luis Cano 19
Tabla 5.1- Información general del Contrato de interventoría No. 5023 de 2023 24

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 2.1 Departamento de Antioquia 10
Imagen 2.2 - Municipio de El Bagre 11
Imagen 2.3 - Vía El Bagre – Vereda La Pizarrita 11
Imagen 2.4 - Tramo a intervenir 12
Imagen 2.5 - Tramo a intervenir 12
Imagen 2.6 - Tramo a intervenir 13

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1 1
ANEXO 2 - RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 2
ANEXO 3. INFORME SEMANAL - MEPI-MN-IN-15-FR-3. 22
ANEXO 4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS - MEPI-MN1-IN-15-FR-12 23
ANEXO 5. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-7. 26
ANEXO 6. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-9. 26
ANEXO 7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-13 26

1 INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional, a través del instituto Nacional de Vías (INVIAS), dentro del marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, asignó fondos para apoyar el desarrollo del programa ejecutado por organismos y/o juntas de acción comunal, en cumplimiento de la legislación vigente.

El desarrollo de infraestructura vial y la conectividad con municipios y ciudades de las zonas rurales es crucial para su progreso y mejora en términos de movilidad. Estas comunidades experimentan un crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se fortalece su red vial.

Por consiguiente, la construcción de un camino ancestral en este sector desempeña un buen papel esencial en el mantenimiento y conservación de los caminos en esta área, lo que brinda confianza y seguridad tanto a peatones como a conductores que transitan por esta vía.

El informe siguiente proporciona todos los detalles relacionados con aspectos administrativos, técnicos, financieros, así como información detallada sobre el estado y el progreso de los Convenios Solidarios: No. 3713 de 2023 - Junta de Acción Comunal Vereda La Pizarrita, No. 3316 de 2023 - Junta de Acción Comunal Vereda La Bonga y No. 4379 de 2023 - Junta de Acción Comunal Vereda Luis Cano, los cuales tienen dentro de su objeto, aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y las Juntas de Acción Comunal del municipio de Bagre, Departamento de Antioquia, para el mantenimiento y/o mejoramiento vial en el marco del programa “caminos comunitarios de la paz total”, correspondiente al mes de Enero. Asimismo, se remite a INVIAS, a la Dirección Territorial Antioquia, al despacho del Supervisor del Contrato de interventoría No. 5023-2023, Ingeniero Mauricio Hoyos Sierra.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN[1]

El municipio de El Bagre se encuentra localizado en la zona oriente del Departamento de Antioquia, dista 281 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con Agricultura, ganadería y minería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 1563 Km cuadrados de los cuales solo 10,8 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales

El Municipio de El Bagre se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 7°36'17"N

Longitud: 74°48'31"O

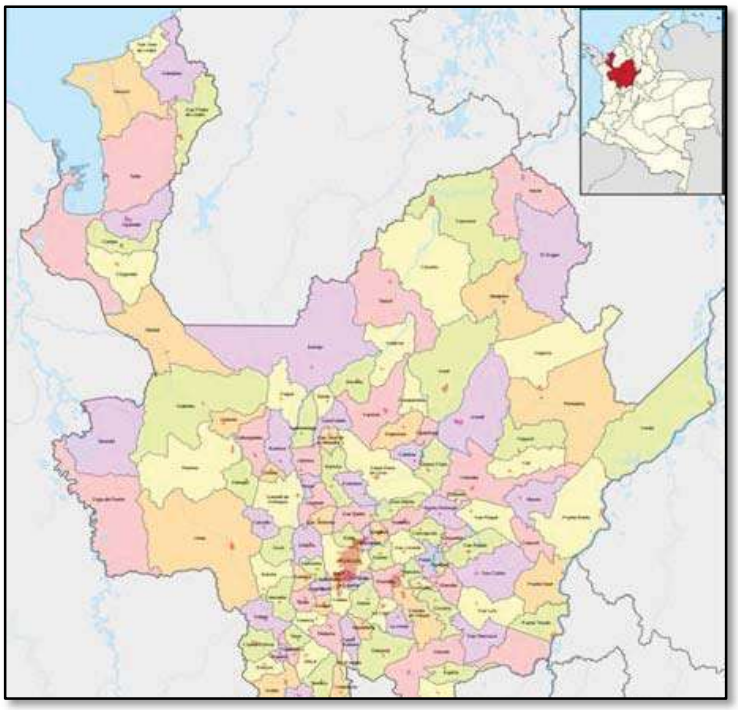


Imagen 2.1 Departamento de Antioquia

[1] Anexo 1 Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, SECOP II. Números de procesos SPSC-CD-CS-437-2023, - SPSC-CD-CS-216-2023, y - SPSC-CD-CS-846-2023.



Imagen 2.2 - Municipio de El Bagre

Los proyectos se ejecutan en tres lugares diferentes en zona rural del municipio de El Bagre, Departamento de Antioquia:

- Vereda La Pizarrita: teniendo como punto de referencia inicial con coordenadas (7°29'39.33"N, 74°41'49.58"O) y punto de referencia final con coordenadas (7°29'3.06"N, 74°41'49.08"O), de la vía terciaria vía villa chica abajo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.



Imagen 2.3 - Vía El Bagre – Vereda La Pizarrita



Imagen 2.4 - Tramo a intervenir

- **Vereda La Bonga:** teniendo como punto inicial las coordenadas planas 7.5257, -74.7327 y punto de referencia final las coordenadas 7.5362, -74.7435 de la vía terciaria, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.



Imagen 2.5 - Tramo a intervenir

- Vereda Luis Cano: teniendo como punto inicial las coordenadas 7°35'37.3"N 74°45'37.1"W y punto de referencia final las coordenadas 7°35'46.0"N 74°45'24.1"W de la vía terciaria, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

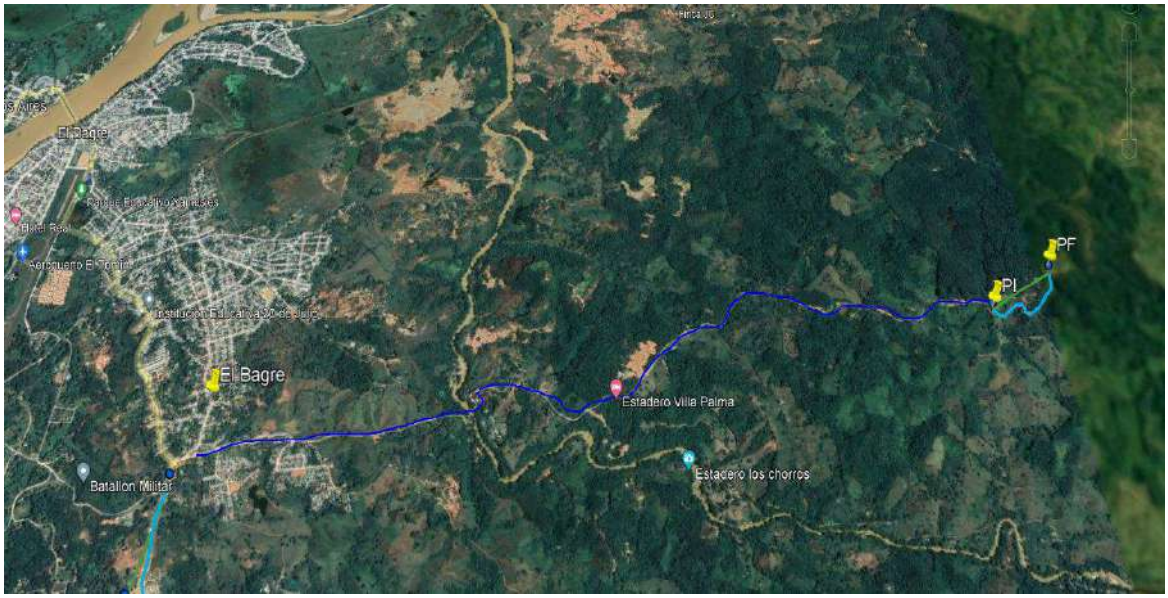


Imagen 2.6 - Tramo a intervenir

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto objeto del convenio de referencia se ejecuta en las veredas La Pizarrita, La Bonga y Luis Cano, zonas rurales del municipio del Bagre, Antioquia.

De su ejecución se beneficia la población de estas veredas directamente y visitantes temporales, mejorando la conectividad de los beneficiarios por cuanto al realizar la construcción de placa huella, esto repercute en mejorar el estado de las vías y mejorar la calidad de vida de los habitantes al permitir un mejor acceso a sus veredas.

Es de indicar que de acuerdo con los estudios previos del proyecto a ejecutar se señala por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, que:

> *"Que dentro de las funciones del INVIAS se encuentra la de brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de*

las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región."[2]

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

- Vereda La Pizarrita: Según reporte de visita ID:1281 realizada por el instituto Nacional de Vías INVIAS, dicha vía tiene el nombre de Vía Puerto Lopez, con un ancho promedio de 5,3 metros. Se identificaron por parte del INVIAS 3 alcantarillas las cuales requieren mantenimiento y 5 posibles puntos para construcción total de 140 metros de placa huella, con un ancho de 5 metros.[3]

Es una vía terciaria que comunica la vereda la Pizarrita con el casco urbano del municipio del Bagre, la cual se encuentra a nivel de afirmado, en muy mal estado debido a la falta de intervención y adecuación, condiciones que empeoran en la temporada de lluvias, volviendo de difícil transitabilidad la vía.

- **Vereda La Bonga:** Según reporte de Vía realizado por el instituto Nacional de Vías INVIAS, dicha vía tiene el nombre de Vía Puerto Lopez, con un ancho promedio de 4 metros. Se identificó por parte del INVIAS 1 alcantarilla la cual requiere mantenimiento y 4 posibles puntos para construcción total de 160 metros de placa huella, con un ancho de 4.10 metros [4]

Es una vía terciaria que comunica la vereda la Bonga con el casco urbano del municipio del Bagre, la cual se encuentra a nivel de afirmado, en muy mal estado debido a la falta de intervención y adecuación, condiciones que empeoran en la temporada de lluvias, volviendo de difícil transitabilidad la vía.

- Vereda Luis Cano: Según reporte de visita ID:1279 realizada por el instituto Nacional de Vías INVIAS, dicha vía tiene el nombre de Vía Luis Cano, con un ancho promedio de 6,51 metros. Se identificó por parte del

[2] Estudios Previos del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, SECOP II. Números de procesos - SPSC-CD-CS-437-2023, - SPSC-CD-CS-216-2023, y - SPSC-CD-CS-846-2023.
[3] Reporte de visita ID:1281 realizada por el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS - Dirección Técnica y de Estructuración. Subdirección de Planificación de Infraestructura – SPI, Grupo SIG, 04/08/2023. SECOP II. Número del proceso SPSC-CD-CS-437-2023.
[4] Reporte de Vía del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS "Necesidades de Caminos de la Paz Total" 04/08/2023. SECOP II. Número del proceso SPSC-CD-CS-216-2023.

INVIAS 2 alcantarillas y 1 posible punto para construcción total de 164 metros de placa huella, con un ancho de 5 metros y la construcción de un muro de gavión de con una longitud de 10 metros y una altura de 3 metros[5]

Es una vía terciaria que comunica la vereda Luis Cano con el casco urbano del municipio del Bagre, la cual se encuentra a nivel de afirmado, en muy mal estado debido a la falta de intervención y adecuación, condiciones que empeoran en la temporada de lluvias, volviendo de difícil transitabilidad la vía.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.[6]

Así mismo, según los presupuestos oficiales comprende:

Vereda la Pizarrita: 130 metros de placa Huella, las cuales incluyen las actividades de excavaciones, colocación de subbase granular, rieles y cunetas en concreto reforzado de 21 Mpa, concreto ciclópeo de 14 Mpa,19 metros de limpieza a mano de alcantarillas de 600 mm a 900 mm y la construcción de 6 metros de alcantarilla, las cuales incluyen las actividades de excavaciones, colocación de solado de limpieza, construcción de obras de encole y descole en concreto reforzado de 21 Mpa y todo lo relacionado con los llenos requeridos.

Vereda La Bonga: 140 metros aproximados de placa Huella las cuales incluyen las actividades de excavaciones, colocación de subbase granular, rieles y cunetas en concreto reforzado de 21 Mpa, concreto ciclópeo de 14 Mpa, 6 metros de limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900 mm, 1,30 Ha de desmonte y limpieza de zonas no boscosas.

[5] Reporte de visita ID:1279 realizada por el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS - Dirección Técnica y de Estructuración. Subdirección de Planificación de Infraestructura – SPI, Grupo SIG, 03/08/2023. SECOP II. Número del proceso SPSC-CD-CS-846-2023.
[6] Estudios Previos del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, SECOP II. Números de procesos - SPSC-CD-CS-437-2023, - SPSC-CD-CS-216-2023, y - SPSC-CD-CS-846-2023.

Vereda Luis Cano: 164 metros de placa Huella las cuales incluyen las actividades de excavaciones, colocación de subbase granular, rieles y cunetas en concreto reforzado de 21 Mpa, concreto ciclópeo de 14 Mpa, construcción de 1 metro de alcantarilla, las cuales incluyen las actividades de excavaciones, colocación de solado de limpieza, construcción de obras de encole y descole en concreto reforzado de 21 Mpa y todo lo relacionado con los llenos requeridos.

De igual manera se contempla la ejecución de actividades ambientales y sociales del programa de adaptación de la guía de manejo socioambiental (PAGA), orientados a evitar, prevenir, corregir y mitigar o compensar los impactos generados en desarrollo del proceso de mejoramiento de la vía mencionada.

3 INFORMACION CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO No. - AÑO	3713 DE 2023
No. DEL PROCESO SECOP II	SPSC-CD-CS-437-2023
ID DEL CONTRATO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.5434254
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA
CC. O NIT	901.664.354-1
REPRESENTANTE LEGAL	LENY ESTER GUZMAN MELENDRES
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO	$200.226.683
FECHA DE INICIACIÓN	12 de diciembre del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre del 2023
PRORROGA No. 1	30 de diciembre del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1	30 de abril de 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN	VEREDA LA PIZARRITA – MUNICIPIO DE EL BAGRE
SUPERVISOR	MAURICIO HOYOS SIERRA
INTERVENTOR	INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S CONTRATO No. 5023-2023

Tabla 3.1- Información general del Convenio Solidario 3713 de 2023 - Vereda La Pizarrita

CONVENIO No. - AÑO	3316 DE 2023
No. DEL PROCESO SECOP II	SPSC-CD-CS-216-2023
ID DEL CONTRATO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.5375152
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BONGA
CC. O NIT	900.349.042-3
REPRESENTANTE LEGAL	DIONISIO MANUEL MARTINEZ ROMERO
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BONGA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR DEL CONVENIO	$198.724.981
FECHA DE INICIACIÓN	19 de diciembre del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre del 2023
PRORROGA No. 1	30 de diciembre del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1	30 de abril de 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN	VEREDA LA BONGA– MUNICIPIO DE EL BAGRE
SUPERVISOR	MAURICIO HOYOS SIERRA
INTERVENTOR	INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S CONTRATO No. 5023-2023

Tabla 3.2 - Información general del Convenio Solidario 3316 de 2023 - Vereda La Bonga

CONVENIO No. - AÑO	4379 DE 2023
No. DEL PROCESO SECOP II	SPSC-CD-CS-846-2023
ID DEL CONTRATO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.5546429
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LUIS CANO
CC. O NIT	900.039.934-8
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE DE LA CRUZ PEREZ VELASQUEZ
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LUIS CANO, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO	$199.775.182
FECHA DE INICIACIÓN	22 de diciembre del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre del 2023
SUSPENSIÓN No. 1	28 de diciembre del 2023
REANUDACION No. 1	17 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION (SUSPENSION 1)	20 de enero de 2024
PRORROGA No. 1	19 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1	30 de abril de 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN	VEREDA LUIS CANO– MUNICIPIO DE EL BAGRE
SUPERVISOR	MAURICIO HOYOS SIERRA
INTERVENTOR	INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S CONTRATO No. 5023-2023

Tabla 3.3 - Información general del Convenio Solidario 4379 de 2023 - Vereda Luis Cano

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo correspondiente al presente informe (del 1 al 31 de enero de 2024) no se ejecutaron actividades de obra, por cuanto el proyecto establece una etapa de revisión previa por parte de las Juntas de Acción Comunal de acuerdo con los lineamientos y contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS. Por otra parte, y para dinamizar dicha etapa las JAC se encuentran realizando lo siguiente:

Vereda la Pizarrita: La Junta de Acción Comunal se encuentra en el proceso de selección del personal que requiere vincular para la ejecución del proyecto, según lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Vereda la Bonga: La Junta de Acción Comunal se encuentra en el proceso de selección del personal que requiere vincular para la ejecución del proyecto, según lo establecido en las Especificaciones Técnicas

Vereda Luis Cano: El 17 de enero de 2024 se reanudo en la plataforma del SECOP II la ejecución del Convenio Solidario suscrito entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y La Junta de Acción Comunal de la vereda Luis Cano. Es de indicar que dicho Convenio se suspendió desde el 28 de diciembre de 2023, y las causas que dieron origen a dicha suspensión según el acta mencionada hacen referencia a: *"(…) inconvenientes en la consecución y disponibilidad de mano de obra no calificada y calificada de la comunidad para ser vinculada al proyecto, así como la disponibilidad de entrega de materiales por parte de los proveedores (…)".* Por otra parte, haciendo referencia la necesidad de contar con el acompañamiento idóneo y en territorio a través de una interventoría, *"(…) Proceso que actualmente se encuentra en trámite el cual ha resultado más extenso de lo previsto, por lo cual resulta necesario suspender el Convenio hasta tanto se cuenta con la interventoría".*

La Junta de Acción Comunal según la suspensión citada, presentó dificultades por la temporada decembrina para la consecución y disponibilidad de mano de obra, así como la consecución y cotización con proveedores de insumos, por lo que se encuentra en el proceso de selección del personal que requiere vincular para la ejecución del proyecto, según lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Por otro lado, ya se encuentra en ejecución el contrato de interventoría requerido por la Entidad para realizar seguimiento al desarrollo del Convenio Solidario.

El 19 de enero de 2024 se prorroga el plazo del Convenio Solidario número 4379 de 2023, hasta el 30 de abril de 2024, según solicitud elevada por la JAC, y teniendo en cuenta los inconvenientes presentados para el perfeccionamiento del Convenio, y los motivos que dieron origen a la suspensión, los cuales afectaron el plazo para la correcta ejecución de las obras.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Durante este periodo se estableció contacto con representantes de las Junta de Acción Comunal realizando la presentación de la Interventoría asignada para realizar seguimiento a los Convenios Solidarios.

Inicialmente los Convenios Solidarios prevén la etapa de revisión y ajuste de diseños a cargo de las Juntas de Acción Comunal, para lo cual, las JAC se encuentran en el proceso de selección del personal requerido según anexo técnico.

El 17 de enero de 2024 se reanudo en el SECOP II el Convenio Solidario suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Luis Cano, y el 19 de enero esta anualidad, se prorroga el plazo del Convenio hasta el 30 de abril de 2024.

La Interventoría está atenta a la presentación de la información inicial por parte de las J.A.C y a resolver las dudas que surjan al respecto.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero del 2024, la información se relaciona en el **ANEXO 2 - MEPI-MN1-IN-15-FR-2**

4.1 INFORME SEMANAL

El desarrollo semanal del Convenio Solidario se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los informes semanales están suscritos por el director de interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III- Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. Gestión Social, VI. Actividades realizadas en la semana y acumuladas, VII. Actividades a realizar en la siguiente semana, VIII. Esquema grafico avance metas físicas programadas vs metas físicas, XI. Registro fotográfico y XII. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de contratista.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto en el **ANEXO 3. INFORME SEMANAL - MEPI-MN-IN-15-FR-3.**

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

A la fecha del presente informe no se han desarrollado actividades de obra por lo tanto no aplica la presentación de dicho formato.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

A la fecha del presente informe no se han desarrollado actividades de obra por lo tanto no aplica la presentación de dicho formato.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

A la fecha del presente informe no se han desarrollado actividades de obra por lo tanto no aplica la presentación de dicho formato.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

A la fecha del presente informe no se han desarrollado actividades de obra por lo tanto no aplica la presentación de dicho formato.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

A la fecha del presente informe no se han desarrollado actividades de obra por lo tanto no aplica la presentación de dicho formato.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

Se diligencia el **ANEXO 4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS - MEPI-MN1-IN-15-FR-12**

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO SOLIDARIO

A la fecha no se presentan los documentos del plan de calidad presentado por el contratista de obra.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión de anticipo:**

  Los Convenio Solidarios No. 3713, 3316, y 4379 de 2023, no contempla anticipo en su forma de pago.

- **Seguimiento Programa de Obra**

No aplica para el periodo de presentación del presente informe.

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

  No aplica para el periodo de presentación del presente informe.

- **Actas de Comité de obra**

  No aplica para el periodo de presentación del presente informe.

- **Actas de reunión**

  No aplica para el periodo de presentación del presente informe.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	5023-2023
FECHA DE SUSCRIPCION	19 de diciembre de 2023
No. DEL PROCESO SECOP II	IP-DT-ANT-033-2023
ID DEL CONTRATO EN SECOP II:	CO1.SLCNTR.11842427
CONTRATISTA	INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S RL: Cesar Mauricio Castañeda Salcedo
NIT	900.819.630-1
DIRECCION /TELEFONO	Calle 2B No. 81A – 460. Cel. 312 2031439
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
PLAZO INICIAL	Hasta 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	29 de diciembre del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre del 2023
PRORROGA No. 1	29 de diciembre del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1	29 de marzo de 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 93.664.308
VALOR ACTUAL	$ 93.664.308

Tabla 5.1- Información general del Contrato de interventoría No. 5023 de 2023

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR:

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2024, la interventoría desarrollo las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución de los Convenio Solidario No. No. 3713, 3316, y 4379 de 2023.

Dentro de las actividades administrativas se encuentran:

- Elaboración de informe semanales de interventoría.
- Elaboración de informe mensual de interventoría
- Se atiende a la reanudación en la plataforma del SECOP II del Convenio Solidario suscrito entre en Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Luis Cano, lo cual se llevó a cabo el 17 de enero de 2024, según acta de suspensión suscrita entre las partes.
- Se dio el trámite requerido por el INVIAS a la solitud de prórroga del Convenio Solidario elevado por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Luis Cano.

Dentro de las actividades técnicas se realizaron:

- En el presente informe no hay labores técnicas.

Visita a la obra:

- En el presente periodo no se presentaron visitas a la obra

Reunión de comité de obra:

- En el presente periodo no se realizaron comités de obra.

Se llevo a cabo acercamientos con las Juntas de Acción Comunal objeto del contrato de Interventoría.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

En el presente informe no se requirieron informes de los especialistas.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

En el presente informe no aplica

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

En el presente informe no aplica

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

- **Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.**

En el presente informe no aplica

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha no se registran actividades que requieran desplazamiento por parte de la interventoría, por lo tanto, no aplica dicho formato.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjunta el **ANEXO 5. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-7** en el que se relaciona el personal de interventoría dispuesto para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2024.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjunta el **ANEXO 6. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-9** en el que se relaciona información financiera y presupuestal del contrato de interventoría.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjunta **ANEXO 7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-13** en el que se relacionan la póliza del contrato de interventoría (Garantía Única).

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No aplica para este tipo de proyecto.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

El contrato de interventoría No. 5023 de 2023 no contempla anticipo en su forma de pago.

- **Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.**

Para el periodo del presente informe no se han generado plan de cargas.

- **Seguimiento al Plan de Cargas**

Para el periodo del presente informe no se han generado plan de cargas.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda dar continuidad a la “etapa de revisión” contemplada en el anexo técnico y a cargo de las Juntas de Acción Comunal.
- Se recomienda dar continuidad a la selección del personal requerido para la ejecución de la obra según lo contemplado en el anexo técnico.
- Se recomienda iniciar la selección de los proveedores requeridos para la ejecución de las obras tales como: alquiler de equipos, maquinaria, insumos y material de ferretería.
- Se reanudo en la plataforma del SECOP II el Convenio Solidario suscrito entre en Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Luis Cano.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

No Aplica. En el presente periodo no se presenta correspondencia entre el contratista e interventoría.

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

No Aplica. En el presente periodo no se realizan actividades de obra.

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

No Aplica. En el presente periodo no se realizan actividades de obra.

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.

No Aplica. En el presente periodo no se realizan actividades de obra.
