INFORME DE ACTIVIDADES

Rev. 1- 2021-06-30
Formato Anexo -014

INFORME FINAL DE SUPERVISION

PERIODO DE INFORME: 13/12/2023 a 28/12/2023 y 09/02/2024 a 12/02/2024

1 TABLA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS Y POZA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CHENTICO DEL RESGUARDO PERRATPU, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA
CÓDIGO BPIN	BPIM- 2023440010103
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($65.745.505)
PROBLEMA	En la zona rural del municipio se presentan aún altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) pese a los esfuerzos realizados por las Administraciones municipales en materia de vivienda y servicios públicos. Esta situación afecta la salud y el desarrollo integral de las personas que allí habitan, genera impactos ambientales negativos y la disminución de las actividades productivas de la zona. Debido a la dispersión de las viviendas rurales, el sistema de alcantarillado no tiene cobertura en esta zona y en cada vivienda la disposición de las aguas residuales se realiza de forma inadecuada hacia los terrenos aledaños a la vivienda, así como hacia los ríos y lagunas. En el mejor de los casos las viviendas cuentan con una unidad sanitaria construida artesanalmente que podría representar riesgo de colapso o problemas de salubridad. Esta situación genera un alto riesgo de trasmisión de enfermedades especialmente en la población infantil.
OBJETIVOS GENERAL	**DISMINUIR LOS NIVELES DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR EN LA ZONA RURAL DISPERSA.**

2 TABLA DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
CONTRATO	028 DE 2023	**FECHA CONTRATO**	12	12	2023
CONTRATISTA	FUNDACIÓN SOCIAL INDÍGENA WALE-KERU. NIT. 900.123.258-6				
REPRESENTANTE LEGAL	JUDITH DEL CARMEN ROJAS IPUANA CC.#40. 937.857 de Riohacha -La Guajira				
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($65.745.505)				
ACTA INICIO	SI	**FECHA INICIO**	13	12	2023
ACTA ADICION	NO	**FECHA ADICCION**			
ACTA TERMINACION	SI	**FECHA TERMINACION**	12	02	2024
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE				

INFORME DE ACTIVIDADES

Rev. 1- 2021-06-30
Formato Anexo -014

ACTA MODIFICACION	SI	FECHA MODIFICACION	22	12	2023
ACTA SUSPENSION No 001	SI	FECHA SUSPENSION	28	12	2023
ACTA DE POSESION	NO	ACTA DE POSESION			
ACTA DE PRORROGA No 001	NO	ACTA DE PRORROGA			
ACTA DE REUNION COMITÉ TECNICO	NO	ACTA DE REUNION COMITÉ TECNICO			
ACTA REINICIO No 001	SI	ACTA REINICIO	09	02	2024
ACTA DE ENTREGA	SI	ACTA DE ENTREGA	06	03	2024
3 TABLA IMPUTACION PRESUPUESTA					
CDP No.1	0000001	Fecha	25	10	2023
R.P No:1	0000002	Fecha:	13	12	2023
FUENTE FINANCIACION No.1	1.3.3.11.00 Asignación especial resguardo				
VALOR AUTORIZADO PAGADO	$ 65.745.505	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	100		
NUMERO CUENTA	528-000055-72 CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA S.A.				
SUPERVISOR DESIGNADO	JAIME ORLANDO BRUGES MORENO				
CARGO SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS				
SUPERVISOR DE APOYO	ANTONI DAVID OÑATE RIVADENEIRA				
CARGO SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO				
FECHA REVISION SUPERVISOR	14 DE FEBRERO DEL 2024	No. DE REVISION	1		

4. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO				
POBLACION MGA			POBLACION ATENDIDA	
GRUPO ETÁREO				
TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	20		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	20
GRUPOS ETNICOS				
GÉNERO				

INFORME DE ACTIVIDADES

6. GARANTÍAS OTORGADAS:

POLIZA SEGÚN ACTA DE INCIO				
Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO		No. De Póliza:	85-44-101125457
Amparo	Sumas Aseguradas	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor de Prima
Cumplimiento	$6.574.550,50	13/12/2023	30/06/2024	
Pago de salarios y prestaciones	$3.287.275,25	13/12/2023	31/12/2027	
Estabilidad de la obra	$6.574.550,50	13/12/2023	31/12/2023	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$32.872.752,50	13/12/2023	31/12/2026	
Responsabilidad Civil	$ 232.000.000,0	13/12/2023	31/12/2023	

7. PAGO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES	AMORTIZACIÓN	EJECUCIÓN	VALOR A PAGAR
Valor Inicial Del Contrato	$ 65.745.505	$ 32.872.752,5	$ 65.745.505	
Anticipo Pactado (50%)	$ 32.872.752,5			
Valor Acta Parcial	0			
Menos Amortización Anticipo Acta De Recibo parcial	$ 32.872.752,5			
TOTAL A PAGAR				$ 32.872.752,5

Se autoriza el pago del valor ejecutado.

8. PERSONAL VINCULADO

Diciembre 2023

Nombre	Cedula	No. Planilla Salud	Periodo salud diciembre 2023		
JUDITH ROJAS IPUANA	40937857	7908844410	13	a	28
ÁLVARO RODRÍGUEZ PEREZ	72270722	4540499067	13	a	28
DAVID CALDERON SIERRA	8703544	540500790	13	a	28
WILDER IPUANA URIANA	1124375548	4540508491	13	a	28

Febrero 2024

INFORME DE ACTIVIDADES

Rev. 1- 2021-06-30
Formato Anexo -014

Nombre	Cedula	No. Planilla Salud	Periodo salud		
			FEBRERO 2024		
JUDITH ROJAS IPUANA	40937857	7918957221	09	a	12
ÁLVARO RODRÍGUEZ PEREZ	72270722	4540499768	09	a	12
DAVID CALDERON SIERRA	8703544	4540501258	09	a	12
WILDER IPUANA URIANA	1124375548	4540502297	09	a	12

9. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ACTIVIDAD MGA	Las actividades realizadas por periodo ejecutado (obligaciones del contratista)	Cumplimiento a satisfacción de las cláusulas contractuales	Bien	Servicio
1.1.1	REALIZAR LAS OBRAS PRELIMINARES	SI	SI	SI
1.1.2	REALIZAR LA EXCAVACION	SI	SI	SI
1.1.3	REALIZAR LA CIMENTACION	SI	SI	SI
1.1.4	CONSTRUIR LAS ESTRUCTURA EN CONCRETO	SI	SI	SI
1.1.5	CONSTRUIR LA CUBIERTA	SI	SI	SI
1.1.6	CONSTRUIR LA MAMPOSTERIA	SI	SI	SI
1.1.7	REALIZAR LOS ACABADOS	SI	SI	SI
1.1.8	INSTALACIONES HIDRAULICAS	SI	SI	SI
1.1.9	INSTALACIONES SANITARIAS	SI	SI	SI
1.1.10	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	SI	SI	SI
1.1.11	CONSTRUIR LA ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO	SI	SI	SI
1.1.12	INSTALAR LOS PISOS	SI	SI	SI

- **ASPECTO TECNICO**

El contratista cumplió con la ejecución del 100% de la obra, cumpliendo con cada una de las actividades descritas y especificaciones contratadas.

- **ASPECTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO**

INFORME DE ACTIVIDADES

Rev. 1- 2021-06-30
Formato Anexo -014

El contratista cumplió a cabalidad con cada uno de los aspectos administrativos y jurídicos para la legalidad y ejecución del contrato para que se realizara en el plazo estipulado, cumpliendo con el pago de la seguridad social con cada uno de sus trabajadores y de esta manera entregaron el paz y salvo de parafiscales.

9.1 ADQUISICIÓN DE BIENES.

BIEN ADQUIRIDOS	Descripción del Bien	Cant.	Ingreso al almacén del Distrito			Salida de almacén del Distrito		
N/A	N/A							

10. Descripción de Actividades Realizadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto:

ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS	Avance Físico	Avance Financ.
1.1	Localización y replanteo	100%	100%
1.2	Descapote manual h=0.10 m.	100%	100%
1.3	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	100%	100%
1.4	Relleno con tierra arenosa (Amarilla)	100%	100%
1.5	Concreto ciclopeo sin formaleta, concreto 3000 psi(60% ccto+40% piedra)	100%	100%
1.6	Viga cimentacion 30x20 concreto de 3.000 psi (21 mpa) no incluye ref.	100%	100%
1.7	Sobrenivel sencillo en bloque macizo h=30 cm	100%	100%
1.8	Refuerzo fy=4200 kg/cm2 1/2"	100%	100%
1.9	Refuerzo fy=2800 kg/cm2 3/8" estructural	100%	100%
1.10	Columneta en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo	100%	100%
1.11	Viga sobre muro de (0.10.0x20.0) cm2 con ref. (3000psi)	100%	100%
1.12	Placa maciza de entrepiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,12 m	100%	100%
1.13	Cubierta en teja ondulada transparente # 6 (No incl. estructura)	100%	100%
1.14	Estructura en madera para cubierta	100%	100%

INFORME DE ACTIVIDADES

1.15	Pisa en concreto de 3.000 psi 0.25 x 0.15 mts	100%	100%
1.16	Muro en bloque hueco abujardado una cara de cemento de 0,09 x 0,18 x 0,38 mts	100%	100%
1.17	Calados en mortero tipo ojo de buey.	100%	100%
1.18	Muro en bloque macizo 0,09 x 0,18 x 0,38 m	100%	100%
1.19	Placa de contrapiso en concreto de 17,2 Mpa con malla elec. e = 0,07 m (2.500 Psi)	100%	100%
1.20	Plantilla de nivelación mortero 1:3 e = 0,05 m para pisos	100%	100%
1.21	Pañete allanado en mortero 1:4	100%	100%
1.22	Piso en cerámica de 1ra. de 40 x 40 cm tipo Mangle, no incluye mortero	100%	100%
1.23	Ceramica para muro primera calidad	100%	100%
1.24	Graniplast aplicado para muro	100%	100%
1.25	Instalaciones hidráulicas	100%	100%
1.26	Instalaciones sanitarias	100%	100%
1.27	Puerta en lámina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa, manija y tope	100%	100%
1.13	Cubierta en teja ondulada transparente # 6 (No incl. estructura)	100%	100%
1.14	Estructura en madera para cubierta	100%	100%
1.15	Pisa en concreto de 3.000 psi 0.25 x 0.15 mts	100%	100%
1.16	Muro en bloque hueco abujardado una cara de cemento de 0,09 x 0,18 x 0,38 mts	100%	100%
1.17	Calados en mortero tipo ojo de buey.	100%	100%
1.18	Muro en bloque macizo 0,09 x 0,18 x 0,38 m	100%	100%
1.19	Placa de contrapiso en concreto de 17,2 Mpa con malla elec. e = 0,07 m (2.500 Psi)	100%	100%
1.20	Plantilla de nivelación mortero 1:3 e = 0,05 m para pisos	100%	100%
1.21	Pañete allanado en mortero 1:4	100%	100%

INFORME DE ACTIVIDADES

1.22	Piso en cerámica de 1ra. de 40 x 40 cm tipo Mangle, no incluye mortero	100%	100%
1.23	Ceramica para muro primera calidad	100%	100%
1.24	Graniplast aplicado para muro	100%	100%
1.25	Instalaciones hidráulicas	100%	100%
1.26	Instalaciones sanitarias	100%	100%
1.27	Puerta en lámina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa, manija y tope	100%	100%
	ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO	100%	100%
2.1	Localización y replanteo	100%	100%
2.2	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	100%	100%
2.3	Solado en concreto de 10,3 Mpa	100%	100%
2.4	Columna de 30x30 (3000 psi) no incluye ref.	100%	100%
2.5	Zapatas en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi), no incluye refuerzo	100%	100%
2.6	Placa maciza de entrepiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,12 m	100%	100%
2.7	Tanque para agua, plástico de 500 lt, completo (flotador)	100%	100%
2.8	Turbina 1/2"	100%	100%

11. Localización Específica de los lugares en las cuales se realizaron las actividades.


Lugar especifico	Ubicación (Urbano/Rural)	No. Actividad
COMUNIDAD DE CHENTICO	RURAL	

12. Informe fotográfico y/o Evidencias


COMUNIDAD INDIGENA CHENTICO: ACTIVIDADES EJECUTADAS.


INFORME DE ACTIVIDADES


Rev. 1- 2021-06-30
Formato Anexo -014

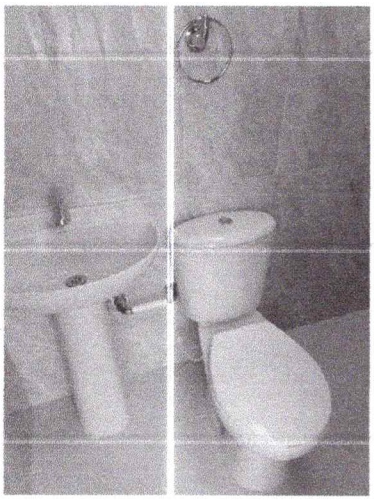




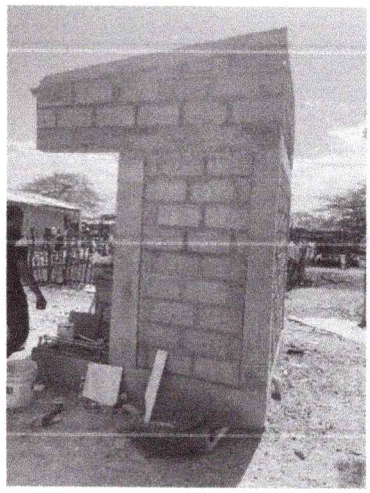


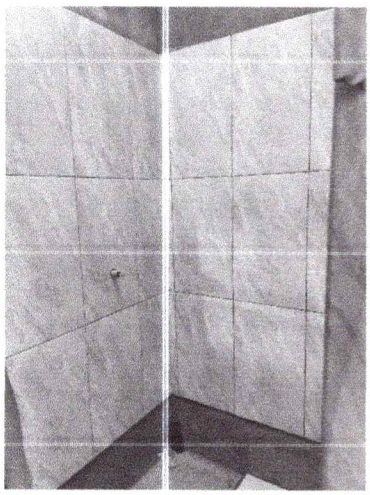


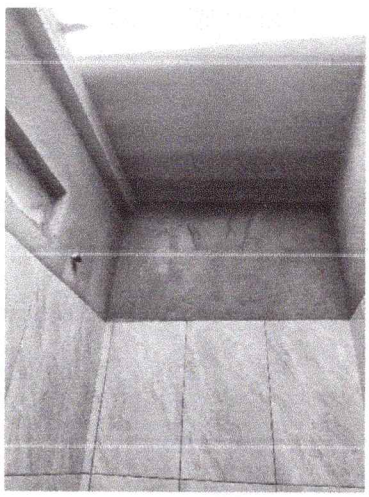

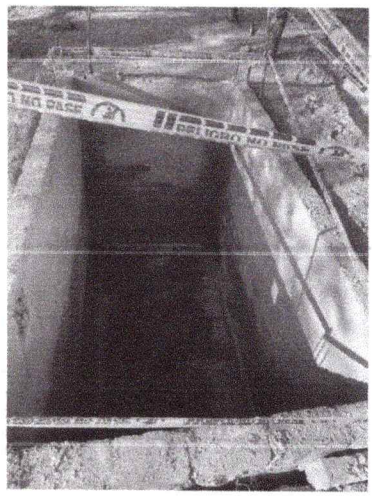

INFORME DE ACTIVIDADES

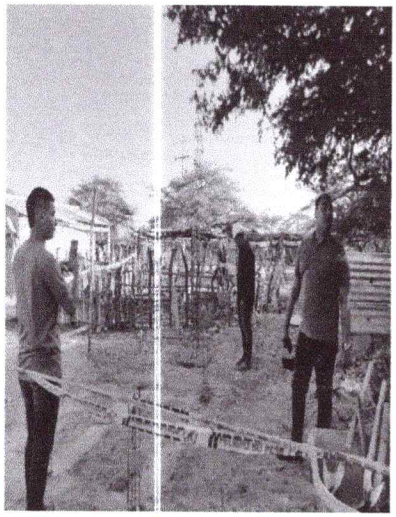

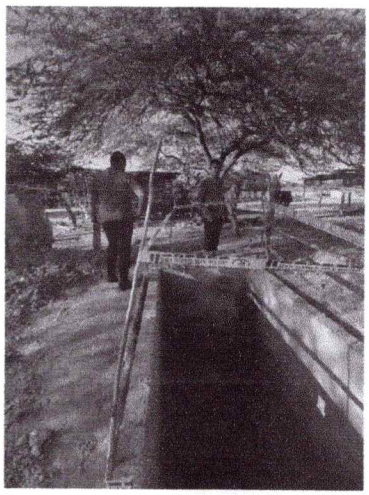

13. Restricciones y Limitaciones

Restricciones y Limitaciones	
Propios:	N/A
Ajenos/Exógenos:	N/A
Presupuestales:	N/A

ANTONI DAVID OÑATE RIVADENEIRA
SUPERVISOR DE APOYO.

JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCUTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.
