CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300
		VERSIÓN: 00
		23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**Contrato de obra No.133 de 2022**				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	101	**DEL**	**22 de abril de 2024**	**AL**	**28 de abril de 2024**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	707	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ	

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO COLEGIO ERU 2022**	**INTERVENTOR:**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**133 de 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Valor Adicion No.01	$ 9,372,533,448.00	**Valor Adicion No.01**	$ 608,308,421.00
Valor Total	$ 52,694,671,128.00	**Valor Total**	$ 2,178,466,360.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Prorroga No.01	7 MESES	**Prorroga No.01**	7 MESES
Plazo Actualizado	24 MESES	**Plazo Actualizado**	24 MESES
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	22 de mayo de 2024	**Fecha de Terminación**	22/05/2024
No póliza contrato de obra	CBC-100035966	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	11/10/2023 hasta 23/11/2024	$ 10,538,934,255.60	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11/10/2023 hasta 23/05/2027	$ 5,269,467,112.80	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/05/2024 hasta 23/05/2029	$ 13,173,667,782.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	11/10/2023 hasta 23/07/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/05/2024	$ 2,634,733,556.00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

No	Ubicación de la actividad	ESTADO	Valor Programado a la fecha	Valor total actividad costo directo	Valor ejecutado acumulado	%AVANCE	Descripción de la Actividad
1.3.3	Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	EJEUCIÓN	$ 113,689,014	$ 382,029,112.08	$ 103,946,966	27.21%	LLENO TANQUE AGUAS LLUVIAS
2.1.4	Suministro y colocacion Concreto para zapatas de cimentacion 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ -	$ 92,445,124.80	$ 46,858,264	50.69%	CIMENTACION TEATRINO PARTE 2
2.3.1	Suministro e instlación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 7,642,051	$ 2,193,172,276.96	$ 2,008,615,430	91.58%	CIMENTACION TEATRINO. BORDE VIGA MODULO K.
4.1.1	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 1,556,981,392	$ 870,056,615.83	$ 748,032,092	85.98%	NODOS CUBIERTA MODULO J.
4.1.2	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 329,186,720	$ 1,707,849,178.75	$ 1,546,393,891	90.55%	CUBIERTA MODULO J
4.2.1	Suministro e instalacion de Acero de refuerzofigurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	EJEUCIÓN	$ 11,805,943	$ 1,778,361,613.00	$ 1,678,257,397	94.37%	ACERO DE MAMPOSTERIA (DOVELAS, ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, ALFAJIAS, POYOS, BORDILLOS) DE LOS MODULOS L / M / N / G / H
4.4.1	Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)	EJEUCIÓN	$ 7,956,766	$ 3,948,097,736.16	$ 3,411,480,048	86.41%	ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE PARA CORTASOLES.
4.4.2	Suministro e instalacion de Junta constructiva manto de poliestireno de alta densidad (unión entre edificaciones)	EJEUCIÓN	$ -	$ 29,997,028.81	$ 10,965,009	36.55%	TERRAZAS ENTRE MODULOS L / M / N / G / H
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	EJEUCIÓN	$ 5,058,377	$ 1,709,972,228.90	$ 1,160,862,047	67.89%	MODULO I - NIVELES 1 y 2.
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	EJEUCIÓN	$ 3,702,804	$ 927,803,448.00	$ 739,906,695	79.75%	MODULO I - NIVELES 1 y 2.
6.1.3.3	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 2" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI	EJEUCIÓN	$ 637,267	$ 7,491,949.50	$ 2,356,112	31.45%	ZONA EXTERIOR (TEATRINO - PARALELO MODULO I y MODULO P)

CONSORCIO 2022 COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300
		VERSIÓN: 00
		23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**Contrato de obra No.133 de 2022**				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	101	**DEL**	**22 de abril de 2024**	**AL**	**28 de abril de 2024**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	707	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ	


6.1.5.12	Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 2.1/2"	EJECUCIÓN	$ 926,196	$ 1,724,634.00	$ 1,724,634	100.00%	MODULO M - NIVEL 1
6.1.8.3	Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1/2" (Sanitario de tanque, lavamanos, lavaplatos, ducha, bebedero, pocetas para aseo, salidas de manguera, puntos de suministro para cocina)	EJECUCIÓN	$ -	$ 21,961,896.00	$ 18,145,347	82.62%	MODULO I - NIVEL 1 y 2.
9.4.1	Suministro e instalacion Tuberia pvc sch 40 (rde21) de 4",incluye (tuberia, codo, union, tee, adaptador macho y hembra, union universal, soldadura, limpiador, cañuela preformada, soporteria y mano de obra de instalacion)	EJECUCIÓN	$ -	$ 4,067,350.25	$ 4,067,350	100.00%	MODULO G - NIVEL 1.
12.1.1	Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	EJECUCIÓN	$ 168,133,324	$ 1,059,112,760.45	$ 688,294,558	64.99%	MODULO L - NIVEL 1.
12.1.10	Construcción de Piso concreto (rayado o escobeado) en concreto de 3000 PSI e=0.10M	EJECUCIÓN	$ 5,342,386	$ 54,948,994.50	$ 54,948,021	100.00%	MODULO L - NIVEL 1.
13.3.1	Afinado, pendientado e impermeabilizado de cubiertas planas en mortero 1:4 e=5 cm (incluye media caña)	EJECUCIÓN	$ 54,530,207	$ 390,958,072.32	$ 203,542,527	52.06%	MODULO L - NIVEL 1.
21.1.4	Suministro y colocacion Sub base granular b -400	EJECUCIÓN	$ 128,590,341	$ 25,333,340.22	$ 25,333,340	100.00%	PLAZOLETA DE BANDERAS
26.1	Aseo Permanente en Obra	EJECUCIÓN	$ 77,831,487	$ 69,027,840.00	$ 60,157,440	87.15%	MODULO I y G - NIVEL 1
28.1	Mejoramiento de terreno y deteccion de fallos	EJECUCIÓN	$ -	$ 65,205,611.51	$ 28,935,849	44.38%	TANQUE DE AGUAS LLUVIAS
28.2	Tratamiento de fallos	EJECUCIÓN	$ 35,504,499	$ 433,897,745.72	$ 338,648,758	78.05%	TANQUE DE AGUAS LLUVIAS
28.5	Construcción de Placa aligerada en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) a la vista con casetón en icopor h= 0.49m y bocel,	EJECUCIÓN	$ 87,270,317	$ 720,751,868.55	$ 632,450,600	87.75%	CUBIERTA MODULO J
28.6	Elemento de concreto reforzado dentro de mamposteria (Dovela en grouting)	EJECUCIÓN	$ 18,114,256	$ 439,360,678.80	$ 307,762,913	70.05%	MODULO I - NIVELES 1 y 2.
28.17	Alistados de pisos en mortero 1:4 e=5 cm	EJECUCIÓN	$ 19,023,239	$ 624,358,986.00	$ 313,484,952	50.21%	MODULO L - NIVEL 1.
28.20	Remate de muros con hilada parada con ladrillos prensados de 0,245x0,12x0,06 m color coral	EJECUCIÓN	$ 77,510,109	$ 127,562,083.74	$ 120,058,534	94.12%	MODULO I - NIVELES 1 y 2.
28.21	Chapa en ladrillo prensado instalación tradicional - (incluye, safarreo y escarificación) ancho menor e igual a 60cm.	EJECUCIÓN	$ 455,911	$ 114,481,036.98	$ 98,178,299	85.76%	MODULO I - NIVELES 1 y 2.
28.25	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M , menor o igual a 60 cm de longitud . Incluye mortero de pega	EJECUCIÓN	$ 30,665,139	$ 641,250,880.88	$ 509,111,031	79.39%	MODULO I - NIVELES 1 y 2.
28.30	Suministro e instalacion de perfil 100 x 3 mm, pintura anticorrosiva y acabado esmalte color aluminio natural	EJECUCIÓN	$ 34,891,881	$ 373,442,715.90	$ 262,022,882	70.16%	MODULO M - NIVEL 1
28.33	Suministro e instalación de dilatación plástica en color blanco para baldosa en granito.	EJECUCIÓN	$ 33,961,517	$ 28,015,490.69	$ 26,607,823	94.98%	MODULOS L / M / N / G / H
28.51	Bordillo arranque de ventaneria en concreto reforzado de 3000 PSI a la vista biselado, en situ - (Dimensiones 0,2 x 0,12) Diseño y especificaciones técnicas según diseño estructural. .	EJECUCIÓN	$ 5,602,092	$ 81,035,798.76	$ 73,007,448	90.09%	MODULO H - NIVEL 2.
28.61	suministro e instalacion de impermeabilizante en manto Poliester 3mm, sin foil de aluminio, incluye emulsion asfaltica	EJECUCIÓN	$ 14,513,283	$ 167,013,862.40	$ 101,019,597	60.49%	TERRAZA TRANSITABLE MODULO N y G.

CONSORCIO 2022 COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300
		VERSIÓN: 00
		23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**Contrato de obra No.133 de 2022**				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	101	**DEL**	**22 de abril de 2024**	**AL**	**28 de abril de 2024**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	707	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO EJE.	AVANCE
$ 36,634,398,592.66	$ 1,131,024,295.86	$ 37,765,422,888.53	$ 28,076,434,305.41	$ 365,017,976.15	$ 28,441,452,281.56	-$ 9,323,970,606.97
85.50%	**2.64%**	**88.14%**	**65.53%**	**0.85%**	**66.38%**	**-21.76%**

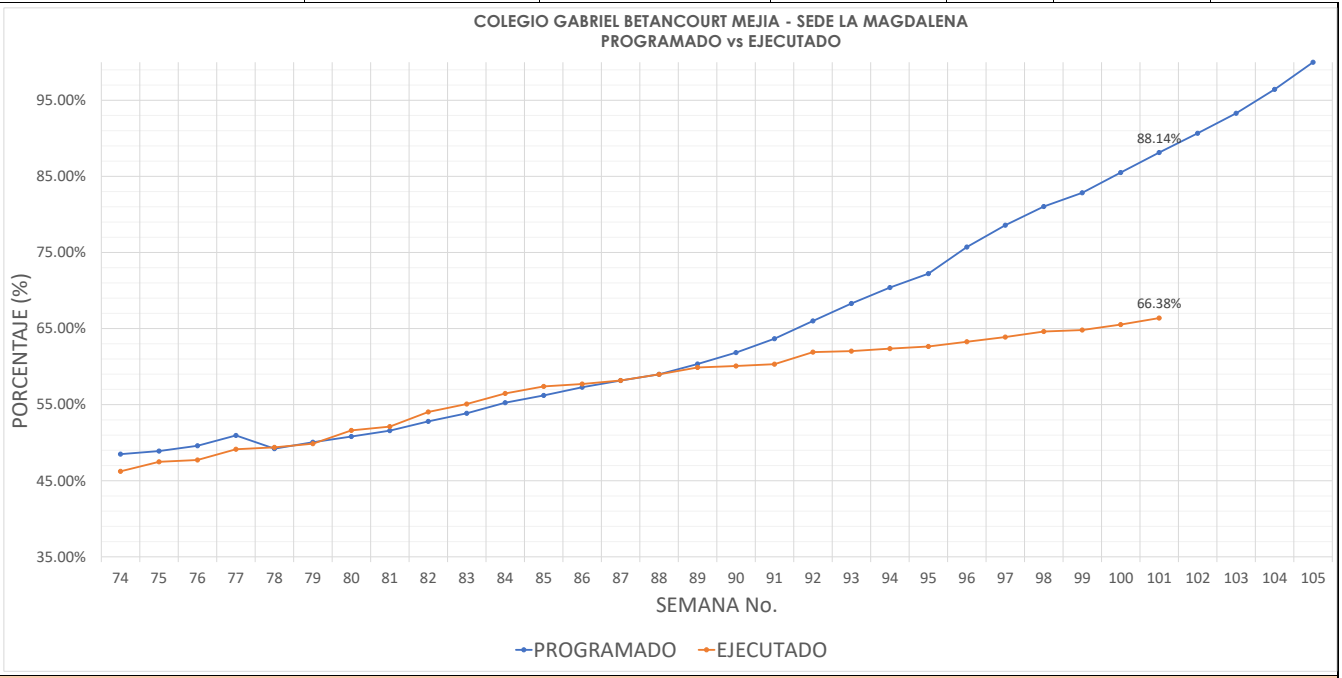

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS

Item	Actividad	Valor atrasos	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
1.3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-$ 798,162,717	**-1.86%**	Hasta el pasado 12 de febrero se pudo iniciar desmonte de las aulas existentes, y hasta el 19 de febrero se pudo iniciar con las labores de movimiento de tierras del módulo K, más de un mes despues del tiempo programado, y aún hay mobiliario de la secretaria de educación en el predio, siendo esta actividad de la ruta crítica del proyecto.
2.1	CIMENTACION	-$ 750,422,732	**-1.75%**	Marca atraso porque ya se tenía programado el inicio de esta labor, pero por la demora en la entrega del predio y las actividades predecesoras de ello, no se ha podido adelantar nada de ello, siendo ruta crítica de la programación de obra.
5.1	MAMPOSTERIA	-$ 1,241,296,971	**-2.90%**	Este capítulo marca atraso por el tema de la definición técnica por todas las partes con respecto a los acabados de las terrazas transitables a nivel de cubierta de los módulos L, M, N, G y H, pero es de recalcar que se adelantan labores en dichos sectores a riesgo del contratista para no seguir acumulando atrasos y sacar el proyecto adelante.
12	PISOS Y ENCHAPES	-$ 1,086,325,641	**-2.54%**	Este capítulo marca atraso por el tema de la definición técnica por todas las partes con respecto a los acabados de las terrazas transitables a nivel de cubierta de los módulos L, M, N, G y H, pero es de recalcar que se adelantan labores en dichos sectores a riesgo del contratista para no seguir acumulando atrasos y sacar el proyecto adelante.
18	CARPINTERIA METALICA	-$ 989,809,719	**-2.31%**	Este capítulo marca atraso por el tema de la definición técnica por todas las partes con respecto a los acabados de las terrazas transitables a nivel de cubierta de los módulos L, M, N, G y H, pero es de recalcar que se adelantan labores en dichos sectores a riesgo del contratista para no seguir acumulando atrasos y sacar el proyecto adelante.
21	OBRAS EXTERIORES, MOBILIARIO URBANO Y PAISAJISMO	-$ 742,872,233	**-1.73%**	Hasta el pasado 12 de febrero se pudo iniciar desmonte de las aulas existentes, y hasta el 19 de febrero se pudo iniciar con las labores de movimiento de tierras del módulo K, más de un mes despues del tiempo programado, y aún hay mobiliario de la secretaria de educación en el predio, siendo esta actividad de la ruta crítica del proyecto.
28	NO PREVISTOS	-$ 1,919,714,631	**-4.48%**	Este capítulo marca atraso por el tema de la definición técnica por todas las partes con respecto a los acabados de las terrazas transitables a nivel de cubierta de los módulos L, M, N, G y H, pero es de recalcar que se adelantan labores en dichos sectores a riesgo del contratista para no seguir acumulando atrasos y sacar el proyecto adelante.

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 101 comprendidos entre los 22 días de abril al 28 de abril del 2024, se radicó los siguientes oficio:
1.El dia 22 de abril del 2024 se radica los colores de mesones y divisiones de baños en zona de preescolar en el oficio CCERU-22-1360. Se radica la solicitud y revision y aporbacion actividad ambiental retiro y disposicion de residuos peligrosos en el oficio CCERU-22-1342. Se radica el diseño estrcutrual graderia teatrino en el oficio CCERU-22-1361
2. El dia 25 de abril del 2024 se da respuesta al comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_1011 en el oficio CCERU-22-1363. Se da alcance al oficio anteriormente menciona en el oficio CCERU-22-1364. Se da respuesta al comuncado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_1010 en el oficio CCERU-22-1365
3. El dia 27 de abril del 2024 se da respuesta al comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_1013 en el oficio CCERU-22-1366

Aspecto Financiero

No se presento ninguna actividad en la semana

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300
		VERSIÓN: 00
		23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**Contrato de obra No.133 de 2022**				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	101	**DEL**	**22 de abril de 2024**	**AL**	**28 de abril de 2024**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	707	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

Aspecto Tecnico

Se observan atrasos con respecto a la programación vigente, toda vez que parte de las actividades programadas se encuentran dentro de las áreas que hasta en la semana 91 (12 de febrero) hizo entrega el colegio (aclarando que aún hay espacios sin poder intervenir ya que hay mobiliario de la S.E.D.), razón por la que este Consorcio requiere la entrega oficial y total de toda el área del Colegio, en aras de ejecutar lo programado sin aumentar el retraso actual. Se aclara que segun nueva programación de obra se evidencia más de un mes de atrasos en actividades de desmontes, demoliciones y excavaciones en el área del predio y todo lo que desencadenan estas dos actividades principales.

Es de recalcar, que al presentarse un retraso de más de un mes en la entrega parcial del área del colegio (aún tienen espacios ocupados), esto repercute directamente en actividades de la ruta crítica del programa de obra, debido a que son de gran peso en el presupuesto de obra (mov. tierras, cimentaciones y estructuras) y desencadenan varias actividades del proyecto que estan programadas hace tiempo y hasta ahora se ha podido ejecutar parcialmente algo de ello, es de anotar que son actividades de la ruta crítica del proyecto y predecesoras indispensables de más actividades que cronológicamente no se pueden adelantar ni traslapar en la ejecución. Como se observa que está en cero en la columna de valor programado, esto nos representa puntualmente que esto se tuvo que ejecutar desde hace más de un mes y hasta ahora se pudo intervenir algunas areas del colegio que se encontraba en uso. También se aclara que está pendiente la definición técnica del acabado de las cubiertas de los módulos L, M, N, G y H, definición que lleva mas de 6 meses trabajando en ello, y que las actividades de acabados de los niveles inferior a estas cubiertas estan detenidos afectando el programa de obra. Tambien se informa que el contratista avanza en estos módulos asumiendo riesgos con el fin de avanzar y no aumentar el retraso en el proyecto.

Se informa que con los recursos actuales existe una imposibilidad de desarrollar las obras al 100%, razón por la que se debe definir el alcance real de las obras. Es de anotar que el atraso no es tan representativo, pero se debe a que el contratista ha buscado la forma de ejecutar actividades que se permitan a medida del avance de la obra y los espacios entregados, sin importar o no que estén en la programación con el fin de no reflejar incumplimientos ni retrasos mayores.

Tambien se aclara que desde la semana pasada se han presentado lloviznas, lluvias fuertes, tormentas eléctricas leves que por temas de seguridad y salud en el trabajo se deben detener actividades para salvaguardar o proteger la integridad de cada trabajador retrasando el normal desarrollo de algunas actividades constructivas del proyecto. Es de aclarar que para todo el tema de las actividades que se adelantan en exteriores, especialmente en urbanismo, el movimiento de tierras y llenos, no solo afecta el tiempo de la precipitación sino el tiempo en que se sequen los materiales y se re construya o este adecuado lo que se había avanzado para poder continuar con dichas labores y garantizar la estabilidad y calidad de ello.

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El dia 25 de abril del 2024 se realiza asistencia y participacion comité de obra, se sugiere consultar a la SDA frente a la identificación de cuerpo de agua vallado en tierra, debido a la posible intervención en las actividades de instalación del cerramiento de la institución.
2. El dia 26 de abril del 2024 se realiza asistencia y participación, comité de participación ciudadana.

Lunes, miércoles y viernes: se realiza la disposición de residuos sólidos convencionales generados en obra a través del operador de aseo del sector de acuerdo con las microrutas de recolección establecidas, todos los días se realiza limpieza de vías, adicionalmente todos los días se realiza jornada de orden y aseo a las áreas intervenidas

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El dia 22 de abril del 2024 se realiza charla de seguridad, pausas activas, diligenciar documentos para las actividades del consorcio y de urbanismo (ats,permisos de trabajo,inspecciones,)entrega de epp, Supervision de actividades en obra- verificacion de planillas ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo señalizacion de areas, supervicion de actividades del personal de servicios
2. El dia 23 de abril del 2024 se realiza charla de seguridad, pausas activas, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal de urbanismo y suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,hacer carnet de personal nuevo, capacitaciones sst,señalizacion de areas, supervicion de actividades.
3. El dia 24 de abril del 2024 se realiza charla de seguridad, pausas activas, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal de urbanismo y suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo
4. El dia 25 de abril del 2024 se realiza charla de seguridad, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal de urbanismo y suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo, capacitaciones sst
5. El dia 26 de abril del 2024 se realiza pausas activas, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal de urbanismo y suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo.
6. El dia 27 de abril del 2024 se realiza charla 5 minutos, validacón de permisos en campo, reunión SST , recorrido en campo, gestión de cronograma de actividades SST, socializacion actividades semanales .

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El dia 25 de abril del 2024 se realiza asistencia y participación Comité de Seguimiento Social. Asistencia y participación Comité de Seguimiento Integral
2. EL dia 26 de abril del 2024 se realiza la Reunión del Comité de Participación Ciudadana No 20, encuentro en el cual se socializó la ejecución del proyecto a la fecha en cada uno de los componentes (técnico, sst, ambiental y social), pese a que se realizó una convocatoria masiva, la asistencia fue baja, es relevante resaltar el acompañamiento al encuentro de la interventoría, representantes de la Dirección Local de Kennedy, rector, docente, estudiantes y comunidad aledaña.

Entre el 22 al 28 de abril de 2024: Se garantizará la atención a la ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

Aspecto PMT

No se presenta ninguna actividad esta semana.

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
35147 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35148 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35149 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA
Con respecto a las polizas de adicion y prorroga, a la fecha aun se encuentran en tramite	
	Firma
