CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300
		VERSIÓN: 00
		23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL						
CONTRATO No.	**Contrato de obra No.133 de 2022**					
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**					
SEMANA No.	103	**DEL**	**6 de mayo de 2024**		**AL**	**12 de mayo de 2024**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	721	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO COLEGIO ERU 2022**	**INTERVENTOR:**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**133 de 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Valor Adicion No.01	$ 9,372,533,448.00	**Valor Adicion No.01**	$ 608,308,421.00
Valor Total	$ 52,694,671,128.00	**Valor Total**	$ 2,178,466,360.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Prorroga No.01	7 MESES	**Prorroga No.01**	7 MESES
Plazo Actualizado	24 MESES	**Plazo Actualizado**	24 MESES
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	22 de mayo de 2024	**Fecha de Terminación**	22/05/2024
No póliza contrato de obra	CBC-100035966	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	11/10/2023 hasta 23/11/2024	$ 10,538,934,255.60	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11/10/2023 hasta 23/05/2027	$ 5,269,467,112.80	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/05/2024 hasta 23/05/2029	$ 13,173,667,782.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	11/10/2023 hasta 23/07/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/05/2024	$ 2,634,733,556.00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

No	Ubicación de la actividad	ESTADO	Valor Programado a la fecha	Valor total actividad costo directo	Valor ejecutado acumulado	%AVANCE	Descripción de la Actividad
2.1.5	Construccion de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	EJEUCIÓN	$ 31,809,687	$ 1,005,736,279.80	$ 936,713,224	93.14%	TORTA INFERIOR CIMENTACION MODULO K.
4.1.5	Suministro y colocacion de Concreto tanques 4,000 PSI (28 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 283,931	$ 145,461,210.37	$ 5,374,896	3.70%	FONDO TANQUE AGUAS LLUVIAS
4.2.1	Suministro e instalacion de Acero de refuerzofigurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	EJEUCIÓN	$ 12,017,834	$ 1,778,361,613.00	$ 1,680,450,844	94.49%	MAMPOSTERIA MODULO O.
4.2.4	Suministro e instalacion de Acero refuerzo fy= 550 Mpa para tanques	EJEUCIÓN	$ 33,034,204	$ 82,171,793.48	$ 10,724,328	13.05%	TANQUE AGUAS LLUVIAS - MUROS
4.4.1	Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)	EJEUCIÓN	$ 7,956,766	$ 3,948,097,736.16	$ 3,572,773,484	90.49%	CUBIERTA TIPO BOVEDA MODULO I.
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	EJEUCIÓN	$ 5,125,683	$ 1,709,972,228.90	$ 1,177,647,670	68.87%	MODULO I - NIVELES 1 y 2.
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	EJEUCIÓN	$ 3,752,073	$ 927,803,448.00	$ 764,432,295	82.39%	MODULO I - NIVELES 1 y 2.
6.2.3.2	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 2" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 44,364,168	$ 3,878,282.70	$ 2,892,021	74.57%	MODULO I - NIVELES 1 y 2.
6.2.3.3	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 1.1/2" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 5,127,136	$ 4,401,857.60	$ 3,996,183	90.78%	MODULO I - NIVELES 1 y 2.
6.2.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 14,538,727	$ 71,676,990.00	$ 71,676,990	100.00%	MODULO I - NIVELES 1 y 2.
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	EJEUCIÓN	$ 9,738,075	$ 104,955,677.00	$ 53,813,554	51.27%	MODULO I - ZONA EXTERIOR

CONSORCIO 2022 COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300 VERSIÓN: 00 23/05/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO No.	Contrato de obra No.133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.				
SEMANA No.	103	DEL	6 de mayo de 2024	AL	12 de mayo de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	721	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

7.1.2.2	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 5,117,199	$ 44,926,575.00	$ 23,361,819	52.00%	MODULO I - ZONA EXTERIOR
7.1.2.3	Suministro e instalación de codo 45° para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	EJEUCIÓN	$ 2,092,483	$ 13,215,888.00	$ 8,259,930	62.50%	MODULO I - ZONA EXTERIOR
7.1.2.5	Excavación manual en material común de brecha para tubería	EJEUCIÓN	$ 33,972,380	$ 6,903,904.00	$ 653,872	9.47%	MODULO I - ZONA EXTERIOR
7.1.5.3	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2"	EJEUCIÓN	$ 7,513,633	$ 20,546,864.00	$ 8,721,728	42.45%	MODULOS G y H - NIVELES 1 y 2.
7.1.5.4	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/2" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 41,116,989	$ 25,013,454.00	$ 17,251,368	68.97%	MODULOS G y H - NIVELES 1 y 2.
7.1.5.5	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/4" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 12,511,576	$ 12,582,346.00	$ 11,251,155	89.42%	MODULOS G y H - NIVELES 1 y 2.
7.1.5.6	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1" (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 9,520,349	$ 104,088,250.00	$ 59,158,768	56.84%	MODULOS G y H - NIVELES 1 y 2.
7.1.5.9	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2"	EJEUCIÓN	$ -	$ 634,370.00	$ 634,370	100.00%	MODULOS G y H - NIVELES 1 y 2.
7.1.5.13	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2"	EJEUCIÓN	$ 6,451,099	$ 7,887,164.00	$ 5,202,172	65.96%	MODULOS G y H - NIVELES 1 y 2.
12.1.1	Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	EJEUCIÓN	$ 5,496,990	$ 54,948,994.50	$ 54,948,021	100.00%	MODULO I - NIVEL 2.
12.2.3	Suministro e instalacion de Poceta de ducha en granito pulido (incluye alistado y acabado granito pulido con dilataciones).	EJEUCIÓN	$ 18,625,253	$ 4,595,539.65	$ 1,547,651	33.68%	MODULO I - NIVEL 2.
18.1.1	Puerta ventana PYV01 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	EJEUCIÓN	$ 15,787,059	$ 120,920,484.86	$ 29,119,874	24.08%	MODULO M - NIVEL 1
18.1.6	Puerta ventana PYV06 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	EJEUCIÓN	$ 63,697,594	$ 751,039,302.37	$ 443,299,809	59.02%	MODULO M - NIVEL 1
18.1.9	Ventana PYV09 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-01,02,02P, V04P).	EJEUCIÓN	$ 13,177,599	$ 8,214,033.66	$ 1,812,037	22.06%	MODULO M - NIVEL 1
26.1	Aseo Permanente en Obra	EJEUCIÓN	$ 79,010,674	$ 69,027,840.00	$ 61,286,400	88.79%	MODULOS L / M / N / G / H - NIVEL 1
28.6	Elemento de concreto reforzado dentro de mamposteria (Dovela en grouting)	EJEUCIÓN	$ 20,490,461	$ 439,360,678.80	$ 313,444,282	71.34%	MODULO I - NIVELES 1 y 2.
28.20	Remate de muros con hilada parada con ladrillos prensados de 0,245x0,12x0,06 m color coral	EJEUCIÓN	$ 78,680,073	$ 127,562,083.74	$ 122,743,269	96.22%	MODULO I - NIVELES 1 y 2.
28.25	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M , menor o igual a 60 cm de longitud . Incluye mortero de pega	EJEUCIÓN	$ 31,606,129	$ 641,250,880.88	$ 524,243,295	81.75%	MODULO I - NIVELES 1 y 2.
28.31	Boca puerta en granito ancho hasta 10 cm incluye destroncado y pulida	EJEUCIÓN	$ 2,183,665	$ 24,818,524.36	$ 13,382,802	53.92%	MODULO I - NIVEL 2.
28.55	Suministro e instalacion de enchape de paso de escalera en baldosa en granito 33 x 33 cm huella y contra huella, nariz en granito	EJEUCIÓN	$ 10,760,928	$ 64,850,607.72	$ 64,850,608	100.00%	MODULO I - NIVEL 2.
28.61	suministro e instalacion de impermeabilizante en manto Poliester 3mm, sin foil de aluminio, incluye emulsion asfaltica	EJEUCIÓN	$ 15,425,367	$ 167,013,862.40	$ 133,324,400	79.83%	MODULO M - TERRAZA TRANSITABLE.

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO EJE.	AVANCE
$ 38,846,849,555.43	$ 1,129,401,947.43	$ 39,976,251,502.86	$ 28,542,143,525.87	$ 343,744,533.98	$ 28,885,888,059.85	-$ 11,090,363,443.01
90.66%	2.64%	93.30%	66.61%	0.80%	67.41%	-25.88%

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300 VERSIÓN: 00 23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO No.	Contrato de obra No.133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.				
SEMANA No.	103	DEL	6 de mayo de 2024	AL	12 de mayo de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	721	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

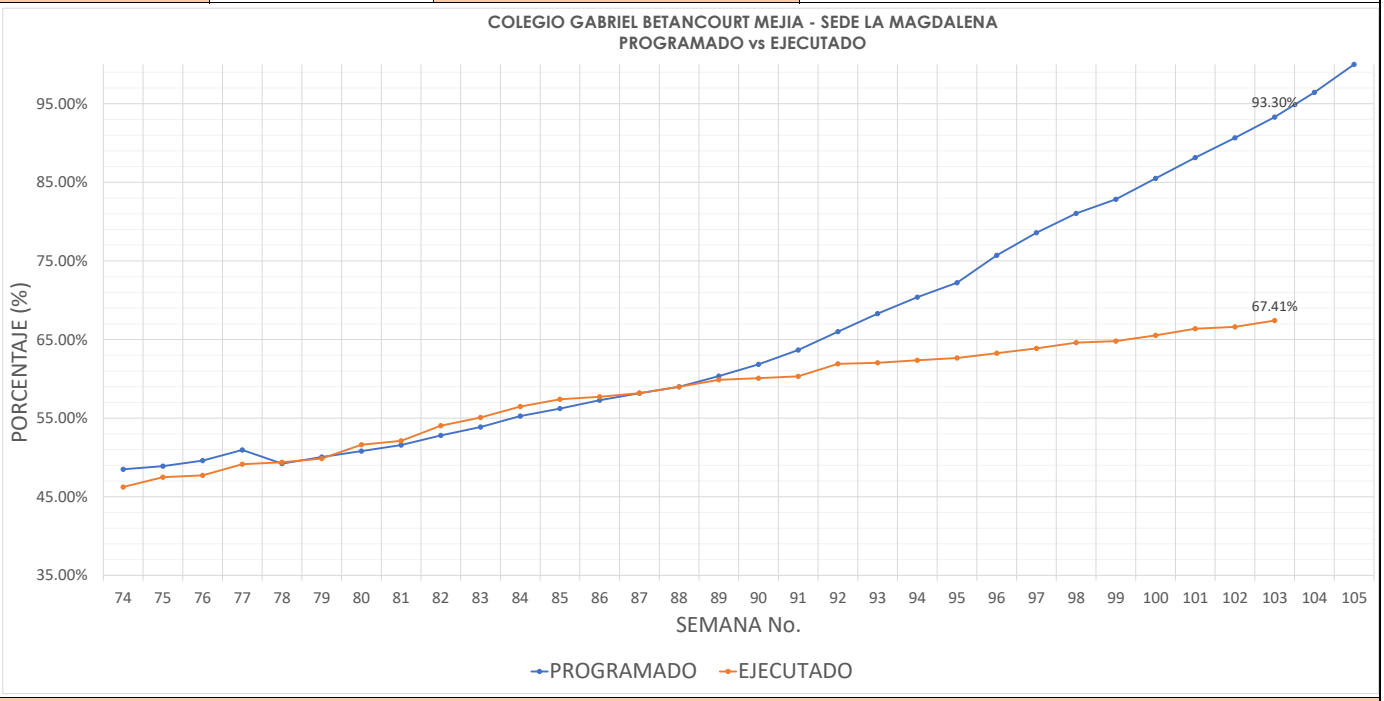

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS

Item	Actividad	Valor atrasos	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
1.3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-$ 798,162,717	-1.86%	Hasta el pasado 12 de febrero se pudo iniciar desmonte de las aulas existentes, y hasta el 19 de febrero se pudo iniciar con las labores de movimiento de tierras del módulo K, más de un mes despues del tiempo programado, y estamos en el fenomeno de la niña (lluvias intensas que impiden el normal desarrollo de estas actividades.
2.1	CIMENTACION	-$ 703,882,318	-1.64%	Marca atraso porque ya se tenía programado el inicio de esta labor, pero por la demora en la entrega del predio y las actividades predecesoras de ello, no se ha podido adelantar nada de ello, siendo ruta crítica de la programación de obra, al igual que la epoca invernal que se esta pesentando.
5.1	MAMPOSTERIA	-$ 1,259,197,678	-2.94%	Marca atraso porque ya se tenía programado el inicio de esta labor, pero por la demora en la entrega del predio y las actividades predecesoras de ello, no se ha podido adelantar nada de ello, siendo ruta crítica de la programación de obra, al igual que la epoca invernal que se esta pesentando.
12	PISOS Y ENCHAPES	-$ 1,216,197,748	-2.84%	Marca atraso porque ya se tenía programado el inicio de esta labor, pero por la demora en la entrega del predio y las actividades predecesoras de ello, no se ha podido adelantar nada de ello, siendo ruta crítica de la programación de obra, al igual que la epoca invernal que se esta pesentando.
18	CARPINTERIA METALICA	-$ 1,213,467,975	-2.83%	Marca atraso porque ya se tenía programado el inicio de esta labor, pero por la demora en la entrega del predio y las actividades predecesoras de ello, no se ha podido adelantar nada de ello, siendo ruta crítica de la programación de obra, al igual que la epoca invernal que se esta pesentando.
21	OBRAS EXTERIORES, MOBILIARIO URBANO Y PAISAJISMO	-$ 996,926,171	-2.33%	Hasta el pasado 12 de febrero se pudo iniciar desmonte de las aulas existentes, y hasta el 19 de febrero se pudo iniciar con las labores de movimiento de tierras del módulo K, más de un mes despues del tiempo programado, y estamos en el fenomeno de la niña (lluvias intensas que impiden el normal desarrollo de estas actividades.
28	NO PREVISTOS	-$ 2,845,833,127	-6.64%	Marca atraso porque ya se tenía programado el inicio de esta labor, pero por la demora en la entrega del predio y las actividades predecesoras de ello, no se ha podido adelantar nada de ello, siendo ruta crítica de la programación de obra, al igual que la epoca invernal que se esta pesentando.

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 103 comprendidos entre los 6 días de mayo al 12 de mayo del 2024, se radicó los siguientes oficio:
1. El dia 7 de mayo del 2024 se da alcance al oficio CCERU-22-1355 Y CCERU-22-1332 con relacion a la solicitud de giro y anticipo en el oficio CCERU-22-1375. Se radica los informes de mamposteria de los bloques L-M-N-G-H en el oficio CCERU-22-1376. Se radica la certificacion de calidad del mes de marzo del suministro de ladrillo en el oficio CCERU-22-1377.
2. El dia 10 de mayo del 2024 se radica el informe mensual de obra No. 23 en el oficio CCERU-22-1379

Aspecto Financiero

No se presento ninguna actividad en la semana

CONSORCIO 2022 COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300 VERSIÓN: 00 23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**Contrato de obra No.133 de 2022**				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	103	**DEL**	**6 de mayo de 2024**	**AL**	**12 de mayo de 2024**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	721	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

Aspecto Tecnico

Se observan atrasos con respecto a la programación vigente, toda vez que parte de las actividades programadas se encuentran dentro de las áreas que hasta en la semana 91 (12 de febrero) hizo entrega el colegio (aclarando que aún hay espacios sin poder intervenir ya que hay mobiliario de la S.E.D.), en aras de ejecutar lo programado sin aumentar el retraso actual. Se aclara que segun nueva programación de obra se evidencia más de un mes de atrasos en actividades de desmontes, demoliciones y excavaciones en el área del predio y todo lo que desencadenan estas dos actividades principales, y todas las dependientes de ellas (sucesoras).

Es de recalcar, que al presentarse un retraso de más de un mes en la entrega parcial del área del colegio, esto repercute directamente en actividades de la ruta crítica del programa de obra, debido a que son de gran peso en el presupuesto de obra (mov. tierras, cimentaciones y estructuras) y desencadenan varias actividades del proyecto que estan programadas hace tiempo y hasta ahora se ha podido ejecutar parcialmente algo de ello, es de anotar que son actividades de la ruta crítica del proyecto y predecesoras indispensables de más actividades que cronológicamente no se pueden adelantar ni traslapar en la ejecución. Como se observa que está en cero en la columna de valor programado, esto nos representa puntualmente que esto se tuvo que ejecutar desde hace más de un mes y hasta ahora se pudo intervenir algunas areas del colegio que se encontraba en uso. También se aclara quela definición técnica del acabado de las cubiertas de los módulos L, M, N, G y H, se concluyo hasta el dia 30 de abril del presente año, y que las actividades de acabados de los niveles inferior a estas cubiertas estan detenidos afectando el programa de obra. Tambien se informa que el contratista avanza en estos módulos asumiendo riesgos con el fin de avanzar y no aumentar el retraso en el proyecto.

Se informa que con los recursos actuales existe una imposibilidad de desarrollar las obras al 100%, razón por la que se debe definir el alcance real de las obras. Es de anotar que se esta esperando aprobacion del prorroga y adicion No.02 que se esta tramitando desde el 6 de diciembre de 2023 y a la fecha aun no se tiene respuesta oficial del mismo, aunque la fecha de finalizacion se tiene programada para el dia 22 de diciembre de 2024.

Tambien se aclara que desde la semana 100 se han presentado lloviznas, lluvias fuertes, tormentas eléctricas leves que por temas de seguridad y salud en el trabajo se deben detener actividades para salvaguardar o proteger la integridad de cada trabajador retrasando el normal desarrollo de algunas actividades constructivas del proyecto. Es de aclarar que para todo el tema de las actividades que se adelantan en exteriores, especialmente en urbanismo, el movimiento de tierras y llenos, no solo afecta el tiempo de la precipitación sino el tiempo en que se sequen los materiales y se re construya o este adecuado lo que se había avanzado para poder continuar con dichas labores y garantizar la estabilidad y calidad de ello.

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El dia 9 de mayo del 2024 se realiza recorrido especialistas consorcio para determinar alternativas para la instalación de cerramiento en vallado, se recibe aprobación de informe ambiental No. 23 por parte de la interventoría.
Lunes, miércoles y viernes: se realiza la disposición de residuos sólidos convencionales generados en obra a través del operador de aseo del sector de acuerdo con las microrutas de recolección establecidas, todos los días se realiza limpieza de vías, adicionalmente todos los días se realiza jornada de orden y aseo a las áreas intervenidas

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El dia 6 de mayo del 2024 se realiza charla de seguridad, se diligencia documentos para las actividades del consorcio (ats,permisos de trabajo,inspecciones), Supervisión de actividades en obra- verificacion de planillas ingreso de vehiculos,verificación final informe mensual, organización y entrega de carnet, se realizo limpieza de zona vehicular externa.
2. EL dia 7 de mayo del 2024 se realiza recorrido en obra, socialización de hallazgos, acompañamiento en actividades de alto riesgo,Charla de seguridad, pausas activas, verificación de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervisión de actividades propias del consorcio, verificación planillas de seguridad, limpieza y mantenimiento de sumideros.
3. El dia 8 de mayo del 2024 se realiza charla de seguridad, pausas activas, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal de suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,hacer carnet de personal nuevo, capacitaciones sst,señalizacion de areas, supervicion de actividades, el inspector Brayan Moya realiza acompañamiento actividades del subcontratista Fenergy.
4. El dia 9 de mayo del 2024se diligencia permisos según actividades realizadas durante el dia, seguimiento cronograma actividades servicios generales .
induccion personal nuevo, validación planillas de seguridad social, radicación personal nuevo,Charla 5 minutos, validacón de permisos en campo, reunión SST , recorrido en campo, gestión de cronograma de actividades SST, socializacion actividades semanales. Jornada orden y aseo,acompañamiento en actividades,
5. El dia 10 de mayo del 2024 se realiza acompañamiento en recorrido de obra, orden y aseo. pausas activas, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo.
6. El dia 11 de mayo del 2024 se realiza charla de 5 minutos, validacón de permisos en campo, reunión SST , recorrido en campo, gestión de cronograma de actividades SST, socializacion actividades semanales .organizacion permisos (ATS, permisos alturas, en caliente y preoparacionales)

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El dia 6 de mayo del 2024 se recibe aprobación al Informe Mensual Gestión Social No 23. A través de oficio GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_1018_T), se recibe petición de la Señora Marly Zapata, representante Legal de CAR Ingeniería SAS.
2. El dia 7 de mayo del 2024 se reciben observaciones por parte de interventoría al acta de reunión del Comité de Participación Ciudadana No 20
3.- El dia 10 de mayo del 2024 se remite a través de correo electrónico para revisión y aprobación de interventoría, volantes No 50 y No 51 correspondientes a la convocatoria para la Reunión del Comité de Participación Ciudadana No 21. Asistencia y participación Comité de Seguimiento Social
4. El dia 11 de mayo del 2024 a traves de correo electronico se confirma a interventoría que el requerimiento de la señora Marly Zapata, ingresó al sistema de atención al ciudadano bajo la PQRS No 07, a la fecha se encuentra incluido en el orden del día para ser objeto de revisión en Comité Interno del Consorcio ERU 2022.
5. El dia 12 de mayo del 2024 se remite para revisión y aprobación de interventoría acta de reunión del Comité de Participación Ciudadana No 20 ajustada conforme a observaciones.


Entre el 01 al 11 de mayo de 2024: Se garantizará la atención a la ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

Aspecto PMT

No se presenta ninguna actividad esta semana.

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
35147 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35148 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35149 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA
Con respecto a las polizas de adicion y prorroga, a la fecha aun se encuentran en tramite	
	Firma
