CONTRATO DE OBRA No. 159 DEL 2023

INFORME DE OBRA No. 08

INFORME DE AVANCE DE OBRA

FINAL [ ] **PARCIAL** [X] **No. 8**

Periodo: del 24 de junio al 23 de julio de 2024.

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	159 de 2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA
VALOR INICIAL	$ 3.204.000.004,00
PLAZO	DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
ANTICIPO 40%:	$ 1.281.600.002,00
CONTRATISTA	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR
SUPERVISOR	ING. YESID ROJAS PEÑA
CONTRATANTE	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
FECHA DE INICIO	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
INTERVENTOR:	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL SAS
OTRO SI 18 DE JUNIO DE 2024	ADICION VALOR: $ 113.338.444,00 ADICION PLAZO: DOS (2) MESES
FECHA FINAL TERMINACION	23 DE NOVIEMBRE DE 2024

Tabla No. 1. Relación de Pólizas de contrato de Obra – Legalización.

Amparos	No. Póliza	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	11-44-101209782	18-10-2023	18-12-2024	**$ 961.200.002,00**
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	11-44-101209782	18-10-2023	18-12-2024	**$ 1.281.600.002,00**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101209782	18-10-2023	18-08-2027	**$ 640.800.001,00**
Estabilidad y Calidad de la Obra	11-44-101209782	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		**$ 961.200.002,00**
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento	11-40-101056110	18-10-2023	18-08-2024	**$ 464.000.000,00**

Tabla No. 2. Relación de Pólizas de contrato de Obra – Acta de inicio.

Amparos	No. Póliza	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	11-44-101209782	24-11-2023	24-01-2025	**$ 961.200.002,00**
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	11-44-101209782	24-11-2023	24-01-2025	**$ 1.281.600.002,00**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101209782	24-11-2023	24-09-2027	**$ 640.800.001,00**
Estabilidad y Calidad de la Obra	11-44-101209782	24-09-2024	24-09-2029	**$ 961.200.002,00**
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento	11-40-101056110	24-11-2023	24-11-2024	**$ 464.000.000,00**

Tabla No. 3. Relación de Pólizas de contrato de Obra Otro si No 01

Amparos	No. Póliza	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	11-44-101209782	24-11-2023	24-01-2025	**995.201.534,40**
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	11-44-101209782	24-11-2023	24-01-2025	**$ 1.326.935.379,20**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101209782	24-11-2023	24-09-2027	**$ 663.467.689,60**
Estabilidad y Calidad de la Obra	11-44-101209782	24-09-2024	24-09-2029	**$ 995.201.534,40**
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento	11-40-101056110	24-11-2023	24-11-2024	**$ 520.000.000,00**

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)

Este informe tiene como objetivo general dejar constancia del desarrollo de las acciones y actividades de obra que se han realizado durante el periodo del 24 de junio al 23 de julio de 2024, de acuerdo a la ejecución del contrato de obra No. 159 de 2023.

Se detallan a continuación las actividades realizadas por CONCRETOS Y ENERGIA LTDA - CONENERGIA LTDA, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y en progreso de la ejecución de las labores realizadas para la "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA".

Se describen los detalles de las actividades contractuales realizadas por CONCRETOS Y ENERGIA LTDA - CONENERGIA LTDA, en cada uno de los componentes técnicos, administrativos, de seguridad y salud en el trabajo, sociales y ambientales correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de junio al 23 de julio de 2024. Igualmente se relacionan los hechos y sucesos más relevantes de las actividades ejecutadas durante el periodo.

En este informe también se describe el estado y avance físico del contrato de obra y consecutivamente se relaciona la información financiera programada versus la inversión financiera ejecutada de acuerdo a la programación del cronograma de obra y con el avance físico real.

El día 23 de Julio de 2024, 3:00 pm, se presenta reunión programada, con el propietario Hernando Cuellar y esposa la señora Ermila Ome, para visualizar el trazado o tramo a intervenir en el predio con el objetivo de firma y otorgar el permiso de servidumbre: asisten a la reunión el secretario de planeación municipal Ing. Daniel Calderón por la Alcaldía de Altamira – Huila, el Ing. Luis Iván Luna profesional de Ingeniería y proyectos Conenergia Ltda, el Inspector de Interventoría Ramon Fabian Murcia y el maestro de obra Alexander Rodríguez, quienes por medio del recorrido se observaron conjuntamente las particularidades y novedades del trazado, se señalaron las actividades a ejecutar en el tramo y los sistemas constructivos a emplear en la ejecución de las obras. El propietario hizo entrega de parte de la documentación requerida para el permiso de servidumbre y quedo verbalmente comprometido en diligenciar el resto de documentación para así, proceder a legalizar y firmar el correspondiente permiso de servidumbre, la semana siguiente a dicha reunión.

Posteriormente en reunión en la Alcaldía Municipal, se unió el señor alcalde Yesid Rodríguez y el abogado municipal el señor Frank, este último indico que el proceso administrativo interpuesto a Flor María Ruiz se encuentra en estado de notificación y respuesta de la misma. Por otra parte el señor Alcalde indica que el personalmente está coordinando la firma del permiso de servidumbre de señor Héctor Vargas y que este está comprometido en firmar el permiso de servidumbre que se anda gestionando desde inicios de la obra.

Por otra parte se hizo el compromiso de formalizar el permiso de servidumbre con la señora Isleny Infante.

A su vez se solicita comedidamente al señor Alcalde y secretario de planeación del Municipio de Altamira - Huila, agilización de dicho proceso para la adquisición de los respectivos permisos de servidumbre, ya que se requieren con urgencia con el propósito de no entorpecer el rendimiento de las obra e instalación de tubería y que tiene demasiada importancia para el correcto desarrollo del proyecto y objetivo a alcanzar.

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS AL 23/06/2024	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	24/11/2023	**240 DÍAS**		24/09/2024
Socialización	27/02/2024			
Otro Si No 01	18/06/2024			23/11/2024

Avance físico de las Obras

En el periodo del 24 de junio al 23 de julio de 2024, en referencia al corte, se ha estado trabajando en las actividades contractuales, que se relacionan a continuación:

CAPITULO 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01 Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).
Se ejecuta excavación manual en material conglomerado, desde la Abs K0+300.00 a K0+600.00 y K4+273.36 a K4+330.

2.03 Excavación Mecánica a todo factor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.
Se ejecuta excavación mecánica en material conglomerado, desde la Abs K4+930.00 a K5+730.00, K5+740.00 a K5+930.00 y K9+080 a K9+450.

2.07 Relleno tipo II: Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material Recebo, compactado en capas cada 20 cm hasta cota terreno, desde la Abs K0+300.00 a K0+580.00, K0+590.00 a K0+600.00, K4+273.36 a K4+330, K4+930.00 a K5+730.00 y K5+740.00 a K5+930.00.

2.08 Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material seleccionado de la misma excavación, desde la Abs K0+300.00 a K0+580.00, K0+590.00 a K0+600.00, K4+273.36 a K4+330, K4+930.00 a K5+730.00 y K5+740.00 a K5+930.00.

2.10 Retiro de sobrantes de excavación Autorizado por el Municipio el cual se encuentra a 10 km de la obra.
Se retira y transporta material conglomerado proveniente de excavación manual y mecánica no apto para relleno, desde la Abs K0+300.00 a K0+580.00, K0+590.00 a K0+600.00, K4+273.36 a K4+330, K4+930.00 a K5+730.00 y K5+740.00 a K5+980.00.

CAPITULO 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

3.06 Instalación Tubería HD 8 " (unión por enchufe y caña).
Se instala tubería HD 8” C40, desde la Abs K0+300.00 a K0+610.00, K4+273.36 a K4+400.79 y K4+930.00 a K5+950.00.

3.12 Suministro e Instalación de Codo HD Extremo Brida 45° D=8"
Se suministra e instala accesorio Codo HD JR D=8" en las Abs: K4+400.79, K4+417.27, K4+420.00, K5+081.67, K5+105.00, K5+183.19, K5+207.95 y K5+209.59.

3.15 Suministro e Instalación de Codo HD 22.5 x 8".
Se suministra e instala accesorio Codo PVC D=8" x 22.5 en las siguientes Abs: K0+325.00, K0+369.37, K0+420.45, K3+695.00, K4+275.00, K5+050.00, K5+054.02, K5+080.03, K5+090.00, K5+104.73, K5+106.47, K5+139.51, K5+184.61, K5+200.00, K5+230.00, K5+260.00, K5+263.57, K5+310.00, K5+563.92 y K5+613.34.

CAPITULO 4 - VÁLVULAS DE PURGA Y VENTOSA

4.01 Localización y Replanteo Estructuras Hidráulicas.
Se localizo y replanteo las estructuras hidráulicas en las siguientes Abs: K3+735.00, K3+784.52, K4+132.66, K5+270.00, K5+365.00 y K5+760.00.

4.02 Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).
Se excavo manualmente en material conglomerado, para las estructuras hidráulicas localizadas en las siguientes Abs: K0+790.00, K0+815.30, K1+050.00, K1+316.14, K1+645.72, K1+660.00, K1+845.00, K2+182.06, K3+090.00, K3+493.15, K4+700.00, K4+840.00 y K5+760.00.

4.04 Retiro de sobrantes de excavación Autorizado por el Municipio el cual se encuentra a 10 km de la obra.
Se retira material sobrante o no apto para relleno de las estructuras hidráulicas localizadas en las Abs: K0+790.00, K0+815.30, K1+050.00, K1+316.14, K1+645.72, K1+660.00, K1+845.00, K2+182.06, K3+090.00, K3+493.15, K4+700.00, K4+840.00 y K5+760.00 a sitio de acopio autorizado por el Municipio de Altamira – Huila.

NP 4.14 Suministro e Instalación de Válvula Ventosa doble cámara HD-EB-2", para tubería 8". Incluye: Válvula compuerta elástica HD-EB-2", Tee HD-JB-8", dos (2) niples pasamuros HD-EL x EB-8", Unión Universal R1-HD-8" y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.
Se suministra e instala válvula ventosa doble cámara HD x EB de 2", para tubería de 8", ubicadas en las siguientes Abs: K0+815.30 y K1+645.72.


NP 4.16 Suministro e Instalación de Válvula compuerta elástica EB-HD-3", para tubería de 8". Incluye: Tee unión mecánica HD-8" x 3", dos (2) niples pasamuros HD-EL x EB-3" y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.
se suministra e instala válvula compuerta elástica EB-HD-3", para purga o limpieza del sistema, ubicadas en las siguientes Abs: K0+790.00, K1+050.00, K1+316.14, K1+660.00, K1+845.00, K3+090.00, K3+493.15 y K4+840.00.

CAPITULO 5 - ANCLAJES TUBERÍA

5.01 Localización y Replanteo Estructuras Hidráulicas.
Se localizo y replanteo las estructuras hidráulicas en las siguientes Abs: K0+325.00, K0+369.37, K5+050.00, K5+054.02, K5+080.00, K5+080.03, K5+081.67, K5+090.00, K5+100.00, K5+104.73, K5+105.00, K5+106.47, K5+139.51, K5+180.00, K5+183.19, K5+184.61, K5+200.00, K5+207.95, K5+209.59, K5+210.00, K5+230.00, K5+260.00, K5+263.57, K5+310.00, K5+563.92 y K5+613.34.

En concordancia con lo estipulado contractualmente las obras se construyeron según las especificaciones técnicas avaladas por los estudios y diseños del proyecto siguiendo las normatividades vigentes para tal fin.

Imagen 1. Actividades programadas del 24 de junio al 23 de julio de 2024.

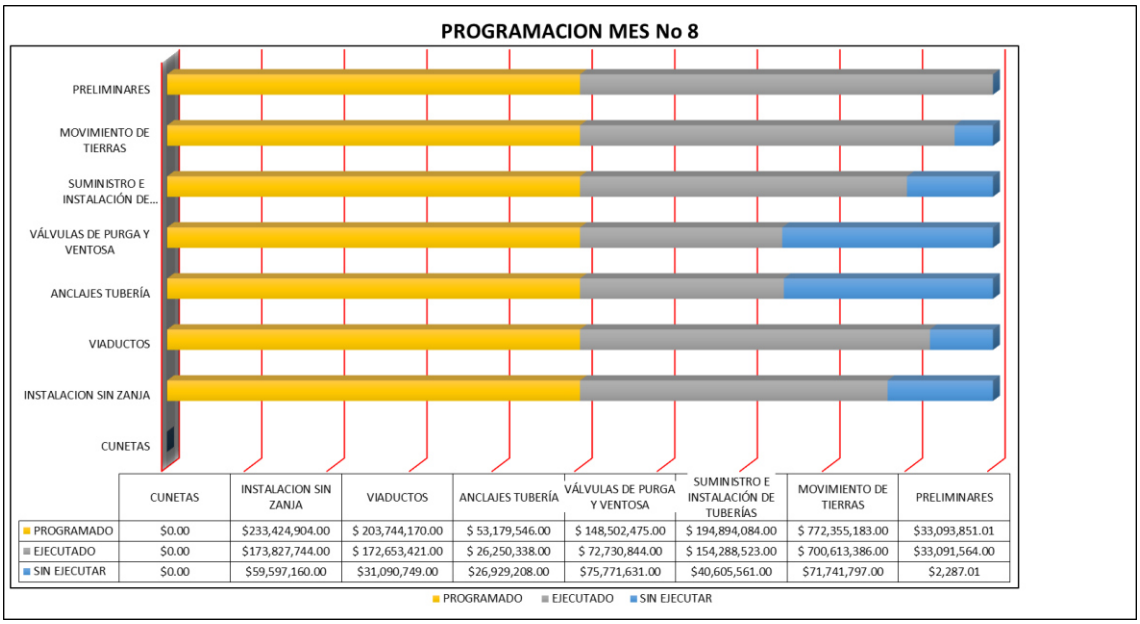

	CUNETAS	INSTALACION SIN ZANJA	VIADUCTOS	ANCLAJES TUBERÍA	VÁLVULAS DE PURGA Y VENTOSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS	MOVIMIENTO DE TIERRAS	PRELIMINARES
PROGRAMADO	$0.00	$233,424,904.00	$ 203,744,170.00	$ 53,179,546.00	$ 148,502,475.00	$ 194,894,084.00	$ 772,355,183.00	$33,093,851.01
EJECUTADO	$0.00	$173,827,744.00	$ 172,653,421.00	$ 26,250,338.00	$ 72,730,844.00	$ 154,288,523.00	$ 700,613,386.00	$33,091,564.00
SIN EJECUTAR	$0.00	$59,597,160.00	$31,090,749.00	$26,929,208.00	$75,771,631.00	$40,605,561.00	$71,741,797.00	$2,287.01

Según la programación de las actividades de obra y flujo de inversión, el porcentaje programado acumulado para el periodo del 24 de junio al 23 de julio de 2024, es de **62.22 %** y el ejecutado acumulado es de **52.49 %.**

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.**)**

Tipo de Acta	No	Fecha
ACTA DE INICIO	01	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE MODIFICACION	01	18 DE JUNIO DE 2024
ACTA PARCIAL	01	19 DE JUNIO DE 2024

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO..... **$ 3.204.00.004,00**
VALOR DEL ANTICIPO.....**$ 1.281.600.001,60**
PORCENTAJE DE ANTICIPO.....**40 %**

AVANCE EN TIEMPO
Tiempo Adición Otro Si No 01 .....**30 días**

Tiempo Total de Obra……**360 días**

Tiempo Total Transcurrido ……..**240días**
Tiempo Total Restante…… **120 días**

Avance Porcentual según plazo inicial……**66.66 %**
Porcentaje restante en tiempo ……**33.34 %**

AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA EJECUTADA

Inversión Contratada…….... **$ 3.204.000.004,00**
Inversión Adicional Otro Si No 01 …… **$ 113.338.444,00**
Inversión Total Contratada…… **$ 3.317.338.448,00**

Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 01) …… **$ 33.766.176,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 02) …… **$ 39.068.820,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 03) …… **$ 24.989.959,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 04) …… **$ 382.299.883,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 05) …… **$ 213.419.942,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 06) …… **$ 393.445.120,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 06) …… **$ 239.033.081,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 07) …… **$ 415.314.095,00**

Porcentaje Avance Físico Mensual Ejecutado ……..**12.52 %**
Inversión Total Ejecutada…… **$ 1.741.347.076,00**

Porcentaje Avance Físico Ejecutado Acumulado .... **52.49 %**
Saldo por Ejecutar ……..**$ 1.575.991.372,00**
Porcentaje por Ejecutar……..…...**47.51 %**

De acuerdo a la programación de obra para este periodo se tenía estimado un avance del **13.22 %,** pero el avance físico ejecutado para este periodo fue del **12.52 %,** lo cual indica un atraso del **0.70 %** para el periodo**.** Este atraso se presenta por las continuas precipitaciones de la zona que no permiten ejecutar o desarrollar las actividades continuamente, ya que por seguridad del recurso humano, maquinaria y equipos estos deben parar hasta presentarse un clima adecuado para ejecutar las labores u actividades a realizar, según el objetó y alcance del contrato de 159 de 2023.

A continuación, se indica el avance ejecutado mensualmente.

% Avance mensual	PERIODO 1 24 NOV AL 23 DIC	PERIODO 2 24 DIC AL 23 ENE	PERIODO 3 24 ENE AL 23 FEB	PERIODO 4 24 FEB AL 23 MAR	PERIODO 5 24 MAR AL 23 ABR	PERIODO 6 24 ABR AL 23 MAY	PERIODO 7 24 MAY AL 23 JUN	PERIODO 8 24 JUN AL 23 JUL	PERIODO 9 24 JUL AL 23 AGO	PERIODO 10 24 AGO AL 23 SEP	PERIODO 11 25 SEP AL 23 OCT	PERIODO 12 26 OCT AL 23 NOV	TOTAL
PROGRAMADO	1.07%	3.50%	6.21%	7.21%	5.93%	6.47%	18.62%	**13.22%**					**62.22%**
EJECUTADO	1.02%	1.18%	0.75%	11.52%	6.43%	11.86%	7.21%	**12.52%**					**52.49%**

CONTROL FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla, se puede observar el flujo de inversión financiero ajustado según acta modificatoria y seguimiento del avance programado financiero, con relación a la ejecución financiera ejecutada según el registro mensual de los valores programados versus los valores ejecutados y los acumulados para el periodo en referencia.


Tabla 3. Control de inversión programada y ejecutada del 24 de junio al 23 de julio de 2024.

INVERCIÓN FINANCIERA PROGRAMADO				INVERCIÓN FINANCIERA EJECUTADA		
AÑO	**PERIODO**	**VR PROGRAMADO MENSUAL**	**% PROGRAMADO**	**PERIODO**	**VR EJECUTADO MENSUAL**	**% PROGRAMADO**
2023	24 NOV- 23 DIC	$ 35,336,945	1.07%	24 NOV- 23 DIC	$ 33,776,176	1.02%
	24 DIC- 23 ENE	$ 116,112,924	3.50%	24 DIC- 23 ENE	$ 39,068,820	1.18%
2024	24 ENE- 23 FEB	$ 206,160,922	6.21%	24 ENE- 23 FEB	$ 24,989,959	0.75%
	24 FEB- 23 MAR	$ 239,152,134	7.21%	24 FEB- 23 MAR	$ 382,299,883	11.52%
	24 MAR- 23 ABR	$ 196,765,797	5.93%	24 MAR- 23 ABR	$ 213,419,942	6.43%
	24 ABR - 23 MAY	$ 214,657,949	6.47%	24 ABR - 23 MAY	$ 393,445,120	11.86%
	24 MAY- 23 JUN	$ 617,581,388	18.62%	24 MAY- 23 JUN	$ 239,033,081	7.21%
	24 JUN- 23 JUL	$ 438,411,556	13.22%	24 JUN- 23 JUL	$ 415,314,095	12.52%
	24 JUL - 23 AGO	$ 344,010,456		24 JUL - 23 AGO		
	24 AGO - 23 SEP	$ 303,994,655		24 AGO - 24 SEP		
	25 SEP - 23 OCT	$ 294,852,807		25 SEP - 23 OCT		
	26 OCT - 23 NOV	$ 310,300,914		26 OCT - 23 NOV		
		$ 3,317,338,448	62.22%		**$ 1,741,347,076**	52.49%

CURVA DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. EJECUTADO

A continuación, se presentan las curvas de avance financiero del flujo de inversión programado versus la curva de inversión ejecutada del 24 de junio al 23 de julio de 2024. En estas curvas se puede evidenciar que el valor financiero programado (línea verde) está levemente por encima del valor financiero ejecutado (línea azul). Estas curvas corroboran e indican que se presenta un leve atraso en las actividades que hacen parte del presupuesto financiero de obra.

Imagen 3. Curvas de Avance Financiero Programado vs. Valor Ejecutado Acumulado.

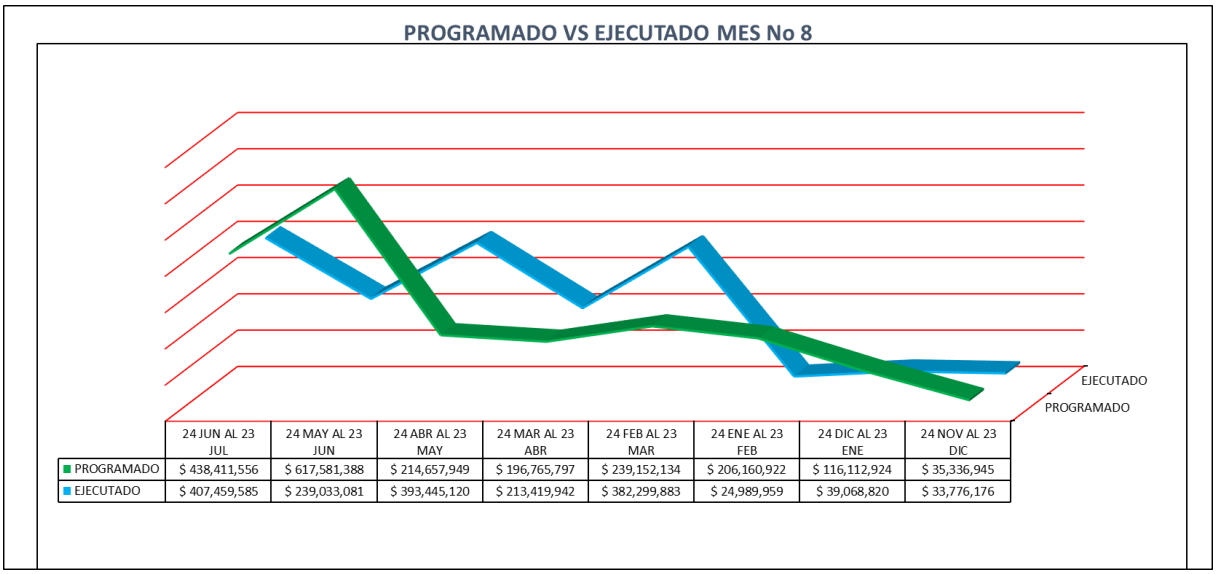

	24 JUN AL 23 JUL	24 MAY AL 23 JUN	24 ABR AL 23 MAY	24 MAR AL 23 ABR	24 FEB AL 23 MAR	24 ENE AL 23 FEB	24 DIC AL 23 ENE	24 NOV AL 23 DIC
PROGRAMADO	$ 438,411,556	$ 617,581,388	$ 214,657,949	$ 196,765,797	$ 239,152,134	$ 206,160,922	$ 116,112,924	$ 35,336,945
EJECUTADO	$ 407,459,585	$ 239,033,081	$ 393,445,120	$ 213,419,942	$ 382,299,883	$ 24,989,959	$ 39,068,820	$ 33,776,176

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato de Obra

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Actas	Amortización	Valor
Anticipo (40%)				$ 1.281.600.002,00
ACTA PARCIAL 1	19/06/2024	$ 1.155.971.156,00	$ 462.388.462,00	$ 693.582.694,00
ACTA PARCIAL 2				
ACTA PARCIAL 3				
TOTALES		**$ 1.155.971.156,00**	**$ 462.388.462,00**	**$ 693.582.694,00**
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Facturado**	**Valor No Facturado**
$ 3.204.000.004,00	**$ 113.338.444.00**	**$ 3.317.338.448,00**	**$ 1.155.971.156,00**	**$ 2.161.367.292,00**

2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

El equipo y personal que se presenta al contrato de obra 159 de 2023, es netamente operativo y administrativo, determinado como calificado y no calificado, con toda la idoneidad para el amplio desarrollo de las ejecuciones de obra y la administración del mismo.

En la siguiente tabla, se relaciona el personal mínimo requerido que ha estado vinculado al proyecto durante el periodo de ejecución No. 8, comprendido entre el 24 de junio al 23 de julio de 2024.

Tabla 4. Relación de personal mínimo requerido dispuesto en obra.

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	% DEDICACIÓN	PROFESIÓN
Representante legal	NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR	-	Ingeniero Electricista
Asesor Estructural	WILLIAN PARRA OLAYA	30%	Ingeniero Civil y Esp. En Estructuras
Residente de Obra	LUIS IVAN LUNA GASCA	100%	Ingeniero Civil
Profesional Siso	VALENTINA POLANCO PARRA	100%	Administradora en gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Maestro de Obra	ALEXANDER RODRIGUEZ LOZADA	100%	Maestro de Obra
Oficial de Obra	JAIDER RODRIGUEZ LOZADA	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	JHOAN ALEXIS RODRIGUEZ CUELLAR	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	JEFERSON GOMEZ CAPIZ	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	ALBERTO DE JESUS ACUÑA AGUILERA	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	GERMAN EDUARDO CASTRO JIMENEZ	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	JOSE ALONSO RAMIREZ PLAZAS	100%	Bachiller

En el ***anexo 1*** se adjunta la planilla de pago de seguridad social del mes de Junio de 2024 del personal de mano de obra calificada y no calificada vinculada a la ejecución de las actividades de obra.

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Descripción de Actividades Desarrollada en el Periodo

Durante el periodo del presente informe se desarrollaron las siguientes actividades:

CAPITULO 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01 Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).
Se ejecuta excavación manual en material conglomerado, desde la Abs K0+300.00 a K0+600.00 y K4+273.36 a K4+330.

2.03 Excavación Mecánica a todo factor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.
Se ejecuta excavación mecánica en material conglomerado, desde la Abs K4+930.00 a K5+730.00, K5+740.00 a K5+930.00 y K9+080 a K9+450.

2.07 Relleno tipo II: Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material Recebo, compactado en capas cada 20 cm hasta cota terreno, desde la Abs K0+300.00 a K0+580.00, K0+590.00 a K0+600.00, K4+273.36 a K4+330, K4+930.00 a K5+730.00 y K5+740.00 a K5+930.00.

2.08 Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material seleccionado de la misma excavación, desde la Abs K0+300.00 a K0+580.00, K0+590.00 a K0+600.00, K4+273.36 a K4+330, K4+930.00 a K5+730.00 y K5+740.00 a K5+930.00.

2.10 Retiro de sobrantes de excavación Autorizado por el Municipio el cual se encuentra a 10 km de la obra.
Se retira y transporta material conglomerado proveniente de excavación manual y mecánica no apto para relleno, desde la Abs K0+300.00 a K0+580.00, K0+590.00 a K0+600.00, K4+273.36 a K4+330, K4+930.00 a K5+730.00 y K5+740.00 a K5+980.00.

CAPITULO 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

3.06 Instalación Tubería HD 8 " (unión por enchufe y caña).
Se instala tubería HD 8" C40, desde la Abs K0+300.00 a K0+610.00, K4+273.36 a K4+400.79 y K4+930.00 a K5+950.00.

3.12 Suministro e Instalación de Codo HD Extremo Brida 45° D=8"
Se suministra e instala accesorio Codo HD JR D=8" en las Abs: K4+400.79, K4+417.27, K4+420.00, K5+081.67, K5+105.00, K5+183.19, K5+207.95 y K5+209.59.

3.15 Suministro e Instalación de Codo HD 22.5 x 8".
Se suministra e instala accesorio Codo PVC D=8" x 22.5 en las siguientes Abs: K0+325.00, K0+369.37, K0+420.45K3+695.00, K4+275.00, K5+050.00, K5+054.02, K5+080.03, K5+090.00, K5+104.73, K5+106.47, K5+139.51, K5+184.61, K5+200.00, K5+230.00, K5+260.00, K5+263.57, K5+310.00, K5+563.92 y K5+613.34.

CAPITULO 4 - VÁLVULAS DE PURGA Y VENTOSA

4.01 Localización y Replanteo Estructuras Hidráulicas.
Se localizo y replanteo las estructuras hidráulicas en las siguientes Abs: K3+735.00, K3+784.52, K4+132.66, K5+270.00, K5+365.00 y K5+760.00.

4.02 Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).
Se excavo manualmente en material conglomerado, para las estructuras hidráulicas localizadas en las siguientes Abs: K0+790.00, K0+815.30, K1+050.00, K1+316.14, K1+645.72, K1+660.00, K1+845.00, K2+182.06, K3+090.00, K3+493.15, K4+700.00, K4+840.00 y K5+760.00.

4.04 Retiro de sobrantes de excavación Autorizado por el Municipio el cual se encuentra a 10 km de la obra.
Se retira material sobrante o no apto para relleno de las estructuras hidráulicas localizadas en las Abs: K0+790.00, K0+815.30, K1+050.00, K1+316.14, K1+645.72, K1+660.00, K1+845.00, K2+182.06, K3+090.00, K3+493.15, K4+700.00, K4+840.00 y K5+760.00 a sitio de acopio autorizado por el Municipio de Altamira – Huila.

NP 4.14 Suministro e Instalación de Válvula Ventosa doble cámara HD-EB-2", para tubería 8". Incluye: Válvula compuerta elástica HD-EB-2", Tee HD-JB-8", dos (2) niples pasamuros HD-EL x EB-8", Unión Universal R1-HD-8" y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.
Se suministra e instala válvula ventosa doble cámara HD x EB de 2", para tubería de 8", ubicadas en las siguientes Abs: K0+815.30 y K1+645.72.

NP 4.16 Suministro e Instalación de Válvula compuerta elástica EB-HD-3", para tubería de 8". Incluye: Tee unión mecánica HD-8" x 3", dos (2) niples pasamuros HD-EL x EB-3" y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.
se suministra e instala válvula compuerta elástica EB-HD-3", para purga o limpieza del sistema, ubicadas en las siguientes Abs: K0+790.00, K1+050.00, K1+316.14, K1+660.00, K1+845.00, K3+090.00, K3+493.15 y K4+840.00.

CAPITULO 5 - ANCLAJES TUBERÍA

5.01 Localización y Replanteo Estructuras Hidráulicas.
Se localizo y replanteo las estructuras hidráulicas en las siguientes Abs: K0+325.00, K0+369.37, K5+050.00, K5+054.02, K5+080.00, K5+080.03, K5+081.67, K5+090.00, K5+100.00, K5+104.73, K5+105.00, K5+106.47, K5+139.51, K5+180.00, K5+183.19, K5+184.61, K5+200.00, K5+207.95, K5+209.59, K5+210.00, K5+230.00, K5+260.00, K5+263.57, K5+310.00, K5+563.92 y K5+613.34.

En el ***anexo 2*** se puede evidenciar en el registro fotográfico de las actividades desarrolladas durante el periodo en cuestión.

3.2 Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

No se reporta ningún daño ni perjuicio a terceros.

3.3 Modificaciones Realizadas en Obra

Durante el periodo del 24 de junio al 23 de julio de 2024, no se han presentado modificaciones realizadas en obra.

3.4. Comité de Obra - Actas de reunión

Fecha de Realización	Lugar	Resultado del Comité – Reunión (Describir)

Presentado por:

NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR
RL/ CONCRETOS Y ENERGIA LTDA - CONENERGIA LTDA
Correo: conenergia-ltda@hotmail.com
Celular: 3187865568
Dirección: Calle 6 No. 7 – 28 Neiva - Huila

CONTROL DE REVISIÓN		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Luis Iván Luna Gasca Residente de Obra **CONENERGIA LTDA – CONCRETO Y ENERGIA LTDA**	**Nelson Gutiérrez Cuéllar** Representante Legal **CONENERGIA LTDA – CONCRETO Y ENERGIA LTDA**	**Sergio Ernesto Gómez Zambrano** Director de interventoría **INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S**

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

A la fecha del presente informe se presentaron se han tomado las siguientes muestras relacionadas a continuación:

ABSCISA	VIADUCTO (ML)	FECHA MUESTRA
K3+440.00	19.00	29/01/2024
K5+820.00	12.00	8/02/2024
K6+000.00	22.50	20/02/2024

Las muestras relacionadas, fueron enviadas para el respectivo ensayo a la compresión de probetas de concreto hidráulico según las ASTM C31, C39A, C-143M, INV E 410-22 y NTC 673 o en su defecto por normatividad vigente para dichos ensayos.

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

A la fecha del presente informe, el Laboratorio certificado SUELOS Y CONCRETOS S.A.S. – SEND, mediante el informe 202405-04, presenta los siguientes resultados de las muestras tomadas relacionadas a continuación:

ABSCISA	VIADUCTO (ML)	FECHA MUESTRA	VALOR PROYECTADO PSI	OBSERVACION
K3+440.00	19.00	29/01/2024	3516.07	ZAPATA
K5+820.00	12.00	8/02/2024	3017.95	ZAPATA
K6+000.00	22.50	20/02/2024	3496.73	ZAPATA

También mediante informe 202405-05, el Laboratorio certificado SUELOS Y CONCRETOS S.A.S. – SEND, genero el diseño de mezcla de 3000 PSI, para estructuras o elementos en concreto reforzado, mediante análisis de granulométrico de agregados o material suministrado y certificado por MASSEQ PROYECTOS E ingeniería S.A.S.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

A continuación, se relaciona el listado de anexos, los cuales hacen parte integral del presente informe mensual de avance de obra No 7, correspondiente al periodo comprendido del 24 de junio al 23 de Julio de 2024.

- *Anexo 1. Planilla Seguridad Social Junio 2024.pdf*
- *Anexo 2: Registro Fotográfico Periodo No 8.pdf*
- *Anexo 3. Bitácora periodo No 8, 24 de junio al 23 de julio de 2024.pdf*

Anexo 1. Planilla Seguridad Social Junio 2024.pdf

Anexo 2: Registro Fotográfico Periodo 8.pdf

Anexo 3. Bitácora Periodo No 8. 24 de Junio al 23 de Julio de 2024.pdf

CAPITULO 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

Registro Fotográfico 01. Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).





Registro Fotográfico 02. Excavación Mecánica a todo factor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.





Registro Fotográfico 03. Relleno tipo II: Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.





Registro Fotográfico 04. Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.





Registro Fotográfico 05. Retiro de sobrantes de excavación Autorizado por el Municipio el cual se encuentra a 10 km de la obra.





CAPITULO 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

Registro Fotográfico 06. Instalación Tubería HD 8 " (unión por enchufe y caña).





Registro Fotográfico 07. Suministro e Instalación de Codo HD Extremo Brida 45° D=8"





Registro Fotográfico 08. Suministro e Instalación de Codo PVC Gran Radio 22.5° (RDE 21 - 200 PSI) (Unión Platino) D= 8".





Registro Fotográfico 09. Suministro e Instalación de Codo HD 22.5 x 8".






CAPITULO 4 - VÁLVULAS DE PURGA Y VENTOSA

Registro Fotográfico 10. Localización y Replanteo Estructuras Hidráulicas.





Registro Fotográfico 11. Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).

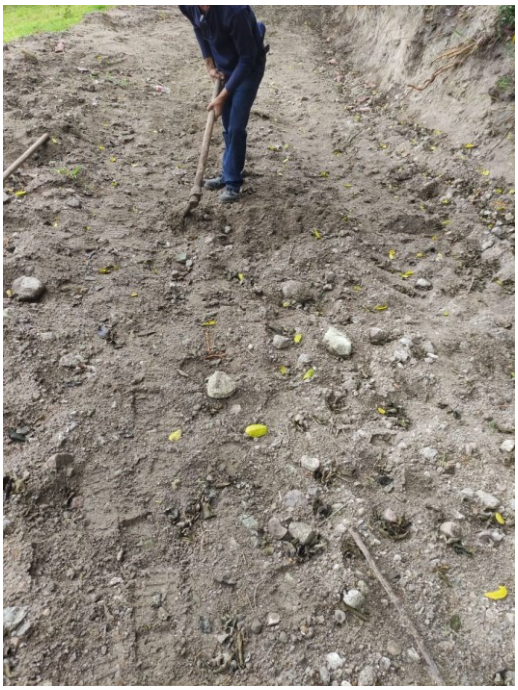



Registro Fotográfico 12. Retiro de sobrantes de excavación Autorizado por el Municipio el cual se encuentra a 10 km de la obra.





Registro Fotográfico 13. Suministro e Instalación de Válvula Ventosa doble cámara HD-EB-2", para tubería 8". Incluye: Válvula compuerta elástica HD-EB-2", Tee HD-JB-8", dos (2) niples pasamuros HD-EL x EB-8", Unión Universal R1-HD-8" y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.





Registro Fotográfico 14. Suministro e Instalación de Válvula compuerta elástica EB-HD-3", para tubería de 8". Incluye: Tee unión mecánica HD-8" x 3", dos (2) niples pasamuros HD-EL x EB-3" y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.





CAPITULO 5 - ANCLAJES TUBERÍA

Registro Fotográfico 15. Localización y Replanteo Estructuras Hidráulicas.






Registro Fotográfico 16. Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).





Registro Fotográfico 17. Reconocimiento trazado de tubería predio Hernando Cuellar y Ermila Ome de Cuellar.



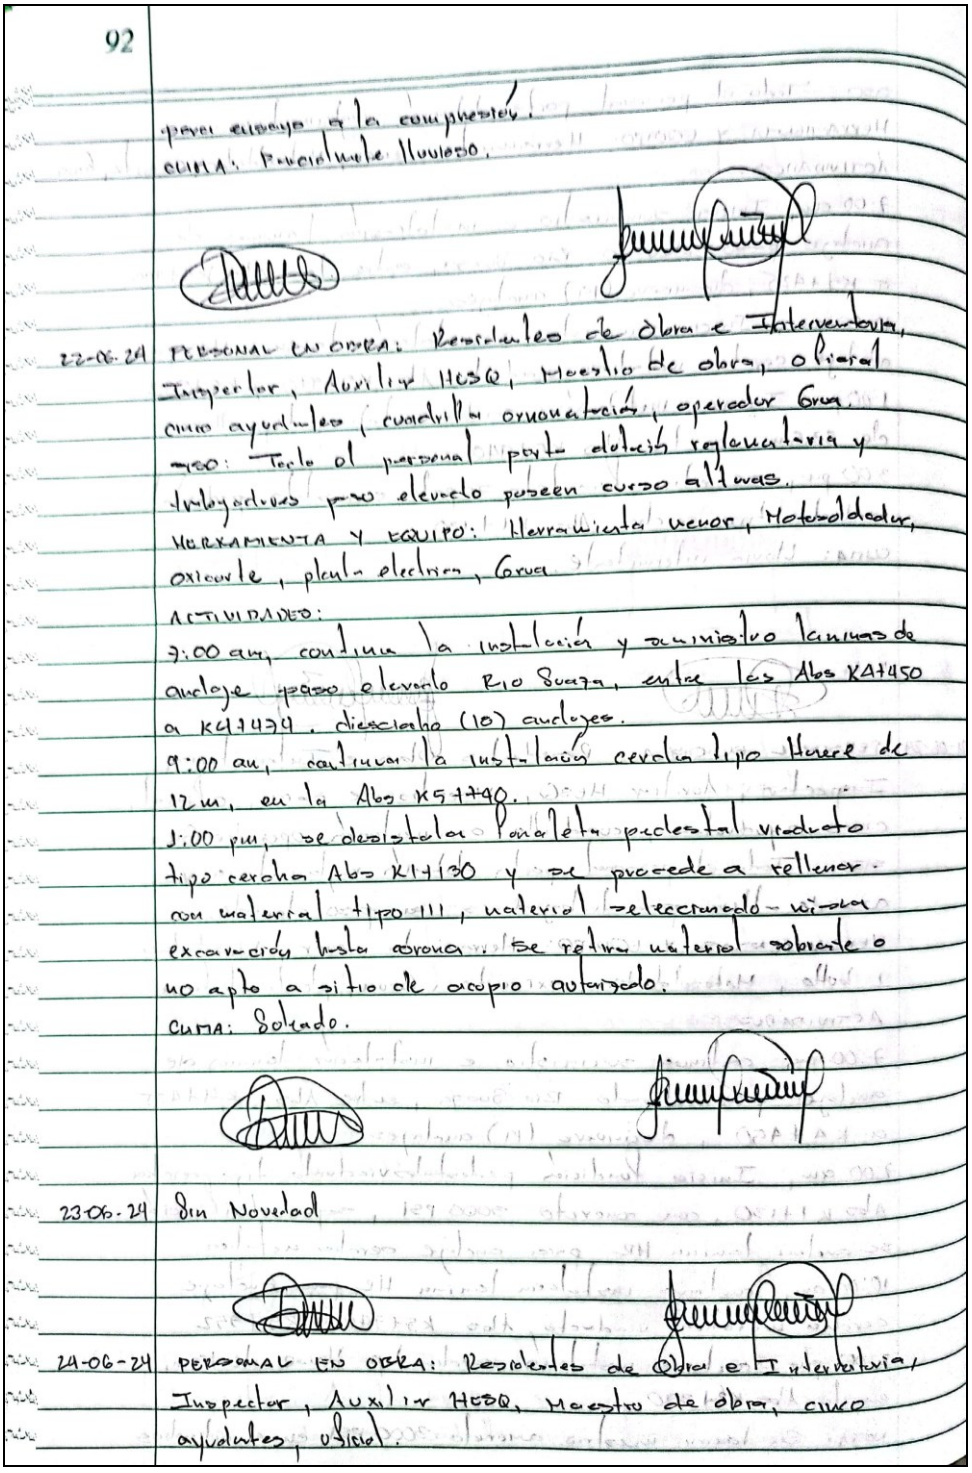

92

pavi cubeya a la completes.
CLIMA: Parcialmente Nuvlado.


22-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial cinco ayudantes, cuadrilla ornamentación, operador Grua. HSEQ: Todo el personal pasa dotación reglamentaria y inducciones para elevado poseen curso alturas.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Motosoldador, oxicorte, planta electrica, Grua
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua la instalación y suministro tramos de anclaje paso elevado Rio Suaza, entre las Abs K41450 a K41474. diecisiete (10) anclajes.
9:00 am, continuar la instalación cerchas tipo Hueco de 12m, en la Abs K51740.
1:00 pm, se desistelan parales pedestal viaducto tipo cercha Abs K41130 y se procede a rellenar con material tipo III, material seleccionado - via-sa excavación hasta corona. Se retira material sobrante o no apto a sitio de acopio autorizado.
CLIMA: Soleado.

23-06-24 Sin Novedad

24-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, cinco ayudantes, oficial.

EPP: Todo el personal porta dotación reglamentaria,
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor, diferencial,
gravel.
ACTIVIDADES:
8:00 am, continua instalación cercha metálica tipo House
para viaducto ubicado en Abs K1+320 de 12 m.
8:00 am, Inicia excavación manual en material conglomerado
entre los Abs K0+300 a K0+350, según niveles topográficos
y niveles del replanteo.
1:00 pm, Inicia instalación tubería HD 8" C40.
3:00 pm, Inicia relleno con material tipo II y III en
zanja, con recebo y material seleccionado de la misma
excavación hasta cota terreno, compactado en capas cada
20 cm. Se retira material sobrante y no apto a sitio
de acopio autorizado.
NOTA: Se instala codo 22.5 HD 8" en Abs K0+325.
CLIMA:

[illegible]-6-24 PERSONAL EN OBRA: Residente Obra e Interventoría,
Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial,
cinco ayudantes
EPP: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor, diferencial
ACTIVIDADES:
7:00 am, Se continua con la excavación manual en material
conglomerado entre los Abs: K0+350 a K0+400, según
replanteo y niveles topográficos
1:00 pm, Se continua con instalación tubería HD 8" C40.
3:00 pm, se continua con relleno con material tipo II y III
de zanja, con recebo y material seleccionado de la
misma excavación hasta cota terreno, compactado en
capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no
apto para relleno a sitio de acopio autorizado

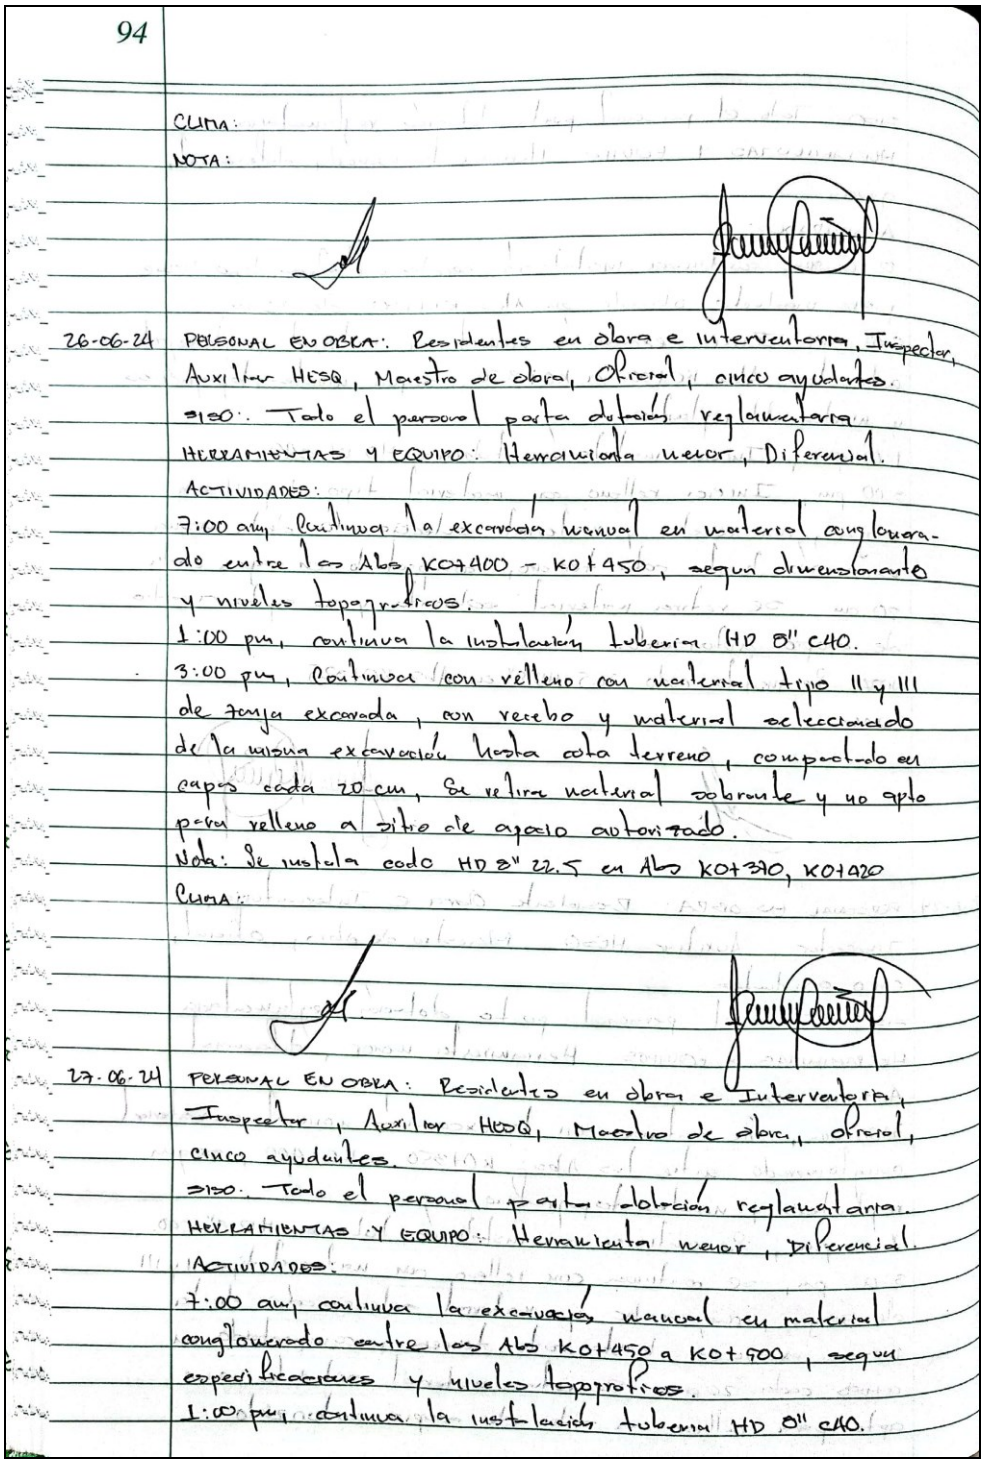


94

CUNA:
NOTA:


26-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes en obra e interventoria, Inspector, Auxiliar HESQ, Maestro de obra, Oficial, cinco ayudantes.
=150: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor, Diferencial.
ACTIVIDADES:
7:00 am Continua la excavación manual en material conglomerado entre las Abs KO+400 - KO+450, segun dimensionamiento y niveles topograficos.
1:00 pm, continua la instalación tuberia HD 8" CAO.
3:00 pm, Continua con relleno con material tipo II y III de zanja excavada, con recebo y material seleccionado de la misma excavación hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm, Se retira material sobrante y no apto para relleno a sitio de acopio autorizado.
Nota: Se instala codo HD 8" 22.5 en Abs KO+390, KO+420
CUNA:

27-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes en obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HESQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
=150: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor, Diferencial.
ACTIVIDADES:
7:00 am continua la excavación manual en material conglomerado entre las Abs KO+450 a KO+500, segun especificaciones y niveles topograficos.
1:00 pm, continua la instalación tuberia HD 8" CAO.

3:00 pm, continua con relleno con material tipo II y III, de zanja excavada, con recebo y material seleccionado de la misma excavación hasta cota terreno, compactado en capas cada 20cm. Se retira material sobrante o no apto para relleno a sitio de acopio autorizado.
CLIMA:



0-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes en obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
0700: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Diferencial.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavación manual en material conglomerado entre las Abs K0+500 a K0+550, segun especificaciones y niveles topograficos.
1:00 pm, continua la instalación tuberia HD 8" c40.
3:00 pm, se continua con relleno de zanja excavada con material tipo II y III, con recebo y material seleccionado de la misma excavación hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto para relleno a sitio de acopio autorizado.
CLIMA:



06-24 PERSONAL EN OBRA: Residente en obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.

96

7:00. Todo el personal porta elotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Diferencial.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavación manual en material conglomerado entre las Abs K0+590 a K0+600, segun especificaciones y niveles topograficos.
11:00 am, continua instalación tuberia HD 8" C40.
1:00 pm, se continua relleno de zanja excavada con material tipo II y III, con recebo y material de la misma excavación hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto para relleno a sitio de acopio autorizado.
CUMA:


30.06.24 Sin Novedad.

01.07.24 Sin Novedad.

02.07.24 PERSONAL EN OBRA: Residente obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestra de obra, Oficial, cinco ayudantes.
7:00: Todo el personal porta elotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Diferencial.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavación manual en material conglomerado entre las Abs K4+273 a K 4+301, segun especifi-

cotones y niveles topograficos.
1:00 pm, Continua (excavacion) instalacion tuberia HD 8" CAO.
3:00 pm, continua relleno de zanja excavada con material tipo II y III, recebo y material seleccionado de la misma excavacion hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto para relleno a sitio de acopio autorizado.
CIMA:
NOTA: Se instala cato HD 8" x 2.15 en Abs K4+275


23-07-24 PERSONAL EN OBRA: Residente obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
SISO: Todo el personal porta documentacion pago Aporte y dotacion reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Diferencial.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavacion (mecanica) manual en material conglomerado entre las Abs K4+301 a K4+329, segun especificaciones y niveles topograficos.
1:00 pm, continua instalacion tuberia HD 8" CAO.
3:00 pm, continua relleno de zanja excavada con material tipo II y III, recebo y material seleccionado de la misma excavacion hasta cota terreno, compactado en capas cada 20cm. Se retira material sobrante o no apto para relleno a sitio de acopio autorizado.
CIMA:

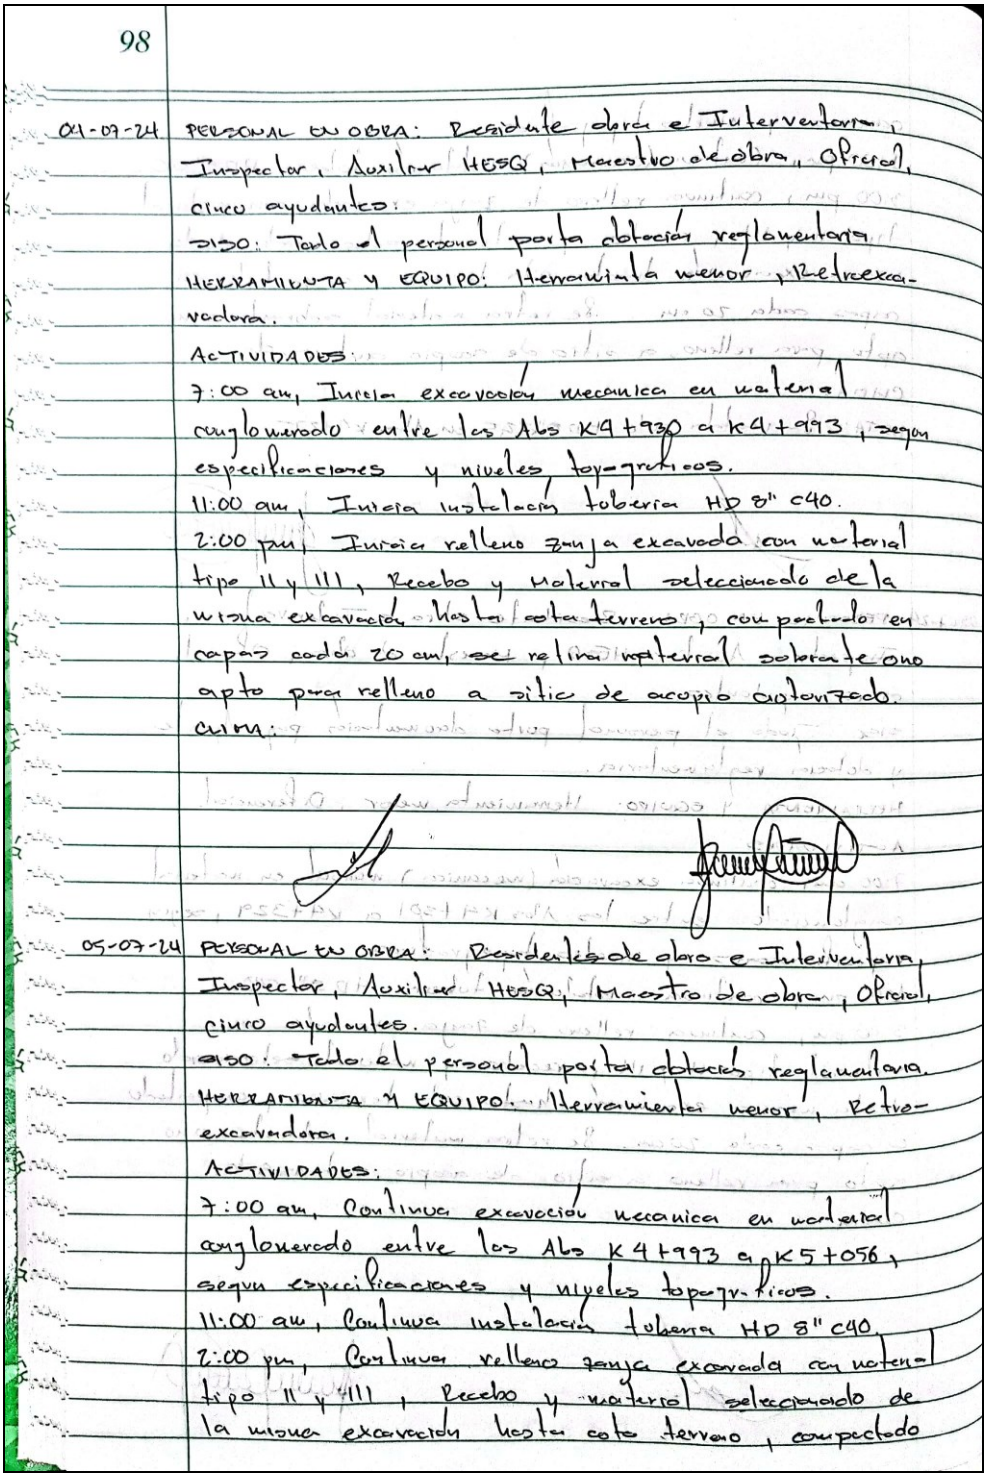

98

04-07-24 PERSONAL EN OBRA: Residente obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, cinco ayudantes.
CISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Inicia excavación mecanica en material conglomerado entre las Abs K4+930 a K4+993, segun especificaciones y niveles topograficos.
11:00 am, Inicia instalacion tuberia HD 8" C40.
2:00 pm, Inicia relleno zanja excavada con material tipo II y III, Recebo y material seleccionado de la misma excavación hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm, se retira material sobrante o no apto para relleno a sitio de acopio autorizado.
CIERRE:

05-07-24 PERSONAL EN OBRA: Residente obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, cinco ayudantes.
CISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavación mecanica en material conglomerado entre las Abs K4+993 a K5+056, segun especificaciones y niveles topograficos.
11:00 am, Continua instalacion tuberia HD 8" C40.
2:00 pm, Continua relleno zanja excavada con material tipo II y III, Recebo y material seleccionado de la misma excavación hasta cota terreno, compactado

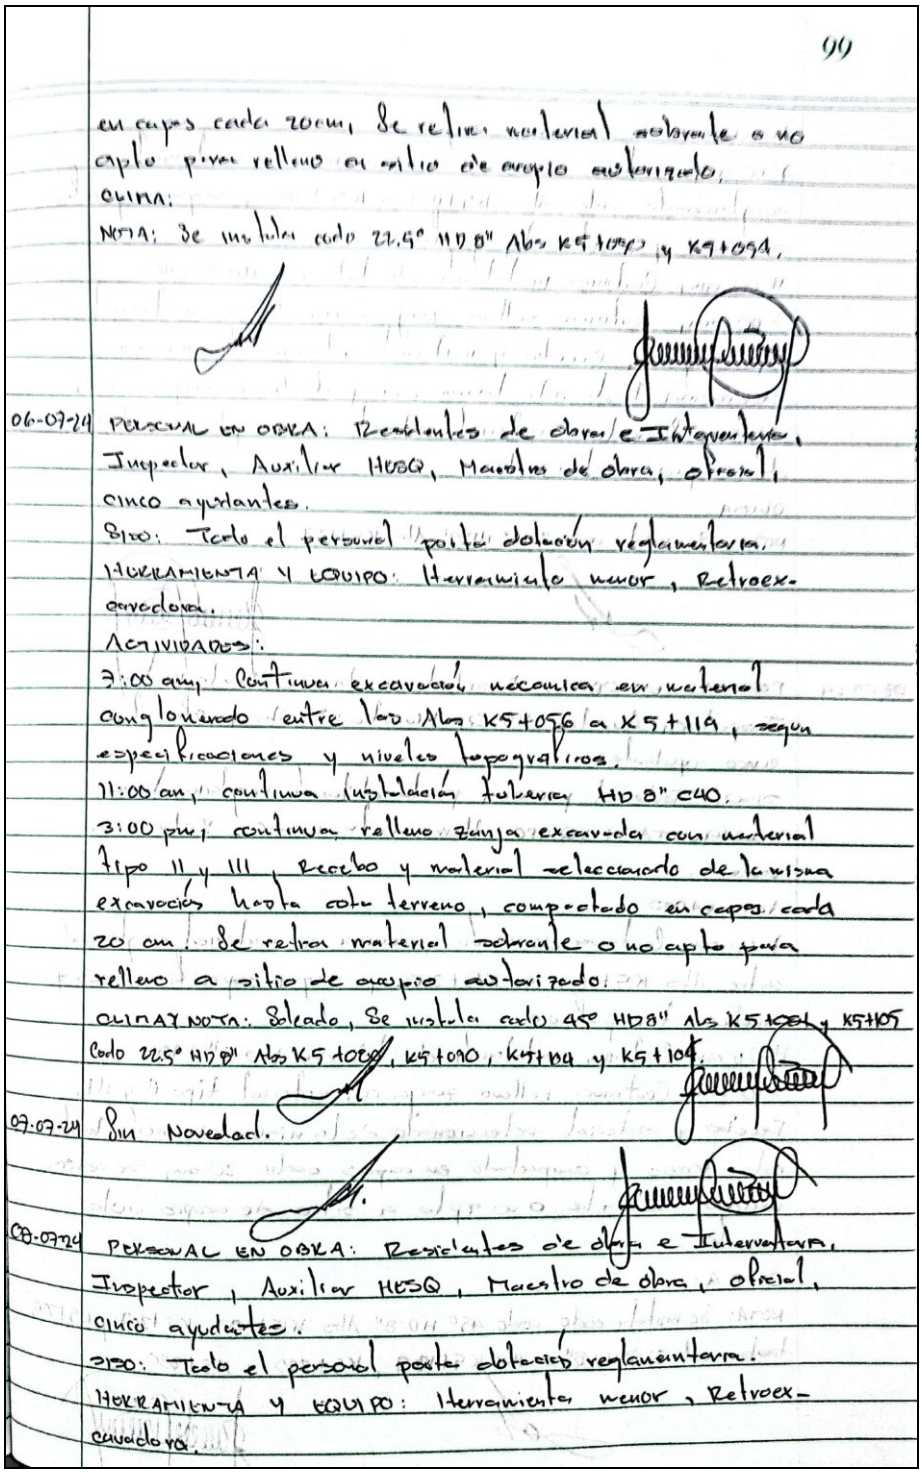


99

en capas cada 20cm, se retira material sobrante o no apto para relleno en sitio de acopio autorizado.
CLIMA:
NOTA: Se instalan codo 22.5° HD 8" Abs K5+090 y K5+094.

06-07-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestros de obra, oficial, cinco ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavación mecanica en material conglomerado entre las Abs K5+056 a K5+119, segun especificaciones y niveles topograficos.
11:00 am, continua instalación tuberia HD 8" C40.
3:00 pm, continua relleno zanja excavada con material tipo II y III, Recebo y material seleccionado de la misma excavación hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto para relleno a sitio de acopio autorizado.
CLIMA Y NOTA: Soleado, Se instala codo 45° HD 8" Abs K5+056 y K5+105 Codo 22.5° HD 8" Abs K5+086, K5+090, K5+114 y K5+104.

07-07-24 Sin Novedad.

08-07-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Retroexcavadora.

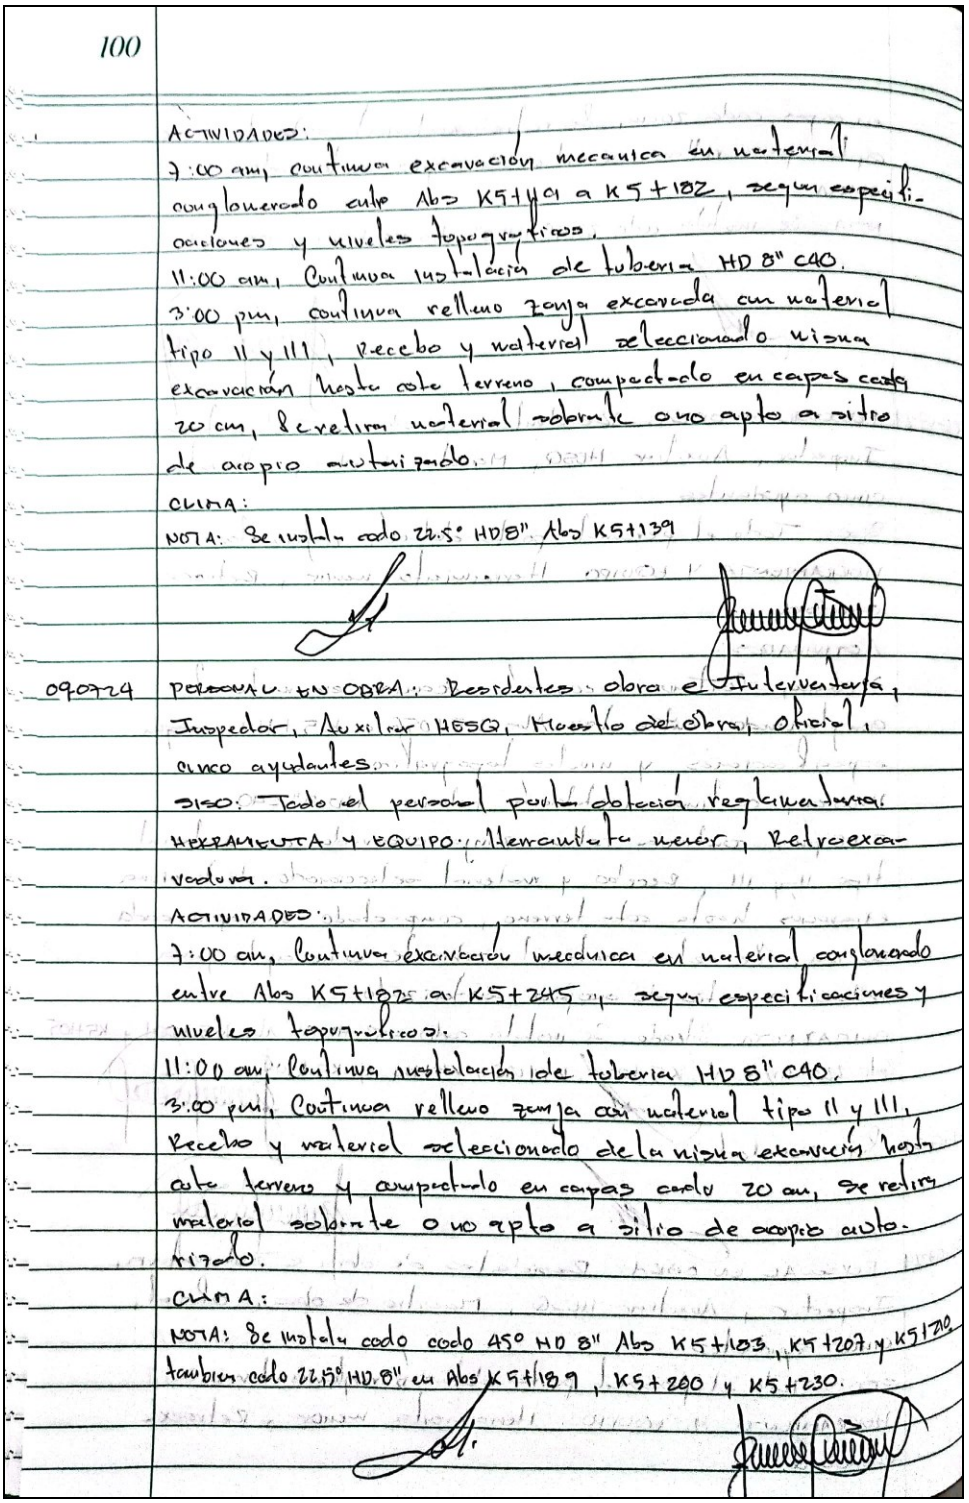

100

ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavacion mecanica en material conglomerado entre Abs K5+191 a K5+182, segun especificaciones y niveles topograficos.
11:00 am, Continua instalacion de tuberia HD 8" C40.
3:00 pm, continua relleno zanja excavada con material tipo II y III, recebo y material seleccionado misma excavacion hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm, se retira material sobrante o no apto a sitio de acopio autorizado.
CLIMA:
NOTA: Se instala codo 22.5° HD8". Abs K5+139

090724 PERSONAL EN OBRA: Residentes obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
DISO: Todo el personal porta dotacion reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavacion mecanica en material conglomerado entre Abs K5+182 a K5+245, segun especificaciones y niveles topograficos.
11:00 am, Continua instalacion de tuberia HD 8" C40.
3:00 pm, Continua relleno zanja con material tipo II y III, Recebo y material seleccionado de la misma excavacion hasta cota terreno y compactado en capas cada 20 cm, se retira material sobrante o no apto a sitio de acopio autorizado.
CLIMA:
NOTA: Se instala codo codo 45° HD 8" Abs K5+183, K5+207 y K5+210 tambien codo 22.5° HD 8" en Abs K5+189, K5+200 y K5+230.

10-07-24

PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HESQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.

SSO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.

HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor, Retroexcavadora.

ACTIVIDADES:

7:00 am, Continua excavación mecanica en material conglomerado entre Abs K5+245 a K5+308, segun especificaciones y niveles topograficos.

11:00 am, continua instalación tuberia HD 8" C40.

3:00 pm, Continua relleno zanja con material tipo II y III, Recebo y material seleccionado de la misma excavación hasta cota terreno, compactado en capas de 20 cm. Se retira material sobrante o no apto para relleno a sitio de acopio autorizado.

CLIMA:

NOTA: Se instalo codo 22.5° HD 8" Abs K5+260 y K5+263.

11-07-24

PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HESQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.

SSO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.


HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Retroexcavadora,

ACTIVIDADES:

7:00 am, Continua excavación mecanica en material conglomerado entre Abs K5+300 a K5+371, segun especificaciones tecnicas y niveles topograficos.

11:00 am, continua instalación tuberia HD 8" C40.

3:00 pm, Continua relleno zanja con material tipo II y III, Recebo y material seleccionado de la misma excavación hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm.

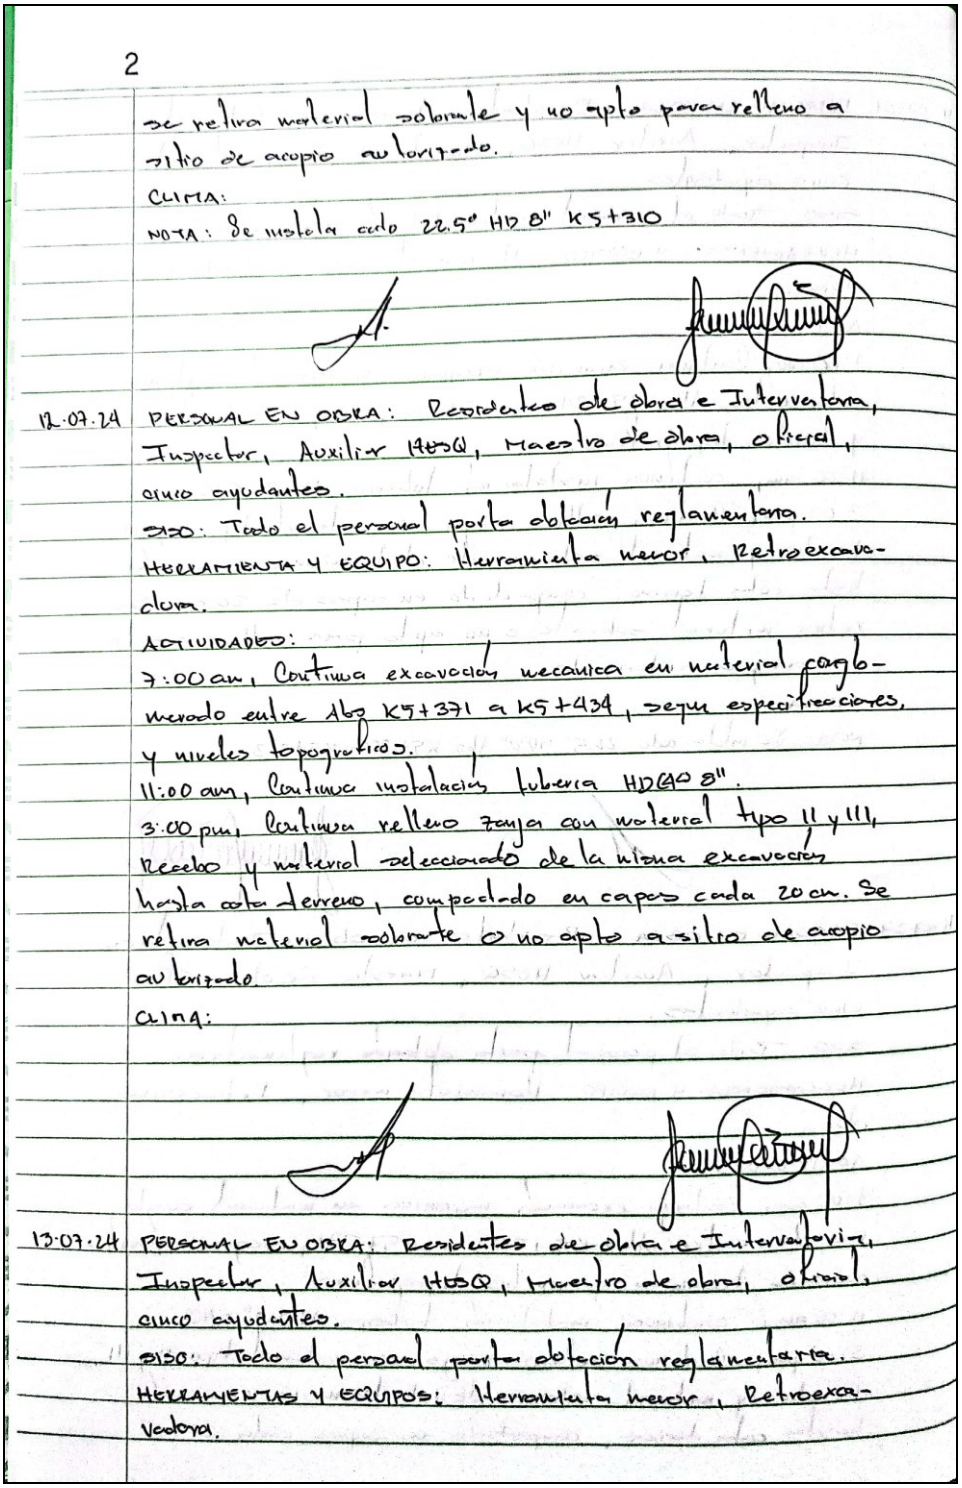


2

se retira material sobrante y no apto para relleno a sitio de acopio autorizado.
CLIMA:
NOTA: Se instala codo 22.5° HD 8" K5+310

12.07.24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
EPP: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavación mecanica en material conglomerado entre Abs K5+371 a K5+434, segun especificaciones, y niveles topograficos.
11:00 am, Continua instalación tuberia HDPE 8".
3:00 pm, Continua relleno zanja con material tipo II y III, Recebo y material seleccionado de la misma excavación hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto a sitio de acopio autorizado.
CLIMA:

13.07.24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
EPP: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor, Retroexcavadora.

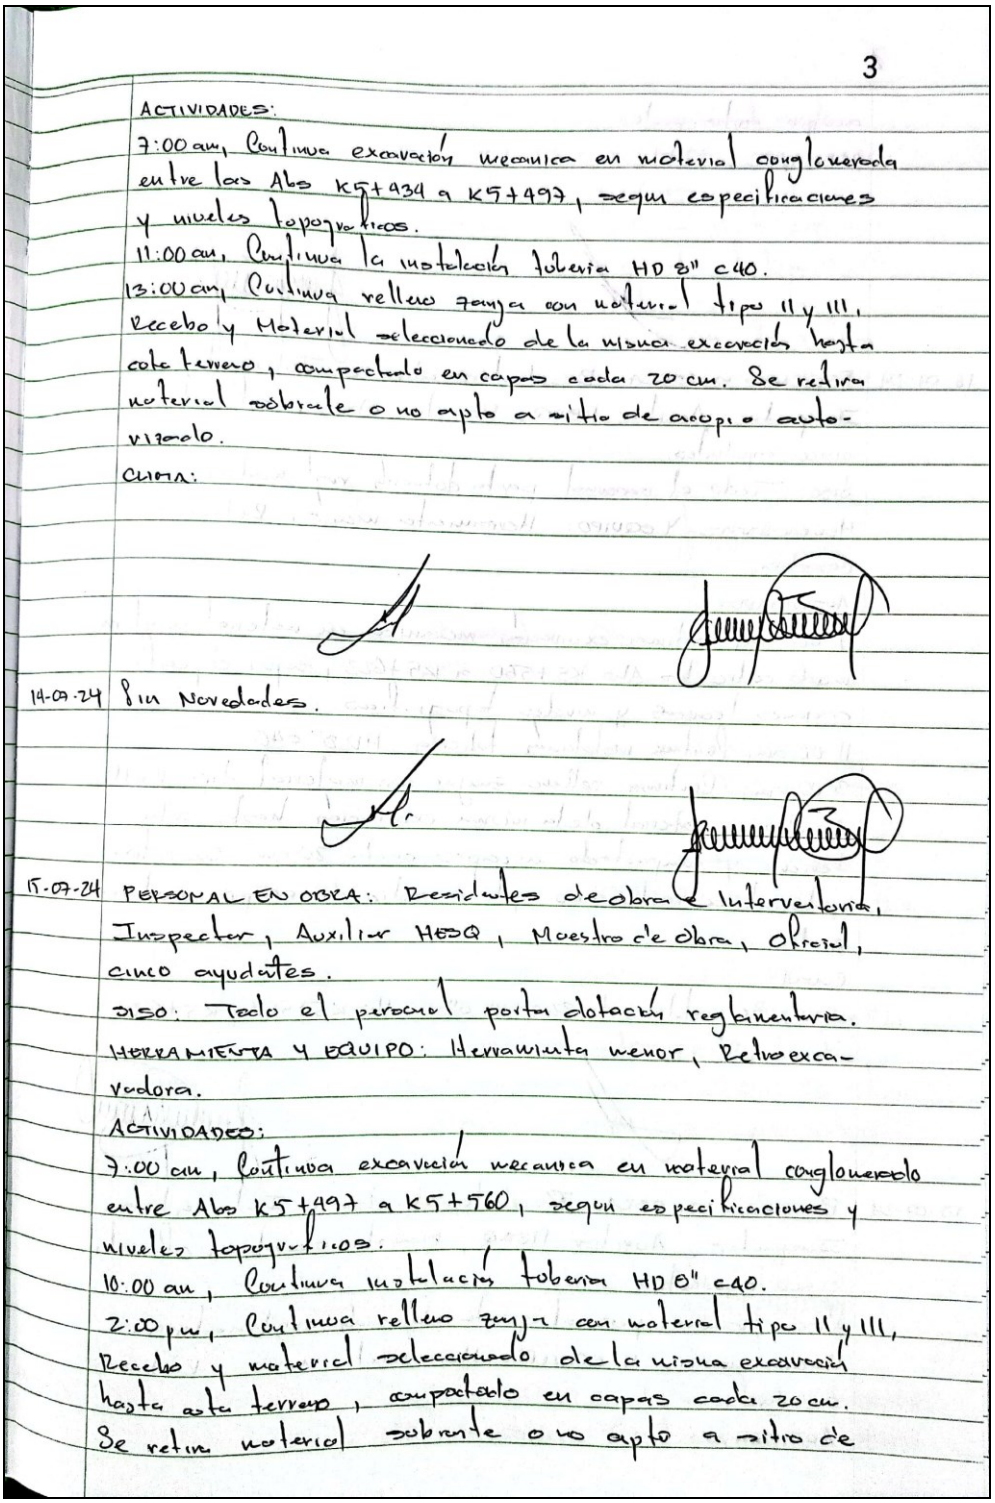

3

ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavación mecanica en material conglomerado entre las Abs K5+434 a K5+497, segun especificaciones y niveles topograficos.
11:00 am, Continua la instalación tuberia HD 8" c40.
13:00 pm, Continua relleno zanja con material tipo II y III, Recebo y Material seleccionado de la misma excavación hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto a sitio de acopio autorizado.
CHIVA:

14-07-24 Sin Novedades.

15-07-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, cinco ayudantes.
DISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavación mecanica en material conglomerado entre Abs K5+497 a K5+560, segun especificaciones y niveles topograficos.
10:00 am, Continua instalación tuberia HD 8" c40.
2:00 pm, Continua relleno zanja con material tipo II y III, Recebo y material seleccionado de la misma excavación hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto a sitio de

Calle 6 No. 7 - 28
Teléfono (8) 8716478
Neiva - Huila.
conenergia_ltda@yahoo.com

acopio autorizado.
CLIMA:

16-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro obra, oficial, cinco ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor, Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavación mecanica en material conglomerado entre los Abs K5+560 a K5+623, segun especificaciones tecnicas y niveles topograficos.
11:00 am, Continua instalación tuberia HD 8" c40.
3:00 pm, Continua relleno zanja con material tipo II y III, Recebo y material de la misma excavación hasta cota terreno y compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto a sitio de acopio autorizado.
CLIMA:
NOTA: Se instala codo 22.5° HD 8" en Abs K5+563 y K5+613.

17-09-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor, Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:

7:00 am, Continua excavación mecanica en material conglomerado, entre los Abs K5+623 a K5+686, segun especificaciones tecnicas y niveles topograficos.
10:00 am, continua la instalacion de tuberia HD 8" CAO.
2:00 pm, Continue relleno zanja con material tipo II y III, Recebo y material de la misma excavación hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto a sitio de acopio autorizado.
CLIMA:

18-07-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HESQ, Maestro de obra, Oficial, cinco ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavación mecanica en material conglomerado entre los Abs K5+686 a K5+749, segun especificaciones y niveles topograficos.
11:00 am, Continua la instalación tuberia HD 8" CAO.
3:00 pm, Continua relleno zanja, con material tipo II y III, Recebo y Material misma excavación seleccionado, hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante y no apto a sitio de acopio autorizado.
CLIMA:

19-07-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HESQ, Maestro de obra, Oficial, cinco ayudantes.


6

SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavación mecanica en material conglomerado entre las Abs KS+749 a KS+812, segun especificaciones y niveles topograficos.
10:00 am, Continua la instalación de tuberia HD 8" C40.
2:00 pm, Continua relleno zanja con material tipo II y III, Recebo y Material seleccionado misma excavación hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto a sitio de acopio autorizado.
CLIMA:

20-07-24 Sin Novedad.

21-07-24 Sin Novedad.

22-07-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, cinco ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continua excavación mecanica en material conglomerado en las Abs KS+812 a KS+875, segun especifi-

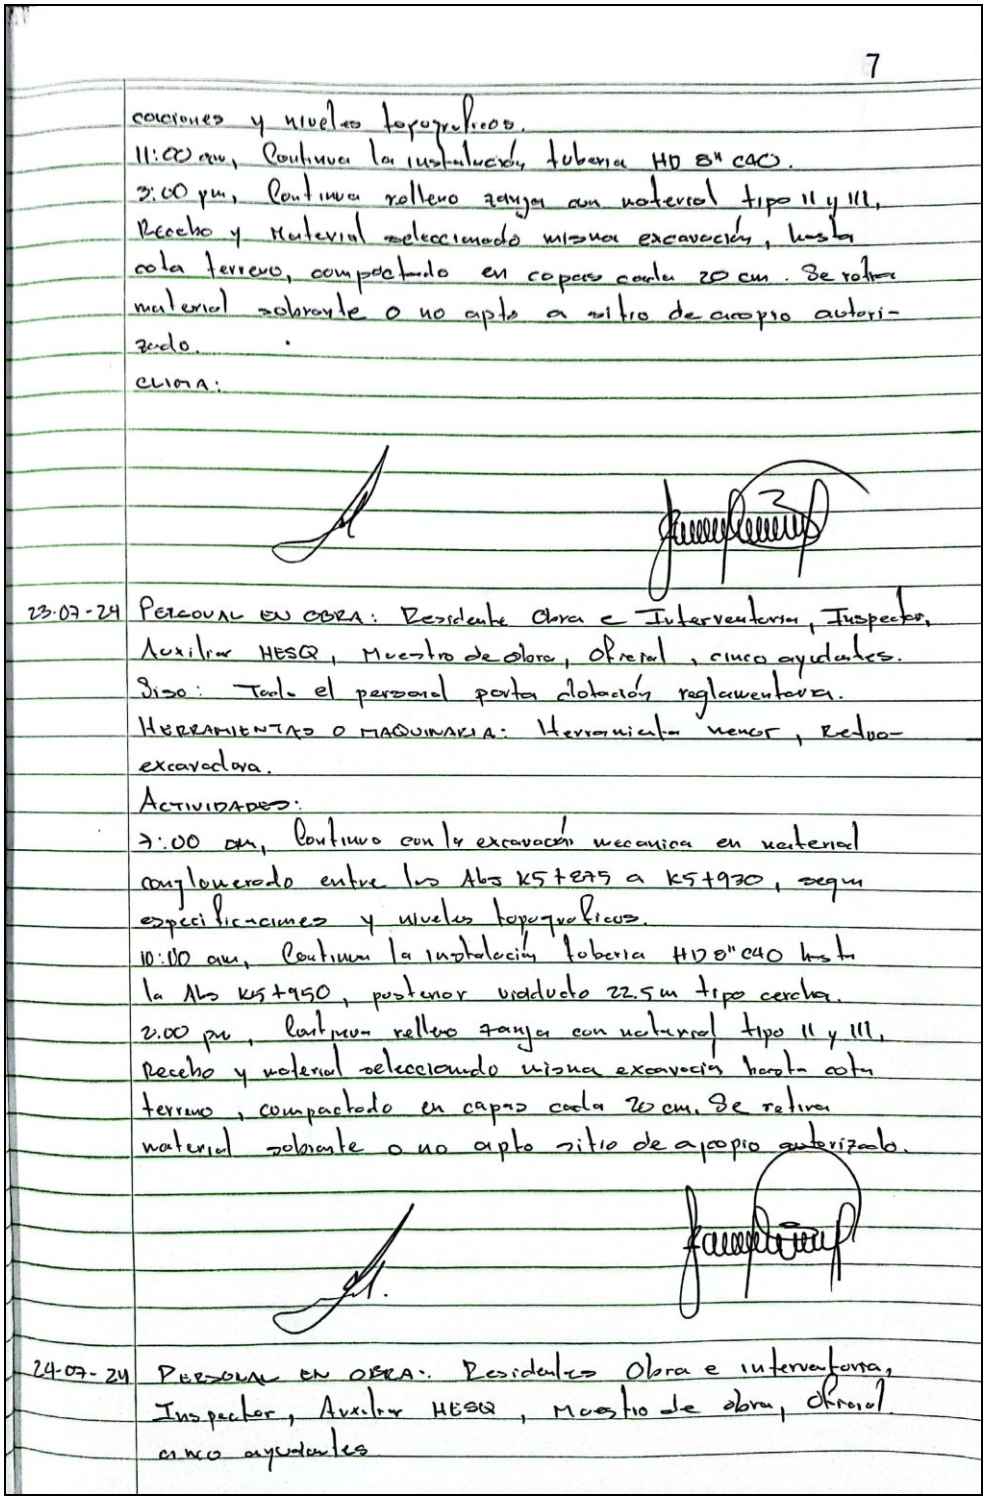

7

coronas y niveles topográficos.
11:00 am, Continua la instalación tubería HD 8" CAO.
3:00 pm, Continua relleno zanja con material tipo II y III, Recebo y material seleccionado misma excavación, hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto a sitio de acopio autorizado.
CLIMA:

23-07-24 PERSONAL EN OBRA: Residente Obra e Interventoría, Inspector, Auxiliar HESQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS O MAQUINARIA: Herramienta menor, Retro-excavadora.
ACTIVIDADES:
7:00 am, Continuo con la excavación mecánica en material conglomerado entre los Abs K5+875 a K5+930, según especificaciones y niveles topográficos.
10:00 am, Continua la instalación tubería HD 8" CAO hasta la Abs K5+950, posterior viaducto 22.5 m tipo cercha.
2:00 pm, Continua relleno zanja con material tipo II y III, Recebo y material seleccionado misma excavación hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto sitio de acopio autorizado.

24-07-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e interventoría, Inspector, Auxiliar HESQ, Maestro de obra, oficial cinco ayudantes

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 30272635

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2024-07-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
14		$16.587.334		30272635

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1035436676	01	No	No	No	41	1	1701001	Fijo	ARREDONDO RAMIREZ ALEXANDRA MARCELA	$1.760.000
CC-30507765	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	CALDERON MURCIA MARLY LORENA	$1.300.000
CC-1075251914	01	No	No	No	41	1	1701001	Fijo	CAMPOS MURCIA ADRIANA DEL PILAR	$1.300.000
CC-12126239	01	No	No	No	41	1	4492301	Fijo	CERQUERA GUILOMBO JOSE WILLIAM	$1.300.000
CC-1081155462	01	No	No	No	41	1	4492301	Fijo	CERVERA PEÑA JOHN FREDY	$1.300.000
CC-1003819875	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	CHARRY TAVERA KIMBERLY	$1.640.000
CC-1117535608	01	No	No	No	41	1	1701001	Fijo	CLAROS FIERRO OSCAR ALIRIO	$1.640.000
CC-7691364	01	1	No	No	41	1	1711001	Fijo	FALLA FLOREZ JESUS ANTONIO	$1.300.000
CC-36069823	01	No	No	No	41	1	1701001	Fijo	FIRIGUA RODRIGUEZ RUBIELA	$1.300.000
CC-19486513	01	No	No	No	41	1	1701001	Fijo	GUTIERREZ CUELLAR NELSON	$1.300.000
CC-1075541804	01	No	No	No	41	1	4492301	Fijo	OLAYA GUILOMBO EDUARD FERNANDO	$1.300.000
CC-1075266765	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	QUINTERO SANCHEZ HAROLD MAURICIO	$1.300.000
CC-1081415763	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	RIVERA QUEVEDO STEFANNY	$1.300.000
TI-1138274458	19	No	No	No	41	1	1711001	Salario	VARGAS GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1035436676																													0		
CC - 30507765																X	2024-06-04	2024-06-05											0		
CC - 30507765																X	2024-06-07	2024-06-07											0		
CC - 30507765																X	2024-06-11	2024-06-17											0		
CC - 30507765			X	2024-06-18																									0		
CC - 1075251914																						X	2024-06-01	2024-06-09					0		
CC - 1075251914																			X	2024-06-10	2024-06-30								0		
CC - 12126239																													0		
CC - 1081155462																													0		
CC - 1003819875																													0		
CC - 1117535608																													0		
CC - 1117535608																X	2024-06-27	2024-06-28											0		
CC - 7691364																													0		
CC - 36069823																													0		
CC - 19486513																													0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075541804																													0		
CC - 1075266765																													0		
CC - 1081415763																													0		
TI - 1138274458																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1035436676	PORVENIR	30	$1.760.000	0.1600000	$281.600	$0	$0	$281.600	$0	$0	$0
CC - 30507765	COLPENSIONES	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 30507765	COLPENSIONES	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 30507765	COLPENSIONES	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 30507765	COLPENSIONES	8	$346.667	0.1600000	$55.500	$0	$0	$55.500	$0	$0	$0
CC - 1075251914	COLPENSIONES	9	$390.000	0.1600000	$62.400	$0	$0	$62.400	$0	$0	$0
CC - 1075251914	COLPENSIONES	21	$910.000	0.1600000	$145.600	$0	$0	$145.600	$0	$0	$0
CC - 12126239	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1081155462	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1003819875	COLFONDOS	30	$1.640.000	0.1600000	$262.400	$0	$0	$262.400	$0	$0	$0
CC - 1117535608	COLPENSIONES	28	$1.530.667	0.1600000	$245.000	$0	$0	$245.000	$0	$0	$0
CC - 1117535608	COLPENSIONES	2	$109.334	0.1600000	$17.500	$0	$0	$17.500	$0	$0	$0
CC - 7691364	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 36069823	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 19486513	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1075541804	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1075266765	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1081415763	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
TI - 1138274458	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1035436676	SANITAS	30	$1.760.000	0.0400000	$70.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.760.000	1	0.0052200	$9.200
CC - 30507765	SANITAS	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	1	0.0000000	$0
CC - 30507765	SANITAS	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0000000	$0
CC - 30507765	SANITAS	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	1	0.0000000	$0
CC - 30507765	SANITAS	8	$346.667	0.0400000	$13.900	$0	0	$0	0	$0	8	$346.667	1	0.0052200	$1.900
CC - 1075251914	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$390.000	0.0400000	$15.600	$0	0	$0	0	$0	9	$390.000	1	0.0000000	$0
CC - 1075251914	NUEVA E.P.S. S.A.	21	$910.000	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	21	$910.000	1	0.0000000	$0
CC - 12126239	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0435000	$56.600
CC - 1081155462	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0435000	$56.600
CC - 1003819875	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.640.000	0.0400000	$65.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.640.000	1	0.0052200	$8.600
CC - 1117535608	NUEVA E.P.S. S.A.	28	$1.530.667	0.0400000	$61.300	$0	0	$0	0	$0	28	$1.530.667	1	0.0052200	$8.000
CC - 1117535608	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$109.334	0.0400000	$4.400	$0	0	$0	0	$0	2	$109.334	1	0.0000000	$0
CC - 7691364	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 36069823	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 19486513	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 1075541804	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0435000	$56.600
CC - 1075266765	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 1081415763	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
TI - 1138274458	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1035436676	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.760.000	0.0400000	$70.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30507765	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30507765	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30507765	COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30507765	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$346.667	0.0400000	$13.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075251914	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075251914	COMFAMILIAR DEL HUILA	21	$910.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12126239	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081155462	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003819875	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.640.000	0.0400000	$65.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117535608	COMFAMILIAR DEL HUILA	28	$1.530.667	0.0400000	$61.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117535608	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7691364	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36069823	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-19486513	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075541804	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075266765	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081415763	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
TI-1138274458	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$416.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$416.000
PORVENIR	2	$489.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$489.600
COLFONDOS	1	$262.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$262.400
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLPENSIONES	7	$1.427.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.427.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	10	$657.800	$0	0	$0	0	$0	$657.800	0	$0	$0	$657.800	$0	0	$0	$0	$657.800	$0	$0	$657.800
SANITAS	4	$205.800	$0	0	$0	0	$0	$205.800	0	$0	$0	$205.800	$0	0	$0	$0	$205.800	$0	$0	$205.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	14	$238.300	0	$0	$0	$238.300	0	$0	$238.300	0	$0	$0	$238.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$627.200	0	$0	$627.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$863.600
PENSIONES	4	$2.595.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$238.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$627.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.324.600

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 30068244

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2024-07-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	WILLIAM PARRA OLAYA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12123891	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 17 NO 6 52	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	MARLIODUSSAN@GMAIL.COM	TELÉFONO	3153217351
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	obras
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		30068244

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-12123891	59	No	No	No	41	1	1711001	Salario	PARRA OLAYA WILLIAM	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12123891																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12123891	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12123891	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12123891	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$6.800	0	$0	$0	$6.800	0	$0	$6.800	0	$0	$0	$6.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$377.300

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30246102
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-07-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	32	NOMBRE SUCURSAL	CTO 159 23 ACU FASE II ALTAMIRA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$4.000.000		30246102

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7714850	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	LUNA GASCA LUIS IVAN	$2.700.000
CC-1082129987	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	POLANCO PARRA VALENTINA	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7714850																													0		
CC - 1082129987																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7714850	COLPENSIONES	30	$2.700.000	0.1600000	$432.000	$0	$0	$432.000	$0	$0	$0
CC - 1082129987	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7714850	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.700.000	0.0400000	$108.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.700.000	5	0.0696000	$188.000
CC - 1082129987	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7714850	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.700.000	0.0400000	$108.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082129987	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 – 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$432.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$432.000
PORVENIR	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$108.000	$0	0	$0	0	$0	$108.000	0	$0	$0	$108.000	$0	0	$0	$0	$108.000	$0	$0	$108.000
SANITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	$278.500	0	$0	$0	$278.500	0	$0	$278.500	0	$0	$0	$278.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$160.000	0	$0	$160.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$160.000
PENSIONES	2	$640.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$278.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$160.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.238.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30071264
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-07-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ALEXANDER RODRIGUEZ LOSADA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	83057718	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 5 N 8A 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	GUADALUPE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4799	CORREO ELECTRÓNICO	NECA_LUNA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8321097
FAX	8321097	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		30071264

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-83057718	03	No	No	No	41	319	0	Salario	RODRIGUEZ LOSADA ALEXANDER	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 83057718																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 83057718	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 83057718	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-83057718	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$370.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30246127
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-07-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	39	NOMBRE SUCURSAL	CTO 159 ACU ALTAMIRA FASE II OPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$7.800.000		30246127

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1007616948	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	ACUÑA AGUILERA ALBERTO DE JESUS	$1.300.000
CC-83239835	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	CASTRO JIMENEZ GERMAN EDUARDO	$1.300.000
CC-1110586146	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	GOMEZ CAPIZ JEFFERSON	$1.300.000
CC-83058468	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	RAMIREZ PLAZAS JOSE ALONSO	$1.300.000
CC-1082124660	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	RODRIGUEZ CUELLAR JHOAN ALEXIS	$1.300.000
CC-83058277	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	RODRIGUEZ LOSADA JAIDER	$1.300.000

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1007616948																													0		
CC - 83239835																													0		
CC - 1110586146																													0		
CC - 83058468																													0		
CC - 1082124660																													0		
CC - 83058277																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1007616948	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 83239835	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1110586146	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 83058468	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1082124660	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 83058277	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007616948	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 83239835	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 1110586146	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 83058468	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 1082124660	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 83058277	EPS-S EMSSANAR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1007616948	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83239835	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110586146	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83058468	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082124660	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83058277	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
PORVENIR	3	$624.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$624.000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$416.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$416.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
EPS-S EMSSANAR	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$208.000	$0	0	$0	0	$0	$208.000	0	$0	$0	$208.000	$0	0	$0	$0	$208.000	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$543.000	0	$0	$0	$543.000	0	$0	$543.000	0	$0	$0	$543.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$312.000	0	$0	$312.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$312.000
PENSIONES	3	$1.248.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$543.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$312.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.415.000
