EL SUSCRITO SUPERVISOR
CERTIFICA

Que el contrato No. 285 de 2023, se cumplió satisfactoriamente con las obligaciones de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Nombre del Contratista	**Número Nit o C.C. y lugar expedición**	**No. informe**		
DC PROJECT S.A.S R/L CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	NIT. 901.410.401-8 C.C N° 1.124.861.171 de Mocoa	2	de	2

Fecha de presentación			**Periodo del informe:**		**Municipio prestación del servicio**
Día	**Mes**	**Año**	**De**	**Al**	
29	JULIO	2024	15/02/2024	10/05/2024	Mocoa

Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓ TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓ PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SE MOCOA EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA D MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUT TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA". DEL PLAN DE FOMENT 2023.		
Tipo de contrato:	Obra		
Fecha de Inicio	16/01/2024	**Fecha de Terminación**	14/02/2024
Plazo	45 días		
Valor total del contrato	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS ($ 179.995.091) MDA/CTE, INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS Y GASTOSDIRECTOS E INDIRECTOS		
Prorrogas	**Acta No.** 001 de **29/02/2024 – Tiempo:** 25 días **Acta No.** 002 de **21/03/2024 – Tiempo:** 30 días **Acta No.** 003 de **24/04/2024 – Tiempo:** 16 días		
Adiciones	**Acta No.** X de **dd/mm/aaaa – Tiempo:** En días y/o meses		
Suspensiones	**Acta No.** X de **dd/mm/aaaa – Tiempo:** En días y/o meses		
Modificatorios	**Acta No.** X de **dd/mm/aaaa – Tiempo:** En días y/o meses		
Interventoría	No hubo interventoría. Se contrató un profesional Ingeniero Eléctrico como apoyo a la supervisión. El contrato es por OPS, por un valor de ocho millones de pesos $ 8.000.000.oo		
Nueva fecha de terminación	N/A		

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

Forma de pago	El INSTITUTO cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera; PAGOS POR ACTAS PARCIALES. Hasta el 90% del valor del contrato, se cancelará mediante la presentación de actas de recibo parciales, para el trámite de pago de la primera acta parcial, el contratista deberá demostrar haber ejecutado mínimo un 50% de la obra física y para el trámite de pago de la segunda acta parcial deberá acreditar haber ejecutado mínimo un 40% de la obra física, Para el trámite de cada acta parcial el contratista deberá aportar los siguientes documentos; informe de las actividades ejecutadas en la cual deberá contener registro fotográficos de la obra ejecutada, copia de la bitácora, planillas de los aportes a seguridad social y parafiscales del tiempo ejecutado, y Factura comercial del servicio prestado. PAGO FINAL: El 10% restante del valor del contrato, se pagará al finalizar la obra en las condiciones requeridas y de la presentación de informes requeridos con registros fotográficos y demás anexos propios de la ejecución y del recibo final de obra previa certificación de cumplimiento el supervisor de la entidad, sus informes y la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar y acta de liquidación. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista. Este pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura, certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; así como, recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. PARÁGRAFO 1º.- EL CONTRATISTA acreditará el pago correspondiente a sus aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes establecidos. PARÁGRAFO 2º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados y liquidados en forma proporcional. PARÁGRAFO 3º.- EL Instituto no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del contrato que se celebra. PARÁGRAFO 4º.- Del Derecho de Turno: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetara el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se haya

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

	aportado el último de los documentos.

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se verificó que el contratista cumplió con el pago a sus aportes al Sistema General de seguridad social integral (salud, pensiones, ARL) según lo establece el contrato. Además, anexa certificado expedido por la contadora Yeseni Vianney Coronel Melo, con Tarjeta Profesional T.P 305532-T, donde expone que el representante legal de la empresa DC PROJECT S.A.S con NIT. 901.410.401-8, CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ, identificado con cédula 1124.861.171 de Mocoa Putumayo, se encuentra en Paz y Salvo, con los aportes Parafiscales y Seguridad Social de los empleados de la empresa.
La (s) planilla (s) aportada (s) se confrontaron en el sistema del operador correspondiente, verificando que son auténticas y cumplen con lo exigido. Para tal efecto relaciono los datos relevantes al respecto.

PLANILLA NUMERO	FECHA DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO
9464049705	2024/03/05	Pensión febrero y salud marzo
9466300160	2024/04/26	Pensión marzo y salud abril
9466873577	2024/05/07	Pensión abril y salud mayo
9469324703	2024/06/28	Pensión mayo y salud junio

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato tal como se evidencia en el producto presentado y aprobado por el supervisor del contrato y por el apoyo a la supervisión, ingeniero German Chamorro y la factura electrónica de venta No. DC1 57 Ver. UBL 2.1 fecha 24/07/2024, AUTORIZO el pago FINAL por la suma de Sesenta y Cinco millones trescientos seis mil treinta pesos con diez centavos ($65,306,030.10) MDA/CTE

DOCUMENTOS SOPORTES (entregados)

ESTADOS FINANCIEROS	
CONTRATOS	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$ 179.995.091
Valor total de adiciones	$ 0
Valor total de reducciones	N/A
Valor total del Contrato	$ 179.995.091
Valor total pagado	$ 105.325.161,10
Valor a pagar en la presente certificación	$ 65,306,030.10
Saldo a favor del Contratante	$ 9.363.899,8

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

La presente certificación se expide para efecto de pago del contrato antes referenciado, en la ciudad de Mocoa a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2024.

_____

JUAN CARLOS CALVACHE ALOMÍA
CC 98.384.386 De Pasto (Nariño)
Cargo o Vinculación: PLANEACIÓN SUPERVISOR

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

Factura Electrónica De Venta No. DC1 58
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 9

Fecha de Validación: 01/08/2024 05:37 PM
Fecha de Generación: 01/08/2024 05:37 PM
Fecha de Vencimiento: 31/08/2024
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : DC PROJECT SAS
Razón Social: DC PROJECT S.A.S
NIT: 901410401-8
Teléfono: + (57) 312 2595903
Correo Electrónico: dcprojectsas@gmail.com
Dirección: BRR ALTOS DE LA COLINA
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA

Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO DELPUTUMAYO
Razón Social INSTITUTO TECNOLOGICO DELPUTUMAYO
NIT: 800247940-1
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: atencionalusuario@itp.edu.co
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	186	EQUIPO DE MEDIDA * MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	EQUIPO DE MEDIDA * MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	1.00	cada	5,369,930.00	5,369,930.00	0	0.00	**5,369,930.00**
2	187	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5ª	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5ª	3.00	cada	426,649.00	1,279,947.00	0	0.00	**1,279,947.00**
3	188	ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	1.00	cada	2,195,100.00	2,195,100.00	0	0.00	**2,195,100.00**
4	189	ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	1.00	unidad	561,000.00	561,000.00	0	0.00	**561,000.00**
5	255	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA	UND	37.00	unidad	974,600.00	36,060,200.00	0	0.00	**36,060,200.00**
6	ADM	ADMINISTRACION 22%	ADMI	1.00	unidad	10,002,558.94	10,002,558.94	0	0.00	**10,002,558.94**
7	IMP	IMPREVISTO 3%	IMP	1.00	unidad	1,363,985.31	1,363,985.31	0	0.00	**1,363,985.31**
8	UTL	UTILIDAD 5%	UTI	1.00	unidad	1,910,343.57	1,910,343.57	19	362,965.28	**2,273,308.85**
9	196	CERTIFICACION RETIE	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP (Según Factura - incluye impuestos y deducciones)	1.00	unidad	6,200,000.00	6,200,000.00	0	0.00	**6,200,000.00**

Detalles:
Son: SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TREINTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS
CUFE :
7fcbbc3d6cfa6ca80e9df0076d6e92ce07b481158eb6c09b19fdc5c04fadb890a1160c645051fd5fe1f4c17a85ef94c5

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 64,943,064.82
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 64,943,064.82
Monto IVA :	COP 362,965.28
Total Venta:	COP 65,306,030.10
Total:	COP 65,306,030.10
Saldo Restante:	COP65,306,030.10

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764065239388 entre los rangos de Facturación del 47 al 200 usando el prefijo DC1 con vigencia entre las fechas 2024-02-08 al 2025-02-08.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Firma Digital:

kE8CGxe0yrAAQabs6ab/zmnUvDtlHK8U1B7YpdFbV+uSRAe07E8gsQQZBTk/FCXI /Xaofe19TX+FnO8/OVyivPb0fFpKWFKLM/FSLApsLKM84ufD8Rg2Xi9P9vyWLGsN
b7SF/YruamDYEHvsfddyrJwF16+gHzfZR9ATtwgbuTp86owekWPamXbqdo5G1i7j 2sc3+bjg3Jb5Gm+zaJncLs3ISRSdCa69CtNehvB9ZJFvL0zn2Za9JKbTN4V21alG
KAw755WpsMbklc29lDcG+fqJOfuZbnl9kpZUTZklBsL8NBB/+QwmwVlsBgr1cLXk J3QS9ebrO31kP2Boee+Dfw==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7fcbbc3d6cfa6ca80e9df0076d6e92ce07b481158eb6c09b19fdc5c04fadb890a1160c645051fd5fe1f4c17a85ef94c5

Número de Factura: DC1-58
Fecha de Emisión: 01/08/2024
Fecha de Vencimiento: 31/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DC PROJECT SAS
Nombre Comercial: DC PROJECT SAS
Nit del Emisor: 901410401
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: MOCOA
Dirección: BRR ALTOS DE LA COLINA
Teléfono / Móvil:
Correo: dcprojectsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DELPUTUMAYO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800247940
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: MOCOA
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: atencionalusuario@itp.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	186	EQUIPO DE MEDIDA * MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	EA	1,00	$ 5.369.930,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.369.930,00
2	187	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5ª	EA	3,00	$ 426.649,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.279.947,00
3	188	ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	EA	1,00	$ 2.195.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.195.100,00
4	189	ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	94	1,00	$ 561.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 561.000,00
5	255	UND	94	37,00	$ 974.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.060.200,00
6	ADM	ADMI	94	1,00	$ 10.002.558,94	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.002.558,94
7	IMP	IMP	94	1,00	$ 1.363.985,31	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.363.985,31
8	UTL	UTI	94	1,00	$ 1.910.343,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 362.965,28	19.00			$ 1.910.343,57
9	196	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP (Según Factura - incluye impuestos y deducciones)	94	1,00	$ 6.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.200.000,00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-01 17:38:38
Documento generado el: 2024-08-01 17:38:26
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890930534

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			64.943.064,82
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			64.943.064,82
IVA			362.965,28
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			362.965,28
Total neto factura (=)			65.306.030,10
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	65.306.030,10

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065239388 Rango desde: 47 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-02-08

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<AttachedDocument
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:AttachedDocument-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:data:specification:CoreComponentTypeSchemaModule
:2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-
2" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"><ext:UBLExtensions><ext:UBLExte
nsion><ext:ExtensionContent><ds:Signature
Id="id-c7fe12c8-b69f-4002-a5ba-96973d422a44">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference Id="id-c7fe12c8-b69f-4002-a5ba-96973d422a44-ref0" URI="">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>FsV7s6QAtyZIaekOvn74nedD9ItnsJsaWMpLzCElbH0=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="#id-c7fe12c8-b69f-4002-a5ba-96973d422a44-ref0">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>87qfpKB3mVXhq7wmUtSobZF9s+Bu/qQT936Q+BLdvVU=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="#id-c7fe12c8-b69f-4002-a5ba-96973d422a44-ref0">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>87qfpKB3mVXhq7wmUtSobZF9s+Bu/qQT936Q+BLdvVU=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>kE8CGxe0yrAAQabs6ab/zmnUvDtlHK8U1B7YpdFbV+uSRAe07E8gsQQZBTk/FCX
I
/Xaofe19TX+FnO8/OVyivPb0fFpKWFKLM/FSLApsLKM84ufD8Rg2Xi9P9vyWLGsN
b7SF/YruamDYEHvsfddyrJwF16+gHzfZR9ATtwgbuTp86owekWPamXbqdo5G1i7j
2sc3+bjg3Jb5Gm+zaJncLs3ISRSdCa69CtNehvB9ZJFvL0zn2Za9JKbTN4V21alG
KAw755WpsMbklc29lDcG+fqJOfuZbnl9kpZUTZkIBsL8NBB/+QwmwVlsBgr1cLXk
J3QS9ebrO31kP2Boee+Dfw==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo Id="id-c7fe12c8-b69f-4002-a5ba-96973d422a44-keyinfo">
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>MIIIEDCCBfigAwIBAgIIbAOqr+Ae6+4wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAhBg
kq
hkiG9w0BCQEWFGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRF
UyBTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJSSB2MzEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2Vy
dGlmaWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsMRIwEAYDVQQKEwlBbmRlcyBTQ0QxFDAS
BgNVBAcTC0JvZ290YSBELkMuMQswCQYDVQQGEwJDTzAeFw0yNDA3MTAxODMxMzha
Fw0yNTA3MTAxODMwMzhaMIIBVTEzMDEGA1UECQwqQ0FSUkVSQSA1MCBOTy4gOTdB
IFNVUi0xNTAgIExBIEVTVFJFTExBIMK3MS4wLAYJKoZIhvcNAQkBFh9qdWxpYW4u
```

YmFycmllbnRvc0BjYWRlbmEuY29tLmNvMRcwFQYDVQQDEw5DQURFTkEgUyAuIEEg
LjETMBEGA1UEBRMKODkwOTMwNTM0MDE2MDQGA1UEDBMtRW1pc29yIEZhY3R1cmEg
RWxlY3Ryb25pY2EgLSBQZXJzb25hIEp1cmlkaWNhMTswOQYDVQQLEzJFbWl0aWRv
IHBvciBBbmRlcyBTQ0QgQWMgMjYgNjkgQyAwMyBUb3JyZSBCIE9mIDcwMTEUMBIG
A1UECgwLVEVDTk9MT0fDjUExFDASBgNVBAcTC0xBIEVTVFJFTExBMRIwEAYDVQQI
EwlBTlRJT1FVSUExCzAJBgNVBAYTAkNPMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAv0Y47hf3B//c97+XpJ9R2IU70NAU59DMURDHfHZbR6QURJcP/v2F
hnWFLsbMllse+rClaoiO0TR/N+AxumWo78+wqaVVd521nVAHlN4imkC52dm5eTaL
4EVzDeqQqeq9XsiYOgSBjMYchDXjffmsmrvONZOYyItAtqg9ATsE6zBegXWiAeL0
sov7e6yG8Mz6P0v9z926DCEQkTtHUvCnuyYoIQHI97v+8DwvpBBRU93lrXjOHIWS
OPpjPvb15ZhOPMn/Veef9jbDxLL89CHZxYRplgYPRE8ELlfmpCK5kAvAUl6U9VCn
v4iL9pQgbFTicIa9Nlr4GmqKDYcScoFnTwIDAQABo4ICfjCCAnowDAYDVR0TAQH/
BAIwADAfBgNVHSMEGDAWgBRA/iZpRzInMtGsIcgu7M+N1TVo6DBvBggrBgEFBQcB
AQRjMGEwNgYIKwYBBQUHMAKGKmh0dHA6Ly9jZXJ0cy5hbmRlc3NjZC5jb20uY28v
Q2xhc2VJSXYzLmNydDAnBggrBgEFBQcwAYYbaHR0cDovL29jc3AuYW5kZXNzY2Qu
Y29tLmNvMCoGA1UdEQQjMCGBH2p1bGlhbi5iYXJyaWVudG9zQGNhZGVuYS5jb20u
Y28wggEhBgNVHSAEggEYMIIBFDCBwAYMKwYBBAGB9EgBAgYJMIGvMIGsBggrBgEF
BQcCAjCBnwyBnExhIHV0aWxpemFjacOzbiBkZSBlc3RlIGNlcnRpZmljYWRvIGVz
dMOhIHN1amV0YSBhIGxhIFBDIGRlIEZhY3R1cmFjacOzbiBFbGVjdHLDs25pY2Eg
eSBEUEMgZXN0YWJsZWNpZGFzIHBvciBBbmRlcyBTQ0QuIEPDs2RpZ28gZGUgQWNy
ZWRpdGFjacOzbjogMTYtRUNELTAwNDBPBgwrBgEEAYH0SAEBAQswPzA9BggrBgEF
BQcCARYxaHR0cHM6Ly93d3cuYW5kZXNzY2QuY29tLmNvL2RvY3MvRFBDX0FuZGVz
U0NELnBkZjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwOQYDVR0fBDIw
MDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5hbmRlc3NjZC5jb20uY28vQ2xhc2VJSXYzLmNy
bDAdBgNVHQ4EFgQUA09YW6ZPeh4d0DdJdFu0LpXN1JEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXg
MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAlf5OA4iTjHLRaS9UuT/FJ4wkcgwaCbtQ4EnVs
SDmmzGcIirNXRXXdiykYuddyofLdaAW7ZLYs2bqXUoz9rT3qY1hGVrVezMdYoo7H
t7HzbtY4YnBaaRUE11NOcFp/FGQA0xy1lwiqkCLcHCAI06NUt+rA2CdRA9+j46Bo
zxDdl+1iNQYwl24VIy+ydYibf/uckuygRLAFHRDnLF/PrGnz/PR67XtTWvb+47Tq
4AW7UOLtKIB6XGOq6Hcu6O/v/PK4b++kpO0ENySU9ekkaWhP+5y0kAvwc2fmfnPl
QKxwGNN5Kyn5n5EZPo67DU61HIDlHVpXCnNK95CHnkfLZFEvWXF1loJVf972TdPD
rpkzBqLlZZqu5N9wXO6HLannyT42y0rM+rHCkXmaRlJQP8HFDJEgWkDlZ7TTVnBR
Sch/Xa+g290CFTweQpBEChv4zTpBvuFo434mnIoD+v2kLd+fq1rgeN4ABdnfTGbC
1mtWaXCPlntV3cltNXA4eIlB9J+s//djo51icHPC1C1ltTE838YY43qWBzCOWSIZ
5NbYPxcq28R1rLPkDkDgd9vsHb7qH25hpNlvzCFYt94YGaK1jNsSNBhG1qgmj9jP
UxAcRg+Kfc8jJcyQYIG71bG5gBYrZyoXF/DHFLzcfNXDxRuEf1y/X3mli6faZoUv
+DxN7w==</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
<ds:KeyValue>
<ds:RSAKeyValue>
<ds:Modulus>v0Y47hf3B//c97+XpJ9R2IU70NAU59DMURDHfHZbR6QURJcP/v2FhnWFLsbMllse
+rClaoiO0TR/N+AxumWo78+wqaVVd521nVAHlN4imkC52dm5eTaL4EVzDeqQqeq9
XsiYOgSBjMYchDXjffmsmrvONZOYyItAtqg9ATsE6zBegXWiAeL0sov7e6yG8Mz6
P0v9z926DCEQkTtHUvCnuyYoIQHI97v+8DwvpBBRU93lrXjOHIWSOPpjPvb15ZhO
PMn/Veef9jbDxLL89CHZxYRplgYPRE8ELlfmpCK5kAvAUl6U9VCnv4iL9pQgbFTi
cIa9Nlr4GmqKDYcScoFnTw==</ds:Modulus>
<ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
</ds:RSAKeyValue>
</ds:KeyValue>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object><xades:QualifyingProperties

Target="#id-c7fe12c8-b69f-4002-a5ba-96973d422a44"
Id="id-3da2bb27-200c-4586-99c2-f54daf2ecea4"><xades:SignedProperties
Id="id-c7fe12c8-b69f-4002-a5ba-96973d422a44-signedprops"><xades:SignedSignaturePro
perties><xades:SigningTime>2024-08-01T17:38:38.827312-05:00</xades:SigningTime><xa
des:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>2GA+xJlbbdq6R
XvhOOjiWkbqYsmWlwF4MgmMudlpMMs=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSe
rial><ds:X509IssuerName>C=CO, L=Bogota D.C., O=Andes SCD, OU=Division de
certificacion entidad final, CN=CA ANDES SCD S.A. Clase II v3,
E=info@andesscd.com.co</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>7783252253382470638
</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate
><xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicyId><xades:SigPolicyId><xad
es:Identifier>https://s3.amazonaws.com/efactura.resources/politicadefirmav2.pdf</x
ades:Identifier><xades:Description>Política de firma para facturas electrónicas de
la República de
Colombia</xades:Description></xades:SigPolicyId><xades:SigPolicyHash><ds:DigestMet
hod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>dMoMvtcG5aIzg
Yo0tIsSQeVJBDnUnfSOfBpxXrmor0Y=</ds:DigestValue></xades:SigPolicyHash></xades:Sign
aturePolicyId></xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignerRole><xades:ClaimedRo
les><xades:ClaimedRole>third
party</xades:ClaimedRole></xades:ClaimedRoles></xades:SignerRole></xades:SignedSig
natureProperties></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Object
></ds:Signature></ext:ExtensionContent></ext:UBLExtension></ext:UBLExtensions><cbc
:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID><cbc:CustomizationID>Documentos
adjuntos</cbc:CustomizationID><cbc:ProfileID>Factura Electrónica de
Venta</cbc:ProfileID><cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID><cbc:ID>DC1
58</cbc:ID><cbc:IssueDate>2024-08-01</cbc:IssueDate><cbc:IssueTime>22:38:38-05:00<
/cbc:IssueTime><cbc:DocumentType>Contenedor de Factura
Electrónica</cbc:DocumentType><cbc:ParentDocumentID>DC158</cbc:ParentDocumentID><c
ac:SenderParty><cac:PartyTaxScheme><cbc:RegistrationName>DC PROJECT
S.A.S</cbc:RegistrationName><cbc:CompanyID schemeID="8" schemeName="31"
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">901410401</cbc:CompanyID><cbc:TaxLevelCode
listName="48">R-99-PN</cbc:TaxLevelCode><cac:TaxScheme><cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Nam
e>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:PartyTaxScheme></cac:SenderParty><cac:Receiv
erParty><cac:PartyTaxScheme><cbc:RegistrationName>INSTITUTO TECNOLOGICO
DELPUTUMAYO</cbc:RegistrationName><cbc:CompanyID schemeID="1" schemeName="31"
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">800247940</cbc:CompanyID><cbc:TaxLevelCode
listName="48">R-99-PN</cbc:TaxLevelCode><cac:TaxScheme><cbc:ID>ZZ</cbc:ID><cbc:Nam
e>No
aplica</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:PartyTaxScheme></cac:ReceiverParty><cac:Att
achment><cac:ExternalReference><cbc:MimeCode>text/xml</cbc:MimeCode><cbc:EncodingC
ode>UTF-8</cbc:EncodingCode><cbc:Description><![CDATA[<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-

```
2" xmlns:sts="dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
<ext:UBLExtensions>
    <ext:UBLExtension>
        <ext:ExtensionContent>
            <sts:DianExtensions>
                <sts:InvoiceControl>

<sts:InvoiceAuthorization>18764065239388</sts:InvoiceAuthorization>
                    <sts:AuthorizationPeriod>
                        <cbc:StartDate>2024-02-08</cbc:StartDate>
                        <cbc:EndDate>2025-02-08</cbc:EndDate>
                    </sts:AuthorizationPeriod>
                    <sts:AuthorizedInvoices>
                        <sts:Prefix>DC1</sts:Prefix>
                        <sts:From>47</sts:From>
                        <sts:To>200</sts:To>
                    </sts:AuthorizedInvoices>
                </sts:InvoiceControl>
            <sts:InvoiceSource>
                       <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6"
listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe"
listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentification
Code-2.1">CO</cbc:IdentificationCode>
                    </sts:InvoiceSource>
                    <sts:SoftwareProvider>
                         <sts:ProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO,
DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="0"
schemeName="31">890930534</sts:ProviderID>
                         <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO,
DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">49fab599-4556-4828-a30b-852a910c5bb1</sts:SoftwareID>
                    </sts:SoftwareProvider>
                     <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">87991867425d25c1ed35e398c746a95b95f5fd7ae2e2fc62d939138cf23f922d3bbc7
bc3ec72cb28feee25e5bbd78ded</sts:SoftwareSecurityCode>
                    <sts:AuthorizationProvider>
                        <sts:AuthorizationProviderID schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
schemeID="4" schemeName="31">800197268</sts:AuthorizationProviderID>
                     </sts:AuthorizationProvider>
                    <sts:QRCode>NroFactura=DC158
                                        NitFacturador=901410401
                                        NitAdquiriente=800247940
                                        FechaFactura=2024-08-01
```

HoraFactura=17:37:45-05:00
ValorFactura=64943064.82
ValorIVA=362965.28
ValorOtrosImpuestos=0.00
ValorTotalFactura=65306030.10

CUFE=https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=7fcbbc3d6cfa6ca80e9df0076d6e92ce07b481158eb6c09b19fdc5c04fadb890a1160c645051fd5fe1f4c17a85ef94c5</sts:QRCode>
</sts:DianExtensions>
</ext:ExtensionContent>
</ext:UBLExtension>

<ext:UBLExtension><ext:ExtensionContent><ds:Signature Id="id-3c1ffb74-6578-492c-bcce-9180dd5866ef">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference Id="id-3c1ffb74-6578-492c-bcce-9180dd5866ef-ref0" URI="">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>zkwust+34vTpFEG2MbOBG8+bA4WmuR5oAhiZ+5Vzmj0=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="#id-3c1ffb74-6578-492c-bcce-9180dd5866ef-ref0">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>FylCEKAdcZzYlYebKFmkzOGC9AokAcJy/8paSVBPjKw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="#id-3c1ffb74-6578-492c-bcce-9180dd5866ef-ref0">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>FylCEKAdcZzYlYebKFmkzOGC9AokAcJy/8paSVBPjKw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>QEFfNtZbMuWkv1ykiDoqHWDNaqI0ykrGO2WFJR5jkEo4WpTbWT2gPePk/ZUz0q6m
6/iJ2AABcVPCj2dJ0l933n3bNk8AucNfD4Rf0XXuvqZqKK/9fOFvk20lTnuqCgBC
jMbozZB72FXjrDgBb0SVi9YSc7bRK8Us2frMmSCSoirClKQOr1zSEVXn/yTfa1aB
MRsojB5yzmZG8OSfdrwbBsgis0DBdoglE6YZZNdTTBqAFKeTBCYGlnN6i82R3+iX
Gx6PTKq2/zB51AuaMFGu+7z1x8pklc+2SiwPMMFDTGs3PytdZHqLg5Wv4QfhJJhq
v580u0uni6/0M+kfNqtBgA==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo Id="id-3c1ffb74-6578-492c-bcce-9180dd5866ef-keyinfo">
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>MIIIEDCCBfigAwIBAgIIbAOqr+Ae6+4wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAhBgkq
hkiG9w0BCQEWFGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRF
UyBTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJSSB2MzEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2Vy
dGlmaWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsMRIwEAYDVQQKEwlBbmRlcyBTQ0QxFDAS
BgNVBAcTC0JvZ290YSBELkMuMQswCQYDVQQGEwJDTzAeFw0yNDA3MTAxODMxMzha

```
Fw0yNTA3MTAxODMwMzhaMIIBVTEzMDEGA1UECQwqQ0FSUkVSQSA1MCBOTy4gOTdB
IFNVUi0xNTAgIExBIEVTVFJFTExBIMK3MS4wLAYJKoZIhvcNAQkBFh9qdWxpYW4u
YmFycmllbnRvc0BjYWRlbmEuY29tLmNvMRcwFQYDVQQDEw5DQURFTkEgUyAuIEEg
LjETMBEGA1UEBRMKODkwOTMwNTM0MDE2MDQGA1UEDBMtRW1pc29yIEZhY3R1cmEg
RWxlY3Ryb25pY2EgLSBQZXJzb25hIEp1cmlkaWNhMTswOQYDVQQLEzJFbWl0aWRv
IHBvciBBbmRlcyBTQ0QgQWMgMjYgNjkgQyAwMyBUb3JyZSBCIE9mIDcwMTEUMBIG
A1UECgwLVEVDTk9MT0fDjUExFDASBgNVBAcTC0xBIEVTVFJFTExBMRIwEAYDVQQI
EwlBTlRJT1FVSUExCzAJBgNVBAYTAkNPMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAv0Y47hf3B//c97+XpJ9R2IU70NAU59DMURDHfHZbR6QURJcP/v2F
hnWFLsbMllse+rClaoiO0TR/N+AxumWo78+wqaVVd521nVAHlN4imkC52dm5eTaL
4EVzDeqQqeq9XsiYOgSBjMYchDXjffmsmrvONZOYyItAtqg9ATsE6zBegXWiAeL0
sov7e6yG8Mz6P0v9z926DCEQkTtHUvCnuyYoIQHI97v+8DwvpBBRU93lrXjOHIWS
OPpjPvb15ZhOPMn/Veef9jbDxLL89CHZxYRplgYPRE8ELlfmpCK5kAvAUl6U9VCn
v4iL9pQgbFTicIa9Nlr4GmqKDYcScoFnTwIDAQABo4ICfjCCAnowDAYDVR0TAQH/
BAIwADAfBgNVHSMEGDAWgBRA/iZpRzInMtGsIcgu7M+N1TVo6DBvBggrBgEFBQcB
AQRjMGEwNgYIKwYBBQUHMAKGKmh0dHA6Ly9jZXJ0cy5hbmRlc3NjZC5jb20uY28v
Q2xhc2VJSXYzLmNydDAnBggrBgEFBQcwAYYbaHR0cDovL29jc3AuYW5kZXNzY2Qu
Y29tLmNvMCoGA1UdEQQjMCGBH2p1bGlhbi5iYXJyaWVudG9zQGNhZGVuYS5jb20u
Y28wggEhBgNVHSAEggEYMIIBFDCBwAYMKwYBBAGB9EgBAgYJMIGvMIGsBggrBgEF
BQcCAjCBnwyBnExhIHV0aWxpemFjacOzbiBkZSBlc3RlIGNlcnRpZmljYWRvIGVz
dMOhIHN1amV0YSBhIGxhIFBDIGRlIEZhY3R1cmFjacOzbiBFbGVjdHLDs25pY2Eg
eSBEUEMgZXN0YWJsZWNpZGFzIHBvciBBbmRlcyBTQ0QuIEPDs2RpZ28gZGUgQWNy
ZWRpdGFjacOzbjogMTYtRUNELTAwNDBPBgwrBgEEAYH0SAEBAQswPzA9BggrBgEF
BQcCARYxaHR0cHM6Ly93d3cuYW5kZXNzY2QuY29tLmNvL2RvY3MvRFBDX0FuZGVz
U0NELnBkZjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwOQYDVR0fBDIw
MDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5hbmRlc3NjZC5jb20uY28vQ2xhc2VJSXYzLmNy
bDAdBgNVHQ4EFgQUA09YW6ZPeh4d0DdJdFu0LpXN1JEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXg
MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAlf5OA4iTjHLRaS9UuT/FJ4wkcgwaCbtQ4EnVs
SDmmzGcIirNXRXXdiykYuddyofLdaAW7ZLYs2bqXUoz9rT3qY1hGVrVezMdYoo7H
t7HzbtY4YnBaaRUE11NOcFp/FGQA0xy1lwiqkCLcHCAI06NUt+rA2CdRA9+j46Bo
zxDdl+1iNQYwl24VIy+ydYibf/uckuygRLAFHRDnLF/PrGnz/PR67XtTWvb+47Tq
4AW7UOLtKIB6XGOq6Hcu6O/v/PK4b++kpO0ENySU9ekkaWhP+5y0kAvwc2fmfnPl
QKxwGNN5Kyn5n5EZPo67DU61HIDlHVpXCnNK95CHnkfLZFEvWXF1loJVf972TdPD
rpkzBqLlZZqu5N9wXO6HLannyT42y0rM+rHCkXmaRlJQP8HFDJEgWkDlZ7TTVnBR
Sch/Xa+g290CFTweQpBEChv4zTpBvuFo434mnIoD+v2kLd+fq1rgeN4ABdnfTGbC
1mtWaXCPlntV3cltNXA4eIlB9J+s//djo51icHPC1C1ltTE838YY43qWBzCOWSIZ
5NbYPxcq28R1rLPkDkDgd9vsHb7qH25hpNlvzCFYt94YGaK1jNsSNBhG1qgmj9jP
UxAcRg+Kfc8jJcyQYIG71bG5gBYrZyoXF/DHFLzcfNXDxRuEf1y/X3mli6faZoUv
+DxN7w==</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
<ds:KeyValue>
<ds:RSAKeyValue>
<ds:Modulus>v0Y47hf3B//c97+XpJ9R2IU70NAU59DMURDHfHZbR6QURJcP/v2FhnWFLsbMllse
+rClaoiO0TR/N+AxumWo78+wqaVVd521nVAHlN4imkC52dm5eTaL4EVzDeqQqeq9
XsiYOgSBjMYchDXjffmsmrvONZOYyItAtqg9ATsE6zBegXWiAeL0sov7e6yG8Mz6
P0v9z926DCEQkTtHUvCnuyYoIQHI97v+8DwvpBBRU93lrXjOHIWSOPpjPvb15ZhO
PMn/Veef9jbDxLL89CHZxYRplgYPRE8ELlfmpCK5kAvAUl6U9VCnv4iL9pQgbFTi
cIa9Nlr4GmqKDYcScoFnTw==</ds:Modulus>
<ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
</ds:RSAKeyValue>
</ds:KeyValue>
```

```
</ds:KeyInfo>
<ds:Object><xades:QualifyingProperties
Target="#id-3c1ffb74-6578-492c-bcce-9180dd5866ef"
Id="id-f36ac5ee-73d3-490f-a93e-9d633d751612"><xades:SignedProperties
Id="id-3c1ffb74-6578-492c-bcce-9180dd5866ef-signedprops"><xades:SignedSignaturePro
perties><xades:SigningTime>2024-08-01T17:38:26.774056-05:00</xades:SigningTime><xa
des:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>2GA+xJlbbdq6R
XvhOOjiWkbqYsmWlwF4MgmMudlpMMs=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSe
rial><ds:X509IssuerName>C=CO, L=Bogota D.C., O=Andes SCD, OU=Division de
certificacion entidad final, CN=CA ANDES SCD S.A. Clase II v3,
E=info@andesscd.com.co</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>7783252253382470638
</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate
><xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicyId><xades:SigPolicyId><xad
es:Identifier>https://s3.amazonaws.com/efactura.resources/politicadefirmav2.pdf</x
ades:Identifier><xades:Description>Política de firma para facturas electrónicas de
la República de
Colombia</xades:Description></xades:SigPolicyId><xades:SigPolicyHash><ds:DigestMet
hod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>dMoMvtcG5aIzg
Yo0tIsSQeVJBDnUnfSOfBpxXrmor0Y=</ds:DigestValue></xades:SigPolicyHash></xades:Sign
aturePolicyId></xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignerRole><xades:ClaimedRo
les><xades:ClaimedRole>third
party</xades:ClaimedRole></xades:ClaimedRoles></xades:SignerRole></xades:SignedSig
natureProperties></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Object
></ds:Signature></ext:ExtensionContent></ext:UBLExtension></ext:UBLExtensions>



<cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
    <cbc:CustomizationID>10</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID>DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta</cbc:ProfileID>
    <cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID>
<cbc:ID>DC158</cbc:ID>
<cbc:UUID schemeID="1"
schemeName="CUFE-SHA384">7fcbbc3d6cfa6ca80e9df0076d6e92ce07b481158eb6c09b19fdc5c04
fadb890a1160c645051fd5fe1f4c17a85ef94c5</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2024-08-01</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>17:37:45-05:00</cbc:IssueTime>
<cbc:InvoiceTypeCode>01</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note/>
<cbc:DocumentCurrencyCode>COP</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:LineCountNumeric>9</cbc:LineCountNumeric><cac:AccountingSupplierParty>
    <cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID>
    <cac:Party>
        <cac:PartyName>
            <cbc:Name>DC PROJECT SAS</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
        <cac:PhysicalLocation>
            <cac:Address>
                <cbc:ID>86001</cbc:ID>
```

```
                <cbc:CityName>MOCOA</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>000000</cbc:PostalZone>
                <cbc:CountrySubentity>PUTUMAYO</cbc:CountrySubentity>
                <cbc:CountrySubentityCode>86</cbc:CountrySubentityCode>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line>BRR ALTOS DE LA COLINA</cbc:Line>
                </cac:AddressLine>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
                    <cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name>
                </cac:Country>
            </cac:Address>
        </cac:PhysicalLocation>
        <cac:PartyTaxScheme>
            <cbc:RegistrationName>DC PROJECT S.A.S</cbc:RegistrationName>
            <cbc:CompanyID schemeID="8" schemeName="31" schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">901410401</cbc:CompanyID>
            <cbc:TaxLevelCode listName="48">R-99-PN</cbc:TaxLevelCode>
            <cac:RegistrationAddress>
                <cbc:ID>86001</cbc:ID>
                <cbc:CityName>MOCOA</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>000000</cbc:PostalZone>
                <cbc:CountrySubentity>PUTUMAYO</cbc:CountrySubentity>
                <cbc:CountrySubentityCode>86</cbc:CountrySubentityCode>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line>BRR ALTOS DE LA COLINA</cbc:Line>
                </cac:AddressLine>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
                    <cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name>
                </cac:Country>
            </cac:RegistrationAddress>
            <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>01</cbc:ID>
                <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>DC PROJECT SAS</cbc:RegistrationName>
            <cbc:CompanyID schemeID="8" schemeName="31" schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">901410401</cbc:CompanyID>
            <cac:CorporateRegistrationScheme>
                <cbc:ID>DC1</cbc:ID>
                <cbc:Name>77240</cbc:Name>
            </cac:CorporateRegistrationScheme>
        </cac:PartyLegalEntity>
        <cac:Contact>
            <cbc:ElectronicMail>dcprojectsas@gmail.com</cbc:ElectronicMail>
        </cac:Contact>
```

```
    </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty><cac:AccountingCustomerParty>
    <cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID>
    <cac:Party>
        <cac:PartyIdentification>
            <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="1" schemeName="31">800247940</cbc:ID>
        </cac:PartyIdentification>
        <cac:PartyName>
            <cbc:Name>INSTITUTO TECNOLOGICO DELPUTUMAYO</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
                <cac:PhysicalLocation>
            <cac:Address>
                <cbc:ID>86001</cbc:ID>
                <cbc:CityName>MOCOA</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>000000</cbc:PostalZone>
                <cbc:CountrySubentity>PUTUMAYO</cbc:CountrySubentity>
                <cbc:CountrySubentityCode>86</cbc:CountrySubentityCode>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line/>
                </cac:AddressLine>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
                    <cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name>
                </cac:Country>
            </cac:Address>
        </cac:PhysicalLocation>
                <cac:PartyTaxScheme>
            <cbc:RegistrationName>INSTITUTO TECNOLOGICO
DELPUTUMAYO</cbc:RegistrationName>
            <cbc:CompanyID schemeID="1" schemeName="31" schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">800247940</cbc:CompanyID>
            <cbc:TaxLevelCode listName="48">R-99-PN</cbc:TaxLevelCode>
                        <cac:RegistrationAddress>
                <cbc:ID>86001</cbc:ID>
                <cbc:CityName>MOCOA</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>000000</cbc:PostalZone>
                <cbc:CountrySubentity>PUTUMAYO</cbc:CountrySubentity>
                <cbc:CountrySubentityCode>86</cbc:CountrySubentityCode>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line/>
                </cac:AddressLine>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
                    <cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name>
                </cac:Country>
            </cac:RegistrationAddress>
                        <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>ZZ</cbc:ID>
                <cbc:Name>No aplica</cbc:Name>
```

```
            </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
                <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>INSTITUTO TECNOLOGICO
DELPUTUMAYO</cbc:RegistrationName>
            <cbc:CompanyID schemeID="1" schemeName="31" schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">800247940</cbc:CompanyID>
            <cac:CorporateRegistrationScheme>
                <cbc:Name>77240</cbc:Name>
            </cac:CorporateRegistrationScheme>
        </cac:PartyLegalEntity>
                <cac:Contact>
            <cbc:ElectronicMail>atencionalusuario@itp.edu.co</cbc:ElectronicMail>
        </cac:Contact>
    </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty><cac:PaymentMeans>
    <cbc:ID>2</cbc:ID>
    <cbc:PaymentMeansCode>10</cbc:PaymentMeansCode>
        <cbc:PaymentDueDate>2024-08-31</cbc:PaymentDueDate>
        <cbc:PaymentID>Efectivo</cbc:PaymentID>
</cac:PaymentMeans>
<cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="COP">362965.28</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxSubtotal>
        <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">1910343.57</cbc:TaxableAmount>
        <cbc:TaxAmount currencyID="COP">362965.28</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxCategory>
            <cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
            <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>01</cbc:ID>
                <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
    </cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">64943064.82</cbc:LineExtensionAmount>
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="COP">1910343.57</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="COP">65306030.10</cbc:TaxInclusiveAmount>
    <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="COP">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
    <cbc:ChargeTotalAmount currencyID="COP">0.00</cbc:ChargeTotalAmount>

    <cbc:PayableAmount currencyID="COP">65306030.10</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>1</cbc:ID>
            <cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1.00</cbc:InvoicedQuantity>

    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">5369930.00</cbc:LineExtensionAmount>
```

```
                <cac:Item>
        <cbc:Description>EQUIPO DE MEDIDA * MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A
AMS</cbc:Description>
        <cac:StandardItemIdentification>
            <cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">186</cbc:ID>
        </cac:StandardItemIdentification>


    </cac:Item>
    <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="COP">5369930.00</cbc:PriceAmount>
        <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1.00</cbc:BaseQuantity>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>2</cbc:ID>
            <cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">3.00</cbc:InvoicedQuantity>

    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">1279947.00</cbc:LineExtensionAmount>









                <cac:Item>
        <cbc:Description>TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5ª</cbc:Description>
        <cac:StandardItemIdentification>
            <cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">187</cbc:ID>
        </cac:StandardItemIdentification>


    </cac:Item>
    <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="COP">426649.00</cbc:PriceAmount>
        <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">3.00</cbc:BaseQuantity>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>3</cbc:ID>
            <cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1.00</cbc:InvoicedQuantity>
```

```
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">2195100.00</cbc:LineExtensionAmount>

                <cac:Item>
        <cbc:Description>ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14</cbc:Description>
        <cac:StandardItemIdentification>
            <cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">188</cbc:ID>
        </cac:StandardItemIdentification>

    </cac:Item>
    <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="COP">2195100.00</cbc:PriceAmount>
        <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1.00</cbc:BaseQuantity>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>4</cbc:ID>
            <cbc:InvoicedQuantity unitCode="94">1.00</cbc:InvoicedQuantity>

    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">561000.00</cbc:LineExtensionAmount>

                <cac:Item>
        <cbc:Description>ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS</cbc:Description>
        <cac:StandardItemIdentification>
            <cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">189</cbc:ID>
        </cac:StandardItemIdentification>

    </cac:Item>
    <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="COP">561000.00</cbc:PriceAmount>
        <cbc:BaseQuantity unitCode="94">1.00</cbc:BaseQuantity>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>5</cbc:ID>
```

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="94">37.00</cbc:InvoicedQuantity>

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">36060200.00</cbc:LineExtensionAmount>

<cac:Item>
<cbc:Description>UND</cbc:Description>
<cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del contribuyente">255</cbc:ID>
</cac:StandardItemIdentification>

</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="COP">974600.00</cbc:PriceAmount>
<cbc:BaseQuantity unitCode="94">37.00</cbc:BaseQuantity>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>6</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="94">1.00</cbc:InvoicedQuantity>

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">10002558.94</cbc:LineExtensionAmount>

<cac:Item>
<cbc:Description>ADMI</cbc:Description>
<cac:StandardItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del contribuyente">ADM</cbc:ID>
</cac:StandardItemIdentification>

</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="COP">10002558.94</cbc:PriceAmount>
<cbc:BaseQuantity unitCode="94">1.00</cbc:BaseQuantity>
</cac:Price>

```
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>7</cbc:ID>
            <cbc:InvoicedQuantity unitCode="94">1.00</cbc:InvoicedQuantity>

    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">1363985.31</cbc:LineExtensionAmount>









                <cac:Item>
        <cbc:Description>IMP</cbc:Description>
        <cac:StandardItemIdentification>
            <cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">IMP</cbc:ID>
        </cac:StandardItemIdentification>


    </cac:Item>
    <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="COP">1363985.31</cbc:PriceAmount>
        <cbc:BaseQuantity unitCode="94">1.00</cbc:BaseQuantity>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>8</cbc:ID>
            <cbc:InvoicedQuantity unitCode="94">1.00</cbc:InvoicedQuantity>

    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">1910343.57</cbc:LineExtensionAmount>









                    <cac:TaxTotal>
            <cbc:TaxAmount currencyID="COP">362965.28</cbc:TaxAmount>
            <cac:TaxSubtotal>
                <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">1910343.57</cbc:TaxableAmount>
               <cbc:TaxAmount currencyID="COP">362965.28</cbc:TaxAmount>
                                              <cac:TaxCategory>
                    <cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
                        <cbc:ID>01</cbc:ID>
                        <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
                    </cac:TaxScheme>
                </cac:TaxCategory>
            </cac:TaxSubtotal>
```

```
        </cac:TaxTotal>

                <cac:Item>
        <cbc:Description>UTI</cbc:Description>
        <cac:StandardItemIdentification>
            <cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">UTL</cbc:ID>
        </cac:StandardItemIdentification>


    </cac:Item>
    <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="COP">1910343.57</cbc:PriceAmount>
        <cbc:BaseQuantity unitCode="94">1.00</cbc:BaseQuantity>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>9</cbc:ID>
            <cbc:InvoicedQuantity unitCode="94">1.00</cbc:InvoicedQuantity>

    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">6200000.00</cbc:LineExtensionAmount>









                <cac:Item>
        <cbc:Description>CERTIFICACION RETIE Y RETILAP (Según Factura - incluye
impuestos y deducciones)</cbc:Description>
        <cac:StandardItemIdentification>
            <cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del
contribuyente">196</cbc:ID>
        </cac:StandardItemIdentification>


    </cac:Item>
    <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="COP">6200000.00</cbc:PriceAmount>
        <cbc:BaseQuantity unitCode="94">1.00</cbc:BaseQuantity>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</Invoice>]]></cbc:Description></cac:ExternalReference></cac:Attachment><cac:Paren
tDocumentLineReference><cbc:LineID>1</cbc:LineID><cac:DocumentReference><cbc:ID>DC
158</cbc:ID><cbc:UUID schemeID="1"
schemeName="CUFE-SHA384">7fcbbc3d6cfa6ca80e9df0076d6e92ce07b481158eb6c09b19fdc5c04
fadb890a1160c645051fd5fe1f4c17a85ef94c5</cbc:UUID><cbc:IssueDate>2024-08-01</cbc:I
ssueDate><cbc:DocumentType>ApplicationResponse</cbc:DocumentType><cac:Attachment><
cac:ExternalReference><cbc:MimeCode>text/xml</cbc:MimeCode><cbc:EncodingCode>UTF-8
</cbc:EncodingCode><cbc:Description><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8"
```

```
standalone="no"?><ApplicationResponse
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-
2" xmlns:sts="dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2">
  <ext:UBLExtensions>
    <ext:UBLExtension>
      <ext:ExtensionContent>
        <sts:DianExtensions>
          <sts:InvoiceSource>
            <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United
Nations Economic Commission for Europe"
listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentification
Code-2.1">CO</cbc:IdentificationCode>
          </sts:InvoiceSource>
          <sts:SoftwareProvider>
            <sts:ProviderID schemeID="4" schemeName="31" schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">800197268</sts:ProviderID>
            <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">...</sts:SoftwareID>
          </sts:SoftwareProvider>
          <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO,
DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">...</sts:SoftwareSecurityCode>
          <sts:AuthorizationProvider>
            <sts:AuthorizationProviderID schemeID="4" schemeName="31"
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">800197268</sts:AuthorizationProviderID>
          </sts:AuthorizationProvider>
        </sts:DianExtensions>
      </ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
    <ext:UBLExtension>
      <ext:ExtensionContent><ds:Signature
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Id="Signature-603398ec-0e1f-4f7c-a311-5abeb9cb6b02"><ds:SignedInfo><ds:Canonicaliz
ationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
/><ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" /><ds:Reference
Id="Reference-b66b0c66-9631-432b-9a60-0524fdb9a4f8"
URI=""><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"
/></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"
/><ds:DigestValue>+sAYWYqTuvuCqQnvbdcxVcFb9QTVcCDtoLcQCMudfyg=</ds:DigestValue></d
s:Reference><ds:Reference Id="ReferenceKeyInfo"
URI="#Signature-603398ec-0e1f-4f7c-a311-5abeb9cb6b02-KeyInfo"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"
```

/><ds:DigestValue>4Ox5mFKc4ZClP0Q1cfpAdPbLPTK1hoDhagJEQvtg2sk=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-Signature-603398ec-0e1f-4f7c-a311-5abeb9cb6b02-signedprops"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /><ds:DigestValue>x+Gz1eeRo3YnCpLJMGS2+g21c5MVjDgmedmJlGG94qo=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue Id="SignatureValue-603398ec-0e1f-4f7c-a311-5abeb9cb6b02">NHhQrOS/m2y8VfLmtB3PW2BZvBLkRxuV/9V5P5d5nde4w3RQIqaXDEd/aPD5/0zRJCue4aF1Ph741iDaLjeFRY7O/PgavoMwiWo2lPoyMYMFN6AvlgSR0fRSx8PJCIhZ4RlsGDyxHl3qQEdYnRZF8FbPXwcNtygd/ozoIvF79uv4LSInSHBR282ueomPitg3Ef6FNKOtQaU9ABzSt3V0yeC/aCM1t66J/lEXIvmlDfZVd0sjldL8eQ/NFfuDlfbsxpM4xWF7tlgR9R4iwd/JA5JTeKd6l3WfdZbBoeCPCX+rOMWweQeSvADyV5PN0c4RfEf6Zdu4Eoap4MBIq3G66g==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo Id="Signature-603398ec-0e1f-4f7c-a311-5abeb9cb6b02-KeyInfo"><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIHVjCCBT6gAwIBAgIKKfJjIKoEFNsBSDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjEeMBwGCSqGSIb3DQEJARYPaW5mb0Bnc2UuY29tLmNvMSUwIwYDVQQDExxBdXRvcmlkYWQgU3Vib3JkaW5hZGEgMDEgR1NFMQwwCgYDVQQLEwNQS0kxDDAKBgNVBAoTA0dTRTEUMBIGA1UEBxMLQm9nb3RhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMB4XDTIzMTIyMDE0MDUxOVoXDTI1MTIxOTE0MDUxOFowggEpMRQwEgYDVQQJDAtDUiA3IDYgQyA1NDEjMCEGA1UEDQwaRkVQSiBHU0UgQ0wgNzcgNyA0NCBPRiA3MDExFDASBgNVBAgMC0JPR09UQSBELkMuMRQwEgYDVQQHDAtCT0dPVEEgRC5DLjELMAkGA1UEBhMCQ08xOzA5BgNVBAMMMlUuQS5FLiBESVJFQ0NJT04gREUgSU1QVUVTVE9TIFkgQURVQU5BUyBOQUNJT05BTEVTMRkwFwYKKwYBBAGkZgEDAgwJODAwMTk3MjY4MQwwCgYDVQQpDANOSVQxEjAQBgNVBAUTCTgwMDE5NzI2ODE5MDcGA1UECwwwRElSRUNDSU9OIERFIEdFU1RJT04gQ09SUE9SQVRJVkEgLSBOSVZFTCBDRU5UUkFMMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAtWs5fz5itJqoQso9/1bjGCG5QmXB+fap4mQmdIE5NDUV+swjUcz7Na0gcTIAOxejr9XPybN1dbyZlI871J2sB67VUSJ9Mt+kF0n6w25sr1gGqEp36RCHCprqmpJPwWitLLrflpp+xNnu2BPOpO365RjjaPqnX7uu3uOEFxzJZqyLu7bGuB9Ob/pQww1KlHbQ8ThHMzRQ/aHIR1DU0NRo9D3Z7u/IyTvbpBrRXy6UWqrlHyS/uDzct2RZvUH6hwt1TlZWRJp6oa0IwcewJ1cRRvuzBwXO/FtQTvkv10x1sjhi906JMqUZivilIpo72H/7i4uhjF0Jwo8iwLSTYH1/BwIDAQABo4ICHjCCAhowDAYDVR0TAQH/BAIwADAfBgNVHSMEGDAWgBRBvNQ5eLiDoxcaCJqpuAQCCS3YmTBoBggrBgEFBQcBAQRcMFowMgYIKwYBBQUHMAKGJmh0dHBzOi8vY2VydHMyLmdzZS5jb20uY28vQ0FfU1VCMDEuY3J0MCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwczovL29jc3AyLmdzZS5jb20uY28wagYDVR0RBGMwYYEUc2FsZGFuYXJAZGlhbi5nb3YuY2+GSWh0dHBzOi8vZ3NlLmNvbS5jby9kb2N1bWVudG9zL2NlcnRpZmljYWNpb25lcy9hY3JlZGl0YWNpb24vMTYtRUNELTAwMS5wZGYwgYMGA1UdIAR8MHoweAYLKwYBBAGB8yABBA8waTBnBggrBgEFBQcCARZbaHR0cHM6Ly9nc2UuY29tLmNvL2RvY3VtZW50b3MvY2FsaWRhZC9EUEMvRGVjbGFyYWNpb25fZGVfUHJhY3RpY2FzX2RlX0NlcnRpZmljYWNpb25fVjE2LnBkZjAnBgNVHSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMBMDUGA1UdHwQuMCwwKqAooCaGJGh0dHBzOi8vY3JsMi5nc2UuY29tLmNvL0NBX1NVQjAxLmNybDAdBgNVHQ4EFgQUE0fI66zAjKen9MQuJMqak2OrD3kwDgYDVR0PAQH/BAQDAgTwMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCIXSoIYaXj4nTBtuM7zzlrAd4wkonF2hIhtbzjnMzye99fkLkp5VR9U/ZKl0KFdndqtUfRM/c8BHsLmdHudrHoUmBCacsa+rwDSKD6w1yhFgGJc8gvQEFRp5JTdFrJop4yst9G5oZ9QdQ9+JcqY567GUY/UkWgeWoMuJyLz1aZ1dMlPzBhNueHOmr6PYmPsZQa5QBUBSk5mzZE6+qdcFZgY989dOZeoIzVbv2hvuq2afxm/BL/hibixwV3RJfIm7TbrsrN+xigq+UCwAdXCxg5CwxyZeYmfLzeoNIECR26R9GUVWYjhvrWmNCjLZ0ZA+21dShn4jJVtDreJKWBL733D30P51hdhwv+mau+7P8zKw2PcFDApIKDakyqqMr0KP/AJ/8biD3LP8GQVB3gGfZbSWtkOfwSO6+wN2Vh/PFfWIou52FPPu89w0KRB8PBoO6wMgvlTfFWoMYswmCtfxPQTapxdTM5e0yN0a6HzQzLC6k8pG1jOyQYcjhtw7UlV5Pkm9+0dUQT2Rrsxfz5cF1jAT9wBq5ZnLXYy9eLXKxTWxcMjrlOjWRE2odBbMi7h3di1tVmEjABGZ6nbt3F3xPksxXU+DqDufU5vzZbzjMOIhDSoml3bGfjCtLPIGa5F+2SKGNkAbWFkVTlyDKaEH4bp94r/gYQS6EH14Xo7txkXA==</ds:X509Certificate></ds:X509Data><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Modulus>tWs5fz5itJqoQso9/1bjGCG5QmXB+fap4mQmdIE5NDUV+swjUcz7Na0gcTIAOxejr9XPybN1dbyZlI871J2sB67VUSJ9Mt+kF0n6w25sr1gGqEp36RCHCprqmpJPwWitLLrflpp+xNnu2BPOpO365RjjaPqnX7uu3uOEFxzJZqyLu7bGuB9Ob/pQww1KlHbQ8ThHMzRQ/aHIR1DU0NRo9D3Z7u/IyTvbpBrRXy6UWqrlHyS/uDzct2RZvUH6hwt1TlZWRJp6oa0IwcewJ1cRRvuzBwXO/FtQTvkv10x1sjhi906JMqUZivilIpo72H/7i4uhjF0Jwo8iwLSTYH1/Bw==</ds:Modulus><ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent></ds:RSAKeyValue></ds:KeyValue></ds:KeyInfo><ds:Object

Id="XadesObjectId-6c0c9a56-bbd1-4dbd-ac73-0a2aceb99049"><xades:QualifyingPropertie
s xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
Id="QualifyingProperties-7d8dd51b-3655-48c1-a264-9411f49bdf30"
Target="#Signature-603398ec-0e1f-4f7c-a311-5abeb9cb6b02"><xades:SignedProperties
Id="xmldsig-Signature-603398ec-0e1f-4f7c-a311-5abeb9cb6b02-signedprops"><xades:Sig
nedSignatureProperties><xades:SigningTime>2024-08-01T17:38:38+00:00</xades:Signing
Time><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"
/><ds:DigestValue>BJbBGalZ6U+wEJrRUD69hteZS82kztgHYNSMJsw4P5I=</ds:DigestValue></x
ades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=CO, L=Bogota D.C., O=GSE,
OU=PKI, CN=Autoridad Subordinada 01 GSE,
E=info@gse.com.co</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>198088280759436681347400
</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate
><xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicyId><xades:SigPolicyId><xad
es:Identifier>https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicade
firmav2.pdf</xades:Identifier><xades:Description
/></xades:SigPolicyId><xades:SigPolicyHash><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"
/><ds:DigestValue>dMoMvtcG5aIzgYo0tIsSQeVJBDnUnfSOfBpxXrmor0Y=</ds:DigestValue></x
ades:SigPolicyHash></xades:SignaturePolicyId></xades:SignaturePolicyIdentifier><xa
des:SignerRole><xades:ClaimedRoles><xades:ClaimedRole>supplier</xades:ClaimedRole>
</xades:ClaimedRoles></xades:SignerRole></xades:SignedSignatureProperties><xades:S
ignedDataObjectProperties><xades:DataObjectFormat
ObjectReference="#Reference-b66b0c66-9631-432b-9a60-0524fdb9a4f8"><xades:MimeType>
text/xml</xades:MimeType><xades:Encoding>UTF-8</xades:Encoding></xades:DataObjectF
ormat></xades:SignedDataObjectProperties></xades:SignedProperties></xades:Qualifyi
ngProperties></ds:Object></ds:Signature></ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
  </ext:UBLExtensions>
  <cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
  <cbc:CustomizationID>1</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>DIAN 2.1</cbc:ProfileID>
  <cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID>
  <cbc:ID>82325354</cbc:ID>
  <cbc:UUID
schemeName="CUDE-SHA384">2faf7a09e2c40448ef342812ff30e9360f5dd424a84eb50bd23f6df58
0d9071216cea1607bc77c19cc54f58c94152738</cbc:UUID>
  <cbc:IssueDate>2024-08-01</cbc:IssueDate>
  <cbc:IssueTime>17:38:38-05:00</cbc:IssueTime>
  <cac:SenderParty>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:RegistrationName>Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="4" schemeName="31">800197268</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>01</cbc:ID>
        <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:SenderParty>
  <cac:ReceiverParty>

```
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:RegistrationName>DC PROJECT S.A.S</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="8" schemeName="31">901410401</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>01</cbc:ID>
        <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:ReceiverParty>
  <cac:DocumentResponse>
    <cac:Response>
      <cbc:ResponseCode>02</cbc:ResponseCode>
      <cbc:Description>Documento validado por la DIAN</cbc:Description>
    </cac:Response>
    <cac:DocumentReference>
      <cbc:ID>DC158</cbc:ID>
      <cbc:UUID
schemeName="CUFE-SHA384">7fcbbc3d6cfa6ca80e9df0076d6e92ce07b481158eb6c09b19fdc5c04
fadb890a1160c645051fd5fe1f4c17a85ef94c5</cbc:UUID>
    </cac:DocumentReference>
    <cac:LineResponse>
      <cac:LineReference>
        <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
      </cac:LineReference>
      <cac:Response>
        <cbc:ResponseCode>0000</cbc:ResponseCode>
        <cbc:Description>0</cbc:Description>
      </cac:Response>
    </cac:LineResponse>
    <cac:LineResponse>
      <cac:LineReference>
        <cbc:LineID>2</cbc:LineID>
      </cac:LineReference>
      <cac:Response>
        <cbc:ResponseCode>FAJ43b</cbc:ResponseCode>
        <cbc:Description>Nombre informado No corresponde al registrado en el RUT
con respecto al Nit suminstrado.</cbc:Description>
      </cac:Response>
    </cac:LineResponse>
    <cac:LineResponse>
      <cac:LineReference>
        <cbc:LineID>3</cbc:LineID>
      </cac:LineReference>
      <cac:Response>
        <cbc:ResponseCode>FAJ43b</cbc:ResponseCode>
        <cbc:Description>Nombre informado No corresponde al registrado en el RUT
con respecto al Nit suminstrado.</cbc:Description>
      </cac:Response>
    </cac:LineResponse>
    <cac:LineResponse>
      <cac:LineReference>
```

```
        <cbc:LineID>4</cbc:LineID>
      </cac:LineReference>
      <cac:Response>
        <cbc:ResponseCode>RUT01</cbc:ResponseCode>
        <cbc:Description>La validación del estado del RUT próximamente estará
disponible.</cbc:Description>
      </cac:Response>
    </cac:LineResponse>
    <cac:LineResponse>
      <cac:LineReference>
        <cbc:LineID>5</cbc:LineID>
      </cac:LineReference>
      <cac:Response>
        <cbc:ResponseCode>RUT01</cbc:ResponseCode>
        <cbc:Description>La validación del estado del RUT próximamente estará
disponible.</cbc:Description>
      </cac:Response>
    </cac:LineResponse>
  </cac:DocumentResponse>
</ApplicationResponse>]]></cbc:Description></cac:ExternalReference></cac:Attachmen
t><cac:ResultOfVerification><cbc:ValidatorID>Unidad Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas
Nacionales</cbc:ValidatorID><cbc:ValidationResultCode>02</cbc:ValidationResultCode
><cbc:ValidationDate>2024-08-01</cbc:ValidationDate><cbc:ValidationTime>17:38:38-0
5:00</cbc:ValidationTime></cac:ResultOfVerification></cac:DocumentReference></cac:
ParentDocumentLineReference></AttachedDocument>
```

GERMAN DARIO CHAMORRO GOMEZ
Apoyo a Supervisión

INFORME FINAL DE APROBACION POR SUPERVISIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 285 DEL 2023

OBJETO:

"CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA"

CONTRATISTA DE OBRA:

DC PROJECT S.A.S.
R/L CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ

SUPERVISOR:

GERMAN DARIO CHAMORRO GOMEZ

PERIODO DEL INFORME:

15 DE FEBREO DE 2024 A 10 DE MAYO DE 2024

1. INTRODUCCION


El presente informe final, contempla la información correspondiente a la ejecución del contrato de obra No. 285 DE 2023 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA” Suscrito entre el Instituto Tecnológico del Putumayo ITP y DC PROJECT S.A.S. representada legalmente por Carlos German Pazmiño Gómez, el cual ha desarrollado las actividades contractuales en el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2024 al 10 de mayo de 2024.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El sitio de ejecución del proyecto es en las instalaciones del Instituto Tecnológico del Putumayo I.T.P. sede Mocoa; El cual requiere de la construcción de la línea de media tensión y transformación trifásica para el coliseo y edificio de 8 aulas e iluminación perimetral dentro de las instalaciones del instituto tecnológico del putumayo sede Mocoa. Con el fin de dar cumplimiento a la misión y visión del instituto y generar accesibilidad a los escenarios deportivos e instalaciones aptas para el desarrollo profesional de la comunidad putumayense.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El contrato es ejecutado en la república de Colombia, Departamento del Putumayo, casco urbano de la ciudad de Mocoa.

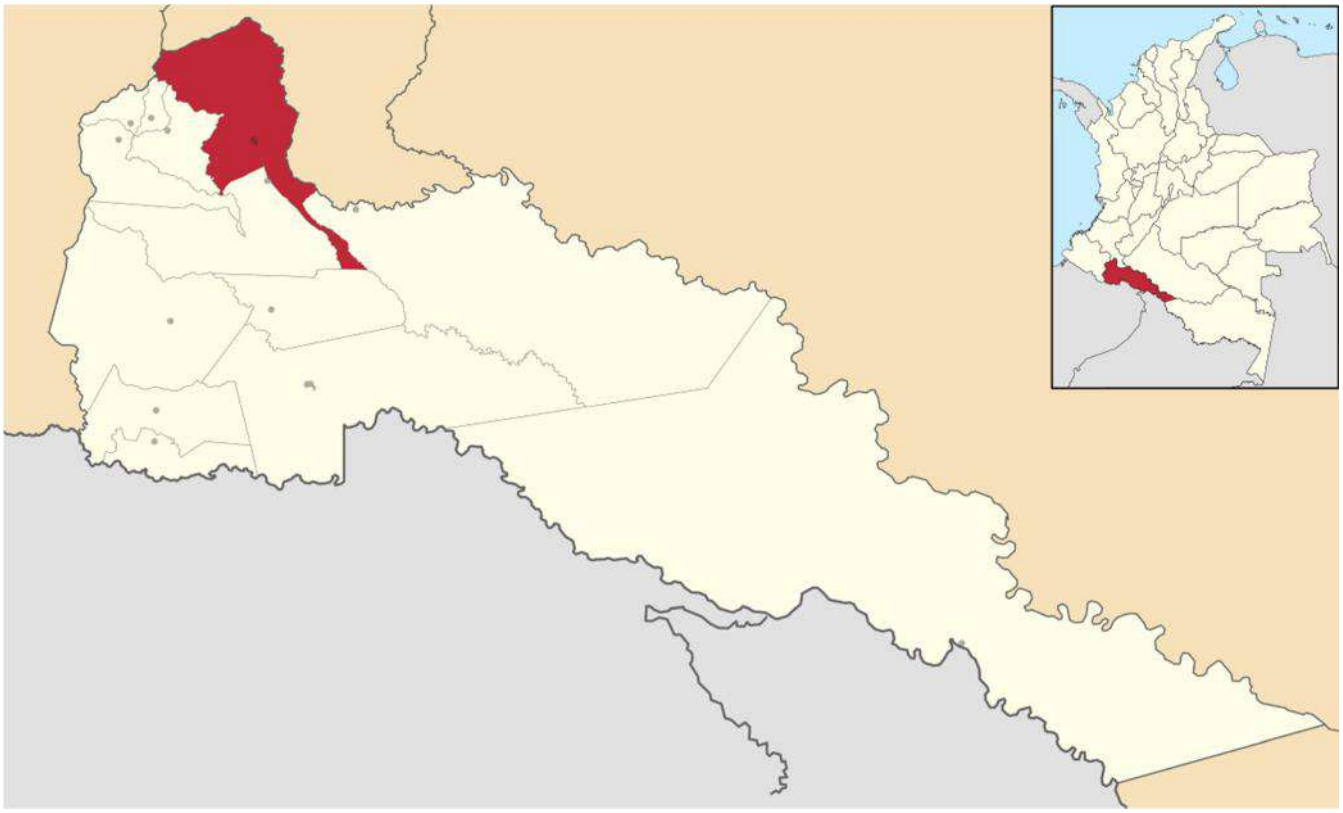

4. RESUMEN EJECUTIVO Y CONTRACTUAL

4.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 285 de 2023.

CONTRATO DE OBRA N°	285 DEL 2023
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATISTA	DC PROJECT S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
CONTRATANTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO ITP.
APOYO A SUPERVISIÓN	GERMAN DARIO CHAMORRO GOMEZ
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS. ($179.995.091) MCTE IVA incluido, gastos directos e indirectos y demás impuestos que correspondan.
PLAZO CONTRATO INICIAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS.
FECHA DE INICIO	16 DE ENERO 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	01 DE MARZO 2024
ADICIONAL No.	001-2024 CONTRATO 285-2023
PLAZO	VEINTICINCO (25) DÍAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	26 DE MARZO DE 2024
ADICIONAL No.	002-2024 CONTRATO 285-2023
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	24 DE ABRIL DE 2024
ADICIONAL No.	003-2024 CONTRATO 285-2023
PLAZO	DIECISÉIS (16) DÍAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	10 DE MAYO DE 2024

4.2. ESTADO FINAL DEL CONTRATO

4.2.1. AVANCE FISICO: el contrato de obra se encuentra completamente finalizado, con la culminación de los siguientes ítems.

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA
1,0	**TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES.**
1,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510
1,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA
1,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711
1,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550
1,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR
1,6	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0
1,7	SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE
1,8	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO
2,0	**EQUIPO DE MEDIDA.**
2,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS
2,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5A
2,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14
2,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS
2,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A
3,0	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO SOLAR.**
3,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA
3,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO

4.2.2. AVANCE EN TIEMPO: el contrato de obra presenta un avance en tiempo del 100%.

PLAZO DE EJECUCION CON PRORROGAS	TRES (03) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
FECHA DE INICIO	16 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE MAYO DE 2024
PERIODO DE INFORME	15 DE FEBRERO 2024 A 10 DE MAYO 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO	TRES (03) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
AVANCE (%)	100%

4.2.3. AVANCE FINANCIERO: el contrato presenta un avance del 94.80%, correspondiente a los siguientes valores:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 179.995.091,20
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 105.325.161,10
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA	$ 170.631.191,00
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	94.80%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 9.363.900,00
VALOR A PAGAR	$ 65.306.030

5. COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO

5.1. PRESUPUESTO INICIAL

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR
1,0	**TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES.**				
1,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510	UND	1,00	$ 2.374.000,00	$ 2.374.000,00
1,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA	UND	1,00	$ 17.629.950,00	$ 17.629.950,00
1,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711	UND	2,00	$ 2.581.480,00	$ 5.162.960,00
1,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550	UND	2,00	$ 1.852.400,00	$ 3.704.800,00
1,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR	ML	360,00	$ 4.649,00	$ 1.673.640,00
1,6	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0	ML	25,00	$ 61.750,00	$ 1.543.750,00
1,7	SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE	UND	1,00	$ 7.863.387,00	$ 7.863.387,00
1,8	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	GL	1,00	$ 12.190.650,00	$ 12.190.650,00
2,0	**EQUIPO DE MEDIDA.**				
2,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	UND	1,00	$ 5.369.930,00	$ 5.369.930,00
2,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5A	UND	3,00	$ 426.649,00	$ 1.279.947,00
2,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	UND	1,00	$ 2.195.100,00	$ 2.195.100,00
2,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	UND	1,00	$ 561.000,00	$ 561.000,00
2,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A	UND	1,00	$ 1.603.910,00	$ 1.603.910,00
3,0	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO SOLAR.**				
3,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA	UND	37,00	$ 974.600,00	$ 36.060.200,00
3,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE	UND	27,00	$ 1.029.000,00	$ 27.783.000,00

	CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO				
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 126.996.224,00**
				ADMINISTRACION **22%**	**$ 27.939.169,00**
				IMPREVISTOS **3%**	**$ 3.809.887,00**
				UTILIDAD **5%**	**$ 6.349.811,00**
				DERECHOS DE CONEXIÓN OPERADOR DE RED	**$ 8.700.000,00**
				CERTIFICACION RETIE	**$ 6.200.000,00**
				COSTO TOTAL OBRA	**$ 179.995.091,00**

5.2. PRESUPUESTO EJECUTADO

En el periodo reportado del 15 de febrero de 2024 al 10 de mayo de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades:

		VALOR CONTRATADO				ACTA PARCIAL 1		ACTA FINAL	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
1,0	**TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES.**								
1,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510	UND	1,00	$ 2.374.000,00	$ 2.374.000,00	1,00	$ 2.374.000,00	0,00	$ 0,00
1,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA	UND	1,00	$ 17.629.950,00	$ 17.629.950,00	1,00	$ 17.629.950,00	0,00	$ 0,00
1,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711	UND	2,00	$ 2.581.480,00	$ 5.162.960,00	2,00	$ 5.162.960,00	0,00	$ 0,00
1,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550	UND	2,00	$ 1.852.400,00	$ 3.704.800,00	2,00	$ 3.704.800,00	0,00	$ 0,00
1,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR	ML	360,00	$ 4.649,00	$ 1.673.640,00	360,00	$ 1.673.640,00	0,00	$ 0,00
1,6	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0	ML	25,00	$ 61.750,00	$ 1.543.750,00	25,00	$ 1.543.750,00	0,00	$ 0,00
1,7	SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE	UND	1,00	$ 7.863.387,00	$ 7.863.387,00	1,00	$ 7.863.387,00	0,00	$ 0,00
1,8	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	GL	1,00	$ 12.190.650,00	$ 12.190.650,00	1,00	$ 12.190.650,00	0,00	$ 0,00
2,0	**EQUIPO DE MEDIDA.**								
2,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	UND	1,00	$ 5.369.930,00	$ 5.369.930,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.369.930,00
2,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5A	UND	3,00	$ 426.649,00	$ 1.279.947,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.279.947,00
2,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	UND	1,00	$ 2.195.100,00	$ 2.195.100,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.195.100,00
2,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	UND	1,00	$ 561.000,00	$ 561.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 561.000,00
2,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A	UND	1,00	$ 1.603.910,00	$ 1.603.910,00	1,00	$ 1.603.910,00	0,00	$ 0,00
3,0	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO SOLAR.**								
3,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA	UND	37,00	$ 974.600,00	$ 36.060.200,00	0,00	$ 0,00	37,00	$ 36.060.200,00
3,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO	UND	27,00	$ 1.029.000,00	$ 27.783.000,00	20,00	$ 20.580.000,00	0,00	$ 0,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 126.996.224,00**		$ 74.327.047,00		$ 45.466.177,00
				ADMINISTRACION **22%**	**$ 27.939.169,00**		$ 16.351.950,34		$ 10.002.558,94
				IMPREVISTOS **3%**	**$ 3.809.887,00**		$ 2.229.811,41		$ 1.363.985,31
				UTILIDAD **5%**	**$ 6.349.811,00**		$ 3.716.352,35		$ 2.273.308,85
				DERECHOS DE CONEXIÓN OPERADOR DE RED	**$ 8.700.000,00**		$ 8.700.000,00		
				CERTIFICACION RETIE	**$ 6.200.000,00**		$ 0,00		$ 6.200.000,00
				COSTO TOTAL OBRA	**$ 179.995.091,00**		**$ 105.325.161,10**		**$ 65.306.030,10**

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DE CONTRATISTA

6.1. Control de pólizas

El contrato cuenta con póliza de seguro que ampara el contrato, de la firma SEGUROS DEL ESTADO S.A. con Nit. 860.009.578-6 y presenta el siguiente estado:

Póliza de cumplimiento entidad estatal No. 41-44-101278533

- Anexo 0: con fecha de expedición 18/12/2023.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	18/12/2023	05/08/2024	$ 17.999.509.10
Calidad de los Elementos	18/12/2023	05/08/2024	$ 17.999.509.10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	18/12/2023	05/02/2027	$ 8.999.754.55
Estabilidad y calidad de la obra	Se ampara 5 años, 0 meses y 01 días		$35.999.018.20

- Anexo 1: con fecha de expedición 30/01/2024.

- Anexo 2: con fecha de expedición 30/01/2024.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	16/01/2024	03/09/2024	$ 17.999.509.10
Calidad de los Elementos	16/01/2024	03/09/2024	$ 17.999.509.10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2024	06/03/2027	$ 8.999.754.55
Estabilidad y calidad de la obra	Se ampara 5 años, 0 meses y 01 días		$35.999.018.20

- Anexo 3: con fecha de expedición 08/03/2024.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	16/01/2024	26/09/2024	$ 17.999.509.10
Calidad de los Elementos	16/01/2024	26/09/2024	$ 17.999.509.10

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2024	26/03/2027	$ 8.999.754.55
Estabilidad y calidad de la obra	Se ampara 5 años, 0 meses y 01 días		$35.999.018.20

- Anexo 4: con fecha de expedición 22/03/2024.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	16/01/2024	26/10/2024	$ 17.999.509.10
Calidad de los Elementos	16/01/2024	26/10/2024	$ 17.999.509.10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2024	26/04/2027	$ 8.999.754.55
Estabilidad y calidad de la obra	Se ampara 5 años, 0 meses y 01 días		$35.999.018.20

- Anexo 5: con fecha de expedición 25/04/2024.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	16/01/2024	11/11/2024	$ 17.999.509.10
Calidad de los Elementos	16/01/2024	11/11/2024	$ 17.999.509.10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2024	12/05/2027	$ 8.999.754.55
Estabilidad y calidad de la obra	Se ampara 5 años, 0 meses y 01 días		$35.999.018.20

6.2. Actos administrativos

Los actos suscritos durante el desarrollo del contrato fueron los siguientes:

- **Acta de inicio,** de fecha 16 de enero de 2024, se inicia ejecución del contrato.
- **Acta de adición y/o modificación No. 001,** de fecha de 01 de marzo de 2024.
- **Acta de adición y/o modificación No. 002,** de fecha de 22 de marzo de 2024.
- **Acta de adición y/o modificación No. 003,** de fecha de 24 de abril de 2024.

6.3. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA

Se verifico el pago de salud y aportes parafiscales del equipo de trabajo mediante planilla integrada de los meses del periodo del informe.

PERSONAL		DICIEMBRE 2023	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.222.600	9462012794
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO GOMEZ	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		
JOSE DANIEL VALENCIA BERMUDEZ	APOYO PROFESIONAL		

PERSONAL		ENERO 2024	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.230.600	9462016461
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO GOMEZ	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		

PERSONAL		FEBRERO 2024	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.513.000	9464049705
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO GOMEZ	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		
NOHELIA URBANO CERÓN	PRACTICANTE		

PERSONAL		MARZO 2024	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA	$ 3.148.200	9466300160
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO GOMEZ	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		
NOHELIA URBANO CERÓN	PRACTICANTE		
CARLOS JESUS LEYTON DAVID	TECNICO ELECTRICISTA		
JHORDAN WILSON PALOMEQUE PALMA	TECNICO ELECTRICISTA		
JOSE DANIEL VALENCIA BERMUDEZ	APOYO PROFESIONAL		
RICARDO ALFONSO VASQUEZ VALENCIA	TECNICO ELECTRICISTA		

PERSONAL		ABRIL 2024	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		

CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA		
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		
NOHELIA URBANO CERÓN	PRACTICANTE	**$ 3.071.000**	**9466873577**
CARLOS JESUS LEYTON DAVID	TECNICO ELECTRICISTA		
JHORDAN WILSON PALOMEQUE PALMA	TECNICO ELECTRICISTA		
NELSON DAVID ORTIZ	AUXILIAR OPERATIVO		
ERIC FABIAN RUEDA AGUDELO	AUXILIAR OPERATIVO		

PERSONAL		**MAYO 2024**	**NUMERO PLANILLA PILA**
NOMBRE	**CARGO**		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA		
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE	**$ 2.846.500**	**9469324703**
NOHELIA URBANO CERÓN	PRACTICANTE		
JHORDAN WILSON PALOMEQUE PALMA	TECNICO ELECTRICISTA		
ERIC FABIAN RUEDA AGUDELO	AUXILIAR OPERATIVO		

Se verifica la afiliación de salud, pensión y ARL del personal contratado por obra el día 19 de diciembre del 2023.

PERSONAL CONTRATADO				
NOMBRE	CARGO	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA	Nueva EPS	Colpensiones	Positiva de seguros
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE	Nueva EPS	Colpensiones	Positiva de seguros
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO GOMEZ	TECNICO ELECTRICISTA	Nueva EPS	Porvenir	Positiva de seguros
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE	Nueva EPS	Colpensiones	Positiva de seguros

6.4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

6.4.1. CONTROL TECNICO

En el aspecto técnico se ejerció la supervisión y control garantizando el correcto cumplimiento de todas las obligaciones convenidas entre las partes contratantes, de esta manera fue necesario llevar un control sobre el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes para verificar que la ejecución de los avances y actividades se realizaron sean conforme al alcance y términos de referencia, a la propuesta técnica económica y a las especificaciones pactadas en el contrato de obra.

Otra de las actividades correspondientes al aspecto técnico fue Resolver las dudas sobre la interpretación de documentos, planos, especificaciones, pruebas, ensayos y términos de referencia y dar recomendaciones e instrucciones sobre el orden en que se realizaron los trabajos para el cumplimiento de los programas de actividades y normas de diseño.

También hace parte de este aspecto la revisión de cantidades de obra, elaboración de bitácora, realizar comités técnicos y velar por la obtención de la mejor calidad en toda la obra.

6.4.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

Se ha realizado el control administrativo de todo el proyecto, cumpliendo con la elaboración y suscripción de los actos administrativos presentados durante el periodo, la elaboración de informes periódicos sobre el avance en la ejecución contractual y se ha mantenido contacto permanente con el instituto Tecnológico del Putumayo ITP sobre el estado y desarrollo del contrato, así como de los eventos que han dado lugar a las suspensiones y reanudación de este.

Se ha realizado durante la ejecución del proyecto la vigilancia al cumplimiento por parte del contratista, de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y que se apliquen las normas de seguridad industrial de cumplimiento obligatorio, así como también el cumplimiento de pagos de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales del contratista, así como las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución de la obra.

Por otro lado, dentro de las actividades administrativas, se ha cumplido con la afiliación del equipo de trabajo a los sistemas de salud y pensiones y se ha brindado atención a las reclamaciones, sugerencias y solicitudes realizadas por el contratista.

6.4.3. CONTROL FINANCIERO

Las actividades desarrolladas en el aspecto financiero correspondieron a cuidar de que se efectuó una adecuada programación financiera, se realizó la revisión y verificación de las cuentas presentadas por el contratista para tramites de pago y se vela para que la ejecución financiera se ajuste al programa de ejecución del proyecto hasta la entrega del mismo.

6.5. **INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.**

- El contratista de obra durante la ejecución del proyecto presentó las siguientes novedades, las cuales, se subsanaron mediante intervenciones técnicas y registros acompañado de supervisor del contrato:

  Falla de luminarias:
  En el presente informe se detalla el proceso de diagnóstico y corrección de fallas en luminarias solares instaladas en el Instituto Tecnológico del Putumayo, El objetivo es restaurar el funcionamiento óptimo de las luminarias, asegurando una iluminación eficiente y sostenible.

  Se realizó una inspección visual y técnica de las luminarias solares, las siguientes fallas fueron identificadas:

  Algunas luminarias no encendían o tenían encendido intermitente por algunas conexiones sueltas en el controlador, y se observó poca capacidad de carga, las cuales, se cambiaron de bombillos led, se cambiaron baterías nuevas y por último se verifico el funcionamiento de las luminarias confirmando que encienden correctamente al oscurecer, se verificó la conexión del panel solar a la luminaria estaba flojo y se ajustó.


6.6. CONCLUSIONES

1. Las obras se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato de obra, el cual se encuentra finalizado.

2. El valor pendiente por ejecutar que corresponde a la suma de $9.363.000,00 es un saldo a favor que queda para el Instituto tecnológico del Putumayo, puesto que, se presentó la necesidad de reajustar la entrega de unas luminarias y se ajustaron en otros soportes diferentes a postes metálicos.

3. El contratista cumple a satisfacción con la seguridad industrial y salud ocupacional del personal que labora en el proyecto, mediante la dotación de elementos de seguridad y afiliaciones al sistema de seguridad social integral de los trabajadores.

4. Se anexa registro fotográfico general de la ejecución de obra.



GERMAN DARIO CHAMORRO GOMEZ
Apoyo a la Supervisión
Instituto Tecnológico del Putumayo. I.T.P.

GERMAN DARIO CHAMORRO GOMEZ
Apoyo a Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO

2.1 EQUIPO DE MEDIDA * MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS



2.2 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5ª





2.3 ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14



2.4 ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS.



3.1 SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA





CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA

ACTA DE RECIBO FINAL

IES Vigilada por: La educación es de todos – Mineducación

ACTA No. 02



TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATISTA: DC PROJECT S.A.S.
SUPERVISOR: MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO

FECHA ACTA: 10 de mayo de 2024

Mediante la presente acta, DC PROJECT S.A.S, en calidad de contratista y CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA, como director de obra, MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO rector ITP, en calidad de supervisor, JUAN CARLOS CALVACHE ALOMIA, en calidad de profesional universitario area de planeacion ITP, JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS profesional de apoyo en el área de Planeación ITP como apoyo a la supervision, dejan constancia de las cantidades de obra ejecutadas a la fecha en las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		SALDO	
			CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR FINAL
1	**TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES**												
1,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510	UND	1,00	$ 2.374.000,00	$ 2.374.000,00	1,00	$ 2.374.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.374.000,00	0,00	$ -
1,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA	UND	1,00	$ 17.629.950,00	$ 17.629.950,00	1,00	$ 17.629.950,00	0,00	$ -	1,00	$ 17.629.950,00	0,00	$ -
1,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711	UND	2,00	$ 2.581.480,00	$ 5.162.960,00	2,00	$ 5.162.960,00	0,00	$ -	2,00	$ 5.162.960,00	0,00	$ -
1,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550	UND	2,00	$ 1.852.400,00	$ 3.704.800,00	2,00	$ 3.704.800,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.704.800,00	0,00	$ -
1,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR	ML	360,00	$ 4.649,00	$ 1.673.640,00	360,00	$ 1.673.640,00	0,00	$ -	360,00	$ 1.673.640,00	0,00	$ -
1,6	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0	ML	25,00	$ 61.750,00	$ 1.543.750,00	25,00	$ 1.543.750,00	0,00	$ -	25,00	$ 1.543.750,00	0,00	$ -
1,7	SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE	UND	1,00	$ 7.863.387,00	$ 7.863.387,00	1,00	$ 7.863.387,00	0,00	$ -	1,00	$ 7.863.387,00	0,00	$ -
1,8	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	GL	1,00	$ 12.190.650,00	$ 12.190.650,00	1,00	$ 12.190.650,00	0,00	$ -	1,00	$ 12.190.650,00	0,00	$ -
2	**EQUIPO DE MEDIDA**												
2,1	EQUIPO DE MEDIDA * MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	UND	1,00	$ 5.369.930,00	$ 5.369.930,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.369.930,00	1,00	$ 5.369.930,00	0,00	$ -
2,2	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5ª	UND	3,00	$ 426.649,00	$ 1.279.947,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.279.947,00	3,00	$ 1.279.947,00	0,00	$ -
2,3	ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	UND	1,00	$ 2.195.100,00	$ 2.195.100,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.195.100,00	1,00	$ 2.195.100,00	0,00	$ -
2,4	ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	UND	1,00	$ 561.000,00	$ 561.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 561.000,00	1,00	$ 561.000,00	0,00	$ -
2,5	TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250ª	UND	1,00	$ 1.603.910,00	$ 1.603.910,00	1,00	$ 1.603.910,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.603.910,00	0,00	$ -
3	**SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A**												
3,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA	UND	37,00	$ 974.600,00	$ 36.060.200,00	0,00	$ -	37,00	$ 36.060.200,00	37,00	$ 36.060.200,00	0,00	$ -
3,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO	UND	27,00	$ 1.029.000,00	$ 27.783.000,00	20,00	$ 20.580.000,00	0,00	$ -	20,00	$ 20.580.000,00	7,00	$ 7.203.000,00
TOTAL					**$ 126.996.224,00**		**$ 74.327.047,00**		**$ 45.466.177,00**		**$ 119.793.224,00**		**$ 7.203.000,00**
ADMINISTRACION (A)			**22%**		**$ 27.939.169,28**		**$ 16.351.950,34**		**$ 10.002.558,94**		**$ 26.354.509,28**		**$ 1.584.660,00**
IMPREVISTOS (I)			**3%**		**$ 3.809.886,72**		**$ 2.229.811,41**		**$ 1.363.985,31**		**$ 3.593.796,72**		**$ 216.090,00**
UTILIDAD (U)			**5%**		**$ 6.349.811,20**		**$ 3.716.352,35**		**$ 2.273.308,85**		**$ 5.989.661,20**		**$ 360.150,00**
	TRAMITES ANTE EL OR (Derechos de Conexión, Matrícula Y D.N.A.)				**$ 8.700.000,00**		**$ 8.700.000,00**				**$ 8.700.000,00**		**$ -**
	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP (Según Factura - incluye impuestos y deducciones)				**$ 6.200.000,00**		**$ -**		**$ 6.200.000,00**		**$ 6.200.000,00**		**$ -**
	VALORES TOTALES DEL CONTRATO				**$ 179.995.091**		**$ 105.325.161**		**$ 65.306.030**		**$ 170.631.191**		**$ 9.363.900**

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 179.995.091**
VALOR ACUMULADO	**$ 105.325.161,00**	
VALOR ACTA Nº 2	**$ 65.306.030,10**	
SALDO POR EJECUTAR	**$ 9.363.900,00**	
SUMAS IGUALES	**$ 179.995.091**	**$ 179.995.091**

Vo.Bo. CONTRATISTA		Vo.Bo. INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO					
		SUPERVISOR DEL CONTRATO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION		PROFESIONAL DE APOYO PLANEACION	
NOMBRE	DC PROJECT SAS	**NOMBRE**	MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO	**NOMBRE**	JUAN CARLOS CALVACHE ALOMIA	**NOMBRE**	GERMAN CHAMORRO
FIRMA		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	

PROJECT S.A.S
Ingenieria a su Servicio

INFORME FINAL DE OBRA FINAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

CONTRATO 285 DE 2023



Mocoa, Putumayo.
Mayo de 2024

INFORME DE OBRA FINAL

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA

CONTRATISTA:

DC PROJECT S.A.S

R/L CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ

PERIODO DEL INFORME:

15 DE FEBRERO 2024 A 10 DE MAYO DE 2024

FECHA DE ENTREGA INFORME:

10 DE MAYO DE 2024

1 INTRODUCCION

En el presente informe se detalla el avance de la ejecución del contrato de obra No. 285-2023; cuyo objeto es "Construcción de la línea de media tensión y transformación trifásica para el coliseo y aulas nuevas del instituto tecnológico del putumayo – ITP, en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo". buscando dar cumplimiento a la misión y visión del instituto tecnológico del putumayo y con el fin de generar accesibilidad a los escenarios deportivos e instalaciones aptas para el desarrollo profesional de la comunidad, la infraestructura y equipos eléctricos de la institución; se logra realizar el objeto del proyecto contratado ejecutando las actividades y entregando el proyecto en los tiempos establecidos los cuales se constituyeron en la transformación de energía eléctrica, se construyó armario eléctrico para gabinete con barraje trifásica intemperie para 6 totalizadores, para buen funcionamiento y distribución del flujo de energía eléctrica en las instalaciones del instituto tecnológico del putumayo, sede Mocoa.

2 LOCALIZACION ESPECIFICA

El proyecto se encuentra ubicado en distintos puntos de las instalaciones del Instituto Tecnológico del Putumayo ITP, en la ciudad de Mocoa, Putumayo.



3 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°	285 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATISTA	DC PROJECT S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
CONTRATANTE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO ITP.
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS. ($179.995.091) MCTE IVA incluido, gastos directos e indirectos y demás impuestos que correspondan.
PLAZO CONTRATO INICIAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO	16 DE ENERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	01 DE MARZO DE 2024
ADICIONAL No.	001-2024 CONTRATO 285-2023
PLAZO	VEINTICINCO (25) DÍAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	26 DE MARZO DE 2024
ADICIONAL No.	002-2024 CONTRATO 285-2023
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	24 DE ABRIL DE 2024
ADICIONAL No.	003-2024 CONTRATO 285-2023
PLAZO	DIECISÉIS (16) DÍAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	10 DE MAYO DE 2024

4 INFORMACIÓN DE LA OBRA


A continuación, se presentan los componentes y la proyección de actividades finales, de la ejecución de la obra del presente contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, cantidades, modificaciones y demás consideraciones para cada caso según lo contratado


4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATADAS.

Resumen de Actividades	
PENDIENTE	0
EN PROCESO	2
FINALIZADO	16
Total Actividades	18

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATO DIAGRAMA GANTT

Actividad	Responsable	Área	Fecha Inicio	Fecha Fin	ESTADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510	DC PROJECT SAS	Operativa	17-ene	17-ene	FINALIZADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA	DC PROJECT SAS	Operativa	18-ene	19-ene	FINALIZADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711	DC PROJECT SAS	Operativa	20-ene	20-ene	FINALIZADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550	DC PROJECT SAS	Operativa	22-ene	22-ene	FINALIZADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR	DC PROJECT SAS	Operativa	22-ene	22-ene	FINALIZADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0	DC PROJECT SAS	Operativa	22-ene	23-ene	FINALIZADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE	DC PROJECT SAS	Operativa	24-ene	29-ene	FINALIZADO
CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	DC PROJECT SAS	Operativa	29-ene	3-feb	FINALIZADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	DC PROJECT SAS	Operativa	12-feb	17-feb	FINALIZADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5A	DC PROJECT SAS	Operativa	19-feb	24-feb	FINALIZADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	DC PROJECT SAS	Operativa	26-feb	1-mar	FINALIZADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	DC PROJECT SAS	Operativa	4-mar	9-mar	FINALIZADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A	DC PROJECT SAS	Operativa	5-feb	6-feb	FINALIZADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA	DC PROJECT SAS	Operativa	11-mar	23-mar	FINALIZADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO	DC PROJECT SAS	Operativa	6-feb	14-feb	FINALIZADO
SUMINISTRO E INSTLACION DE BRAZO DE 2" CON COLLARÍN PARA LUMINARIAS DE PARED	DC PROJECT SAS	Operativa	15-abr	20-abr	EN PROCESO
DERECHOS DE CONEXIÓN OPERADOR DE RED	DC PROJECT SAS	Operativa	14-feb	14-feb	FINALIZADO
CERTIFICACION RETIE	DC PROJECT SAS	Operativa	21-mar	10-may	EN PROCESO

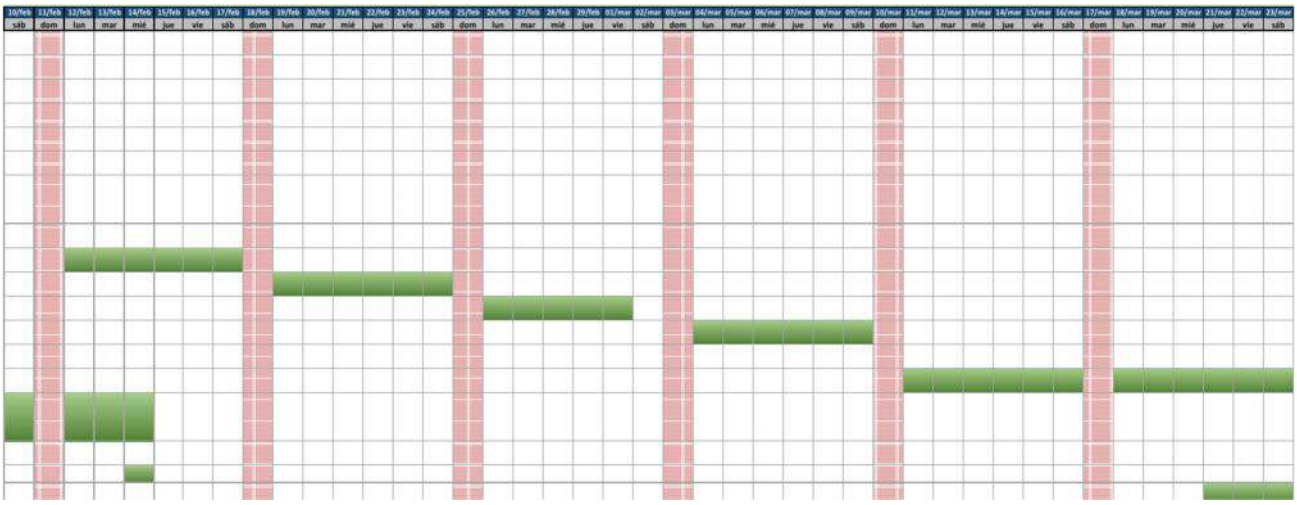

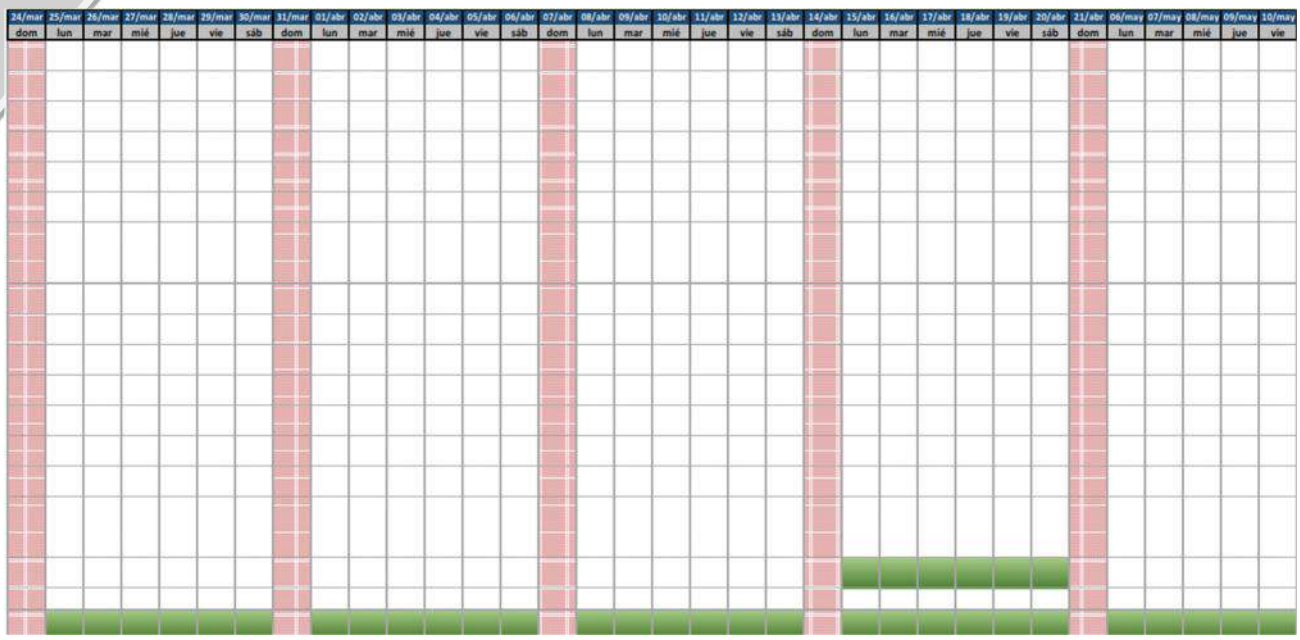

4.2 AVANCE FISICO

De acuerdo con las actividades ejecutadas y el reporte de avance físico, en el periodo del reporte se ejecutó el 100% del objeto contractual, por lo tanto, se cuenta con un óptimo desarrollo del proyecto acorde a los tiempos de ejecución y los establecidos de acuerdo al cronograma de obra presentado.

Se realizó la ahoyada e hincado de poste de 12 metros x 510KGF, instalación de transformador de 75KVA con su respectiva herrajeria, estructuras de redes en media y baja tensión, cableado para la red de media tensión y baja tensión, sistema de puesta a tierra para su adecuada protección y acometidas para armario eléctrico teniendo en cuenta los diseños planteados y aprobados por el operador de red.

Posterior a las labores de redes de media y baja tensión se procedió a la construcción de armario eléctrico, instalación de gabinete con barraje trifásico y la instalación de medidores de medida indirecta, transformadores de corriente, se instaló el armario para el equipo de medida y sus accesorios para conexionado junto con totalizador industrial.

La última parte del proyecto consistió en la compra de las luminarias solares de alumbrado público de 200W. Para la instalación de los postes metálicos de 3 metros; fue necesario extender una prorroga al tiempo contratado por la no existencia de los materiales para la última parte del, puesto que, nuestros proveedores no contaron por un tiempo con el inventario para la fabricación de los mismos; por tal razón se hizo necesario realizar la

instalación de algunas luminarias en pared y reorganizar la instalación de los postes metálicos.

Lo anteriormente descrito se puede evidenciar al final del presente informe mediante registros fotográficos.

La entrega del proyecto contratado se ha dificultado por la certificación RETIE, puesto que, el organismo certificador evidenció hallazgos para corregir en las obras; los cuales ya han sido subsanados, pero se está a la espera del certificado de aprobación del proyecto.

4.3 AVANCE EN TIEMPO

A la fecha del presente informe, la obra presenta un avance en tiempo del 100% de acuerdo a la siguiente información.

PLAZO DE EJECUCION CON PRORROGAS	TRES (03) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
FECHA DE INICIO	16 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION	10 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME	15 de febrero 2024 a 10 de mayo 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO	TRES (03) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
% DE AVANCE EN TIEMPO	100%

4.4 AVANCE FINANCIERO

A la fecha del presente informe del contrato de obra 285 de 2023, presenta un avance financiero del 100% de acuerdo a los siguientes valores incluyendo modificación de ítem no previsto.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 179.995.091,20
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 105.325.161,10
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA	$ 170.631.191,00
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	94.80%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 9.363.900,00
VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	**$ 65.306.030**

5 COMPONENTES FINALES DEL PROYECTO

5.1 ITEMS CONTRATADOS CON MODIFICATORIO

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	**TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES.**		
1.1	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510	UND	**1**
1.2	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA	UND	**1**
1.3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711	UND	**2**
1.4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550	UND	**2**
1.5	SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR	ML	**360**
1.6	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0	ML	**25**
1.7	SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE	UND	**1**
1.8	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	GL	**1**
2	**EQUIPO DE MEDIDA.**		
2.1	SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	UND	**1**
2.2	SUMINISTRO E INSTLACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5A	UND	**3**
2.3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	UND	**1**
2.4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	UND	**1**
2.5	SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A	UND	**1**
3	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO SOLAR.**		
3.1	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA	UND	**37**
3.2	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO	UND	**27**
4	**ÍTEM NO PREVISTOS**		
INP.1	SUMINISTRO E INSTLACION DE BRAZO DE 2" CON COLLARÍN PARA LUMINARIAS DE PARED	UND	**0**

5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades desarrolladas durante el periodo del 16 de enero de 2024 al 10 de mayo de 2024 se describen de acuerdo a los ítems contratados y se llevaron a cabo todas las actividades contratadas y soportadas con el registro fotográfico:

DESCRIPCIÓN		VALORES CONTRATADOS				ACTA PARCIAL No. 01		ACTA FINAL	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1,0	**TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES.**								
1,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510	UND	1,00	$ 2.374.000,00	$ 2.374.000,00	1,00	$ 2.374.000,00	0,00	$ 0,00
1,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA	UND	1,00	$ 17.629.950,00	$ 17.629.950,00	1,00	$ 17.629.950,00	0,00	$ 0,00
1,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711	UND	2,00	$ 2.581.480,00	$ 5.162.960,00	2,00	$ 5.162.960,00	0,00	$ 0,00
1,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550	UND	2,00	$ 1.852.400,00	$ 3.704.800,00	2,00	$ 3.704.800,00	0,00	$ 0,00
1,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR	ML	360,0	$ 4.649,00	$ 1.673.640,00	360,0	$ 1.673.640,00	0,00	$ 0,00
1,6	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0	ML	25,00	$ 61.750,00	$ 1.543.750,00	25,00	$ 1.543.750,00	0,00	$ 0,00
1,7	SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE	UND	1,00	$ 7.863.387,00	$ 7.863.387,00	1,00	$ 7.863.387,00	0,00	$ 0,00
1,8	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	GL	1,00	$ 12.190.650,00	$ 12.190.650,00	1,00	$ 12.190.650,00	0,00	$ 0,00
2,0	**EQUIPO DE MEDIDA.**								
2,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	UND	1,00	$ 5.369.930,00	$ 5.369.930,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.369.930,00
2,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5ª	UND	3,00	$ 426.649,00	$ 1.279.947,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.279.947,00
2,3	SUMINISTRO E INSTLACION DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	UND	1,00	$ 2.195.100,00	$ 2.195.100,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.195.100,00
2,4	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	UND	1,00	$ 561.000,00	$ 561.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 561.000,00
2,5	SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A	UND	1,00	$ 1.603.910,00	$ 1.603.910,00	1,00	$ 1.603.910,00	0,00	$ 0,00
3,0	**LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO SOLAR.**								
3,1	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA	UND	37,00	$ 974.600,00	$ 36.060.200,00	0,00	$ 0,00	37,00	$ 36.060.200,00
3,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO	UND	27,00	$ 1.029.000,00	$ 27.783.000,00	20,00	$ 20.580.000,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 126.996.224,00**		$ 74.327.047,00		$ 45.466.177,00
	ADMINISTRACION			**22%**	**$ 27.939.169,00**		$ 16.351.950,34		$ 10.002.558,94
	IMPREVISTOS			**3%**	**$ 3.809.887,00**		$ 2.229.811,41		$ 1.363.985,31
	UTILIDAD			**5%**	**$ 6.349.811,00**		$ 3.716.352,35		$ 2.273.308,85
	DERECHOS DE CONEXIÓN OPERADOR DE RED				**$ 8.700.000,00**		$ 8.700.000,00		
	CERTIFICACION RETIE				**$ 6.200.000,00**		$ 0,00		$ 6.200.000,00
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 179.995.091,00**		**$ 105.325.161**		**$ 65.306.030,10**

Con base en lo anterior, se establece que el presente ajuste no incurrió en ninguna de las estipulaciones de improcedencias y revisando las actividades, indicadores, productos, objetivos del proyecto, se establece que la presentación del ajuste no altera el objeto del proyecto ni afecta sustancialmente las actividades del mismo, al contrario, se pretende lograr el cumplimiento del objeto del proyecto y evitar un posible desequilibrio económico, con la incorporación de ítems nuevos, según las nuevas necesidades y requerimientos presentados por el proyecto, verificadas y aprobadas por la supervisión en cabeza de la entidad ejecutora INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO.

6 BALANCE FINANCIERO

A continuación, se detalla el balance financiero del contrato 285-2023 incluyendo modificación de ítem no previsto.

VALORES EJECUTADOS DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 179.995.091
VALOR PAGADO A LA FECHA (ACTA PARCIAL No. 01)	$ 105.325.161
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA	$ 170.631.191
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	94.80%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 9.363.900,00
VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	**$ 65.306.030,10**
SALDO A FAVOR I.T.P	**$ 9.363.900,00**

BALANCE FINAL DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 179.995.091**
VALOR ACUMULADO	**$ 105.325.161**	
VALOR ACTA Nº 2	**$ 74.669.930**	
SALDO A FAVOR I.T.P.	**$ 9.363.900,00**	
SUMAS IGUALES	**$ 179.995.091**	**$ 179.995.091**

7 ASPECTOS LOGÍSTICOS DE OBRA

7.1 Personal del contratista:

DC PROJECT SAS presentó documentación referente al personal que laboró en la ejecución del proyecto en el periodo de 16 de enero de 2024 hasta el 10 de mayo de 2024 en todas las actividades contractuales. Aunque el personal operativo es variable, puesto que, depende de las actividades a desarrollar.

ÍTEM	CARGO	CANTIDAD
1	Ingeniero Director del Proyecto	1
2	Ingeniero Residente	1
3	Profesional HSEQ	1
4	Liniero técnico	2

7.2 Maquinaria y Equipo del Contratista:

Procedimiento por el cual los equipos, materiales y herramientas para la realización de trabajos con tensión y alturas; los cuales se eligen teniendo en cuenta las características del trabajo y la tensión del servicio. Se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su fabricante, la norma nacional o internacional vigente que les aplique y las que defina la empresa para garantizar la protección del trabajador y su correcta operación y calidad.

La maquinaria y equipo utilizado en obra por el contratista, para el desarrollo de las actividades del contrato en este periodo fueron:

CANTIDAD	EQUIPO
1	Equipo de topografía
Global	Vestida Estructura Postes
Global	Herramienta Menor
1	Camión Grúa
2	Equipos de alturas
1	Kit de Rescate en Alturas

7.3 Elementos de protección personal y contra caídas:

DC PROJECT S.A.S. para el trabajo en el sector eléctrico de acuerdo con la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación del riesgo, suministró oportunamente a sus trabajadores y de conformidad a la labor, elementos y equipos de seguridad requeridos para la ejecución de los trabajos, así como la reposición de estos cuando por su deterioro o perdidas sea requerido.

Se tuvo en cuenta:

a) La ropa de labor del personal es confeccionada en algodón para categoría cero, sin accesorios metálicos.

b) DC PROJECT S.A.S. Se apoyó en las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo, se aplicó un análisis de riesgo por exposición a arco eléctrico por distinto nivel de tensión para cada uno de sus procesos y definió que tipo de protección especial se requiere considerando la exposición a corrientes de cortocircuito en las condiciones más desfavorables para cada caso.

c) DC PROJECT S.A.S. Capacitó acorde a la normatividad legal vigente a los trabajadores sobre el uso, manejo, inspección, mantenimiento y almacenamiento de los elementos y equipos de protección personal y colectivos indicando las características técnicas de cómo utilizarlos, cuidados y criterios de reposición.

d) Se promovió en recomendaciones en que ningún trabajador debe iniciar labores sin usar el equipo de protección personal requerido de acuerdo a los factores de riesgo a los cuales va a estar expuesto.

e) Se concientizó que es obligación de los trabajadores el uso y cuidado del elemento o equipo de protección. El cual debe ser inspeccionado por los trabajadores antes y después de cada utilización. De no encontrarse en buen estado; no lo utilizara y gestionara su reposición con el profesional SST.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SUMINISTRADOS	
Ítem	**Descripción**
1	Casco dieléctrico con barboquejo
2	Gafas de seguridad
3	Ropa de seguridad
4	Guantes dieléctricos
5	Botas dieléctricas
6	Arnes dieléctrico en X
7	Eslingas de posicionamiento
8	TIE OFF o tercer pretal
9	Pretales

8 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8.1 Evaluación de los riesgos.

Se realizó una evaluación de los riesgos antes de comenzar el trabajo, del mismo modo se identificaron los peligros asociados con la construcción de redes eléctricas y se implementaron las medidas preventivas para mitigar los riesgos identificados.

8.2 Charlas de seguridad y capacitación.

Se realizó la contratación de todo el personal en general que labora con respectivo orden de trabajo, esto incluye la verificación de las afiliaciones a EPS, ARL, AFP y CCF. Entrega de dotación seguido de la inducción y socialización pre operacional HSE, esta socialización se lleva a cabo antes de iniciar labores a las 7:00 a.m. en campamento, con la finalidad de capacitar a los trabajadores sobre su exposición a los principales factores de riesgo con la asistencia y participación de todos los trabajadores. En esta socialización se da a conocer el personal que ingresa, los riesgos a los que se encuentran expuestos según la tarea desarrollada, se aclaran dudas y se finaliza la charla.

En estas charlas se logra analizar situaciones que pueden causar accidentes o incidentes dentro del desarrollo de la jornada laboral, es por esto que diariamente se realiza el programa de charla de cinco minutos sobre los riesgos a los que se exponen diariamente y se da pautas de como intervenir y adoptar medidas para prevenir algún suceso en estos casos.

8.3 Trabajo eléctrico en altura.

Para realizar trabajos eléctricos en alturas; DC PROJECT S.A.S. garantizó el cumplimiento de las medidas de Salud y Seguridad en el Trabajo, en la intervención de líneas y redes de media y baja tensión en altura, contando como mínimo con dos trabajadores laborando en conjunto y cumpliendo con la normatividad vigente para trabajos en alturas según la resolución 4272 de 2021.

8.4 Tendido y tensionado de conductores.

En las actividades de tendido y tensionado de conductores, además del uso de los equipos y elementos de protección; DC PROJECT S.A.S. tuvo en cuenta lo siguiente:

a) Utilización de ayudas mecánicas; como diferenciales y agarradoras.
b) Mantener visibilidad del área y comunicaciones adecuadas.

c) Verificar la clase de conductor, calibre, peso, resistencia mecánica y longitud del vano o tramos a tensionar para minimizar el riesgo de ruptura.

d) Conectar a tierra los conductores desnudos a tensionar.

e) Verificar la tensión de ruptura máxima del conductor en su tensionado.

8.4 Prevención del trabajador.

Los procedimientos, equipos y materiales utilizados en el método de trabajo de los ejecutores de obra deben asegurar la protección de ellos frente al peligro eléctrico y el riesgo de caída; garantizando en particular que el trabajador no entre en contacto accidentalmente con cualquier otro elemento o potencial distinto al suyo.

El personal habilitado debe verificar el buen estado y usar los elementos de protección personal conforme a los procedimientos previstos, las responsabilidades asignadas y la técnica de trabajo con tensión a utilizar.

8.5 Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos.

En la realización de trabajos a la intemperie se tuvo en cuenta siempre las condiciones climáticas como; la presencia de tormentas eléctricas, lluvias, neblina, vientos fuertes u otras condiciones climáticas que pusieran en riesgo a los ejecutores de la obra dificultando su visibilidad o la manipulación de las herramientas.

8.6 Programa medicina preventiva del trabajo.

Reportes Accidentes de Trabajo:

NOMBRE DE INDICADOR	DEFINICIÓN	COMO SE MIDE	FUENTE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD	INTERPRETACIÓN
Tasa de accidentalidad	Relación del número de casos de accidentes de trabajo ocurridos durante el periodo con el numero promedio de trabajadores en el mismo periodo	TA = N° AT / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES x 100 TA = 0/5 x 100 = 0%	SG-SST	Profesional SST	Mensual	Porcentaje %	Durante este periodo no se presentó accidentes de trabajo.

8.7 Plan de emergencia y contingencia.

Para ésta obra DC PROJECT S.A.S. Actualizó su matriz de vulnerabilidad, incluyendo las valoraciones de emergencia eléctrica acorde a las actividades misionales de la empresa. El plan de emergencia contempla todos los aspectos que le aplican, descritos en la normatividad legal vigente y de acuerdo con el análisis de peligro y vulnerabilidad, entre otros:

a) Recursos para su atención.
b) Sistema de detección, notificación y alarma.
c) Brigadas de atención y de rescate.
d) Atención a lesionados.
e) Grupos de apoyo externo.
f) El personal debe estar informado sobre la inhabilitación de los sistemas cuando asi ocurriese.
g) Documentar procedimientos operativos normalizados de actuación para las vulnerabilidades eléctricas priorizadas.
h) Establecer anualmente ensayos y pruebas de las medidas planificadas (Planes de Emergencia) para la atención de las emergencias eléctricas.





MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS IPERV.

RUTINARIO (SI o NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES				MEDIDAS INTERVENCIÓN					
	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCION		EN LA FUENTE	EN EL MEDIO	EN LA PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACIÓN DEL NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	TIEMPO DE EXPOSICIÓN	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITOS LEGALES ESPECIFICOS	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	SEÑALIZACIÓN ADVERTENCIA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
NO	FISICO	Ensolamiento Excesivo	1-fatiga 2-deshidratacion 3-dolor de cabeza. 4-temperatura eleva del cuerpo	Ninguno	Ninguno	Usar EPP (chavo) Ropa de dotacion. Usar bloqueador solar	2	1	2	**bajo**	25	50	**III**	**ACEPTABLE**	2	3 Horas	Desmayo por deshidratacion	Ninguno	N/A	N/A	N/A	Progarama de capacitacion e induccion de medicina preventiva y factor de riesgos fisicos.	N/A	usar Chavo usar protector solar usar ropa de dotacion
NO	BIOMECANICO	Posturas: Prolongadas, forzadas y Antigravitatorias	1-Lesion de tendones. 2-Lesion de nervios. 3-Lesion de espalda.	Ninguno	Ninguno	Usar EPP: botas de trabajo, guantes, gafas de seguridad, casco de seguridad.	6	2	12	**alto**	25	300	**II**	**NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO**	2	3 Horas	Lesiones permantes en espalda, miembros superiores e inferiores.	Ninguno	N/A	N/A	N/A	Formacion y capacitacion en prevencion de lesiones osteomusculares, higiene postural, pausas activas	N/A	Botas de tabajo, Guantes de trabajo, Gafas de seguridad, Casco de seguridad
NO	BIOMECANICO	Transporte de posteadura de 600 Kg o 1000Kg.	1-Lesion de tendones. 2-Lesion de nervios. 3-Lesion de espalda.	Implementacion de grua para transporte de posteadura	Ninguno	Formacion y Capacitacion en gestion del riesgo biomecanico.	6	1	6	**medio**	60	360	**II**	**NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO**	3	1 Hora	Aplastamiento, Lesiones permanentes	Ninguno	N/A	N/A	Implementacion grua.	Induccion preoperacional sobre el autocuidado	N/A	N/A
NO	MECANICO	Levantamiento y Posicionamiento de posteadura de 600Kg y 1000Kg.	1-Cisallamiento. 2-Aplastamiento. 3-Atrapamiento. 4-Impactos.	Implementacion de grua para el posicionamiento de posteadura	Ninguno	Usar EPP: Guantes de carnaza, caso de seguridad, botas punta de acero.	6	1	6	**medio**	60	360	**II**	**NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO**	3	2 Horas	Aplastamiento, Lesiones permanentes	Ninguno	N/A	N/A	Implementacion grua, Brazo mecanico	Formacion y capacitacion en gestion del riesgo mecanico.	N/A	Guantes de Carnza, casco de seguridad, botas punta de acero.
NO	ALTURAS	Caidas mayor a 1,.50 metros de altura	1-Fracturas. 2-Contusiones. 3-Traumatismos. 4-Luaciones	Uso de linea de vida	Ninguno	Usar EPCC: Uso adecuado de arnes, eslinga de posicionamiento, pretales,	6	2	12	**alto**	60	720	**I**	**NO ACEPTABLE**	2	2 Horas	Caidas, lesiones permanentes, Muerte.	Certificacion para trabajo en alturas según resolucion 4272 de 2021. Permisos de trabajos en alturar.	N/A	N/A	N/A	Programa de Inspecciones: Supervicion de actividades en alturas antes, durante y despues de ejecutadas.	N/A	Casco de Seguridad, Gafas de seguridad, Botas, Equipo Contra caidas.

NO	ALTURAS	Caidas mayor a 2 metros de altura	1- Fracturas. 2- Contusiones. 3- Traumatismos. 4- Luaciones	Uso de linea de vida	Ninguno	Usar EPCC: Uso adecuado de arnes, eslinga de posicionamiento, pretales,	6	2	12	**alto**	60	720	**I**	**NO ACEPTABLE**	2	2 Horas	Caidas, lesiones permanentes, Muerte.	Certificacion para trabajo en alturas según resolucion 4272 de 2021. Permisos de trabajos en alturar.	N/A	N/A	N/A	Programa de Inspecciones: Supervicion de actividades en alturas antes, durante y despues de ejecutadas.	N/A	Casco de Seguridad, Gafas de seguridad, Botas, Equipo Contra caidas.
NO	MECANICO	Afectado integridad fisica	1- Cisallamiento. 2- Aplastamiento. 3- Atrapamiento. 4- Impactos.	Implementacion de grua para posicionamiento de transformadores	Ninguno	Usar EPP: Guantes de carnaza, caso de seguridad, botas punta de acero.	6	1	6	**medio**	60	360	**II**	**NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO**	2	3 Horas	Atrapamiento, Lesiones permanentes	Ninguno	N/A	N/A	Implementacion grua, Brazo mecanico	Induccion preoperacional sobre el autocuidado	N/A	Guantes de Carnza, casco de seguridad, botas punta de acero.
NO	ALTURAS	Caidas mayor a 2 metros de altura	1- Fracturas. 2- Contusiones. 3- Traumatismos. 4- Luaciones	Uso de linea de vida	Ninguno	Usar EPCC: Uso adecuado de arnes, eslinga de posicionamiento, pretales,	6	2	12	**alto**	60	720	**I**	**NO ACEPTABLE**	2	2 Horas	Caidas, lesiones permanentes, Muerte.	Certificacion para trabajo en alturas según resolucion 4272 de 2021. Permisos de trabajos en alturar.	N/A	N/A	N/A	Programa de Inspecciones: Supervicion de actividades en alturas antes, durante y despues de ejecutadas.	N/A	Casco de Seguridad, Gafas de seguridad, Botas, Equipo Contra caidas.
NO	BIOLOGICO	Mordeduras animales, picadura insectos, contacto con microrganismos de carater vegetal	1- Enfermedades Infecciosas 2- Reacciones alerqicas 3-Efectos toxicos	Identificar los animales suceptibles	Ninguno	Usar EPP: Guantes de carnaza, caso de seguridad, botas punta de acero.	2	2	4	**bajo**	25	100	**III**	**ACEPTABLE**	4	3 Horas	Lesiones corporales por toxicidad de picaduras de animales venenosos	Ninguno	N/A	N/A	N/A	Progarama de capacitacion e induccion de animales venenosos y peligrosos; factor de riesgos Biologicos	N/A	Guantes de Carnza, casco de seguridad, botas punta de acero, Pantalon largo y Camisa manga larga

9 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONAL		DICIEMBRE 2023	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA		
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO GOMEZ	TECNICO ELECTRICISTA	**$ 2.222.600**	**9462012794**
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		
JOSE DANIEL VALENCIA BERMUDEZ	APOYO PROFESIONAL		

PERSONAL		ENERO 2024	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA		
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE	**$ 2.230.600**	**9462016461**
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO GOMEZ	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		

PERSONAL		FEBRERO 2024	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA		
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO GOMEZ	TECNICO ELECTRICISTA	**$ 2.513.000**	**9464049705**
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		
NOHELIA URBANO CERÓN	PRACTICANTE		

PERSONAL		MARZO 2024	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA		
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO GOMEZ	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		
NOHELIA URBANO CERÓN	PRACTICANTE	**$ 3.148.200**	**9466300160**
CARLOS JESUS LEYTON DAVID	TECNICO ELECTRICISTA		
JHORDAN WILSON PALOMEQUE PALMA	TECNICO ELECTRICISTA		
JOSE DANIEL VALENCIA BERMUDEZ	APOYO PROFESIONAL		
RICARDO ALFONSO VASQUEZ VALENCIA	TECNICO ELECTRICISTA		

PERSONAL		ABRIL 2024	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	**CARGO**		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA	**$ 3.071.000**	**9466873577**
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		
NOHELIA URBANO CERÓN	PRACTICANTE		
CARLOS JESUS LEYTON DAVID	TECNICO ELECTRICISTA		
JHORDAN WILSON PALOMEQUE PALMA	TECNICO ELECTRICISTA		
NELSON DAVID ORTIZ	AUXILIAR OPERATIVO		
ERIC FABIAN RUEDA AGUDELO	AUXILIAR OPERATIVO		

PERSONAL		ABRIL 2024	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	**CARGO**		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA	**$ 2.846.500**	**9469324703**
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
PABLO ALEJANDRO CHAMORRO	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL HSE		
NOHELIA URBANO CERÓN	PRACTICANTE		
JHORDAN WILSON PALOMEQUE PALMA	TECNICO ELECTRICISTA		
ERIC FABIAN RUEDA AGUDELO	AUXILIAR OPERATIVO		

Se presenta planillas como soporte de pago de salud pensión, riesgos y parafiscales desde el mes de diciembre de 2023 hasta el mes de mayo de 2024 anexos al presente informe. (Anexo planillas PILA)

10 CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA

- Durante la obra el contratista realizó actividades encaminadas a la protección ambiental de la zona.
- Se dispuso puntos para el almacenamiento adecuado de residuos naturales del área y residuos sólidos de la obra.
- Se tuvo especial cuidado con las zonas verdes de las instalaciones del Instituto; para no perjudicar las diferentes especies de árboles que hay en el lugar.

11 NOVEDADES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

Falla de luminarias:

En el presente informe se detalla el proceso de diagnóstico y corrección de fallas en luminarias solares instaladas en el Instituto Tecnológico del Putumayo, El objetivo es restaurar el funcionamiento óptimo de las luminarias, asegurando una iluminación eficiente y sostenible.

Se realizó una inspección visual y técnica de las luminarias solares, las siguientes fallas fueron identificadas:

Algunas luminarias no encendían o tenían encendido intermitente por algunas conexiones sueltas en el controlador, y se observó poca capacidad de carga, las cuales, se cambiaron de bombillos led, se cambiaron baterías nuevas y por último se verifico el funcionamiento de las luminarias confirmando que encienden correctamente al oscurecer, se verificó la conexión del panel solar a la luminaria estaba flojo y se ajustó.

Se recomienda al personal del instituto tecnológico del putumayo cuidar y preservar las luminarias evitar de salpicar fluidos como tierra o barro, realizar limpiezas y revisiones periódicas de los paneles solares y sus conexiones. Se debe realizar una revisión de los sensores que se encuentren funcionando correctamente y garantizar el sellado de las luminarias a la intemperie para protegerlas de la humedad y el polvo.













12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN FUNCION DEL PROYECTO

- Se ha ejecutado el 100% del objeto contractual
- El valor ejecutado en el presente informe del contrato de obra 285-2023 es de $74.669.929,90 y el valor pendiente por ejecutar es por la suma de $ 9.363.900,00 valores que son el producto de multiplicar el valor unitario de cada ítem contratado, por la cantidad requerida en la obra donde el saldo pendiente de ejecución fue calculado por la diferencia entre el valor contractual y el valor ejecutado.
- Se aclara que el valor pendiente por ejecutar que corresponde a la suma de $9.363.000,00 es un saldo a favor que queda para el Instituto tecnológico del Putumayo, puesto que, se presentó la necesidad de reajustar la entrega de unas luminarias y se ajustaron en otros soportes diferentes a postes metálicos.

CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ
C.C. 1.124.861.171
REPRESENTANTE LEGAL
DC PROJECT S.A.S

Anexo 1. Registro fotográfico y descripción de actividades ejecutadas.

2.1 EQUIPO DE MEDIDA * MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS



2.2 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5ª





2.3 ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14



2.4 ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS.





3.1 SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

3.2 SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO









EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA:

Que el señor **CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ**, identificado con C.C 1.124.861.171, en calidad de representante legal, de la empresa **DC PROJECT S.A.S.** con NIT No. 901.410.401-8 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Lo anterior acorde con lo dispuesto en el ARTÍCULO 50 de la ley 789 de diciembre de 2002 y el ARTÍCULO 23 de la LEY 1150 de 2007.

Dado en Mocoa, Putumayo a los tres (03) días del mes de mayo de 2024

YESENI VIANNEY CORONEL MELO
Contador Público
TP 305532-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

305532-T

YESENI VIANNEY
CORONEL MELO
C.C. 69008257
RES. INSCRIPCION 0001 DEL 31/01/2023
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

354423 355285



220361/0322

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E8B0609D0B8C8DB0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YESENI VIANNEY CORONEL MELO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 69008257 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 305532-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901410401	8	DC PROJECT S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO CONDOMINIO NORTE	MOCOA-PUTUMAYO	4200600	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	496001878	9464049705	E	2024/03/04	2024/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$2,513,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	13352109	ARAQUE CARLOS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$1,300,000	$65,000
2	CC	1124862605	CHAMORRO PABLO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
3	CC	1123324852	PANTOJA RUTH	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$1,300,000	$65,000
4	CC	1124861171	PAZMIÑO CARLOS	25-14	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$151,700	CCF63	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$52,800	28	$1,213,334	$60,800
5	CC	1004631546	URBANO NOHELIA		0	$0	$0	ESSC18	30	$1,300,000	$162,500	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$1,300,000	$65,000
Total	**Afiliados(5)**					**$5,113,334**	**$818,200**			**$6,413,334**	**$801,700**			**$6,413,334**	**$256,600**			**$6,413,334**	**$313,100**		**$6,413,334**	**$320,800**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$818,200	$0	$819,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$610,200	$0	$610,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$208,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$313,100	$0	$313,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$313,100	$0	$313,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$256,600	$0	$256,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	$256,600	$0	$256,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$801,700	$0	$802,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$162,500	$0	$162,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$639,200	$0	$639,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$192,500	$0	$192,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$192,500	$0	$192,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$128,300	$0	$128,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$128,300	$0	$128,500
TOTAL				**5**	**$2,510,400**	**$0**	**$2,513,000**

2024/03/05 04:16 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901410401	8	DC PROJECT S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO CONDOMINIO NORTE	MOCOA-PUTUMAYO	4200600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	599957386	9466300160	E	2024/04/02	2024/04/26	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$3,148,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	13352109	ARAQUE PARADA CARLOS ORLANDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
2	CC	1124862605	CHAMORRO GOMEZ PABLO ALEJANDRO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1124863712	LEYTON DAVID CARLOS JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1124862071	PALOMEQUE PALMA JHORDAN WILSON	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1123324852	PANTOJA CADENA RUTH ESTELA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
6	CC	1124861171	PAZMIÑO GOMEZ CARLOS GERMAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
7	CC	1004631546	URBANO CERON NOHELIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
8	CC	1093222284	VALENCIA BERMUDEZ JOSE DANIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1124865140	VASQUEZ VALENCIA RICARDO ALFONSO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			**$10,443,334**	**$1,671,000**			**$10,443,334**	**$417,800**			**$10,143,334**	**$405,800**			**$10,443,334**	**$590,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,671,000	$0	$1,705,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,040,000	$0	$1,061,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$631,000	$0	$643,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$590,300	$0	$602,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$590,300	$0	$602,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$405,800	$0	$414,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	9	$405,800	$0	$414,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$417,800	$0	$426,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$52,000	$0	$53,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$104,000	$0	$106,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$261,800	$0	$267,200
TOTAL				**9**	**$3,084,900**	**$0**	**$3,148,200**

2024/05/07 03:47 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901410401	8	DC PROJECT S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO CONDOMINIO NORTE	MOCOA-PUTUMAYO	4200600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	625458326	9466873577	E	2024/05/03	2024/05/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$3,071,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	13352109	ARAQUE PARADA CARLOS ORLANDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
2	CC	1124862605	CHAMORRO GOMEZ PABLO ALEJANDRO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1124851441	DAVID ORTIZ NELSON	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF63	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$54,700	29	$0	$0
4	CC	1124863712	LEYTON DAVID CARLOS JESUS	230301	6	$260,000	$41,600	ESSC18	6	$260,000	$10,400	CCF63	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
5	CC	1124862071	PALOMEQUE PALMA JHORDAN WILSON	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1123324852	PANTOJA CADENA RUTH ESTELA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
7	CC	1124861171	PAZMIÑO GOMEZ CARLOS GERMAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
8	CC	1006962342	RUEDA AGUDELO ERIC FABIAN	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF63	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$54,700	29	$0	$0
9	CC	1004631546	URBANO CERON NOHELIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					**$10,573,334**	**$1,691,800**			**$10,573,334**	**$423,000**			**$10,273,334**	**$411,000**			**$10,573,334**	**$534,900**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,691,800	$0	$1,697,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,241,100	$0	$1,245,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$450,700	$0	$452,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$534,900	$0	$536,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$534,900	$0	$536,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$411,000	$0	$412,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	9	$411,000	$0	$412,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$423,000	$0	$424,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$62,400	$0	$62,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$360,600	$0	$361,800
TOTAL				9	$3,060,700	$0	$3,071,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901410401	8	DC PROJECT S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO CONDOMINIO NORTE	MOCOA-PUTUMAYO	4200600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	737169218	9469324703	E	2024/06/05	2024/06/28	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$2,846,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	13352109	ARAQUE PARADA CARLOS ORLANDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
2	CC	1124862605	CHAMORRO GOMEZ PABLO ALEJANDRO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1124851441	DAVID ORTIZ NELSON	25-14	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF63	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	$22,700	12	$0	$0
4	CC	1124862071	PALOMEQUE PALMA JHORDAN WILSON	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1123324852	PANTOJA CADENA RUTH ESTELA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
6	CC	1124861171	PAZMIÑO GOMEZ CARLOS GERMAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
7	CC	1006962342	RUEDA AGUDELO ERIC FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
8	CC	1004631546	URBANO CERON NOHELIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					**$9,620,000**	**$1,539,200**			**$9,620,000**	**$384,800**			**$9,620,000**	**$384,800**			**$9,620,000**	**$486,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,539,200	$0	$1,567,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,123,200	$0	$1,143,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$423,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$486,700	$0	$495,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$486,700	$0	$495,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$384,800	$0	$391,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	8	$384,800	$0	$391,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$384,800	$0	$391,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$53,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$332,800	$0	$338,900
TOTAL				**8**	**$2,795,500**	**$0**	**$2,846,500**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14972346768

(415)7707212489984(8020) 000001497234676 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 1 0 4 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DC PROJECT S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal
CARR 29 10 16 BRR CONDOMINIO NORTE

42. Correo electrónico dcprojectsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 7 7 3 4 1 9	3 1 9 2 2 2 4 8 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 1	2 0 2 0 0 9 0 9	4 6 6 3	2 0 2 0 0 9 0 9	4 2 9 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 15 / 10 : 39: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUINTANA ANACONA ALEJANDRO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962804043

(415)7707212489984(8020) **000001496280404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 1 0 4 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 9 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 9 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 7 7 2 4 0	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	4 6	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 9 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 2 1 0 2 0 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962804043

(415)7707212489984(8020) **000001496280404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 1 0 4 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 9 1 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 1 6 8 6 5 3 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
QUINTANA	ANACONA	ALEJANDRO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962804043

(415)7707212489984(8020) **000001496280404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 1 0 4 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 7 3 5 3 5 6 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SALAS	GOMEZ	ALICIA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 9 1 0	2 0 2 1 0 2 0 2

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **DC PROJECT S.A.S.**, identificado(a) con NIT número **901.410.401-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0598427789** aperturada el **22 de septiembre del 2020**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **25 de enero del 2024.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0598427789**
Cuenta de 16 dígitos:**0598000200427789**
Cuenta de 20 dígitos:**00130598000200427789**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
