ACTA No.004/2024	
FECHA	16/03/2024
LUGAR	ALCALDÍA MUNICIPIO DE BOCHALEMA
ASISTENTES	
EMPRESA	**NOMBRE**
CONSORCIO SIES 2023	ROLANDO RAMIRO VILLAMIZAR
ALCALDIA DE BOCHALEMA	DIANA MILENA BOLAÑOS
INTERVENTORIA	IVÁN MAURICIO BRITO MEJÍA

TEMAS A TRATAR

Solicitud de traslado de Pantalla LCD del Sistema CCTV - FASE I.

DESARROLLO

En la alcaldía de Bochalema los anteriormente mencionados participantes se reunieron con el fin de tratar el siguiente tema concerniente al contrato LP-003-2023 cuyo objeto es "BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II":

1. El contratista solicita autorización para realizar el traslado de la pantalla LCD perteneciente al Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) Fase I al punto de visualización a instalar en el despacho del alcalde y ubicar la pantalla LCD que inicialmente se proyectó para este punto en el Centro de Control y monitoreo, esto con el fin de generar armonía en las pantallas LCD que conformarán el sistema de Video Wall ya que la perteneciente a la FASE I tiene un desgaste natural, pero se encuentra en perfecto estado.

2. La interventoría ve viable la reubicación de la pantalla que se tenía proyectada para el punto de visualización al Centro de Control de Monitoreo, teniendo en cuenta que daría una mejor presentación al Video Wall.

3. Se confirma por parte de la alcaldía la viabilidad y la reubicación del monitor perteneciente al sistema de CCTV Fase I, teniendo en cuenta que se ubicará en el palacio municipal y se garantizará su remplazo en el Centro de Control y Monitoreo.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Pantalla LCD – Fase I

1374 a 1713

HORA DE INICIO	**11:00 AM**
HORA TERMINA	**12:00 PM**

FIRMAS



ROLANDO VILLAMIZAR
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO SIES



DIANA MILENA BOLAÑOS
SUPERVISOR DE CONTRATO
ALCALDÍA DE BOCHALEMA



IVÁN MAURICIO BRITO MEJA
DIRECTOR INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA

Anexo 3.
Correos enviados y recibidos

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

Aprobación informes mensuales contrato LP-003-2023

interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com
<interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Para: CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

12 de marzo de 2024, 10:22 a.m.

Cordial Saludo

Por medio del presente nos permitimos adjuntar oficio para verificación y fines pertinentes

--
IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
Director de Interventoría
Cel.(57) 3017441295
www.comunipingenieria.com
Colombia

Aprobación de informes.pdf
275K

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

Aprobación cambio de Coordinador de Proyecto LP-003-2023

1 mensaje

interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com 12 de marzo de 2024, 10:34 a.m.
<interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Para: CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

Cordial Saludo:

Por medio de la presente nos permitimos dar respuesta a su solicitud mediante oficio adjunto.

sin otro particular

--
IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
Director de Interventoría
Cel.(57) 3017441295
www.comunipingenieria.com
Colombia

Aprobación Cambio de Coordinador.pdf
270K

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORIA Y CONSULTORIA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

Invitation: Comité de Seguimiento CCTV Bochalema @ Thu Mar 21, 2024 11am - 12pm (GMT-5) (cctv.bochalema@smartycolombia.co)

1 mensaje

Mauricio Brito <hebrito1@gmail.com> 20 de marzo de 2024, 2:07 p.m.
Responder a: Mauricio Brito <hebrito1@gmail.com>
Para: cctv.bochalema@smartycolombia.co, anabolenamezamora@gmail.com, proyectos@netkoln.com, havidnuma@gmail.com, planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co, alejandramirandam06@gmail.com, jsech98@gmail.com, Edgardo Andrés Olier Henao <eolier@gmail.com>

Join with Google Meet

Meeting link

meet.google.com/kmz-foox-wsm

When

Thursday Mar 21, 2024 · 11am – 12pm (Peru Standard Time)

Guests

Mauricio Brito - organizer
anabolenamezamora@gmail.com
proyectos@netkoln.com
havidnuma@gmail.com
planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co
alejandramirandam06@gmail.com
jsech98@gmail.com
Edgardo Andrés Olier Henao
cctv.bochalema@smartycolombia.co

View all guest info

Reply for cctv.bochalema@smartycolombia.co

Yes | No | Maybe | More options

Invitation from Google Calendar

You are receiving this email because you are subscribed to calendar notifications. To stop receiving these emails, go to Calendar settings, select this calendar, and change "Other notifications".

Forwarding this invitation could allow any recipient to send a response to the organizer, be added to the guest list, invite others regardless of their own invitation status, or modify your RSVP. Learn more

invite.ics
3K

1380 a 1713

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

[INTERVENTORÍA CCTV BOCHALEMA]: Petición de recolección de escombros.

1 mensaje

interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com 20 de marzo de 2024, 2:35 p.m.
<interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Para: proyectos@netkoln.com, cctv.bochalema@smartycolombia.co
CC: Planeacion <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>, Anabolenamezamora <anabolenamezamora@gmail.com>, Alejandramirandam06 <alejandramirandam06@gmail.com>

Buen día estimado Anderson.

En recorrido a todos los puntos de intervenciones civiles realizado el día de ayer, se evidencio cantidad de escombros en varios de los puntos de cámara, registro fotográfico que adjunto a este correo.

Siendo consecuentes con el proyecto, es claro que estos son utilizados para evitar el daño de la infraestructura civil hasta que las cajas, concretizado, y canalizaciones, fragüen adecuadamente y tomen la resistencia requerida.

Ayer se identificó adecuaciones con mas de 8 días, para lo cual se solicita de manera urgente, y tal como lo ha manifestado la supervisora del contrato, sea retirados los escombros de los puntos intervenidos de mas de tres días, los cuales corresponden a:

Punto 14
Punto 11
Punto 15
Punto 16
Punto 17
Punto 20
Punto 21
Punto 22
Punto 23
Punto 24
Punto 25
Punto 26.
Punto 27 (Se estaba interviniendo ayer)
Punto 28
Punto 29

Como en recorrido realizado se evidencio la recolección de escombros, por favor compartir registro fotográfico por punto, donde se evidencia la efectiva recolección de escombros de los puntos.

Agradezco su atención y gestión.

Cordial saludo!

--
IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
Director de Interventoría
Cel.(57) 3017441295
www.comunipingenieria.com
Colombia

14 archivos adjuntos



Punto 11.jfif
128K



Punto 20.jfif
272K



Punto 21.jfif
174K



Punto 22.jfif
149K



Punto 23.jfif
203K

Punto 24.jfif
196K



Punto 25.jfif
236K



Punto 26.jfif
225K



Punto 27.jfif
304K

Punto 28.jfif
291K



Punto 29.jfif
186K



Punto 17.jfif
350K



Punto 15.jfif
297K



Punto 16.jfif
379K

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

[INTERVENTORÍA CCTV BOCHALEMA]: Borrador de Acta Nro. 8 para aprobación o realimentación.

1 mensaje

interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com 20 de marzo de 2024, 7:34 p.m.
<interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Para: Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>, Planeacion <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>, Anabolenamezamora <anabolenamezamora@gmail.com>, Proyectos <proyectos@netkoln.com>, cctv.bochalema@smartycolombia.co, alejandramirandam06@gmail.com, eolier@gmail.com, jsech98@gmail.com

Buen día estimados.

Adjunto envío el borrador del Acta del comité del pasado jueves 14 de Marzo de 2024, para su revisión.

La idea es recoger las firmas esta semana.

Cordial saludo!

--
IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
Director de Interventoría
Cel.(57) 3017441295
www.comunipingenieria.com
Colombia

8. ACTA DE REUNION NRO. 008 14_03_2024_sin firmas.docx
739K

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

[INTERVENTORÍA CCTV BOCHALEMA]: Solicitud de espacio de reunión virtual.

1 mensaje

interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com 21 de marzo de 2024, 3:46 p.m.
<interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Para: nelson.mogollon@cens.com.co
CC: Proyectos <proyectos@netkoln.com>, cctv.bochalema@smartycolombia.co, Planeacion <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>, Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>

Buen día estimado Nelson.

De acuerdo a lo conversado telefónicamente, se viene adelantando el proyecto con contrato: LP-003-2023, que tiene por objeto: "BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCT) FASE II", donde se esta realizando la instalación de 21 puntos de cámara.

Dentro del proyecto se tiene contemplado la utilización de infraestructura (Postería) de CENS, para lo cual debe surtir un convenio o contrato entre el Municipio de Bochalema y ustedes.

El contrato tiene fecha de terminación el 30 de Abril de 2024, por lo que nos encontramos próximos a la finalización, y obviamente con este pendiente es posible la culminación del proyecto.

Tras lo anterior, se quiere hacer una reunión con todas las partes, para que busquemos como darle celeridad al tema, y tal vez plantear alguna solución mientras el tramite finaliza.

Conforme lo conversado telefónicamente, se plantea este espacio para mañana a las 4pm, espacio tentativo para que verifiques con los compañeros que me indicas si es posible ese espacio, o se plantee un nuevo espacio.

Agradezco mucho su atención y gestión.

Quedo atento.

Cordial saludo!

--
IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
Director de Interventoría
Cel.(57) 3017441295
www.comunipingenieria.com
Colombia

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

[INTERVENTORÍA CCTV BOCHALEMA]: Hallazgos en visita realizada del 19 de Marzo de 2024.

1 mensaje

interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com 26 de marzo de 2024, 7:26 a.m.
<interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Para: CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>, Andreson <proyectos@netkoln.com>
CC: Alejandramirandam06 <alejandramirandam06@gmail.com>, Edgar Andres Olier <eolier@gmail.com>, Planeacion <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>, Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>, Anabolenamezamora <anabolenamezamora@gmail.com>, Juan Sebastian Echeverry <jsech98@gmail.com>

Buen día señores CONSORCIO SIES 2023

Adjunto envío documento de hallazgos encontrados en la visita conjunta del 19 de Marzo de 2024.

Por favor hacer allegar la evidencia de subsanación de los mismos.

Agradezco su atención y gestión.

Quedo atento.

Cordial saludo!

--
IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
Director de Interventoría
Cel.(57) 3017441295
www.comunipingenieria.com
Colombia

011. Oficio Nro. 011. Hallazgos en revisión 19_03_2024.pdf
4812K

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

Usted sido invitado a "Revisión del avance del tramite de alquiler postería CENS en Bochalema."

2 mensajes

interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com 26 de marzo de 2024, 7:37 a.m.
<interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Para: CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

Revisión del avance del tramite de alquiler postería CENS en Bochalema.

When: 2024-05-04 16:00 - 17:00 (America/Bogota)

Invitees: interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com,
CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>,
Andreson <proyectos@netkoln.com>,
Nelson Mogollon <nelson.mogollon@cens.com.co>,
Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>,
Planeacion <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>

Se adjunta un archivo iCalendar con los detalles del evento actualizados que se puede importar a la aplicación de calendario.

event.ics
3K

interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com 26 de marzo de 2024, 7:37 a.m.
<interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Para: CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

[Texto citado oculto]

event.ics
3K

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

DOCUMENTACIÓN PROYECTO BOCHALEMA

1 mensaje

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co> 4 de marzo de 2024, 4:31 p.m.
Para: nelson.mogollon@cens.com.co
CCO: CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

Buena tarde

Cordial saludo,

De forma respetuosa, me permito remitir la documentación concerniente al proyecto que se ejecutará en el municipio de Bochalema, Norte de Santander y que tiene por objeto: “BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II”para la viabilidad del uso de la infraestructura de la empresa CENS.

Quedo atento a sus comentarios y cualquier requerimiento adicional

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

6 archivos adjuntos

- **1. Plano Red de posteria.dwg** 2822K
- **2. KMZ Bochalema CCTV Fase II .kmz** 56K
- **3. Plantilla uso infraestructura eléctrica Bochalema.xlsx** 56K
- **5. Especificaciones técnicas de los elementos a instalar.pdf** 965K
- **4. AUTORIZACION TERCERO CENS.pdf** 497K
- **6. Certificado de Vigencia Matricula profesional.pdf** 98K

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

INFORME MENSUAL 004-FEBRERO DE 2024

1 mensaje

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co> 4 de marzo de 2024, 6:07 p.m.
Para: interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com

Buen día

Cordial saludo,

Adjunto oficio del asunto.

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

2 archivos adjuntos

INFORME MENSUAL 004 FEBRERO DE 2024 CON ANEXOS.pdf
23643K

CSIES-BOCHALEMA-0013-2024 - INFORME MENSUAL - FEBRERO.pdf
183K

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

PLAN DE CHOQUE CONTRATO LP-003-2023

1 mensaje

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co> 7 de marzo de 2024, 9:59 a.m.
Para: interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com, "havid.numa@mininterior.gov.co" <Havid.numa@mininterior.gov.co>, planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co

Buen día

Cordial saludo,

De forma respetuosa, adjunto oficio del asunto

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

2 archivos adjuntos

CSIES-BOCHALEMA-0014-2024 - PLAN DE CHOQUE.pdf
187K

BOCHALEMA CCTV PDC.xlsx
76K

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

SOLICITUD DE PODA DE ÁRBOLES

1 mensaje

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co> 12 de marzo de 2024, 7:04 p.m.
Para: planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co

Buen día

Cordial saludo,

Adjunto oficio del asunto.

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

CSIES-BOCHALEMA-0015-2024 - PODA DE ÁRBOLES.pdf
192K

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 9

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 10

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 10

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 11

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 11

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA

CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 12

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 12

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 13

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



HINCADO POSTE DE APOYO



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

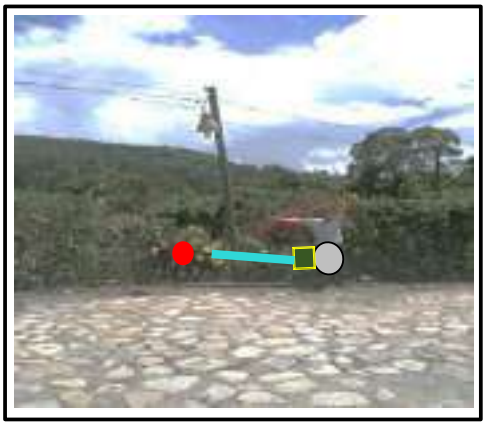
CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 14

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023


MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 14

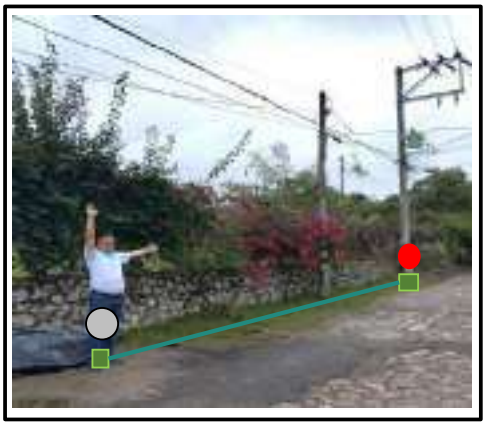REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 15

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 15

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 16

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 16

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 17

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 17

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 18

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-001-155-2023

PC 18

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 19

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 19

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 20

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 20

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 21

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 21

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 22

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 22

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 23

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023


MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 23

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 24

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 25

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 26

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 26

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 27

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 27

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 28

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 28

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 29

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE DEL POSTE



EXCAVACIÓN SITIO POSTE



HINCADO DE POSTE



UBICACION POSTE FINAL Y GABINETE

CONSORCIO SIES 2023

MENTE Y HONOR
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Interior

INFORME DESCRIPTIVO PUNTO DE CÁMARA
CONTRATO N°LP-003-2023

PC 29

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA REGISTRO SPT



PANORÁMICA ANTES



CAJA DE 60*60 ABIERTA



CAJA DE 60*60 CERRADA



PANORÁMICA CANALIZACIÓN

Anexo 5.
Acta parcial de avance

Seguimiento Ejecución Presupuestal

Convenio 1612

Fecha seguimiento: 31 Marzo 2024

	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	PRECONFIGURACION	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PUESTA EN MARCHA	DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO FINANCIERO
Total Estudios y Diseños IVA incluido	1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	Unid	1						100%	4,12%	$ 71.653.878,00
Fase II: fase Implementación	2	CÁMARAS DOMO PTZ. TIPO 1.	Unid	21	21	21	21	21			15,50%	$ 269.194.032,24
	3	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS	UND	0							0,00%	$ -
	4	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	MTS	7344	7344	1000	1000	1000			7,26%	$ 126.063.429,60
	5	SWITCH TIPO 4	UND	1	1	1	1				0,98%	$ 16.964.544,12
	6	SWITCH TIPO 1	UND	21	21	21	21	21			5,22%	$ 90.680.386,23
	7	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	UND	2	2	2					1,43%	$ 24.856.959,00
	10	MONITOR OPERADOR CCTV	UND	2	2						0,15%	$ 2.574.267,30
	11	ESTACIÓN DE TRABAJO OPERADOR	UND	1	1	1	1				1,08%	$ 18.728.754,00
	13	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	1	1	1	1				0,21%	$ 3.655.539,60
	14	UPS 1.5KVA	UND	21	21	21	21	21			5,42%	$ 94.108.492,80
	17	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CÁMARA	UND	21	21	21	21	21			10,75%	$ 186.803.844,78
	23	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU	UND	1	1	1					0,38%	$ 6.589.143,00
	24	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	UND	21	21	21	21	21	21		6,07%	$ 105.402.692,64
	25	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	21	21	21	21	21	21		4,35%	$ 75.577.148,22
	26	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	21	21	21	21	21			0,46%	$ 8.072.647,38
	27	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	UND	21	21	21	21	21	21		0,66%	$ 11.468.987,04
	28	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	4	4	4	4	4			0,26%	$ 4.449.482,76
	29	PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NORMAL	UND	4	4	4	4	4			0,27%	$ 4.628.483,52
	30	PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA	UND	4	4	4	4	4			0,29%	$ 5.002.158,96
	31	SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA (PUNTOS DE CÁMARA Y CENTRO CONTROL Y NODO)	UND	21	21	18		18			2,65%	$ 46.032.241,14
	32	MÓDULOS - PUESTOS DE TRABAJO	UND	1	1						0,13%	$ 2.322.556,40
	37	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN SALA DE CONTROL	GLB	1	1	1	1	0,7			1,90%	$ 33.063.800,00
	39	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS Y NODOS	UND	22	21	21	21	21			4,02%	$ 69.852.630,12
	40	PUNTO DE VISUALIZACIÓN ENTIDAD TERRITORIAL	GLB	1	1	1	1	0,5			2,80%	$ 48.587.977,02
		total Implementación (incluido Impuestos)										

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN	TOTALES	76,35%	$ 1.326.334.075,87

$ 1.665.625.403,00

ING. DIANA MILENA BOLAÑOS DUARTE
SUPERVISOR CONVENIO - MUNICIPIO

ING. RAFAEL PABON LOPEZ
DIRECTOR DE PROTECTO
CONSORCIO SIES 2023

Anexo 6.
Planilla integradora de pagos
001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Carrera 13A No.29-24 Piso 21
Bogotá, D.C.

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el de _____ de, manera atenta solicitamos los siguientes giros:

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES					**SNF-GP-FOT08**
Proceso: Gestión de pagos Negocios Fiduciarios				**Responsable:** Gerente de Servicios y Transformación Negocios Fiduciarios	**00**
Clasificación de la Información Registrada: Uso interno y externo					**10/11/2023**
Uso de la Información: Reservada					

NOMBRE FIDEICOMISO	**P.A. ANT. CONS. SIES 2023**				
CIUDAD:	**Bucaramanga**	**CÓDIGO DE NEGOCIO**	**31910**	**No. Orden**	**001**
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:			**500805294869**	**BANCO**	**Banco Popular**
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No				**GMF (4*1000)**	**Gravada**
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					**SI**

Validar Operaciones | Impresión | Duplicar

CAUSAR Y PAGAR

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO									CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT						VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	N° CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO				
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2															NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FV-2129927	NIT	830.018.214	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.				Ups 2Kva Monofasica On Line Tipotorre, Snmptxwebpro Snmp Web Prointernal Slot Mounted V Protocol	33.855.730,48					33.855.730,48	ACH	Banco de Bogota	045046000	CC	SI	NIT	830.018.214	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.				Ups 2Kva Monofasica On Line Tipotorre, Snmptxwebpro Snmp Web Prointernal Slot Mounted V Protocol
2	FV-2141517	NIT	830.018.214	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.				Ups 2Kva Monofasica On Line Tipotorre, Snmptxwebpro Snmp Web Prointernal Slot Mounted V Protocol	11.334.669,26					11.334.669,26	ACH	Banco de Bogota	045046000	CC	SI	NIT	830.018.214	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.				Ups 2Kva Monofasica On Line Tipotorre, Snmptxwebpro Snmp Web Prointernal Slot Mounted V Protocol
3	CO2309011	NIT	900.979.802	HIKVISION COLOMBIA S A S				Cámaras Domo, Cámaras Fijas, Monitor De Visualización, Sistema De Visualización, Joystick De Operación, Sistema De Almacenamiento Por Cámara, Software De Visualización Control Y Administración, Servidor, Control De Acceso Facial, Estación De Trabajo Operador	88.109.244,68					88.109.244,68	ACH	Bancolombia	63900003281	CH	SI	NIT	900.979.802	HIKVISION COLOMBIA S A S				Cámaras Domo, Cámaras Fijas, Monitor De Visualización, Sistema De Visualización, Joystick De Operación, Sistema De Almacenamiento Por Cámara, Software De Visualización Control Y Administración, Servidor, Control De Acceso Facial, Estación De Trabajo Operador
4	6075-00291/24	NIT	901.192.317	SYSCOM COLOMBIA SAS				Fibra Óptica	18.851.016,51					18.851.016,51	ACH	Banco de Occidente	231839408	CC	SI	NIT	901.192.317	SYSCOM COLOMBIA SAS				Fibra Óptica
5	02-1032	NIT	901.218.332	ITC PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES S.A				Postes Tipo 1, Tapas Y Marcos E Instalación	6.920.400,00					6.920.400,00	ACH	Bancolombia	82000005075	CH	SI	NIT	901.218.332	ITC PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES S.A.				Postes Tipo 1, Tapas Y Marcos E Instalación

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES **$ 159.071.060,93** **VALOR NETO OPERACIONES** **$ 159.071.060,93**

*** Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Popular S.A. con ocasión de este formato certifico:**
i) Que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos aquí contenidos para que la información sea tratada con el fin de procesar y hacer seguimiento a los pagos y/o giros instruidos; y
ii) Que he dado cumplimiento a las normas referentes a la protección y tratamiento de datos.
** Certifico que los pagos instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario.*
** Certifico que los pagos instruidos en los fideicomisos de la línea de anticipos se han practicado las retenciones conforme a la normatividad vigente.*

El registro de las firmas están sujetas a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago.

FIRMA AUTORIZADA		**FIRMA AUTORIZADA**		**FIRMA AUTORIZADA**	
NOMBRE:		**NOMBRE:**		**NOMBRE:**	RAFAEL PABÓN LÓPEZ
CARGO:		**CARGO:**		**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SIES 2023
ELABORÓ		**REVISÓ**		**APROBÓ**	

FIRMA AUTORIZADA		
NOMBRE:	IVÁN MAURICIO BRITO MEJÍA	
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
APROBÓ		

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Carrera 13A No.29-24 Piso 21

Bogotá, D.C.

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el de _____ de, **manera atenta solicitamos los siguientes giros:**

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES					**SNF-GP-FOT08**
Proceso: Gestión de pagos Negocios Fiduciarios				**Responsable:** Gerente de Servicios y Transformación Negocios Fiduciarios	**00**
Clasificación de la Información Registrada: Uso interno y externo					**10/11/2023**
Uso de la Información: Reservada					

NOMBRE FIDEICOMISO	**P.A. ANT. CONS. SIES 2023**				
CIUDAD:	**Bucaramanga**	**CÓDIGO DE NEGOCIO**	**31910**	**No. Orden**	**002**
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:			**500805294869**	**BANCO**	**Banco Popular**
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No				**GMF (4*1000)**	**Gravada**
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					**SI**

Validar Operaciones | Impresión | Duplicar

CAUSAR Y PAGAR

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO									CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT						VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	N° CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO				
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2															NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	No. 1-3	NIT	900.183.676	LMC TECNOLOGIA S.A.S.				Monitor Operador Cctv, Brazo Escualizable Para Doble Monitor. F160. (Importado)	2.924.150,00					2.924.150,00	ACH	Bancolombia	14129647637	CC	SI	NIT	900.183.676	LMC TECNOLOGIA S.A.S.				Monitor Operador Cctv, Brazo Escualizable Para Doble Monitor. F160. (Importado)
2	C112	NIT	901.031.933	COMCAST TECHNOLOGY S.A.S				Materiales y herramientas	6.171.600,61					6.171.600,61	ACH	Bancolombia	83469183567	CH	SI	NIT	901.031.933	COMCAST TECHNOLOGY S.A.S				Materiales y herramientas
3	2042	NIT	900.988.445	COPCO INGENIERIA - COMPAÑIA DE CONSTRUC				Mini-Split, Capacidad 24.000 Btu, Modelo Vs242C7, Marca Lg, Dual Cool Inverter Sin Wifi, A 220V, Con 3 Metros Tubería De Cobre	3.574.557,85					3.574.557,85	ACH	Bancolombia	02062956561	CH	SI	NIT	900.988.445	COPCO INGENIERIA - COMPAÑIA DE CONSTRUC				Mini-Split, Capacidad 24.000 Btu, Modelo Vs242C7, Marca Lg, Dual Cool Inverter Sin Wifi, A 220V, Con 3 Metros Tubería De Cobre
4	243568	NIT	860.030.723	MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS S A S				Materiales y herramientas	5.749.784,88					5.749.784,88	ACH	Banco de Bogota	036147296	CH	SI	NIT	860.030.723	MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS S A S				Materiales y herramientas

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES | **VALOR BRUTO OPERACIONES** $ 18.420.093,34 | **VALOR NETO OPERACIONES** $ 18.420.093,34

*** Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Popular S.A. con ocasión de este formato certifico:**

i) Que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos aquí contenidos para que la información sea tratada con el fin de procesar y hacer seguimiento a los pagos y/o giros instruidos; y

ii) Que he dado cumplimiento a las normas referentes a la protección y tratamiento de datos.

** Certifico que los pagos instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario.*

** Certifico que los pagos instruidos en los fideicomisos de la línea de anticipos se han practicado las retenciones conforme a la normatividad vigente.*

El registro de las firmas están sujetas a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago.

FIRMA AUTORIZADA		**FIRMA AUTORIZADA**		**FIRMA AUTORIZADA**	**FIRMA AUTORIZADA**
NOMBRE:		**NOMBRE:**		**NOMBRE:** RAFAEL PABÓN LÓPEZ	**NOMBRE:** IVÁN MAURICIO BRITO MEJÍA
CARGO:		**CARGO:**		**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SIES 2023	**CARGO:** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ELABORÓ		**REVISÓ**		**APROBÓ**	**APROBÓ**

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Carrera 13A No.29-24 Piso 21
Bogotá, D.C.

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el de _____ de, **manera atenta solicitamos los siguientes giros:**

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES					**SNF-GP-FOT08**
Proceso: Gestión de pagos Negocios Fiduciarios				**Responsable:** Gerente de Servicios y Transformación Negocios Fiduciarios	**00**
Clasificación de la Información Registrada: Uso interno y externo					**10/11/2023**
Uso de la Información: Reservada					

NOMBRE FIDEICOMISO	**P.A. ANT. CONS. SIES 2023**				
CIUDAD:	**Bucaramanga**	**CÓDIGO DE NEGOCIO**	**31910**	**No. Orden**	**003**
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:		**500805294869**	**BANCO**		**Banco Popular**
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No			**GMF (4*1000)**		**Exenta**
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					**SI**

Validar Operaciones | Impresión | Duplicar

CAUSAR Y PAGAR

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO									CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT						VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	N° CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO				
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2															NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FEVE 90	NIT	900.808.866	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.				Contrato de mano de obra Eléctrica, centro de control y monitoreo, fase 1, fase 2 y punto de visualización	149.344.812,32					149.344.812,32	ACH	Banco de Bogota	614289288	CC	SI	NIT	900.808.866	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.				Contrato de mano de obra Eléctrica, centro de control y monitoreo, fase 1, fase 2 y punto de visualización
xxx	**OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES**													xxxx						**VALOR BRUTO OPERACIONES**	**$ 149.344.812,32**	**VALOR NETO OPERACIONES**	**$ 149.344.812,32**			

*** Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Popular S.A. con ocasión de este formato certifico:**
i) Que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos aquí contenidos para que la información sea tratada con el fin de procesar y hacer seguimiento a los pagos y/o giros instruidos; y
ii) Que he dado cumplimiento a las normas referentes a la protección y tratamiento de datos.
** Certifico que los pagos instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario.*
** Certifico que los pagos instruidos en los fideicomisos de la línea de anticipos se han practicado las retenciones conforme a la normatividad vigente.*

El registro de las firmas están sujetas a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago.

FIRMA AUTORIZADA		**FIRMA AUTORIZADA**		**FIRMA AUTORIZADA**		**FIRMA AUTORIZADA**	
NOMBRE:		**NOMBRE:**		**NOMBRE:**	RAFAEL PABÓN LÓPEZ	**NOMBRE:**	IVÁN MAURICIO BRITO MEJÍA
CARGO:		**CARGO:**		**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SIES 2023	**CARGO:**	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ELABORÓ		**REVISÓ**		**APROBÓ**		**APROBÓ**	

1440 a 1713

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Carrera 13A No.29-24 Piso 21
Bogotá, D.C.

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el de _____ de, manera atenta solicitamos los siguientes giros:

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES					**SNF-GP-FOT08**
Proceso: Gestión de pagos Negocios Fiduciarios				**Responsable:** Gerente de Servicios y Transformación Negocios Fiduciarios	**00**
Clasificación de la Información Registrada: Uso interno y externo					**10/11/2023**
Uso de la Información: Reservada					

NOMBRE FIDEICOMISO	**P.A. ANT. CONS. SIES 2023**				
CIUDAD:	**Bucaramanga**	**CÓDIGO DE NEGOCIO**	**31910**	**No. Orden**	**004**
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:			**500805294869**	**BANCO**	**Banco Popular**
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No				**GMF (4*1000)**	**Exenta**
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					**SI**

Validar Operaciones | Impresión | Duplicar

CAUSAR Y PAGAR

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO										CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT						VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO				
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2															NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FE 1007	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Gabinetes De Poste/Fachada, Coronas Anti Escalatorias, Brazos De Soporte Para Cámaras, Gabinete Para Cuarto De Equipos, Transformadores De Gabinetes	$ 48.817.461,00					48.817.461,00	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Gabinetes De Poste/Fachada, Coronas Anti Escalatorias, Brazos De Soporte Para Cámaras, Gabinete Para Cuarto De Equipos, Transformadores De Gabinetes
2	FE 1054	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Gabinetes De Poste/Fachada, Coronas Anti Escalatorias, Brazos De Soporte Para Cámaras, Gabinete Para Cuarto De Equipos, Transformadores De Gabinetes	$ 1.766.140,00					1.766.140,00	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Gabinetes De Poste/Fachada, Coronas Anti Escalatorias, Brazos De Soporte Para Cámaras, Gabinete Para Cuarto De Equipos, Transformadores De Gabinetes
3	FE 1055	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Gabinetes De Poste/Fachada, Coronas Anti Escalatorias, Brazos De Soporte Para Cámaras, Gabinete Para Cuarto De Equipos, Transformadores De Gabinetes	$ 2.970.000,00					2.970.000,00	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Gabinetes De Poste/Fachada, Coronas Anti Escalatorias, Brazos De Soporte Para Cámaras, Gabinete Para Cuarto De Equipos, Transformadores De Gabinetes
4	PROFORMA 1-65	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Switch Tipo 6, Switch Tipo 1, Sfp Receptor, Sfp Transmisor	$ 39.934.810,16					39.934.810,16	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Switch Tipo 6, Switch Tipo 1, Sfp Receptor, Sfp Transmisor
5	IC-67876	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas	$ 2.305.329,41					2.305.329,41	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas
6	IC-68888	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas	$ 17.849.019,82					17.849.019,82	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas
7	IC-68885	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas	$ 1.843.588,02					1.843.588,02	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas
8	991411744 42	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas	$ 4.034.900,00					4.034.900,00	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas
9	LE-751	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas	$ 3.292.517,59					3.292.517,59	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas
10	FT160444	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas	$ 4.983.800,00					4.983.800,00	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas
11	FEV13338	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas	$ 5.722.082,52					5.722.082,52	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas
xxx	**OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES**													xxxx							**VALOR BRUTO OPERACIONES**	**$ 133.519.648,54**	**VALOR NETO OPERACIONES**	**$ 133.519.648,54**		

*** Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Popular S.A. con ocasión de este formato certifico:**

i) Que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos aquí contenidos para que la información sea tratada con el fin de procesar y hacer seguimiento a los pagos y/o giros instruidos; y
ii) Que he dado cumplimiento a las normas referentes a la protección y tratamiento de datos.
** Certifico que los pagos instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario.*
** Certifico que los pagos instruidos en los fideicomisos de la línea de anticipos se han practicado las retenciones conforme a la normatividad vigente.*

El registro de las firmas están sujetas a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago.

FIRMA AUTORIZADA	**FIRMA AUTORIZADA**	**FIRMA AUTORIZADA**	**FIRMA AUTORIZADA**
NOMBRE:	**NOMBRE:**	**NOMBRE:** RAFAEL PABÓN LÓPEZ	**NOMBRE:** IVÁN MAURICIO BRITO MEJÍA
CARGO:	**CARGO:**	**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SIES 2023	**CARGO:** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**	**APROBÓ**

FIDUCIARIA POPULAR S.A. Carrera 13A No.29-24 Piso 21 Bogotá, D.C.	**PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES**	**SNF-GP-FOT08**
	Proceso: Gestión de pagos Negocios Fiduciarios — **Responsable:** Gerente de Servicios y Transformación Negocios Fiduciarios	**00**
	Clasificación de la Información Registrada: Uso interno y externo **Uso de la Información:** Reservada	**10/11/2023**

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el de _____ de, manera atenta solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDEICOMISO	**P.A. ANT. CONS. SIES 2023**				
CIUDAD:	**Bucaramanga**	**CÓDIGO DE NEGOCIO**	**31910**	**No. Orden**	**005**
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:			**500805294869**	**BANCO**	**Banco Popular**
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No				**GMF (4*1000)**	**Exenta**
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					**SI**

CAUSAR Y PAGAR

Validar Operaciones | Impresión | Duplicar

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO										CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT						VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO				
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2															NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FEV-1	CEDULA	5.476.433	RAFAEL		PABON	SUAREZ	Apoyo administrativo y logística	80.000.000,00					80.000.000,00	ACH	Banco Davivienda S.A.	066870082972	CH	SI	CEDULA	5.476.433	RAFAEL		PABON	SUAREZ	Apoyo administrativo y logística
xxx	OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES													xxxx												

VALOR BRUTO OPERACIONES **$ 80.000.000,00** **VALOR NETO OPERACIONES** **$ 80.000.000,00**

*** Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Popular S.A. con ocasión de este formato certifico:**

i) Que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos aquí contenidos para que la información sea tratada con el fin de procesar y hacer seguimiento a los pagos y/o giros instruidos; y
ii) Que he dado cumplimiento a las normas referentes a la protección y tratamiento de datos.
** Certifico que los pagos instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario.*
** Certifico que los pagos instruidos en los fideicomisos de la línea de anticipos se han practicado las retenciones conforme a la normatividad vigente.*

El registro de las firmas están sujetas a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago.

FIRMA AUTORIZADA		**FIRMA AUTORIZADA**		**FIRMA AUTORIZADA**	**FIRMA AUTORIZADA**
NOMBRE:		**NOMBRE:**		**NOMBRE:** RAFAEL PABÓN LÓPEZ	**NOMBRE:** IVÁN MAURICIO BRITO MEJÍA
CARGO:		**CARGO:**		**CARGO:** RESPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SIES	**CARGO:** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ELABORÓ		**REVISÓ**		**APROBÓ**	**APROBÓ**

1442 a 1713

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Carrera 13A No.29-24 Piso 21
Bogotá, D.C.

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el de _____ de, manera atenta solicitamos los siguientes giros:

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES		SNF-GP-FOT08
Proceso: Gestión de pagos Negocios Fiduciarios	**Responsable:** Gerente de Servicios y Transformación Negocios Fiduciarios	00
Clasificación de la Información Registrada: Uso interno y externo		10/11/2023
Uso de la Información: Reservada		

NOMBRE FIDEICOMISO	**P.A. ANT. CONS. SIES 2023**				
CIUDAD:	Bucaramanga	**CÓDIGO DE NEGOCIO**	31910	**No. Orden**	006
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:		500805294869	**BANCO**		Banco Popular
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No			**GMF (4*1000)**		Exenta
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					SI

Validar Operaciones | Impresión | Duplicar

CAUSAR Y PAGAR

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO										CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT						VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	N° CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO				
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2															NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	FE-3	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Mano De Obra Calle	$ 19.795.918,11					19.795.918,11	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Mano De Obra Calle
2	FEV13434	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas	$ 3.049.159,70					3.049.159,70	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Materiales y herramientas
3	C-1-3	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Postes Tipo 1, Tapas Y Marcos E Instalación	$ 57.312.012,00					57.312.012,00	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Postes Tipo 1, Tapas Y Marcos E Instalación
4	11G-362361	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Otros gastos generados en la eiecución del contrato	$ 179.153,31					179.153,31	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Otros gastos generados en la eiecución del contrato
5	11G-362655	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Otros gastos generados en la eiecución del contrato	$ 537.688,41					537.688,41	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Otros gastos generados en la eiecución del contrato
6	F. 491077462 3191	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Impuestos proveedores nacionales y distritales	$ 1.114.000,00					1.114.000,00	ACH	Bancolombia	07300007540	CH	SI	NIT	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023				Impuestos proveedores nacionales y distritales

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES | **VALOR BRUTO OPERACIONES** $ 81.987.931,53 | **VALOR NETO OPERACIONES** $ 81.987.931,53

*** Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Popular S.A. con ocasión de este formato certifico:**
i) Que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos aquí contenidos para que la información sea tratada con el fin de procesar y hacer seguimiento a los pagos y/o giros instruidos; y
ii) Que he dado cumplimiento a las normas referentes a la protección y tratamiento de datos.
** Certifico que los pagos instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario.*
** Certifico que los pagos instruidos en los fideicomisos de la línea de anticipos se han practicado las retenciones conforme a la normatividad vigente.*

El registro de las firmas están sujetas a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago.

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE:	**NOMBRE:**	**NOMBRE:** RAFAEL LÓPEZ PABÓN	**NOMBRE:** IVÁN MAURICIO BRITO MEJÍA
CARGO:	**CARGO:**	**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SIES 2023	**CARGO:** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**	**APROBÓ**

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Carrera 13A No.29-24 Piso 21
Bogotá, D.C.

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el de _____ de, **manera atenta solicitamos los siguientes giros:**

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES		SNF-GP-FOT08
Proceso: Gestión de pagos Negocios Fiduciarios	**Responsable:** Gerente de Servicios y Transformación Negocios Fiduciarios	00
Clasificación de la Información Registrada: Uso interno y externo		10/11/2023
Uso de la Información: Reservada		

NOMBRE FIDEICOMISO	**P.A. ANT. CONS. SIES 2023**				
CIUDAD:	**Bucaramanga**	**CÓDIGO DE NEGOCIO**	**31910**	**No. Orden**	**007**
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:			**500805294869**	**BANCO**	**Banco Popular**
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No				**GMF (4*1000)**	**Exenta**
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					**SI**

CAUSAR Y PAGAR

Validar Operaciones | Impresión | Duplicar

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO										CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT						VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO				
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2															NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1	EV-3	CEDULA	4.574.215	ENRIQUE		VALENCIA	LOPEZ	Tendido De Fibra Óptica	$ 56.000.000,00					56.000.000,00	ACH	Scotiabank - Red Multibanca Colpatria S. A.	702170192	CH	SI	CEDULA	4.574.215	ENRIQUE		VALENCIA	LOPEZ	Tendido De Fibra Óptica
xxx	**OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES**													xxxx				**VALOR BRUTO OPERACIONES**		**$ 56.000.000,00**		**VALOR NETO OPERACIONES**		**$ 56.000.000,00**		

*** Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Popular S.A. con ocasión de este formato certifico:**
i) Que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos aquí contenidos para que la información sea tratada con el fin de procesar y hacer seguimiento a los pagos y/o giros instruidos; y
ii) Que he dado cumplimiento a las normas referentes a la protección y tratamiento de datos.
** Certifico que los pagos instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario.*
** Certifico que los pagos instruidos en los fideicomisos de la línea de anticipos se han practicado las retenciones conforme a la normatividad vigente.*

El registro de las firmas están sujetas a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago.

FIRMA AUTORIZADA	**FIRMA AUTORIZADA**		**FIRMA AUTORIZADA**	**FIRMA AUTORIZADA**
NOMBRE:	**NOMBRE:**		**NOMBRE:** RAFAEL PABÓN LÓPEZ	**NOMBRE:** IVAN MAURICIO BRITO MEJÍA
CARGO:	**CARGO:**		**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SIES 2023	**CARGO:** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ**		**APROBÓ**	**APROBÓ**

Anexo 7.
Adenda Modificatoria N°001 de 2024

ADENDA MODIFICATORIA No 001 de 2024	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATO N°	LP -003-2023
OBJETO	BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BOCHALEMA NIT 890505662-3
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA C.C. N° 1.093.140.227 expedida en Bochalema
CONTRATISTA	CONSORCIO SIES 2023 R.L. RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL	Nit 901.770.539-9 c.c. 88.269.550 de Cúcuta
VALOR DEL CONTRATO	MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($1.737.279.281.oo) M/CTE
DURACIÓN	TRES (3) MESES
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Secretaria de Planeación
INTERVENTOR	Por parte del Ministerio del interior
FORMA DE PAGO	El Municipio pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales
GARANTÍAS	N.A.

Entre los suscritos: **RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.093.140.227 expedida en Bochalema, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Bochalema con NIT 890505662-3, en su condición de Representante Legal, circunstancia que acredita con el acta 003 de fecha veintinueve (29) de diciembre de 2023, realizada ante la Notaria Segunda del Círculo de Pamplona, donde tomó posesión como Alcalde Municipal para el periodo constitucional 2024-2027, debidamente facultado para firmar contratos según lo dispuesto en ley 1551 de 2012, articulo 18 parágrafo 4 y articulo 29; Ley 80 de 1993, articulo 11, numeral 3; Articulo 315 numeral 3 Constitución política; Ley 136 de 1994, Articulo 91, Artículo modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012; Artículo 110 del decreto 111 de 1996, Articulo modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO,** por una parte; y por la otra **CONSORCIO SIES 2023 NIT 901.770.539-9 representada legalmente por RAFAEL PABON LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía numero 88.269.550** expedida en Cúcuta, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido en celebrar la presente adenda modificatoria teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Municipio de Bochalema adelanto el proceso contractual denominado licitación publica No 003 de 2023 cuyo objeto es BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II
2. Que el proceso fue adjudicado **CONSORCIO SIES 2023 NIT 901.770.539-9 representada legalmente por RAFAEL PABON LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía numero 88.269.550** expedida en Cúcuta, por un plazo de tres (03) meses y un valor de MIL

1446 a 1713

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($1.737.279.281.oo) M/CTE

3. Que el contrato Lp 003-2023 cuenta con el registro presupuestal No AL 1121 -001 del 21 de noviembre de 2023
4. Que el contratista presento pólizas que garantizan el cumplimiento del objeto contractual las cuales fueron aprobadas por parte del Municipio
5. Que se suscribió acta de inicio del contrato LP 003-2023, el día 28 de noviembre de 2023, teniendo como plazo de ejecución del contrato el 27 de febrero de 2024
6. Que mediante comunicación telefónica adelantada con el contratista y la secretaria de planeación municipal, el contratista manifiesta que para la ejecución de la obra se requiere el desembolso del anticipo establecido en los pliegos de condiciones correspondiente al 40% del valor del contrato
7. Que revisado los pliegos de condiciones establecidos dentro de proceso contractual LP 003-2023 se puede establecer que la forma de pago establecida corresponde a

2.4. FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO DE BOCHALEMA a través de la Secretaria de Planeación, cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera:

UN PRIMER DESEMBOLSO: La alcaldía municipal cancelará el del contrato de la siguiente forma: Un primer por valor del cuarenta (40%) del valor total previa las siguientes reglas:

1) La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

2) La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Municipio de Bochalema, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor.

3) El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

4) Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

5) El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: • El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad

1447 a 1713

fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. • El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. • Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. • Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. • La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. • En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. • La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de servicios y suministro, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 6) El anticipo será amortizado mediante deducciones de actas o informes, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser vigilada por la interventoría

UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente al el 30% del valor total del contrato previa entrega de los siguientes productos: A. La respectiva acta parcial de avance del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños.

UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente al 30% restante del valor del contrato contra entrega de los siguientes productos: a) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" debidamente diligenciado.

PARÁGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería retendrá al contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables y el estatuto de rentas municipales.

PARÁGRAFO 2. El contratista, entregará al municipio, copia de la constancia de todo pago que efectúe la Tesorería del municipio, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al mismo.

8. Que la forma de pago establecida en el contrato LP 003-2023 es la siguiente

$ 1.737.279.281,00
Cláusula 4 – Valor del contrato y forma de pago El valor del presente contrato corresponde a la suma de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($1.737.279.281), incluido IVA. El Municipio pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales acorde a los estipulado en los pliegos de condiciones y estudios previos previa certificación de cumplimiento a satisfacción del mismo por parte del supervisor del contrato y presentación del informe de ejecución y factura por parte del contratista. Después de radicada la factura y/o cuenta de cobro por parte del contratista con los soportes requeridos, el municipio de Bochalema efectuará su pago dentro de los 30 días calendarios.

Documentos que pueden ser debidamente revisados y verificados a través de la pagina del Secop 1 del Municipio de Bochalema Norte de Santander

9. Que se hace necesario realizar la corrección de la forma de pago del contrato LP 003-2023 de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones definitivos publicados por parte de la Administración Municipal 2020-2023

1448 a 1713

10. Que no se encuentran archivo o documento en donde se haya establecido la suspensión del objeto de contrato
11. Que el plazo de ejecución del contrato LP 003-2023 se encuentran próximo a fenecer y el contratista no ha iniciado las actividades planteadas dentro del contrato, por cuanto no recibió en la vigencia 2023 el desembolso del anticipo establecido en el pliego de condiciones definitivos dentro del proceso contractual.
12. Que ante esta situación y con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato Lp 003-2023, se hace necesario realizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de abril de 2024.
13. Que se deja constancia que el plazo de ejecución del contrato de suministro LP 003-2023 no puede superar el día 30 de abril de 2024, fecha en la cual vence el convenio interadministrativo No 1612 suscrito con el Ministerio
14. Que la presente adenda modificatoria no genera erogación alguna al contrato
15. Que la presente adenda modificatoria se regirá por el siguiente clausulado

CLAUSULA PRIMERA OBJETO BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II

CLAUSULA SEGUNDA MODIFIQUESE LA CLAUSULA 4 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, la cual quedara de la siguiente manera

UN PRIMER DESEMBOLSO: La alcaldía municipal cancelará el del contrato de la siguiente forma: Un primer pago por valor del cuarenta (40%) del valor total previa las siguientes reglas:

1) La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
2) La Entidad, a través de la interventoría. revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Municipio de Bochalema, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor. quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor.
3) El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado. el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.
4) Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga. informando el número y año del contrato, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.
5) El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

1449 a 1713

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.
• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.
• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. • La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.
• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.
• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de servicios y suministro, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.
6) El anticipo será amortizado mediante deducciones de actas o informes, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser vigilada por la interventoría

UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente al el 30% del valor total del contrato previa entrega de los siguientes productos: A. La respectiva acta parcial de avance del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños.

UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente al 30% restante del valor del contrato contra entrega de los siguientes productos: a) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" debidamente diligenciado.

PARÁGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería retendrá al contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables y el estatuto de rentas municipales.

PARÁGRAFO 2. El contratista, entregará al municipio, copia de la constancia de todo pago que efectúe la Tesorería del municipio, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al mismo.

CLAUSULA TERCERA MODIFIQUESE LA CLAUSUAL 6 PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION del contrato LP 003-2023 hasta el 30 de abril de 2024, de acuerdo a lo expresado en los considerandos

1450 a 1713

CLAUSULA CUARTA: GARANTIAS El contratista se obliga con el municipio de Bochalema a actualizar las pólizas de acuerdo a lo establecido en el presente documento

CLAUSULA QUINTA INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA; Las demás cláusulas del contrato No LP 003 DE 2023., cuyo objeto es **BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II**, seguirán vigentes y sin sufrir modificación alguna

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN; La presente Adenda, contrato adicional u otro sí, se perfecciona con la suscripción de las partes, en constancia se firma la presente adicional No. 001 de 2024, en el Municipio de Bochalema a los seis (6) días del mes de febrero de 2024, y hace parte integral del contrato No LP 003 DE 2023

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Para Constancia se firma a los seis (6) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

RAFAEL ORTÍZ MORA.	Rafael Pabón López
RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA C.C. N° 1.093.140.227 expedida en Bochalema **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** NIT 890505662-3 **CONTRATANTE**	**CONSORCIO SIES 2023** **NIT 901.770.539-9** **R.L. RAFAEL PABON LOPEZ** **C.C. 88.269.550** expedida en Cúcuta **CONTRATISTA**

ACTUACIÓN	NOMBRE	CARGO	TIPO DE VINCULACION	FIRMA
Revisó	Diana Milena Bolaños Duarte	Secretaria de Planeacion	NOMBRAMIENTO	
Proyectó	DASO JURIDICO ASESORES SAS	ASESORES JURIDICOS DEL MUNICIPIO	CONTRATISTA	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.				

1451 a 1713

Anexo 8.
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual y Cumplimiento

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101057290	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	02	2024	28	11	2023	00:00	30	04	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO SIES 2023	NIT: 901.770.539-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 3 NRO 11 E - 36 BRR QUINTA ORIENTAL	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	6075480328

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACION
	MUNICIPIO DE BOCHALEMA	NIT: 890.505.662-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 3 NO.3-08 PALACIO MUNICIPAL	BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER	7586394

BENEFICIARIO: 890505662 - MUNICIPIO DE BOCHALEMA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 12-05-2010 - 1329-P-06-08008-E-RCE-3023-0001 / 30-03-23 -1329-P-06-08008-E-RCE-0012-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y BAJO EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. LP-063-2023 RELACIONADO CON OCHOMBIA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) FASE II

ASEGURADO DE LA POLIZA (CONSORCIO SIES 2023 NIT 901770539 - 9 Y/O MUNICIPIO DE BOCHALEMA NIT: 890.505.662-3

BENEFICIARIOS DE LA POLIZA TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE BOCHALEMA NIT: 890.505.662-3

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	28/11/2023	30/04/2024	$347,455,856.20	$347,455,856.20

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN AUDIENCIA MODIFICATORIA NO 001 DE 2024 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA SEGÚN NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL 30/04/2024.

LAS DEMAS CONDICIONES Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******147,549.00	$ ******3,000.00	$ ******28,604.00	$ **********179,153.00	$ ******347,455,856.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONICA GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52644	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-80/74 - TELEFONO: 2180563 - BOGOTA, D.C.

11-40-101057290

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101057260	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	02	2024	29	11	2023	00:00	30	04	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO SIES 2023		NIT: 901.770.539-8

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 3 NRO. 11 E - 38 BRR QUINTA ORIENTAL	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5075450328

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE BOCHALEMA		NIT: 890.505.662-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 3 NO 3-08 PALACIO MUNICIPAL	BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER	7585074

BENEFICIARIO 890506662 - MUNICIPIO DE BOCHALEMA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SMARTY COLOMBIA S.A.S. BIC.	900369549-4	35.00
EXPERIAN DIGITAL SOLUTIONS SAS	900808866-9	65.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-9074 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101057260

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ceda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DLF652469

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101212252	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	02	2024	28	11	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO SIES 2023 — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.770.539-9

DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 11 E - 38 BRR QUINTA ORIENTAL — CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER — TELÉFONO: 6075460326

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE BOCHALEMA — IDENTIFICACIÓN: NIT: 890.505.662-3

DIRECCIÓN: CALLE 3 NO.3-38 PALACIO MUNICIPAL — CIUDAD: BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER — TELÉFONO: 7586031

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU1128, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, EXCLUYE DEL RIESGO S.A., CAMPIFICA:

ASEGURAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS ORIGINADOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 14 DE 2023 RELACIONADO CON BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES 23 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) FASE II

AMPAROS

RIESGO: DESCRIPCION DE SERVICIOS

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/11/2023	31/08/2024	$173,727,928.10	$173,727,928.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	28/11/2023	30/04/2024	$694,911,712.40	$694,911,712.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/11/2023	30/04/2027	$173,727,928.10	$173,727,928.10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	EL AMPARA 3 AÑOS, 6 MESES Y 2 DÍAS *		$347,455,856.20	$347,455,856.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADENDA MODIFICATORIA NO 001 DE 2024 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA SIENDO NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL 30/08/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****443,532.00	$ ****8,000.00	$ ****85,849.00	$ *********537,888.00	$ ****1,389,823,424.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA	12440	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-6074 - TELEFONO: 2180900 - BOGOTA, D.C.

11-44-101212252

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1455 a 1713

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101212252	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	02	2024	28	11	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION	
CONSORCIO SIES 2023		NIT:	901.770.539-9
DIRECCION: CL 3 NRO 11 E - 38 BRR QUINTA ORIENTAL	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELEFONO:	6075480328

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE BOCHALEMA		NIT:	890.505.662-3
DIRECCIÓN: CALLE 3 NO 3-08 PALACIO MUNICIPAL	CIUDAD: BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	7585014

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GRANTY COLOMBIA S.A.S. BIC	900245549-6	35.00
ESTUDIO DIGITAL SOLUCIONES SAS	900808866-5	65.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-6074 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101212252

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ADRIANA HERRAN C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101212252, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de FEBRERO de 2024

11-44-101212252

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Anexo 9.
Planilla de pago seguridad social febrero

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	534567024	9464836965	E	2024/03/15	2024/03/26	BANCO DE BOGOTA	11	$7,123,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)																							$26,026,667	$4,164,300			$26,026,667	$1,041,100			$26,026,667	$1,041,100			$26,026,667		$810,600		$0	$0		$7,057,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$15,026,667	$2,404,300			$15,026,667	$601,100			$15,026,667	$601,100			$15,026,667		$78,700		$0	$0		$3,685,200
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (8 Afiliados)																							$15,026,667	$2,404,300			$15,026,667	$601,100			$15,026,667	$601,100			$15,026,667		$78,700		$0	$0		$3,685,200
1	CC	60405616	AGUILAR GLENDA	X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1090469227	CASTAÑEDA ASTRID	X																	23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
3	CC	88229079	CASTELLANOS JHON																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	1092354302	GARZON JOHAN																		23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
5	CC	88269550	PABON RAFAEL																		25-14	30	$4,350,000	$696,000	EPS005	30	$4,350,000	$174,000	CCF37	30	$4,350,000	$174,000	14-23	30	$4,350,000	0.522%	$22,800	30	$0	$0	Si	$1,066,800
6	CC	1090390508	ROSALES ELIZABETH	X																	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF37	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	0.522%	$2,500	11	$0	$0	Si	$117,000
7	CC	1010128996	VARGAS DANNA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
8	CC	1094271057	VILLAMIZAR ROLANDO																		23100 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
Centro de Trabajo: RIEGO IV (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
9	CC	13472856	HERNANDEZ LUIS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
Centro de Trabajo: RIESGO V (5 Afiliados)																							$9,700,000	$1,552,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000		$675,300		$0	$0		$3,003,300
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (5 Afiliados)																							$9,700,000	$1,552,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000		$675,300		$0	$0		$3,003,300
10	CC	13279288	CONTRERAS ANDERSON																		23030 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	6.960%	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
11	CC	37273128	MEZA ANA																		25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS042	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	6.960%	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
12	CC	1090375054	MIZRAJI NOAM																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
13	CC	1090392473	MURILLO EDIXON	X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	1093798862	TOLOZA JESUS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total			**Afiliados(14)**																				$26,026,667	$4,164,300			$26,026,667	$1,041,100			$26,026,667	$1,041,100			$26,026,667		$810,600		$0	$0		$7,057,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	534567024	9464836965	E	2024/03/15	2024/03/26	BANCO DE BOGOTA	11	$7,123,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,164,300	$39,300	$0	$4,203,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$464,000	$4,400	$0	$468,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,236,300	$11,700	$0	$1,248,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,464,000	$23,200	$0	$2,487,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$810,600	$7,700	$0	$818,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$810,600	$7,700	$0	$818,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,041,100	$9,800	$0	$1,050,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	14	$1,041,100	$9,800	$0	$1,050,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$1,041,100	$9,900	$0	$1,051,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$116,000	$1,100	$0	$117,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$500	$0	$52,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$311,100	$3,000	$0	$314,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$500	$0	$52,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$510,000	$4,800	$0	$514,800
TOTAL				**14**	**$7,057,100**	**$66,700**	**$0**	**$7,123,800**

Anexo 10.

Planilla de seguridad social febrero - ING Nicolas Alvarado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090503679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE NICOLAS ALVARADO MEZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ABREGO	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	LOS PROCERES	TELÉFONO:	5740982
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7918458756**			TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	500161496

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
SUBTOTALES:										**$ 832.000**	**$ 0**	**$ 832.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 487.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.500	$ 0	$ 0	$ 487.500
SUBTOTALES:													**$ 650.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 650.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 362.000	$ 362.000	$ 0	$ 0	$ 362.000
SUBTOTALES:									**$ 362.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 362.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																		
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1090436254	CANO PAREDES DIEGO ARMANDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO	01																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	109050367	$ 90.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1093758816	VELASQUEZ QUINTERO JOSE LUIS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO	01																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	109050367	$ 90.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 6664414	VELASQUEZ QUINTERO YECSON HUMBERTO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO	01																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	109050367	$ 90.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 88238780	ORTEGA URON LUIS FELIPE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO	01																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	109050367	$ 90.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.844.000**

Anexo 11.
Planilla seguridad social
NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	534567024	9464836965	E	2024/03/15	2024/03/26	BANCO DE BOGOTA	11	$7,123,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)																							$26,026,667	$4,164,300			$26,026,667	$1,041,100			$26,026,667	$1,041,100			$26,026,667		$810,600		$0	$0		$7,057,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$15,026,667	$2,404,300			$15,026,667	$601,100			$15,026,667	$601,100			$15,026,667		$78,700		$0	$0		$3,685,200
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (8 Afiliados)																							$15,026,667	$2,404,300			$15,026,667	$601,100			$15,026,667	$601,100			$15,026,667		$78,700		$0	$0		$3,685,200
1	CC	60405616	AGUILAR GLENDA	X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1090469227	CASTAÑEDA ASTRID	X																	23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
3	CC	88229079	CASTELLANOS JHON																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	1092354302	GARZON JOHAN																		23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
5	CC	88269550	PABON RAFAEL																		25-14	30	$4,350,000	$696,000	EPS005	30	$4,350,000	$174,000	CCF37	30	$4,350,000	$174,000	14-23	30	$4,350,000	0.522%	$22,800	30	$0	$0	Si	$1,066,800
6	CC	1090390508	ROSALES ELIZABETH	X																	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF37	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	0.522%	$2,500	11	$0	$0	Si	$117,000
7	CC	1010128996	VARGAS DANNA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
8	CC	1094271057	VILLAMIZAR ROLANDO																		23100 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
Centro de Trabajo: RIEGO IV (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
9	CC	13472856	HERNANDEZ LUIS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
Centro de Trabajo: RIESGO V (5 Afiliados)																							$9,700,000	$1,552,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000		$675,300		$0	$0		$3,003,300
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (5 Afiliados)																							$9,700,000	$1,552,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000		$675,300		$0	$0		$3,003,300
10	CC	13279288	CONTRERAS ANDERSON																		23030 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	6.960%	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
11	CC	37273128	MEZA ANA																		25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS042	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	6.960%	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
12	CC	1090375054	MIZRAJI NOAM																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
13	CC	1090392473	MURILLO EDIXON	X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	1093798862	TOLOZA JESUS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total			**Afiliados(14)**																				$26,026,667	$4,164,300			$26,026,667	$1,041,100			$26,026,667	$1,041,100			$26,026,667		$810,600		$0	$0		$7,057,100

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	534567024	9464836965	E	2024/03/15	2024/03/26	BANCO DE BOGOTA	11	$7,123,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,164,300	$39,300	$0	$4,203,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$464,000	$4,400	$0	$468,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,236,300	$11,700	$0	$1,248,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,464,000	$23,200	$0	$2,487,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$810,600	$7,700	$0	$818,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$810,600	$7,700	$0	$818,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,041,100	$9,800	$0	$1,050,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	14	$1,041,100	$9,800	$0	$1,050,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$1,041,100	$9,900	$0	$1,051,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$116,000	$1,100	$0	$117,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$500	$0	$52,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$311,100	$3,000	$0	$314,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$500	$0	$52,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$510,000	$4,800	$0	$514,800
TOTAL				**14**	**$7,057,100**	**$66,700**	**$0**	**$7,123,800**

RE: [INTERVENTORÍA CCTV BOCHALEMA]: Seguimiento al proceso del Convenio con CENS y solicitud de tiempos del proceso.

De solicitudesaie <solicitudesaie@cens.com.co>
Destinatario interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com <interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>, NELSON GABRIEL MOGOLLON AFANADOR <NELSON.MOGOLLON@cens.com.co>
Cc Planeacion <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>, Anderson Jhoan Contreras <proyectos@netkoln.com>, CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>, Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>
Fecha 2024-04-17 17:57

PLANTILLA CONOCIMIENTO DEL TERCERO (4).docx (~65 KB)

Cordial saludo,

Dentro de la información jurídica que debe enviar el Municipio es necesario incluir la plantilla conocimiento del tercero diligenciada y firmada por el alcalde. En el correo anterior no se relaciona dentro de los ítems. Adjunto la plantilla, importante tener en cuenta las notas para su diligenciamiento.

Respecto a los tiempos, se informa lo siguiente:
Una vez recibida la documentación completa para la firma del contrato, se requiere un tiempo de 4 días hábiles para la validación respectiva. Si no se presentan alertas, se puede enviar la minuta al día siguiente; es decir, en 5 días hábiles se puede realizar el proceso por parte de CENS. El tiempo de ahí en adelante depende del que emplee el Municipio para revisar la minuta, al igual que la constitución de la póliza depende del Municipio.
El proceso de firma del contrato por parte de CENS puede requerir 3 días si es en digital. ¿Este contrato se tramita por el SECOP II?
Nota: Se debe estimar el tiempo que requiera el Municipio para el proceso de revisión de la minuta, firma del contrato y constitución de pólizas.

En cuanto al proyecto, ya se realizó la revisión en terreno, estamos a la espera de las observaciones para enviar respuesta. No obstante, se debe considerar que la aprobación para utilizar la infraestructura se dará en cuanto se tenga el contrato firmado y las pólizas. Por lo pronto, se enviarán las observaciones para su conocimiento.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

-----Mensaje original-----
De: interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com <interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Enviado el: miércoles, 17 de abril de 2024 9:59 a. m.
Para: NELSON GABRIEL MOGOLLON AFANADOR <NELSON.MOGOLLON@cens.com.co>; solicitudesaie <solicitudesaie@cens.com.co>; EILEN MARCELA BAUTISTA MARTINEZ <EILEN.BAUTISTA@cens.com.co>
CC: Planeacion <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>; Anderson Jhoan Contreras <proyectos@netkoln.com>; CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>; Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>
Asunto: Re: [INTERVENTORÍA CCTV BOCHALEMA]: Seguimiento al proceso del Convenio con CENS y solicitud de tiempos del proceso.

¡Cuidado! este correo proviene de un usuario externo, no abras archivos adjuntos ni hagas clic en enlaces sin validar que el remitente y el contenido sean seguros. Nunca entregues tu usuario ni contraseñas a través de enlaces.

El 2024-04-17 09:53, interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com
escribió:

Buen día estimada Eilen, Nelson y Diego Contreras.

De ante mano, les agradezco mucho por su atención y apoyo con este tema.

A continuación proceso a brindarles la información del seguimiento del proceso, o lo actuado a la fecha:
El 5 de Abril de 2024, se reenvío al correo de EILEN.BAUTISTA@cens.com.co, la siguiente información técnica:

KMZ Bochalema CCTV Fase II.kmz
Especificaciones técnicas de los elementos a instalar.pdf Plantilla uso infraestructura eléctrica Bochalema.xlsx Plano Red de posteria.dwg PLANTILLA CONOCIMIENTO DEL TERCERO (4).docx
CSIES-BOCHALEMA-0002-2024 - DOCUMENTACION PARA CENS.pdf Certificado de Vigencia Matricula profesional.pdf AUTORIZACION TERCERO CENS.pdf

El proceso general de acuerdo a mi entendimiento es el siguiente:
1. Se envía la información jurídica del municipio. [Pendiente] 2. Se envía la información técnica del proyecto. [Realizado] 3. Se realiza y firma contrato / convenio. [Pendiente] 4. El municipio tramita la póliza. [Pendiente]

De estos 4 pasos, el municipio no ha enviado la información por que esta pendiente el CDP. Para el CDP se requiere una aprobación de un comité que se va a celebrar el próximo 23 de Abril de 2024.

La información jurídica completa que debe enviar el municipio a CENS es la siguiente:
1. Registro Único Tributario (RUT) del Municipio con una vigencia no mayor a 30 días.
2. Fotocopia de la cédula del alcalde.
3. Fotocopia del acuerdo municipal para formalizar contratos.
4. CDP con la disponibilidad para la ejecución del contrato, de acuerdo con la infraestructura de CENS que se proyecta utilizar.

Bueno, explicado el proceso, y el estado actual del mismo, si o si se requiere de mayor tiempo con el fin de culminar el tramite con CENS, y terminar las actividades del contrato.

Tras lo anterior, y sobre el escenario de que el próximo martes 23 de Abril de 2024, se realice el comité con la aprobación del CDP, y que al día siguiente, o sea el miércoles 24 de abril de 2024 le sea enviado el CDP junto la la otra información jurídica a CENS, requiero de su colaboración, Eilen, Diego, Nelson, indicándonos los tiempos del proceso, después de recibida la información?

Tener en cuenta, sobre el mismo escenario, que el personal del contratista que va a realizar las intervenciones de instalación de fibra y las conexiones eléctricas a la red de CENS, realizó el año pasado las mismas actividades en el municipio de Sardinata, y que es el mismo personal, el cual ya cuenta con la capacitación de normas propias de la empresa CENS.

Agradezco su atención y gestión.

Quedo atento.

Cordial saludo!

-------- Mensaje Original --------
Asunto: [INTERVENTORÍA CCTV BOCHALEMA]: Apuntes de reunión con CENS
Fecha: 2024-04-08 11:38
De: interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com
Destinatario: Planeacion <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>, Andreson <proyectos@netkoln.com>, CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>, Nelson Mogollon <nelson.mogollon@cens.com.co>
Cc: Anabolenamezamora <anabolenamezamora@gmail.com>, Edgar Andres Olier <eolier@gmail.com>, Havid Numa <havid.numa@mininterior.gov.co>

Buen día estimados.

Relaciono los apuntes de reunión del 5 Abril con CENS - Centrales

Asistentes:
* Nelson G Mogollon A - Comercial, CENS
* Ellen, CENS
* Diego Contreras - Encargado de arrendamiento e infraestructura, CENS
* Adbel Villamizar, Municipio Bochalema
* Jonnathan Boada Ortega - Supervisor del contrato, Municipio de Bochalema
* Anderson Contreras, CONSORCIO SIES 2023
* Willians Alexander Camelo
* Iván Mauricio Brito, Interventor del contrato.

I. Se socializa:
* Los problemas que se han presentado que han retrasado el tramite del permiso, que corresponden al cambio de administración.
* Que se tiene premura con el tema del permiso debido a que el contrato tiene fecha de terminación el próximo 30 de Abril de 2024.
* Se solicita permiso anticipado de uso de la postería para instalación de la fibra, pero el personal de CENS indica que no es posible hasta que se tenga la póliza, ya que se debe garantizar el tema de daños a la infraestructura.

II. Se socializa el procedimiento para el tramite en cuestión, el cual se relaciona a continuación:
Para firma del contrato, los documentos son:
1. Registro Único Tributario (RUT) del Municipio con una vigencia no mayor a 30 días.
2. Fotocopia de la cédula del alcalde.
3. Fotocopia del acuerdo municipal para formalizar contratos.
4. CDP con la disponibilidad para la ejecución del contrato, de acuerdo con la infraestructura de CENS que se proyecta utilizar.
5. Plantilla conocimiento del tercero debidamente diligenciada y firmada (Ver adjunto).
1. Plano georreferenciado en formato DWG de acuerdo al capítulo 12 "Presentación de proyecto", la escala de 1:1000 y el rotulado "Diseño detallado y simplificado", firmado digitalmente por un ingeniero electricista con número de matrícula profesional vigente.
2. Archivo KMZ del proyecto.
3. Plantilla solicitud de factibilidad de uso de infraestructura eléctrica (Anexo Capítulo 10 Norma CENS). Se envía como anexo.
4. Carta de autorización para presentación del proyecto ante CENS.

III. El contratista CONSORCIO SIES 2023 indica que con anterioridad se envió la información técnica al supervisor y al correo indicado por CENS: solicitudesaie@cens.com.co.

IV. Se genera el compromiso de reenvío de la información técnica al contratista CONOSRCIO SIES 2023, con copia a solicitudesaie@cens.com.co, con el fin de poder adelantar la revisión técnica por parte de CENS.

V. Se genera el compromiso de envío de CDP a CENS por parte del supervisor del contrato, así como la otra información relacionada, mientras surte el tema de la póliza.

VI. Se genera el compromiso de reunión de seguimiento para el próximo miércoles 10 de Abril a las 4pm, con todas las partes, para revisar los avances al proceso.

Cordial saludo!

Tener también en cuenta, que el viernes de la semana pasada (12 de Abril de 2024), ustedes realizaron la visita técnica al proyecto.

Cordial saludo!

--
IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
Director de Interventoría
Cel.(57) 3017441295
http://www.comunipingenieria.com/
Colombia

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener Información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Igualmente, el uso indebido, revisión no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión o reproducción de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibido y sancionado legalmente. Agradecemos su atención. Grupo Empresarial EPM.

The contents of this document and/or its attachments are for exclusive use of the intended recipient and may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient of this document, please immediately reply to the sender and delete this information and its attachments from your system. Likewise, the misuse, unauthorized review, any retention, dissemination, distribution, disclosure, forwarding, copying, printing or reproduction of this transmission, including any attachments, is strictly prohibited and punishable by law. Thank you for your attention. Grupo Empresarial EPM.

Fwd: DOCUMENTACIÓN PARA CENS

De CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>
Destinatario <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>
Cc <interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>, <EILEN.BAUTISTA@cens.com.co>, licenciasbochalema@gmail.com <licenciasbochalema@gmail.com>
Fecha 2024-04-05 16:52

2. KMZ Bochalema CCTV Fase II .kmz (~57 KB) 5. Especificaciones técnicas de los elementos a instalar.pdf (~992 KB)
3. Plantilla uso infraestructura eléctrica Bochalema.xlsx (~57 KB) 1. Plano Red de posteria.dwg (~2.8 MB)
PLANTILLA CONOCIMIENTO DEL TERCERO (4).docx (~67 KB) CSIES-BOCHALEMA-0002-2024 - DOCUMENTACION PARA CENS.pdf (~179 KB)
6. Certificado de Vigencia Matricula profesional.pdf (~100 KB) 4. AUTORIZACION TERCERO CENS.pdf (~511 KB)

Buena tarde

Adjunto nuevamente la documentación para el permiso de uso de la infraestructura de CENS

--------- Forwarded message ---------
De: **CCTV BOCHALEMA** <cctv.bochalema@smartycolombia.co>
Date: mar, 16 ene 2024 a la(s) 8:39 a.m.
Subject: DOCUMENTACIÓN PARA CENS
To: <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>

Buen día

Cordial saludo,

Me permito adjuntar oficio del asunto

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023


--
RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC
Carrera 7N 19-28 Ed. Torre Bolívar Oficina 1504
Tel: +57 310 491 8242 - +57 311 6017996 Pereira - Risaralda
Web: www.smartycolombia.com - www.smartycolombia.co

"La información contenida en este correo electrónico y anexos son confidenciales, están dirigidos únicamente para el uso del emisor y el remitente al que fue dirigido, contiene información confidencial, cualquier uso, distribución o reproducción de este correo que no sea por el destinatario, queda prohibido."
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. ¡Proteger el medio ambiente es tarea de todos!

ÍTEM 7.A CARTERA DE POSTES

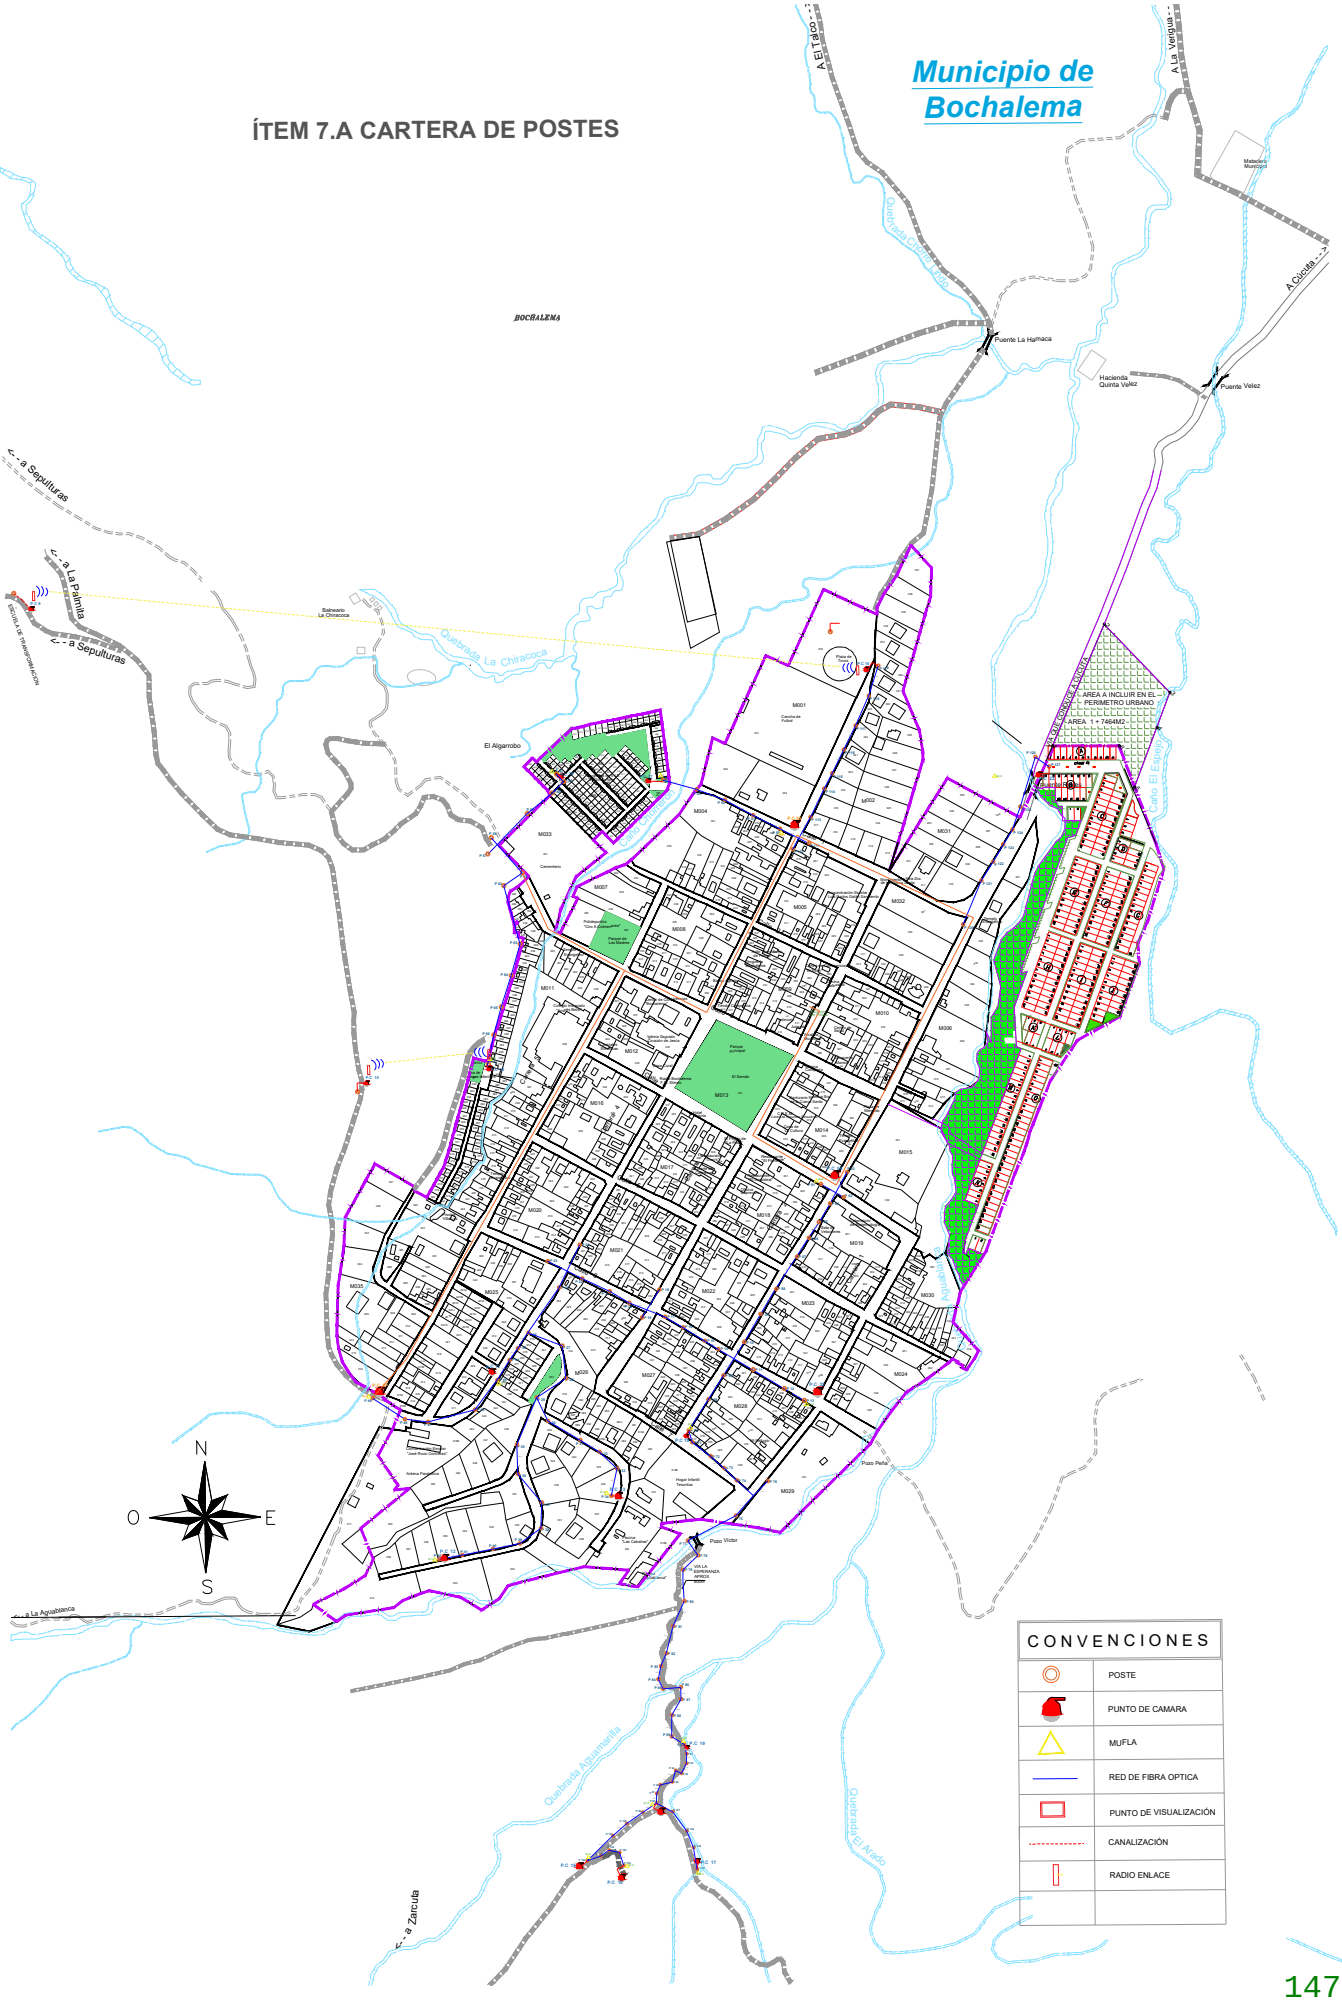Municipio de Bochalema



CONVENCIONES	
	POSTE
	PUNTO DE CAMARA
	MUFLA
	RED DE FIBRA OPTICA
	PUNTO DE VISUALIZACIÓN
	CANALIZACIÓN
	RADIO ENLACE

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

PLANTILLA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

ITEM	DIRECCIÓN	NÚMERO DE POSTE	GEORREFERENCIACIÓN wgs 84 centro bogotá	POSTE		TIPO DE CABLE				AMPLIFICADORES				FUENTES		CAJA			BAJANTE	BRAZO EXTENSOR O CRUCETA	EMPALMES	NODOS		RESERVAS	CANTIDAD DE CABLES A INSTALAR	CANTIDAD DE HERRAJES A INSTALAR	RESERVAS DE OTRO OPERADOR	CANTIDAD DE CABLES OTRO OPERADOR	PUESTA A TIERRA	ELEMENTOS PASIVOS			MARQUILLA	OBSERVACIONES	LONGITUD VANO
				ALTURA DE POSTE	RESISTENCIA (kgf)	FIBRA ÓPTICA	COAXIAL	TELEFÓNICO	DIÁMETRO DEL CABLE (mm)	A RED	A FUENTE	CORRIENTE	PESO Kg	CÓDIGO	Dimensiones largo X ancho X alto (cm)	DISPERSIÓN	EMPALME	Dimensiones largo X ancho X alto (cm)				A RED	A FUENTE							TAP	SPLITTER	OTRO			
1	Calle 4 2_07	1	07°36'40.19"N 72°38'46.3"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	0
2	Cll 4 # juzgado	2	07°36'39.88"N 72°38'45.73"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	2	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	23
3	Carrera 2 # 3-81	3	07°36'40.94"N 72°38'45.16"W	8 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	35
4	Carrera 2 calle 4	4	07°36'39.66"N 72°38'46.01"W	12 Mt	1350	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	37
5	Carrera 2# 4_32	5	07°36'38.99"N 72°38'46.35"W	8 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	30
6	Car2 # 4_51	6	07°36'38.21"N 72°38'46.91"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	26
7	Carrera 2 # 4_87	7	07°36'37.51"N 72°38'47.33"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	36
8	Carrera 2 # 5_31	8	07°36'36.57"N 72°38'47.89"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	30
9	Carrera 2 # 5_75	9	07°36'35.59"N 72°38'48.54"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	36
10	Carrera 2 # calle 5	10	07°36'34.54"N 72°38'49.23"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	38
11	Calle 6 # 1_63	11	07°36'33.91"N 72°38'48.73"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	50
12	Call 6 # 1_31	12	07°36'33.09"N 72°38'47.3"W	12 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	36
13	Call e # 1'_25	13	07°36'32.85"N 72°38'46.82"W	8 Mt	750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	28
14	Call 6 # carrera 2	14	07°36'34.45"N 72°38'49.61"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	40
15	Cal 6 # 2_31	15	07°36'34.87"N 72°38'50.3"W	12 Mt	1350	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	39
16	Cal 6 # 2_3	16	07°36'35.55"N 72°38'51.42"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	48
17	Calle 6 # 2_3	17	07°36'35.74"N 72°38'51.66"W	12 Mt	1350	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	7
18	Carrera 3 # 5_84	18	07°36'36.8"N 72°38'51.55"W	8 Mt	1050	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	1	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	37
19	Carrera 3 # 6_02	19	07°36'35.86"N 72°38'52.05"W	12 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	21
20	Cll 6 # 3_12;	20	07°36'36.43"N 72°38'53.09"W	12 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	38
21	Cll 6 # 3_47	21	07°36'36.69"N 72°38'53.65"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	25
22	Cll 6 # 3_81	22	07°36'37.05"N 72°38'54.51"W	12 Mt	1350	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	34
23	Call 6 carrera 4	23	07°36'37.46"N 72°38'55.44"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	39
24	Carrera 4 # calle 6	24	07°36'37.97"N 72°38'54.3"W	12 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	32
25	Carrera 4 # 6_03	25	07°36'36.7"N 72°38'55.16"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	38
26	Carrera 4 # 7-07	26	07°36'35.35"N 72°38'56.1"W	12 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	2	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	55
27	Carrera 3 A # 7-08	27	07°36'35.11"N 72°38'54.85"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	42
28	Carrera 3 A #	28	07°36'33.41"N 72°38'54.69"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	46
29	Carrera 3 A cll 7 a 2	29	07°36'32.74"N 72°38'55.55"W	12 Mt	1350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	2	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	46
30	Call 7 a 10 carrera 3A	30	07°36'32.11"N 72°38'55.41"W	8 Mt	metálico riel	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	24
31	Cll 7 lote 3	31	07°36'31.75"N 72°38'54.83"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	21
32	Call 7 lote 4	32	07°36'31.18"N 72°38'53.88"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	43
33	Cll 7 cabaña villa lola	33	07°36'30.53"N 72°38'52.96"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	36
34	Cabañas lote 19	34	07°36'29.46"N 72°38'53.04"W	10 Mt	1050	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	60
35	Call 7b #3 -80	35	07°36'31.16"N 72°38'56.11"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	63
36	Carrera 3A cll 7b	36	07°36'30.52"N 72°38'56.09"W	12 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	28
37	Cll 7b lote 39	37	07°36'28.8"N 72°38'55.29"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	65
38	Cll 7b lote 40	38	07°36'28.12"N 72°38'55.55"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	26
39	Call 7b casa 3	39	07°36'28.03"N 72°38'56.16"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	34
40	Call 7b casa 4	40	07°36'27.73"N 72°38'57.36"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	37
41	Call 7 b villa Tere lote 41	41	07°36'27.31"N 72°38'58.58"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	22
42	Cll 7 b Villa Tere lote 42	42	07°36'27.04"N 72°38'59.36"W	8 Mt	510	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	1	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	20
43	Carrera 4 # 7-13	43	07°36'34.65"N 72°38'56.49"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	18
44	Catrera 4 # 7-35	44	07°36'34.16"N 72°38'56.77"W	12 Mt	1350	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	20
45	Carrera 4 # 7a-13	45	07°36'33.65"N 72°38'57.05"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	35
46	Carrera 4 lote 2 agua blanca	46	07°36'32.45"N 72°38'57.94"W	12 Mt	1350	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	38
47	Carrera 4 # 7_146	47	07°36'32.23"N 72°38'59.09"W	12 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	27

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

PLANTILLA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

ITEM	DIRECCIÓN	NÚMERO DE POSTE	GEORREFERENCIACIÓN wgs 84 centro bogotá	POSTE		TIPO DE CABLE				AMPLIFICADORES				FUENTES		CAJA			BAJANTE	BRAZO EXTENSOR O CRUCETA	EMPALMES	NODOS		RESERVAS	CANTIDAD DE CABLES A INSTALAR	CANTIDAD DE HERRAJES A INSTALAR	RESERVAS DE OTRO OPERADOR	CANTIDAD DE CABLES OTRO OPERADOR	PUESTA A TIERRA	ELEMENTOS PASIVOS			MARQUILLA	OBSERVACIONES	LONGITUD VANO
				ALTURA DE POSTE	RESISTENCIA (kgf)	FIBRA ÓPTICA	COAXIAL	TELEFÓNICO	DIÁMETRO DEL CABLE (mm)	A RED	A FUENTE	CORRIENTE	PESO Kg	CÓDIGO	Dimensiones largo X ancho X alto (cm)	DISPERSIÓN	EMPALME	Dimensiones largo X ancho X alto (cm)				A RED	A FUENTE							TAP	SPLITTER	OTRO			
48	Carrera 4 # escuela rozo	48	07°36'32.32"N 72°39'00.21"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	2	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	36
49	Carrera 4 entrada sendero ecologico	49	07°36'32.49"N 72°39'01.11"W	12 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	27
50	Calle 1 carrera 4	50	07°36'51.97"N 72°38'47.61"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	0
51	Call 1 # 4_57	51	07°36'52.4"N 72°38'48.39"W	8 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	37
52	Call 1 # 4_46	52	07°36'52.78"N 72°38'49.06"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	30
53	Calle 1 # 4_83	53	07°36'53.34"N 72°38'50"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	23
54	Call 1 # 4_94	54	07°36'53.53"N 72°38'50.65"W	8 Mt	1050	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	34
55	Call 3 5_99	55	07°36'50.69"N 72°38'56.05"W	12 Mt	1350	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	0
56	Call 3 carrera 6	56	07°36'51.65"N 72°38'56.99"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	42
57	Call 3 carrera 6	57	07°36'51.33"N 72°38'56.99"W	14 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	20
58	Carrera 6 detrás de cementerio	58	07°36'51.33"N 72°38'56.99"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	46
59	Carrera 6 detrás de cementerio	59	07°36'53.23"N 72°38'54.85"W	12 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	45
60	Carrera 6 call 2	60	07°36'53.86"N 72°38'54.24"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	48
61	Call 2 carretera 6	61	07°36'54.26"N 72°38'54.62"W	8 Mt	510		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	11
62	Carr 6 con calle 3	62	07°36'50.23"N 72°38'56.72"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	35
63	Carre 6 # k6. 319-1	63	07°36'47.98"N 72°38'57.05"W	12 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	73
64	Carrera 6 # 4_91	64	07°36'47.98"N 72°38'57.05"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	24
65	Carrera 6 # agua blanca lote 3	65	07°36'46.39"N 72°38'57.44"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	30
66	Carrera 6 # #4_57	66	07°36'45.21"N 72°38'57.86"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	47
67	Carrera 6 # 4_79	67	07°36'44.348"N 72°38'58.365"W	8 Mt	510	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	40
68	Carrera 2 calle 6 25	68	07°36'33.61"N 72°38'49.9"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	40
69	Carrera 2 calle 6 60	69	07°36'32.83"N 72°38'50.42"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	32
70	Carrera 2 calle 6 84	70	07°36'31.89"N 72°38'50.89"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	32
71	Calle 7 carrera 2	71	07°36'31.7"N 72°38'50.85"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	9
72	Calle 7 carrera 2	72	07°36'31.08"N 72°38'50.01"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Regular	30
73	Calle 7 carrera 2	73	07°36'30.7"N 72°38'49.53"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Regular	24
74	Calle 7 carrera 1	74	07°36'30.12"N 72°38'48.8"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	25
75	Carrera 1 parador agua blanca	75	07°36'29.04"N 72°38'49.23"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	46
76	Carrera 1 parador agua blanca	76	07°36'30.4"N 72°38'48.28"W	8 Mt	510	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	17
77	Parador turístico agua blanca	77	07°36'28.08"N 72°38'50.75"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	1	2	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	60
78	Via Vereda el porvenir, Vereda San J	78	07°36'27.42"N 72°38'50.1"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	30
79	Via Vereda el porvenir	79	07°36'26.2"N 72°38'50.64"W	8 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	43
80	Via Vereda el porvenir	80	07°36'25.15"N 72°38'51.12"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	37
81	Via Vereda el porvenir	81	07°36'24.38"N 72°38'51.3"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	28
82	Via Vereda el porvenir	82	07°36'23.65"N 72°38'51.45"W	8 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	27
83	Via Vereda el porvenir	83	07°36'22.88"N 72°38'51.67"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	28
84	Via Vereda el porvenir	84	07°36'21.73"N 72°38'51.69"W	8 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	36
85	Via Vereda el porvenir	85	07°36'21.04"N 72°38'51.01"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	30
86	Via Vereda el porvenir	86	07°36'21.47"N 72°38'50.07"W	8 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	32
87	Granja la perla .. via Vereda el porver	87	07°36'21.25"N 72°38'49.7"W	12 Mt	2000	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	15
88	Via Vereda el porvenir kdX 19-3	88	07°36'20.08"N 72°38'50.72"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	48
89	Via Vereda el porvenir	89	07°36'19.4"N 72°38'51.78"W	12 Mt	1350	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	40
90	Via Vereda el porvenir	90	07°36'18.41"N 72°38'51.36"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	34
91	Urbanización la esmeralda.. via Vered	91	07°36'17.95"N 72°38'51.5"W	12 Mt	1350	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	15
92	Via Vereda el porvenir. La esmeralda	92	07°36'17.38"N 72°38'52.36"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	30
93	Via Vereda el porvenir.. urb la esmera	93	07°36'17.1"N 72°38'53.49"W	12 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	38
94	Via Vereda el porvenir	94	07°36'17.31"N 72°38'53.72"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	12

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

PLANTILLA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

				POSTE		TIPO DE CABLE				AMPLIFICADORES				FUENTES		CAJA						NODOS								ELEMENTOS PASIVOS					
ITEM	DIRECCIÓN	NÚMERO DE POSTE	GEORREFERENCIACIÓN wgs 84 centro bogotá	ALTURA DE POSTE	RESISTENCIA (kgf)	FIBRA ÓPTICA	COAXIAL	TELEFÓNICO	DIÁMETRO DEL CABLE (mm)	A RED	A FUENTE	CORRIENTE	PESO Kg	CÓDIGO	Dimensiones largo X ancho X alto (cm)	DISPERSIÓN	EMPALME	Dimensiones largo X ancho X alto (cm)	BAJANTE	BRAZO EXTENSOR O CRUCETA	EMPALMES	A RED	A FUENTE	RESERVAS	CANTIDAD DE CABLES A INSTALAR	CANTIDAD DE HERRAJES A INSTALAR	RESERVAS DE OTRO OPERADOR	CANTIDAD DE CABLES OTRO OPERADOR	PUESTA A TIERRA	TAP	SPLITTER	OTRO	MARQUILLA	OBSERVACIONES	LONGITUD VANO
95	Via Vereda el porvenir	95	07°36'16.79"N 72°38'54.27"W	8 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	25
96	Via Vereda el porvenir	96	07°36'16.53"N 72°38'54.86"W	12 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	17
97	Via Vereda el porvenir	97	07°36'16.02"N 72°38'55.23"W	8 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	22
98	Via Vereda el porvenir	98	07°36'15.14"N 72°38'55"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	36
99	Via Vereda el porvenir	99	07°36'14.21"N 72°38'56.85"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	42
100	Via Vereda el porvenir	100	07°36'13.09"N 72°38'57.68"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	38
101	Via Vereda el porvenir	101	07°36'12.34"N 72°38'58.42"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	36
102	La Y vereda el porvenir	102	07°36'10.39"N 72°38'59.46"W	12 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	1	2	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	65
103	La Y, La esmeralda lote 31-1	103	07°36'10.83"N 72°38'58.53"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	31
104	La esmeralda	104	07°36'11.04"N 72°38'58.21"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	16
105	La esmeralda	105	07°36'10.95"N 72°38'57.74"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	14
106	La esmeralda lote 46	106	07°36'10.38"N 72°38'57.43"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	25
107	La esmeralda lote 31	107	07°36'14.31"N 72°38'55.25"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	37
108	La esmeralda	108	07°36'13.47"N 72°38'54.72"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	32
109	La esmeralda	109	07°36'12.79"N 72°38'54.2"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	30
110	La esmeralda lote 96	110	07°36'11.74"N 72°38'53.41"W	8 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	38
111	Calle 1 carrera 4	111	07°36'51.59"N 72°38'46.8"W	8 Mt	1050	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	28
112	Carrera 4 calle 1	112	07°36'51.41"N 72°38'47.15"W	12 Mt	1350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	16
113	Carrera 4 calle 1	113	07°36'52.19"N 72°38'46.5"W	8 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	36
114	Carrera 4 plaza de toros	114	07°36'53.24"N 72°38'45.88"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	35
115	Carrera 4 plaza de toros	115	07°36'54.22"N 72°38'45.32"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	39
116	Carrera 4 plaza de toros	116	07°36'55.21"N 72°38'44.71"W	12 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	36
117	Carrera 4 plaza de toros	117	07°36'56.35"N 72°38'44.09"W	8 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	42
118	Carrera 4 plaza de toros	118	07°36'57.44"N 72°38'43.42"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	43
119	Carrera 4 plaza de toros	119	07°36'58.53"N 72°38'42.82"W	8 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	40
120	Carrera 2 calle 1 entrada bochalema	120	07°36'48.68"N 72°38'41.19"W	8 Mt	1500	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	0
121	Entrada via Bochalema	121	07°36'49.69"N 72°38'40.51"W	8 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	40
122	Via a bochalema.. entrada principal	122	07°36'50.64"N 72°38'40.11"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	31
123	Via a bochalema.. entrada principal	123	07°36'51.5"N 72°38'39.71"W	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	32
124	Via a bochalema.. entrada principal	124	07°36'52.26"N 72°38'39.31"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	26
125	Via a bochalema.. entrada principal	125	07°36'52.72"N 72°38'39.01"W	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	16
126	Via a bochalema.. entrada a barrio la	126	07°36'54.75"N 72°38'38.16"W	12 Mt	2000	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	74
127	Entrada barrio la granja	127	07°36'54.23"N 72°38'37.84"W	12 Mt	1050	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	16
128	La esmeralda lote 46	128	7°36'9.34"N 72°38'56.99"O	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	
129	La esmeralda lote 46	129	7°36'7.85"N 72°38'56.25"O	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	1	2	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	
130	La esmeralda lote 46	130	7°36'6.68"N 72°38'55.72"O	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	
131	La esmeralda lote 46	131	7°36'5.46"N 72°38'55.12"O	8 Mt	510	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	440×205×115 mm	X	N/A	N/A	N/A	N/A	X	1	1	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	
132	Carrera 4 lote agua blanca	132	7°36'32.89"N 72°38'57.37"O	8 Mt	750	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bueno	24
133																																				
134																																				

Nota: Las cajas, nodos y fuentes se asumirán en el poste.

Alcaldía de Bochalema Norte de Santander	**COMUNICACIONES EXTERNAS** **Alcaldía Municipal**	Código	FGC 001
		Versión	00
		Página	1 de 1

Bochalema,

SP-120-AMB

Señores
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S. P
Dirección: Avenida 7 N° 5N-220 Barrio Sevilla
Teléfono: 5824444 Ext:4200
Cúcuta - Norte de Santander

Asunto: Solicitud uso de infraestructura eléctrica

Cordial saludo,

Yo RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA con cédula de ciudadanía número 1.093.140.227 de Bochalema, actuando como Representante Legal del Municipio de Bochalema en mi condición de Alcalde Municipal, de acuerdo con la credencial expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de fecha 31 de octubre del 2023 y posesionado ante Notaria segunda del Circulo de Pamplona-Norte de Santander según Acta de Posesión de fecha 29 de diciembre del 2023 autorizo al ingeniero electricista GELAR ASLEY ALBA BETANCOURT con cédula de ciudadanía número 1.093.739.192 de Los Patios, para la presentación del siguiente proyecto ante CENS.

Descripción o alcance del proyecto: Contrato LP-003-2023 cuyo objeto es "BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"

Este proyecto cobija el uso de infraestructura en el municipio de Bochalema.
Para mayor información comunicarse al número de celular: 3183927126 – secretaria de Planeación, DIANA MILENA BOLAÑOS DUARTE

Autorizo la notificación por correo electrónico al siguiente buzón: planeación@bochalema-nortedesantander.gov.co
Con la presentación de esta solicitud autorizo a CENS para utilizar la información referente a datos personales para toda la gestión relacionada con el trámite del presente proyecto y su tratamiento estará regulado por la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuento le sean aplicables y por la política de CENS, la cual puedo consultar en la página web https://www.cens.com.co/Portals/0/internas-home/documentos/decision-empresarial.pdf

Cordialmente,

Representante empresa:

Rafael Ortiz Mora.

RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA
CC: 1.093.140.227 de Bochalema
Alcalde Municipal de Bochalema
Número de celular: 316 5551359

Aval técnico:

GELAR ASLEY ALBA BETANCOURT
CC: 1.093.739.192 de Los Patios
Ingeniero Electricista
Matrícula profesional: SN205-146835
Número de celular: 321-9178745

1475 a 1713

CONSORCIO SIES 2023

San José de Cúcuta, 16 de enero de 2023.

CSIES-BOCHALEMA-0002-2024

Señores
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ATN. Dra. Diana Bolaños
planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co

ASUNTO: Entrega Documentación para trámite ante CENS.

REFERENCIA: Contrato LP-003-2023 cuyo objeto es *"BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"*

Cordial saludo,

De forma respetuosa, me permito informar que una vez solicitada la respectiva información para el uso de la infraestructura de la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander – CENS, se nos allego un listado con la documentación que deberá aportar el municipio para la suscripción del contrato de arrendamiento con dicha empresa (Adjunto Correo Electrónico enviado).

Así mismo, una vez suscrito el contrato de arrendamiento se deberá allegar la siguiente información concerniente al proyecto de la referencia, la cual adjunto a la presente:

1. Plano georreferenciado en formato DWG de acuerdo al capítulo 12 "Presentación de proyecto", la escala de 1:1000 y el rotulado "Diseño detallado y simplificado", firmado digitalmente por un ingeniero electricista con número de matrícula profesional vigente.
2. Archivo KMZ del proyecto.
3. Plantilla solicitud de factibilidad de uso de infraestructura eléctrica.
4. Carta de autorización para presentación del proyecto ante CENS
5. Especificaciones técnicas de los elementos a instalar en la infraestructura eléctrica.
6. Copia de la matrícula profesional del ingeniero electricista.

Es importante mencionar que debe realizarse la correspondiente gestión por la administración de carácter urgente puesto que la empresa CENS cuenta con términos en días hábiles para el estudio y autorización del uso de la infraestructura, lo cual podría afectar el cronograma de actividades de ejecución del contrato de no realizarse prontamente.

Finalmente, es necesario contar con el consentimiento de la empresa CENS para la correcta instalación de la fibra óptica y la energización de las cámaras a instalar producto del contrato de la referencia.

Quedo atento a cualquier inquietud y/o requerimiento adicional.

Atentamente,



RAFAEL PABON LOPEZ
Representante Legal
Consorcio SIES 2023

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Gelar Asley ALBA BETANCOURT**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1093739192** de **Los Patios (Norte de Santander)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **SN205-146835** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **SANTANDER** mediante resolución No. **SN-13 de 2020** el día **16** de **Marzo** de **2020** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-26 de 2020**.

2. La matrícula profesional No. **SN205-146835**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Cuatro (4) días del mes de Marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901817212. Vence el 04-Septiembre-2024**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez



MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo

RE: SOLICITUD DE TERCER DESEMBOLSO CONVENIO 1612-2023

De Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>
Destinatario <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>, Walter Kevin Arregoces Martínez <walter.arregoces@mininterior.gov.co>
Cc Sergio Andrés Vega Novoa <sergio.vega@mininterior.gov.co>, Netkoln Proyectos <Proyectos@netkoln.com>, interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com <interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Fecha 2024-04-22 07:52

Buenos días, después de revisar la documentación allegada, no se evidencian dentro de la solicitud los siguientes documentos:

- Cuenta de cobro firmada y expedida por el alcalde municipal.
- Informe de Interventoría del avance con registro fotográfico.
- Parafiscales

Adicionalmente, se debe subsanar el certificado de avance del supervisor, toda vez que menciona que la supervisión por parte del Ministerio del Interior, elaboró y certificó el avance del acta parcial, lo anterior carece en todo sentido de veracidad, cabe recordarles que el avance es avalado, certificado y verificado por la interventoría.

De acuerdo a lo anterior, se solicita de manera atenta que la documentación relacionada se allegue a esta supervisión a más tardes a las 13:00 horas del día de hoy lunes 22 de abril de 2024, quedamos atento a cualquier duda al respecto y de antemano agradecemos la gestión.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Profesional de Apoyo Subdirección de Proyectos SCC
Havid Numa Marchena
Havid.numa@mininterior.gov.co
Teléfono: 3007119840.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: planeacion @bochalema-nortedesantander.gov.co <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>
Enviado: viernes, 19 de abril de 2024 13:56
Para: Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>; Walter Kevin Arregoces Martínez <walter.arregoces@mininterior.gov.co>
Asunto:

Buenas tardes ingenieros del Ministerio del Interior.

Adjunto envío la siguiente documentación.

11.1 Carta Solicitud
11.A. la certificación del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños.

B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance.: Se adjunta en Drive por el peso del mismo:
https://drive.google.com/file/d/16pnNzU3rkYTVC1z6nLinqnLrjgiq6Dkj/view?usp=drive_link

C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.
12.1. Designación de supervisora Diana Bolaños
12.2. Designación de supervisor Jhonattan Boada.
13.. Informe Mensual Supervisión Febrero + Anexo Informe Financiero.
Agradezco su atención.

Cordial saludo!

--

AHORA SÍ¡ BOCHALEMA AVANZA¡

Arq. Jhonattan José Boada Ortega
Contacto: 3209925867
Secretaria de Planeación Municipal
Bochalema Norte de Santander

CORRECCIÓN INFORMES MENSUALES

De CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>
Destinatario <interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Fecha 2024-04-13 08:32

INFORME MENSUAL 003 ENERO DE 2024 CON ANEXOS.pdf (~6.6 MB) INFORME MENSUAL 002 DICIEMBRE DE 2023 CON ANEXOS.pdf (~14 MB)

Buenos días,

Cordial saludo,

Conforme a su requerimiento, me permito anexar los siguientes informes corregidos ya que presentaban el mismo error involuntario en la redacción:

- Informe mensual 001 Noviembre
- Informe mensual 002 Diciembre
- Informe mensual 003 Enero
- Informe mensual 004 Febrero

Quedo atento a sus comentarios y/o cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

INFORME MENSUAL 004 FEBRERO DE 2024 CON ANEXOS.pdf
INFORME MENSUAL 001 NOVIEMBRE DE 2023 CON ANEXOS.pdf

SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC
Carrera 7N 19-28 Ed. Torre Bolívar Oficina 1504
Tel: +57 310 491 8242 - +57 311 6017996 Pereira - Risaralda
Web: www.smartycolombia.com - www.smartycolombia.co

"La información contenida en este correo electrónico y anexos son confidenciales, están dirigidos únicamente para el uso del emisor y el remitente al que fue dirigido, contiene información confidencial, cualquier uso, distribución o reproducción de este correo que no sea por el destinatario, queda prohibido."
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. ¡Proteger el medio ambiente es tarea de todos!

RESPUESTA OFICIO INT-CM04-012-2024.

De CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>
Destinatario <interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Fecha 2024-04-16 11:20

CSIES-BOCHALEMA-0020-2024 - RESPUESTA OFICIO INT-CM04-012-2024 .pdf (~1.7 MB)

Buen día

Cordial saludo,

Adjunto oficio del asunto.

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC
Carrera 7N 19-28 Ed. Torre Bolívar Oficina 1504
Tel: +57 310 491 8242 - +57 311 6017996 Pereira - Risaralda
Web: www.smartycolombia.com - www.smartycolombia.co

"La información contenida en este correo electrónico y anexos son confidenciales, están dirigidos únicamente para el uso del emisor y el remitente al que fue dirigido, contiene información confidencial, cualquier uso, distribución o reproducción de este correo que no sea por el destinatario, queda prohibido."
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. ¡Proteger el medio ambiente es tarea de todos!

San José de Cúcuta, 16 de abril de 2024

CSIES-BOCHALEMA-0020-2024

Ingeniero
IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
Director de Interventoría
interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com

ASUNTO: Respuesta a oficio No. INT-CM04-012-2024.

REFERENCIA: Contrato LP-003-2023 cuyo objeto es *"BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"*

Cordial saludo,

De forma respetuosa, me permito reportar el estado actual de los puntos de cámara a la fecha con el fin de subsanar los hallazgos encontrados por la interventoría en el oficio del asunto:

CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO	
	
Observaciones: A la fecha del presente, ya realizó construcción del poyo y la respectiva instalación de la condensadora del aire.	

PUNTO DE CÁMARA 11

Observación: Se realizó resane de perforación realizada para instalación de la canalización IMC a PVC.

PUNTO DE CÁMARA 14

Observación: Se realizó instalación de tapa de la caja de poste auxiliar.

PUNTO DE CÁMARA 20

Observación: Se realizó resane de perforación realizada para instalación de la canalización IMC a PVC de caja auxiliar.

PUNTO DE CÁMARA 23

Observación: Me permito manifestar que la caja auxiliar se encuentra diseñada para trabajos pesados, contando con reforzamiento de los ángulos así mismo, el marco está diseñado con platinas de mayor grosor otorgándole más resistencia y su tapa se encuentra reforzada conforme a los especificado en la normatividad vigente.

PUNTO DE CÁMARA 25

Observación: Se realizó resane de perforación realizada para instalación de la canalización IMC a PVC de caja auxiliar.

PUNTO DE CÁMARA 28

Observación: Se realizó resane de perforación realizada para instalación de la canalización IMC a PVC de caja auxiliar.

- En lo concerniente a la solución de aislamiento requerido para el punto de cámara 19, manifestamos que en conversaciones con la empresa CENS dueña de las redes, se llegó a la conclusión del remplazo del cableado eléctrico que se encuentra cercano al punto de cámara por cableado ecológico (Adjunto Cotización). De esta forma, ya realizado el pago de la cotización, nos encontramos a la espera de la programación por la empresa de energía para el trabajo de remplazo del cableado.

Atentamente,



RAFAEL PABON LOPEZ
Representante Legal
Consorcio SIES 2023

CENS | Grupo epm

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9
Avenida Aeropuerto 5N - 220 Sevilla, Cúcuta / Tel.: 5824444
Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002
Grandes Contribuyentes: Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 - **Agentes Retenedores IVA**

Reporta daños y emergencia marcando gratis
018000 414115
0 al 115

COTIZACIÓN

Cotización No.: 21357146 SERVICIOS

Fecha: 15/03/2024
Municipio: BOCHALEMA
Dirección: CRA 2 6 90 - BOCHALEMA
Alcance: Mano de obra para instalar cable ecologico por MT

Solicitante: ANDERSON JHOAN CONTRERAS
Barrio: CRA 2 6 90 - BOCHALEMA
Teléfono: 3045512411

Tipo de Cotización: COTIZACIONES

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	IVA	TOTAL
4386	TRABAJO CON CUADRILLA DE LINEAS DESENERGIZADAS EN AREA METROPOLITANA (JORNADA ORDINARIA DIURNA)	5.00	$ 380,200.0	$ 361,190.0	$ 1,901,000.0

SubTotal	$ 1,901,000.0
IVA	$ 361.190,0
TOTAL	$ 2,262,190

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS

FACTURA DE SERVICIOS DE PORTAFOLIO

Resolución DIAN: Autorización número 18764067083614 del 11-3-2024 RANGO 8001 HASTA LA 13000

Periodo Facturado Desde: 2024-04-11 **Hasta:** 2024-04-11

Fecha y Hora Generación: 2024-04-11 16:49:43-05:00

Forma de Pago: CRÉDITO

Fecha de Vencimiento: 2024-05-03

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE8302

Artículo 1.6.1.4.39. Decreto 1625 de 2016

Nombre o Razón Social: CONSORCIO SIES 2023 **Código Cuenta-NIU:** 1134514-2 **Cédula o Nit:** 901770539-9

Dirección: CL 3 11 E 38 BRR QUINTA ORIENTAL **Ciudad:** SAN JOSÉ DE CÚCUTA **Teléfono:** 3157810517

Correo Electrónico: smarty.colombia@gmail.com

CUFE: 3c4207c8e29006fea7922902be85d11eef3df4f890a6af7b12f3e66474b769ede5aad0341f22a874c1ee63ae4bfab60e

Nro Lineas	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNIDAD	IVA	VALOR TOTAL
1	3915	MTTO DE REDES GRAVADO 19%	Peso	5	380,200	361,190	2,262,190
Total Lineas	1						

TOTAL VENTA	1,901,000
IVA	361,190
SALDO ANTERIOR	0
OTROS	0
TOTAL DOCUMENTO	2,262,190

Valor Reclamación: 0
Valor Congelado: 0
Valor Financiado: 0
Observación:

INFORMACION DE RECAUDO	INFORMACION CONTACTO CENS
Puede realizar el pago a través de los siguientes canales: • Pago en físico en los puntos de recaudo del servicio de energía. • Pago en línea ingresando a la página web www.cens.com.co / Servicios en línea / Paga tu factura • Transferencia bancaria en la cuenta corriente número 0661-6999971-2 de Davivienda. Para la aplicación de este pago se requiere el envío del soporte al correo electrónico recaudoempresarial@cens.com.co indicando como referencia el número de usuario o de factura.	Para gestionar inquietudes de portafolio dirigirse a: portafolio@cens.com.co o al celular 3125732640. Para gestionar inquietudes sobre arrendamiento de infraestructura puede dirigirse a: eilen.bautista@cens.com.co o al Celular: 3114748698.

ESTIMADO CLIENTE: EXPRESE SUS INCONFORMIDADES CON RELACIÓN AL VALOR FACTURADO A NUESTROS REVISORES FISCALES, KPMG S.A.S, AL APARTADO AÉREO N° 1212 DE MEDELLÍN.
LINEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. / E-mail: contactotransparente@epm.com.co - Linea Nacional: 01 8000 522 955.
CENS velará por la reserva de la información del denunciante.

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9
Avenida Aeropuerto SN – 220 Sevilla, Cúcuta / Tel:5824444
Somos Autorretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002
Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 0012220 del 26 de diciembre de 2022- Agentes Retenedores IVA

CUPÓN DE BANCO

Código Cuenta-NIU: 1134514-2
Periodo Facturado desde: 2024-04-11 **Hasta:** 2024-04-11
Total a Pagar: **2,262,190**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Artículo 1.6.1.4.39. Decreto 1625 de 2016
FE8302

(415)7709998001794(8020)01000113451400(3900)2262190(96)20240503

ACTSIS LTDA, NIT: 800204634-8, Sistema: SAC Actsis@actsis.com
eFactura Cadena. NIT 830.959.144-0

Comprobante

de pago en línea

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER SA

Pago realizado por: Carla Lorena Valencia Marín

Nro. de factura: 1617288359

Descripción del pago: Pago sin factura cliente 1134514. Doc. 901770539

Nro. de referencia: 1617288359

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 8905005149

Fecha y hora de la transacción: Viernes 12 de Abril de 2024 04:44:52 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 2,262,190.00

Cuenta: *******3170

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com



Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado $2.262.190,00	Banco BANCOLOMBIA
Autorización / CUS 572229352	Fecha de transacción 2024-04-12 16:44:43
Recibo 1617288359	Dirección IP 191.156.231.240
Código Respuesta 00	

El comprobante será enviado a
smarty.colombia@gmail.com

Total pagado

S140815701-T103

$2.262.190,00 COP

Pago sin factura cliente 1134514. Doc. 901770539

Detalle del pago

Referencia
6619aa81f16dc

Fecha de solicitud
2024-04-12 16:43:09

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en recaudos@cens.com.co

Hecho por placetopay by evertec

Regresar

Idioma

Pagos electrónicos

¡Hola!

Smarty Colombia Sas Bic

Tu transacción a CENS - Micrositio Personalizado por valor de

$2.262.190

ha sido

Aprobado

Referencia de pago	6619aa81f16dc
Fecha de pago	2024-04-12 16:46:52

Registros relacionados

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REF. ALTERNA	TOTAL A PAGAR	VENCIMIENTO
6619aa81f16dc	Pago sin factura cliente 1134514. Doc. 901770539	1134514	$2.262.190	2024-04-13

Regresar al micrositio

placetopay by evertec

CONCEPTO SOBRE TIEMPOS REQUERIDOS PARA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

De CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>
Destinatario <interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Cc <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>
Fecha 2024-04-18 14:11

CSIES-BOCHALEMA-0021-2024 - Concepto Tiempos requeridos.pdf (~198 KB)

Buen día

Cordial saludo,

Adjunto oficio del asunto.

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC
Carrera 7N 19-28 Ed. Torre Bolívar Oficina 1504
Tel: +57 310 491 8242 - +57 311 6017996 Pereira - Risaralda
Web: www.smartycolombia.com - www.smartycolombia.co

"La información contenida en este correo electrónico y anexos son confidenciales, están dirigidos únicamente para el uso del emisor y el remitente al que fue dirigido, contiene información confidencial, cualquier uso, distribución o reproducción de este correo que no sea por el destinatario, queda prohibido."
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. ¡Proteger el medio ambiente es tarea de todos!

San José de Cúcuta, 18 de abril de 2024

CSIES-BOCHALEMA-0021-2024

Ingeniero
IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
Director de Interventoría
interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com

C.C.
JHONATTAN BOADA ORTEGA
Secretario de Planeación
Municipio de Bochalema
planeación@bochalema-nortedesantander.gov.co

ASUNTO: Concepto Tiempos requeridos para finalización de ejecución contractual.

REFERENCIA: Contrato LP-003-2023 cuyo objeto es *"BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"*

Cordial saludo,

De forma respetuosa, me permito dar concepto acerca del tiempo que requerimos para la correcta finalización de las actividades contractuales, el cual sería de **UN (1) MES y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FACTIBILIDAD DE ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA POR LA EMPRESA CENS** la cual será emitida cuando el Municipio de Bochalema cumpla con los documentos requeridos por la misma para el perfeccionamiento del Contrato de Arrendamiento.

A continuación, se discriminan las actividades a realizar dentro del término solicitado:

ACTIVIDAD	TIEMPO REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
Tendido de Fibra Óptica	Dos (2) semanas	En este término deberá realizarse el tendido de fibra óptica aérea e instalación de herrajería utilizando los postes de la infraestructura eléctrica aprobada por la empresa CENS además de realizar la conexión del suministro eléctrico de los puntos de cámaras.
Empalmería	Una (1) semana.	Tiempo requerido para la interconexión física de la fibra óptica a través de fusión térmica.
Pruebas del sistema CCTV	Dos (2) semanas.	El contratista debe realizar pruebas de mínimo diez (10) días para asegurar que la interconexión de todo el sistema de cámaras este en correcto funcionamiento (Sistema de visualización, equipos, fibra óptica)

Capacitación – Documentación – Entrega a Municipio	Una (1) semana	Se realizará capacitación a los operadores del sistema (Designados por la Policía Nacional). Así mismo, se debe cumplir con toda la documentación correspondiente a los entregables del proyecto al Ministerio del Interior con aprobación de la interventoría. Finalmente se realizará la entrega oficial a satisfacción del proyecto al Municipio de Bochalema.

Por tal motivo, resulta indispensable la correspondiente adición en tiempo del Contrato N° LP-003-2023 esto con el fin de poderse realizar la entrega a satisfacción del proyecto.

Agradeciendo la atención prestada.

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
Representante Legal
Consorcio SIES 2023

RE: Solicitud de Prorroga del Convenio 1612 de 2023 + Anexos.

De Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>
Destinatario <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>
Cc Walter Kevin Arregoces Martínez <walter.arregoces@mininterior.gov.co>, interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com <interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>, Proyecto Infraestructura <proyectos.infraestructura@mininterior.gov.co>, Sergio Andrés Vega Novoa <sergio.vega@mininterior.gov.co>, Adriana Bello Leon <adriana.bello@mininterior.gov.co>
Fecha 2024-04-22 08:12

Buenos días, después de revisar la documentación allegada en cuanto a la solicitud de prorroga solicitada por la supervisión del Municipio, no se evidencian los siguientes documentos:

- Cronograma del convenio hasta la fecha de solicitud de prórroga firmado por el alcalde municipal, la supervisión del municipio, y los respectivos datos y espacio para firma de supervisión y apoyo a la supervisión del Ministerio.
- Cronograma del Contratista (diagrama de Gantt)

Adicionalmente, se evidencia en el oficio del contratista una solicitud de suspensión, lo que no es coherente con la aprobación de la interventoría ni con la solitud que está haciendo el municipio.

De acuerdo a lo anterior, solicitamos se alleguen los documentos faltantes, y se de claridad sobre la solicitud del contratista y del municipio, allegar lo anterior a esta supervisión a más tardar a las 13:00 horas del día de hoy lunes 22 de abril de 2024, quedo atento a cualquier duda al respecto, de antemano agradecemos la gestión.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Profesional de Apoyo Subdirección de Proyectos SCC
Havid Numa Marchena
Havid.numa@mininterior.gov.co
Teléfono: 3007119840.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: planeacion @bochalema-nortedesantander.gov.co <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>
Enviado: viernes, 19 de abril de 2024 12:13
Para: Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>; Walter Kevin Arregoces Martínez <walter.arregoces@mininterior.gov.co>
Asunto: Solicitud de Prorroga del Convenio 1612 de 2023 + Anexos.

Buen día señores Havid y Kevin.

De acuerdo con las observaciones al documento entregado el día de ayer,
adjunto la información.

2.1 Oficio de solicitud de prórroga del Municipio
2.2. Oficio de viabilidad o concepto por parte de la interventoría, el cual debe tener adjunto los oficios de solicitud de parte del contratista.
2.3 Cédula Alcalde
2.4 Acta de posesión
2.5 Certificado e-27
2.6 Certificados de antecedentes fiscales - contraloría
2.7. Certificados de antecedentes procuraduría
2.8 Certificados de antecedentes judiciales
2.9 REDAM
2.10. RNMC
2.11 RUT actualizado
2.12 Designación de supervisor del municipio

Cordial saludo!

--

AHORA SÍ¡ BOCHALEMA AVANZA¡

Arq. Jhonattan José Boada Ortega
Contacto: 3209925867
Secretaria de Planeación Municipal
Bochalema Norte de Santander

Diseño de Cajas - Puntos de Cámara 15 y 23.

De CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>
Destinatario <interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Fecha 2024-04-24 09:09

CSIES-BOCHALEMA-0023-2024 - Diseño de cajas – Punto de cámara 15 y 23.pdf (~723 KB)

Buen día

Cordial saludo,

Adjunto oficio del asunto.

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC
Carrera 7N 19-28 Ed. Torre Bolívar Oficina 1504
Tel: +57 310 491 8242 - +57 311 6017996 Pereira - Risaralda
Web: www.smartycolombia.com - www.smartycolombia.co

"La información contenida en este correo electrónico y anexos son confidenciales, están dirigidos únicamente para el uso del emisor y el remitente al que fue dirigido, contiene información confidencial, cualquier uso, distribución o reproducción de este correo que no sea por el destinatario, queda prohibido."
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. ¡Proteger el medio ambiente es tarea de todos!

San José de Cúcuta, 24 de abril de 2024

CSIES-BOCHALEMA-0023-2024

Ingeniero
IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
Director de Interventoría
interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com

ASUNTO: Diseño de cajas – Punto de cámara 15 y 23.

REFERENCIA: Contrato LP-003-2023 cuyo objeto es *"BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"*

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito indicar los motivos por los cuales se realizó modificación del diseño de caja 60 x 60 de los puntos de cámara 15 y 23:

PUNTO DE CÁMARA 15	
	
Como se puede observar en las imágenes de referencia, cuando se realizó la excavación para el hincado del poste se tenía proyectado la realización de la caja 60*60. Una vez hincado el poste y comenzado las excavaciones para la caja, la base del poste de apoyo no permitió la que la caja se realizará de este tamaño por lo que se tuvo que realizar los ajustes que se evidencian en el diseño civil adjunto al presente.	

1500 a 1713

PUNTO DE CÁMARA 23	
	
Como se puede observar en la imagen de referencia el tamaño del andén donde se encuentra ubicada la caja es reducido lo cual nos obligó a disminuir el tamaño de la caja.	

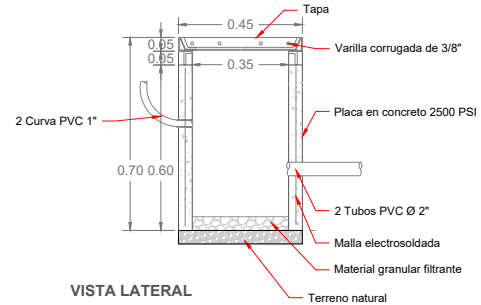
Finalmente, adjunto a la presente el diseño civil de las cajas de los puntos de cámara mencionados.

Agradeciendo la atención prestada.


Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
Representante Legal
Consorcio SIES 2023

CAJA DE INSPECCIÓN




VISTA LATERAL

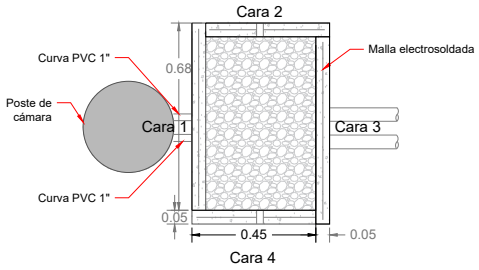



VISTA SUPERIOR

VISTA AXONOMÉTRICA MARCO




VISTA AXONOMÉTRICA TAPA DE CONCRETO



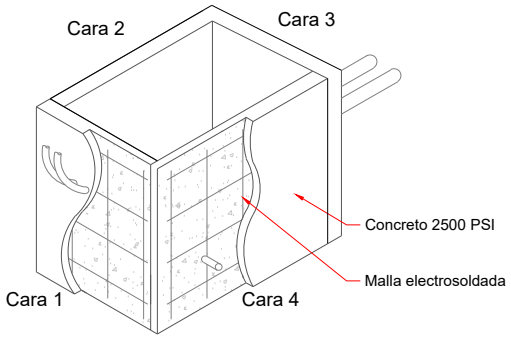

VISTA AXONOMÉTRICA CAJA

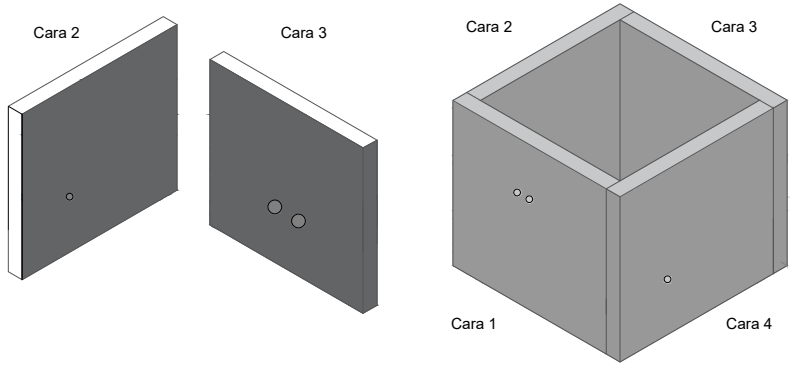

VISTA AXONOMÉTRICA PLACAS DE CONCRETO

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

INTERVENTORÍA:

PROYECTO:
BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN FASE II.

BOCHALEMA
NORTE DE SANTANDER

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE BOCHALEMA(CCTV)

GERENTE DE PROYECTO CONSORCIO SIES:
RAFAEL PABON LÓPEZ
INGENIERO DE SISTEMAS
MP. 54255165929NTS

RESIDENTE DE PROYECTO CONSORCIO SIES:
ROLANDO RAMIRO VILLAMIZAR P.
INGENIERO ELECTRÓNICO
MP. NS206-140999

DISEÑO CIVIL
ANA BOLENA MEZA MORA
ARQUITECTO
MP. A21252013-37273128

DIBUJÓ:
ANA BOLENA MEZA MORA
ARQUITECTO
MP. A21252013-37273128

NOTAS PARTICULARES:

- NO HACER MODIFICACIONES A LOS PLANOS SIN LA AUTORIZACIÓN DE LOS DISEÑADORES.
- ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A ESTA FECHA.
-A MENOS QUE SE DIGA OTRA COSA, LAS DIMENSIONES SON EN METROS.

CONTIENE:
CAJA DE INSPECCIÓN

APROBÓ (INTERVENTORÍA):
IVÁN MAURICIO BRITO MEJIA
ING. ELECTRÓNICO
MP. QN206-67219

ESCALA: 1:100

FECHA: ABRIL DE 2024

CÓDIGO: CSIES-BOCHALEMA-LP-003-2023

PLANCHA No. 1/1

1502 a 1713

Fwd: Observaciones de tercer desembolso convenio 1612-2023 BOCHALEMA

De <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>
Destinatario <hebrito1@gmail.com>, <interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Fecha 2024-04-26 12:19

---------- Forwarded message ---------
De: **Walter Kevin Arregoces Martínez** <walter.arregoces@mininterior.gov.co>
Date: jue, 25 abr 2024 a las 20:46
Subject: Observaciones de tercer desembolso convenio 1612-2023 BOCHALEMA
To: planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>
Cc: Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>, Sergio Andrés Vega Novoa <sergio.vega@mininterior.gov.co>

Cordial saludo colaboradores del Municipio de Bochalema

De acuerdo al trámite relacionado al tercer desembolso se registran las siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN PRINCIPAL:

En la documentación se especifica el 78,23% de avance con corte al 18 de abril 2024, cuando en la visita se identificaron elementos que no fueron instalados o garantizados en bodega. Lo cual trajo en consecuencia que el porcentaje fuese reducido al 78,06%, con el cual se tramitó la solicitud de prórroga. El acta parcial no fue ajustada reduciendo dichas cantidades mencionadas durante la visita. De lo anterior se solicita adjuntar un breve informe ejecutivo de la interventoría donde se refleje la ejecución de cantidades que ascienden al 78,23% de acuerdo con los items mencionados en la visita del Ministerio; en caso contrario, todo el documento se deberá ajustar al 78,06% e igualmente la factura que soporte el contratista.

OBSERVACIONES EN DETALLE:

1. El acta parcial debe incluir el acta de mayores y menores cantidades inmediatamente posterior a la misma, con su respectiva justificación tal y como se solicitó en la visita. En especial lo relacionado al reemplazo de los radio enlace por fibra con soporte de costos.

2. El acta parcial debe contener las notas donde se indique con claridad como se atribuye la asignación porcentual para la valoración del avance de cada item, especialmente para aquellos donde se está valorando como avance la compra y stock en bodega.

4. No se encuentra incluido el desglose de actividades de obra civil solicitado para el CCM con su balance de mayores y menores cantidades.

5. El informe de interventoría está relacionando al supervisor del convenio por parte del Ministerio, como supervisor del contrato de implementación.


INFORME EJECUTIVO INTERVENTORIA
PARCIAL DE AVANCE N°031

Tabla 18. Ficha Técnica del Convenio

4.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

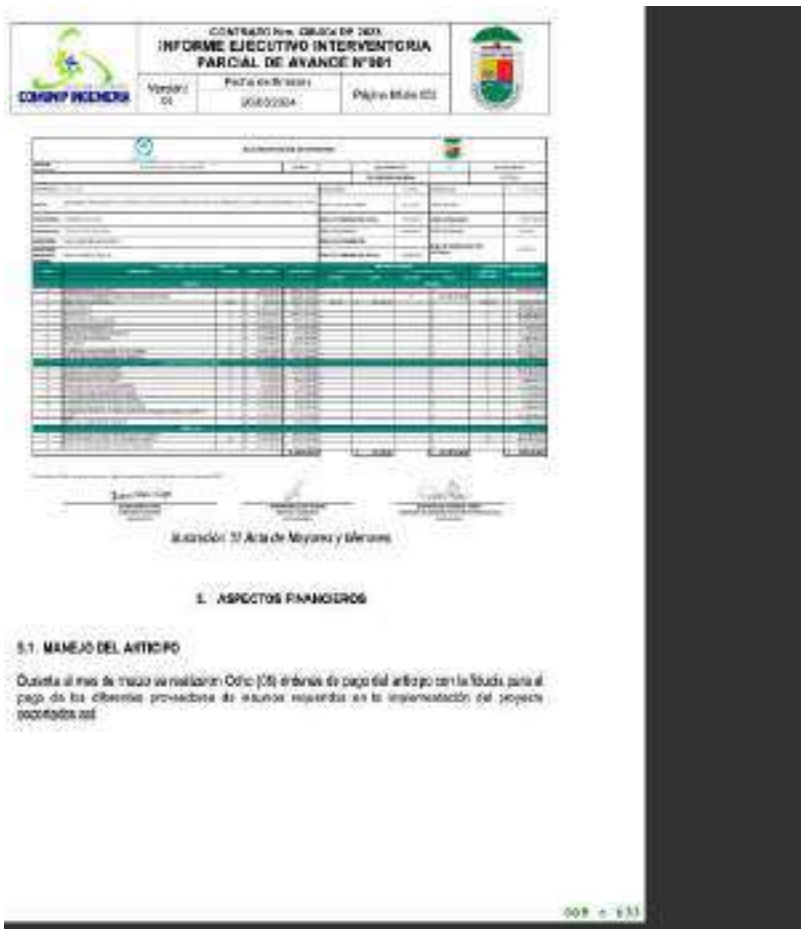
Para el periodo del presente informe se tiene un avance del 78.23%

Elementos que se encuentran instalados

- CAMARAS DOMO PTZ. TIPO 1. Se encuentra instaladas total 21
- FIBRA ÓPTICA MONOMODO se encuentra en bodega.
- SWITCH TIPO 0. Adquirido
- SWITCH TIPO 1 se encuentra instalado en cada punto de cámara
- MONITOR DE VISUALIZACIÓN. Se encuentra en bodega ya contratista.
- ESTACIÓN DE TRABAJO OPERADOR Se encuentra en bodega del contratista.
- JOYSTICK DE OPERACIÓN Se encuentra en bodega del contratista.
- UPS 1.5KVA Se encuentra instalada en cada punto de cámara, total 21
- SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CÁMARA Se encuentra instalada en Rack total 21
- POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN, hacados 21 postes de 14m y 1 de apoyo
- GABINETES DE POSTE FACHADA Se encuentran instalado en cada punto de cámara, total 21
- CORONAS ANTIESCALATORIAS Se encuentra en bodega del contratista
- BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS Se encuentran instalado en cada punto de cámara, total 21

6. Informe de interventoría se contradice con respecto al porcentaje de ejecución. Primer y ultimo parrafo. El ultimo párrafo corresponde en realidad con lo verificado en la visita del Ministerio.





7. El supervisor del municipio que valida la aprobación de mayores y menores cantidades con respecto a la eliminacion de los radio enlace, no es el mismo quien certifica el avance del proyecto. Debe ser el mismo.

8. No se registra sustento financiero soporte de la moficacion del radio enlace por instalacion de fibra optica, en lo que refiere a los costos para la ejecucion de ambas actividades. El informe de interventoría se remite en exclusivo a mencionar la concertación de las partes valorando la importancia de efectuar el cambio de radio enlace por fibra. Si es asi, ¿Por qué motivo no quedó esta solución desde los estudios y diseños del proyecto? considero que esto se debe soportar con el análisis de precios unitarios y deslogose del costo por actividad. Fueron requeridos mayores recursos? se generó un saldo a favor?

10. Se requiere claridad con respecto al plan de amortizacion del anticipo, donde se especifica un valor de $ 80.000.000 por concepto de "apoyo administrativo y logístico".

11. Se requiere incluir como anexo el contrato suscrito con la fiducia mercantil, ya que sobre el informe de interventoría no es legible. De igual forma se requiere incluir el respectivo informe de fiducia con sus respectivos anexos.

12. Considero pertinente incluir no solo las prorrogas del contrato como anexo al informe de interventoria, sino igualmente las aprobaciones en SECOP por parte del municipio.

13. Se debe verificar si la modificación a la forma de pago de los contratos se realizó y publicó en la plataforma SECOP II. Adicionalmente se identifica un error en dicho docmento modificatorio donde se relaciona al Ministerio del Interior en calidad de interventor del contrato de implementación y tampoco se especifican las garantias del contrato. Genera interrogante que los documentos no se encuentran firmados por quienes participaron en la suscripción de dicho documento, se puede solucionar con una aclaración breve y concreta por parte del municipio.


CONTRATO

Página 1 de 9


CONTRATO

Página 3 de 9

RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA
MUNICIPIO DE BOCHALEMA
CONTRATANTE

IVAN MAURICIO MATTO MEDINA
CONTRATISTA

12. Se adjunta en el documento pág. 452, un acta con porcentaje del 78,35% con fecha posterior a la visita del Ministerio y el corte realizado por la interventoría.



Agradecemos sus respuestas a los puntos solicitados.

--

AHORA SÍ¡ BOCHALEMA AVANZA¡

Arq. Jhonattan José Boada Ortega
Contacto: 3209925867
Secretaria de Planeación Municipal
Bochalema Norte de Santander

Fwd: Solicitud de informes de Supervisión Convenio 1612-2023 Municipio de Bochalema Norte de Santander

De <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>
Destinatario <interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Fecha 2024-04-26 16:03

--------- Forwarded message ---------
De: **Faiver Rivera Montes** <faiver.rivera@mininterior.gov.co>
Date: vie, 26 abr 2024 a las 15:57
Subject: Solicitud de informes de Supervisión Convenio 1612-2023 Municipio de Bochalema Norte de Santander
To: alcladia@bochalema-nortedesantander.gov.co <alcladia@bochalema-nortedesantander.gov.co>, planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>, ontactenos@bochalema-nortedesantander.gov.co <ontactenos@bochalema-nortedesantander.gov.co>
Cc: Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>

Buenas tardes,

En desarrollo de las actividades correspondientes a la ejecución del Convenio No. 1612 de 2023, suscrito el 28 de junio de 2023 entre el Ministerio del Interior y el municipio de Bochalema Norte de Santander, cuyo objeto es "REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES AL ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV PARA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, POR PARTE DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES FINANCIEROS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON - SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD Y LAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS DEL PROYECTO, POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTER." Y cuyo plazo de ejecución finaliza el 30 de abril de 2024.

De acuerdo con los compromisos adquiridos por parte del municipio, recordamos enviar los informes de supervisión por parte del municipio. En su CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente contrato, El municipio de Bochalema Norte de Santander, entre otras tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS:

"(...) ***Numeral 13. Elaborar y presentar al MINISTERIO - FONSECON, dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de perfeccionamiento del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio; indicando los porcentajes de avance y ejecución conforme a lo establecido en el cronograma previamente presentado.***

Se debe adjuntar al informe de supervisión:

1. *Informe de supervisión municipio mes de noviembre y diciembre de 2023, enero, febrero y marzo de 2024*
2. *Informe financiero mes de noviembre y diciembre de 2023, enero, febrero y marzo de 2024*
3. *Extracto bancario mes de noviembre y diciembre de 2023, enero, febrero y marzo de 2024*
4. *Informe de Interventoría de noviembre y diciembre de 2023, enero, febrero y marzo de 2024*
5. *Informe de contratista de obra de noviembre y diciembre de 2023, enero, febrero y marzo de 2024*

El plazo máximo para radicar los informes de supervisión es el próximo **29 de abril 2024.** Agradecemos el cumplimiento de lo señalado y la entrega completa de la información

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a supervisión
FAIVER RIVERA MONTES
faiver.rivera@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

--

AHORA SÍ¡ BOCHALEMA AVANZA¡

Arq. Jhonattan José Boada Ortega
Contacto: 3209925867
Secretaria de Planeación Municipal
Bochalema Norte de Santander

Informes mensuales y financiero CCTV Supervisor

De <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>
Destinatario <interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Fecha 2024-04-26 18:06

Informes mensuales y financiero CCTV.zip

--

AHORA SÍ¡ BOCHALEMA AVANZA¡





Arq. Jhonattan José Boada Ortega
Contacto: 3209925867
Secretaria de Planeación Municipal
Bochalema Norte de Santander




ANEXO N° 12 BITACORA TOTAL DEL PROYECTO





ANEXO N° 12.1 BITACORA PLANTA EXTERNA



CONTRATO N° LP-003-2023









BITCORA DIARIA OBRA EN CALLE


FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3/02/2024	• Se realizó entrega de elementos de protección personal y capacitación en normas básicas de seguridad y salud en el trabajo al personal de obra. • Se realizó excavación de los siguientes puntos de cámara: P.C 14 - P.C 15.	
4/02/2024	Se realizó excavación de los siguientes puntos de cámara: P.C.12 - P.C. 13 - P.C. 16	
5/02/2024	Se realizó excavación de los siguientes puntos de cámara: P.C.18 - P.C. 11 - P.C. 19	
6/02/2024	Se realizó excavación de los siguientes puntos de cámara: P.C 20 - P.C 21	
7/02/2024	Se realizó vencimiento de rocas grandes con el martillo demoledor en los diferentes puntos de cámara donde se encontraron.	
8/02/2024	Se realizó excavación del punto de cámara 17. Modificación del punto de cámara 24	
9/02/2024	• Modificación de los puntos de cámaras 25 y 26. • Se continuó con el vencimiento de rocas grandes con el martillo demoledor en los diferentes puntos de cámara donde se encontraron.	
10/02/2024	Se realizó excavación de los siguientes puntos de cámara: P.C.24 - P.C. 28 - P.C. 10	
11/02/2024	Domingo - Día de descanso	
12/02/2024	Se realizó hincado de posteria en los siguientes puntos de cámara: P.C 11 P.C 12 P.C 13 P.C 14 P.C 15 P.C 16 P.C.17 P.C 18 P.C 19 P.C 20 P.C 24	
13/02/2024	Se realizó excavación de los siguientes puntos de cámara: P.C.26 - P.C 29 - P.C.27	
14/02/2024	• Modificación de la ubicación del punto de cámara 9. • Se realizó fundición de plachas para cajas 60*60	

15/02/2024	• Se realizó excavación del punto de cámara 25. • Se realizó fundido de cajas de los puntos de cámaras 12 y 14. • Se continuó con fundido de planchas para cajas 60*60.	
16/02/2024	Se realizó fundido de cajas de los puntos de cámara 15 y 17.	
17/02/2024	Se realizó excavación de los siguientes puntos de cámara: P.C.9 - P.C. 22	
18/02/2024	**Domingo - Día de descanso**	
19/02/2024	Se realizó hincado de posteria en los siguientes puntos de cámara: P.C 9 P.C 10 P.C 13 (Poste de Apoyo) P.C 21 P.C 22 P.C 25 P.C.26 P.C 27 P.C 28 P.C 29	
20/02/2024	• Se realizó excavación del punto de cámara 23. • Se realizó canalización del punto de cámara 14.	
21/02/2024	• Se realizó fundido de caja del punto de cámara 13. • Se realizó instalación de marco de caja punto de cámara 14. • Se realizó instalación de marco de caja punto de cámara 12.	
22/02/2024	• Se realizó fundido de caja en los puntos de cámara 18 Y19. • Se realizó fundición de planchas para cajas 60*60	
23/02/2024	• Se realizó hincado de poste del punto de cámara 23,	
24/02/2024	• Se realizó fundido de caja en puntos de cámara 16, 22 y 24.	
25/02/2024	**Domingo - Día de descanso**	
26/02/2024	• Se realizó fundido de caja y canalización del punto de cámara 21. • Se realizó fundido de caja y canalización del punto de cámara 29. • Se realizó fundido de caja del punto de cámara 20.	
27/02/2024	• Se realizó fundido de caja del punto de cámara 25. • Se realizó fundido de caja y canalización del punto de cámara 9. • Se realizó fundido de caja del punto de cámara 28 • Se realizó fundido de caja del punto de cámara 11	
28/02/2024	• Se realizó fundido de caja de los puntos de cámara 26, 27 y 28.	

29/02/2024	• Culminación de canalización y reposición de tableta existente en punto de cámara 21. • Culminación de fundido de caja del punto de cámara 11.	
1/03/2024	• Culminación de fundido de caja 30*30 y trabajo de reposición de tableta existente en punto de cámara 21	
2/03/2024	• Se realizó fundido de caja del punto de cámara 29. • Se realizó fundido de caja del punto de cámara 23. • Se realizó fundido de caja del punto de cámara 10. • Se realizó fundido de caja del punto de cámara 9.	
4/03/2024	• Se realizó fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 11. • Se inició fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 20.	
5/03/2024	• Se culmino fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 20. • Se realizó fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 18	
6/03/2024	• Se realizó fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 19. • Se realizó fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 17. • Se realizó fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 16.	
7/03/2024	• Se inicio apertura de canalización del punto de cámara 22. • Se inicio apertura de canalización del punto de cámara 11.	
8/03/2024	• Se realizó fundido de caja 30*30 y se culmino canalización del punto de cámara 22. • Se realizó fundido de caja 30*30 y se culmino canalización del punto de cámara 11.	
9/03/2024	**NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE**	
10/03/2024	**Domingo - Día de descanso**	
11/03/2024	**NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE**	
12/03/2024	• Se realizó fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 28. • Se realizó Fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 23.	
13/03/2024	• Vestida de poste – Punto de cámara 22. • Vestida de poste – Punto de cámara 23. • Vestida de poste – Punto de cámara 29. • Se finalizaron trabajos de fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 23. • Se realizó fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 29.	
14/03/2024	• Vestida de poste – Punto de cámara 27 • Vestida de poste – Punto de cámara 26. • Vestida de poste – Punto de cámara 28. • Vestida de poste – Punto de cámara 24. • Vestida de poste – Punto de cámara 29. • Vestida de poste – Punto de cámara 9. • Se finalizaron trabajos de fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 29. • Se finalizó fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 28.	
15/03/2024	• Vestida de poste – Punto de cámara 11 • Vestida de poste – Punto de cámara 12. • Vestida de poste – Punto de cámara 14. • Vestida de poste – Punto de cámara 13. • Vestida de poste – Punto de cámara 25. • Vestida de poste – Punto de cámara 23. • Reforzado de caja 60*60 punto de cámara 20. • Se realizó fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 25.	

16/03/20204	• Vestida de poste – Punto de cámara 15 • Vestida de poste – Punto de cámara 16 • Vestida de poste – Punto de cámara 17. • Vestida de poste – Punto de cámara 18. • Vestida de poste – Punto de cámara 20. • Vestida de poste – Punto de cámara 19. • Terminación de caja 60*60 punto de cámara 22. • Se realizó fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 24.	
17/03/2024	Domingo - Día de descanso	
18/03/2024	• Terminación de caja 60*60 punto de cámara 21. • Se inició fundido de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 27.	
19/03/2024	• Terminación de caja 30*30 y canalización del punto de cámara 27. • Terminación de caja 60*60 punto de cámara 11.	
20/03/2024	• Terminación de caja 60*60 del punto de cámara 13.	
21/03/2024	• Fundido de caja 60*60 y canalización del punto de cámara 10. • Fundido de caja 60*60 – 30*30 y canalización del punto de cámara 9.	
22/03/2024	• Se realizó aplome de poste del punto de cámara 24.	
23/03/2024	• Fundido de marco de caja y reposición de cerámica en punto de cámara 23. • Terminación de trabajo de aplome de poste de punto de cámara 24. • Fundido de tapas de cajas.	
24/03/2024	Domingo - Día de descanso	
25/03/2024	• Instalación de tubería y tendido de fibra armada en punto de cámara 15. • Instalación de tubería y tendido de fibra armada en punto de cámara 13. • Instalación de tubería y tendido de fibra armada en punto de cámara 16. • Instalación de tubería y tendido de fibra armada en punto de cámara 17. • Instalación de tubería y tendido de fibra armada en punto de cámara 18. • Tapas terminadas para instalación.	
26/03/2024	• Instalación de tubería y tendido de fibra armada en punto de cámara 22. • Instalación de tubería y tendido de fibra armada en punto de cámara 23. • Instalación de tubería y tendido de fibra armada en punto de cámara 24. • Instalación de tubería y tendido de fibra armada en punto de cámara 27. • Instalación de tubería y tendido de fibra armada en punto de cámara 25.	
27/03/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
28/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
29/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
30/03/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
31/03/2024	Domingo - Día de descanso	
1/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
2/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
3/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
4/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
5/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
6/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
7/04/2024	Domingo - Día de descanso	
8/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
9/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
10/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
11/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
12/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
13/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
14/04/2024	Domingo - Día de descanso	
15/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
16/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
17/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
18/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
19/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
20/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
21/04/2024	Domingo - Día de descanso	
22/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
23/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
24/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
25/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
26/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	















27/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
28/04/2024	Domingo - Dia de descanso	
29/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
30/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
1/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
2/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
3/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
4/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
5/05/2024	Domingo - Dia de descanso	
6/05/2024	• Se realiza instalación de sistemas puesta a tierra en los diferentes puntos de camaras.	
7/05/2024	• Se realiza instalación de sistemas puesta a tierra en los diferentes puntos de camaras.	
8/05/2024	• Se realiza instalación de sistemas puesta a tierra en los diferentes puntos de camaras.	
9/05/2024	• Se realiza instalación de sistemas puesta a tierra en los diferentes puntos de camaras.	
10/05/2024	• Se realiza instalación de sistemas puesta a tierra en los diferentes puntos de camaras.	
11/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
12/05/2024	Domingo - Dia de descanso	
13/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
14/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
15/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
16/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
17/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
18/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
19/05/2024	Domingo - Dia de descanso	
20/05/2024	• Se termina instalación del sistema puesta a tierra.	
21/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
22/05/2024	• Se realiza tendido de fibra en postería de almubrado publico.	
23/05/2024	• Se realiza tendido de fibra en postería de almubrado publico.	
24/05/2024	• Se realiza tendido de fibra en postería de almubrado publico.	
25/05/2024	• Se realiza tendido de fibra en postería de almubrado publico.	










26/05/2024	• Se realiza tendido de fibra en posteria de almubrado publico.	
27/05/2024	• Se realiza tendido de fibra en posteria de almubrado publico.	
28/05/2024	• Se realiza tendido de fibra en posteria de almubrado publico.	
29/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
30/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	
31/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CALLE	

ANEXO N° 12.2 BITACORA PLANTA INTERNA

CONTRATO N° LP-063-2022

BITCORA DIARIA CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO (CCM)

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
23/02/2024	• Inicio de trabajos en estación de policía para adecuar CCM actual. • Se realizó tendido de fibra provisional • Desinstalación del control del acceso al CCM actual. • Se realizó empalmeria de pigtails.	
27/02/2024	• Se inicio retiro cajas de circuitos y tableros de distribución eléctrica. • Se realizó desinstalación de rack y puesto de monitoreo CCTV FASE I. • Se realizó el traslado temporal del rack de comunicaciones del CCM para garantizar la continuidad del servicio mientras se realizan las adecuaciones de Bochalema fase II. • Se verificio el correcto funcionamiento del sistema CCTV Fase I en sitio provisional. • Se realizaron empalmes y migración de red de fibra para desplazamiento de CCTV Bochalema Fase I con el fin de comenzar trabajo de obra civil.	
28/02/2024	• Inicio instalación punto de visualización. • Desmonte de luminarias. • Desmonte, mantenimiento y embalaje de aire acondicionado del CCM existente (FASE I) • Demolición de muro para ventanas y puerta adecuación para el nuevo Armerillo.	
29/02/2024	• Regata para instalación eléctrica. • Demolición para puerta de baño estación de policía.	
1/03/2024	• Adecuaciones eléctricas en CCM. • Instalación de puerta para baño existente en el nuevo armerillo.	
2/03/2024	• Continuación de adecuaciones eléctricas en CCM.	
4/03/2023	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
5/03/2024	• Se realizó relleno de regatas para tubería. • Se realizó instalación de tubería para cable de fibra.	
6/03/2023	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
7/03/2024	Se continuó con adecuaciones para el traslado de armerillo.	
8/03/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM POR REQUERIMIENTO DE COMANDANTE DE ESTACIÓN	
9/03/2024	• Se desinstaló puerta de vidrio del CCM Fase I. • Retiro rejilla de ventilación del Armerillo y se selló la ventana con bloques. • Se hizo cerramiento de la entrada al CCM FASE I con lona verde.	
10/03/2024	Domingo - Día de descanso	
11/03/2024	• Se realizó instalación de rejillas de ventilación en el CCM FASE I como adecuación del nuevo Armerillo. • Empafetado de ventana del cuarto de Armerillo como adecuación para el nuevo CCM.	
12/03/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
13/03/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
14/03/2024	• Sellado de puerta de baño con bloques y empafetado en antiguo CCM. • Adecuaciones en luminarias.	
15/03/2024	• Se cubrimió con estucado y pintura de la puerta sellada y regatas del antiguo CCM.	
16/03/2024	• Se realizó Instalación de luminarias. • Fijación de muebles a pared para traslado de armerillo.	
17/03/2024	Domingo - Día de descanso	
18/03/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
19/03/2024	• Desinstalación de marco de la puerta en antiguo cuarto de armerillo. • Adecuación en marco de puerta metálica para armerillo. • Instalación de marco de la puerta en nuevo cuarto de armerillo.	
20/03/2024	• Instalación NVR. • Se realizó instalación de baldosa en baño con sus respectivos acabados y se finalizó los arreglos faltantes entregándose en completo funcionamiento. • Se removió el piso de cerámica para iniciar con trabajos de adecuación del CCM. • Se realizó apertura de puerta	
21/03/2024	• Se selló antigua puerta en CCM. • perforación de regatas para instalaciones eléctricas en muros y suelo.	
22/03/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
23/03/2024	• Instalación de puerta de Armerillo. • Acabados en marco de puerta de Armerillo. • Apertura de regatas e instalación de tubería eléctrica. • Se realizaron acabados en marco de puerta en CCM.	
24/03/2024	Domingo - Día de descanso	
25/03/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
26/03/2024	• Instalación de tubería eléctrica y cajas en piso. • Tendido de cableado eléctrico a través de tubería. • Instalación de tubería eléctrica gris en techo.	
27/03/2024	• Se fundió ante piso en concreto en CMM. • Relleno de regatas para tubería.	
28/03/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM POR REQUERIMIENTO DE COMANDANTE DE ESTACIÓN	
29/03/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM POR REQUERIMIENTO DE COMANDANTE DE ESTACIÓN	
30/03/2024	• Se remplazo ceramica. • Sondeo de cableado eléctrico	
1/04/2024	• Continuación de resane de regatas en pared. • Embouillado de piso remplazado en patio interno • Instalación y adecuación de puntos eléctricos. • Estucado blanco en pared	
2/04/2024	• Continuación de resane y estucado de regatas en pared. • Continuación de resane y estucado en marco de puerta	
3/04/2024	• Instalación de láminas de drywall en techo. • Instalación de marco metálico para pared en drywall. • Instalación de tableros eléctricos.	
4/04/2024	• Masillado de techo de drywall. • Instalación de cableado y peinado de tableros eléctricos. • Lijado de pared • Continuación de resane y estucado de pared interna y externa.	
5/04/2024	• Continuación masillado de techo y pared de drywall. • Apertura de hueco en techo para instalación de luminaria. • Continuación de instalación de cableado y peinado de tableros eléctricos. • Continuación de Lijado de pared • Continuación de estucado pared externa. • Pintado de paredes.	

6/04/2024	• Terminación de instalación y mancillado de pared de drywall. • Apertura de hueco en techo para instalación de luminaria. • Continuación de instalación de cableado y peinado de tableros eléctricos.	
7/04/2024	Domingo - Día de descanso	
8/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
9/04/2024	• Lijado de mancillado en paredes y techo. • Continuación de pintado en paredes y techo.	
10/04/2024	• Instalación de marcos en los huecos de las luminarias. • Instalación, adecuación y resane de marco en puerta. • Se realiza conexión eléctrica para aires acondicionados.	
11/04/2024	• Instalación de condensadoras para aires acondicionados.	
12/04/2024	• Instalación de piso en porcelanato en CCM. • Emboquillado de piso en CCM. • Instalación de tubería para cableado eléctrico de aires acondicionados. • Se finaliza la conexión electrica para los aires acondicionados. • Se realiza instalación de cableado en tableros.	
13/04/2024	• Finalización de instalación de piso en porcelanato del CCM. • Finalización del emboquillado de piso en CCM. • Instalación de videowall en CCM. • Se realiza instalación de puestos de trabajo en CCM. • Se realiza instalación de rack en CCM • Se realiza instalación de luminarias.	
14/04/2024	Domingo - Día de descanso	
15/04/2024	• Se realiza peinado de tableros.	
16/04/2024	• Pasta en cielo raso pasillos • Instalación lampara de emergencia • Pintura Cuarto de equipos • Adecuación CCM	
17/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM POR REQUERIMIENTO DE COMANDANTE DE ESTACIÓN	
18/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM POR REQUERIMIENTO DE COMANDANTE DE ESTACIÓN	
19/04/2024	• Se realiza instalación de la puerta del cuarto de equipos	
20/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
21/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
22/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
23/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
24/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
25/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
26/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
27/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
28/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
29/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
30/04/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
1/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
2/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
3/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
4/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
5/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
6/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
7/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
8/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
9/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
10/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
11/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
12/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
13/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
14/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
15/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
16/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
17/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
18/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
19/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
20/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
21/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
22/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
23/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
24/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
25/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
26/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
27/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
28/05/2024	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DENTRO DEL CCM	
29/05/2024	• Se realiza configuración de equipos en el CCM.	
30/05/2024	• Se realiza configuración de equipos en el CCM.	
31/05/2024	• Se realiza entrega del proyecto al municipio de Bochalema.	

ANEXO N° 13 ACTA DE MAYORES Y MENORES #001

ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

ENTIDAD EJECUTORA:	ALCALDIA MUNICIPIO DE BOCHALEMA	**ACTA No:**	1	**POR CANTIDADES**	**X**	**FECHA DEL ACTA**	
				POR CONTRATO ADICIONAL		26/02/2024	

CONTRATO No:	LP-001-2023	**PLAZO INICIAL:**	3 MESES	**VALOR INICIAL:**	$ 1.737.279.281,00
OBJETO:	"BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"	**FECHA DE ACTA DE INICIO:**	28/11/2023	**VALOR ADICION:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIES 2023	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	27/02/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.737.279.281,00
INTERVENTOR:	IVAN MAURICIO BRITO MEJIA	**FECHA AMPLIACION:**	06/02/2024	**PLAZO ADICIONAL:**	3 MESES
SUPERVISOR:	DIANA MILENA BOLAÑOS DUARTE	**FECHA DE ACTA REINICIO:**		**FECHA DE TERMINACION CON ADICIONAL:**	30/04/2024
SUPERVISOR MINISTERIO INTERIOR :	HAVID ALEXANDER NUMA M.	**FECHA DE TERMINACION ACTUAL:**	30/04/2024		

	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALES	
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDADES MAYORES**		**CANTIDADES MENORES**		**CANTIDAD AJUSTADA**	**VALOR AJUSTADO**
					CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**		
	EQUIPOS									
1	CÁMARAS DOMO PTZ. TIPO 1.	21	$ 16.866.794,00	$ 354.202.674,00				$ -	21	$ 354.202.674,00
2	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS	4	$ 25.746.831,00	$ 102.987.324,00			4	$ 102.987.324,00	0	$ -
3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	4503	$ 36.250,00	$ 163.233.750,00	2841,03	$ 36.250,00		$ -	7344,03	$ 266.221.074,00
4	SWITCH TIPO 4	1	$ 29.249.214,00	$ 29.249.214,00				$ -	1	$ 29.249.214,00
5	SWITCH TIPO 1	21	$ 4.963.349,00	$ 104.230.329,00				$ -	21	$ 104.230.329,00
6	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	2	$ 24.856.959,00	$ 49.713.918,00				$ -	2	$ 49.713.918,00
7	MONITOR OPERADOR CCTV	2	$ 2.860.297,00	$ 5.720.594,00				$ -	2	$ 5.720.594,00
8	ESTACIÓN DE TRABAJO OPERADOR	1	$ 31.214.590,00	$ 31.214.590,00				$ -	1	$ 31.214.590,00
9	JOYSTICK DE OPERACIÓN	1	$ 6.092.566,00	$ 6.092.566,00				$ -	1	$ 6.092.566,00
10	UPS 1.5KVA	21	$ 5.210.880,00	$ 109.428.480,00				$ -	21	$ 109.428.480,00
11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CÁMARA	21	$ 10.343.513,00	$ 217.213.773,00				$ -	21	$ 217.213.773,00
12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU	1	$ 13.178.286,00	$ 13.178.286,00				$ -	1	$ 13.178.286,00
	ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA									
13	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	21	$ 5.121.608,00	$ 107.553.768,00				$ -	21	$ 107.553.768,00
14	GABINETES DE POSTE/FACHADA	21	$ 3.672.359,00	$ 77.119.539,00				$ -	21	$ 77.119.539,00
15	CORONAS ANTIESCALATORIAS	21	$ 413.346,00	$ 8.680.266,00				$ -	21	$ 8.680.266,00
16	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	21	$ 557.288,00	$ 11.703.048,00				$ -	21	$ 11.703.048,00
17	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	4	$ 1.278.587,00	$ 5.114.348,00				$ -	4	$ 5.114.348,00
18	PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NORMAL	4	$ 1.330.024,00	$ 5.320.096,00				$ -	4	$ 5.320.096,00
19	PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA	4	$ 1.437.402,00	$ 5.749.608,00				$ -	4	$ 5.749.608,00
20	SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA (PUNTOS DE CÁMARA Y CENTRO CONTROL Y NODO)	21	$ 2.939.479,00	$ 61.729.059,00				$ -	21	$ 61.729.059,00
21	MÓDULOS - PUESTOS DE TRABAJO	1	$ 5.806.391,00	$ 5.806.391,00				$ -	1	$ 5.806.391,00
	OBRA CIVIL									
22	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN SALA DE CONTROL	1	$ 39.550.000,00	$ 39.550.000,00				$ -	1	$ 39.550.000,00
23	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS Y NODOS	22	$ 3.655.292,00	$ 80.416.424,00				$ -	22	$ 80.416.424,00
24	PUNTO DE VISUALIZACIÓN ENTIDAD TERRITORIAL	1	$ 70.417.358,00	$ 70.417.358,00				$ -	1	$ 70.417.358,00
				$ 1.665.625.403,00		**$ 36.250,00**		**$ 102.987.324,00**		**$ 1.665.625.403**

En constancia firman los que intervienen en la presente acta a los 26 días del mes de Febrero de 2024

RAFAEL PABÓN LÓPEZ
CONSORCIO SIES 2023
CONTRATISTA

IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
COMUNIP INGENIERIA
INTERVENTORÍA

DIANA MILENA BOLAÑOS DUARTE
SECRETARIO PLANEACIÓN MUNICIPIO DE BOCHALEMA
SUPERVISOR

ANEXO N° 14 ACTA DE MAYORES Y MENORES #002

ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

ENTIDAD EJECUTORA:	ALCALDIA MUNICIPIO DE BOCHALEMA	**ACTA No:**	2	**POR CANTIDADES**	**X**	**FECHA DEL ACTA**	
				POR CONTRATO ADICIONAL		18/04/2024	

CONTRATO No:	LP-001-2023	**PLAZO INICIAL:**	3 MESES	**VALOR INICIAL:**	$ 1.737.279.281,00
OBJETO:	"BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"	**FECHA DE ACTA DE INICIO:**	28/11/2023	**VALOR ADICION:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIES 2023	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	27/02/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.737.279.281,00
INTERVENTOR:	IVAN MAURICIO BRITO MEJIA	**FECHA AMPLIACION:**	6/02/2024	**PLAZO ADICIONAL:**	3 MESES
SUPERVISOR:	DIANA MILENA BOLAÑOS DUARTE	**FECHA DE ACTA REINICIO:**		**FECHA DE TERMINACION CON ADICIONAL:**	30/04/2024
		FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	30/04/2024		

	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALES	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES MAYORES		CANTIDADES MENORES		CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
	EQUIPOS				EQUIPOS					
1	CÁMARAS DOMO PTZ. TIPO 1.	21	$ 16.866.794,00	$ 354.202.674,00				$ -	21	$ 354.202.674,00
2	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS	4	$ 25.746.831,00	$ 102.987.324,00			4	$ 102.987.324,00	0	$ -
3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	4503	$ 36.250,00	$ 163.233.750,00	2941,87	$ 36.250,00		$ -	7444,87	$ 269.876.366,00
4	SWITCH TIPO 4	1	$ 29.249.214,00	$ 29.249.214,00				$ -	1	$ 29.249.214,00
5	SWITCH TIPO 1	21	$ 4.963.349,00	$ 104.230.329,00				$ -	21	$ 104.230.329,00
6	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	2	$ 24.856.959,00	$ 49.713.918,00				$ -	2	$ 49.713.918,00
7	MONITOR OPERADOR CCTV	2	$ 2.860.297,00	$ 5.720.594,00				$ -	2	$ 5.720.594,00
8	ESTACIÓN DE TRABAJO OPERADOR	1	$ 31.214.590,00	$ 31.214.590,00				$ -	1	$ 31.214.590,00
9	JOYSTICK DE OPERACIÓN	1	$ 6.092.566,00	$ 6.092.566,00				$ -	1	$ 6.092.566,00
10	UPS 1.5KVA	21	$ 5.210.880,00	$ 109.428.480,00				$ -	21	$ 109.428.480,00
11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CÁMARA	21	$ 10.343.513,00	$ 217.213.773,00				$ -	21	$ 217.213.773,00
12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU	1	$ 13.178.286,00	$ 13.178.286,00				$ -	1	$ 13.178.286,00
	ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA									
13	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	21	$ 5.121.608,00	$ 107.553.768,00				$ -	21	$ 107.553.768,00
14	GABINETES DE POSTE/FACHADA	21	$ 3.672.359,00	$ 77.119.539,00				$ -	21	$ 77.119.539,00
15	CORONAS ANTIESCALATORIAS	21	$ 413.346,00	$ 8.680.266,00				$ -	21	$ 8.680.266,00
16	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	21	$ 557.288,00	$ 11.703.048,00				$ -	21	$ 11.703.048,00
17	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	4	$ 1.278.587,00	$ 5.114.348,00				$ -	4	$ 5.114.348,00
18	PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NORMAL	4	$ 1.330.024,00	$ 5.320.096,00				$ -	4	$ 5.320.096,00
19	PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA	4	$ 1.437.402,00	$ 5.749.608,00				$ -	4	$ 5.749.608,00
20	SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA (PUNTOS DE CÁMARA Y CENTRO CONTROL Y NODO)	21	$ 2.939.479,00	$ 61.729.059,00				$ -	21	$ 61.729.059,00
21	MÓDULOS - PUESTOS DE TRABAJO	1	$ 5.806.391,00	$ 5.806.391,00				$ -	1	$ 5.806.391,00
	OBRA CIVIL									
22	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN SALA DE CONTROL	1	$ 39.550.000,00	$ 39.550.000,00				$ -	1	$ 39.550.000,00
23	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS Y NODOS	22	$ 3.655.292,00	$ 80.416.424,00			1	$ 3.655.292,00	21	$ 76.761.132,00
24	PUNTO DE VISUALIZACIÓN ENTIDAD TERRITORIAL	1	$ 70.417.358,00	$ 70.417.358,00				$ -	1	$ 70.417.358,00
				$ 1.665.625.403,00		$ 36.250,00		$ 106.642.616,00		$ 1.665.625.403

En constancia firman los que intervienen en la presente acta a los 18 días del mes de Abril de 2024

RAFAEL PABÓN LÓPEZ
CONSORCIO SIES 2023
CONTRATISTA

IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
COMUNIP INGENIERIA
INTERVENTORÍA

JHONATANN JOSÉ BOADA ORTEGA
SECRETARIO PLANEACIÓN MUNICIPIO DE BOCHALEMA
SUPERVISOR

ANEXO N° 15 SOPORTE VISITA TÉCNICA CENS A POSTERIA

CENS

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

PLANTILLA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

ANDREW CONTRERAS 13794288. ALCALDÍA BOCHALEMA

ITEM	DIRECCIÓN	NÚMERO DE POSTE	KMZ REVISION	GEORREFERENCIACIÓN wgs 84 centro bogotá	POSTE		TIPO DE FIBRA ÓPTICA	OBSERVACIONES 21629336
					ALTURA DE POSTE	RESISTENCIA (kgf)		
1	Calle 4 2_07	1	1	07°36'40.19"N 72°38'46.3"W	8 Mt	750	X	
2	Cll 4 # juzgado	2	2	07°36'39.88"N 72°38'45.73"W	12 Mt	1050	X	
3	Carrera 2 # 3-81	3	3	07°36'40.94"N 72°38'45.16"W	8 Mt	1050	X	
4	Carrera 2 calle 4	4	4	07°36'39.66"N 72°38'46.01"W	12 Mt	1350	X	
5	Carrera 2# 4_32	5	5	07°36'38.99"N 72°38'46.35"W	8 Mt	1050	X	
6	Car2 # 4_51	6	6	07°36'38.21"N 72°38'46.91"W	8 Mt	510	X	
7	Carrera 2 # 4_67	7	7	07°36'37.51"N 72°38'47.33"W	8 Mt	750	X	
8	Carrera 2 # 5_31	8	8	07°36'36.57"N 72°38'47.89"W	8 Mt	510	X	
9	Carrera 2 # 5_75	9	9	07°36'35.59"N 72°38'48.54"W	8 Mt	750	X	
10	Carrera 2 # calle 5	10	10	07°36'34.54"N 72°38'49.23"W	8 Mt	510	X	
11	Calle 6 # 1_63	11	11	07°36'33.91"N 72°38'48.73"W	8 Mt	510	X	
12	Call 6 # 1_31	12	12	07°36'33.09"N 72°38'47.3"W	12 Mt	1500	X	
13	Call e # 1'_25	13	13	07°36'32.85"N 72°38'46.82"W	8 Mt	750	N/A	
14	Call 6 # carrera 2	14	63	07°36'34.45"N 72°38'49.61"W	8 Mt	510	X	Hierro en base
15	Cal 6 # 2_31	15	C4	07°36'34.87"N 72°38'50.3"W	12 Mt	~~1350~~	X	
16	Cal 6 # 2_3	16	65	07°36'35.55"N 72°38'51.42"W	8 Mt	510	X	
17	Calle 6 # 2_3	17	66	07°36'35.74"N 72°38'51.66"W	12 Mt	1350	X	Transformador
18	Carrera 3 # 5_84	18	68	07°36'36.8"N 72°38'51.55"W	8 Mt	1050	N/A	
19	Carrera 3 # 6_02	19	67	07°36'35.86"N 72°38'52.05"W	12 Mt	1500	X	
20	Cll 6 # 3_12;	20	69	07°36'36.43"N 72°38'53.09"W	12 Mt	750	X	
21	Cll 6 # 3_47	21	70	07°36'36.69"N 72°38'53.65"W	8 Mt	510	X	
22	Cll 6 # 3_81	22	71	07°36'37.05"N 72°38'54.51"W	12 Mt	1350	X	
23	Call 6 carrera 4	23	72	07°36'37.46"N 72°38'55.44"W	12 Mt	1050	X	
24	Carrera 4 # calle 6	24	73	07°36'37.97"N 72°38'54.3"W	12 Mt	750	X	
25	Carrera 4 # 6_03	25	74	07°36'36.7"N 72°38'55.16"W	8 Mt	750	X	
26	Carrera 4 # 7-07	26	75	07°36'35.35"N 72°38'56.1"W	12 Mt	1500	X	
27	Carrera 3 A # 7-08	27	76	07°36'35.11"N 72°38'54.85"W	12 Mt	1050	X	
28	Carrera 3 A #	28	77	07°36'33.41"N 72°38'54.69"W	12 Mt	1050	X	
29	Carrera 3 A cll 7 a 2	29	78	07°36'32.74"N 72°38'55.55"W	12 Mt	1350	N/A	Transformador
30	Call 7 a 10 carrera 3A	30	79	07°36'32.11"N 72°38'55.41"W	8 Mt	metálico riel	X	
31	Cll 7 lote 3	31	80	07°36'31.75"N 72°38'54.83"W	8 Mt	510	X	
32	Call 7 lote 4	32	81	07°36'31.18"N 72°38'53.88"W	8 Mt	510	X	
33	Cll 7 cabaña villa lola	33	82	07°36'30.53"N 72°38'52.96"W	8 Mt	510	X	

1525 a 1713

Powered by CamScanner

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

PLANTILLA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

ALCALDIA BOCHALEMA

	DIRECCIÓN	NÚMERO DE POSTE	KMZ REVISION	GEORREFERENCIACIÓN wgs 84 centro bogotá	POSTE		TIPO DE	OBSERVACIONES 21629336
					ALTURA DE POSTE	RESISTENCIA (kgf)	FIBRA ÓPTICA	
34	Cabañas lote 19	34	83	07°36'29.46"N 72°38'53.04"W	10 Mt	1050	N/A	
35	Call 7b #3 -80	35	84	07°36'31.16"N 72°38'56.11"W	8 Mt	510	X	
36	Carrera 3A cll 7b	36	85	07°36'30.52"N 72°38'56.09"W	12 Mt	1500	X	
37	Cll 7b lote 39	37	86	07°36'28.8"N 72°38'55.29"W	8 Mt	750	X	
38	Cll 7b lote 40	38	87	07°36'28.12"N 72°38'55.55"W	8 Mt	510	X	
39	Call 7b casa 3	39	88	07°36'28.03"N 72°38'56.16"W	8 Mt	510	X	
40	Call 7b casa 4	40	89	07°36'27.73"N 72°38'57.36"W	8 Mt	510	X	
41	Call 7 b villa Tere lote 41	41	90	07°36'27.31"N 72°38'58.58"W	8 Mt	510	X	
42	Cll 7 b Villa Tere lote 42	42	91	07°36'27.04"N 72°38'59.36"W	8 Mt	510	N/A	
43	Carrera 4 # 7-13	43	92	07°36'34.65"N 72°38'56.49"W	8 Mt	510	X	
44	Catrera 4 # 7-35	44	93	07°36'34.16"N 72°38'56.77"W	12 Mt	1350	X	
45	Carrera 4 # 7a-13	45	94	07°36'33.65"N 72°38'57.05"W	8 Mt	510	X	
46	Carrera 4 lote 2 agua blanca	46	96	07°36'32.45"N 72°38'57.94"W	12 Mt	1350	X	
47	Carrera 4 # 7_146	47	97	07°36'32.23"N 72°38'59.09"W	12 Mt	1500	X	
48	Carrera 4 # escuela rozo	48	98	07°36'32.32"N 72°39'00.21"W	8 Mt	750	X	
49	Carrera 4 entrada sendero ecologico	49	99	07°36'32.49"N 72°39'01.11"W	12 Mt	1500	X	
50	Calle 1 carrera 4	50	117	07°36'51.97"N 72°38'47.61"W	12 Mt	1050	X	
51	Call 1 # 4_57	51	116	07°36'52.4"N 72°38'48.39"W	8 Mt	1500	X	
52	Call 1 # 4_46	52	115	07°36'52.78"N 72°38'49.06"W	8 Mt	510	X	
53	Calle 1 # 4_83	53	114	07°36'53.34"N 72°38'50"W	8 Mt	750	X	
54	Call 1 # 4_94	54	113	07°36'53.53"N 72°38'50.65"W	8 Mt	1050	N/A	
55	Call 3 5_99	55	106	07°36'50.69"N 72°38'56.05"W	12 Mt	1350	X	cerca en
56	Call 3 carrera 6	56	1CA	07°36'51.65"N 72°38'56.99"W	8 Mt	510	X	
57	Call 3 carrera 6	57	108	07°36'51.33"N 72°38'56.99"W	14 Mt	1500	X	
58	Carrera 6 detrás de cementerio	58	109	07°36'51.33"N 72°38'56.99"W	8 Mt	510	X	
59	Carrera 6 detrás de cementerio	59	110	07°36'53.23"N 72°38'54.85"W	12 Mt	510	X	
60	Carrera 6 call 2	60	111	07°36'53.86"N 72°38'54.24"W	8 Mt	510	X	
61	Call 2 carretera 6	61	112	07°36'54.26"N 72°38'54.62"W	8 Mt	510		
62	Carr 6 con calle 3	62	105	07°36'50.23"N 72°38'56.72"W	12 Mt	1050	X	
63	Carre 6 # k6. 319-1	63	104	07°36'47.98"N 72°38'57.05"W	12 Mt	750	X	
64	Carrera 6 # 4_91	64	103	07°36'47.98"N 72°38'57.05"W	8 Mt	510	X	
65	Carrera 6 # agua blanca lote 3	65	102	07°36'46.39"N 72°38'57.44"W	12 Mt	1050	X	
66	Carrera 6 # #4_57	66	101	07°36'45.21"N 72°38'57.86"W	8 Mt	510	X	

Powered by CamScanner

1526 a 1713

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

PLANTILLA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

ALCALDIA BOCHALEMA

	DIRECCIÓN	NÚMERO DE POSTE	KMZ REVISION	GEORREFERENCIACIÓN wgs 84 centro bogotá	POSTE		TIPO DE FIBRA ÓPTICA	OBSERVACIONES 21629336
					ALTURA DE POSTE	RESISTENCIA (kgf)		
67	Carrera 6 # 4_79	67	60	07°36'44.348"N 72°38'58.365"W	8 Mt	510	N/A	
68	Carrera 2 calle 6 25	68	62	07°36'33.61"N 72°38'49.9"W	8 Mt	510	X	
69	Carrera 2 calle 6 60	69	61	07°36'32.83"N 72°38'50.42"W	8 Mt	510	X	
70	Carrera 2 calle 6 84	70	60	07°36'31.89"N 72°38'50.89"W	8 Mt	510	X	
71	Calle 7 carrera 2	71	59	07°36'31.7"N 72°38'50.85"W	8 Mt	510	X	
72	Calle 7 carrera 2	72	58	07°36'31.08"N 72°38'50.01"W	8 Mt	510	X	
73	Calle 7 carrera 2	73	57	07°36'30.7"N 72°38'49.53"W	8 Mt	510	X	
74	Calle 7 carrera 1	74	56	07°36'30.12"N 72°38'48.8"W	8 Mt	510	X	
75	Carrera 1 parador agua blanca	75	13	07°36'29.04"N 72°38'49.23"W	8 Mt	510	X	
76	Carrera 1 parador agua blanca	76	14	07°36'30.4"N 72°38'48.28"W	8 Mt	510	N/A	
77	Parador turistico agua blanca	77	16	07°36'28.08"N 72°38'50.75"W	8 Mt	750	X	
78	Via Vereda el porvenir, Vereda San Jerónimo	78	17	07°36'27.42"N 72°38'50.1"W	8 Mt	750	X	Sin continuidad
79	Via Vereda el porvenir	79	18	07°36'26.2"N 72°38'50.64"W	8 Mt	1050	X	
80	Via Vereda el porvenir	80	19	07°36'25.15"N 72°38'51.12"W	8 Mt	750	X	
81	Via Vereda el porvenir	81	20	07°36'24.38"N 72°38'51.3"W	8 Mt	750	X	
82	Via Vereda el porvenir	82	21	07°36'23.65"N 72°38'51.45"W	8 Mt	1050	X	
83	Via Vereda el porvenir	83	22	07°36'22.88"N 72°38'51.67"W	8 Mt	510	X	
84	Via Vereda el porvenir	84	23	07°36'21.73"N 72°38'51.69"W	8 Mt	1050	X	
85	Via Vereda el porvenir	85	24	07°36'21.04"N 72°38'51.01"W	8 Mt	750	X	
86	Via Vereda el porvenir	86	25	07°36'21.47"N 72°38'50.07"W	8 Mt	1050	X	
87	Granja la perla .. via Vereda el porvenir	87	26	07°36'21.25"N 72°38'49.7"W	12 Mt	2000	X	Transformador
88	Via Vereda el porvenir kdX 19-3	88	27	07°36'20.08"N 72°38'50.72"W	12 Mt	1050	X	
89	Via Vereda el porvenir	89	28	07°36'19.4"N 72°38'51.78"W	12 Mt	1350	X	
90	Via Vereda el porvenir	90	29	07°36'18.41"N 72°38'51.36"W	12 Mt	1050	X	
91	Urbanización la esmeralda.. via Vereda el porvenir	91	30	07°36'17.95"N 72°38'51.5"W	12 Mt	1350	X	Transformador
92	Via Vereda el porvenir. La esmeralda lote 4	92	31	07°36'17.38"N 72°38'52.36"W	12 Mt	1050	X	
93	Via Vereda el porvenir.. urb la esmeralda lote 9	93	32	07°36'17.1"N 72°38'53.49"W	8 ~~12 Mt~~	1500	X	
94	Via Vereda el porvenir	94	33	07°36'17.31"N 72°38'53.72"W	12 Mt	1050	X	
95	Via Vereda el porvenir	95	34	07°36'16.79"N 72°38'54.27"W	8 Mt	1050	X	
96	Via Vereda el porvenir	96	35	07°36'16.53"N 72°38'54.86"W	12 Mt	1500	X	
97	Via Vereda el porvenir	97	36	07°36'16.02"N 72°38'55.23"W	8 Mt	1050	X	
98	Via Vereda el porvenir	98	37	07°36'15.14"N 72°38'55"W	12 Mt	1050	X	
99	Via Vereda el porvenir	99	42	07°36'14.21"N 72°38'56.85"W	8 Mt	750	X	

1527 a 1713

Powered by CamScanner

Yamid F-C
1007301771
ALCALDIA BOCHALEMA

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
PLANTILLA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

	DIRECCIÓN	NÚMERO DE POSTE	KMZ REVISION	GEORREFERENCIACIÓN wgs 84 centro bogotá	POSTE		TIPO DE	OBSERVACIONES 21629336
					ALTURA DE POSTE	RESISTENCIA (kgf)	FIBRA ÓPTICA	
100	Via Vereda el porvenir	100	43	07°36'13.09"N 72°38'57.66"W	12 Mt	1050	X	
101	Via Vereda el porvenir	101	44	07°36'12.34"N 72°38'58.42"W	12 Mt	1050	X	
102	La Y vereda el porvenir	102	45	07°36'10.39"N 72°38'59.46"W	12 Mt	1500	X	
103	La Y. La esmeralda lote 31-1	103	46	07°36'10.83"N 72°38'58.53"W	8 Mt	510	X	
104	La esmeralda	104	47	07°36'11.04"N 72°38'58.21"W	12 Mt	1050	X	
105	La esmeralda	105	48	07°36'10.95"N 72°38'57.74"W	12 Mt	1050	X	
106	La esmeralda lote 46	106	49	07°36'10.38"N 72°38'57.43"W	8 Mt	510	X	
107	La esmeralda lote 31	107	38	07°36'14.31"N 72°38'55.25"W	8 Mt	750	X	
108	La esmeralda	108	39	07°36'13.47"N 72°38'54.72"W	8 Mt	510	X	
109	La esmeralda	109	40	07°36'12.79"N 72°38'54.2"W	8 Mt	510	X	
110	La esmeralda lote 96	110	41	07°36'11.74"N 72°38'53.41"W	8 Mt	1050	X	
111	Calle 1 carrera 4	111	118	07°36'51.59"N 72°38'46.8"W	8 Mt	1050	N/A	
112	Carrera 4 calle 1	112	119	07°36'51.41"N 72°38'47.15"W	12 Mt	1350	N/A	
113	Carrera 4 calle 1	113	120	07°36'52.19"N 72°38'46.5"W	8 Mt	1500	X	
114	Carrera 4 plaza de toros	114	121	07°36'53.24"N 72°38'45.88"W	12 Mt	1050	X	
115	Carrera 4 plaza de toros	115	122	07°36'54.22"N 72°38'45.32"W	8 Mt	510	X	
116	Carrera 4 plaza de toros	116	123	07°36'55.21"N 72°38'44.71"W	12 Mt	1500	X	
117	Carrera 4 plaza de toros	117	124	07°36'56.35"N 72°38'44.09"W	8 Mt	1500	X	
118	Carrera 4 plaza de toros	118	125	07°36'57.44"N 72°38'43.42"W	8 Mt	750	X	
119	Carrera 4 plaza de toros	119	126	07°36'58.53"N 72°38'42.82"W	8 Mt	1050	X	
120	Carrera 2 calle 1 entrada bochalema	120	127	07°36'48.68"N 72°38'41.19"W	8 Mt	1500	X	
121	Entrada via Bochalema	121	128	07°36'49.69"N 72°38'40.51"W	8 Mt	1050	X	
122	Via a bochalema.. entrada principal	122	129	07°36'50.64"N 72°38'40.11"W	12 Mt	1050	X	
123	Via a bochalema.. entrada principal	123	130	07°36'51.5"N 72°38'39.71"W	8 Mt	510	X	
124	Via a bochalema.. entrada principal	124	131	07°36'52.26"N 72°38'39.31"W	12 Mt	1050	X	
125	Via a bochalema.. entrada principal	125	132	07°36'52.72"N 72°38'39.01"W	8 Mt	750	X	
126	Via a bochalema.. entrada a barrio la granja	126	133	07°36'54.75"N 72°38'38.16"W	12 Mt	2000	X	
127	Entrada barrio la granja	127	134	07°36'54.23"N 72°38'37.84"W	12 Mt	1050	X	
128	La esmeralda lote 46	128	50	7°36'9.34"N 72°38'56.99"O	8 Mt	510	X	
129	La esmeralda lote 46	129	51	7°36'7.85"N 72°38'56.25"O	8 Mt	510	X	
130	La esmeralda lote 46	130	53	7°36'6.68"N 72°38'55.72"O	8 Mt	510	X	
131	La esmeralda lote 46	131	54	7°36'5.46"N 72°38'55.12"O	8 Mt	510	X	
132	Carrera 4 lote agua blanca	132	55-95	7°36'32.89"N 72°38'57.37"O	8 Mt	750	X	
		129A	52		12m	1050	X	transfor

1528 a 1713

Powered by CamScanner

ANEXO N° 16 BITACOTA PUNTO DE CÁMARA

Inventario De Equipos Instalados En Punto De Cámara	CONSORCIO SIES 2023

PUNTO DE CÁMARA	9
SERIAL UPS	A00049602G23D21501333
SERIAL SWITCH	TM44229000044
SERIAL CÁMARA	AG6560706



PUNTO DE CÁMARA	10
SERIAL UPS	A00049602G22L22501148
SERIAL SWITCH	TM44229000006
SERIAL CÁMARA	AG6560738




PUNTO DE CÁMARA	11
SERIAL UPS	A00049602G22E03501514
SERIAL SWITCH	TM44229000031
SERIAL CÁMARA	AG6560723



PUNTO DE CÁMARA	12
SERIAL UPS	A00049602G23109500255
SERIAL SWITCH	TM44229000032
SERIAL CÁMARA	AG6560754



PUNTO DE CÁMARA	13
SERIAL UPS	A00049602G22L22501154
SERIAL SWITCH	TM44229000033
SERIAL CÁMARA	AG6560752

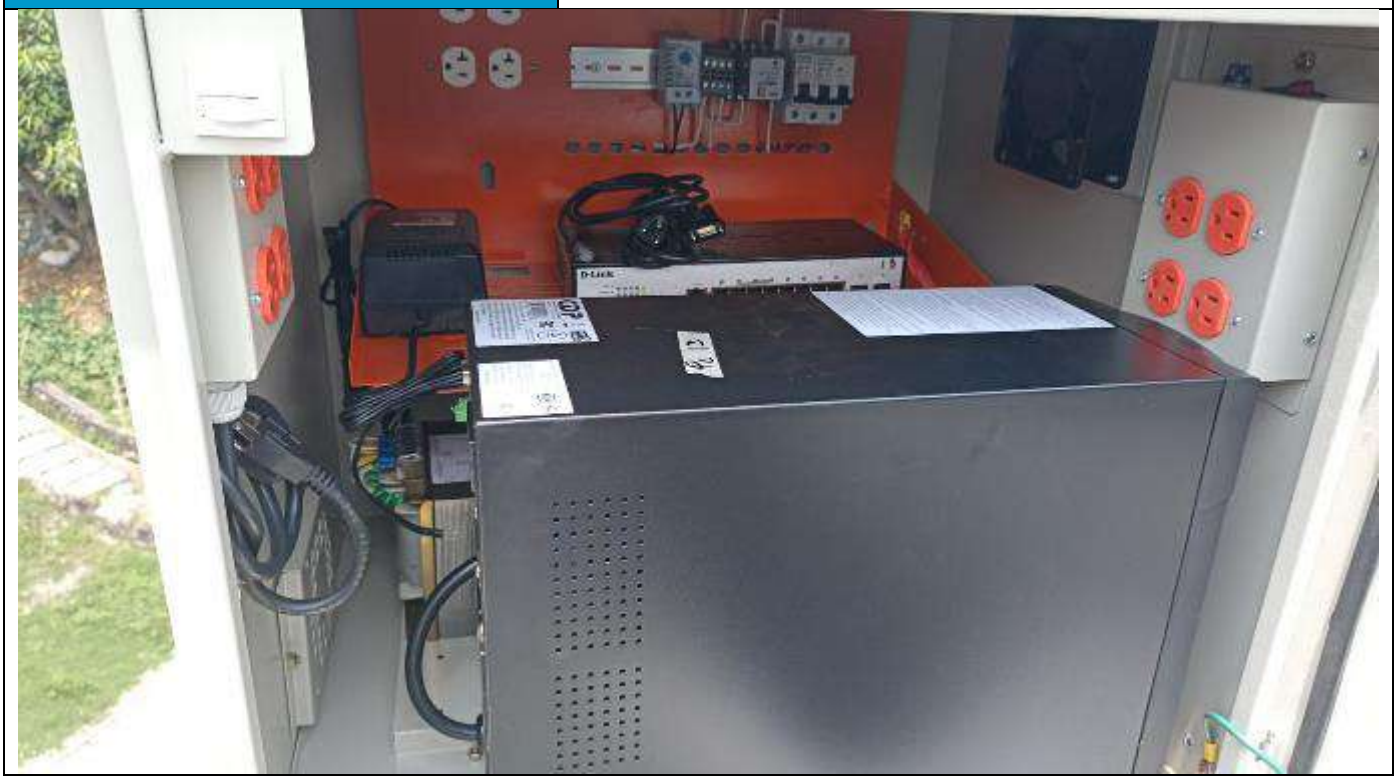


PUNTO DE CÁMARA	14
SERIAL UPS	A00049602G23109500262
SERIAL SWITCH	TM44229000034
SERIAL CÁMARA	AG6560712



PUNTO DE CÁMARA	15
SERIAL UPS	A00049602G23D21500718
SERIAL SWITCH	TM44229000035
SERIAL CÁMARA	AG6560726



PUNTO DE CÁMARA	16
SERIAL UPS	A00049602G23B01501559
SERIAL SWITCH	TM44229000036
SERIAL CÁMARA	AG6427963

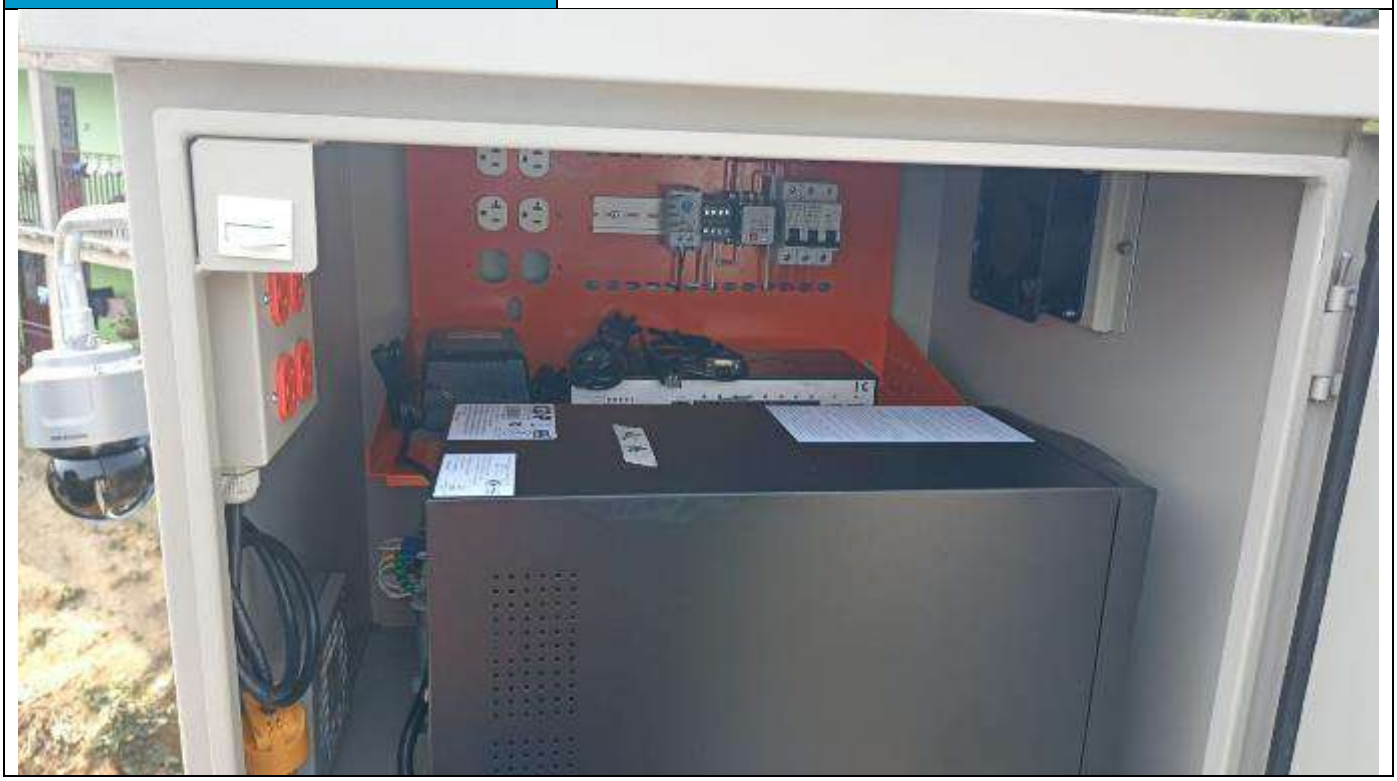

PUNTO DE CÁMARA	17
SERIAL UPS	A00049602G22L22500541
SERIAL SWITCH	TM44229000037
SERIAL CÁMARA	AG6427920



PUNTO DE CÁMARA	18
SERIAL UPS	A00049602G22L22501123
SERIAL SWITCH	TM44229000038
SERIAL CÁMARA	AG6560735



PUNTO DE CÁMARA	19
SERIAL UPS	A00049602G23B01501558
SERIAL SWITCH	TM44229000039
SERIAL CÁMARA	AG6560717



1540 a 1713

PUNTO DE CÁMARA	20
SERIAL UPS	A00049602G23D21500968
SERIAL SWITCH	TM44229000040
SERIAL CÁMARA	AG6560741



PUNTO DE CÁMARA	21
SERIAL UPS	A00049602G22L22501339
SERIAL SWITCH	TM44229000046
SERIAL CÁMARA	AG6560704



PUNTO DE CÁMARA	22
SERIAL UPS	A00049602G23D21500720
SERIAL SWITCH	TM44229000047
SERIAL CÁMARA	AG6427929



PUNTO DE CÁMARA	23
SERIAL UPS	A00049602G23B01501313
SERIAL SWITCH	TM44229000048
SERIAL CÁMARA	AG6427971



PUNTO DE CÁMARA	24
SERIAL UPS	A00049602G23D21500957
SERIAL SWITCH	TM44229000049
SERIAL CÁMARA	AG6560758



PUNTO DE CÁMARA	25
SERIAL UPS	A00049602G23B01501598
SERIAL SWITCH	TM44229000050
SERIAL CÁMARA	AG6560721



PUNTO DE CÁMARA	26
SERIAL UPS	A00049602G23D21500719
SERIAL SWITCH	TM44229000061
SERIAL CÁMARA	AG6560716



PUNTO DE CÁMARA	27
SERIAL UPS	TM44229000062
SERIAL SWITCH	A00049602G23B01501324
SERIAL CÁMARA	AG6560731



PUNTO DE CÁMARA	28
SERIAL UPS	A00049602G22L22501323
SERIAL SWITCH	TM44229000063
SERIAL CÁMARA	AG6560714



PUNTO DE CÁMARA	29
SERIAL UPS	221025-5360924
SERIAL SWITCH	TM44229000064
SERIAL CÁMARA	AG6560722



ANEXO N° 17 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIDO 1612 CORTE ABRIL 2024

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1612 DE 2023

INFORME FINANCIERO DE 29 FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
MUNICIPIO DE BOCHALEMA-NORTE DE SANTANDER

PROYECTO (S):	Realizar acciones, actividades y compromisos conjuntos, tendientes al estudio, diseño, implementación e instalación del circuito cerrado de televisión CCTV para seguridad y convivencia, por parte del Municipio de BOCHALEMA, Departamento de Norte de Santander,

CUENTA (AHORROS) No.: 49700006868 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 1,887,478,792.00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1,698,730,913.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 188,747,879.00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	27/07/2023	GIRO 1	$ 713,466,983.00
	16/02/2024	GIRO 2	$ 475,644,656.00
		GIRO 3	
		GIRO 4	$ 0.00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1,189,111,639.00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 49700006868 A LA FECHA (1) **$ 1,189,111,639.00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP 003-2023	CONSORCIO SIES 2023	$ 1,737,279,281.00	$ 0.00	$ 1,737,279,281.00
CM-004 DE 2023	IVAN MAURICIO BRITO M	$ 150,047,100.00	$ 0.00	$ 150,047,100.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1,887,326,381.00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
LP 001 DE 2023	ANTICIPO DEL 40%	AL 0223-001-R	AL0223-001	1/03/2024	$ 694,911,712.40		$ 694,911,712.40
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 694,911,712.40**	**$ 0.00**	**$ 694,911,712.40**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/07/2023	$ 48,771.17
31/08/2023	$ 302,455.74
30/09/2023	$ 292,821.14
31/10/2023	$ 302,708.03
30/11/2023	$ 293,065.44
31/12/2023	$ 302,960.59
31/01/2024	$ 303,089.01
29/02/2024	$ 442,782.68
31/03/2024	$ 84,341.80
TOTAL (3)	**$ 2,372,995.60**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0.00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1,189,111,639.00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 694,911,712.40**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) **$ 2,372,995.60**

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) **$ 0.00**

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 2,372,995.60**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 494,199,926.60**

SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 494,199,926.60**

OBSERVACIONES

FIRMA **FIRMA**

OSCAR ADRIAN ARGUELLO PASTO
Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

JHONATTAN JOSÉ BOADA ORTEGA
Secretario de Planeación
Supervisor del Convenio 1612 de 2023 y contratos derivados

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOCHALEMA

890505662-3

COMPROBANTE DE EGRESO : AL 0223-001

ORDEN DE PAGO : AL 0223-001-R

FECHA : feb-23/2024

BENEFICIARIO : CONSORCIO SIES 2023 **CTA. BENEFICIARIO :**

NIT : 9017705399

CONCEPTO : BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SEIS EN IMPLEMENTACION DEL SISTE

OBJETO : BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SEIS EN IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) FASE II. ANTICIPO DEL 40% CONTRATO LP´-001-2023

BANCO : BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVECIA CIUDADANA SIES- FASE II **CUENTA** : 497-0000-6868 :

TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.**

DOCUMENTO : LP-003-2023 0.00

0.00

0.00

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
00	CONCEPTO UNICO	AL 0223-001	2.3.2.01.01.003.05.03	240101.01	MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO DE SEGURIDAD NACIONAL Y CONVIVENCIA	694,911,712.40

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501028 **Código BPIN:** 00 **Prod. DANE:** 48321

TOTALES **694,911,712.40**

NETO A PAGAR **694,911,712.40**

1553 a 1713

Bancolombia

Fogafín
el Seguro de Depósito

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49700006969

SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
CLL 3 #3-08 ESQUINA PALACIO MUN
BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	SALDO PROMEDIO	$	113,076,693
TOTAL ABONOS	$	713,515,754.17	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	48,771.17
SALDO ACTUAL	$	713,515,754.17	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
27/07	PAGO INTERBANCARIO			713,466,983.00	713,466,983
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			48,771.17	713,515,754
	FIN ESTADO DE CUENTA				

1554 a 1713

Bancolombia

Fogafín
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49700006868

SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
CLL 3 #3-08 ESQUINA PALACIO MUN
BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER



Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	713,515,754.17	SALDO PROMEDIO	$	713,525,511
TOTAL ABONOS	$	302,455.74	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	302,455.74
SALDO ACTUAL	$	713,818,209.91	RETENCIONES	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/08	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			302,455.74	713,818,209.91

DIRIJASE

1555 a 1713

Bancolombia

Fogafín — El Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49700006868

SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
CLL 3 NJ-08 ESQUINA PALACIO MUN
BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	713,818,209.91	SALDO PROMEDIO	$	713,827,970
TOTAL ABONOS	$	292,821.14	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	292,821.14
SALDO ACTUAL	$	714,111,031.05	RETENCIONES	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
30/09	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			292,821.14	714,111,031.05

Defensor del Cliente / fsanchezdefensor@bancolombia.com (601) 4917644 Cel 3142... P. O. Box ... Tel (601) ... Línea Nal 018000 ...

PÁGINA: 1

1556 a 1713

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49700006868

SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
CLL 3 Y3-08 ESQUINA PALACIO MUN
BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	714,111,331.05	*SALDO PROMEDIO*	$	714,120,796
TOTAL ABONOS	$	302,708.03	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	302,708.03
SALDO ACTUAL	$	714,413,739.08	*RETENCIONES*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			302,708.03	714,413,739.08

"En caso de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

Bancolombia

Fogafín
Asegurador de los colombianos
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49700006868

SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

CLL 3 #3-08 ESQUINA PALACIO MUN

BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	714,413,739.68	SALDO PROMEDIO	$	714,423,508
TOTAL ABONOS	$	293,065.44	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	293,065.44
SALDO ACTUAL	$	714,706,804.52	RETENTUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	ABONO INTERESES AHORROS EN ESTADO DE CUENTA			293,065.44	714,706,804.52

"En caso de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

Fogafín el Seguro de Depósit

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49700006868

SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

CLL 3 #3-09 ESQUINA PALACIO MUN

SOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen, pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	714,706,804.52	SALDO PROMEDIO	$	714,710,577
TOTAL ABONOS	$	302,960.59	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	302,960.59
SALDO ACTUAL	$	715,009,765.11	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/12	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			302,960.59	715,009,765

"En caso de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestra revisoría fiscal PwC Contadores y Auditores".

1559 a 1713

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49700006868

SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
CLL 3 #3-09 ESQUINA PALACIO MUN
BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	715,009,765.11	SALDO PROMEDIO	$	715,019,542
TOTAL ABONOS	$	303,089.01	CUOTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	303,089.01
SALDO ACTUAL	$	715,312,854.12	RETENCION	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			303,089.01	715,312,854.12

1560 a 1713

Bancolombia

Fogafín — Fogafín Seguro de Depósitos — Producto protegido por el Seguro de Depósitos — www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49700006868

SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
CLL 3 #3-08 ESQUINA PALACIO MUN
BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	715,312,854.12	SALDO PROMEDIO	$	945,020,502
TOTAL ABONOS	$	476,087,438.68	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	442,782.68
SALDO ACTUAL	$	1,191,400,292.80	RETENCIONES	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	OCTO	VALOR	SALDO
15/02	ABONO INTERESES AHORROS			146,702.09	715,459,556.21
16/02	PAGO INTERBANCARIO			475,644,656.00	1,191,104,212.21
29/02	ABONO INTERESES AHORROS			296,080.59	1,191,400,292.80
	FIN ESTADO DE CUENTA				

OCFdelivery@bancolombia.com.co/www.bancolombia.com/ocr/ocr-web/delivery/ 0488f88A-14 P11 Mediatek/1e804201225-015000622822

Bancolombia

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49700003868

SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

CLL 3 #3-05 ESQUINA PALACIO MUN

BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1.191.400.292.80	SALDO PROMEDIO	$	696,491,301
TOTAL ABONOS	$	84,341.80	CUPPTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	694,911,712.40	VALOR INTERESES PAGADOS	$	84,341.80
SALDO ACTUAL	$	496,572,922.20	RETENCIONES	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/03	PAGO A PROV PA ANT 2088 3BI320			-694,911,712.40	496,488,580.40
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			84,341.80	496,572,922.20
	FIN ESTADO DE CUENTA				

1562 a 1713

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

DESDE 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49700005868
SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
CLL 3 #3-08 ESQUINA PALACIO MUN
BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo validas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	496,572,922.20	SALDO PROMEDIO	$	496,838,001
TOTAL ABONOS	$	465,991.17	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	81,674.79
SALDO ACTUAL	$	497,038,913.37	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			29,931.19	496,602,853.39
12/04	PAGO INTERBANC FIDUC POPULAR			384,316.38	496,987,169.77
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			51,743.60	497,038,913.37
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Powered by CamScanner

ANEXO N° 18 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIARIOS A ABRIL 2024

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

Entre los suscritos, de una parte, FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, sociedad de servicios financieros legalmente constituida, en adelante LA FIDUCIARIA; y por la otra, LA PARTE FIDEICOMITENTE, identificada como aparece en el numeral 2 del presente contrato. hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS**, que se rige por las cláusulas que se señalan a continuación y en lo no previsto en ellas por las normas que regulan la materia, previos los siguientes numerales y cláusulas siguientes:

CARÁTULA

1. DATOS GENERALES

Denominación del Patrimonio Autónomo: P.A. ANTICIPO CONSORCIO SIES 2023

2. PARTE FIDEICOMITENTE

Integrante 1	**Integrante 2**
Persona Natural ( ) Persona Jurídica (X)	Persona Natural ( ) Persona Jurídica (X)
Nombre NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	Nombre SMARTY COLOMBIA S.A.S. BIC.
NIT / CC NIT 900.808.866-5	NIT/ CC NIT 900.249.549-6
Teléfono 3157810517	Teléfono 3104918242
Dirección de notificación CL 3 11 E 38 BRR QUINTA ORIENTAL	Dirección de notificación _CR 7 19 28 EDIFICIO TORRE BOLIVAR OF 1504
Dirección de correo electrónico _proyectos@netkoln.com	Dirección de correo electrónico administrativobogota@smartycolombia.com
Nombres y apellidos Representante Legal RAFAEL PABON LOPEZ	Nombres y apellidos Representante Legal ANYELA MARIA PIEDRAHITA VALENCIA
No. Identificación CC 88.269.550 DE CUCUTA	No. Identificación CC 42.142.767 DE PEREIRA
Porcentaje de Participación en el Consorcio/ Unión Temporal 65%	Porcentaje de Participación en el Consorcio/ Unión Temporal 35%
Integrante 3	**Integrante 4**
Persona Natural (_) Persona Jurídica ( )	Persona Natural ( ) Persona Jurídica ( )
Nombre _____	Nombre _____
NIT/ CC _____	NIT/ CC _____
Teléfono _____	Teléfono _____
Dirección de notificación _____	Dirección de notificación _____
Dirección de correo electrónico _____	Dirección de Correo electrónico _____
Nombres y Apellidos Representante Legal _____	Nombres y Apellidos Representante Legal _____
No. Identificación _____	No. Identificación _____
Porcentaje de Participación en el Consorcio/ Unión Temporal _____	Porcentaje de Participación en el Consorcio/ Unión Temporal _____

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

Nombre del Consorcio / Unión Temporal CONSORCIO SIES 2023	
NIT 901.770.539-9	Teléfono 3157810517
Dirección de notificación CL 3 11 E 38 BRR QUINTA ORIENTAL	Dirección de Correo electrónico proyectos@netkoln.com
Nombres y apellidos Representante Legal RAFAEL PABON LOPEZ	No. Identificación CC 88.269.550 DE CUCUTA
3. DATOS CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO	
Nombre del contrato CONTRATO DE SUMINISTRO NO LP-03-2023	
Fecha de suscripción NOVIEMBRE 21 DE 2023	Duración del Contrato TRES (3) MESES
Entidad Contratante MUNICIPIO DE BOCHALEMA	NIT 890505662-3
Dirección de Notificación CALLE 3 NO 3 - 08	Dirección de Correo electrónico alcaldia@bochalema-nortede santander.gov.co
Interventor / Supervisor del contrato de obra, concesión o suministro_INTERVENTOR IVAN MAURICIO BRITO MEJIA CC 9.729.480	Valor del contrato de obra, concesión o suministro $1.737.279.281
Valor del anticipo $694.911.712,4	Porcentaje del anticipo 40%
Objeto del Contrato *Bochalema con seguridad y convivencia ciudadana SIES en implementación del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) Fase II _*	
De acuerdo con el contrato de obra, concesión o suministro: Los recursos objeto de administración provienen del Sistema General de Regalías SI (___) NO (__X__) Los recursos del anticipo deben ser invertidos en cuentas corrientes o de ahorros SI (__X__) NO (____) Existe alguna restricción para que los recursos sean administrados en el FIC FIDULIQUIDEZ SI (_X_) NO (___).	
4. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO FIDUCIARIO	
Entidad a la que se le transfieren los rendimientos del anticipo	**MUNICIPIO DE BOCHALEMA NIT 890505662-3**
Tipo y número de cuenta bancaria a la que se transfieren los rendimientos	**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NO 497-0000-6868**
Periodicidad con la que se deben girar los rendimientos	**MENSUAL**
Entidad a la que se le transfieren los excedentes del anticipo	**MUNICIPIO DE BOCHALEMA NIT 890505662-3**
Tipo y número de cuenta bancaria a la que se transfieren los excedentes	**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NO 497-0000-6868**
5. CUENTA BANCARIA DEL FIDEICOMITENTE	
Banco, Tipo y Número de cuenta bancaria: **POR DEFINIR**	Titular de la cuenta bancaria y Nit: **POR DEFINIR**
6. APORTE INICIAL	
VALOR DEL APORTE INICIAL: DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000)	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

CONSIDERACIONES

PRIMERA: El artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 establece la obligación de constituir una fiducia mercantil para crear un Patrimonio Autónomo que permita el manejo y giro de los recursos entregados a título de Anticipo en los contratos de obra, concesión, salud o los que se realicen por licitación pública.

SEGUNDA: Por su parte el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 prevé las condiciones mínimas que las Entidades Estatales deben establecer para la administración y giro del Anticipo por medio de un Contrato de Fiducia Mercantil.

TERCERA: Entre **LA ENTIDAD CONTRATANTE** y **EL FIDEICOMITENTE** se celebró el **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO**, cuyo objeto se ha descrito en el numeral 3 de la Carátula de este contrato.

CUARTA: En el **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO**, se estableció que **LA ENTIDAD CONTRATANTE** se obliga a entregar al Contratista (**FIDEICOMITENTE),** la suma equivalente al **VALOR DEL ANTICIPO** cuya descripción se detalla en el numeral 3 de la Caratula de este contrato.

QUINTA: El **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO**, dispone que previo al desembolso del anticipo, al Contratista (**FIDEICOMITENTE)** deberá constituir una fiducia o un Patrimonio Autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, de conformidad con los dispuesto en el art. 91 de la ley 1474 de 2011 y Art 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente.

SEXTA: Es voluntad del Contratista (**FIDEICOMITENTE)** que **FIDUCIARIA POPULAR S.A.** administre a través del patrimonio autónomo que aquí se constituye, los recursos que le corresponden dentro del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** por concepto del **VALOR DEL ANTICIPO.**

SÉPTIMA: LA FIDUCIARIA, presentó al Contratista (**FIDEICOMITENTE)** la propuesta de servicios, la cual una vez analizada por éste, fue aceptada.

Los riesgos, limitaciones técnicas y aspectos inherentes a los bienes y servicios que hacen parte del objeto del presente contrato de fiducia así como las dificultades o imprevistos que pueden ocurrir en la ejecución del contrato, tanto la etapa precontractual, como la contractual y post contractual, se encuentran estipulados en el presente contrato, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el numeral primero del artículo mil doscientos treinta y cuatro (1.234) del Código de Comercio Colombiano en concordancia con lo establecido en el numeral dos punto tres (2.3), sub-numeral dos punto tres punto nueve (2.3.9) del Título V, Capítulo Primero de la Circular Externa Número cero veintinueve (029) de dos mil catorce (2014) – Circular Básica Jurídica.

OCTAVA: Los recursos a administrar por parte de la **FIDUCIARIA,** provienen de:

LA ENTIDAD CONTRATANTE, y son girados por ésta a título de **ANTICIPO** de acuerdo con lo dispuesto en el **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO**.

ii) Recursos aportados por el **FIDEICOMITENTE,** incluyendo el **APORTE INICIAL**. Recursos que servirán únicamente para cubrir los costos y gastos de administración del **FIDEICOMISO**, principalmente la comisión fiduciaria y GMF.

iii) Los rendimientos que pudieren generar los recursos fideicomitidos,

Los recursos que conforman en **PATRIMONIO AUTÓNOMO** se deberán invertir de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 de la carátula del presente contrato.

NOVENA: EL FIDEICOMITENTE deja constancia en forma expresa y voluntaria que celebra este contrato de Fiducia Mercantil con **LA FIDUCIARIA**, de buena fe y sin ánimo de defraudar con él mismo a terceros, y en consecuencia asumen

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

todas las obligaciones que se originen por el incumplimiento de esta declaración que se asume como obligación contractual.

DÉCIMA: EL FIDEICOMITENTE autoriza a **LA FIDUCIARIA** para remitir las rendiciones y demás informes, a el(los) correo(s) electrónico(s) registrado(s) en la Carátula del presente contrato.

Previas las consideraciones citadas, las partes acuerdan las siguientes

CLAÚSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. - DEFINICIONES: Para efectos del presente contrato de fiducia, se definen los siguientes términos así:

1. **ANTICIPO:** Es el valor objeto de administración a través del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, el cual corresponde al señalado en el **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO**.

2. **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO:** Es el contrato descrito en la Carátula del presente documento, el cual fue celebrado entre **LA ENTIDAD CONTRATANTE** y **EL FIDEICOMITENTE** (en calidad de Contratista) y en el que se estipuló lo concerniente al **ANTICIPO**.

3. **LA FIDUCIARIA:** Es la sociedad **FIDUCIARIA POPULAR S.A.**, sociedad de servicios financieros encargada de administrar los bienes que conforman el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** que se constituye con la celebración del presente contrato fiduciario, en los términos y condiciones que se establecen más adelante en este contrato de fiducia.

4. **EL FIDEICOMITENTE**: Es (son) la(s) persona(s) jurídica(s) y/o natural(es) descrita(s) en la Carátula de este contrato, quien(es) constituye(n) el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** que por este acto jurídico se constituye, con la transferencia de los recursos para la conformación del **APORTE INICIAL**, así como aquellos recursos que transfiera(n) con posterioridad para incrementar el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.

   Si el **FIDEICOMITENTE** está conformado por los miembros del **CONSORCIO** o **LA UNIÓN TEMPORAL** que ostenta la calidad de contratista en el **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO**, el porcentaje de participación sobre los derechos fiduciarios del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, de cada **FIDEICOMITENTE**, corresponderá al porcentaje de participación de cada miembro en el **CONSORCIO** o **LA UNIÓN TEMPORAL** según lo descrito en la Carátula de este contrato.

5. **FIDEICOMISO Ó PATRIMONIO AUTÓNOMO:** Es la universalidad de bienes y derechos que se integra con los activos transferidos a **LA FIDUCIARIA** para su administración los cuales están destinados al cumplimiento del objeto y finalidad del mismo, y que para efectos del presente contrato de fiducia se denominará de la forma establecida en el Formato Inicial.

6. **PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Es el documento que presenta **EL FIDEICOMITENTE** en su calidad de Contratista, a consideración de la **ENTIDAD CONTRATANTE** que discrimina: (a) Los ítems en los cuales se va a utilizar el **ANTICIPO** tales como la mano de obra, maquinaria, equipos, materiales e insumos, servicios financieros, entre otros, los cuales deben venir plenamente identificadas incluyendo los que contemple el rubro de "VARIOS" y (b) El valor que representa cada ítem. Cabe resaltar que, los gastos y/o costos relacionados en dicho plan, en cualquier caso tendrán que estar directamente relacionados con el objeto del **ANTICIPO**. Este plan debe ser aprobado por el **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** del **CONTRATO**.
7. **GIROS Y/O DESEMBOLSOS**: Es el cumplimiento de una obligación de **EL FIDEICOMITENTE** con sus proveedores por la compra o suministro de bienes y/o servicios previstos en el plan de utilización o de inversión del **ANTICIPO**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

8. **BENEFICIARIOS:** Serán los siguientes:

a) Para todos los efectos fiscales será Beneficiario **EL FIDEICOMITENTE.**

b) **LA ENTIDAD CONTRATANTE** tendrá la calidad de **BENEFICIARIO** en el evento en que la Fiduciaria deba transferirle los remanentes de los recursos del Patrimonio Autónomo, cuando la **ENTIDAD CONTRATANTE** comunique a la **FIDUCIARIA** la ocurrencia de la declaratoria de terminación anticipada o unilateral, declaratoria de caducidad o nulidad del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO**. **LA ENTIDAD CONTRATANTE** también será Beneficiario de los rendimientos que llegaren a generar los recursos del Fideicomiso, en el evento que conforme a los pliegos de condiciones que dieron origen al **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO**, dichos rendimientos deban ser puestos a disposición de **LA ENTIDAD CONTRATANTE.**

9. **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:** Será la persona natural o jurídica contratada o designada por la ENTIDAD CONTRATANTE, quien autorizará los desembolsos de los recursos de acuerdo con el Plan de Inversión del anticipo.

10. **APORTE INICIAL**: Se trata de la suma de señalada en la carátula que transferirá EL FIDEICOMITENTE a la fecha de suscripción del presente contrato, cuyos recursos serán utilizados para atender los costos y gastos del PATRIMONIO AUTÓNOMO incluyendo el pago de la comisión fiduciaria, los costos bancarios, el gravamen al movimiento financiero y demás costos, impuestos, tasas y contribuciones que deban asumirse en la ejecución del presente contrato de fiducia.

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO: En virtud del presente contrato de fiducia, **LA ENTIDAD CONTRATANTE** por instrucción impartida por **EL FIDEICOMITENTE**, transfiere o transferirá para al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** los recursos del **ANTICIPO** del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO**, con el fin de que **LA FIDUCIARIA** como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO, los administre e invierta, entregue y gire los rendimientos a quien corresponda, ejecute los pagos instruidos por **EL FIDEICOMITENTE**, previa autorización del **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR**, con el propósito que estos sean destinados exclusivamente a la ejecución del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** previo cumplimiento de las formalidades establecidas más adelante, y con el fin de que la **FIDUCIARIA** adelante las siguientes gestiones:

1. Recibir los bienes entregados por **LA ENTIDAD CONTRATANTE** por concepto de **ANTICIPO** derivado del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO**, así como el **APORTE INICIAL** para la atención de los gastos y comisiones a cargo.
2. Administrar los bienes fideicomitidos conforme a lo establecido en la carátula del presente contrato.
3. Efectuar los pagos ordenados por **EL FIDEICOMITENTE** y aprobados por el **INTEVENTOR o SUPERVISOR**, de conformidad con el **PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.**
4. Girar los rendimientos conforme lo indicado en la carátula del presente contrato.
5. Restituir a **EL FIDEICOMITENTE** los recursos del **APORTE INICIAL** que a la liquidación del contrato no hayan sido utilizados.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efectos de manejo y control de los recursos, inversión y pagos, **LA FIDUCIARIA** llevará registro en cuenta del **FIDEICOMISO**, para lo cual todo trámite de pago deberá realizarse mediante orden impartida por **EL FIDEICOMITENTE** con la firma del **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR.**

PARÁGRAFO SEGUNDO.- NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL** es un contrato de derecho privado que se rige por las normas del Código de Comercio y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993); por lo tanto, los **BIENES FIDEICOMITIDOS** constituyen un **PATRIMONIO AUTÓNOMO** independiente y separado de los patrimonios de las partes en este **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**, el cual está exclusivamente destinado a los fines del presente contrato de fiducia. En consecuencia, los bienes de propiedad del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** son para dar cumplimiento a la finalidad perseguida, de acuerdo con los términos del presente contrato de fiducia. Este **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL** es de carácter irrevocable, de manera que **EL FIDEICOMITENTE** no podrá modificar, unilateralmente, el destino de los **RECURSOS FIDEICOMITIDOS**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

PARÁGRAFO TERCERO.- EL FIDEICOMITENTE, de manera expresa, exonera a **LA FIDUCIARIA** de toda responsabilidad respecto de las obligaciones, deberes y responsabilidades que en general le correspondan frente a terceros, por concepto de las obligaciones derivadas de la suscripción del presente **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL** y de aquellas otras que se les llegare a originar en razón de la transferencia o giro de los **BIENES FIDEICOMITIDOS**.

CLÁUSULA TERCERA.- BIENES FIDEICOMITIDOS: EL PATRIMONIO AUTÓNOMO constituido en virtud del presente contrato de fiducia se integrará con los siguientes activos:

1. Con los recursos aportados por **EL FIDEICOMITENTE** al momento de la legalización del presente contrato de fiducia y con los cuales se conformará el **APORTE INICIAL**.
1. **EL VALOR DEL ANTICIPO** descrito en la Carátula del presente contrato.
2. Los demás recursos transferidos directamente por **EL FIDEICOMITENTE al PATRIMONIO AUTÓNOMO**, los cuales incrementarían el APORTE INICIAL.

PARÁGRAFO PRIMERO.- En caso de que no se giren los recursos producto del anticipo, o **EL FIDEICOMITENTE** no cumpla con la entrega del **APORTE INICIAL,** será causal de la terminación del presente contrato fiduciario, caso en el cual **LA FIDUCIARIA** iniciará la liquidación . El documento de terminación y liquidación anticipada se perfeccionará con el envío de la comunicación al **FIDEICOMITENTE** y a la **ENTIDAD CONTRATANTE** a las direcciones de correo electrónico registradas en la Fiduciaria o en su defecto de manera física a la dirección de domicilio, en dicha comunicación: i. Informará la situación del negocio fiduciario y el acaecimiento de la causal de terminación del contrato, ii. Remitirá la rendición final de cuentas e iii. Indicará que contará con un término de quince (15) días hábiles para presentar observaciones o manifestar sus inconformidades frente a la documentación remitida, so pena que de no obtenerse pronunciamiento por parte del **FIDEICOMITENTE Y/O LA ENTIDAD CONTRATANTE**, el contrato se entenderá terminado y liquidado, esto sin perjuicio del derecho que le asiste a al **FIDEICOMITENTE** y a la **ENTIDAD CONTRATANTE** de solicitar en cualquier tiempo aclaraciones o información adicional respecto de la información que le fue presentada. De presentarse observaciones e inconformidades, la Fiduciaria contará con un término máximo de quince (15) días hábiles para proporcionar respuesta.

Así mismo, **LA FIDUCIARIA** cobrará a **EL FIDEICOMENTE** el monto de las comisiones fiduciarias causadas a la Liquidación del contrato de fiducia mercantil, de conformidad con lo definido en el presente Contrato de fiducia, las cuales serán canceladas con recursos propios del **FIDEICOMITENTE**.

CLÁUSULA CUARTA. RENDIMIENTOS: Tratándose de los rendimientos que generen los recursos girados por la **ENTIDAD CONTRATANTE**, éstos serán transferidos, de acuerdo con lo señalado en la carátula del presente contrato, **EL FIDEICOMITENTE** deberá remitir los datos de la cuenta bancaria por parte de la **ENTIDAD CONTRATANTE** para el giro respectivo. Lo mismo ocurrirá con respecto a los recursos que quedaren en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** después de haberse efectuado la totalidad de los giros y/o desembolsos (Excedentes).

Sí a la liquidación del contrato fiduciario, siempre y cuando no existan gastos y costos a cargo del **FIDEICOMISO** o del **FIDEICOMITENTE** que atender, existen recursos derivados del **APORTE INICIAL,** éstos le corresponderán al **FIDEICOMITENTE** quien informará a la **FIDUCIARIA** los datos de la cuenta bancaria a la que deberán girarse.

CLAÚSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE: Además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del presente contrato de fiducia, **EL FIDEICOMITENTE** se obliga a:

1. Cumplir con todos los trámites pertinentes para la transferencia al Patrimonio Autónomo del **ANTICIPO** derivado del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** para lo cual deberá **EL FIDEICOMITENTE** notificar de la celebración de este contrato de fiducia a la **ENTIDAD CONTRATANTE**.

2. Entregar copia del plan de utilización o de inversión del anticipo dispuesto en el **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** el cual deberá ser previamente aprobado por el **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** contratado. Para el efecto entregará a **LA FIDUCIARIA** el documento por el cual consta dicha aprobación, de ser exigido por parte de la **ENTIDAD CONTRATANTE**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

3. Entregar a **LA FIDUCIARIA**, la comunicación en la que se indica las condiciones de giro de los rendimientos y excedentes, que generen los recursos correspondientes al **ANTICIPO** del **CONTRATO** (periodicidad, tercero, cuenta bancaria donde se consignaran, entre otros), en caso de no suministrarlos en la caratula. Esta información deberá ser entregada a la **FIDUCIARIA,** en el término de un mes contado a partir de la suscripción del contrato fiduciario; en caso de no recibir esta información, la **FIDUCIARIA** no podrá cumplir con la obligación de los giros de los rendimientos y excedentes.

4. Gestionar ante la **ENTIDAD CONTRATANTE** el registro de las firmas del **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** en **LA FIDUCIARIA**, con el lleno de requisitos solicitados por esta última.

5. Entregar copia del documento por el cual se designa al **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR.**

6. Registrar las firmas de la(s) persona(s), que ordenaran los pagos con cargo a los recursos administrados, en las tarjetas de firmas que para el efecto entregue **LA FIDUCIARIA**.

7. Dar estricto cumplimiento al **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** y atender las obligaciones a su cargo establecidas en dicho **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO**.

8. Ordenar los pagos que deba realizar **LA FIDUCIARIA**, con el lleno de las formalidades previstas en el numeral 2 de la Cláusula Octava del presente Contrato de Fiducia.

9. Pagar a **LA FIDUCIARIA** el valor correspondiente a las comisiones fiduciarias (más IVA) en desarrollo del contrato de fiducia conforme a los datos suministrados en la respectiva factura.

10. **EL FIDEICOMITENTE** no podrá recibir suma alguna de dinero por concepto de **ANTICIPO** del **CONTRATO** directamente de la **ENTIDAD CONTRATANTE.** En el evento en que **EL FIDEICOMITENTE** llegare a recibir **RECURSOS** por este concepto, se obliga a transferirlos al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** el día siguiente de su recepción.

11. Suministrar a **LA FIDUCIARIA** la información e instrucciones necesarias para cumplir permanentemente con el objeto del contrato de fiducia.

12. Reconocer a **LA FIDUCIARIA**, los gastos debidamente justificados que se generen por la defensa y protección de los bienes entregados, incluyendo los desplazamientos que se requieran de trabajadores de **LA FIDUCIARIA**. En el evento que el **APORTE INICIAL** no existan recursos con cargo a los cuales se pagarán dichos gastos, **EL FIDEICOMITENTE**, se obliga a entregarlos a **LA FIDUCIARIA** a más tardar en la fecha de vencimiento de la respectiva factura.

13. **ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN**: Para los fines previstos en el acápite referente a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, contenido en la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás que en el futuro la adicionen o modifiquen, **EL FIDEICOMITENTE** se obliga a entregar información veraz y verificable, y, a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e información exigidos por **LA FIDUCIARIA** al momento de la vinculación. **LA FIDUCIARIA** queda desde ya facultada para dar por terminado el contrato de fiducia, en caso de desatención a estos deberes.

14. Informar a **LA FIDUCIARIA** la ocurrencia de aquellos eventos que comprometan la solvencia y liquidez patrimonial de **EL FIDEICOMITENTE** así como la imposibilidad de seguir desarrollando sus negocios en forma normal tales como: a- Incumplimiento de las obligaciones amparadas con **EL PATRIMONIO AUTÓNOMO**; b- Iniciación de procesos ejecutivos en contra de **EL FIDEICOMITENTE**, y de la ocurrencia de cualquier embargo, secuestro de que sean objeto los bienes del **FIDEICOMITENTE**; c- La oferta de cesión de bienes o de daciones en pago y d- Ser admitido en proceso de Ley de Insolvencia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

15. Informar a **LA FIDUCIARIA** sobre cualquier cambio material o legal adverso en la situación financiera de **EL FIDEICOMITENTE** de cada uno de sus integrantes cuando sea el caso, o de otra índole que pueda afectar las condiciones en que debe mantenerse **EL PATRIMONIO AUTÓNOMO**.

16. **EL FIDEICOMITENTE** con la suscripción del presente contrato de fiducia se obliga a remitir constancia de recibo de la(s) rendición(es) de cuentas al correo electrónico a través del cual le sea(n) remitida(s), o mediante comunicación escrita. Queda entendido, que pasados quince (15) días hábiles contados a partir de la presentación de la respectiva rendición sin que **EL FIDEICOMITENTE** hubiese manifestado objeción alguna, se entenderá que **EL FIDEICOMITENTE** ha impartido aprobación de la misma. No obstante, lo anterior en cualquier tiempo EL **FIDEICOMITENTE** podrá solicitar aclaraciones o información adicional respecto de las rendiciones y/o informes presentados por **LA FIDUCIARIA**. Las rendiciones de cuenta y demás informes serán remitidas a el (los) correo(s) electrónico(s) citados en el numeral 7. de la cláusula sexta de este contrato.

    Se exceptúa del término de los quince (15) días hábiles la rendición final de cuentas, como quiera que lo concerniente a esta rendición se regula en el numeral 3. de la cláusula vigésima cuarta siguiente.

17. Informar a **LA FIDUCIARIA**, inmediatamente tenga conocimiento, sobre cualquier cambio material o legal que se presente en el **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** así como de prórrogas, otrosíes o suspensiones que se generen en razón del mencionado CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO, así como de los contratos del interventor y/o supervisor.

18. Suministrar a **LA FIDUCIARIA** la información e instrucciones necesarias para cumplir permanentemente con el objeto del contrato de fiducia.

19. Los reembolsos o giros a los proveedores que sean solicitados por **EL FIDEICOMITENTE** con cargo a los recursos del **FIDEICOMISO**, por concepto de pagos efectuados en desarrollo del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** celebrado con la **ENTIDAD CONTRATANTE,** deberán tener la autorización del **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** y encontrarse dentro del plan de inversión del anticipo aprobado.

20. Asumir las obligaciones tributarias, formales y de fondo, a que estén sometidos **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, así como responder por las declaraciones y liquidaciones tributarias a que haya lugar. En las solicitudes de giros a proveedores, de forma obligatoria, en cada planilla de pagos se deberá remitir la certificación firmada por contador público en la que se certifique, el cumplimiento de esta obligación, con copia de la tarjeta profesional por única vez

21. EL **FIDEICOMITENTE** se obliga a la firma del presente contrato de fiducia, a otorgar un pagaré en blanco con carta de instrucciones para garantizar las obligaciones adquiridas con **LA FIDUCIARIA.**

22. Las demás obligaciones previstas en la Ley o que sean establecidas por las partes.

CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: Para la consecución del objeto del presente contrato de fiducia, dentro de su obligación de medio, **LA FIDUCIARIA** contrae las siguientes obligaciones además de las consagradas en otras cláusulas del presente contrato de fiducia:

1. Recibir en las cuentas bancarias o en el Fondo de Inversión Colectiva Fiduliquidez a nombre del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** los recursos del **ANTICIPO.** manteniéndolos separados de sus propios recursos o de los pertenecientes a otros negocios fiduciarios y destinándolos al cumplimiento de la finalidad del presente contrato de fiducia.

2. Realizar los pagos que **EL FIDEICOMITENTE** instruya, conforme a lo dispuesto en este contrato de fiducia y previa aprobación del **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** designado.

3. Invertir los recursos de conformidad con lo establecido en la Carátula del presente contrato fiduciario.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

4. Llevar en forma separada y discriminada los estados financieros de los recursos del Patrimonio Autónomo de tal manera que pueda verificarse en cualquier momento su situación.

5. Restituir a **EL FIDEICOMITENTE** los bienes o recursos que se encuentren en su poder a la terminación del presente Contrato de Fiducia Mercantil, que hayan sido aportados para la atención de gastos y comisiones y que no hayan sido utilizados, de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato.

6. Entregar a la **ENTIDAD CONTRATANTE** o a quien está indique, los recursos no utilizados que correspondan al **ANTICIPO** que se encuentren en **EL FIDEICOMISO** a la terminación del presente contrato de fiducia mercantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato.

7. De conformidad con el numeral 8° del Artículo 1234 y el numeral 4 del Artículo 1236 ambos del Código de Comercio y el numeral 6 de la Parte II, Título II, Capítulo I de la Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), **LA FIDUCIARIA** tendrá la obligación de rendir cuentas a **EL FIDEICOMITENTE** y la **ENTIDAD CONTRATANTE** cada seis (6) meses a partir de la fecha de suscripción del presente contrato de fiducia, justificando, argumentando y demostrando a través de los medios idóneos el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato de fiducia. **EL FIDEICOMITENTE** autoriza con la suscripción del presente contrato de fiducia que el envío de las rendiciones de cuentas para él y para la **ENTIDAD CONTRATANTE, EL INTERVENTOR** y/o **EL SUPERVISOR** por parte de **LA FIDUCIARIA** se realice a través de los correos electrónicos señalados en la Carátula de este contrato.

8. Notificar al **FIDEICOMITENTE** y, si a ello hubiere lugar, a la **ENTIDAD CONTRATANTE** cualquier acto o hecho que afecte la normal ejecución del **PATRIMONIO AUTÓNOMO.**

9. Entregar mensualmente a **EL FIDEICOMITENTE** y a la **ENTIDAD CONTRATANTE,** un informe que contendrá **(i)** Los Estados Financieros, **(ii**) El plan de inversiones ejecutado, **(iii)** el extracto mensual las cuentas bancarias y/o fondo de inversión del **FIDEICOMISO y (iv)** un informe de fuentes y usos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO.** El presente informe mensual se entregará a partir del ingreso de los recursos del **ANTICIPO** a favor del **PATRIMONIO AUTÓNOMO.**

10. Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o cuando deba apartarse de las autorizaciones contenidas en este acto, si así lo ameritan las circunstancias. En el evento en que **LA FIDUCIARIA** haga uso de esta facultad, quedarán en suspenso sus obligaciones relacionadas con el aspecto consultado hasta tanto se profiera la correspondiente respuesta, sin que por ello pueda predicarse incumplimiento de **LA FIDUCIARIA** en la ejecución de las mismas.

11. Todas las demás que le correspondan según lo establecido en la ley y en este contrato de fiducia.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- EXCEDENTES: Se consideran recursos excedentes, los recursos disponibles en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** cuando se haya cumplido la finalidad de su constitución y cuando **LA FIDUCIARIA** verifique que todos los pagos y desembolsos previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo, se hayan realizado, los cuales deberán ser restituidos a la **ENTIDAD CONTRATANTE** o entregados a **EL FIDEICOMITENTE** cuando se liquide el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, según lo determine la **ENTIDAD CONTRATANTE**.

En todo caso, el giro de estos recursos deberá contar con el visto bueno de la **ENTIDAD CONTRATANTE**. En el evento en que se entregue al **FIDEICOMITENTE**, dicha entrega se considerará como un abono que realiza la **ENTIDAD CONTRATANTE** de los pagos pendientes a **EL FIDEICOMITENTE** con cargo al **CONTRATO,** de tal forma que el valor que corresponda a dichos excedentes deberá ser informado por **LA FIDUCIARIA** a la **ENTIDAD CONTRATANTE** para que ésta registre el abono en la proporción pertinente.

CLÁUSULA OCTAVA.- INSTRUCCIONES GENERALES: Para el cumplimiento del objeto antes expresado, **LA FIDUCIARIA** tiene las siguientes instrucciones:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1. **INVERSIÓN DE LOS RECURSOS: EL FIDEICOMITENTE** instruye expresamente a **LA FIDUCIARIA** para que los recursos que transfiere para su administración y mientras se destinan a las finalidades del objeto del presente contrato de fiducia, sean invertidos en el **FONDO DE ADMINISTRACIÓN COLECTIVA FIDULIQUIDEZ** administrados por **LA FIDUCIARIA**, los cuales se rigen por el reglamento respectivo y las políticas fijadas para su administración, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1525 de 2008 y demás normas que lo modifiquen o complementen. Igualmente, **EL FIDEICOMITENTE** autoriza que, en caso de requerirse, **LA FIDUCIARIA** maneje los recursos mientras se destinan al objeto del presente contrato de fiducia, en cuentas corrientes o de ahorros de su matriz, filiales o empresas vinculadas o subordinadas.

2. **CLASIFICACIÓN GRUPO CONTABLE : EL FIDEICOMITENTE** autoriza que la contabilidad del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** se realice según el grupo conforme al Grupo 3, es decir, que se aplicará lo dispuesto en el Capítulo XXIX de la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995, para lo cual **EL FIDEICOMITENTE** se obliga con **LA FIDUCIARIA** a suministrar las políticas contables respectivas para su aplicación, de lo contario **LA FIDUCIARIA** aplicará el modelo estándar de políticas definido para este tipo de negocio.

3. **PROCEDIMIENTO PARA PAGOS:** Una vez hayan ingresado al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** los recursos referidos en el numeral 2 de la cláusula tercera del presente contrato de fiducia, LA FIDUCIARA procederá a la realización de los pagos, conforme el procedimiento interno de FIDUCIARIA POPULAR S.A, el cual será informado al FIDEICOMITENTE mediante correo electrónico. No obstante lo anterior, deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

    1. La instrucción de pagos deberá estar debidamente firmada por el ordenador del pago, el **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR**, igualmente deberá indicar el rubro que corresponda al **PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN.**

    2. Allegada la instrucción de pagos, debidamente firmada por el ordenador del pago, el **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, LA FIDUCIARIA** procederá a la realización del respectivo pago dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al momento en que **LA FIDUCIARIA** reciba la instrucción de pago.

    3. **LA FIDUCIARIA** solo estará facultada para realizar los pagos mediante transferencias electrónicas a cuenta corriente, de ahorros a nivel nacional, a los terceros registrados como beneficiarios de pago de acuerdo con las facturas o cuentas de cobro suministradas.

    4. Es claro para las partes que es responsabilidad de **EL FIDEICOMITENTE** cumplir con la obligación de realizar el estudio previo a los receptores de los pagos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, y en este orden se entenderá que los pagos que ordene a **LA FIDUCIARIA** han cumplido previamente con este trámite, sin perjuicio de las verificaciones que corresponda efectuar a **LA FIDUCIARIA** en aras de aceptar o no la instrucción de pago, ya que en el evento de detectarse movimientos y/o operaciones con personas naturales o jurídicas incluidas en listas de cautela, **LA FIDUCIARIA** se abstendrá del cumplimiento de la respectiva instrucción o reversándola si a ello hubiere lugar.

    5. Será responsabilidad del **FIDEICOMITENTE**, del **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** del **CONTRATO** respecto al **PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN**, la destinación que den a los pagos o a los recursos. En consecuencia, es claro para las partes que, tratándose de los recursos a administrar, **LA FIDUCIARIA** sólo será responsable por los que efectivamente le hayan sido transferidos al **PATRIMONIO AUTÓNOMO. LA FIDUCIARIA** no será responsable por la mora en la realización de los pagos cuando la misma sea imputable a **EL FIDEICOMITENTE** o a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.

        EL FIDEICOMITENTE podrá solicitar que, con cargo a los recursos del **FIDEICOMISO**, se realicen reembolsos a su favor por concepto de pagos efectuados en desarrollo del **CONTRATO** celebrado con la **ENTIDAD CONTRATANTE** siempre y cuando las órdenes de pago cuenten con la autorización del **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** y que el concepto objeto del reembolso se encuentre dentro del plan de inversión del anticipo aprobado. En este evento, **EL FIDEICOMITENTE** estará obligado a efectuar las declaraciones y pagos de las retenciones practicadas a los beneficiarios de los pagos objeto del reembolso solicitado y deberá adjuntar copia de las facturas canceladas.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

6. En las instrucciones de pagos a proveedores aprobada por parte del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, de forma obligatoria se deberá remitir la certificación firmada por contador público en la que se certifique, el cumplimiento de esta obligación.

7. El FIDEICOMITENTE se obliga a asumir las obligaciones tributarias, formales y de fondo, a que este sometido el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, así como responder por las declaraciones y liquidaciones tributarias a que haya lugar. En las solicitudes de giros a proveedores, de forma obligatoria, en cada planilla de pagos se deberá remitir la certificación firmada por contador público en la que se certifique, el cumplimiento de esta obligación"

PARÁGRAFO PRIMERO. No podrán ordenarse con cargo al anticipo pagos diferentes a los que sean aprobados por el **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR**, incluso en aquellos casos en que resulten escasos los recursos del APORTE INICIAL constituido.

CLÁUSULA NOVENA.- DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE: EL FIDEICOMITENTE según corresponda frente a la forma de inversión de los recursos del **ANTICIPO** declara expresamente mediante este instrumento y bajo la gravedad del juramento:

1. Que ha recibido una copia del reglamento del fondo de inversión colectiva administrado por **LA FIDUCIARIA** en el que serán administrados los recursos del **FIDEICOMISO**, siendo conocedor de las características propias de las mismas y acepta:

    1. Que es un fondo de rentabilidad variable y está condicionado al riesgo propio de tales instrumentos de inversión.
    2. Que por su naturaleza las obligaciones de **LA FIDUCIARIA** son de medio y no de resultado, por lo que no se garantiza rentabilidad, ni valorización mínima de las inversiones.
    3. Que la comisión fiduciaria por la inversión en el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDULIQUIDEZ, se causará, liquidará y cobrará en los términos del respectivo reglamento.

2. Que ha sido informado que cualquier reclamo relativo al cumplimiento o a la calidad de los servicios prestados por **LA FIDUCIARIA** en desarrollo del presente contrato de fiducia, también pueden dirigirlo al Defensor del Consumidor Financiero cuya información se consigna a continuación, y el cual ha sido designado por LA FIDUCIARIA, de conformidad con lo previsto en la Ley 1328 de 2009 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen:

    DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO LAGUADO GIRALDO LTDA. Defensor Principal: DARIO LAGUADO MONSALVE
    Correo Electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co / mario.vargas@defensorialg.com.co.
    Calle 70A No. 11-83
    Teléfonos: 5439850 / 235 1604 / 320-3981187
    Página Web: www.defensorialg.com

3. Que autoriza a **LA FIDUCIARIA**, a su matriz y a las filiales y subsidiarias de ésta o a quien en el futuro represente sus derechos u ostente la calidad de acreedor, de manera irrevocable, para reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información Financiera, administrada por la Asociación Bancaria y de Personas naturales de Colombia, a DATACREDITO o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos que tengan fines de información, financieros estadísticos, de control, supervisión, gerenciales y de consolidación de información, todos mis (nuestros) datos personales económicos, incluyendo la información referente a mi(nuestro) comportamiento comercial y crediticio, tales como el nacimiento, modificación o extinción de obligaciones contraídas con anterioridad o que se llegaren a contraer fruto de contratos financieros o bursátiles celebrados con **LA FIDUCIARIA**, su matriz y las filiales o subsidiarias de éste. Como consecuencia de esta autorización **LA FIDUCIARIA**, su matriz y las filiales o subsidiarias de éste podrán consultar e incluir mis(nuestros) datos financieros y comerciales en las bases de datos mencionadas, en las cuales se verá reflejado mi(nuestro) actual y

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

pasado comportamiento en relación con el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones o el manejo dado a los servicios que presta el sector financiero, bursátil y asegurador, la cual permanecerá durante el término establecido por la ley y en su defecto por la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional. Así mismo, la presente autorización implica que la sociedad fiduciaria, su matriz y las filiales o subsidiarias de ésta podrán circular y compartir con propósitos gerenciales, comerciales, de control de riesgos, consolidación de información, estadísticos y de servicio, los datos suministrados por mí(nosotros) a la sociedad fiduciaria su matriz y las filiales o subsidiarias de ésta con ocasión de una vinculación contractual o los relacionados con la situación propia del suscriptor(es) que conozcan en desarrollo de la actividad financiera que prestan, así como la información que se genere en virtud de los contratos financieros celebrados o que se celebren en el futuro entre el(los) suscriptor(es) y la sociedad fiduciaria y/o su matriz y/o las filiales o subsidiarias de ésta. 5. Que autoriza a **LA FIDUCIARIA** para remitir todos los informes relacionados en el presente contrato de fiducia, a la dirección, fax o correo electrónico registrados por **EL FIDEICOMITENTE**; por lo tanto la información o el material que se envíe, bajo ningún concepto se responsabilizará a **LA FIDUCIARIA** de ningún daño directo, indirecto, incidental, especial o consecuente, como tampoco de ningún daño por lucro cesante, pérdida de ingresos, datos o uso, en el que hubiere incurrido **EL FIDEICOMITENTE** o algún tercero por acción contractual o extracontractual resultante del acceso, alteración o uso de dicha información. Con esta autorización no se está violando la confidencialidad ni la reserva bancaria.

4. **COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL FIDEICOMITENTE** declara conocer que de conformidad con las disposiciones locales e internacionales anti-corrupción, se encuentra prohibido pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o cualquier otro elemento de valor a cualquier servidor público o funcionario de gobierno, partido político, candidato, o a cualquiera persona actuando a nombre de una entidad pública cuando dicho pago comporta la intención corrupta de obtener, retener o direccionar negocios a alguna persona para obtener una ventaja ilícita ("Normas Anti-Corrupción del Sector Público"). Así mismo, las partes reconocen la existencia de regulación similar en materia de soborno en el sector privado, entendido como el soborno de cualquier persona particular o empresa privada para obtener una ventaja indebida ("Normas Anti-Corrupción del Sector Privado" y junto con las Normas Anti-Corrupción del Sector Público, las "Normas y Anti-Corrupción". En consideración de lo anterior, las partes se obligan a conocer y acatar las Normas Anti-Corrupción absteniéndose de efectuar conductas que atenten contra las referidas Normas Anti-Corrupción a nivel local o internacional. El incumplimiento de la obligación contenida en este numeral constituirá causal de terminación inmediata del presente contrato sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a indemnización alguna.

5. **CUMPLIMIENTO SARLAFT**: **EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA** declaran que sus negocios y los recursos que utilizan para la ejecución del presente contrato no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita, Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. Así mismo se comprometen a entregar toda la información que les sea solicitada para dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y declaran que la misma es veraz y verificable. **EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA** se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores o empleados, y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas; en todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato **EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA** o alguno de sus socios, administradores, clientes, proveedores o empleados llegarán a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo como penal, administrativa, o de cualquier otra índole, relacionada con actividades ilícitas, Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc., cualquiera de **EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA** tiene derecho a terminar unilateralmente el presente contrato sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a indemnización alguna ni pena pecuniaria.

6. **EL FIDEICOMITENTE** declara expresamente que, independientemente de los bienes que compromete en esta Fiducia, tiene capacidad suficiente para responder con su propio patrimonio y la generación suficiente de recursos para atender la totalidad de las obligaciones contraídas por él, incluyendo sus accesorios. Así mismo, manifiesta que, por la constitución de esta Fiducia no se produce un desequilibrio en su patrimonio que le impida satisfacer las obligaciones contraídas en el pasado, en cuanto que, como se dijo, posee otros bienes que son suficientes para atender las obligaciones de pago anteriormente descritas y asegura además que, la presente Fiducia no tiene como causa, ni produce como efecto, la defraudación de derechos de terceros por la disminución de la prenda general de sus acreedores, y, sin perjuicio de la responsabilidad penal del caso, se compromete a responder civilmente por las consecuencias de la inexactitud o reticencia en las declaraciones contenidas en esta cláusula.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

En todo caso, **EL FIDEICOMITENTE** queda obligado a salir al saneamiento ante cualquier situación, perturbación, reclamación o decisión que afecte o pueda afectar los **BIENES FIDEICOMITIDOS** y está obligado al resarcimiento de la totalidad de los costos y gastos o de los pagos que se causen para la defensa de los bienes o derechos y de los costos y gastos que se causen para lograr la efectividad de la finalidad perseguida por el **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL.**

7. **INDEMNIDAD:** Con la suscripción del presente contrato, **EL FIDEICOMITENTE** declara de manera irrevocable que mantendrá a **FIDUCIARIA POPULAR S.A.**, indemne y libre de toda consecuencia y/o perjuicio que pueda derivarse de cualquier reclamo, demanda, litigio, acción judicial, reivindicación, multas y en general de cualquier clase de fallo judicial o extrajudicial o administrativo, que se genere en ejecución del presente contrato de fiducia, iniciado por hechos directamente atribuibles a su responsabilidad incluyendo los relacionados con la ejecución o el incumplimiento de cualquier obligación derivada del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO**.

CLÁUSULA DÉCIMA- IRREVOCABILIDAD: El presente contrato de fiducia es irrevocable, en consecuencia, no podrá darse por terminado de manera unilateral por **EL FIDEICOMITENTE.**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA: Por disposición legal la responsabilidad de **LA FIDUCIARIA** es de medio y no de resultado, y se extiende hasta de la culpa leve, por lo tanto **LA FIDUCIARIA** deberá disponer de los medios adecuados para lograr un resultado sin que en ningún momento se entienda que garantiza la consecución del mismo, por lo que **LA FIDUCIARIA** no será responsable de las pérdidas que llegaren a ocasionar en desarrollo del presente contrato de fiducia o del **CONTRATO**.

Queda claramente entendido que bajo ninguna circunstancia **LA FIDUCIARIA** será responsable por la falta de recursos en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. La obligación de realizar los pagos ordenados por **EL FIDEICOMITENTE** con el visto bueno del **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** se entenderá condicionada a la existencia y disponibilidad de recursos en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, conforme al **PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN** previsto para los recursos correspondientes al **ANTICIPO**, luego de efectuados los pagos instruidos a favor de los terceros que le indiquen. **LA FIDUCIARIA** no es responsable por la ejecución de las obligaciones a cargo de **EL FIDEICOMITENTE** en desarrollo de las operaciones de las cuales se derivan **LOS RECURSOS** vinculados al **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** ni de los perjuicios que la inejecución que el mencionado CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO puedan ocasionar, todo lo cual está a cargo exclusivamente de **EL FIDEICOMITENTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- DERECHOS DE LAS PARTES: Para la consecución del objeto del presente contrato de fiducia las partes tienen los siguientes derechos:

12.1. DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE:

1. Exigir a la **FIDUCIARIA** el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales a su cargo conforme a los términos previstos en este Contrato de Fiducia Mercantil y en la ley.

2. Examinar en cualquier momento los documentos relacionados con el presente contrato de fiducia.

3. Exigir a **LA FIDUCIARIA** las rendiciones de cuentas y los informes a que haya lugar en los términos y plazos previstos en el presente Contrato de Fiducia Mercantil conforme a la legislación vigente, así como exigir los informes requeridos por la **ENTIDAD CONTRATANTE**, previo requerimiento escrito, informado por canal físico o electrónico a la **FIDUCIARIA** y concertado de mutuo acuerdo con la **FIDUCIARIA** la entrega de dichos informes. **EL FIDEICOMITENTE** se encuentra facultado para solicitar en cualquier momento aclaraciones o información adicional respecto de las rendiciones y/o informes presentados por **LA FIDUCIARIA**.

4. Exigir a **LA FIDUCIARIA** que lleve una contabilidad separada del negocio.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

5. Exigir a **LA FIDUCIARIA**, a la terminación de este Contrato de Fiducia Mercantil proceder a la liquidación del **FIDEICOMISO** y a la restitución de los bienes que a la fecha de liquidación conforman el **FIDEICOMISO**, de acuerdo con lo establecido en este Contrato de Fiducia Mercantil.

6. Pedir la remoción de **LA FIDUCIARIA** en el caso en que ésta incumpla las obligaciones contempladas en este contrato de fiducia y cuando haya lugar a ello por razones debidamente justificadas.

7. Los demás reconocidos por la ley y el presente contrato de fiducia.

12.2. DERECHOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

1. Examinar en cualquier momento los documentos relacionados con el presente contrato de fiducia.

2. Exigir a **LA FIDUCIARIA**, la entrega de informes en los plazos y términos previstos en el presente contrato de fiducia.

3. Los demás reconocidos por la ley y el presente contrato de fiducia.

12.3. DERECHOS DE LA FIDUCIARIA:

1. Exigir el pago de la comisión fija mensual en el término establecido en el presente contrato de fiducia. En el evento que existan recursos en el **APORTE INICIAL, LA FIDUCIARIA** descontará las comisiones que se causen a su favor.

2. Solicitar a **EL FIDEICOMITENTE** los soportes necesarios para realizar los pagos ordenados en cumplimiento de la finalidad del presente contrato de fiducia.

3. Dar por terminado el presente contrato de fiducia en el evento que **EL FIDEICOMITENTE**, la **ENTIDAD CONTRATANTE**, el **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** y/o algún tercero receptor de pagos sean incluidos en listas de control, cautela o represente riesgo reputacional para **LA FIDUCIARIA**.

4. Los demás reconocidos en la ley y el presente contrato de fiducia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: LA FIDUCIARIA se obliga a mantener la reserva y confidencialidad de la información suministrada por **EL FIDEICOMITENTE**, y a darle un adecuado manejo, respecto de sus funcionarios, empleados, asesores, contratistas, subcontratistas y otros terceros, información que sólo podrá ser divulgada en los siguientes eventos:

1. Por autorización expresa y escrita del **FIDEICOMITENTE** y de la **ENTIDAD CONTRATANTE.**

2. Por orden de autoridad judicial o administrativa competente.

3. Por la expedición de alguna norma que así lo determine.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- PROHIBICIÓN USO DEL NOMBRE DE LA FIDUCIARIA Y/O FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ADMINISTRADOS POR LA FIDUCIARIA: EL FIDEICOMITENTE se abstendrá de indicar de cualquier forma y en cualquier tipo de documento el nombre de la **FIDUCIARIA POPULAR S.A.** y/o de cualquiera de los fondos de inversión colectiva, , administrados como garantes de sus operaciones o como obligadas a realizar los pagos a favor de terceros con ocasión de las operaciones celebradas en virtud del presente contrato de fiducia. El desconocimiento de esta prohibición facultará a **LA FIDUCIARIA** para dar por terminado de manera automática el presente contrato de fiducia sin que haya lugar a ningún tipo de indemnización y sin perjuicio de adoptar las medidas legales que estime pertinentes.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA Como contraprestación por su labor **LA FIDUCIARIA** recibirá de la parte FIDEICOMITENTE como retribución a título de comisión fiduciaria las siguientes sumas:

1. Por la administración del fideicomiso, se causará una comisión mensual equivalente a**: UN (1) SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (1.0 S.M.M.L.V) más IVA,** desde el ingreso de los recursos del anticipo al **PATRIMONIO AUTONOMO** hasta el giro total de los mismos o hasta que acaezcan una de las causales de terminación del presente contrato. Es de aclarar que esta comisión se cobrará por el valor de mensual y no por fracción.

   Esta comisión incluye hasta la realización de **DIEZ (10)** pagos mensuales. Los pagos adicionales que se presenten en el mes de corte tendrán un costo **VEINTISIETE MIL PESOS MCTE ($27.000.oo)** más IVA, mediante transferencia electrónica, sumas que se ajustarán cada año en el IPC del año inmediatamente anterior. Esta comisión se mantendrá siempre y cuando los recursos sean invertidos en los fondos de inversión de la fiduciaria.

   Esta comisión incluye la apertura de **UNA (1)** cuenta(s) bancaria(s) a nombre del **FIDEICOMISO**. En el evento en que se requiera la apertura de cuentas bancarias adicionales, **EL FIDEICOMITENTE** pagará con recursos propios a favor de **LA FIDUCIARIA** previa apertura de la(s) nueva(s) cuenta(s) bancaria(s) la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($250.000.oo)** más de IVA, valor que será aplicado por cada cuenta adicional que se abra y el mismo valor adicional a la comisión de administración mensual establecida en el contrato fiduciario.

2. La suma equivalente a **CERO PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (0.5 S.M.M.L.V.)** más IVA, por cada trámite de modificación, OTRO SÍ, aclaración que se requiera efectuar al contrato, suma que deberá ser cancelada por EL FIDEICOMITENTE, previo a la firma del correspondiente Otro sí modificatorio.

3. El equivalente a **DIEZ SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (10 S.M.M.L.V.)** más IVA, por la cesión del contrato a otra sociedad Fiduciaria.

4. Por la inversión de los recursos fideicomitidos en los Fondos de Inversión administrados por **LA FIDUCIARIA**, se cobrará la comisión estipulada en el reglamento del mismo, y en las políticas fijadas por **LA FIDUCIARIA** dentro del marco legal y contractual

   El pago de la comisión fiduciaria está a cargo del **FIDEICOMITENTE**, por lo tanto, no es un gasto a cargo del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.

PARÁGRAFO PRIMERO.- El monto de las comisiones señaladas en la presente cláusula, será asumido directamente por **EL FIDEICOMITENTE** quien se obliga a cancelar las sumas antes descritas, a más tardar en la fecha de vencimiento de la respectiva factura que expida **LA FIDUCIARIA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- MÉRITO EJECUTIVO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de dar o hacer a cargo del **FIDEICOMITENTE** incluida la relativa al pago de las comisiones relacionadas anteriormente, así como las obligaciones de **LA FIDUCIARIA**, serán exigibles ejecutivamente, para lo cual el presente contrato de fiducia prestará mérito ejecutivo, sin necesidad de requerimiento judicial alguno, al cual renuncia **EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA**.

PARÁGRAFO TERCERO.- PAGARÉ EN BLANCO: EL FIDEICOMITENTE se obliga a la firma del presente contrato de fiducia, a otorgar un pagaré en blanco con carta de instrucciones para garantizar las obligaciones adquiridas con **LA FIDUCIARIA.**

PARÁGRAFO CUARTO: LA FIDUCIARIA podrá abstenerse de realizar pagos o cualquier otra gestión relacionada con el desarrollo del presente contrato, si al momento en que sea solicitada cualquier gestión por parte del FIDEICOMITENTE, este se encuentra en mora en la cancelación de la comisión fiduciaria a que tiene derecho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- COSTOS: Serán costos a cargo del **FIDEICOMITENTE** los gastos que se generen por los pagos, transferencias o similares, giros y en general los costos bancarios de orden nacional o internacional que se generen por la operación del negocio fiduciario, al igual que las tasas, contribuciones, impuestos y demás gastos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

tributarios a que haya lugar distintos a los que le corresponda asumir directamente a **EL FIDEICOMITENTE** o que por norma se generen por la ejecución de los recursos del **ANTICIPO**. En consecuencia, es responsabilidad del **FIDEICOMITENTE** aportar los recursos que sean necesarios para atender en debida forma los gastos y costos generados en desarrollo del presente contrato de fiducia, cuando no se cuente con recursos suficientes para el efecto en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, caso en el cual **LA FIDUCIARIA** solicitará a **EL FIDEICOMITENTE** que suministren los recursos faltantes, obligándose estos últimos a suministrarlos en un término no superior a los tres (3) días hábiles a partir del requerimiento que por escrito efectúe LA FIDUCIARIA, so pena de reconocer intereses a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera o LA EMPRESA que haga sus veces.

PARÁGRAFO: Será a cargo del **FIDEICOMITENTE** el valor correspondiente al dictamen que deba efectuar del negocio la Revisoría Fiscal de **LA FIDUCIARIA** o cualquier ente de control o autoridad competente por tratarse de negocios de administración de recursos públicos (aplica para negocios de administración de anticipos vigentes al treinta y uno (31) de diciembre de cada año fiscal), suma que deberá ser cancelada con recursos propios del **FIDEICOMITENTE** dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en el que **LA FIDUCIARIA** expida la respectiva factura.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS: En desarrollo de su deber legal de lealtad, **LA FIDUCIARIA** se abstendrá de incurrir en conductas que den lugar a posibles situaciones de conflictos de interés, o que lesionen los intereses del **FIDEICOMITENTE** por alejarse o desconocer lo instruido por **EL FIDEICOMITENTE** en el presente contrato de fiducia. Para tal efecto, los accionistas, administradores y empleados de **LA FIDUCIARIA** procurarán que en las actuaciones de esta última no se presenten situaciones que puedan configurar conflictos de intereses, entendiéndose como tal la situación en virtud de la cual **LA FIDUCIARIA** se enfrenta a distintas alternativas de conducta en relación con intereses incompatibles, entre las cuales se encuentran las señaladas en el artículo 67 del Decreto 2175 de 2007 (hoy Decreto 2555 de 2010) o las normas que lo deroguen, modifiquen o complementen. No obstante, si se identifica alguna situación que pueda ser generadora de conflictos de interés, la misma será informada a la Presidencia de **LA FIDUCIARIA** por parte del funcionario que tuvo conocimiento de la misma, para la respectiva presentación a la Junta Directiva de **LA FIDUCIARIA** si la situación así lo amerita dado su alcance o impacto. Reportada a la Junta la situación respectiva, procederá éste órgano a determinar la existencia o no de un conflicto de interés y a adoptar las decisiones respectivas en relación con la situación presentada, todo lo cual deberá quedar debidamente documentado con base en criterios objetivos. En todo caso, los conflictos de intereses que llegaren a presentarse se resolverán en principio dando estricto cumplimiento con las regulaciones contenidas al respecto en las normas legales vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- MECANISMOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS: LA FIDUCIARIA aplicará, durante toda la vigencia del presente contrato a **EL(LOS) FIDEICOMITENTE(S)** y/o a sus cesionarios y en general a los terceros que resulten partícipes en el desarrollo del presente contrato, desde su vinculación y hasta que cese todo vínculo contractual e incluso hasta su liquidación, los procedimientos que a continuación se describen, respecto de cada uno de los siguientes riesgos:

Con relación al **RIESGO LEGAL: LA FIDUCIARIA** cuenta con un procedimiento adecuado de estructuración de negocios, el cual contempla entre otros aspectos, la revisión de documentos necesarios para la celebración de los contratos fiduciarios, revisión del alcance del contrato, revisión de las obligaciones de **EL(LOS) FIDEICOMITENTE(S)** y de LA FIDUCIARIA.

Con relación al **RIESGO OPERACIONAL**: Para mitigar la exposición a este tipo de riesgo que se puede generar por deficiencias, fallas o inadecuado funcionamiento interno de los procesos, la tecnología, la infraestructura o el recurso humano, LA FIDUCIARIA cuenta con herramientas como procesos, manuales, políticas, estructura organizacional adecuada y sistemas de información de monitoreo de riesgo, entre otros. Para hacer seguimiento y control a las herramientas anteriores cuenta con mecanismos como el Sistema de Control Interno y el Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO), fundamentado en los lineamientos del Capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Con relación al **RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD:** Para mitigar la exposición a este riesgo ante posibles amenazas potenciales que afecten la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, **LA FIDUCIARIA** cuenta con herramientas como procesos, manuales, políticas, estructura organizacional

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

adecuada y sistemas de información de monitoreo de riesgo, entre otros.

Con relación al **RIESGO DE MERCADO**: LA FIDUCIARIA cuenta con herramientas que se encuentra consignadas en el Manual de Gestión de Riesgos y Tesorería tales como: políticas, límites, procedimientos, metodologías para la medición del riesgos como son: el modelo del VaR y modelo de asignación de cupos de emisor y contraparte , y controles para el seguimiento de las operaciones, adicionalmente la fiduciaria cuenta con el comité de riesgo de mercado y un, comité de inversiones que realizan seguimiento al cumplimiento de las políticas y los límites.

Con relación al **RIESGO DE LIQUIDEZ**: LA FIDUCIARIA cuenta con herramientas para la medición conforme a la metodología aceptada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Con relación al **RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO**: LA FIDUCIARIA cuenta con procesos de vinculación, conocimiento y estudio de sus clientes, al igual que con un monitoreo de las operaciones realizadas dentro de la vigencia del contrato. La Fiduciaria cuenta con los mecanismos de control necesarios que permiten detectar operaciones sospechosas e inusuales y proceder a tomar las decisiones pertinentes, de conformidad con el Manual implementado al interior de la misma, sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT-.

Con relación al **RIESGO REPUTACIONAL**: Este riesgo se genera en la mayoría de los casos como consecuencia de las situaciones de riesgo antes citadas, y por ende las herramientas y mecanismos para su mitigación se encuentran descritos en los ítems anteriores.

Las partes con la suscripción del presente contrato se obligan a acatar los mecanismos establecidos para el cumplimiento de los estándares indicados para la gestión de los riesgos asociados al presente contrato, durante cualquier etapa de mismo (pre-contratual, durante la ejecución del negocio e incluso hasta su liquidación) y de igual forma se obligan a dar a conocer tales mecanismos a los terceros interesados en vincularse al negocio.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- SISTEMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO: En aras de consolidar los esquemas de protección al consumidor financiero y fortalecer la normatividad existente sobre la materia, el Gobierno Nacional expidió la ley 1328 de 2009, mediante la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. En desarrollo de esta normativa, la Fiduciaria Popular consciente de la necesidad de adoptar una cultura de servicio, fortalecer las relaciones, obligaciones y deberes con nuestros Consumidores Financieros, implementó su Sistema de Atención al Consumidor Financiero, dentro del cual se han creado canales idóneos de comunicación para brindarles una adecuada información de nuestros servicios y promover el desarrollo de una Educación Financiera para nuestro público de interés que les permitirá tomar las mejores decisiones financieras y alcanzar sus metas y objetivos.

Canales para la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos: Con el fin de brindar una experiencia positiva a nuestros clientes, a través de las diferentes interacciones que tienen con Fiduciaria Popular, disponemos de distintos canales de atención para la recepción y gestión de las peticiones, quejas, reclamos, consultas, felicitaciones y demás solicitudes que requieran interponer, los cuales pueden conocer ingresando al siguiente link:

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - DURACIÓN: El presente contrato de fiducia tendrá la duración necesaria para cumplir con la finalidad, o hasta que se presenten alguna de las causales de terminación del mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso la duración del presente contrato estará supeditado a la duración del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO**, y a las terminaciones que eventualmente se puedan generar sobre el mismo, a notificaciones de caducidades o notificaciones de la terminación del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO.**

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el término de duración del presente contrato alguna de las causales de terminación del mismo, se prorrogará el término necesario para la liquidación efectiva del mismo.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - CESIÓN: EL FIDEICOMITENTE no podrá ceder el presente contrato de fiducia, sin previa autorización expresa y por escrito de **LA FIDUCIARIA** y de la **ENTIDAD CONTRATANTE**. Para efectos de la cesión de la posición contractual de **FIDEICOMITENTE** o de derechos fiduciarios o de beneficio, **LA FIDUCIARIA** realizará el proceso de vinculación de clientes, en cumplimiento al Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, reservándose el derecho de no aceptar al cesionario. Una vez impartida la aprobación por parte de **LA FIDUCIARIA y la ENTIDAD COTRATANTE**, podrá la formalizarse el documento de cesión, copia del cual deberá remitirse a **LA FIDUCIARIA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- ADICIÓN Y MODIFICACIÓN: El presente contrato de fiducia solo podrá ser adicionado o modificado previa autorización de la **ENTIDAD CONTRATANTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- TERMINACIÓN: El presente contrato de fiducia se podrá dar por terminado por las siguientes causales:

1. Por haberse ejecutado completamente su objeto.

2. Cuando transcurridos seis (6) meses desde la constitución del contrato de fiducia, no se hayan desembolsado los recursos correspondientes al anticipo del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO,** la **FIDUCIARIA** podrá terminar unilateralmente el contrato fiduciario.

3. Cuando sea imposible el cumplimiento del objeto del contrato de fiducia por causas que no sean imputables a la **FIDUCIARIA**.

4. Por el vencimiento del término de duración del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO.**

5. Por suspensión temporal o terminación definitiva del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** celebrado entre **EL FIDEICOMITENTE** con la **ENTIDAD CONTRATANTE**, **LA FIDUCIARIA** podrá realizar el cobro de la comisión Fiduciaria hasta el día hábil siguiente en que **LA FIDUCIARIA** haya sido debidamente notificada por cualquier medio idóneo, sobre de la suspensión temporal y/o terminación definitiva del **CONTRATO** y en todo caso medie solicitud expresa por parte del **FIDEICOMITENT**E y previo estudio de la situación particular del negocio. De darse el supuesto anterior y siempre que se trate de suspensión temporal del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** el cobro de la comisión fiduciaria se reactivará tan pronto cese dicha suspensión y la misma se notifique de igual forma a **LA FIDUCIARIA**. Hasta tanto dicha notificación no se surta, se entenderá que el **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** señalado se encuentra suspendido en su ejecución y por consiguiente las obligaciones derivadas del mismo. Si se llegare a constatar que la reanudación del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** celebrado entre **EL FIDEICOMITENTE** con la **ENTIDAD CONTRATANTE** tuvo lugar con anterioridad a la notificación aquí indicada, **LA FIDUCIARIA** podrá cobrar las comisiones fiduciarias de forma retroactiva a partir de la fecha en que haya tenido lugar el objeto señalado.

6. Por declaratoria de caducidad del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** por parte de la **ENTIDAD CONTRATANTE**.

7. Por la simple notificación de la **ENTIDAD CONTRATANTE,** en la que notifique expresamente y por escrito a la **FIDUCIARIA,** la terminación del presente del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** por cualquier causa.

8. Por el incumplimiento de las obligaciones del **FIDEICOMITENTE**, y especialmente las relacionadas con el pago de la comisión fiduciaria y de los demás costos y gastos del negocio fiduciario, cuando quiera que **EL FIDEICOMITENTE** incurra en mora igual o superior a treinta (30) días para el pago de estos conceptos.

9. Por la no actualización de la información que requiera la **FIDUCIARIA** por parte del **FIDEICOMITENTE** o de eventuales cesionarios de derechos.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

10. Unilateralmente por **LA FIDUCIARIA** cuando **EL FIDEICOMITENTE**, cualquier tercero que tenga relación con el presente contrato de fiducia, el **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** se encuentren reportados en alguna de las listas de cautela por actividades relacionadas con lavado de activos o financiación del terrorismo, o represente riesgo reputacional para **LA FIDUCIARIA**. Claramente evidenciada esta situación, se entenderán que existen suficientes razones objetivas para dar por terminado el presente contrato de fiducia.

11. Por decisión judicial debidamente ejecutoriada.

12. Por mutuo acuerdo de las partes, previa aprobación de la **ENTIDAD CONTRATANTE.**

13. Por las demás causales previstas en la ley y en este contrato de fiducia.

PARÁGRAFO PRIMERO.-TRÁMITES CONCURSALES: En los eventos de promoción o aceptación del **FIDEICOMITENTE** a trámites concursales, **LA FIDUCIARIA** deberá acogerse a lo ordenado por la Superintendencia de Sociedades o la autoridad competente, sin que por este hecho pueda predicarse responsabilidad alguna de su parte, toda vez que el presente contrato de fiducia se realiza bajo presupuestos de buena fe precontractual y en beneficio de todas las partes que en el intervienen.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- En cualquiera de los eventos en los cuales se dé por terminado el presente contrato de fiducia, los bienes que forman parte del mismo y que correspondan al **ANTICIPO** del **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO** serán restituidos a favor de la **ENTIDAD CONTRATANTE** o a quien esta indique. Los recursos que correspondan al **APORTE INICIAL** serán restituidos al **FIDEICOMITENTE**. Para el efecto, las partes acuerdan que los bienes se trasladarán acorde con las formalidades especiales de transferencia establecidas para el tipo de recursos administrados, estando a cargo del **FIDEICOMITENTE** todos los gastos en que se incurra para la transferencia efectiva de los recursos fideicomitidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: : Se entiende que la etapa de liquidación inicia una vez se haya girado la totalidad de los recursos del **ANTICIPO,** y se encuentre pendiente el giro de los excedentes y/o rendimientos del **FIDEICOMISO**. Lo anterior salvo que se presente una causal distinta de terminación a la mencionada en el presente numeral, consagradas como tal en el presente contrato de fiducia.

Acaecida la terminación del presente contrato por cualquier circunstancia, perderán vigencia el objeto y las instrucciones del mismo y la gestión de **LA FIDUCIARIA** deberá dirigirse exclusivamente a realizar aquellos actos directa o indirectamente relacionados con la liquidación del mismo. Para ese efecto **LA FIDUCIARIA** procederá a:

1. El cobro de las sumas que se le deban por concepto de comisiones fiduciarias o costos y gastos del fideicomiso, con cargo a los recursos existentes en el **APORTE INICIAL**. En el evento en que estos sean insuficientes, el cobro se realizará directamente al **FIDEICOMITENTE**.

2. Se efectuará a favor de la **ENTIDAD CONTRATANTE** o a quien está indique la restitución de los recursos existentes en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, que correspondan al **ANTICIPO** y sus rendimientos conforme a lo establecido en este contrato.

3. **LA FIDUCIARIA** remitirá un comunicado al **FIDEICOMITENTE** y a la **ENTIDAD CONTRATANTE** a las direcciones de correo electrónico registradas en la Fiduciaria o en su defecto de manera física a la dirección de domicilio, en dicha comunicación: i. Informará la situación del negocio fiduciario y el acaecimiento de la causal de terminación del contrato, ii. Remitirá la rendición final de cuentas e iii. Indicará que contará con un término de quince (15) días hábiles para presentar observaciones o manifestar sus inconformidades frente a la documentación remitida, so pena que de no obtenerse pronunciamiento por parte del **FIDEICOMITENTE Y/O LA ENTIDAD CONTRATANTE**, el contrato se entenderá terminado y liquidado, esto sin perjuicio del derecho que le asiste a al **FIDEICOMITENTE** y a la **ENTIDAD CONTRATANTE** de solicitar en cualquier tiempo aclaraciones o información adicional respecto de la información que le fue presentada. De presentarse observaciones e inconformidades, la Fiduciaria contará con un término máximo de quince (15) días hábiles para proporcionar respuesta.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

4. Se efectuará a favor del **FIDEICOMITENTE**, la restitución de los recursos que le correspondan según lo dispuesto en el presente contrato.

5. En caso de no ser posible la localización del **FIDEICOMITENTE** se entenderá recibida la rendición de cuentas una vez la misma haya sido remitida vía correo electrónico o correo certificado a las direcciones físicas o virtuales indicadas en la Carátula o a las ultimas registradas por **EL FIDEICOMITENTE,** y **LA FIDUCIARIA** transferirá los recursos que a éste corresponden en la cuenta de la que registró en **LA FIDUCIARIA**.

6. En caso de que una vez liquidado el presente contrato de fiducia, **LA FIDUCIARIA** reciba requerimientos por parte de la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN**, **LA FIDUCIARIA** requerirá formalmente a **EL FIDEICOMITENTE**, quienes dispondrán lo pertinente para resolver dicho requerimiento y asumir dicha obligación, so pena de repetir contra él judicialmente.

7. En caso de que **LA FIDUCIARIA**, dentro de su régimen de responsabilidad, no logre localizar a **EL FIDEICOMITENTE** pondrá en la cuenta bancaria que para tal efecto indique por escrito **EL FIDEICOMITENTE**, las sumas que se liquiden a su favor en caso de que las hubiere.

8. En aquellos casos en que **EL FIDEICOMITENTE** no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga **LA FIDUCIARIA**, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido, **LA FIDUCIARIA** tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el mismo dentro del mes siguiente a la finalización de término mencionado en el numeral anterior.

PARÁGRAFO SEGUNDO: **EL FIDEICOMITENTE** acepta incondicionalmente los plazos fijados para la liquidación y terminación del presente contrato de fiducia señalados en el parágrafo anterior.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes se obligan a utilizar mecanismos de arreglo directo para el caso de surgir entre ellas cualquier controversia sobre el presente contrato de fiducia o sobre su ejecución. Podrá utilizarse cualquier mecanismo de arreglo directo entre las partes, tales como la transacción, la conciliación o la negociación directa.

En consecuencia, cualquiera de las partes podrá por escrito plantear a la otra la controversia contractual de la que se trate y un proyecto de solución. A partir de la fecha y hora de la recepción de esta solicitud por la parte destinataria, se contará un término de treinta (30) días comunes prorrogables como se indica a continuación. Durante este período ninguna de las partes podrá hacer uso de otro mecanismo de solución de conflictos, y ambas se comprometen a desarrollar su mejor esfuerzo para la consecución de una salida directa al conflicto que pudiere existir. El término anteriormente señalado podrá ser prorrogado de común acuerdo por las partes y salvo que se manifieste lo contrario, se entenderá prorrogado en un número de treinta (30) días comunes contados desde el momento de expiración del plazo inicialmente previsto.

Si la controversia no pudiere ser solucionada por la vía anteriormente descrita, se someterá a la decisión de un Amigable Componedor que será elegido por las partes, en los términos del artículo 59 y siguientes de la Ley 1563 de 2012. El Amigable Componedor fallará en derecho y sesionará en la ciudad de Bogotá, D.C. La decisión del amigable componedor producirá los efectos legales relativos a la transacción.

Una vez agotada esta vía, las partes quedarán en plena libertad de acudir ante la jurisdicción ordinaria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato de fiducia se rige por las leyes mercantiles de la República de Colombia y por las normas especiales que gobiernan las sociedades fiduciarias y las actividades que éstas pueden desarrollar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales el presente contrato de fiducia es de cuantía indeterminada, pero determinable, toda vez que corresponde a la sumatoria de las comisiones que percibirá **LA FIDUCIARIA** en los términos del presente contrato de fiducia. Las comisiones fiduciarias pactadas razonablemente no superarán la suma del mínimo legal establecido en el artículo 519 del Estatuto Tributario, por lo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

que el contrato fiduciario no estará gravado con el impuesto de timbre. En caso de causarse dicho impuesto, el mismo será asumido por **EL FIDEICOMITENTE.**

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio para efectos contractuales será la ciudad de Bogotá D.C. Las partes contratantes declaran que, para efectos de cualquier comunicación y notificación, éstas deberán realizarse a las direcciones y demás datos de contacto descritos en la Carátula de este contrato:

PARÁGRAFO PRIMERO.- Las comunicaciones que se envíen por correo electrónico se considerarán recibidas en el momento de su despacho; las que se envíen por correo certificado se entenderán recibidas tres (3) días hábiles después de haber sido puestas en el correo; y las que se envíen por correo ordinario, se entenderán recibidas cinco (5) días hábiles después de su despacho. Tratándose de correos electrónicos se atenderá lo dispuesto por la Ley de Comercio Electrónico (Ley 527 de 1999). Las notificaciones referentes al cambio de dirección de domicilio tendrán el mismo tratamiento señalado en precedencia.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Si durante el periodo de ejecución del presente contrato de fiducia, cualquiera de los intervinientes requiere notificar cualquier clase de situación a uno o a la totalidad de aquellos y no resulta dable su ubicación en las direcciones antes señaladas, la notificación correspondiente se entenderá satisfecha a través de la publicación de la situación antedicha en la página WEB de la **FIDUCIARIA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS: LAS PARTES se encargarán de mantenerse actualizados y cumplir la legislación Colombiana de protección de datos, reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

Así mismo, con la suscripción del presente escrito se comprometen a cumplir las políticas de tratamiento de datos que cada uno tiene.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA . - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato de fiducia se perfecciona con:

1. La firma de las partes.

2. La suscripción por parte del **FIDEICOMITENTE** del pagaré de que trata el presente contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- LEGALIZACIÓN: El presente contrato de fiducia una vez perfeccionado se legalizará con:

1. La entrega a **LA FIDUCIARIA** copia del documento por el cual se designa al **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR**, si al momento de la legalización del presente contrato de fiducia se ha designado el mismo. En caso contrario lo deberá remitir dentro de los dos (2) días siguientes a aquel en el que se designó al **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR**.

2. La entrega a **LA FIDUCIARIA** de la copia de la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo debidamente aprobada por **LA ENTIDAD CONTRATANTE**, para el efecto se deberá adjuntar igualmente el documento por el cual consta dicha aprobación.

3. La entrega a **LA FIDUCIARIA** del **PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**, debidamente aprobado por la **ENTIDAD CONTRATANTE** y por el **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR**, si al momento de la legalización del presente contrato de fiducia se cuenta con el mismo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRÓNICA: Las Partes reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son) confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relación con el contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

Por parte de la Fiduciaria

1. Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al firmante, quien actúa única y exclusivamente en nombre y representación legal de Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad jurídica para comprometer a Fiduciaria Popular S.A.

2. Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la Fiduciaria mediante firma electrónica y no requieren de autorización adicional para ello.

3. Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación de la firma.


Por parte del Fideicomitente:

1. Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente al firmante quien tiene la capacidad jurídica para comprometer a la sociedad que representa (cuando la partes fideicomitente sea una persona jurídica); o comprometerse en nombre propio (cuando la parte fideicomitente sea una persona natural)

2. Que los firmantes actuando en representación de cada una de las Partes (cuando la partes fideicomitente sea una persona jurídica) o en nombre propio (cuando la parte fideicomitente sea una persona natural); tienen plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrónica y no requieren de autorización adicional para ello. El texto en rojo redactar según corresponda.
3. Que el firmante registrado es quien tiene y tendrá acceso a los datos de creación de la firma

Para constancia de lo anterior, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor legal, con destino a cada una de las partes, en Bogotá D.C., a los 12-Dec-2023.

LOS FIDEICOMITENTES




RAFAEL PABON LOPEZ
C.C. 88.269.550 expedida en Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO SIES 2023
Representante Legal
NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.
NIT 900.808.866-5
Quien conforma CONSORCIO SIES 2023



ANYELA MARIA PIEDRAHITA VALENCIA
C.C. 42.142767 expedida en Pereira.
Representante Legal
SMARTY COLOMBIA S.A.S. BIC.
NIT 900.249.549-6
Quien conforma el CONSORCIO SIES 2023

LA FIDUCIARIA



EVELYN CARRASQUILLA MARIN
C.C 43.877.326 expedida en Envigado
Vicepresidente Comercial
FIDUCIARIA POPULAR S.A.
NIT 800.141.235-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A N° 29 - 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX 607 99 77 / 596 15 06
● servicioalcliente@fidupopular.com.co ● www.fidupopular.com.co
● Línea Nacional gratuita 018000-513962

CONTRATO DE ANTICIPOS CONSORCIOS SIES 2023

Final Audit Report 2023-12-12

Created:	2023-12-12
By:	Mauricio Alexander Fuentes Rodriguez (mauricio.fuentes@fidupopular.com.co)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAABfBFbOhNC-Z344xXzSAXr7b0bT_xI9xR

"CONTRATO DE ANTICIPOS CONSORCIOS SIES 2023" History

Document created by Mauricio Alexander Fuentes Rodriguez (mauricio.fuentes@fidupopular.com.co)
2023-12-12 - 8:25:51 PM GMT- IP address: 190.144.253.210

Document emailed to proyectos@netkoln.com for signature
2023-12-12 - 8:28:58 PM GMT

Email viewed by proyectos@netkoln.com
2023-12-12 - 8:34:24 PM GMT- IP address: 66.102.8.196

Signer proyectos@netkoln.com entered name at signing as Rafael Pabon Lopez
2023-12-12 - 8:40:05 PM GMT- IP address: 179.13.211.235

Document e-signed by Rafael Pabon Lopez (proyectos@netkoln.com)
Signature Date: 2023-12-12 - 8:40:07 PM GMT - Time Source: server- IP address: 179.13.211.235

Document emailed to administrativobogota@smartycolombia.com for signature
2023-12-12 - 8:40:09 PM GMT

Email viewed by administrativobogota@smartycolombia.com
2023-12-12 - 9:35:07 PM GMT- IP address: 66.102.8.198

Signer administrativobogota@smartycolombia.com entered name at signing as Anyela Maria Piedrahita Valencia
2023-12-12 - 9:36:45 PM GMT- IP address: 186.146.100.222

Document e-signed by Anyela Maria Piedrahita Valencia (administrativobogota@smartycolombia.com)
Signature Date: 2023-12-12 - 9:36:47 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.146.100.222

fiduciaria popular | Powered by Adobe Acrobat Sign

Document emailed to Evelyn Carrasquilla Marin (evelyn.carrasquilla@fidupopular.com.co) for signature
2023-12-12 - 9:36:48 PM GMT

Email viewed by Evelyn Carrasquilla Marin (evelyn.carrasquilla@fidupopular.com.co)
2023-12-12 - 10:07:00 PM GMT- IP address: 104.47.51.126

Document e-signed by Evelyn Carrasquilla Marin (evelyn.carrasquilla@fidupopular.com.co)
Signature Date: 2023-12-12 - 10:08:16 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.144.253.210

Agreement completed.
2023-12-12 - 10:08:16 PM GMT

fiduciaria popular | Powered by Adobe Acrobat Sign

Fideico - Sistema de Fideicomiso

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-03-2024 hasta 31-03-2024

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 31910 P.A. ANT. CONS. SIES 2023

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta		Beneficiario	Banco Destino Banc	Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
12/03/2024	EF	2	500805294869	900183676	LMC TECNOLOGIA S.A.S.	7	14129647637	2,924,150.00	0.00	2,924,150.00	PAGADA	002-Monitor Operador Cctv, Brazo Escualizable Para Doble Monitor. F160. (Importado)	**OTROS CONCEPTOS**	12/03/2024	11
12/03/2024	EF	2	500805294869	901031933	COMCAST TECHNOLOGY S.A.S	7	83469183567	6,171,600.61	0.00	6,171,600.61	PAGADA	002-Materiales y herramientas	**OTROS CONCEPTOS**	12/03/2024	12
12/03/2024	EF	2	500805294869	900988445	COPCO INGENIERIA - COMPAÑIA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA EN MANTENI	7	02062956561	3,574,557.85	0.00	3,574,557.85	PAGADA	002-Mini¿Split, Capacidad 24.000 Btu, Modelo Vs242C7, Marca Lg, Dual Cool Inverter Sin Wifi, A 220V, Con 3 Metros Tubería De Cobre	**OTROS CONCEPTOS**	12/03/2024	13
12/03/2024	EF	2	500805294869	860030723	MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS LTDA	1	036147296	5,749,784.88	0.00	5,749,784.88	PAGADA	002-Materiales y herramientas	**OTROS CONCEPTOS**	12/03/2024	14
12/03/2024	EF	2	500805294869	900808866	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	1	614289288	149,344,812.32	0.00	149,344,812.32	PAGADA	003-Contrato de mano de obra Eléctrica, centro de control y monitoreo, fase 1, fase 2 y punto de visualización	**OTROS CONCEPTOS**	12/03/2024	15
12/03/2024	EF	2	500805294869	830018214	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.	1	045046000	33,855,730.48	0.00	33,855,730.48	PAGADA	001-Ups 2Kva Monofasica On Line Tipotorre, Snmptxwebpro Snmp Web Prointernal Slot Mounted V Protocol	**OTROS CONCEPTOS**	13/03/2024	16
12/03/2024	EF	2	500805294869	830018214	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.	1	045046000	11,334,669.26	0.00	11,334,669.26	PAGADA	001-Ups 2Kva Monofasica On Line Tipotorre, Snmptxwebpro Snmp Web Prointernal Slot Mounted V Protocol	**OTROS CONCEPTOS**	13/03/2024	17
12/03/2024	EF	2	500805294869	900979802	HIKVISION COLOMBIA S A S	7	63900003281	88,109,244.68	0.00	88,109,244.68	PAGADA	001-Cámaras Domo, Cámaras Fijas, Monitor De Visualización, Sistema De Visualización, Joystick	**OTROS CONCEPTOS**	13/03/2024	18
12/03/2024	EF	2	500805294869	901192317	SYSCOM COLOMBIA SAS	23	231839408	18,851,016.51	0.00	18,851,016.51	PAGADA	001-Fibra Óptica	**OTROS CONCEPTOS**	13/03/2024	19
12/03/2024	EF	2	500805294869	901218332	ITC PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	7	82000005075	6,920,400.00	0.00	6,920,400.00	PAGADA	001-Postes Tipo 1, Tapas Y Marcos E Instalación	**OTROS CONCEPTOS**	13/03/2024	20
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539	CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	19,795,918.11	0.00	19,795,918.11	PAGADA	004-Mano De Obra Calle	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	21
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539	CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	3,049,159.70	0.00	3,049,159.70	PAGADA	004-Materiales y herramientas	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	22
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539	CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	57,312,012.00	0.00	57,312,012.00	PAGADA	004-Postes Tipo 1, Tapas Y Marcos E Instalación	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	23
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539	CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	179,153.31	0.00	179,153.31	PAGADA	004-Otros gastos generados en la ejecución del contrato	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	24
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539	CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	537,688.41	0.00	537,688.41	PAGADA	004-Otros gastos generados en la ejecución del contrato	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	25
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539	CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	1,114,000.00	0.00	1,114,000.00	PAGADA	004-Impuestos proveedores nacionales y distritales	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	26
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539	CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	48,817,461.00	0.00	48,817,461.00	PAGADA	004-Gabinetes De Poste/Fachada, Coronas Anti Escalatorias, Brazos De Soporte Para Cámaras, Gabinete Para Cuarto De Equipos, Transformadores De Gabinetes	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	27
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539	CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	1,766,140.00	0.00	1,766,140.00	PAGADA	004-Gabinetes De Poste/Fachada, Coronas Anti Escalatorias, Brazos De Soporte Para Cámaras, Gabinete Para Cuarto De Equipos, Transformadores De Gabinetes	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	28
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539	CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	PAGADA	004-Gabinetes De Poste/Fachada, Coronas Anti Escalatorias, Brazos De Soporte Para Cámaras, Gabinete Para Cuarto De Equipos, Transformadores De Gabinetes	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	29
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539	CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	39,934,810.16	0.00	39,934,810.16	PAGADA	004-Switch Tipo 6, Switch Tipo 1, Sfp Receptor, Sfp Transmisor	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	30
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539	CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	2,305,329.42	0.00	2,305,329.42	PAGADA	004-Materiales y herramientas	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	31

INFORMACION RESTRINGIDA

Fideico - Sistema de Fideicomiso

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-03-2024 hasta 31-03-2024

EMPRESA 31910 P.A. ANT. CONS. SIES 2023

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario	Banco Destino Banc	Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539 CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	17,849,019.83	0.00	17,849,019.83	PAGADA	004-Materiales y herramientas	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	32
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539 CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	1,843,588.03	0.00	1,843,588.03	PAGADA	004-Materiales y herramientas	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	33
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539 CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	4,034,900.01	0.00	4,034,900.01	PAGADA	004-Materiales y herramientas	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	34
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539 CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	3,292,517.60	0.00	3,292,517.60	PAGADA	004-Materiales y herramientas	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	35
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539 CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	4,983,800.01	0.00	4,983,800.01	PAGADA	004-Materiales y herramientas	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	36
21/03/2024	EF	2	500805294869	901770539 CONSORCIO SIES 2023	7	07300007540	5,722,082.52	0.00	5,722,082.52	PAGADA	004-Materiales y herramientas	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	37
21/03/2024	EF	2	500805294869	5476433 PABON SUAREZ RAFAEL	51	06687008297	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	PAGADA	FEV-1-Apoyo administrativo y log?stica	**OTROS CONCEPTOS**	21/03/2024	38
21/03/2024	EF	2	500805294869	4574215 VALENCIA LOPEZ ENRIQUE	19	702170192	56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	PAGADA	EV-3-Tendido De Fibra ?ptica	**OTROS CONCEPTOS**	26/03/2024	39

Nro. de Operaciones: 29

TOTAL 678,343,546.70 0.00 678,343,546.70

Formas de Pago

EF	PAGO ELECTRONICO ACH
CT	TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA
PT	PAGO TERCEROS POR CARTA
AC	CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS BANCO POPULAR
CF	CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR
CH	CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR
TW	TRANSFERENCIA WEB -BANCOS

Bancos

67	MIBANCO S.A.	**0**	BANCO DE LA REPUBLICA
1	BANCO DE BOGOTA	**2**	BANCO POPULAR S.A.
6	BANCO CORPBANCA-ITAU	**7**	BANCOLOMBIA
9	CITIBANK	**10**	HSBC COLOMBIA
12	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA	**13**	BBVA COLOMBIA
14	HELM BANK-ITAU	**19**	BANCO COLPATRIA
23	BANCO DE OCCIDENTE	**32**	BANCO CAJA SOCIAL
37	ADMINISTRADORA COUNTRY	**40**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
51	BANCO DAVIVIENDA	**52**	BANCO AV VILLAS
60	BANCO PICHINCHA	**147**	BANCO ALIADAS
531	FIDUCOLOMBIA	**8**	SCOTIABANK COLOMBIA S.A COLPAT
58	BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	**61**	BANCO COOMEVA S.A.
63	BANCO FINANDINA S.A.	**62**	BANCO FALABELLA S.A.
59	BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN	**53**	BANCO WWB S.A..
64	BANCO MULTIBANK S.A	**66**	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO	**121**	FINANCIERA JURISCOOP S.A.
292	CONFIAR COOPERATIVA FNANCIERA	**108**	IRIS CF-COMPAÑIA DE FINANCI
68	BANCO MUNDO MUJER S.A.	**46**	COLTEFINANCIERA S.A.
70	LULO BANK S.A.	**286**	JKF COOPERATIVA FINANCIERA
289	COTRAFA FINANCIERA	**25**	OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD
130	BANCO UNION S.A.		

INFORMACION RESTRINGIDA

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-29486-9	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CR 13 A NO 29 24 PI 20 21 24	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/03/01 Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	1715	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1N20000074	0 00	694911712 40	694911712 40
03 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23650 63	694935363 03
03 01	2138	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	150P541COP 00003	1655 54	0 00	694933707 49
03 01	2138	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150P541COP 00002	6 62	0 00	694933700 87
03 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23651 37	694957352 24
03 02	2139	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	150P541COP 00003	1655 60	0 00	694955696 64
03 02	2139	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150P541COP 00002	6 62	0 00	694955690 02
03 03	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23652 12	694979342 14
03 03	2141	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	150P541COP 00003	1655 65	0 00	694977686 49
03 03	2141	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150P541COP 00002	6 62	0 00	694977679 87
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23652 87	695001332 74
03 04	2203	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	150P541COP 00003	1655 70	0 00	694999677 04
03 04	2203	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150P541COP 00002	6 62	0 00	694999670 42
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23653 62	695023324 04
03 05	2135	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	150P541COP 00003	1655 75	0 00	695021668 29
03 05	2135	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150P541COP 00002	6 62	0 00	695021661 67
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23654 37	695045316 04
03 06	2137	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	150P541COP 00003	1655 81	0 00	695043660 23
03 06	2137	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150P541COP 00002	6 62	0 00	695043653 61
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23655 12	695067308 73
03 07	2135	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	150P541COP 00003	1655 86	0 00	695065652 87
03 07	2135	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150P541COP 00002	6 62	0 00	695065646 25
03 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23655 86	695089302 11
03 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23656 67	695112958 78
03 10	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23657 47	695136616 25
03 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23658 28	695160274 53
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23659 08	695183933 61
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23659 89	695207593 50
03 14	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000136	149344812 32	0 00	545862781 18
03 14	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000136	597379 25	0 00	545265401 93
03 14	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000142	159071060 93	0 00	386194341 00
03 14	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000142	636284 24	0 00	385558056 76
03 14	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000180	18420093 34	0 00	367137963 42
03 14	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000180	73680 37	0 00	367064283 05
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	10006 54	367074289 59
03 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	10006 81	367084296 40
03 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	10007 09	367094303 49
03 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	10007 36	367104310 85
03 18	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	10007 63	367114318 48
03 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	10007 90	367124326 38
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	10008 18	367134334 56
03 21	0006	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	962 56	367135297 12
03 21	1439	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2K000166	133519648 58	0 00	233615648 54
03 21	1439	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2K000166	534078 59	0 00	233081569 95
03 21	1439	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2K000167	81987931 53	0 00	151093638 42
03 21	1439	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2K000167	327951 73	0 00	150765686 69
03 21	1439	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2K000168	80000000 00	0 00	70765686 69

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

www.bancopopular.com.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-29486-9 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
03 21	1439	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2K000168	320000	00	0	00	70445686	69
03 22	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	962	57	70446649	26
03 23	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	962	58	70447611	84
03 24	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	962	60	70448574	44
03 25	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	962	61	70449537	05
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	962	62	70450499	67
03 27	0526	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2Q000147	56000000	00	0	00	14450499	67
03 27	0526	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2Q000147	224000	00	0	00	14226499	67
03 27	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	39	14226694	06
03 28	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	39	14226888	45
03 29	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	40	14227082	85
03 30	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	40	14227277	25
03 31	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	40	14227471	65

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
0 00	681068557 13	695296028 78	378095932 94	0 00	14227471 65

Fogafín Productos protegidos por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

NIT. 800141235

P.A. ANT. CONS. SIES 2023
P.A. ANT. CONS. SIES 2023 - RESERVAS
CL 3 11 E 38 BRR QUINTA ORIENTAL
CUCUTA / NORTE DE SANTADER

Número de Identificación. 31910

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Marzo 2024 **al** 31 Marzo 2024 **Número de Encargo:** XXXXXXX4878-5

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Marzo 2024		$ 0.00
Aportes	$ 3,000,000.00	
Retiros	$ 0.00	
Gravamen a los movimientos financieros	$ 0.00	
Rendimientos	$ 16,928.48	
Retención en la fuente	$ 0.00	
Saldo Final a 31 Marzo 2024		$ 3,016,928.48

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/03/2024 al 31/03/2024	F ANTICIPOS	12,369.411694	0.000000	12,481.557109	241.710906	3,016,928.48

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/03/2024	SALDO ANTERIOR		0.00		0.000000	0.00
12/03/2024	APORTES	241.493432	3,000,000.00	12,422.698107	241.493432	3,000,000.00

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F ANTICIPOS	2.00%	$856,135,938,962.85

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
DIREC ESPECIAL	12.647	14.012	11.872	13.065	12.359	8.856	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
F ANTICIPOS	11.212	12.560	10.447	11.624	10.928	7.468	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
F INV DIREC	11.980	13.338	11.210	12.396	11.692	8.209	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
F NEG FIDU	11.212	12.560	10.447	11.624	10.928	7.468	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP04 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

P.A. ANT. CONS. SIES 2023
P.A. ANT. CONS. SIES 2023 - RESERVAS
CL 3 11 E 38 BRR QUINTA ORIENTAL
CUCUTA / NORTE DE SANTADER

Número de Identificación. 31910

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Marzo 2024 **al** 31 Marzo 2024 **Número de Encargo:** XXXXXXX4878-5

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP11 INMOB	11.212	12.560	10.447	11.624	10.928	7.468	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
OFICIAL ESPECIAL	12.536	13.899	11.761	12.953	11.322	7.434	0.217	0.629	0.275	0.583	0.566	0.532

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico marisolrincon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A. ANT. CONS. SIES 2023 - 31910
DETALLE DE COMISIONES
mar-24

FECHA	NIT	CONCEPTO	FACTURA	CAUSADO	PAGADO	SALDO
31-mar-24	901.770.539	FACTURA COMISION MARZO	129743	2,214,121.62		2,214,121.62
TOTAL COMISION				**2,214,121.62**	**-**	**2,214,121.62**

fiduciaria popular



CODIGO NEGOCIO	31910
NOMBRE NEGOCIO	P.A. ANT. CONS. SIES 2023
ENTIDAD	CTA BANCARIA ANTICIPO
TIPO CUENTA	AHORROS
NÚMERO CUENTA	500805294869

FECHA	CONCEPTO BANCARIO (SI APLICA)	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VALOR
INGRESOS			
Aportes			
mar-24	ABONOS	Aporte entidad otorgante	$ 694,911,712.40
Sub Total Aportes			**$ 694,911,712.40**
Ingresos por Traslados			
Sub Total Ingresos por Traslados			**$ -**
Rendimientos			
mar-24	N.C. INTERESES	Rendimientos Generados	$ 384,316.38
Sub Total Rendimientos			**$ 384,316.38**
TOTAL INGRESOS			$ 695,296,028.78

EGRESOS			
Pagos			
mar-24	DEBITOS	Pago a proveedores	$ 678,343,546.70
Sub Total Pagos			**$ 678,343,546.70**
GMF pagos procesados			
mar-24	GMF	GMF pago a proveedores	$ 2,713,374.19
Sub Total pagos rechazados			**$ 2,713,374.19**
Gastos bancarios			
mar-24	DEBITOS	Gastos bancarios	$ 11,636.24
Sub Total gastos bancarios			**$ 11,636.24**
TOTAL EGRESOS			$ 681,068,557.13

SALDO FINAL	$ 14,227,471.65

CODIGO NEGOCIO	31910
NOMBRE NEGOCIO	P.A. ANT. CONS. SIES 2023
ENTIDAD	FONDO RESERVA
TIPO CUENTA	FIDULIQUIDEZ
NÚMERO CUENTA	70083604878

FECHA	CONCEPTO BANCARIO (SI APLICA)	DESCRIPCION	VALOR
INGRESOS			
Aportes			
mar-24	ABONOS	Aporte inicial	$ 3,000,000.00
Sub Total Aportes			**$ 3,000,000.00**
Rendimientos			
mar-24	ABONOS	Rendimientos generados	$ 16,928.48
Sub Total rendimientos			**$ 16,928.48**
TOTAL EGRESOS			$ -

SALDO FINAL	$ 3,016,928.48

31910-P.A. ANT. CONS. SIES 2023

PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO CUENTA BANCARIA 500-80529486-9 POPULAR

ITEM	PLAN DE INVERSION	VALOR ANTICIPO POR RUBRO	11/03/2024 ORDEN No. 01	11/03/2024 ORDEN No. 02	11/03/2024 ORDEN No. 03	20/03/2024 ORDEN No. 04	20/03/2024 ORDEN No. 05	20/03/2024 ORDEN No. 06	22/03/2024 ORDEN No. 07	ORDEN No. 08	SALDO ANTICIPO POR RUBRO
1	Gabinetes De Poste/Fachada, Coronas Anti Escalatorias, Brazos De Soporte Para Cámaras, Gabinete Para Cuarto De Equipos, Transformadores De Gabinetes	$ 53,553,681				$ 53,553,601.00					$ 80.00
2	Mini-Split, Capacidad 24.000 Btu, Modelo Vs242C7, Marca Lg, Dual Cool Inverter Sin Wifi, A 220V, Con 3 Metros Tubería De Cobre	$ 3,574,558		$ 3,574,557.85							$ 0.15
3	Fibra Óptica	$ 18,851,017	$ 18,851,016.51								$ 0.49
4	Postes Tipo 1, Tapas Y Marcos E Instalación	$ 64,232,500	$ 6,920,400.00					$ 57,312,012.00			$ 88.00
5	Ups 2Kva Monofasica On Line Tipotorre, Snmptxwebpro Snmp Web Prointernal Slot Mounted V Protocol	$ 45,190,400	$ 45,190,399.74								$ 0.26
6	Cámaras Domo, Cámaras Fijas, Monitor De Visualización, Sistema De Visualización, Joystick De Operación, Sistema De Almacenamiento Por Cámara, Software De Visualización Control Y Administración, Servidor, Control De Acceso Facial, Estación De Trabajo Operador	$ 88,109,245	$ 88,109,244.68								$ 0.32
7	Apoyo administrativo y logística	$ 80,000,000					$ 80,000,000.00				$ -
8	Módulos - Puestos De Trabajo	$ 0									$ -
9	Switch Tipo 6, Switch Tipo 1, Sfp Receptor, Sfp Transmisor	$ 39,934,811				$ 39,934,810.16					$ 0.84
10	Monitor Operador Cctv, Brazo Escualizable Para Doble Monitor. F160. (Importado)	$ 2,986,898		$ 2,924,150.00							$ 62,748.00
11	Mano De Obra Calle	$ 27,147,918						$ 19,795,918.11		$ 6,649,989.00	$ 702,010.89
12	Tendido De Fibra Óptica	$ 56,000,000							$ 56,000,000.00		$ -
13	Contrato de prestación de servicios, centro de control y monitoreo, fase 1, fase 2 y punto de visualización	$ 149,344,813			$ 149,344,812.32						$ 0.68
14	Materiales y herramientas	$ 55,002,000		$ 11,921,385.49		$ 40,031,237.38		$ 3,049,159.70			$ 217.43
15	Impuestos proveedores nacionales y distritales	$ 1,115,000						$ 1,114,000.00			$ 1,000.00
16	Otros gastos	$ 9,868,871						$ 716,841.72		$ 4,559,569.00	$ 4,592,460.28
	TOTAL PLAN DE INVERSION	**$ 694,911,712**	**$ 159,071,061**	**$ 18,420,093**	**$ 149,344,812**	**$ 133,519,649**	**$ 80,000,000**	**$ 81,987,932**	**$ 56,000,000**	**$ 11,209,558**	**$ 5,358,607**
	TOTAL PLAN DE INVERSION /Recursos que ingresaron por concepto de anticipo 20/04/2023										
	TOTAL DEL PLAN DE INVERSION (RECURSOS A ADMON SEGÚN CONTRATO)	**$ 694,911,712.40**									

Descuento de la entidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**.00**	**698,312,957.27**	**681,068,557.14**	**17,244,400.13**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**.00**	**695,296,028.79**	**681,068,557.14**	**14,227,471.65**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**.00**	**695,296,028.79**	**681,068,557.14**	**14,227,471.65**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**695,296,028.79**	**681,068,557.14**	**14,227,471.65**
11150501		**CUENTA AHORROS**	**NAPL**	**.00**	**695,296,028.79**	**681,068,557.14**	**14,227,471.65**
1115050101		BANCO POPULAR- AHORROS	NAPL	.00	695,296,028.79	681,068,557.14	14,227,471.65
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**.00**	**3,016,928.48**	**.00**	**3,016,928.48**
1302		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**.00**	**3,016,928.48**	**.00**	**3,016,928.48**
130205		**EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**3,016,928.48**	**.00**	**3,016,928.48**
13020501		**PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS**	**NAPL**	**.00**	**3,016,928.48**	**.00**	**3,016,928.48**
1302050105		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL	.00	3,016,928.48	.00	3,016,928.48
2		**PASIVO**	**NAPL**	**.00**	**678,343,546.70**	**678,343,546.70**	**.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**678,343,546.70**	**678,343,546.70**	**.00**
2590		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**678,343,546.70**	**678,343,546.70**	**.00**
259095		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**678,343,546.70**	**678,343,546.70**	**.00**
25909501		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**678,343,546.70**	**678,343,546.70**	**.00**
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	.00	678,343,546.70	678,343,546.70	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**.00**	**680,672,714.23**	**697,917,114.36**	**-17,244,400.13**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**.00**	**678,348,948.66**	**697,917,114.36**	**-19,568,165.70**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**697,911,712.40**	**-697,911,712.40**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**697,911,712.40**	**-697,911,712.40**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**697,911,712.40**	**-697,911,712.40**
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	.00	.00	697,911,712.40	-697,911,712.40
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**.00**	**678,348,948.66**	**5,401.96**	**678,343,546.70**
351005		**RESTITUCIONES DE APORTES**	**NAPL**	**.00**	**5,401.96**	**5,401.96**	**.00**
35100501		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**.00**	**5,401.96**	**5,401.96**	**.00**
3510050105		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	5,401.96	5,401.96	.00
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**.00**	**678,343,546.70**	**.00**	**678,343,546.70**
35101000		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**.00**	**678,343,546.70**	**.00**	**678,343,546.70**
3510100095		OTROS	NAPL	.00	678,343,546.70	.00	678,343,546.70
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**2,323,765.57**	**.00**	**2,323,765.57**
3920		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**2,323,765.57**	**.00**	**2,323,765.57**
392001		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**2,323,765.57**	**.00**	**2,323,765.57**
39200101		**PÉRDIDA DEL EJECICIO**	**NAPL**	**.00**	**2,323,765.57**	**.00**	**2,323,765.57**
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	.00	2,323,765.57	.00	2,323,765.57
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**401,244.86**	**-401,244.86**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**401,244.86**	**-401,244.86**
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**384,316.38**	**-384,316.38**
410395		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**384,316.38**	**-384,316.38**
41039501		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**384,316.38**	**-384,316.38**
4103950101		OTROS INTERESES	NAPL	.00	.00	384,316.38	-384,316.38
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**16,928.48**	**-16,928.48**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**16,928.48**	**-16,928.48**
41080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**16,928.48**	**-16,928.48**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
41080501		**(CR)**					
4108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	.00	.00	16,928.48	-16,928.48
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**2,725,010.44**	**2,323,765.58**	**401,244.86**
51		**GASTOS OPERACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**2,725,010.44**	**.01**	**2,725,010.43**
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,725,010.44**	**.01**	**2,725,010.43**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,725,010.44**	**.01**	**2,725,010.43**
51400501		**G.M.F.**	**NAPL**	**.00**	**2,713,420.53**	**.01**	**2,713,420.52**
5140050101		G.M.F. CUENTAS AHORROS	NAPL	.00	2,713,420.53	.01	2,713,420.52
51400503		**SOBRETASAS Y OTROS**	**NAPL**	**.00**	**11,589.91**	**.00**	**11,589.91**
5140050395		OTROS	NAPL	.00	11,589.91	.00	11,589.91
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,323,765.57**	**-2,323,765.57**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,323,765.57**	**-2,323,765.57**
590501		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,323,765.57**	**-2,323,765.57**
59050101		**GANANCIAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,323,765.57**	**-2,323,765.57**
5905010101		GANANCIAS	NAPL	.00	.00	2,323,765.57	-2,323,765.57
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**2,214,121.62**	**2,214,121.62**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,214,121.62**	**-2,214,121.62**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,214,121.62**	**-2,214,121.62**
829501		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,214,121.62**	**-2,214,121.62**
82950101		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,214,121.62**	**-2,214,121.62**
8295010101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	.00	.00	2,214,121.62	-2,214,121.62
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**.00**	**2,214,121.62**	**.00**	**2,214,121.62**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**.00**	**2,214,121.62**	**.00**	**2,214,121.62**
840500		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**.00**	**2,214,121.62**	**.00**	**2,214,121.62**
84050000		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**.00**	**2,214,121.62**	**.00**	**2,214,121.62**
8405000000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	2,214,121.62	.00	2,214,121.62
			Total	.00	2,062,268,350.26	2,062,268,350.26	.00

DIRECTOR CONTABLE . . REPRESENTANTE LEGAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-29486-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CR 13 A NO 29 24 PI 20 21 24	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	40	14227666	05
04 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	41	14227860	46
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	41	14228054	87
04 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	41	14228249	28
04 05	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	41	14228443	69
04 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	42	14228638	11
04 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	42	14228832	53
04 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	42	14229026	95
04 09	0510	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N38000010	11209558	00	0	00	3019468	95
04 09	0510	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N38000010	44838	23	0	00	2974630	72
04 09	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	8	14	2974638	86
04 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	8	14	2974647	00
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	8	14	2974655	14
04 12	0521	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3B002028	384316	38	0	00	2590338	76
04 12	0521	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3B002028	1537	27	0	00	2588801	49
04 12	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588808	58
04 13	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588815	67
04 14	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588822	76
04 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588829	85
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588836	94
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588844	03
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588851	12
04 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588858	21
04 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588865	30
04 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588872	39
04 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588879	48
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588886	57
04 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588893	66
04 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588900	75
04 26	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588907	84
04 27	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588914	93
04 28	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588922	02
04 29	2356	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588929	11
04 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7	09	2588936	20

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
14227471 65	11640249 88	1714 43	6005317 77	0 00	2588936 20

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Fogafín Productos protegidos por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

ANEXO N° 19 ACTA MINISTERIO DEL INTERIOR VISITA 16-17 DE ABRIL 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	1 de 6
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

MUNICIPIO:	BOCHALEMA-NORTE DE SANTANDER	No. CONVENIO:	1612-2023
FECHA DE ACTA INICIO:	07/07/2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO:	30/04/2024
ELABORO:	HAVID NUMA MARCHENA	FECHA DE VISITA:	16 al 17 de abril de 2024
TIPO DE PROYECTO:	CCTV – SIES PARA EL MUNICIPIO DE BOCHALEMA – NORTE DE SANTANDER		

ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1.	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA	SUPERVISOR CONVENIO 1612-2023	MINISTERIO DEL INTERIOR
2.	RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER
3.	JHONATTAN JOSÉ BOADA ORTEGA	SUPERVISOR CONVENIO 1612-2023	MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER
4.	HAVID NUMA MARCHENA	APOYO A LA SUPERVISION	MINISTERIO DEL INTERIOR
5.	RAFEL PABÓN LÓPEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA DE IMPLEMENTACIÓN
6.	ANDERSON JHOAN CONTRERAS GARZÓN	INGENIERO COORDINADOR	CONTRATISTA DE IMPLEMENTACIÓN
7.	IVAN MAURICIO BRITO MEJIA.	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA-
8.	ALEJANDAR MIRANDA MEZA	INGENIERO SISO INTERVENTORIA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
9	ROLANDO RAMIRO VILLAMIZAR PABÓN	INGENIERO RESIDENTE	CONTRATISTA DE IMPLEMENTACIÓN
10	ANA BOLENA MEZA MORA	RESIDENTE CIVIL	CONTRATISTA DE IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Dirección: Calle 3 No. 3 - 08 Esquina Palacio Municipal, Bochalema – Norte de Santander.

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

No. contrato	Nombre del contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Contrato CM- 004-2023 del 28 de noviembre de 2023 INTERVENTORÍA	IVAN MAURICIO BRITO MEJIA. Representante Legal IVAN MAURICIO BRITO MEJIA.	28/11/2023	30/04/2024
Contrato LP 003-2023 del 20 de abril de 2023 ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACION	CONSORCIO SIES 2023 Representante Legal RAFAEL PABÓN LÓPEZ	28/11/2023	30/04/2024

CUADRO FINANCIERO

CONCEPTO (adjuntar celdas si es necesario)	VALOR	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA PAGO
VALOR DEL CONTRATO DE ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACION	$1.737.279.281,00		
ANTICIPO AL CONTRATISTA DE ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACION.	$0,00		N/A
PAGO PARCIAL 1 AL CONTRATISTA DE ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACION	$0,00		N/A
PAGOS REALIZADOS A LA FECHA	$694.911.712,40	01/03/2024	AL-0223-001

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACION	$150.047.100,00		NA
ANTICIPO	$0		NA
PAGOS REALIZADOS A LA FECHA	$0		NA

NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.
NOTA: A LA FECHA NO SE LE HAN REALIZADO PAGOS POR PARTE DEL MUNICIPIO NI AL CONTRATISTA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMNETACIÓN NI A LA INTERVENTORIA.

CUENTAS RECÍPROCAS

SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE	$ 0,00

DESARROLLO DE LA VISITA

ANTECEDENTES

• El día 07 de julio de 2023 se firma acta de inicio convenio No. 1612– 2023.

• El día 12 de diciembre de 2023 se recibió los estudios y diseños por parte del Ministerio del Interior del convenio No. 1612- 2023.

• Plazo Inicial del convenio 1612-2023: 06 de enero de 2024.

• Fecha de aprobación primera prórroga del convenio 1612-2023: 28 diciembre de 2023.

• Nuevo Plazo con prórroga del convenio 1612-2023: 30 de abril de 2024.

• Plazo inicial del contrato derivado de Estudios y Diseños e Implementación No. LP 003-2023: 26-febrero-2024.

• Plazo inicial del contrato derivado de interventoría CM- 004-2023: 26 de febrero de 2024.

• Nuevo Plazo del contrato derivado de Estudios y Diseños e Implementación No. LP 003-2023: 30 de abril de 2024.

VALORES ADICIONALES APORTADOS POR EL MUNICIPIO: $0

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $1.867.478.792,00

VALOR DE LA IMPLEMENTACIÓN RESULTADO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $1.665.625.403,00

SALDO NO A EJECUTAR RESULTADOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $0

• El Aporte de FONSECON es de $ 1.698.730.913,00

• El Aporte del Municipio de Bochalema departamento de Norte de Santander como cofinanciación del proyecto es de: $ 188.747.879,00

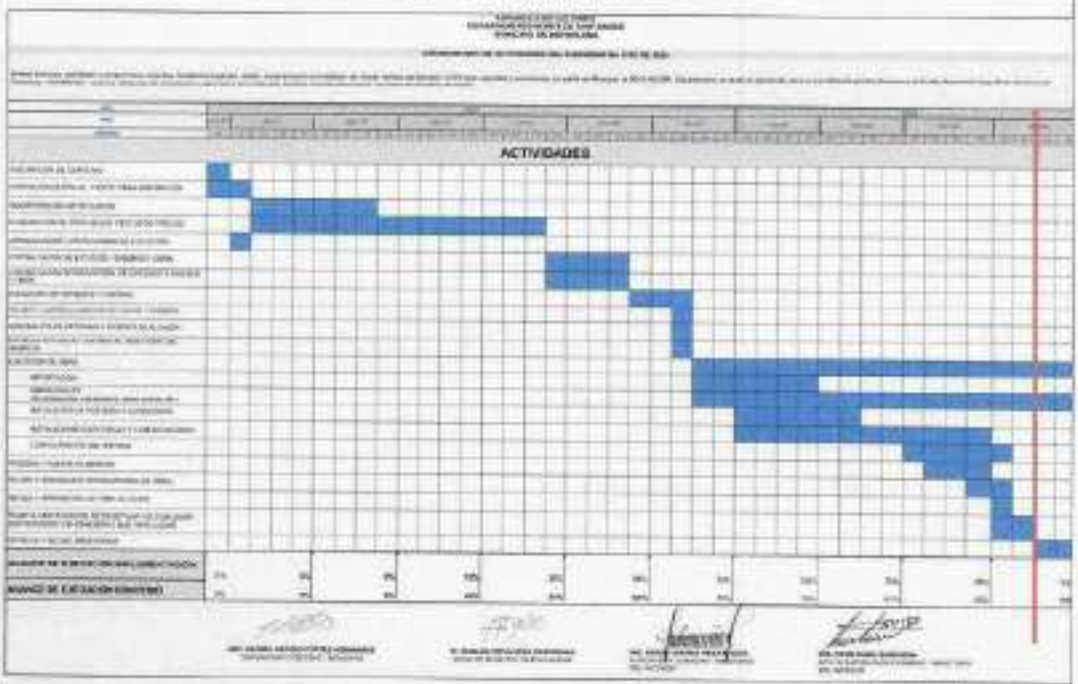
• El Municipio de Bochalema departamento de Norte de Santander, se comprometió a ejecutar los recursos bajo el presupuesto presentado y aprobado por la interventoría y certifico que con este valor ejecutará el 100% del objeto contractual del convenio N. 1612-2023.

ESTADO DEL CONVENIO:

Se inició la primera prórroga del convenio 162-2023 a partir del 07 de enero de 2024, se realizó ajuste del cronograma de obras con respecto a la primera prórroga.

A la fecha 17 de abril de 2024 se tiene:

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACUERDO CON EL CRONOGRMA



De acuerdo con el cronograma del proyecto y del convenio, para la fecha, el porcentaje programado es del 94%, con un porcentaje ejecutado del 78,06% y un atraso del 15,94%.

Del 15,94% de atraso, el 14,56% es presuntamente imputable al municipio toda vez, que no realizó de manera oportuna los trámites necesarios para garantizar el tendido de fibra óptica y las actividades relacionadas, ya que se requiere la suscripción de un contrato de arrendamiento de infraestructura con la empresa de Energía (Centrales Eléctricas de Norte de Santander - CENS) a cargo de la alcaldía de Bochalema, lo cual son gestiones comprometidas desde la viabilidad del proyecto ante del Ministerio del Interior de acuerdo con el numeral 4 de la CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Actualmente se están realizando dichas gestiones, sin embargo, esto ha afectado la ruta crítica del proyecto generando atraso en las actividades de:

1. Tendido de fibra óptica aérea
2. Puesta en marcha de las cámaras
3. Puesta en marcha de switch tipo 4
4. Puesta en marcha de switch tipo 1
5. Puesta de marcha de monitores de visualizacion.
6. Puesta en marcha de monitor de operador
7. Puesta en marcha Joystick
8. Puesta en marcha UPS de las cámaras
9. Puesta en marcha del sistema de almacenamiento
10. Puesta en marcha de canalizaciones eléctricas
11. Puesta a tierra
12. Pruebas del sistema en general.

Manifiesta el municipio que ya están efectuando las gestiones necesarias para suscribir dicho contrato para uso de infraestructura eléctrica ante terceros, indicando que desde el 14 de febrero 2024 se remitió la documentación a CENS y posteriormente dos comités de seguimiento con los contratistas de obra e interventoría, pactando que para el día 12 de abril 2024 se realizaría la primera visita técnica de CENS para la posteria, lo cual se cumplió. Sin embargo, el municipio se comprometió a expedir el CDP y constitución de

póliza para suscribir dicho contrato con CENS; compromisos que a la fecha no se han cumplido, generando un riesgo en la entrega del proyecto dentro del plazo actual por afectación de las actividades pendientes y en consecuencia presunto incumplimiento del Convenio 1612-2023 suscrito con el Ministerio del Interior, considerando que restan 13 días para la finalización del Convenio. Se le recuerda al municipio que en caso de no garantizar la entrega del proyecto en la vigencia contractual, se dará traslado a la Subdirección de Gestión Contractual para que proceda con la actuación administrativa sancionatoria con declaración de Cláusula Penal Pecuniaria y con perjuicio de incurrir en faltas disciplinarias, fiscales y legales.

Asimismo e incluso si el municipio garantizara la suscripción del contrato de arrendamiento, manifiesta la interventoría que el tiempo para la culminación de las actividades pendientes resulta insuficiente; situación que alertó mediante oficio al municipio de Bochalema desde el 16 de enero 2024 (Adjunto a la presente acta). Por lo anterior, indica la interventoría la necesidad de ampliación al tiempo del contrato entre el municipio y el CONSORCIO SIES 2023, así como del Convenio 1612-2023 con el Ministerio del Interior, indicando que las causas del atraso en un 14,56% no son imputables al contratista y que el 1,38% son subsanables a través de un plan de contingencia.

De acuerdo a lo anterior y ante el pronunciamiento de la interventoría, el municipio deberá atender la novedad contractual que considere pertinente ante el Ministerio del Interior para garantizar la ejecución de las actividades dentro del término contractual del Convenio. La supervisión por parte del Ministerio se permite indicar que cualquier solicitud de modificación se deberá informar como mínimo 15 días previos a la fecha de vencimiento del plazo contractual, motivo por el cual cualquier comunicación recibida por parte del municipio sería de manera extemporánea y debido a la proximidad del vencimiento, el plazo para radicar cualquier solicitud es el día 18 de abril 2024.

Observaciones técnicas

Después de realizar recorrido por los 21 puntos de Cámaras, centro de monitoreo y a la bodega del contratista; en dicha visita se evidenció lo siguiente:

Los puntos de cámara 9, 10, 11,12,13,14,15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27,28 y 29 cuenta con el Hincado del Poste, cajas de paso e inspección, adicionalmente, instalación de Las cámaras PTZ, Brazos, Switches tipo 1, UPS´s y sistema de puesta a tierra, faltando la instalación de las coronas antiescalatorias en todos los puntos, sin embargo, se evidencio que estas se encuentran en la bodega del Contratista.

El poste del punto de cámara 9 visualmente se ve desaplomado, se solicita realizar la inspección y verificación a la Interventoría, si realmente se encuentra en este estado, si es así, se deben realizar las labores necesarias por parte del contratista para que el hincado del poste cumpla con los índices de verticalidad, adicionalmente, en el punto de cámara 22 se debe realizar ajuste a las tapas de las cajas de paso y de inspección.

Los puntos de cámara 10 y 20 se deben realizar poda de árboles cercanos al poste para permitir la visual de la cámara, esta actividad se debe realizar por parte del municipio.

Las obras en el Centro de Control y Monitoreo se encuentran en un avance del 90%, con lo cual se han realizado las actividades de demoliciones de pisos, retiros de puertas y ventanas, retiro de cielo rasos existentes, muros en mampostería, instalación de pisos, instalación de cielo rasos, instalación eléctrica, instalación de luminarias, reubicación de puerta antivandálica, montaje de aires acondicionados, primera mano de pintura.

Se encuentra pendiente por instalar puerta principal del centro de control, puerta cuarta de equipos, terminación de pintura para muros.

En visita realizada a la bodega del contratista se evidenció que están las 21 coronas antiescalatorias, 2 Monitores de Operador, Estaciones de Trabajo (Workstation) operador CCTV, Estaciones de Trabajo (Workstation) punto de visualización, Switch tipo 4 y Joyslick de operación.

La interventoría manifiesta que por solicitud de Telemática de Policía, se suprimieron dos (2) Radio Enlace (Equipo de recepción y transmisión de microondas por un valor de $ y la reubicación de un punto

1. Se debe ajustar el acta parcial de avance con corte al 17 de abril 2024, ya que de acuerdo con la verificación de actividades ejecutadas, el proyecto cuenta con un avance aproximado del 78,06% que deberá ser confirmado por la interventoría.
2. Se debe incluir registro fotográfico y descripción de las actividades con APU y memorias de cantidades, para cada uno de los ítems que suman el 78,06%.

3. Se debe incluir al informe de interventoria, hoja de vida de cada punto con registro fotográfico y descripción de cada uno de los elementos al interior del gabinete.
4. Se descuenta canalización del punto de visualización que será instalado en la alcaldía, generando un saldo a favor de $ 3.665.929.

Avance financiero

Del total aporte de los recursos del convenio a cargo del Ministerio del Interior ($ 1.698.730.913) se ha desembolsado la suma de $ 1.189.111.639, lo que corresponde al 70% del avance financiero del Convenio; suma que será verificada objeto de la presente visita frente al avance de ejecución del proyecto.

De acuerdo con el informe financiero con corte a marzo 2024, expedido por el Tesorero del municipio de Bochalema - Nte. De Santander, la afectación de los recursos del Ministerio corresponde la suma de $ 694.911.712, que se efectuaron directamente a la Fiducia constituida por el contratista CONSORCIO SIES 2023. Al contrato de Interventoria no se la ha efectuado ningún pago, pese a haber radicado cuenta de cobro por el 40% de ejecución.

El saldo en la cuenta del convenio, de acuerdo con el extracto bancario del mes de marzo 2024 es de $ 496.572.922,20, que incluye rendimientos financieros por la suma de $ 2.372.995,20, los cuales no se podrán disponer en uso y deberán ser reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Público DNT, posterior al recibo del proyecto y para la liquidación del convenio.

- Requerimientos:

Se solicita comprobantes de egreso por concepto de pago a la FIDUCIA y el informe correspondiente al mes de marzo 2024,

CONCLUSIONES

1. La supervisión por parte del Ministerio indica que se cumplen los requisitos para efectuar trámite de Tercer Desembolso del Convenio de acuerdo con el porcentaje verificado en campo, sin embargo el trámite estará sujeto a subsanar las observaciones mencionadas con respecto al avance técnico e incluidas dentro del informe de interventoria con corte al 17 de abril de 2024. De acuerdo a la programación presupuestal PAC del Ministerio del Interior, se deberá radicar la solicitud por parte del municipio a mas tardar el 18 de abril de 2024.

2. El municipio deberá atender con suma diligencia el pronunciamiento de la interventoria y justificar ante la supervisión del Ministerio, el atraso del proyecto imputable a su presunta responsabilidad, mencionando la solicitud pertinente, de requerir la modificación del convenio, en aras de garantizar el cumplimiento de las actividades pendientes y la entrega del proyecto dentro del plazo contractual.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
Municipio/	Incluir subsanación a las observaciones registradas con relación al tema técnico y financiero dentro del informe de interventoria a corte 17 de abril de 2024, para que lo mismo se constituya como parte integral de la solicitud del tercer desembolso del convenio.	18 abril de 2024
Municipio	Solicitud y entrega de documentos para tramite del tercer desembolso de acuerdo a la clausula SEXTA del Convenio	18 abril de 2024
Municipio	Entrega de documentos de designación de supervisor del convenio 1612-2023 y de los contratos derivados	18 abril de 2024
Municipio	Entrega de comprobantes de egreso por concepto de pago a la FIDUCIA y el informe correspondiente al mes de marzo 2024.	18 abril de 2024
Municipio	Remitir evidencia de la suscripción del Contrato con Centrales Eléctricas de Norte de Santander.	26 de abril de 2024
Municipio	Remitir justificación y solicitud de modificación del convenio o garantía y certificación de culminar las actividades pendientes dentro de la fecha contractual.	18 abril de 2024

Ministerio del Interior manifiesta que el no cumplimiento de los compromisos adquiridos en la presente acta conllevara a adelantar un proceso de posible incumplimiento del convenio.

CIERRE DE LA INSPECCIÓN

Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita)

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)

Por parte de: **MUNICIPIO BOCHALEMA – DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER** **Nombre y firma: RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA** Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Email: alcaldia@bochalema-nortedesantander.gov.co Celular: 3173684352	Por parte de: ***MINISTERIO DEL INTERIOR*** **Nombre: SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA** **Cargo:** SUPERVISOR DEL CONVENIO **Email:** Sergio.vega@mininterior.gov.co **Celular:** 3115085036
Por parte de: ***MINISTERIO DEL INTERIOR*** **Nombre: HAVID NUMA MARCHENA** **Cargo:** APOYO A LA SUPERVISION **Email:** Havid.numa@mininterior.gov.co **Celular:** 3007119840	*Por parte de:* ***MUNICIPIO BOCHALEMA – DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER*** **Nombre: JHONATTAN JOSÉ BOADA ORTEGA** **Cargo:** SECRETARIO DE PLANEACIÓN-SUPERVISOR **Email:** planeación@bochalema-nortedesantander.gov.co **Celular:** 3209925867
Por parte de: ***CONTRATISTA DE ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN.*** **Nombre: ROLANDO RAMIRO VILLAMIZAR PABÓN** **Cargo:** INGENIERO RESIDENTE **Email:** proyectos@netkoln.com **Celular:** 3143651924	*Por parte de:* ***CONTRATISTA DE ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN.*** **Nombre y firma: RAFAEL PABÓN LÓPEZ** **Cargo:** Representante Legal – Consorcio SIES 2023 **Email:** Rafael.pabon@netkoln.com **Celular:** 3157810517
Por parte de: ***CONTRATISTA INTERVENTORIA ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN.*** **Nombre y firma: IVAN MAURICIO BRITO MEJIA** **Cargo:** director de Interventoría **Email:** interventoriabochalemacctv@gmail.com **Celular:** 3017441295	*Por parte de:* ***ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN*** **Nombre y firma: ANDERSON CONTRERAS G.** **Cargo:** Ingeniero Coordinador- Consorcio SIES 2023 **Email:** proyectos@netkoln.com **Celular:** 3118311540
Por parte de: ***CONTRATISTA INTERVENTORIA ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN.*** **Nombre y firma: ALEJANDRA MIRANDA MEZA** **Cargo:** Ingeniera SISO **Email:** alejandramirandam06@gmail.com **Celular:** 3146891595	*Por parte de:* ***ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN*** **Nombre y firma: ANA BOLENA MEZA MORA** **Cargo:** Residente Civil-Consorcio SIES 2023 **Email:** proyectos@netkoln.com **Celular:** 3177242907

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.

ANEXO N° 20 ACTA PARCIAL DE AVANCE

Seguimiento Ejecución Presupuestal
Convenio 1612
Fecha seguimiento: 31 de mayo 2024

	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN ESTUDIOS Y DISEÑOS	CAN IMPLEMENTACIÓN	CAN TOTALES	VR/UNIT	VR/TOTAL	Peso porcentual Financiero Unitario	Peso porcentual Financiero del componente	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	PRECONFIGURACION	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PUESTA EN MARCHA	DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	PRECONFIGURACION	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PUESTA EN MARCHA	DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO FINANCIERO	PORCENTAJE POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR
Total Estudios y Diseños IVA incluido	1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	Unid			1	$ 71.653.878,00	$ 71.653.878,00	4,12%	4,12%	100%												100%	4,12%	$ 71.653.878,00	0,00%	$ -
Fase II: fase Implementación	2	CÁMARAS DOMO PTZ. TIPO 1.	Unid	21	21	21	$ 16.866.794,00	$ 354.202.674,00	0,97%	20,39%	40%	5%	10%	21%	20%	4%	100%	21	21	21	21	21	21	20,39%	$ 354.202.674,00	0,00%	$ -
	3	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS	UND	4	0	0	$ 25.746.831,00	$ -	1,48%	0,00%	45%	5%	10%	26%	10%	4%	100%							0,00%	$ -	0,00%	$ -
	4	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	MTS	4503	7445	7445	$ 36.250,00	$ 269.876.366,00	0,00%	15,53%	40%	7%	1%	46%	2%	4%	100%	7445	7445	7445	7445	7445	7445	15,53%	$ 269.876.366,00	0,00%	$ -
	5	SWITCH TIPO 4	UND	1	1	1	$ 29.249.214,00	$ 29.249.214,00	1,68%	1,68%	45%	5%	8%	26%	14%	2%	100%	1	1	1	1	1	1	1,68%	$ 29.249.214,00	0,00%	$ -
	6	SWITCH TIPO 1	UND	21	21	21	$ 4.963.349,00	$ 104.230.329,00	0,29%	6,00%	45%	5%	10%	27%	9%	4%	100%	21	21	21	21	21	21	6,00%	$ 104.230.329,00	0,00%	$ -
	7	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	UND	2	2	2	$ 24.856.959,00	$ 49.713.918,00	1,43%	2,86%	45%	5%	4%	33%	9%	4%	100%	2	2	2	2	2	2	2,86%	$ 49.713.918,00	0,00%	$ -
	10	MONITOR OPERADOR CCTV	UND	2	2	2	$ 2.860.297,00	$ 5.720.594,00	0,16%	0,33%	45%	5%	4%	28%	14%	4%	100%	2	2	2	2	2	2	0,33%	$ 5.720.594,00	0,00%	$ -
	11	ESTACIÓN DE TRABAJO OPERADOR	UND	1	1	1	$ 31.214.590,00	$ 31.214.590,00	1,80%	1,80%	45%	5%	10%	22%	14%	4%	100%	1	1	1	1	1	1	1,80%	$ 31.214.590,00	0,00%	$ -
	13	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	1	1	1	$ 6.092.566,00	$ 6.092.566,00	0,35%	0,35%	45%	5%	10%	27%	9%	4%	100%	1	1	1	1	1	1	0,35%	$ 6.092.566,00	0,00%	$ -
	14	UPS 1.5KVA	UND	21	21	21	$ 5.210.880,00	$ 109.428.480,00	0,30%	6,30%	45%	5%	4%	32%	10%	4%	100%	21	21	21	21	21	21	6,30%	$ 109.428.480,00	0,00%	$ -
	17	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CÁMARA	UND	21	21	21	$ 10.343.513,00	$ 217.213.773,00	0,60%	12,50%	45%	5%	10%	26%	9%	5%	100%	21	21	21	21	21	21	12,50%	$ 217.213.773,00	0,00%	$ -
	23	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU	UND	1	1	1	$ 13.178.286,00	$ 13.178.286,00	0,76%	0,76%	45%	5%	4%	40%	3%	3%	100%	1	1	1	1	1	1	0,76%	$ 13.178.286,00	0,00%	$ -
	24	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	UND	21	21	21	$ 5.121.608,00	$ 107.553.768,00	0,29%	6,19%	40%	20%	1%	32%	5%	2%	100%	21	21	21	21	21	21	6,19%	$ 107.553.768,00	0,00%	$ -
	25	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	21	21	21	$ 3.672.359,00	$ 77.119.539,00	0,21%	4,44%	45%	9%	4%	30%	10%	2%	100%	21	21	21	21	21	21	4,44%	$ 77.119.539,00	0,00%	$ -
	26	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	21	21	21	$ 413.346,00	$ 8.680.266,00	0,02%	0,50%	40%	20%	1%	32%	5%	2%	100%	21	21	21	21	21	21	0,50%	$ 8.680.266,00	0,00%	$ -
	27	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	UND	21	21	21	$ 557.288,00	$ 11.703.048,00	0,03%	0,67%	35%	25%	1%	32%	5%	2%	100%	21	21	21	21	21	21	0,67%	$ 11.703.048,00	0,00%	$ -
	28	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	4	4	4	$ 1.278.587,00	$ 5.114.348,00	0,07%	0,29%	45%	5%	4%	33%	9%	4%	100%	4	4	4	4	4	4	0,29%	$ 5.114.348,00	0,00%	$ -
	29	PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NORMAL	UND	4	4	4	$ 1.330.024,00	$ 5.320.096,00	0,08%	0,31%	45%	5%	4%	33%	9%	4%	100%	4	4	4	4	4	4	0,31%	$ 5.320.096,00	0,00%	$ -
	30	PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA	UND	4	4	4	$ 1.437.402,00	$ 5.749.608,00	0,08%	0,33%	45%	5%	4%	33%	9%	4%	100%	4	4	4	4	4	4	0,33%	$ 5.749.608,00	0,00%	$ -
	31	SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA (PUNTOS DE CÁMARA Y CENTRO CONTROL Y NODO)	UND	21	21	21	$ 2.939.479,00	$ 61.729.059,00	0,17%	3,55%	30%	20%	8%	32%	5%	5%	100%	21	21	21	21	21	21	3,55%	$ 61.729.059,00	0,00%	$ -
	32	MÓDULOS - PUESTOS DE TRABAJO	UND	1	1	1	$ 5.806.391,00	$ 5.806.391,00	0,33%	0,33%	40%	7%	4%	45%	2%	2%	100%	1	1	1	1	1	1	0,33%	$ 5.806.391,00	0,00%	$ -
	37	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN SALA DE CONTROL	GLB	1	1	1	$ 39.550.000,00	$ 39.550.000,00	2,28%	2,28%	26%	25%	13%	28%	4%	4%	100%	1	1	1	1	1	1	2,28%	$ 39.550.000,00	0,00%	$ -
	39	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS Y NODOS	UND	22	21	21	$ 3.655.292,00	$ 76.761.132,00	0,21%	4,42%	30%	20%	13%	28%	5%	4%	100%	21	21	21	21	21	21	4,42%	$ 76.761.132,00	0,00%	$ -
	40	PUNTO DE VISUALIZACIÓN ENTIDAD TERRITORIAL	GLB	1	1	1	$ 70.417.358,00	$ 70.417.358,00	4,05%	4,05%	40%	5%	10%	28%	9%	8%	100%	1	1	1	1	1	1	4,05%	$ 70.417.358,00	0,00%	$ -
	total Implementación (incluido Impuestos)							$ 1.665.625.403,00																			

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN	$ 1.737.279.281,00	100,00%	TOTALES	100,00%	$ 1.737.279.281,00	0,00%	$ -

ARQ. JHONATTAN JOSÉ BOADA ORTEGA
SUPERVISOR CONVENIO - MUNICIPIO

ING. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. RAFAEL PABON LOPEZ
DIRECTOR DE PROTECTO
CONSORCIO SIES 2023

ASIGNACIÓN PORCENTUAL PARA VALORACIÓN DE AVANCE POR ÍTEM

A continuación, se detalla las notas de cada casilla que se utiliza porcentualmente en el acta de avance parcial con la cual se evaluará semanalmente el avance del proyecto de acuerdo al peso que tienen sobre el presupuesto.

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	NOTA
ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	26% - 45%	El porcentaje está directamente relacionado al costo de adquisición de equipos dispuestos al proyecto, el cual varia de un 26% a un 45% dependiendo el tipo de equipo y la disponibilidad de entrega en el mercado
MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	5% - 25%	Se tiene presente un porcentaje para llevar un control de avance a la llegada de los equipos, los equipos son de uso profesional/Industrial y los proveedores toman de 15 a 90 días entregar estos equipos. El porcentaje varía de acuerdo al tipo de logística requerida en temas de trasporte que se requiere para transportar desde la bodega del proveedor a la bodega del contratista.
PRECONFIGURACIÓN	1% - 10%	Los equipos requieren una configuración determinada de acuerdo a la necesidad del proyecto y las diferentes indicaciones de las entidades, el porcentaje de costo de este ítem contra el presupuesto es bajo por lo que se asignan valores para tener el control del ítem y el avance.
IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIONES (CIVILES / ELÉCTRICAS)	21% - 46%	La obra civiles y eléctricas tienen un porcentaje alto por el peso en el proyecto, los requerimientos normativos en construcción y normativa eléctrica hace que se le asigne estos valores de referencia.
PUESTA EN MARCHA	2% - 20%	Se tomó como referencia el tiempo que se requiere su puesta en marcha con respecto a la implementación, dado de que este porcentaje depende de la obra civil y eléctrica.
DOCUMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y ENTREGA	2% - 8%	Los porcentajes reflejan la documentación que se requiere para los documentos de entregables del proyecto.

IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
Director de Interventoría

RAFAEL PABÓN LÓPEZ
RL. CONSORCIO SIES 2023

ANEXO N° 21 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA USO POSTERIA CENS

CONTRATO No. 7200-017-2024

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. NIT. 890.500.514-9 Y MUNICIPIO DE BOCHALEMA NIT 890.505.662-3

ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE PROPIEDAD DE CENS PARA EL TENDIDO DE LAS REDES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Entre **CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.**, empresa de servicios públicos, identificada con el NIT 890.500.514-9, representada por **WILLIAM MONDRAGÓN VILLAMIZAR**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 13.500.747 expedida en Cúcuta, en su condición de Jefe de Área Gestión Comercial, actuando en virtud de la delegación conferida por el Gerente General mediante decisión empresarial 6300-060-2016 para la suscripción de contratos cuya cuantía no exceda los trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en concordancia con la delegación contenida en el numeral 1 del artículo primero de la Decisión Empresarial No. 37 del 20 de noviembre de 2020, por una parte, quien en adelante se denominará **CENS o EL ARRENDADOR**; y por otra parte, **EL MUNICIPIO DE BOCHALEMA**, entidad territorial identificada con NIT No. 890.505.662-3, representado por **RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1098140227 de Bochalema, quien obra en su calidad de Alcalde del **MUNICIPIO DE BOCHALEMA**, actuando en virtud de Acuerdo 001 - 2024, y quienes conjuntamente se denominarán **LAS PARTES,** se suscribe el presente Contrato de Arrendamiento, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Antecedentes. El presente contrato se celebra en consideración a los siguientes antecedentes:

a) Que es función de la Alcaldía Municipal, junto con la Policía Nacional, propender por la protección y seguridad de los bienes del estado, y la comunidad del área de Cúcuta.

b) La Resolución CREG 063 de junio de 2013 y 140 de octubre de 2014, define las condiciones de calidad, operación y mantenimiento de la infraestructura del sector de energía eléctrica que deben observarse y exigirse para la celebración y ejecución de los acuerdos de compartición de infraestructura eléctrica para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión.

c) Es voluntad de **LAS PARTES**, celebrar un contrato para el acceso y uso de la infraestructura eléctrica y establecer las condiciones que regirán la relación hacia futuro.

d) Para la celebración del presente Contrato, los representantes de **LAS PARTES** tienen las facultades suficientes para acordar los términos del mismo.

e) El acceso y uso de la infraestructura eléctrica a que se refiere el presente contrato comprende postes, torres y canalizaciones ubicados en el municipio de **BOCHALEMA**.

f) Que el **MUNICIPIO DE BOCHALEMA**, expidió el CDP No. 0422-003 con fecha de 4/22/2024 por valor de 10.000.000 Pesos, con el objetivo de garantizar el pago de los servicios de Alquiler de infraestructura para los servicios requeridos por el **MUNICIPIO DE BOCHALEMA.**

SEGUNDA. Objeto. El objeto del presente contrato es el uso en calidad de arrendamiento de la infraestructura eléctrica de propiedad de **CENS**, para el tendido de las redes y demás elementos que permitan cubrir necesidades de vigilancia, conectividad u otra índole por parte del **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** y que puedan ser instalados en esta infraestructura.

Parágrafo 1°. El acceso y uso de la infraestructura por parte de **CENS** no implica la transferencia de la propiedad de los bienes utilizados, así como tampoco implica disposición o limitación alguna de los demás atributos propios del derecho de dominio de los bienes.

TERCERA. Modificaciones al contrato. El presente contrato podrá modificarse mediante acta de modificación bilateral suscrita por los representantes legales y/o apoderados debidamente facultados de **LAS PARTES**. Las obligaciones y derechos que este contrato confiere a cada una de **LAS PARTES**, no se entenderán que han sido modificadas o derogadas en virtud de prácticas en contrario durante el curso de su ejecución. Así mismo, la tolerancia de una de **LAS PARTES** ante el incumplimiento de cualquier obligación a cargo de la otra, no se considerará como aceptación del hecho tolerado, ni como precedente para su repetición.

CUARTA. Remuneración, forma y periodos de pago. El valor inicial estimado del presente contrato es $5.295.298, no obstante, su valor final dependerá de las necesidades de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA.** Como remuneración por el acceso y uso de la infraestructura objeto del presente contrato, **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** se obliga a pagar a **CENS** una tarifa de compartición mensual por el uso de la infraestructura eléctrica, de acuerdo con lo definido en el artículo 4.10.3.1.de la Resolución CRC 7120 de 2023 y en la resolución CRC 7242 de 2023, equivalente al resultado de la suma de la *"cantidad de postes, torres o metros de canalización accesados"* multiplicados por la *"cantidad de apoyos en el poste, torre o canalización"*, cuyo resultado se deberá multiplicar por el *"valor por poste, torre o metro de canalización, según el tipo"* más el IVA.

En la tabla 1 se identifica el valor mensual a pagar de acuerdo con la infraestructura utilizada, la cual se actualizará en la medida que ingresen nuevos proyectos. Los valores están expresados en pesos constantes del año 2024. El valor tope corresponde a la remuneración por punto de apoyo.

Tabla 1. Valor mensual a pagar

MUNICIPIO DE BOCHALEMA									
Tipo de Poste y/o Torre	Apoyos	Cant postes acceder	Total Elementos acceder	Valor por Poste, según tipo	Valor Subtotal antes de IVA		IVA 19%		Valor Total
Postes de 8 Metros	1	77	198	$ 1,689.10	$ 130,061		$ 24,712		$ 154,772
	2	22		$ 1,689.10	$ 74,320		$ 14,121		$ 88,441
Postes de 12 Metros	1	67		$ 2,685.86	$ 179,953		$ 34,191		$ 214,144
	2	32		$ 2,685.86	$ 171,895		$ 32,660		$ 204,555
Valor mensual estimado					**$**	**556,229**	**$**	**105,683**	**$ 661,912**
Valor anual estimado					**$**	**4,449,830**	**$**	**845,468**	**$ 5,295,298**

Pegar tabla de Excel con el valor a pagar según el inventario

Tabla 2. Tipo de elementos y apoyos correspondientes

ELEMENTOS	N° APOYOS
Cable o conductor	1
Amplificadores	3
Equipos de señal remota	2
Dispositivos de conexión	2
Cubiertas de empalme	3
Cajas de dispersión	2
Nodos ópticos	2
Splitter	1
Cámaras de vigilancia	2
Espejos retrovisores	2
Sirenas	2
Reflectores	2
Crucetas	2
Fuentes	4

En tendidos aéreos, el punto de apoyo debe entenderse como el mecanismo de fijación de un cable/conductor o conjunto de cables/conductores agrupados con un diámetro total no superior a los 25,4 mm. Cuando se supere dicho diámetro, se remunerará según el cociente redondeado hacia la siguiente unidad que resulte de dividir el diámetro total del cable/conductor o conjunto de cables/conductores por 25,4 mm.

Para la contabilización de apoyos en tendidos subterráneos, el punto de apoyo corresponde a un solo cable o conductor instalado en la infraestructura, con independencia del mecanismo de fijación utilizado.

La remuneración de canalizaciones incluye el uso de cámaras de paso y cajas de revisión.

La remuneración incluye la utilización de tubos bajantes y puestas a tierra adosados al poste u otros elementos técnicamente necesarios y relacionados con el apoyo en el poste o con el cable en el ducto para materializar el acceso a la infraestructura. En caso de no haber disponibilidad de los mencionados elementos o de capacidad en los mismos, deberá permitirse su instalación por parte del PRST, teniendo en cuenta que el uso del espacio que estos ocupen en la infraestructura se encuentra comprendido en la remuneración por apoyo en poste o en canalización.

La remuneración por elementos distintos a conductores o cables tendidos que estén instalados sobre el cable/conductor auto soportado o cable mensajero soportado en el poste, se encuentra incluida dentro del valor tope por punto de apoyo.

Para elementos distintos a conductores o cables tendidos que, por su peso, volumen o funcionalidad o por solicitud del PRST, deban ser instalados directamente en el poste, la utilización de la infraestructura se remunerará según el número de puntos de apoyo correspondiente al cociente redondeado hacia la siguiente unidad que resulte de dividir la longitud total de la cara del elemento apoyada en el poste por 15 cm.

Para la compartición de postes y torres en el STR y STN, el punto de apoyo corresponderá al soporte en poste o torre del cable de guarda.

Parágrafo 1. Los valores serán reajustados a partir del primero de enero de cada año, de acuerdo con el Índice de Precios al Productor oferta interna (IPP) del año inmediatamente anterior certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), o el índice definido por los entes regulatorios para tal fin.

Parágrafo 2. La remuneración de nuevos puntos de apoyo será a partir del mes siguiente de la fecha de finalización del montaje del proyecto reportado por **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** en el formato de cartera de postería de construcción proyectos. Es responsabilidad de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** informar los cambios de los proyectos en este formato.

Parágrafo 3. MUNICIPIO DE BOCHALEMA pagará a **CENS** por el acceso y uso de la infraestructura de propiedad de **CENS**, mensualidades vencidas. Las facturas serán liquidadas y entregadas a **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** por parte del supervisor designado por **CENS** por correo electrónico dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, salvo en aquellos casos que por efectos de los ciclos de facturación no se pueda presentar la factura dentro del término antes mencionado, se procederá a entregar dicho documento a la mayor brevedad posible; la factura deberá ser cancelada por **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** dentro de los (15) días calendarios siguientes a la recepción de la misma, mediante consignación realizada en la cuenta corriente número 066169999712 del Banco Davivienda, a nombre de **CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P**, para efectos de aplicación del pago realizado, **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** deberá remitir correo electrónico a recaudoempresarial@cens.com.co con copia a los destinatarios comerciales.

QUINTA. Inventario inicial. Para efecto de la determinación del inventario, se tiene que, a la fecha de suscripción del presente contrato, con un inventario aprobado, el cual se relaciona en la cláusula cuarta.

En caso de requerir nuevos proyectos, **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** enviará la información de cada uno los proyectos a implementar, con el detalle de la infraestructura de propiedad de **CENS** que requiera ser usada, para obtener de su parte la aceptación de la factibilidad del proyecto, en adelante "Factibilidad Técnica" remitiendo la información requerida para tal fin.

Los proyectos que hayan obtenido factibilidad técnica de **CENS** se regirán por lo establecido en este contrato y sus anexos.

Al finalizar el montaje de cada proyecto, **CENS** podrá realizar un conteo para validar la cantidad de infraestructura realmente utilizada. **CENS** incluirá en la facturación el valor de los apoyos sobre la infraestructura realmente utilizada por **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** en cada proyecto, o reintegrará lo pagado en exceso, en caso de que los apoyos en la infraestructura sean menores de la informada en el proyecto. El cobro se hará igualmente por el mes completo y no por fracción de mes.

Parágrafo 1. CENS podrá realizar la revisión del inventario posterior a la fecha de finalización del montaje informada por **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** en el formato de cartera de postería de construcción proyectos; en este caso, **CENS** y **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** acordarán la fecha en la que realizará la revisión, si no se cumple, **CENS** comenzará el inventario sin retraso y lo enviará para observaciones por parte de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA.**

Parágrafo 2. El personal de acompañamiento designado por **LAS PARTES** estará bajo cuenta y riesgo de cada empresa y no le generará costo o vinculación alguna a **LAS PARTES.**

1615 a 1713

SEXTA. Intereses Moratorios. En caso de incumplimiento o simple retardo de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** en el pago de los valores que adeude a **CENS** con ocasión del presente contrato, aquella reconocerá y pagará el interés moratorio que corresponda a la máxima tasa autorizada legalmente, liquidado sobre los saldos que se encuentren vencidos.

SÉPTIMA. Valor de referencia. Para los efectos del presente contrato, para la vigencia 2024, el valor unitario mensual por poste, será el indicado en la siguiente tabla, más el IVA:

Elemento de infraestructura eléctrica		Municipios pertenecientes al clúster alto, moderado e incipiente	Municipios pertenecientes al clúster bajo y limitado
		Valor mensual (Antes de IVA)	Valor mensual (Antes de IVA)
Postes del Sistema de Distribución Local (SDL)	Poste menor o igual a 8 metros	$ 1,698.35	$ 1,689.10
	Poste mayor a 8 metros y menor o igual a 10 metros	$ 1,778.06	$ 1,768.38
	Poste mayor a 10 metros	$ 2,700.57	$ 2,685.86
STR o STN	Postes o Torres	$ 141,361.97	$ 140,591.82
Canalizaciones	Canalización con 1 ducto en compartición (metro lineal)	$ 177.49	$ 176.52
	Canalización con 2 ductos en compartición (metro lineal)	$ 88.21	$ 87.73

OCTAVA. Renuncia a requerimiento de constitución en mora. Para el cobro de cualquier suma de dinero que **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** adeude a **CENS** en virtud de este contrato, no será necesario constituirla en mora o requerirla previamente, derechos a los cuales, con la firma del presente contrato, **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** renuncia expresamente.

NOVENA. Duración del contrato. La vigencia del presente contrato será por el término de Ocho (8) meses contados a partir de su perfeccionamiento, o en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2024 y podrá ser prorrogado de común acuerdo entre Las Partes.

Parágrafo 1. En caso de terminación del contrato, **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** se compromete, a más tardar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia de esta o el que se acuerde entre las partes, a recoger y retirar completamente de la infraestructura objeto de este contrato, los elementos que conformen la red de su propiedad, con el cuidado necesario para dejarla en el mismo estado en que se encontraba antes de su utilización, salvo el deterioro normal por el uso. En todo caso, **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** deberá pagar la remuneración correspondiente por el acceso y uso de la infraestructura eléctrica por los puntos de apoyo utilizados desde la fecha de terminación del contrato hasta la fecha de terminación del desmonte; la cantidad de puntos de apoyo para la remuneración se actualizará de acuerdo a la ejecución del cronograma de desmonte el cual deberá ser presentado por **MUNICIPIO DE BOCHALEMA,** deberá presentar cronograma de desmonte por zonas y/o sectores para que **CENS** o la interventoria designada por esta haga el seguimiento respectivo a esta labor.

Parágrafo 2. Se entiende que hasta tanto **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** no retire completamente todos los elementos que integran su red, todas las previsiones de este contrato referentes a la utilización de la infraestructura se mantendrán vigentes; por lo tanto, las obligaciones de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** con respecto a **CENS** conservarán su vigencia, siempre que el cumplimiento de la obligación de que se trate, no implique seguir ejecutando el contrato más allá del plazo previsto para el retiro de los elementos que integran la red de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** en especial, **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** deberá mantener vigentes las pólizas pactadas en la Cláusula

Décima Tercera durante todo el tiempo que demore retirando todos los elementos que integra su red y sesenta (60) días calendario más.

Parágrafo 3. Si finalizados los seis (6) meses siguientes a la terminación del contrato, o el tiempo que se acuerde entre las partes, **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** no ha recogido ni retirado los elementos de red de su propiedad, autoriza por este medio a **CENS** para que en forma directa o por interpuesta persona, proceda a retirarlos, recogerlos y guardarlos para ser entregados a aquélla. **CENS** facturará a **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** las sumas a que haya lugar por el uso de Infraestructura, los trabajos de retiro y el bodegaje a que hubiere lugar. Si al finalizar los seis (6) meses de que dispone **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** para el retiro de todos los elementos que integran su red, no lo ha hecho, **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** deberá prorrogar la vigencia de las garantías por cuatro (4) meses adicionales a los dispuestos en la cláusula décima tercera del presente contrato y en todo caso estas deberán permanecer vigentes hasta tanto finalice el desmonte.

DÉCIMA. Obligaciones de LAS PARTES. Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en el presente contrato, son también obligaciones de **LAS PARTES** las siguientes:

a) **De MUNICIPIO DE BOCHALEMA**

- Coordinar previamente con **CENS**, todas las labores que pretenda realizar **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** y que estén directamente relacionadas con la infraestructura objeto del presente Contrato.
- No modificar las condiciones normales de utilización de los elementos de la infraestructura de **CENS**, de acuerdo con los términos del presente contrato.
- Responder por la ejecución de todos los trabajos relacionados con la instalación, mantenimiento, adición o retiro de sus redes.
- Seguir y adoptar las instrucciones y observaciones para la utilización de la infraestructura de **CENS** que estén acordes con lo estipulado en la regulación vigente y en los manuales de operación, que le sean impartidas a través de funcionarios autorizados para el efecto.
- Adoptar las precauciones necesarias para evitar daños o perjuicios a las personas o a los bienes de **CENS** o de terceros y cumplir con la normatividad ambiental que sea necesaria en desarrollo del presente contrato.
- No manipular las redes de **CENS** o de **terceros** que hagan uso del acceso y uso de la infraestructura eléctrica de **CENS**, salvo que sea **autorizado** por escrito por **CENS**.
- Renovar oportunamente, durante la vigencia del presente contrato o de sus prórrogas, las garantías que se hubiere obligado a otorgar por virtud de la celebración del presente contrato y a reponer oportunamente sus montos o vigencias en caso de ser necesario.
- En caso de fallas cuya reparación implique un replanteo de la ruta, **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** deberá actualizar esta información del proyecto en un tiempo inferior a treinta (30) días calendario después del replanteo, para que el proyecto esté debidamente actualizado y la facturación esté correcta.
- Cumplir con las disposiciones que le apliquen y que se encuentran establecidas en la Resolución CREG 063 de 2013 y Resolución CREG 140 de 2014 o aquellas que las modifiquen o sustituyan.
- Realizar el pago oportuno por parte de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** por el acceso y uso de infraestructura.
- Desmontar e instalar nuevamente los equipos instalados en la infraestructura eléctrica de **CENS**, cuando se requiera modificar el trazado de la línea. Los costos por el traslado de la

infraestructura eléctrica estarán a cargo de **CENS**, los costos por el traslado de los elementos de **NOMBRE DEL MUNICIPIO** estarán a cargo de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA.**

- Mantener marcados los elementos de su propiedad de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. Agrupar los conductores nuevos de acuerdo con lo establecido en la regulación vigente.
- Trasladar sus redes y elementos a solicitud del Operador de Red dentro de los 7 días siguientes a la notificación respectiva de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. Los costos por el traslado de la infraestructura eléctrica estarán a cargo de **CENS**, los costos por el traslado de los elementos del **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** estarán a cargo del **MUNICIPIO DE BOCHALEMA**.
- **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** deberá tramitar, cuando lo requiera, la solicitud de servicio de energía e instalación de medidor de acuerdo con el trámite que **CENS** tiene definido para tal fin, en ningún momento obtendrá energía de manera no autorizada y siempre cumpliendo con los requisitos técnicos, comerciales y de seguridad que apliquen.

b) De CENS:

- Permitir a **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** el uso de la infraestructura a que se refiere este contrato, de conformidad con el Anexo Técnico y las normas legales vigentes.
- Dar mantenimiento a la infraestructura eléctrica objeto de este contrato de tal manera que se garantice su utilización durante la vigencia del contrato y sus renovaciones.
- Efectuar la reposición de la infraestructura eléctrica que sufra algún daño, por causas no imputables a **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** siempre que el daño coloque el elemento en condiciones inservibles o hagan inviable su uso y la prestación de servicios por parte de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA.**
- Reparar o reponer por el valor comercial los bienes de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** que en desarrollo del presente contrato resulten dañados por causas imputables a **CENS**.
- Cumplir con las disposiciones que le apliquen y que se encuentran establecidas en la Resolución CREG 063 de 2013 y Resolución CREG 140 de 2014 o aquellas que las modifiquen o sustituyan.
- Permitir a **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** el retiro de la red apoyada en la infraestructura de propiedad de CENS, cuando **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** así lo requiera siempre que se haya dado a conocer el cronograma de desmonte respectivo.
- Informar a **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** cuando se requiera hacer cambios en el trazado de la línea con no menos de 7 días, en todo caso, cuando por causas excepcionales no sea posible cumplir dicho término, se informará en la mayor brevedad posible. Los costos por el traslado de la infraestructura eléctrica estarán a cargo de **CENS**, los costos por el traslado de los elementos de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** estarán a cargo de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA.**

Parágrafo 1. LAS PARTES serán responsables por todos los daños y perjuicios provocados al personal o a los bienes de propiedad de la otra parte o a terceros, que ocasionen sus dependientes o los de sus subcontratistas, previa la respectiva comprobación. En el evento de que la responsabilidad en los casos descritos sea imputable a una de **LAS PARTES**, ésta deberá asumir la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a la otra parte, así como el costo que ocasione la normalización o retiro de los elementos que hayan causado los daños o perjuicios.

Parágrafo 2. Según sea el caso, en el evento que se presente un daño en la infraestructura de **CENS** o de un tercero por causas atribuibles y comprobadas a **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** o de un tercero a su cargo, se define un plazo máximo de un (1) mes para el pago de los daños en cuestión

1618 a 1713

incluyendo el valor de los daños y/o perjuicios ocasionados a los clientes de **CENS**, so pena de la suspensión de permisos por parte de **CENS** de proyectos de expansión y/o montaje hasta que se solucione el problema, sin que ello implique la afectación de los usuarios de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA.** De igual forma, según sea el caso, en el evento que se presente un daño en la infraestructura de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** por causas atribuibles y comprobadas a **CENS** o de un tercero a su cargo, **CENS** tendrá un plazo máximo de un (1) mes para el pago de los daños y/o perjuicios en cuestión ocasionados a **MUNICIPIO DE BOCHALEMA**, incluyendo el valor de los daños y/o perjuicios ocasionados a los clientes de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA.**

DÉCIMA PRIMERA. Exoneración de responsabilidad.

CENS no asume ninguna responsabilidad por daños y perjuicios causados a terceras personas o trabajadores de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA,** derivados directa o indirectamente de la instalación o retiro de las redes y equipos por parte de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** cuando no le sean imputables. Así mismo, tampoco responderá por los daños que se ocasionen a las redes, equipos o servicios prestados por **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** ocasionados por terceros o debidos a fuerza mayor o caso fortuito. En especial, **CENS** tampoco asumirá ninguna responsabilidad por inadecuadas puestas a tierra que sean instaladas por **MUNICIPIO DE BOCHALEMA,** errores en la instalación de la red, fallas en la prestación del servicio, desacato de normas técnicas o el empleo de materiales inadecuados por parte de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA.**

MUNICIPIO DE BOCHALEMA, no asume ninguna responsabilidad por daños y perjuicios causados a terceras personas o trabajadores de la **CENS**, derivados directa o indirectamente de la instalación o retiro de las redes o equipos de propiedad de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** por parte de **CENS**, cuando no le sean imputables.

Parágrafo. En los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, la parte afectada procurará avisar a la otra parte el hecho que tenga tales connotaciones, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del mismo y ello dará lugar a que se aplique el régimen legal colombiano para los efectos que se generen por el hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito.

DÉCIMA SEGUNDA. Indemnidad.

- **LAS PARTES** se mantendrán indemnes, es decir, libres de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de actuaciones de la otra parte, de sus subcontratistas o dependientes. Por lo anterior, cada parte responsable asumirá todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, incluyendo pago de honorarios y costas del proceso, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones contempladas en el contrato.

  En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra una de las partes por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad de la otra parte se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o el contrato, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible.

- **LAS PARTES** asumen el riesgo por la pérdida o daño a bienes de su propiedad o que estén a su cargo. En consecuencia, declaran expresamente que se relevan de cualquier responsabilidad, obligación o reclamo, por razón de la pérdida o daño a dichos bienes,

incluyendo los causados por terceros, salvo si la causa que los origine se deba a culpa comprobada de **LA OTRA PARTE**.

- Después de la terminación del contrato por cualquier causa, **LAS PARTES** continuarán obligadas a mantenerse libres, defenderse e indemnizarse de todo perjuicio imputable a **LA OTRA PARTE** que llegare a sufrir, incluyendo pago de honorarios y costas del proceso, en caso de cualquier reclamación, demanda, acción o pretensión, sea que provenga de socios, empleados, agentes, funcionarios, proveedores o subcontratistas de **LA OTRA PARTE** o de terceros, por causas imputables a **LA OTRA PARTE** con ocasión de la ejecución del contrato.

- **LAS PARTES** tomarán las medidas del caso para no ocasionar daños ni perjuicios a las edificaciones, estructuras, tuberías, equipos, redes eléctricas o de telecomunicaciones, etc., siendo entendido que cualquier daño que sea imputable a **CADA PARTE** será reparado o indemnizado por éste.

DÉCIMA TERCERA. Garantías y Seguros. MUNICIPIO DE BOCHALEMA deberá constituir a favor de **CENS** las siguientes garantías.

Garantía de Cumplimiento

Por medio de este amparo se cubre a **CENS** contra los perjuicios patrimoniales que le cause **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** derivados del incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato asegurado, así como por los daños imputables a **MUNICIPIO DE BOCHALEMA.**
Este amparo comprende medidas de apremio provisionales y la cláusula penal pecuniaria que se hicieren efectivas. Aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por estos conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.
Deberá amparar una suma igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y deberá estar vigente durante la totalidad del plazo del contrato y seis (6) meses más.

La garantía de cumplimiento podrá ser amparada mediante una póliza de seguros o una garantía bancaria, emitida por una compañía de seguros o un banco, respectivamente.

La garantía se expedirá teniendo como asegurado/beneficiario a **CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.** NIT: 890500514-9.

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

La ASEGURADORA se obliga a indemnizar los perjuicios patrimoniales incluidos daño emergente y lucro cesante y extra patrimoniales incluido el daño moral y el perjuicio fisiológico o a la vida en relación que cause **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** en razón de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra, incluyendo la culpa grave, hasta el límite amparado siempre y cuando los hechos ocurran durante la vigencia de este seguro y se causen en virtud de la ejecución del contrato.

El límite asegurado será de doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMMLV), y la póliza deberá estar vigente durante la totalidad de la duración del contrato, y las prórrogas a las que haya lugar.

La póliza deberá incluir además del amparo básico PLO, los siguientes amparos y condiciones:

1620 a 1713

- Cobertura expresa de los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado tanto el daño emergente como el lucro cesante. Aplica sin sublímite.
- Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. Aplica sin sublímite.
- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas. Aplica sin sublímite.
- Responsabilidad Civil Patronal. Aplica sin sublímite.

La aseguradora deberá notificar por escrito a **CENS** la revocación o no renovación de la póliza con no menos de sesenta (60) días de antelación.

El sistema de contratación debe ser ocurrencia (sin limitaciones temporales para la presentación de la reclamación por parte del tercero diferentes a las de los términos de prescripción o caducidad de sus acciones contra los responsables).

Si **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** tiene una póliza para amparar su actividad comercial de manera global, podrá aportar copia de dicha póliza y un certificado otorgado por la aseguradora donde especifique que se cubre el contrato que se celebra, y certifique el límite asegurado, la vigencia y las coberturas adicionales abajo señaladas. Si la vigencia de dicha póliza termina con anterioridad al plazo de ejecución del contrato respectivo, **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** se obliga a traer la renovación de la póliza con el respectivo certificado que especifique el cubrimiento del contrato respectivo y mantener vigente dicha póliza durante todo el plazo del contrato y sesenta (60) días más.

Cuando se opte por esta última opción a la póliza se deberá adjuntar el recibo o certificado de pago de la prima y en todo caso, su aceptación por parte de **CENS** estará sujeta a la revisión de las condiciones otorgadas en dicha póliza y a que cubra el riesgo que se genera por la ejecución del contrato.
La póliza de responsabilidad civil extracontractual solo podrá ser otorgada por compañías de seguros.

En todos los casos en los que haya modificación del plazo y/o los precios del contrato, **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** deberá modificar el valor y/o el plazo de las garantías y seguros respectivos según corresponda, en la proporción correspondiente a los nuevos valores y plazos. Igualmente, cuando se presenten modificaciones en el contrato que no impliquen variación del valor estimado o del plazo, **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** deberá aportar la constancia de la comunicación a la compañía de seguros o al banco, según sea el caso, en la cual les notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

Condiciones de las pólizas emitidas por compañías de seguros

Las pólizas deberán ser emitidas por compañías de seguros legalmente constituidas en Colombia, bajo el clausulado para entidades particulares o para empresas de servicios públicos domiciliarios. Deberá figurar como asegurado y beneficiario **CENS**, y deberá ser constituida por **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del contrato. Esta garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

Condiciones de las garantías emitidas por entidades bancarias

Si se opta por otorgar una garantía bancaria (aval o carta de crédito Stand By) emitida por entidades bancarias, deberán reunir los siguientes requisitos:

- Deberán ser irrevocables y a la vista.

1621 a 1713

- Deberán ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificación deberá corresponder a la máxima calificación para el corto plazo y como mínimo la segunda mejor calificación para el largo plazo, según las escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.
- El garante debe haber renunciado al beneficio de excusión.
- La garantía bancaria deberá constituirse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la formalización del contrato y estar vigente por el término de duración del contrato y mínimo 30 días más.
- Deberán ser incondicional y a primer requerimiento o a primera demanda, sin que se exijan requisitos o formalidades adicionales a la reclamación presentada en español para su pago. En consecuencia, no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la manifestación de "Beneficiario" sobre el monto del incumplimiento.
- Se deberá indicar la sucursal del banco en la que se deberá presentar la reclamación.
- El banco deberá pagar la suma garantizada a más tardar en los 6 días bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago.
- La garantía podrá ser utilizada durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario, hasta completar el monto total de la misma.
- La garantía estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen por el Banco a petición del ordenante, los cuales deberán estar previamente aprobados por el beneficiario de la garantía. Toda modificación que se realice a la garantía inicial deberá presentarse bajo el mismo formato, y este reemplazará en su totalidad la garantía existente.

La garantía bancaria deberá especificar, la fecha de emisión, la vigencia, la cobertura que otorga, el valor garantizado, así como el número de solicitud de ofertas en el caso de la garantía de seriedad o el número del contrato garantizado para las garantías de cumplimiento.

DÉCIMA CUARTA. Cláusula penal pecuniaria. LAS PARTES acuerdan que en caso de que cualquiera de ellas incurra en un incumplimiento del contrato, bien sea de carácter parcial o total, la parte cumplida o que se allanó a cumplir tendrá derecho a cobrar a la parte incumplida una suma de dinero equivalente al diez por ciento (10%) del Valor total de Referencia del presente contrato a modo de sanción pecuniaria. Este valor se imputará como perjuicios anticipados y será exigible sin necesidad de requerimiento de ninguna índole, ya que ambas partes renuncian expresamente a él. Lo anterior sin menoscabo del inicio de las acciones correspondientes para el cobro de los perjuicios no cubiertos con esta cláusula penal. Así mismo, podrá exigirse al tiempo, el pago de la pena y el cumplimiento de la obligación.

DÉCIMA QUINTA. Control. CENS está facultada para verificar que la utilización de la infraestructura de propiedad de **CENS** por parte de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** se está haciendo de acuerdo con lo establecido en el objeto del presente contrato.

Parágrafo 1. En el evento que **CENS** encuentre que se está haciendo uso de infraestructura sin aprobación o autorización previa, **CENS** informará por escrito a **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** sobre tal situación, cobrará por los apoyos instalados por un equivalente a seis (6) meses de remuneración mensual por el acceso y uso de la infraestructura ocupada sin autorización, sin perjuicio de exigir el retiro inmediato y las demás acciones a que haya lugar, sin que ello implique la afectación a los

1622 a 1713

usuarios de los servicios de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** y al cumplimiento de la regulación vigente en materia de acceso.

Parágrafo 2. Si como resultado de la verificación se concluye u observa que **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** está utilizando la infraestructura objeto del contrato, en contravención a lo dispuesto por la Cláusula Segunda del mismo, esto constituirá un incumplimiento para todos los efectos a que haya lugar.

DÉCIMA SEXTA. Cesión del contrato. Ninguna de **LAS PARTES** podrá ceder el contrato, salvo autorización previa y escrita de la otra parte. La parte que reciba la solicitud deberá dar respuesta a la otra parte en un término no mayor de treinta (30) días hábiles. Si alguna de **LAS PARTES** cambia de naturaleza jurídica, se transforma, se fusiona, se escinde, se enajena o se vende total o parcialmente, con arreglo a lo estipulado por la legislación, se entenderá que el contrato continuará su ejecución y que los derechos y obligaciones contractuales seguirán en cabeza de quien, como consecuencia del cambio de naturaleza jurídica, de la transformación, de la fusión, de la escisión, de la enajenación o venta total o parcial, haya asumido la prestación de los servicios asociados a éste contrato y que correspondían a la parte que originalmente lo suscribió.

DÉCIMA SÉPTIMA. Relaciones entre LAS PARTES. Los términos de este contrato no dan lugar a la existencia entre **LAS PARTES**, de una asociación, sociedad, agencia o mandato. Como empresas independientes, cada parte cumplirá ante la otra con todas las obligaciones derivadas del presente contrato y responderá por sus propios actos, los de sus subordinados, empleados, agentes o subcontratistas. Este contrato no da lugar a que exista relación o vínculo laboral entre los empleados de una de **LAS PARTES**, con la otra parte. Las personas que intervengan por cada parte en la ejecución de este contrato estarán bajo su exclusiva responsabilidad como única empleadora o contratante, siendo de su cargo los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar, así como los honorarios o cualquier otra forma de remuneración.

DÉCIMA OCTAVA. Inexistencia de exclusividad en la utilización de la infraestructura. El presente contrato no le confiere a **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** el derecho a la utilización exclusiva de la infraestructura de **CENS**, por lo anterior y teniendo en cuenta los principios de libre competencia y no discriminación, **CENS** podrá celebrar acuerdos con terceros interesados que versen sobre la utilización de la misma infraestructura.

DÉCIMA NOVENA. Terminación del contrato. El presente contrato se podrá terminar por las siguientes causas: **1.** Por mutuo acuerdo. **2.** La imposibilidad de ejecución de este por caso fortuito o fuerza mayor, que persista durante un periodo superior a seis (6) meses. **3.** Por vencimiento del término de duración del contrato en las condiciones pactadas en la Cláusula Novena. **4. CENS** podrá dar por terminado el contrato en forma unilateral, en los siguientes eventos: **4.1** Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo exija. **4.2** Cuando se dé la disolución y liquidación de la persona jurídica de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA 4.3** En caso de realización de actividades por parte de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** que excedan el objeto del contrato y/o excedan las autorizaciones otorgadas por **CENS** para la utilización de la infraestructura de **CENS**. **4.4** Por la existencia de un embargo judicial sobre bienes de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA**, cesación de pagos o concurso de acreedores de la misma, que afecten de manera grave el cumplimiento del presente contrato. **4.5** Por incumplimiento grave de alguna de las normas técnicas incorporadas en el presente contrato o demás normas aplicables. **4.6** Por ceder el presente contrato sin autorización de **CENS. 4.7** Por el incumplimiento de las obligaciones esenciales a cargo de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA 4.8** Por la no constitución o ampliación de las garantías de que trata la cláusula Décima Tercera. **4.9**. El no pago oportuno por parte de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** del valor convenido por la prestación del servicio de uso de infraestructura, durante

1623 a 1713

tres (3) o más periodos de facturación consecutivos **5. MUNICIPIO DE BOCHALEMA** podrá dar por terminado el contrato en forma unilateral, en los siguientes eventos: **5.1**. En cualquier momento previo aviso a **CENS** con noventa (90) días de antelación a la fecha efectiva de terminación, sin que haya lugar al pago de suma alguna adicional o de indemnización a favor de **CENS. 5.2** Por el incumplimiento de las obligaciones esenciales a cargo de **CENS.**

Parágrafo. La terminación a que se refieren los numerales 4.3, 4.5 y 4.7, operará sin perjuicio del derecho de **CENS** de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y de obtener el pago de los perjuicios que no queden cubiertos con ésta.

VIGÉSIMA. Liquidación del contrato. Cuando se presente alguno de los eventos previstos en la cláusula de terminación del presente contrato, la liquidación del mismo estará a cargo y bajo responsabilidad de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA**, mediante la conciliación, determinación y cancelación de los saldos a favor de cada parte y el retiro de redes a que haya lugar por parte de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** o **CENS** acordará acciones de desmonte de las redes de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA**. Lo anterior se consignará en un acta de liquidación y retiro de redes, la cual deberán suscribir LAS PARTES en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de la terminación del contrato, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula de duración del contrato. El acta de liquidación prestará mérito ejecutivo en cuanto en ella consten obligaciones claras, expresas y exigibles a favor de cualquiera de LAS PARTES. Si no hay acuerdo para la liquidación, se acudirá al procedimiento de solución de diferencias establecido en el contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. Procedimiento para la solución de diferencias. LAS PARTES buscarán solucionar, en forma ágil y directa, las diferencias que surjan de la interpretación, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del presente contrato. Para el efecto, se acuerda el siguiente procedimiento de solución de controversias: **a)** En primera instancia, las diferencias serán sometidas al conocimiento de las partes, las cuales disponen de un término máximo de treinta (30) días calendario para solucionar directa y amigablemente, tales diferencias. **b)** Si agotada la etapa anterior, subsisten diferencias, se acudirá a la justicia competente.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Propiedad y confidencialidad de la información. La información escrita o verbal que se entreguen **LAS PARTES** y que se indique como confidencial durante la ejecución del contrato, será por regla general de carácter privado y deberá manejarse de manera reservada y confidencial por la parte que la recibe. La información confidencial o reservada solo podrá ser utilizada para el propósito de adelantar la ejecución del presente contrato. Esta información se podrá dar a conocer únicamente a aquellos empleados y dependientes que deban conocerla para fines de la ejecución del contrato. La violación de la confidencialidad o el uso indebido de la información dará lugar a que se cause el derecho de reclamar indemnización por la parte perjudicada a la otra parte. La información se mantendrá como confidencial aún después de terminado el contrato y hasta por un (1) año más. Ninguna parte adquirirá derechos de propiedad o disposición respecto de la información suministrada por la otra parte. La parte que adquiera información de la otra parte se abstendrá de utilizarla cuando tenga por objeto o como efecto incrementar sus prestaciones comerciales o disminuir la competencia en el respectivo servicio o mercado.

VIGÉSIMA TERCERA. Ley aplicable y cambios en la legislación. El presente contrato se rige por las leyes vigentes en la República de Colombia. Quedan igualmente incorporadas las normas expedidas por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del presente contrato se expiden, promulgan o en cualquier forma se producen cambios en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos del Contrato y los derechos que ahora se

1624 a 1713

adquieren y contraen, **LAS PARTES** expresamente aceptan que estas modificaciones se entenderán incorporadas al Contrato sin que se requiera modificación alguna.

VIGÉSIMA CUARTA. Anexos. Forman parte integral de este contrato el Anexo Técnico y los Proyectos.

VIGÉSIMA QUINTA. Impuestos, tasas, contribuciones y derechos. Los tributos del orden internacional, nacional, distrital y territorial que se causen con ocasión de la celebración del presente contrato estarán a cargo de quien, conforme a los tratados, leyes, ordenanzas departamentales, acuerdos municipales y distritales vigentes en Colombia, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la celebración del presente contrato y la práctica de las retenciones que resulten aplicables, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en los tratados, leyes, ordenanzas departamentales, acuerdos municipales y distritales colombianos vigentes.

Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las propuestas el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle a **CENS** los mayores costos o hacerle las deducciones a que haya lugar.

VIGÉSIMA SEXTA. Domicilio. Para todos los efectos, **LAS PARTES** manifiestan que su domicilio es la ciudad de Cúcuta.

VIGESIMA SÉPTIMA. Inhabilidades e incompatibilidades. Las partes manifiestan que no se encuentran incursas en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las Leyes.

VIGÉSIMA OCTAVA. Prevención de lavado de activos: LAS PARTES declaran bajo la gravedad del juramento lo siguiente:

a) Que, sus ingresos o bienes no provienen de ninguna actividad ilícita contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia, declaran que sus ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias de su objeto social en el caso de personas jurídicas o del ejercicio de su profesión u oficio en el caso de personas naturales.

a) Que, no han efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades.

b) Que los recursos o bienes objeto del presente contrato, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.

c) Que, en la ejecución del presente contrato, ninguna de **LAS PARTES** se abstendrá de tener vínculos con terceros que se conozca por cualquier medio estén vinculados a actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, fraude, corrupción y/o soborno.

1625 a 1713

d) Que, **LAS PARTES** cumplen con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), fraude, corrupción y/o soborno que le resulten aplicables, teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al Lavado de activos o financiación del terrorismo, prevención del fraude, corrupción y/o soborno que se derivan de dichas disposiciones legales.

e) Que, ninguna de **LAS PARTES** ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni sus representantes legales, ni sus Revisores Fiscales, ni sus Auditores Externos y miembros de Junta Directiva, se encuentran en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude, corrupción y/o soborno (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-), estando **LA OTRA PARTE** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes, y que no existan en contra de ellos una sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción y/o soborno, o que se encuentren vinculados a investigaciones penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción y/o soborno.

f) Que no existe en contra de ninguna de **LAS PARTES** ni de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni de sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, ni de sus Revisores Fiscales o Auditores Externos, una sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o que se encuentren vinculados a investigaciones penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, no existe información pública con respecto a tales personas que exponga a **LA OTRA PARTE** a riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo fraude, corrupción o soborno, estando **CADA PARTE** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales.

VIGÉSIMA NOVENA. Deber de información: MUNICIPIO DE BOCHALEMA se obliga a entregar la información veraz y verificable para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año.

De la misma forma, **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** deberá informar a **CENS** del inicio de cualquier proceso penal, sin importar si se encuentra en etapa de investigación o juicio, que lleve a cabo la autoridad competente en donde **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** esté involucrada en el proceso, así como cualquier citación que le realice dicha autoridad para que comparezca dentro de una investigación o proceso penal, sin importar en la calidad que sea citado.

TRIGÉSIMA. Buena Fe Exenta de Culpa: CENS declara que dentro del proceso de contratación cumplió con las obligaciones establecidas en la normatividad que le aplica relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), así como con los procedimientos internos establecidos en esta materia. En consecuencia, **CENS** en la

suscripción del presente contrato obró con la máxima diligencia establecida en la normatividad aplicable y sus procedimientos internos relacionados con esta materia.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Perfeccionamiento y formalización. El presente contrato se perfecciona con la suscripción por **LAS PARTES** del presente documento. Para su formalización se requiere la previa aprobación por parte de **CENS** de las garantías a que se hace referencia en la Cláusula Décima Tercera; la certificación de cumplimiento del pago de las obligaciones de seguridad social y parafiscales, y la consulta por **CENS** de no reporte de **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** en el Boletín de responsables Fiscales.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Mérito Ejecutivo. El presente contrato, y su anexo Técnico, presta mérito ejecutivo para hacer exigibles las obligaciones y prestaciones contenidas en él. En consecuencia, **LAS PARTES** acuerdan en forma expresa, que una copia autógrafa del mismo, junto con las facturas enviadas constituirá título ejecutivo suficiente para que se exija por la vía judicial el cumplimiento de las obligaciones dinerarias.

Para constancia, se firma por cada una de las partes en las fechas indicadas.

WILLIAM MONDRAGÓN VILLAMIZAR
JEFE ÁREA GESTIÓN COMERCIAL
CENS
Fecha: 06 de mayo de 2024

RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA
ALCALDE
MUNICIPIO DE BOCHALEMA
Fecha: 06 de mayo de 2024

ANEXO N° 22 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL MUNICIPIO

ACTA RECIBIDO FINAL A SATISFACCION DEL PROYECTO CCTV CONTRATO LP-003-2023 MUNICIPIO DE BOCHALEMA – NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CM-004-2023	
OBJETO:	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1612 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - CON EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE BOCHALEMA – NORTE DE SANTANDER
INTERVENTORIA:	IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BOCHALEMA
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA FINALIZACION:	30 DE JUNIO DE 2024 (SEGÚN ADENDA MODIFICATORIA No.002-2024)
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS MCTE ($150.047.100)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No. LP 003-2023	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BOCHALEMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIES 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"

Alcaldía de Bochalema Norte de Santander	COMUNICACIÓN EXTERNA Alcaldía Municipal ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	1 de 1

VALOR DEL CONTRATO:	MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($1.737.279.281) MCTE
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA FINALIZACION:	30 DE JUNIO DE 2024 (SEGÚN ADENDA MODIFICATORIA No.002-2024)
SUPERVISOR MUNICIPIO:	SECRETARIA PLANEACIÓN
INTERVENTORÍA:	IVAN MAURICIO BRITO MEJIA

OBJETIVO: Recibir a satisfacción mediante el cumplimiento de la ejecución del proyecto para el Municipio de Bochalema – Norte de Santander, el cual se encuentra enmarcado en el contrato N°LP-003-2023 cuyo objeto es: "BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II" de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Interventoría N° CM-004-2023, celebrado entre el Municipio de Bochalema y Iván Mauricio Brito Mejía.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 30 de mayo de 2024, en las instalaciones de la Estación de Policía del Municipio de Bochalema se reunieron los abajo firmantes con el fin de llevar a cabo la entrega final de la ejecución del proyecto Circuito Cerrado de Televisión – CCTV del Municipio de Bochalema, de acuerdo con lo establecido en el Contrato LP-003-2023 suscrito entre el Municipio de Bochalema y el Consorcio SIES 2023.

AGENDA DE LA REUNIÓN.

1. Verificación de pruebas de instalaciones técnicas operativas del punto a punto correspondiente a las especificaciones técnicas del sistema CCTV implementado en el Municipio de Bochalema– Norte de Santander.

1630 a 1713

2. Verificación del inventario pormenorizado de los equipos, elementos y demás materiales o dispositivos que conforman el sistema CCTV implementado en el Municipio de Bochalema– Norte de Santander.

3. Protocolo de pruebas del sistema general, documento que se anexa con los protocolos de pruebas realizados sin pendientes operativos y no operativos.

4. Verificación de los entregables, carta de empalme de fibra, certificación de fibra óptica (Pruebas OTDR), certificación del cableado estructurado, acta de verificación SPT y certificación de entrega de manuales, acta de verificación obras planta externa y toda la documentación exigida en los entregables del proyecto.

5. Cuadro económico final.

6. Levantamiento de los pendientes operativos y no operativos.

7. Conclusiones, acuerdos y compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DE PRUEBAS DE INSTALACIONES TÉCNICAS OPERATIVAS DEL PUNTO A PUNTO CORRESPONDIENTE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA CCTV IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DE BOCHALEMA– NORTE DE SANTANDER.

La verificación se realizó el día 30 de mayo de 2024, en presencia de la Interventoria IVAN MAURICIO BRITO MEJIA y CONSORCIO SIES 2023 comprobando punto a punto las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. De acuerdo con los resultados de la verificación se da por recibido el cumplimiento a satisfacción de todos los requerimientos del punto a punto del sistema CCTV.

2. VERIFICACIÓN DE INVENTARIO. La Interventoría IVAN MAURICIO BRITO MEJIA realizó la verificación del inventario de todos los componentes instalados en centro de control y monitoreo, cuarto de equipos y puntos de cámara.

- VERIFICACIÓN INVENTARIO EQUIPOS Y ELEMENTOS CUARTO DE EQUIPOS.
- VERIFICACIÓN INVENTARIO EQUIPOS EN PUNTOS DE CÁMARA.

3. PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SISTEMA GENERAL. El objetivo de las pruebas es corroborar el funcionamiento y operatividad del del sistema CCTV del Municipio de Bochalema.

Se anexan resultados del protocolo de pruebas realizados entre los días 20 al 30 de mayo de 2024, de acuerdo con los protocolos definidos para las "PRUEBAS SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA SIES- SUBSISTEMA CCTV sin ningún pendiente operativo y no operativo.

4. VERFICACIÓN ENTREGABLES.

DESCRIPCIÓN	CUMPLE
Certificación de cableado estructurado	CUMPLE
Pruebas OTDR	CUMPLE
Carta de empalmes	CUMPLE
Acta de verificación puntos de cámara y estación de policía.	CUMPLE
Acta de verificación obras planta externa	CUMPLE
Entrega de manuales	CUMPLE
Capacitaciones operativas y técnicas	CUMPLE
Entregables documentales del proyecto	CUMPLE

5. CUADRO ECONÓMICO FINAL.

Los abajo firmantes verificaron que las cantidades del cuadro económico corresponden a las cantidades contratadas e instaladas. (Se adjunta cuadro cantidades finales)

6. PENDIENTES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS.

1632 a 1713

Se entiende por pendientes operativos aquellos que limitan el correcto funcionamiento del subsistema CCTV y por pendientes no operativos, aquellos que no limitan el correcto funcionamiento del subsistema CCTV.

Para el presente proyecto, no se tienen pendientes operativos.

7. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

- El CONSORCIO SIES 2023 entrega el subsistema CCTV del Municipio de Bochalema– Norte de Santander, bajo las condiciones del contrato N°LP-003-2023 suscrito entre el MUNICIPIO DE BOCHALEMA y el CONSORCIO SIES 2023.
- A partir de la suscripción de la presente acta se da por entendido que el subsistema CCTV del Municipio de Bochalema– Norte de Santander, queda totalmente operacional para su funcionamiento por parte de la Policía Nacional.
- Con base a esta acta, el CONSORCIO SIES 2023 entregará al municipio de Bochalema la información correspondiente a los equipos activos del proyecto con el fin de que este incluya dentro de la póliza todo riesgo existente el subsistema CCTV del Municipio de Bochalema– Norte de Santander la cual debe estar vigente durante los dos (2) años de garantía y soporte Técnico contratados.
- El CONSORCIO SIES 2023 capacitará durante el tiempo de mantenimiento y garantía a los operadores del subsistema CCTV del Municipio de Bochalema– Norte de Santander cuando por decisión de la institución sean cambiados o trasladados.
- Una vez finalizados los dos (2) años de garantía y mantenimiento, es responsabilidad Municipio de Bochalema– Norte de Santander, la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo que garantice el buen funcionamiento del sistema, dado que es una herramienta fundamental para la seguridad del municipio.
- El CONSORCIO SIES 2023 de acuerdo al Contrato N°LP-003-2023 se obliga a realizar el servicio posventa para la totalidad del sistema y sus componentes como lo indican las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones.

1633 a 1713

Alcaldía de Bochalema Norte de Santander	COMUNICACIÓN EXTERNA Alcaldía Municipal ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	1 de 1

Para constancia se firma por las partes intervinientes el 30 de mayo de 2024.

NOMBRE: IVAN MAURICIO BRITO MEJIA DIRECTOR INTERVENTORIA	RAFAEL PABON LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SIES 2023
ROLANDO RAMIRO VILLAMIZAR PABON INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO SIES 2023	ANDERSON JHOAN CONTRERAS COORDINADOR DEL PROYECTO CONSORCIO SIES 2023
JHONATTAN JOSE BOADA ORTEGA SUPERVISOR DESIGNADO SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPIO DE BOCHALEMA	T.E. ELKIN LEON JOAQUI BURBANO TELEMATICA DENOR

ANEXO N° 23 INFORME SST

COMUNIP INGENIERIA	**INFORME MENSUAL SST**
	CONTRATO DE INTERVENTORIA CONCURSO DE MERITOS CM-004 DE 2023

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 007



CONTRATO N°	CM-004 DE 2023
OBJETO:	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA LA IMLEMENTACION DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1612 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - CON EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE BOCHALEMA – NORTE DE SANTANDER."
CONTRATISTA:	IVAN MAURICIO BRITO MEJIA- COMUNIP INGENIERIA
IDENTIFICACION:	C.C N° 9.729.480 de Armenia
PERIODO REPORTADO:	INFORME MES DE MAYO 2024
ELABORADO POR:	MARIA ALEJANDRA MIRANDA MEZA C.C. 1090497669 DE CUCUTA PROFESIONAL SST- RESOLUCION SST: No. 2035/2023

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar los registros de supervisión, seguimiento y control del cumplimiento a los compromisos establecidos en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, por el contratista IVAN MAURICIO BRITO MEJIA en el contrato de interventoría CM-004 de 2023; para el seguimiento del contrato de obra del CONSORCIO SIES 2023 contrato N° LP-003-2023, durante el periodo inicial comprendido entre el 28 de noviembre del 2023 al 27 de febrero del 2024 y su prorroga comprendida entre el 28 de febrero hasta el 30 de abril del 2024

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades SST por parte del contratista y el seguimiento a estas por parte de la Interventoría.
- Verificar y validar el seguimiento de la totalidad de las actividades SST dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, leyes, decretos, resoluciones, normas, manuales y guías de seguridad y salud en el trabajo vigente para el contrato.
- Propender porque durante el desarrollo del contrato se implementen las medidas de manejo de SST por parte del contratista.
- Verificar el cumplimiento en los soportes de pagos de seguridad social y nómina del personal de los contratistas y el contrato de Interventoría.
- Describir las actividades de SST que se desarrollarán durante el periodo evaluado; los cuales se dividirán por componentes y programas de acuerdo con lo establecido en el plan de acción SST de la interventoría y de los Contratistas, junto con lo establecido en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. CONTRATO DE OBRA

2.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

En la tabla 1, se incluye la información general del contrato de interventoría

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BOCHALEMA
SUPERVISOR:	LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ.
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO:	CM-004 de 2023
CONTRATISTA:	IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA LA IMLEMENTACION DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1612 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE

1637 a 1713

	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - CON EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE BOCHALEMA – NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS MCTE ($150.047.100)
PLAZO:	TRES (3) MESES.
ACTA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	28 DE FEBRERO DEL 2024
PRORROGA AL PERIODO INICIAL:	29 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

3. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.1. ASPECTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.1.1. Proceso de Planificación y liderazgo de la alta dirección.

El Contratista de obra, diseñó y estructuró el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST para el CONTRATO DE SUMINISTRO No. LP-003-2023, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo, y preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

La interventoría, en su función de seguimiento a la aplicación del SG SST de los contratistas de obra CONSORCIO SIES 2023 contrato N° LP-003-2023, realizó la verificación de su implementación, a través de las medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presentes en la ejecución de los contratos de obra en el periodo del presente informe.

3.1.2. Contratación del Personal

En este periodo la interventoría no realizó ingreso de personal contratista, sin embargo, se realiza el pago al sistema general de seguridad social de todo el personal activo, como se evidencia en el **Anexo 1.** Afiliaciones y pago seguridad social interventoría.

Tabla 2. Personal activo Interventoría, mayo de 2024.

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	Iván Mauricio Brito mejía	9.729.480	Director
2	Ronald Joan burgos Salazar	1.013.577.347	residente civil
3	Edgardo Andrés Olier Henao	9.738.072	residente
4	María Alejandra miranda meza	1.090.497.669	SISO

Fuente: IVAN MAURICIO BRITO MEJIA- COMUNIP INGENIERIA

1638 a 1713

3.1.3. Contratación del Personal Consorcio SIES 2023

La interventoría en su función verificadora, realizo el seguimiento de todo el personal por parte del contratista de obra conforme todas las etapas ejecutadas dentro del contrato N° LP-003-2023.

El CONSORCIO SIES realizo ingreso y retiro de personal de manera directa e indirecta mediante la subcontratación de personal para la ejecución de las actividades de obra. Por parte de la interventoría, se realizó la verificación de los soportes de afiliación a la seguridad social del periodo validado en el presente informe. Anexo 3. Planilla de aportes.
A continuación, se relaciona el personal subcontratado para el desarrollo de obra civil, así mismo se evidencia el pago y el retiro del personal para el mes de marzo del 2024.

Tabla 3. Personal subcontratado.

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	Diego armando canon paredes	1090436254	Maestro
2	Luis Felipe ortega uron	88238780	Ayudante
3	Jose Luis velasquez quintero	1093758816	Ayudante
4	Yecson Humberto velasquez quintero	6664414	Ayudante



Fuente: CONTRATISTA OBRA CIVIL JOSE NICOLAS ALVARADO.

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	EDWIN OMAR BOHORQUEZ MOLINA	1004808208	Linieros
2	JORGE ARMANDO MOLINA QUINTERO	1090390447	Linieros
3	ZAID FABIAN OSUNA CLAVIJO	1090434543	Linieros

1639 a 1713




Fuente: ENLACE REDES Y CONEXIONES SAS NIT:901801227

El contratista no realizó ingreso de personal directamente, pero realizo el pago al sistema general de seguridad social correspondiente al mes de abril del personal activo, como se evidencia en el Anexo 2. Afiliaciones y pago seguridad social.

Tabla 4. Personal activo del contratista de obra

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	Rafael Pabón López	88.269.550	Director
2	Rolando Ramiro Villamizar Pabón	1.094.271.057	Residente
3	Ana Bolena Meza Mora	37.273.128	Residente civil
4	Anderson Johan Contreras Garzón	13.279.288	Coordinador
5	Henry Alexander Castro Celis	88.211.168	SISO

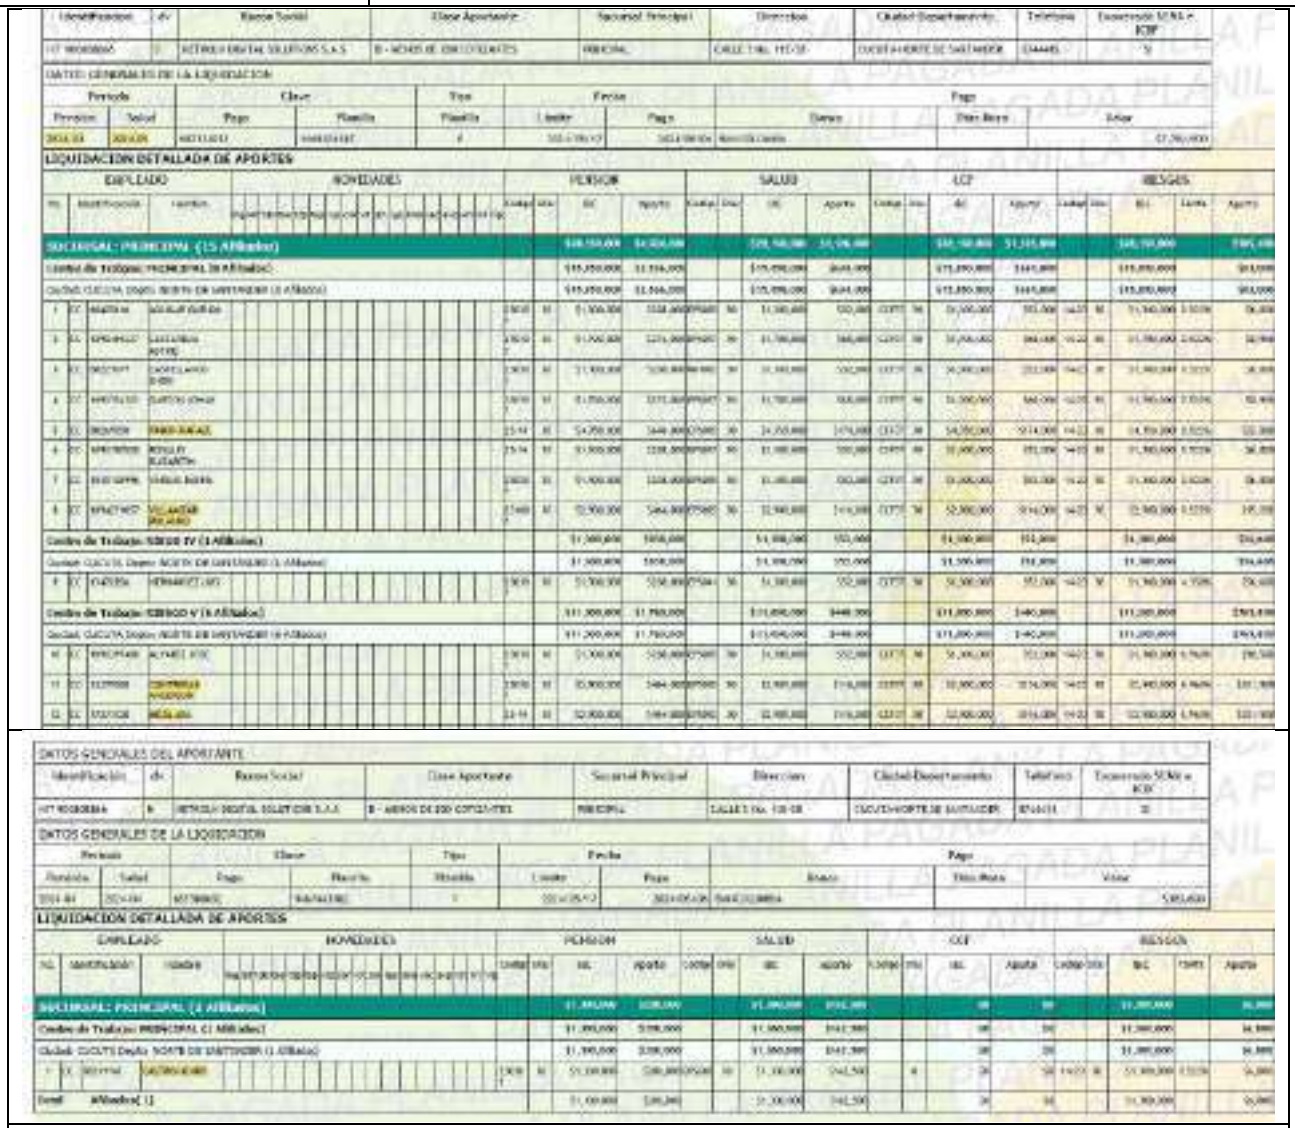1640 a 1713



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901000864	6	RETOLA DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	B - APORTE DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 13No. 10-58	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744411	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	ASISTIDO	5485154187	E	2024-05-10	2024-05-06	Banco de Occidente		$7,780,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombre		Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Tarifa	Aporte
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)						$28,350,000	$4,304,500			$29,148,000	$3,496,800			$25,150,000	$3,015,800			$26,750,000		$385,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)						$15,050,000	$2,304,000			$15,696,000	$844,000			$13,850,000	$1,661,800			$15,050,000		$216,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (15 Afiliados)						$15,050,000	$2,304,000			$15,696,000	$844,000			$13,850,000	$1,661,800			$15,050,000		$216,800
1	CC	MARTIN		30/30	X	$1,500,000	$228,000	30/30	X	$1,500,000	$120,000	30/30	X	$1,500,000	$180,000	30/30	X	$1,500,000	0.522%	$7,830
2	CC	[illegible]		30/30	X	$1,500,000	$228,000	30/30	X	$1,500,000	$120,000	30/30	X	$1,500,000	$180,000	30/30	X	$1,500,000	2.422%	$36,330
3	CC	[illegible]		30/30	X	$1,500,000	$228,000	30/30	X	$1,500,000	$120,000	30/30	X	$1,500,000	$180,000	30/30	X	$1,500,000	0.522%	$7,830
4	CC	[illegible]		30/30	X	$1,500,000	$228,000	30/30	X	$1,500,000	$120,000	30/30	X	$1,500,000	$180,000	30/30	X	$1,500,000	0.522%	$7,830
5	CC	[illegible]		30/30	X	$1,500,000	$228,000	30/30	X	$1,500,000	$120,000	30/30	X	$1,500,000	$180,000	30/30	X	$1,500,000	0.522%	$7,830
6	CC	[illegible]		30/30	X	$1,500,000	$228,000	30/30	X	$1,500,000	$120,000	30/30	X	$1,500,000	$180,000	30/30	X	$1,500,000	0.522%	$7,830
7	CC	[illegible]		30/30	X	$1,500,000	$228,000	30/30	X	$1,500,000	$120,000	30/30	X	$1,500,000	$180,000	30/30	X	$1,500,000	0.522%	$7,830
8	CC	[illegible]		30/30	X	$1,500,000	$228,000	30/30	X	$1,500,000	$120,000	30/30	X	$1,500,000	$180,000	30/30	X	$1,500,000	0.522%	$7,830
Centro de Trabajo: CODIGO IV (4 Afiliados)						$7,500,000	$960,000			$7,500,000	$600,000			$7,500,000	$900,000			$7,500,000		$39,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)						$7,500,000	$960,000			$7,500,000	$600,000			$7,500,000	$900,000			$7,500,000		$39,000
9	CC	[illegible]		30/30	X	$1,500,000	$228,000	30/30	X	$1,500,000	$120,000	30/30	X	$1,500,000	$180,000	30/30	X	$1,500,000	0.522%	$7,830
Centro de Trabajo: CODIGO V (4 Afiliados)						$11,000,000	$1,760,000			$11,000,000	$880,000			$11,000,000	$1,320,000			$11,000,000		$143,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)						$11,000,000	$1,760,000			$11,000,000	$880,000			$11,000,000	$1,320,000			$11,000,000		$143,000
10	CC	[illegible]		30/30	X	$1,500,000	$228,000	30/30	X	$1,500,000	$120,000	30/30	X	$1,500,000	$180,000	30/30	X	$1,500,000	0.522%	$7,830
11	CC	[illegible]		30/30	X	$1,500,000	$228,000	30/30	X	$1,500,000	$120,000	30/30	X	$1,500,000	$180,000	30/30	X	$1,500,000	0.522%	$7,830
12	CC	[illegible]		30/30	X	$1,500,000	$228,000	30/30	X	$1,500,000	$120,000	30/30	X	$1,500,000	$180,000	30/30	X	$1,500,000	0.522%	$7,830

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901000864	6	RETOLA DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	B - APORTE DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 13No. 10-58	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744411	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	ASISTIDO	5485154187	E	2024-05-10	2024-05-06	Banco de Occidente		$7,780,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombre		Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Tarifa	Aporte
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,000	$228,000			$1,400,000	$112,000			$0	$0			$1,400,000		$16,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,000	$228,000			$1,400,000	$112,000			$0	$0			$1,400,000		$16,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$1,400,000	$228,000			$1,400,000	$112,000			$0	$0			$1,400,000		$16,800
1	CC	[illegible]		30/30	X	$1,500,000	$228,000	30/30	X	$1,500,000	$120,000	0/30	X	$0	$0	30/30	X	$1,500,000	0.522%	$7,830
Total	Afiliados: 1					$1,500,000	$228,000			$1,500,000	$120,000			$0	$0			$1,500,000		$7,830

Fuente: CONSORCIO SIES 2023 con NIT: 901770539-9

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



La interventoría realizado el acompañamiento al CONSORCIO SIES 2023 desde el inicio de la fase II IMPLEMENTACIÓN, verificando siempre que el personal contara con los elementos de protección personal suministrados por el contratista, acorde a la actividad que realiza cada uno y con la suficiencia de EPP para todo el personal activo; ya que estos elementos deben ser de uso individual y no podrán ser intercambiables.

INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Dotación para obra civil



Dotación para trabajo de alturas





- Los EPP se utilizaron como parte del programa de gestión de seguridad industrial del CONSORCIO SIES 2023, el cual abarco la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, su formación y la educación de los empleados que los llevaron durante las distintas actividades a desarrolladas.
- Los EPP son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Minimizando la exposición a este en conjunto con la aplicación de controles.

1642 a 1713

PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION SG-SST







- El Consorcio SIES 2023 explico en sus inducciones y/o capacitaciones todo lo relacionado a la seguridad y la salud en el trabajo, a cargo del profesional Henry Alexander Castro Celis y cuyo objetivo se centró en la prevención y el auto cuidado mediante charlas de 5 min a todo el personal.

AISLAMIENTO DE LA OBRA, DEMARCACION DE AREAS Y SEÑALIZACION

- En el desarrollo de la obra se observó el cumplimiento por parte del contratista en la prevención de riesgos mediante la demarcación de las áreas con la finalidad de incrementar la seguridad del personal, la población y proteger el patrimonio y bienes en general mediante la instalación de señales y avisos, con el propósito de que los trabajadora y la población identificaran los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación.

1643 a 1713

		
Fotografia: Aislamiento de la obra en desarrollo de actividades de riesgo alto	**Fotografia:** elementos para emergencias	**Fotografia:** Señalizacion ruta de evacuacion
TRABAJO EN ALTURAS		
		
Soportes documentales	Idoneidad del personal	Uso de epps acorde a la actividad

- El contratista desarrolla el programa de seguridad y salud en el trabajo, mediante el diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas que, para la verificación y control de todos los aspectos relacionados en la resolución 4272 de 2021, permitiendo prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de la actividad
- Se valido la idoneidad del personal para la ejecucion de las distintas actividades y/o trabajo en altura

INSPECCION FINAL ORDEN Y ASEO









Se evidencio que el área principal del circuito cerrado de televisión del comando de la policía nacional de Bochalema se encontraba en óptimas condiciones en cuanto al orden y aseo de las áreas.

INSPECCION DE LOS PUNTOS DE INTERVENCION



PUNTO 22



PUNTO 20



PUNTO 19

1645 a 1713

 PUNTO 18	 PUNTO 15	 PUNTO 16
 PUNTO 17	 PUNTO 21	 PUNTO 10

1646 a 1713



PUNTO 12



PUNTO 24



PUNTO 25



PUNTO 27



PUNTO 26



PUNTO 9



PUNTO 29



PUNTO 28



PUNTO 23

1647 a 1713

		
PUNTO 11	PUNTO 14	PUNTO 13
• Se realizaron inspecciones a todos los puntos intervenidos para validar las condiciones finales para la entrega de la obra, esto con la finalidad de verificar que no existe riesgo alguno para la poblacion vinculada directa o indirectamente al proyecto. • Estos espacios se encontraron despejados de residuos propios de la obra y se pudo evidenciar a los puntos fueron terminados en su totalidad		

5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Interventoría durante el periodo realizó seguimiento al plan de seguridad del contratista, evidenciando en otras, las siguientes actividades:

- Idoneidad del personal contratado para las distintas etapas
- Afiliaciones del personal de la obra y pago de seguridad social
- Supervisión del uso adecuado de los EPP´s.
- Programa de inducción y capacitación de Trabajo seguro
- Inspección y dotación
- Programa de promoción y prevención (hidratación de personal)
- señalización y delimitación de los puntos de trabajo
- programa de cero papeles
- seguimiento a la disposición de los residuos solidos
- puntos de intervención
- revisión preoperacional de vehículos, grúa izaje, entre otros
- revisión de documentación de vehículos
- plan seguridad vial - control de prevención vial
- bloqueo de vias
- identificación de productos químicos y etiquetado y rotulado
- demarcación de areas
- revisión preoperacional de herramientas

Durante el periodo de tiempo evaluado en la presente obra, la interventoría velo porque se cumplieran todas las normatividades vigentes sobre seguridad industrial, y se exigió

1648 a 1713

permanentemente al contratista el cumplimiento de estas con el personal a su cargo durante el desarrollo de la obra. Se superviso la prevención de accidentes en cuanto a riesgo y prevención; Se exigió en todo momento la utilización de implementos personales de seguridad según la actividad desarrollada por el personal.

La interventoría realizo un continuo seguimiento a los trabajos realizados y a la forma como se emplearon los materiales

En la ejecución de los trabajos no se presentaron condiciones negativas de orden público, por el contrario, se observó la colaboración y agradecimiento por parte de la comunidad en el desarrollo de la obra en los distintos puntos que fueron intervenidos.

La obra se concluyó según las instrucciones dadas por el director, residentes de obra y la supervisión permanente de la interventoría. Se realizo el debido seguimiento técnico durante toda la ejecución de las obras en los distintos frentes de trabajo

COMUNIP INGENIERIA	**INFORME MENSUAL SST**
	CONTRATO DE INTERVENTORIA CONCURSO DE MERITOS CM-004 de 2023



Anexo 1. INTERVENTORIA

Afiliaciones:(ARL- EPS- AFP)

Planilla de seguridad social

- Iván Mauricio Brito mejía
- Ronald Joan burgos Salazar
- Edgardo Andrés Olier Henao
- Maria Alejandra Miranda Meza

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9729480
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CLLE 21 NORTE #9-65	TELÉFONO:	7349563
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7919086003**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	576788907

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSION									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 9729480	BRITO MEJIA IVAN MAURICIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	9729480	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 377.300**

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-9738072 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	18	208.000	3.000	211.000
Período salud:	2024-04	EPS010	800088702	EPS SURA	1	18	162.500	2.400	164.900
Planilla Nro.:	29499337 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	18	6.800	100	6.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-06-07	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	689613964	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 382.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	18	112.000	1.700	113.700
Período salud:	2024-04	EPS010	800088702	EPS SURA	1	18	87.500	1.300	88.800
Planilla Nro.:	30099730 Tipo N	14-23	860011153	POSITIVA	1	18	3.700	100	3.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	18	0	0	0
Fecha transacción:	2024-06-07	PASENA	899999034	SENA	0	18	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	18	0	0	0
Transacción:	689635713	PAESAP	899999054	ESAP	0	18	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	18	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 206.300

PAGADO

RAZÓN SOCIAL :	JUAN SEBASTIAN ECHEVERRY HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1096040442
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-23
FECHA DE PAGO:	2024-05-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29738269
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29738269
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 200.000	$ 202.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 256.000	$ 258.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 500	$ 39.000	$ 39.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 495.000	$ 500.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/06/2024

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA ALEJANDRA MIRANDA MEZA identificado(a) con CC 1090497669 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MIRANDA MEZA MARIA ALEJANDRA CC 1090497669

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-04	2024-04	673087407	9467909026	I	2024-05-31		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,300,000	$31,700
EPS	SANITAS	30	12.5%	$1,300,000	$162,500

Este certificado se expide el día 2024-06-07 a las 02:15.



Anexo 2. CONTRATISTA DE OBRA

Afiliaciones:(ARL- EPS- AFP)

Planilla de seguridad social

- Rafael Pabón López
- Rolando Ramiro Villamizar Pabón
- Ana Bolena Meza Mora
- Anderson Johan Contreras Garzón

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	687334033	9468336187	E	2024/05/17	2024/06/06	BANCOLOMBIA		$7,784,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)																						$28,150,000	$4,504,000			$28,150,000	$1,126,000			$28,150,000	$1,126,000			$28,150,000		$905,400		$0	$0		$7,661,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)																						$15,850,000	$2,536,000			$15,850,000	$634,000			$15,850,000	$634,000			$15,850,000		$83,000		$0	$0		$3,887,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (8 Afiliados)																						$15,850,000	$2,536,000			$15,850,000	$634,000			$15,850,000	$634,000			$15,850,000		$83,000		$0	$0		$3,887,000
1	CC	60405616	AGUILAR GLENDA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1090469227	CASTAÑEDA ASTRID																		23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
3	CC	88229079	CASTELLANOS JHON																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	1092354302	GARZON JOHAN																		23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
5	CC	88269550	PABON RAFAEL																		25-14	30	$4,350,000	$696,000	EPS005	30	$4,350,000	$174,000	CCF37	30	$4,350,000	$174,000	14-23	30	$4,350,000	0.522%	$22,800	30	$0	$0	Si	$1,066,800
6	CC	1090390508	ROSALES ELIZABETH																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	1010128996	VARGAS DANNA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
8	CC	1094271057	VILLAMIZAR ROLANDO																		23100 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
Centro de Trabajo: RIEGO IV (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
9	CC	13472856	HERNANDEZ LUIS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
Centro de Trabajo: RIESGO V (6 Afiliados)																						$11,000,000	$1,760,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000		$765,800		$0	$0		$3,405,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (6 Afiliados)																						$11,000,000	$1,760,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000		$765,800		$0	$0		$3,405,800
10	CC	1090399480	ALVAREZ JOSE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
11	CC	13279288	CONTRERAS ANDERSON																		23030 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	6.960%	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
12	CC	37273128	MEZA ANA																		25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS042	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	6.960%	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
13	CC	1090375054	MIZRAJI NOAM		X																23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	1090392473	MURILLO EDIXON																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
15	CC	1093798862	TOLOZA JESUS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total			**Afiliados(15)**																				$28,150,000	$4,504,000			$28,150,000	$1,126,000			$28,150,000	$1,126,000			$28,150,000		$905,400		$0	$0		$7,661,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$4,504,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$464,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,368,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,672,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$905,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$905,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,126,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	15	$1,126,000

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	**CODIGO**	**NIT**	**DV**	**AFILIADOS**	**VALOR LIQUIDADO**
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$1,126,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$116,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$344,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$562,000
TOTAL				**15**	**$7,661,400**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	687388632	9467443102	Y	2024/05/17	2024/06/06	BANCOLOMBIA		$383,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	88211168	CASTRO HENRY																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**



Anexo 3. SUBCONTRATISTA DE OBRA

Afiliaciones:(ARL- EPS- AFP)

Planilla de seguridad social

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-23, 10:30:38 AM Tipo Planilla: Y. PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS Numéro Planilla: 70365297

Periodo Cotización: marzo de 2024 Periodo Servicio: marzo de 2024

PAGADO 23/04/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE NICOLAS ALVARADO MEZA		
Documento	CC1090503679	**Dirección**	CL 7A NORTE #16 AE - 98
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5740982
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CUCUTA	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
CC 1090436294	DIEGO ARMANDO CANO PAREDES	59	00	X																0	30	30	30	0	(25-16) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,960	$ 1.300.000	$ 50.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.000
CC 1090758816	JOSE LUIS VELASQUEZ QUINTERO	59	00	X																0	1	1	1	0	(23001) PROTECCION	$ 43.334	$ 7.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 43.334	$ 5.500	0,960	$ 43.334	$ 2.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.600
CC 5664414	FECSON HUMBERTO VELASQUEZ QUINTERO	59	00	X																0	1	1	1	0	(25-16) COLPENSIONES	$ 43.334	$ 7.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 43.334	$ 5.500	0,960	$ 43.334	$ 2.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.600
CC 5638780	LUIS FELIPE ORTEGA URON	59	00	X																0	1	1	1	0	(23001) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(ESS024) EPS-S COOSALUD MONTLIDAD	$ 43.334	$ 5.500	0,960	$ 43.334	$ 2.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.430.002	$ 1.430.002	$ 1.430.002	$ 0	$ 229.000	$ 179.000	$ 99.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.800	$ 2.900	$ 510.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901801227	0	ENLACES REDES Y CONEXIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6110	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 21 # 0E-76	3107809168	SEGUROSINTEGRALESGROUP15@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30020287	E	2024-06-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.647.500	0	NEQUI

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7	30020287	2024-06-11	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 88257978	RAMON OJEDA FRANKLIN ALEXANDER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5422001
2	CC 88274171	MOLINA QUINTERO JESUS ALBERTO	1.300.000	F	X	X														0			8	8	8	8	COLPENSIONES-25-14	346.667	55.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	346.667	13.900	COMFANORTE-CCF37	346.667	13.900	346.667	8.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	91.800	S	3611002
3	CC 88310560	CARDENAS CAMPOS LUIS ARNOLDO	1.300.000	F	X															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3611001
4	CC 1004808208	BOHORQUEZ MOLINA EDWIN OMAR	1.300.000	F	X	X														0			8	8	8	8	PROTECCION-230201	346.667	55.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	346.667	13.900	COMFANORTE-CCF37	346.667	13.900	346.667	8.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	91.800	S	3611002
5	CC 1090390447	MOLINA QUINTERO JORGE ARMANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3611002
6	CC 1090434543	OSUNA CLAVIJO ZAID FABIAN	1.300.000	F	X															0			27	27	27	27	PROTECCION-230201	1.170.000	187.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.170.000	46.800	COMFANORTE-CCF37	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5422001
7	PT 1401177	PARRA MORENO CARLOS FAUSTINO	1.300.000	F		X														0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	43.334	7.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	43.334	1.800	COMFANORTE-CCF37	43.334	1.800	43.334	1.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	11.700	S	3611002

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901801227	0	ENLACES REDES Y CONEXIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6110	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 21 # 0E-76		3107809168			SEGUROSINTEGRALESGROUP15@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30020287	E	2024-06-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.647.500	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	30020287	2024-06-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.806.668	5.806.668	5.806.668	5.806.668	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	929.200	0	0	0	929.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	416.000	0	0	0	416.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	62.500	0	0	0	62.500
PROTECCION	230201	800229739	0	3	450.700	0	0	0	450.700
EPS(Administradoras: 2)				7	232.400	0	0	0	232.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	13.900	0	0	0	13.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	218.500	0	0	0	218.500
ARP(Administradoras: 1)				7	253.500	0	0	0	253.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	253.500	0	0	0	253.500
CCF(Administradoras: 1)				7	232.400	0	0	0	232.400
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	7	232.400	0	0	0	232.400
Gran Total					1.647.500	0	0	0	1.647.500

CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) JORGE ARMANDO MOLINA QUINTERO identificado(a) con CC 1090390447 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 30/06/2022

Estado de la Afiliación: **Vigente**

IPS: **ALIADOS EN SALUD S.A.**

Categoría: **A**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 20 días del mes 5 del año 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JORGE ARMANDO MOLINA QUINTERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.090.390.447**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Mayo del 2024.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

EPS | sura ARL | sura

Medellín, 20 de Mayo de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ENLACES REDES Y CONEXIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER		Clase: 3	Porcentaje Cotización:	2.436%	
C1090390447	MOLINA QUINTERO JORGE ARMANDO	05/04/2024		13116691	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10903904472414143902

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/05/2024 12:11:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.33.217.29, 192.230.104.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) EDWIN OMAR BOHORQUEZ MOLINA identificado(a) con CC 1004808208 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 02/12/2023

Estado de la Afiliación: **Vigente**

IPS: **ALIADOS EN SALUD S.A.**

Categoría: **SISBEN_1**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 20 días del mes 5 del año 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **BOHORQUEZ MOLINA EDWIN OMAR** identificado(a) con **CC** número **1.004.808.208** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 19 de abril de 2021 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 18 de mayo de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2024051812454

Medellín, 18 de May de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ENLACES REDES Y CONEXIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER		Clase: 3	Porcentaje Cotización:	2.436 %	
C1004808208	BOHORQUEZ MOLINA EDWIN OMAR	19/05/2024		12234208	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/05/2024 12:53:23 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 8.243.162.6, 107.154.67.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) ZAID FABIAN OSUNA CLAVIJO identificado(a) con CC 1090434543 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 01/03/2018

Estado de la Afiliación: **Vigente**

IPS: **U.T. VIHONCO CEIMLAB - SEDE 2 CALLE 9 CONTRIBUTIVO**

Categoría: **A**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 20 días del mes 5 del año 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **OSUNA CLAVIJO ZAID FABIAN** identificado(a) con **CC** número **1.090.434.543** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 02 de febrero de 2014 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 20 de mayo de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2024052011390

Medellín, 06 de Mayo de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ENLACES REDES Y CONEXIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000005 - SUCURSAL 2, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1090434543	OSUNA CLAVIJO ZAID FABIAN	05/05/2024		14324728	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C882579782412745444

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/05/2024 12:37:24 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 8.243.162.6, 107.154.67.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO N° 24 PAGOS SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	339526372	9460420604	E	2023/12/18	2023/12/15	BANCOLOMBIA	0	$4,695,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							$18,030,000	$2,942,800			$18,030,000	$721,200			$18,030,000	$721,200			$18,030,000		$310,100		$0	$0		$4,695,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$14,210,000	$2,331,600			$14,210,000	$568,400			$14,210,000	$568,400			$14,210,000		$74,400		$0	$0		$3,542,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																							$14,210,000	$2,331,600			$14,210,000	$568,400			$14,210,000	$568,400			$14,210,000		$74,400		$0	$0		$3,542,800
1	CC	10030485	OSPINA EMMANUEL																		25-14	30	$5,800,000	$986,000	EPS018	30	$5,800,000	$232,000	CCF37	30	$5,800,000	$232,000	14-23	30	$5,800,000	0.522%	$30,300	30	$0	$0	Si	$1,480,300
2	CC	88269550	PABON RAFAEL																		25-14	30	$4,350,000	$696,000	EPS005	30	$4,350,000	$174,000	CCF37	30	$4,350,000	$174,000	14-23	30	$4,350,000	0.522%	$22,800	30	$0	$0	Si	$1,066,800
3	CC	1010128996	VARGAS DANNA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
4	CC	1094271057	VILLAMIZAR ROLANDO																		231001	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
Centro de Trabajo: RIEGO IV (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
5	CC	13472856	HERNANDEZ LUIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
Centro de Trabajo: RIESGO V (2 Afiliados)																							$2,660,000	$425,600			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000		$185,200		$0	$0		$823,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																							$2,660,000	$425,600			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000		$185,200		$0	$0		$823,600
6	CC	13279288	CONTRERAS ANDERSON																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF37	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
7	CC	1090375054	MIZRAJI NOAM																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total			**Afiliados(7)**																				$18,030,000	$2,942,800			$18,030,000	$721,200			$18,030,000	$721,200			$18,030,000		$310,100		$0	$0		$4,695,300

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	339526372	9460420604	E	2023/12/18	2023/12/15	BANCOLOMBIA	0	$4,695,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,942,800	$0	$0	$2,942,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$464,000	$0	$0	$464,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,682,000	$0	$0	$1,682,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$796,800	$0	$0	$796,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$310,100	$0	$0	$310,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$310,100	$0	$0	$310,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$721,200	$0	$0	$721,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$721,200	$0	$0	$721,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$721,200	$0	$0	$721,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$232,000	$0	$0	$232,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$396,400	$0	$0	$396,400
TOTAL				7	$4,695,300	$0	$0	$4,695,300

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	360754675	9460577876	E	2023/12/18	2023/12/26	BANCOLOMBIA	8	$47,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$150,000	$24,000			$150,000	$6,000			$150,000	$6,000			$150,000		$10,500		$0	$0		$46,500
Centro de Trabajo: RIESGO V (1 Afiliados)																							$150,000	$24,000			$150,000	$6,000			$150,000	$6,000			$150,000		$10,500		$0	$0		$46,500
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							$150,000	$24,000			$150,000	$6,000			$150,000	$6,000			$150,000		$10,500		$0	$0		$46,500
1	CC	37273128	MEZA ANA	X																	25-14	3	$150,000	$24,000	EPS042	3	$150,000	$6,000	CCF37	3	$150,000	$6,000	14-23	3	$150,000	6.960%	$10,500	3	$0	$0	Si	$46,500
Total		**Afiliados(1)**																					$150,000	$24,000			$150,000	$6,000			$150,000	$6,000			$150,000		$10,500		$0	$0		$46,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	360754675	9460577876	E	2023/12/18	2023/12/26	BANCOLOMBIA	8	$47,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$200	$0	$24,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$24,000	$200	$0	$24,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$100	$0	$10,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$100	$0	$10,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,000	$100	$0	$6,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$6,000	$100	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,000	$100	$0	$6,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$6,000	$100	$0	$6,100
TOTAL				**1**	**$46,500**	**$500**	**$0**	**$47,000**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	351888012	9460549732	Y	2023/12/18	2023/12/21	BANCOLOMBIA	3	$750,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000	$86,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	88211168	CASTRO HENRY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO V (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
2	CC	1065883118	ROJAS SIMON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000	$86,900		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	351888012	9460549732	Y	2023/12/18	2023/12/21	BANCOLOMBIA	3	$750,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$371,200	$1,100	$0	$372,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$1,100	$0	$372,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$86,900	$300	$0	$87,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$86,900	$300	$0	$87,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$290,000	$1,000	$0	$291,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$500	$0	$145,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$500	$0	$145,500
TOTAL				2	$748,100	$2,400	$0	$750,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	432983231	9461200842	E	2024/01/17	2024/02/02	BANCOLOMBIA	16	$5,234,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$19,530,000	$3,182,800			$19,530,000	$781,200			$19,530,000	$781,200			$19,530,000		$414,500		$0	$0		$5,159,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$14,210,000	$2,331,600			$14,210,000	$568,400			$14,210,000	$568,400			$14,210,000		$74,400		$0	$0		$3,542,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																							$14,210,000	$2,331,600			$14,210,000	$568,400			$14,210,000	$568,400			$14,210,000		$74,400		$0	$0		$3,542,800
1	CC	10030485	OSPINA EMMANUEL		X																25-14	30	$5,800,000	$986,000	EPS018	30	$5,800,000	$232,000	CCF37	30	$5,800,000	$232,000	14-23	30	$5,800,000	0.522%	$30,300	30	$0	$0	Si	$1,480,300
2	CC	88269550	PABON RAFAEL																		25-14	30	$4,350,000	$696,000	EPS005	30	$4,350,000	$174,000	CCF37	30	$4,350,000	$174,000	14-23	30	$4,350,000	0.522%	$22,800	30	$0	$0	Si	$1,066,800
3	CC	1010128996	VARGAS DANNA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
4	CC	1094271057	VILLAMIZAR ROLANDO																		23100 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
Centro de Trabajo: RIEGO IV (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
5	CC	13472856	HERNANDEZ LUIS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
Centro de Trabajo: RIESGO V (3 Afiliados)																							$4,160,000	$665,600			$4,160,000	$166,400			$4,160,000	$166,400			$4,160,000		$289,600		$0	$0		$1,288,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)																							$4,160,000	$665,600			$4,160,000	$166,400			$4,160,000	$166,400			$4,160,000		$289,600		$0	$0		$1,288,000
6	CC	13279288	CONTRERAS ANDERSON																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF37	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
7	CC	37273128	MEZA ANA	X																	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS042	30	$1,500,000	$60,000	CCF37	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
8	CC	1090375054	MIZRAJI NOAM																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total			**Afiliados(8)**																				$19,530,000	$3,182,800			$19,530,000	$781,200			$19,530,000	$781,200			$19,530,000		$414,500		$0	$0		$5,159,700

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	432983231	9461200842	E	2024/01/17	2024/02/02	BANCOLOMBIA	16	$5,234,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,182,800	$46,100	$0	$3,228,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$464,000	$6,700	$0	$470,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,922,000	$27,900	$0	$1,949,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$796,800	$11,500	$0	$808,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$414,500	$6,000	$0	$420,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$414,500	$6,000	$0	$420,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$781,200	$11,300	$0	$792,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	8	$781,200	$11,300	$0	$792,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$781,200	$11,500	$0	$792,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$60,000	$900	$0	$60,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$700	$0	$47,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$700	$0	$47,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$232,000	$3,400	$0	$235,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$396,400	$5,800	$0	$402,200
TOTAL				**8**	**$5,159,700**	**$74,900**	**$0**	**$5,234,600**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	346449102	9460418882	Y	2024/01/17	2023/12/18	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	88211168	CASTRO HENRY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	346449102	9460418882	Y	2024/01/17	2023/12/18	BANCOLOMBIA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	474125355	9463473786	E	2024/02/15	2024/02/26	BANCOLOMBIA	11	$5,374,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)																							$19,843,334	$3,175,000			$19,843,334	$793,800			$19,843,334	$793,800			$19,843,334		$558,900		$0	$0		$5,321,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							$12,250,000	$1,960,000			$12,250,000	$490,000			$12,250,000	$490,000			$12,250,000		$64,200		$0	$0		$3,004,200
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (7 Afiliados)																							$12,250,000	$1,960,000			$12,250,000	$490,000			$12,250,000	$490,000			$12,250,000		$64,200		$0	$0		$3,004,200
1	CC	60405616	AGUILAR LIZCANO GLENDA LADIN	X	X																230301	16	$800,000	$128,000	EPS005	16	$800,000	$32,000	CCF37	16	$800,000	$32,000	14-23	16	$800,000	0.522%	$4,200	16	$0	$0	Si	$196,200
2	CC	1090469227	CASTAÑEDA PEÑARANDA ASTRID CAROLINA	X	X																230301	16	$800,000	$128,000	EPS037	16	$800,000	$32,000	CCF37	16	$800,000	$32,000	14-23	16	$800,000	0.522%	$4,200	16	$0	$0	Si	$196,200
3	CC	88229079	CASTELLANOS CAMACHO JHON GERSON	X																	230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	1092354302	GARZON AVILA JOHAN MANUEL	X																	230301	16	$800,000	$128,000	EPS037	16	$800,000	$32,000	CCF37	16	$800,000	$32,000	14-23	16	$800,000	0.522%	$4,200	16	$0	$0	Si	$196,200
5	CC	88269550	PABON LOPEZ RAFAEL																		25-14	30	$4,350,000	$696,000	EPS005	30	$4,350,000	$174,000	CCF37	30	$4,350,000	$174,000	14-23	30	$4,350,000	0.522%	$22,800	30	$0	$0	Si	$1,066,800
6	CC	1010128996	VARGAS COLMENARES DANNA VALERIA							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	1094271057	VILLAMIZAR PABON ROLANDO RAMIRO																		231001	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
Centro de Trabajo: RIEGO IV (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
8	CC	13472856	HERNANDEZ LUIS ERNESTO							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
Centro de Trabajo: RIESGO V (5 Afiliados)																							$6,293,334	$1,007,000			$6,293,334	$251,800			$6,293,334	$251,800			$6,293,334		$438,100		$0	$0		$1,948,700
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (5 Afiliados)																							$6,293,334	$1,007,000			$6,293,334	$251,800			$6,293,334	$251,800			$6,293,334		$438,100		$0	$0		$1,948,700
9	CC	13279288	CONTRERAS GARZON ANDERSON JHOAN	X	X																230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF37	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
10	CC	37273128	MEZA MORA ANA BOLENA																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS042	30	$1,500,000	$60,000	CCF37	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
11	CC	1090375054	MIZRAJI DAGAN NOAM							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	1090392473	MURILLO ORTEGA EDIXON	X	X																230301	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF37	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	6.960%	$48,300	16	$0	$0	Si	$214,900
13	CC	1093798862	TOLOZA PORTILLA JESUS FERNANDO	X																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total			**Afiliados(13)**																				$19,843,334	$3,175,000			$19,843,334	$793,800			$19,843,334	$793,800			$19,843,334		$558,900		$0	$0		$5,321,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	474125355	9463473786	E	2024/02/15	2024/02/26	BANCOLOMBIA	11	$5,374,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$3,175,000	$31,500	$0	$3,206,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$464,000	$4,600	$0	$468,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$936,000	$9,300	$0	$945,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,775,000	$17,600	$0	$1,792,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$558,900	$5,600	$0	$564,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$558,900	$5,600	$0	$564,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$793,800	$7,900	$0	$801,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	13	$793,800	$7,900	$0	$801,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$793,800	$8,200	$0	$802,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$60,000	$600	$0	$60,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$600	$0	$52,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$195,800	$2,000	$0	$197,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$600	$0	$52,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$434,000	$4,400	$0	$438,400
TOTAL				**13**	**$5,321,500**	**$53,200**	**$0**	**$5,374,700**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	534567024	9464836965	E	2024/03/15	2024/03/26	BANCO DE BOGOTA	11	$7,123,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)																						**$26,026,667**	**$4,164,300**			**$26,026,667**	**$1,041,100**			**$26,026,667**	**$1,041,100**			**$26,026,667**		**$810,600**		**$0**	**$0**		**$7,057,100**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)																						**$15,026,667**	**$2,404,300**			**$15,026,667**	**$601,100**			**$15,026,667**	**$601,100**			**$15,026,667**		**$78,700**		**$0**	**$0**		**$3,685,200**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (8 Afiliados)																						**$15,026,667**	**$2,404,300**			**$15,026,667**	**$601,100**			**$15,026,667**	**$601,100**			**$15,026,667**		**$78,700**		**$0**	**$0**		**$3,685,200**
1	CC	60405616	AGUILAR GLENDA	X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1090469227	CASTAÑEDA ASTRID	X																230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
3	CC	88229079	CASTELLANOS JHON																	230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	1092354302	GARZON JOHAN																	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
5	CC	88269550	PABON RAFAEL																	25-14	30	$4,350,000	$696,000	EPS005	30	$4,350,000	$174,000	CCF37	30	$4,350,000	$174,000	14-23	30	$4,350,000	0.522%	$22,800	30	$0	$0	Si	$1,066,800
6	CC	1090390508	ROSALES ELIZABETH	X																25-14	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF37	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	0.522%	$2,500	11	$0	$0	Si	$117,000
7	CC	1010128996	VARGAS DANNA																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
8	CC	1094271057	VILLAMIZAR ROLANDO																	231001	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
Centro de Trabajo: RIEGO IV (1 Afiliados)																						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**		**$56,600**		**$0**	**$0**		**$368,600**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**		**$56,600**		**$0**	**$0**		**$368,600**
9	CC	13472856	HERNANDEZ LUIS																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
Centro de Trabajo: RIESGO V (5 Afiliados)																						**$9,700,000**	**$1,552,000**			**$9,700,000**	**$388,000**			**$9,700,000**	**$388,000**			**$9,700,000**		**$675,300**		**$0**	**$0**		**$3,003,300**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (5 Afiliados)																						**$9,700,000**	**$1,552,000**			**$9,700,000**	**$388,000**			**$9,700,000**	**$388,000**			**$9,700,000**		**$675,300**		**$0**	**$0**		**$3,003,300**
10	CC	13279288	CONTRERAS ANDERSON																	230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	6.960%	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
11	CC	37273128	MEZA ANA																	25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS042	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	6.960%	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
12	CC	1090375054	MIZRAJI NOAM																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
13	CC	1090392473	MURILLO EDIXON	X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	1093798862	TOLOZA JESUS																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total			**Afiliados(14)**																			$26,026,667	$4,164,300			$26,026,667	$1,041,100			$26,026,667	$1,041,100			$26,026,667		$810,600		$0	$0		$7,057,100

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	534567024	9464836965	E	2024/03/15	2024/03/26	BANCO DE BOGOTA	11	$7,123,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,164,300	$39,300	$0	$4,203,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$464,000	$4,400	$0	$468,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,236,300	$11,700	$0	$1,248,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,464,000	$23,200	$0	$2,487,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$810,600	$7,700	$0	$818,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$810,600	$7,700	$0	$818,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,041,100	$9,800	$0	$1,050,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	14	$1,041,100	$9,800	$0	$1,050,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$1,041,100	$9,900	$0	$1,051,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$116,000	$1,100	$0	$117,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$500	$0	$52,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$311,100	$3,000	$0	$314,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$500	$0	$52,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$510,000	$4,800	$0	$514,800
TOTAL				**14**	**$7,057,100**	**$66,700**	**$0**	**$7,123,800**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	492074519	9463564444	Y	2024/03/15	2024/03/04	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	88211168	CASTRO HENRY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	492074519	9463564444	Y	2024/03/15	2024/03/04	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	587294883	9465845899	E	2024/04/15	2024/04/22	BANCOLOMBIA	7	$7,477,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (15 Afiliados)						$27,630,000	$4,420,800			$27,630,000	$1,105,200			$27,240,000	$1,089,600			$27,630,000	$817,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$16,630,000	$2,660,800			$16,630,000	$665,200			$16,240,000	$649,600			$16,630,000	$85,100		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (9 Afiliados)						$16,630,000	$2,660,800			$16,630,000	$665,200			$16,240,000	$649,600			$16,630,000	$85,100		$0	$0
1	CC	60405616	AGUILAR GLENDA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1090399480	ALVAREZ JOSE	230301	18	$780,000	$124,800	EPS005	18	$780,000	$31,200	CCF37	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,000	$4,100	18	$0	$0
3	CC	1090469227	CASTAÑEDA ASTRID	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0
4	CC	88229079	CASTELLANOS JHON	230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	1092354302	GARZON JOHAN	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0
6	CC	88269550	PABON RAFAEL	25-14	30	$4,350,000	$696,000	EPS005	30	$4,350,000	$174,000	CCF37	30	$4,350,000	$174,000	14-23	30	$4,350,000	$22,800	30	$0	$0
7	CC	1090390508	ROSALES ELIZABETH	25-14	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF37	21	$910,000	$36,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
8	CC	1090390508	ROSALES ELIZABETH	25-14	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF37	0	$0	$0	14-23	9	$390,000	$0	0	$0	$0
9	CC	1010128996	VARGAS DANNA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
10	CC	1094271057	VILLAMIZAR ROLANDO	231001	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	$15,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIEGO IV (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$56,600		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$56,600		$0	$0
11	CC	13472856	HERNANDEZ LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO V (5 Afiliados)						$9,700,000	$1,552,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000	$675,300		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (5 Afiliados)						$9,700,000	$1,552,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000	$388,000			$9,700,000	$675,300		$0	$0
12	CC	13279288	CONTRERAS ANDERSON	230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
13	CC	37273128	MEZA ANA	25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS042	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
14	CC	1090375054	MIZRAJI NOAM	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	1090392473	MURILLO EDIXON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
16	CC	1093798862	TOLOZA JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total Afiliados(15)						$27,630,000	$4,420,800			$27,630,000	$1,105,200			$27,240,000	$1,089,600			$27,630,000	$817,000		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	587294883	9465845899	E	2024/04/15	2024/04/22	BANCOLOMBIA	7	$7,477,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$4,420,800	$26,400	$0	$4,447,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$464,000	$2,800	$0	$466,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,368,000	$8,200	$0	$1,376,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,588,800	$15,400	$0	$2,604,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$817,000	$4,900	$0	$821,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$817,000	$4,900	$0	$821,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,089,600	$6,500	$0	$1,096,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	15	$1,089,600	$6,500	$0	$1,096,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$1,105,200	$6,900	$0	$1,112,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$116,000	$700	$0	$116,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$400	$0	$52,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$344,000	$2,100	$0	$346,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$400	$0	$52,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$541,200	$3,300	$0	$544,500
TOTAL				**15**	**$7,432,600**	**$44,700**	**$0**	**$7,477,300**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900808866	5	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 No. 11E-38	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744415	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	687334033	9468336187	E	2024/05/17	2024/06/06	BANCOLOMBIA		$7,784,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)																							$28,150,000	$4,504,000			$28,150,000	$1,126,000			$28,150,000	$1,126,000			$28,150,000		$905,400		$0	$0		$7,661,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$15,850,000	$2,536,000			$15,850,000	$634,000			$15,850,000	$634,000			$15,850,000		$83,000		$0	$0		$3,887,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (8 Afiliados)																							$15,850,000	$2,536,000			$15,850,000	$634,000			$15,850,000	$634,000			$15,850,000		$83,000		$0	$0		$3,887,000
1	CC	60405616	AGUILAR GLENDA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1090469227	CASTAÑEDA ASTRID																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
3	CC	88229079	CASTELLANOS JHON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	1092354302	GARZON JOHAN																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
5	CC	88269550	PABON RAFAEL																		25-14	30	$4,350,000	$696,000	EPS005	30	$4,350,000	$174,000	CCF37	30	$4,350,000	$174,000	14-23	30	$4,350,000	0.522%	$22,800	30	$0	$0	Si	$1,066,800
6	CC	1090390508	ROSALES ELIZABETH																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	1010128996	VARGAS DANNA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
8	CC	1094271057	VILLAMIZAR ROLANDO																		231001	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
Centro de Trabajo: RIEGO IV (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
9	CC	13472856	HERNANDEZ LUIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
Centro de Trabajo: RIESGO V (6 Afiliados)																							$11,000,000	$1,760,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000		$765,800		$0	$0		$3,405,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (6 Afiliados)																							$11,000,000	$1,760,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000	$440,000			$11,000,000		$765,800		$0	$0		$3,405,800
10	CC	1090399480	ALVAREZ JOSE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
11	CC	13279288	CONTRERAS ANDERSON																		230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	6.960%	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
12	CC	37273128	MEZA ANA																		25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS042	30	$2,900,000	$116,000	CCF37	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	6.960%	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
13	CC	1090375054	MIZRAJI NOAM		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	1090392473	MURILLO EDIXON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
15	CC	1093798862	TOLOZA JESUS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total			**Afiliados(15)**																				$28,150,000	$4,504,000			$28,150,000	$1,126,000			$28,150,000	$1,126,000			$28,150,000		$905,400		$0	$0		$7,661,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$4,504,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$464,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,368,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,672,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$905,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$905,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,126,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	15	$1,126,000

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$1,126,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$116,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$344,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$562,000
TOTAL				15	$7,661,400

ANEXO N° 25 PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2023-12
Período Salud : 2023-12

Se certifica que en la fecha 2023-12-28 la empresa JUAN SEBASTIAN ECHEVERRY HERNANDEZ con documento de identificación CC 1096040442 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ECHEVERRY HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN identificado con CC-1096040442, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1096040442	JUAN SEBASTIAN ECHEVERRY HERNANDEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
28513491	I	2023-12-28	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2023-11
Período Salud : 2023-11

Se certifica que en la fecha 2023-12-14 la empresa JUAN SEBASTIAN ECHEVERRY HERNANDEZ con documento de identificación CC 1096040442 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ECHEVERRY HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN identificado con CC-1096040442, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1096040442	JUAN SEBASTIAN ECHEVERRY HERNANDEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
28316841	I	2023-12-14	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2024-01
Período Salud : 2024-01

Se certifica que en la fecha 2024-02-26 la empresa JUAN SEBASTIAN ECHEVERRY HERNANDEZ con documento de identificación CC 1096040442 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ECHEVERRY HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN identificado con CC-1096040442, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1096040442	JUAN SEBASTIAN ECHEVERRY HERNANDEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
28638999	I	2024-02-26	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2023-11
Período Salud : 2023-11

Se certifica que en la fecha 2023-12-14 la empresa JUAN SEBASTIAN ECHEVERRY HERNANDEZ con documento de identificación CC 1096040442 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ECHEVERRY HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN identificado con CC-1096040442, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1096040442	JUAN SEBASTIAN ECHEVERRY HERNANDEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
28316841	I	2023-12-14	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que IVAN MAURICIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 9729480, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) IVAN MAURICIO BRITO MEJIA con documento CC 9729480, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7903247589	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2023	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2023
Fecha Pago	2023/12/01	Número de Autorización	309327956

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS010 - SURAMERICANA DE
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-9738072 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	48	232.000	10.000	242.000
Período salud:	2023-12	EPS010	800088702	EPS SURA	1	48	181.300	7.800	189.100
Planilla Nro.:	28280085 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	48	7.600	400	8.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	48	0	0	0
Fecha transacción:	2024-03-06	PASENA	899999034	SENA	0	48	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	48	0	0	0
Transacción:	497462344	PAESAP	899999054	ESAP	0	48	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	48	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 439.100

PAGADO

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que IVAN MAURICIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 9729480, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) IVAN MAURICIO BRITO MEJIA con documento CC 9729480, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7906218751	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2023	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2023
Fecha Pago	2023/12/21	Número de Autorización	354051322

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS010 - SURAMERICANA DE
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-9738072 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	48	320.000	13.400	333.400
Período salud:	2024-01	EPS010	800088702	EPS SURA	1	48	250.000	10.500	260.500
Planilla Nro.:	29371744 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	48	10.500	500	11.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	48	0	0	0
Fecha transacción:	2024-04-04	PASENA	899999034	SENA	0	48	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	48	0	0	0
Transacción:	554803012	PAESAP	899999054	ESAP	0	48	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	48	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 604.900

PAGADO

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que IVAN MAURICIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 9729480, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) IVAN MAURICIO BRITO MEJIA con documento CC 9729480, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7911517722	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ENERO/2024	Periodo Cotización Salud	ENERO/2024
Fecha Pago	2024/01/23	Número de Autorización	411797844

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS010 - SURAMERICANA DE
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-9738072 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	17	320.000	4.700	324.700
Período salud:	2024-02	EPS010	800088702	EPS SURA	1	17	250.000	3.700	253.700
Planilla Nro.:	29371745 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	17	10.500	200	10.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	17	0	0	0
Fecha transacción:	2024-04-04	PASENA	899999034	SENA	0	17	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	17	0	0	0
Transacción:	554846849	PAESAP	899999054	ESAP	0	17	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	17	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 589.100

PAGADO

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que IVAN MAURICIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 9729480, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) IVAN MAURICIO BRITO MEJIA con documento CC 9729480, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7912836971	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	FEBRERO/2024	Periodo Cotización Salud	FEBRERO/2024
Fecha Pago	2024/03/04	Número de Autorización	491849784

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS010 - SURAMERICANA DE
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2024-02
Período Salud : 2024-02

Se certifica que en la fecha 2024-03-14 la empresa JUAN SEBASTIAN ECHEVERRY HERNANDEZ con documento de identificación CC 1096040442 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ECHEVERRY HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN identificado con CC-1096040442, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1096040442	JUAN SEBASTIAN ECHEVERRY HERNANDEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
29124246	I	2024-03-14	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

PAGADO

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA ALEJANDRA MIRANDA MEZA identificado(a) con CC 1090497669 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MIRANDA MEZA MARIA ALEJANDRA CC 1090497669

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-02	2024-02	527426645	9464588276	I	2024-03-21	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,300,000	$31,700
EPS	SANITAS	30	12.5%	$1,300,000	$162,500

Este certificado se expide el día 2024-04-01 a las 05:16.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-9738072 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	320.000	0	320.000
Período salud:	2024-03	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	250.000	0	250.000
Planilla Nro.:	29371747 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	10.500	0	10.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-04-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	554822913	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 580.500

PAGADO

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que IVAN MAURICIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 9729480, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) IVAN MAURICIO BRITO MEJIA con documento CC 9729480, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7917633287	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MARZO/2024	Periodo Cotización Salud	MARZO/2024
Fecha Pago	2024/03/12	Número de Autorización	508566379

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS010 - SURAMERICANA DE
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA ALEJANDRA MIRANDA MEZA identificado(a) con CC 1090497669 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MIRANDA MEZA MARIA ALEJANDRA CC 1090497669

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-04	2024-04	673087407	9467909026	I	2024-05-31		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,300,000	$31,700
EPS	SANITAS	30	12.5%	$1,300,000	$162,500

Este certificado se expide el día 2024-06-07 a las 02:15.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-9738072 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	18	208.000	3.000	211.000
Período salud:	2024-04	EPS010	800088702	EPS SURA	1	18	162.500	2.400	164.900
Planilla Nro.:	29499337 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	18	6.800	100	6.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-06-07	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	689613964	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 382.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	18	112.000	1.700	113.700
Período salud:	2024-04	EPS010	800088702	EPS SURA	1	18	87.500	1.300	88.800
Planilla Nro.:	30099730 Tipo N	14-23	860011153	POSITIVA	1	18	3.700	100	3.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	18	0	0	0
Fecha transacción:	2024-06-07	PASENA	899999034	SENA	0	18	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	18	0	0	0
Transacción:	689635713	PAESAP	899999054	ESAP	0	18	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	18	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 206.300

PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9729480
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CLLE 21 NORTE #9-65	TELÉFONO:	7349563
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7919086003**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		576788907

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 9729480	BRITO MEJIA IVAN MAURICIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	9729480	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 377.300**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN SEBASTIAN ECHEVERRY HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1096040442
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-23
FECHA DE PAGO:	2024-05-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29738269
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29738269
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 200.000	$ 202.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 256.000	$ 258.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 500	$ 39.000	$ 39.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 495.000	$ 500.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/06/2024

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-9738072 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	320.000	0	320.000
Período salud:	2024-05	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	250.000	0	250.000
Planilla Nro.:	30099771 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	10.500	0	10.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-06-07	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	690684568	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 580.500

PAGADO

Certificado de Aportes

Se certifica que MIRANDA MEZA MARIA ALEJANDRA identificado(a) con CC 1090497669 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA ALEJANDRA MIRANDA MEZA identificado(a) con CC 1090497669

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9468403327	690929577	I	2024-06-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30
9468403327	690929577	I	2024-06-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30
9468403327	690929577	I	2024-06-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-05	30
9468403327	690929577	I	2024-06-07	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-05	30
9468403327	690929577	I	2024-06-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-05	30
9468403327	690929577	I	2024-06-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-05	30
9468403327	690929577	I	2024-06-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30

Este certificado se expide el día 2024-06-07 a las 03:46.

CONSORCIO SIES 2023

INFORME MENSUAL No.007

CONTRATO LP-003-2023 CUYO OBJETO ES *"BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"*

BOCHALEMA (NORTE DE SANTANDER), MAYO 2024

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE ILUSTRACIONES 4

LISTA DE TABLAS 5

INTRODUCCIÓN 6

CAPITULO I – INFORMACIÓN DEL PROYECTO 7

CAPITULO II. VERIFICACION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 8

CAPITULO III - GESTION ADMINISTRATIVA 9

3.1 REUNIONES DE SEGUIMIENTO **9**

3.2. ACTAS INTERNAS **11**

3.3. CORRESPONDENCIA **11**

CAPITULO IV- GESTIÓN TÉCNICA 17

4.1. OBRA PLANTA INTERNA – CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO (CCM) **17**

4.2. VESTIDA DE POSTE. **18**

4.3. AVANCE DE OBRA **19**

CAPITULO V - GESTIÓN FINANCIERA 19

CAPITULO VI – GESTIÓN JURÍDICA 21

6.1 ADENDA MODIFICATORIA N°002 de 2024. ..... **21**

6.2. PÓLIZAS **22**

CAPITULO VII - GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 23

7.1. GESTIÓN AMBIENTAL **23**

7.1.1 SEGUIMIENTO A LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 24

7.1.2 ROTULACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS. 24

7.2. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) **25**

7.2.1 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 25

7.2.2 CAPACITACIONES 25

7.2.3. INSPECCION Y DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS 26

7.2.4 PUNTOS DE INTERVENCIÓN 26

7.2.5 DOCUMENTACION PROCESO SG-SST. 27

7.3. SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS **27**

7.3.1. SEGUIMIENTO A LA EMPRESA ENLACE REDES Y CONEXIONES..... 28

7.3.2. SEGUIMIENTO A LA EMPRESA NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S. 28

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Adenda No.002/2024 22
Ilustración 2. Disposición Residuos Sólidos 24
Ilustración 3. Disposición sustancias químicas. 24
Ilustración 4. Capacitaciones 26
Ilustración 5. Inspección Trabajo de alturas 26
Ilustración 6. Evidencia prevención vial y bloqueo de vías 26

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información básica del proyecto. 7
Tabla 2. Obligaciones contractuales 8
Tabla 3. Actas de Reunión Virtual 10
Tabla 4. Actas internas generadas 11
Tabla 5. Correspondencia enviada y recibida 16
Tabla 6. Estado Obra civil en Calle 19
Tabla 7. Balance Contrato LP-003-2023 19
Tabla 8.Resumen Movimientos fiducia 21
Tabla 9. Información Orden de pago 009 21
Tabla 10. Información Pólizas 23
Tabla 11. Personal activo abril 2024 25
Tabla 12. Personal Enlaces, Redes y Conexiones 28
Tabla 13.Personal Nektoln Digital Solutions 28

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Bochalema mediante Licitación pública No. LP-003-2023, publicó el proceso cuyo objeto es *"BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"* proceso que fue adjudicado a CONSORCIO SIES 2023. mediante el Contrato de Suministro No. LP-003-2023.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación el sexto informe mensual de ejecución del Contrato de Suministro No. LP-003-2023 celebrado entre el Municipio de Bochalema y CONSORCIO SIES 2023, con fecha de suscripción de acta de inicio del 28 de noviembre de 2023, comprendiendo el periodo entre 1 al 31 de mayo de 2024, donde se presentarán las actividades desarrolladas desde el componente administrativo, técnico, financiero-contable, jurídico y ambiental concernientes a la fase de estudios y diseños e implementación del contrato citado en el párrafo anterior.

CAPITULO I – INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO	
CONTRATO No.	LP 003-2023 DE FECHA: 20/04/2023
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BOCHALEMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIES 2023
NIT:	901.770.539-9
OBJETO DEL CONTRATO:	*"BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"*
VALOR DEL CONTRATO:	MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($1737.279.280)
INTERVENTORÍA:	ING. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA MEDIANTE CONTRATO CM-004-2023 DE FECHA 22/11/2023.
SUPERVISOR DESIGNADO:	ARQ. LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.
FECHA INICIO DE CONTRATO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGÚN ACTA DE INICIO.
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
PLAZO SEGÚN ADENDA MODIFICATORIA N°001 DE 2024:	30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO SEGÚN ADENDA MODIFICATORIA N°002 DE 2024:	30 DE JUNIO DE 2024

Tabla 1. Información básica del proyecto.

CAPITULO II. VERIFICACION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

A continuación, se desarrolla un resumen de estado de las obligaciones contractuales.

No.	OBLIGACIÓN	ESTADO	DETALLE
1	Entregar los bienes objeto de este contrato con las especificaciones técnicas descritas en la cláusula tercera en el lugar y plazos establecidos en el presente contrato.	Cumplido	Se cumplieron todas las obligaciones contempladas dentro del pliego de condiciones definitivos y anexos del proceso LP-003-2023 con el recibo a satisfacción del proyecto.
2	Entregar los bienes en buen estado y libres de defectos o vicios ocultos, garantizando que cuenten con plena idoneidad para el desarrollo de las funciones a las cuales se encuentran destinados.	Cumplido	Se cumplieron todas las obligaciones contempladas dentro del pliego de condiciones definitivos y anexos del proceso LP-003-2023 con el recibo a satisfacción del proyecto.
3	Asumir en el suministro de dichos bienes las obligaciones del vendedor como productor, conforme a la regulación de protección al consumidor.	Cumplido	Se cumplieron todas las obligaciones contempladas dentro del pliego de condiciones definitivos y anexos del proceso LP-003-2023 con el recibo a satisfacción del proyecto.
4	Sanear la venta de los bienes objeto de este contrato, tanto en casos de evicción como en casos de vicios ocultos.	Cumplido	Se cumplieron todas las obligaciones contempladas dentro del pliego de condiciones definitivos y anexos del proceso LP-003-2023 con el recibo a satisfacción del proyecto.
5	Dar a conocer al Municipio de Bochalema cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	Cumplido	Se cumplieron todas las obligaciones contempladas dentro del pliego de condiciones definitivos y anexos del proceso LP-003-2023 con el recibo a satisfacción del proyecto.

Tabla 2. Obligaciones contractuales

CAPITULO III - GESTION ADMINISTRATIVA

Con el objetivo del correcto desarrollo del contrato No. LP 003-2023, se determinaron un conjunto de actividades coordinadas con el fin de proyectar, establecer y llevar un control de la ejecución de las etapas en las que será desarrollado el proyecto, a través de diferentes medios:

3.1 REUNIONES DE SEGUIMIENTO

Se programa la realización de reuniones de seguimiento, donde intervienen el secretario de planeación como supervisor designado por el Municipio de Bochalema, el supervisor designado por el Ministerio del Interior, la interventoría IVAN MAURICIO BRITO MEJIA y CONSORCIO SIES 2023. En la realización de estos comités se revisa el avance de la obra, aspectos de SST, técnicos, financieros, entre otros, concernientes a la ejecución y trazabilidad del desarrollo del contrato.

No.	MODALIDAD	No. ACTA	FECHA	TEMAS TRATADOS
1	Virtual Google Meet	Acta de reunión Nro.001-2023	7/12/2023	- Presentar al equipo Interventoría y Contratista del proyecto. - Realizar seguimiento al desarrollo de los Estudios y Diseños del proyecto - Revisión del plan de trabajo. - Requerimientos SST por parte de la interventoría para el inicio de la fase de Implementación.
2	Virtual Google Meet	Acta de reunión Nro.002-2023	27/12/2023	-Realizar seguimiento al desarrollo de la fase de implementación. - Revisión del plan de trabajo. - Plan de Inversión del anticipo
3	Presencial	Acta de reunión Nro.003-2024	16/01/2024	-Realizar verificación de las fichas técnicas de los equipos a instalar en el proyecto. - Visita de aprobación de postería a instalar.
4	Virtual Google Meet	Acta de reunión Nro.004-2024	18/01/2024	- Presentación del estado actual del proyecto en la fase de implementación
5	Virtual Microsoft Teams	Acta de reunión Nro.005-2024	9/02/2024	- Presentación del estado actual del proyecto en la fase de implementación
6	Virtual Google Meet	Acta de reunión Nro.006-2024	15/02/2024	- Presentación del estado actual del proyecto en la fase de implementación
7	Virtual Google Meet	Acta de reunión Nro.007-2024	29/02/2024	-Realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos en el comité anterior, y los adquiridos en la visita conjunta con supervisor del convenio el día 19 de febrero de 2024. - Presentación del estado actual del proyecto en la Fase de Implementación por parte del contratista.

8	Virtual Google Meet	Acta de reunión Nro.008-2024	14/03/2024	-Realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos en el comité anterior. - Presentación del estado actual del proyecto en la Fase de Implementación por parte del contratista.
9	Virtual Google Meet	Acta de reunión Nro.009-2024	21/03/2024	-Realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos en el comité anterior. - Presentación del estado actual del proyecto en la Fase de Implementación por parte del contratista.
10	Presencial	Acta de reunión Nro.010-2024	22/03/2024	- Realizar verificación de cada uno de los 21 puntos de cámara del proyecto para validación de porcentaje de avance del proyecto.
11	Virtual Google Meet	N/A	5/04/2024	-Revisión del avance del trámite de alquiler postería CENS en Bochalema.
12	Virtual Google Meet	Acta de reunión Nro.011-2024	9/04/2024	-Realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos en el comité anterior. - Presentación del estado actual del proyecto en la Fase de Implementación por parte del contratista.
13	Virtual Google Meet	Acta de reunión Nro.012-2024	26/04/2024	-Realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos en el comité anterior. - Presentación del estado actual del proyecto en la Fase de Implementación por parte del contratista.
14	Virtual TEAMS	Acta No.10/05/2024-C1612	10/05/2024	- Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo. - Seguimiento a la concesión de los postes con CENS. - Aclaración sobre funcionamiento de cámaras Fase I. - Avance del proyecto.
15	Virtual Google Meet	Acta No.17/05/2024-C1612	17/05/2024	- Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo. - Seguimiento a la concesión de los postes con CENS. - Métodos de reducción de porcentaje de atraso. - Avance de tendido de fibra sobre infraestructura alumbrado público. - Compromiso de resolver observaciones para el tercer desembolso.
16	Virtual TEAMS	Acta No.24/05/2024-C1612	24/05/2024	- Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo. - Seguimiento compromisos anteriores. - Entrega expediente de pago - Avance del proyecto.
17	Virtual TEAMS	Acta No.31/05/2024-C1612	31/05/2024	- Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo. - Seguimiento compromisos anteriores. - Avance del proyecto. - Las cámaras se encuentran en perfecto estado - Compromiso de póliza todo riesgo

Tabla 3. Actas de Reunión Virtual

Para las reuniones realizadas por la plataforma Google Meet, y/o Teams se recibe invitación a través del correo electrónico y se elaboraron las correspondientes actas (Anexo 1. Actas de seguimiento)

3.2. ACTAS INTERNAS

Se celebran reuniones entre la interventoría, secretaria de planeación, Estación Policía de Bochalema y el contratista con el fin de socializar, modificar y/o aprobar los diferentes documentos que hacen parte integral de los estudios y diseños e implementación del proyecto.

No.	PARTICIPANTES	No. ACTA Y FECHA	MODALIDAD	TEMAS TRATADOS
1	Interventoría Secretaria de Planeación Contratista Policía Bochalema DENOR	Acta No.001/2023 del 29/noviembre/2023	Presencial	- Socialización del Proyecto - Solicitud de Traslado CCM a cuarto de Armerillo.
2	Interventoría Secretaria de Planeación Contratista	Acta No.002/2023 del 6/diciembre/2023	Presencial	- Solicitud de ampliación del Convenio Interadministrativo 1612 de 2023.
3	Interventoría Secretaria de Planeación Contratista Policía Bochalema DENOR	Acta No.003/2024 del 16/febrero/2024	Presencial	- Solicitud de modificación de punto por radio enlaces.
	Interventoría Secretaria de Planeación Contratista	ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 26/febrero/2024	N/A	- Modificación de cantidades de fibra óptica y puntos de radio enlaces
4	Interventoría Secretaria de Planeación Contratista	Acta No.004/2024 del 16/marzo/2023	Presencial	- Solicitud de traslado de Pantalla LCD del Sistema CCTV - FASE I.

Tabla 4. Actas internas generadas

3.3. CORRESPONDENCIA

Se realizó el intercambio de mensajes y/o información a través del uso de correo electrónico para agilizar la entrega de los requerimientos contemplados en el pliego. (Anexo 2. Correspondencia enviada y recibida - mayo 2024)

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
N°	OFICIO/ CORREO	FECHA DE RADICADO	CONSECUTIVO	ASUNTO	RADICADO	ENTIDAD
1	OFICIO/ CORREO	1/12/2023	CSIES-BOCHALEMA-0001-2023	APROBACIÓN TRASLADO DE UBICACIÓN CCM A CUARTO DE ARMERILLO	GE-2023-009776-DENOR	DENOR
2	OFICIO	11/12/2023	CSIES-BOCHALEMA-0002-2023	SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO.	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
3	CORREO	26/12/2023	CSIES-BOCHALEMA-0003-2023	APERTURA DE CUENTA – PATRIMONIO AUTÓNOMO.	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
4	CORREO	26/12/2023	CSIES-BOCHALEMA-0004-2023	RESPUESTA OFICIO N°INT-CM004-005-2023.	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA

5	CORREO	27/12/2023	CSIES-BOCHALEMA-0005-2023	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS – INCLUSIÓN MININTERIOR.	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA PLANEACIÓN
6	CORREO	27/12/2023	CSIES-BOCHALEMA-0006-2023	ENTREGA INFORME MENSUAL – NOVIEMBRE 2023	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
7	CORREO	27/12/2023	N/A	SOLICITUD DE REQUISITOS PARA USO DE INFRAESTRUCTURA DE CENS	N/A	CENS
8	OFICIO	29/12/2023	CSIES-BOCHALEMA-007-2023	DOCUMENTACIÓN PARA PAGO DE ANTICIPO	005652	PLANEACION BOCHALEMA
9	OFICIO/ CORREO	15/01/2024	CSIES-BOCHALEMA-001-2024	ENTREGA INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2023	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
10	OFICIO/ CORREO	16/01/2024	CSIES-BOCHALEMA-002-2024	DOCUMENTACIÓN PARA CENS	N/A	PLANEACION BOCHALEMA
11	OFICIO/ CORREO	18/01/2024	CSIES-BOCHALEMA-003-2024	RESPUESTA OFICIO INT-CM004-008-2023	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
12	OFICIO/ CORREO	19/01/2024	CSIES-BOCHALEMA-004-2024	SOLICITUD CAMBIO DE COORDINADOR DE PROYECTO	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
13	OFICIO	23/01/2024	CSIES-BOCHALEMA-005-2024	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN ANTICIPO EN RESERVA	N/A	PLANEACION BOCHALEMA
14	OFICIO/ CORREO	25/01/2024	CSIES-BOCHALEMA-006-2024	SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DIRECCIONAMIENTO IP	N/A	DENOR GUTIC
15	CORREO	25/01/2024	N/A	SOLICITUD APLAZAMIENTO COMITE	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
16	CORREO	31/01/2024	N/A	HOJA DE VIDA INGENIERO ELECTRICO PARA PROYECTO CENS	N/A	PLANEACIÓN BOCHALEMA
17	OFICIO/ CORREO	5/02/2024	CSIES-BOCHALEMA-0008-2024	ESTADO TRÁMITE CONTRATO ARRENDAMIENTO CENS	N/A	PLANEACION BOCHALEMA INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
18	OFICIO/ CORREO	6/02/2024	CSIES-BOCHALEMA-0009-2024	ENTREGA INFORME MENSUAL ENERO 2024	N/A	PLANEACIÓN BOCHALEMA
19	OFICIO/ CORREO	8/02/2024	CSIES-BOCHALEMA-0010-2024	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS	N/A	PLANEACION BOCHALEMA INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
20	CORREO	19/02/2024	N/A	CERTIFICACIÓN CUENTA PATRIMONIO AUTONOMO	N/A	TESORERIA BOCHALEMA
21	OFICIO/ CORREO	29/02/2024	CSIES-BOCHALEMA-0012-2024	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO	N/A	PLANEACION BOCHALEMA INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA

22	OFICIO/ CORREO	4/03/2024	CSIES-BOCHALEMA-00013-2024	INFORME MENSUAL DE FEBRERO 2024	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO
23	CORREO	4/03/2024	N/A	DOCUMENTOS PARA USO DE INFRAESTRUCTURA	N/A	CENS
24	OFICIO/ CORREO	7/03/2024	CSIES-BOCHALEMA-00014-2024	ENTREGA PLAN DE CHOQUE	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO PLANEACIÓN BOCHALEMA MININTERIOR
25	OFICIO/ CORREO	15/03/2024	CSIES-BOCHALEMA-00015-2024	SOLICITUD DE PODA DE ÁRBOLES	N/A	PLANEACION BOCHALEMA
26	OFICIO/ CORREO	2/04/2024	CSIES-BOCHALEMA-00016-2024	RESPUESTA OFICIO No. INT-CM04-011-2024.	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO
27	CORREO	5/04/2024	N/A	REENVÍO DOCUMENTACIÓN PARA CENS	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO PLANEACIÓN BOCHALEMA CENS
28	OFICIO/ CORREO	5/04/2024	CSIES-BOCHALEMA-00017-2024	INFORME MENSUAL DE MARZO 2024	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO
29	OFICIO/ CORREO	10/04/2024	CSIES-BOCHALEMA-00018-2024	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO
30	CORREO	10/04/2024	N/A	CORRECCIÓN OFICIO DE SUSPENSIÓN	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO
31	CORREO	13/04/2024	N/A	CORRECCIÓN INFORMES MENSUALES	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO
32	OFICIO/ CORREO	13/04/2024	CSIES-BOCHALEMA-00019-2024	INVITACION ACOMPAÑAMINETO VISITA MINISTERIO	N/A	DENOR
33	CORREO	15/04/2024	N/A	SOLICITUD USO DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PÚBLICO		ENERGIZETT
34	OFICIO/ CORREO	16/04/2024	CSIES-BOCHALEMA-00020-2024	RESPUESTA OFICIO INT-CM04-012-2024	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO
35	OFICIO/ CORREO	18/04/2024	CSIES-BOCHALEMA-00021-2024	CONCEPTO TÉCNICO TIEMPOS REQUERIDOS	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO
36	OFICIO	18/04/2024	CSIES-BOCHALEMA-00022-2024	SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONVENIO	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO
37	OFICIO/ CORREO	24/04/2024	CSIES-BOCHALEMA-00023-2024	DISEÑO DE CAJAS - PUNTOS DE CÁMARA 15 Y 23	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO
38	OFICIO/ CORREO	6/05/2024	CSIES-BOCHALEMA-00024-2024	INFORME MENSUAL DE ABRIL 2024	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO

39	OFICIO/ CORREO	10/05/2024	CSIES-BOCHALEMA-00025-2024	TRÁMITES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CENS	N/A	PLANEACION BOCHALEMA
40	OFICIO/ CORREO	15/05/2024	CSIES-BOCHALEMA-00026-2024	RETIRO DE ESCRITORIO - CCTV FASE I	N/A	ESTACION POLICIA BOCHALEMA
41	CORREO	20/05/2024	N/A	SOLICITUD CAPACITACIÓN CUADRILLA TENDIDO FIBRA	N/A	NELSON MOGOLLON CENS
42	OFICIO/ CORREO	20/05/2024	CSIES-BOCHALEMA-00027-2024	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS - CONTRATO LP-003-202	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO
43	OFICIO/ CORREO	24/05/2024	CSIES-BOCHALEMA-00028-2024	SOLICITUD PERSONAL OPERADOR CCM BOCHALEMA	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO
44	OFICIO/ CORREO	24/05/2024	CSIES-BOCHALEMA-00029-2024	SOLICITUD DE PAGO PARCIAL No.001	2089 - 27 DE MAYO DE 2024	PLANEACION BOCHALEMA
45	OFICIO/ CORREO	28/05/2024	CSIES-BOCHALEMA-00030-2024	FACTURAS - ORDENES DE PAGO ANTICIPO	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO PLANEACIÓN BOCHALEMA MININTERIOR
46	CORREO	29/05/2024	N/A	INFORME DE ABRIL CORREGIDO	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO
47	OFICIO/ CORREO	30/05/2024	CSIES-BOCHALEMA-00031-2024	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO - ENTREGA CCTV FASE II	GE-2024-004487-DENOR	DENOR
48	OFICIO/ CORREO	30/05/2024	CSIES-BOCHALEMA-00032-2024	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO - ENTREGA CCTV FASE II	N/A	INT IVAN MAURICIO BRITO PLANEACIÓN BOCHALEMA
49	OFICIO/ CORREO	30/05/2024	CSIES-BOCHALEMA-00033-2024	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO - ENTREGA CCTV FASE II	N/A	ALCALDIA BOCHALEMA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

N°	OFICIO/ CORREO	FECHA DE RADICADO	CONSECUTIVO	ASUNTO	RADICADO	ENTIDAD
1	OFICIO	19/12/2023	INT -CM004-005-2023	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
2	OFICIO/ CORREO	27/12/2023	INT -CM004-008-2023	SOLICITUD ESTADO TRAMITE PERMISO CENS	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
3	OFICIO/ CORREO	15/01/2024	INT -CM004-003-2024	SOLICITUD DE REVISIÓN FICHAS TÉCNICAS EQUIPOS A INSTALAR	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
4	CORREO	18/01/2024	N/A	CITACIÓN COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
5	OFICIO	24/01/2024	SP-120-AMB-0053	RESPUESTA SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE ANTICIPO EN RESERVA	N/A	PLANEACION BOCHALEMA

6	CORREO	25/01/2024	N/A	APROBACIÓN APLAZAMIENTO COMITÉ	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
7	CORREO	29/01/2024	INT -CM004-005-2024	ALERTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO FASE II IMPLEMENTACIÓN	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
8	CORREO	29/01/2024	INT -CM004-006-2024	SOLICITUD PLAN DE CHOQUE FASE II IMPLEMENTACIÓN	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
9	CORREO	9/02/2024	N/A	CITACIÓN COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
10	CORREO	10/02/2024	N/A	RESPUESTA DIRECCIONMIENTO IP	N/A	DENOR
11	CORREO	15/02/2024	N/A	CITACIÓN COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
12	CORREO	28/02/2024	N/A	CITACIÓN COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
13	OFICIO/ CORREO	12/03/2024	INT-CM004-009-2024	APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES CONTRATO N° LP-003-2023	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
14	OFICIO/ CORREO	12/03/2024	INT-CM004-010-2024	APROBACIÓN CAMBIO DE COORDINADOR CONTRATO N° LP-003-2023	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
15	CORREO	20/03/2024	N/A	CITACIÓN COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
16	CORREO	20/03/2024	N/A	PETICION DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
17	CORREO	20/03/2024	N/A	BORRADOR ACTA N° 008 PARA APROBACIÓN O RETROALIMENTACIÓN	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
18	CORREO	21/03/2024	N/A	SOLICITUD DE ESPACIO PARA REUNIÓN VIRTUAL	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
19	OFICIO/ CORREO	26/03/2024	INT-CM04-011-2024.	HALLAZGOS EN VISITA REALIZADA EL 19 DE MARZO DE 2024	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
20	CORREO	26/03/2024	N/A	CITACIÓN REUNIÓN AVANCE TRÁMITE CENS	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
21	CORREO	2/04/2024	N/A	BORRADOR ACTA N° 009 PARA APROBACIÓN O RETROALIMENTACIÓN	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
22	CORREO	8/04/2024	N/A	APUNTES REUNIÓN CON CENS - 5 DE ABRIL	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
23	CORREO	9/04/2024	INT-CM04-012-2024.	HALLAZGOS EN VISITA REALIZADA EL 4 DE ABRIL DE 2024	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
24	CORREO	11/04/2024	N/A	PREPARACIÓN VISITA DEL MINISTERIO	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA

25	CORREO	12/04/2024	N/A	CORRECIÓN DE INFORME MENSUAL 001 - NOVIEMBRE	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
26	CORREO	15/04/2024	N/A	BORRADOR ACTA N°009 Y N°010 CORREGIDAS PARA REVISIÓN	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
27	CORREO	22/04/2024	N/A	OBSERVACIONES CONFORME A REVISIÓN DEL 16/04/2024	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
28	CORREO	23/04/2024	N/A	CITACIÓN COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
29	CORREO	26/04/2024	N/A	AUTORIZACION USO INFRAESTRUCTURA DE ENERGIZETT	N/A	ENERGIZETT
30	CORREO	4/05/2024	N/A	CITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES MINISTERIO	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
31	CORREO	10/05/2024	N/A	CITACIÓN COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO	N/A	MININTERIOR
32	CORREO	17/05/2024	N/A	CITACIÓN COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
33	OFICIO	18/05/2024	GS-2024-074812-DENOR/DISPO 1-ESTBO-13	RESPUESTA SOLICITUD CAMBIO DE ESCRITORIO	N/A	ESTACION BOCHALEMA
34	CORREO	23/05/2024	N/A	AUTORIZACION INICIO TENDIDO FIBRA EN INFRESTRUCTURA CENS	N/A	NELSON MOGOLLON CENS
35	CORREO	27/05/2024	N/A	APROBACIÓN PÓLIZAS ADICION No.002	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
36	CORREO	27/05/2024	N/A	OBSERVACIONES INFORME ABRIL 2024	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
37	CORREO	28/05/2024	N/A	FORMATO PRESENTACIÓN ESTADO DE ANTICIPO	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
38	CORREO	29/05/2024	N/A	SOLICITUD ENLACE ENTREGABLES FINALES Y PROTOCOLO DE PRUEBAS	N/A	INT. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
39	CORREO	30/05/2024	N/A	RADICADO DE OFICIO DE SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO	N/A	DENOR

Tabla 5. Correspondencia enviada y recibida


CAPITULO IV- GESTIÓN TÉCNICA

Una vez aprobados los estudios y diseños por la interventoría y el secretario de Planeación como supervisor designado del contrato, se dio inicio formalmente a la etapa de Implementación del objeto contractual.

4.1. OBRA PLANTA INTERNA – CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO (CCM)

Para las adecuaciones concernientes a instalación y configuración de equipos e instalaciones eléctricas, fue subcontratada la empresa NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS SAS, quienes para el mes de ayo de 2024 reportaron las siguientes actividades; valga aclarar que el CONSORCIO SIES 2023 mantiene la responsabilidad final del entregable:

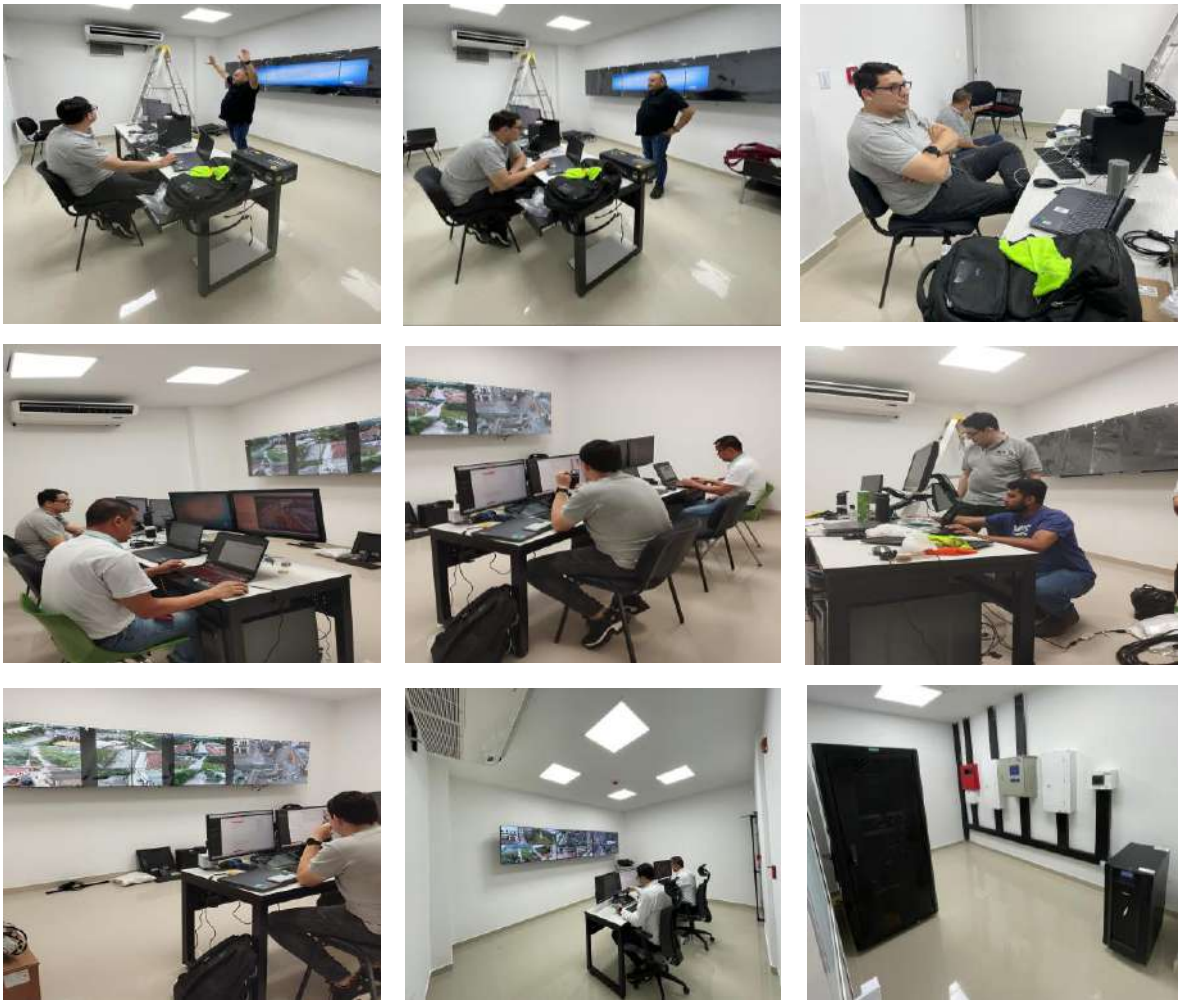- ACTIVIDADES 27, 28, 29 y 30 DE MAYO DE 2024:



Se realizó configuración de equipos en el CCM y se visualizó por completo la totalidad de puntos de cámara correspondientes a la FASE I y FASE II del Circuito Cerrado de Televisión de Bochalema.

- ACTIVIDADES 31 DE MAYO DE 2024.







Se realizó entrega oficial del Centro de Control y Monitoreo en total operación al Municipio de Bochalema en presencia de la Interventoría y Policía Nacional.

4.2. VESTIDA DE POSTE.

Las adecuaciones concernientes a instalación y configuración de equipos e instalaciones eléctricas, fue subcontratada la empresa NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS SAS, así mismo, se subcontrató a la empresa ENLACE REDES Y CONEXIONES SAS para el tendido de fibra óptica quienes para el mes de mayo de 2024 presentaron el siguiente avance, valga aclarar que el CONSORCIO SIES 2023 mantiene la responsabilidad final del entregable (Anexo 3. Hojas de vida puntos de cámara)

PUNTO DE CÁMARA	EXCAVACIÓN DE HUECO	HINCADO DE POSTE	CAJA 60*60	CAJA 30*30	CANALIZACIÓN	CAMARA PTZ	SPT	CORONAS
P.C 9	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 10	LISTO	LISTO	LISTO	N/A	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 11	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 12	LISTO	LISTO	LISTO	N/A	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 13	LISTO	LISTO	LISTO	N/A	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO

P.C 14	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 15	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 16	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 17	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 18	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 19	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 20	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 21	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 22	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 23	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 24	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 25	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 26	LISTO	LISTO	LISTO	N/A	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 27	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 28	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
P.C 29	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO

Tabla 6. Estado Obra civil en Calle

4.3. AVANCE DE OBRA

A la fecha de presentación del siguiente informe, se cuenta con el avance del 100% del proyecto conforme al cronograma estipulado. (Anexo 4. Acta parcial de avance)

CAPITULO V - GESTIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO MARZO DE 2023		
ITEM	**CONCEPTO**	VALOR
1	**Valor Inicial Del Contrato**	$ 1.737.279.281,00
2	Valor De Anticipo Entregado (40%)	$ 694.911.712,40
3	**Valor Total Restante Del Negocio**	**$ 1.047.726.176,35**
RESUMEN MOVIMIENTOS FIDUCIA		
1	Aportes realizados por el municipio a la fiducia	$ 694.911.712,40
2	Total movimientos egresos de la fiducia a proveedores	$ 694.911.314,95
3	Diferencia de aportes y egresos	$ 397,45
4	Porcentaje Gastado Del Anticipo	99,99%
5	Total rendimientos con corte a abril 2024	$ 386.030,81

Tabla 7. Balance Contrato LP-003-2023

A continuación, se presenta la información correspondiente a la inversión realizada del anticipo del proyecto previamente aprobado por la interventoría con corte al mes de Mayo (Anexo 5. Constancia de pago planilla integradora No.009)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR		RENDIMIENTOS
19/12/2023	Cuenta de cobro para desembolso del anticipo del 40% del valor del contrato, siendo el Beneficiario la Fiduciaria Popular	$ 694.911.712,40		
06/03/2023	Aporte Inversionista (Ingreso del recurso al banco)	$ 694.911.712,40		
14/03/2024	Desembolso 1 de anticipo de acuerdo a Orden de operación No.001 Nota: La amortización del anticipo hará mediante deducciones de actas o informes.	$ 159.071.060,93	Reflejado	
14/03/2024	Desembolso 2 de anticipo, de acuerdo a Orden de operación No.002 para el desembolso de la fiduciaria popular a los causantes: LMC TECNOLOGIA S.A.S., COMCAST TECHNOLOGY S.A.S, COPCO INGENIERIA - COMPAÑIA DE CONSTRUCC, MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS S A S Nota: La amortización del anticipo hará mediante deducciones de actas o informes.	$ 18.420.093,34	Reflejado	
14/03/2024	Desembolso 3 de anticipo, de acuerdo a Orden de operación No.003 para el desembolso de la fiduciaria popular a los causantes: NETKOLN DIGITAL SOLUTI. Nota: La amortización del anticipo hará mediante deducciones de actas o informes.	$ 149.344.812,32	Reflejado	
21/03/2024	Desembolso 4 de anticipo, de acuerdo a Orden de operación No.004 para el desembolso de la fiduciaria popular a los causantes: CONSORCIO SIES 2023 Nota: La amortización del anticipo hará mediante deducciones de actas o informes.	$ 133.519.648,54	Reflejado	
21/03/2024	Desembolso 5 de anticipo, de acuerdo a Orden de operación No.005 para el desembolso de la fiduciaria popular a los causantes: PABON SUAREZ RAFAEL Nota: La amortización del anticipo hará mediante deducciones de actas o informes.	$ 80.000.000,00	Reflejado	
21/03/2024	Desembolso 6 de anticipo, de acuerdo a Orden de operación No.006 para el desembolso de la fiduciaria popular a los causantes: CONSORCIO SIES 2023 Nota: La amortización del anticipo hará mediante deducciones de actas o informes.	$ 81.987.931,53	Reflejado	
26/3/2024	Desembolso 7 de anticipo, de acuerdo a Orden de operación No.007 para el desembolso de la fiduciaria popular a los causantes: VALENCIA LOPEZ ENRIQUE Nota: La amortización del anticipo hará mediante deducciones de actas o informes.	$ 56.000.000,00	Reflejado	
	RENDIMIENTOS A CORTE 24 DE MARZO DE 2024			$ 384.316,38

3/4/2024	Desembolso 8 de anticipo, de acuerdo a Orden de operación No.008 para el desembolso de la fiduciaria popular a los causantes: OFFIDISEÑOS SOLUCIONES INTEGRALES SAS, CHUSCANO ANAYA JOSE DAVID, ENLACES REDES Y CONEXIONES SAS Nota: La amortización del anticipo hará mediante deducciones de actas o informes.	$ 11.209.558,00	Reflejado	
	RENDIMIENTOS A CORTE 24 DE ABRIL DE 2024			$ 1.714,43
23/05/2024	Desembolso 9 de anticipo, de acuerdo a Orden de operación No.009 para el desembolso de la fiduciaria popular a los causantes: CONSORCIO SIES 2023. **Nota:** La amortización del anticipo hará mediante deducciones de actas o informes.	$ 5.358.210,29	Reflejado	
	TOTAL MOVIMIENTOS EGRESOS	**$ 694.911.314,95**		**$ 386.030,81**

Tabla 8.Resumen Movimientos fiducia

Para el mes de mayo de 2024, se realizó el pago de la Orden de operación No.009 dirigida a los siguientes proveedores (Anexo 6. Planilla integradora de pagos No.009):

ORDEN DE PAGO No.009				
ITEM	**No. FACTURA**	**No. NIT**	**NOMBRE**	**VALOR NETO PAGADO**
1	BOG1224272	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023	$ 5.041.380,29
2	IC - 71487	901.770.539	CONSORCIO SIES 2023	$ 316.830,00
TOTAL				**$ 5.358.210,29**

Tabla 9. Información Orden de pago 009

Una vez agotado el anticipo, se procedió a solicitar a la Fiduciaria popular la liquidación del Patrimonio autónomo, así mismo, que el saldo existente por un valor de trescientos noventa y siete 45/100 pesos ($397,45) fuere depositado a la cuenta del Municipio de Bochalema. (Anexo 7. Solicitud de liquidación patrimonio autónomo)

CAPITULO VI – GESTIÓN JURÍDICA

6.1 ADENDA MODIFICATORIA N°002 de 2024.

Se suscribió en fecha del 30 de abril de 2024 Adenda Modificatoria N°002 de 2024 al Contrato LP-003-2023 entre el Municipio de Bochalema y el Contratista CONSORCIO SIES 2023 en cual se modifica el plazo de ejecución del mismo hasta el 30 de junio de 2024, con el fin de dar cabal cumplimiento al objeto contratado. (Anexo 8. Adenda modificatoria No.002-2024)

Alcaldía de Bochalema Norte de Santander	CONTRATO	Código	FGC 036
		Versión	00
		Página	Página 1 de 3

ADENDA MODIFICATORIA No 002 de 2024	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATO N°	LP -003-2023
OBJETO	BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BOCHALEMA NIT 890505662-3
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA C.C. N° 1.093.140.227 expedida en Bochalema
CONTRATISTA	CONSORCIO SIES 2023 R.L. RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL	Nit 901.770.539-9 c.c. 88.269.550 de Cúcuta
VALOR DEL CONTRATO	MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($1.737.279.281.oo) M/CTE
DURACIÓN	TRES (3) MESES
DURACION ADICIONAL No 001	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Secretaria de Planeación
INTERVENTOR	IVAN MAURICIO BRITO
FORMA DE PAGO	**UN PRIMER DESEMBOLSO:** La alcaldía municipal cancelará el del contrato de la siguiente forma: Un primer pago por valor del cuarenta (40%) del valor total previa las siguientes reglas: **UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente al el 30% del valor total del contrato previa entrega de los siguientes productos: A. La respectiva acta parcial de avance del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. **UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente al 30% restante del valor del contrato contra entrega de los siguientes productos: a) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" debidamente diligenciado.
GARANTÍAS	Seguros del Estado Póliza de cumplimiento 11-44-101212252 Póliza de responsabilidad civil extracontractual 11-40-101057260

Entre los suscritos: **RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.093.140.227 expedida en Bochalema, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Bochalema con NIT 890505662-3, en su condición de Representante Legal, circunstancia que acredita con el acta 003 de fecha veintinueve (29) de diciembre de 2023, realizada ante la Notaría Segunda del Círculo de Pamplona, donde tomó posesión como Alcalde Municipal para el periodo constitucional 2024-2027, debidamente facultado para firmar contratos según lo dispuesto en ley 1551 de 2012, artículo 18 parágrafo 4 y artículo 29; Ley 80 de 1993, artículo 11, numeral 3; Artículo 315 numeral 3 Constitución política; Ley 136 de 1994, Artículo 91, Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012; Artículo 110 del decreto 111 de 1996, Artículo modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO,** por una parte; y por la otra **CONSORCIO SIES 2023 NIT 901.770.539-9 representada legalmente por RAFAEL PABON LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía número 88.269.550** expedida en Cúcuta, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA.**

Código Postal 543010 Calle 3 N° 3-08 Esquina Palacio Municipal Bochalema – Norte de Santander e-mail: alcaldia@bochalema-nortedesantander.gov.co

Ilustración 1. Adenda No.002/2024

6.2. PÓLIZAS

Para le ejecución del proyecto fueron aprobadas dos (2) pólizas con la aseguradora Seguros del estado S.A.:

No. DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA*	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	FECHA APROBACIÓN
PÓLIZA CUMPLIMIENTO ESTATAL 11-44-101212252	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/11/2023 al 31/10/2024	$173,727,928.10	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	28/11/2023 al 30/06/2024	$694,911,712.40		
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	$347,455,856.20		
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/11/2023 al 30/06/2027	$173,727,928.10		
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 11-40-101057260	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	28/11/2023 al 30/06/2024	$347,455,856.20		

Tabla 10. Información Pólizas

CAPITULO VII - GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2024, se continuaron las obras para la adecuación e instalación de los equipos conforme a las especificaciones técnicas del contrato. Por lo tanto, se llevó a cabo el seguimiento de la correcta aplicación de los Planes de Gestión ambiental y SG-SST.

7.1. GESTIÓN AMBIENTAL

Los informes de cumplimiento ambiental (ICA) son una herramienta de prevención, seguimiento y control, los cuales se centran en la verificación del cumplimiento y efectividad de las responsabilidades

asumidas por el beneficiario de la licencia ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El informe de cumplimiento ambiental reunirá todas las evidencias y actividades realizadas sobre el cumplimiento del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA) con la finalidad de emitir conclusiones sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental de la empresa y tomar las acciones correctivas y preventivas para la mejora continua de sus procesos, para ello se llevan a cabo las siguientes actividades en la etapa de la implementación:

7.1.1 SEGUIMIENTO A LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

Conforme a los lineamientos estipulados en la Resolución 472 del 2017, por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición, se dispuso de sitios estratégicos, para el almacenamiento de los residuos sólidos, los cuales son guardados en costales y después son trasladados a su destino final.



Ilustración 2. Disposición Residuos Sólidos

7.1.2 ROTULACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS.

Se comprobó para el mes de marzo de 2024 que se cumpliera con la conservación y depósito de los productos químicos teniendo en cuenta las condiciones del ambiente (Calor, fuentes de ignición, luz y humedad), así mismo, se realizó la identificación y clasificación de las sustancias.



Ilustración 3. Disposición sustancias químicas.

7.2. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Este Informe se entrega los primeros días de cada mes de ejecución del contrato en su fase de implementación, en este se incluyen las inducciones, capacitaciones realizadas, las inspecciones, los permisos de trabajo tanto de alturas como eléctricos, además de los análisis de trabajo seguro.

Se verifica que el grupo operativo cuente con los elementos de protección personal y elementos contra caídas asignados para las actividades concernientes en el contrato, diariamente se realizará inspección de los equipos y herramientas. Además, se confirmará que los funcionarios con actividades en alturas cuenten con el certificado vigente para realizar dichos trabajos.

El supervisor de seguridad y salud en el trabajo designado es el Ingeniero Industrial Henry Alexander Castro Celis, con especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo, quien realizó la verificación del cumplimiento de los procesos y protocolos correspondientes y efectuó acompañamiento constante a las actividades del contrato y encuesta diaria, reporte de actos y condiciones inseguras, reporte de las ACPM, acciones (correctivas, preventivas y de mejora), charlas preoperativas de seguridad y salud en el trabajo y ambiental.

7.2.1 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Para el mes de mayo de 2024 se contó con el siguiente personal, del cual se verificó la realización del pago al sistema de seguridad social correspondiente al mes vencido de abril de 2024 (Anexo 9. Planilla de pago seguridad social abril):

ITEM	NOMBRE	CARGO	TIPO DE VINCULACION	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	RAFAEL PABON LOPEZ	Director de proyecto	Nomina	X
2	ROLANDO RAMIRO VILLAMIZAR	Residente de proyecto	Nomina	X
3	ANA BOLENA MESA MORA	Residente Civil	Nomina	X
4	ANDERSON JHOAN CONTRERAS	Coordinador de proyecto	Nomina	X
5	HENRY ALEXANDER CASTRO	Coordinador SISO	Prestación de servicios	X

Tabla 11. Personal activo abril 2024

7.2.2 CAPACITACIONES

Se realizaron capacitaciones tanto a trabajadores dependientes como a contratistas con el fin de que pudiesen identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados a las actividades realizadas y documentándose bajo el proceso de inducción por personal idóneo conforme a la normatividad vigente.



Ilustración 4. Capacitaciones.

7.2.3. INSPECCION Y DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

El CONSORCIO SIES 2023 suministro para el mes de mayo todos los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades. Es compromiso del personal realizar inspecciones de los equipos antes de cada operación y diariamente antes de iniciar la labor. En este proceso se lleva a cabo antes de cada actividad.



Ilustración 5. Inspección Trabajo de alturas

7.2.4 PUNTOS DE INTERVENCIÓN

Es importante señalizar y delimitar los puntos de intervención para informar o advertir de la existencia de un riesgo o peligro, con los conos o bandas de seguridad se delimita la obligación a seguir de una determinada conducta de los transeúntes para evitar posibles riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de la actividad



Ilustración 6. Evidencia prevención vial y bloqueo de vías

7.2.5 DOCUMENTACION PROCESO SG-SST.

Se cuenta con el programa de SG-SST con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo en el desarrollo del objeto contractual, y de preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Para el cumplimiento del programa de SG-SST, se realiza seguimiento mediante la utilización de los siguientes formatos:

- Formato ATS O AST: Se establece este proceso, para la identificación de los peligros y riesgos en todas las actividades a desarrollar, y donde identificamos el personal que interviene en la actividad, para este proceso se lleva a cabo el formato ATS del sitio de intervención.

- Formato de Asistencia: En este se registra las charlas diarias y de capacitación y de los procesos donde se deseen dejar constancias de comunicación de reuniones, cursos ya sea del responsable SST o jefes áreas o personal experto en los temas

- Formato de Manejo de Residuos Sólidos: Se identifica la cantidad de material solido saliente de la actividad intervenida donde se registra diariamente la cantidad de material solido saliente a la bodega de manejo de RCD.

- Formato Preoperacional Pulidora y Taladro: Se realiza diariamente por los operarios en presencia del jefe de área el registro documental con la lista de chequeo de la revisión de los equipos eléctricos antes de iniciar labores.

- Formato de Inducción y Reinducción En SST: Se realizan capacitaciones al personal en el proceso de inducción y reinducción en el sistema de gestión seguridad salud en el trabajo, con el fin de brindar la información y comprometer al personal en cumplir con los procesos del programa del SG-SST

- Formato de Reporte de Incidentes y Accidentes: se establece los formatos de reporte de incidentes y accidentes para darle cumplimiento a la normatividad vigente y llevar a cabo los procesos que se requieren para presentar ante la ARL y alta dirección de la empresa.

- Formato de Entrega de EPP y Dotación: De Trabajo: en este formato se establece la dotación y entrega de elementos de seguridad acorde a la actividad que se desarrolla.

7.3. SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS

Con el fin de garantizar el cuidado integral y protección del personal de trabajo en la obra y dándole cumplimiento al **decreto único reglamentario 1072 del 2015 del sector trabajo**, los proveedores y contratistas deben ser involucrados dentro del SGSST, de la empresa y cumplir con las políticas de SST establecidas y alinear su SGSST con el contratante **Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.2.2.16.**

7.3.1. SEGUIMIENTO A LA EMPRESA ENLACE REDES Y CONEXIONES

Se verificó el personal activo en terreno con corte al mes de mayo de 2024 por la empresa enlace redes y conexiones, así como las respectivas afiliaciones a salud, pensiones, riesgos laborales (Anexo 10. Planilla de pago Seguridad Social mayo – Afiliaciones Seguridad Social)

No.	NOMBRE	VINCULACIÓN	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	AFILIACIONES (Salud, Pensión y Riesgos)
1	JORGE ARMANDO MOLINA	Prestación de servicios	X	X
2	EDWIN OMAR BOHORQUEZ	Prestación de servicios	X	X
3	ZAID FABIAN OSUNA	Prestación de servicios	X	X

Tabla 12. Personal Enlaces, Redes y Conexiones

7.3.2. SEGUIMIENTO A LA EMPRESA NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.

Se verificó el personal activo en terreno con corte al mes de mayo de 2024, del cual se verificó la realización del pago al sistema de seguridad social correspondiente al mes vencido de abril de 2024 (Anexo 11. Planilla de pago seguridad social abril NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS)

No.	NOMBRE	VINCULACIÓN	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	JESUS FERNANDO TOLOZA PORTILLA	Nomina	X
2	EDIXON MURILLO ORTEGA	Nomina	X
3	LUIS ERNESTO HERNANDEZ	Nomina	X

Tabla 13.Personal Nektoln Digital Solutions

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
Representante Legal
CONSORCIO SIES 2023

Anexo 1.
Actas de seguimiento

El futuro es de todos Mininterior	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **ANEXO 7**	**Código: GC-P3-F7** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

ACTA No.	10/05/24-C1612
FECHA	10/05/2024
CIUDAD	BOGOTA D.C / TEAMS MINISTERIO DEL INTERIOR
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1612-2023
OBJETO CONTRATO 1612 - 2023:	Realizar acciones, actividades y compromisos conjuntos, tendientes al estudio, diseño, implementación e instalación del circuito cerrado de televisión CCTV para seguridad y convivencia, por parte del Municipio de BOCHALEMA, Departamento de Norte de Santander, para lo cual obtendrá aportes financieros del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON - sistemas integrados de emergencia y seguridad y las condiciones técnicas mínimas del proyecto, por parte del ministerio del interior
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	79,15%
MOTIVO:	Reunión Seguimiento semanal sobre las obligaciones contractuales a cargo del Municipio de Bochalema Norte de Santander

ANTECEDENTES DEL CONTRATO 2316-2022

EL DIA 07/07/2023 SE SUSCRIBE EL CONVENIO No. 1612 - 2023
VALOR DEL CONVENIO $1.887.478.792 APORTES MINISTERIO - FONSECON: $1.189.111.639 APORTES MUNICIPIO: $188.747.879
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO No. 1612 - 2023: 30 de julio de 2024.

DESARROLLO DE LA REUNION

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, que integran el grupo de supervisión y apoyo a la supervisión; del convenio, tanto del Municipio como del Ministerio.

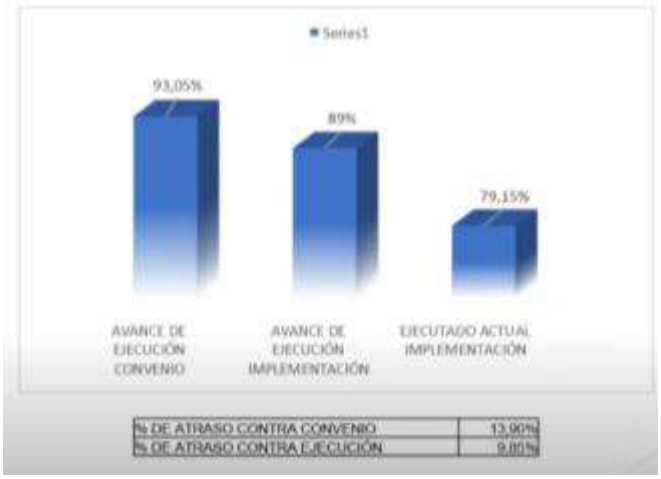
2. Concesión de los postes con CENS; se ha generado la minuta de concesión de arriendo de los postes a CENS por parte del municipio Bochalema, se presentan inconvenientes para tramitar la póliza de este convenio debido que la empresa CENS solicita crear la póliza con entidades reconocidas debido a que han tenido inconvenientes con pólizas de empresas no reconocidas, el secretario de Planeación menciona que la póliza se tramitara en el trascurso del día 10 de mayo 2024.

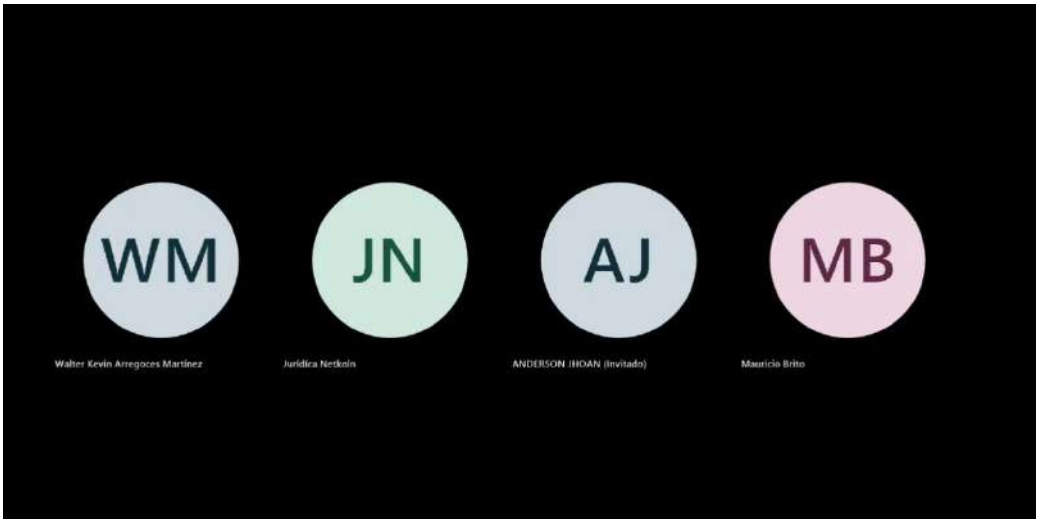
3. Se generaron quejas por parte del contratista CCTV debido que una cámara de seguridad de la estación de policía quedo deshabilitada durante la ejecución de labores del convenio, el contratista aclara que los trabajos realizados no afectan las cámaras relacionadas; y que el actual convenio no cubre mantenimiento de fases anteriores, el actual inconveniente no gener a riesgos para el convenio 1612-23

4. Avance del proyecto

   Se desarrollaron las siguientes actividades:
   Módulos de puesto de trabajo
   Puntos de cableado Estructurado
   Monitores de operador
   Instalación de puerta de acceso y puerta de cuarto de equipo

Conforme a las actividades realizadas el porcentaje de avance ejecutado actual de implementación es 79,15% lo que genera un atraso del 13,9 % con respecto al convenio y un 9,85 con respeto a la ejecución





ASISTENTES DE LA REUNIÓN

MINISTERIO DEL INTERIOR

- Walter Kevin Arregoces - Apoyo a la Supervisión Convenio No. 1612-2023
- Havid Numa Marchena - Apoyo a la Supervisión Convenio No. 1612-2023

MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

- Jhonattan Jose Boada Ortega - secretario de Planeación de Bochalema
- Mauricio Brito –Interventoría
- Anderson Contreras – Coordinador contratista

- Ana Bolena - Ingeniera residente Contratista

Fecha de Vencimiento del Convenio 1612 de 2023: 30 de julio de 2024.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio Bochalema	• Queda como compromiso el cargue de la póliza de concesión de postes con CENS.	14/05/2024

FIRMA	
 **Nombre y firma: Jhonattan Jose Boada Ortega** Cargo: secretario de Planeación del Municipio de Bochalema	 **Nombre y firma: Mauricio Brito** Cargo: Interventor
 **Nombre y firma: Anderson Contreras** Cargo: Coordinador contratista.	 **Nombre y firma: Rolando Villamizar** Cargo: Residente contratista.
 **Nombre y firma: Walter Kevin Arregoces Martínez.** Cargo: Apoyo a la Supervisión Convenio 1612- 2023 Ministerio del Interior	

ACTA No.	17/05/24-C1612
FECHA	17/05/2024
CIUDAD	BOGOTA D.C / TEAMS MINISTERIO DEL INTERIOR
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1612-2023
OBJETO CONTRATO 1612 - 2023:	Realizar acciones, actividades y compromisos conjuntos, tendientes al estudio, diseño, implementación e instalación del circuito cerrado de televisión CCTV para seguridad y convivencia, por parte del Municipio de BOCHALEMA, Departamento de Norte de Santander, para lo cual obtendrá aportes financieros del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON - sistemas integrados de emergencia y seguridad y las condiciones técnicas mínimas del proyecto, por parte del ministerio del interior
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	81,13%
MOTIVO:	Reunión Seguimiento semanal sobre las obligaciones contractuales a cargo del Municipio de Bochalema Norte de Santander

ANTECEDENTES DEL CONTRATO 2316-2022

EL DIA 07/07/2023 SE SUSCRIBE EL CONVENIO No. 1612 - 2023
VALOR DEL CONVENIO $1.887.478.792 APORTES MINISTERIO - FONSECON: $1.189.111.639 APORTES MUNICIPIO: $188.747.879
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO No. 1612 - 2023: 30 de julio de 2024.

DESARROLLO DE LA REUNION

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, que integran el grupo de supervisión y apoyo a la supervisión; del convenio, tanto del Municipio como del Ministerio.

2. Retomamos el compromiso del proceso de la póliza de la concesión con CENS, el municipio envió la póliza a CENS tal como se evidencio en el grupo de WhatsApp por parte del supervisor del contrato; el contratista nos indica que tienen autorización para el uso de la infraestructura de postería para llevar a cabo las actividades del convenio desde el día 16 de mayo 2024. Revisión de las fechas de contrato derivados: El contrato del consorcio se confirma que su fecha se amplió al 30 de julio

3. Según compromisos adquiridos por parte del contratista la ejecución de la implementación se tomaría un mes y medio a partir de la aprobación de la concesión con CENS para poder trabajar sobre la infraestructura, teniendo en cuenta las fechas se realizará entrega de obra para el 30 de junio.

4. La interventoría pregunta de qué forma se podría reducir el porcentaje de atraso (7%) de la ejecución; el contratista nos indica que gracias a la agilización y rapidez del tendido de fibra se podrá reducir el atraso, actualmente llevan 4 km de tendido hasta el momento

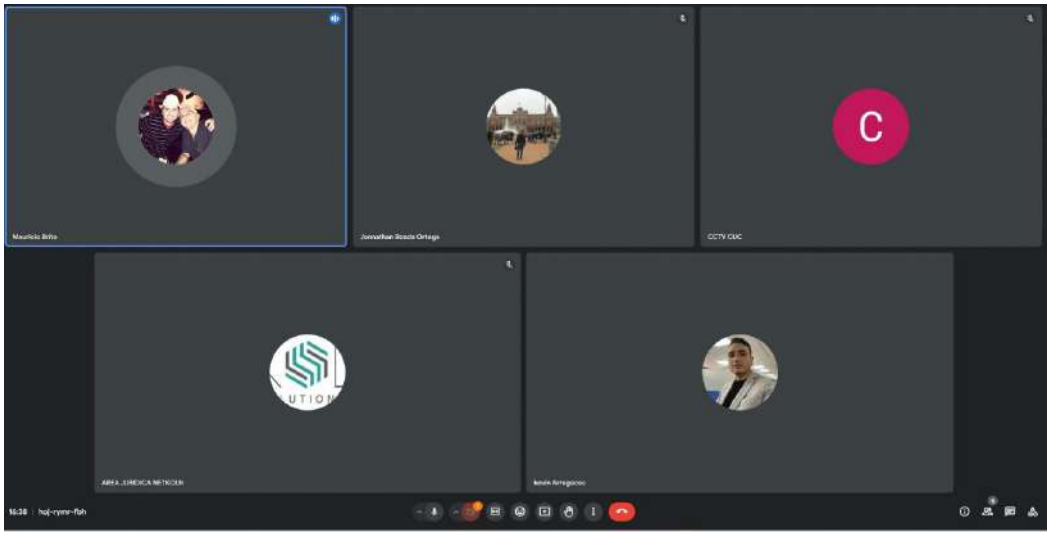
5. El contratista menciona que se reportó un acto de vandalismo contra una de las cámaras, hasta el momento no se ha verificado si se generaron daños en el dispositivo; también menciona que se tiene identificado al agresor en caso de que se reporten daños para proceder de forma legal.

6. Se retoma el compromiso de las observaciones sobre el tercer desembolso, punto 12; el supervisor del municipio menciona que el jurídico se le ha asignado la tarea nuevamente y el enviara el oficio una vez este completo.

7. Avance del proyecto

Tendido de fibra óptica
Terminación de punto de visualización.

Conforme a las actividades realizadas el porcentaje de avance ejecutado actual de implementación es 81,13% lo que genera un atraso del 7,88 % con respecto al avance programado



ASISTENTES DE LA REUNIÓN

MINISTERIO DEL INTERIOR

- Walter Kevin Arregoces - Apoyo a la Supervisión Convenio No. 1612-2023
- Havid Numa Marchena - Apoyo a la Supervisión Convenio No. 1612-2023

MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

- Jhonattan Jose Boada Ortega - secretario de Planeación de Bochalema
- Mauricio Brito –Interventoría
- Anderson Contreras – Coordinador contratista
- Ana Bolena - Ingeniera residente Contratista

Fecha de Vencimiento del Convenio 1612 de 2023: 30 de julio de 2024.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO

Municipio Bochalema	• Queda como compromiso el inicio de instalación eléctrica de los puntos de cámara desde el día Martes 21 de mayo del 2024 • Entrega del Oficio de aclaración del punto 12 de Observaciones realizadas sobre el tercer desembolso del convenio.	21/05/2024 20/05/2024

FIRMA	
Nombre y firma: Jhonattan Jose Boada Ortega Cargo: secretario de Planeación del Municipio de Bochalema	**Nombre y firma: Mauricio Brito** Cargo: Interventor
Nombre y firma: Anderson Contreras Cargo: Coordinador contratista.	**Nombre y firma: Rolando Villamizar** Cargo: Residente contratista.
Nombre y firma: Walter Kevin Arregoces Martínez. Cargo: Apoyo a la Supervisión Convenio 1612- 2023 Ministerio del Interior	

ACTA No.	24/05/24-C1612
FECHA	24/05/2024
CIUDAD	BOGOTA D.C / TEAMS MINISTERIO DEL INTERIOR
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1612-2023
OBJETO CONTRATO 1612 - 2023:	Realizar acciones, actividades y compromisos conjuntos, tendientes al estudio, diseño, implementación e instalación del circuito cerrado de televisión CCTV para seguridad y convivencia, por parte del Municipio de BOCHALEMA, Departamento de Norte de Santander, para lo cual obtendrá aportes financieros del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON - sistemas integrados de emergencia y seguridad y las condiciones técnicas mínimas del proyecto, por parte del ministerio del interior
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	89.15%
MOTIVO:	Reunión Seguimiento semanal sobre las obligaciones contractuales a cargo del Municipio de Bochalema Norte de Santander

ANTECEDENTES DEL CONTRATO 2316-2022

EL DIA 07/07/2023 SE SUSCRIBE EL CONVENIO No. 1612 - 2023
VALOR DEL CONVENIO $1.887.478.792 APORTES MINISTERIO - FONSECON: $1.189.111.639 APORTES MUNICIPIO: $188.747.879
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO No. 1612 - 2023: 30 de julio de 2024.

DESARROLLO DE LA REUNION

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, que integran el grupo de supervisión y apoyo a la supervisión; del convenio, tanto del Municipio como del Ministerio.

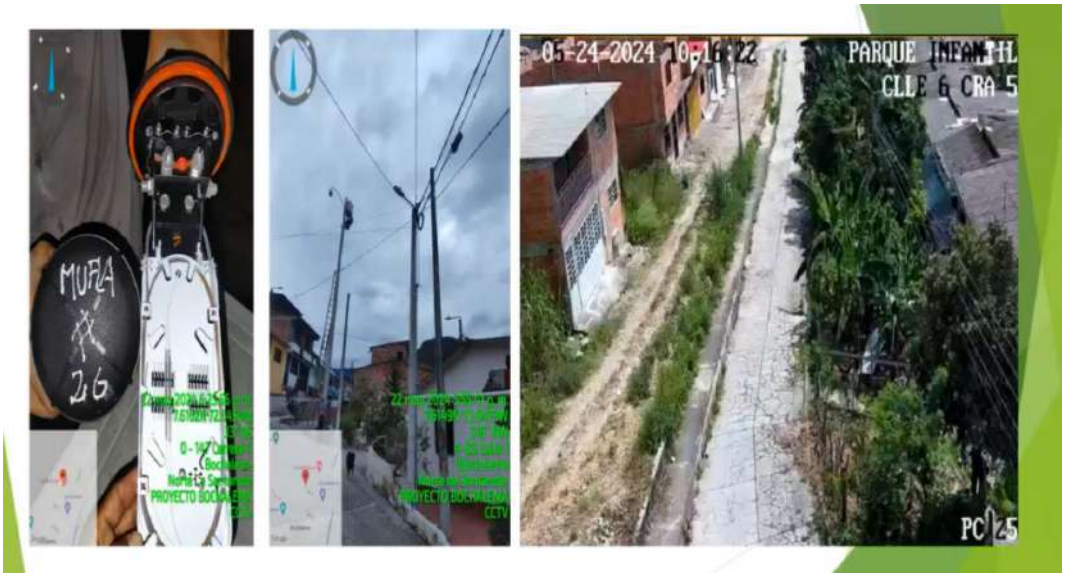
2. Se retoman los compromisos de seguimientos anteriores

   - Se realiza seguimiento al proceso de concesión con la empresa CENS, la empresa dio la autorización de iniciar labores, además solicitaron información técnica al contratista y dicha información se envió por parte del contratista.
   - Se realizo la revisión de la cámara vandalizada, el contratista nos comenta que se realizaron visitas a los puntos afectados, no se evidencia afectación de forma superficial, aun no se pueden realizar pruebas de visualización del cámara debido que no se ha realizado el empalme de fibra, queda pendiente realizar pruebas de visualización
   - El supervisor del municipio realizo la entrega de las observaciones del tercer desembolso, el proceso se encuentra en revisión.

3. Se recordó la entrega del expediente de pago, información que se solicitó según los compromisos adquiridos en el convenio, actualmente se está recopilando la información.

4. A continuación el contratista nos comparte el avance parcial del proyecto:
   Se lleva adelantado el tendido de fibra, se inician labores de empalme y visualización de cámaras, se confirma que se pueden visualizar 5 cámaras desde el CSM, se cuenta con 6000 mts de fibra tendida y 5 muflas empalmadas, lo que nos representa un 89.15% de avance de con respecto a 92% generando un atraso del 2.85%

   Se comparten evidencias fotográficas:



ASISTENTES DE LA REUNIÓN



MINISTERIO DEL INTERIOR

- Walter Kevin Arregoces - Apoyo a la Supervisión Convenio No. 1612-2023

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

- Jhonattan Jose Boada Ortega - secretario de Planeación de Bochalema
- Mauricio Brito –Interventoría

- Anderson Contreras – Coordinador contratista
- Ana Bolena - Ingeniera residente Contratista

Fecha de Vencimiento del Convenio 1612 de 2023: 30 de julio de 2024.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio Bochalema	• Queda como compromiso el inicio de pagos a contratista por parte del municipio.	31/05/2024

FIRMA	
Nombre y firma: Jhonattan Jose Boada Ortega Cargo: secretario de Planeación del Municipio de Bochalema	**Nombre y firma: Mauricio Brito** Cargo: Interventor
Nombre y firma: Anderson Contreras Cargo: Coordinador contratista.	**Nombre y firma: Rolando Villamizar** Cargo: Residente contratista.
Nombre y firma: Walter Kevin Arregoces Martínez. Cargo: Apoyo a la Supervisión Convenio 1612- 2023 Ministerio del Interior	

ACTA No.	31/05/24-C1612
FECHA	31/05/24
CIUDAD	BOGOTA D.C / TEAMS MINISTERIO DEL INTERIOR
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1612-2023
OBJETO:	Realizar acciones, actividades y compromisos conjuntos, tendientes al estudio, diseño, implementación e instalación del circuito cerrado de televisión CCTV para seguridad y convivencia, por parte del Municipio de BOCHALEMA, Departamento de Norte de Santander, para lo cual obtendrá aportes financieros del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON - sistemas integrados de emergencia y seguridad y las condiciones técnicas mínimas del proyecto, por parte del ministerio del interior
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	100%
MOTIVO:	Reunión Seguimiento semanal sobre las obligaciones contractuales a cargo del Municipio de Bochalema Norte de Santander

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: WALTER KEVIN ARREGOCES Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN SPSCC	Nombre: Ana Bolena Cargo: Ingeniera residente Contratista

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

EL DIA 07/07/2023 SE SUSCRIBE EL CONVENIO No. 1612 - 2023
VALOR DEL CONVENIO $1.887.478.792 APORTES MINISTERIO - FONSECON: $1.189.111.639 APORTES MUNICIPIO: $188.747.879
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO No. 1612 - 2023: 30 de julio de 2024.

DESARROLLO DE LA REUNION

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, que integran el grupo de supervisión y apoyo a la supervisión; del convenio, tanto del Municipio como del Ministerio.

2. Se retoman los compromisos de seguimientos anteriores
   - Se realiza la socialización de las respuestas a las segundas observaciones generadas sobre el tercer desembolso del convenio 1612; por lo anterior el interventor se encarga de sustentar cada uno de los puntos compartidos con su debida justificación y soportes.

3. A continuación se comparte el avance parcial del proyecto:

Para la fecha del 31 de junio el convenio según el avance en la ejecución debería ser de 96% con respecto a la implementación y 97% de convenio, actualmente se tiene un 100% en la implementación, el proyecto se encuentra en el cierre de revisión documental, actualmente se encuentra en la fase de pruebas y puesta en marcha, ya se realizo la puesta en marcha, se verifico cada uno de los puntos de cámara, se presentan atrasos de verificación debido a inconvenientes climáticos con las lluvias.

Se presentan evidencias fotográficas del CSM



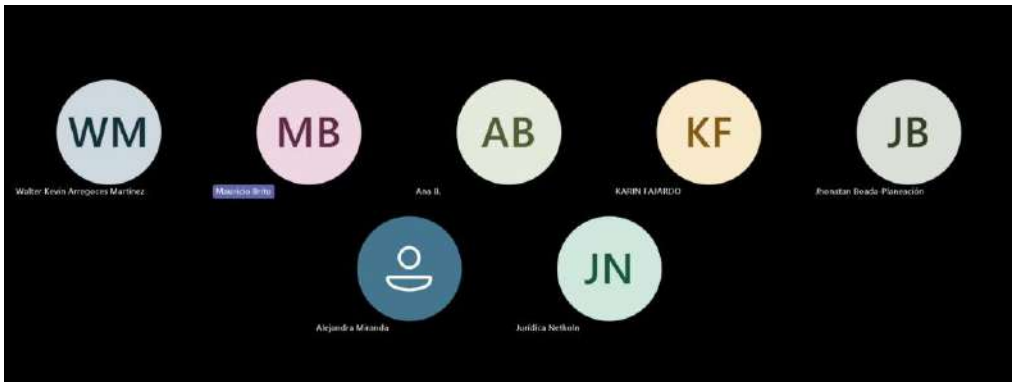


Hasta el momento no se asignado el personal de visualización por parte de la policía nacional, esta actividad es requerida para que el contratista realice la transferencia del conocimiento al personal encargado.

4. Se confirma que las cámaras vandalizadas se encuentran en perfecto estado y transmitiendo video.

5. Actualmente se esta realizando el seguimiento de una póliza de todo riesgo, la cual esta asignada al municipio por contrato, el municipio se compromete a entrega de la póliza en la siguiente semana.

ASISTENTES DE LA REUNIÓN



MINISTERIO DEL INTERIOR

- Walter Kevin Arregoces - Apoyo a la Supervisión Convenio No. 1612-2023

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

- Jhonattan Jose Boada Ortega - secretario de Planeación de Bochalema
- Mauricio Brito –Interventoría
- Ana Bolena - Ingeniera residente Contratista

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO DE BOCHALEMA	Generar la póliza de todo riesgo por parte del municipio como requerimiento contractual.	7/06/2024

FIRMA DE ASISTENTES	
Por parte de: ***MINISTERIO DEL INTERIOR***  **Nombre y firma: WALTER KEVIN ARREGOCES** Cargo: Apoyo a supervisión 1612-2022 Email: Walter.arregoces@mininterior.gov.co Celular: 3057975877	

Anexo 2. Correspondencia enviada y recibida

ENVIADOS

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

INFORME MENSUAL 006 - ABRIL DE 2024

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co> 6 de mayo de 2024, 3:17 p.m.
Para: interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com

Buen día

Cordial saludo,

Adjunto oficio del asunto.

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

2 archivos adjuntos

CSIES-BOCHALEMA-0024-2024 - INFORME MENSUAL - ABRIL.pdf
183K

INFORME MENSUAL 006 ABRIL DE 2024 CON ANEXOS.pdf
15262K

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

Tramites convenio interadministrativo CENS

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co> 10 de mayo de 2024, 6:22 p.m.
Para: planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co

Buen día

Cordial saludo,

Adjunto oficio del asunto.

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

CSIES-BOCHALEMA-0025-2024 - Tramites convenio interadministrativo CENS.pdf
243K

CONSORCIO SIES 2023

San José de Cúcuta, 15 de mayo de 2.024

CSIES-BOCHALEMA-0026-2024

Intendente
KATIUSKA CASTRO CARPIO
Comandante Estación de Policía
Bochalema, Norte de Santander

Recibido
15/05/24
11:41 Am
Pt: Tatiana Bermudez

ASUNTO: Retiro de escritorio – CCTV Fase I.

REFERENCIA: Contrato LP-003-2023 cuyo objeto es *"BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"*

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, me permito comunicar que será retirado del cuarto de CCTV ubicado en la estación de policía, el escritorio perteneciente a la Fase I y en su lugar, será remplazado por un escritorio nuevo con el fin de unificar y conservar la armonía de la sala de CCTV.

Cordialmente,

RAFAEL PABON LOPEZ
Representante Legal
Consorcio SIES 2023

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

SOLICITUD CAPACITACIÓN CUADRILLA TENDIDO FIBRA - PROYECTO BOCHALEMA

1 mensaje

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co> 20 de mayo de 2024, 2:05 p.m.
Para: nelson.mogollon@cens.com.co
CC: planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co

Buen día

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito remitir la información solicitada respecto a la cuadrilla técnica que realizará el tendido de fibra en el Municipio de Bochalema referente al Contrato LP-003-2023 cuyo objeto es *"BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"* con el fin de que se programe la capacitación correspondiente en la mayor brevedad posible:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CURSO ALTURAS
ZAID FABIAN OSUNA CLAVIJO	1.090.434.543	LINIERO	SI
EDWIN OMAR BOHORQUEZ MOLINA	1.004.808.208	AUXILIAR LINIERO	N/A
JORGE ARMANDO MOLINA QUINTERO	1.090.390.447	LINIERO	SI
EDIXON MURILLO ORTEGA	1.090.392.473	TEC. LINEAL/EMPALMADOR	SI

Adjunto Certificación Curso de Alturas y afiliaciones a Salud, pensiones y Riesgos.

Quedo atento a sus comentarios y/o cualquier requerimiento adicional.

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

7 archivos adjuntos

AFILIACIONES LINIERO- EMPALMADOR - EDIXON MURILLO ORTEGApdf.pdf
263K

AFILIACIONES LINIERO - ZAID FABIAN OSUNA.pdf
660K

ALTURAS ZAID FABIAN OSUNA CLAVIJO.pdf
43K

ALTURAS JORGE ARMANDO MOLINA.pdf
43K

ALTURAS EDIXON MURILLO.pdf
43K

AFILIACIONES AUX LINIERO - EDWIN OMAR BOHORQUEZ.pdf
500K

AFILIACIONES LINIERO - JORGE ARMANDO MOLINA.pdf
683K

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS - CONTRATO LP-003-2023

2 mensajes

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co> 20 de mayo de 2024, 2:54 p.m.
Para: planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co
CC: interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com

Buen día

Cordial saludo,

Adjunto oficio del asunto.

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

3 archivos adjuntos

Anexo 5 Póliza Cumplimiento_ Adición 2.pdf
2772K

Anexo 5_Póliza RCE Actualización_Adición 2.pdf
3760K

CSIES-BOCHALEMA-0027-2024 - ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS.pdf
185K

interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com 27 de mayo de 2024, 5:53 a.m.
<interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Para: CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>
CC: planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co

[Texto citado oculto]

> [Texto citado oculto]
> SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC
> Carrera 7N 19-28 Ed. Torre Bolívar Oficina 1504
> Tel: +57 310 491 8242 - +57 311 6017996 Pereira - Risaralda
> Web: www.smartycolombia.com [1] - www.smartycolombia.co [1]
>
> _"La información contenida en este correo electrónico y anexos son confidenciales, están dirigidos únicamente para el uso del emisor y el remitente al que fue dirigido, contiene información confidencial, cualquier uso, distribución o reproducción de este correo que no sea por el destinatario, queda prohibido."_
> Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario.
> ¡Proteger el medio ambiente es tarea de todos!
>
> Links:
> ------
> [1] https://smartycolombia.com/

Buen día estimados.

Se revisan las pólizas suministradas por el contratista de acuerdo a la Ampliación Nro. 2 de contrato, y se encuentran conformes.

Cordial saludo!

--
IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
Director de Interventoría
Cel.(57) 3017441295
www.comunipingenieria.com
Colombia

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

SOLICITUD PERSONAL OPERADOR CCM BOCHALEMA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co> 24 de mayo de 2024, 11:14 a.m.
Para: Denor.ebochalema@policia.gov.co

Buen día

Cordial saludo,

Adjunto oficio del asunto.

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

CSIES-BOCHALEMA-0028-2024 - PERSONAL CCM.pdf
182K

CONSORCIO SIES 2023

San José de Cúcuta, 24 de mayo de 2024

CSIES-BOCHALEMA-0029-2024

Arquitecto
JHONATTAN BOADA ORTEGA
Secretario de Planeación
Municipio de Bochalema
planeación@bochalema-nortedesantander.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCHALEMA
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
Hora 10:00 Am
Fecha 27 MAY 2024 Radicado - - 2089
Cód. Dependencia destino 100
Responde: Folios 106
Sale a:

ASUNTO: Solicitud de Pago parcial No.001

REFERENCIA: Contrato LP-003-2023 cuyo objeto es *"BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"*

Cordial saludo,

De forma respetuosa, me permito presentar la siguiente documentación para el segundo desembolso del contrato conforme se estipula en la cláusula segunda de la Adenda modificatoria No.001 de 2024 y con la cual acreditamos el porcentaje de avance del 78.06%:

- Factura electrónica de venta
- Acta de recibo parcial
- Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales
- Registro Único Tributario – RUT
- Certificación Bancaria
- Informe de avance de ejecución No.001-2024 (Consorcio SIES 2023)
- Informe de parcial de avance de interventoría No.001.

Agradeciendo la atención prestada.

Atentamente,

Rafael Pabón López

RAFAEL PABON LOPEZ
Representante Legal
Consorcio SIES 2023

Nro. Folios: 106.

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

FACTURAS - ORDENES DE PAGO DE ANTICIPO

1 mensaje

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co> 28 de mayo de 2024, 3:49 p.m.
Para: interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com
CC: planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co, walter.arregoces@mininterior.gov.co

Buen día

Cordial saludo,

Adjunto oficio del asunto.

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

10 archivos adjuntos

- **ORDEN DE PAGO 007.rar** 55K
- **ORDEN DE PAGO 008.rar** 288K
- **ORDEN DE PAGO 003.rar** 92K
- **ORDEN DE PAGO 009.rar** 313K
- **ORDEN DE PAGO 006.rar** 896K
- **ORDEN DE PAGO 002.rar** 1112K
- **ORDEN DE PAGO 005.rar** 52K
- **ORDEN DE PAGO 001.rar** 766K
- **ORDEN DE PAGO 004.rar** 4171K
- **CSIES-BOCHALEMA-0030-2024 - FACTURAS ANTICIPO.pdf** 235K

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

INFORME MES DE ABRIL CORREGIDO

1 mensaje

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co> 29 de mayo de 2024, 6:37 p.m.
Para: interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com

Buen día

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito adjuntar informe del mes de abril con las correcciones solicitadas.

Quedo atento a sus comentarios y/o cualquier inquietud.

cordialmente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

INFORME MENSUAL 006 ABRIL DE 2024 CORREGIDO CON ANEXOS.pdf
16369K

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

INFORME MES DE ABRIL CORREGIDO

1 mensaje

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co> 29 de mayo de 2024, 6:37 p.m.
Para: interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com

Buen día

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito adjuntar informe del mes de abril con las correcciones solicitadas.

Quedo atento a sus comentarios y/o cualquier inquietud.

cordialmente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

INFORME MENSUAL 006 ABRIL DE 2024 CORREGIDO CON ANEXOS.pdf
16369K

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co> 30 de mayo de 2024, 2:57 p.m.
Para: denor.coman@policia.gov.co
CC: Denor.ebochalema@policia.gov.co

Buen día

Cordial saludo,

Adjunto oficio del asunto.

Atentamente,

RAFAEL PABON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SIES 2023

CSIES-BOCHALEMA-0031-2024 - ACOMPAÑIMIENTO ENTREGA CCTV.pdf
183K

RECIBIDOS

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

[INTERVENTORÍA CCTV BOCHALEMA]: Seguimiento a solicitudes de Ministerio del 18 de abril y del 25 de Abril de 2024

1 mensaje

interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com 4 de mayo de 2024, 8:13 p.m.
<interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>
Para: Planeacion <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>
CC: CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>, Anderson Jhoan Contreras <proyectos@netkoln.com>, Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>, walter.arregoces@mininterior.gov.co, Anabolenamezamora <anabolenamezamora@gmail.com>

Buen día para todos.

Adjunto el seguimiento que se tiene con respecto a las solicitudes de los tres comunicados de Ministerio a la Supervisión y a la Interventoría del Convenio 1612 de 2023 y contratos derivados.

Me hace falta la evidencia o la verificación de ítem 13, el cual se consultará el lunes para verificar que se encuentre procesado el requerimiento.

Cordial saludo!

--
IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
Director de Interventoría
Cel.(57) 3017441295
www.comunipingenieria.com
Colombia

2 archivos adjuntos

soporte 80 Millones Plan Fiducia.pdf
297K

Seguimiento pendientes Ministerio 25_04_2024.xlsx
20K

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

Seguimiento Semanal 10-05-24 Convenio 1612-2023

1 mensaje

Walter Kevin Arregoces Martínez <walter.arregoces@mininterior.gov.co> 10 de mayo de 2024, 2:45 p.m.
Para: Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>, "cctv.bochalema@smartycolombia.co" <cctv.bochalema@smartycolombia.co>, "planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co" <planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co>, "interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com" <interventoriabochalemacctv@comunipingenieria.com>

Microsoft Teams ¿Necesitas ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 248 595 163 737

Código de acceso: VjJXKz

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

---

invite.ics
5K

SMARTY COLOMBIA
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV BOCHALEMA <cctv.bochalema@smartycolombia.co>

Invitation: Comite de Seguimiento semanal @ Fri May 17, 2024 4:30pm - 5:30pm (GMT-5) (cctv.bochalema@smartycolombia.co)

1 mensaje

Mauricio Brito <hebrito1@gmail.com> 17 de mayo de 2024, 4:17 p.m.
Responder a: Mauricio Brito <hebrito1@gmail.com>
Para: cctv.bochalema@smartycolombia.co, anabolenamezamora@gmail.com, havidnuma@gmail.com, planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co, walter.arregoces@mininterior.gov.co

Join with Google Meet

Meeting link

meet.google.com/hoj-rymr-fbh

When

Friday May 17, 2024 · 4:30pm – 5:30pm (Peru Standard Time)

Guests

Mauricio Brito - organizer
anabolenamezamora@gmail.com
havidnuma@gmail.com
planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co
cctv.bochalema@smartycolombia.co
walter.arregoces@mininterior.gov.co

View all guest info

Reply for cctv.bochalema@smartycolombia.co

Yes | No | Maybe | More options

Invitation from Google Calendar

You are receiving this email because you are subscribed to calendar notifications. To stop receiving these emails, go to Calendar settings, select this calendar, and change "Other notifications".

Forwarding this invitation could allow any recipient to send a response to the organizer, be added to the guest list, invite others regardless of their own invitation status, or modify your RSVP. Learn more

invite.ics
3K
