Bogotá D.C.

Junio 26 de 2024

Dirección: DG 45 BIS B SUR 13 F 36 Rafael Uribe Uribe
Unidad Operativa: JI San Jorge

Asunto: Informe Mantenimiento Preventivo Planta Eléctrica

Contrato No. 8176 - 2023

Secretaria Integración Social

Objeto contrato: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS."

El día 26 junio de 2024 se procedió a realizar el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica SDMO 131 KVA en la unidad operativa JI San Jorge.

En el mantenimiento se le realizo lo siguiente:

Revisión electromecánica
Se hace reajuste de contactos y borneras
Revisión de fluidos
Los filtros de combustible y aceite se encuentran en buen estado
Los niveles de refrigerante están en más del 80%
Niveles de aceite en más del 80%
Cuenta con base tanque de 200 galones, no se logra evidenciar un tanque externo
Revisión transferencia funcionando sin novedad
Se realizan pruebas de funcionamiento con batería y se encuentra en condiciones optimas y operando
Cargador de batería funcionando correctamente
Se realiza limpieza general de la planta eléctrica


REGISTRO FOTOGRAFICO

Planta eléctrica







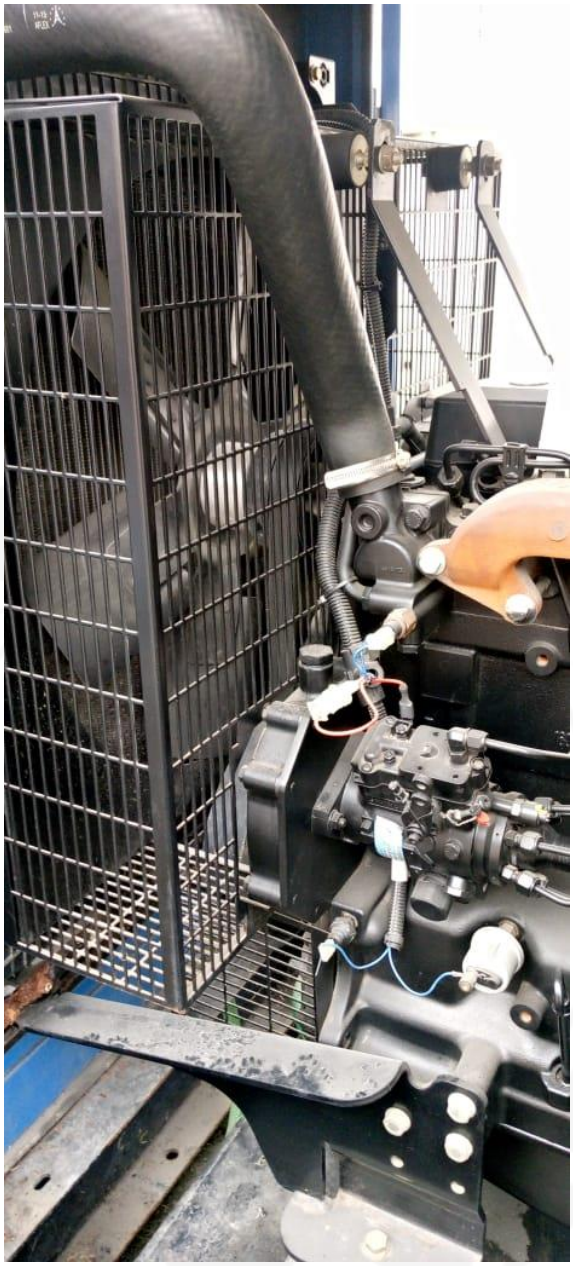

SEDE BOGOTA
CARRERA 19B # 27 - 59

(+57) 317 440 56 59
PBX 702 40 26
soporte@hhingenieria.com
sactécnielectricossas@hhingenieria.com


Limpieza planta






SEDE BOGOTA
CARRERA 19B # 27 - 59


(+57) 317 440 56 59
PBX 702 40 26
soporte@hhingenieria.com
sactécnielectricossas@hhingenieria.com

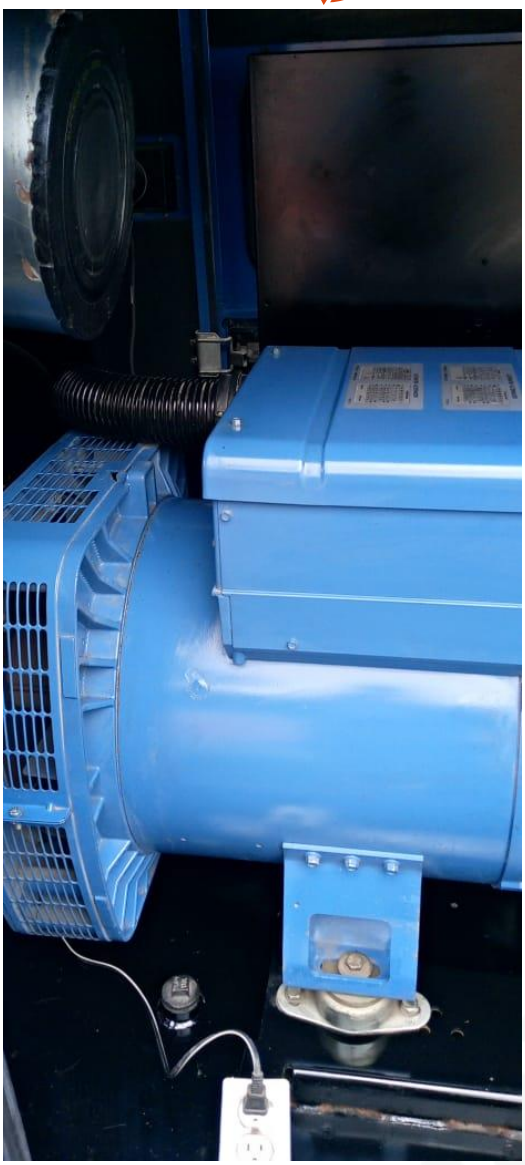

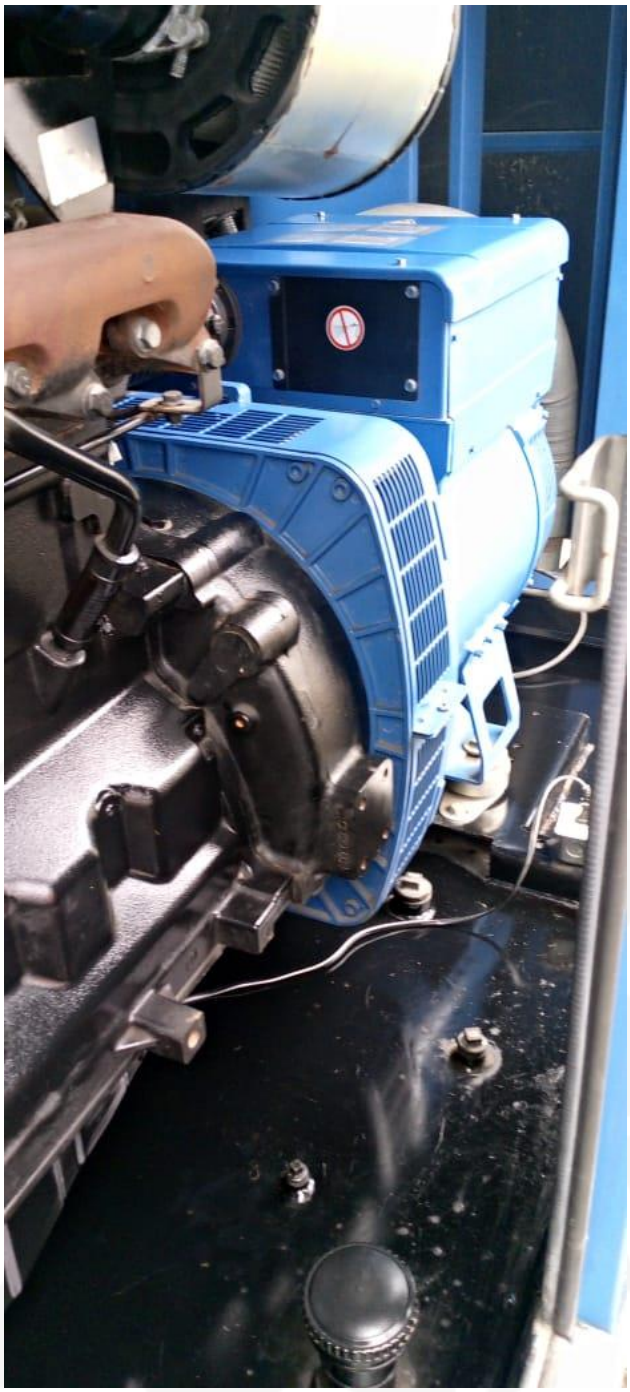

SEDE BOGOTA
CARRERA 19B # 27 - 59

(+57) 317 440 56 59
PBX 702 40 26
soporte@hhingenieria.com
sactécnielectricossas@hhingenieria.com

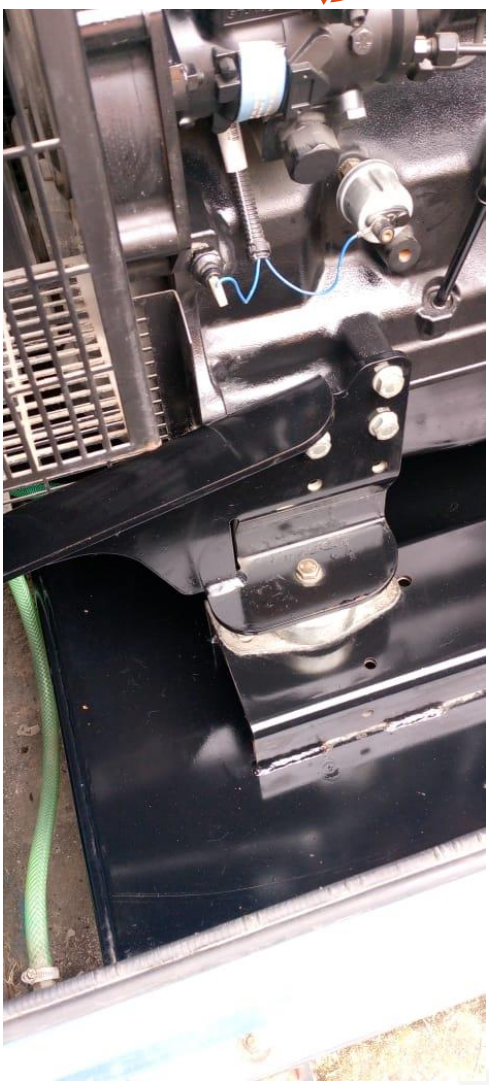



SEDE BOGOTA
CARRERA 19B # 27 - 59

(+57) 317 440 56 59
PBX 702 40 26
soporte@hhingenieria.com
sactécnielectricossas@hhingenieria.com





SEDE BOGOTA
CARRERA 19B # 27 - 59

(+57) 317 440 56 59
PBX 702 40 26
soporte@hhingenieria.com
sactécnielectricossas@hhingenieria.com

SE ANEXA CUADRO COSTOS

Planta electrica SDMO 131 KVA - GD 45B BIS 13F 36 SUR Rafael Uribe Uribe - Jl San Jorge					
ITEM BOLSA DE REPUESTOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	INSPECCIÓN PLANTA ELECTRICA 131 kva (Motores Diesel) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible), SIN INSUMOS, mano de OBRA.	UNIDAD	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00
				SUBTOTAL	$ 250.000,00
				IVA	$ 47.500,00
				TOTAL	$ 297.500,00
