E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO -CISNEROS-ANT Nit: 890.980.444-1			
COMPROBANTE DE EGRESO:	**OP7 5822**	**Fecha:**	**Ago.08/2024**

2024 08 08 ****16,535,129.**

**CONSORCIO AYP HOSPITAL
******DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE Y NUEVE PESOS M/L.**********

Proveedor:	CONSORCIO AYP HOSPITAL	Nit/CC:	901.746.064
		Vr Pagado:	**16,535,129.**
Cta. Banco:	13 -100015350	Cheque:	7
		Vr Cheque:	16,535,129.
Vr Letras:	DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE Y NUEVE PESOS M/L.		
Observaciones:	PAGO DEL ACTA 4 POR EL CONTRATO DE INTERVENTORIA		

VALORES

Vr. Bruto:	18,397,769.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	1,862,640.	Vr.Rete-Iva:	0.
HONORARIOS Y	1,862,640.	ESTAMPILLA P	169,331.
ESTAPILLA PR	677,322.	ESTAMPILLA P	423,326.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	16,535,129.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 4	16,535,129.00	2024/08/05			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 32 10 04			16,535,129.00
2 4 90 54 01	901,746,064		16,535,129.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2024	3232	23201010010319	20,150,340.00
		Total:	**20,150,340.00**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS GERENTE

JUAN CAMILO ORTIZ PEREZ
Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

LADYZ YOLIMA GUTIERREZ LOPEZ
Subdirector Administrativo

CONSORCIO AYP HOSPITAL
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:LYGL Imprime: LYGL
Fecha Sistema:08/08/2024
Hora:9:11:38

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO -CISNEROS-AN

CISNEROS

NIT: 890.980.444 - 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. OB 2799

FACTURA PROVEEDOR No. FP 4 Fecha: **Ago.05/2024**

Señor(es): **CONSORCIO AYP HOSPITAL**

Nit: **901.746.064-1** Valor: **16,535,129.00**

Dirección: **CR 101A 99 28 ED LAS AMERCIAS OF 204, APARTADO**

Concepto: **fra 4 CONSORCIO AYP HOSPITAL, ADJUDICACIÓN PROCESO INTERVENTORIA PROYECTO REMODELACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:		**Vr. Gravado:**		16,933,059.00
Vr. IVA:	3,217,281.00	**Vr. Retención:**	02	1,862,640.00
Vr. ReteIVA:	482,592.00	**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	1,269,979.00	**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		16,535,129.00

Son: **DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE Y NUEVE PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
23201010010319	Otras obras de ingeniería civil	C23276	D23191	20,150,340.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24905401	Honorarios		16,535,129.00
51117901	Honorarios	16,933,059.00	
51117901	Honorarios	3,217,281.00	
24360301	Honorarios		1,862,640.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendie		482,592.00
24072201	ESTAPILLAS PRO HOSPITAL		169,331.00
24072203	ESTAMPILLA PRO CBA 4%		677,322.00
24072206	ESTAMPILLAS DEPORTE Y RECREACION 2.5%		423,326.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Elaborado Por

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS

GERENTE

Autorizado

Revisado

CONSORCIO AYP HOSPITAL
NIT 901.746.064-1
CR 101 A 99 28 ED LAS AMERICAS OF 204
Tel: (604) 3122353208
Apartadó - Colombia
provimasconstruccionesas@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. AYP 4

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO		
NIT	890.980.444-1	**Teléfono**	(604) 8631847 - Ext. 000
Dirección	CL 18 17 105	**Ciudad**	Cisneros - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/08/2024, 19:56
Expedición	01/08/2024, 19:56
Vencimiento	01/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta No. 4 Interventoria de Obra segun contrato de consultoria numero de solicitud privada de oferta No. 02-2023.	1.00	20,150,340.21

Total items: 1

Total Bruto	16,933,059.00
IVA 19%	3,217,281.21
Total a Pagar	20,150,340.21

Valor en Letras:
Veinte millones ciento cincuenta mil trescientos cuarenta pesos m/cte con veintiuno cent.

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 20,150,340.21

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764063860021 aprobado en 20240116 prefijo AYP desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 1d30e3d1e6bdd67e22f8c4cb7d57ea43505dea7c4b7559892f91790c54bb26eba35abbd5382eeaef893c043d2b736eab

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Consorcio AyP Hospital

Cisneros, 20 de junio de 2024

Señores:
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS
ATN. Ladyz Yolima Gutiérrez López – subdirectora Administrativa.
La Ciudad.

Asunto: Entrega de Acta de obra No 4 del contrato No solicitud publica de oferta 02 - 2023

Cordial saludo, adjunto estamos enviando para su revisión y aprobación el acta de obra No 4, con corte al 30 de julio del 2024, del CONSORCIO AYP HOSPITAL. Y dentro de los términos del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA No. 02-2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS", en el presente se adjuntan los documentos anexos, descritos a continuación:

1. Informe de interventoría No 9.
2. Informe de interventoría No 10
3. Informe quincenal de obra No 19
4. Informe quincenal de obra No 20
5. Listado de personal del contratista
6. Planillas de pago de seguridad social del constructor
7. Actas de comité de obra y firmas.
8. Informes de control de tiempo

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente;


Atentamente,
JAIME COSSIO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO AYP HOSPITAL
Celular: 3127917318

Consorcio AyP Hospital

CONTRATO N° 02-2023 "INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAPARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA FISICA DELA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS"

INFORME DE INTERVENTORÍA No 9.



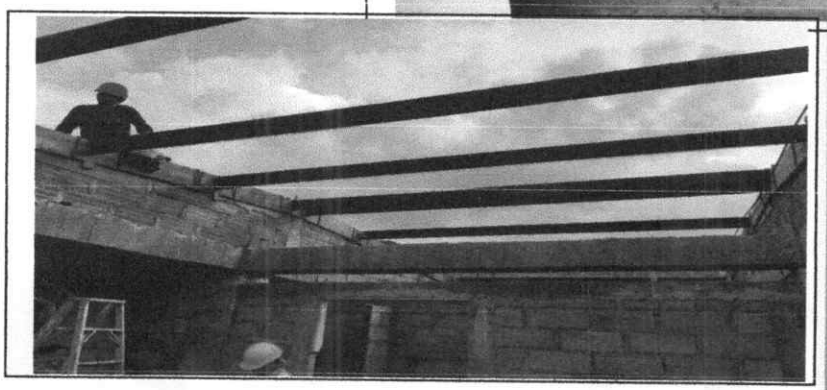

CONSORCIO AYP HOSPITAL.

Carrera 104 No 95 A 05, Barrio Nuevo Apartadó Ant.
3043490767, correo: ingenieia@gmail.com

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IN FRESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS"

INFORME DE INTERVENTORÍA No 9.

CONTRATISTA

DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S

INTERVENTORÍA

CONSORCIO AYP HOSPITAL

PERIODO:

01 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE MAYO DE 2024

Consorcio AyP Hospital

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS
CONTRATISTA DE OBRA	DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S
CONTRATO Nº	SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA N°012023
OBJETO DE CONTRATO	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO DE LA RESOLUCION CON RADICADO S2023060046294 FECDHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITA POR LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 4.220.751.447,31 (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CURENTA Y SIETE PESOS, CON 31 CENTAVOS.
% ANTICIPO	30%
VALOR ANTICIPO	$ 1.266.225.434
VALOR ACTA N°1	$ 269.504.497
VALOR ACTA N°2	$ 255.384.904
VALOR ACTA N°3	$ 139.711.730
VALOR ACTA N° 4	$426.633.979
PLAZO INICIAL	6 MESES
OTRO SI N° 1	4 MESES
FECHA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO OTRO SI N°1	01 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACION OTRO SI N°1	30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION	-
FECHA DE REINICIO	-
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS ANTIOQUIA
CONTRATISTA	CONSORCIO AYP HOSPITAL
CONTRATO Nº	SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA N°012023
OBJETO DE CONTRATO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IN FRESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS"
VALOR DEL CONTRATO	($ 199.905.045,27) CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS.
% ANTICIPO	30%
VALOR ANTICIPO	($ 59.971.513) CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/L.
PLAZO INICIAL	6 MESES
OTRO SI N°1	4 MESES
FECHA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DE OTRO SI	01 DE MARZO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION	-
FECHA DE REINICIO	-

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 DE JUNIO DE 2024

INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO AYP HOSPITAL, en calidad de Interventor, a quien se le adjudicó el contrato Numero **SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA N°012023 que tiene como objeto la** "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IN FRESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS"

Presenta el siguiente informe correspondiente a la ejecución de las obras durante el período de tiempo comprendido entre los días 01 de mayo al 30 de mayo de 2024, y a la ejecución de la interventoría entre los mismos días, con el objetivo de informar a los entesinteresados, todas las obras programadas y ejecutadas en el período, las dificultades encontradas, el avance físico acumulado de cada una de las actividades, las acciones desarrolladas por la Interventoría, el personal y equipo utilizado por el Constructor y otras consideraciones de gran importancia que permiten conocer con detalle todas lasdisposiciones de tipo técnico, administrativo, financiero y legal sobre el contrato.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

TABLA DE CONTENIDO 6

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA TÉCNICA EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024 10

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 10

2.1.1 REVISIÓN DE PLANOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 9

2.1.1.3. Diseño de elementos estructurales 9

2.2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN 10

2.4. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 11

2.5 RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES 11

2.5.1 CANTIDADES DE OBRA 11

2.5.3 RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS CON LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, APROBACIÓN Y CONCLUSIONES 12

2.5.3.1 Control de procedencia de materiales 12

2.5.3.2 Control en las proporciones y dosificaciones de materiales 12

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024 13

3.1 COMITÉ DE OBRA 13

3.2 INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL, EQUIPOS E INSUMOS 13
3.2.1PERSONAL 13

- Personal Técnico y Administrativo del Contratista 14
- Personal de Subcontratistas 14
- Personal Técnico y Administrativo de la Interventoría 14

3.2.2 EQUIPOS 15

3.2.3 INSUMOS 15

3.3 BITÁCORA DE OBRA 16

3.4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 16

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024 16

4.1 CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN 16

4.2 REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES 16

4.3 ESTADO DEL ANTICIPO 16

4.3.1 CONTRATISTA 16

4.5 VALOR DE LAS ACTAS EN TRÁMITE 17

LISTADO DE ANEXOS

Anexo No. 1 *Registro Fotográfico*

Anexo No. 2 *Plan de Inversión del Anticipo*

Anexo No. 3 *Actas de Reunión (Comité de Obra)*

Anexo No. 4 *Seguridad social Personal Operativo*

Anexo No. 5 *Control de correo electrónicos enviados y recibidos*

Anexo No. 6 *Certificado calidad de los materiales*

Anexo Nº 7: *Documentos Interventoría*

Anexo Nº 8: *Documentos Contratista*

Anexo Nº 9: *Cronograma de Obra y Trabajo*

Anexo Nº 10: *Flujo de Fondos del Municipio*

Anexo Nº 11: *Acta de Obra Numero 1, Acta de obra Numero 2.*

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra situado en el Municipio de Cisneros Antioquia, el cual consiste en el **FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO DE LA RESOLUCION CON RADICADO S2023060046294 FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITA POR LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA.**

UBICACIÓN MUN ICIPIO DE CISNEROS



Actualmente se están realizando las siguientes actividades:

- SE REALIZAN INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO 1 Y 2.
- INSTALACIÓN RED HIDROSANITARIA MOD 1 Y MOD 2.
- INSTALACION ACERO PARA REPOTENCIACIÓN EN MODULO 2.
- SE CONTINUA CON MAMPOSTERIA DE 0.10MT 0.15MT EN MOD 1 Y 2.

- SE CONTINUA CON REPOTENCIACIÓN DE COLUMNAS EN MOD 2.
- PREPARACION DE CILINDROS, PARA ENSAYOS DE LABORATORIO.
- SE INICIA CON LA ACTIVIDAD DE REVOQUE.
- CONTINUA DISPOCISION DE R.D-C (residuos de construcción)
- SE REALIZAN REUNIONES Y COMITES DE OBRA.

El Contratista debe cumplir con todos los requisitos y Normas Técnicas de Construcción contenidas en la NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas aplicables.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA TÉCNICA EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

2.1.1 REVISIÓN DE PLANOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

2.1.2 DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

Se unifican criterios desde el conocimiento y experiencia de los actores y se determina lo siguiente.

- Vaciado de dados en ciclópeo, según especificaciones técnicas.
- El acero de refuerzo según especificaciones técnicas
- Armado de acero para vigas de fundación.
- Armado de acero para columnas de 0,40mt x 0,40mt.
- Armado de acero para columnas de 0,35mt x 0,35mt.
- Armado de acero para Vigas de Fundación de 0,35mt x 0,35mt.
- Armado de acero para Vigas Aéreas de 0,35mt x 0,35mt.
- Excavación para vaciado de dados en ciclópeo en módulo 2.
- Excavación para red hidrosanitaria.
- Entibado en las excavaciones que lo requieran.
- Vaciado de zapatas en módulo 1 y 2-
- Vaciado de pedestales en módulo 1 y 2.
- Estribado de columnas, vigas de fundación y vigas aéreas en modulo1 y 2,
- Armado de acero para losa en Modulo 2 y Mod 1.
- Llenos en arenilla.
- Demoliciones para viga de fundación V.F. en modulo2.
- Diseño de instalación de acero para repotenciación en columnas, vigas y zapatas en módulo 2.
- Redes de gas, oxigeno.
- Revoques.

2.2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN.

Se contrata personal necesario para mitigar atraso inicial, se está cumpliendo con el objetivo de nivelar dichos atrasos.

NOTA: Se realizará nueva programación, teniendo en cuenta las nuevas contrataciones.

A la fecha del presente informe han trascurrido 270 días desde el inicio de las actividades de obra, que equivalen en porcentaje de días contractuales trascurridos al 90 %.

2.4. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

Durante el período objeto del presente informe la obra ha contado con la maquinaria en obra y mantenimiento relacionado:

EQUIPO	VOLUMEN	CARACTERÍSTICAS	ESTADO
Concertadora		1,5 sacos	Bueno
Herramienta menor			Buena
Taladros percutores	3		Buenos
Taladros demoledores	3		Buenos
Volqueta	9,46 m3		Buena
Canguro			Bueno
Vibrador		De Aguja	Bueno

2.5 RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES.

2.5.1 CANTIDADES DE OBRA

Después de superar y mitigar los impases iniciales se toma la determinación de dar inicio a las excavaciones, vaciados, y amarre del acero en vigas aéreas y losa según diseños.

- Vaciado de dados en ciclópeo según especificaciones.
- Amarre de acero de vigas de fundación y columnas y vigas aéreas en módulo 1 y 2.
- Amarre de acero de columnas y vigas de fundación según especificaciones en mod 1 y 2.
- Vaciado de concreto 3.000 psi para zapatas y vigas de fundación en módulo 1 y 2.
- Demolición estructuras en concreto.
- Excavaciones para las nuevas zapatas y vigas de fundación en módulo 1 y 2.
- Excavaciones para Red Hidrosanitaria.
- Armado de acero para losa en Modulo 2 y Modulo1.
- Armado de acero para repotenciación columnas y zapatas en Modulo 2.

- Vaciado concreto vigas Aéreas y columnas módulo 2 3.000 psi.
- Llenos en R.D.C (residuos de construcción).
- Llenos con arenilla.
- Nivelación de piso.
- Armado de la obra falsa para losa en módulo 2.
- Se termina figuración del acero en vigas aéreas del módulo 2, para proceder con vaciado.
- Se realiza apantallamiento y se Instalan las conexiones eléctricas pertinentes antes del vaciado de piso.
- Se instala red hidrosanitaria, salidas de agua potable, antes de vaciado de piso.
- Se realiza excavación para la conexión a la red principal. (tubos colectores)-
- Mampostería.

2.5.3 RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS CON LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, APROBACIÓN Y CONCLUSIONES.

La interventoría para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de los materiales, le requiere al Contratista como aseguramiento de calidad, lo siguiente:

2.5.3.1 Control de procedencia de materiales.

Durante este periodo se le solicitó al contratista los certificados de calidad de los materiales ingresados a la obra, los cuales ya fueron presentados por el contratista

2.5.3.2 Control en las proporciones y dosificaciones de materiales.

Se presenta el respectivo diseño de mezcla, las respectivas especificaciones de los materiales a utilizar, se realizan los ensayos respectivos el SLUMP y se sacan las muestras respectivas en los. cilindros, se informa al laboratorio que estará a cargo de realizar los respectivos ensayos a compresión de los cilindros. Los cuales se encuentran dentro del rango de diseño,ya que a la fecha de elaboración del informe se ha utilizado en obra concreto de 2500 psi (lb/pulg2), y 3.000 psi (lb/pulg2) respectivamente.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024.

3.1 COMITÉ DE OBRA

Durante el período, se realizan diferentes comités de obra, que se adjuntan al final del presente informe

A continuación, se relacionan los profesionales de las diferentes entidades y empresas que participan del comité de obra:

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS COMITÉ DE OBRA	
CONTRATISTA	**CARGO**
JUAN SEBASTIAN ALVARRACIN	GERENTE
JHON JAIRO HENAO	DIRECTOR DE OBRA
JHON LEON VARGAS FLOREZ	RESIDENTE DE OBRA
ANA MARIA PARRA MONSALVE	SISO
INTERVENTORIA	CARGO
JAIME ALONSO COSSIO MORALES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONRADO MORALES COSSIO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3.2 INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL, EQUIPOS E INSUMOS

3.2.1 PERSONAL

El personal encargado de coordinar las actividades en la obra, corresponde a:

3.2.1.1 Personal Técnico y Administrativo del Contratista

La empresa contratista DISEÑO VERTICAL S.A.S, cuenta en la obra con el siguiente personal

técnico y administrativo:

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA	
CARGO	**No. DE PERSONAS**
Director de Obra	1
Residente de obra Ingeniero Civil	1
Profesional SISO	1
Auxiliar administrativa	1
Social	1
Almacenista	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	15
TOTAL PERSONAL EN OBRA	**24**

-Personal Técnico y Administrativo de la Interventoría

El personal de interventoría está conformado por los siguientes profesionales:

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORIA	
CARGO	**No. DE PERSONAS**
Director de Interventoría	1
Residente de Interventoría	1
Auxiliar administrativa	1
TOTAL EN OBRA	**3**

NOTA: La interventoría viene realizando el seguimiento de personal de mano de obra y administrativo, con el fin de tener claridad sobre la permanencia de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.

3.2.2 EQUIPOS

Durante el mes de mayo de 2024, el contratista ha tenido en forma oportuna, el suministro de las herramientas y equipos, necesarios para el curso regular de las actividades.

DESCRIPCIÓN	ESTADO
CONCRETADORA	Buen estado
VIBRADORES	Buen estado
TALADROS PERCUTORES	Buen estado
VOLQUETA	Buen estado
HERRAMIENTA MENOR	Buen estado
CANGURO	Buen estado
FORMALETERIA EN GENERAL	Buen estado

En la obra se cuenta con herramienta menor: Palas, Barras, Picas, almádanas, coches, pala coca, teleras, muelas, nivel de manguera, cimbra, codales, mango de sierra, plomada de punto etc.

3.2.3 INSUMOS

La obra cuenta con el suministro de materiales. Igualmente se tienen diferentes proveedores de materiales para las diferentes actividades desarrolladas.

MATERIAL
MATERIAL DE PLAYA
HIERRO CORRUGADO, PERLINERIA
CEMENTO
FORMALETERIA EN GENERAL
INSUMOS ELECTRICOS, RED SANITARIA

3.3 BITÁCORA DE OBRA

En el libro diario de obra se relaciona de manera continua lo ejecutado, observaciones, inquietudes y dificultades surgidas en el desarrollo de las actividades durante el día.

3.4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

A la fecha la Interventoría ha estado en contacto por medio de cartas y correos electrónicos con el contratante y el Contratista, de esta se lleva control por medio de planillas.
Esta información se presenta en los documentos anexos.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024.

4.1 CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN.

El contralto presenta un avance en tiempo de 270 días equivalente al 90%.

Se está pendiente para que se efectué una adecuada programación financiera del contrato mediante:

- **Programación de Obra.**
- **Proyección económica del contrato.**

Se envía mensual un reporte al Coordinador del proyecto, con las metas físicas, que incluye: cada una de las actividades con su respectivo valor, % ponderado, % programado, % ejecutado, % atraso, % falta por ejecutar, de igual forma el avance de tiempo acumulado, el avance ejecutado acumulado y el avance pagado al contratista.

4.2 REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES.

No hubo reporte de multas y sanciones en éste período.

4.3 ESTADO DEL ANTICIPO.

4.3.1 CONTRATISTA.

El anticipo del contrato de obra equivalente al 30% del valor total correspondió a un valor de $ 1.266.225.434..... el cual ya fue entregado al contratista, se han realizado cuatro actas de pago más, se está realizando el corte numero 5.

4.5 VALOR DE LAS ACTAS EN TRÁMITE.

Este informe correspondiente al mes de marzo, no hay actas en tramite.

DESCRIPCION	VALOR
Valor del contrato	$ 4.220.751.447,31
Anticipo entregado al contratista	$1.266.225.434
Acta de pago N° 1	$ 269.504.497
Acta de pago N° 2	$ 255.384.904
Acta de pago N° 3	$ 139.711.730
Acta de pago N° 4	$426.633.979

CONRADO MORALES COSSIO

Residente de Interventoría
CONSORCIO AY P HOSPITAL

VoBo

JAIME ALONSO COSSIO
Director de Interventoría
CONSORCIO AYP HOSPITAL

Anexo No. 1

Registro Fotográfico

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER NIVEL

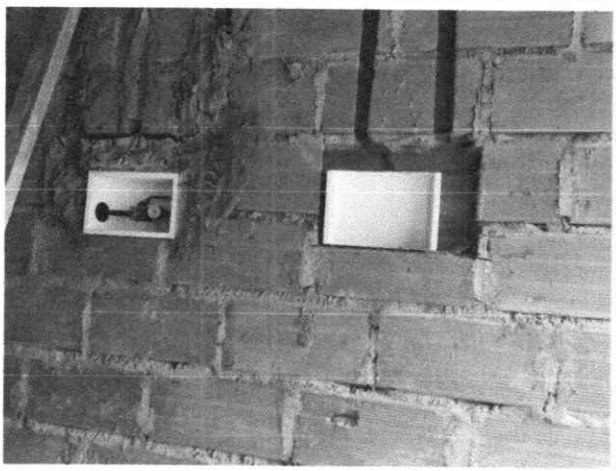


FOTO 1:SE OBSERVA INSTALACION DE RED DE OXIGENO EN MODULO 2.(primer nivel)

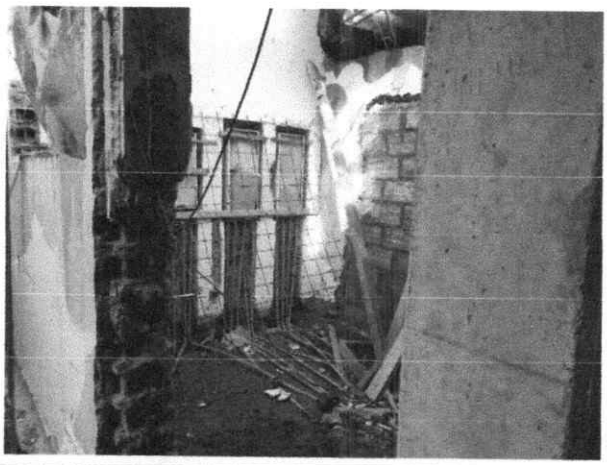


FOTO 2: SE OBSERVA INSTALACION DE CUARTO ELECTRICO EN MODULO 2. (primer nivel)

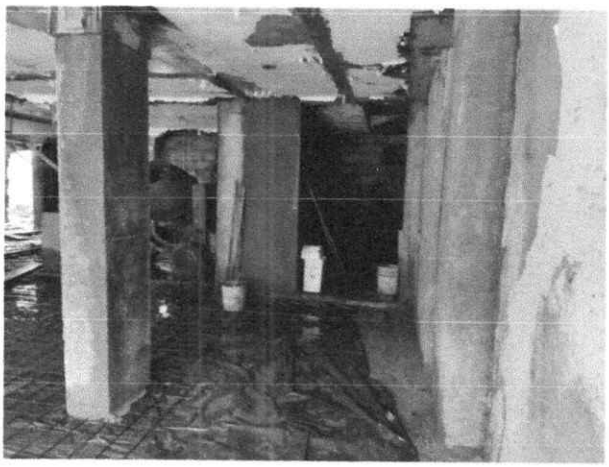


FOTO 2: SE OBSEVA INATALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA PISO EN MODULO 2.. (primer nivel)

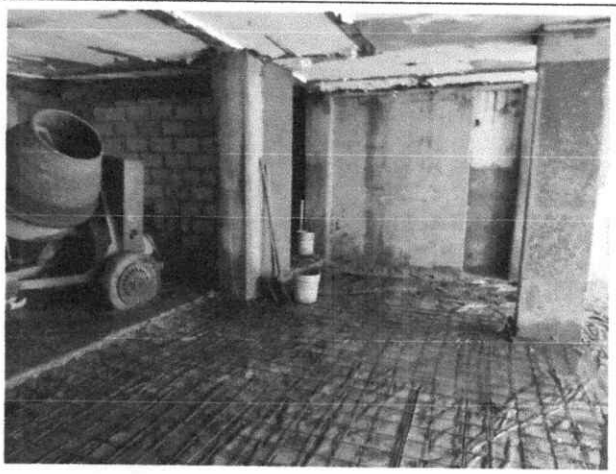


FOTO 4: SE OBSEVA INSTALACIONES ELECTRICAS DE PISO EN MODULO 2.. (primer nivel)

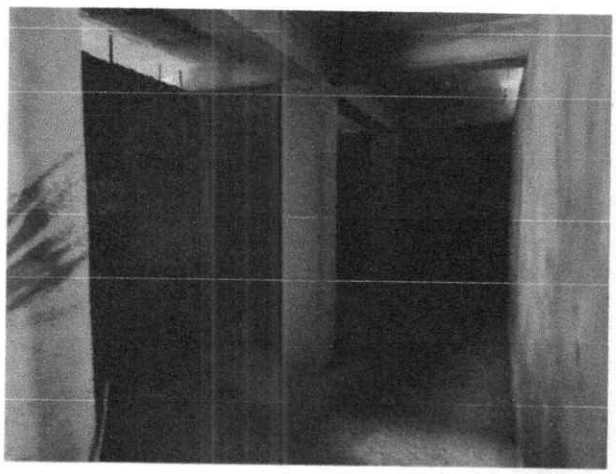


FOTO 5: SE OBSERVA REVOQUES Y PISO VACUADO EN MODULO 2.

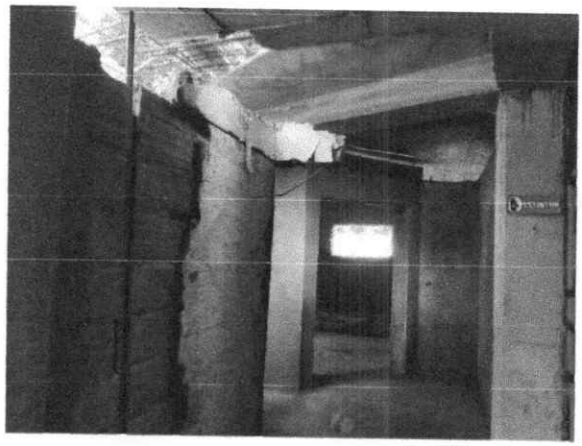


FOTO 5: SE OBSERVA PISO VACIADO EN MODULO 2.

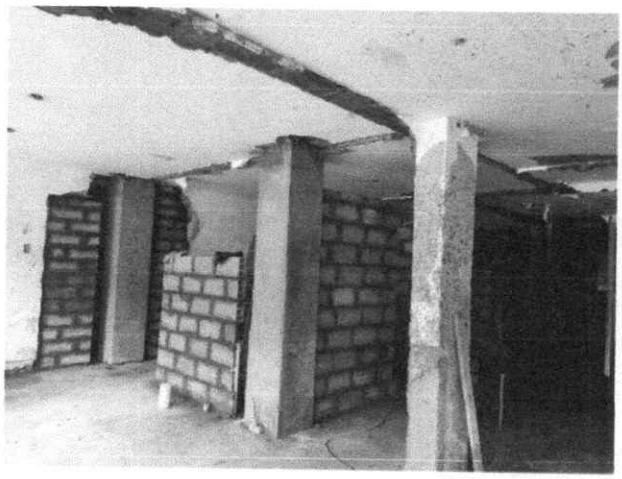


FOTO 7: SE OBSEVA DIVISIONES EN MAMPOSTERIA Y PISO VACIADO EN MODULO 2.

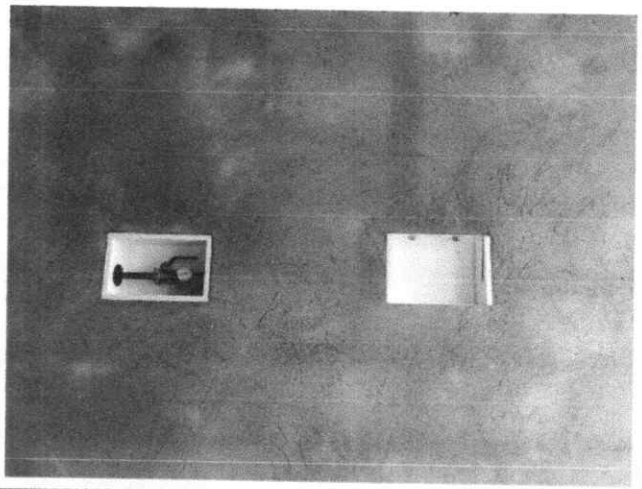


FOTO 8: SE OBSERVA INSTALACION DE RED DE OXIGENO.

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER NIVEL



FOTO 9: SE OBSERVA MANPOSTERRIA COLUMNAS Y VIGAS VACIADAS EN SEGUNDO NIVEL MODULO 2.

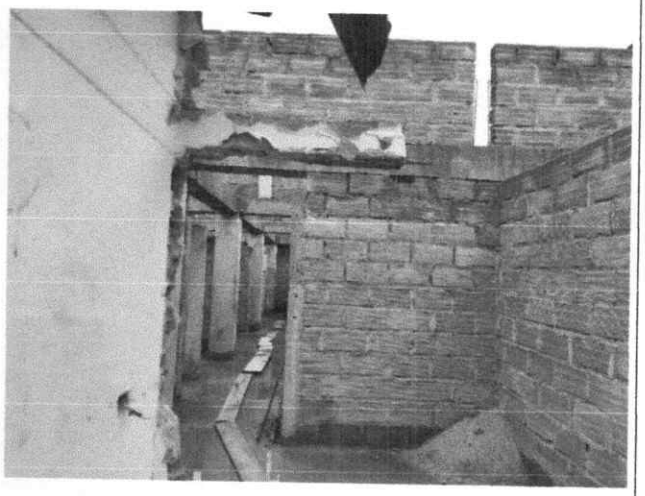


FOTO 10: SE OBSERVA CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN MAMPOSTERIA EN SEGUNDO NIVEL DEL MODULO 2. .



FOTO 11: SE OBSERVA INSTALACION DE PERLINES PPARA CUBIERTA EN SEGUNDO NIVEL DEL MODULO 2.EN MODULO 2.



FOTO 12: CONTINUA CONSTRUCCION DE CUCHILLAS EN ,MAMPOSTERIA MODULO 2 (segundo nivel)

INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO AYP HOSPITAL, en calidad de Interventor, a quien se le adjudicó el contrato Numero **SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA N°012023 que tiene como objeto la** "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IN FRESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS"

Presenta el siguiente informe correspondiente a la ejecución de las obras durante el período de tiempo comprendido entre los días 01 de mayo al 30 de mayo de 2024, y a la ejecución de la interventoría entre los mismos días, con el objetivo de informar a los entesinteresados, todas las obras programadas y ejecutadas en el período, las dificultades encontradas, el avance físico acumulado de cada una de las actividades, las acciones desarrolladas por la Interventoría, el personal y equipo utilizado por el Constructor y otras consideraciones de gran importancia que permiten conocer con detalle todas lasdisposiciones de tipo técnico, administrativo, financiero y legal sobre el contrato.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

TABLA DE CONTENIDO 6

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA TÉCNICA EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024 10

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 10

2.1.1 REVISIÓN DE PLANOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 9

2.1.1.3. Diseño de elementos estructurales 9

2.2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN 10

2.4. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 11

2.5 RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES 11

2.5.1 CANTIDADES DE OBRA 11

2.5.3 RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS CON LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, APROBACIÓN Y CONCLUSIONES 12

2.5.3.1 Control de procedencia de materiales 12

2.5.3.2 Control en las proporciones y dosificaciones de materiales 12

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024 13

3.1 COMITÉ DE OBRA 13

3.2 INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL, EQUIPOS E INSUMOS 13
3.2.1PERSONAL 13

- Personal Técnico y Administrativo del Contratista 14
- Personal de Subcontratistas 14
- Personal Técnico y Administrativo de la Interventoría 14

3.2.2 EQUIPOS 15

3.2.3 INSUMOS 15

3.3 BITÁCORA DE OBRA 16

3.4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 16

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024 16

4.1 CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN 16

4.2 REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES 16

4.3 ESTADO DEL ANTICIPO 16

4.3.1 CONTRATISTA 16

4.5 VALOR DE LAS ACTAS EN TRÁMITE 17

LISTADO DE ANEXOS

Anexo No. 1 *Registro Fotográfico*

Anexo No. 2 *Plan de Inversión del Anticipo*

Anexo No. 3 *Actas de Reunión (Comité de Obra)*

Anexo No. 4 *Seguridad social Personal Operativo*

Anexo No. 5 *Control de correo electrónicos enviados y recibidos*

Anexo No. 6 *Certificado calidad de los materiales*

Anexo Nº 7: *Documentos Interventoría*

Anexo Nº 8: *Documentos Contratista*

Anexo Nº 9: *Cronograma de Obra y Trabajo*

Anexo Nº 10: *Flujo de Fondos del Municipio*

Anexo Nº 11: *Acta de Obra Numero 1, Acta de obra Numero 2.*

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra situado en el Municipio de Cisneros Antioquia, el cual consiste en el **FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO DE LA RESOLUCION CON RADICADO S2023060046294 FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITA POR LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA.**

UBICACIÓN MUN ICIPIO DE CISNEROS



Actualmente se están realizando las siguientes actividades:

- SE REALIZAN INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO 1 Y 2.
- INSTALACIÓN RED HIDROSANITARIA MOD 1 Y MOD 2.
- INSTALACION ACERO PARA REPOTENCIACIÓN EN MODULO 2.
- SE CONTINUA CON MAMPOSTERIA DE 0.10MT 0.15MT EN MOD 1 Y 2.

- SE CONTINUA CON REPOTENCIACIÓN DE COLUMNAS EN MOD 2.
- PREPARACION DE CILINDROS, PARA ENSAYOS DE LABORATORIO.
- SE INICIA CON LA ACTIVIDAD DE REVOQUE.
- CONTINUA DISPOCISION DE R.D-C (residuos de construcción)
- SE REALIZAN REUNIONES Y COMITES DE OBRA.

El Contratista debe cumplir con todos los requisitos y Normas Técnicas de Construcción contenidas en la NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas aplicables.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA TÉCNICA EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

2.1.1 REVISIÓN DE PLANOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

2.1.2 DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

Se unifican criterios desde el conocimiento y experiencia de los actores y se determina lo siguiente.

- Vaciado de dados en ciclópeo, según especificaciones técnicas.
- El acero de refuerzo según especificaciones técnicas
- Armado de acero para vigas de fundación.
- Armado de acero para columnas de 0,40mt x 0,40mt.
- Armado de acero para columnas de 0,35mt x 0,35mt.
- Armado de acero para Vigas de Fundación de 0,35mt x 0,35mt.
- Armado de acero para Vigas Aéreas de 0,35mt x 0,35mt.
- Excavación para vaciado de dados en ciclópeo en módulo 2.
- Excavación para red hidrosanitaria.
- Entibado en las excavaciones que lo requieran.
- Vaciado de zapatas en módulo 1 y 2-
- Vaciado de pedestales en módulo 1 y 2.
- Estribado de columnas, vigas de fundación y vigas aéreas en modulo1 y 2,
- Armado de acero para losa en Modulo 2 y Mod 1.
- Llenos en arenilla.
- Demoliciones para viga de fundación V.F. en modulo2.
- Diseño de instalación de acero para repotenciación en columnas, vigas y zapatas en módulo 2.
- Redes de gas, oxigeno.
- Revoques.

2.2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN.

Se contrata personal necesario para mitigar atraso inicial, se está cumpliendo con el objetivo de nivelar dichos atrasos.

NOTA: Se realizará nueva programación, teniendo en cuenta las nuevas contrataciones.

A la fecha del presente informe han trascurrido 270 días desde el inicio de las actividades de obra, que equivalen en porcentaje de días contractuales trascurridos al 90 %.

2.4. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

Durante el período objeto del presente informe la obra ha contado con la maquinaria en obra y mantenimiento relacionado:

EQUIPO	VOLUMEN	CARACTERÍSTICAS	ESTADO
Concertadora		1,5 sacos	Bueno
Herramienta menor			Buena
Taladros percutores	3		Buenos
Taladros demoledores	3		Buenos
Volqueta	9,46 m3		Buena
Canguro			Bueno
Vibrador		De Aguja	Bueno

2.5 RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES.

2.5.1 CANTIDADES DE OBRA

Después de superar y mitigar los impases iniciales se toma la determinación de dar inicio a las excavaciones, vaciados, y amarre del acero en vigas aéreas y losa según diseños.

- Vaciado de dados en ciclópeo según especificaciones.
- Amarre de acero de vigas de fundación y columnas y vigas aéreas en módulo 1 y 2.
- Amarre de acero de columnas y vigas de fundación según especificaciones en mod 1 y 2.
- Vaciado de concreto 3.000 psi para zapatas y vigas de fundación en módulo 1 y 2.
- Demolición estructuras en concreto.
- Excavaciones para las nuevas zapatas y vigas de fundación en módulo 1 y 2.
- Excavaciones para Red Hidrosanitaria.
- Armado de acero para losa en Modulo 2 y Modulo1.
- Armado de acero para repotenciación columnas y zapatas en Modulo 2.

- Vaciado concreto vigas Aéreas y columnas módulo 2 3.000 psi.
- Llenos en R.D.C (residuos de construcción).
- Llenos con arenilla.
- Nivelación de piso.
- Armado de la obra falsa para losa en módulo 2.
- Se termina figuración del acero en vigas aéreas del módulo 2, para proceder con vaciado.
- Se realiza apantallamiento y se Instalan las conexiones eléctricas pertinentes antes del vaciado de piso.
- Se instala red hidrosanitaria, salidas de agua potable, antes de vaciado de piso.
- Se realiza excavación para la conexión a la red principal. (tubos colectores)-
- Mampostería.

2.5.3 RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS CON LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, APROBACIÓN Y CONCLUSIONES.

La interventoría para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de los materiales, le requiere al Contratista como aseguramiento de calidad, lo siguiente:

2.5.3.1 Control de procedencia de materiales.

Durante este periodo se le solicitó al contratista los certificados de calidad de los materiales ingresados a la obra, los cuales ya fueron presentados por el contratista

2.5.3.2 Control en las proporciones y dosificaciones de materiales.

Se presenta el respectivo diseño de mezcla, las respectivas especificaciones de los materiales a utilizar, se realizan los ensayos respectivos el SLUMP y se sacan las muestras respectivas en los. cilindros, se informa al laboratorio que estará a cargo de realizar los respectivos ensayos a compresión de los cilindros. Los cuales se encuentran dentro del rango de diseño,ya que a la fecha de elaboración del informe se ha utilizado en obra concreto de 2500 psi (lb/pulg2), y 3.000 psi (lb/pulg2) respectivamente.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024.

3.1 COMITÉ DE OBRA

Durante el período, se realizan diferentes comités de obra, que se adjuntan al final del presente informe

A continuación, se relacionan los profesionales de las diferentes entidades y empresas que participan del comité de obra:

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS COMITÉ DE OBRA	
CONTRATISTA	**CARGO**
JUAN SEBASTIAN ALVARRACIN	GERENTE
JHON JAIRO HENAO	DIRECTOR DE OBRA
JHON LEON VARGAS FLOREZ	RESIDENTE DE OBRA
ANA MARIA PARRA MONSALVE	SISO
INTERVENTORIA	CARGO
JAIME ALONSO COSSIO MORALES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONRADO MORALES COSSIO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3.2 INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL, EQUIPOS E INSUMOS

3.2.1 PERSONAL

El personal encargado de coordinar las actividades en la obra, corresponde a:

3.2.1.1 Personal Técnico y Administrativo del Contratista

La empresa contratista DISEÑO VERTICAL S.A.S, cuenta en la obra con el siguiente personal

técnico y administrativo:

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA	
CARGO	**No. DE PERSONAS**
Director de Obra	1
Residente de obra Ingeniero Civil	1
Profesional SISO	1
Auxiliar administrativa	1
Social	1
Almacenista	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	15
TOTAL PERSONAL EN OBRA	**24**

-Personal Técnico y Administrativo de la Interventoría

El personal de interventoría está conformado por los siguientes profesionales:

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORIA	
CARGO	**No. DE PERSONAS**
Director de Interventoría	1
Residente de Interventoría	1
Auxiliar administrativa	1
TOTAL EN OBRA	**3**

NOTA: La interventoría viene realizando el seguimiento de personal de mano de obra y administrativo, con el fin de tener claridad sobre la permanencia de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.

3.2.2 EQUIPOS

Durante el mes de mayo de 2024, el contratista ha tenido en forma oportuna, el suministro de las herramientas y equipos, necesarios para el curso regular de las actividades.

DESCRIPCIÓN	ESTADO
CONCRETADORA	Buen estado
VIBRADORES	Buen estado
TALADROS PERCUTORES	Buen estado
VOLQUETA	Buen estado
HERRAMIENTA MENOR	Buen estado
CANGURO	Buen estado
FORMALETERIA EN GENERAL	Buen estado

En la obra se cuenta con herramienta menor: Palas, Barras, Picas, almádanas, coches, pala coca, teleras, muelas, nivel de manguera, cimbra, codales, mango de sierra, plomada de punto etc.

3.2.3 INSUMOS

La obra cuenta con el suministro de materiales. Igualmente se tienen diferentes proveedores de materiales para las diferentes actividades desarrolladas.

MATERIAL
MATERIAL DE PLAYA
HIERRO CORRUGADO, PERLINERIA
CEMENTO
FORMALETERIA EN GENERAL
INSUMOS ELECTRICOS, RED SANITARIA

3.3 BITÁCORA DE OBRA

En el libro diario de obra se relaciona de manera continua lo ejecutado, observaciones, inquietudes y dificultades surgidas en el desarrollo de las actividades durante el día.

3.4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

A la fecha la Interventoría ha estado en contacto por medio de cartas y correos electrónicos con el contratante y el Contratista, de esta se lleva control por medio de planillas.
Esta información se presenta en los documentos anexos.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024.

4.1 CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN.

El contralto presenta un avance en tiempo de 270 días equivalente al 90%.

Se está pendiente para que se efectué una adecuada programación financiera del contrato mediante:

- **Programación de Obra.**
- **Proyección económica del contrato.**

Se envía mensual un reporte al Coordinador del proyecto, con las metas físicas, que incluye: cada una de las actividades con su respectivo valor, % ponderado, % programado, % ejecutado, % atraso, % falta por ejecutar, de igual forma el avance de tiempo acumulado, el avance ejecutado acumulado y el avance pagado al contratista.

4.2 REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES.

No hubo reporte de multas y sanciones en éste período.

4.3 ESTADO DEL ANTICIPO.

4.3.1 CONTRATISTA.

El anticipo del contrato de obra equivalente al 30% del valor total correspondió a un valor de $ 1.266.225.434..... el cual ya fue entregado al contratista, se han realizado cuatro actas de pago más, se está realizando el corte numero 5.

4.5 VALOR DE LAS ACTAS EN TRÁMITE.

Este informe correspondiente al mes de marzo, no hay actas en tramite.

DESCRIPCION	VALOR
Valor del contrato	$ 4.220.751.447,31
Anticipo entregado al contratista	$1.266.225.434
Acta de pago N° 1	$ 269.504.497
Acta de pago N° 2	$ 255.384.904
Acta de pago N° 3	$ 139.711.730
Acta de pago N° 4	$426.633.979

CONRADO MORALES COSSIO

Residente de Interventoría
CONSORCIO AY P HOSPITAL

VoBo

JAIME ALONSO COSSIO
Director de Interventoría
CONSORCIO AYP HOSPITAL

Anexo No. 1

Registro Fotográfico

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER NIVEL

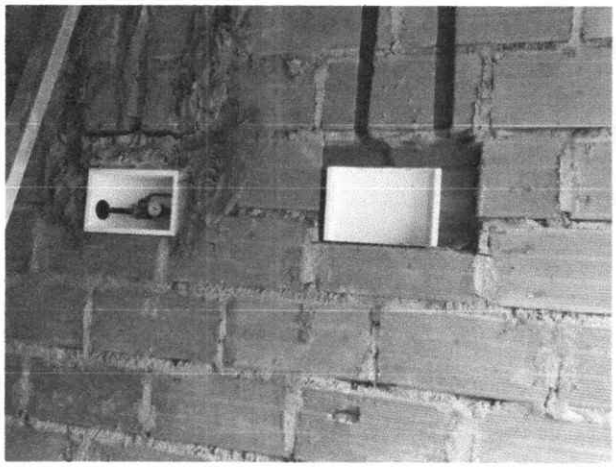


FOTO 1:SE OBSERVA INSTALACION DE RED DE OXIGENO EN MODULO 2.(primer nivel)

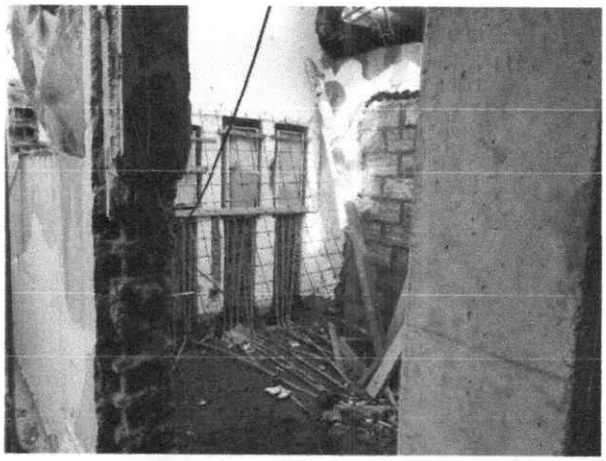


FOTO 2: SE OBSERVA INSTALACION DE CUARTO ELECTRICO EN MODULO 2. (primer nivel)

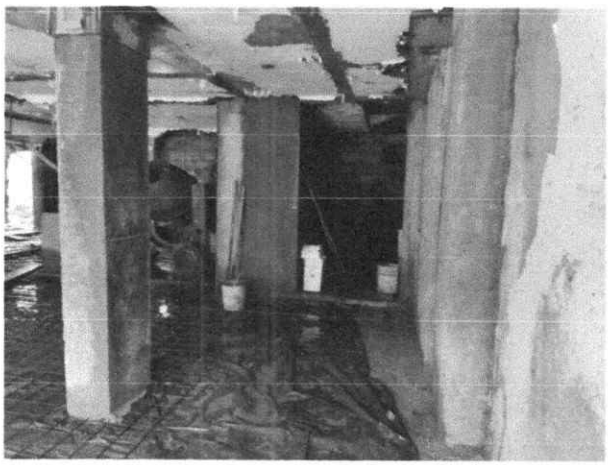


FOTO 2: SE OBSEVA INATALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA PISO EN MODULO 2.. (primer nivel)

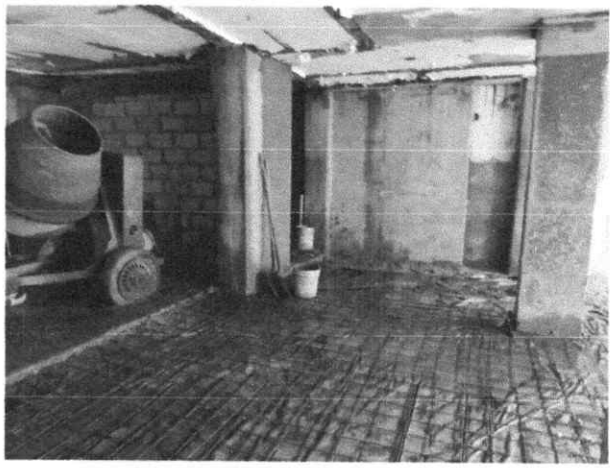


FOTO 4: SE OBSEVA INSTALACIONES ELECTRICAS DE PISO EN MODULO 2.. (primer nivel)

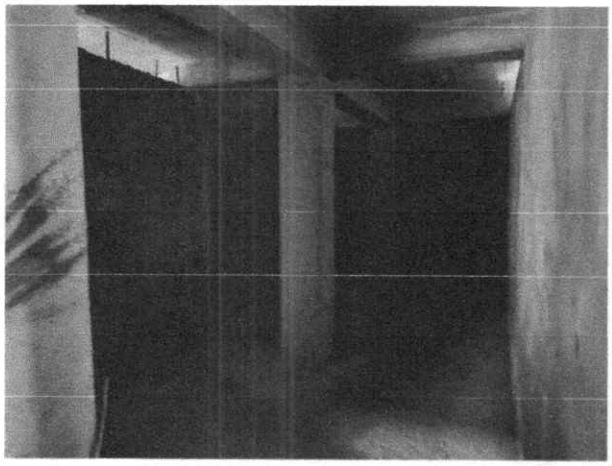


FOTO 5: SE OBSERVA REVOQUES Y PISO VACUADO EN MODULO 2.

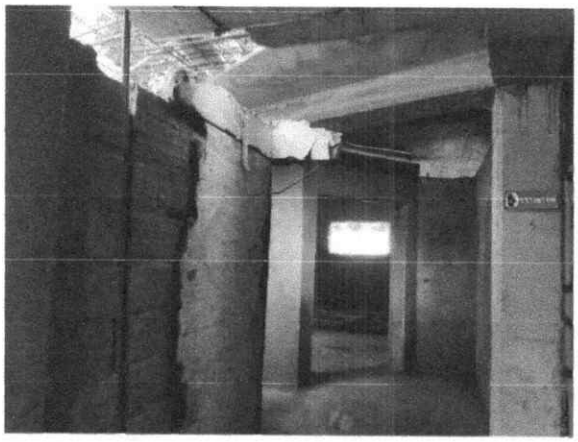


FOTO 5: SE OBSERVA PISO VACIADO EN MODULO 2.

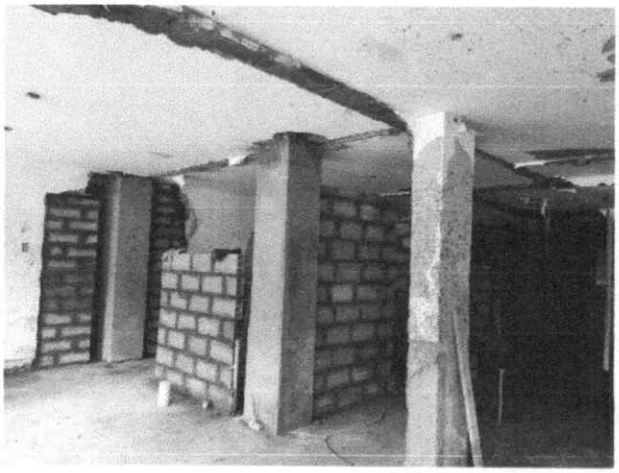


FOTO 7: SE OBSEVA DIVISIONES EN MAMPOSTERIA Y PISO VACIADO EN MODULO 2.

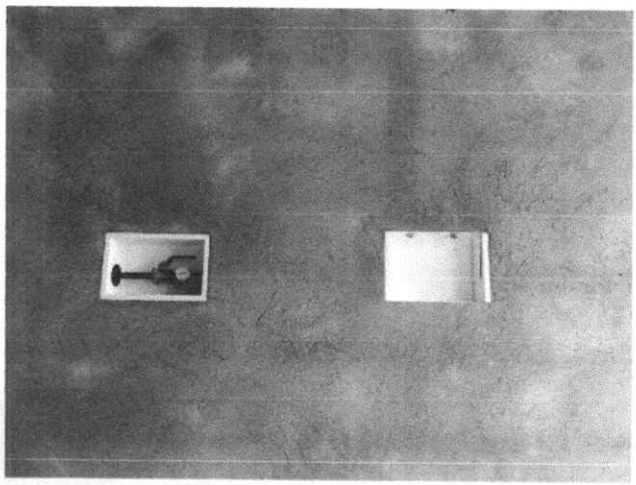


FOTO 8: SE OBSERVA INSTALACION DE RED DE OXIGENO.

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER NIVEL



FOTO 9: SE OBSERVA MANPOSTERRIA COLUMNAS Y VIGAS VACIADAS EN SEGUNDO NIVEL MODULO 2.

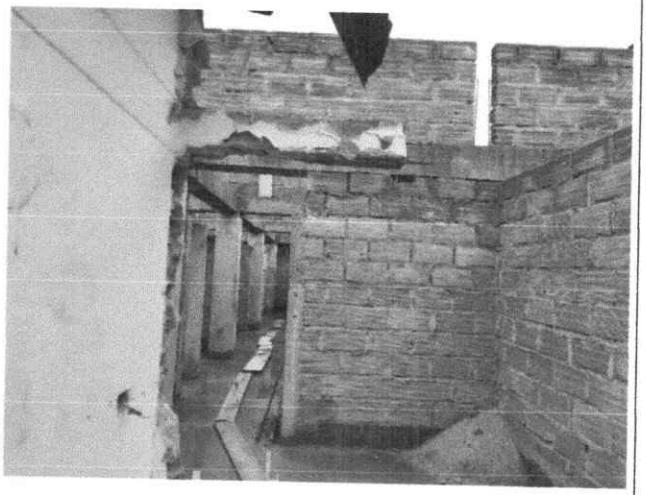


FOTO 10: SE OBSERVA CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN MAMPOSTERIA EN SEGUNDO NIVEL DEL MODULO 2. .



FOTO 11: SE OBSERVA INSTALACION DE PERLINES PPARA CUBIERTA EN SEGUNDO NIVEL DEL MODULO 2.EN MODULO 2.



FOTO 12: CONTINUA CONSTRUCCION DE CUCHILLAS EN ,MAMPOSTERIA MODULO 2 (segundo nivel)

CONTRATISTA **DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA**

CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS

INTERVENTORIA **CONSORCIO AYP HOSPITAL**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 012023 **FECHA PRESENTE ACTA**

ACTA DE RECIBO DE OBRA EJECUTADA VALOR DEL CONTRATO 4,343,542,741.00

FECHA DEL ACTA 45443 ACTA No4

ACTA No 5			
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
1.00	**CAPITULO 1 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE**		
1,1	DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.15m. Incluye retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros).	102.40	CUMPLE
1,2	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES EXISTENTES EN CONCRETO, Incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo.	0.54	CUMPLE
1,3	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS EN CONCRETO hasta llegar a los estribos de confinamiento por medio de equipos mecanicos y manuales. Incluye la botada de los escombros resultantes.	1.48	CUMPLE
1,4	DEMOLICIÓN MAMPOSTERIA EN LADRILLO O BLOQUE DE 10 a 15 cm DE ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros resultantes y todos lo elementos necesarios para su correcta ejecución.	141.78	CUMPLE
2,0	**CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRA**		
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	1.98	CUMPLE
4,0	**CAPITULO 4 CAPITULO 4 LLENOS**		
4,1	LLENOS, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O SIMILAR). Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado para conformación de terreno, incluye transporte interno. SU MEDIDA SERÁ EN EL SITIO.	10.24	CUMPLE
5,0	**CAPITULO 5 CONCRETOS (CIMENTACION Y ESTRUCTURA)**		
5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VIGA DE FUNDACION DE 0.35X0.35 m EN CONCRETO 21 MPA (Sin refuerzo). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2.60	CUMPLE
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS (60% Concreto f'c = 21 Mpa y 40% piedra). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	0.42	CUMPLE
5,3	Concreto de 21 Mpa para LOSA MACIZA de piso e=10 cms, incluye: armado, preparación, encofrado, vaciado, vibrado, curado y desencofrado. No incluye entresuelo. (Sin refuerzo)	102.40	CUMPLE
5,4	Construcción de COLUMNAS DE 0.40 x 0.40 m en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y cotocación del concreto, formaleta en súper "T" de 18mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. (Sin refuerzo).	5.10	CUMPLE
5,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 21 MPA PARA ZAPATA (no incluye refuerzo). Incluye desencofrado, curado y vibrado. Todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	0.90	CUMPLE
5,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 21 MPA PARA Reforzamiento de elementos estructurales (no incluye refuerzo). Incluye desencofrado, curado y vibrado. Todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2.37	CUMPLE
6,0	**CAPITULO 6 ACERO DE REFUERZO**		
6,1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE F Y = 420 MPA. (4.200 KG/CM²) INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	2,925.97	CUMPLE
6,2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA D-188 INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	102.30	CUMPLE
11,0	**CAPITULO 11 CUBIERTAS - CANOAS**		
11,1	Suministro, transporte y colocación de cubierta en teja tipo sandwich termoacustica color blanco.	281.00	CUMPLE
11,2	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar wash primer, pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	3,500.00	CUMPLE
11,3	SUMINISTO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA GALVANIZADA Cal .24 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con 2 manos de anticorrosivo + anclaje a muro + sikaflex 1A)	53.00	CUMPLE
11,4	suministo, transporte e instalacion de ruana en lamina galvanizada cal .26 d/ 0.60 m.	74.00	CUMPLE
11,5	suministo, transporte e instalacion de embudos en lamina galvanizada cal .26	6.00	CUMPLE

14,0	**CAPITULO 14 ELECTRICIDAD**		
14,4	SALIDA ALUMBRADO EMT	39.00	CUMPLE
14,5	SALIDA S1 EMT	35.00	CUMPLE
14,6	SALIDA S2 EMT	4.00	CUMPLE
14,7	SALIDA SC1 EMT	4.00	CUMPLE
14,13	SALIDA TOMA 120 PVC	29.00	CUMPLE
14,14	SALIDA TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA	12.00	CUMPLE
15,0	**CAPITULO 15 SISTEMA APANTALLAMIENTO**		
15,2	CABLE COBRE DESNUDO # 1/0	25.00	CUMPLE
15,3	SOLDADURA TERMOWELD X 115 GRM	6.00	CUMPLE
19	**CAPITULO 19 SISTEMA DE RED DE OXIGENO MEDICINAL**		
19.10	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre Tipo L, referencia B-88 soportada, pintada, marcada, soldada con plata al 15% y probada con nitrogeno; en los siguientes diametros: rigida de 1/2"	25.60	CUMPLE
19.30	Suministro e instalacion de Caja de control de zona, Nacional, con valvulas de tres cuerpos, desmontable, en acero inoxidable, puertos para manometros o vacuometros, soldada en sus extremos tapa acrilica de los siguientes casos: 1 gas	2.00	CUMPLE
19.60	Suministro e instalacion de Salidas para Gases Medicinales, Importadas, de fabricación americana, con doble cheque, codificacion de colores, extension de tuberia tipo K para soldar, debe cumplir norma NFPA 99 de pared QC y clelticas DISS.Tomas Qc de Oxigeno	18.00	CUMPLE
	OBRAS EXTRAS		
OE 2	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE. incluye retiro de estructura. Y su disposicion.	142.00	CUMPLE
OE 3	DESMONTE DE RED DE GAS MEDICINAL EXISTENTE, INCLUYE : retiro, traslado y ajuste para que siga en funcionamiento en la zona de urgencias y hospitalizacion provisional.	1.00	CUMPLE
OE 6	Construcción de PANTALLAS DE 0.20 X 2 m en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en sùper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción segùn diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. (Sin refuerzo)	2.55	CUMPLE
OE 12	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 21 MPA PARA VIGA AEREA de 30cm x 30 (no incluye refuerzo). Incluye desencofrado, curado y vibrado. Todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	68.51	CUMPLE
OE 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 21 MPA PARA VIGA AEREA de 20cm x 35 (no incluye refuerzo). Incluye desencofrado, curado y vibrado. Todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	11.00	CUMPLE
OE 18	Construcción de MAMPOSTERIA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.02 m	199.26	CUMPLE
OE 19	Construcción de MAMPOSTERIA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 10 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 10 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.02 m	116.32	CUMPLE
OE 20	FABRICACION Y APLICACIÓN DE REVOQUE EN MUROS MAMPUESTOS. Incluye aplicacion a una cara y a dos caras según sea necesario para dar unn adecuado acabado.	873.61	CUMPLE
OE 23	FABRICACION DE COLUMNETAS Y VIGAS PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA concreto de 3000 psi. Incluye formaleta, encofrado y vaciado, No incluye refuerzo	9.50	CUMPLE

JAIME ALONSO COSSIO MORALES
CONSORCIO AYP HOSPITAL
INTERVENTORIA

OSCAR FELIPE MUÑOZ MARIN
RL. DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S.
CONTRATISTA

ACTA: N°

HORA DE INICIO	1:45 p.m.	**HORA DE FINALIZACIÓN**	2:45 p.m.
LUGAR:	Oficina Obra		
FECHA:	14 junio 2024		
COMITÉ QUE SE REUNE:	Equipo técnico y administrativo Diseño Vertical Constructora SAS		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	1. Articular tareas		

ASISTENTES

NOMBRES COMPLETOS	CARGO	FIRMA
Felipe Muñoz Marín	Gerencia Proyecto	
Lewis Charrasquiel	Coordinador Administrativo	
Ana María Parra	Siso	
Anderson Rojas	Residente de Obra	
Diana Jiménez	Auxiliar Residente	
Diego Perez	Maestro de obra	

DESARROLLO REUNIÓN

Siendo las 1:45pm del día 14 de junio de 2024 se reunieron en la oficina de la obra, el equipo técnico y administrativo de Diseño Vertical Constructora SAS, Felipe Muñoz Marín gerente de proyectos, Lewis Charrasquiel coordinador administrativo, Ana María Parra SISO, Anderson Rojas residente de obra, Diana Jiménez auxiliar residente y Diego Pérez maestro de obra; para articular las tareas a realizar en la obra:

→ Dadas las falencias observadas en el manejo del almacén, el 28 de junio, se cambia el cargo y las funciones del contrato de Diana Jiménez, quien pasa a ser la almacenista de la obra, apoyando el área administrativa con las cotizaciones, control de inventarios, entrega de herramientas y equipos al personal en obra, etc. Actualmente, apoya en la elaboración de actas, informes y seguimiento de obra.

→ Ingeniero residente Anderson Rojas, se le hace lectura de las funciones plasmadas en el contrato, y Felipe Muñoz le detalla sobre los informes y anexos que se deben presentar en cada corte de obra: informe quincenal (15 y 30 de cada mes), informe mensual con memorias manuales y memorias fotográficas de cada actividad (tres fotos mínimo), bitácora de obra, implementar el formato de recibo y entrega de actividades ejecutadas en el día por los diferentes oficiales para anexarlo en los soportes de calidad.

En caso de encontrar una actividad por definir, se apoya en el director de obra, en caso extremo, en el interventor.

→ Acta de Obra N°06, 30 de junio de 2024, con las siguientes actividades: cubierta eje 1-5, revoque de muros piso 2 y piso (mortero y baldosa). Ana continúa apoyando con los soportes del acta que se deben escanear (bitácora y memorias manuales) y la solicitud del informe administrativo.

→ Alimentación: Lewis socializa el incremento que se realizó al mercado, pasa de $900.000 a $1.050.000; la señora Sorangela tiene el compromiso de hacer desayuno, almuerzo y aseo general; la cena la realiza el personal de manera rotativa.

Ana propone implementar una minuta y separar en bolsas las porciones de carne para cada día.

→ Felipe solicita implementar un formato para las actividades del contratista eléctrico y verificar en campo lo que hay pendiente de ejecutar.

Esta misma actividad se debe realizar por cada espacio o ambiente en el primer piso.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Entrega de formatos	Ana Parra y Diana Jiménez	
2. Diligenciar formatos de calidad	Anderson Rojas	
3. Entregar modelo de informe quincenal y mensual al residente de obra	Diana Jiménez	
4. Escanear documentos soportes del informe mensual	Ana Parra	
5. Formato de actividades eléctricas	Diana Jiménez	
6. Formato control ejecución actividades por ambiente	Diana Jiménez	
7.		
8.		
9.		
10.		

ELABORÓ:
Lewis Charrasquiel – Coordinador Administrativo Diseño Vertical

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**VERSIÓN**	**RESPONSABLE**
14-09-2023	Se realiza acta de reunión para los diferentes comités de la empresa	01	Ana M. SST
11/11/2023	Se realiza modificación del encabezado	02	Marcela V SST

ACTA: N°

HORA DE INICIO	9:37 a.m.	**HORA DE FINALIZACIÓN**	10:27 a.m.
LUGAR:	Oficina Obra municipio de Cisneros y oficina principal municipio de Carepa		
FECHA:	14 junio 2024		
COMITÉ QUE SE REUNE:	Equipo técnico y administrativo Diseño Vertical Constructora SAS		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	1. Aclarar temas de coordinación de trabajo en equipo		

ASISTENTES

NOMBRES COMPLETOS	CARGO	FIRMA
Felipe Muñoz Marín	Gerencia Proyecto	
Lewis Charrasquiel	Coordinador Administrativo	
Sebastián Albarracín		
Ana María Parra	Siso	
Anderson Rojas	Residente de Obra	
Diana Jiménez	Auxiliar Residente	

DESARROLLO REUNIÓN

Siendo las 9:37am del día 19 de junio de 2024 se reunieron virtualmente, el equipo técnico y administrativo de Diseño Vertical Constructora SAS, Felipe Muñoz Marín gerente de proyectos, Lewis Charrasquiel coordinador administrativo, Sebastián Albarracín, Ana María Parra SISO, Anderson Rojas residente de obra y Diana Jiménez auxiliar residente; para aclarar temas de coordinación de trabajo en equipo:

Anderson Rojas, ingeniero residente, expresa inconformidad con el ambiente de trabajo, el uso del mobiliario de oficina, apoyo técnico por parte de Diana Jiménez y la distribución de las funciones en la obra.

El arquitecto Sebastián y Lewis, manifiestan, que de acuerdo a lo expresado por el ingeniero Anderson, las dificultades expresadas es por problemas de comunicación, entender que somos diferentes y estamos en un proceso de adaptabilidad.

Felipe Muñoz, gerente del proyecto, esclarece cuales son las funciones de cada uno en el proyecto:

Diana se va a encargar de realizar los pedidos de materiales de acuerdo a la programación de actividades que haga el residente con el maestro de obra, control de inventarios, entrega de herramientas y equipos al personal en obra, etc.

Anderson Rojas, como residente de obra, debe realizar los informes quincenales, que son los acumulados para el corte de obra; diligenciar el formato de entrega y recibo de actividades al finalizar el día, porque es la autoridad para decirle a Diego como debe quedar la actividad.

Diana puede apoyar en el seguimiento a las actividades, pero quien entrega y recibe es Diego Pérez y Anderson Rojas, respectivamente.

Conclusión: mejorar la comunicación, trabajo en equipo y coordinar bien las actividades a realizar, con el fin de llevar el proyecto a feliz término.

Organizar el área que funcionara como almacén provisional.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Bodega	Diana Jiménez	22.06.2024
2.		
3.		
4.		
5.		

ELABORÓ:
Lewis Charrasquiel – Coordinador Administrativo Diseño Vertical

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**VERSIÓN**	**RESPONSABLE**
14-09-2023	Se realiza acta de reunión para los diferentes comités de la empresa	01	Ana M. SST
11/11/2023	Se realiza modificación del encabezado	02	Marcela V SST

ACTA: N°

HORA DE INICIO	10:30 a.m.	**HORA DE FINALIZACIÓN**	11:00 a.m.
LUGAR:	Oficinas administrativas del Hospital		
FECHA:	14 junio 2024		
COMITÉ QUE SE REUNE:	Administración del hospital y Diseño Vertical		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	1. Acuerdo para evaluar costo de equipos malos por causa de altibajos de energía		

ASISTENTES

NOMBRES COMPLETOS	CARGO	FIRMA
Juan Camilo Ortiz	Gerente E.S. E.	
Oscar Felipe Muñoz	Ingeniero Diseño Vertical	
Lewis Charrasquiel	Coordinador Administrativo Diseño Vertical	

DESARROLLO REUNIÓN

Siendo las 10:30am del día 14 de junio de 2024 se reunieron en la oficina provisional de gerencia los señores Juan Camilo Ortiz, Gerente ESE Hospital San Antonio Cisneros, Felipe Muñoz Gerente de proyectos y Lewis Charrasquiel coordinador administrativo de Diseño Vertical Constructora SAS, para revisar que solución se pueda dar de manera conjunta a la reparación de los equipos biomédicos que se quemaron con los altibajos de la energía en las instalaciones y el municipio;

Se acordó que:
Se determinaran los costos de reparación por medio de cotizaciones legales y de esta forma estipular el aporte conjunto, por ambas partes, para darle solución a ese tema.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Cotizar el costo de la reparación de los equipos	ESE Hospital San Antonio Cisneros	
2.		
3.		
4.		
5.		

ELABORÓ:
Lewis Charrasquiel – Coordinador Administrativo Diseño Vertical

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**VERSIÓN**	**RESPONSABLE**
14-09-2023	Se realiza acta de reunión para los diferentes comités de la empresa	01	Ana M. SST
11/11/2023	Se realiza modificación del encabezado	02	Marcela V SST

ACTA: N°

HORA DE INICIO	10:00 a.m.	**HORA DE FINALIZACIÓN**	12:00 m.
LUGAR:	Obra y Oficina administrativa del Hospital		
FECHA:	06 junio 2024		
COMITÉ QUE SE REUNE:	Funcionarios ESE Hospital San Antonio Cisneros, Interventoría y Obra		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	1. Comité de Obra 2. Avances 3. Proyecciones 4. Varios		

ASISTENTES

NOMBRES COMPLETOS	CARGO	FIRMA
Jhon Jairo Henao	Director de Obra	
Jaime Cossio	Director Interventoría	
Felipe Muñoz Marín	DV Gerencia Proyecto	
Ladyz Yolima Gutiérrez	Administradora Hospital	
Sebastián Albarracín	DV Gerente	
Luz Aida David Sepúlveda	Interventoría	
Lewis Charrasquiel	DV Coordinador Adtivo.	
Diana Jiménez	DV Auxiliar Residente	

DESARROLLO REUNIÓN

El comité de obra se desarrolla en dos tiempos, en las horas de la mañana se realiza recorrido de obra con el equipo técnico de Diseño Vertical, director de obra e interventoría hasta las 12:00m; y en las horas de la tarde en compañía de la administradora del hospital Ladyz Yolima Gutiérrez en el horario 2:00pm a 3:07pm:

Piso 1:

- Perforar cielo raso existente para evacuar el agua lluvia que ha saturado la losa de entrepiso (modulo 2)
- Se define doble acceso a urgencias, uno para pacientes en camilla y otro para peatones. Este tema se precisó con el gerente del hospital y la Dra. Pilar Jaramillo
- El área de reanimación por ser un ambiente (resolución 4445) debe tener muros y una puerta amplia de 1,50mts en sentido diagonal para facilitar el giro e ingreso de la camilla
- El cuarto dispuesto para lavado pasa a ser cuarto de disposición de cadáveres; y lavado se reubicara al lado del cuarto de aislado

□ Cuarto de aseo: se debe sellar la caja de inspección de la puesta a tierra por ser una zona húmeda
□ Cuarto trabajo sucio: acabado final pintura anti hongos lavable
□ Cuarto de oxigeno: interventoría recomienda adecuarlo en estos 15 días con todo lo que lleva a futuro, con el fin de tener un área disponible para traslados provisionales de otras áreas, y tener disponibilidad para ejecutar la columna D6 y losa faltante.
En esta área también se debe sellar la caja de inspección de la puesta a tierra.
□ Patio trasero: nivelar el terreno y realizar un mortero de 5cm
□ Director de obra ordena corregir conexión de viga y columna de amarre en eje 8
□ Contratista de actividades eléctricas, recomienda dar inicio al proceso de inspección y certificación RETIE con SERVIMETERS

Piso 2:
□ Director de obra recomienda no cambiar la dirección de la cubierta en la etapa 2 por el volumen de agua lluvia que recibiría la canal del eje G
□ Al muro ático se le debe realizar lagrimal en concreto vaciados en el sitio que cumpla la función de amarrar el muro y protegerlo de la humedad por lluvias (pendiente detalle constructivo por parte del director de obra)
□ Una vez instalada la cubierta se debe adecuar el cuarto de telecomunicaciones, para reubicar todo lo existente y terminar la mampostería. Esta actividad se debe hacer, una vez se ejecute la pantalla.
□ Amarre del muro de fachada: el director de obra recomienda demoler la cara interna del muro existente a nivel con la columna, proyectar las vigas aéreas, dejar unos pelos para columnetas y remate del muro en lagrimal. Una vez ejecutado la parte superior, hacer la columneta de la losa a la viga.

La viga del eje 1 se debe ampliar 25cm, hasta la mitad del muro, y colocarle hierro en U (pendiente detalle constructivo por parte del director de obra)

□ La viga aérea de los ejes G2-I2 y H1-H3, se debe reforzar con dos varillas de 5/8", una en cada cara lateral, y ampliar el área de concreto a 35x40.

Una vez reunidos con la administradora del hospital Ladyz Yolima Gutiérrez, el arquitecto Sebastián informa del avance de la obra y de los ajustes que se han hecho en compañía del Dr. Camilo y la Dra. Pilar Jaramillo. El informe final de todos los ajustes está en proceso:

□ Cubierta: el sub contratista de cubierta instala el primer tramo, eje 5 al 8, el día sábado 8 de junio, y se tiene proyectado el resto de cubierta para el día 16 de junio. Actualmente se está amarrando hierro para vaciar vigas aéreas faltantes.

 Cuarto lavado, pasa a depósito de cadáveres; y el cuarto para almacén de medicamentos pasa a cuarto de lavado.

 Dra. Ladyz Yolima, solicita revisar el presupuesto de las puertas y mirar la posibilidad de instalar una puerta vidriera, en el vano adicional de ingreso a urgencias.

Por otro lado, manifiesta no estar de acuerdo en dejar espacio para lockers de enfermeras, y se encargara de definir el tema con el Dr. Camilo.

Además, no considera necesario la instalación de llamado de pacientes, esos recursos es mejor invertirlos en cámaras de seguridad. Gloria y Carlos, plantearon una propuesta de la ubicación de cámaras y planta telefónica; frente a este tema, el ingeniero Jaime Cossio, interventor, sugiere que una persona experta haga el estudio y recomiende técnicamente que tipo de cámara se debe implementar y la cantidad.

 Arq. Sebastián informa a los presentes que es importante definir el espacio para almacén de medicamentos, de acuerdo a las recomendaciones de la Dra. Pilar Jaramillo, que por temas de habilitación, el hospital debe contar con este espacio

PLANTA DE EMERGENCIA Y RED CONTRA INCENDIOS
COMPROMISOS:
 El arquitecto Sebastián se compromete a consultar con la Dra. Pilar como exige la norma la red contra incendio y si es necesaria la planta de emergencia para la habilitación del hospital.
 Director de obra considera que el tema más neurálgico de la obra es el eléctrico, por la antigüedad de las instalaciones, y solicita un informe de la red externa actual y copia del plan de mantenimiento de la planta.
 Ing. Jaime Cossio, interventor, considera necesario involucrar a Empresas Públicas de Medellín ESP –EPM, y definir prontamente estos temas, si se necesita una nueva planta y la capacidad de la red externa con EPM

La directora del hospital, Dra. Ladyz Yolima, expresa que el tema de la planta se puede justificar con las continuas suspensiones de energía en el municipio; y se compromete a programar una reunión que involucre al Dr. Camilo y EPM.

 Dra. Ladyz Yolima, se compromete a reprogramar a XENCO para el ultimo puente de Junio

Se concluye la reunión con el tema de la reubicación de la sala de urgencias #2 para el área del comedor, provisional de lavandería en cuarto de oxígeno y movimiento provisional de

Adíela. Al no finiquitar el tema, el interventor Jaime Cossio insiste en hacerle los acabados al cuarto de oxígeno para tenerlo disponible para una área provisional.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. consultar con la Dra. Pilar como exige la norma la red contra incendio y si es necesaria la planta de emergencia para la habilitación del hospital	Arq. Sebastián Albarracín	
2. informe de la red externa actual y copia del plan de mantenimiento de la planta	Ladyz Yolima Gutiérrez	
3. reunión con EPM para revisar la capacidad de la red externa	Ladyz Yolima Gutiérrez	
4. reprogramar la visita de Xenco	Ladyz Yolima Gutiérrez	
5. acabados al cuarto de oxígeno para tenerlo disponible para una área provisional	Diseño Vertical	
6. definir cambio (eliminar) de área lockers enfermeras	Ladyz Yolima Gutiérrez	
7. definir tema de llamado de pacientes y cámaras de seguridad	Ladyz Yolima Gutiérrez	
8. puerta #2 de ingreso a urgencias, revisar presupuesto para instalarla en vidrio	Arq. Sebastián Albarracín	
9. conexión de viga y columna de amarre en eje 8	Diseño Vertical	
10. iniciar proceso de inspección y *certificación* RETIE con *SERVIMETERS*	Diseño Vertical	

ELABORÓ:
Lewis Charrasquiel – Coordinador Administrativo Diseño Vertical

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**VERSIÓN**	**RESPONSABLE**
14-09-2023	Se realiza acta de reunión para los diferentes comités de la empresa	01	Ana M. SST
11/11/2023	Se realiza modificación del encabezado	02	Marcela V SST

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-28, 11:30:59 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 70599722

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 23/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COTA 30 INGENIERIA SAS ZOMAC		
Documento	NI901700295	**Dirección**	CR 104A NORTE #95 A - 05 NUEVO APARTADO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3127917318
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	APARTADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	COSSIO MORALES JAIME ALONSO	**Identificación**	CC 71776726
Total Afiliados	15	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1037898657	EDINSON ARIEL BOLIVAR RAMOS	01	00	X																	0	8	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 390.000	$ 62.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 390.000	$ 15.600	4,350	$ 390.000	$ 17.000	(CCF04) COMFAMA	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.600
CC 1037898602	ALEXANDER RAMOS CALDERIN	01	00	X																	0	8	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 390.000	$ 62.400	(EPS010) EPS SURA	$ 390.000	$ 15.600	4,350	$ 390.000	$ 17.000	(CCF04) COMFAMA	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.600
CC 1023970524	ARLEVIS GUZMAN TUBERQUIA	01	00	X	X																0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 216.667	$ 34.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 216.667	$ 8.700	4,350	$ 216.667	$ 9.500	(CCF04) COMFAMA	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.600
CC 1048017691	DEISY PATRICIA GONZALEZ HOYOS	01	00	X																	0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 996.667	$ 159.500	(EPS010) EPS SURA	$ 996.667	$ 39.900	4,350	$ 996.667	$ 43.400	(CCF04) COMFAMA	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.700
CC 1037594749	JOSE DANIEL MUÑOZ CORDERO	01	00	X																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 996.667	$ 159.500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 996.667	$ 39.900	4,350	$ 996.667	$ 43.400	(CCF04) COMFAMA	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.700
CC 1043361810	CRISTIAN DAVID RUEDA AREIZA	01	00	X																	0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 390.000	$ 62.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 390.000	$ 15.600	4,350	$ 390.000	$ 17.000	(CCF04) COMFAMA	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.600
CC 1041255559	HECTOR SEGUNDO GUZMAN BALLESTAS	01	00	X																	0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 996.667	$ 159.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 996.667	$ 39.900	4,350	$ 996.667	$ 43.400	(CCF04) COMFAMA	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.700
CC 1078116598	JESUS ALEXANDER RENTERIA CORDOBA	01	00	X																	0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 303.334	$ 48.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 303.334	$ 12.200	4,350	$ 303.334	$ 13.200	(CCF04) COMFAMA	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.200
CC 1152434432	ANA LUCELLY AVILES URREGO	01	00	X																	0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.300.000	$ 92.000	4,350	$ 2.300.000	$ 100.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.100
CC 71776726	JAIME ALONSO COSSIO MORALES	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	4,350	$ 3.000.000	$ 130.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.500
CC 71941893	JUAN GREGORIO GUZMAN AREIZA	01	00	X																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 996.667	$ 159.500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 996.667	$ 39.900	4,350	$ 996.667	$ 43.400	(CCF04) COMFAMA	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.700
CC 71943807	KENEDY DE JESUS TUBERQUIA USUGA	01	00	X																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 996.667	$ 159.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 996.667	$ 39.900	4,350	$ 996.667	$ 43.400	(CCF04) COMFAMA	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.700
CC 71946646	DAVID DE JESUS SOTELO JARABA	01	00	X																	0	23	23	23	23	(231001) COLFONDOS	$ 996.667	$ 159.500	(EPS010) EPS SURA	$ 996.667	$ 39.900	4,350	$ 996.667	$ 43.400	(CCF04) COMFAMA	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.700
CC 78136101	LUIS MANUEL NAVARRO SALCEDO	01	05	X																	0	0	23	23	23	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 996.667	$ 39.900	4,350	$ 996.667	$ 43.400	(CCF04) COMFAMA	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.200
CC 32351132	JAIRO ESTEBINSON RENTERIA CORDOBA	01	00	X																	0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 303.334	$ 48.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 303.334	$ 12.200	4,350	$ 303.334	$ 13.200	(CCF04) COMFAMA	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 13.273.337	$ 14.270.004	$ 14.270.004	$ 14.270.004	$ 2.124.100	$ 571.200	$ 821.300	$ 571.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.997.800	$ 0	$ 3.997.800

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-26, 10:31:14 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 71574284

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADA 24/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COTA 30 INGENIERIA SAS ZOMAC				
Documento	NI901700295	**Dirección**	CR 104A NORTE #95 A - 05 NUEVO APARTADO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3127917318		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	17
Ciudad	APARTADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	COSSIO MORALES JAIME ALONSO	**Identificación**	CC71776726		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71776726	COSSIO MORALES JAIME ALONSO	01	00																	0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	ARL SURA	$ 3.000.000	$ 130.500	COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.500
CC 71941693	GUZMAN AREIZA JUAN GREGORIO	01	00																	0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 56.600	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 71943607	TUBERQUIA USUGA KENEDY DE JESUS	01	00																	0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 56.600	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 71946646	BOTELO JARABA DAVID DE JESUS	01	00																	0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 56.600	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 78106101	NAVARRO SALCEDO LUIS MANUEL	01	05																	0	0	30	30	30	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 56.600	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 62361138	RENTERIA CORDOBA JAIRO ESTEBINSON	01	00																	0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 56.600	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1007898657	BOLIVAR RAMOS EDINSON ARIEL	01	00																	0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 56.600	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1007898802	RAMOS CALDERIN ALEXANDER	01	00																	0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 56.600	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.600
CC 1028017891	GONZALEZ HOYOS DEISY PATRICIA	01	00		X															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 56.600	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1028027562	GARCIA RESTREPO LEONARDO	01	00	X	X															0	10	10	10	10	COLPENSIONES	$ 433.334	$ 69.400	EPS SURA	$ 433.334	$ 17.400	ARL SURA	$ 433.334	$ 18.900	COMFAMA	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.100
CC 1028034874	CAUSIL DURANGO HERMES ALBERTO	01	00	X	X															0	2	2	2	2	PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	NUEVA EPS	$ 86.667	$ 3.500	ARL SURA	$ 86.667	$ 3.800	COMFAMA	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.700
CC 1040361051	BEDOYA MANCO JUAN CARLOS	01	00																	0	2	2	2	2	PROTECCION	$ 86.667	$ 13.900	SAVIA SALUD	$ 86.667	$ 3.500	ARL SURA	$ 86.667	$ 3.800	COMFAMA	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.700
CC 1040361810	RUEDA AREIZA CRISTIAN DAVID	01	00																	0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 56.600	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1041255559	GUZMAN BALLESTAS HECTOR SEGUNDO	01	00																	0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 56.600	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1045519938	GAMBOA RUIZ OWARD	01	00	X																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 56.600	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1076116556	RENTERIA CORDOBA JESUS ALEXANDER	01	00																	0	3	3	3	3	PORVENIR	$ 130.000	$ 20.800	NUEVA EPS	$ 130.000	$ 5.200	ARL SURA	$ 130.000	$ 5.700	COMFAMA	$ 130.000	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.900
CC 71718879	CONRADO MORALES COSSIO	01	00																	0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 56.600	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
																				0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	ARL SURA	$ 3.000.000	$ 130.500	COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.500


III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 19.736.668	$ 21.036.668	$ 21.036.668	$ 21.036.668	$ 3.158.000	$ 0	$ 0	$ 841.600	$ 915.800	$ 841.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.757.000	$ 0	$ 5.757.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO: **FT-SST-015**

☑ **SG-SST**

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha:	01/10/2023
Versión:	002
	Pagina 1 de 1

Ciudad	**Lugar**	**DD**	**MM**	**AA**
Cisneros.	Obra Cisneros.	14	06	2024

ACTIVIDAD REALIZADA		**TEMAS TRATADOS**
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad		Reunión administrativa.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra	✓	

HORA INICIAL: 18:40 . HORA FINAL: :

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Diana Jimenez	43532771	Aux Obra	
2	Ana Maria Pava M.	43483691	SST	
3	Diego Perez	1001024644	maestro	Diego Perez
4	Felipe Muñoz Marin.	1029943910.	Gerente P	
5	Lewis Chamuscuel R	1040354781	coordinador	
6	Anderson E Rojas Quintero	79.489.426	Residente	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre:	**Firma y cargo:**

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
[redacted]	FORMATO: FT-SST-015
	☑ SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha:	01/10/2023
Versión:	002
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Cisneros - Antioquia.	ESE Hospital San Antonio	14	06	2024

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad		Acuerdo para Evaluar costo de equipos malos por causa de altibajos de Energia.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra	X	

HORA INICIAL: 10:30 HORA FINAL:: 11:00

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jhon Carlos Alzate Perez	1017147887	Gerente	
2	Leyvi Estiwyver Rivera	1040357421	coordinador	
3	Felipe Flores Marin.	1027943910.	Ingeniero	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre:	Firma y cargo:

Escaneado con CamScanner

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-28, 04:21:07 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 70960229

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 23/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA SAS	**Nombre Sucursal**	ADMIN	**Código Sucursal**	0000
Documento	NI900613436	**Dirección**	CR 78 #76 - 20 MARIA CANO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3234595388		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	CAREPA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MUÑOZ MARIN OSCAR FELIPE	**Identificación**	CC 1027943910		
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1018136556	JULISSA RUIZ RODRIGUEZ	01	00	X																0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 520.000	$ 83.200	(EPS010) EPS SURA	$ 520.000	$ 20.800	0,960	$ 520.000	$ 36.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 520.000	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.000
CC 1027943910	OSCAR FELIPE MUÑOZ MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.717.392	$ 434.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.717.392	$ 108.700	5,960	$ 2.717.392	$ 189.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.717.392	$ 108.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 841.400
CC 1040357481	LEWIS NADER CHARRASQUIEL RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.717.392	$ 434.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.717.392	$ 108.700	5,960	$ 2.717.392	$ 189.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.717.392	$ 108.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 841.400
CC 32476669	MAYLEN TAIDIT SANCHEZ FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	5,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 9356461	JUAN SEBASTIAN ALBARRACIN CABEZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.717.392	$ 434.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.717.392	$ 108.700	5,960	$ 2.717.392	$ 189.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.717.392	$ 108.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 841.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.372.176	$ 10.372.176	$ 10.372.176	$ 10.372.176	$ 1.659.600	$ 414.900	$ 722.200	$ 414.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.211.600	$ 33.900	$ 3.245.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-09, 10:55:40 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 70959514

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 23/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA SAS	**Nombre Sucursal**	OBRAS	**Código Sucursal**	002
Documento	NI900613436	**Dirección**	CR 78 #76 - 20 MARIA CANO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3234595388		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	CAREPA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MUÑOZ MARIN OSCAR FELIPE	**Identificación**	CC 1027943910		
Total Afiliados	19	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001024699	DIEGO ARMANDO PEREZ SALGADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1001738457	MAURICIO VARGAS MC EVEN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1016033773	LUIS FERNANDO ORTIZ RESTREPO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 5.300	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 43.334	$ 0	0,000	$ 43.334	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 43.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300
CC 1016033773	LUIS FERNANDO ORTIZ RESTREPO	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.256.667	$ 201.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.256.667	$ 50.300	6,960	$ 1.256.667	$ 87.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.256.667	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.200
CC 1028026158	JORGE LUIS PATERNINA GONZALEZ	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 693.334	$ 111.000	(EPS010) EPS SURA	$ 693.334	$ 27.800	6,960	$ 693.334	$ 48.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.900
CC 1030668540	EDIER YAMID SALAZAR ALZATE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1030694603	DIEGO ALEXANDER ARBOLEDA MORALES	01	00	X																0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION	$ 606.667	$ 97.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 606.667	$ 24.300	6,960	$ 606.667	$ 42.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000
CC 1040352000	RICARDO ALBEIRO GOMEZ SEPULVEDA	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1.066.667	$ 170.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.066.667	$ 42.700	6,960	$ 1.066.667	$ 74.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.066.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.400
CC 1193079327	JHON DAIRO OQUENDO RUIZ	01	00	X																0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 606.667	$ 97.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 606.667	$ 24.300	6,960	$ 606.667	$ 42.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000
CC 21651353	SORANGELA DE JESUS ZAPATA FRANCO	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.500
CC 43483691	ANA MARIA PARRA MONSALVE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 71171608	HECTOR DARIO CARDONA BUILES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 71171813	ELKIN ELIECER GARCIA MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 71172313	LEONARDO DE JESUS MARIN LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 71173601	ADONIS ANTONIO ARBOLEDA HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.640.000	$ 262.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.640.000	$ 65.600	6,960	$ 1.640.000	$ 114.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.640.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.800
CC 71253165	DOMINGO LLORENTE LARA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 71714807	PEDRO NEL HURTADO CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 7543736	JHON JAIRO HENAO CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.000	$ 70.000	6,960	$ 1.750.000	$ 121.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800
CC 8069477	JHON LEON VARGAS FLOREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 23/05/2024 | Empresa NI900613436 DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA SAS | Planilla Nro: 70959514 | Periodo Cotización: abril de 2024 | Periodo Servicio: mayo de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 8102318	JORGE MARIO ROLDAN ISAZA	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.640.000	$ 262.400	(EPS016) EPS SURA	$ 1.640.000	$ 65.600	6,960	$ 1.640.000	$ 114.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.640.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 27.883.336	$ 29.103.336	$ 29.103.336	$ 29.103.336	$ 4.447.100	$ 1.162.600	$ 2.023.100	$ 1.162.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.795.400	$ 92.800	$ 8.888.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-09, 10:56:05 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 71470316

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 19/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA SAS	**Nombre Sucursal**	ADMIN	**Código Sucursal**	0000
Documento	NI900613436	**Dirección**	CR 78 #76 - 20 MARIA CANO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3234595388		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	CAREPA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MUÑOZ MARIN OSCAR FELIPE	**Identificación**	CC 1027943910		
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010136550	JULISSA RUIZ RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.347.396	$ 215.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.347.396	$ 53.900	6.960	$ 1.347.396	$ 93.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.347.396	$ 53.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.200
CC 1027943910	OSCAR FELIPE MUÑOZ MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.717.392	$ 434.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.717.392	$ 108.700	6.960	$ 2.717.392	$ 189.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.717.392	$ 108.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 841.400
CC 1040357481	LEWIS NADER CHARRASQUIEL RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.717.392	$ 434.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.717.392	$ 108.700	6.960	$ 2.717.392	$ 189.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.717.392	$ 108.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 841.400
CC 22476960	MAYLEN TAIDIT SANCHEZ FERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.761.979	$ 282.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.761.979	$ 70.500	6.960	$ 1.761.979	$ 122.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.761.979	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.700
CC 8358461	JUAN SEBASTIAN ALBARRACIN CABEZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.717.392	$ 434.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.717.392	$ 108.700	6.960	$ 2.717.392	$ 189.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.717.392	$ 108.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 841.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.261.551	$ 11.261.551	$ 11.261.551	$ 11.261.551	$ 1.882.000	$ 450.500	$ 784.100	$ 450.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.487.100	$ 16.800	$ 3.503.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-09, 10:56:02 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 71506656

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 19/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA SAS	**Nombre Sucursal**	OBRAS	**Código Sucursal**	002
Documento	NI900613436	**Dirección**	CR 78 #76 - 20 MARIA CANO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3234595388		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	CAREPA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MUÑOZ MARIN OSCAR FELIPE	**Identificación**	CC 1027943910		
Total Afiliados	20	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	KGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio	Total
CC 1001024699	DIEGO ARMANDO PEREZ SALGADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.591.146	$ 414.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.591.146	$ 103.700	0,960	$ 2.591.146	$ 180.400	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 2.591.146	$ 103.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 802.400
CC 1001738457	MAURICIO VARGAS MC EWEN	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 86.667	$ 10.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 86.667	$ 0	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500
CC 1001738457	MAURICIO VARGAS MC EWEN	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.260.730	$ 201.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.260.730	$ 50.500	0,960	$ 1.260.730	$ 87.800	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 1.260.730	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.600
CC 1016033773	LUIS FERNANDO ORTIZ RESTREPO	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 10.500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 86.667	$ 0	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500
CC 1016033773	LUIS FERNANDO ORTIZ RESTREPO	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.260.730	$ 201.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.260.730	$ 50.500	0,960	$ 1.260.730	$ 87.800	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 1.260.730	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.600
CC 1028026158	JORGE LUIS PATERNINA GONZALEZ	01	00																	2	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.000	(EPS010) EPS SURA	$ 86.667	$ 3.500	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.400
CC 1028026158	JORGE LUIS PATERNINA GONZALEZ	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.260.730	$ 201.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.260.730	$ 50.500	0,960	$ 1.260.730	$ 87.800	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 1.260.730	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.600
CC 1036998546	EDIER YAMID SALAZAR ALZATE	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.347.396	$ 215.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.347.396	$ 53.900	0,960	$ 1.347.396	$ 93.800	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 1.347.396	$ 53.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.200
CC 1039684603	DIEGO ALEXANDER ARBOLEDA MORALES	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 86.667	$ 10.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 86.667	$ 0	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500
CC 1039684603	DIEGO ALEXANDER ARBOLEDA MORALES	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.260.730	$ 201.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.260.730	$ 50.500	0,960	$ 1.260.730	$ 87.800	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 1.260.730	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.600
CC 1040362000	RICARDO ALBEIRO GOMEZ SEPULVEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.072.917	$ 331.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.072.917	$ 83.000	0,960	$ 2.072.917	$ 144.300	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 2.072.917	$ 83.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.000
CC 1193079327	JHON DAIRO OQUENDO RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.347.396	$ 215.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.347.396	$ 53.900	0,960	$ 1.347.396	$ 93.800	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 1.347.396	$ 53.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.200
CC 21651353	SORANGELA DE JESUS ZAPATA FRANCO	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	0,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.500
CC 43483691	ANA MARIA PARRA MONSALVE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.591.146	$ 414.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.591.146	$ 103.700	0,960	$ 2.591.146	$ 180.400	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 2.591.146	$ 103.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 802.400
CC 43532771	DIANA PATRICIA JIMENEZ VALENCIA	01	00	X									X							0	3	3	3	3	(231001) COLFONDOS	$ 300.208	$ 48.100	(EPS010) EPS SURA	$ 300.208	$ 12.100	0,960	$ 300.208	$ 20.900	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 300.208	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.200
CC 71171508	HECTOR DARIO CARDONA BULES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.554.688	$ 248.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.554.688	$ 62.200	0,960	$ 1.554.688	$ 108.300	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 1.554.688	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.500
CC 71171813	ELKIN ELIECER GARCIA MONTOYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.347.396	$ 215.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.347.396	$ 53.900	0,960	$ 1.347.396	$ 93.800	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 1.347.396	$ 53.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.200
CC 71172313	LEONARDO DE JESUS MARIN LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.347.396	$ 215.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.347.396	$ 53.900	0,960	$ 1.347.396	$ 93.800	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 1.347.396	$ 53.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.200
CC 71173661	ADONIS ANTONIO ARBOLEDA HENAO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.700.549	$ 272.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.700.549	$ 68.100	0,960	$ 1.700.549	$ 118.400	(CCF03) CCMFENALCO ANTIOQUIA.	$ 1.700.549	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 19/06/2024 **Empresa NI900613436 DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA SAS** **Planilla Nro: 71506656** **Periodo Cotización: mayo de 2024** **Periodo Servicio: junio de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71253165	DOMINGO LLORENTE LARA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.554.668	$ 248.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.554.668	$ 62.200	6,960	$ 1.554.668	$ 108.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.554.668	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.500
CC 71714807	PEDRO NEL HURTADO CANO	01	00											X						0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 130.000	$ 15.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 130.000	$ 0	0,000	$ 130.000	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.600
CC 71714807	PEDRO NEL HURTADO CANO	01	00										X							0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.217.306	$ 194.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.217.306	$ 48.700	6,960	$ 1.217.306	$ 84.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.217.306	$ 48.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.000
CC 7545736	JHON JAIRO HENAO CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS085) EPS SANITAS	$ 1.750.000	$ 70.000	6,960	$ 1.750.000	$ 121.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800
CC 9863477	JHON LEON VARGAS FLOREZ	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PROTECCION	$ 133.334	$ 16.100	(EPS010) EPS SURA	$ 133.334	$ 0	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.100
CC 9863477	JHON LEON VARGAS FLOREZ	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PROTECCION	$ 3.866.667	$ 515.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.866.667	$ 154.700	6,960	$ 3.866.667	$ 269.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.866.667	$ 154.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.197.300
CC 8102318	JORGE MARIO ROLDAN ISAZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.699.792	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.699.792	$ 68.000	6,960	$ 1.699.792	$ 118.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.699.792	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 31.941.703	$ 33.241.703	$ 33.241.703	$ 33.241.703	$ 5.090.900	$ 1.309.500	$ 2.272.100	$ 1.306.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.978.500	$ 47.700	$ 10.026.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Cliente: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNEROS
NIT: 890980444

Estado del Lote: LOTE APROBADO
Lote: BT00004847

Fecha de Solicitud: 20240805

Aprobado por: JUAN CAMILO ORTIZ PEREZ

Supervisado por:

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16.535.129	**Valor Reg. Procesados:** $16.535.129	**Valor Reg. Rechazados:** $0	**Valor Reg. Pendientes:** $0

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	REFERENCIA	ESTADO	CUENTA IDEA
00000064500003393	Ahorros	901700295	COTA 30 INGIENERIA SAS	$16.535.129	BANCOLOMBIA	FRA NRO 4	APLICADO	00000000100015350
