INFORME DE GESTIÓN 008 GERENCIA DE PROYECTOS

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

COGUA CUNDINAMARCA

DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

INTRODUCCIÓN

La gerencia de proyectos busca que se obtenga el producto o servicio requerido y se cumpla con las restricciones del alcance, tiempo y costo, con los requerimientos de calidad planteados al inicio y que además el producto o servicio satisfaga las expectativas de los usuarios.

La metodología del PMI en gerencia de proyectos es aplicable a la mayoría de los proyectos, sus lineamientos y prácticas pueden mejorar el éxito de los mismos. Con base en lo anterior, este proyecto aplica las 10 áreas del conocimiento propuestas por el PMI®, para garantizar el éxito en el MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

A continuación, se presenta el desempeño del proyecto en el periodo correspondiente.

Contenido

INTRODUCCIÓN 2

1. **DIRECCIÓN DEL PROYECTO** 4
2. **GESTIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS** 6
3. **GESTIÓN DEL ALCANCE** 7
4. **GESTIÓN DEL CRONOGRAMA** 9
5. **GESTIÓN DE LOS RIESGOS** 9
6. **GESTIÓN DE LOS RECURSOS** 14
7. **GESTIÓN DE LOS COSTOS** 15
8. **GESTIÓN DE LA CALIDAD** 16
9. **GESTIÓN DE LA COMUNICACIONES** 16
10. **GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES** 20

1. DIRECCIÓN DEL PROYECTO


Durante el periodo en curso, se realizó el seguimiento a las líneas base del alcance del proyecto, se evaluó el cronograma de actividades, relación de equipo mínimo los cuales son necesarios para medir el progreso y finalización del proyecto teniendo en cuenta la gestión de cada área de conocimiento.

1.1. Descripción de proyecto

1.1.1. Localización

El proyecto denominado “MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, fue suscrito entre el ICCU y el CONSORCIO VIAS 2023, se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia de acuerdo a la localización relacionada a continuación:



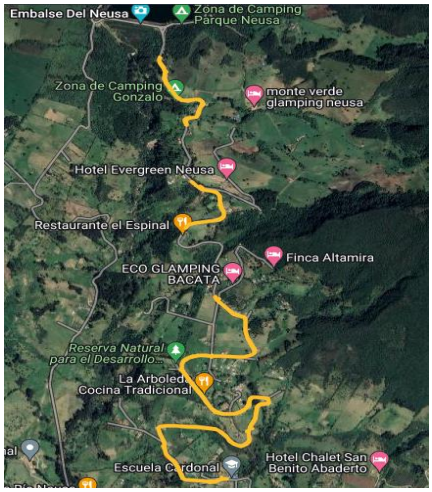

El lugar de ejecución de las obras se encuentra situado a 9.4 km de distancia del casco urbano del municipio de Cogua, corredor vial que conecta la cabecera municipal con las veredas de: Cardonal.

Los tramos para ejecutar en el proyecto son los siguientes, tomando como base la escuela cardonal, como el PR 0+000.

Tramo 1. 0+000 - 1+240
Tramo 2. 1+320 - 3+199
Tramo 3. 3+500 - 4+400
Tramo 4. 4+400 - 4+880
Tramo 5. 4+880 - 4+940
Tramo 6. 4+940 - 4+985

1.1.2. Conectividad, área de influencia y beneficios

El mantenimiento y la rehabilitación de una vía, como la que conduce de Cogua al embalse del Neusa en la vereda Cardonal, pueden ofrecer una serie de beneficios significativos tanto para la comunidad local como para los visitantes, como lo son la mejora de la seguridad al tener una vía en buen estado, el cual reduce el riesgo de accidentes de tráfico y facilita el acceso de vehículos de emergencia en caso de ser necesario; además, permite un acceso más fácil a la zona del embalse, lo que fomenta el turismo y actividades recreativas. Esto puede impulsar la economía local al atraer a más visitantes.

Desarrollo económico: La mejora de la infraestructura vial puede abrir oportunidades para el desarrollo de proyectos turísticos, restaurantes, alojamientos y otras empresas relacionadas.

Reducción del tiempo de viaje: Una vía en buen estado permite a los residentes locales desplazarse más rápidamente a sus lugares de trabajo y a los visitantes llegar al embalse de manera eficiente, lo que ahorra tiempo y recursos.

Preservación del medio ambiente: Al mantener la vía en buenas condiciones, se evita la erosión y la degradación ambiental, lo que contribuye a la preservación de los recursos naturales en la zona.

Mejora de la calidad de vida: Una vía bien mantenida hace que la vida diaria sea más cómoda para los residentes locales al facilitar la movilidad y el acceso a servicios y actividades.

2. GESTIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

Los interesados clave en el proceso, los cuales se observan en la tabla relacionada a continuación, han estado presentes e involucrados durante el presente periodo del contrato, y desde el Consorcio Vías 2023 se ha tenido en cuenta la expectativa de cada uno de ellos, es por esto que se han realizado comités, mesas de trabajo y comunicaciones con el fin de cumplir los requisitos del cliente teniendo en cuenta las condiciones contractuales y precontractuales del mismo.


MATRIZ DE ANÁLISIS DE INTERESADOS SEGÚN CALIFICACIÓN		
INTERESADO	**INTERÉS**	**PODER**
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU (Patrocinador/Sponsor)	Alto	Alto
DIRECTOR DE PROYECTO	Alto	Alto
EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO	Alto	Bajo
OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO	Bajo	Alto
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD	Alto	Bajo
USUARIOS / CLIENTES	Alto	Bajo
PRESIDENTES JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	Alto	Bajo
PROVEEDORES / SOCIOS DE NEGOCIOS	Bajo	Alto
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	Alto	Alto
OTROS INTERESADOS	Bajo	Bajo

3. GESTIÓN DEL ALCANCE

El alcance del proyecto a la fecha se mantiene y en el presente periodo corresponde a todos los procesos necesarios para garantizar que el proyecto "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA se desarrolle a cabalidad cumpliendo los requisitos de la entidad contratante (Sponsor).

En el presente mes se aprobaron los siguientes ítems no previstos mediante modificatorio No 2 el 22 de marzo de 2024 lo cual genera cambios en la EDT para el cumplimiento del alcance contractual:

- EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM).
- SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTISOL PARA CUNETA DE CONCRETO
- DESMONTE Y RETIRO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
- DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE (30X45 cm), EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y REFLECTIVIDAD TIPO IV GRADO DIAMANTE AL CUBO, CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD VIGENTE.
- LIMPIEZA DE DEFENSA METÁLICA CON MEDIOS MECÁNICOS Y DISOLVENTES
- PINTURA DEFENSA METÁLICA - CROMATO DE ZN - PINTURA TRÁFICO
- DESMONTE Y RETIRO DE DEFENSA METÁLICA EXISTENTE

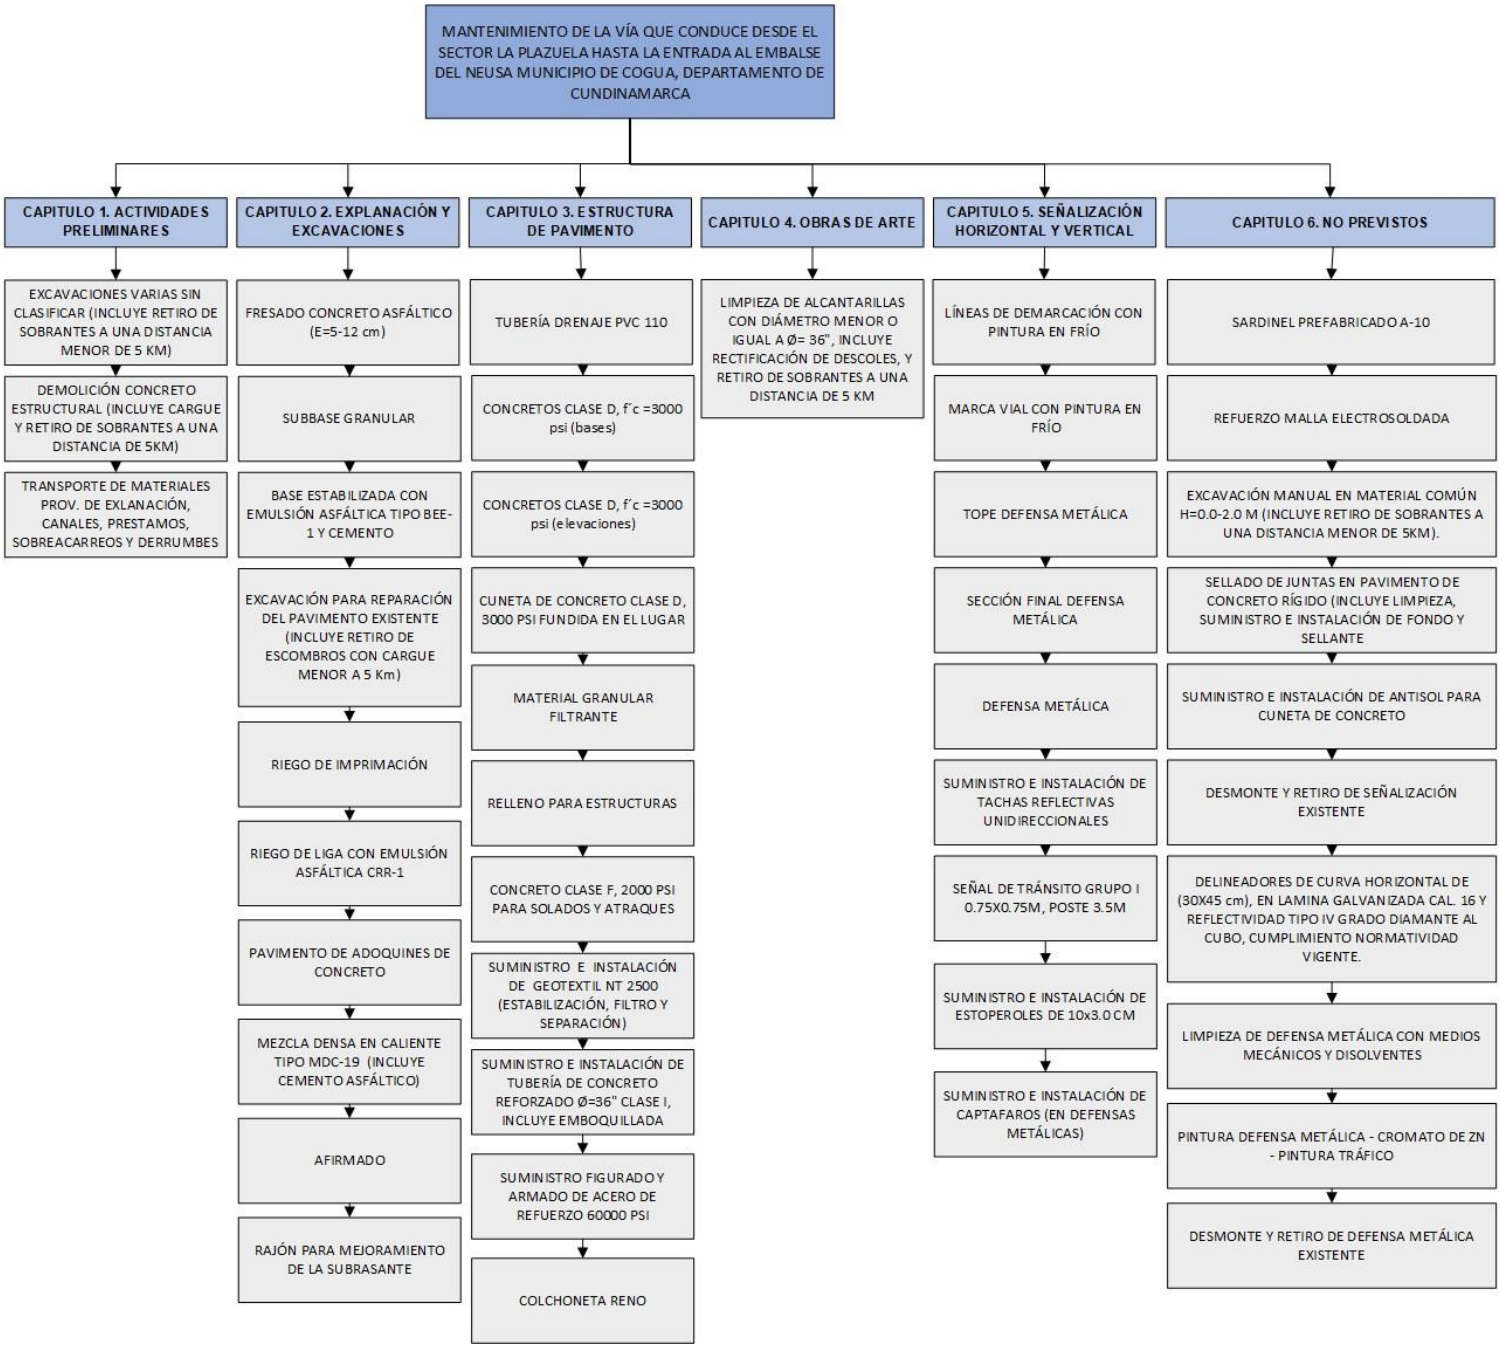
MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES
CAPITULO 2. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES
FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)
SUBBASE GRANULAR
BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO
EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)
RIEGO DE IMPRIMACIÓN
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1
PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)
AFIRMADO
RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
CAPITULO 3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
TUBERÍA DRENAJE PVC 110
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)
CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
COLCHONETA RENO
CAPITULO 4. OBRAS DE ARTE
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM
CAPITULO 5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO
TOPE DEFENSA METÁLICA
SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA
DEFENSA METÁLICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES
SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)
CAPITULO 6. NO PREVISTOS
SARDINEL PREFABRICADO A-10
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM).
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTISOL PARA CUNETA DE CONCRETO
DESMONTE Y RETIRO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE (30X45 cm), EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y REFLECTIVIDAD TIPO IV GRADO DIAMANTE AL CUBO, CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD VIGENTE.
LIMPIEZA DE DEFENSA METÁLICA CON MEDIOS MECÁNICOS Y DISOLVENTES
PINTURA DEFENSA METÁLICA - CROMATO DE ZN - PINTURA TRÁFICO
DESMONTE Y RETIRO DE DEFENSA METÁLICA EXISTENTE

4. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

De acuerdo con el programa de obra ajustado al modificatorio No 2 se tiene un porcentaje programado al 28 de marzo del 2024 del 93.21% el cual equivale a $ $ 8,169,032,528.00, a la fecha se han realizado actividades de cunetas en concreto, de base estabilizada con emulsión asfáltica, cemento y de mezcla Asfáltica MDC-19 y señalización y demarcación a lo largo del corredor, estas actividades han generado un avance financiero y ejecución de $ 8,120,487,529.21, el cual corresponde al 92.66% se evidencia un atraso del 0.55% debido al ajuste del modificatorio No 2 con su respectiva prorroga.

En particular, las actividades actuales en el sitio incluyen el fresado, la instalación de una base estabilizada con emulsión asfáltica y cemento y la instalación de mezcla Asfáltica MDC-19, cuneta en concreto y señalización y demarcación a lo largo del corredor. Estas tareas cumplidas han generado una ejecución por $ 8,120,487,529.21, constituyendo el 92.66% del total del proyecto, mostrando un atraso general del 0.55% en ejecución.

5. GESTIÓN DE LOS RIESGOS

A la fecha se han identificado los siguientes riesgos por parte del Consorcio vías 2023:

#	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	CATEGORÍA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	RIESGO	TIPO DE RIESGO
R1	01/08/2023	CALIDAD	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA
R2	01/08/2023	TIEMPO	Daños a terceros	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA
R3	01/08/2023	CALIDAD	Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA

#	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	CATEGORÍA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	RIESGO	TIPO DE RIESGO
R4	01/08/2023	COSTO	Huelgas o paros al interior de la empresa contratista	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R5	01/08/2023	CALIDAD	Huelgas o paros generales	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R6	01/08/2023	CALIDAD	Asonada, guerra o ataque terrorista	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R7	01/08/2023	COSTO	Financiamiento del contrato	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R8	01/08/2023	ALCANCE	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA
R9	01/08/2023	ALCANCE	Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R10	01/08/2023	TIEMPO	Modificaciones abruptas en el tipo de cambio	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R11	01/08/2023	TIEMPO	Mora en el pago por parte del Estado	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA

#	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	CATEGORÍA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	RIESGO	TIPO DE RIESGO
R12	01/08/2023	CALIDAD	Obtención de seguros u otras garantías	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R13	01/08/2023	ALCANCE	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R14	01/08/2023	TIEMPO	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA
R15	01/08/2023	COSTO	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R16	01/08/2023	ALCANCE	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA

#	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	CATEGORÍA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	RIESGO	TIPO DE RIESGO
R17	01/08/2023	COSTO	Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial (es decir, cuando se encuentran por debajo del 95 por ciento de cada uno de los ítems del presupuesto oficial y/o de cada uno de los insumos, costos, precios, tarifas, alquiler de equipos, salarios, transportes, de los APU) en la propuesta del CONTRATISTA	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA
R18	01/08/2023	CALIDAD	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R19	01/08/2023	TIEMPO	Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución		AMENAZA

#	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	CATEGORÍA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	RIESGO	TIPO DE RIESGO
R20	01/08/2023	COSTO	Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno.	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA
R21	01/08/2023	TIEMPO	Riesgo presentado por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución del contrato	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA
R22	01/08/2023	TIEMPO	Riesgo presentado por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas por el CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo	Retraso en la ejecución de obra y presupuesto	AMENAZA
R23	01/08/2023	COSTO	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA

#	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	CATEGORÍA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	RIESGO	TIPO DE RIESGO
R24	01/08/2023	CALIDAD	Uso de Materiales o Procesos Constructivos con Especificaciones menores a las estipuladas en los Estudios y Diseños	Retraso en el cronograma y en la entrega de las obras	AMENAZA

A corte del presente periodo no se ha materializado ningún riesgo de los identificados inicialmente, ni se han identificado riesgos nuevos.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

A la fecha se tienen revisados y aprobados el personal profesional mínimo requerido para la ejecución del proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO	
MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS:	
RECURSOS	***CANTIDAD***
SPONSOR	1
INTERVENTORÍA	1
DIRECTOR DE OBRA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
INSPECTOR VIAL	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL	1
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES	1
TOPOGRAFO	1

CANT	CARGO	NOMBRE
1	DIRECTOR DE OBRA	LUIS FERNANDO BRICEÑO
1	RESIDENTE DE OBRA	YEISON ANDRES VEGA VASQUEZ
1	INSPECTOR VIAL	MARIA CAROLINA AVILA
1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JHONNATAN SANTIAGO SANABRIA VERGARA
1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	VICTOR MANUEL PUERTO NOCUA
1	ESPECIALISTA AMBIENTAL	JULLY ALEJANDRA TIUZO GARCIA
1	PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL	NANCY CONSTANZA IPUZ FORERO
1	PROFESIOAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES	IVON NATALIA MONROY REYES

7. GESTIÓN DE LOS COSTOS

Para la estimación de los costos del proyecto se elaboró el presupuesto y las reservas de gestión del proyecto. Este documento fue elaborado por el gerente (director de obra) del proyecto y, revisado y aprobado por el Sponsor y la interventoría. Para elaborar el presupuesto se realizó la suma de los costos

estimados de las actividades o paquetes de trabajo o cuentas de control para obtener el estimado del proyecto, luego de esto en el área del conocimiento de gestión de riesgos calculó las reservas de contingencia (Posibles riesgos conocidos que se pueden materializar en la ejecución del proyecto) logrando de esta forma la línea base de costos, a esta línea base se le agregó la reserva de gestión (Riesgos no previstos del proyecto), obteniendo finalmente el presupuesto de costos del proyecto.

El programa de inversión aprobado del contrato se encuentra distribuido de acuerdo con la siguiente tabla:

MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO	$31.760.095	$1.222.011.670	$2.362.828.162	$2.362.282.162	$2.591.580.360
EJECUTADO	$0	$5.380.541	$146.015.159	$884.174.546	$2.026.809.076

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	$ 1.053.861.685,50	$ 991.834.234	$ 490.531.219,79
EJECUTADA	$ 2.033.549.691	$ 1.442.320.733	$ 1.574.555.497,39

Dada la ejecución de la mezcla Asfáltica MDC-19, Base estabilizada y cunetas en concreto del proyecto, el valor ejecutado en el presente periodo del mes de marzo es de $ 1,574,555,497.39 pesos.

8. GESTIÓN DE LA CALIDAD

Se realiza el seguimiento a plan de calidad y al plan de inspección y ensayo, el cual se localiza anexo al informe general técnico para el presente periodo.

9. GESTIÓN DE LA COMUNICACIONES

La comunicación entre las partes interesadas del proyecto, se ha realizado a través de oficios de comunicación enviados por medio de correo electrónico, donde a cada registro se asigna un identificador único el cual facilitará la respuesta por parte del remitente a corte del presente periodo se han remitido las siguientes comunicaciones:

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
No.	**CONSECUTIVO**	**FECHA**	**ASUNTO**
385	GG-FOR13-428	26/03/2024	GIRO DE ANTICIPO N°23
384	GG-FOR13-424	19/03/2024	RADICACIÓN DE INFORMES MENSUALES NO. 7
383	GG-FOR13-424	18/03/2024	REMISÓN APUS NP
382	GG-FOR13-423	18/03/2024	CONCEPTO SOBRE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN OBRA No 2 Y APROBACIÓN DE ÍTEM NO PREVISTOS. RTA COMUNICADO CIO-449-2023
381	GG-FOR13-422	18/03/2024	REMISION PROGRAMACION DE OBRA
380	GG-FOR13-419	13/03/2024	REMISIÓN ACTA PARCIAL 5
379	GG-FOR13-417	13/03/2024	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CIO-441-2024 SOLICITUD PREACTA 6 GESTIÓN AMBIENTAL SUSCRITA POR DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
378	GG-FOR13-415	8/03/2024	RESPUESTA A COMUNICADO No CIO-440-2023 – APUS NO PREVISTOS
377	GG-FOR13-413	7/03/2024	Respuesta a comunicado CIO-369-2023 y CIO-440-2023 - Solicitud Distribución Señalización Y Demarcación Del Proyecto.
376	GG-FOR13-409	7/03/2024	REMISIÓN INFORME DE ANTICIPO.
375	GG-FOR13-408	6/03/2024	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CIO-433-2024 INFORME MENSUAL AMBIENTAL 6 V2
374	GG-FOR13-407	5/03/2024	RADICACIÓN DE INFORMES MENSUALES NO. 5 y 6
373	GG-FOR13-402	1/03/2024	RADICACIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 28
372	GG-FOR13-401	1/03/2024	RESPUESTA A COMUNICADO No CIO-424-2023 – APUS NO PREVISTOS
371	GG-FOR13-400	1/03/2024	RESPUESTA A COMUNICADO No CIO-398-2023
370	GG-FOR13-399	1/03/2024	SOLICITUD DE INICIO ACTIVIDADES COMUNICACIÓN CIO-424-2023

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
No.	**CONSECUTIVO**	**FECHA**	**ASUNTO**
374	CIO-463-2023	27/03/2024	Respuesta comunicación CO -417 Solicitud de Pre-Actas No.6 (enero de 2024) del componente Ambiental.
373	CIO-462-2023	27/03/2024	Respuesta comunicación CO -424 Radicación Informes Mensual No.7 (01 al 29 de febrero de 2024) Componente Ambiental
372	CIO-461-2023	26/03/2024	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-424 radicada el 19 de marzo 2024 – observaciones al informe mensual de gestión social #7 V1.
371	CIO-460-2023	21/03/2024	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-425 radicada el 20 de marzo 2024 – Aprobación informe mensual de gestión social #6 V3.
370	CIO-455-2023	20/03/2024	RESPUESTA COMUNICACAION CO 419 DE 2024 APROBACION CORTE DE OBRA N° 5
369	CIO-454-2023	19/03/2024	APROBACION INFORME MENSUAL TECNICO No. 5 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
368	CIO-453-2023	19/03/2024	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-420 radicada el 19 de marzo 2024 – observaciones al informe mensual de gestión social #6 V2.
367	CIO-451-2023	19/03/2024	Entrega Informe mensual N° 7 periodo 1 a 29 de febrero de 2024
366	CIO-450-2023	18/03/2024	Respuesta comunicado No. 424 REMISION APUS NP
365	CIO-449-2023	18/03/2024	Respuesta comunicado No. 421 CONCEPTO SOBRE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN OBRA No 2 Y APROBACIÓN DE ÍTEM NO PREVISTOS.
364	CIO-448-2023	18/03/2024	Reiteración comunicación CIO-445-2023 Actividades componente social - cierre de contrato
363	CIO-447-2023	13/03/2024	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-416 radicada el 12 de marzo 2024 – observaciones al informe mensual de gestión social #6 V2.
362	CIO-446-2023	12/03/2024	Respuesta comunicado CO-415 RESPUESTA A COMUNICADO No CIO- 440-2023 – APUS NO PREVISTOS
361	CIO-445-2023	11/03/2024	Actividades componente social - cierre de contrato
360	CIO-444-2023	11/03/2024	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-4122 radicado el 8 de marzo de 2024 – Aprobación documento Informe mensual de gestión social #5 V3

359	CIO-443-2023	11/03/2024	Respuesta al comunicado CO.409 alternativa para realizar el mantenimiento en el pavimento de la vía sobre el Sector La Plazuela.
358	CIO-442-2023	11/03/2024	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-411 radicada el 8 de marzo 2024 – Aprobación al cronograma de cierre de gestión social.
357	CIO-441-2023	7/03/2024	Respuesta comunicación CO -408 Radicación Informe Mensual No.6V2 Componente Ambiental
356	CIO-440-2023	7/03/2024	Respuesta comunicación CO-401. APUS NO PREVISTOS.
355	CIO-439-2023	7/03/2024	Respuesta comunicación CO-399. SOLICITUD DE INICIO ACTIVIDADES COMUNICACIÓN CIO-424-2023.
354	CIO-438-2023	7/03/2024	Llamado de atención por presunto incumplimiento en la divulgación de cierre de vía.
353	CIO-437-2023	6/03/2024	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-405 radicada el 6 de marzo 2024 –observaciones al cronograma de cierre de gestión social.
352	CIO-436-2023	6/03/2024	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-404 radicada el 6 de marzo 2024 –observaciones al informe mensual de gestión social #5 V2.
351	CIO-435-2023	6/03/2024	Respuesta comunicación CO -379 - Ejecución de obra dentro de los días contractualmente previstos.
350	CIO-434-2023	5/03/2024	Respuesta comunicación CO - 400 Plan de contingencia.
349	CIO-433-2023	5/03/2024	Respuesta comunicación CO -379 Radicación Informes Mensual No.6 (01 al 31 de enero de 2024) Componente Ambiental
348	CIO-429-2023	3/03/2024	Reiteración solicitud CIO-369-2023 Distribución señalización y Demarcación del Proyecto.
347	CIO-428-2023	1/03/2024	Respuesta comunicación CO- 398 Presupuesto y memorias propuesta de intervención La Plazuela – La Chocita
346	CIO-427-2023	1/03/2024	Respuesta al comunicado CO.396 PRESENTACIÓN ALTERNATIVA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO LA PLAZUELA – LA CHOCITA
345	CIO-426-2023	1/03/2024	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-397 radicada el 29 de febrero 2024 – observaciones al cronograma de cierre de gestión social.

344	CIO-425-2023	1/03/2024	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-395 radicada el 29 de febrero 2024 – observaciones al informe mensual de gestión social #5 V1.

10. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Las adquisiciones del proyecto se realizan según el procedimiento de compras, el cual se encuentra anexo al plan de calidad, con el fin de llevar el control de cada uno de los recursos físicos implementando los formatos asociados.

Estas compras comprenderán todos los materiales y/o equipos especificados en el contrato, que le corresponden ser suministrados por el CONSORCIO, y a los cuales se les hará la respectiva inspección y se registrarán para su liberación en los formatos de entrada y salida de materiales, también adjunto al plan de aseguramiento de la calidad de la obra.

Atentamente,

JULLY ALEJANDRA TIUZO GARCIA
INGENIERA AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS
CONSORCIO VÍAS 2023
