INFORME MENSUAL No. 1

ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA “CORPAMAG”.

OBJETO: “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES."



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-006-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ICASM2023

PERIODO: 19 DE MARZO DE 2024 HASTA 31 DE MARZO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 4
2.1 DESCRIPCION GENERAL 4
2.2 LOCALIZACIÓN 5
2.2.1 Localización Especifica del Proyecto 6
2.2.2 Inventario y estado inicial del sitio donde se ejecutarán las obras 7
2.3 ALCANCE Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 10
2.4 CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES PERIODO 2024 16
3 ESTADO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS 17
3.1 CONTRATO DE OBRA 17
3.1.1 INFORMACION BÁSICA CONTRATO DE OBRA Nº LP-006-2023 .. 17
4 ACTIVIDADES DE OBRA 17
4.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO 17
4.1.1 INFORME DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS VERIFICADAS DENTRO DEL PERIODO 19
4.1.2 INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO 19
4.1.3 PERSONAL DE OBRA 20
4.1.4 EQUIPO DE OBRA 20
4.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS 21
4.1.6 SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y LA PROGRAMACION 21
4.1.7 BITÁCORA DE OBRA. 22
4.1.8 CONTROL DE CALIDAD 22
4.1.9 CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO 22
4.1.10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA 23
4.1.11 CONTROL DE PERSONAL 23
4.2 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 23
4.2.1 CONTROL DE PÓLIZAS 23
4.2.2 CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES 24
4.2.3 CORRESPONDENCIA 24
4.2.4 ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS PERMISOS 25
4.2.5 REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 25
4.3 ACTIVIDADES DE ORDEN AMBIENTAL, SST Y SOCIAL 25
4.4 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 25
4.4.1 ACTAS PARCIALES DE COBRO 26
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 26

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Datos generales de contrato de Obra Pública No. LP 006 2023, Periodo 2024. 17
Tabla 2. Informes Semanales. 19
Tabla 3. Personal mínimo requerido. 20
Tabla 4. Relación Maquinara de Obra. 20
Tabla 5. Relación Volquetas de Obra. 20
Tabla 6. Relación de Equipos de Topografía. 21
Tabla 7. Resumen del cumplimiento a la programación durante el periodo. 21
Tabla 8. Póliza del Contrato no. LP 006 DE 2023. 24
Tabla 9. Relación de correspondencia durante el periodo. 25
Tabla 10. Descripción de pagos o cobros realizados por el contratista de obra. 26

LISTA DE FIGURAS

Ilustración 1. Localización general del proyecto, Distrito de Santa Marta. Fuente: Propia. 6
Ilustración 2. Ubicación de los cuerpos de agua que se tiene proyectado su intervención. Fuente: Propia. 7
Ilustración 3. Registro Fotográfico Rio Gaira. Fuente: Propia. 9
Ilustración 4. Registro Fotográfico Rio Gaira. Fuente: Propia. 9
Ilustración 5. Registro Topográfico - Rio Gaira. Fuente: Propia. 10
Ilustración 6. Localización de la Cuenca del Rio Gaira. Fuente: Propia. 13
Ilustración 7. Figura representativa de muro en Geocontenedor. Fuente: Propia. 14
Ilustración 8 Oferta económica correspondiente a los periodos 2023 y 2024. 16
Ilustración 9 Toma de muestras - Estudio de Suelos. Fuente: Propia. 18
Ilustración 10. Análisis de Batimetría - Estudio Topo-Batimétrico. Fuente: Propia. 18
Ilustración 11 Levantamiento topografico - Rio gaira. Fuente: Propia. 19

LISTA DE GRÁFICO

Gráfico 1. Porcentaje Programado vs Ejecutado en la las semanas del mes. Fuente: Propia. 21
Gráfico 2. Porcentaje Acumulado de vs Programado vs Ejecutado. Fuente: Propia. 22
Gráfico 3. Porcentaje de Adelanto o Atraso de la Programación del proyecto. Fuente: Propia. 22
Gráfico 4. Estado del Tiempo en el Mes. Fuente: Propia. 23
Gráfico 5.Avance Financiero de Ejecucion Vs Programado Mensual. Fuente: Propia. 25

1 INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) dentro de sus funciones propone y articula las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos de tipo ambiental, por lo anterior le adjudicó el contrato de obra al CONSORCIO ICASM2023, cuyo objeto es "**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES**". El presente documento corresponde al informe mensual No. 1, este contiene la descripción de las actividades desarrolladas en la ejecución de los trabajos relacionados con el contrato de obra en el periodo de tiempo comprendido entre el 19 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2024, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Dentro de las funciones de obra se tienen en cuenta la ejecución de las actividades del contrato, con el fin de dar el cumplimiento eficaz de las mismas, acorde a las especificaciones técnicas, diseños estipulados y recomendaciones de Interventoría. El informe mensual está conformado, por un resumen ejecutivo del mes, en el cual se presenta la descripción general del proyecto, el control de la programación, las actividades ejecutadas en el periodo y finalmente un registro fotográfico de las actividades realizadas.
De esta manera, con el presente informe se pretende proporcionar una visión global de las ejecuciones del contrato, dentro del periodo mencionado, en el que se analizan de manera conceptual y gráfica, los rendimientos o avance de la obra.

2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL

Los cuerpos de agua proveen servicios ambientales que garantizan la disponibilidad del recurso hídrico, la diversidad de la flora y la fauna, la sostenibilidad de los territorios y la calidad de vida de sus habitantes, lo que significa que de su cuidado depende el correcto funcionamiento de cada uno de los ecosistemas terrestres.

En tal sentido, la ejecución de este proyecto es importante no solo para la ciudad, si no para el país en general, debido a que el distrito de Santa Marta representa un turístico, que genera fuentes de empleo a la región y divisas a la ciudad, pero debido a los graves problemas de socavación e inundación no se ha podido desarrollar todo el potencial que tiene. La desembocadura de estos ríos con el mar caribe, representa un atractivo sin igual, que atrae casi que naturalmente al turista, que ven en estos parajes un sitio agradable, apacible y donde la calidez del nativo los hace regresar.

Con la ejecución de este proyecto no sólo se está contribuyendo al mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad Santa Marta, sino que también contribuye con

los procesos de restauración y recuperación de hábitats presentes en los cauces de estos ríos y en la zona costera del Mar Caribe donde la mayoría de ellos desembocan.

Además, con estas obras de mantenimiento en los ríos propuestos en la zona rural y urbana del Distrito de Santa Marta se contribuye que en temporadas de fuertes precipitaciones se mitiguen los riesgos por inundación a las que se encuentran expuestas las comunidades que colindan con las rondas hídricas de estos, así mismo, contribuye a la perduración en el tiempo del proyecto que actualmente se está ejecutando denominado: "**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALE**S".

El proyecto busca mantener estos cuerpos de agua en un escenario integral-colectivo sostenible de la ciudad, que resalte a Santa Marta y su carácter transversal. Por consiguiente, este escenario abrirá espacio a todas las personas y los invitará a participar de él y a usarlo permanentemente de manera sostenible.

Además de lo anteriormente expuesto, el presente proyecto se encuentra enmarcado en el enfoque hacia los 500 años buscando la preservación y valorización de la biodiversidad del distrito, con los mantenimientos permanentes en sus cuerpos de agua prestar servicios turísticos de calidad, además con este proyecto se contribuye al desarrollo urbano, social, económico sostenible y adaptado al cambio climático.

2.2 LOCALIZACIÓN

El Distrito de Santa Marta está conformado por un mar territorial, un área montañosa correspondiente a la Sierra Nevada, cuerpos de agua interiores, las islas y bahías localizadas en el mar territorial y en los cuerpos de agua, el suelo consolidado constituido por una zona costera y una zona continental, el suelo no consolidado constituido por la zona de Bajamar, el subsuelo y el espacio aéreo asociado.

Limita Por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur los municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la Guajira y Cesar. Sus coordenadas geográficas son: 11º 14' 50" de latitud norte y 74º 12' 06" de latitud oeste. Dista de Bogotá 992 Km; de Riohacha 166 Km y de Barranquilla 93 Km. Cuenta con una extensión total de 2,393.35 Km2, de los cuales 55.10 Km2 pertenecen a zona urbana y 2,338.25 km2 a zona rural. La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm en el Pico Cristóbal Colón, que es el más elevado de toda Colombia ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta (PDD Santa Marta, 2023).

Ilustración 1. Localización general del proyecto, Distrito de Santa Marta. Fuente: Propia.



2.2.1 Localización Especifica del Proyecto

Los cuerpos de agua a intervenir, serán definidos año a año por la entidad (CORPAMAG), soportado en los informes técnicos, así como en el concepto expedido por la INTERVENTORIA.

El mantenimiento se realizará en los siguientes cuerpos de agua:

- RIO MANZANARES
- RIO GAIRA
- RIO PIEDRAS
- RIO GUACHACA
- RIO MENDIGUACA
- RIO BURITACA
- RIO DON DIEGO

Y otros cuerpos de agua que puedan ser priorizados dentro del Distrito de Santa Marta.

Ilustración 2. Ubicación de los cuerpos de agua que se tiene proyectado su intervención. Fuente: Propia.



Para el año **2024** el rio escogido fue el **RIO GAIRA**. El tramo de intervención va desde la desembocadura en el Rodadero hasta donde se tenga proyectado.

2.2.2 Inventario y estado inicial del sitio donde se ejecutarán las obras

RIO GAIRA

La degradación hidráulica y ambiental de este río, está asociada principalmente en la cuenca baja, donde se encuentra asentada la mayor parte de la población urbana; esto se ha generado por diferentes procesos históricos de desplazamiento y a su vez de invasión de manera no planificada en terrenos que generalmente no cuentan con condiciones físicas, ambientales, geográficas. Estas comunidades han invadido la cuenca de este importante afluente, año tras año ante situaciones ambientales relacionada con las épocas de inviernos torrenciales de la región son vulnerables a los procesos de inundación por los desbordamientos del río, ocasionándoles afectaciones en sus viviendas.

Sumado a eso, está la ausencia de cultura ambiental por parte de las poblaciones asentadas en la ronda hídrica del río, evidenciado en el manejo de las excretas y desechos arrojados permanentemente al cauce; situación que muestra claramente la falta de pertenencia de las comunidades asentadas en la cuenca del río, lo que además de contribuir a la perdida de la capacidad hidráulica, contribuye al deterioro paisajístico de este sector de la ciudad y ocasiona que las comunidades aledañas a la zona tengan una percepción negativa de este afluente, por otra parte este cumulo de basuras y desechos impactan negativamente en el ecosistema marino.

Es preciso indicar que como consecuencia de factores meteorológicos como lo son grande precipitaciones o deshieles, el caudal de los ríos aumenta repentinamente produciendo desbordamientos e inundaciones, afectando a las poblaciones aledañas. Estas situaciones climáticas cuando los ríos aumentan su cauce y arrastran de aguas arriba gran cantidad de lodos que se alojan en las desembocaduras, ocasiona sedimentación de las cuencas bajas, en el caso del río Gaira estas cantidades de sedimento interrumpen la interconexión natural entre este afluente y el sistema marino, lo que ocasiona un detrimento en la fauna del ecosistema estuarino de este importante sector, evidenciándose en el detrimento de la actividad pesquera en estos ecosistemas y por ende afectando económicamente a la población dedicada a esta actividad.

Es por eso que la población ha percibido el río como un problema durante años, ya que este se encuentra asociado a procesos como las inundaciones que año tras año se sufren en la ciudad. El invierno y la deforestación en la parte media de la cuenca, es una de las causas importantes de las inundaciones, la ruptura de boquetes y bermas que permiten el paso del agua hacia áreas residenciales provocando la perdida de los mismos y el direccionamiento del agua hacia las comunidades dejando como resultado pérdidas materiales del patrimonio de la población.

Debido a lo anterior, se presentan entonces cambios del uso del suelo en áreas de uso público, reduciendo las posibilidades de restauración ecológica y conservación, comprometiendo la viabilidad de objetivos de protección ligados a las comunidades ubicadas en la zona de intervención.

Ilustración 3. Registro Fotográfico Rio Gaira. Fuente: Propia.



Ilustración 4. Registro Fotográfico Rio Gaira. Fuente: Propia.



Ilustración 5. Registro Topográfico - Rio Gaira. Fuente: Propia.



2.3 ALCANCE Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El proyecto tiene como alcance, las "**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES**" para mitigar los fenómenos de inundación debido a las fuertes lluvias recurrentes en el Distrito de Santa Marta, y además del mantenimiento de los cuerpos hídricos, cumpliendo los estándares ambientales de la corporación.

Con motivo de la recuperación de la capacidad hidráulica y la limpieza del cauce, se tienen programadas actividades de: Remoción de sedimentos a máquina, Que busca el retiro de todo material depositado en el cauce, junto con esta actividad se tiene el retiro en volquetas del material removido; Limpieza de vegetación dentro del cauce, este es un trabajo manual y tiene como propósito el despeje del cuerpo de agua de todo tipo de maleza que genere obstrucciones.

Así mismo se construirán obras de protección (Muros en Geocontenedores) en la margen donde se requiera protección, el material proveniente de la excavación será explanado, usado para la conformación de terraplenes y dispuesto como material de relleno de los geocontenedores.

Las estructuras estarán constituidas con Geobolsas relleno con material de sitio con cuatro niveles, cada nivel de 1.15 metros (Altura inicial 1.45m) para una altura total de 5,75 metros. Estos Geocontenedores tendrán en su parte inferior un geomanto antisocavante para evitar la erosión en su base. Adicionalmente, en la parte de contacto con el agua tendrá un geomanto protector generar vegetación a lo largo del tiempo. En la parte posterior del relleno se proveerá de un geotextil no tejido para evitar migración de finos.

Las obras de protección consistirán en un Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil de poliéster; Manto Antisocavación ensamblado en geotextil de poliéster de 89 KN/m; Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50; Geotextil Tejido de Poliéster, resistencia método tira ancha de 40 KN/m y Relleno con Material del Sitio para Conformación de Terraplenes.
Estas obras serán complementadas con la implementación de la Revisión y Ajustes a Estudios y/o Diseños y la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica.
Para lo cual, se ejecutarán las siguientes actividades:

- Remoción Mecánica De Sedimentos Mediante El Uso De Excavadora Sobre Orugas.
- Dragado Mecánico De Sedimentos Mediante Uso De Excavadora.
- Cargue, Retiro Y Disposición Final De Material Proveniente De La Remoción Y Excavaciones.
- Limpieza Manual De Vegetación.
- Muro En Geocontenedores Ensamblado Con Tensores Internos En Geotextil. Incluye: Relleno Con Material Proveniente De La Excavación, Formaletería Y Costuras.
- Manto Antisocavación Ensamblado En Geotextil. Incluye: Inyección De Arena Proveniente De La Excavación En Lastre Inferior.
- Manto Para El Control De Erosión Permanente, Tipo Trm 50.
- Geotextil Tejido De Poliéster.
- Protocolo De Ahuyentamiento Y Rescate Fauna En El Marco De La Ejecución Del Proyecto.
- Implementación De Estrategia De Sensibilización Y Participación Ambiental Dirigido A La Comunidad En La Zona De Influencia Del Proyecto.
- Diseño De Sistema De Alerta Temprana.

A continuación, se describen los componentes analizados para la ejecución del contrato en mención.

- COMPONENTE TOPOGRÁFICO

En el informe topográfico contiene los criterios desarrollados en los levantamientos que se realizaron en el distrito de Santa Marta. El estudio topográfico, consta con la descripción topográfica y batimétrica del área propuesta para el proyecto, brindando información a nivel de detalle debidamente geo-referenciada a partir de la colección de datos de la red local geodésica de proyecto. Sin embargo, de este componente se obtiene que:
El máximo error de cierre para las poligonales de los levantamientos de replanteo del eje del canal y estructuras será mínimo de 1:2500 en distancia y e=10N, en ángulo, expresado en segundos, siendo “N” el número de vértices de la poligonal. El máximo error de cierre en las nivelaciones para el control de las excavaciones expresado en milímetros será de 50K, siendo “K” la longitud en kilómetros de las líneas de nivelación. En ninguna circunstancia se permitirá utilizar equipo con sistema de posicionamiento global como instrumento de nivel. En la localización de los puntos para sondeos el error máximo admisible es de ±0.80 m.

- COMPONENTE ESTUDIO DE SUELO, GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO

Se presenta el informe de Estudio de suelos, geológico y geotécnico donde se relaciona la evaluación geotécnica inicial y la investigación del subsuelo para identificar la estratigrafía y determinar los parámetros geotécnicos de la zona, además se incluyen registros de la exploración en campo con la información de las muestras de material tomadas.
De igual manera se observa que no se evidencio en ninguno de los sondeos realizados la presencia del nivel freático, así como la examinación de la sismicidad de la zona ante posibles amenazas, además incluye las recomendaciones que deben seguirse durante la ejecución de las obras, teniendo en cuenta la posibilidad de cambio de las condiciones del proyecto. Sin embargo, de este componente se obtiene que:

1. Debido a la homogeneidad de los materiales encontrados en la exploración, no fue necesario hacer zonificaciones geotécnicas, sino que se consideró realizar una sola caracterización geotécnica para todo el lote.

2. Se realizó diseño geotécnico de una estructura de contención para el control de inundaciones generados por una creciente del río. Para todos los casos se encontraron factores de seguridad superiores a los mínimos exigidos en la normatividad colombiana tanto en condiciones estáticas como pseudo estáticas.

3. Los materiales producto de las excavaciones a realizar para construir la cimentación podrán ser empleados como material de relleno en razón a su buena capacidad mecánica y su estabilidad volumétrica.

Es importante tener en cuenta la posible variabilidad del perfil estratigráfico en otros sectores del río, lo que genera por ende otras propiedades geomecánicas de los materiales. Lo anterior no indica cambios en los diseños, ya que el trabajo de campo, los resultados de laboratorio y el análisis de éstos, permitieron concluir teniendo en cuenta condiciones desfavorables. De todas formas, se deberá tener presente que, si durante la ejecución de los trabajos se encuentran en la zona condiciones del subsuelo muy diferentes a las descritas como típicas en el informe, o se generan variaciones sustanciales del proyecto que afecten de una u otra manera las recomendaciones emitidas, se deberá informar oportunamente para complementar las conclusiones y recomendaciones consignadas en el informe.

- COMPONENTE ESTUDIO HIDROLÓGICO – HIDRÁULICO

Para estimar los caudales picos del Río Gaira, se generará modelo lluvia-escorrentía; que permita, con base en las características de cuenca y de laslluvias característica de diferentes períodos de retorno, estimar el caudal de pico de escorrentía para cada de estos períodos. Para tal efecto, se emplearán herramientas informáticas.

Caracterización de la Cuenca.

Ilustración 6. Localización de la Cuenca del Rio Gaira. Fuente: Propia.




La cuenca cuenta con aproximadamente 10.875 hectáreas. La longitud del río Gaira es de 33,95 kilómetros y tiene un caudal promedio anual de 2,7 m³/s a la altura de la estación MINCA ubicada en el centro poblado del mismo nombre.

Los principales afluentes del río Gaira son: quebrada El Palmar, quebrada Las Mercedes, quebrada Agua Dulce, quebrada La Macanilla, entre otras. Sus principales centros poblados son Minca, Gaira y el Rodadero.

- COMPONENTE ESTUDIO ESTRUCTURAL

En el estudio estructural fue necesario para determinar el dimensionamiento y el refuerzo necesario para resistir las acciones de las cargas producidos por las acciones de las fuerzas externas. En este orden de ideas, este estudio contiene el diseño de las estructuras de contención con Geobolsas, con el fin de proteger la orilla ante las crecientes que se vienen presentando.

Ilustración 7. Figura representativa de muro en Geocontenedor. Fuente: Propia.

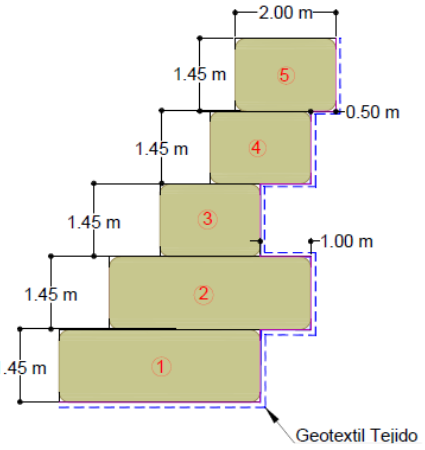

Según el estudio se concluye que:

- El análisis de estabilidad de geobolsas se hace basado con el peso unitario saturado, la cual sería el caso para la condición más crítica.
- Se deben respetar los materiales, las dimensiones, ángulo de inclinación de la estructura, con el fin de garantizar la estabilidad estructural para el cual fue chequeado los geocontenedores,
- Se verificó que la configuración de los Geocontenedores cumple con las condiciones de estabilidad exigidos en la normativa vigente colombiana NSR 2010.

- Las cargas actuantes sobre las estructuras se basaron del estudio de suelos, hipótesis de niveles de agua de acuerdo con el flujo de agua en el rio, para lo cual, si existe alguna condición diferente en el sitio, se debe consultar con el ingeniero estructural con el fin de revisar cualquier cambio que se pueda presentar.

- Los Geocontenedores se deben llenar mecánicamente, de manera que cuando el primer nivel está semi-sumergido, la medida que se llena con arena y se desplaza el agua, no depende del flujo a través del geotextil, ya que es muy pequeño.

- El sistema de anclaje de cualquier tipo de recubrimiento o geotextil de control de erosión se debe realizar con el mismo peso del elemento, pues ello significa evitar la perforación del geotextil. Son actividades previas para considerar durante la conformación del geocontenedor pues este último es el sistema de anclaje del geotextil o manto de recubrimiento.

2.4 CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES PERIODO 2024

Ilustración 8 Oferta económica correspondiente a los periodos 2023 y 2024.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

FORMATO OFERTA ECONOMICA

LICITACION DE OBRA PUBLICA No. LP 006 DE 2023
"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"

AÑO 2023

ITEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
I. MANTENIMIENTO HIDRAULICO						**$ 131,639,004.00**
1.1	P - 2.4	Limpieza Manual de vegetación	mes	3.0	$ 43,879,668.00	$ 131,639,004.00
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 131,639,004.00**
					Aministración (23%)	$ 30,276,971.00
					Imprevistos (2%)	$ 2,632,780.00
					Utilidad (5%)	$ 6,581,950.00
					IVA (19%) sobre la Utilidad	$ 1,250,571.00
					TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 40,742,272.00**
					VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL	**$ 172,381,276.00**
II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						**$ 169,284,398.00**
3.1	P - 3.5	Estudios y Diseños de Parque Lineal en áreas disponibles de Ronda Hidrica.	Glb	1.00	$ 169,284,398.00	$ 169,284,398.00
					IVA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA	**$ 32,164,035.62**
					VALOR TOTAL OBRA AÑO 2023	**$ 373,829,710.00**

AÑO 2024

ITEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
I. PRELIMINARES						**$ 29,672,424.00**
1.1	P - 1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	und	8.0	$ 3,709,053.00	$ 29,672,424.00
II. MANTENIMIENTO HIDRAULICO						**$ 5,660,158,685.10**
2.1	P - 2.1	Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico	m3	67,732.23	$ 15,543.18	$ 1,052,774,242.69
2.3	P - 2.3	Cargue, Retiro y Disposicion Final de Material proveniente de la remoción y Excavaciones. Incluye: Disposicion en Escombrera Certificada	m3	67,732.23	$ 40,034.60	$ 2,711,632,735.16
2.4	P - 2.4	Limpieza Manual de vegetación	mes	12.0	$ 46,500,598.00	$ 558,007,176.00
2.5	P - 2.5	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras.	m3	6,000.0	$ 151,008.00	$ 906,048,000.00
2.6	P - 2.6	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior	m2	2,250.0	$ 31,202.00	$ 70,204,500.00
2.7	P - 2.7	Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50	m2	7,031.25	$ 43,292.00	$ 304,396,875.00
2.8	P - 2.8	Geotextil Tejido de Poliéster	m2	5,156.25	$ 11,073.00	$ 57,095,156.25
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 5,689,831,109.10**
					Aministración (23%)	$ 1,308,661,155.00
					Imprevistos (2%)	$ 113,796,622.00
					Utilidad (5%)	$ 284,491,555.00
					IVA (19%) sobre la Utilidad	$ 54,053,395.00
					TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 1,761,002,727.00**
					VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL	**$ 7,450,833,836.10**
III. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						**$ 881,356,151.00**
3.1	P - 3.1	Rescate de Fauna Acuatica y Terrestre	und	1.0	$ 246,260,339.00	$ 246,260,339.00
3.2	P - 3.3	Implementacion de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	und	12.0	$ 35,256,288.00	$ 423,075,456.00
3.3	P - 3.4	Diseño de sistema de alerta temprana Río Manzanares.	und	1.0	$ 212,020,356.00	$ 212,020,356.00
					IVA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA	**$ 167,457,668.69**
					VALOR TOTAL OBRA AÑO 2024	**$ 8,499,647,656.00**

3 ESTADO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS

3.1 CONTRATO DE OBRA

3.1.1 INFORMACION BÁSICA CONTRATO DE OBRA Nº LP-006-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICASM2023
REPRESENTANTE LEGAL:	CHESMAN HOBBET BARROS PIMIENTA
OBJETO:	INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$ 330.530.495.016,00
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	147 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO:	19 DE JUNIO DE 2036
PERIODO ACTUAL:	**2024**
CUERPO DE AGUA A INTERVENIR:	**RIO GAIRA**
VALOR DEL PERIODO:	$ 8.873.477.366,00
FECHA DE INICIO DE PERIODO:	19 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PERIODO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Tabla 1. Datos generales de contrato de Obra Pública No. LP 006 2023, Periodo 2024.

4 ACTIVIDADES DE OBRA

4.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO

Se realizaron actividades referentes a la recolección de datos para los ajustes a estudios y diseño. Se adelanto trabajo de campo, toma de muestras, recolección de datos y procesamiento de información de oficina. Estos informes tienen como propósito el ajuste a los estudios y diseños de proyecto para ajustar el balance del proyecto para su inicio en labores de obra.

Semana No. 1 (19/03/2024 - 24/03/2024)

1. Se inició la evaluación hidráulica del rio Gaira y su desembocadura para los ajustes a los estudios y diseño.
2. Se realizó seguimiento a la Topobatimetría, en la cual se levantó secciones cada 20m en puntos del rio Gaira, también se realizó el levantamiento de la bahía de Rodadero.
3. se extrajeron muestras por medio de sondeos, para evaluar las condiciones del suelo.

4. Se realizo la socialización del proyecto en el auditorio de Corpamag a sus directivos, subdirectivas, otros funcionarios de la corporación e Interventoría.

Semana No. 2 (25/03/2024 - 31/03/2024)

1. Se continua con el seguimiento de las actividades de topobatimetría en la zona en lo que respecta al procesamiento de la información.
2. Se sigue realizando la evaluación hidrológica e hidráulica del rio Gaira para realizar las modelaciones.

Ilustración 9 Toma de muestras - Estudio de Suelos. Fuente: Propia.


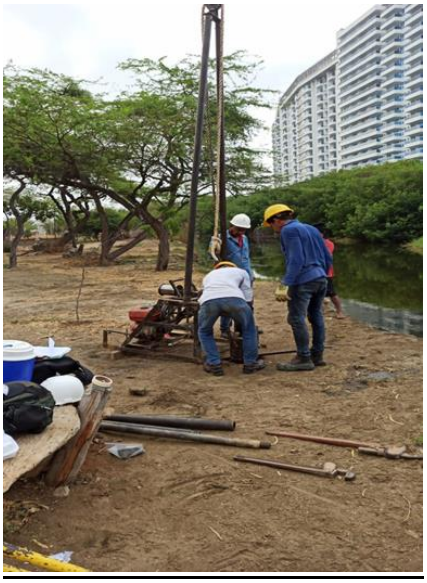


Ilustración 10. Análisis de Batimetría - Estudio Topo-Batimétrico. Fuente: Propia.

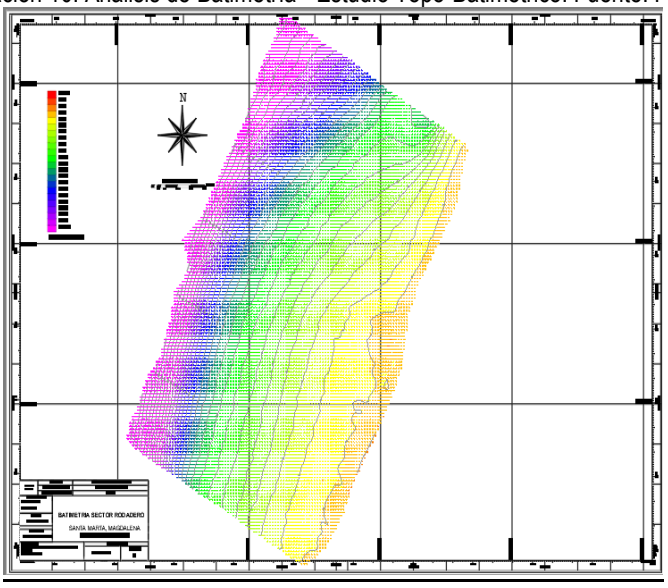

4.1.1 INFORME DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS VERIFICADAS DENTRO DEL PERIODO.

Se realizo el trabajo del levantamiento topográfico que va desde la desembocadura del rio Gaira en Rodadero, hasta el puente que se encuentra en la Vía alterna al puerto.

Ilustración 11 Levantamiento topografico - Rio gaira. Fuente: Propia.



En lo que sigue el periodo se ha estado realizando el trabajo del procesamiento de la información obtenida en campo para la realización de los entregables junto con el balance y los diseños.

4.1.2 INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.

- Informe Semanal de Obra.

Los informes semanales de obras correspondiente al periodo de ejecución son los siguientes:

SEMANA	ARCHIVO
SEMANA 1	INFORME SEMANAL No. 1 (19MAR-24MAR)
SEMANA 2	INFORME SEMANAL No. 2 (25MAR-31MAR)

Tabla 2. Informes Semanales.

Los informes se encuentran plasmados en el ***"Anexo No.1 Informes Semanales"*** del presente Informe.

4.1.3 PERSONAL DE OBRA

A continuación, se presenta el personal mínimo requerido para el proyecto.

CARGO	NOMBRES
Director de Obra	Luis Fernando Ochoa Marulanda
Residente de Obra	Mayra Alejandra Del Rio Coronell
Especialista Ambiental	Pilar Eugenia Novoa Julio
Especialista Hidráulico	Fernando Raul Arrieta Castañeda
Topógrafo	Angela Maria Fernandez Fajardo
Trabajador Social	Elga Johanna Toncel Pannelflek
Profesional SST	Ana Milagro Marenco Caballero

Tabla 3. Personal mínimo requerido.

(Ver Anexo N.o.2 Personal de Obra)

4.1.4 EQUIPO DE OBRA

A continuación, se presenta el equipo y maquinaria de obra mínimo para la ejecución del contrato.

MAQUINARIA:

MAQUINA	MARCA	MODELO	POTENCIA
Excavadora	HYUNDAI	R220LC-9S	143HP
Excavadora	HYUNDAI	HX220S	148HP
Excavadora	HYUNDAI	HX220S	148HP
Excavadora	CATERPILLAR	320C-06	138HP
Excavadora	CATERPILLAR	320C-07	138HP

Tabla 4. Relación Maquinara de Obra.

VOLQUETAS:

MARCA	PLACA	CAPACIDAD
CHEVROLET	SLE923	20Ton
KENWORTH	TVA708	15Ton
CHEVROLET	TVA536	15Ton
MACK	TVA460	19,9Ton
KENWORTH	TVD190	16,8Ton
INTERNATIONAL	UAP243	19Ton
FOTON	KNL544	15,5Ton
FOTON	KNL545	15,5Ton
FOTON	KNL546	15,5Ton
FOTON	KNL549	15,5Ton
FOTON	KNL550	15,5Ton
FOTON	KNL551	15,5Ton

Tabla 5. Relación Volquetas de Obra.

EQUIPO DE TOPOGRAFIA:

EQUIPO	ESPECIFICACIONES	MARCA
Estación Total	REF ES -105/PSLBG	TOPCON
Nivel Automatico	REF AP-281 PENTAX	PENTAX
Receptor GNSS Y Rover	REF GALAXY G7	SOUTH
GPS: GNSS RTK	S900A	STONEX
Estación Total	GTS-102N	TOPCON

Tabla 6. Relación de Equipos de Topografía.

4.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS

Hasta el momento no se han realizado actividades contractuales. Las labores que se tienen adelantadas son de carácter técnico y administrativo.

4.1.5.1 MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo correspondiente al primer mes, no se han iniciado trabajo de campo.

4.1.6 SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y LA PROGRAMACION

SEMANA	FECHA		% PROGRAMADO EN LA SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO EN LA SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO	ADELANTO (+) Ó ATRASO (-)
	DEL	AL					
1	19 DE MARZO DE 2024	24 DE MARZO DE 2024	0.37	0.37	0	0	-0.37
2	25 DE MARZO DE 2024	31 DE MARZO DE 2024	0.15	0.52	0	0	-0.52

Tabla 7. Resumen del cumplimiento a la programación durante el periodo.

Gráfico 1. Porcentaje Programado vs Ejecutado en la las semanas del mes. Fuente: Propia.

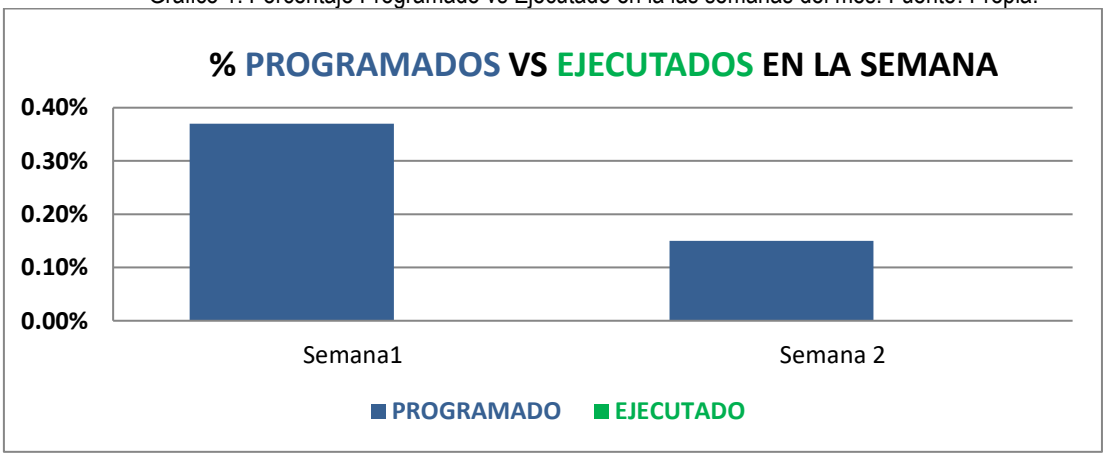


Gráfico 2. Porcentaje Acumulado de vs Programado vs Ejecutado. Fuente: Propia.


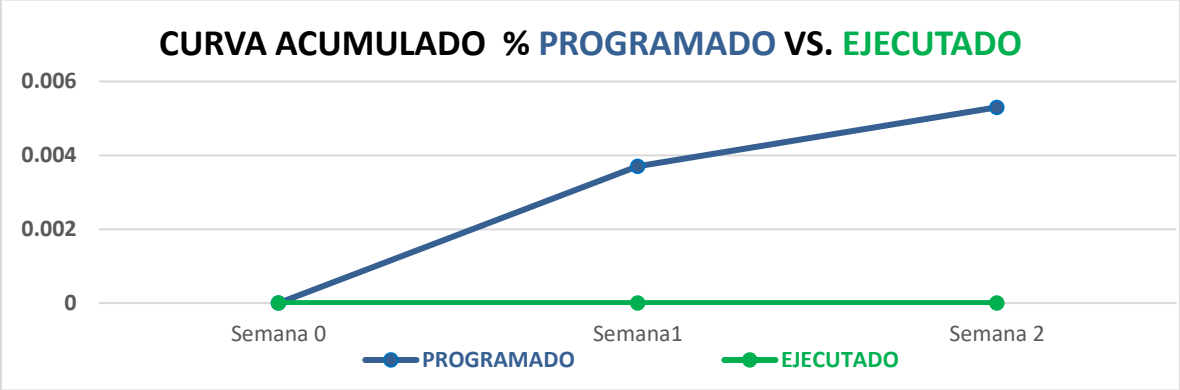


Gráfico 3. Porcentaje de Adelanto o Atraso de la Programación del proyecto. Fuente: Propia.

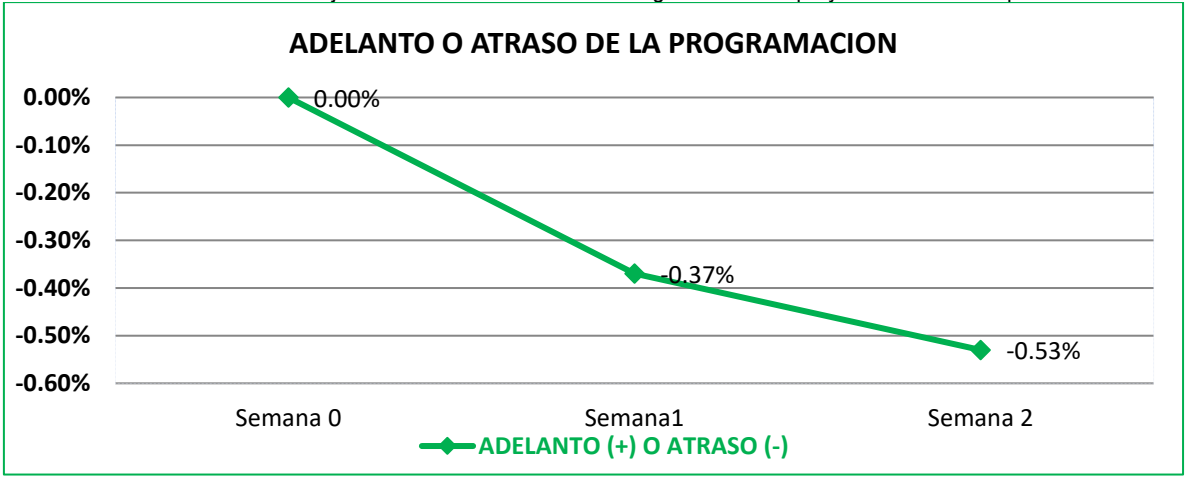

4.1.7 BITÁCORA DE OBRA.

Durante el periodo correspondiente al primer mes, no se han iniciado trabajo de campo, solo administrativas. La Bitácora se relaciona en el ***"Anexo No.3 Bitácora de Obra"***.


4.1.8 CONTROL DE CALIDAD

Durante el periodo correspondiente al primer mes no se han realizado pruebas de calidad para las actividades contractuales, debido a que no sea han iniciado las labores de campo en el periodo.

4.1.9 CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

El registro del estado del tiempo del periodo comprendido entre el 19 de marzo de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024. Se relaciona la información registrada en el ***"Anexo No.4 Estado General del Tiempo"*.**

Gráfico 4. Estado del Tiempo en el Mes. Fuente: Propia.

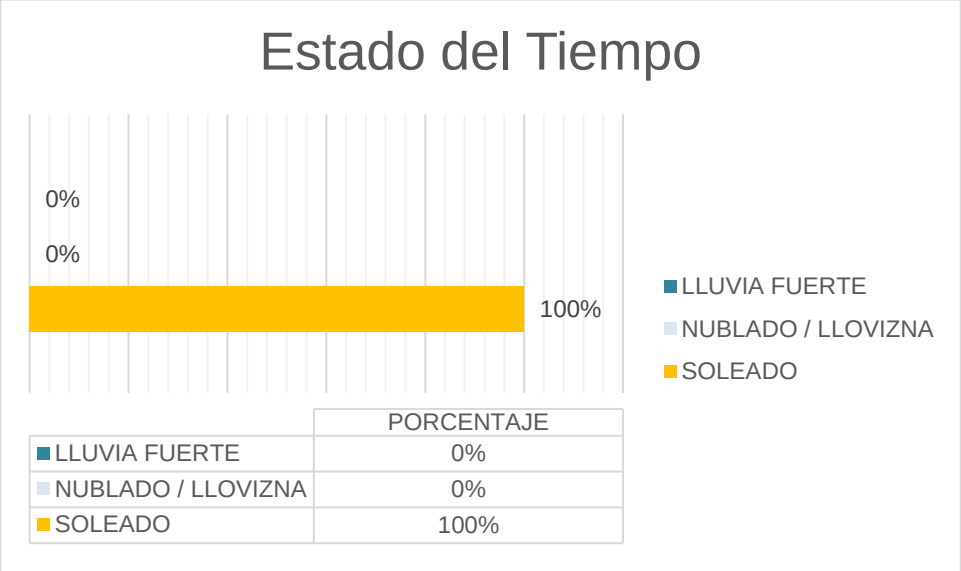

4.1.10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

El control de los equipos utilizados en obra se relaciona en el ***"Anexo No.5 Maquinaria y Equipo de Obra"***, adjunto en los anexos del presente informe, cabe resaltar que durante este periodo no se ejecutaron actividades en campo.

4.1.11 CONTROL DE PERSONAL

El control del personal en obra se relaciona en el ***"Anexo No.6 Seguridad social del personal"*** adjunto en los anexos del presente informe.

4.2 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

4.2.1 CONTROL DE PÓLIZAS

4.2.1.1 Control de Pólizas Contrato de Obra No. LP-006-2023

A continuación, se relaciona la información de las pólizas vigentes que amparan el contrato de obra de acuerdo con el acta de inicio.

Garantía de cumplimiento según suscripción de contrato.

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. DE POLIZA	CG-1051454
FECHA DE EXPEDICIÓN	**09/02/2024**

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
CUMPLIMIENTO	26/12/2023	30/06/2025	$ 887.347.736,60
PRESTACIONES SOCIALES	26/12/2023	31/12/2027	$ 443.673.868,30
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	31/12/2026	$ 175.177.646,00

Garantía de responsabilidad civil extracontractual según suscripción de contrato.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADOS S.A		
No. DE POLIZA	75-40-101050575		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**26/01/2024**		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	26/12/2023	31/12/2024	$ 650.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	26/12/2023	31/12/2024	$ 650.000.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	26/12/2023	31/12/2024	$ 650.000.000,00

Tabla 8. Póliza del Contrato no. LP 006 DE 2023.

4.2.2 CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES

4.2.2.1 CONTRATO DE OBRA

Se relaciona la seguridad social del personal durante el periodo **Anexo No.7**.

4.2.3 CORRESPONDENCIA

OFICIOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA A INTERVENTORIA PERIODO: 19 DE MARZO DE 2024 HASTA 31 DE MARZO DE 2024			
FECHA	**REFERENCIA**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**
12/03/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	**ICASM-001**	Entrega de hojas de vida del Personal Mínimo Requerido

16/03/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	**ICASM-002**	Revisión Hojas de Vida Personal Mínimo Requerido
22/03/2024	CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023	**ICASM-003**	Respuesta Oficio ISM-003-2024 - Solicitud Cronograma de Actividades.

Tabla 9. Relación de correspondencia durante el periodo.

4.2.4 ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS PERMISOS

No se han transmitido permisos en este periodo.

4.2.5 REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


- **19 de marzo de 2024**, Se firma Acta de inicio del Contratado de Obra.
- **20 de marzo de 2024**, Se realiza la socialización del estado actual del proyecto por parte del representante legal a la entidad contratante (CORPAMAG) e Interventoría.

4.3 ACTIVIDADES DE ORDEN AMBIENTAL, SST Y SOCIAL

No se realizaron actividades de campo en el periodo referente al mes 1.

4.4 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

Gráfico 5.Avance Financiero de Ejecucion Vs Programado Mensual. Fuente: Propia.

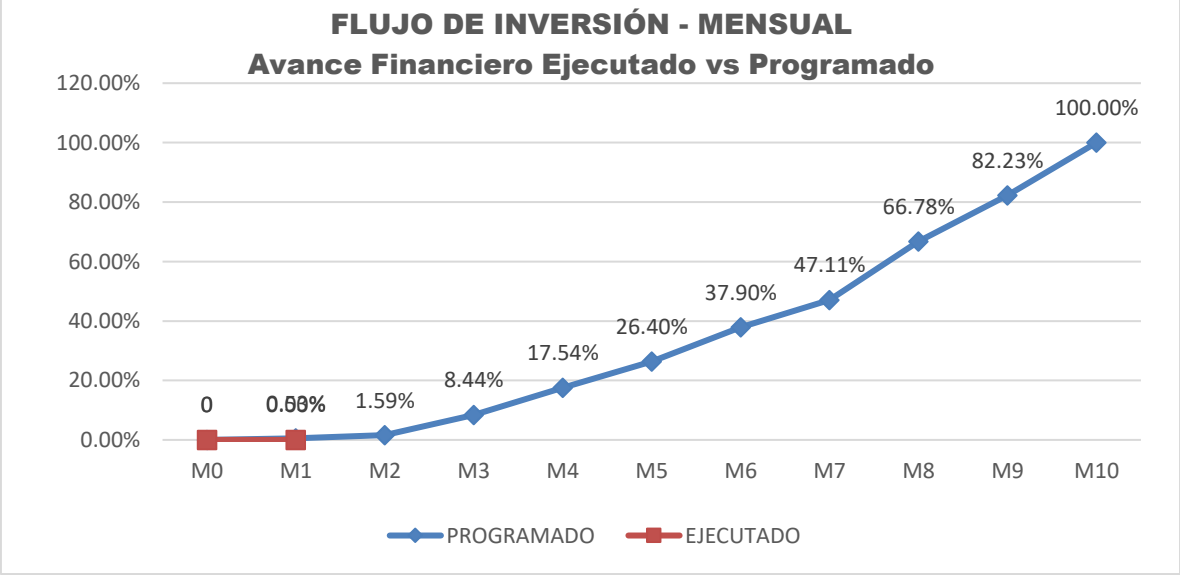

4.4.1 ACTAS PARCIALES DE COBRO

No se ha realizado cobros para el periodo en cuestión.

4.4.1.1 Actas de Cobro de Contratista de Obra y cobros realizados


%	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR	% AMORTIZACIÓN	VALOR AMORTIZADO	VALOR PAGADO	ESTADO

Tabla 10. Descripción de pagos o cobros realizados por el contratista de obra.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el primer mes de ejecución del contrato No. LP 006 DE 2023 que tiene como objeto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”. se concluye: El presente informe comprende el periodo desde el 19 de marzo del 2024 al 31 de marzo de 2024, en este, se continuó con actividades de ajustes a estudios y diseños, además de otras actividades administrativas que buscan un inicio de obra con todas las garantías de calidad que se requieran.

Responsable:



LUIS FERNANDO OCHOA
DIRECTOR DE OBRA DEL CONSORCIO ICASM2023
TP. 13202-33067 BLV

ANEXO No.1
INFORMES SEMANALES - MES 1

INFORME SEMANAL No.1
(19 DE MAR - 24 DE MAR)

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

CONTRATISTA DE OBRA: **CONSORCIO ICASM2023** CONTRATO No: **LP 006 DE 2023**

INTERVENTORIA: **INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S** CONTRATO No: **CM 007 DE 2023**

Semana Número: 1 Del: 19 de marzo de 2024 Al: 24 de marzo de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Días

Supervisor Contrato: Francisco Jairo Sanchez De la Hoz

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

OBJETO: “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.37%	0.37%
Valor básico de la	$ $ 33,084,131.00	$ $ 33,084,131.00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0.00%	0.00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ $ 0.00	$ $ 0.00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:		CONSORCIO ICASM2023
Contrato No.		LP 006 DE 2023
Valor Inicial:	$	330,530,495.016
Valor Actualizado:	$	330,530,495.016
Plazo Inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		19 de junio 2036

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:		INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S
Contrato No.		CM 007 DE 2023
Valor Inicial:	$	23,163,036,792.00
Valor Actualizado:	$	23,163,036,792.00
Plazo Inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		19 de junio 2036

CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)

Contratista:		CONSORCIO ICASM2023
Contrato No.		LP 006 DE 2023
Valor Inicial:	$	8,873,477,366.00
Valor Actualizado:	$	8,873,477,366.00
Plazo Inicial:		Un (1) año
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)

Interventor:		INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S
Contrato No.		CM 007 DE 2023
Valor Inicial:	$	620,485,992.00
Valor Actualizado:	$	620,485,992.00
Plazo Inicial:		Un (1) año
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizaron los levantamiento topograficos de la desembocadura del rio Gaira.
Se realiza la gestion y seguimiento para la elaboracion de los estudios Hidraulicos.
Se realizan ensayos de spt, para evaluar las condiciones del suelo.
Se realiza el estudio batimetrico de la bahia de Santa Marta.
Se realizó la socialización del proyecto en Corpamag.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se hará Seguimiento a la topobatimetría
Se Digitalizarán los datos recopilados del levantamiento de la topobatimetría
Se hará Seguimiento al Estudio de suelos
Se hará Seguimiento al Estudio y diseño hidráulico

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

-Acta de inicio de obra: 19 de Marzo de 2024.

	%Programado	% Ejecutado
Avance semanal	0.37%	0.00%
Avance Acumulado	0.37%	0.00%

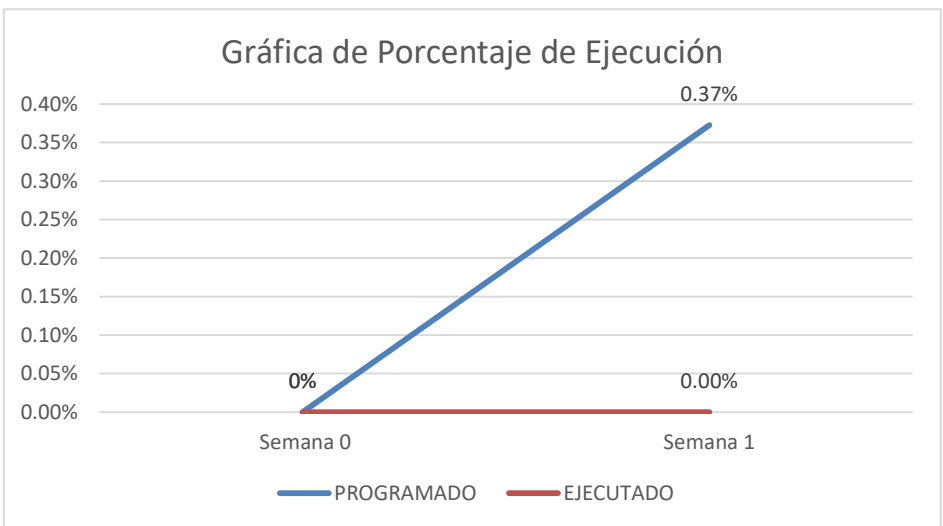

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	**CONSORCIO ICASM2023.** **NIT: 901.782.970-2**

OBSERVACIONES	**DIRECTOR DE OBRA**
El avance que se evidencia en esta semana es del 0% tal se está trabajando en los ajustes a estudios y diseños para tener claro como se va a trabajar en las intervenciones. En esta semana se avanzó en los ajustes y diseños del proyecto, así como también se realizaron actividades de topobatimetría.	Firma Nombre: Luis Fernando Ochoa Cedula: 73.113.864 de Cartagena

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:

Topográfia Bahia de Rodadero



Descripción:

Topobatimetría de Estructura Rio Gaira



Descripción:

Topobatimetría de Rio Gaira



Descripción:

Topobatimetría de Rio Gaira



Descripción:

Socialización del proyecto a Corpamag



Descripción:

Ensayos SPT - Estudio de Suelos

INFORME SEMANAL No.2
(25 DE MAR - 31 DE MAR)

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

CONTRATISTA DE OBRA: **CONSORCIO ICASM2023** CONTRATO No: **LP 006 DE 2023**

INTERVENTORIA: **INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S** CONTRATO No: **CM 007 DE 2023**

Semana Número: 2 Del: 25 de marzo de 2024 Al: 31 de marzo de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 13 Días

Supervisor Contrato: Francisco Jairo Sanchez De la Hoz

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

OBJETO: “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.15%	0.53%
Valor básico de la	$ 13,656,110.59	$ 46,740,241.59

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0.00%	0.00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 0.00	$ 0.00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:		CONSORCIO ICASM2023
Contrato No.		LP 006 DE 2023
Valor Inicial:	$	330,530,495.016
Valor Actualizado:	$	330,530,495.016
Plazo Inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		19 de junio 2036

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:		INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S
Contrato No.		CM 007 DE 2023
Valor Inicial:	$	23,163,036,792.00
Valor Actualizado:	$	23,163,036,792.00
Plazo Inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		19 de junio 2036

CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)

Contratista:		CONSORCIO ICASM2023
Contrato No.		LP 006 DE 2023
Valor Inicial:	$	8,873,477,366.00
Valor Actualizado:	$	8,873,477,366.00
Plazo Inicial:		Un (1) año
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)

Interventor:		INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S
Contrato No.		CM 007 DE 2023
Valor Inicial:	$	620,485,992.00
Valor Actualizado:	$	620,485,992.00
Plazo Inicial:		Un (1) año
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana No.2 se continua labores de oficina que resultan en los estudios y diseños para el balance de este año e información del parque lineal.
Se continua con la gestion para la elaboracion de los estudios Hidraulicos.
Se sigue trabajando en el procesamiento de la información de los levantamientos topograficos

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se hará Seguimiento a la topobatimetría
Se Digitalizarán los datos recopilados del levantamiento de la topobatimetría
Se hará Seguimiento al Estudio de suelos
Se hará Seguimiento al Estudio y diseño hidráulico

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

-Se continua con el trabajo de ajustes a estudios y diseños


	%Programado	% Ejecutado
Avance semanal	0.15%	0.00%
Avance Acumulado	0.53%	0.00%

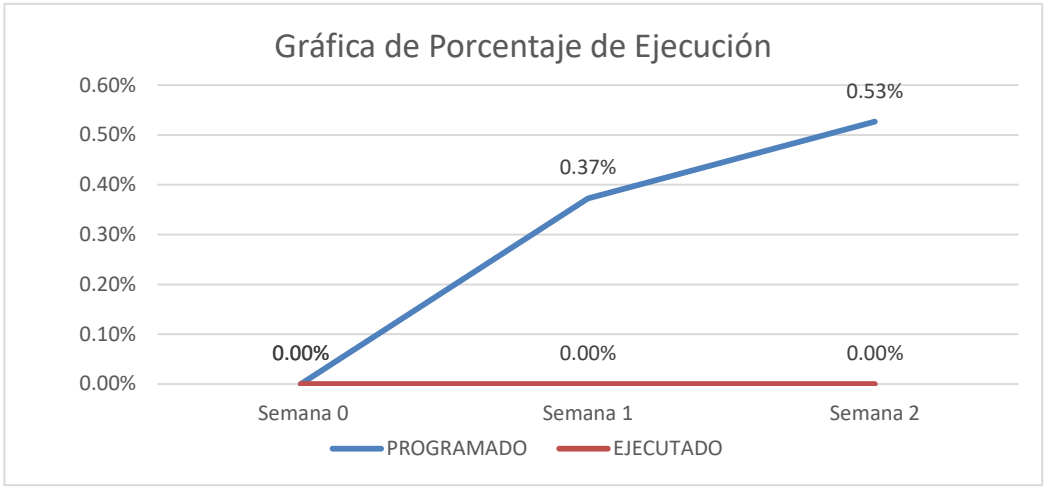

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	***CONSORCIO ICASM2023.*** **NIT: 901.782.970-2**

OBSERVACIONES	**DIRECTOR DE OBRA**
El avance que se evidencia en esta semana es del 0% tal se está trabajando en los ajustes a estudios y diseños para tener claro como se va a trabajar en las intervenciones. En esta semana se avanzó en los ajustes y diseños del proyecto.	Firma Nombre: Luis Fernando Ochoa Cedula: 73.113.864 de Cartagena

REGISTRO FOTOGRÁFICO

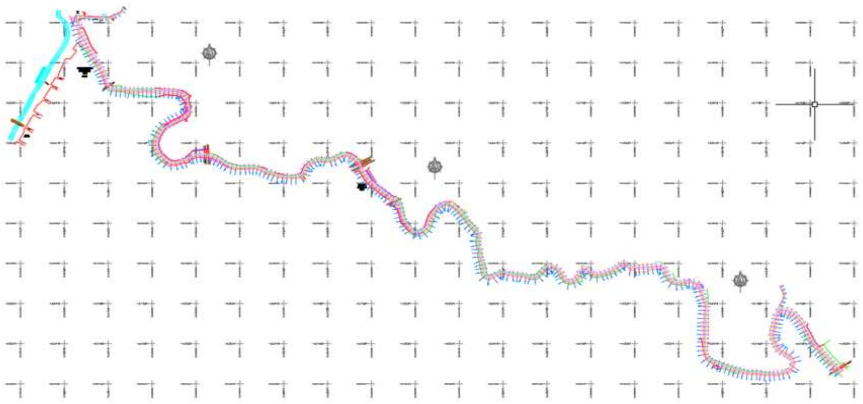

Descripción:

Datos de levantamiento topográfico Rio Gaira



Descripción:

Levantamiento topográfico Rio Gaira

ANEXO

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: 1 **CONTRATO DE OBRA No.** LP 006 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ICASM2023

PROYECTO: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 007 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

NOMBRE	CARGO	mar-24															
		M 19	M 20	J 21	V 22	S 23	D 24	L 25	M 26	M 27	J 28	V 29	S 30	D 31			
MAYRA ALEJANDRA DEL RIO CORONELL	Residente de Obra	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X				
ANA MILAGRO MARENCO CABALLERO	Profesional SST																
LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA	Director de obra	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X				
PILAR EUGENIA NOVOA JULIO	Especialista Ambiental																
FERNANDO RAUL ARRIETA CASTAÑEDA	Especialista Hidraulico			X		X		X	X	X	X	X	X				
ELGA JOHANNA TONCEL PANNELFLEK	Trabajador Social																
ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO	Ing. Topografo		X	X		X		X	X	X	X	X	X				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

Firma
Nombre: MAYRA ALEJANDRA DEL RIO CORONELL
Residente de Obra
T.P. 08202-320271 ATL

Firma
Nombre: EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 08202-181155 ATL

BITÁCORA DE OBRA

Objeto del contrato: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES

Contratista de obra: CONSORCIO ICASM 2023

Contrato de Obra No. LP-006-2023

→ Inicio Ejecución: 19-03-2024

→ Fecha Terminación: 19-06-2036

Valor del contrato: $330.530.495.016,00

Duración Contrato: Ciento cuarenta y siete (147) meses

Interventoría: INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S

Contrato de Interventoría No. CM-007-2023

→ Inicio Ejecución: 19-03-2024

→ Fecha Taminación: 19-06-2036

Valor del contrato $23.163.036.792,00

Duración Contrato Ciento cuarenta y siete (147) meses

Semana No. 1 (19 de Marzo de 2024-24 de Marzo de 2024).

Martes, 19 de Marzo 2024: Clima: Día soleado-seco, sin Precipitaciones. Actividades: se realiza Firma del acta de inicio de los contratos de obra e interventoría. Personal: (1) Conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de obra, (1) comisión de Topografía. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría. Equipo: Computador Portátil, Vehículo.

Miércoles, 20 de Marzo 2024: Clima: Día soleado-seco, sin Precipitaciones. Actividades: se llevó a cabo socialización del Proyecto con acompañamiento del contratista de Obra, Interventoría, Dirección General, subdirección técnica y demas Funcionarios de la corporación. Personal: (1) Conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) comisión de topografía. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría. Equipo: Computador Portátil, Vehículo.

Jueves, 21 de Marzo 2024: Clima: Día soleado-seco, sin Precipitaciones. Actividades: se realizaron actividades topo-batimétricas, trámites administrativos entre el contratista de Obra, Interventoría y CORPAMAG. Personal: (1) Conductor, (1) coordinador de obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de obra. (1) especialista Hidráulica, (1) comisión de Topografía. (1) Director de interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: Contador Portátil, vehículo, Equipo de topografía.

Viernes, 22 de Marzo 2024: No se realizan actividades

Sábado, 23 de Marzo 2024: clima: Día soleado-seco, sin Precipitaciones. Actividades: Se realizaron actividades topo-batimétricas, trámites administrativos entre el contratista de Obra, Interventoría, y CORPAMAG. Personal: (1) Conductor, (1) coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) comisión de topografía. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico, de Interventoría. Equipo: Computador Portátil, Vehículo Equipo de topografía.

Domingo, 24 de Marzo 2024: No se realizan Actividades.

Semana No. 2 (25 de marzo de 2024-31 de Marzo de 2024).

Lunes, 25 de Marzo 2024: clima: Día soleado-seco, sin Precipitaciones. Actividades: Se realizaron actividades topo-batimétricas, trámites administrativos entre el contratista de Obra, Interventoría, y CORPAMAG. Realización de sondeos en la zona, en la búsqueda de contar con información actualizada y necesaria para llevar a cabo el estudio de Suelos de manera previa a la Intervenciones. Personal: (1) Conductor, (1) coordinador de obra (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) comisión de topografía. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico, de Interventoría. Equipo: Computador

Portátil, Vehículo, Equipo de topografía, Equipos de ensayos de suelos.

Martes, 26 de Marzo 2024: Clima: Día soleado-seco, sin Precipitaciones. Actividades: se realizaron actividades topo-batimétricas, Trámites administrativos entre el contratista de Obra, interventoría y CORPAMAG. Realización de sondeos en la zona, en la busqueda de contar con información actualizada y necesaria para llevar a cabo el estudio de suelos de manera Previa a la intervenciones. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra (1) Especialista Hidráulico, (1) comisión de topografía, (1) Director de Interventoría (1) Residente de interventoría (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: Computador Portátil, Vehículo, Equipos de Topografía, Equipo de Ensayos de suelos.

Miércoles, 27 de Marzo 2024: Clima: Día soleado-seco, sin Precipitaciones. Actividades: se realizaron actividades topo-batimétricas, trámites administrativos entre el contratista de Obra, Interventoría y CORPAMAG. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: Computador Portátil, vehículo, Equipo de topografía.

Jueves, 28 de Marzo 2024: Clima: Día soleado-seco, sin pre

Cipitaciones. Actividades: Se realizaron actividades topo-batimétricas, trámites administrativos entre el Contratista de obra, Interventoría y CORPAMAG. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra (1) Especialista Hidráulica (1) comisión de topografía. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: Computador Portátil, Vehículo, Equipo de topografía.

Viernes 29 de Marzo 2024: Día soleado-seco, sin Precipitaciones. Actividades: Se realizaron actividades topo-batimétricas, trámites administrativos entre el Contratista de Obra, Interventoría y CORPAMAG. Personal: (1) conductor, (2) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de obra (1) Especialista Hidráulica, (1) comisión de topografía. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: Computador Portátil, Vehículo, Equipo de Topografía.

Sábado, 30 de Marzo 2024: clima: Se inició el día soleado-seco, sin Precipituciones. Actividades: Se realizaron actividades topo-batimétricas, trámites administrativos entre el contratista de obra, Interventoría y CORPAMAG. Personal: (1) conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de topografía. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor

de Interventoría. (2) Ingeniero Ambiental de Interventoría. (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: computador Portátil, Vehículo, Equipo de topografía.

Domingo, 31 de Marzo 2024: No se realizan actividades.

ANEXO - ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

FECHA	31	MARZO	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: LP 006 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ICASM2023 **INFORME MENSUAL No.** 1

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	mar-24																																Total
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24																				312
Lluvias moderadas																																	0
Lluvias intensas																																	0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: MAYRA ALEJANDRA DEL RIO CORONELL
Residente de Obra
Matrícula No.: 08202-320271 ATL

Firma
Nombre: EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 08202-181155 ATL

ANEXO

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

UNIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: 1 **CONTRATO DE OBRA No.** LP 006 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ICASM2023

PROYECTO: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 007 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO	mar-24															
	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
EXCAVADORA R220LC-9S	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
EXCAVADORA HYNDAI HX220S 1	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
EXCAVADORA HYNDAI HX220S 2	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
EXCAVADORA - 320C-06	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
EXCAVADORA - 320D-07	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
VOLQUETA SLE923	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
VOLQUETA TVA460	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
VOLQUETA TVA536	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
VOLQUETA TVA708	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
VOLQUETA TVD190	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
VOLQUETA UAP243	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
VOLQUETA KNL544	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
VOLQUETA KNL545	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
VOLQUETA KNL546	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
VOLQUETA KNL549	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
VOLQUETA KNL550	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
VOLQUETA KNL551	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				
ESTACION TOTAL	A	A	A	I	A		A	A	A	A	A	A				
GPS GNSS RTK	A	A	A	I	A		A	A	A	A	A	A				
NIVEL DE PRECISIÓN	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO=A, EN REPARACIÓN=R, INACTIVO=I.**

Firma
Nombre: MAYRA ALEJANDRA DEL RIO CORONELL
Residente de Obra
T.P. 08202-320271 ATL

Firma
Nombre: EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 08202-181155 ATL

Certificado de Aportes

Se certifica que ANA MILAGRO MARENCO CABALLERO identificado(a) con CC 1083009348 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

B&P CONSTRUCCIONES SAS NI 900481955

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	581316519	9465543830	E	2024-04-17	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	27	16%	$2,250,000	$360,000
ARL	ARL SURA	27	6.96%	$2,250,000	$156,600
CCF	CAJAMAG	27	4%	$2,250,000	$90,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	27	4%	$2,250,000	$90,000

Este certificado se expide el día 2024-04-17 a las 11:01.

Certificado de Aportes

Se certifica que EUGENIO JOSE PRADA DAZA identificado(a) con CC 19145528 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES NI 900336004															
Clave Planilla	Clave Pago	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades						
									ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	sus
9464493661	546305737	2024-04-01	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30								
9463545268	485939160	2024-03-01	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30								

Este certificado se expide el día 2024-04-11 a las 16:04.

PAGADO

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA identificado(a) con CC 73113864 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S NI 806003450

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	567725300	9465483235	E	2024-04-10							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$7,788,000	$1,246,100
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$7,788,000	$39,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$7,788,000	$39,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$7,788,000	$542,100
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$7,788,000	$311,600
EPS	SANITAS	30	4%	$7,788,000	$311,600

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 01:57.

Certificado de Aportes

Se certifica que MAYRA ALEJANDRA DEL RIO CORONELL identificado(a) con CC 1143134321 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S NI 806003450

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	567725300	9465483235	E	2024-04-10							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$4,720,000	$755,200
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	4.35%	$4,720,000	$205,400
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$4,720,000	$188,800
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$4,720,000	$188,800

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 01:56.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PILAR EUGENIA NOVOA JULIO identificado(a) con CC 22805922 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S NI 806003450

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	567725300	9465483235	E	2024-04-10							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,848,340	$455,800
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	4.35%	$2,848,340	$124,000
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$2,848,340	$114,000
EPS	MUTUAL SER	30	4%	$2,848,340	$114,000

Este certificado se expide el día 2024-04-11 a las 01:58.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52934912	ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO	CALL 157C NU 91 86 TOR 4 APT 914	3064561	AMAFEFA07@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	02/04/2024	75647104	$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52934912	ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO	CALL 157C NU 91 86 TOR 4 APT 914	3064561	AMAFEFA07@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	02/04/2024	75647104	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52934912	FERNANDEZ FAJARDO ANGELA MARIA	59	0			N																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57444131		TONCEL PANNEFLEK ELGA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 D 33-45	SANTA MARTA-MAGDALENA	4355795	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	541186138	9464715844	I	2024/04/08	2024/04/01	NEQUI	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC 57444131	TONCEL ELGA	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57444131		TONCEL PANNEFLEK ELGA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 D 33-45	SANTA MARTA-MAGDALENA	4355795	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	541186138	9464715844	I	2024/04/08	2024/04/01	NEQUI	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-13, 02:49:07 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1064418754

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 13/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EUGENIO JOSE PRADA DAZA		
Documento	CC19145528	**Dirección**	CL 76 #54 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6692364
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19145528	EUGENIO JOSE PRADA DAZA	59	02	X																0	0	21	21	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.260.000	$ 157.500	0,522	$ 1.260.000	$ 6.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.260.000	$ 1.260.000	$ 0	$ 0	$ 157.500	$ 6.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.100	$ 9.300	$ 173.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-13, 02:47:28 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1064419122

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 13/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERNANDO ARRIETA CASTANEDA		
Documento	CC79487509	**Dirección**	CL 76 #54 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6692464
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79487509	FERNANDO RAUL ARRIETA CASTAÑEDA	59	00	X																0	21	21	21	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.260.000	$ 201.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.260.000	$ 157.500	0,522	$ 1.260.000	$ 6.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.260.000	$ 1.260.000	$ 1.260.000	$ 0	$ 201.600	$ 157.500	$ 6.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 21.400	$ 387.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
