INFORME MENSUAL DE EJECUCION No. 11
CONVENIO N.º1621 MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE TURMEQUÉ - BOYACÁ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE 28 DE ABRIL DE 2024 AL 27 DE MAYO DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 2 No. 3 – 10 s		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$2.383.023.552
	APORTES MIN – FONSECON		$2.383.023.552
	APORTES MUNICIPIO		$0
	OTROS APORTES		$0
FECHA SUSCRIPCION	17 DE JULIO DE 2023		
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	16 DE AGOSTO DE 2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MANUEL ANTONIO LINARES DONATO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	HERNANDO DE JESUS PEREZ PEREZ	17/07/2023	31/01/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Arq. Paula Macarena Morales	17/07/2023	31/01/2024
	Ing. Jhoan Sebastian Navas P.	13/02/2024	Vigente
SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. Hernando Orjuela Malagón	17/07/2023	31/12/2023
	Arq. Jorge Andrés Cuitiva Quintana	04/01/2024	Vigente
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL	No. 600-47-994000069351	17/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	17 DE JULIO DE 2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION		FECHA: 20/03/2024
	PRIMERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACION SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		

VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$2.144’721.552
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$238’302.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**UN PRIMER DESEMBOLSO**, por la suma de MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.072.360.598), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	27/07/23	$1.072’360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**UN SEGUNDO DESEMBOLSO,** por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO M/CTE ($436.887.651), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	TREINTA POR CIENTO (30%)		$ 436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	**UN TERCER DESEMBOLSO** por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO M/CTE ($436.887.651), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	SETENTA POR CIENTO (70%)		$ 436.887.651
CUARTO DESEMBOLSO	**UN ÚLTIMO DESEMBOLSO**, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($436.887.652), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado.	CIEN POR CIENTO (100%)		$ 436.887.652
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.072’360.598
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 643.332.674,40

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
600-47-994000069351	Cumplimiento	476.604.710,40	28/06/2023	31/03/2025

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
N° LP-03-2023	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA		$2.144.442.248
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL COBING INFRATUR		
Fecha de Acta de inicio del contrato	27 de octubre de 2023		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
	MODIFICACIÓN 1	10/04/2024	
	MODIFICACIÓN 2	27/05/2024	
Fecha de terminación del Contrato	**16 de agosto de 2024**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.144.442.248

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA N°	39-44-101155606 – CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
FECHA DE LA POLIZA	Fecha de expedición: 02/10/2023 Anexo 0

Amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	22/09/2023	05/12/2024	$214.444.224,60
Buen manejo y correcta inversion del Anticipo	22/09/2023	05/12/2024	$643.332.674,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/09/2023	05/08/2027	$107.222.112,40
Estabilidad y calidad de la obra	Ampara 5 años, 0 meses y 0 dias		$214.444.224,80
Calidad del servicio	22/09/2023	22/09/2028	$32.873.600,00

Fecha de expedición: 17/04/2024 Anexo 3
Aclaraciones: Prorroga vigencia de los amparos de acuerdo al modificatorio No. 1 de fecha 10 de abril de 2024.

Fecha de expedición: 10/05/2024 Anexo 4
Aclaraciones: Incluye como beneficiario LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON NIT 8301144756.

Fecha de expedición: 29/05/2024 Anexo 5
Aclaraciones: Prorroga vigencia de los amparos de acuerdo al modificatorio No. 2 de fecha 27 de mayo de 2024.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA N°	39-40-101040702 – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
FECHA DE LA POLIZA	Fecha de expedición: 02/10/2023 Anexo 0

Amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Predios labores y operaciones	22/09/2023	05/10/2024	232.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	22/09/2023	05/10/2024	232.000.000,00
Vehiculos propios y no propios	22/09/2023	05/10/2024	232.000.000,00

Fecha de expedición: 17/04/2024 Anexo 3
Aclaraciones: Prorroga vigencia de los amparos de acuerdo al modificatorio No. 1 de fecha 10 de abril de 2024.

Fecha de expedición: 17/04/2024 Anexo 4
Aclaraciones: reajuste al valor asegurado de los amparos.

Amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Responsabilidad civil patronal	27/10/2023	09/12/2024	260.000.000,00
Daño emergente y lucro cesante	27/10/2023	09/12/2024	260.000.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	27/10/2023	09/12/2024	260.000.000,00

Fecha de expedición: 10/05/2024 Anexo 5
Aclaraciones: Incluye como beneficiario LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON NIT 8301144756.

Fecha de expedición: 29/05/2024 Anexo 6
Aclaraciones: Prorroga vigencia de los amparos de acuerdo al modificatorio No. 2 de fecha 27 de mayo de 2024.

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
N°CMA-002-2023	INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA		$238.302.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00 $ 0,00
Nombre contratista	INTEROBRAS SC SAS R/L ELIANA SARMIENTO CIFUENTES C.C.No.1.049.611.640 DE TUNJA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**27 de octubre de 2023**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
	MODIFICACIÓN 1	10/04/2024	
	MODIFICACIÓN 2	27/05/2024	
Fecha de terminación del Contrato	**16 de agosto de 2023**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$238.302.000,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
POLIZA N°	600-47-994000070177 CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
FECHA DE LA POLIZA	Fecha de expedición: 02/10/2023 Anexo 0

Amparos	**Vigencia**		**Suma asegurada**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento	14/09/2023	05/12/2024	$47.660.400,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.	14/09/2023	05/08/2027	$47.660.400,00
Calidad del servicio	14/09/2023	14/09/2028	$71.490.600,00

Fecha de expedición: 17/04/2024 Anexo 2
Aclaraciones: Prorroga vigencia de los amparos de acuerdo al modificatorio No. 1 de fecha 10 de abril de 2024.

Amparos	**Vigencia**		**Suma asegurada**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento	27/10/2023	01/04/2024	$47.660.400,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.	27/10/2023	30/11/2027	$47.660.400,00
Calidad del servicio	27/10/2023	27/11/2028	$71.490.600,00

Fecha de expedición: 10/05/2024 Anexo 3
Aclaraciones: Incluye como beneficiario LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON NIT 8301144756

Fecha de expedición: 28/05/2024 Anexo 4
Aclaraciones: Prorroga vigencia de los amparos de acuerdo al modificatorio No. 2 de fecha 27 de mayo de 2024.

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**10**	**14 de mayo de 2024**
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	3	05/04/24
INFORME FINANCIERO		31/05/24
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	Bancolombia 545-541707-25	$431.653.981,17
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Firma acta de inicio	27/10/2023
	Pago Anticipo (03-11-2023) 30%	643.332.674,40
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**1,12%**
% EJECUTADO DE OBRA	**7.00%**

% AVANCE DE OBRA	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**
	0.00%	**7.00%**	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	5,00%	9,31%	0,00%	0,00%

INFORME: 11
AVANCE: 14.12%
ESTADO: CONTRACTUAL
RECURSOS GIRADOS: 1.072.360.598
Pendiente por recibir: 1.310.662.954

INFORME DE ACTIVIDADES

El municipio de Turmequé, adelantó procesos contractuales de obra e interventoría, los cuales se encuentran en ejecución y dentro de los plazos establecidos para dar cumplimiento al objeto del convenio, de la siguiente forma:

ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA

PROCESO	LICITACION PUBLICA LP-03-2023
OBJETO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA
VALOR	Dos Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro Millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho Pesos M/Cte. ($2.144.442.248)
ESTADO:	En ejecución
Enlace	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-39604
Pagos	03/11/2023 Anticipo del 30% ($643.332.674,40)
Actividades	De acuerdo al informe de actividades de la Interventoría se han realizado las siguientes Actividades: 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: Entrega de paquete topográfico (31/10/23); Entrega de correcciones (13/11/23). 1.2. ESTUDIO DE SUELOS: Entrega informe preliminar (13/11/2023) 1.3. DISEÑO ARQUITECTONICO: Presentación de 2 alternativas de implantación (17/11/2023) seleccionando Alternativa No. 1 (Detalle informe No. 1 de Interventoría); entre el 21 y el 24 de Noviembre se presentan las correcciones solicitadas al diseño arquitectónico inicial y el avance correspondiente a cubiertas y fachadas. 1.4. Socialización de Avances a la nueva Administración, presentación de presupuesto preliminar para estudio y aprobación 1.5. El día 13 de febrero de 2024 se realizan actas de vecindad por parte del contratista. 1.6. Radicación de Estudios y diseños en el Ministerio de Interior con todas las correcciones solicitadas. (07/03/2024) 1.7. Aprobación Estudios y Diseños (23/04/2024) 2. Se notifica por parte de la Secretaría de Planeación y desarrollo económica la Licencia de construcción No. 006-2024, por medio de la cual se concede Licencia de construcción en modalidad de obra nueva en predio urbano. 3. Se adjunta acta de entrega del terreno del (15/04/2024) donde se establece que se encuentra nivelado, con retiro de capa vegetal y sin estructuras que puedan obstaculizar el desarrollo de la obra. 4. De acuerdo al informe mensual de No. 2 de interventoría, el cual hace parte integral del presente informe, se ejecutaron las siguientes actividades: 4.1 CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL: Esta actividad se encuentra comprendida dentro de la administración del contrato, y comprendió la instalación de madera rolliza y lona verde en todo el perímetro del área a intervenir. 4.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO: Se realiza la localización y replanteo de las estructuras en sitio, actividad que se ejecutó con estación total. Inicialmente se materializan ejes del edificio de servicios, debido a que en la demás área se encuentra una capa vegetal que es necesario retirar en su totalidad, conforme a la recomendación del estudio de suelos. Se informa al supervisor del municipio para que realicen esta actividad de excavación y retiro de capa vegetal, de acuerdo con las actividades a cargo del mismo indicadas en el convenio y anexo 22. De acuerdo con el avance del retiro de material de capa vegetal, se procede a materializar ejes del edificio complementario. 4.3 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR: Desde el inicio de actividades en obra se procede por parte del contratista a realizar el suministro y transporte del material de afirmado desde la cantera AGREGADOS SANTA LUCIA, localizada en el Municipio de Cucaita – Boyacá, a 52,10 km del sitio de la obra. Durante el mes de mayo se acopia en sitio 350 m3 de material transportado, destinado para el 100% del mejoramiento y relleno de las edificaciones. Dentro de la cuantificación de la distancia se tuvo en cuenta el descuento de los 5 Km incluidos en los ítems de materiales de agregado.

4.4 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE: Se realiza excavación manual para la cimentación de zapatas y vigas del edificio de servicios, conforme a la sección de diseño. De igual forma se realiza la excavación para el mejoramiento en concreto ciclópeo de las zapatas del edificio complementario. En este último se dejan secciones de 1.1x1.1, con el fin de dar mayor firmeza y espacio a las zapatas que se encuentran sobre el nivel excavado mecánicamente.

4.5 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE: Una vez fundidas las vigas de cimentación del edificio de servicios, se retira mecánicamente un espesor de 30 cm de suelo, con el fin de realizar su mejoramiento y dar soporte a la placa de contrapiso en atención a la recomendación del estudio de suelos. De igual forma se retira un espesor de 20 cm en toda el área del edificio complementario, con el fin de ubicar la arcilla de soporte indicada en el estudio de suelos.

4.6 CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA: Se mezcla en obra concreto de 21 Mpa, de acuerdo con diseño de mezcla elaborado por el contratista de obra, para la construcción de los ciclópeos localizados bajo las zapatas de los edificios de servicios y complementario, en un espesor de 25 cm.

4.7 MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM: Se realza la instalación y compactación de material de afirmado para el mejoramiento del suelo bajo placa del edificio de servicios, en un espesor de 30 cm. De igual forma, una vez fraguado el concreto y adquirida su resistencia, se inicia con el relleno del edificio complementario, hasta llegar al nivel superior de zapatas, desde el cual se realizará la actividad de solado y vigas.

4.8 SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM: Se funden solados de limpieza en concreto de 14 MPA para la conformación de los solados localizados baja las vigas de cimentación del edificio de servicios, con ancho de 35 cm.

4.9 ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA: Se funde concreto de 21 MPA en obra para la conformación de zapatas del edificio de servicios y complementario, con una sección de 1m x 1m x 40 cm, localizadas sobre el concreto ciclópeo.

4.10 VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA: Se funde concreto en obra de 21 MPA para la conformación de vigas de cimentación del edificio de servicios, con sección de 35cm x 40cm, localizadas sobre el solado.

4.11 CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS: Se funde concreto de 21 MPA, para rellenar los espacios existentes entre las zapatas y las vigas de cimentación del edificio de servicios, esto debido a que el nivel de cimentación de la viga se encuentra 10 cm por encima del nivel superior de la zapata, conforme al diseño estructural.

4.12 COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLUYE FORMALETA METÁLICA: Se realiza la instalación de formaleta metálica para columnas y se funde en obra concreto de 21 MPA su conformación en el edificio de servicios, con una sección de 30cm x 30cm y una altura sobre viga de 2,30m. Durante su ejecución se realiza vibrado de concreto para garantizar su correcta integración.

4.13 SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA: Se suministra y lleva a obra por parte del contratista el 100% del acero figurado para las estructuras de las tres edificaciones. Se realiza el amarre e instalación del acero de zapatas, vigas de cimentación, pedestales y columnas del edificio de servicios. De igual forma se realiza el amarre e instalación del acero de zapatas, columnas y vigas del edificio complementario.

4.14 MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS: Se instalan las mallas electrosoldadas de 6mm, separación c/15cm, en el edificio de servicios, para la conformación de la placa de contrapiso. En las mismas se deja traslapo de 20 cm, conforme lo indica el diseño estructural.

4.15 INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS: Se realiza la instalación de la red de tubería sanitaria de 2” y 4” del edificio de servicios, localizada dentro del mejoramiento del suelo bajo placa, para conformar las arañas sanitarias y de aguas lluvias de los baños, cocineta y cafetería, las cuales incluyeron accesorios de conexión como codos, yee, y sifones. La distribución de las arañas se realiza de acuerdo con el diseño sanitario, con algunas variaciones mínimas que facilitan la evacuación de las aguas servidas. Previo a la instalación de relleno, se realizó prueba de estanqueidad de las redes, para verificar la no existencia de filtraciones.

De acuerdo con la localización topográfica, se instala parte de la tubería de 4”, 6” y 8” de aguas lluvias localizada en urbanismo, para la cual se realizó la respectiva excavación y relleno.

INTERVENTORIA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS

PROCESO	**CONCURSO ABIERTO DE MERITOS CMA-002-2023**
OBJETO	INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA
VALOR	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS ($238.302.000) M/CTE
ESTADO:	En ejecución
Enlace	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13755512

NOTA:

Se adjunta:

- Informe semanal No. 2 correspondiente al periodo de 29/04/2024 al 05/05/2024
- Informe semanal No. 3 correspondiente al periodo de 06/05/2024 al 12/05/2024
- Informe semanal No. 4 correspondiente al periodo de 13/05/2024 al 19/05/2024
- Informe semanal No. 5 correspondiente al periodo de 20/05/2024 al 26/05/2024

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/11/2023 (Acta No. 2)	04/04/2024	09/05/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO


























9. SUPERVISOR MUNICIPIO

JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

GIOVANNI VELA BERNAL
Alcalde Municipal

MODIFICATORIO NO. 02 LP-02-2023 Y CMA-003-2023

Alcaldía Municipal Turmequé Boyacá
Calle 3 No. 4-65 Código Postal – 153630
Teléfono. 3157799711
email. gobierno@turmeque-boyaca.gov.co
http://www.turmeque-boyaca.gov.co

MODIFICATORIO Nº 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº. CMA-002-2023

CONTRATO	**CMA-002-2023**
FECHA	14 DE SEPTEMBRE DE 2023
OBJETO	INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ - BOYACÁ
VALOR	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS ($238.302.000) M/CTE.
PLAZO/DURACIÓN INICIAL	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO.
PLAZO SEGÚN MODIFICATORIA N° 01	OCHO (08) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS. EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CINCO (05) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS Y PARA EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
NUEVO PLAZO SEGÚN MODIFICATORIA N° 02	NUEVE (09) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ – BOYACÁ
REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI VELA BERNAL
CARGO	ALCALDE MUNICIPAL.
CONTRATISTA	INTEROBRAS SC SAS - NIT: 901.245.192-6 R/L. ELIANA SARMIENTO CIFUENTES - CC. 1.049.611.640 DE TUNJA
FECHA MODIFICATORIO	27 DE MAYO DE 2024

Entre los suscritos a saber **GIOVANNI VELA BERNAL** mayor de edad y con domicilio en este Municipio, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 47.150.529 de Turmequé, en su condición de **ALCALDE MUNICIPAL DE TURMEQUÉ**, según Acta de Posesión del 31 de diciembre de 2023, quien para todo efecto se llamará en adelante el MUNICIPIO como CONTRATANTE por una parte y por la otra **INTEROBRAS SC SAS.,** identificada con NIT: 901.245.192-6, representada legalmente por ELIANA SARMIENTO CIFUENTES con cedula de ciudadanía No. 1.049.611.640 de Tunja, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente Modificatorio al Contrato CMA-002-2023, que se regirá por las cláusulas que adelante se expresan, previa las siguientes consideraciones:

1). Que con fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) se suscribió el contrato de interventoría **Nº CMA-002-2023**, cuyo objeto es INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA, de conformidad con las condiciones, características y especificaciones señaladas en los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista. Las Partes declaran iniciado el objeto de contrato de prestación de servicios a partir del día 27 de octubre de 2023.

2). Que, con fecha (28) de junio de 2023, EL MINISTERIO DEL INTERIOR y EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, suscribieron el **convenio interadministrativo No. 1621 de 2023**, con el objeto de: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA". En el anexo de condiciones del convenio se pactó el valor inicial del mismo por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.383.023.552), y un plazo inicial de ejecución por el termino de trece (13) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. El diecisiete (17) de julio de 2023, de acuerdo con la aprobación de póliza y expedición de Registros Presupuestales del convenio las partes suscribieron acta de inicio del mismo.

3). Por otro lado, EL MINISTERIO adelantó ACLARATORIO del convenio relacionado con la fecha de terminación del mismo en la cual se digitó como fecha de terminación del convenio Nº 1621 de 2023, el treinta y uno (31) de julio de 2024, siendo la fecha correcta el dieciséis (16) de agosto de 2024, de acuerdo con lo establecido en el anexo de condiciones y los estudios previos del convenio.

4). Teniendo en cuenta que las condiciones dispuestas en el convenio interadministrativo Nº 1621 de 2023, priman sobre las condiciones del contrato Nº CMA-002-2023, se generó un error involuntario al establecer el plazo de ejecución del objeto contratado, ya que debe existir una sincronicidad, entre las fechas plasmadas en el convenio Interadministrativo para la ejecución del objeto y las fechas de duración de los contratos de obra e Interventoría generados a raíz de la firma del convenio Interadministrativo. Por esta razón fue preciso adelantar un primer MODIFICATORIO al plazo de ejecución del contrato de interventoría Nº CMA-002-2023, ya que éste no puede tener una fecha de terminación posterior a la fecha de terminación del convenio que es el 16 de agosto de 2024.

5). Según las condiciones establecidas en la cláusula segunda del MODIFICATORIO N° 01 se especificó un plazo de cinco (05) meses y veintiún (21) días para surtir con la etapa de la Ejecución de Estudios y Diseños, plazo que se cumplía el día dieciséis (16) de abril del 2024.

6). Que dicho plazo no fue posible cumplirse por retrasos en la aprobación de los mismos por parte del Ministerio dentro del tiempo estipulado y, según lo ya mencionado en el numeral 4 de este justificado, las condiciones dispuestas en el convenio interadministrativo Nº 1621 de 2023, priman sobre las condiciones del contrato Nº CMA-002-2023.

7). Que, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se hace necesario suscribir el presente MODIFICATORIO cambiando los plazos anteriormente dispuestos.

8). Que por lo expuesto, el Legislador ha dotado al contrato estatal de una serie de prerrogativas y ritualidades que deben observarse para que el mismo exista, se perfeccione y pueda iniciar su ejecución. En este sentido se hace necesario precisar que el contrato estatal es un acto de carácter solemne, razón por la cual este debe constar por escrito. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, y lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales, así como sus modificaciones deben constar por escrito.

9). Que por otra parte, es importante señalar que el objeto de los contratos que celebran las Entidades Públicas, es cumplir Con los fines estatales, satisfacer el interés general, dar una continua y eficiente prestación de los servicios públicos y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, lo cual debe estar presente durante la ejecución del contrato. Por lo que, en ocasiones es necesario hacer modificaciones al contrato para la consecución de dichos fines. De esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato estatal pueda modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos para los cuales fue previsto, siempre y cuando no se altere el objeto del contrato. Esta modificación puede ser por un acuerdo bilateral o por acto unilateral de la entidad contratante, el cual deberá ser motivado tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 80 de 1993.

10) Que a la fecha del Contrato se encuentra vigente y es viable la suscripción de la presente reducción de tiempo.

11). Que la siguiente modificación en tiempo se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO Nº CMA-002-2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA".

CLAUSULA SEGUNDA. - MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO N° CMA-02-2023 Y DE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL MODIFICATORIO N° 01 – PLAZO DEL CONTRATO: Se modificará la cláusula cuarta del contrato Nº CMA-02-2023, la cual quedará así: el plazo de ejecución del presente contrato será de **NUEVE (09) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS.** Ejecución estudios y diseños seis (06) meses. Ejecución, Certificaciones y Recibo de obra tres (03) meses y veintiún (21) días, contados a partir de la orden de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA TERCERA. - GARANTÍAS. Las Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo, establecidas en la cláusula 09 del acuerdo contractual inicial deberán incluir como beneficiario LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON. Lo anterior en consonancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015. Por lo anterior las garantías del contrato quedaran así:

CLAUSULA 17. GARANTÍAS

17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características:

Característica	**Condición**
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.
Asegurado/ beneficiario	ALCALDIA MUNICIPAL DE TURMEQUÉ identificada con el NIT 891.801.787-8 LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON identificado con NIT. 830.114.475-6
Amparos, vigencia y valores asegurados	

Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del Contrato	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del Contrato y tres (3) años más.	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.	Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de Garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 (5 años)	Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato

Tomador	• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Interventor • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA CUARTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato Nº. CMA-002-2023, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLAUSULA QUINTA. - DOCUMENTOS: presente adicional y obliga jurídicamente a las partes los documentos que a continuación se relacionan: a) Estudio Previo para el Modificatorio en plazo. b) Todos los demás documentos relativos al mismo, suscritos y cruzados entre las partes

Para constancia se firma en Turmequé a los (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por los que intervinieron.

FIRMADO EN ORIGINAL **GIOVANNI VELA BERNAL** ALCALDE MUNICIPAL	FIRMADO EN ORIGINAL **ELIANA SARMIENTO CIFUENTES** R/L. INTEROBRAS SC SAS C.C. 1.049.611.640 de Tunja

MODIFICATORIO Nº 02 AL CONTRATO Nº LP-03-2023

CONTRATO	**LP-03-2023**
FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA -TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACA
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ - BOYACÁ
VALOR INICIAL	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($2.144.442.248).
PLAZO/DURACIÓN INICIAL	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO.
PLAZO SEGÚN MODIFICATORIA N° 01	OCHO (08) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS. EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CINCO (05) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS Y PARA EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
NUEVO PLAZO SEGÚN MODIFICATORIA N° 02	NUEVE (09) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
INTERVENTOR	Contrato de Interventoría CMA-002-2023 CONTRATISTA: INTEROBRAS SC SAS NIT: 901245192-6 R/L: ELIANA SARMIENTO CIFUENTES C.C. NO.: 1.049.611.640 DE TUNJA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ – BOYACÁ
REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI VELA BERNAL
CARGO	ALCALDE MUNICIPAL.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL COBING INFRATUR. NIT: 901755256-7 R/L. JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS C.C. 7.182.662 DE TUNJA
FECHA MODIFICATORIO	27 DE MAYO DE 2024

Entre los suscritos a saber **GIOVANNI VELA BERNAL** mayor de edad y con domicilio en este Municipio, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 47.150.529 de Turmequé, en su condición de **ALCALDE MUNICIPAL DE TURMEQUÉ**, según Acta de Posesión del 31 de diciembre de 2023, quien para todo efecto se llamará en adelante el MUNICIPIO como CONTRATANTE por una parte y por la otra la **UNION TEMPORAL COBING INFRATUR.,** identificada con NIT: 901755256-7, representada legalmente por JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS con cedula de ciudadanía No. 7.182.662 de Tunja, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente Modificatorio al Contrato LP-03-2023, que se regirá por las cláusulas que adelante se expresan, previa las siguientes consideraciones:

1). Que con fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) se suscribió el contrato de obra **Nº LP-03-2023**, cuyo objeto es REALIZAR LOS ESTUDIOS Y LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA -TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE -BOYACA, de conformidad con las condiciones, características y especificaciones señaladas en los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista. Las Partes declaran iniciado el objeto de contrato de prestación de servicios a partir del día 27 de octubre de 2023.

2). Que, con fecha veintiocho (28) de junio de 2023, EL MINISTERIO DEL INTERIOR y EL MUNIICPIO DE TURMEQUÉ, suscribieron el **convenio interadministrativo No. 1621 de 2023**, con el objeto de: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA". En el anexo de condiciones del convenio se pactó el valor inicial del mismo por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.383.023.552), y un plazo inicial de ejecución por el termino de trece (13) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. El diecisiete (17) de julio de 2023, de acuerdo con la aprobación de póliza y expedición de Registros Presupuestales del convenio las partes suscribieron acta de inicio del mismo.

3). Por otro lado, EL MINISTERIO adelantó ACLARATORIO del convenio relacionado con la fecha de terminación del mismo en la cual se digitó como fecha de terminación del convenio Nº 1621 de

2023, el treinta y uno (31) de julio de 2024, siendo la fecha correcta el dieciséis (16) de agosto de 2024, de acuerdo con lo establecido en el anexo de condiciones y los estudios previos del convenio.

4). Teniendo en cuenta que las condiciones dispuestas en el convenio interadministrativo Nº 1621 de 2023, priman sobre las condiciones del contrato Nº LP-03-2023, se generó un error involuntario al establecer el plazo de ejecución del objeto contratado, ya que debe existir una sincronicidad, entre las fechas plasmadas en el convenio Interadministrativo para la ejecución del objeto y las fechas de duración de los contratos de obra e Interventoría generados a raíz de la firma del convenio Interadministrativo. Por esta razón fue preciso adelantar un primer MODIFICATORIO al plazo de ejecución del contrato de obra N° LP-03-2023, ya que éste no puede tener una fecha de terminación posterior a la fecha de terminación del convenio que es el 16 de agosto de 2024.

5). Según las condiciones establecidas en la cláusula segunda del MODIFICATORIO N° 01 se especificó un plazo de cinco (05) meses y veintiún (21) días para surtir con la etapa de la Ejecución de Estudios y Diseños, plazo que se cumplía el día dieciséis (16) de abril del 2024.

6). Que dicho plazo no fue posible cumplirse por retrasos en la aprobación de los mismos por parte del Ministerio dentro del tiempo estipulado y, según lo ya mencionado en el numeral 4 de este justificado, las condiciones dispuestas en el convenio interadministrativo Nº 1621 de 2023, priman sobre las condiciones del contrato Nº LP-03-2023.

7). Que, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se hace necesario suscribir el presente MODIFICATORIO cambiando los plazos anteriormente dispuestos.

8). Que por lo expuesto, el Legislador ha dotado al contrato estatal de una serie de prerrogativas y ritualidades que deben observarse para que el mismo exista, se perfeccione y pueda iniciar su ejecución. En este sentido se hace necesario precisar que el contrato estatal es un acto de carácter solemne, razón por la cual este debe constar por escrito. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, y lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales, así como sus modificaciones deben constar por escrito.

9). Que por otra parte, es importante señalar que el objeto de los contratos que celebran las Entidades Públicas, es cumplir con los fines estatales, satisfacer el interés general, dar una continua y eficiente prestación de los servicios públicos y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, lo cual debe estar presente durante la ejecución del contrato. Por lo que, en ocasiones es necesario hacer modificaciones al contrato para la consecución de dichos fines. De esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato estatal pueda modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos para los cuales fue previsto, siempre y cuando no se altere el objeto del contrato. Esta modificación puede ser por un acuerdo bilateral o por acto unilateral de la entidad contratante, el cual deberá ser motivado tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 80 de 1993.

10). Que a la fecha del Contrato se encuentra vigente y es viable la suscripción de la presente reducción de tiempo.

11). Que la siguiente modificación de tiempo se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO Nº LP-03-2023, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA -TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE -BOYACA".

CLAUSULA SEGUNDA. - MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO N° LP-03-2023 Y DE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL MODIFICATORIO N° 01 – PLAZO DEL CONTRATO: Se modificará la cláusula cuarta del contrato Nº LP-03-2023, la cual quedará así: el plazo de ejecución del presente contrato será de **NUEVE (09) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS.** Ejecución estudios y diseños seis (06) meses. Ejecución de obra, Certificaciones y Recibo de obra tres (03) meses y veintiún (21) días, contados a partir de la orden de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA TERCERA. - GARANTÍAS. Las Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo, establecidas en la cláusula 09 del acuerdo contractual inicial deberán incluir como beneficiario LA

NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON. Lo anterior en consonancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015. Por lo anterior las garantías del contrato quedaran así:

CLAUSULA 18. GARANTÍAS

18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>ALCALDIA MUNICIPAL DE TURMEQUÉ identificada con el NIT 891.801.787-8 LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON identificado con NIT. 830.114.475-6</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del Contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del Contrato</td><td>10% del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>Hasta la liquidación del Contrato</td><td>100% del valor entregado a título de anticipo</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>5% del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad</td><td>10% del valor total final del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>Cinco (5) años contados a partir de la aprobación de los estudios y diseños</td><td>Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de los estudios y diseños.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.

</td></tr>
<tr><td>Información necesaria dentro de la póliza</td><td>

Número y año del Contrato
Objeto del Contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

</td></tr>
</table>

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ- BOYACÁ identificado con NIT 891801787-8, LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON identificado con NIT. 830.114.475-6 y EL CONTRATISTA
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	No debe ser inferior a Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ- BOYACÁ identificado con NIT 891801787-8 y LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON identificado con NIT. 830.114.475-6
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del treinta por ciento (30%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA CUARTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato Nº. LP-03-2023, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLAUSULA QUINTA. - DOCUMENTOS: presente adicional y obliga jurídicamente a las partes los documentos que a continuación se relacionan: a) Estudio Previo para el Modificatorio en plazo. b) Todos los demás documentos relativos al mismo, suscritos y cruzados entre las partes

Para constancia se firma en Turmequé a los veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por los que intervinieron.

FIRMADO EN ORIGINAL **GIOVANNI VELA BERNAL** ALCALDE MUNICIPAL	FIRMADO EN ORIGINAL **JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS** R/L. UNION TEMPORAL COBING INFRATUR C.C. 7.182.662 de Tunja

EXTRACTOS BANCARIOS

Alcaldía Municipal Turmequé Boyacá
Calle 3 No. 4-65 Código Postal – 153630
Teléfono. 3157799711
email. gobierno@turmeque-boyaca.gov.co
http://www.turmeque-boyaca.gov.co

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 54554170725

SUCURSAL VILLAPINZON

MUNICIPIO DE TURMEQUE

CRA 3 # 4 - 65 CENTRO

TURMEQUE BOYACA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	431,653,981.17	*SALDO PROMEDIO*	$	431,656,346
TOTAL ABONOS	$	73,327.92	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	73,327.92
SALDO ACTUAL	$	431,727,309.09	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			73,327.92	431,727,309.09

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME FINANCIERO AL 31/05/2024

Alcaldía Municipal Turmequé Boyacá
Calle 3 No. 4-65 Código Postal – 153630
Teléfono. 3157799711
email. gobierno@turmeque-boyaca.gov.co
http://www.turmeque-boyaca.gov.co

CONVENIO 1621 DE 2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE BOYACA"

INFORME FINANCIERO DEL 24 DE JULIO 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024
MUNICIPIO DE TURMEQUE BOYACA

PROYECTO (S): INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE BOYACA

CUENTA (ahorros) No. 54554170725 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO **$ 2,383,023,552.00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2,383,023,552.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0.00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	24/07/2023	GIRO 1	**$ 1,072,360,598.00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1,072,360,598.00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 1,072,360,598.00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP 03 -2023	UNION TEMPORAL COBING INFRATUR	$ 2,144,442,248.00	$ 0.00	$ 2,144,442,248.00
CMA-002-2023	INTEROBRAS SC S.A.S	$ 238,302,000.00	$ 0.00	$ 238,302,000.00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 2,382,744,248.00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
LP-03-2023	ANTICIPO 30% REALIZAR LOS ESTUDIOS Y LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA -TIPO 1B EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACA	2023110003	2023110003	07/11/2023	$ 643,332,674.40	$ 0.00	$ 643,332,674.40
	VALOR TOTAL PAGADO				$ 643,332,674.40	**$ 0.00**	$ 643,332,674.40

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/06/2023	$ 95,193.72
31/08/2023	$ 590,389.70
30/09/2023	$ 571,654.32
31/10/2023	$ 591,029.42
3011/2023	$ 204,500.90
31/12/2023	$ 146,107.01
31/01/2024	$ 146,156.54
29/02/2024	$ 136,771.91
31/03/2024	$ 73,303.41
30/04/2024	$ 70,950.64
31/05/2024	$ 73,327.92


INFORMES SEMANALES 2 AL 5

Interior	**INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA** **INTEROBRAS SC S.A.S** **PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ**	
Versión: 01		**Página 1 de 4**

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 2		**MES: MAYO**		**FECHA DE INFORME**
CONTRATO No	LP 03-2023	**OBJETO:**	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ	**29-abr-24** **al** **5-may-24**
INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA:** ING. JONATHAN A. ROJAS H.	**RESIDENTE DE OBRA:** ING. DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO	

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

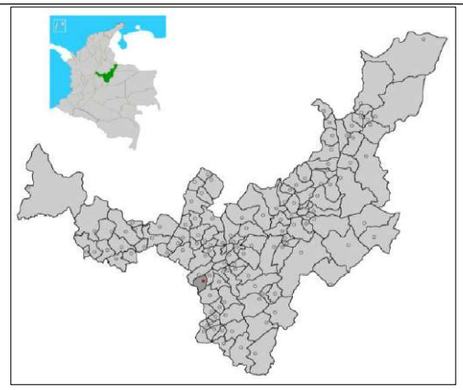




2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 22 de septiembre de 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 2.144.442.248,00
FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023	**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	N/A
FECHA APROBACIÓN INICIO DE OBRA:	martes, 23 de abril de 2024	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	OCHO (8) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA:	TRES (3) MESES	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	lunes, 26 de agosto de 2024
PRORROGA Nº 1:	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	miércoles, 17 de julio de 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 2.144.442.248,00	**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 643.332.674,40
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS:	$ 164.368.000,00	**VALOR DE OBRA:**	$ 1.980.073.076,00
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR	**REPRESENTANTE LEGAL:**	ING. JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS
PLAZO TRANSCURRIDO OBRA:	13 DíAS	**PLAZO RESTANTE OBRA:**	73 DÍAS

EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	0,00%	**PROGRAM. SEMANA**	0,13%	**PROGRAM. ACUMULADO**	0,83%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 0	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 2.663.786	**PROGRAM FINANC ACUMULADO**	$ 16.459.962

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

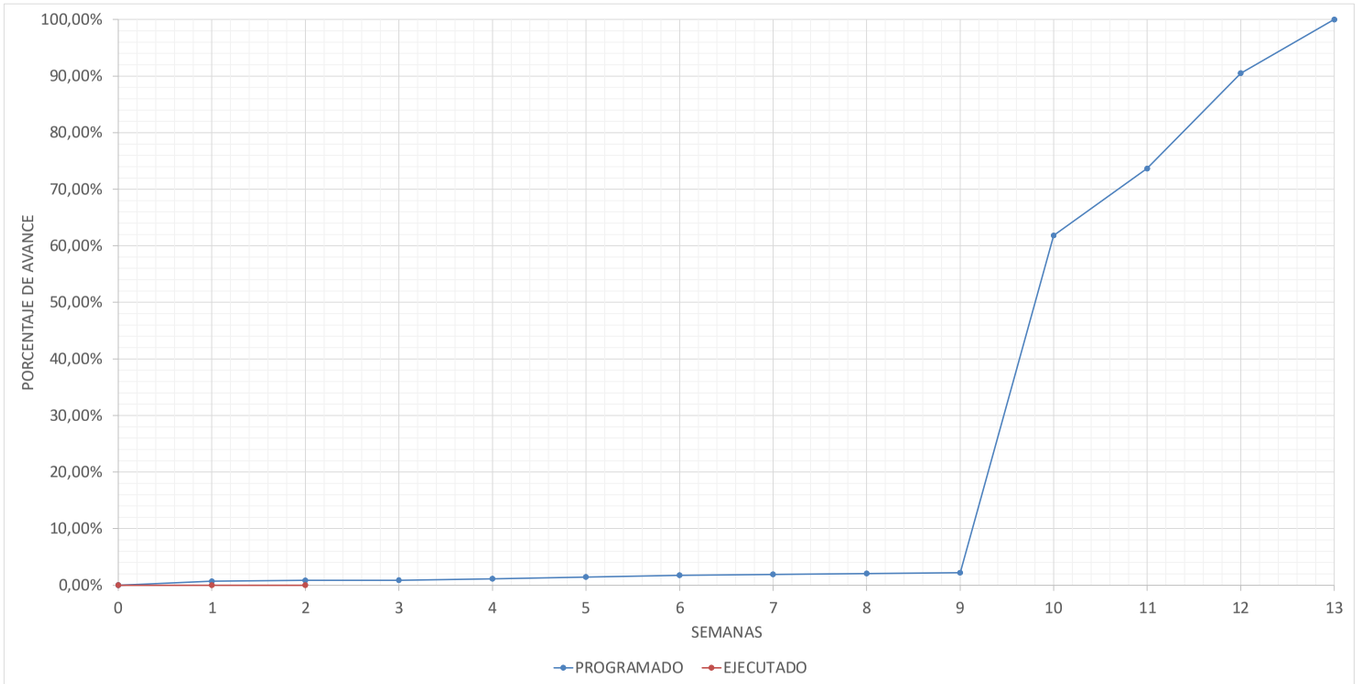

VALOR PROGRAMADO POR MES ACUMULADO							
23 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 13.796.176,00	0,70%		01 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 34.681.602,00	1,75%	
01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	$ 1.224.389.617,00	61,84%		01 AL 17 DE JULIO DE 2024	$ 1.980.073.076,00	100,00%	

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

CONTRATO INICIAL

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00

AVANCE ACTUAL	0,00%	SUBTOTAL	$ -	$ -	$ -
		A.I.U (30%)	$ -	$ -	$ -
		VALOR TOTAL OBRA	$ -	$ -	$ -
PROGRAMADO	0,83%	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 133.138.080	$ -	$ 133.138.080
		IVA (19%)	$ 31.229.920	$ -	$ 31.229.920
		VALOR TOTAL DISEÑOS	$ 164.368.000	$ -	$ 164.368.000
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	-0,83%	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 164.368.000	$ -	$ 164.368.000

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	$ 214.444.224,80	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101155606 - ANEXO 3 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	$ 643.332.674,40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	27-oct.-2023	9-oct.-2027	$ 107.222.112,40	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	ACTA RECIBO	5 AÑOS	$ 214.444.224,80	
CALIDAD DEL SERVICIO	SI	27-oct.-2023	27-oct.-2028	$ 32.873.600,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	27-oct.-2023	9-dic.-2024	$ 260.000.000,00	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 39-40-101040702 - ANEXO 4 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA INICIO	27-oct.-2023	INICIO AL CONTRATO DE OBRA.						
ORDEN DE INICIO DE OBRA	23-abr.-2024	INICIO DE OBRA POSTERIOR A APROBACIÓN DE DISEÑOS						

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	CONTRATO DE OBRA	PAGO ANTICIPO DE OBRA		30,00%	$ 643.332.674,40	0	$ 643.332.674,40	$ 643.332.674,40	$ 1.501.109.573,60
2									
3									

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

LABORES PRESENTE SEMANA: DURANTE EL PERÍODO SE FORMALIZA ACTA DE RECIBO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (ANEXO 22) POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A INICIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA LOGÍSTICA DE INICIO EN OBRA.

OBSERVACIONES: No se presentan para el presente periodo.

Elaborado por:


NOMBRE: ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	NOMBRE: JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA ARQUITECTO SUPERVISOR MUNICIPIO DE TURMEQUÉ

Interior	**INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA** **INTEROBRAS SC S.A.S** **PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ**	
Versión: 01		**Página 1 de 5**

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 3			**MES: MAYO**	**FECHA DE INFORME**
CONTRATO No	LP 03-2023	**OBJETO:**	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ	**6-may-24 al 12-may-24**
INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA:** ING. JONATHAN A. ROJAS H.	**RESIDENTE DE OBRA:** ING. DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO	

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

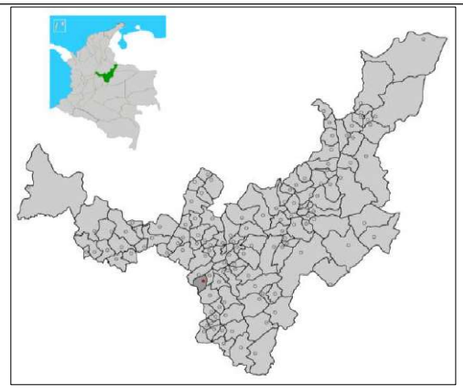




2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 22 de septiembre de 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 2.144.442.248,00
FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023	**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	N/A
FECHA APROBACIÓN INICIO DE OBRA:	martes, 23 de abril de 2024	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	OCHO (8) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA:	TRES (3) MESES	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	lunes, 26 de agosto de 2024
PRORROGA Nº 1:	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	miércoles, 17 de julio de 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 2.144.442.248,00	**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 643.332.674,40
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS:	$ 164.368.000,00	**VALOR DE OBRA:**	$ 1.980.073.076,00
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR	**REPRESENTANTE LEGAL:**	ING. JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS
PLAZO TRANSCURRIDO OBRA:	20 DíAS	**PLAZO RESTANTE OBRA:**	66 DÍAS

EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	0,00%	**PROGRAM. SEMANA**	0,05%	**PROGRAM. ACUMULADO**	0,88%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 0	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 918.311	**PROGRAM FINANC ACUMULADO**	$ 17.378.273

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

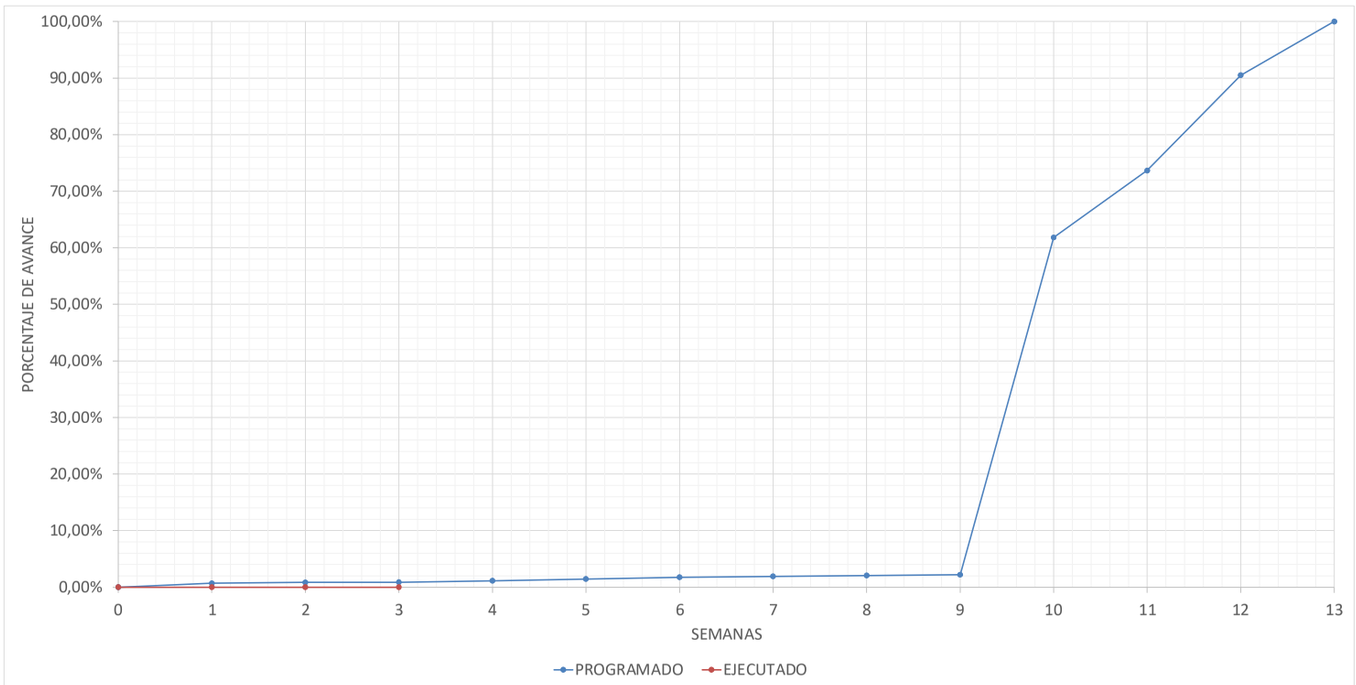

VALOR PROGRAMADO POR MES ACUMULADO							
23 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 13.796.176,00	0,70%		01 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 34.681.602,00	1,75%	
01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	$ 1.224.389.617,00	61,84%		01 AL 17 DE JULIO DE 2024	$ 1.980.073.076,00	100,00%	

Interior	INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA INTEROBRAS SC S.A.S PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ	
Versión: 01		Página 1 de 5

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

CONTRATO INICIAL

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00

AVANCE ACTUAL	0,00%	SUBTOTAL	$ -	$ -	$ -
		A.I.U (30%)	$ -	$ -	$ -
		VALOR TOTAL OBRA	$ -	$ -	$ -
PROGRAMADO	0,88%	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 133.138.080	$ -	$ 133.138.080
		IVA (19%)	$ 31.229.920	$ -	$ 31.229.920
		VALOR TOTAL DISEÑOS	$ 164.368.000	$ -	$ 164.368.000
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	-0,88%	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 164.368.000	$ -	$ 164.368.000

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	$ 214.444.224,80	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101155606 - ANEXO 3 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	$ 643.332.674,40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	27-oct.-2023	9-oct.-2027	$ 107.222.112,40	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	ACTA RECIBO	5 AÑOS	$ 214.444.224,80	
CALIDAD DEL SERVICIO	SI	27-oct.-2023	27-oct.-2028	$ 32.873.600,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	27-oct.-2023	9-dic.-2024	$ 260.000.000,00	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 39-40-101040702 - ANEXO 4 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA INICIO	27-oct.-2023	INICIO AL CONTRATO DE OBRA.						
ORDEN DE INICIO DE OBRA	23-abr.-2024	INICIO DE OBRA POSTERIOR A APROBACIÓN DE DISEÑOS						

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	CONTRATO DE OBRA	PAGO ANTICIPO DE OBRA		30,00%	$ 643.332.674,40	0	$ 643.332.674,40	$ 643.332.674,40	$ 1.501.109.573,60
2									
3									

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

LABORES PRESENTE SEMANA: DURANTE EL PERIODO SE REALIZA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD Y SE CONTINÚA CON LOGÍSTICA DEL CONTRATISTA PARA COMPRA DE MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PARA INICIO EN OBRA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2024**.** EN LA PRESENTE SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA.

OBSERVACIONES: No se presentan para el presente periodo.

Elaborado por:

NOMBRE: ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	NOMBRE: JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA ARQUITECTO SUPERVISOR MUNICIPIO DE TURMEQUÉ

9. REGISTRO FOTOGRAFICO












Interior	**INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA** **INTEROBRAS SC S.A.S** **PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ**	
Versión: 01		**Página 1 de 6**

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 4			**MES: MAYO**	**FECHA DE INFORME**
CONTRATO No	LP 03-2023	**OBJETO:**	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ	**13-may-24 al 19-may-24**
INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA:** ING. JONATHAN A. ROJAS H.	**RESIDENTE DE OBRA:** ING. DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO	

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

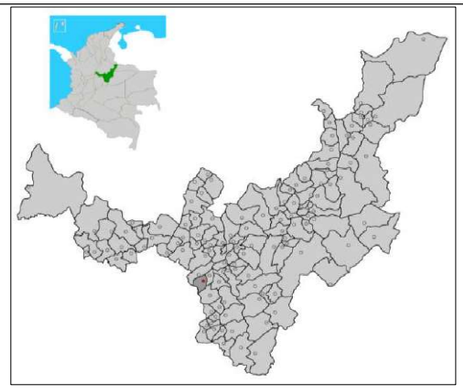




2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 22 de septiembre de 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 2.144.442.248,00
FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023	**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	N/A
FECHA APROBACIÓN INICIO DE OBRA:	martes, 23 de abril de 2024	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	OCHO (8) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA:	TRES (3) MESES	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	lunes, 26 de agosto de 2024
PRORROGA Nº 1:	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	miércoles, 17 de julio de 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 2.144.442.248,00	**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 643.332.674,40
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS:	$ 164.368.000,00	**VALOR DE OBRA:**	$ 1.980.073.076,00
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR	**REPRESENTANTE LEGAL:**	ING. JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS
PLAZO TRANSCURRIDO OBRA:	27 DíAS	**PLAZO RESTANTE OBRA:**	59 DÍAS

EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,70%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	0,70%	**PROGRAM. SEMANA**	0,24%	**PROGRAM. ACUMULADO**	1,12%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 13.801.109	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 13.801.109	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 4.804.197	**PROGRAM FINANC ACUMULADO**	$ 22.182.470

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

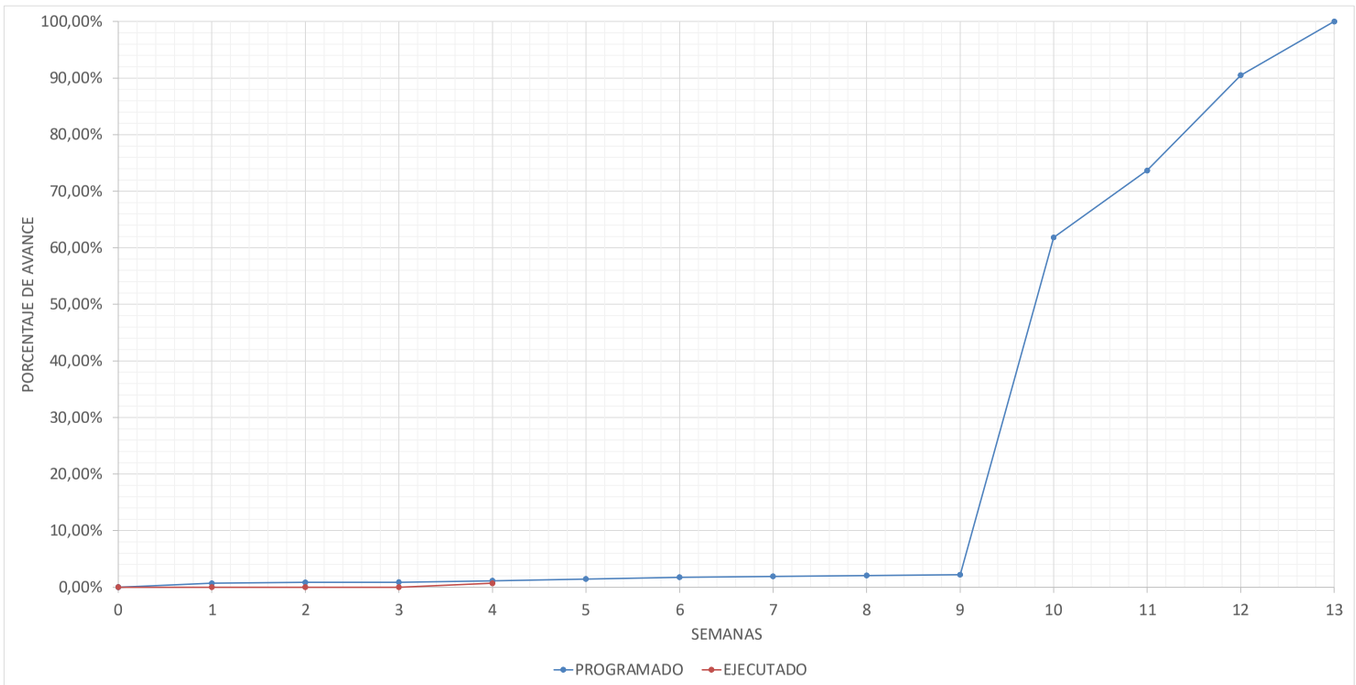

VALOR PROGRAMADO POR MES ACUMULADO							
23 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 13.796.176,00	0,70%		01 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 34.681.602,00	1,75%	
01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	$ 1.224.389.617,00	61,84%		01 AL 17 DE JULIO DE 2024	$ 1.980.073.076,00	100,00%	

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

CONTRATO INICIAL

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0	PRELIMINARES			
0,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	$ 10.312.038,00		$ 10.312.038,00
B	EDIFICIO DE SERVICIOS			$ 0,00
1,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	$ 304.200,00		$ 304.200,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00

AVANCE ACTUAL	0,70%	SUBTOTAL	$ 10.616.238	$ -	$ 10.616.238
		A.I.U (30%)	$ 3.184.871	$ -	$ 3.184.871
		VALOR TOTAL OBRA	$ 13.801.109	$ -	$ 13.801.109
PROGRAMADO	1,12%	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 133.138.080	$ -	$ 133.138.080
		IVA (19%)	$ 31.229.920	$ -	$ 31.229.920
		VALOR TOTAL DISEÑOS	$ 164.368.000	$ -	$ 164.368.000
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	-0,42%	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 178.169.109	$ -	$ 178.169.109

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	$ 214.444.224,80	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101155606 - ANEXO 3 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	$ 643.332.674,40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	27-oct.-2023	9-oct.-2027	$ 107.222.112,40	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	ACTA RECIBO	5 AÑOS	$ 214.444.224,80	
CALIDAD DEL SERVICIO	SI	27-oct.-2023	27-oct.-2028	$ 32.873.600,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	27-oct.-2023	9-dic.-2024	$ 260.000.000,00	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 39-40-101040702 - ANEXO 4 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA INICIO	27-oct.-2023	INICIO AL CONTRATO DE OBRA.						
ORDEN DE INICIO DE OBRA	23-abr.-2024	INICIO DE OBRA POSTERIOR A APROBACIÓN DE DISEÑOS						

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	CONTRATO DE OBRA	PAGO ANTICIPO DE OBRA		30,00%	$ 643.332.674,40	0	$ 643.332.674,40	$ 643.332.674,40	$ 1.501.109.573,60
2									
3									

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

LABORES PRESENTE SEMANA: SE REALIZA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL. SE INICIAL EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS. SE CONTINÚA POR PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON EL RETIRO DE MATERIAL DE CAPA VEGETAL DEL PREDIO. ACTIVIDAD QUE SE REALIZA CON LA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ Y LAS VOLQUETAS DEL CONTRATISTA. SE REALIZA LA INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA VERDE. SE REALIZA ACOPIO DE MATERIALES DE ARENA, GRAVILLA Y AFIRMADO.

OBSERVACIONES: CON LA ACTIVIDAD DE RETIRO DE LA CAPA VEGETAL QUE SE ENCUETRA EN EL COSTADO SUR OCCIDENTAL DEL PREDIO, SE ENCUENTRA QUE EL ESPESOR EN ALGUNOS LUGARES ES MAYOR A LOS 60 CM PREVISTOS EN EL APIQUE DEL ESTUDIO DE SUELOS. SE DEBE REALIZAR EL RETIRO DE TODA LA CAPA VEGETAL HASTA LLEGAR A LA ARCILLA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE SUELOS.

Elaborado por:

NOMBRE: ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	NOMBRE: JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA ARQUITECTO SUPERVISOR MUNICIPIO DE TURMEQUÉ


9. REGISTRO FOTOGRAFICO









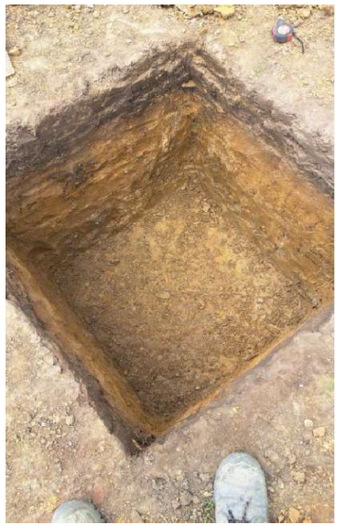










Interior	**INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA** **INTEROBRAS SC S.A.S** **PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B , EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ**	
Versión: 01		**Página 1 de 6**

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 5			**MES: MAYO**	**FECHA DE INFORME**
CONTRATO No	LP 03-2023	**OBJETO:**	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ	**20-may-24 al 26-may-24**

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA:** ING. JONATHAN A. ROJAS H.	**RESIDENTE DE OBRA:** ING. DIEGO FERNANDO MONTAÑA TAMAYO

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

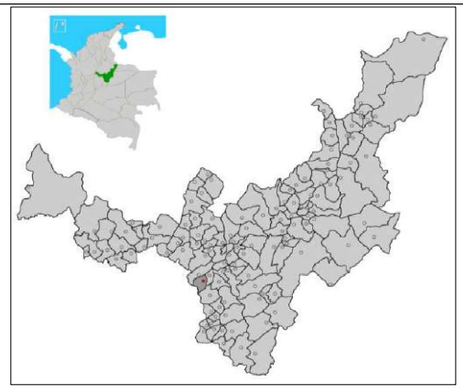




2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 22 de septiembre de 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 2.144.442.248,00
FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023	**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	N/A
FECHA APROBACIÓN INICIO DE OBRA:	martes, 23 de abril de 2024	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	OCHO (8) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA:	TRES (3) MESES	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	lunes, 26 de agosto de 2024
PRORROGA Nº 1:	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	miércoles, 17 de julio de 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 2.144.442.248,00	**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 643.332.674,40
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS:	$ 164.368.000,00	**VALOR DE OBRA:**	$ 1.980.073.076,00
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR	**REPRESENTANTE LEGAL:**	ING. JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS
PLAZO TRANSCURRIDO OBRA:	34 DíAS	**PLAZO RESTANTE OBRA:**	52 DÍAS

EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,95%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	1,65%	**PROGRAM. SEMANA**	0,32%	**PROGRAM. ACUMULADO**	1,44%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 18.818.811	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 32.619.920	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 6.281.033	**PROGRAM FINANC ACUMULADO**	$ 28.463.503

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

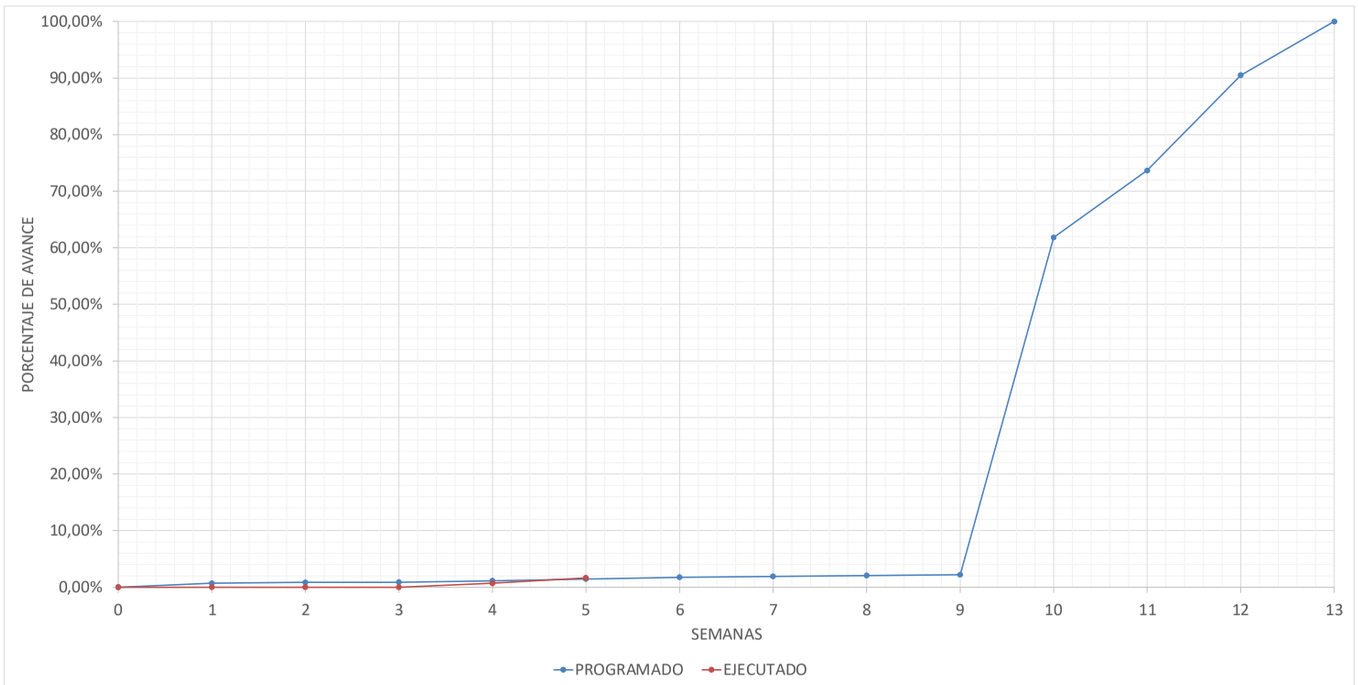

VALOR PROGRAMADO POR MES ACUMULADO							
23 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 13.796.176,00	0,70%		01 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 34.681.602,00	1,75%	
01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	$ 1.224.389.617,00	61,84%		01 AL 17 DE JULIO DE 2024	$ 1.980.073.076,00	100,00%	

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

CONTRATO INICIAL

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0	**PRELIMINARES**			
0,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO		$ 10.312.038,00	**$ 10.312.038,00**
B	**EDIFICIO DE SERVICIOS**			**$ 0,00**
1,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	$ 653.664,96	$ 304.200,00	**$ 957.864,96**
1,3	CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA	$ 1.352.906,00		**$ 1.352.906,00**
2,3	SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM	$ 755.173,02		**$ 755.173,02**
2,6	CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS	$ 209.384,19		**$ 209.384,19**
4,1	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	$ 11.504.880,00		**$ 11.504.880,00**
				$ 0,00

AVANCE ACTUAL	**1,65%**	SUBTOTAL	**$ 14.476.008**	**$ 10.616.238,00**	**$ 25.092.246**
		A.I.U (30%)	**$ 4.342.802**	**$ 3.677.464,84**	**$ 7.527.674**
		VALOR TOTAL OBRA	**$ 18.818.811**	**$ 14.293.702,84**	**$ 32.619.920**
PROGRAMADO	**1,44%**	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 133.138.080	$ 304.200,00	$ 133.138.080
		IVA (19%)	$ 31.229.920	$ 105.374,88	$ 31.229.920
		VALOR TOTAL DISEÑOS	**$ 164.368.000**	**$ 409.574,88**	**$ 164.368.000**
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	**0,21%**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**$ 183.186.811**	**$ 514.949,76**	**$ 196.987.920**

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	$ 214.444.224,80	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101155606 - ANEXO 3 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SI	27-oct.-2023	9-feb.-2025	$ 643.332.674,40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	27-oct.-2023	9-oct.-2027	$ 107.222.112,40	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	ACTA RECIBO	5 AÑOS	$ 214.444.224,80	
CALIDAD DEL SERVICIO	SI	27-oct.-2023	27-oct.-2028	$ 32.873.600,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	27-oct.-2023	9-dic.-2024	$ 260.000.000,00	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 39-40-101040702 - ANEXO 4 ACTUALIZACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA INICIO	27-oct.-2023	INICIO AL CONTRATO DE OBRA.						
ORDEN DE INICIO DE OBRA	23-abr.-2024	INICIO DE OBRA POSTERIOR A APROBACIÓN DE DISEÑOS						

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	CONTRATO DE OBRA	PAGO ANTICIPO DE OBRA		30,00%	$ 643.332.674,40	0	$ 643.332.674,40	$ 643.332.674,40	$ 1.501.109.573,60
2									
3									

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

LABORES PRESENTE SEMANA: SE CONTINÚA POR PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON EL RETIRO DE MATERIAL DE CAPA VEGETAL DEL PREDIO, ACTIVIDAD QUE SE REALIZA CON LA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ Y LAS VOLQUETAS DEL CONTRATISTA. SE CONTINÚA CON LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS Y VIGAS. SE FUNDE CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPA PARA EL ÁREA DE LAS 8 ZAPATAS DEL EDIFICIO DE SERVICIOS, CON UNA ALTURA DE 25 CM. SE FUNDE CONCRETO DE SOLADO PARA EL ÁREA DE LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN. SE REALIZA AMARRE DE ACERO DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS DE ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS DEL EDIFICIO DE SERVICIOS.

OBSERVACIONES: DEBIDO A QUE NO SE COMPLETÓ EL DESCAPOTE DEL ÁREA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS PREVIO AL INICIO DE ACTIVIADES DEL CONTRATISTA, HUBO UN AUMENTO LEVE EN LA ALTURA DE EXCAVACIÓN PARA LOS ELEMENTOS DE ZAPATAS Y VIGAS. SE REALIZA CONVOCATORIA POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL SECTOR, MEDIANTE ANUNCIO EN EL INGRESO A LA OBRA Y CARTELERA MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA. SE RECIBE EN OBRA TODO EL MATERIAL DE TUBERÍA DE PVC.

Elaborado por:

NOMBRE: ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	NOMBRE: JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA ARQUITECTO SUPERVISOR MUNICIPIO DE TURMEQUÉ

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

























REPROGRAMACIONES

OBRA


PRELIMINARES	**3 días**	**mié 24/04/24**	**vie 26/04/24**
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	3 días	mié 24/04/24	vie 26/04/24
EDIFICACIÓN ÁREA POLIVALENTE	**50 días**	**sáb 27/04/24**	**mié 3/07/24**
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**22 días**	**sáb 27/04/24**	**lun 27/05/24**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	10 días	sáb 27/04/24	vie 10/05/24
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	sáb 27/04/24	sáb 4/05/24
CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA	10 días	mar 14/05/24	lun 27/05/24
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	7 días	sáb 4/05/24	mar 14/05/24
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	7 días	sáb 4/05/24	mar 14/05/24
ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN	**30 días**	**mar 14/05/24**	**vie 21/06/24**
SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM	5 días	mar 14/05/24	lun 20/05/24
ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	15 días	lun 27/05/24	sáb 15/06/24
VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA	10 días	sáb 8/06/24	vie 21/06/24
CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS	5 días	lun 17/06/24	vie 21/06/24
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**2 días**	**sáb 22/06/24**	**mar 25/06/2**
COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLYE FORMALETA METÁLICA	1 día	sáb 22/06/24	lun 24/06/24
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM	1 día	lun 24/06/24	mar 25/06/24
MURO EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN ZARPA 45X20 CM, Y MURO 40X12 CM, PARA TARIMA Y/O GRADAS	1 día	sáb 22/06/24	lun 24/06/24
ESTRUCTURAS EN ACERO	**28 días**	**mar 21/05/24**	**mié 26/06/2**
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	25 días	mar 21/05/24	vie 21/06/24
MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS	1 día	lun 24/06/24	mar 25/06/2
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	1 día	lun 24/06/24	mar 25/06/24
PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE, INCLUYE ANTICORROSIVO	1 día	mar 25/06/24	mié 26/06/24
MAMPOSTERÍA	**4 días**	**mar 25/06/24**	**sáb 29/06/2**
MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, E=12 CM	1 día	mar 25/06/24	mié 26/06/24
DOVELAS EN MORTERO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/2" Y GRAFIL 4MM	1 día	mar 25/06/24	mié 26/06/24
ANCLAJE PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, INCLUYE SIKA ANCHORFIX-4 O SIMILAR Y VARILLA DE ANCLAJE 1/2", L=30 CM	1 día	mar 25/06/24	mié 26/06/24
MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, SECCIÓN 12X24 CM	1 día	mié 26/06/24	jue 27/06/24
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA CULATAS	1 día	jue 27/06/24	vie 28/06/24
PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	1 día	vie 28/06/24	sáb 29/06/24
MURO PRENSADO LIVIANO PARA GRADERÍAS EDIFICIO POLIVALENTE, E=12 CM, A=45 CM, H=35 CM, INCLUYE DOVELAS	1 día	mar 25/06/24	mié 26/06/24
PISOS Y ENCHAPES	**2 días**	**vie 28/06/24**	**mar 2/07/24**
PISO EN CONCRETO DE 21 MPA ENDURECIDO, E=5CM, CON SIKAFLOOR-3 QUARTZTOP O EQUIVALENTE, CON ACABADO LLANEADO. INCLUYE SELLADO Y BRILLADO	1 día	vie 28/06/24	sáb 29/06/24

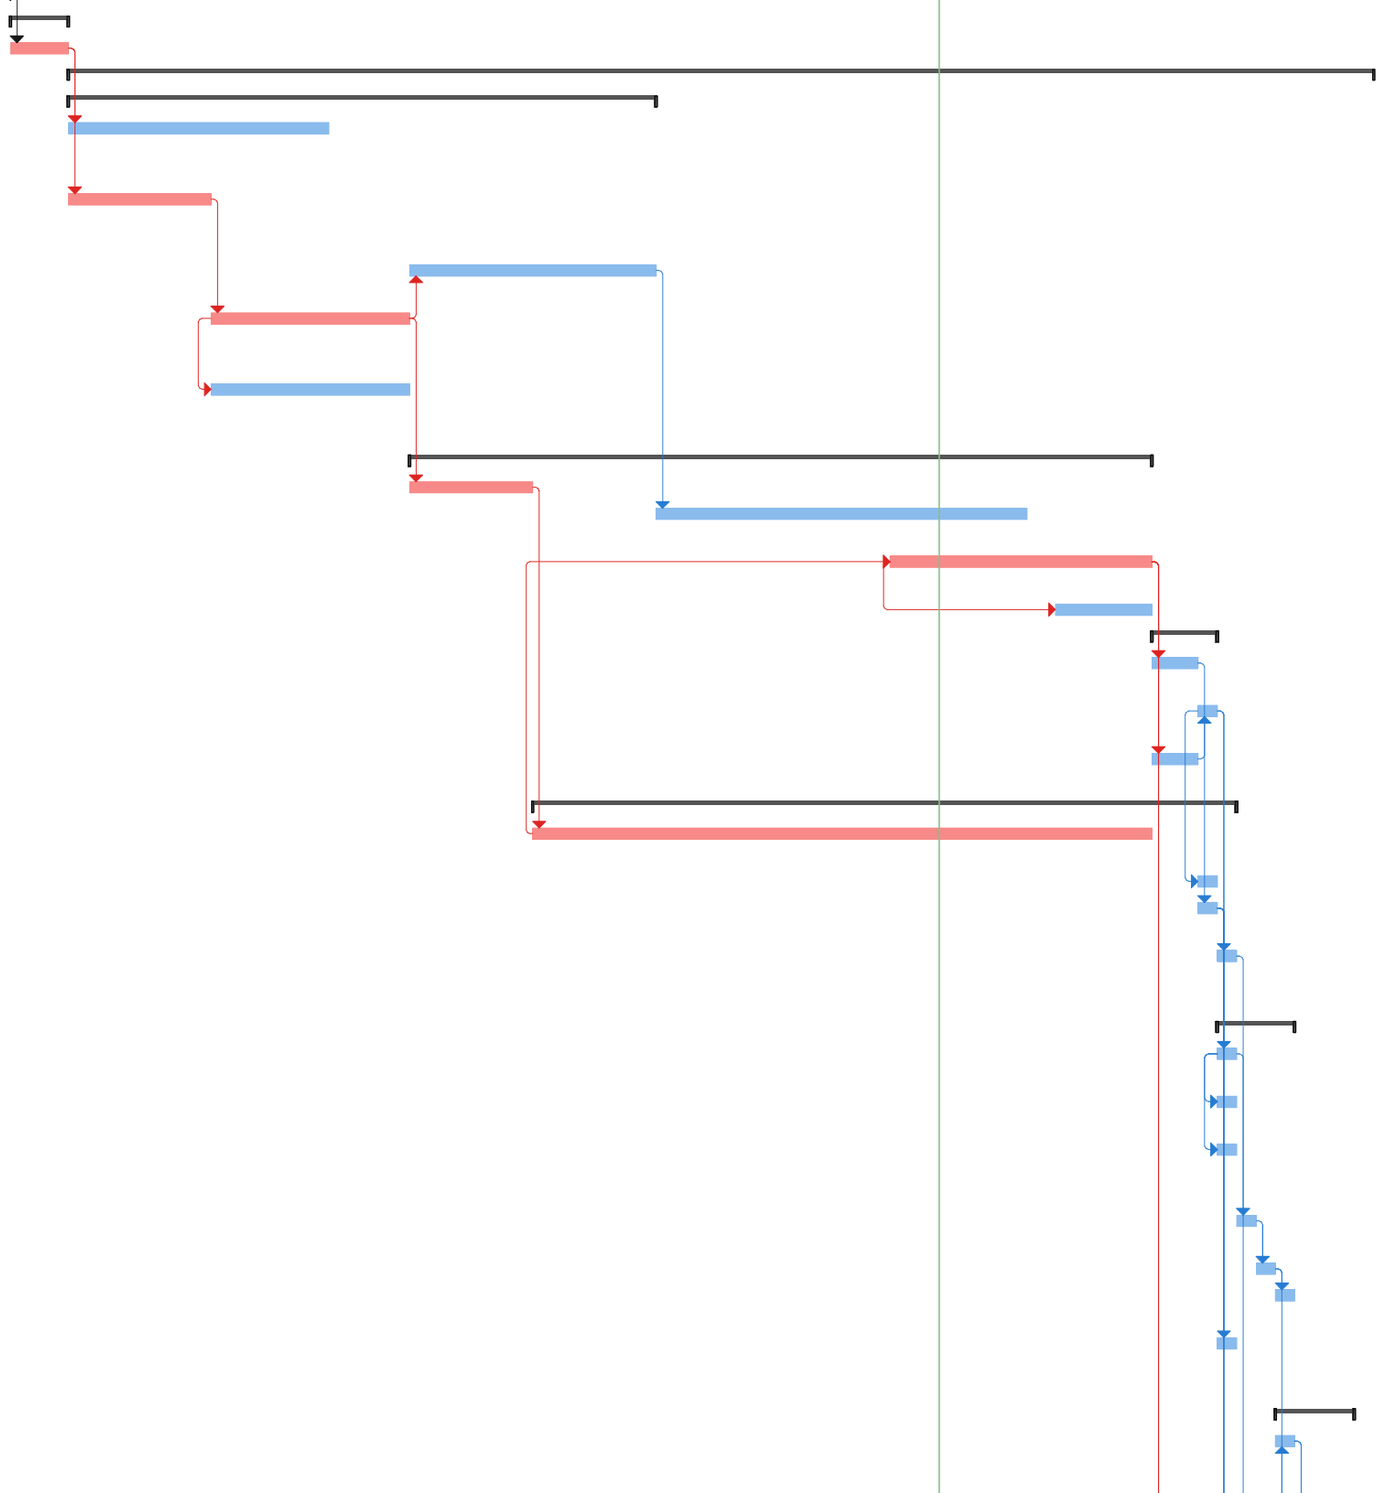


INSTALACIONES ELECTRICAS	**3 días**	**vie 28/06/24**	**mié 3/07/24**
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON PUERTA CAHAPA Y TOTALIZADOR PARA TPL Y TEC	1 día	vie 28/06/24	sáb 29/06/24
SALIDA DE ALUMBRADO CON ITERRUPCION SENCILLA CONMUTABLE Y/O SENSOR	1 día	sáb 29/06/24	mar 2/07/24
LUMINARIA DE LEDS HIGH BAY DE 100W-220V	1 día	mar 2/07/24	mié 3/07/24
LAMPARA WALLPACK LEDS 30W 100-270V PARA INTEMPERIE	1 día	mar 2/07/24	mié 3/07/24
TOMACORRIENTE BIFASICA 240V-20A TIPO INDUSATRIAL	1 día	mar 2/07/24	mié 3/07/24
TOMACORRIENTE GENERAL DOBLE 127V-15 CON POLO A TIERRA	1 día	mar 2/07/24	mié 3/07/24
LAMPARA DE EMERGENCIA DE DOS FOCOS ESCUALIZABLES Y LETRERO DE SALIDA 4,2W CON AUTONOMIA DE UNA HORA	1 día	mar 2/07/24	mié 3/07/24
CUBIERTA	**2 días**	**mié 26/06/24**	**vie 28/06/24**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ESPAÑOLA PARA CUBIERTA EDIFICIO POLIVALENTE, INCLUYE ANDAMIO A DOBLE ALTURA Y DESPERDICIO CIRCULAR.	1 día	mié 26/06/24	jue 27/06/24
CIELO RASO EN DRYWALL 1/2", INCLUYE PINTURA	1 día	jue 27/06/24	vie 28/06/24
CLARABOYA EN VIDRIO LAMINADO 4+4 PARA CUBIERTA	1 día	jue 27/06/24	vie 28/06/24
CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA	**1 día**	**mar 25/06/24**	**mié 26/06/24**
CORTASOLES EN PERFIL METÁLICO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	1 día	mar 25/06/24	mié 26/06/24
EDIFICIO DE SERVICIOS	**17 días**	**sáb 22/06/24**	**sáb 13/07/24**
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**8 días**	**sáb 22/06/24**	**mié 3/07/24**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	8 días	sáb 22/06/24	mié 3/07/24
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	sáb 22/06/24	vie 28/06/24
CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA	1 día	sáb 29/06/24	mar 2/07/24
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	1 día	vie 28/06/24	sáb 29/06/24
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	1 día	vie 28/06/24	sáb 29/06/24
ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN	**5 días**	**mar 2/07/24**	**lun 8/07/24**
SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM	1 día	mié 3/07/24	jue 4/07/24
ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	1 día	mar 2/07/24	mié 3/07/24
VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA	2 días	mié 3/07/24	vie 5/07/24
CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS	2 días	vie 5/07/24	lun 8/07/24
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**3 días**	**vie 5/07/24**	**mar 9/07/24**
COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLYE FORMALETA METÁLICA	1 día	vie 5/07/24	sáb 6/07/24
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM	1 día	sáb 6/07/24	lun 8/07/24
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 20X30 CM	1 día	sáb 6/07/24	lun 8/07/24
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
PLACA MACIZA AÉREA PARA TANQUE, EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
ESTRUCTURAS EN ACERO	**7 días**	**mié 3/07/24**	**jue 11/07/24**
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	5 días	mié 3/07/24	mar 9/07/24
MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS	1 día	sáb 6/07/24	lun 8/07/24
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24

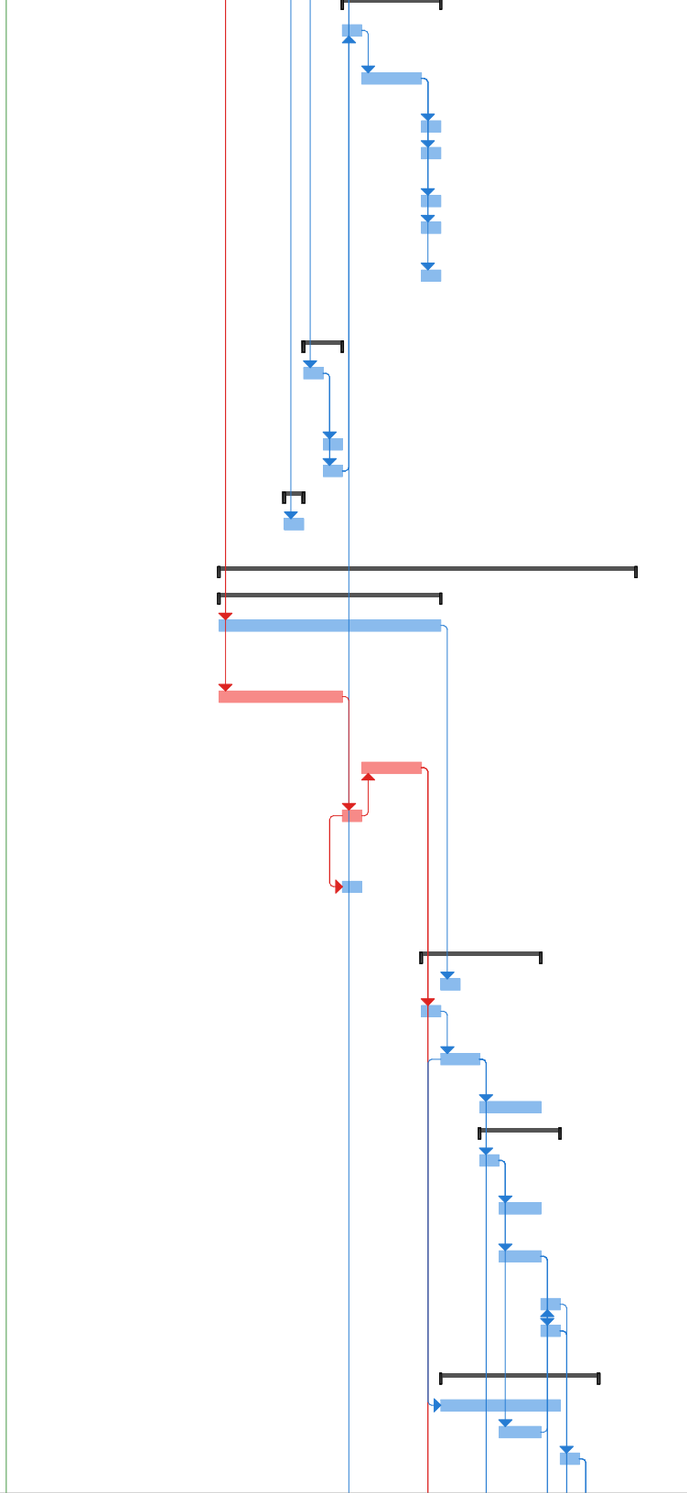


MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, E=12 CM	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
ENCHAPADO DE COLUMNAS Y VIGAS EN LADRILLO PRENSADO	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=14 CM, PARA CULATAS	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
DOVELAS EN MORTERO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/2" Y	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
ANCLAJE PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, INCLUYE SIK	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, SECCIÓN	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
DILATANCIONES DE MAMPOSTERÍA CON ELEMENTOS ESTRUC	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA CULATAS	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
PAÑETE 1:4 PARA INTERIORES	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE PARA MESONES EN CON	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
PISOS Y ENCHAPES	**3 días**	**mar 9/07/24**	**vie 12/07/24**
ALISTADO Y NIVELADO DE PISOS CON MORTERO 1:3, E=4 CM	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
PISO DE TRÁFICO INSTITUCIONAL REF. DUROPISO BLANCO, FO	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
GUARDA ESCOBA EN ENCHAPE CERÁMICO TIPO DUROPISO O S	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
ENCHAPE CERÁMICO PARA MUROS ÁREA DE BAÑOS Y COCINETA, FORMATO 30X75 O SIMILAR	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
WIN METÁLICO PARA ESQUINAS	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	**3 días**	**mar 9/07/24**	**vie 12/07/24**
TUBERÍA DE PRESIÓN 1-1/2" RDE 21	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" RDE 11	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" RDE 9	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1-1/2"	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1/2"	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
REGISTRO DE CORTE 1"	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
REGISTRO DE CORTE 1/2"	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
TAPA REGISTROS PLÁSTICO 20X20 CM	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
CODO PRESIÓN 1-1/2"	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
REDUCCIÓN PRESIÓN 1-1/2" A 3/4"	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
LLAVE DE JARDÍN	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	**6 días**	**vie 5/07/24**	**vie 12/07/24**
TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	1 día	vie 5/07/24	sáb 6/07/24
TUBERÍA PVC SANITARIA 2"	1 día	vie 5/07/24	sáb 6/07/24
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA SANITARIA 4", INCL	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
CODO SANITARIO 4"	1 día	vie 5/07/24	sáb 6/07/24
YEE REDUCIDA 4"X2" SANITARIA	1 día	vie 5/07/24	sáb 6/07/24
YEE 4" SANITARIA	1 día	vie 5/07/24	sáb 6/07/24
SIFÓN 2"	1 día	vie 5/07/24	sáb 6/07/24
SIFÓN 4"	1 día	vie 5/07/24	sáb 6/07/24
REJILLA METÁLICA PARA SIFÓN 3"X2"	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
REJILLA METÁLICA PARA SIFÓN 6"X4"	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
REJILLA CUPULA TRAGANTE 6"X4" METÁLICA PARA BAJANTES	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	**2 días**	**jue 11/07/24**	**sáb 13/07/24**
SALIDA DE ALUMBRADO CON ITERRUPCION SENCILLA CONMUTABLE Y/O SENSOR	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
PANEL REDODNDO DE LEDS 18W-120V	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
TOMACORRIENTE BIFASICA 240V-20A TIPO INDUSATRIAL	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
TOMACORRIENTE GENERAL DOBLE 127V-15 CON POLO A TIERRA	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
TOMACORRIENTE GENERAL DOBLE 127V-15 CON POLO A TIERRA AUTOPROTEGIDOTIPO GFCI	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ESPAÑOLA PARA CUBIERTA EDIFICIO DE SERVICIOS Y COMPLEMENTARIA	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
CIELO RASO EN DRYWALL 1/2", INCLUYE PINTURA	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, INCLUYE ANTIC	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM, INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
APARATOS SANITARIOS Y MESONES	**2 días**	**mié 10/07/24**	**vie 12/07/24**
TAZA ADRIATICA ENTRADA POSTERIOR CON GRIFERÍA ANTIVA	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
SANITARIO INSTITUCIONAL CON TANQUE TIPO AQUAPRO	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
ORINAL MEDIANO CON GRIFERÍA TRADICIONAL	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
MESÓN EN CONCRETO A=60 CM, INCLUYE ABERTURA DE HUE	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
LAVANAMOS DE SOBREPONER TIPO MARSELLA O SIMILAR, INC	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
KIT BARRAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
DISPENSADOR DE JABÓN DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABI	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
PORTA ROLLO CON CUBREROLLO METAL ACCESORIO BAÑO	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
DISPENSADOR DE TOALLAS EN ACERO INOXIDABLE	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 50X40 CM, INCLUYE GRIF	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA	**1 día**	**jue 11/07/24**	**vie 12/07/24**
PUERTA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO Y VIDRIO LAMI	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
VENTANAS EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO Y VIDRIO LAI	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
PUERTA CON PERSIANA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO,	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE PIS	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
EDIFICIO COMPLEMENTARIO	**13 días**	**mar 2/07/24**	**mié 17/07/24**
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**3 días**	**mar 2/07/24**	**vie 5/07/24**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARG	1 día	mar 2/07/24	mié 3/07/24
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CAR	1 día	mar 2/07/24	mié 3/07/24
CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 M	1 día	jue 4/07/24	vie 5/07/24
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTAD	1 día	mié 3/07/24	jue 4/07/24
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DE	1 día	mié 3/07/24	jue 4/07/24
ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN	**5 días**	**mié 3/07/24**	**mar 9/07/24**
SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM	1 día	mié 3/07/24	jue 4/07/24
ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	1 día	vie 5/07/24	sáb 6/07/24
VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA	1 día	sáb 6/07/24	lun 8/07/24
CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**3 días**	**lun 8/07/24**	**jue 11/07/24**
COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLYE FORMALETA METÁLICA	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
MURO EN CONCRETO PARA ACTIVIDAD DE ESCALADA, E=15CM	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
ESTRUCTURAS EN ACERO	**5 días**	**sáb 6/07/24**	**vie 12/07/24**
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	1 día	sáb 6/07/24	lun 8/07/24
MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE, INCLUYE ANTICORROSIVO	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
MAMPOSTERÍA	**3 días**	**mié 10/07/24**	**sáb 13/07/24**
MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, E=12 CM	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
ENCHAPADO DE COLUMNAS Y VIGAS EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=14 CM, PARA CULATAS	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24

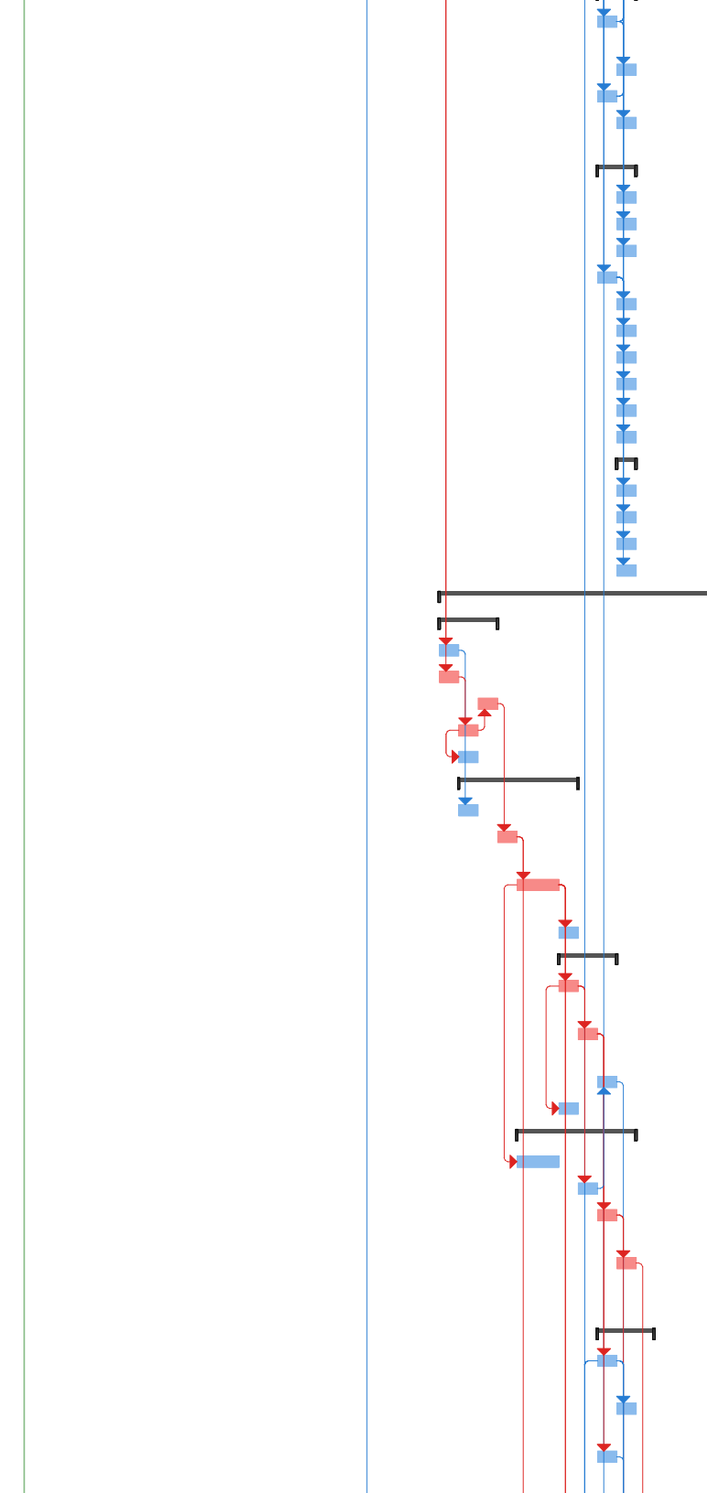


PAÑETE 1:4 PARA INTERIORES	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
PISOS Y ENCHAPES	**3 días**	**jue 11/07/24**	**lun 15/07/24**
ALISTADO Y NIVELADO DE PISOS CON MORTERO 1:3, E=4 CM	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
PISO DE TRÁFICO INSTITUCIONAL REF. DUROPISO BLANCO, FO	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
GUARDA ESCOBA EN ENCHAPE CERÁMICO TIPO DUROPISO O S	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	**3 días**	**mié 10/07/24**	**sáb 13/07/24**
APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 20	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTA	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" RDE 9	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1/2"	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
LLAVE DE JARDÍN	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	**6 días**	**lun 8/07/24**	**lun 15/07/24**
TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA SANITARIA 4", INCL	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
SIFÓN 4"	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
REJILLA METÁLICA PARA SIFÓN 6"X4"	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
REJILLA CUPULA TRAGANTE 6"X4" METÁLICA PARA BAJANTES	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	**3 días**	**lun 15/07/24**	**mié 17/07/24**
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON PUERTA CAHAPA Y TOTALIZADOR PARA TPL Y TEC	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
APERTURA DE ZANJA 0,25*0,65M TENDIDO DE 2 DUCTOS PVC	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
ALAMBRADO DE DUCTO CON 3F*10+1N*10+1T*12 CU AWG T	1 día	mar 16/07/24	mar 16/07/24
SALIDA DE ALUMBRADO CON ITERRUPCION SENCILLA CONMUTABLE Y/O SENSOR	1 día	mar 16/07/24	mar 16/07/24
PANEL REDODNDO DE LEDS 18W-120V	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/24
TOMACORRIENTE GENERAL DOBLE 127V-15 CON POLO A TIER	1 día	mar 16/07/24	mar 16/07/24
LAMPARA DE EMERGENCIA DE DOS FOCOS ESCUALIZABLES Y LETRERO DE SALIDA 4,2W CON AUTONOMIA DE UNA HORA	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/24
CUBIERTA	**3 días**	**jue 11/07/24**	**lun 15/07/24**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ESPAÑOLA PARA CUBIERTA EDIFICIO DE SERVICIOS Y COMPLEMENTARIA	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
CIELO RASO EN DRYWALL 1/2", INCLUYE PINTURA	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, INCLUYE ANTIC	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM, INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA	**1 día**	**lun 15/07/24**	**lun 15/07/24**
PUERTA PLEGABLE COMPUESTA POR 3 HOJAS, BATIENES PLEGABLES, 1 HOJA BATIENTE, A=1M, H= 2,15M, EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO Y VIDRIO LAMINADO 3+3	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
VENTANAS EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO Y VIDRIO LAMINADO 3+3, FIJA Y/O PROYECTANTE	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
GIMNASIO BIOSALUDABLE	**8 días**	**lun 8/07/24**	**mié 17/07/24**
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**5 días**	**lun 8/07/24**	**sáb 13/07/24**
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ÁREAS PEATONALES, PISTA DE TROTE Y ADOQUÍN ECOLÓGICO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24

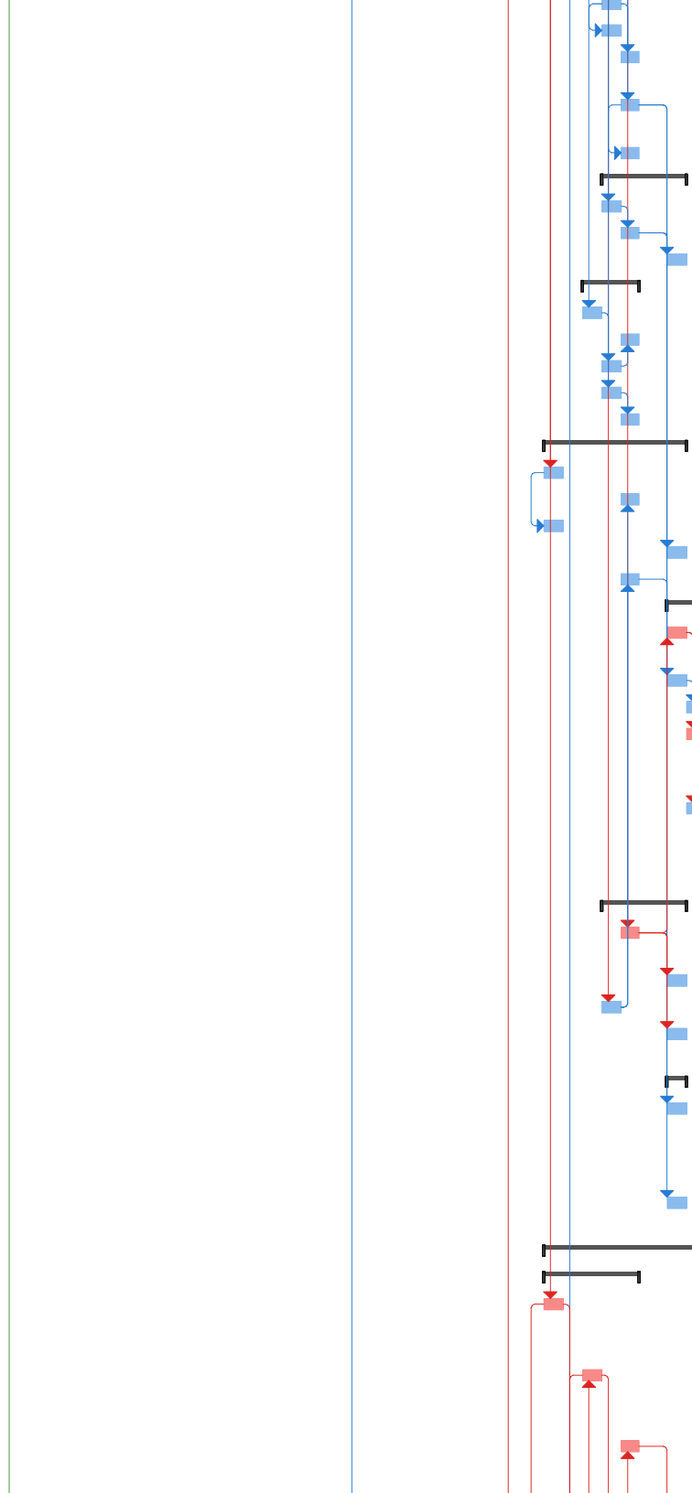


URBANISMO	**4 días**	**jue 11/07/24**	**mar 16/07/2**
PLACA EN ADOQUÍN ECOLÓGICO 30X30X6 CM	1 día	mar 16/07/24	mar 16/07/2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
EQUIPAMIENTOS PARA PARQUE Y GIMNASIO	**1 día**	**mié 17/07/24**	**mié 17/07/2**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PONY REMO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAS PARALELAS. INCLUYE TO	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO GIRO DE CADERA Y TW	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMINADOR AÉREO. INCLUYE TC	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/2
PISTA DE TROTE	**7 días**	**lun 8/07/24**	**mar 16/07/2**
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**4 días**	**lun 8/07/24**	**vie 12/07/24**
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ÁREAS PEATONALES, PISTA DE TROTE Y ADOQUÍN ECOLÓGICO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DE	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
URBANISMO	**5 días**	**mié 10/07/24**	**mar 16/07/2**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
CARPETA ASFÁLTICA EN MEZCLA TIPO MDC-19, COMPACTADA	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
RECUBRIMIENTO TRU-FLEX ANTIDESLIZANTE SINTÉTICO 100% ACRÍLICO PARA ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. SISTEMA DE 3 CAPAS UNA BASE DE CUARZO Y DOS CAPAZ DE TRU-FLEX DE COLOR.	1 día	mar 16/07/24	mar 16/07/24
ZONA DE JUEGOS INFANTILES	**12 días**	**vie 28/06/24**	**sáb 13/07/24**
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**3 días**	**vie 28/06/24**	**mié 3/07/24**
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	vie 28/06/24	sáb 29/06/24
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	1 día	mar 2/07/24	mié 3/07/24
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DE	1 día	mar 2/07/24	mié 3/07/24
ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN	**1 día**	**sáb 6/07/24**	**lun 8/07/24**
CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS	1 día	sáb 6/07/24	lun 8/07/24
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**1 día**	**mar 9/07/24**	**mié 10/07/2**
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
ESTRUCTURAS EN ACERO	**1 día**	**lun 8/07/24**	**mar 9/07/24**
MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	**7 días**	**mié 3/07/24**	**jue 11/07/24**
APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 40X60 CM	1 día	mié 3/07/24	jue 4/07/24
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO	1 día	vie 5/07/24	sáb 6/07/24
TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	1 día	jue 4/07/24	vie 5/07/24
CODO SANITARIO 4"	1 día	jue 4/07/24	vie 5/07/24
YEE REDUCIDA 6"X4" SANITARIA	1 día	jue 4/07/24	vie 5/07/24
SIFÓN 4"	1 día	jue 4/07/24	vie 5/07/24
REJILLA METÁLICA PARA SIFÓN 6"X4"	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA	**1 día**	**mié 10/07/24**	**jue 11/07/24**

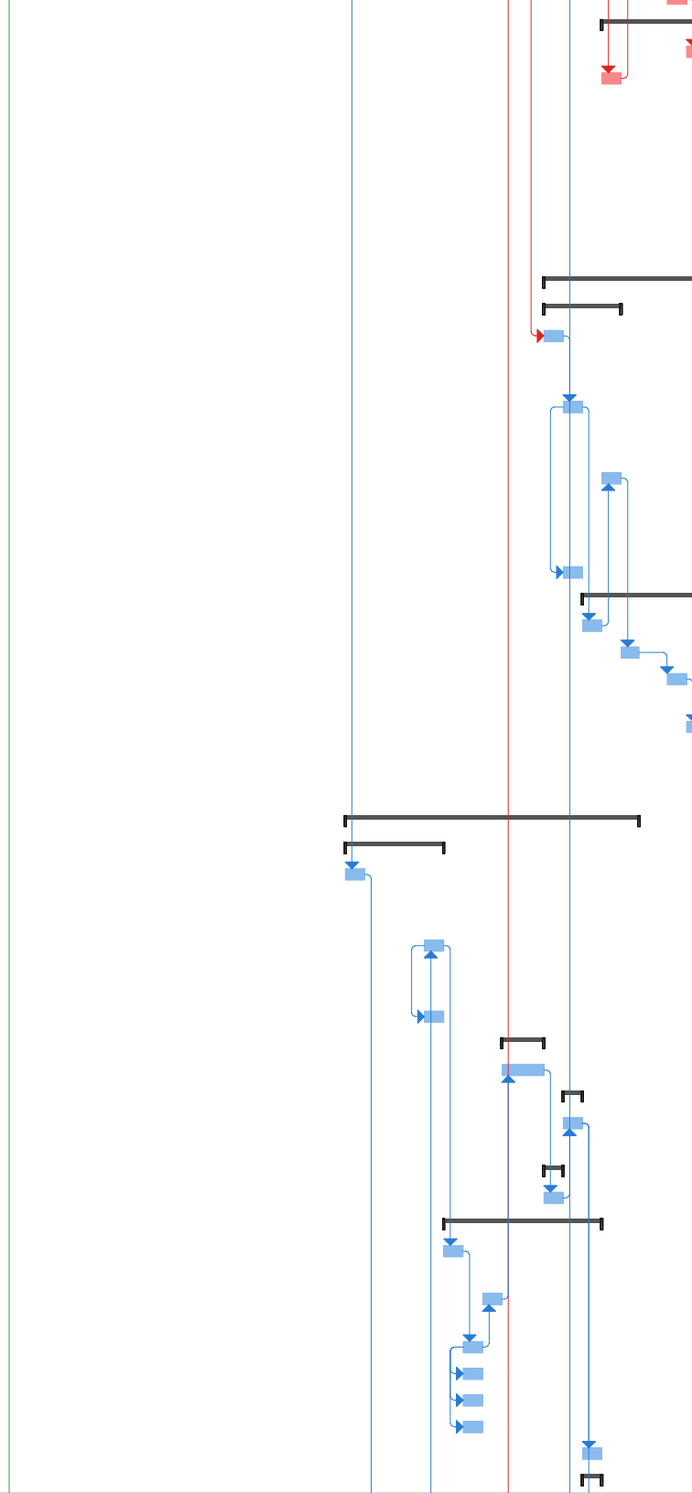


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80	1 día	sáb 29/06/24	mar 2/07/24
RECUBRIMIENTO EN SISTEMA EN CAUCHO GRANULADO, BASE SBR Y RECUBRIMIENTO EPDM GRANULADO	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
EQUIPAMIENTOS PARA PARQUE Y GIMNASIO	**1 día**	**vie 12/07/24**	**sáb 13/07/24**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CULUMPIO MULTIPLE PARA 9 USUARIOS	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
MODULO MUELLE BALSA, CAP. 6 USUARIOS	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORRE PUENTE DESLIZADERO	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SET DE 100 PRESAS PARA MURO DE ESCALADA INFANTIL	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
URBANISMO	**9 días**	**sáb 6/07/24**	**mié 17/07/24**
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**4 días**	**sáb 6/07/24**	**jue 11/07/24**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	sáb 6/07/24	lun 8/07/24
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ÁREAS PEATONALES, PISTA DE TROTE Y ADOQUÍN	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DE	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN	**3 días**	**lun 8/07/24**	**jue 11/07/24**
FILTRO FRÁNCES 1,2 x 0,5 M, CONTIENE GEOTEXTIL NT-2500 Y GRAVA GRUESA D= 1" A 1-1/2", TUBERÍA PERFORADA D=4" Y EXCAVACIÓN MANUAL	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
GEOTEXTIL NT-2500 PARA SEPARACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIALES GRANULARES	1 día	lun 8/07/24	mar 9/07/24
ESTRUCTURAS EN ACERO	**1 día**	**lun 15/07/24**	**lun 15/07/24**
MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
MAMPOSTERÍA	**1 día**	**vie 12/07/24**	**sáb 13/07/24**
MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, E=12 CM	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
DOVELAS EN MORTERO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/2" Y	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
ANCLAJE PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, INCLUYE SIK	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	**5 días**	**mar 9/07/24**	**lun 15/07/24**
APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 20X30 CM	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTA	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
DERIVACIÓN DE RED PÚBLICA PARA CONEXIÓN ACOMETIDA D	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
CONEXIÓN MEDIDOR DE 1/2" A ACOMETIDA 1", INCLUYE CAJA	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
TUBERÍA DE PRESIÓN 2" RDE 21	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
TUBERÍA DE PRESIÓN 1-1/2" RDE 21	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
TUBERÍA DE PRESIÓN 1" RDE 21	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" RDE 9	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
CODO PRESIÓN 2"	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
CODO PRESIÓN 1-1/2"	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
CODO PRESIÓN 1"	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
REDUCCIÓN PRESIÓN 2" A 1"	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
REDUCCIÓN PRESIÓN 2" A 1-1/2"	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
TANQUE PLÁSTICO DE 1000 L, TIPO BAJITO, INCLUYE ACCESOR	1 día	mar 9/07/24	mié 10/07/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA DE 2HP, CON	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
REGISTRO DE BOLA DE 2"	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	**4 días**	**mié 10/07/24**	**lun 15/07/24**
APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 40	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1X1X1 M, INCLUYE PAÑ	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24

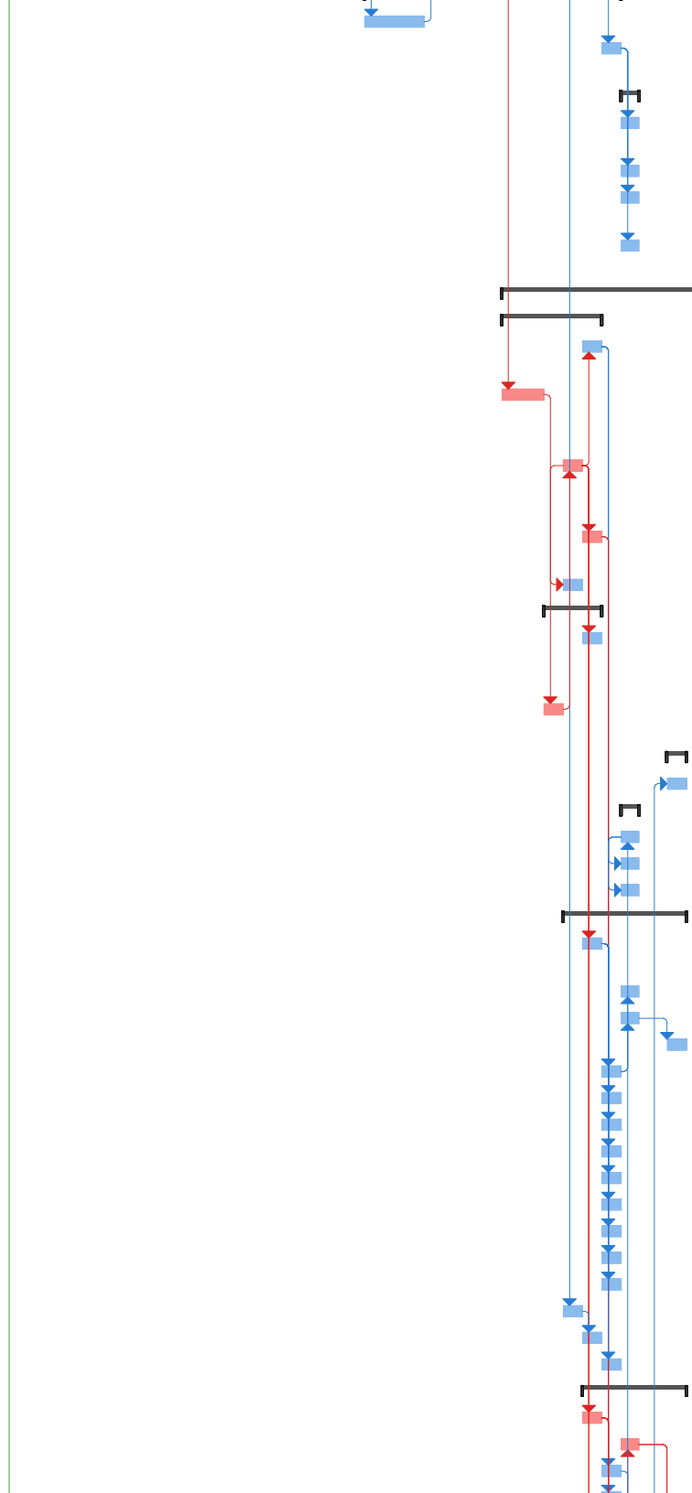


TUBERIA PVC SANITARIA 4"	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
CODO SANITARIO 6"	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
CÁRCAMO EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE REJILLA METÁLICA, SE	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	**5 días**	**mié 10/07/24**	**mar 16/07/2**
BAJANTE EN DUCTO METALICO IMC DE 11/4"* 6M INCLUYE CONDULETA CURVA UNION Y CINTA BAND IT	1 día	mar 16/07/24	mar 16/07/24
CAJA DE PASO EN MAMPOSTERIA CON TAPA EN FC DE 3500PSI DE DOS MODULOS DE 0,6*0,6*0,9	1 día	mar 16/07/24	mar 16/07/24
APERTURA DE ZANJA 0,4*0,65M TENDIDO DE 2 DUCTOS PVC T	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA,CON VARILLA DE CU, CABLE DE	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
TABLERO METALICO EN CR 16 Y 18 PARA MEDIDOR TRIFASICO	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 18 CIRCUITOS CON PUE	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON PUE	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
APERTURA DE ZANJA 0,25*0,65M TENDIDO DE 2 DUCTOS PVC	1 día	mié 10/07/24	jue 11/07/24
ALAMBRADO DE DUCTO CON 3F*8+1N*8 +1T*10CU AWG THH	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
ALAMBRADO DE DUCTO CON 3F*10+1N*10+1T*12 CU AWG T	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
APERTURA DE HUECO,ARRIMADA HINCADA Y PLOMADO DE POSTE FC 10M 510KGF	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
COLOCACION DE HERRAJES Y LAMPARAS 45W-240V LEDS PARA ILUMINACION DE SENDEROS	1 día	mar 16/07/24	mar 16/07/24
PEDESTAL EN FC O,4*0,4*1,25M	1 día	vie 12/07/24	sáb 13/07/24
POSTE METALICO DE 6M CON BASE EN PLATINA CERTIFICADO CON DOS BRAZOS DE 1,2M	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
COLOCACION DE PARARRAYOS TIPO FRANKLIN Y BAJANTES PARA SIPRA	1 día	mar 16/07/24	mar 16/07/24
URBANISMO	**5 días**	**jue 11/07/24**	**mié 17/07/2**
ANDÉN EN ADOQUÍN DE ARCILLA, INCLUYE CINTAS DE CONFINAMIENTO	1 día	mar 16/07/24	mar 16/07/24
CONCRETO DE 21 MPA A LA VISTA CON ACABADO ESCOBEADO	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
LOSETAS PODOTÁCTILES DE 20X20 CM	1 día	mar 16/07/24	mar 16/07/2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80	1 día	lun 15/07/24	lun 15/07/24
CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN MATERAS, SECCIÓI	1 día	jue 11/07/24	vie 12/07/24
BANCA DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO M-31	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/2
CANECA EN ACERO INOXIDABLE PARA MOBILIARIO URBANO TIPO M-120	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/24
SEÑALIZACION	**1 día**	**mié 17/07/24**	**mié 17/07/2**
AVISO DEL PROYECTO EN ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES 2M X 1 M	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/24
INSPECCIÓN CERTIFICACIÓN RETIE	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/2
INSPECCIÓN CERTIFICACIÓN RETILAP	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/2
FINAL PROGRAMADO	0 días	mié 17/07/24	mié 17/07/2




INICIO DE OBRA	0 días	lun 29/04/24	lun 29/04/24
SOCILIZACIÓN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD	0 días	vie 10/05/24	vie 10/05/24
PRELIMINARES	**5 días**	**vie 10/05/24**	**vie 17/05/24**
LOGÍSTICA PARA INICIO DE OBRA	2 días	vie 10/05/24	mar 14/05/24
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	3 días	mar 14/05/24	vie 17/05/24
EDIFICACIÓN ÁREA POLIVALENTE	**33 días**	**vie 5/07/24**	**vie 16/08/24**
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**22 días**	**vie 5/07/24**	**jue 1/08/24**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	10 días	vie 5/07/24	mié 17/07/24
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	vie 5/07/24	jue 11/07/24
CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA	10 días	vie 19/07/24	jue 1/08/24
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	7 días	jue 11/07/24	vie 19/07/24
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	7 días	jue 11/07/24	vie 19/07/24
ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN	**13 días**	**vie 19/07/24**	**lun 5/08/24**
SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM	5 días	vie 19/07/24	vie 26/07/24
ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	2 días	jue 1/08/24	sáb 3/08/24
VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**2 días**	**mar 6/08/24**	**jue 8/08/24**
COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLYE FORMALETA METÁLICA	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
MURO EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN ZARPA 45X20 CM, Y MURO 40X12 CM, PARA TARIMA Y/O GRADAS	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
ESTRUCTURAS EN ACERO	**11 días**	**vie 26/07/24**	**vie 9/08/24**
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA	10 días	vie 26/07/24	jue 8/08/24
MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE, INCLUYE ANTICORROSIVO	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
MAMPOSTERÍA	**4 días**	**vie 9/08/24**	**mié 14/08/24**
MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, E=12 CM	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
DOVELAS EN MORTERO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/2" Y GRAFIL 4MM	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
ANCLAJE PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, INCLUYE SIKA ANCHORFIX-4 O SIMILAR Y VARILLA DE ANCLAJE 1/2", L=30 CM	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, SECCIÓN 12X24 CM	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA CULATAS	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24
PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24

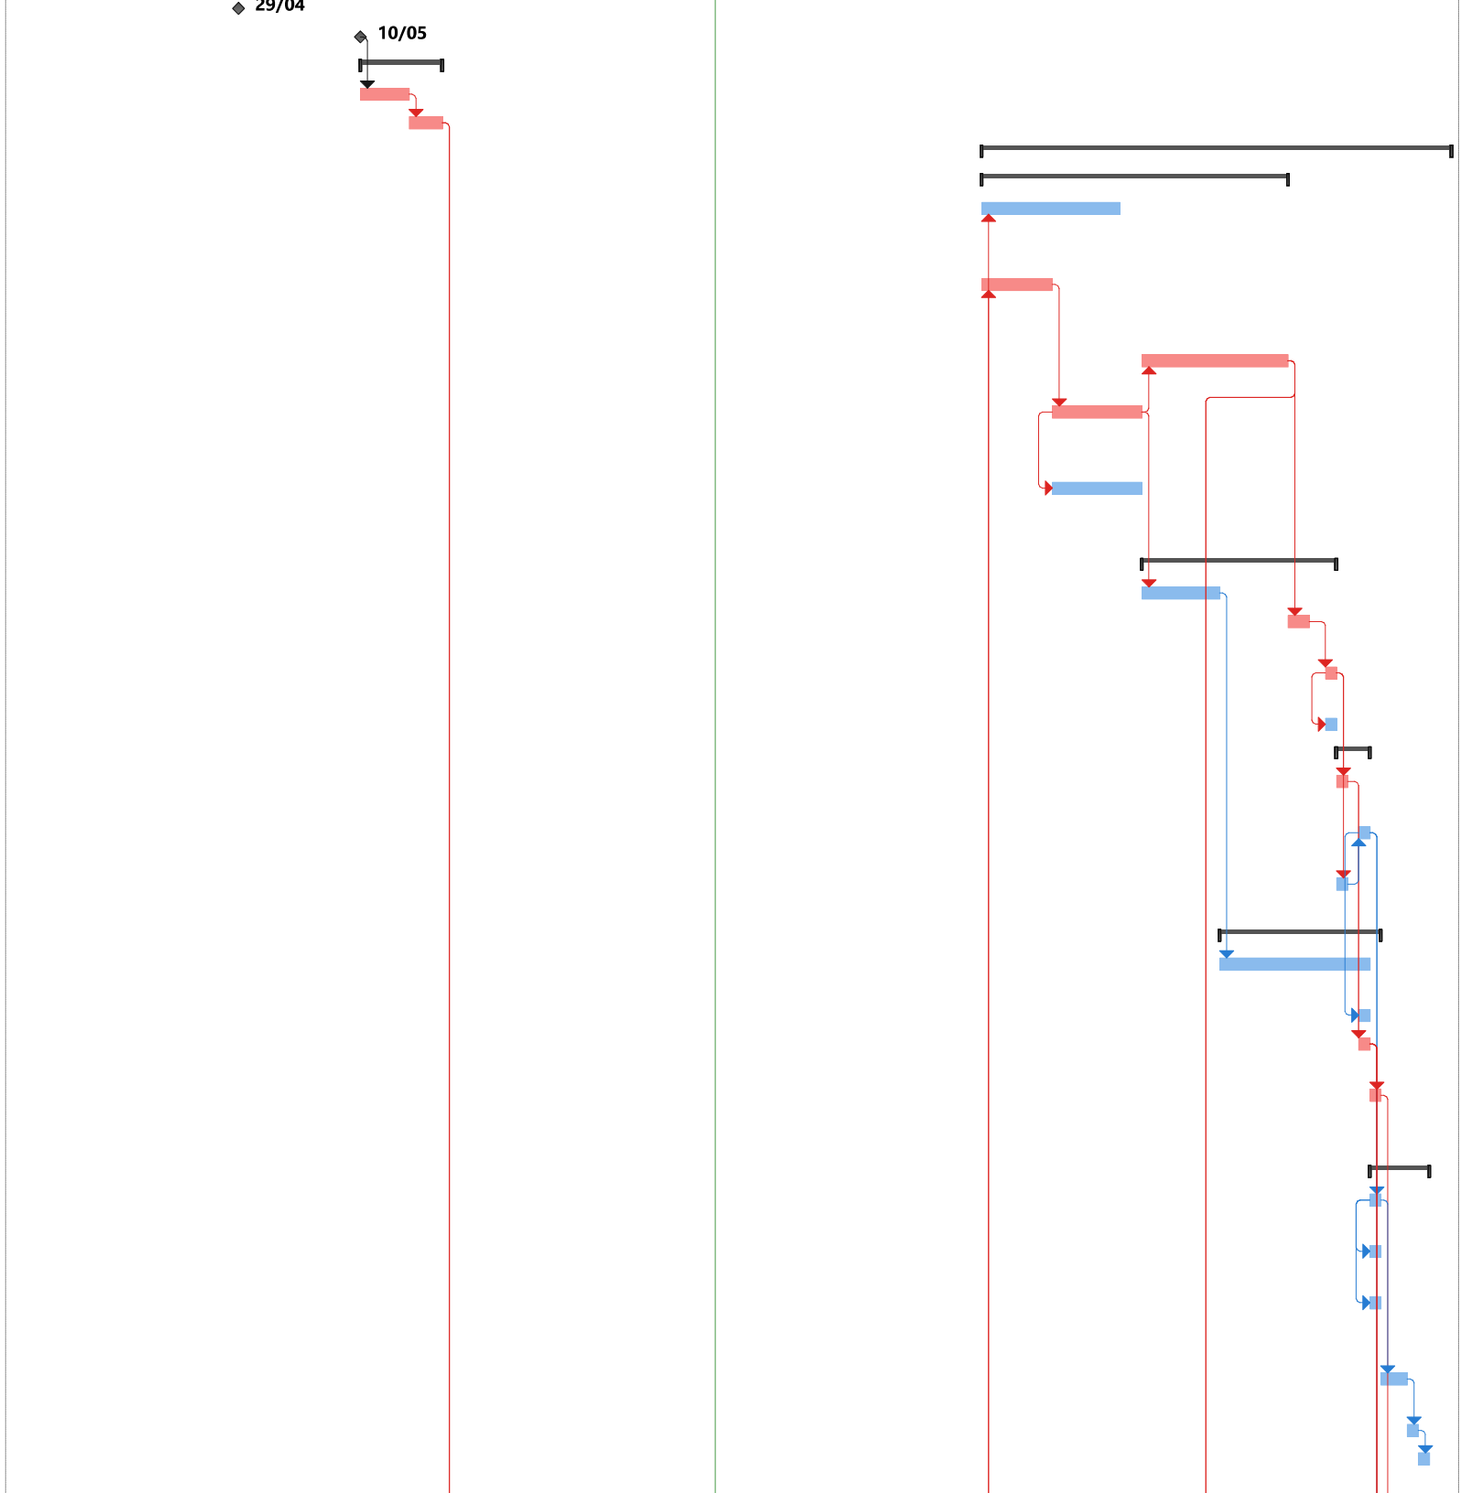


PISOS Y ENCHAPES	**2 días**	**mar 13/08/24**	**jue 15/08/24**
PISO EN CONCRETO DE 21 MPA ENDURECIDO, E=5CM, CON SIKAFLOOR-3 QUARTZTOP O EQUIVALENTE, CON ACABADO LLANEADO, INCLUYE SELLADO Y BRILLADO	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
DILATACIÓN DE PLACA EN CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELL	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO, E=8CM	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	**1 día**	**vie 9/08/24**	**vie 9/08/24**
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA SANITARIA 4", INCL	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
REJILLA CUPULA TRAGANTE 6"X4" METÁLICA PARA BAJANTES	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	**3 días**	**mar 13/08/24**	**vie 16/08/24**
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON PUERTA CAHAPA Y TOTALIZADOR PARA TPL Y TEC	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
SALIDA DE ALUMBRADO CON ITERRUPCION SENCILLA CONMUTABLE Y/O SENSOR	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
LUMINARIA DE LEDS HIGH BAY DE 100W-220V	1 día	jue 15/08/24	vie 16/08/24
LAMPARA WALLPACK LEDS 30W 100-270V PARA INTEMPERIE	1 día	jue 15/08/24	vie 16/08/24
TOMACORRIENTE BIFASICA 240V-20A TIPO INDUSATRIAL	1 día	jue 15/08/24	vie 16/08/24
TOMACORRIENTE GENERAL DOBLE 127V-15 CON POLO A TIERRA	1 día	jue 15/08/24	vie 16/08/24
LAMPARA DE EMERGENCIA DE DOS FOCOS ESCUALIZABLES Y LETRERO DE SALIDA 4,2W CON AUTONOMIA DE UNA HORA	1 día	jue 15/08/24	vie 16/08/24
CUBIERTA	**2 días**	**sáb 10/08/24**	**mar 13/08/24**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ESPAÑOLA PARA CUBIERTA EDIFICIO POLIVALENTE, INCLUYE ANDAMIO A DOBLE ALTURA Y DESPERDICIO CIRCULAR.	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
CIELO RASO EN DRYWALL 1/2", INCLUYE PINTURA	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24
CLARABOYA EN VIDRIO LAMINADO 4+4 PARA CUBIERTA	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24
CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA	**1 día**	**vie 9/08/24**	**vie 9/08/24**
CORTASOLES EN PERFIL METÁLICO, INCLUYE ANTICORROSIVO	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
EDIFICIO DE SERVICIOS	**69 días**	**vie 17/05/24**	**jue 15/08/24**
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**20 días**	**vie 17/05/24**	**jue 13/06/24**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARG	8 días	vie 17/05/24	lun 27/05/24
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	vie 17/05/24	jue 23/05/24
CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA	8 días	vie 31/05/24	jue 13/06/24
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	7 días	jue 23/05/24	vie 31/05/24
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DE	7 días	jue 23/05/24	vie 31/05/24
ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN	**34 días**	**lun 27/05/24**	**jue 11/07/24**
SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM	7 días	lun 27/05/24	mié 5/06/24
ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	8 días	jue 13/06/24	sáb 22/06/24
VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA	9 días	sáb 22/06/24	jue 4/07/24
CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS	5 días	vie 5/07/24	jue 11/07/24
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**24 días**	**vie 5/07/24**	**sáb 3/08/24**
COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30 CM, INCLYE FORMALETA METÁLICA	18 días	vie 5/07/24	sáb 27/07/24
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 25X30 CM	1 día	sáb 27/07/24	lun 29/07/24
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 20X30 CM	5 días	sáb 27/07/24	vie 2/08/24

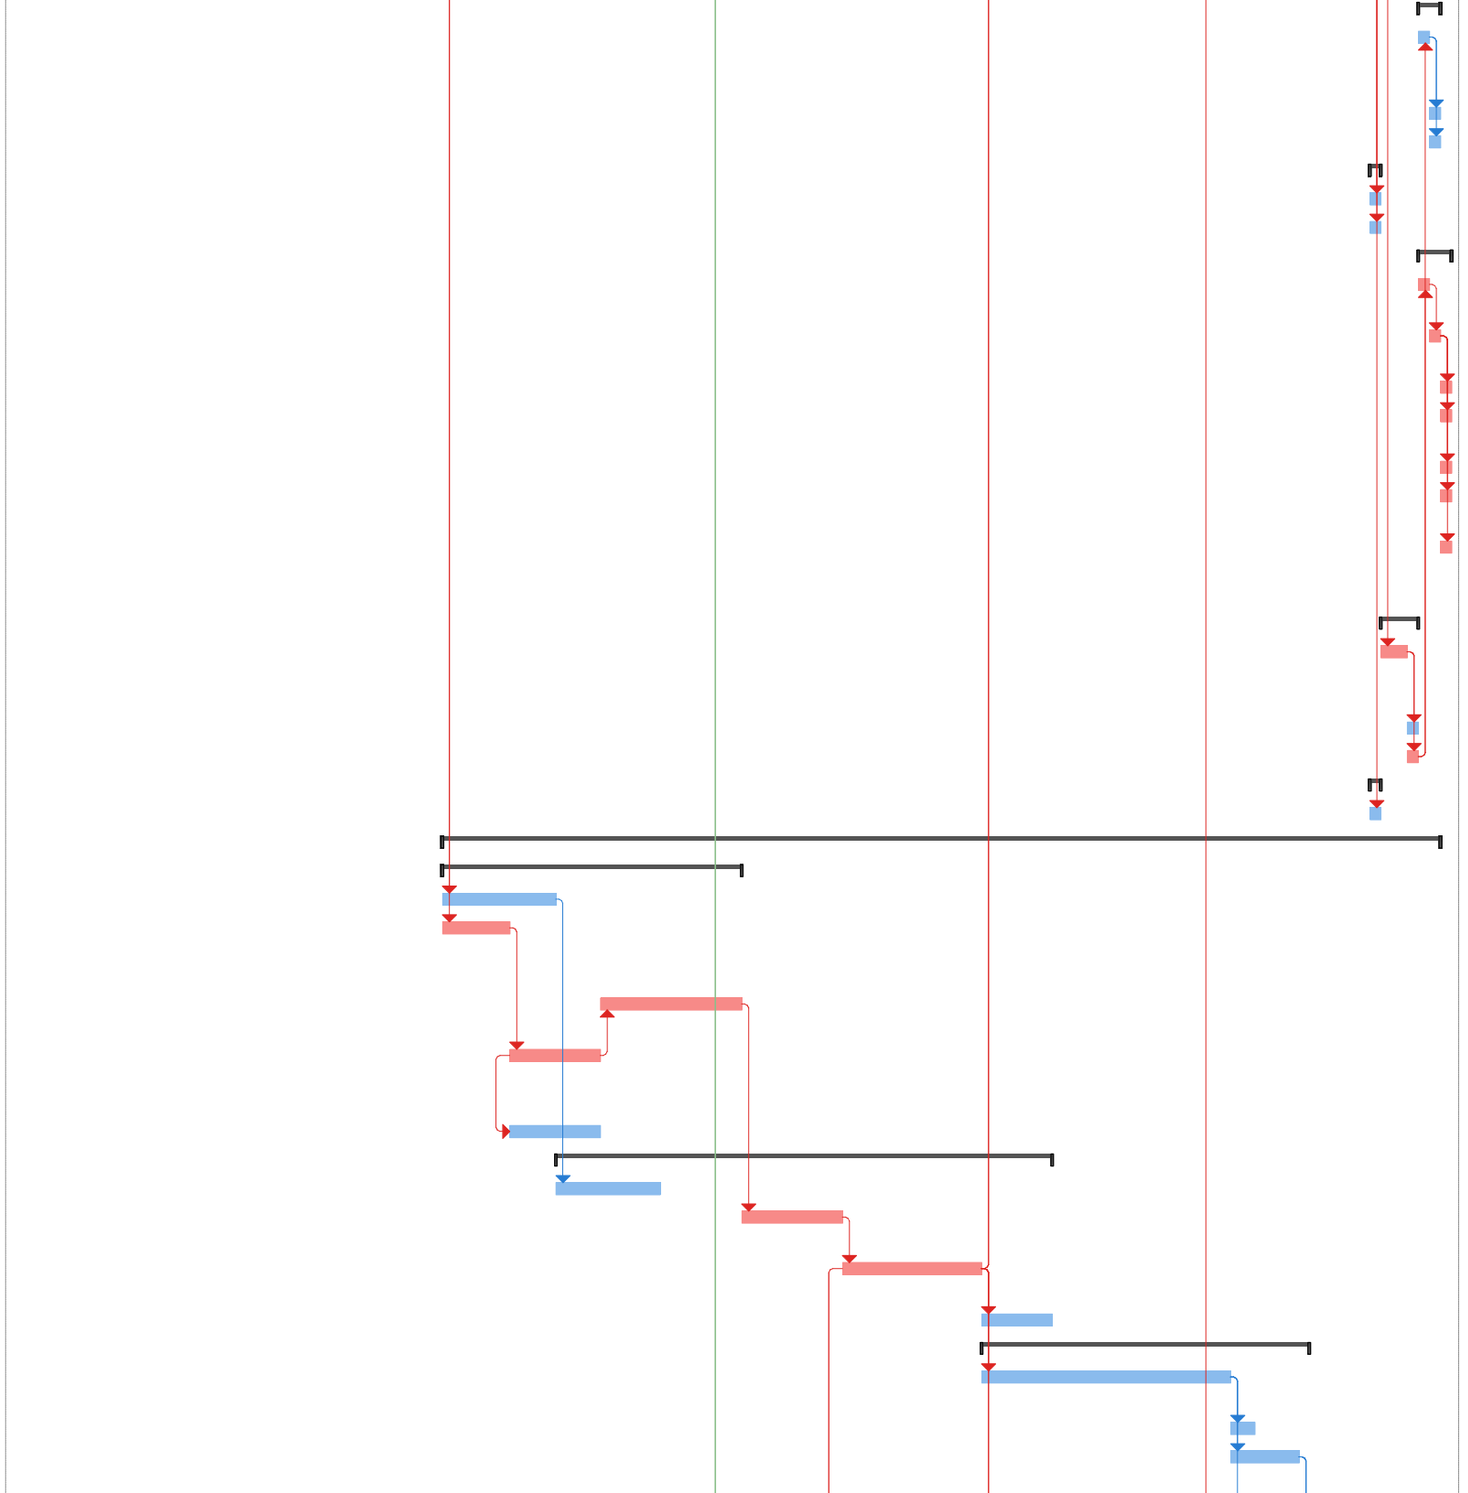


SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	30 días	sáb 22/06/24	mié 31/07/24
MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS	1 día	sáb 27/07/24	lun 29/07/24
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	5 días	lun 5/08/24	lun 12/08/24
PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE, INCLUYE ANTICORROSIVO	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24
MAMPOSTERÍA	**4 días**	**vie 2/08/24**	**jue 8/08/24**
MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, E=12 CM	1 día	vie 2/08/24	sáb 3/08/24
ENCHAPADO DE COLUMNAS Y VIGAS EN LADRILLO PRENSADO	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=14 CM, PARA CULATAS	1 día	vie 2/08/24	sáb 3/08/24
DOVELAS EN MORTERO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/2" Y	1 día	vie 2/08/24	sáb 3/08/24
ANCLAJE PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, INCLUYE SIK	1 día	vie 2/08/24	sáb 3/08/24
MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, SECCIÓN	1 día	vie 2/08/24	sáb 3/08/24
DILATANCIONES DE MAMPOSTERÍA CON ELEMENTOS ESTRUC	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA CULATAS	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
PAÑETE 1:4 PARA INTERIORES	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE PARA MESONES EN CON	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
PISOS Y ENCHAPES	**8 días**	**mar 30/07/24**	**vie 9/08/24**
ALISTADO Y NIVELADO DE PISOS CON MORTERO 1:3, E=4 CM	1 día	mar 30/07/24	mié 31/07/24
PISO DE TRÁFICO INSTITUCIONAL REF. DUROPISO BLANCO, FO	1 día	mié 31/07/24	jue 1/08/24
GUARDA ESCOBA EN ENCHAPE CERÁMICO TIPO DUROPISO O S	1 día	jue 1/08/24	vie 2/08/24
ENCHAPE CERÁMICO PARA MUROS ÁREA DE BAÑOS Y COCINETA, FORMATO 30X75 O SIMILAR	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
WIN METÁLICO PARA ESQUINAS	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	**3 días**	**lun 5/08/24**	**jue 8/08/24**
TUBERÍA DE PRESIÓN 1-1/2" RDE 21	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" RDE 11	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" RDE 9	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1-1/2"	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1/2"	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
REGISTRO DE CORTE 1"	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
REGISTRO DE CORTE 1/2"	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
TAPA REGISTROS PLÁSTICO 20X20 CM	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
CODO PRESIÓN 1-1/2"	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
REDUCCIÓN PRESIÓN 1-1/2" A 3/4"	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
LLAVE DE JARDÍN	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	**31 días**	**vie 5/07/24**	**mié 14/08/24**
TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	10 días	vie 5/07/24	mié 17/07/24
TUBERÍA PVC SANITARIA 2"	10 días	vie 5/07/24	mié 17/07/24
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA SANITARIA 4", INCL	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
CODO SANITARIO 4"	10 días	vie 5/07/24	mié 17/07/24
YEE REDUCIDA 4"X2" SANITARIA	10 días	vie 5/07/24	mié 17/07/24
YEE 4" SANITARIA	10 días	vie 5/07/24	mié 17/07/24
SIFÓN 2"	10 días	vie 5/07/24	mié 17/07/24
SIFÓN 4"	10 días	vie 5/07/24	mié 17/07/24
REJILLA METÁLICA PARA SIFÓN 3"X2"	5 días	jue 1/08/24	jue 8/08/24

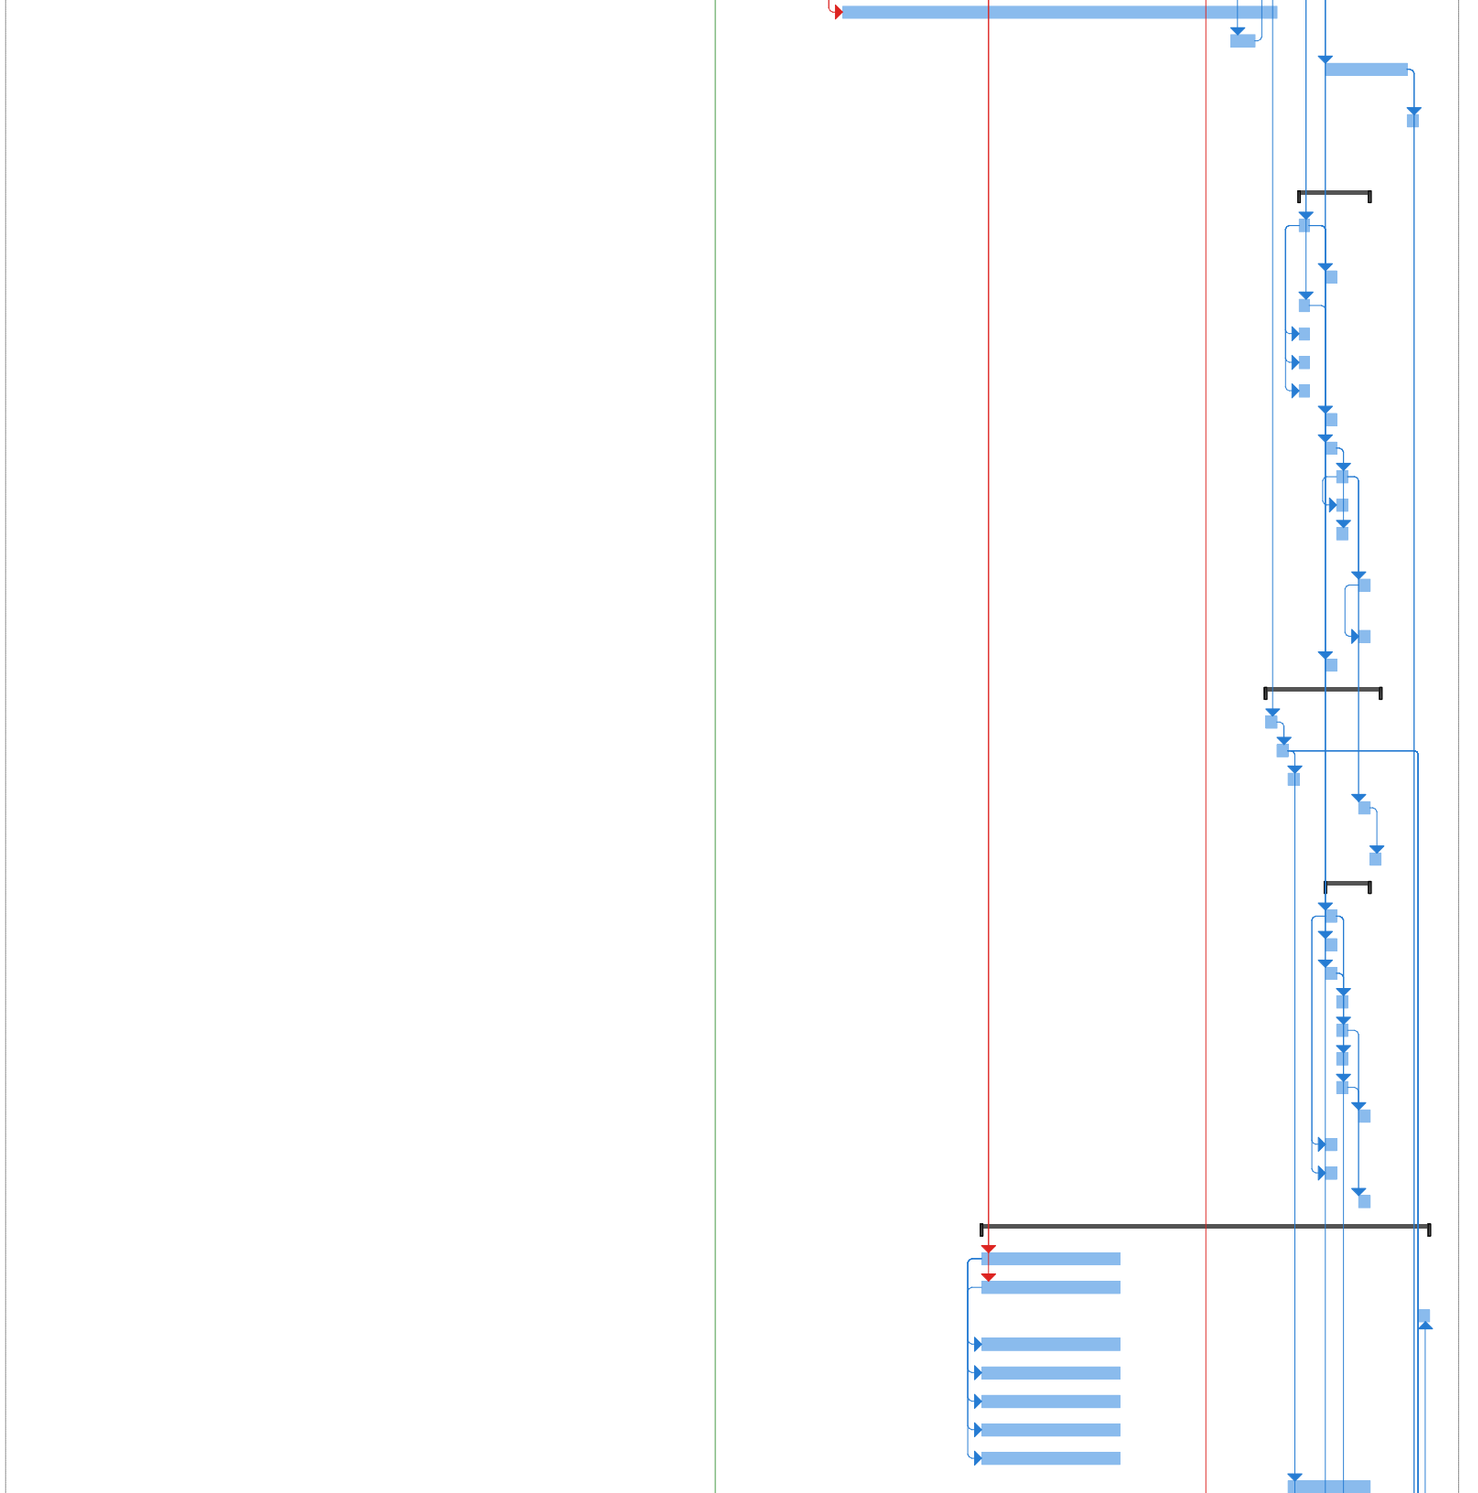


CONMUTABLE Y/O SENSOR			
PANEL REDODNDO DE LEDS 18W-120V	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
TOMACORRIENTE BIFASICA 240V-20A TIPO INDUSATRIAL	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
TOMACORRIENTE GENERAL DOBLE 127V-15 CON POLO A TIERRA	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
TOMACORRIENTE GENERAL DOBLE 127V-15 CON POLO A TIERRA AUTOPROTEGIDOTIPO GFCI	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
LAMPARA DE EMERGENCIA DE DOS FOCOS ESCUALIZABLES Y LETRERO DE SALIDA 4,2W CON AUTONOMIA DE UNA HORA	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
CUBIERTA	**2 días**	**lun 12/08/24**	**mié 14/08/24**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ESPAÑOLA PARA CUBIERTA EDIFICIO DE SERVICIOS Y COMPLEMENTARIA	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24
CIELO RASO EN DRYWALL 1/2", INCLUYE PINTURA	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, INCLUYE ANTIC	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24
CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM, INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
APARATOS SANITARIOS Y MESONES	**2 días**	**mar 13/08/24**	**jue 15/08/24**
TAZA ADRIATICA ENTRADA POSTERIOR CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
SANITARIO INSTITUCIONAL CON TANQUE TIPO AQUAPRO	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
ORINAL MEDIANO CON GRIFERÍA TRADICIONAL	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
MESÓN EN CONCRETO A=60 CM, INCLUYE ABERTURA DE HUE	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
LAVANAMOS DE SOBREPONER TIPO MARSELLA O SIMILAR, IN	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
KIT BARRAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
DISPENSADOR DE JABÓN DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABI	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
PORTA ROLLO CON CUBREROLLO METAL ACCESORIO BAÑO	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
DISPENSADOR DE TOALLAS EN ACERO INOXIDABLE	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 50X40 CM, INCLUYE GRIF	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA	**1 día**	**mar 13/08/24**	**mié 14/08/24**
PUERTA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO Y VIDRIO LAMI	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
VENTANAS EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO Y VIDRIO LA	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
PUERTA CON PERSIANA EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO,	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE PIS	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
EDIFICIO COMPLEMENTARIO	**13 días**	**vie 26/07/24**	**mar 13/08/24**
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**3 días**	**vie 26/07/24**	**mar 30/07/24**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARG	1 día	vie 26/07/24	sáb 27/07/24
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	vie 26/07/24	sáb 27/07/24
CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA RELACIÓN 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA	1 día	lun 29/07/24	mar 30/07/24
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	1 día	sáb 27/07/24	lun 29/07/24
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DE	1 día	sáb 27/07/24	lun 29/07/24
ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN	**5 días**	**sáb 27/07/24**	**vie 2/08/24**
SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, E=7 CM	1 día	sáb 27/07/24	lun 29/07/24
ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA	1 día	mar 30/07/24	mié 31/07/24
VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN 35 X 40 CM, INCLUYE FORMALETA	1 día	mié 31/07/24	jue 1/08/24
CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS	1 día	jue 1/08/24	vie 2/08/24
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**3 días**	**jue 1/08/24**	**lun 5/08/24**
COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCIÓN DE 30X30	1 día	jue 1/08/24	vie 2/08/24

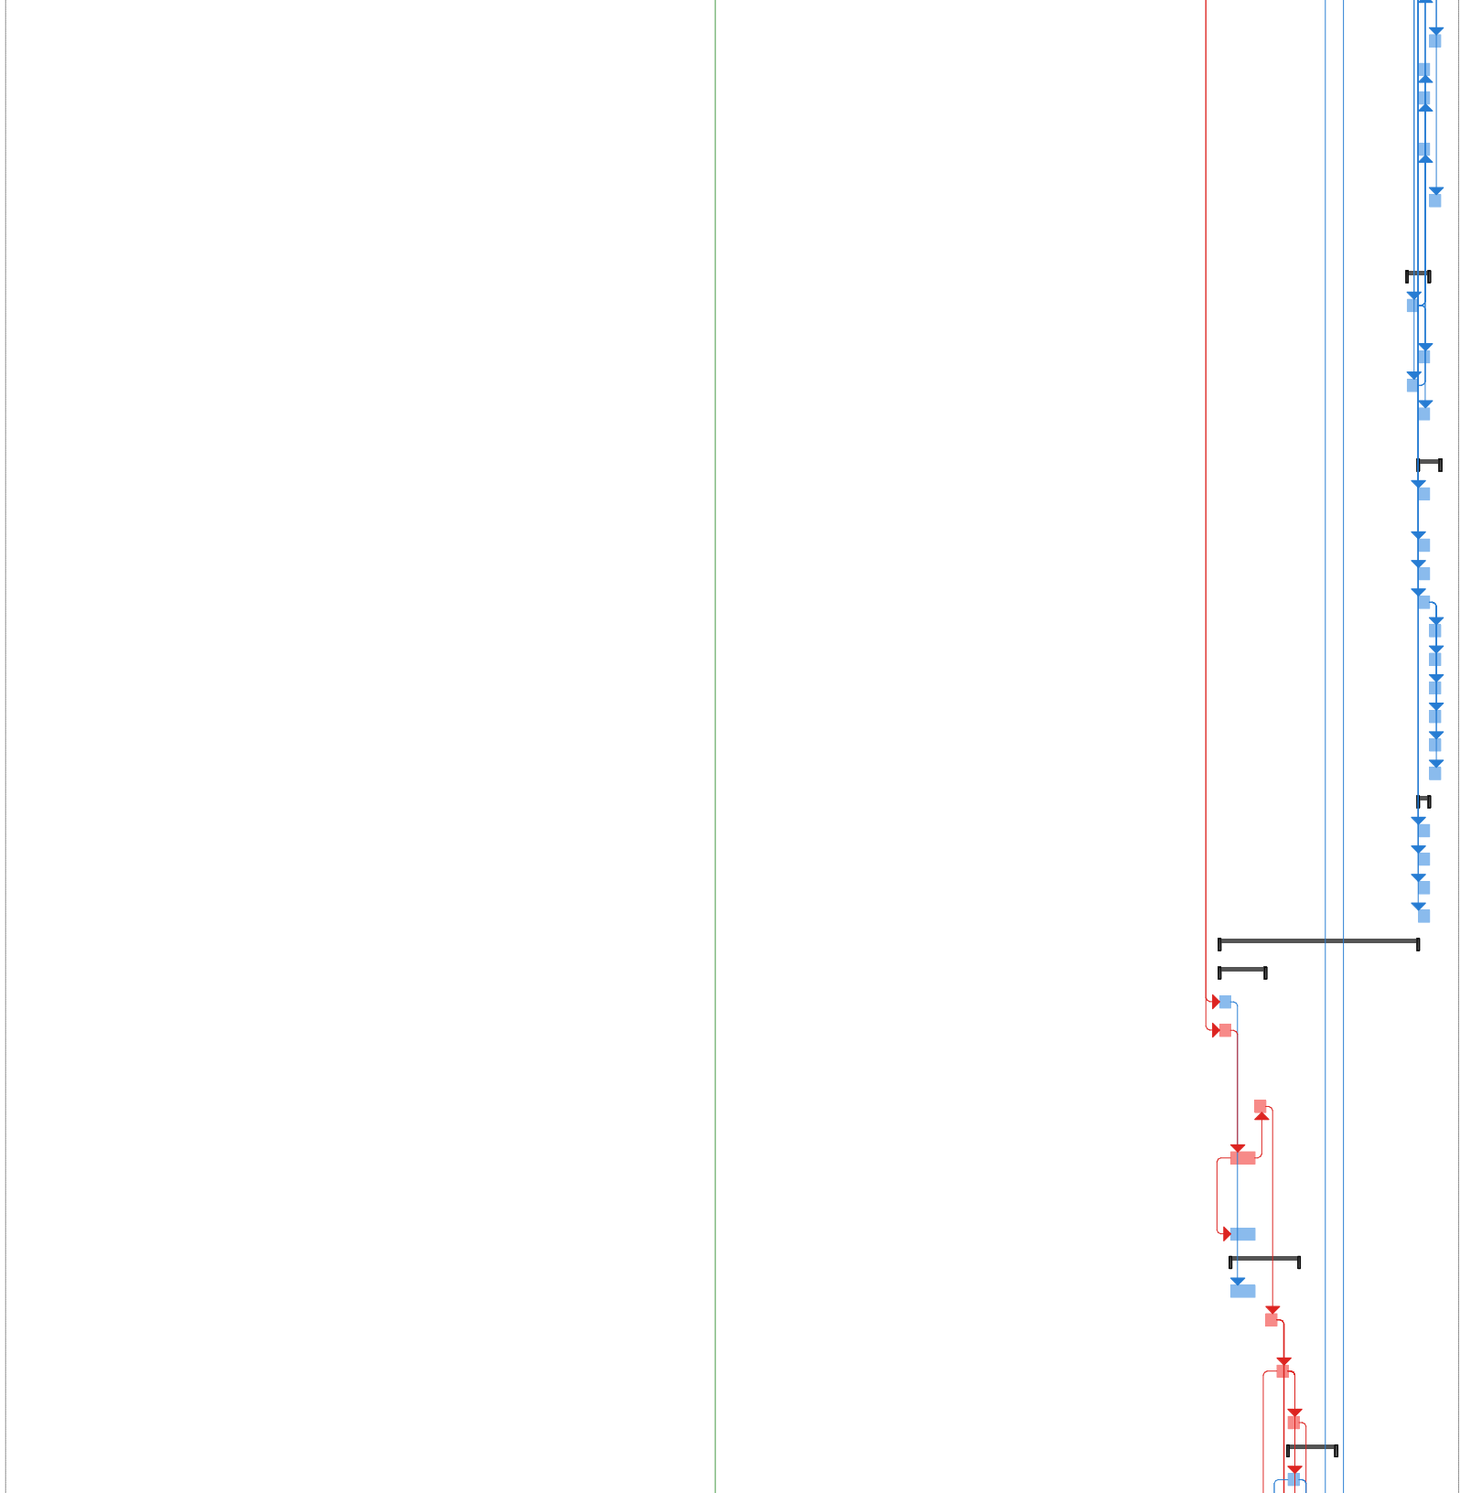


MURO EN CONCRETO PARA ACTIVIDAD DE ESCALADA, E=15CM	1 día	jue 1/08/24	vie 2/08/24
ESTRUCTURAS EN ACERO	**5 días**	**mié 31/07/24**	**mar 6/08/24**
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	1 día	mié 31/07/24	jue 1/08/24
MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS	1 día	vie 2/08/24	sáb 3/08/24
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE, INCLUYE ANTICORROSIVO	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
MAMPOSTERÍA	**3 días**	**lun 5/08/24**	**jue 8/08/24**
MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, E=12 CM	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
ENCHAPADO DE COLUMNAS Y VIGAS EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=14 CM, PARA CULATAS	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
DOVELAS EN MORTERO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/2" Y	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
ANCLAJE PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, INCLUYE SIK	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, SECCIÓN	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
DILATACIONES DE MAMPOSTERÍA CON ELEMENTOS ESTRUCTU	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA CULATAS	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
PAÑETE 1:4 PARA INTERIORES	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
PISOS Y ENCHAPES	**3 días**	**mar 6/08/24**	**vie 9/08/24**
ALISTADO Y NIVELADO DE PISOS CON MORTERO 1:3, E=4 CM	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
PISO DE TRÁFICO INSTITUCIONAL REF. DUROPISO BLANCO, FO	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
GUARDA ESCOBA EN ENCHAPE CERÁMICO TIPO DUROPISO O S	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	**3 días**	**mar 6/08/24**	**vie 9/08/24**
APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 20	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTA	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" RDE 9	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA 1/2"	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
LLAVE DE JARDÍN	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	**6 días**	**jue 1/08/24**	**vie 9/08/24**
TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	1 día	jue 1/08/24	vie 2/08/24
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA SANITARIA 4", INCL	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
SIFÓN 4"	1 día	jue 1/08/24	vie 2/08/24
REJILLA METÁLICA PARA SIFÓN 6"X4"	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
REJILLA CUPULA TRAGANTE 6"X4" METÁLICA PARA BAJANTES	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	**3 días**	**vie 9/08/24**	**mar 13/08/24**
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON PUERTA CAHAPA Y TOTALIZADOR PARA TPL Y TEC	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
APERTURA DE ZANJA 0,25*0,65M TENDIDO DE 2 DUCTOS PVC	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
ALAMBRADO DE DUCTO CON 3F*10+1N*10+1T*12 CU AWG T	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
SALIDA DE ALUMBRADO CON ITERRUPCION SENCILLA CONMUTABLE Y/O SENSOR	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
PANEL REDODNDO DE LEDS 18W-120V	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24
TOMACORRIENTE GENERAL DOBLE 127V-15 CON POLO A TIER	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
LAMPARA DE EMERGENCIA DE DOS FOCOS ESCUALIZABLES Y	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24

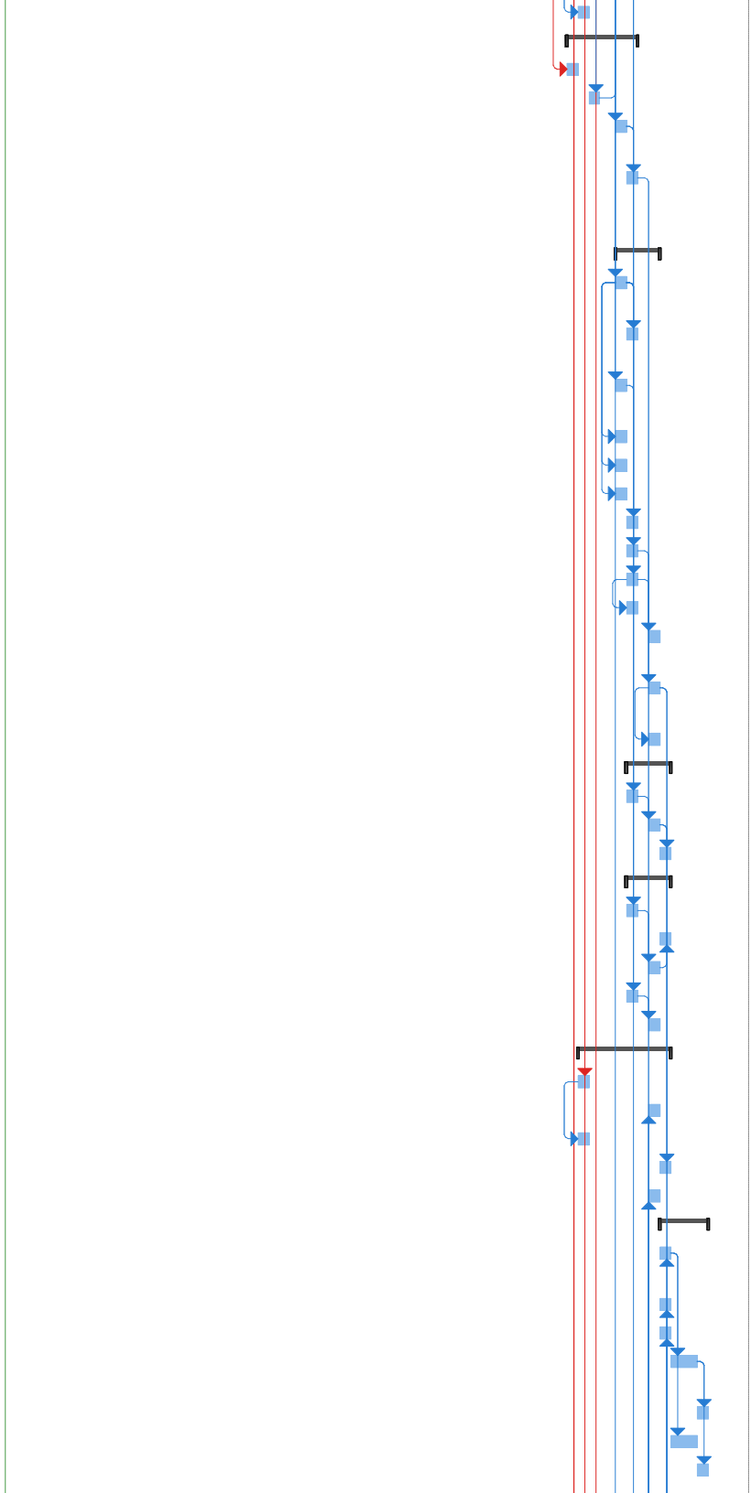


CIELO RASO EN DRYWALL 1/2", INCLUYE PINTURA	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, INCLUYE ANTIC	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM, INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA	**1 día**	**vie 9/08/24**	**vie 9/08/24**
PUERTA PLEGABLE COMPUESTA POR 3 HOJAS, BATIENES PLEGABLES, 1 HOJA BATIENTE, A=1M, H= 2,15M, EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO Y VIDRIO LAMINADO 3+3	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
VENTANAS EN ALUMINIO CON ACABADO NEGRO Y VIDRIO LAMINADO 3+3, FIJA Y/O PROYECTANTE	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
GIMNASIO BIOSALUDABLE	**11 días**	**jue 1/08/24**	**vie 16/08/24**
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**8 días**	**jue 1/08/24**	**mar 13/08/24**
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	4 días	jue 1/08/24	mar 6/08/24
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ÁREAS PEATONALES, PISTA DE TROTE Y ADOQUÍN ECOLÓGICO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DE	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN	**5 días**	**jue 8/08/24**	**mié 14/08/24**
GEOTEXTIL NT-2500 PARA SEPARACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIALES GRANULARES	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
URBANISMO	**4 días**	**sáb 10/08/24**	**jue 15/08/24**
PLACA EN ADOQUÍN ECOLÓGICO 30X30X6 CM	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
EQUIPAMIENTOS PARA PARQUE Y GIMNASIO	**1 día**	**jue 15/08/24**	**vie 16/08/24**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PONY REMO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1 día	jue 15/08/24	vie 16/08/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAS PARALELAS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1 día	jue 15/08/24	vie 16/08/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO GIRO DE CADERA Y TWISTER. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1 día	jue 15/08/24	vie 16/08/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMINADOR AÉREO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1 día	jue 15/08/24	vie 16/08/24
PISTA DE TROTE	**11 días**	**jue 1/08/24**	**vie 16/08/24**
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**8 días**	**jue 1/08/24**	**mar 13/08/24**
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	jue 1/08/24	jue 8/08/24
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ÁREAS PEATONALES, PISTA DE TROTE Y ADOQUÍN ECOLÓGICO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24




CARPETA ASFÁLTICA EN MEZCLA TIPO MDC-19, COMPACTADA	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
RECUBRIMIENTO TRU-FLEX ANTIDESLIZANTE SINTÉTICO 100% ACRÍLICO PARA ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. SISTEMA DE 3 CAPAS UNA BASE DE CUARZO Y DOS CAPAZ DE TRU-FLEX DE COLOR.	1 día	jue 15/08/24	vie 16/08/24
ZONA DE JUEGOS INFANTILES	**12 días**	**mié 31/07/24**	**vie 16/08/24**
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**3 días**	**mié 31/07/24**	**sáb 3/08/24**
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 31/07/24	jue 1/08/24
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	1 día	vie 2/08/24	sáb 3/08/24
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DE	1 día	vie 2/08/24	sáb 3/08/24
ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN	**1 día**	**vie 9/08/24**	**vie 9/08/24**
CONCRETO DE 21 MPA PARA RELLENOS	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**1 día**	**lun 12/08/24**	**mar 13/08/24**
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=10 CM	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24
ESTRUCTURAS EN ACERO	**1 día**	**sáb 10/08/24**	**lun 12/08/24**
MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	**7 días**	**lun 5/08/24**	**mié 14/08/24**
APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 40X60 CM	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
CODO SANITARIO 4"	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
YEE REDUCIDA 6"X4" SANITARIA	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
SIFÓN 4"	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
REJILLA METÁLICA PARA SIFÓN 6"X4"	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA	**1 día**	**mar 13/08/24**	**mié 14/08/24**
CERRAMIENTO TIPO M-80 CON MALLA ESLABONADA HUECO 2”, H= 1.2 M, PARA, INCLUYE DOS ENTRADAS, PARA PARQUE DE NIÑOS.	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
URBANISMO	**10 días**	**jue 1/08/24**	**jue 15/08/24**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80	1 día	jue 1/08/24	vie 2/08/24
RECUBRIMIENTO EN SISTEMA EN CAUCHO GRANULADO, BASE SBR Y RECUBRIMIENTO EPDM GRANULADO	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
EQUIPAMIENTOS PARA PARQUE Y GIMNASIO	**1 día**	**jue 15/08/24**	**vie 16/08/24**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CULUMPIO MULTIPLE PARA 9 USUARIOS	1 día	jue 15/08/24	vie 16/08/24
MODULO MUELLE BALSA, CAP. 6 USUARIOS	1 día	jue 15/08/24	vie 16/08/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORRE PUENTE DESLIZADERO	1 día	jue 15/08/24	vie 16/08/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SET DE 100 PRESAS PARA MURO DE ESCALADA INFANTIL	1 día	jue 15/08/24	vie 16/08/24
URBANISMO	**11 días**	**mié 31/07/24**	**jue 15/08/24**
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**6 días**	**mié 31/07/24**	**jue 8/08/24**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y	1 día	mié 31/07/24	jue 1/08/24
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	vie 2/08/24	sáb 3/08/24



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ÁREAS PEATONALES, PISTA DE TROTE Y ADOQUÍN ECOLÓGICO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DE	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN	**3 días**	**lun 5/08/24**	**jue 8/08/24**
FILTRO FRÁNCES 1,2 x 0,5 M, CONTIENE GEOTEXTIL NT-2500 Y GRAVA GRUESA D= 1" A 1-1/2", TUBERÍA PERFORADA D=4" Y EXCAVACIÓN MANUAL	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
GEOTEXTIL NT-2500 PARA SEPARACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIALES GRANULARES	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
ESTRUCTURAS EN ACERO	**1 día**	**lun 12/08/24**	**mar 13/08/24**
MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACAS	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24
MAMPOSTERÍA	**1 día**	**sáb 10/08/24**	**lun 12/08/24**
MURO PRENSADO LIVIANO 24X12X6 CM O SIMILAR, E=12 CM	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
DOVELAS EN MORTERO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/2" Y GRAFIL 4MM	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
ANCLAJE PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, INCLUYE SIKA ANCHORFIX-4 O SIMILAR Y VARILLA DE ANCLAJE 1/2", L=30 CM	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	**6 días**	**lun 5/08/24**	**mar 13/08/24**
APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 20X30 CM	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTA	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
DERIVACIÓN DE RED PÚBLICA PARA CONEXIÓN ACOMETIDA D	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
CONEXIÓN MEDIDOR DE 1/2" A ACOMETIDA 1", INCLUYE CAJA	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24
TUBERÍA DE PRESIÓN 2" RDE 21	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
TUBERÍA DE PRESIÓN 1-1/2" RDE 21	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
TUBERÍA DE PRESIÓN 1" RDE 21	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" RDE 9	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
CODO PRESIÓN 2"	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
CODO PRESIÓN 1-1/2"	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
CODO PRESIÓN 1"	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
REDUCCIÓN PRESIÓN 2" A 1"	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
REDUCCIÓN PRESIÓN 2" A 1-1/2"	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
TANQUE PLÁSTICO DE 1000 L, TIPO BAJITO, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FLOTADOR PARA TANQUE	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA DE 2HP, CON HIDRONEUMÁTICO, TANQUE DE 200 LTS	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24
REGISTRO DE BOLA DE 2"	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	**7 días**	**jue 1/08/24**	**lun 12/08/24**
APERTURA DE ZANJA PARA TUBERÍAS, SECCIÓN PROMEDIO 40X60 CM	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE RECEBO COMPACTADO	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1X1X1 M, INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, Y TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO	1 día	jue 1/08/24	vie 2/08/24
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0,8X0,8X0,8 M, INCLU	1 día	jue 1/08/24	vie 2/08/24
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0,6X0,6X0,6 M, INCLU	1 día	jue 1/08/24	vie 2/08/24
SUMIDERO CON DESARENADOR EN MAMPOSTERÍA, SECCIÓN LIBRE CAJA 1X0,4X0,8 Y SALIDA 0,35*0,2*0,4, SEGÚN DISEÑO	1 día	vie 2/08/24	sáb 3/08/24
TUBERÍA PVC SANITARIA 8"	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
TUBERÍA PVC SANITARIA 6"	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24



INSTALACIONES ELÉCTRICAS	**5 días**	**jue 8/08/24**	**mié 14/08/24**
BAJANTE EN DUCTO METALICO IMC DE 11/4"* 6M INCLUYE CONDULETA CURVA UNION Y CINTA BAND IT	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
CAJA DE PASO EN MAMPOSTERIA CON TAPA EN FC DE 3500PSI DE DOS MODULOS DE 0,6*0,6*0,9	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
APERTURA DE ZANJA 0,4*0,65M TENDIDO DE 2 DUCTOS PVC T	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA,CON VARILLA DE CU, CABLE DE	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
TABLERO METALICO EN CR 16 Y 18 PARA MEDIDOR TRIFASICO	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 18 CIRCUITOS CON PUE	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON PUE	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
APERTURA DE ZANJA 0,25*0,65M TENDIDO DE 2 DUCTOS PVC	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24
ALAMBRADO DE DUCTO CON 3F*8+1N*8 +1T*10CU AWG THH	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
ALAMBRADO DE DUCTO CON 3F*10+1N*10+1T*12 CU AWG T	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
APERTURA DE HUECO,ARRIMADA HINCADA Y PLOMADO DE POSTE FC 10M 510KGF	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
COLOCACION DE HERRAJES Y LAMPARAS 45W-240V LEDS PARA ILUMINACION DE SENDEROS	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
PEDESTAL EN FC O,4*0,4*1,25M	1 día	sáb 10/08/24	lun 12/08/24
POSTE METALICO DE 6M CON BASE EN PLATINA CERTIFICADO CON DOS BRAZOS DE 1,2M	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24
COLOCACION DE PARARRAYOS TIPO FRANKLIN Y BAJANTES PARA SIPRA	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
URBANISMO	**5 días**	**vie 9/08/24**	**jue 15/08/24**
ANDÉN EN ADOQUÍN DE ARCILLA, INCLUYE CINTAS DE CONFINAMIENTO	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
CONCRETO DE 21 MPA A LA VISTA CON ACABADO ESCOBEADO	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24
LOSETAS PODOTÁCTILES DE 20X20 CM	1 día	mar 13/08/24	mié 14/08/24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24
CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN MATERAS, SECCIÓI	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24
BANCA DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO M-31	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
CANECA EN ACERO INOXIDABLE PARA MOBILIARIO URBANO TIPO M-120	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
SEÑALIZACION	**1 día**	**mié 14/08/24**	**jue 15/08/24**
AVISO DEL PROYECTO EN ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES 2M X 1 M	1 día	mié 14/08/24	jue 15/08/24
INSPECCIÓN CERTIFICACIÓN RETIE	2 días	mié 14/08/24	vie 16/08/24
INSPECCIÓN CERTIFICACIÓN RETILAP	2 días	mié 14/08/24	vie 16/08/24
FINAL PROGRAMADO	0 días	vie 16/08/24	vie 16/08/24



Otros Documentos

Alcaldía Municipal Turmequé Boyacá
Calle 3 No. 4-65 Código Postal – 153630
Teléfono. 3157799711
email. gobierno@turmeque-boyaca.gov.co
http://www.turmeque-boyaca.gov.co

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 ETAPA DE OBRA

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE TURMEQUÉ

CONTRATO DE OBRA No. LP 03-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-002-2023

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA – TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR

INTERVENTOR:

INTEROBRAS SC SAS

SUPERVISOR:

ARQ. JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA

PERIODO DEL INFORME:

ABRIL DE 2024

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 ETAPA DE OBRA

1. GENERALIDADES

1.1 LOCALIZACIÓN

La ejecución del proyecto se lleva a cabo en la zona urbana del municipio de Turmequé, Departamento de Boyacá, en la Carrera 2 No. 3-10 sur, predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 070-21230 y cédula catastral No. 15835-010000390003000, propiedad del municipio de Turmequé.

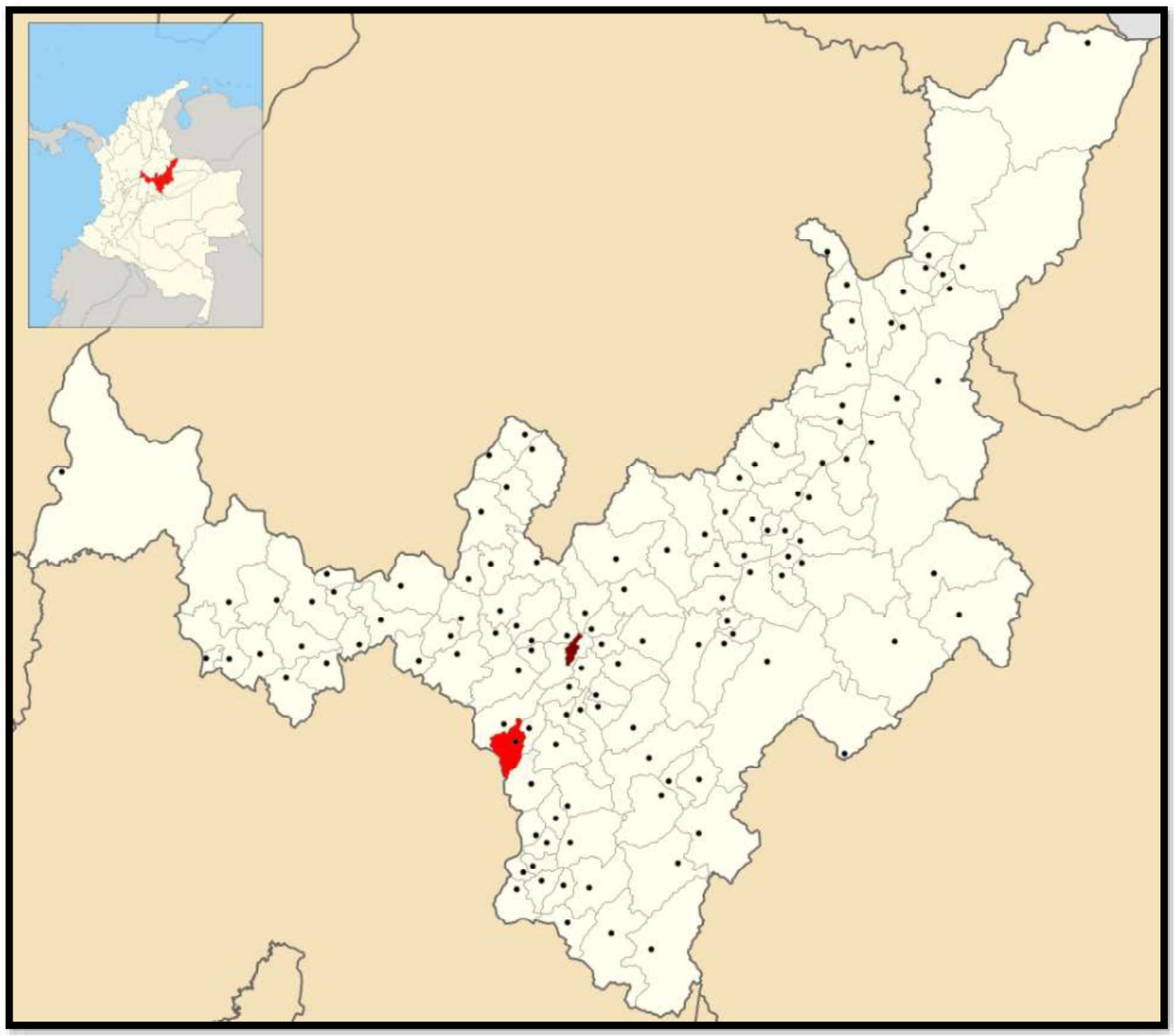


IMAGEN No. 1 – LOCALIZACIÓN MUNICIPIO DE TURMEQUÉ - BOYACÁ



IMAGEN No 2 – LOCALIZACIÓN PROYECTO EN CASCO URBANO MUNICIPIO TURMEQUÉ

1.2 ESTADO INICIAL

El sitio de intervención se encuentra incluido dentro de un complejo deportivo denominado Zona Estadio. Colinda por el norte con una cancha de fútbol, por el costado oriental con una cancha de baloncesto en asfalto en mal estado, seguida del Centro de Integración Ciudadana, por el costado sur con vía vehicular pública, y por el costado occidental con predio privado con uso residencial.

Inicialmente el lugar de intervención se encontraba ocupado por una cancha de baloncesto en asfalto en mal estado, un Gimnasio Bio saludable y unas jardineras. Estas estructuras y mobiliario fue retirado por parte del municipio previo al inicio de la etapa de obra.

De acuerdo con el estudio de suelos, el costado sur occidental se encontraba comprendido por una capa de material vegetal de aproximadamente de 60 cm, localizada bajo el nivel 0+00 del proyecto, situación que fue corroborada en campo, siendo retirada dicha capa por parte del municipio de Turmequé, conforme al compromiso de actividades adquiridas mediante el convenio 1621 de 2023.



IMAGEN No 3 – ESTADO INICIAL DEL PREDIO



IMAGEN No 4 – ESTADO DE PREDIO PARA INICIO DE OBRA

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. CONDICIONES CONTRATO DE OBRA

Modalidad y No. contrato	CONTRATO DE OBRA No. LP 03 -2023
Fecha de Suscripción	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Contratante	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
Contratista	UNIÓN TEMPORAL INFRATUR
Supervisor	ARQ. JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA
Interventor	INTEROBRAS SC S.A.S.
Objeto	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA – TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA.
Valor Total del Contrato	$2.144.442.248,00
Fecha de Inicio	27 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha Aprobación Inicio de Obra	23 DE ABRIL DE 2024

Plazo de ejecución inicial	DIEZ (10) MESES EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 2 MESES Y EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA 8 MESES, CONTADO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO
Plazo Según Modificatorio No. 01	OCHO (08) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS. EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CINCO (05) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS Y PARA EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Terminación Inicial	26 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Terminación Actual	17 DE JULIO DE 2024
Periodo del Informe	23 AL 30 DE ABRIL DE 2024

2.2. CONDICIONES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Modalidad y No. contrato	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-002-2023
Fecha de Suscripción	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Contratante	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
Contratista	INTEROBRAS SC S.A.S.
Supervisor	ARQ. JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATRO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVNECIA – TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE-BOYACA.
Valor Total del Contrato	$238.302.000,00
Fecha de Inicio	27 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo de ejecución inicial	DIEZ (10) MESES EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 2 MESES Y EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA 8 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Plazo Según Modificatorio No. 01 del 10/04/2024	OCHO (08) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS. EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CINCO (05) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS Y PARA EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Terminación Inicial	26 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Terminación Actual	17 DE JULIO DE 2024

Periodo del Informe	23 AL 30 DE ABRIL DE 2024

3. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS EN EL CONTRATO

FECHA	TIPO ACTA	CONCEPTO
27/10/2023	INICIO CONTRATO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA
23/04/2024	INICIO OBRA	ACTA DE RECIBO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DEL MINISTERIO Y AUTORIZACIÓN INICIO DE OBRA

4. RELACIÓN POLIZAS VIGENTES CONTRATOS

- **Contrato de Obra – Seguros del Estado**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
39-44-101155606 ANEXO 4	Cumplimiento del Contrato	214.444.224,80	27/10/2023	09/02/2025
	Pago Salarios y Prestaciones Sociales	107.222.112,40	27/10/2023	09/10/2027
	Estabilidad y Calidad de la obra	214.444.224,80		5 años
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	643.332.674,40	27/10/2023	09/02/2025
	Calidad del servicio	32.873.600,00	27/10/2023	27/10/2028
39-40-101040702 ANEXO 5	Responsabilidad Civil Extracontractual	260.000.000,00	27/10/2023	09/12/2024

- **Contrato de Interventoría – Aseguradora Solidaria**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
600-47-994000070177 ANEXO 3	Cumplimiento del Contrato	47.660.400,00	27/10/2023	01/04/2025
	Pago Salarios y Prestaciones Sociales	47.660.400,00	27/10/2023	30/11/2027
	Calidad del servicio	71.490.600,00	27/10/2023	27/11/2028

5. PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO

- **Contrato de obra**

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS	DIRECTOR DE OBRA	30%

- **Contrato de interventoría**

Durante el periodo de la presente acta, el personal a cargo del proyecto fue:

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
ELIANA SARMIENTO CIFUENTES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	30%

6. INFORMES DEL PERIODO GENERADOS POR INTERVENTORÍA

TIPO DE INFORME	No. INFORME	FECHA
INFORME ESTUDIOS Y DISEÑOS	0	23/04/2024
INFORME SEMANAL (23/04/2024 – 28/04/2024)	1	29/04/2024

7. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Durante el periodo del presente informe no se utiliza maquinaria y/o equipos, toda vez que no se adelantan actividades de obra

8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA

- **ESTUDIOS Y DISEÑOS**

Finalizada la ejecución de estudios y diseños, se procede a realizar una revisión de los documentos de diseños nuevamente por parte de la nueva supervisión del Ministerio del Interior, quién presenta unas observaciones de forma respecto de los planos entregados, mediante comité de obra llevado a cabo el día 26 de febrero de 2024, las cuales fueron atendidas por el contratista y revisadas por la interventoría.

Mediante comités virtuales se realiza la verificación de la atención de observaciones por parte del Ministerio del Interior, cuyo recibo final de diseños se realiza el día 23 de abril de 2024, con la suscripción del anexo 22.

De acuerdo con el trámite de suscripción y legalización del anexo 22 en el Ministerio del Interior, se recibe aval para inicio de actividades de obra el día 29 de abril de 2024, momento desde el cual el contratista de obra inicia la logística de inicio para contratación de personal y movilización de materiales y equipos.

- **EJECUCIÓN DE OBRA**

Durante el presente mes no se llevaron a cabo actividades en obra, debido a que del 23 al 29 de abril, se dio trámite de suscripción y legalización de anexo 22,

para el recibo de estudios y diseños por parte del Ministerio del Interior, y autorización de inicio de obra.

9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el presente mes no se llevaron a cabo actividades en interventoría, debido a que del 23 al 29 de abril, se dio trámite de suscripción y legalización de anexo 22, para el recibo de estudios y diseños por parte del Ministerio del Interior, y autorización de inicio de obra.


10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 2.144.442.248,00	
Valor anticipo	$ 0,00	$643.332.674,40
Valor pagado actas parciales	$ 0,00	$ 0,00
Valor amortizado actas parciales	$ 0,00	$ 0,00
Saldo por pagar	$ 0,00	$ 1.501.109.573,60
Sumas Iguales	**$ 2.144.442.248,00**	**$ 2.144.442.248,00**

11. REPORTE DE AVANCE DE OBRA

% DE AVANCE DE OBRA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
% PROGRAMADO OBRA	0,70%	1,75%	61,84%	100%
% EJECUTADO OBRA	0,00%			
% EJECUTADO CONTRATO	7,66%			

NOTA: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

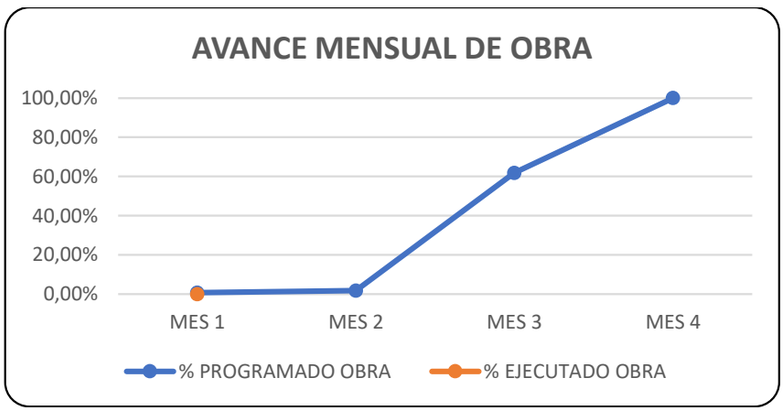

12. FECHAS DE COMITÉS REALIZADOS

02/11/2023	21/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	04/12/2023
22/12/2023	18/01/2024	26/02/2024		

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO







MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	ACTA DE RECIBO DE ENTREGABLES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ANEXO 22	PÁGINA	5 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Por parte de: **MINISTERIO DEL INTERIOR** **JHOAN SEBASTIAN NAVAS POVEDA** Cargo: Apoyo a la supervision Email: jhoan.navas@mininterior.gov.co Teléfono: 3176377744	Por parte de: **MUNICIPIO DE TURMEQUE** **JORGE ANDRES CUELLAR QUINTANA** Cargo: Secretario de planeación y Desarrollo Económico Email: planeacion@turmeque-boyaca.gov.co Teléfono: 3212304313
Por parte de: **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA** **ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES** Cargo: Representante Legal Email: interobrassc@gmail.com Teléfono: 3222167102	Por parte de: **CONTRATISTA DE CONSULTORÍA** **JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS** Cargo: Representante Legal Email: cotorgas@gmail.com Teléfono: 3125815250

IMÁGENES No 5, 6, 7, 8, Y 9 – ANEXO 22 CON APROBACIÓN DE INICIO

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el presente mes no se llevaron a cabo actividades de obra, debido a que el anexo 22 suscrito con el Ministerio del Interior y mediante el cual se da aval al inicio de obra, fue legalizado y socializado el día 29 de abril de 2024.

- Es necesario se gestione ante el Ministerio del Interior una prórroga al convenio, con el fin de reajustar los tiempos de ejecución de los contratos de obra e interventoría, acorde con el tiempo de obra inicialmente contratados.

INTEROBRAS SC SAS
R/L ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES
INTERVENTOR

MUNICIPIO:	**Turmequé-Boyacá**	**No. CONVENIO:**	**1621-23**
FECHA DE ACTA INICIO:	**17/07/2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:**	**16/08/2024**
ELABORÓ:	Jhoan Sebastian Navas Poveda	**FECHA DE VISITA:**	**09 y 10 mayo 2024**
TIPO DE PROYECTO:	**INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B**		

ASISTENTES

No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1.	Jhoan Sebastián Navas Poveda	Contratista	Supervisión – Ministerio del Interior
2.	Jorge Andres Cuitiva Quintana	Secretario De Planeación	Supervisión - Municipio de Turmequé
3.	Oscar Javier Briceño	Contratista	Supervisión - Municipio de Turmequé
4.	Camilo Saenz	Representante Legal Estudios, diseños y obra	UNION TEMPORAL COBING INFRATUR
5.	Eliana Sarmiento	Representante Legal Interventoría	INTEROBRAS SC S.A.S

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Carrera 2 # 3-10 sur

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

No. contrato	Nombre del contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Obra: LP-03-2023	**JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS**	**27/10/2023**	**16/08/2024**
Interventoría: CMA-002-2023	**ELIANA SARMIENTO CIFUENTES**	**27/10/2023**	**16/08/2024**

CUADRO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO 30% AL CONTRATO DE OBRA	$ 643.332.674.40	2023110003	03 NOV 2023

CUENTAS RECÍPROCAS

SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE	$ 429,027,923.60


DESARROLLO DE LA VISITA

El día 09 de mayo 2024 el Ing. Jhoan Navas, apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del interior, inicia con la visita de seguimiento a la ejecución contractual del convenio 1621-23 en el municipio de Turmequé-Boyacá, el Arq. Andres Cuitiva, supervisor del convenio por parte del municipio, manifiesta que por obligaciones previas no puede acompañar la visita en el presente día, por lo que delega verbalmente al Arq. Oscar Briceño para tal fin, no hay presencia por parte del contratista de estudios, diseños y obra, ni de interventoría.

El Ing. Jhoan Navas realiza el recorrido al lote, realiza registro fotográfico y evidencia material producto aparentemente del descapote sobre el lote, además de una estructura en mampostería, sin embargo, se deja constancia en la presente acta que el municipio remitió al Ministerio del Interior, acta de entrega del terreno al contratista de estudios, diseños y obra en la cual se manifiesta que el lote se encuentra nivelado, con retiro de capa vegetal y sin estructuras que puedan obstaculizar el desarrollo de la obra, la anterior suscrita también por la interventoría. No se evidencia la valla con la información del convenio ni la valla de la licencia de construcción. No se encuentran ejecutando actividades de obra ni se evidencia el inicio de las mismas.

Se recuerdan las obligaciones propias del municipio según acuerdo de condiciones, Clausula Segunda: ***"(…)26) Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL MUNICIPIO. (…)", (…) B. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. (…).***

El 10 de mayo 2024 se continua con la visita de seguimiento a la ejecución contractual del convenio, en el presente día asisten Arq. Andrés Cuitiva, supervisor del convenio por parte del municipio, Camilo Saenz representante legal del contrato de estudios, diseños y obra, y Eliana Sarmiento representante legal de interventoría, respecto a la valla del convenio se evidencia su instalación en la parte alta del CIC, se recomienda instalarla en un lugar visible a toda la comunidad y con sus respectivos soportes independientes, el Ing. Jhoan Navas pregunta los motivos por los cuales no se ha iniciado obra, el Ing. Camilo Saenz, manifiesta que se encontraba contratando el personal y realizando pedido de material, y que a más tardar el 14 de mayo 2024 se iniciaran con actividades de obra fisica, se le solicita al municipio presentar un plan de choque en el que se soporte las actividades pendientes a ejecutar, lo anterior a mas tardar el viernes 17 de mayo 2024, lo anterior en razón al atraso que presenta el actual cronograma del convenio.

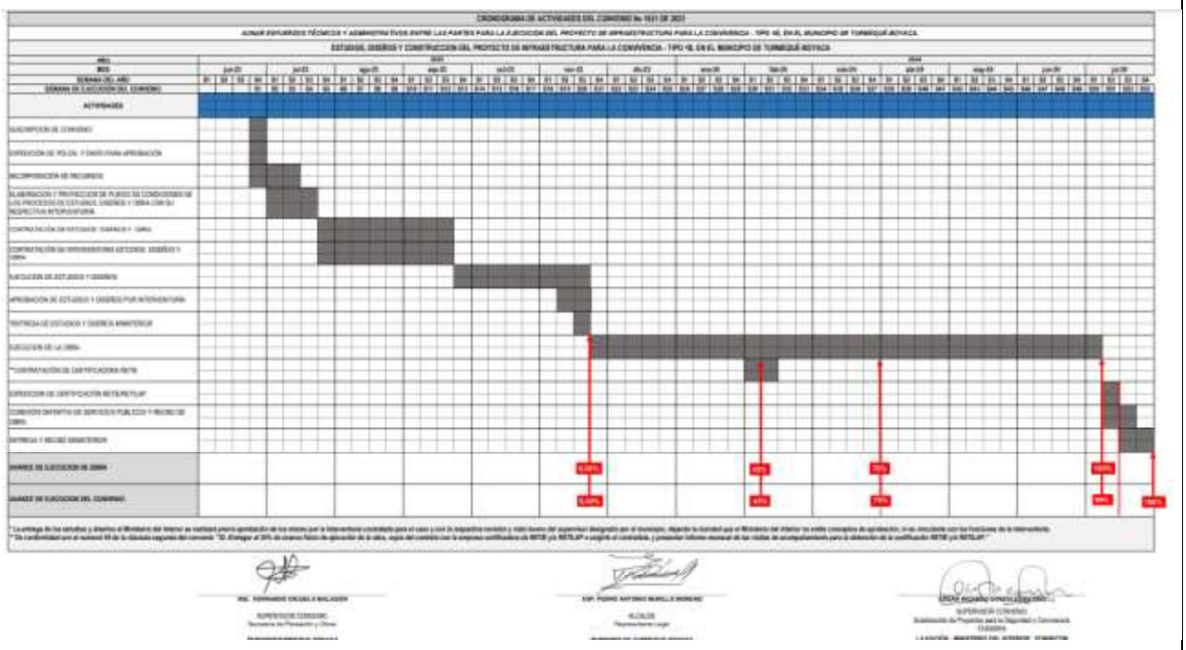

El Ing Jhoan Navas le manifiesta al municipio que las aclaratorias recibidas de los contratos derivados persisten en la terminación de los mismos, posterior al plazo de ejecución del convenio, por lo cual recomienda revisar y/o aclarar la situación, además dichas actuaciones no se reflejan en el secop, el Arq. Andres Cuitiva responde que la fecha fin de los contratos derivados es el 16/08/2024, y que el día de hoy se realizaran los respectivos cargues en la plataforma Secop. Se recuerda el compromiso de la visita realizada el pasado 04 de abril donde se solicitaba la aclaración y/o modificación de las pólizas de la contratación derivada y que a hoy no han sido entregadas ni cargadas al Secop, el Arq. Andres manifiesta que, aunque estas fueron modificadas se percibió otro error y que por lo tanto a mas tardar el 17 de mayo 2024 se entregaran con las subsanaciones pertinentes.

El Ing. Jhoan Navas solicita al municipio, licencia de construcción, informe mensual de supervisión del municipio, informes de ejecución de obra e interventoría, informes semanales de interventoría, certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas derivados frente al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto, el Arq. Andres Cuitiva manifiesta que respecto a la resolución de la licencia ya fue entregada y que esta es la única que representa la misma, por lo demás dice que a mas tardar el 14 mayo 2024 e entregara toda la documentación. El Ing. Camilo Saenz manifiesta que realizara su reprogramación acorde al la fecha de inicio de obra.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio Turmequé	Plan de choque para el cumplimiento estricto del cronograma del convenio	17 mayo 2024

Municipio Turmequé	Modificaciones y/o aclaraciones de pólizas	17 mayo 2024
Municipio Turmequé	Instalación de valla licencia de construcción	14 mayo 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)


FIRMA DE ASISTENTES	
Por parte de: ***MINISTERIO DEL INTERIOR***	*Por parte de:****MUNICIPIO***
Nombre y firma: Jhoan Sebastián Navas Poveda Cargo: Contratista Email: Jhoan.navas@mininterior.gov.co Celular:3176377744	**Nombre y firma: Jorge Andres Cuitiva Quintana** Cargo: secretario de Planeación Email: planeacion@turmeque-boyaca.gov.co Celular: 3212304313
Por parte de: Contratista de Estudios, Diseños y Obra	*Por parte de: Contratista de Interventoría*
Nombre y firma: Johan Camilo Saenz Rojas Cargo: Representante Legal Estudios, diseños y obra Email: cobingsas@gmail.com Celular: 3125919250	**Nombre y firma: Eliana Sarmiento Cifuentes** Cargo: Representante Legal Interventoría Email: interobrassc@gmail.com Celular: 3222167102

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Anexo 1.

Mínimo 6 fotos(Fotos de: Avance total de la obra)



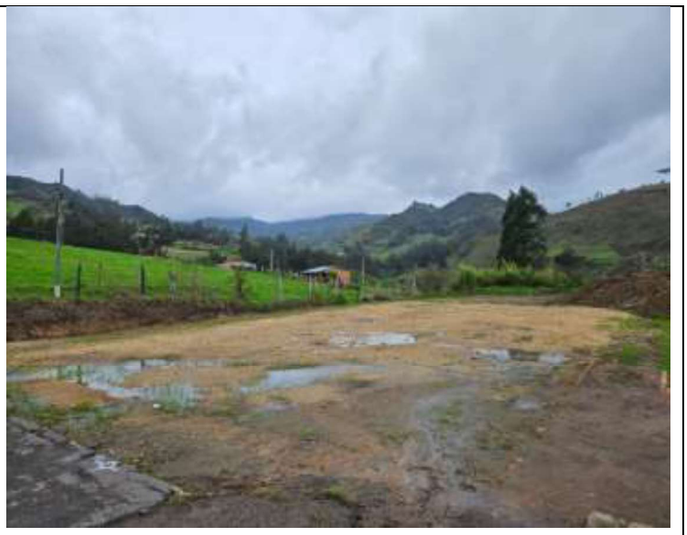








CENTRO DE
CONVIVENCIA, VIDA
Y TERRITORIO
