INFORME DE ACTIVIDADES FERNANDO ISAAC CERÓN ROSADA APOYO A LA SUPERVISIÓN CORPORACIÓN NASA KIWE – ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO DE OBRA No. 070-2024




CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS

PERIODO: JULIO DE 2024

SEGUIMIENTO CONTRATO

Julio 25 de 2024 – Contrato 070-2024 (Jair López Rojas)

San Miguel Arcángel, Páez: *Se visita la obra, se encuentra al personal de trabajo utilizando elementos básicos de seguridad industrial, desarrollando actividades de excavación para colectores y cámaras de inspección entre cámaras 6-7 y 7-8 para los cuales se mantienen profundidades mínimas en cámaras de 1,10 y anchos mínimos de excavación, considerando que se trata de un paso de servidumbre(camino), en el cual se han tenido algunas dificultades al encontrarse cruzando el sistema de alcantarillado existente y pases de la red de acueducto, los cuales han tenido que hacerse reparaciones donde se han afectado en el proceso, este tramo se recomienda debe realizarse de manera urgente para no generar incomodidad en la población siendo el camino de acceso a viviendas. Por otra parte, se determina en sitio la necesidad de conectar dos viviendas adicionales al sistema, las cuales al momento del diseño no existían, proyectando un colector de domiciliarias de aproximadamente entre 70 y 100 m. se ha realizado fundición de algunas cajas de inspección sanitaria para algunas viviendas, así como también la fundición de losas inferiores y cilindros para cámaras de inspección sanitaria para las cuales se verifica dimensiones de diseño y cumplen lo requerido (cámaras 2,3,4 y 5) por tanto se libera continuación de actividad. Se han realizado conexiones para algunas domiciliarias entre cámaras 4-5 y 6 en tubería de pared estructural 160mm según lo establecido en diseños, por tanto, se valida parcialmente. Se ha instalado la cinta de señalización para los tramos donde se labora de acuerdo a lo requerido en visita pasada, sin embargo no se ha hecho uso de la tela verde y cerramiento por tramos como se había sugerido, para el cual el contratista manifiesta que es posible por tratarse de un paso angosto, el cual es un cambio de servidumbre y no se puede cerrar y que tomaron otro tipo de acciones para este tramo, que a partir de la cámara #8 y en la PTAR se dispondrá de la tela verde a partir de la próxima semana cuando se adelanten actividades en esos sectores, de lo contrario se suspenderán labores.*

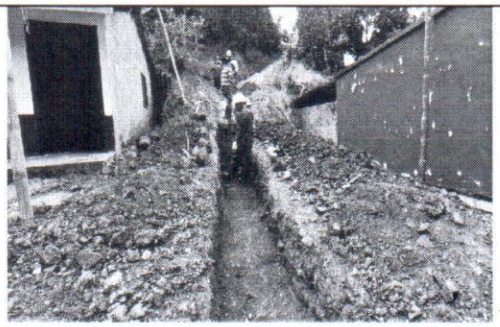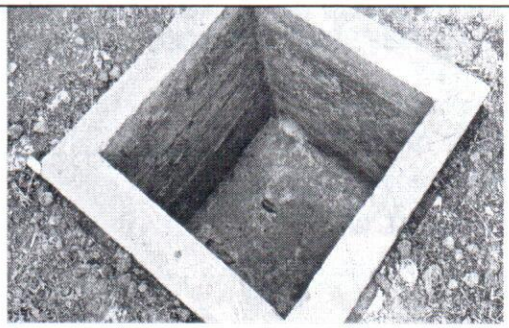
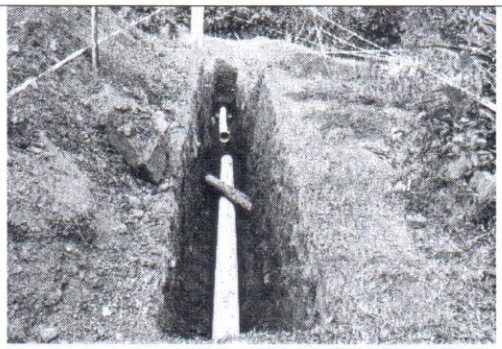





Julio 26 de 2024 – Contrato 070-2024 (Jair López Rojas)

San Miguel Arcángel, Páez: *Se visita nuevamente obra con el fin de determinar con el topógrafo y el equipo de trabajo del contratista el espacio ideal para ubicación de las estructuras de la PTAR en el área disponible para este fin, para lo cual se verifican niveles requeridos según el funcionamiento de las estructuras que la componen y las condiciones del terreno disponible de las cuales se dejan ubicando de manera preliminar con las dimensiones correspondientes, donde el topógrafo procede a la realización del levantamiento y localización con equipo de precisión . Por otra parte, se continúan actividades de excavación en material conglomerado y algunos tramos en material rocoso, para los tramos 6-7 y 7-8; el personal presente se encuentra utilizando elementos básicos de seguridad industrial y se verifica en planillas la seguridad social, los cuales se encuentran debidamente afiliados. Continúan con actividad de corte, armado de acero para losas y tapas de cámaras de inspección sanitaria, los cuales cumplen con lo requerido en diseño, por tanto, se aprueba continuación de actividad. Para la fecha se evalúa el avance de obra proyectado en cronograma de obra inicial con el 23% aproximadamente versus el real ejecutado de aproximadamente el 8%, con un gran desface en lo proyectado para lo cual se debe presentar un cronograma ajustado a la ejecución real de la presente fecha y tomar acciones necesarias para dar celeridad en la ejecución de las actividades implementando otros frentes de trabajo. Por último, de acuerdo a la solicitud de visitas anteriores el material pétreo se ha reubicado en un mejor sitio y con el material plástico sobre el suelo natural evitando la contaminación, practica que debe continuar durante toda la ejecución. se recomienda arrumar y acopiar de manera adecuada el material procedente de excavación para evitar accidentes*

en la obra e incomodidad en el flujo normal de las personas que transitan por estos sitios.

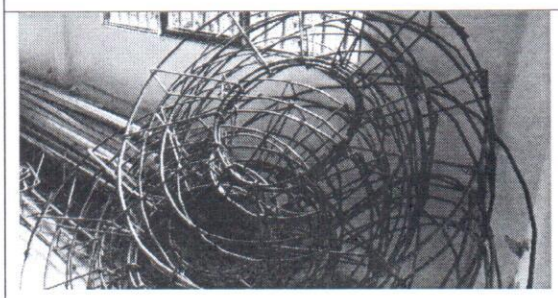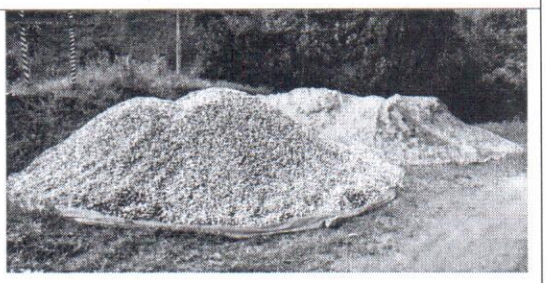

PROYECTO		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
Contrato de obra No. 070 de 2024: Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y PTAR de la localidad de San Miguel, resguardo de Avirama, municipio de Páez, departamento del Cauca.	PROGRAMADO (%)		5%	9%	23%	
	EJECUTADO (%)		0%	2%	8%	

A pesar de que se continúa avanzando y se cuenta con personal en obra, el avance no es el esperado con un rendimiento real del 8% aproximadamente vs el 23% programado a la fecha, por tanto, se solicita al contratista realizar ajuste en el cronograma de obra con el avance real e implementar de manera urgente acciones que le permitan adelantar de manera adecuada las actividades recuperar el tiempo perdido según lo programado inicialmente.

Ing. FERNANDO ISAAC CERON ROSADA
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico
