INFORME DE ACTIVIDADES FERNANDO ISAAC CERÓN ROSADA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CORPORACIÓN NASA KIWE – ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO DE OBRA No. 070-2024
CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS
PERIODO: JUNIO DE 2024

SEGUIMIENTO CONTRATO


Junio 02 de 2024 – Contrato 070-2024 (Jair López Rojas)

San Miguel Arcángel, Páez: *Se realiza visita al sitio, se encuentran realizando el acarreo de materiales de obra hasta el sitio de ejecución considerando el mal estado de la vía de acceso debido a las fuertes pendientes de que la componen y por la ola invernal que atraviesa la zona que también han afectado el tráfico normal en varios sitios de la malla vial. En el sitio de ejecución se ha realizado el replanteo topográfico de los colectores propuestos y cámaras de inspección sanitaria, para los cuales se han ubicado estacas de posición y referencias según corresponde, por tanto, se aprueba trazado topográfico hasta la última cámara de inspección propuesta. Por otra parte, se reúnen los propietarios del predio donde se va a ubicar la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), con el fin de determinar exactamente el área a disposición considerando que se trata de una finca familiar con cultivos de pan coger y se pretende realizar una optimización del espacio, teniendo en cuenta que esta finca es el sustento familiar, para lo cual se realiza un levantamiento preliminar de ubicación de estructuras conformando un área aproximada de 12 metros de ancho por 20 metros de largo aproximadamente con desniveles apropiados para la ubicación de las estructuras y en zona estable, área en la cual se encuentra incluida la PTAR existente, para la cual se está analizando la opción de no surtir demolición, para garantizar que mientras se construye el sistema de alcantarillado nuevo, se pueda seguir utilizando el anterior. Se recomienda al contratista dar celeridad en la ejecución de las actividades preliminares como excavaciones mientras se realiza el acarreo total de materiales hasta el sitio para iniciar actividades constructivas.*







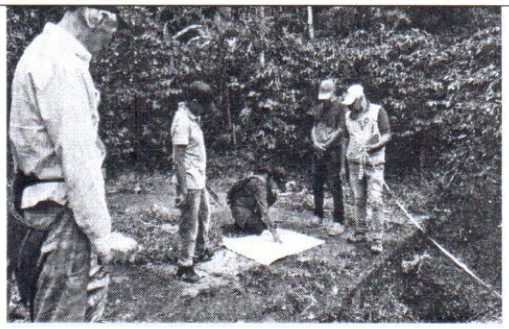



Junio 26 de 2024 – Contrato 070-2024 (Jair López Rojas)

San Miguel Arcángel, Páez: *Se realiza visita al sitio, se encuentra al personal de obra utilizando elementos básicos de seguridad industrial realizando actividades preliminares de excavación en material común y conglomerado para los primeros tramos de colectores iniciales y cámaras de inspección entre las cámaras 1-2, 2-3 y parte del tramo 3-4, para los cuales se han conservado profundidades no inferiores a 1,10 m considerando que se trata de caminos de servidumbre y con un ancho ideal fara facilidad de trabajo al interior de la excavación, así como también los alineamientos requeridos de acuerdo a lo propuesto en los diseños, por tanto se aprueba actividad parcialmente, por otra parte se han adelantado actividades de corte, armado y figurado de acero para cámaras de inspección para el cual se rectifican dimensiones y diámetros de diseño, los cuales cumplen según lo requerido, por tanto se aprueba parcialmente la actividad. Adicionalmente se verifica el acopio de materiales de construcción en el sitio de trabajo y se puede evidenciar un buen almacenamiento del acero, cemento y tuberías en el salón comunal de la localidad, con fecha de caducidad vigente, de acuerdo a lo solicitado, pero para el caso de los agregados pétreos se han dispuesto directamente al suelo para lo cual se recomienda al contratista se debe reubicar el material evitando el contacto directo con el suelo y la contaminación por agentes externos. Finalmente se solicita al contratista de manera urgente ubicar cinta de señalización y cierre en tela verde y bastidores para los tramos donde se están adelantando labores, evitando accidentes de la comunidad y moradores de la zona.*





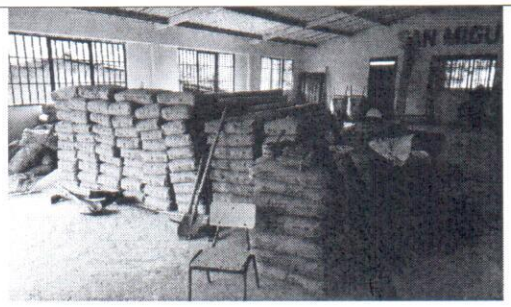

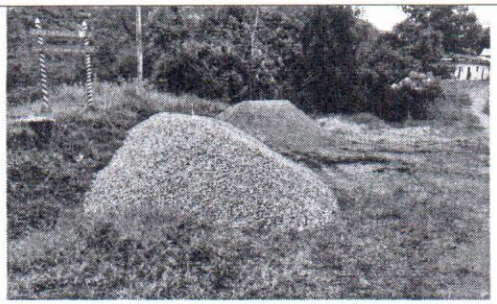

PROYECTO		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
Contrato de obra No. 070 de 2024: Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y PTAR de la localidad de San Miguel, resguardo de Avirama, municipio de Páez, departamento del Cauca.	PROGRAMADO (%)		5%	9%		
	EJECUTADO (%)		0%	2%		

Se han iniciado actividades preliminares en la ejecución, se cuenta con buen personal en obra, pero no se avanza de manera adecuada considerando el avance real del 2% aproximadamente vs el 9% programado en cronograma de actividades, se espera en el siguiente mes compensar porcentaje de desface para nivelar lo proyectado para lo cual se debe dar celeridad en la ejecución de las actividades, de lo contrario se deberá realizar ajuste al cronograma de obra presentado inicialmente y tomar acciones necesarias que permitan recuperar el tiempo perdido.

Ing. FERNANDO ISAAC CERON ROSADA
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico
