SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: Dirección Administrativay Financiera	**Objetivo:** Realizar seguimiento al lavado de tanques y desarenador.	
Fecha: 19 de julio del 2024	**Lugar:** Super CADE 20 de julio	**Hora:** 08:00 am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firm
Christian Henrique Parias Villalba	DAF-PIGA	SGAMB	3186712376	
Jacobo Villarreal Peña	DAF	SGAMB	3004344570	
Diego Armando Muñoz Varela	DSDSC	SGAMB	3112206637	

Desarrollo

Se realizó seguimiento y verificación del procedimiento de lavado de tanque subterráneo de aguas lluvias y desarenador donde se evidencio que la empresa fumigaciones el Triunfo Car, es la encargada de realizar la actividad donde dos técnicos hicieron presencia para adelantar la actividad.

Del procedimiento se evidencio lo siguiente:

1. El tanque subterráneo de agua potable se encontraba lleno por tal motivo se realizó aplazamiento del lavado hasta nueva programación según estado del nivel del tanque.
2. En el recorrido se evidencio que se cuenta en la sede con dos sistemas desarenadores en cada una de las dos líneas de abastecimiento de aguas lluvias al tanque de almacenamiento, pero solo se tenía en el requerimiento el lavado de un solo desarenador. Se rquiere programar lavado del segundo desarenador
3. Se realizó verificación del lavado subterráneo del tanque de agua lluvia y se evidencio que no se realizó de manera adecuada el procedimiento, teniendo en cuenta que las superficies internas presentaban acumulación de materia orgánica y deficiente limpieza; por tal motivo se solicitó realizar al técnico nuevamente el procedimiento.
4. El procedimiento de lavado de desarenador se limitó a retirar lodos y no se realizó lavado de la estructura del desarenador.
5. Se finalizó el procedimiento realizando las observaciones por parte del enlace ambiental de la Sede, Ingeniero de infraestructura de la zona sur y profesional del equipo PIGA de la Entidad.

Anexos:


- Registro fotográfico



Materia organica presente en los muros despues del lavado realizado por la fumigaciones el Triunfo Car.



Condiciones de la Malla de cribado de ingreso a tanque subterraneo de aguas lluvias despues de lavado.

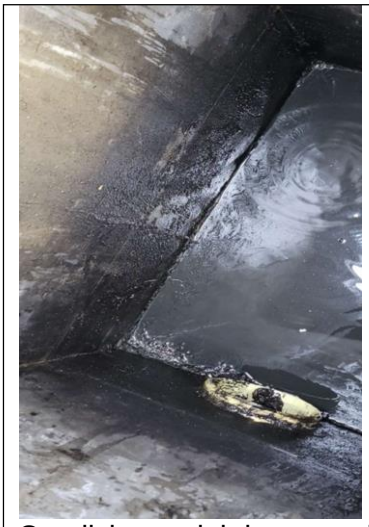

Condiciones del desarenador después de haberse retirado los lodos pero no se le realizo lavado.



Los lodos que fueron retirados se embalaron en bolsa doble de color negra para ser dispuestos en el vehículo recolector de residuos del operador de la zona.
