sucomputo
infraestructura tecnológica

INFORME UPS
(2024/06/22) Requisición: 267705
Tipo Actividad: SERVICIO

Datos del Cliente

Datos del Cliente: C83000282_1
Cliente: Unidad de Planeacion Minero Energetica / Upme
Dirección: Bogota DC, Avenida calle 26 No 69D-91 Torre 1Oficina 901
Barrio:

Datos del Técnico

Usuario
Hernan Dario Gomez
401



Fechas de Visita

Fecha: 2024/06/22	**Hora inicial:** 2024/06/22 09:13:40	**Hora Final:** 2024/06/22 10:40:05	**Duración total:** 01:26:25

Pausas

Inicio	Fin	Duración
2024/06/22 09:30:48	2024/06/22 10:39:27	01:08:39
Duración total pausas		01:08:39
Duración sin pausas		**00:17:46**

Información del Servicio

Tipo de servicio a facturar
Contrato

Fotos del Técnico



PERMISO DE TRABAJO

Nivel de Tensión a Trabajar
208

SELECCIONE

1. ¿Tiene y utiliza todos los elementos de protección personal?
SI

2. ¿Identifica y controla los peligros y riesgos propios de la actividad?
SI

3. ¿Las herramientas que va a utilizar están aisladas y/o certificadas a 1000 Voltios de acuerdo al nivel de tensión a trabajar?
SI

4. ¿Los equipos eléctricos a utilizar se encuentran conformes?
SI

5. ¿Tiene claros los procedimientos de riesgo eléctrico, emergencia y punto de encuentro del lugar donde realiza la actividad?
SI


6. ¿Cumple las reglas de oro (Señalizar y/o Etiquetar, Desenergizar, Verificar ausencia de tensión), aplicables a la tarea que va a realizar?
SI

7. ¿Verifica las condiciones seguras para energizar?
SI

Diagnostico Inicial
UPS encontrada operando en sistema normal sosteniendo la carga y sin alarmas activas

Ubicación del Equipo
Rack # 4

Foto Ubicación del Equipo



Número de Inventario
SI

Foto Número de Inventario



Tipo de Servicio
PREVENTIVO

Foto Inicial del equipo



Marca del Equipo
APC

Modelo del Equipo
SURTD5000RMXLP3U

Serial de equipo
QS1324271708


Foto del serial del equipo




El equipo cuenta con tarjeta SNMP
SI

Tiene punto de red
SI

Fotos tarjeta SNMP



Fotos punto de Red



Capacidad (KVA)
5

Estado de la Conexión

Barrajes

BIEN

Breaker´s

BIEN

Bypass Externo

NO APLICA

Rack de Baterías

BIEN

Tablero Eléctrico

NO APLICA

Tomas y Clavijas

BIEN

Tensión de Entrada (VAC) F-N

F1
:
123

F2
:
124

F3
:
1

Tensión de Entrada (VAC) F-F
210

Tensión de Entrada (VAC) N-T
0.2

Corriente de Entrada (AMP)

F1
:
2

F2

:
3

F3
:
1

Frecuencia de Entrada HZ
60

Tensión de Salida (VAC) F-N

F1
:
120

F2
:
121

F3
:
1

Tensión de Salida (VAC) F-F
209

Corriente de Salida (AMP)

F1
:
2

F2
:
2

F3
:
1

Carga de Salida (KW)

F1
:
0.2

F2
:
0.2

F3
:
1

Frecuencia de Salida HZ
60

Polaridades
BIEN


Neutro Aislado
BIEN


Pruebas del Equipo - Cargador




Voltaje de flotación

208

Fotos durante el servicio



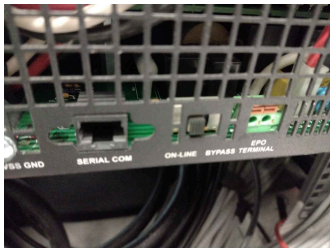

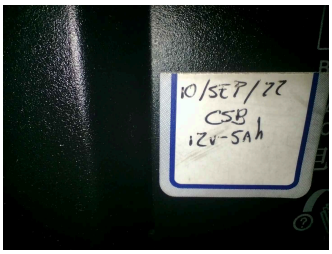Informe de Baterías

01. Marca:

Csb

03. Voltaje:

12

04. AH:

5

05. Número de Bancos:

1

06. Estado

Operativo

07. Conexión:

Bien

08. Estado de los bornes:

N/A

09. Fecha de Fabricación:

2022

10. Cantidad

16

02. Referencia:

12/5

Adicionar Informe de Baterías?
NO

Inversor queda funcionando?
SI

Pruebas del equipo - Generales

Bypass del equipo

NO APLICA

Estado final del equipo

BIEN

Limpieza de Baterías

NO APLICA

Limpieza del Equipo

BIEN

Soporte del equipo con carga

BIEN

Se dicto capacitación
NO

Observaciones Técnicas

Describa el trabajo realizado
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIN APAGADO: Se encontró UPS en sistema normal, sosteniendo la carga y sin alarmas activas, con autorización del cliente se revisa estado del equipo por display y toma de consumos en tomas de entrada y salida, revisión de ventiladores, todo aparentemente en buen estado, con limpieza externa, UPS trabajando en sistema normal sosteniendo la carga y sin alarmas activas. Con 5 % de carga, baterías del 2022 Sin bypass externo, ventilación de aire acondicionado adecuada.

Observaciones Técnicas
Ninguna

Foto Final del Servicio





Los residuos quedan bajo custodia del cliente
N/A

Firma Técnico



Calificación del Servicio por el cliente

Asistecia Técnica
Excelente

Atención al Usuario
Excelente

Presentación Personal
Excelente

Puntualidad
Excelente

Recibido por

Cargo
Contratista

E-mail
edison.velasquez@upme.com.co

Nombre
Edinson Velázquez

Telefono
3185893186

Firma Cliente



Autoriza el tratamiento de los datos consignados en el informe del cliente, de acuerdo a la ley 1581 de 2012
SI

UBICACIÓN



4.6616283, -74.1096285

SERVICIO

OPERATIVO


clickidea
