		COD. FORMATO	
		VERSIÓN	
		FECHA APROBACIÓN	
	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		

CONTRATO	**026**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**4**	**INFORME FINAL**	

1. **DATOS GENERALES**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	034 DE FEBRERO 24 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	FEBRERO 21 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VÍAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE.
CONTRATISTA	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA
NIT	1113311986-2
REPRESENTANTE LEGAL	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	1113311986
CIIU	4923 Transporte de carga por carretera
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 27.500.000

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Actas parciales de avance de actividades aprobadas por el supervisor con su respectiva factura y planilla de seguridad social pagada.				
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	DICIEMBRE 30 DE 2024				
Supervisión e Interventoría	Nombre	CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO Secretario De Obras Públicas			
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	FEBRERO 21 DE 2024			
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0000050	Valor(es)	$ 27.500.000	FECHA(S)	ENERO 22 DE 2024
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
Nº	0000277	Valor (es)	$ 27.500.000	FECHA (S)	FEBRERO 21 DE 2024
Rubro presupuestal afectado:	2.3.2.02.02.0092402112979904 - Propósito General Libre Inversión				
Valor contratado	$ 27.500.000				
Valor primer pago parcial	$ 2.750.000				
Valor segundo pago parcial	$ 2.750.000				
Valor tercer pago parcial	$ 2.750.000				
Valor cuarto pago parcial	$ 2.750.000				
Valor cancelado a la fecha	$ 8.250.000				
Saldo por ejecutar	$ 16.500.000				

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	4552400181	MAYO
PENSION	4552400181	MAYO
ARL		

2. **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades

ACTIVIDADES CONTRATADAS

DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
Realizar inspección Motoniveladora	No.	264	28.000	**7.392.000**
Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	No.	44	90.000	**3.960.000**
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	No.	44	367.000	**16.148.000**
TOTAL				**$27.500.000**

ACTIVIDADES EJECUTADAS

DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
Realizar inspección Motoniveladora	N°	26.4	28.000	**739.200**
Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	N°	4.4	90.000	**396.000**
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	N°	4.4	367.000	**1.614.800**
TOTAL				**$2.750.000**

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESULTADO	% DE EJECUCIÓN Informe 1
22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Realizar inspección Motoniveladora y Retroexcavadora	Inspección de: niveles de aceite motor e hidráulico, líquido de frenos. Filtros, correas, combustible, batería, luces, pito, alarma, llantas, frenos, espejos, equipo de carretera, extintor, botiquín, cinturón de seguridad **(Cant. 26.4)**	**10%**
		Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora y Retroexcavadora	Realización de mantenimientos preventivos **(Cant. 4.4)**	**10%**
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS RURALES	**Atención de 135.5 Kms de vías rurales** Mediante la operación de los equipos: motoniveladora (según se requiera) en vías rurales - Limpieza de cunetas y conformación de vía - Limpieza de barrancos (bermas) - Cargue de material de afirmado para disponerlo en las vías	Sector Vía Barragan, Longitud de vía **4 kms**. Apoyo en limpieza de andenes luego de la guadañada y limpieza de sumideros afectados por la ola invernal. Sector Vía Samaria – Fuente Hermosa – La Frontera. Longitud **0.03 km**, Se conformo tramo que se encontraba en malas condiciones. Sector La Tagua – Montegrande. Longitud **0.10 km** Se conformó vía con material roca muerta para mitigar los pasos más deteriorados por la lluvia. Sector Travesías hasta Puerto Rico. Longitud **0.40 km**, Se intervienen sectores críticos realizando mantenimiento de la vía en cuanto a desagües y esparcimiento de roca muerta.	**9%**

			Sector Verdún. Longitud **0.20 km**, Se realizó Céreo, cajeo y nivelación de terreno, además de conformación con material base y sub base en la vía para el respectivo asfalto.	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS URBANAS	**Atención de 4Km de vías urbanas** Mediante la operación de los equipos: retroexcavadora, Retroexcavadora (según se requiera) en vías urbanas. - Conformación de cunetas, - Conformación de banca. -Aplicación riego y compactación de material sobre las vías	Apoyo en la construcción de dos (2) rampas (Cra. 15 Calle 11 y 12 Esquina) con la normatividad vigente para el acceso a los andenes de los discapacitados. Sector calle 13 Longitud de vía **0.02 km**. se conformó haciendo una limpieza de capa vegetal y realizando la respectiva cuneta. Sector Samaria por el Crucero, Longitud **4 km**. Se esparcieron 32 m3 de material roca muerta en puntos críticos y re realizaron desagües y cunetas. Sector La Camelia Apoyo en creación de filtro 10 metros lineales aprox. para mitigar dos nacimientos presentes frente a dos casas y afectaban la vía.	**4%**
		Atención de vías en asfalto 10M3. Aplicación de asfalto, tipo reparcheo en las vías que lo requiera en una longitud existente de 2.6KM de vías asfaltadas en la zona urbana	Sector Parque Principal. Longitud 0.01 km. Se realizo reparcheo de la calle frente al C.A.M. usando 50 kl de asfalto frio.	**2.5%**

	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	Mediante la operación de Retroexcavadora, Cargador, (según se requiera) dado en M3:	Sector Samaria por el Crucero, se esparcieron 32 m^3 de material roca muerta en puntos críticos, se realizaron desagües y cunetas. Sector Vía Samaria a dos kilómetros de la Isabela. Se realizó mitigación y ampliación de la vía, donde se presenta falla. Se descargaron 84 m^3 de aproximadamente de tierra. Sector Vía Samaria – Fuente Hermosa – La Frontera. Se conformó y se llevaron 32 m^3 de material de rio en puntos críticos. Sector La Tagua – Montegrande. Se conformó vía con material roca muerta 14 m^3 para mitigar los pasos más deteriorados por la lluvia. Sector Travesías hasta Puerto Rico. Se intervienen sectores críticos realizando mantenimiento de la vía en cuanto a desagües y esparcimiento de roca muerta 53 m^3. Sector Verdún. Se realizó Céreo, cajeo y nivelación de terreno, además de conformación con material base y sub base, 126 m^3 en la vía para el respectivo asfalto	

4.3 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS	
4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.** Mantenimiento Preventivo de motoniveladora y retroexcavadora. se realizó inspección pre operativa diariamente de la retroexcavadora Cat 416e y la motoniveladora New Holand RG140b antes de cada labor y se realizó mantenimiento preventivo semanal (4 veces en el mes) con engrase a partes móviles, limpieza, verificación de pernos y tornillos con correcto ajuste y calibración de aire a las llantas de los equipos. Sector Vía Barragán, Longitud de vía 4 kms. Apoyo en limpieza de andenes luego de la guadañada y limpieza de sumideros afectados por la ola invernal. Sector Vía Samaria – Fuente Hermosa – La Frontera. Longitud 0.03 km, Se conformo tramo que se encontraba en malas condiciones. Sector La Tagua – Montegrande. Longitud 0.10 km Se conformó vía con material roca muerta para mitigar los pasos más deteriorados por la lluvia. Sector Travesías hasta Puerto Rico. Longitud 0.40 km, Se intervienen sectores críticos realizando mantenimiento de la vía en cuanto a desagües y esparcimiento de roca muerta. Sector Verdún. Longitud 0.20 km, Se realizó Céreo, cajeo y nivelación de terreno, además de conformación con material base y sub base en la vía para el respectivo asfalto. Apoyo en la construcción de dos (2) rampas (Cra. 15 Calle 11 y 12 Esquina) con la normatividad vigente para el acceso a los andenes de los discapacitados. Sector calle 13, Longitud de vía 0.02 km. se conformó haciendo una limpieza de capa vegetal y realizando la respectiva cuneta. Sector Samaria por el Crucero, Longitud 4 km. Se esparcieron 32 m3 de material roca muerta en puntos críticos y re realizaron desagües y cunetas. Sector La Camelia, Apoyo en creación de filtro 10 metros lineales aprox. para mitigar dos nacimientos presentes frente a dos casas y afectaban la vía. Sector Parque Principal. Longitud 0.01 km, Se realizo reparcheo de la calle frente al C.A.M. usando 50 kl de asfalto frio. Sector Samaria por el Crucero, se esparcieron 32 m3 de material roca muerta en puntos críticos, se realizaron desagües y cunetas. Sector Vía Samaria a dos kilómetros de la Isabela. Se realizó mitigación y ampliación de la vía, donde se presenta falla. Se descargaron 84 m3 de aproximadamente de tierra. Sector Vía Samaria – Fuente Hermosa – La Frontera. Se conformó y se llevaron 32 m3

	de material de rio en puntos críticos. Sector La Tagua – Montegrande. Se conformó vía con material roca muerta 14 m3 para mitigar los pasos más deteriorados por la lluvia. Sector Travesías hasta Puerto Rico. Se intervienen sectores críticos realizando mantenimiento de la vía en cuanto a desagües y esparcimiento de roca muerta 53 m3. Sector Verdún. Se realizó Céreo, cajeo y nivelación de terreno, además de conformación con material base y sub base, 126 m3 en la vía para el respectivo asfalto.
Cumplir con el alcance del objeto del contrato, así como las especificaciones esenciales y éticas., tales como mantenimiento y mejoramiento de la red vial urbana y rural del Municipio de Caicedonia.	El contratista en cumplimiento de las obligaciones contractuales hace entrega de los siguientes documentos: - Informe de ejecución y Registro fotográfico de actividades - Factura No. DSE1472 - Comprobante de pago de seguridad social mes de mayo **REGISTRO FOTOGRÁFICO** Apoyo construcción 2 rampas en andenes para discapacitados Cra. 15 Calle 11 y 12  




Limpieza de andenes, luego de guadañada en sumideros





Conformación con limpieza de capa vegetal en la Callle 13



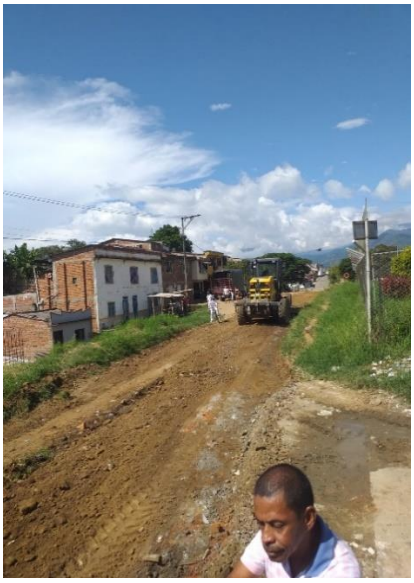

Esparcimiento de material roca muerta en puntos críticos Vía Samaria






Mitigación y ampliación de la vía por falla geológica vía Samaria





Conformación vía Samaria – Fuente Hermosa – La Frontera

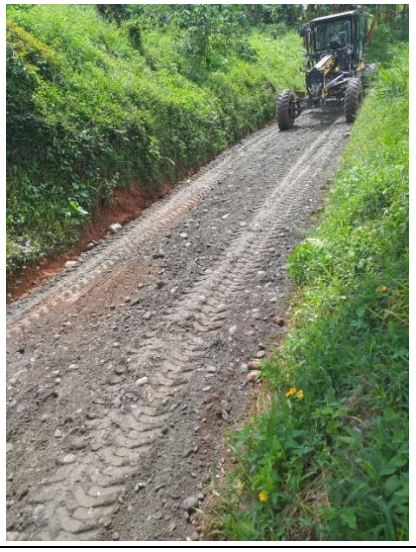



Mantenimiento y Conformación vía La Camelia





Construcción de filtro para mitigar dos nacimientos presentes en la Camelia





Reparcheo con asfalto parque principal Calle





Conformación de vía San Isidro





Riego de material roca muerta para mitigación de vía sector la Tagua - Montegrande





Mantenimiento de vía y esparcimiento de roca muerta sector Travesías – Puerto Rico





Apoyo con céreo para asfaltar sector Verdún





Mantenimiento preventivo





4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	**$ 2.750.000** Dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte.

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

Una vez analizados los compromisos de las partes y corroborado el cumplimiento de los mismos, el Secretario de Obras Públicas Supervisor, CERTIFICA en la presente acta que se ha verificado y está conforme a las especificaciones del Contrato de Prestación de Servicios No. 026 de Febrero 21 de 2024 y recibido a satisfacción el INFORME parcial de actividades por lo que se autoriza efectuar el pago parcial del contrato.

Ciudad y fecha de emisión:	02 de Julio de 2024
Firma del interventor y/o supervisor:	CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO Secretario de Obras Públicas Supervisión
