INFORME SEMANAL

Semana Número: 6 Del: 9 de octubre de 2023 Al: 15 de octubre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 70 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,97%	1,97%
Valor básico de la Obra	$ 5.834.837,50	$ 5.834.837,50

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,37%	1,37%
Valor básico de la Obra	$ 405.729,70	$ 405.729,70

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	5 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



Pañetes en muros de atencion al publico, hall de acceso y oficina administrativa # 1,

desmonte de muebles de cocina

desmonte de cielo raso y limpieza en cuarto de planta electrica




pañetes muros y desmonte de paneles y cielo raso cuarto de planta elctrica



pañetes general hall 1er piso




pañetes muros atencion al publico

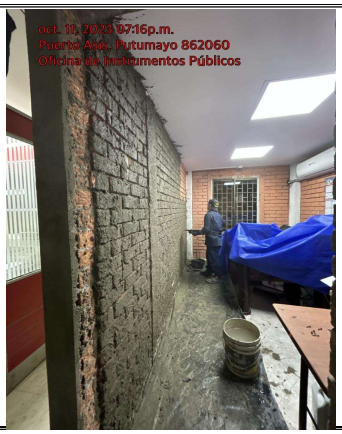

pañetes en oficina administrativa #1



demolicion de enchape en baño auxiliar 1er piso

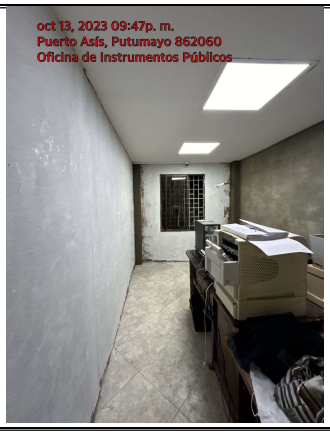

estuco oficina administrativa #1

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555
