INFORME SEMANAL No.8

Semana Número: 9 Del: 30 de Octubre de 2023 Al: 5 Noviembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 91 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10,00%	37,00%
Valor básico de la Obra	$ 29.618.464,62	$ 109.588.319,08

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,00%	17,00%
Valor básico de la Obra	8.885.539,38	50.351.389,85

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	5 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



IMAGENES AVANCE






Instalación de Puertas en Oficina Administrativa No.1 y Baño No.1





Instalación de mueble oficina administrativa No.1

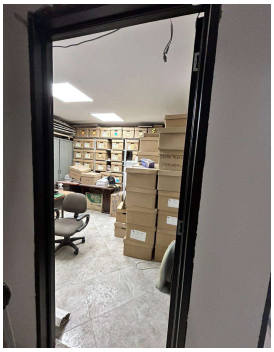




Instalación de Puerta en oficina de gestión documental

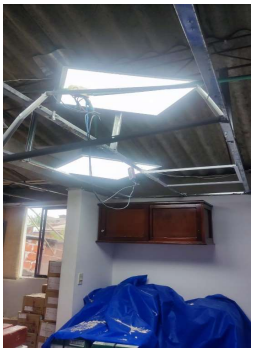

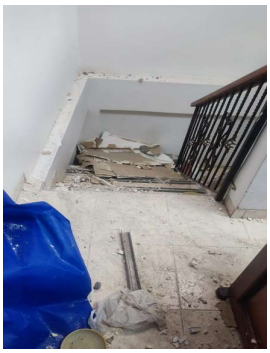


Desintalación de cielo falso en el segundo piso



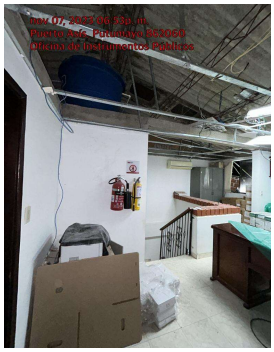

Desinstalación de cielo falso en el segundo piso

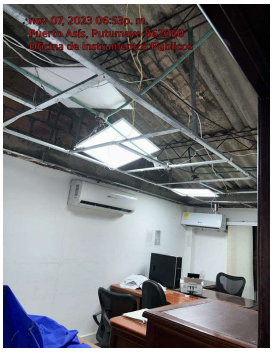



Desinstalación de cielo falso en el segundo piso

Actividades ejecutadas:

Instalación de Puertas en madera en el primer piso

Desinstalación de cielo falso en el segundo piso

No se realizaron actividades desde el día 1 de noviembre hasta el día 3 de noviembre por cambio de empresa de seguridad en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, puesto que, se debió realizar nuevamente la gestión de permisos de ingreso para el personal.

Firma

Nombre : J. Andres Melo G,

Matrícula No.: A201020555
