SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y REGISTRO

INTERVENTORIA GRUCOING S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1708 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)



INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA
Del 01 al 31 de enero de 2024

BOGOTA, ENERO DE 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES 4
2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 4
2.2. RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 5
2.3. RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6
3. INFORME TÉCNICO 7
3.1. Construcción a ejecutar 7
3.2. Localización 8
4. REGISTRO EVALUACIÓN TÉCNICA 9
4.1. Registro de ejecución de obra 9
4.2. Control del clima 13
4.3. Programación de obra 13
5. INFORME FINANCIERO 34
5.1. INTERVENTORÍA 34
5.2. CONTRATISTA 35
5.2.1. PROGRAMADO VS EJECUTADO 37
5.3. ANTICIPO 38
5.4. RELACIÓN FINANCIERA 39
6. INFORME ADMINISTRATIVO 39
6.1. PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA 39
6.2. PERSONAL INTERVENTORIA DE OBRA 39
6.3. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 40
6.4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S 42
6.5. Correspondencia recibida SNR 43
6.6. Relación de comités de obra y reuniones 45
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 46
8. ANEXOS 47

INTRODUCCION

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual de interventoría N°6 del periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2024; de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1708 de 2023 y sus anexos, se da cumplimiento al objeto contractual verificando que la obra objeto del contrato que se interviene, se eje-cute de acuerdo con los documentos y especificaciones en forma integral, con los enfoques, organigramas, recursos humanos y dentro del plazo contractual.

A través de este informe cuyo objeto contractual es "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)".** Se presentan los Controles técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las actividades desarrolladas durante todas las fases de ejecución del contrato que se interviene; así mismo se describe la información detallada que evidencia el desarrollo del contrato conel contratista **SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S**, se presentarán todos los por menores correspondientes a la ejecución del contrato.

2. GENERALIDADES

2.1. Datos generales del contrato.

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	GRUCOING S.A.S
CONTRATO:	1708 DE 2023
OBJETO:	CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"
PLAZO DE EJECUCION:	6 MESES 29 DIAS
FECHA DE INICIO:	31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 1:	N/A
SUSPENSION 1:	N/A
FECHA DE TERMINACION:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
ADICION 1:	28 DE FEBRERO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$352.258.326.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$352.258.326.00
SUPERVISOR:	ING. JAQUELINE GUZMAN HERAZO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
CONTRATO:	1675 DE 2023
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS

	OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACIÓN 2
PLAZO DE EJECUCION:	5 MESES 16 DIAS
FECHA DE INICIO:	31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 1:	N/A
SUSPENSION 1:	N/A
FECHA DE TERMINACION:	5 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICION 1:	15 DE ENERO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1974.357.452.93
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1974.357.452.93
SUPERVISOR:	ING. JAQUELINE GUZMAN HERAZO

2.2 RELACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza de seguro de cumplimiento – Acta de inicio
Aseguradora: Mundial de Seguros
No de póliza: NB-100269103

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL		VALOR ASEGURADO
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**06/07/2023**	**21/05/2024**	**$394.871.490,40**
PRESTACIONES SOCIALES	**06/07/2023**	**21/11/2026**	**$98.717.872,60**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	**21/11/2023**	**21/11/2028**	**$394.871.490,40**

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual -Inicial
Aseguradora: Mundial de Seguros
No de póliza: NB-100064873

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL		VALOR ASEGURADO
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BASICO –	**06/07/2023**	**21/11/2023**	**$348.000.000,00**

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			
PATRONAL	**06/07/2023**	**21/11/2023**	**$104.400.000,00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**06/07/2023**	**21/11/2023**	**$104.400.000,00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**06/07/2023**	**21/11/2023**	**$104.400.000,00**

Póliza de seguro de cumplimiento – Modificación
Aseguradora: Mundial de Seguros
No de póliza: NB-100269103

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL		VALOR ASEGURADO
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**31/07/2023**	**16/06/2024**	**$394.871.491,00**
PRESTACIONES SOCIALES	**31/07/2023**	**16/12/2026**	**$98.717.872,75**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	**16/12/2023**	**16/12/2028**	**$394.871.491.00**

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual – Modificación
Aseguradora: Mundial de Seguros
No de póliza: NB-100064873

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL		VALOR ASEGURADO
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	**31/07/2023**	**16/12/2023**	**$348.000.000,00**
PATRONAL	**31/07/2023**	**16/12/2023**	**$104.400.000,00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**31/07/2023**	**16/12/2023**	**$104.400.000,00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**31/07/2023**	**16/12/2023**	**$104.400.000,00**

2.3 RELACION POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Póliza de seguro de cumplimiento – Inicial
Aseguradora: Seguros del Estado
No de póliza: 96-44-101183055

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL

	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**13/07/2023**	**30/06/2024**	**$70,451,665.20**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	**13/07/2023**	**31/12/2026**	**$17,612,916.30**

Póliza de seguro de cumplimiento – Acta de inicio
Aseguradora: Seguros del Estado
No de póliza: 96-44-101183055

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL		VALOR ASEGURADO
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**31/07/2023**	**18/07/2024**	**$70,451,665.20**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	**31/07/2023**	**18/01/2027**	**$17,612,916.30**

Póliza de seguro de cumplimiento – Modificación
Aseguradora: Seguros del Estado
No de póliza: 96-44-101183055

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL		VALOR ASEGURADO
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**31/07/2023**	**18/07/2024**	**$70,451,665.200**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	**31/07/2023**	**18/01/2027**	**$17,612,916.30**

3. INFORME TECNICO

3.1 Construcción a ejecutar

De acuerdo con las prioridades de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, el contrato de obra se encuentra estipulado en CONTRATAR POR EL SISTEMADE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACIÓN 2, con una asignación de las siguientes oficinas u/o ORIP adjudicadas a el contratista de obra para su adecuación mejoramiento y

mantenimiento, ORIP ACACIAS $ 341.793.536,10, ORIP BUCARAMANGA $ 327.791.724,09, ORIP CHARALA $ 229.567.226,93, ORIP FACATATIVA $ 327.791.724,09, ORIP PUERTO ASIS $ 296.184.646,22, ORIP PUERTO INIRIDA $ 257.460.500,85, ORIP SAN VICENTE DEL CAGUAN $ 211.933.007,73 y un valor total asignado de $1974.357.452.93.

3.2 Localización

Las siguientes Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos – ORIP, se encuentran en los diferentes departamentos del país, tales son: ACACIAS – META, BUCARAMANGA Y CHARALA- SANTANDER, FACATATIVA – CUNDINAMARCA, SAN VICENTE DEL CAGUAN – CAQUETA, PUERTO ASIS – PUTUMAYO, PUERTO INIRIDA – GUAVIARE



MAPA DE COLOMBIA – LOCALIZACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

4. REGISTRO Y EVALUACION TECNICA

A continuación, se describe las actividades ejecutadas acompañadas de registro fotográfico conlas cuales se soportan las visitas técnicas de obra durante el periodo.

4.1 Registro de ejecución de obra

Durante este periodo, se inicia las diferentes actividades de ejecución de obra, se realiza la visita técnica de obra.

ACTIVIDADES

- *Continua la revisión de presupuestos de obra*
- *Continua la revisión de flujos de caja*
- *Continua la revisión de programación*
- *Continua la revisión de actividades no previstas (NP)*
- *Revisión de personal de obra para ingreso de las diferentes Orip regionales*
- *Seguimiento de las actividades de obra*

ACACIAS:

- *Culminación de enchapes de piso en general*
- *Pinturas en muros en general*
- *Instalación de lámparas en cielo rasos*
- *Revisión de aires acondicionados*
- *Aseo general y recolección de escombros*
- *Revisión de sistema eléctrico general*
- *Instalación de aparatos sanitarios*
- *Cubrimiento del mobiliario y elementos que pertenecen a la oficina*

BUCARAMANGA

- *Culminación de actividades de obra*

CHARALA

- *Culminación de actividades de obra*

FACATATIVA

- *Sin actividades realizadas en el periodo*

PUERTO ASIS

- *Instalación de lámina micro perforada en fachada*
- *Instalación de rejillas metálicas en cárcamos de cuarto de planta eléctrica.*
- *Instalación de barandas en escalera*
- *Demolición de anden y organización de rampa de acceso*

- *Revisión de tubería hidráulica*
- *Instalación de baranda a acceso rampa*
- *Instalación de electro bomba para pozo acuífero*
- *Instalación de mecanismo eléctrico para electrobomba*
- *Aseo y recolección de escombros y sobrantes de obra*

PUERTO INIRIDA

- *Culminación de actividades de obra*

SAN VICENTE

- *Culminación de actividades de obra*

Durante el periodo del mes de enero de 2024, Mediante oficio OF-SNR–130 de Interventoría se solicita los balances finales, ítems no previstos, memorias de cálculo, cotizaciones respectivas y acta de justificación de mayores y menores y obra no prevista final para cada orip (Acacias, Bucaramanga, Charalá, Facatativá, puerto asís, puerto Inírida, San Vicente del Caguán).

De igual forma la supervisión envía el corte No 1 de interventoría firmado para su respectivo tramite de radicación.

El día 9 de enero de 2024 por oficio OF-SNR-131 se radica la cuenta de cobro No 1 de interventoría a la supervisión del contrato para sus respectivos tramites.

Mediante correo electrónico el contratista de obra envía balances de las oficinas de Facatativá, Charalá y Puerto Inírida, el día 10 de enero de 2024.

Nuevamente la Interventoría envía vía e mail a la supervisión el corte No 2 de obra para su respectiva aprobación por parte de la supervisión.



El día 15 de enero la supervisión envía vía email los radicados respectivos de la facturación del corte 2 de Contratista de obra.


Nuevamente la supervisión recibe los radicados de la facturación 2 de interventoría y envía los respectivos radicados a la interventoría

El día 15 de enero se culmina la prórroga solicitada por el contratista de obra.
Nuevamente esta interventoría solicita mediante oficio OF-SNR–133 los balances finales, ítems no previstos, memorias de cálculo, cotizaciones respectivas y acta de justificación de mayores y menores y obra no prevista final para cada orip (Acacias, Bucaramanga, Charalá, Facatativá, puerto asís, puerto Inírida, San Vicente del Caguán

Mediante oficio OF-SNR-134 de interventoría se envía oficio al contratista de obra sobre los pendientes de obra en la oficina de Puerto Asís.

De acuerdo a lo anterior, relacionamos el registro fotográfico de las actividades ejecutadas en el periodo:

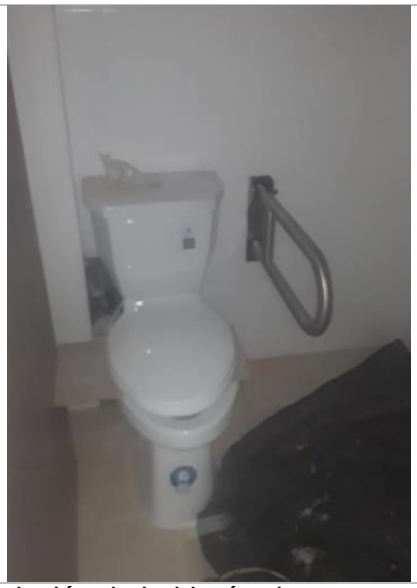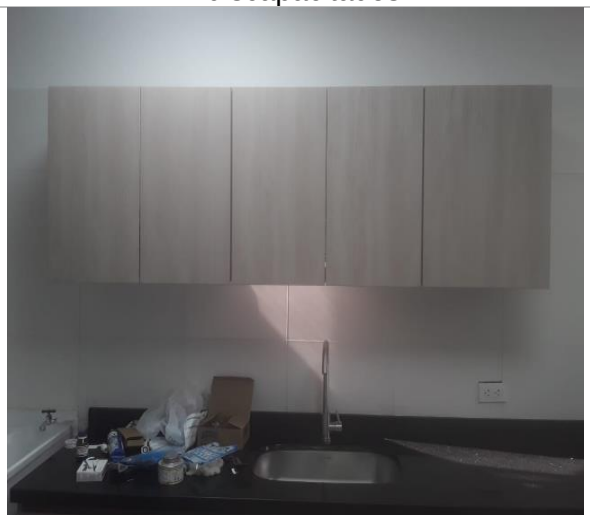Registro fotográfico actividades de obra Orip Acacias – enero de 2024	
	
Instalación de mueble baño	Instalación de baldosín piso , aparatos sanitarios y accesorios para discapacitados
	
instalación de muebles de cocina y lavadero	instalación mueble superior de cocina

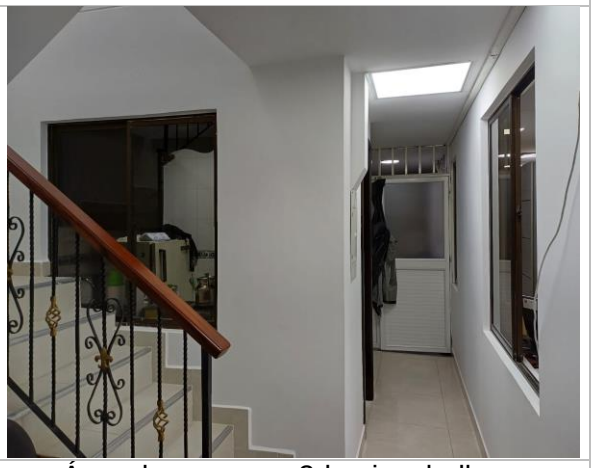Registro fotográfico actividades de obra Orip Puerto Asís – diciembre de 2023	
	
Instalacion de bomba lapicero, acuifero	Alistamiento bomba tipo lapicero para acuifero
	
Instalación aviso de registro y notariado	Revisión de aparatos sanitarios, baño 1er piso auxiliar
	
Zona de atención al usuario	Área de acceso a 2do piso, hall a cocina y cuarto técnico

	
Área archivo general	zona cocina

4.2 Control del clima

De acuerdo a la visita técnica realizada en el periodo, se presentó el siguiente registro del clima

TABLA DE ESTADO DEL CLIMA

	ACACIAS		FACATATIVA		BUCARAMANGA		CHARALA		PTO INIRIDA		PTO ASIS		SAN VICENTE	
FECHA	SOLEADO	LLUVIAS	SOLEADO	LLUVIAS	SOLEADO	LLUVIAS	SOLEADO	LLUVIAS	SOLEADO	LLUVIAS	SOLEADO	LLUVIAS	SOLEADO	LLUVIAS
1/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
2/01/2024	X	X	X		X		X		X		X		X	
3/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
4/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	X
5/01/2024	X		X		X		X		X	X	X		X	X
6/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
7/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
8/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
9/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
10/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
11/01/2024	X		X	X	X		X		X		X		X	
12/01/2024	X		X	X	X		X		X		X		X	
13/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
14/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
15/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
16/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
17/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
18/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
19/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
20/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
21/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
22/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
23/01/2024	X		X		X		X	X	X		X		X	
24/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
25/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
26/01/2024	X		X		X	X	X		X		X		X	
27/01/2024	X		X		X		X	X	X		X		X	
28/01/2024	X		X		X	X	X	X	X		X		X	
29/01/2024	X		X		X		X		X		X		X	
30/01/2024	X	X	X		X		X		X		X		X	
31/01/2024	X		X		X		X	X	X		X		X	

4.3 Programación de obra

Para el periodo del presente informe se realizó seguimiento y control a las siguientes actividades:

ORIP ACACIAS

ITEM	DESCRIPCION	UN	%PROGR	% EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**			
1,02	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	m	100,00%	100,00%
1,03	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	un	100,00%	100.00%
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m^2	100,00%	100,00%
1,09	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	100,00%	100.00%
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	100,00%	100,00%
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m^2	100%	100,00%
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	un	100%	100,00%
1,16	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	m^2	100%	100,00%
1,18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	m^2	100%	0,00%
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	100%	100,00%
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	100%	100,00%
1,24	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO	un	100%	0,00%
1,25	DESMONTE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	m	0%	0,00%
1,26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	m	100%	100%
1,35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	100%	100%
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	100%	100%
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m^2	95%	100%
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	100%	0,00%
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	100%	0,00%
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m^2	95%	95,00%
1,48	DEMOLICIÓN DE MARCO EN CONCRETO	m	90%	0,00%
1,49	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	m^2	90%	0,00%
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	95%	100,00%
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	100%	100%
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	95%	100,00%
1,56	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	100%	100,00%
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	100%	100%
1,61	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	m^3	0%	0,00%
1,63	LLENO EN ARENA	m^3	0%	0,00%
1,64	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m^3	0%	0,00%
1,65	LLENO MATERIAL DE SITIO	m^3	0%	0,00%
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	m^2	100%	100%
1,67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m^3	100%	100,00%
1,68	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	100%	100,00%

1,69	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	100%	100,00%
1,70	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	m^3	100%	100,00%
1,72	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN	m^3	100%	100,00%
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	un/día	100%	100,00%
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**			
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	100%	100%
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	100%	100%
2,13	PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	un	100%	100%
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	100%	100%
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m^2	100%	100%
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	100%	100%
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**			
3,08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	m^2	95%	0%
3,09	VENTANA EN LÁMINA CAL. 20 BATIENTE	m^2	95%	0%
3,12	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,51-0,75M	un	95%	100%
3,13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	95%	100%
3,14	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	un	100%	0%
3,15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	m^2	100%	0%
4	**CIELORRASOS**			
4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC	m^2	100%	100%
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**			
5,02	PAÑETE MUROS 1:3	m^2	100%	100%
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m^2	100%	100%
6	**CUBIERTAS**			
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	100%	100%
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	100%	100%
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	m^2	100%	100%
7	**ENCHAPE MUROS**			
7,01	ESTUCO EXTERIOR	m^2	0%	0%
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m^2	100%	100%
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m^2	100%	100%
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	m^2	100%	100%
8	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			
8,03	VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM	m	0%	0%
8,04	MARCO EN CONCRETO 2500 PSI PARA VENTANAS 8CMX15CM	m	0%	0%
8,05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM	m^2	0%	0%
8,06	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA	m^2	0%	0%
9	**ESTRUCTURAS EN MADERA**			

9,03	PINTURA IGNÍFUGA CONTRA INCENDIOS	m²	0%	0%
12	**MAMPOSTERÍA**			
12,01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	m	0%	0%
12,06	MURO DIVISORIO BLOQUE LISO NO.5	m²	100%	100%
12,11	DINTEL EN CONCRETO 5CM	m	100%	100%
13	**PINTURAS**			
13,05	BARNIZ SOBRE MUEBLES	m²	0%	0%
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	100%	100%
14	**PISOS**			
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m²	100%	93,0%
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	100%	93,0%
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	m	100%	93,0%
15	**RED ELÉCTRICA**			
15,03	TUBERÍA EMT 3/4" DESCOLGADA	m	100%	100%
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	100%	100%
15,13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	100%	100%
15,29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	un	100%	100%
15,31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	un	100%	100%
15,32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	un	100%	100%
15,35	CAMBIO SALIDA TOMA	un	100%	100%
15,41	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO PVC	un	100%	100%
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	100%	100%
15,47	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN	un	100%	0%
15,50	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	un	100%	0%
16	**RED HIDRÁULICA**			
16,03	TUBERÍA PVCP 3/4"	m	100%	100%
16,06	VÁLVULA DE REGISTRO 3/4"	un	100%	100%
16,07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	un	100%	100%
16,11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	un	100%	100%
16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	un	100%	100%
16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	100%	0%
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	un	100%	100%
16,20	LAVAMANOS DE PEDESTAL	un	100%	100%
16,21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	un	100%	100%
16,27	TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT	un	100%	100%
16,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL D=1,25M	m	100%	100%
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	100%	100%
17	**RED SANITARIA**			
17,01	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM	un	100%	100%
17,09	REVENTILACIÓN 2"	m	100%	100%

17,10	REVENTILACIÓN 3"	m	100%	100%
17,12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	un	100%	100%
17,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	un	100%	100%
17,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	un	100%	100%
17,18	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	un	100%	100%
17,21	TUBERÍA PVCS 2"	m	100%	100%
17,23	TUBERÍA PVCS 4"	m	100%	100%
17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	un	100%	100%
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	un	100%	100%
18	**URBANISMO**			
18,02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	m	0%	0%
18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	m^2	0%	0%
18,06	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS	m^3	0%	0%
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**			
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	100%	100%
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	100%	0%
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	100%	0%
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	100%	0%
20	**NO PREVISTOS**			
NP-01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	und	100%	100%
NP-02	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	m	100%	100%
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO	m2	100%	100%
NP-04	MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	m2	100%	100%
NP-05	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	und	100%	100%
NP-06	GÁRGOLA PREFABRICADA 8X12X21CM	und	100%	100%
NP-07	Teja Española Ecoroof UPVC 2.3mm Mate 1.08 x 4.92 Mts 5.31M2	m2	100%	100%
NP-08	MOTOBOMBA 2,0 HP	und	0%	0%

ORIP BUCARAMANGA

ITEM	DESCRIPCION	UN	% PROG	% EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**			
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	100%	100,00%
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	100,00%	100,00%
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m^2	100,00%	100,00%
1,17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	m^2	100,00%	100,00%
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	100,00%	100,00%
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	100,00%	100,00%

1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	100,00%	100,00%
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	100,00%	100,00%
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	100,00%	100,00%
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	100,00%	100,00%
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	100,00%	100,00%
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	un/día	100,00%	100,00%
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**			
2,08	MANTENIMIENTO PASAMANOS EN MADERA	m	100,00%	100,00%
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	100,00%	100,00%
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	100,00%	100,00%
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	100,00%	100,00%
6	**CUBIERTAS**			
6,08	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	m²	100,00%	100,00%
6,12	AFINADOS CUBIERTAS PLANAS E=0,03M	m²	100,00%	100,00%
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	m	100,00%	100,00%
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	100,00%	100,00%
6,23	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE DOMOS	un	100,00%	100,00%
7	**ENCHAPE MUROS**			
7,03	RESANE	m²	100,00%	100,00%
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**			
10,04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	m²	100,00%	100,00%
10,06	LAVADO FACHADA	m²	100,00%	100,00%
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**			
11,01	BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	m²	100,00%	100,00%
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	100,00%	100,00%
13	**PINTURAS**			
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	100,00%	100,00%
13,11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	m²	100,00%	100,00%
14	**PISOS**			
14,11	PISO GRES 30,5X30,5CM	m²	100,00%	100,00%
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	100,00%	100,00%
14,19	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	m	100,00%	100,00%
15	**RED ELÉCTRICA**			
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	100,00%	100,00%
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	100,00%	100,00%
16	**RED HIDRÁULICA**			
16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	100,00%	100,00%

16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	100,00%	100,00%
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	100,00%	100,00%
17	**RED SANITARIA**			
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	100,00%	100,00%
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	100,00%	100,00%
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	un	100,00%	100,00%
17,29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	un	100,00%	100,00%
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**			
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	100,00%	100,00%
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	100,00%	00,00%
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	0,00%	0,00%
20	**NO PREVISTOS**			
NP-01	SUMINISTRO E ENSTALACION DE PUNTO DE ANCLAJE ESTRUCTURALES, FABRICADO EN TUBERIA RECTANGULAR. (INCLUYE ENSAYO CON DINAMOMETRO DE EXTRACCION, INFORME DEL ENSAYO Y MEMORIA DE CALCULO DE LOS PUNTOS, FIRMADO POR PERSONA CALIFICADA SEGÚN RESOLUCION 4272	un	100,00%	100,00%
NP-02	IMPERMEABILIZACIÓN HIDROFUGO	M2	100,00%	100,00%

ORIP CHARALA

ITEM	DESCRIPCION	UN	% PROG	% EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**			
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	100,00%	100%
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	100,00%	100%
1,12	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	m²	100,00%	100%
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	100,00%	100,00%
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	100,00%	0,00%
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	m	98,00%	0,00%
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	98,00%	0,00%
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	98,00%	0,00%
1,56	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	100,00%	0,00%
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	100,00%	100,00%
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	m²	98,00%	0,00%
1,67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	100%	100,00%
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	97,00%	100,00%
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	un/día	100,00%	100,00%
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**			
2,07	MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	m	95,00%	0,00%

2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	97,00%	0,00%
2,12	MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	m²	98,00%	0,00%
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	98,00%	0,00%
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**			
3,20	ESPEJO BISELADO 5MM	m²	97,00%	0,00%
4	**CIELORRASOS**			
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	100%	100,00%
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**			
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	97,00%	0,00%
6	**CUBIERTAS**			
6,10	LIMATESA TEJA DE BARRO NATURAL	m	100,00%	100,00%
6,11	TEJA DE BARRO NATURAL	m²	100,00%	100,00%
6,14	ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE BARRO NATURAL	m	100,00%	100,00%
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	m	100,00%	100,00%
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	100,00%	100,00%
7	**ENCHAPE MUROS**			
7,01	ESTUCO EXTERIOR	m²	98,00%	0,00%
7,03	RESANE	m²	100,00%	0,00%
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	98,00%	0,00%
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	m²	98,00%	0,00%
9	**ESTRUCTURAS EN MADERA**			
9,02	ESTERILLA DE GUADUA BAJO ENTRAMADO	m²	100,00%	0,00%
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**			
10,03	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE [3 MANOS]	m²	100,00%	0,00%
13	**PINTURAS**			
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	98,00%	0,00%
14	**PISOS**			%
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m²	98,00%	0,00%
14,11	PISO GRES 30,5X30,5CM	m²	98,00%	0,00%
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	98,00%	0,00%
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	m	98,00%	0,00%
15	**RED ELÉCTRICA**			
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	100%	100%
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	100,00%	100,00%
15,34	TAPA INTERRUPTOR DOBLE	un	98,00%	0,00%
15,45	TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	un	98,00%	0,00%
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	100,00%	0,00%
16	**RED HIDRÁULICA**			
16,19	LAVAMANOS DE COLGAR	un	100,00%	0,00%
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	100,00%	0,00%
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	100,00%	0,00%

16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	100,00%	0,00%
17	**RED SANITARIA**			
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	100,00%	100,00%
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	100,00%	0,00%
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	un	100,00%	0,00%
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**			
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	100,00%	100,00%
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	0,00%	0,00%
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	0,00%	0,00%
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	0,00%	0,00%
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	0,00%	0,00%
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	0,00%	0,00%
20	**ADICIONALES**			
20,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA	und	100,00%	100,00%
21	**NO PREVISTOS**			
NP-01	MANTO ASFALTICO E=3mm	m2	100,00%	100,00%

ORIP FACATATIVA

ITEM	DESCRIPCION	UN	% PROG	% EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**			
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	87,00%	85,00%
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	97,00%	0,00%
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	84,00%	82,00%
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	100,00%	100,00%
1,17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	m²	100,00%	100,00%
1,18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	m²	95,00%	0,00%
1,19	DESMONTE VENTANA EN MADERA	m²	0,00%	0,00%
1,32	DESMONTE DE MURO EN DRYWALL	m²	95,00%	0,00%
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	un	100,00%	0,00%
1,34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	m²	100,00%	0,00%
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	100,00%	0,00%
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	95,00%	0,00%
1,41	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO	m	100,00%	0,00%
1,42	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	m²	100,00%	0,00%
1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	m²	95,00%	0,00%
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m²	100,00%	5,00%
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	m	100,00%	100,00%
1,49	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	m²	100,00%	0,00%

1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	m	90,00%	100,00%
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	100,00%	0,00%
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	84,00%	82,00%
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	100,00%	100,00%
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	m²	100,00%	0,00%
1,67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	100,00%	95,00%
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	100,00%	95,00%
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	un/día	100,00%	100,00%
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**			
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	87,00%	0,00%
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	87,00%	0,00%
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	87,00%	80,00%
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	87,00%	0,00%
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	un	87,00%	0,00%
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**			
3,06	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	m	90,00%	100,00%
3,10	DIVISIÓN ORINAL EN ACERO INOXIDABLE	un	100,00%	0,00%
4	**CIELORRASOS**			
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	93,00%	93,00%
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	93,00%	95,00%
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**			
5,02	PAÑETE MUROS 1:3	m²	87,00%	0,00%
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	95,00%	97,00%
5,05	PAÑETE MUROS 1:4 IMPERMEABILIZADO	m²	95,00%	97,00%
6	**CUBIERTAS**			
6,08	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	m²	100,00%	100,00%
6,12	AFINADOS CUBIERTAS PLANAS E=0,03M	m²	100,00%	100,00%
6,17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	100,00%	0,00%
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	100,00%	90,00%
7	**ENCHAPE MUROS**			
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	100,00%	100,00%
7,03	RESANE	m²	100,00%	100,00%
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	95,00%	0,00%
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	m²	95,00%	0,00%
7,07	ENCHAPE CERÁMICO PARA MESÓN COCINA	m²	95,00%	0,00%
8	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			
8,05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM	m²	95,00%	0,00%
8,06	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA	m²	95,00%	0,00%
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**			
10,01	GRANIPLAS	m²	100,00%	100,00%

10,03	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE [3 MANOS]	m²	97,00%	95,00%
10,06	LAVADO FACHADA	m²	100,00%	100,00%
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**			
11,02	MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	m²	100,00%	100,00%
12	**MAMPOSTERÍA**			
12,08	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²	94,00%	0,00%
13	**PINTURAS**			
13,01	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	92,00%	0,00%
13,03	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	m	89,00%	0,00%
13,04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	m²	89,00%	0,00%
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	97,00%	94,00%
14	**PISOS**			
14,04	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	93,00%	0,00%
14,06	PISO CERÁMICO DURO PISO	m²	97,00%	0,00%
14,14	ALISTADO DE PISO 4CM	m²	100,00%	0,00%
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	m	100,00%	100,00%
15	**RED ELÉCTRICA**			
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	97,00%	97,00%
15,12	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	un	97,00%	97,00%
15,25	SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT	un	73,00%	0,00%
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	100,00%	100,00%
15,47	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN	un	100,00%	0,00%
15,49	TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS	un	100,00%	0,00%
16	**RED HIDRÁULICA**			
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	un	100,00%	0,00%
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	97,00%	0,00%
16,29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	un	95,00%	0,00%
17	**RED SANITARIA**			
17,02	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	un	93,00%	0,00%
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	95,00%	0,00%
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	95,00%	0,00%
18	**URBANISMO**			
18,01	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM	m²	97,00%	0,00%
18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	m²	697,00%	0,00%
18,04	SARDINEL EN CONCRETO 12X40CM	m	97,00%	0,00%
18,05	BASE GRANULAR B-200	m³	97,00%	0,00%
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**			
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	100,00%	100,00%
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	0,00%	0,00%
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	0,00%	0,00%
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	0,00%	0,00%

19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	0,00%	0,00%
19,06	PODA CESPED	m²	100,00%	100,00%
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	0,00%	0,00%
20	**ITEMS NO PREVISTOS**			
NP-01	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m2	90,00%	0,00%
NP-02	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA,MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	m2	90,00%	0,00%
NP-03	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	m	97,00%	0,00%
NP-04	VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	m	97,00%	0,00%
NP-05	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5	m2	97,00%	0,00%
NP-06	ASEO FINO DE OBRA (Una pasada)	m2	100,00%	100,00%

ORIP PUERTO ASIS

ITEM	DESCRIPCION	UN	% PROG	% EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**			
1,02	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	m	97,00%	100,00%
1,03	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	un	97,00%	100,00%
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	100%	100,00%
1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	m²	100,00%	0,00%
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	100,00%	100,00%
1,08	TALA Y DESENRAICE ÁRBOLES MEDIANOS	un	100,00%	0,00%
1,09	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	100,00%	100,00%
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	95,00%	95,00%
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	100,00%	0,00%
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	un	100,00%	0,00%
1,16	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	m²	100,00%	0,00%
1,18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	m²	100,00%	0,00%
1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	un	100,00%	100,00%
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	100,00%	100,00%
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	100,00%	100,00%
1,23	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	un	100,00%	0,00%
1,24	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO	un	100,00%	100,00%
1,25	DESMONTE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	m	100,00%	100,00%
1,27	DESMONTE TUBERÍA AGUA POTABLE	m	95,00%	95,00%
1,29	DESMONTE DE VIDRIO	m²	97,00%	97,00%
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	un	100,00%	100,00%
1,34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	m²	100,00%	100,00%
1,35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	100,00%	100,00%

1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	100,00%	0,00%
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	100,00%	0,00%
1,40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	m	100,00%	0,00%
1,42	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	m^2	100,00%	100,00%
1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	m^2	100,00%	100,00%
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m^2	100,00%	100,00%
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m^2	100,00%	100,00%
1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	m^2	100,00%	0,00%
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	m	97,00%	95,00%
1,49	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	m^2	0,00%	0,00%
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	m	100,00%	100,00%
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	100,00%	100,00%
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	100,00%	100,00%
1,54	INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	m^2	100,00%	100,00%
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	97,00%	95,00%
1,56	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	100,00%	100,00%
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	100,00%	100,00%
1,61	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	m^3	100,00%	100,00%
1,63	LLENO EN ARENA	m^3	0,00%	0,00%
1,64	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m^3	100,00%	100,00%
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	m^2	100,00%	100,00%
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m^3	97,00%	97,00%
1.68	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	97,00%	97,00%
1.69	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	97,00%	97,00%
1.70	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	m^3	97,00%	97,00%
1.71	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD PELIGROSO, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	97,00%	97,00%
1.72	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN	m^3	97,00%	97,00%
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m^2	100,00%	100,00%
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	un/día	100,00%	100,00%
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**			
2,08	MANTENIMIENTO PASAMANOS EN MADERA	m	97,00%	100,00%
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	100,00%	100,00%
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	100,00%	100,00%
2,13	PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	un	100,00%	100,00%
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	100.00%	100,00%
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m^2	100,00%	100,00%
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	100,00%	100,00%
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	un	100,00%	100,00%
2,20	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	un	100,00%	35,00%
2,22	MANTENIMIENTO DE MUEBLE	m	95,00%	95,00%

3	**CARPINTERÍA METÁLICA**			
3,08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	m²	0,00%	0,00%
3,09	VENTANA EN LÁMINA CAL. 20 BATIENTE	m²	0,00%	0,00%
3,12	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,51-0,75M	un	0,00%	0,00%
3,13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	0,00%	0,00%
3,14	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	un	0,00%	0,00%
3,15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	m²	0,00%	0,00%
3,16	REJA TIPO BANCO	m²	0,00%	0,00%
3,18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	m²	0,00%	0,00%
4	**CIELORRASOS**			
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	100,00%	100,00%
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	100,00%	0,00%
4,07	CIELORRASO PLANO EN DRYWALL 1/2	m²	100,00%	100,00%

ORIP PUERTO INIRIDA

ITEM	DESCRIPCION	UN	% PROG	% EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**			
1,02	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	m	100,00%	100,00%
1,03	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	un	100,00%	100,00%
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	100,00%	100,00%
1,08	TALA Y DESENRAICE ÁRBOLES MEDIANOS	un	0,00%	0,00%
1,09	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	100,00%	100,00%
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	100,00%	100,00%
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	100,00%	100,00%
1,16	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	m²	100,00%	100,00%
1,18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	m²	97,00%	0,00%
1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	un	100,00%	100,00%
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	95,00%	100,00%
1,25	DESMONTE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	m	100,00%	100,00%
1,26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	m	100,00%	100,00%
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	un	100,00%	100,00%
1,35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	100,00%	100,00%
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	100,00%	100,00%
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	100,00%	100,00%
1,42	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	m²	100,00%	90,00%
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	95,00%	100,00%
1,48	DEMOLICIÓN DE MARCO EN CONCRETO	m	100,00%	100,00%

1,49	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	m²	95,00%	100,00%
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	m	100,00%	100,00%
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	100,00%	100,00%
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	100,00%	100,00%
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	100,00%	100,00%
1,56	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	100,00%	100,00%
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	100,00%	100,00%
1,60	DESCAPOTE MANUAL E=20CM	m²	95,00%	100,00%
1,61	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	m³	95,00%	100,00%
1,63	LLENO EN ARENA	m³	95,00%	100,00%
1,64	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	95,00%	100,00%
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	m²	100,00%	100,00%
1,67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	97,00%	97,00%
1,68	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	97,00%	97,00%
1,69	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	97,00%	97,00%
1,70	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	m³	97,00%	97,00%
1,71	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD PELIGROSO, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	97,00%	97,00%
1,72	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN	m³	97,00%	97,00%
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	un/día	100,00%	100,00%
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**			
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	100,00%	100,00%
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	100,00%	100,00%
2,13	PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	un	100,00%	100,00%
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	100,00%	100,00%
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	100,00%	100,00%
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**			
3,08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	m²	0,00%	0,00%
3,09	VENTANA EN LÁMINA CAL. 20 BATIENTE	m²	0,00%	0,00%
3,12	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,51-0,75M	un	100,00%	100,00%
3,13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	100,00%	100,00%
3,15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	m²	100,00%	100,00%
3,16	REJA TIPO BANCO	m²	100,00%	0,00%
4	**CIELORRASOS**			
4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC	m2	100,00%	100,00%
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**			
5,02	PAÑETE MUROS 1:3	m²	100,00%	100,00%
6	**CUBIERTAS**			
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	100,00%	100,00%
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	m²	100,00%	100,00%
7	**ENCHAPE MUROS**			

7,01	ESTUCO EXTERIOR	m²	100,00%	100,00%
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	100,00%	100,00%
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	100,00%	100,00%
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	m²	100,00%	100,00%
8	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			
8,03	VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM	m	100,00%	100,00%
8,05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM	m²	97,00%	100,00%
8,06	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA	m²	97,00%	100,00%
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**			
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	100,00%	100,00%
10,05	PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS]	m²	95,00%	100,00%
12	**MAMPOSTERÍA**			
12,01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	m	95,00%	0,00%
12,05	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5	m²	95,00%	0,00%
12,11	DINTEL EN CONCRETO 5CM	m	95,00%	0,00%
13	**PINTURAS**			
13,02	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	m²	100,00%	100,00%
13,04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	m²	95,00%	100,00%
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	97,00%	100,00%
14	**PISOS**			
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m²	97,00%	100,00%
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	m	97,00%	100,00%
15	**RED ELÉCTRICA**			
15,06	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	m	100,00%	100,00%
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	97,00%	100,00%
15,13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	97,00%	100,00%
15,16	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A	un	100,00%	100,00%
15,28	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	un	100,00%	100,00%
15,29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	un	100,00%	100,00%
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	un	100,00%	100,00%
15,35	CAMBIO SALIDA TOMA	un	100,00%	100,00%
15,41	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO PVC	un	100,00%	100,00%
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	100,00%	100,00%
16	**RED HIDRÁULICA**			
16,01	TUBERÍA PVCP 1"	m	95,00%	100,00%
16,02	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	95,00%	100,00%
16,03	TUBERÍA PVCP 3/4"	m	95,00%	100,00%
16,05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	un	100,00%	100,00%
16,07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	un	100,00%	100,00%
16,08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	un	100,00%	100,00%
16,10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	un	100,00%	100,00%

16,11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	un	100,00%	100,00%
16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	un	100,00%	100,00%
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	un	100,00%	100,00%
16,19	LAVAMANOS DE COLGAR	un	100,00%	100,00%
16,21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	un	100,00%	100,00%
16,26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	un	100,00%	100,00%
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	100,00%	100,00%
17	**RED SANITARIA**			
17,01	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM	un	100,00%	100,00%
17,09	REVENTILACIÓN 2"	m	100,00%	100,00%
17,11	SALIDA SANITARIA BAÑO 2"	un	100,00%	100,00%
17,12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	un	100,00%	100,00%
17,13	SALIDA SANITARIA LAVADERO/TRAPERO 2"	un	100,00%	100,00%
17,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	un	100,00%	100,00%
17,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	un	100,00%	100,00%
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	100,00%	100,00%
17,21	TUBERÍA PVCS 2"	m	100,00%	100,00%
17,23	TUBERÍA PVCS 4"	m	100,00%	100,00%
17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	un	100,00%	100,00%
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	un	100,00%	100,00%
18	**URBANISMO**			
18,01	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM	m^2	100,00%	100,00%
18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	m^2	97,00%	0,00%
18,04	SARDINEL EN CONCRETO 12X40CM	m	97,00%	0,00%
18,05	BASE GRANULAR B-200	m^3	100,00%	100,00%
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**			
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	97,00%	100,00%
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	100,00%	100,00%
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	97,00%	0,00%
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	97,00%	0,00%
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	100,00%	100,00%
20	**NO PREVISTOS**			
NP-01	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUAPOTABLE CUALQUIER MATERIAL	un	97,00%	100,00%
NP-02	DESMONTE DE MANTO EN VIGA CANAL	m	100,00%	100,00%
NP-03	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	un	100,00%	100,00%
NP-04	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE [3 MANOS]	m2	100,00%	100,00%
NP-05	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	100,00%	100,00%
NP-06	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	un	100,00%	100,00%
NP-07	MANTENIMIETNO DE TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT	un	100,00%	100,00%
NP-08	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	un	100,00%	100,00%
NP-09	SANITARIO TIPO AHORRADOR	un	100,00%	100,00%

ORIP SAN VICENTE

ITEM	DESCRIPCION	UN	% PROG	% EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**			
1,02	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	m	100,00%	100,00%
1,03	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	un	100,00%	100,00%
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	97,00%	100,00%
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	100,00%	100,00%
1,08	TALA Y DESENRAICE ÁRBOLES MEDIANOS	un	0,00%	0,00%
1,09	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	100,00%	100,00%
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	97,00%	100,00%
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	100,00%	100,00%
1,16	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	m²	100,00%	100,00%
1,18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	m²	100,00%	100,00%
1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	un	100,00%	100,00%
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	97,00%	100,00%
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	100,00%	100,00%
1,25	DESMONTE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	m	100,00%	100,00%
1,26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	m	100,00%	100,00%
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	un	100,00%	100,00%
1,34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	m²	100,00%	100,00%
1,35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	100,00%	100,00%
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	100,00%	100,00%
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	100,00%	100,00%
1,40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	m	97,00%	0,00%
1,42	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	m²	97,00%	0,00%
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	97,00%	0,00%
1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	m²	97,00%	0,00%
1,48	DEMOLICIÓN DE MARCO EN CONCRETO	m	100,00%	100,00%
1,49	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	m²	100,00%	100,00%
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	m	100,00%	100,00%
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	100,00%	100,00%
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	100,00%	100,00%
1,54	INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	m²	100,00%	100,00%
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	100,00%	100,00%
1,56	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	100,00%	100,00%
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	100,00%	100,00%

1,61	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	m³	100,00%	100,00%
1,63	LLENO EN ARENA	m³	100,00%	100,00%
1,64	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	100,00%	75,00%
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	m²	100,00%	100,00%
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	97,00%	97,00%
1.68	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	97,00%	97,00%
1.69	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	97,00%	97,00%
1.70	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	m³	97,00%	97,00%
1.71	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD PELIGROSO, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	97,00%	97,00%
1.72	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN	m³	97,00%	97,00%
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	100,00%	100,00%
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	un/día	100,00%	100,00%
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**			
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	100,00%	100,00%
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	100,00%	100,00%
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	100,00%	100,00%
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**			
3,08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	m²	97,00%	100,00%
3,09	VENTANA EN LÁMINA CAL. 20 BATIENTE	m²	100,00%	100,00%
3,12	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,51-0,75M	un	100,00%	100,00%
3,13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	100,00%	100,00%
3,14	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	un	100,00%	100,00%
3,15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	m²	100,00%	0,00%
4	**CIELORRASOS**			
4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC	m²	100,00%	100,00%
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**			
5,02	PAÑETE MUROS 1:3	m²	100,00%	100,00%
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	97,00%	100,00%
6	**CUBIERTAS**			
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	100,00%	100,00%
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	m²	100,00%	100,00%
7	**ENCHAPE MUROS**			
7,01	ESTUCO EXTERIOR	m²	100,00%	100,00%
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	100,00%	100,00%
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	100,00%	100,00%
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	m²	100,00%	100,00%
7,07	ENCHAPE CERÁMICO PARA MESÓN COCINA	m²	97,00%	100,00%
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**			
10,06	LAVADO FACHADA	m²	100,00%	100,00%
12	**MAMPOSTERÍA**			

12,01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	m	100,00%	100,00%
12,05	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5	m²	100,00%	100,00%
12,11	DINTEL EN CONCRETO 5CM	m	100,00%	100,00%
12,12	MESÓN EN CONCRETO 2500 PSI	m²	0,00%	0,00%
13	**PINTURAS**			
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	100,00%	100,00%
14	**PISOS**			
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m²	97,00%	100,00%
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	98,00%	100,00%
15	**RED ELÉCTRICA**			
15,06	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	m	98,00%	100,00%
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	98,00%	100,00%
15,13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	98,00%	100,00%
15,15	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	un	100,00%	100,00%
15,28	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	un	100,00%	100,00%
15,34	TAPA INTERRUPTOR DOBLE	un	100,00%	100,00%
15,41	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO PVC	un	100,00%	100,00%
15,45	TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	un	100,00%	100,00%
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	100,00%	100,00%
16	**RED HIDRÁULICA**			
16,01	TUBERÍA PVCP 1"	m	100,00%	100,00%
16,02	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	100,00%	100,00%
16,03	TUBERÍA PVCP 3/4"	m	0,00%	0,00%
16,04	VÁLVULA DE REGISTRO 1"	un	100,00%	100,00%
16,05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	un	100,00%	100,00%
16,06	VÁLVULA DE REGISTRO 3/4"	un	0,00%	0,00%
16,07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	un	100,00%	100,00%
16,08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	un	100,00%	100,00%
16,09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	un	100,00%	100,00%
16,10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	un	100,00%	100,00%
16,11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	un	100,00%	100,00%
16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	un	100,00%	100,00%
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	un	97,00%	100,00%
16,19	LAVAMANOS DE COLGAR	un	97,00%	100,00%
16,20	LAVAMANOS DE PEDESTAL	un	97,00%	100,00%
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	100,00%	100,00%
16,26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	un	98,00%	100,00%
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	98,00%	100,00%
17	**RED SANITARIA**			
17,01	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM	un	100,00%	100,00%
17,09	REVENTILACIÓN 2"	m	100,00%	100,00%

17,12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	un	100,00%	100,00%
17,13	SALIDA SANITARIA LAVADERO/TRAPERO 2"	un	100,00%	100,00%
17,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	un	100,00%	100,00%
17,15	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	un	100,00%	100,00%
17,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	un	100,00%	100,00%
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	100,00%	100,00%
17,21	TUBERÍA PVCS 2"	m	100,00%	100,00%
17,23	TUBERÍA PVCS 4"	m	100,00%	100,00%
17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	un	98,00%	100,00%
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	un	98,00%	100,00%
18	**URBANISMO**			
18,01	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM	m²	98,00%	0,00%
18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	m²	98,00%	0,00%
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**			
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	97,00%	100,00%
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	90,00%	100,00%
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	90,00%	0,00%
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	90,00%	0,00%
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	90,00%	0,00%
20	**NO PREVISTOS**			
NP-01	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO	m	98,00%	0,00%
NP-02	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	m2	100,00%	100,00%
NP-03	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m2	98,00%	100,00%
NP-04	REGATA SOBRE MURO+RESANE	m	98,00%	100,00%
NP-05	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m2	97,00%	100,00%
NP-06	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	m	100,00%	100,00%
NP-07	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	un	100,00%	100,00%
NP-08	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	m2	0,00%	0,00%
NP-09	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	100,00%	100,00%
NP-10	CANAL EN LÁMINA LIMAHOYA	m	100,00%	100,00%
NP-11	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	100,00%	100,00%
NP-12	RESANE	m2	98,00%	100,00%
NP-13	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	m	100,00%	100,00%
NP-14	VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	m	100,00%	100,00%
NP-15	VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM	m	100,00%	100,00%
NP-16	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM	m2	98,00%	100,00%
NP-17	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE [3 MANOS]	m2	98,00%	100,00%
NP-18	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	m	100,00%	100,00%
NP-19	ALFAGÍA EN CONCRETO 25CM	m	100,00%	100,00%
NP-20	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	98,00%	100,00%
NP-21	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	m	98,00%	100,00%

NP-22	ALISTADO DE PISO 4CM	m2	100,00%	100,00%
NP-23	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	m	100,00%	100,00%
NP-24	SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC	un	100,00%	100,00%
NP-25	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	un	100,00%	100,00%
NP-26	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	un	100,00%	100,00%
NP-27	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	un	100,00%	100,00%
NP-28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	98,00%	100,00%
NP-29	SARDINEL EN CONCRETO 12X40CM	m	98,00%	0,00%
NP-30	CONCRETO CICLOPEO	m3	98,00%	0,00%
NP-31	VIGA RIOSTRA DE 20X20	ml	0,00%	0,00%
NP-32	CABALLETE METALICO	m	100,00%	100,00%

5 INFORME FINANCIERO

A continuación, se informará el estado financiero de los contratos de obra e interventoría.

5.1 INTERVENTORIA

De acuerdo a lo contemplado en el contrato de interventoría 1708 de 2023 suscrito entre la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS – GRUCOING S.A.S, resume: CLAUSULA CUARTA: - FORMA DE PAGO: La Superintendencia de Notariado y Registro pagará al contratista el 100% del valor del contrato así:

- **PAGOS - ACTA PARCIAL 1**

  El primer pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 30%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

- **SEGUNDO PAGO -ACTA PARCIAL 2**

  El segundo pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), el cual se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 60%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

- **TERCER PAGO -ACTA PARCIAL 3**

  El tercer pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), el cual se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 90%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

- **CUARTO PAGO-PAGO FINAL**

Se efectuará el pago final del 10% del valor ejecutado del contrato restante, con la presentación del informe final del contratista, aprobado por la interventoría, la póliza de la garantía única actualizada y la proyección del acta de liquidación del contrato.

Por ende, los pagos de la interventoría están supeditados al porcentaje de avance de obra que ejecute el contratista de obra. Durante este periodo, el contratista ha realizado corte de obra debido a que los porcentajes de avance alcanzan al segundo 30% de avance ejecutado real.

CONTRATO INTERVENTORIA				
ÍTEM	**VALOR**	**ESTADO**	**FECHA DE TRAMITE**	**FECHA DE PAGO**
Acta parcial No 1	$105.677.497.80	En tramite	09/01/2024	--
Acta parcial No 2	$105.677.497.80	En tramite	15/01/2024	--
Acta parcial No 3	$0.00	--	--	--
Acta final liquidación	$000	--	--	--
Total, Facturado	$211.354.995.60		**Porcentaje Facturado**	60%

5.2 CONTRATISTA DE OBRA

De acuerdo a lo estipulado en el contrato suscrito entre la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO y SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S, resume: **CLAUSULA CUARTA: - FORMA DE PAGO:** La Superintendencia de Notariado y Registro pagara al contratista el 100% del valor del contrato así:

- **PAGOS - ACTA PARCIAL 1**

  El primer pago será del 30% del valor inicial del contrato (incluido el AIU e IVA del 19%), se pagará a precios unitarios fijos sin formula de ajuste, de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo de ejecución contra avance de obra igual o mayor al 30% de acuerdo con las actividades relacionadas en los presupuestos oficiales que forman parte del presente pliego de condiciones y con la suscripción del acta de recibo parcial previa aprobación de la interventoría.

- **SEGUNDO PAGO - ACTA PARCIAL 2**

El segundo pago será del 30% del valor inicial del contrato (incluido el AIU e IVA del 19%), se pagará a precios unitarios fijos sin formula de ajuste, de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo de ejecución contra avance de obra igual o mayor al 60% de acuerdo con las actividades relacionadas en los presupuestos oficiales que forman parte del presente pliego de condiciones y con la suscripción del acta de recibo parcial previa aprobación de la interventoría.

- **TERCER PAGO - ACTA PARCIAL 3**

  El tercer pago será del 30% del valor inicial del contrato (incluido el AIU e IVA del 19%), se pagará a precios unitarios fijos sin formula de ajuste, de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo de ejecución contra avance de obra igual o mayor al 90% de acuerdo con las actividades relacionadas en los presupuestos oficiales que forman parte del presente pliego de condiciones y con la suscripción del acta de recibo parcial previa aprobación de la interventoría.

- **CUARTO PAGO – PAGO FINAL**

  Se efectuará el pago final del 10% del valor final correspondiente al 100% de la ejecución del contrato, con la presentación del informe final del contratista, aprobado por la interventoría, la póliza de la garantía única actualizada y la proyección del acta de liquidación del contrato.


Por ende, los pagos al contratista de obra están supeditados al porcentaje de avance de obra que ejecute el mismo, adicional serán revisados y verificados por la interventoría. Durante este periodo, el contratista ha realizado corte de obra debido a que los porcentajes de avance alcanzan al segundo 30% de avance ejecutado real.

CONTRATO OBRA				
ÍTEM	**VALOR**	**ESTADO**	**FECHA DE TRAMITE**	**FECHA DE PAGO**
Acta parcial No 1	$592.307.237.89	TRAMITE	28/12/23	--
Acta parcial No 2	$592.307.237.89	TRAMITE	15/01/24	--
Acta parcial No 3	$0.00	--	--	--
Acta final liquidación	$0.00	--	--	--
Total, Facturado	$592.307.237.89		**Porcentaje Facturado**	60,00%

5.2.1 PROGRAMADO VS EJECUTADO


A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de acuerdo a la programación presentada por el contratista.

Valor asignado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% programado	% ejecutado	Atraso
$1974.357.452.93	31/07/2023	15/01/2024	100%	99.47%	0.53%

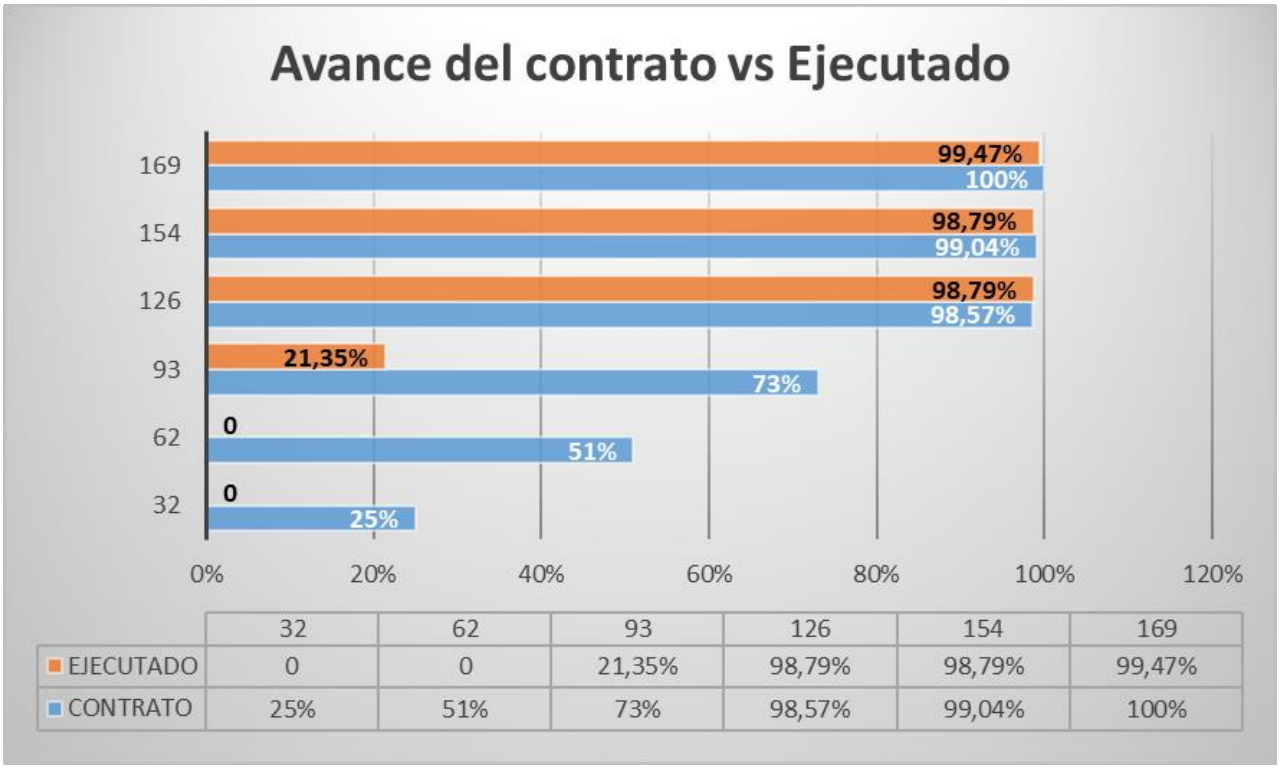

Avance del contrato Vs Ejecutado

En el presente periodo el avance de ejecución se encuentra en 100% con respecto al 99.47% del avance del contrato, debido a que el contratista de obra inicio actividades la primera semana del mes de octubre de 2023.

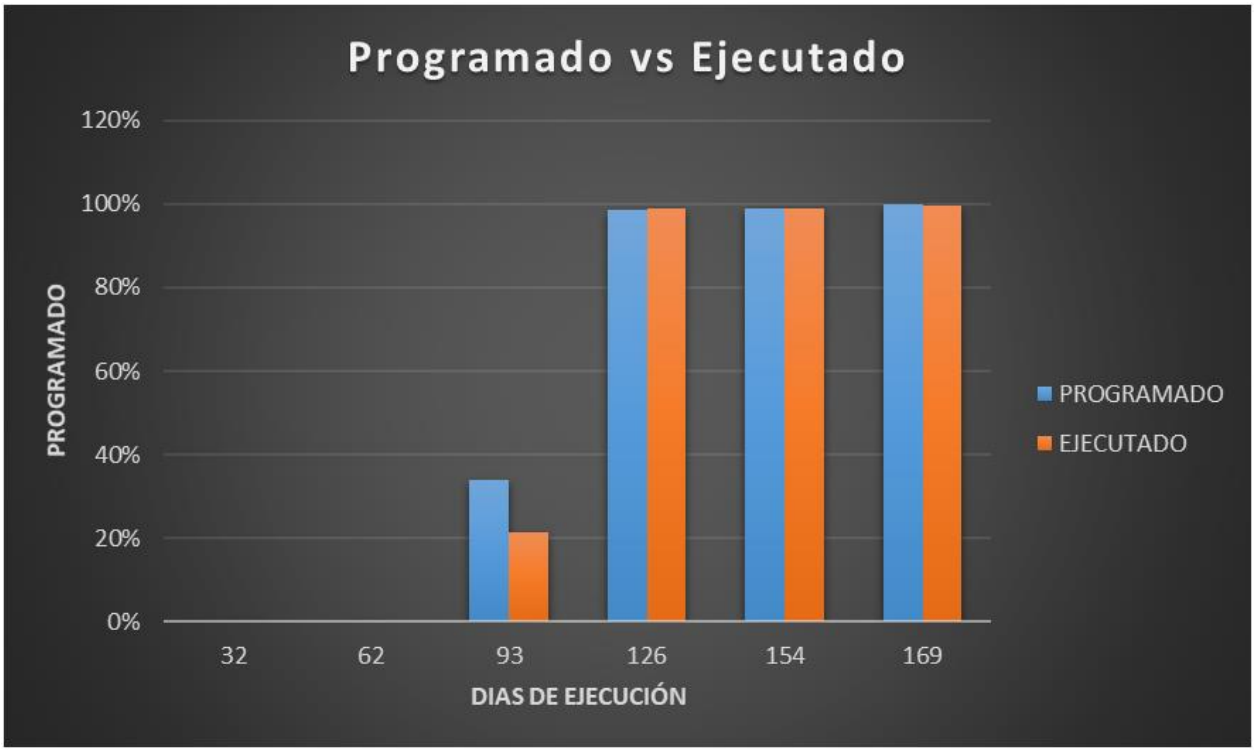

Programación de ejecución de actividades vs Ejecutado

Los reportes de programación y ejecución corresponden a las siguientes fechas, de acuerdo con los informes semanales elaborados por esta Interventoría.

Por lo tanto, durante el presente periodo se presentan los siguientes resultados:

PERIODO	**% PROGRAMADO ACUMULADO**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
1 al 7 de enero 2024	99.04%	98.79%
8 al 15 de enero 2024	100%	99.47%

En el presente periodo el avance de la obra se encuentra en 98.79% con respecto al 99.04% programado, por lo tanto, se refleja un atraso del 0.25%.

5.3 ANTICIPO

En el presente contrato, la supervisión no emite anticipos monetarios, adicional el contratista de obra inicia actividades con recursos propios.

5.4 RELACION FINANCIERA

CONTRATO DE OBRA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1974.357.452.93
FACTURADO	$592.307.237.89
PAGADO	$0.00
SALDO A FACTURAR	$0.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$352.258.326.00
FACTURADO	$0.00
PAGADO	$0.00
SALDO A FACTURAR	$0.00

6 INFORME ADMINISTRATIVO

6.1 PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

La tabla a continuación se relaciona el personal profesional, técnico y auxiliar del contratista que iintervendrá en la ejecución de la obra.

REPRESENTANTE LEGAL	FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA	LUIS EDUARDO DAZA
RESIDENTE DE OBRA 1	JORGE TOVAR MELO
RESIDENTE DE OBRA 2	YOLMAN ANDRÉS CHAPARRO CHAPARRO
RESIDENTE DE OBRA 3	EDGAR MAURICIO GÓMEZ
RESIDENTE SST 1	HARVEY DARÍO CEPEDA
RESIDENTE SST 2	LAURA TATIANA GÓMEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE SST 3	VIVIANA ANDREA RAMOS GARZÓN

6.2 PERSONAL INTERVENTORIA DE OBRA

La tabla a continuación se relaciona el personal profesional, técnico y auxiliar del contratista que iintervendrá en la ejecución de la obra.

REPRESENTANTE LEGAL	LUZ JARAMILLO
DIRECTOR DE OBRA	ALVARO SOLANO
RESIDENTE DE OBRA 1	JESUS ANDRES MELO GACHANCIPA
RESIDENTE DE OBRA 2	DIEGO HERRERA
RESIDENTE DE OBRA 3	JOSE ORDUZ

RESIDENTE SST 1	ELIANA PATRICIA MORENO FORERO
RESIDENTE SST 2	AURA MARIA ALARCON GOMEZ
RESIDENTE SST 3	JHONATAN AGUDELO CARDONA

6.3 RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

Durante el periodo correspondiente se adjunta la relación de correos enviados por esta Interventoría en el periodo en curso.

Consecutivo	Fecha	Asunto
OF-SNR-130	3/01/2024	SOLICITUD DE BALANCES FINALES, ITEMS NO PREVISTOS, MEMORIAS DE CALCULO, COTIZACIONES RESPECTIVAS Y ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES Y OBRA NO PREVISTA FINAL PARA CADA ORIP (ACACIAS, BUCARAMANGA, CHARALA, FACATATIVA, PUERTO ASIS, PUERTO INIRIDA, SAN VICENTE DEL CAGUAN)
CORREO ELECTRONICO	3/01/2024	ACTA 1 INTERVENTORIA.
CORREO ELECTRONICO	4/01/2024	ACTAS CORTE 2 contrato de interventoría 1708 de 2023
OF-SNR-131	9/01/2024	OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP ACACIAS- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023.
OF-SNR-131	9/01/2024	OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP BUCARAMANGA- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023.
OF-SNR-131	9/01/2024	OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP CHARALA- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023.
OF-SNR-131	9/01/2024	OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP FACATATIVA- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023.
OF-SNR-131	9/01/2024	OF-SNR-131 - DOCUMENTACION,

		RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO ASIS- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023.
OF-SNR-131	9/01/2024	OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO INIRIDA- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023.
OF-SNR-131	9/01/2024	OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP SAN VICENTE- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023.
CORREO ELECTRONICO	10/01/2024	BALANCES CON NPS
CORREO ELECTRONICO	09/01/2024	FACTURACION CORTES DE OBRA 2 – CONTRATISTA
CORREO ELECTRONICO	12/01/2024	CORTE 2 OBRA ACACIAS - PUERTO ASIS
CORREO ELECTRONICO	02/01/2024	CORTES DE OBRA 2
OF-SNR-132	15/01/2024	OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP CHARALA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023
OF-SNR-132	15/01/2024	OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP BUCARAMANGA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023
OF-SNR-132	15/01/2024	OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP ACACIAS- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023
OF-SNR-132	15/01/2024	OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP FACATATIVA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023
OF-SNR-132	15/01/2024	OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO ASIS- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023

OF-SNR-132	15/01/2024	OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO INIRIDA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023
OF-SNR-132	15/01/2024	OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP SAN VICENTE- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023
OF-SNR-133	16/01/2024	SOLICITUD DE BALANCES FINALES, ITEMS NO PREVISTOS, MEMORIAS DE CALCULO, COTIZACIONES RESPECTIVAS Y ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES Y OBRA NO PREVISTA FINAL PARA CADA ORIP (ACACIAS, PUERTO ASIS, SAN VICENTE DEL CAGUAN)
OF-SNR-134	16/01/2024	PENDIENTES ACTIVIDADES DE EJECUCUCION ORIP PUERTO ASIS
OF-SNR-135	25/01/2024	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO, Y SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE-DICIEMBRE
OF-SNR-135	31/01/2024	RADICACION INFORME No 5 DE INTERVENTORIA

6.4 CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

La siguiente tabla resume el listado de comunicados oficiales recibidos por esta Interventoría de parte del contratista Soluciones Integrales Unión S.A.S.

Consecutivo	Fecha	Asunto
CORREO ELECTRONICO	4/01/2024	MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DE LA SNR
CORREO ELECTRONICO	9/01/2024	BALANCES CON NPS
CORREO ELECTRONICO	12/01/2024	CORTES DE OBRA 2
CORREO ELECTRONICO	15/01/2024	CORTE 1 - CONTRATO 1675 - ORIP ACACIAS

CORREO ELECTRONICO	15/01/2024	CORTE 2 - CONTRATO 1675-2023 - ORIP FACATATIVA
CORREO ELECTRONICO	15/01/2024	CORTE 2 - CONTRATO 1675-2023 - ORIP CHARALA
CORREO ELECTRONICO	15/01/2024	CORTE 2 - CONTRATO 1675-2023 - ORIP BUCARAMANGA
CORREO ELECTRONICO	15/01/2024	CORTE 2 - CONTRATO 1675-2023 - ORIP PUERTO INIRIDA
CORREO ELECTRONICO	15/01/2024	CORTE 2 - CONTRATO 1675-2023 - ORIP SAN VICENTE DEL CAGUAN
CORREO ELECTRONICO	15/01/2024	CORTE 2 - CONTRATO 1675-2023 - ORIP PUERTO ASIS
CORREO ELECTRONICO	15/01/2024	CORTE 2 - CONTRATO 1675-2023 - ORIP ACACIAS

6.5 CORRESPONDENCIA RECIBIDA SNR

La siguiente tabla resume el listado de comunicados oficiales recibidos por esta Interventoría de parte de la SNR

Consecutivo	Fecha	Asunto
CORREO ELECTRONICO	8/01/2024	ACTA 1 INTERVENTORIA
CORREO ELECTRONICO	8/01/2024	ACTAS CORTE 2 contrato de interventoría 1708 de 2023
CORREO ELECTRONICO	9/01/2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 1675-2023
CORREO ELECTRONICO	9/01/2024	FACTURACION CORTES DE OBRA 2 – CONTRATISTA
CORREO ELECTRONICO	10/01/2024	OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP ACACIAS- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023.
CORREO ELECTRONICO	10/01/2024	OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP BUCARAMANGA- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023.
CORREO ELECTRONICO	10/01/2024	OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP

		CHARALA- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023.
CORREO ELECTRONICO	10/01/2024	OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP FACATATIVA- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023.
CORREO ELECTRONICO	10/01/2024	OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO ASIS- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023.
CORREO ELECTRONICO	10/01/2024	OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO INIRIDA- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023.
CORREO ELECTRONICO	10/01/2024	OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP SAN VICENTE- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023.
CORREO ELECTRONICO	12/01/2024	CORTE 2 OBRA ACACIAS - PUERTO ASIS
CORREO ELECTRONICO	16/01/2024	OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP CHARALA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023
CORREO ELECTRONICO	16/01/2024	OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP BUCARAMANGA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023
CORREO ELECTRONICO	16/01/2024	OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP ACACIAS- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023
CORREO ELECTRONICO	16/01/2024	OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP FACATATIVA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023

CORREO ELECTRONICO	16/01/2024	OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO ASIS- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023
CORREO ELECTRONICO	16/01/2024	OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO INIRIDA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023
CORREO ELECTRONICO	16/01/2024	OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP SAN VICENTE- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 - 2023
CORREO ELECTRONICO	30/01/2024	COMITE DE SEGUIMIENTO PARA EL RECIBO DE OBRAS

6.6 RELACION DE COMITES DE OBRA Y REUNIONES

Fecha	Lugar	Asunto
9/01/2024	COMITÉ DE OBRA # 10 VIRTUAL	COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 1675-2023
30/01/2024	COMITÉ DE OBRA # 11 VIRTUAL	COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 1675-2023

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el presente periodo el avance de la obra se encuentra en 99.47% con respecto al 100% del avance del contrato y que a la fecha el Contratista de obra ha enviado la documentación respectiva de las actividades de obra de cada Orip. (Balances, flujos de caja, cortes de obra)

- Se solicita al contratista de obra agilizar los trabajos a ejecutar para cumplir con los tiempos pactados en la programación y respetar la programación presentada inicialmente por el contratista.

- Cumplir con las actividades finales para dar a por terminado las respectivas obras ejecutadas en las respectivas oficinas regionales (Orip)

8. ANEXOS

8.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

8.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE CONTRATISTA DE OBRA

8.3 INFORMES SEMANALES

8.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Bogotá, 03 de enero de 2024

OF-SNR-130

Señor
FLAMINIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Rep. Legal Soluciones Integrales Unión S.A.S
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1675 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMADE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACIÓN 2".

ASUNTO: - SOLICITUD DE BALANCES FINALES, ITEMS NO PREVISTOS, MEMORIAS DE CALCULO, COTIZACIONES RESPECTIVAS Y ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES Y OBRA NO PREVISTA FINAL PARA CADA ORIP (ACACIAS, BUCARAMANGA, CHARALA, FACATATIVA, PUERTO ASIS, PUERTO INIRIDA, SAN VICENTE DEL CAGUAN)

Cordial saludo,

En cumplimiento de las Actividades Contractuales de esta Interventoría de manera atenta y en atención al asunto en referencia me permito informar lo siguiente:

De acuerdo a la documentación se solicita nuevamente los siguientes documentos, debido a que los archivos o documentos remitidos por Uds. no cumplen los parámetros establecidos, ya que al momento de realizar la revisión pertinente envían un listado de materiales cotizados en diferentes ferreterías y comercializadoras, esta documentación fue enviada por Uds. el día 7 de noviembre de 2023,

Adicional, por solicitud de esta interventoría en su oficio OF-SNR 087 de 9 de noviembre de 2023, nuevamente se les solicita con medida de apremio la documentación anteriormente solicitada en el oficio.

Adicional a estos requerimientos se les **REITERA** el **APREMIO** para la entrega de dicha documentación para la liquidación y recibo final de los trabajos realizados por Uds.

Para la entrega final se solicita los siguientes documentos:

- Balances finales de cada oficina regional u ORIP donde se incluya los ítems o Apus no previstos.
- Memorias de cálculo donde se incluya los ítems no previstos con sus respectivas cantidades ejecutadas.
- Listado de cada Apu o Item no previsto, donde se incluya él o los materiales, mano de obra y tiempos de ejecución.
- La respectiva cotización del material a utilizar en el nuevo Apu o Item no previsto (3 cotizaciones) adicionar además la ficha técnica del material y a que Orip pertenece.
- Acta de justificación de mayores y menores y obra no prevista final, suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría, en el cual esta referenciado en su cláusula cuarta numeral 11 del contrato de obra 1675-2023

Por lo anterior se le recuerda que dentro del pacto contractual reza las siguientes clausulas.

Se le INSTA al contratista las obligaciones firmadas en los documentos iniciales **(CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 1675 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS, IDENTIFICADA NIT. 800.205.914-1) que se debe cumplir y acatar en EL CONTRATO DE OBRA.**

CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO - NUMERAL 11 Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES GENERALES - NUMERAL 6 - Allegar a la Superintendencia de Notariado y Registro, en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato; NUMERAL 8 - Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Interventor del contrato y/o de la entidad; NUMERAL 9 – Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. NUMERAL 10. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual. NUMERAL 13. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro.

Adicional a la **CLAUSULA NOVENA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**: el contratista se obliga a desarrollar las siguientes obligaciones específicas: NUMERAL 9. Presentar los siguientes documentos a la interventoría, una vez sean requeridos por ellos: I. Flujo de inversión por cada Oficina. II. APU del Item no previsto el cual contendrá 3 cotizaciones como mínimo de insumos, las cuales serán evaluadas por la interventoría en paralelo con las cotizaciones que ellos mismos presenten. NUMERAL 16 - Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual. NUMERAL 17 - Presentar al interventor del contrato un informe mensual de ejecución, por Oficina Intervenida, manifestando el avance en la programación, de acuerdo con lo establecido en el contrato y las dificultades en la ejecución del mismo. NUMERAL 18 - PRESENTAR INFORMES EJECUTIVOS SEMANALES, en donde manifieste el estado del contrato, en lo correspondiente a la ejecución de las obras y la programación presentada, personal de la obra, materiales, ensayos, equipos, actividades ejecutadas en el periodo y actividades pendientes, de acuerdo al formato entregado por la Entidad.

Agradezco su atención y a la espera de dicha respuesta a dicho documento.

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ
Rep. Legal **GRUCOING SAS**
C.C Jaqueline Guzmán Herazo- Supervisión
Mundial de Seguros - Aseguradora

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

acta 1 interventoría

5 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 3 de enero de 2024, 17:33
Para: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>

Cordial saludo Ingeniera Jaqueline, adjunto acta #1 para su revisión

ACTA 1 INTERVENTORIA.rar

y fines pertinentes

Gracias

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 12:10
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenos Días Ingenieros,

Remito corte 1 de interventoría firmado de las oficinas de Bucaramanga y Acacias.
Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de enero de 2024 17:33
Para: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Asunto: acta 1 interventoría

[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

FACTURA ACACIAS CORTE 1.pdf
8049K

FACTURA BUCARAMANGA - CORTE 1.pdf
8053K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 12:13
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenos Días Ingenieros,

Remito corte 1 interventoría de las oficinas de Charalá y Facatativá.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 12:10
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Asunto: RE: acta 1 interventoría

[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

FACTURA CHARALA CORTE 1.pdf
8047K

FACTURA FACATATIVA CORTE 1.pdf
8049K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 12:17
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenos Días Ingenieros,

Remito corte 1 interventoría firmado de las oficinas de Puerto Asís y Puerto Inírida.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co



AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 12:13
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

FACTURA PTO ASIS CORTE 1.pdf
8053K

FACTURA PTO INIRIDA - CORTE 1.pdf
8037K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 12:21
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenos Días Ingenieros,

Remito corte 1 interventoría de la oficina de San Vicente del Caguan.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co



AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 12:17
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]



FACTURA SAN VICENTE - CORTE 1.pdf
8052K

Gmail SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

ACTAS CORTE 2 contrato de interventoría 1708 de 2023

8 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 4 de enero de 2024, 14:58
Para: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>

Ingeniera
JAQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: ENTREGA DE ACTAS CORTE 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1708 DE 2023

Cordial saludo**.**

Por medio del presente, se adjunta documentación del asunto para su revisión y fines pertinentes.

Agradecemos su atención y estamos a la espera de su respuesta.

Cordialmente,

LUDWIG FRANCISCO ALMEYDA SARMIENTO
INTERVENTORÍA

CORTE2INTERVENTORIA.rar

POLIZA.pdf

GRUCOIG S.A.S.

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 14:18
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito el corte 2 firmado de la oficina de Acacias.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co



AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: jueves, 4 de enero de 2024 14:58
Para: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Asunto: ACTAS CORTE 2 contrato de interventoría 1708 de 2023

[El texto citado está oculto]



CORTE 2 ACACIAS.pdf
14232K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 14:19
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito el corte 2 firmado de la oficina de Bucaramanga.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co



AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 14:18
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Asunto: RE: ACTAS CORTE 2 contrato de interventoría 1708 de 2023

[El texto citado está oculto]

CORTE 2 BUCARAMANGA.pdf
14239K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 14:21
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito el corte 2 firmado de la oficina de Charalá.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 14:19
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

CORTE 2 CHARALA.pdf
14232K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 14:22
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito el corte 2 firmado de la oficina de Facatativá.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 14:21
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

CORTE 2 FACATATIVA.pdf
14237K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 14:25
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito el corte 2 firmado de la oficina de Puerto Asís.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co


AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 14:22
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]


CORTE 2 PUERTO ASIS.pdf
14234K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 14:31
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito el corte 2 firmado de la oficina de P. Inírida.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co


AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 14:25
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

CORTE 2 PUERTO INIRIDA.pdf
14230K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 14:33
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito el corte 2 firmado de la oficina de San Vicente.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 14:31
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

CORTE 2 SAN VICENTE.pdf
14239K

Bogotá, 9 de enero de 2024

OF-SNR-131

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordial saludo,

De acuerdo con nuestras obligaciones contractuales me permito anexar la documentación pertinente para cuenta de cobro – corte de obra No 1; contrato de Interventoría 1708-2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ
Rep. Legal GRUCOING SAS

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP ACACIAS- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 16:35
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-131 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 1.pdf
369K

FACTURA ACACIAS CORTE 1 (1).pdf
8049K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 10 de enero de 2024, 8:31
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,

El numero de radicado asignado es SNR2024ER002225

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 16:35
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP ACACIAS- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP BUCARAMANGA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 16:35
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-131 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 1.pdf
369K

FACTURA BUCARAMANGA - CORTE 1 (1).pdf
8053K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 10 de enero de 2024, 8:36
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,

El numero de radicado asignado es SNR2024ER002227

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 16:35
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP BUCARAMANGA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP CHARALA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 16:36
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-131 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 1.pdf
369K

FACTURA CHARALA CORTE 1 (1).pdf
8047K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 10 de enero de 2024, 8:40
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER002230

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 16:36
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP CHARALA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP FACATATIVA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 16:36
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-131 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 1.pdf
369K

FACTURA FACATATIVA CORTE 1 (1).pdf
8049K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 10 de enero de 2024, 8:43
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER002233

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 16:36
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP FACATATIVA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO ASIS - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 16:37
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-131 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 1.pdf
369K

FACTURA PTO ASIS CORTE 1 (1).pdf
8053K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 10 de enero de 2024, 8:52
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER002239

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 16:37
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO ASIS - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO INIRIDA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 16:37
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-131 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 1.pdf
369K

FACTURA PTO INIRIDA - CORTE 1 (2).pdf
8037K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 10 de enero de 2024, 8:49
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER002237

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 16:37
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO INIRIDA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP SAN VICENTE - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 16:37
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-131 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 1.pdf
369K

FACTURA SAN VICENTE - CORTE 1 (3).pdf
8052K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 10 de enero de 2024, 8:56
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER002242

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 16:37
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP SAN VICENTE - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

BALANCES CON NPS

2 mensajes

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com> 9 de enero de 2024, 18:23
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: "jacqueline.guzman" <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>

Cordial saludo:

De acuerdo con la reunión sostenida el día de hoy, adjunto remitimos los balances de Facatativa, Charalá y Puerto Inirida para su conocimiento y fines pertinentes.

Nos encontramos atentos a sus comentarios y/o observaciones.

Cordialmente:

Soluciones Integrales Unión
Ruben Hernández
Karen Fontecha

3 adjuntos

- **2024-01-04-BALANCE ORIP FACATATIVA OK.pdf** 196K
- **2024-01-04-BALANCE CHARALA OK.pdf** 1023K
- **2024-01-04-BALANCE PTO INIRIDA OK.pdf** 327K

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 10 de enero de 2024, 9:06
Para: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>

PSI
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

- **2024-01-04-BALANCE ORIP FACATATIVA OK.pdf** 196K
- **2024-01-04-BALANCE CHARALA OK.pdf** 1023K
- **2024-01-04-BALANCE PTO INIRIDA OK.pdf** 327K

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

FACTURACION CORTES DE OBRA 2 - CONTRATISTA

7 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 10:37
Para: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, gilland.lopez@supernotariado.gov.co, luis.chaparro@supernotariado.gov.co

Buenos días

cordial saludo

Envío carpeta de facturación corte 2 de Contratista de obra con sus respectivas firmas y documentos anexos.

Quedamos atentos a sus comentarios y observaciones

Cordialmente

J.Andres Melo G
Arq. Residente de Interventoria
GRUCOING SAS

FACTURACION CONTRATISTA DE OBRA - CORTE 2.zip

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 9 de enero de 2024, 14:13
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>

Buenas Tardes Ingenieros,

Remito corte 2 firmado de las oficinas de Bucaramanga y Charala.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co


AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 10:37
Para: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>
Asunto: FACTURACION CORTES DE OBRA 2 - CONTRATISTA

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

_2023-12-06-Corte 2 Bucaramanga V1.pdf
14440K

_2023-12-06-CORTE 2 Charala V1.pdf
7585K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 9 de enero de 2024, 14:15

Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito corte 2 de obra firmado de la oficina de P. Inirida.
Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 14:13
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>
Asunto: RE: FACTURACION CORTES DE OBRA 2 - CONTRATISTA

[El texto citado está oculto]

_2023-12-06-CORTE 2 PTO INIRIDA V1.pdf
9828K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 9 de enero de 2024, 14:16

Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito corte 2 firmado de la oficina de Facatativá.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 14:15
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

2023-12-06-CORTE 2 FACATATIVA V1.pdf
10336K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 9 de enero de 2024, 14:17

Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito corte 2 de San Vicente

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo

Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 14:16
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

2023-12-06-Corte 2 San Vicente V1.pdf
7791K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 9 de enero de 2024, 14:20

Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>

2023-12-06-CORTE 2 ACACIAS V1.pdf 2023-12-06-CORTE 2 PTO ASIS V1.pdf

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 14:17
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 10 de enero de 2024, 16:18
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>

Buena tarde, adjunto acta 2 firmada para su conocimiento y fines pertinentes
[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

CORTE 2 OBRA ACACIAS - PUERTO ASISI

2 mensajes

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 12 de enero de 2024, 14:25
Para: GERENCIA GRUCOING SAS <gerencia.grucoingsas@gmail.com>, "interventoria.snr@gmail.com" <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros,

Remito corte 2 de obra de las oficinas de Acacias y Puerto Asís.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía

e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.

2 adjuntos

- **2023-12-06-CORTE 2 ACACIAS V1.rar**
  4983K
- **2023-12-06-CORTE 2 PTO ASIS V1.rar**
  17572K

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 12 de enero de 2024, 14:47
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>

Cordial saludo, adjunto remito actas corte 2 para su información y fines pertinentes
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

- **2023-12-06-CORTE 2 ACACIAS V1.rar**
  4983K
- **2023-12-06-CORTE 2 PTO ASIS V1.rar**
  17572K

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

CORTES DE OBRA 2

3 mensajes

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com> 12 de enero de 2024, 17:13
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>, "jacqueline.guzman" <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>

Cordial saludo

Informamos que de los cortes remitidos solo tenemos la firma de la Supervisión para los frentes de obra de Acacias y Puerto Asís recibidos el día de hoy a las 14:48 horas.

Adicionalmente informamos que no tenemos el formato de cumplimiento firmado por la interventoría.

Sin estos documentos no es posible realizar la radicación del corte de obra.

Nos encontramos atentos al recibo de la información para continuar con los trámites correspondientes.

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 12 de enero de 2024, 17:34
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>

Buena tarde por favor revisar bien el correo fue enviado el día 9 de enero el correo con los archivos relacionados por parte del contratista y donde las actas de acacias y puerto asís no pudieron ser descargadas por tal motivo se enviaron el dia de hoy
Nota: se reenvíara el correo para que descarguen los archivos los cuales están como se recibieron y así se revisaron
[El texto citado está oculto]

Gmail - FACTURACION CORTES DE OBRA 2 - CONTRATISTA.pdf
61K

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 12 de enero de 2024, 17:49
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Cco: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>

Cordial saludo, adjunto archivos acta 2

acta 2.rar

[El texto citado está oculto]

Gmail - FACTURACION CORTES DE OBRA 2 - CONTRATISTA.pdf
61K

Bogotá, 15 de enero de 2024

OF-SNR-132

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordial saludo,

De acuerdo con nuestras obligaciones contractuales me permito anexar la documentación pertinente para cuenta de cobro – corte de obra No 2; contrato de Interventoría 1708-2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ
Rep. Legal GRUCOING SAS

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP CHARALA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 15 de enero de 2024, 15:41
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-132 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 2.pdf
369K

CORTE 2 CHARALA.pdf
14326K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 16 de enero de 2024, 9:07
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,

El numero de radicado asignado es SNR2024ER004248

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:41
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP CHARALA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP BUCARAMANGA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 15 de enero de 2024, 15:42
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-132 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 2.pdf
369K

CORTE 2 BUCARAMANGA.pdf
14332K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 16 de enero de 2024, 9:12
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER004276

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:42
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP BUCARAMANGA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP ACACIAS- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 15 de enero de 2024, 15:43
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-132 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 2.pdf
369K

CORTE 2 ACACIAS.pdf
14328K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 16 de enero de 2024, 9:20
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER004294

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:43
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP ACACIAS- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP FACATATIVA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 15 de enero de 2024, 15:45
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-132 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 2.pdf
369K

CORTE 2 FACATATIVA.pdf
14331K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 16 de enero de 2024, 9:26
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER004301

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:45
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP FACATATIVA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO ASIS- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 15 de enero de 2024, 15:46
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-132 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 2.pdf
369K

CORTE 2 PUERTO ASIS.pdf
14328K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 16 de enero de 2024, 9:38
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,

El numero de radicado asignado es SNR2024ER004317

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:46
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO ASIS- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO INIRIDA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 15 de enero de 2024, 15:48
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ
Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-132 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 2.pdf
369K

CORTE 2 PUERTO INIRIDA.pdf
14324K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 16 de enero de 2024, 9:52
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER004327

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:48
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO INIRIDA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP SAN VICENTE- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 15 de enero de 2024, 15:48
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-132 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 2.pdf
369K

CORTE 2 SAN VICENTE.pdf
14333K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 16 de enero de 2024, 9:57
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,

El numero de radicado asignado es SNR2024ER004331

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:48
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP SAN VICENTE- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Bogotá, 16 de enero de 2024

OF-SNR-133

Señor
FLAMINIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Rep. Legal Soluciones Integrales Unión S.A.S
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1675 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMADE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACIÓN 2".

ASUNTO: - SOLICITUD DE BALANCES FINALES, ITEMS NO PREVISTOS, MEMORIAS DE CALCULO, COTIZACIONES RESPECTIVAS Y ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES Y OBRA NO PREVISTA FINAL PARA CADA ORIP (ACACIAS, PUERTO ASIS, SAN VICENTE DEL CAGUAN)

Cordial saludo,

En cumplimiento de las Actividades Contractuales de esta Interventoría de manera atenta y en atención al asunto en referencia me permito informar lo siguiente:

De acuerdo a la documentación se solicita nuevamente se envíen los siguientes documentos, con medida de apremio la documentación solicitada en el oficio.

Adicional a estos requerimientos se les **REITERA** el **APREMIO** para la entrega de dicha documentación para la liquidación y recibo final de los trabajos realizados por Uds.

Para la entrega final se solicita los siguientes documentos:

- Balances finales de cada oficina regional u ORIP donde se incluya los ítems o Apus no previstos.
- Memorias de cálculo donde se incluya los ítems no previstos con sus respectivas cantidades ejecutadas.
- Listado de cada Apu o Item no previsto, donde se incluya él o los materiales, mano de obra y tiempos de ejecución.

- La respectiva cotización del material a utilizar en el nuevo Apu o Item no previsto (3 cotizaciones) adicionar además la ficha técnica del material y a que Orip pertenece.
- Acta de justificación de mayores y menores y obra no prevista final, suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría, en el cual esta referenciado en su cláusula cuarta numeral 11 del contrato de obra 1675-2023

Por lo anterior se le recuerda que dentro del pacto contractual reza las siguientes clausulas.

Se le INSTA al contratista las obligaciones firmadas en los documentos iniciales **(CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 1675 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS, IDENTIFICADA NIT. 800.205.914-1) que se debe cumplir y acatar en EL CONTRATO DE OBRA.**

CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO - NUMERAL 11 Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES GENERALES - NUMERAL 6 - Allegar a la Superintendencia de Notariado y Registro, en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato; NUMERAL 8 - Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Interventor del contrato y/o de la entidad; NUMERAL 9 – Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. NUMERAL 10. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual. NUMERAL 13. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro.

Adicional a la **CLAUSULA NOVENA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**: el contratista se obliga a desarrollar las siguientes obligaciones específicas: NUMERAL 9. Presentar los siguientes documentos a la interventoría, una vez sean requeridos por ellos: I. Flujo de inversión por cada Oficina. II. APU del Item no previsto el cual contendrá 3 cotizaciones como mínimo de insumos, las cuales serán evaluadas por la interventoría en paralelo con las cotizaciones que ellos mismos presenten. NUMERAL 16 - Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones

en la actuación contractual. NUMERAL 17 - Presentar al interventor del contrato un informe mensual de ejecución, por Oficina Intervenida, manifestando el avance en la programación, de acuerdo con lo establecido en el contrato y las dificultades en la ejecución del mismo. NUMERAL 18 - PRESENTAR INFORMES EJECUTIVOS SEMANALES, en donde manifieste el estado del contrato, en lo correspondiente a la ejecución de las obras y la programación presentada, personal de la obra, materiales, ensayos, equipos, actividades ejecutadas en el periodo y actividades pendientes, de acuerdo al formato entregado por la Entidad.

Agradezco su atención y a la espera de dicha respuesta a dicho documento.

Cordialmente,



LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ
Rep. Legal **GRUCOING SAS**
C.C Jaqueline Guzmán Herazo- Supervisión
Mundial de Seguros - Aseguradora

Puerto Asís, 16 de enero de 2024

OF-SNR-0134

Señor
FLAMINIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Rep. Legal Soluciones Integrales Unión S.A.S

Referencia: Contrato de obra No. 1675 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO, DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACIÓN 2".

ASUNTO: PENDIENTES ACTIVIDADES DE EJECUCUION ORIP PUERTO ASIS

Cordial saludo:

Considerando que la interventoría es un ente vigilante de la parte administrativa, técnica y financiera del contrato en cuestión. Esta se ve en la obligación de expresar su preocupación por el estado en que actualmente se encuentran las Oficinas de Instrumentos Públicos en el Municipio de Puerto Asís.

Cabe resaltar que el día 19 de diciembre del 2023 se dieron a conocer algunas actividades pendientes por ejecutar y otras por completar en un listado de forma escrita por medio de WhatsApp al contratista, subcontratista de mano de obra como también al Ingeniero residente en su momento. Se aclara que algunas de las actividades pendientes se fueron completando entre las fechas del 20 al 28 de diciembre del 2023, pero a partir de estas fechas se siguen evidenciando pendientes.

A continuación, se enumerarán en el siguiente listado y se recomienda que esto se corrijan lo antes posible para su respectiva entrega:

1. Falta instalación de 3 tapas de registro.
2. Falta la instalación de 3 vidrios en puertas de oficinas.
3. Falta la instalación de 1 vidrio en escritorio oficina de archivo.

4. Falta la instalación de la baranda de apoyo en baño de discapacitados.
5. Falta la activación de la alarma en puerta de ingreso a las oficinas de los funcionarios.
6. Falta reparación de humedad en cielorraso en oficina de archivos.
7. Falta reparar agujeros en el techo. Debido al ingreso de roedores en la oficina de archivos y cocina.
8. Falta la instalación del monitor de huellas de registro de ingreso y salida de los funcionarios.
9. Verificar nuevamente la existencia de una gotera en la oficina de la registradora. Fue reparada en una oportunidad, pero aún persiste.
10. Falta la instalación de rejas en cárcamo existente en el cuarto de máquinas.
11. Instalación de accesorios para baños.
12. Reparación de la cerámica instalada en la tapa del aljibe.
13. Instalación de letreros de la Orip.
14. Reparación o cambio barra de mármol en atención a usuarios.
15. Correcta adecuación de tomas en las oficinas.
16. Se presentan acabados de pintura en regular estado.
17. No se presenta un correcto encauchetado en tubería o ductos de algunos aires acondicionados.
18. Se sugiere dejar un solo tono de pintura al escritorio de la registradora.
19. Acabado en marco de puertas regular.
20. Se presenta resíduos de pintura em cielorraso.
21. Aún se presenta material de trabajo en la cubierta posterior de las instalaciones.
22. Falta la instalación de la reja en ventana parte posterior de las instalaciones.
23. Falta instalación de cornisas en algunos sectores.
24. Se presenta un acabado regular en la aplicación de pintura en entre muros y marcos de las puertas.
25. Existe un funcionamiento irregular en la red de Wi-Fi en las instalaciones. Por lo tanto, los funcionarios se ven en la obligación de instalar cables de una oficina a otra para poder ejecutar sus actividades diarias.
26. Se presenta filtración de agua en lavamanos y sanitario en baño de discapacitados.
27. Falta la instalación de brazo mecánico en puerta de ingreso de funcionario a oficinas.
28. Filtración de agua, por llenado de tanques de almacenamiento. Revisar el sistema de abastecimiento.
29. Fallo en proceso de instalación del mueble para lavamanos en baño segundo nivel, oficina registradora.
30. Realizar resanes en la fachada principal, parte superior de la misma.

La interventoría está presta para aclarar cualquier inquietud sobre dicho listado y espera la corrección de las mismas para su verificación y entrega final. Se anexa registro fotográfico.

Agradecemos su atención y a la espera de la respuesta a dicho documento.

Cordialmente

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
Rep. Legal GRUCOING S.A.S
C.c Ing. Jaqueline Guzmán Herazo – Supervisora SNR
C.c Mundial de seguros – Aseguradora
Anexo; Registro fotográfico

TAPAS DE REGISTRO Y VIDRIOS EN PUERTAS










OFICINA DE ARCHIVOS

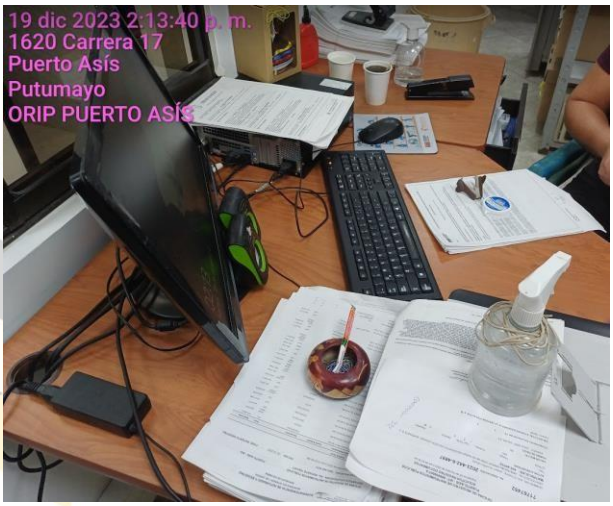
19 dic 2023 2:13:40 p. m.
1620 Carrera 17
Puerto Asís
Putumayo
ORIP PUERTO ASÍS


VIDRIO PARA ESCRITORIO



FALTA BARANDA DE APOYO Y
ACCESORIOS DE BAÑO.


28 dic 2023 9:41:28 a. m.
1620 Carrera 17
Puerto Asís
Putumayo
ORIP PUERTO ASÍS
FILTRACIÓN DE AGUA

BAÑO DISCAPACITADOS OFICINA DE ARCHIVOS





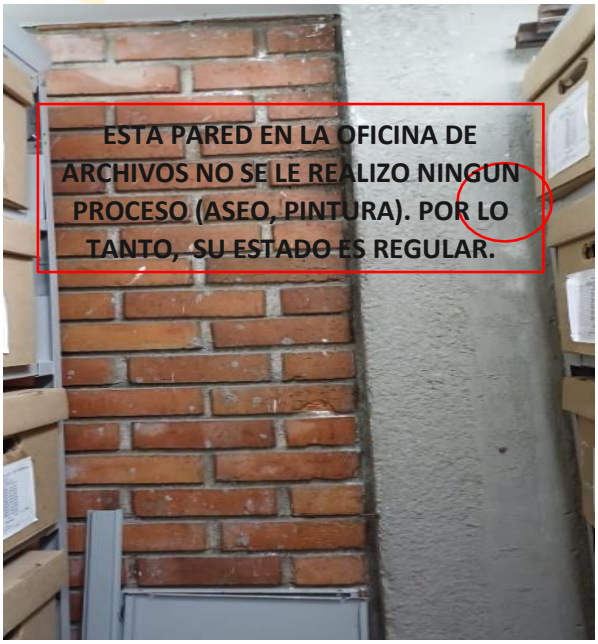



ALARMA EN PUERTA DE INGRESO Y HUELLERO DE REGISTRO





AGUJEROS (INGRESO DE ROEDORES)





NOTA: SE PRESENTA ESTA EVIDENCIA COMO REPARRACIÓN DE GOTERA EN LA OFICINA DE LA REGISTRADORA. PERO LA GOTERA AUN PERSISTE.


REPARACIÓN 15
DE DICIEMBRE


ACTUALMENTE
PERSISTEN
ESTAS GOTERAS


12 dic 2023 7:32:13 p. m.
1620 Carrera 17
Puerto Asís
Putumayo
ORIP PUERTO ASÍS
GOTERA


9 ene 2024 9:02:15 a. m.
ORIP PUERTO ASÍS
BRAZO
HIDRÁULICO
PARA PUERTA
150KG

FACHADA PRINCIPAL





CUARTO DE PLANTA (REJILLAS DE CARCAMO)











9 ene 2024 9:01:50 a. m.
ORIP PUERTO ASÍS
LA PUERTA ESTA INESTABLE (SE BALANCEA DE LADO A LADO)


9 ene 2024 9:04:05 a. m.
ORIP PUERTO ASÍS
FALTA INSTALACIÒN DE REJA DE SEGURIDA

CUARTO DE MÀQUINAS

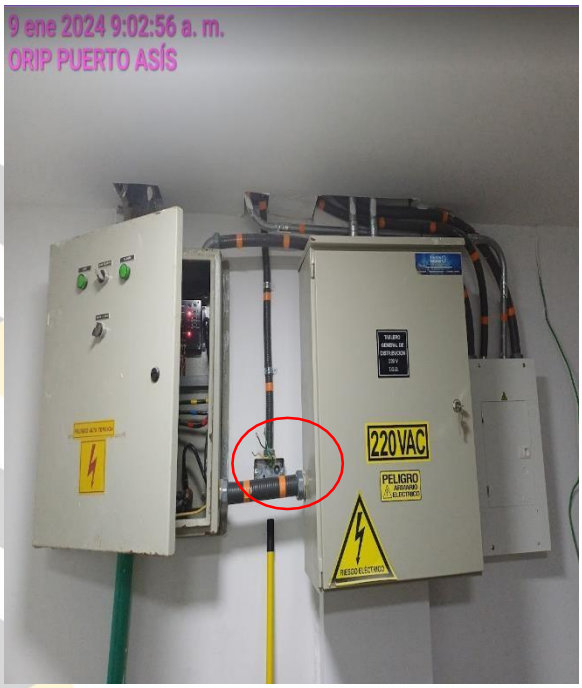



OFICINAS





BAÑO FUNCIONARIOS PRIMER NIVEL





SE REALIZA LA INSTALACIÒN DE LA MOTOBOMBA PARA ELA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES, PERO NO SE PUEDE ENCENDER DEBIDO A UN TUBO QUE PRESENTA FUGA EN LA OFICINA DE LA REGISTRADORA.







MESÒN DE MÀRMOL EN ATENCIÒN AL USUARIO.







OFICINA REGISTRADORA







OFICINA REGISTRADORA (BAÑO)







FACHADA PRINCIPAL (RESANES)



Bucaramanga, 25 de enero del 2023

OF-SNR-0135

Señor
FLAMINIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Rep. Legal Soluciones Integrales Unión S.A.S

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)".

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES SST MES DE DICIEMBRE Y ENERO Y SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE-DICIEMBRE.


Cordial saludo:
El Grupo Consultor e Ingenieros SAS (Grucoing) en cumplimiento de sus obligaciones contractuales en calidad de interventoría técnica, administrativa y jurídica, solicita de manera inmediata realizar el cumplimiento de los informes SST del mes de diciembre del 2023 y enero del 2024 y la seguridad social de **noviembre- diciembre** de todos los puntos de trabajo por parte de la empresa contratista **SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S** ya que hasta el momento no ha sido efectiva la entrega de la información solicitada en los puntos de trabajo**.**

Por lo tanto, la interventoría del proyecto hasta la fecha no ha podido corroborar el cumplimiento a cabalidad en temas de seguridad y salud en el trabajo que tienen que ir plasmados en los informes mensuales de los meses en ejecución. Es importante tener en

cuenta el valor de los incumplimientos de las obligaciones que tienen como contratistas de obra como lo especifica en la **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA MULTAS**: **a)**" con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas hasta por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada día de incumplimiento o retraso hasta cuando estas efectivamente se cumplan".

Agradecemos su atención y respuesta urgente ante estas observaciones plasmadas en dicho documento.

Cordialmente,



LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
Rep. Legal GRUCOING S.A.S
C.C Ing. Jaqueline Guzmán Herazo – Supervisora SNR

Bogotá, 31 de enero de 2024

OF-SNR-135

Ingeniera
JAQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: RADICACION INFORME No 5 DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

De acuerdo con nuestras obligaciones contractuales me permito anexar el informe mensual de Interventoría No 5, comprendido en el periodo:

Informe mensual No 05: 01/12/2023 al 31/12/2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ
Rep. Legal GRUCOING SAS

Adjunto: (1) informe mensual de interventoría No 05

8.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE CONTRATISTA DE OBRA

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DE LA SNR

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 13 de diciembre de 2023, 19:53
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>, administrativa@siu.com.co

Señor
FLAMINIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Rep. Legal Soluciones Integrales Unión S.A.S Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1675 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACIÓN 2".

ASUNTO: MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DE LA SNR

Libre de virus.www.avg.com

2 adjuntos

OF-SNR-120- MANUAL DE INDENTIDAD VISUAL SNR.pdf
387K

Manual de Identida Visual Corporativa de la SNR.pdf
2733K

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com> 4 de enero de 2024, 9:02
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: administrativa@siu.com.co, "jacqueline.guzman" <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, magaly.caycedo@supernotariado.gov.co

Cordial saludo,

Adicional a la información enviada (Manual de identidad Visual Corporativa de la SNR) que sean remitidas las leyendas para cada espacio de las Orip, esto se debe coordinar entre la supervisión, los registradores y la interventoría para de esta forma poder concluir las actividades contractuales.

Cordialmente,

Ing.Karen Fontecha
Coordinadora de Proyectos
SIU

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

BALANCES CON NPS

2 mensajes

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com> 9 de enero de 2024, 18:23
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: "jacqueline.guzman" <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>

Cordial saludo:

De acuerdo con la reunión sostenida el día de hoy, adjunto remitimos los balances de Facatativa, Charalá y Puerto Inirida para su conocimiento y fines pertinentes.

Nos encontramos atentos a sus comentarios y/o observaciones.

Cordialmente:

Soluciones Integrales Unión
Ruben Hernández
Karen Fontecha

3 adjuntos

- **2024-01-04-BALANCE ORIP FACATATIVA OK.pdf** 196K
- **2024-01-04-BALANCE CHARALA OK.pdf** 1023K
- **2024-01-04-BALANCE PTO INIRIDA OK.pdf** 327K

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 10 de enero de 2024, 9:06
Para: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>

PSI
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

- **2024-01-04-BALANCE ORIP FACATATIVA OK.pdf** 196K
- **2024-01-04-BALANCE CHARALA OK.pdf** 1023K
- **2024-01-04-BALANCE PTO INIRIDA OK.pdf** 327K

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

CORTES DE OBRA 2

3 mensajes

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com> 12 de enero de 2024, 17:13
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>, "jacqueline.guzman" <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>

Cordial saludo

Informamos que de los cortes remitidos solo tenemos la firma de la Supervisión para los frentes de obra de Acacias y Puerto Asís recibidos el día de hoy a las 14:48 horas.

Adicionalmente informamos que no tenemos el formato de cumplimiento firmado por la interventoría.

Sin estos documentos no es posible realizar la radicación del corte de obra.

Nos encontramos atentos al recibo de la información para continuar con los trámites correspondientes.

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 12 de enero de 2024, 17:34
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>

Buena tarde por favor revisar bien el correo fue enviado el día 9 de enero el correo con los archivos relacionados por parte del contratista y donde las actas de acacias y puerto asís no pudieron ser descargadas por tal motivo se enviaron el dia de hoy
Nota: se reenvíara el correo para que descarguen los archivos los cuales están como se recibieron y así se revisaron
[El texto citado está oculto]

Gmail - FACTURACION CORTES DE OBRA 2 - CONTRATISTA.pdf
61K

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 12 de enero de 2024, 17:49
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Cco: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>

Cordial saludo, adjunto archivos acta 2

acta 2.rar

[El texto citado está oculto]

Gmail - FACTURACION CORTES DE OBRA 2 - CONTRATISTA.pdf
61K

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

CORTE 1 - CONTRATO 1675 - ORIP ACACIAS

1 mensaje

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com> 15 de enero de 2024, 12:17
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: "jacqueline.guzman" <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Señores:
SUPERNOTARIADO
Ing JACQUELINE GUZMÁN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura

REFERENCIA: “CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).”. (**AGRUPACIÓN 2**).

Cordial saludo:

Adjunto remitimos la información relacionada en el asunto para el contrato 1675-2023 de la Orip de Acacias para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

Soluciones Integrales Unión S.A.S.

2 adjuntos

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO contra obra 2.pdf
463K

2023-12-06-CORTE 2 ACACIAS V1.pdf
24412K

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

CORTE 2 - CONTRATO 1675-2023 - ORIP FACATATIVA

2 mensajes

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com> 15 de enero de 2024, 12:13
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>, "jacqueline.guzman" <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>

Señores:
SUPERNOTARIADO
Ing JACQUELINE GUZMÁN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura

REFERENCIA: "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).". (**AGRUPACIÓN 2**).

Cordial saludo:

Adjunto remitimos la información relacionada en el asunto para el contrato 1675-2023 de la Orip de Bucaramanga para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

Soluciones Integrales Unión S.A.S.

2 adjuntos

2023-12-06-CORTE 2 FACATATIVA V1.pdf
10336K

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO contra obra 2.pdf
463K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 15 de enero de 2024, 12:27
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Cc: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>, Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER003905

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 12:13
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>; Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

<jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Asunto: CORTE 2 - CONTRATO 1675-2023 - ORIP FACATATIVA

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

ORTE 2 - CONTRATO 1675-2023 - ORIP CHARALÁ

2 mensajes

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com> 15 de enero de 2024, 12:14
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: "jacqueline.guzman" <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Señores:
SUPERNOTARIADO
Ing JACQUELINE GUZMÁN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura

REFERENCIA: "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).". (**AGRUPACIÓN 2**).

Cordial saludo:

Adjunto remitimos la información relacionada en el asunto para el contrato 1675-2023 de la Orip de Charalá para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

Soluciones Integrales Unión S.A.S.

2 adjuntos

_2023-12-06-CORTE 2 Charala V1.pdf
7585K

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO contra obra 2.pdf
463K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 15 de enero de 2024, 12:34
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER003910

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 12:14
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; SUPERNOTARIADO Y

REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Asunto: ORTE 2 - CONTRATO 1675-2023 - ORIP CHARALÁ

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

ORTE 2 - CONTRATO 1675-2023 - ORIP BUCARAMANGA

2 mensajes

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com> 15 de enero de 2024, 12:16
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: "jacqueline.guzman" <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Señores:
SUPERNOTARIADO
Ing JACQUELINE GUZMÁN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura

REFERENCIA: "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).". (**AGRUPACIÓN 2**).

Cordial saludo:

Adjunto remitimos la información relacionada en el asunto para el contrato 1675-2023 de la Orip de Bucaramanga para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

Soluciones Integrales Unión S.A.S.

2 adjuntos

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO contra obra 2.pdf
463K

_2023-12-06-Corte 2 Bucaramanga V1.pdf
14440K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 15 de enero de 2024, 12:40
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER003913

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 12:16
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; SUPERNOTARIADO Y

REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Asunto: ORTE 2 - CONTRATO 1675-2023 - ORIP BUCARAMANGA

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

CORTE 2 - CONTRATO 1675 - PUERTO INIRIDA

2 mensajes

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com> 15 de enero de 2024, 12:18
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: "jacqueline.guzman" <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Señores:
SUPERNOTARIADO
Ing JACQUELINE GUZMÁN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura

REFERENCIA: "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).". (**AGRUPACIÓN 2**).

Cordial saludo:

Adjunto remitimos la información relacionada en el asunto para el contrato 1675-2023 de la Orip de Puerto Inirida para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

Soluciones Integrales Unión S.A.S.

2 adjuntos

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO contra obra 2.pdf
463K

_2023-12-06-CORTE 2 PTO INIRIDA V1.pdf
9828K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 15 de enero de 2024, 12:44
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER003917

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 12:18
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; SUPERNOTARIADO Y

REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Asunto: CORTE 2 - CONTRATO 1675 - PUERTO INIRIDA

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

CORTE 2 - CONTRATO 1675 - SAN VICENTE DEL CAGUAN

2 mensajes

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com> 15 de enero de 2024, 12:20
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: "jacqueline.guzman" <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com> 12:13 (hace 6 minutos)
para correspondencia, SUPERNOTARIADO, jacqueline.guzman

Señores:
SUPERNOTARIADO
Ing JACQUELINE GUZMÁN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura

REFERENCIA: "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).". (**AGRUPACIÓN 2**).

Cordial saludo:

Adjunto remitimos la información relacionada en el asunto para el contrato 1675-2023 de la Orip de San Vicente para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

Soluciones Integrales Unión S.A.S.

2 adjuntos

2023-12-06-Corte 2 San Vicente V1.pdf
7791K

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO contra obra 2.pdf
463K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 15 de enero de 2024, 12:49
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER003920

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 12:20
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Asunto: CORTE 2 - CONTRATO 1675 - SAN VICENTE DEL CAGUAN

[El texto citado está oculto]

Gmail SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

CORTE 2 - CONTRATO 1675 - PUERTO ASIS

2 mensajes

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com> 15 de enero de 2024, 12:23
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: "jacqueline.guzman" <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Señores:
SUPERNOTARIADO
Ing JACQUELINE GUZMÁN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura

REFERENCIA: "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).". (**AGRUPACIÓN 2**).

Cordial saludo:

Adjunto remitimos la información relacionada en el asunto para el contrato 1675-2023 de la Orip de Puerto Asís para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

Soluciones Integrales Unión S.A.S.

2 adjuntos

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO contra obra 2.pdf
463K

2023-12-06-CORTE 2 PTO ASIS V1.pdf
4026K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 15 de enero de 2024, 12:52
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER003922

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 12:23
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; SUPERNOTARIADO Y

REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Asunto: CORTE 2 - CONTRATO 1675 - PUERTO ASIS

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

CORTE 2 - CONTRATO 1675 - ORIP ACACIAS

2 mensajes

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com> 15 de enero de 2024, 13:12
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: "jacqueline.guzman" <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Señores:
SUPERNOTARIADO
Ing JACQUELINE GUZMÁN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura

REFERENCIA: "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).". (**AGRUPACIÓN 2**).

Cordial saludo:

Adjunto remitimos la información relacionada en el asunto para el contrato 1675-2023 de la Orip de Acacias para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

Soluciones Integrales Unión S.A.S.

2 adjuntos

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO contra obra 2.pdf
463K

2023-12-06-CORTE 2 ACACIAS V1.pdf
3403K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 15 de enero de 2024, 14:16
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER003951

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 13:12
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; SUPERNOTARIADO Y

REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Asunto: CORTE 2 - CONTRATO 1675 - ORIP ACACIAS

[El texto citado está oculto]

8.3 INFORMES SEMANALES

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

acta 1 interventoría

5 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 3 de enero de 2024, 17:33
Para: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>

Cordial saludo Ingeniera Jaqueline, adjunto acta #1 para su revisión

ACTA 1 INTERVENTORIA.rar

y fines pertinentes

Gracias

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 12:10
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenos Días Ingenieros,

Remito corte 1 de interventoría firmado de las oficinas de Bucaramanga y Acacias.
Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de enero de 2024 17:33
Para: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Asunto: acta 1 interventoría

[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

FACTURA ACACIAS CORTE 1.pdf
8049K

FACTURA BUCARAMANGA - CORTE 1.pdf
8053K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 12:13
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenos Días Ingenieros,

Remito corte 1 interventoría de las oficinas de Charalá y Facatativá.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 12:10
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Asunto: RE: acta 1 interventoría

[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

FACTURA CHARALA CORTE 1.pdf
8047K

FACTURA FACATATIVA CORTE 1.pdf
8049K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 12:17
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenos Días Ingenieros,

Remito corte 1 interventoría firmado de las oficinas de Puerto Asís y Puerto Inírida.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co



AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 12:13
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

FACTURA PTO ASIS CORTE 1.pdf
8053K

FACTURA PTO INIRIDA - CORTE 1.pdf
8037K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 12:21
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenos Días Ingenieros,

Remito corte 1 interventoría de la oficina de San Vicente del Caguan.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co



AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 12:17
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

FACTURA SAN VICENTE - CORTE 1.pdf
8052K

Gmail SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

ACTAS CORTE 2 contrato de interventoría 1708 de 2023

8 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 4 de enero de 2024, 14:58
Para: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>

Ingeniera
JAQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: ENTREGA DE ACTAS CORTE 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1708 DE 2023

Cordial saludo**.**

Por medio del presente, se adjunta documentación del asunto para su revisión y fines pertinentes.

Agradecemos su atención y estamos a la espera de su respuesta.

Cordialmente,

LUDWIG FRANCISCO ALMEYDA SARMIENTO
INTERVENTORÍA

CORTE2INTERVENTORIA.rar

POLIZA.pdf

GRUCOIG S.A.S.

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 14:18
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito el corte 2 firmado de la oficina de Acacias.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: jueves, 4 de enero de 2024 14:58
Para: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Asunto: ACTAS CORTE 2 contrato de interventoría 1708 de 2023

[El texto citado está oculto]

CORTE 2 ACACIAS.pdf
14232K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 14:19
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito el corte 2 firmado de la oficina de Bucaramanga.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 14:18
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Asunto: RE: ACTAS CORTE 2 contrato de interventoría 1708 de 2023

[El texto citado está oculto]

CORTE 2 BUCARAMANGA.pdf
14239K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 14:21
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito el corte 2 firmado de la oficina de Charalá.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co


AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 14:19
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

CORTE 2 CHARALA.pdf
14232K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 14:22
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito el corte 2 firmado de la oficina de Facatativá.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 14:21
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

CORTE 2 FACATATIVA.pdf
14237K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 14:25
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito el corte 2 firmado de la oficina de Puerto Asís.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 14:22
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

CORTE 2 PUERTO ASIS.pdf
14234K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 14:31
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito el corte 2 firmado de la oficina de P. Inírida.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 14:25
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

CORTE 2 PUERTO INIRIDA.pdf
14230K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 8 de enero de 2024, 14:33
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito el corte 2 firmado de la oficina de San Vicente.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 14:31
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

CORTE 2 SAN VICENTE.pdf
14239K

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

Comité de seguimiento contrato de obra 1675-2023

1 mensaje

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 9 de enero de 2024, 9:32
Para: "interventoria.snr@gmail.com" <interventoria.snr@gmail.com>, "contratosnr1675@gmail.com" <contratosnr1675@gmail.com>

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 221 967 900 786
Código de acceso: zxwnt5
Descargar Teams | Unirse en la web

O llame (solo audio)
+57 6015142209,,637575957# Colombia, Bogotá
Id. de conferencia de teléfono: 637 575 957#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.

invite.ics
6K

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

FACTURACION CORTES DE OBRA 2 - CONTRATISTA

7 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 10:37
Para: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, gilland.lopez@supernotariado.gov.co, luis.chaparro@supernotariado.gov.co

Buenos días

cordial saludo

Envío carpeta de facturación corte 2 de Contratista de obra con sus respectivas firmas y documentos anexos.

Quedamos atentos a sus comentarios y observaciones

Cordialmente

J.Andres Melo G
Arq. Residente de Interventoria
GRUCOING SAS

FACTURACION CONTRATISTA DE OBRA - CORTE 2.zip

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 9 de enero de 2024, 14:13
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>

Buenas Tardes Ingenieros,

Remito corte 2 firmado de las oficinas de Bucaramanga y Charala.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co



AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 10:37
Para: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>
Asunto: FACTURACION CORTES DE OBRA 2 - CONTRATISTA

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

_2023-12-06-Corte 2 Bucaramanga V1.pdf
14440K

_2023-12-06-CORTE 2 Charala V1.pdf
7585K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 9 de enero de 2024, 14:15

Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito corte 2 de obra firmado de la oficina de P. Inirida.
Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 14:13
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>
Asunto: RE: FACTURACION CORTES DE OBRA 2 - CONTRATISTA

[El texto citado está oculto]

_2023-12-06-CORTE 2 PTO INIRIDA V1.pdf
9828K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 9 de enero de 2024, 14:16

Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito corte 2 firmado de la oficina de Facatativá.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 14:15
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

2023-12-06-CORTE 2 FACATATIVA V1.pdf
10336K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 9 de enero de 2024, 14:17

Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>

Buenas Tardes Ingenieros

Remito corte 2 de San Vicente

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo

Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 14:16
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

2023-12-06-Corte 2 San Vicente V1.pdf
7791K

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 9 de enero de 2024, 14:20

Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>

2023-12-06-CORTE 2 ACACIAS V1.pdf 2023-12-06-CORTE 2 PTO ASIS V1.pdf

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

---

De: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 14:17
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 10 de enero de 2024, 16:18
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>

Buena tarde, adjunto acta 2 firmada para su conocimiento y fines pertinentes
[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP ACACIAS- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 16:35
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-131 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 1.pdf
369K

FACTURA ACACIAS CORTE 1 (1).pdf
8049K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 10 de enero de 2024, 8:31
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,

El numero de radicado asignado es SNR2024ER002225

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 16:35
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP ACACIAS- CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP BUCARAMANGA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 16:35
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-131 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 1.pdf
369K

FACTURA BUCARAMANGA - CORTE 1 (1).pdf
8053K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 10 de enero de 2024, 8:36
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,

El numero de radicado asignado es SNR2024ER002227

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 16:35
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP BUCARAMANGA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP CHARALA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 16:36
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-131 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 1.pdf
369K

FACTURA CHARALA CORTE 1 (1).pdf
8047K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 10 de enero de 2024, 8:40
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER002230

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 16:36
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP CHARALA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP FACATATIVA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 16:36
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-131 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 1.pdf
369K

FACTURA FACATATIVA CORTE 1 (1).pdf
8049K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 10 de enero de 2024, 8:43
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER002233

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 16:36
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP FACATATIVA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO ASIS - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 16:37
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-131 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 1.pdf
369K

FACTURA PTO ASIS CORTE 1 (1).pdf
8053K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 10 de enero de 2024, 8:52
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER002239

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 16:37
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO ASIS - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO INIRIDA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 16:37
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-131 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 1.pdf
369K

FACTURA PTO INIRIDA - CORTE 1 (2).pdf
8037K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 10 de enero de 2024, 8:49
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER002237

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 16:37
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO INIRIDA - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>

OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP SAN VICENTE - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 9 de enero de 2024, 16:37
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-131 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 1.pdf
369K

FACTURA SAN VICENTE - CORTE 1 (3).pdf
8052K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 10 de enero de 2024, 8:56
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER002242

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 16:37
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-131 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP SAN VICENTE - CORTE DE OBRA No 1 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

CORTE 2 OBRA ACACIAS - PUERTO ASISI

2 mensajes

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 12 de enero de 2024, 14:25
Para: GERENCIA GRUCOING SAS <gerencia.grucoingsas@gmail.com>, "interventoria.snr@gmail.com" <interventoria.snr@gmail.com>

Buenas Tardes Ingenieros,

Remito corte 2 de obra de las oficinas de Acacias y Puerto Asís.

Cordialmente;

Ing Jaqueline Guzmán Herazo
Profesional especializado Grupo Infraestructura

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 328 21 21 E-mail: jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía

e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.

2 adjuntos

- **2023-12-06-CORTE 2 ACACIAS V1.rar**
  4983K
- **2023-12-06-CORTE 2 PTO ASIS V1.rar**
  17572K

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 12 de enero de 2024, 14:47
Para: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS <contratosnr1675@gmail.com>

Cordial saludo, adjunto remito actas corte 2 para su información y fines pertinentes
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

- **2023-12-06-CORTE 2 ACACIAS V1.rar**
  4983K
- **2023-12-06-CORTE 2 PTO ASIS V1.rar**
  17572K

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP CHARALA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 15 de enero de 2024, 15:41
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-132 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 2.pdf
369K

CORTE 2 CHARALA.pdf
14326K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 16 de enero de 2024, 9:07
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,

El numero de radicado asignado es SNR2024ER004248

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:41
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP CHARALA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP BUCARAMANGA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 15 de enero de 2024, 15:42
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-132 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 2.pdf
369K

CORTE 2 BUCARAMANGA.pdf
14332K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 16 de enero de 2024, 9:12
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER004276

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:42
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP BUCARAMANGA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP ACACIAS- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 15 de enero de 2024, 15:43
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-132 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 2.pdf
369K

CORTE 2 ACACIAS.pdf
14328K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 16 de enero de 2024, 9:20
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER004294

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:43
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP ACACIAS- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP FACATATIVA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 15 de enero de 2024, 15:45
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-132 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 2.pdf
369K

CORTE 2 FACATATIVA.pdf
14331K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 16 de enero de 2024, 9:26
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER004301

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:45
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP FACATATIVA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO ASIS- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 15 de enero de 2024, 15:46
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-132 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 2.pdf
369K

CORTE 2 PUERTO ASIS.pdf
14328K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 16 de enero de 2024, 9:38
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,

El numero de radicado asignado es SNR2024ER004317

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:46
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO ASIS- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO INIRIDA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 15 de enero de 2024, 15:48
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ
Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-132 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 2.pdf
369K

CORTE 2 PUERTO INIRIDA.pdf
14324K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 16 de enero de 2024, 9:52
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,
El numero de radicado asignado es SNR2024ER004327

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:48
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP PUERTO INIRIDA- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP SAN VICENTE- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

2 mensajes

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com> 15 de enero de 2024, 15:48
Para: correspondencia@supernotariado.gov.co
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, luis.chaparro@supernotariado.gov.co, gilland.lopez@supernotariado.gov.co

Ingeniera
JACQUELINE GUZMAN HERAZO
Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Superintendencia de notariado y Registro
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 1708 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)"

ASUNTO: DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ

Rep. Legal GRUCOING SAS

2 adjuntos

OF-SNR-132 - RADICACION CUENTA DE COBRO - CORTE 2.pdf
369K

CORTE 2 SAN VICENTE.pdf
14333K

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co> 16 de enero de 2024, 9:57
Para: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>, Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>

Buen día,

El numero de radicado asignado es SNR2024ER004331

Cordialmente,
Grupo de Correspondencia SNR

De: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:48
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>
Cc: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co>; Luis Alejandro Chaparro Rodriguez <luis.chaparro@supernotariado.gov.co>; Gilland Rodolfo Lopez Santamaria <gilland.lopez@supernotariado.gov.co>
Asunto: OF-SNR-132 - DOCUMENTACION, RADICACION CUENTA DE COBRO ORIP SAN VICENTE- CORTE DE OBRA No 2 – CONTRATO DE INTERVENTORIA 1708 -2023

[El texto citado está oculto]

Gmail **SUPERNOTARIADO Y REGISTRO <interventoria.snr@gmail.com>**

COMITE DE BSEGUIMIENTO PARA EL RECIBO DE OBRAS

1 mensaje

Jacqueline del Carmen Guzman Herazo <jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co> 29 de enero de 2024, 15:46
Para: "interventoria.snr@gmail.com" <interventoria.snr@gmail.com>, "contratosnr1675@gmail.com" <contratosnr1675@gmail.com>

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 228 023 913 407
Código de acceso: agrWTh
Descargar Teams | Unirse en la web

O llame (solo audio)
+57 6015142209,,979260160# Colombia, Bogotá
Id. de conferencia de teléfono: 979 260 160#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.

invite.ics
6K

INFORME SEMANAL

Semana Número: 15 Del: **11 de Diciembre de 2023** Al: **17 de Diciembre de 2023**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 142 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - ACACIAS SUPERVISOR SST JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 9.746.250,00	$ 308.106.791,83

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,85%	90,14%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	9.746.250,00	308.106.791,83

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 15 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	5 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

Actividades Civiles ejecutadas durante el transcurso de la semana:

* Revoque de estuco
* Pintura
* Instalación de unidades sanitarias en baños (Sisterna, Lavamanos, accesorios)
* Enbaldosinado de piso diferentes áreas
* Retiro de escombros
* Adecuación de filos y enboquillado
* Mantenimiento e instalación de aires acondicionados
* Instalación de marcos puertas

IMAGENES AVANCE



INSTALACIÓN DE BALDOSÍN PISO Y ENBOQUILLADO BAÑO DISCAPACITADOS



INSTALACIÓN DE BALDOSÍN MUROS Y ENBOQUILLADO BAÑO DISCAPACITADOS



ADECUACIÓN JARDÍN PARTE CENTRAL OFICINA SNR



INSTALACIÓN MARCOS PARA PUERTAS

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Con actividades de ejecución de obra al 00,00 %	
Inspección vuisual y acompañamiento SST por parte de Interventoría a el Contratista.	
Se dan Observaciones SST a el Contratista: uso obligatorio de EPI, no modificar elementos o dispositivos de seguridad de equipos menores	
o herramientas menores.	Firma
Solicitud documental del SG-SST del contratista / No entregada a la fecha / Octubre-Noviembre	Nombre : J. Andres Melo G,
Se hacen recomendaciones al contratista sobre las diferentes actividades contratadas para dar cumplimiento a la entrega a satisfacción	Matrícula No.: A201020555
por parte de la Interventoría.	

INFORME SEMANAL

Semana Número: 15 Del: 9 de diciembre de 2023 Al: 17 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 140 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - BUCARAMANGA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		100,00%
Valor básico de la Obra	$	$ 309.626.811,01

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		100,00%
Valor básico de la Obra		309.626.811,01

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOING - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



Sin actividades de obra debido a que se culminaron el 5 de diciembre de 2023

Firma

Nombre : JOSE FERNANDO ORDUZ

Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 15 Del: 10 de diciembre de 2023 Al: 17 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 132 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - CHARALA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$	$ 229.567.226,93

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	-	229.567.226,93

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.453,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



Sin actividades de obra debido a que se culminaron el 5 de diciembre de 2023

	Firma  Nombre : DIEGO ORLANDO HERRERA DLGADO Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 16 Del: 18 de Diciembre de 2023 Al: 24 de Diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 149 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: ORIP - ACACIAS SUPERVISOR SST: JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 7.246.022,97	$ 341.793.536,41

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,12%	92,26%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	7.246.022,97	315.338.716,69

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 15 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESE 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOING - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA




AVANCE

Actividades Civiles ejecutadas durante el transcurso de la semana:

* Revoque de estuco
* Pintura
* Instalación de unidades sanitarias en baños (Sisterna, Lavamanos, accesorios)
* Enbaldosinado de piso diferentes áreas
* Retiro de escombros
* Adecuación de filos y enboquillado
* Mantenimiento e instalación de aires acondicionados
* Instalación de marcos puertas


IMAGENES AVANCE

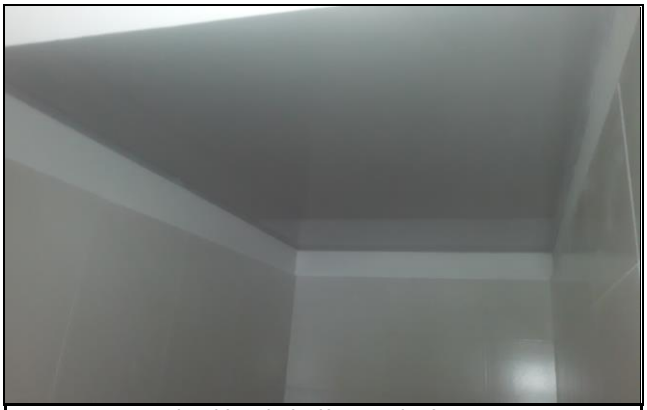


INSTALACION DE CIELO RASO Y PINTURAS EN GENERAL



INSTALACIÓN DE BALDOSÍN PISO Y MUROS EN BAÑO

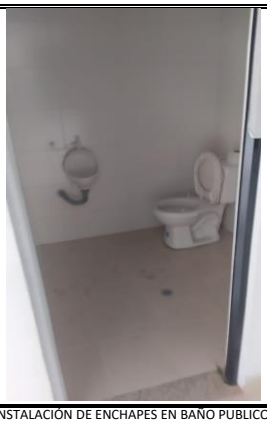

INSTALACIÓN DE ENCHAPES EN BAÑO PUBLICO

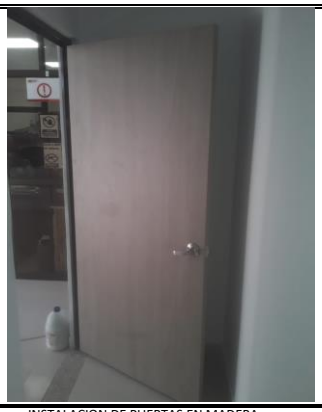

INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Inspección vuisual y acompañamiento SST por parte de Interventoría a el Contratista.	
Se dan Observaciones SST a el Contratista: uso obligatorio de EPI, no modificar elementos o dispositivos de seguridad de equipos menores o herramientas menores.	Firma
Solicitud documental del SG-SST del contratista / No entregada a la fecha / Noviembre- diciembre	Nombre : J. Andres Melo G,
Se hacen recomendaciones al contratista sobre las diferentes actividades contratadas para dar cumplimiento a la entrega a satisfacción por parte de la Interventoría.	Matrícula No.: A201020555

INFORME SEMANAL

Semana Número: 16 Del: 18 de diciembre de 2023 Al: 24 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 147 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - BUCARAMANGA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		100,00%
Valor básico de la Obra	$	$ 309.626.811,01

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		100,00%
Valor básico de la Obra		309.626.811,01

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOING - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



Sin actividades de obra debido a que se culminaron el 5 de diciembre de 2023

Firma
Nombre : JOSE FERNANDO ORDUZ
Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 16 Del: 18 de diciembre de 2023 Al: 24 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 139 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - CHARALA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$	$ 229.567.226,93

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	-	229.567.226,93

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



Sin actividades de obra debido a que se culminaron el 5 de diciembre de 2023

	Firma  Nombre : DIEGO ORLANDO HERRERA DLGADO Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 16 Del: 18 de Diciembre de 2023 Al: 24 Diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 134 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 2.961.846,46	$ 296.184.646,16

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,03%	98,03%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	3.050.701,86	290.349.808,63

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



IMAGENES AVANCE



Intalación de baranda para rampa



Inicio de instalacion de malla microperforada



Malla microperforada



Instalacion de malla microperforada



	
Culminacion e Instalacion de malla microperforada	

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Actividades ejecutadas:	
1. Instalación de baranda en graderia.	
2. instalacion de malla micro perforada para cubrir aires acondicionados	Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555

INFORME SEMANAL

Semana Número: 16 Del: 18 de diciembre de 2023 Al: 24 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 141 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - SAN VICENTE DEL CAGUAN SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ 211.933.007,73

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,00%	95,00%
Valor básico de la Obra	10.596.650,39	201.336.357,34

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

Pintura de fachada frontal

Pintura de fachada lateral

Instalacion de puerta principal

Instalacion de puerta de baño

Instalacion de lavadero prefabricado

Aseo de patio

Aseo general

IMAGENES AVANCE



Pintura de fachada frontal



Pintura de fachada lateral





Instalacion de puerta principal	Instalacion de accesorios para discapacitados
	
Instalacion de lavadero prefabricado	Aseo de patio
	
Aseo general	pintura fachada principal

El dia Martes 19 de Diciembre 2023 se entrego por parte del Maestro de obra e ingeniero encargado las actividades desarrolladas al 100% de la obra en San Vicente del Caguán, se espera recibimiento por parte de la Superintendencia encargada.	Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555

INFORME SEMANAL

Semana Número: 17 Del: 18 de diciembre de 2023 Al: 24 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 119 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,35%	93,35%
Valor básico de la Obra	$ 10.981.022,77	$ 305.993.574,74

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,94%	93,94%
Valor básico de la Obra	12.914.993,34	307.927.545,91

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

pintura final - vinilo
culminacion de instalacion de cubierta traslucida
finalizacion de instalacion cielo raso en 2do piso
Recolecion de escombro y aseo en general



Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta







Instalacion de cubierta



finalizacion de instalacion cielo raso en 2do piso



aseo oficinas



pintura final hall 2do piso



pintura final escalera3



recoleccion de escombros y basura

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555

INFORME SEMANAL

Semana Número: 16 Del: 18 de diciembre de 2023 Al: 24 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 140 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO INIRIDA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ 257.460.500,85

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,87%	94,49%
Valor básico de la Obra	$ 9.963.721,38	$ 243.274.427,25

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA



AVANCE

1. pintura fachada principal
2.colocacion malla electrosoldada, fundida placa de contrapiso en acceso para vehiculos

IMAGENES AVANCE









Placa anden acceso peatonal

Pintura fachada principal





Colocacion Malla electrosoldada para acceso parqueo

Pintura fachada principal



instalacion de puertas en lamina coll roll - acceso principal

Firma _____

Nombre : J. Andres Melo G,

Matrícula No.: A201020555

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 17 Del: **25 de Diciembre de 2023** Al: **31 de Diciembre de 2023**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 156 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - ACACIAS SUPERVISOR SST JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 8.579.017,76	$ 341.793.536,41

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,51%	94,77%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	8.579.017,76	323.917.734,50

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 15 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESE 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOING - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

Actividades Civiles ejecutadas durante el transcurso de la semana:

* Revoque de estuco
* Pintura
* Instalación de lamparas
* Enbaldosinado de piso diferentes áreas
* Retiro de escombros
* Adecuación de filos y enboquillado
* Mantenimiento e instalación de aires acondicionados
* Instalación de marcos puertas

IMAGENES AVANCE



INSTALACION DE CIELO RASO Y PINTURAS EN GENERAL



INSTALACIÓN DE BALDOSÍN PISO , CIELO RASO Y PINTURA EN OFICINA REGISTRADOR



INSTALACIÓN DE BALDOSÍN PISO , CIELO RASO Y PINTURA EN OFICINA REGISTRADOR



ADECUACION DE OFICINAS CON MOBILIARIO

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Inspección vuisual y acompañamiento SST por parte de Interventoría a el Contratista.	
Se dan Observaciones SST a el Contratista: uso obligatorio de EPI, no modificar elementos o dispositivos de seguridad de equipos menores o herramientas menores.	Firma
Solicitud documental del SG-SST del contratista / No entregada a la fecha / Noviembre- diciembre	Nombre : J. Andres Melo G,
Se hacen recomendaciones al contratista sobre las diferentes actividades contratadas para dar cumplimiento a la entrega a satisfacción por parte de la Interventoría.	Matrícula No.: A201020555

INFORME SEMANAL

Semana Número: 17 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 154 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - BUCARAMANGA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		100,00%
Valor básico de la Obra	$	$ 309.626.811,01

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		100,00%
Valor básico de la Obra		309.626.811,01

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOING - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESE 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



Sin actividades de obra debido a que se culminaron el 5 de diciembre de 2023

Firma
Nombre : JOSE FERNANDO ORDUZ
Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 17 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 146 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - CHARALA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$	$ 229.567.226,93

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	-	229.567.226,93

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



Sin actividades de obra debido a que se culminaron el 5 de diciembre de 2023

	Firma  Nombre : DIEGO ORLANDO HERRERA DLGADO Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 17 Del: 25 de Diciembre de 2023 Al: 31 Diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 141 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 2.961.846,46	$ 296.184.646,16

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,67%	98,70%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	1.984.437,13	292.334.245,76

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



IMAGENES AVANCE



Intalación de mueble de lavamanos



instalacion de baranda rampa de acceso a Orip

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Actividades ejecutadas:
1. Instalación de baranda en acceso a rampa
2. Instalacion de mueble lavamanos

Firma

Nombre : J. Andres Melo G,

Matrícula No.: A201020555

INFORME SEMANAL

Semana Número: 17 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 148 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - SAN VICENTE DEL CAGUAN SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ 211.933.007,73

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	10.596.650,39	211.933.007,73

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE


Obras terminadas al 100%

revision total de todas las actividades

IMAGENES AVANCE




Pintura de fachada frontal

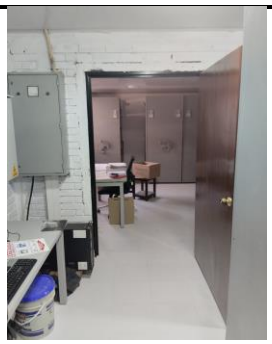

Pintura en cuarto de rack



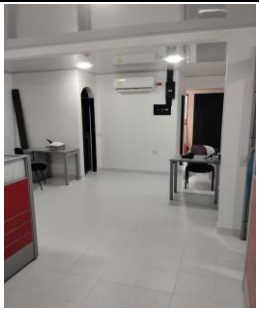

	
oficina de registrador	salon auxiliar
	
aparatos sanitarios en baño auxiliar	

El dia Martes 19 de Diciembre 2023 se entrego por parte del Maestro de obra e ingeniero encargado las actividades desarrolladas al 100% de la obra en San Vicente del Caguán, se espera recibimiento por parte de la Superintendencia encargada.	Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555

INFORME SEMANAL

Semana Número: 18 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 126 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,35%	96,70%
Valor básico de la Obra	$ 10.981.022,77	$ 316.974.597,50

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,10%	98,04%
Valor básico de la Obra	13.439.460,70	321.367.006,61

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA

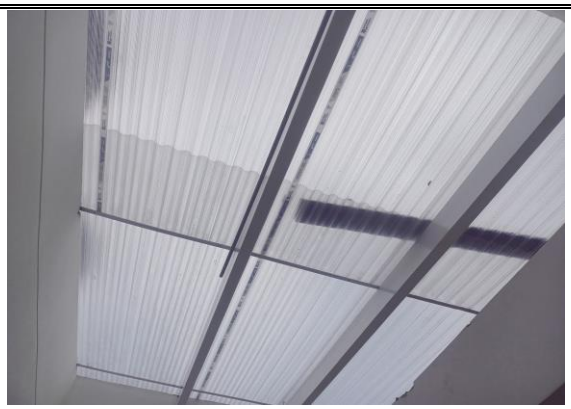


IMAGEN OFICINA



AVANCE

pintura final - vinilo
culminacion de instalacion de cubierta traslucida
finalizacion de instalacion cielo raso en 2do piso
Recolecion de escombro y aseo en general



Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta







Instalacion de cubierta




Instalacion de cubierta



cielo raso star 2do piso



pintura final hall 2do piso

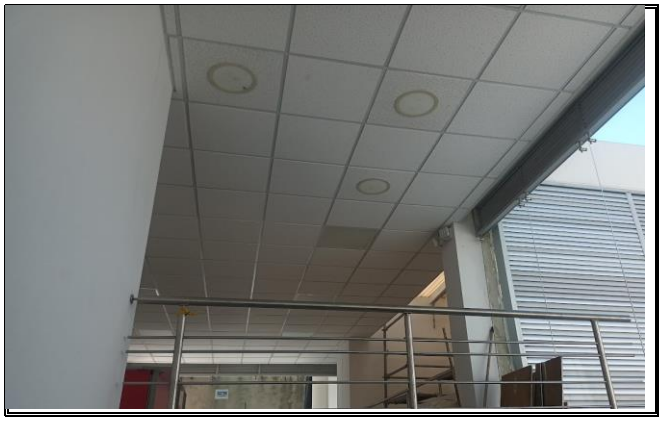

cielo raso star 2do piso



cielo raso y pintura final en 1er piso

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555

INFORME SEMANAL

Semana Número: 17 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 147 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: ORIP - PUERTO INIRIDA SUPERVISOR: JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ 257.460.500,85

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,28%	98,77%
Valor básico de la Obra	$ 11.019.309,44	$ 254.293.736,69

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA




AVANCE

1. culminacion de actividades de obra


IMAGENES AVANCE







instalacion accesorios para discapacitados



Pintura area de salon abogados



instalacion de muebles de cocina



placa de contrapiso acceso vehicular



instalacion lamparas



instalacion lamparas

Firma _____
Nombre : J. Andres Melo G,
Matrícula No.: A201020555

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 18 Del: **1 de enero de 2024** Al: **7 de enero de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 163 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - ACACIAS SUPERVISOR SST JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ 341.793.536,41

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	94,77%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	-	323.917.734,50

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 15 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESE 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOING - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

Actividades Civiles ejecutadas durante el transcurso de la semana:

* Sin actividades en ejecucuion debido a semana de descanso por parte de la oficina de notariado y registro

IMAGENES AVANCE

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	 Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555

INFORME SEMANAL

Semana Número: 18 Del: 1 de enero de 2024 Al: 7 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 161 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - BUCARAMANGA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		100,00%
Valor básico de la Obra	$	$ 309.626.811,01

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		100,00%
Valor básico de la Obra		309.626.811,01

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOING - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



Sin actividades de obra debido a que se culminaron el 5 de diciembre de 2023

Firma

Nombre : JOSE FERNANDO ORDUZ

Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 18 Del: 1 de enero de 2024 Al: 7 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 153 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - CHARALA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$	$ 229.567.226,93

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	-	229.567.226,93

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



Sin actividades de obra debido a que se culminaron el 5 de diciembre de 2023

	Firma  Nombre : DIEGO ORLANDO HERRERA DLGADO Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 18 Del: 1 de enero de 2024 Al: 7 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 141 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 2.961.846,46	$ 296.184.646,16

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,67%	98,70%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	1.984.437,13	292.334.245,76

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



IMAGENES AVANCE

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	
Actividades ejecutadas:	Firma
1. No hay ejecucion de actividades , personal de notariado estan en vacaciones	Nombre : J. Andres Melo G,
	Matrícula No.: A201020555

INFORME SEMANAL

Semana Número: 18 Del: 1 de enero de 2024 Al: 8 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 155 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - SAN VICENTE DEL CAGUAN SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ 211.933.007,73

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	-	211.933.007,73

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

Obras terminadas al 100%

IMAGENES AVANCE

INFORME SEMANAL

Semana Número: 19 Del: 1 de enero de 2024 Al: 7 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 133 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,35%	96,70%
Valor básico de la Obra	$ 10.981.022,77	$ 316.974.597,50

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,10%	98,04%
Valor básico de la Obra	13.439.460,70	321.367.006,61

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

sin actividades realiazadas en la semana

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555

INFORME SEMANAL

Semana Número: 18 Del: 1 de enero de 2024 Al: 7 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 154 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO INIRIDA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ $ 257.460.500,85

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,23%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 3.166.764,16	$ 257.460.500,85

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA



AVANCE

1. Sin actividades de obra

IMAGENES AVANCE

INFORME SEMANAL

Semana Número: 19 Del: 8 de enero de 2024 Al: 15 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 170 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: ORIP - ACACIAS SUPERVISOR SST: JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 9.604.398,37	$ 341.793.536,41

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,81%	97,58%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	9.604.398,37	333,522132,87

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 15 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESE 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOING - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE


Actividades Civiles ejecutadas durante el transcurso de la semana:

* Pintura
* Instalación de mueble en baños
* Enbaldosinado de piso diferentes áreas
* Retiro de escombros
* Adecuación de filos y enboquillado
* Mantenimiento e instalación de aires acondicionados
* Instalacion de muebles de cocina

IMAGENES AVANCE



INSTALACION DE MUEBLE BAÑO

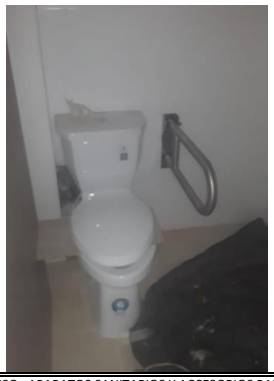

INSTALACIÓN DE BALDOSÍN PISO , APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS PARA DISCAPACITADOS



INSTALACIÓN DE MUEBLES DE COCINA Y LAVADERO



INSTALACION MUEBLE SUPERIOR DE COCINA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Inspección vuisual y acompañamiento SST por parte de Interventoría a el Contratista.	
Se dan Observaciones SST a el Contratista: uso obligatorio de EPI, no modificar elementos o dispositivos de seguridad de equipos menores o herramientas menores.	Firma
Solicitud documental del SG-SST del contratista / No entregada a la fecha / diciembre2023 - enero 2024	Nombre : J. Andres Melo G,
Se hacen recomendaciones al contratista sobre las diferentes actividades contratadas para dar cumplimiento a la entrega a satisfacción por parte de la Interventoría.	Matrícula No.: A201020555

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 19 Del: 8 de enero de 2024 Al: 15 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 161 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - BUCARAMANGA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		100,00%
Valor básico de la Obra	$	$ 309.626.811,01

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		100,00%
Valor básico de la Obra		309.626.811,01

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOING - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



Sin actividades de obra debido a que se culminaron el 5 de diciembre de 2023

Firma
Nombre : JOSE FERNANDO ORDUZ
Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 19 Del: 8 de enero de 2024 Al: 15 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 161 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - CHARALA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$	$ 229.567.226,93

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	-	229.567.226,93

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



Sin actividades de obra debido a que se culminaron el 5 de diciembre de 2023

	Firma  Nombre : DIEGO ORLANDO HERRERA DLGADO Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 19 Del: 8 de enero de 2024 Al: 15 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 149 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 2.961.846,46	$ 296.184.646,16

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,39%	99,09%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	1.155.120,12	293.489.365,88

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



IMAGENES AVANCE



Instalacion de lapicero , acuifero




Alistamiento bomba tipo lapicero para acuifero




Instalacion de lamina perforada para cubrimiento de aires acondicionados




Instalacion aviso de registro y notariado








Revision de aparatos sanitarios , baño 1er piso auxiliar

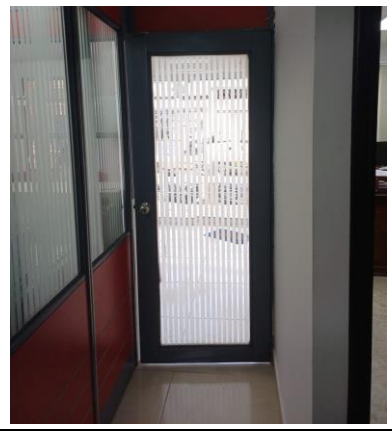

revision puerta de acceso area de oficinas



zona de atencion al usuario

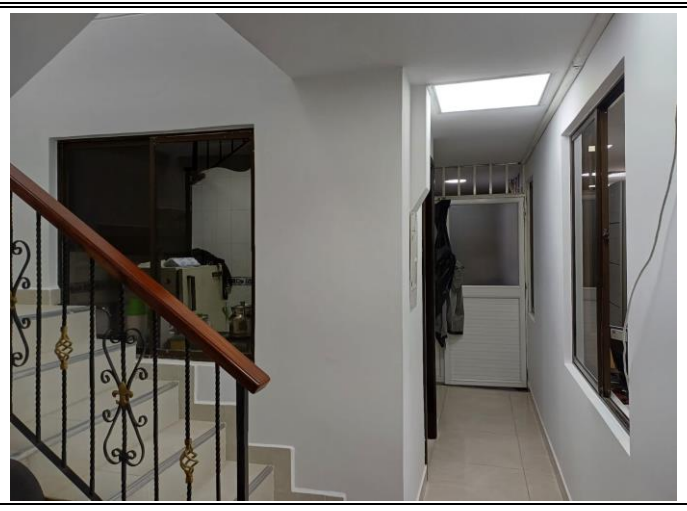

Area de acceso a 2do piso, hall a cocina y cuarto tecnico



Area archivo general



zona cocina

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Actividades ejecutadas:	
1. Instalacion de Bomba lapicero, acuifero	
2, Instalacion de lamina perforada para cubrimiento de aires acondicionados	Firma
3, Instalacion aviso de registro y notariado	Nombre : J. Andres Melo G,
	Matrícula No.: A201020555

INFORME SEMANAL

Semana Número: 19 Del: 9 de enero de 2024 Al: 15 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 163 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - SAN VICENTE DEL CAGUAN SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ 211.933.007,73

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	-	211.933.007,73

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

Obras terminadas al 100%

IMAGENES AVANCE

INFORME SEMANAL

Semana Número: 20 Del: 8 de enero de 2024 Al: 15 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 140 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,35%	96,70%
Valor básico de la Obra	$ 10.981.022,77	$ 316.974.597,50

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,10%	98,04%
Valor básico de la Obra	13.439.460,70	321.367.006,61

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

sin actividades realiazadas en la semana

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555

INFORME SEMANAL

Semana Número: 19 Del: 8 de enero de 2024 Al: 15 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 161 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO INIRIDA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ 257.460.500,85

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,23%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 3.166.764,16	$ 257.460.500,85

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	$ 1.974.357.452,93
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	5 MESES 16 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	$ 352.258.326,00
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	6 MESES 29 DIAS
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE ENERO DE 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA



AVANCE

1. Sin actividades de obra

IMAGENES AVANCE
