INFORME SEMANAL

Semana Número: 3 Del: 8 de julio de 2024 Al: 14 de julio de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SEDE: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE OROCUE-CASANARE | SUPERVISOR: HANNER SABOGAL

OBJETO:

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA No. 2 ARCHIVO, DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (5 ORIP Y BODEGA No. 2 FUNZA (Cundinamarca). GRUPO 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N/A	N/A
Valor básico de la Obra	$ N/A	$ N/A

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	N/A	N/A
Valor básico de la Obra Ejecutada:	N/A	N/A

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SAMAR 2024
Contrato No.	1652 de 2024
Valor Inicial:	$279.864.816
Valor Actualizado:	$279.864.816
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	24 de junio de 2024
Fecha de Vencimiento:	23 de octubre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	1649 DE 2024
Valor Inicial:	$230.380.144
Valor Actualizado:	$230.380.144
Plazo Inicial:	4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado:	4 MESES Y 15 DIAS
Fecha de Iniciación:	24 de junio de 2024
Fecha de Vencimiento:	7 de noviembre de 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

IMAGENES AVANCE



Comentario: FACHADA DE LA OFICINA E INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE FLORENCIA.



Comentario: ESTADO DEL ANDEN.




Comentario: ESTADO DE LOS APARATOS SANITARIOS.



Comentario: ESTADO DE LA FACHADA DE LA SNR.



Comentario: ESTADO DE LAS PAREDES DE LOS MUROS DE LA OFICINA.

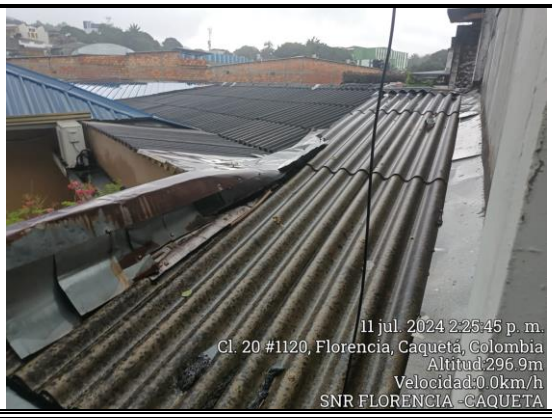

Comentario: ESTADO DE LA CUBIERTA.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
SE REALIZA VISITA A LA OBRA EL 11 Y 12 DE JULIO EN ACOMPAÑAMIENTO DE SUPERVISIÓN, CONTRATISTA E INTERVENTORIA PARA DETERMINAR EL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.	Firma Nombre :Martha Lucia Moreno Heredia Matrícula No.:15202-417824 BYC. INGENIERO RESIDENTE
