
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	1 de 17

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	**UNIDAD** MT2

ANEXOS

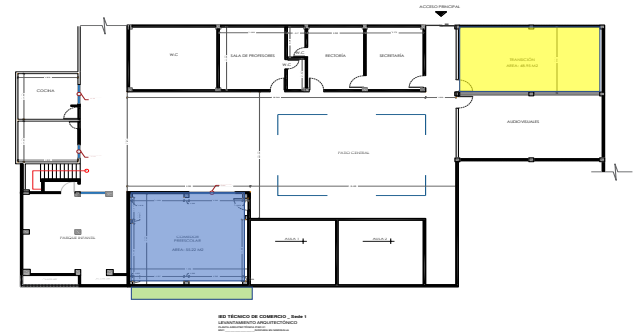



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
COMEDOR ACTUAL	7,91	7,76					61,38
AULA TRANSICION ACTUAL	5,21	9,42					49,08
CAJA AIRE	7,91	0,50					3,96
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	114,41						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**114,41**

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8**			**Código:**	**IP-FM-29**
				Versión:	**02**
				Fecha:	**20/02/2023**
				Páginas:	**2 de 17**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1.05	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	**UNIDAD**	ML

ANEXOS





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**VANOS**	**UND**	**CANT**	**TOTAL**
	LONG	**ANCHO**	**ALTURA**				**ML**
PARTE EXTERNA SALA PROFESORES	3,00						3,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	3,00						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**3,00**

Vo.Bo. Director CED	**Vo.Bo. Inspector Interventoria**	**Vo.Bo. Director Interventoria**
Conrado		


OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	3 de 17

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	**UNIDAD** MT2

ANEXOS

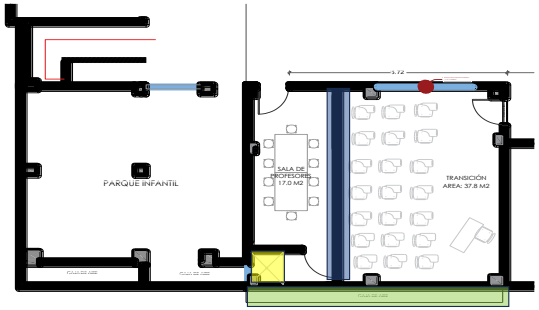



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
BAÑO	1,60	3,00					4,80
CIMIENTO MURO DIVISORIO SALA PRFORES	7,20	0,30					2,16
CAJA DE AIRE	7,91	0,50					3,96
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	10,92						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**10,92**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	4 de 17

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.09	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	**UNIDAD**	MT3

ANEXOS

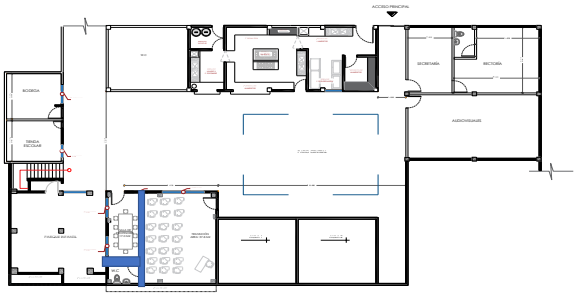



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT3
CIMIENTO MURO DIVISORIO TRANSICION	7,20	0,30	0,30				0,65
CIMIENTO MURO BAÑO	3,00	0,30	0,30				0,27
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	0,92						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,92**

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

OBSERVACIONES:


CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	5 de 17

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.15	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**UNIDAD** KGS

ANEXOS

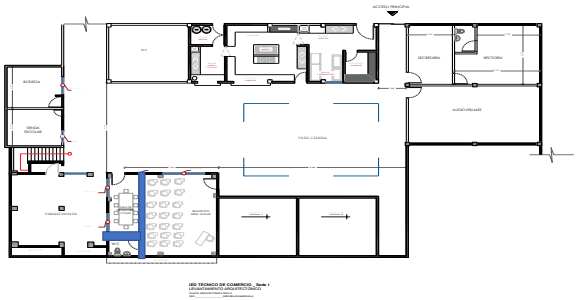





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	KG/ML	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL KGS
VIGA DE CIMIENTO SALA PROFESORES							
Varilla 1/2"	9,56	0,99			4	1	38,01
Varilla 3/8"	1,20	0,56			64	1	42,83
TRASLAPOS VIGAS DE CIMIENTO							
Varilla 1/2"	1,59	0,99			4	1	6,34
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	87,17						
TOTAL PRESENTE ACTA:							87,17

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
		


CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	6 de 17

CONTRATO:	EDU-345-2022			**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.24	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.

ANEXOS

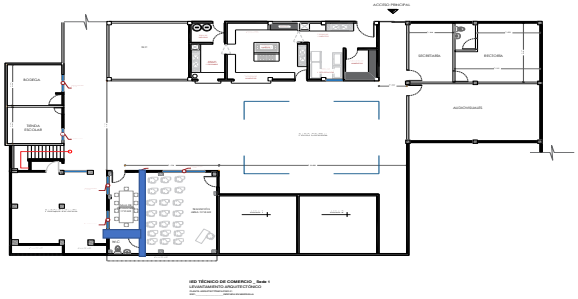





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
MUROS SALA PROFESOR			3,00			7	21,60
MURO BAÑO SALAA PROFESOR			3,00			5	14,16
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	35,76						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**35,76**


OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8**			**Código:**	**IP-FM-29**
				Versión:	**02**
				Fecha:	**20/02/2023**
				Páginas:	**7 de 17**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.28	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	**UNIDAD**	ML

ANEXOS

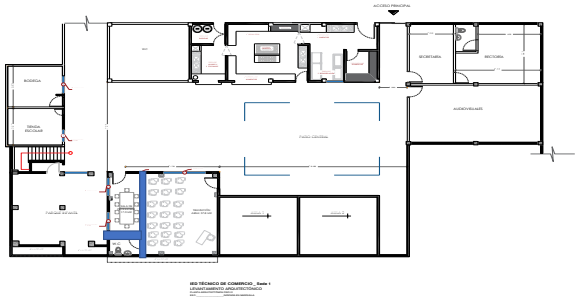

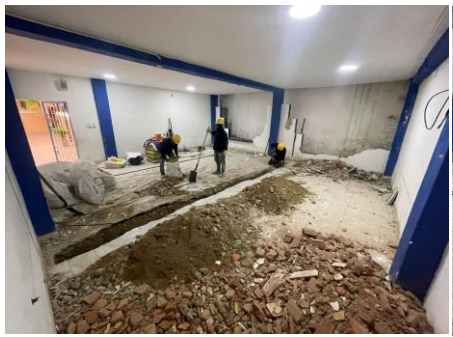



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**VANOS**	**UND**	**CANT**	**TOTAL**
	LONG	**ANCHO**	**ALTURA**				**ML**
CIMIENTO MURO DIVISORIO TRANSICION	7,20					2	14,40
CIMIENTO MURO BAÑO	3,00					2	6,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	20,40						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**20,40**


OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	**Vo.Bo. Inspector Interventoria**	**Vo.Bo. Director Interventoria**
Jconrado		

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8**			**Código:**	**IP-FM-29**
				Versión:	**02**
				Fecha:	**20/02/2023**
				Páginas:	**8 de 17**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD**	ML

ANEXOS

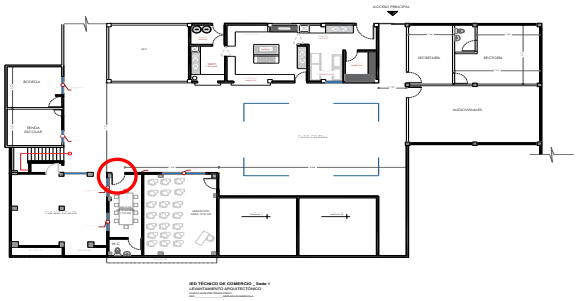



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
VANO PUERTA A SALA PROFESORES	4,90						4,90
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	4,90						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**4,90**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	9 de 17

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS

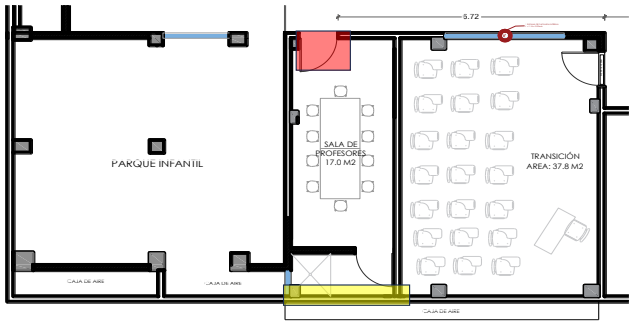





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
VANO PUERTA ACCESO SALA PROFESORES		0,90	2,00				1,80
MURO PARTE EXTERNO BAÑO PROFESORES		3,00	1,35				4,05
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	5,85						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**5,85**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	10 de 17

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3.06	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS

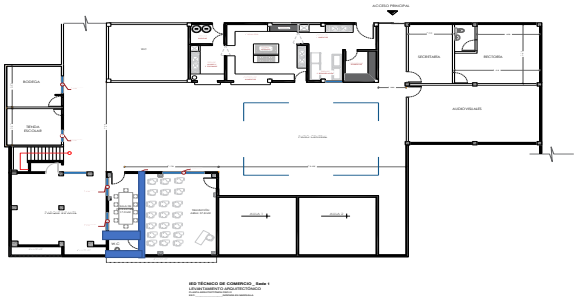





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
MURO EN SALA DE PROFESORES	7,20		3,00				21,60
BAÑO SALA PROFESOR	4,72		2,40	1,58			9,75
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	31,35						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**31,35**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	11 de 17

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ACABADOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	6.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	**UNIDAD** MT2

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
BAÑOS	1,45	3,00					4,35
CIMIENTO MURO DIVISORIO SALA PRFORES	9,56	0,30					2,87
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	7,22						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**7,22**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	12 de 17

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	HIDRAULICO, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE	**CÓDIGO DEL ITEM:** 10.04	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	**UNIDAD** UND

ANEXOS

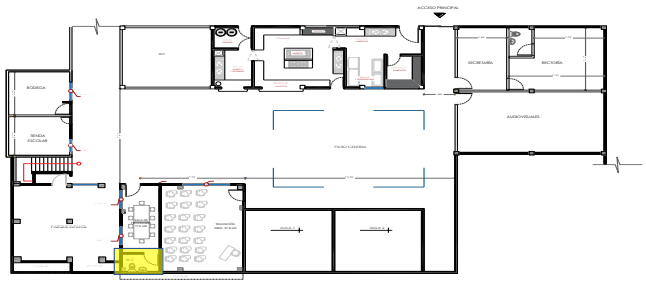





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL UND
LAVAMANOS BAÑO PROFESOR						1	1,00
SANITARIO BAÑO PROFESORES						1	1,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	2,00						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**2,00**

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	13 de 17

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: HIDRAULICO, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE	**CÓDIGO DEL ITEM:**	10.05	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	**UNIDAD** UND

ANEXOS

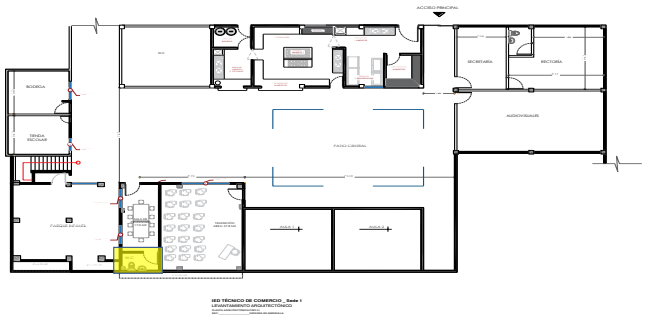





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
LAVAMANOS BAÑO PROFESOR						1	1,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	1,00						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	14 de 17

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	HIDRAULICO, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE	**CÓDIGO DEL ITEM:** 10.21	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	**UNIDAD** UND

ANEXOS

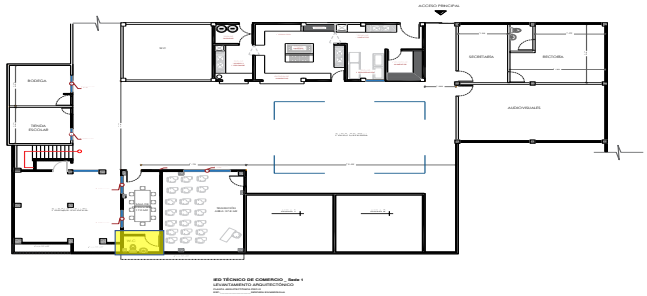

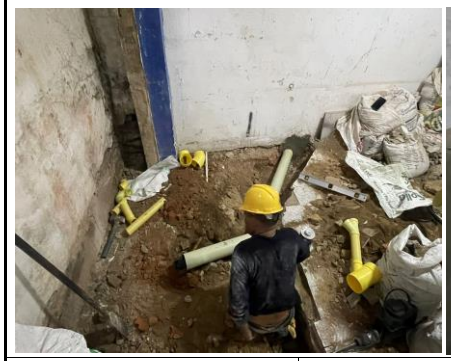



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
SANITARIO BAÑO PROFESOR						1	1,00
DESAGUES BAÑO PROFESOR						1	1,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	2,00						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**2,00**

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Conrado		


CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	15 de 17

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP 38	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**UNIDAD**	M3

ANEXOS

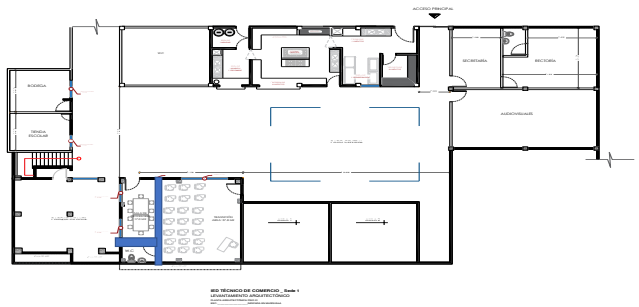





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				M3
CIMIENTO MURO DIVISORIO TRANSICION	7,20	0,30	0,30				0,65
CIMIENTO MURO BAÑO SALA PROFESORES	3,00	0,30	0,30				0,27
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	0,92						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,92**

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	16 de 17

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP 65	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	**UNIDAD** M2

ANEXOS

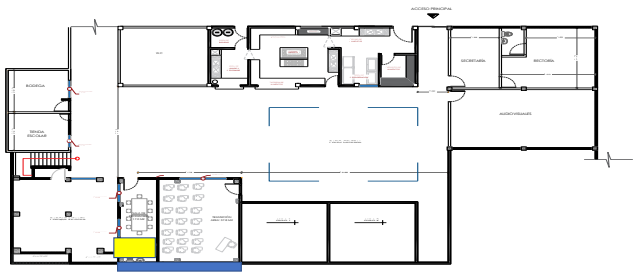






LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				M2
BAÑOS	1,60	3,00					4,80
CAJA DE AIRE	7,91	0,50					3,96
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	8,76						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**8,76**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
		

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	17 de 17

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 1				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP 103	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DINTEL 0.15 X 0.20 MTS EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE VARILLA DE REFUERZO LONGITUDINAL DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8". INCLUYE TRIPLEX FORMALETA	**UNIDAD**	ML

ANEXOS

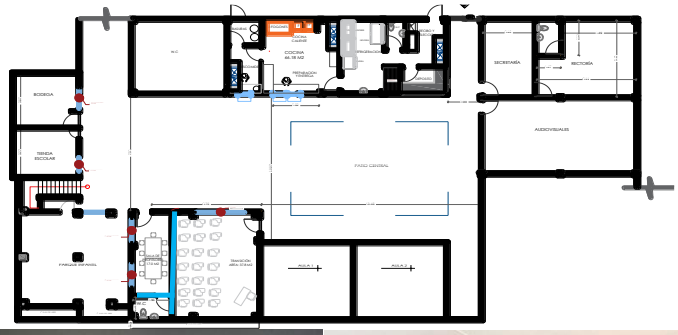





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
VIGA SOBRE MURO MURO DIVISORIO TRANSICION	7,20						7,20
VIGA SOBRE MURO BAÑO SALA PROFESORES	4,72						4,72
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	11,92						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**11,92**

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	1 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	**UNIDAD** MT2

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
AREA DE INTERVENCION	36,44	9,60		6,55			343,27
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	343,27						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**343,27**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	2 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1.07	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	**UNIDAD**	ML

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
PASILLO	30,35						30,35
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	30,35						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**30,35**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	3 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	**UNIDAD** MT2

ANEXOS









LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL MT2
VIGA DE CIMIENTO	8,60	0,30					2,58
	9,12	0,30					2,74
	3,45	0,30				2	2,07
	3,75	0,30				2	2,25
	9,54	0,30					2,86
	3,33	0,30					1,00
	5,25	0,30					1,58
TUBERIA TRAMO 1	11,30	0,30					3,39
TUBERIA TRAMO 7	3,27	0,30					0,98
TUBERIA TRAMO 5	4,25	0,30					1,28
TUBERIA TRAMO 9	2,32	0,30					0,70
TUBERIA TRAMO 4	4,29	0,30					1,29
TUBERIA TRAMO 3	8,60	0,30					2,58
TUBERIA TRAMO 2	9,08	0,30					2,72
TUBERIA TRAMO 8	1,35	0,30					0,41
TUBERIA TRAMO 6	1,00	0,30					0,30
TUBERIA TRAMO 10	1,50	0,30					0,45
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	29,16						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**29,16**

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


OBSERVACIONES:


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	4 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.09	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	**UNIDAD** MT3

ANEXOS









LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL MT3
VIGA DE CIMIENTO	8,60	0,30	0,30				0,77
	9,12	0,30	0,30				0,82
	3,45	0,30	0,30			2	0,62
	3,75	0,30	0,30			2	0,68
	9,54	0,30	0,30				0,86
	3,33	0,30	0,30				0,30
	5,25	0,30	0,30				0,47
TUBERIA TRAMO 1	11,30	0,30	0,40				1,36
TUBERIA TRAMO 7	3,27	0,30	0,40				0,39
TUBERIA TRAMO 5	4,25	0,30	0,40				0,51
TUBERIA TRAMO 9	2,32	0,30	0,40				0,28
TUBERIA TRAMO 4	4,29	0,30	0,40				0,51
TUBERIA TRAMO 3	8,60	0,30	0,40				1,03
TUBERIA TRAMO 2	9,08	0,30	0,40				1,09
TUBERIA TRAMO 8	1,35	0,30	0,40				0,16
TUBERIA TRAMO 6	1,00	0,30	0,40				0,12
TUBERIA TRAMO 10	1,50	0,30	0,40				0,18
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	10,16						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**10,16**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	5 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.12	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	**UNIDAD** MT3

ANEXOS

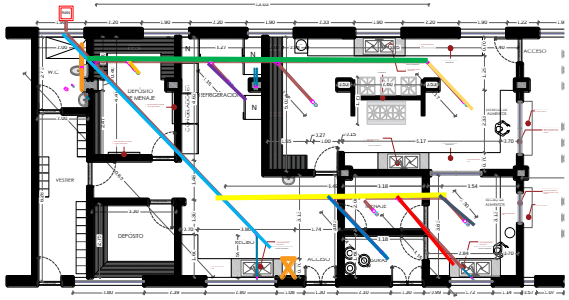







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT3
TUBERIA TRAMO 1	11,30	0,30	0,30				1,02
TUBERIA TRAMO 7	3,27	0,30	0,30				0,29
TUBERIA TRAMO 5	4,25	0,30	0,30				0,38
TUBERIA TRAMO 9	2,32	0,30	0,30				0,21
TUBERIA TRAMO 4	4,29	0,30	0,30				0,39
TUBERIA TRAMO 3	8,60	0,30	0,30				0,77
TUBERIA TRAMO 2	9,08	0,30	0,30				0,82
TUBERIA TRAMO 8	1,35	0,30	0,30				0,12
TUBERIA TRAMO 6	1,00	0,30	0,30				0,09
TUBERIA TRAMO 10	1,50	0,30	0,30				0,14
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	4,23						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**4,23**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	6 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.15	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**UNIDAD** KGS

ANEXOS





Sección de viga de cimentación

4Ø 1/2" - Concreto 3000 PSI
FL Ø3/8" @ 0.15 - 0.20

Seccion viga sobre muro

2Ø 1/2"
Concreto 3000 PSI
FL Ø3/8" @ 0.15 - 0.20



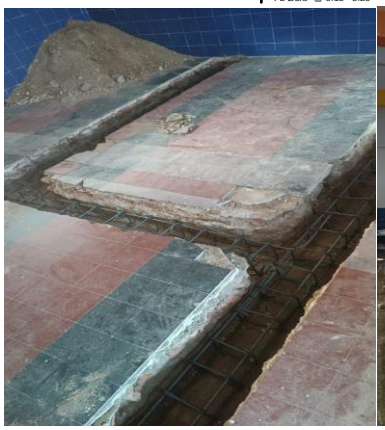



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	KG/ML	ALTURA				KGS
VIGA SOBRE MURO							
Varilla 3/8"	50,24	0,56			2	1	
Varilla 1/4"	0,20	0,25			251	1	
VIGA DE CIMIENTO							
Varilla 1/2"	50,24	0,99			4	1	199,75
Varilla 3/8"	1,20	0,56			335	1	225,08
TRASLAPOS VIGA DE CIMIENTO							
Varilla 1/2"	7,95	0,99			4	1	31,50
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	456,33						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**456,33**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	7 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022		OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 2.24		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	UNIDAD: ML

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL ML
VESTIER			2,90			6	17,78
MENAJE			2,90			6	18,47
DEPOSITO ALIMENTOS			2,90			9	25,72
BASURAS			2,90			7	19,40
MENAJE			2,90			4	11,60
COCINA			2,90			13	37,38
			2,90			5	15,37
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	145,73						
TOTAL PRESENTE ACTA:							145,73

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Jconrado		


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	8 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.28	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	**UNIDAD** ML

ANEXOS









LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
VIGA DE CIMIENTO	9,12					2	18,24
	8,60					2	17,20
	3,45					2	6,90
	3,75					2	7,50
	9,54					2	19,08
	3,33					2	6,66
	5,25					2	10,50
CORTE PARA TUBERIA HIDROSANITARIA	46,96					2	93,92
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	180,00						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**180,00**

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	9 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022	OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM: 3.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UNIDAD	ML

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL ML
PUERTA AREA DE VESTIER	5,00						5,00
PUERTA DE BAÑO	5,00						5,00
ACCESO COCINA	5,00						5,00
VENTANA ENTREGA ALIMENTOS	6,00						6,00
VENTANA DESCOMIDE	4,00						4,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	25,00						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	25,00

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Jconrado		


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	10 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD** MT2

ANEXOS











LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
DEMOLICION MUROS AULAS	9,00		4,50			2	81,00
DEMOLICION MUROS AULAS	24,96		4,50	3,20			109,12
PUERTA AREA DE VESTIER		1,00	2,00				2,00
PUERTA ACCESO BAÑO		1,00	2,00				2,00
ACCESO COCINA		1,00	2,00				2,00
VENTANA ENTREGA ALIMENTOS		2,03	1,00				2,03
VENTANA DESCOMIDE		1,20	1,00				1,20
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	199,35						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**199,35**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	11 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3.06	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
VESTIER	6,13		2,40				14,71
MENAJE	6,37		2,40	2,00			13,29
DEPOSITO ALIMENTOS	8,87		2,40	2,00			19,29
BASURAS	6,69		2,40	2,00			14,06
MENAJE	4,00		2,40	4,00			5,60
COCINA	12,89		2,40	3,97			26,97
	5,10		1,05				5,36
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	99,27						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**99,27**


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	12 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.10	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	**UNIDAD** MT2

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
MENAJE	15,72		2,60	6,05			34,82
VESTIER	16,26		2,60	4,00			38,28
DEPOSITO ALIMENTOS	18,84		2,60	5,35			43,63
AREA BASURAS	9,56		2,60	4,60			20,26
AREA DE MENAJE	10,80		2,60	4,00			24,08
RECIBO ALIMENTOS	14,74		2,60	8,86			29,46
COCINA	29,96		2,60	11,80			66,10
	10,60		0,90				9,54
REFRIGERACION	13,07		2,60				33,98
RECIBO	15,93		2,60	5,40			36,02
MUROS EXISTENTES	63,66		2,60	29,25		0,65	-88,57
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	247,60						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**247,60**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	13 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	CARPINTERIA METALICA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 7.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD** UND

ANEXOS





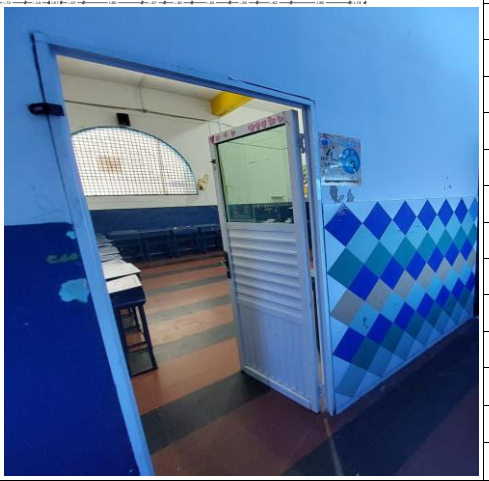

LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
PUERTA AULAS						2	2,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	2,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							2,00

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	14 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	CARPINTERIA METALICA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 7.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD** UND

ANEXOS



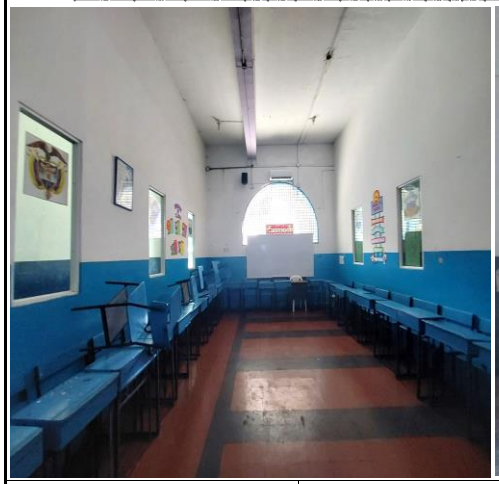



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
VENTANAS AULAS						7	7,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	7,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**7,00**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Jconrado		

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	15 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: CARPINTERIA DE MADERA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 8.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD**	UND

ANEXOS





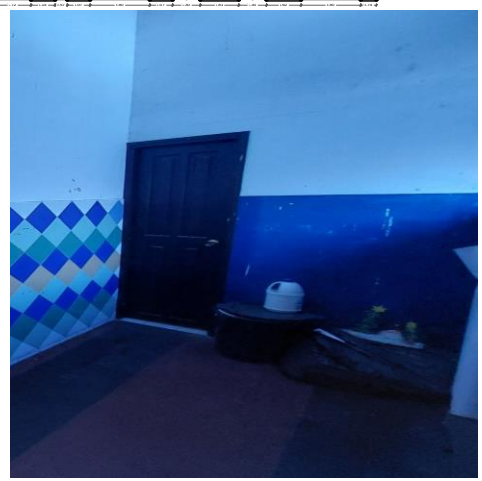

LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
BAÑO						1	1,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	1,00						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	16 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ELECTRICO	**CÓDIGO DEL ITEM:** 9.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	**UNIDAD** UND

ANEXOS





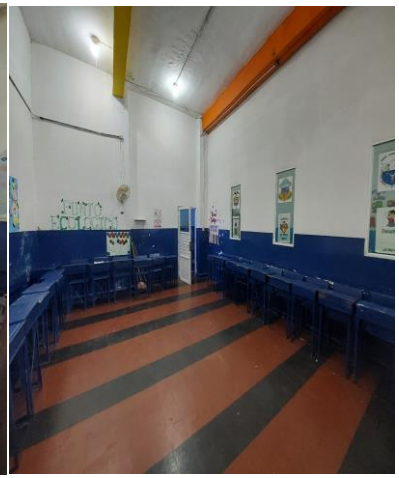

LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
AULA 1					4,00		4,00
AULA 2					4,00		4,00
AULA 3					4,00		4,00
AULA 4					4,00		4,00
AULA 5					4,00		4,00
PASILLO					4,00		4,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	24,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**24,00**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	17 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ELECTRICO	**CÓDIGO DEL ITEM:** 9.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	**UNIDAD**	UND

ANEXOS



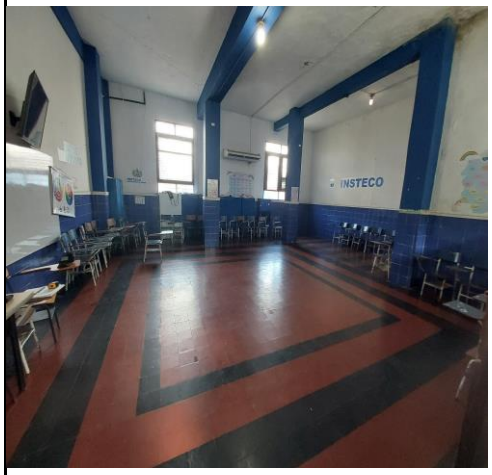



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
AULA 1					4,00		4,00
AULA 2					4,00		4,00
AULA 3					4,00		4,00
AULA 4					4,00		4,00
AULA 5					4,00		4,00
PASILLO					4,00		4,00
AIRES					5,00		5,00
TV					1,00		1,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	30,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**30,00**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	18 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ELECTRICO	**CÓDIGO DEL ITEM:** 9.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	**UNIDAD**	UND

ANEXOS



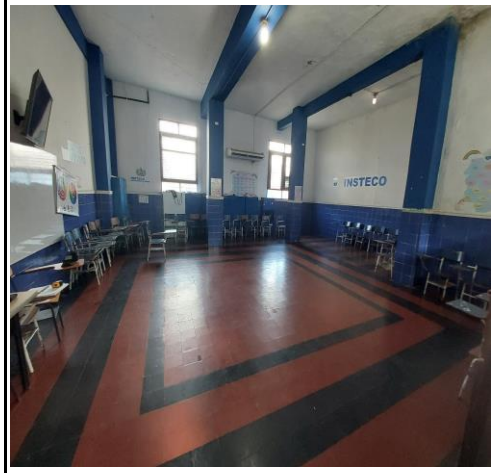

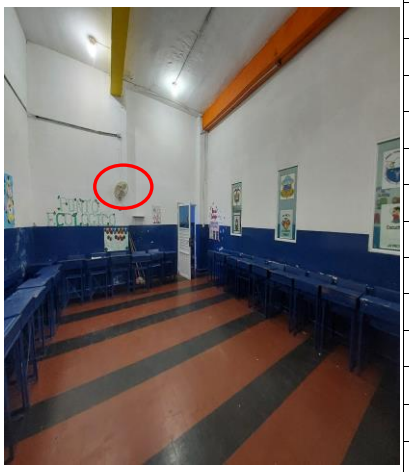

LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
AULA 1					2,00		2,00
AULA 2					2,00		2,00
AULA 3					2,00		2,00
AULA 4					2,00		2,00
AULA 5					2,00		2,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	10,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**10,00**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	19 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022	OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: NP 38	CÓDIGO DEL ITEM: NP 38	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UNIDAD	M3

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				M3
VIGA DE CIMIENTO	9,00	0,30	0,30			2	1,62
	3,45	0,30	0,30			2	0,62
	3,75	0,30	0,30			2	0,68
	9,29	0,30	0,30				0,84
	3,33	0,30	0,30				0,30
	5,22	0,30	0,30				0,47
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	4,52						
TOTAL PRESENTE ACTA:							4,52

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Jconrado		

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	20 de 20

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	INSTECO SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: NP	**CÓDIGO DEL ITEM:**	NP 103	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DINTEL 0.15 X 0.20 MTS EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE VARILLA DE REFUERZO LONGITUDINAL DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8". INCLUYE TRIPLEX FORMALETA	**UNIDAD** ML

ANEXOS





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL ML
DINTEL	9,00	0,15	0,20			2	0,54
	3,45	0,15	0,20			2	0,21
	3,75	0,15	0,20			2	0,23
	9,29	0,15	0,20				0,28
	3,33	0,15	0,20				0,10
	5,22	0,15	0,20				0,16
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	1,51						
					TOTAL PRESENTE ACTA:		1,51

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	1 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022			OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN

ANEXOS

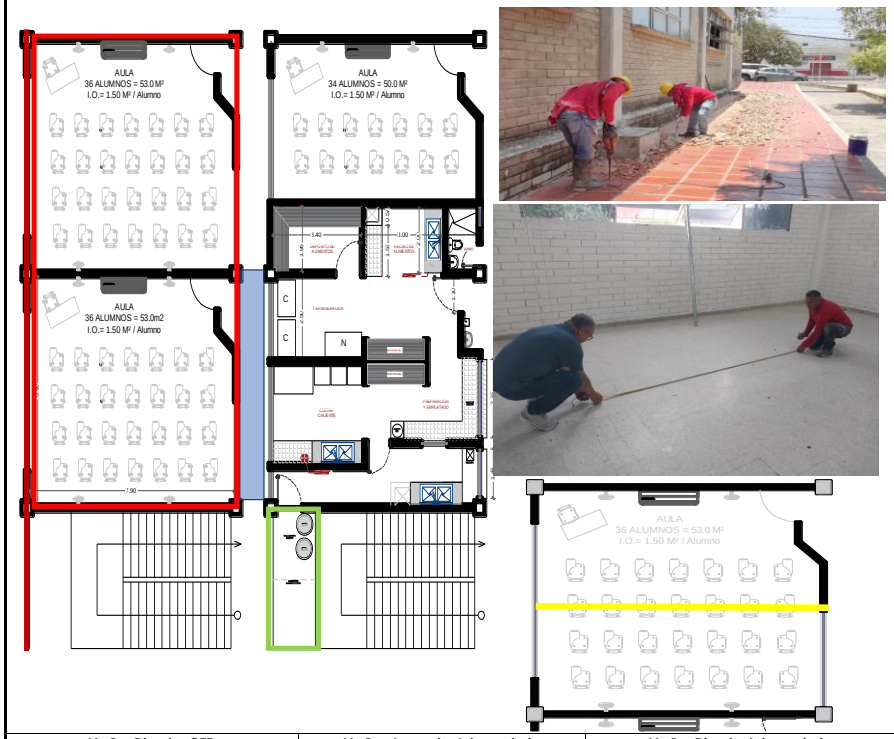

LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
DIVISION AULA DRYWALL	7,00	0,50					3,50
AREA RESIDUOS	4,15	1,63					6,76
AULAS INTERVENIDAS	9,00	8,45					76,05
ARREGLO DE TUBERIA EXTERNA	9,43	1,00					9,43
AREA EXTERNA AL COLEGIO	40,00	0,50					20,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	115,74						
TOTAL PRESENTE ACTA:							115,74

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	2 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1.05	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	**UNIDAD** ML

ANEXOS

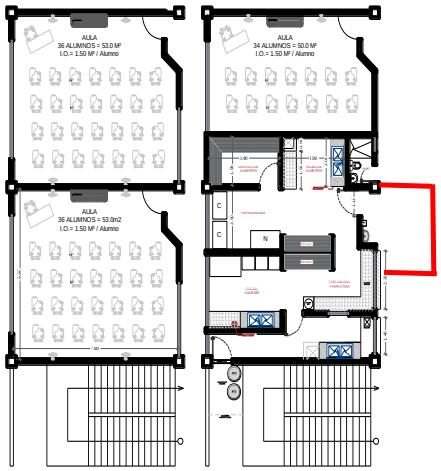





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
AREA DE INTERVENCION	3,00						3,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	3,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**3,00**

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	3 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	**UNIDAD** MT2

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
DEPOSITO ALIMENTOS	3,40	1,95					6,63
BAÑO	1,20	1,95					2,34
AREA DE LAVADO	3,00	2,00					6,00
REFRIGERACION	7,19	2,50					17,98
ENTREGA ALIMENTOS	3,50	3,00					10,50
	4,45	2,30					10,24
RECIBO ALIMENTOS	4,25	1,80					7,65
	3,65	0,98					3,58
TUBERIA EXTERNA	40,00	0,40					16,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	80,91						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	80,91

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	4 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.09	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	**UNIDAD** MT3

ANEXOS

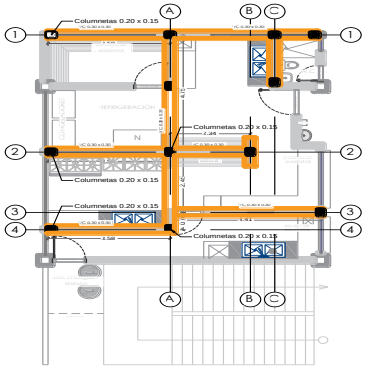

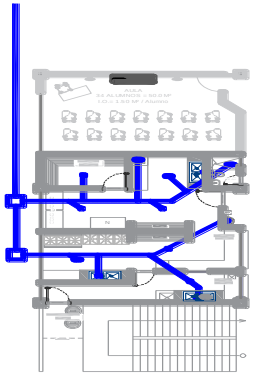







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL MT3
VIGAS DE CIMIENTO	7,90	0,30	0,30				0,71
	7,95	0,30	0,30				0,72
	4,41	0,30	0,30				0,40
	3,43	0,30	0,30				0,31
	1,88	0,30	0,30				0,17
	3,49	0,30	0,30				0,31
	3,58	0,30	0,30				0,32
TUBERIA EXTERNA	40,00	0,40	0,40				6,40
TUBERIAS INTERNAS	29,61	0,30	0,30				2,66
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	12,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							12,00

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	5 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022	OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 2.12	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	UNIDAD	MT3

ANEXOS

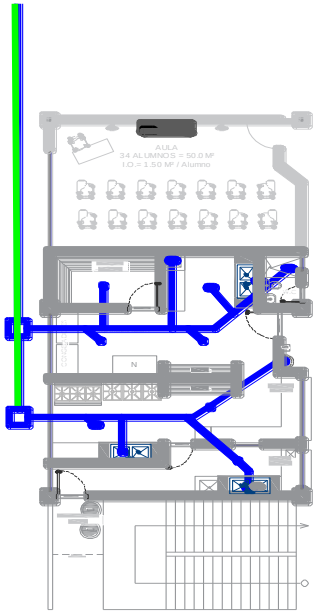



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT3
TUBERIA EXTERNA	40,00	0,40	0,40				6,40
TUBERIAS INTERNAS	29,61	0,30	0,30				2,66
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	9,06						
TOTAL PRESENTE ACTA:							9,06


OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Jconrado		

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8**	**Código:**	**IP-FM-29**
		Versión:	**02**
		Fecha:	**20/02/2023**
		Páginas:	**6 de 30**


CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.15	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**UNIDAD**	KGS

ANEXOS



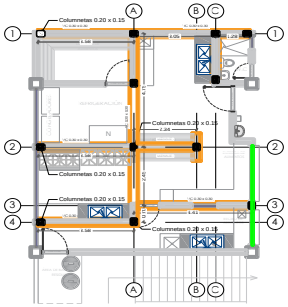



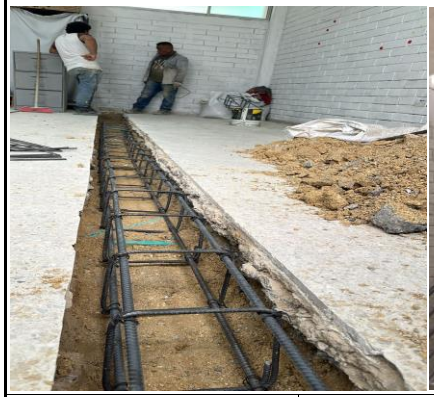



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	KG/ML	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL KGS
VIGA DE CIMIENTO							
Varilla 1/2"	31,14	0,99			4	1	123,31
Varilla 3/8"	1,20	0,56			208	1	139,51
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	262,82						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**262,82**

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	7 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.22	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	**UNIDAD** ML

ANEXOS

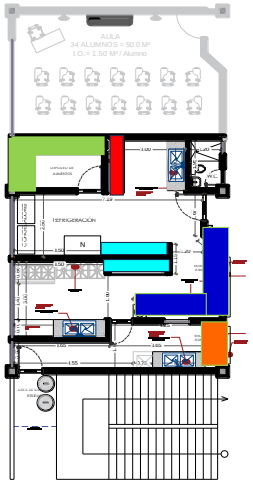









LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL ML
MENAJE	6,57					2	13,14
DEPOSITO ALIMENTOS	4,75					3	14,25
AREA LAVADO	1,53						1,53
RECIBO ALIMENTOS	1,80						1,80
	0,74						0,74
ENTREGA ALIMENTOS	4,80						4,80
	1,18						1,18
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	37,44						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	37,44

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	8 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.24	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	**UNIDAD** ML

ANEXOS

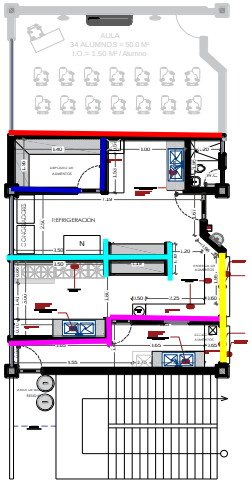





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
LEVANTE DE MUROS NUEVOS			2,70	1,80		9	21,42
			2,70			8	21,57
			2,70	2,00		5	12,53
			2,70			3	8,18
			3,40			8	26,86
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	90,56						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	90,56


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8**			**Código:**	**IP-FM-29**
				Versión:	**02**
				Fecha:	**20/02/2023**
				Páginas:	**9 de 30**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.28	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	**UNIDAD**	ML

ANEXOS

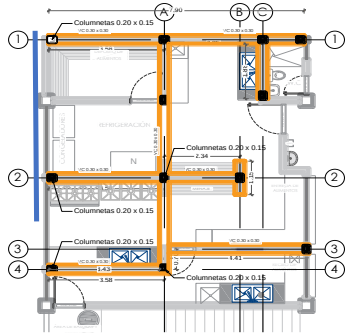








LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
VIGA DE CIMIENTO	32,64					2	65,28
TUBERIA EXTERNA	40,00					2	80,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	145,28						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**145,28**

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
		


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	10 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD**	ML

ANEXOS



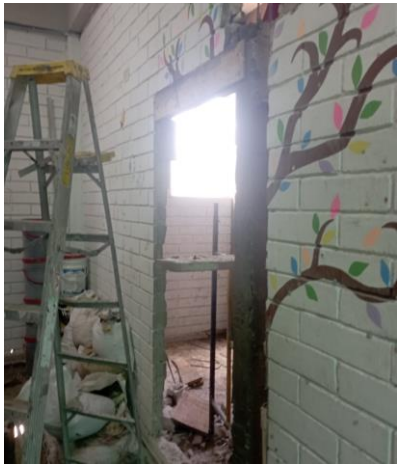

LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
VANO PUERTA ACCESO RESIDUOS	5,00						5,00
VENTANA DESCOMIDE	4,92						4,92
VENTATANA ENTREGA ALIMENTOS	6,70						6,70
VANO PUERTA ACCESO BAÑO	4,70						4,70
VANO DEPÓSITO	5,00						5,00
ZONA DE LAVADO Y SECADO	9,50						9,50
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	35,82						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	35,82

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


OBSERVACIONES:


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	11 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS

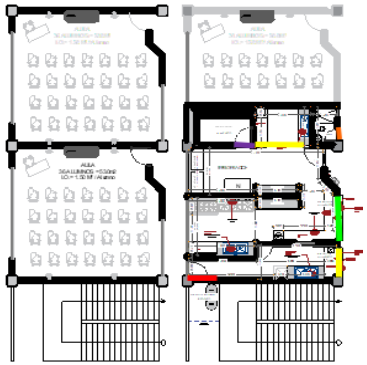

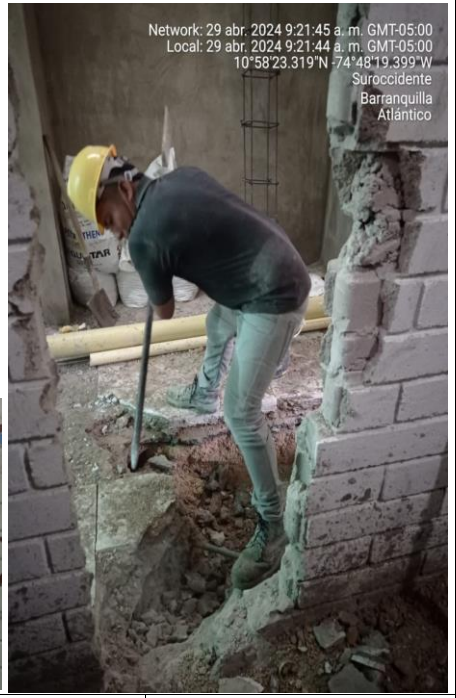



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
VANO DEPÓSITO	3,00		3,50				10,50
ZONA DE LAVADO Y SECADO	1,00		2,00				2,00
VANO PUERTA ACCESO RESIDUOS		1,00	2,00				2,00
VENTATANA ENTREGA ALIMENTOS		2,35	1,00				2,35
VENTANA DESCOMIDE		1,46	1,00				1,46
VANO PUERTA ACCESO BAÑO		0,70	2,00				1,40
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	19,71						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**19,71**

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8**			**Código:**	**IP-FM-29**
				Versión:	**02**
				Fecha:	**20/02/2023**
				Páginas:	**12 de 30**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3.06	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS







LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**VANOS**	**UND**	**CANT**	**TOTAL**
	LONG	**ANCHO**	**ALTURA**				**MT2**
LEVANTE DE MUROS NUEVOS	8,60		2,70	2,80			20,42
	7,99		2,70				21,57
	5,38		2,70	2,00			12,53
	3,03		2,70				8,18
	7,90		3,10				24,49
LAVAPAPA	1,45		0,50				0,73
	0,57		0,50				0,29
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	88,20						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**88,20**

Vo.Bo. Director CED	**Vo.Bo. Inspector Interventoria**	**Vo.Bo. Director Interventoria**
Jconrado		

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	13 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022	OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM: 3.10	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	UNIDAD	MT2

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
RECIBO ALIMENTOS	8,60		2,90	2,80			22,14
	10,68		2,90	4,45			26,52
LAVAPAPA RECIBO ALIMENTOS	2,65		0,50				1,33
ENTREGA DE ALIMENTOS	22,77		2,90	8,15			57,88
APOYO MESON ENTREGA ALIMENTOS	1,20		0,90			3	3,24
REFRIGERACION	16,40		2,90	6,50			41,06
DEPOSITO ALIMENTOS	10,70		2,90	2,00			29,03
ZONA LAVADO	7,00		2,90				20,30
APOYO ZONA LAVADO	1,20		0,90			2	2,16
BAÑO	5,10		2,90	4			10,39
MURO DIVISORIO AULA	7,90		3,50				27,65
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	241,70						
					TOTAL PRESENTE ACTA:		241,70

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8**			**Código:**	**IP-FM-29**
				Versión:	**02**
				Fecha:	**20/02/2023**
				Páginas:	**14 de 30**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ACABADOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** 6.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS









LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
DEPOSITO ALIMENTOS	3,40	1,95					6,63
BAÑO	1,20	1,95					2,34
AREA DE LAVADO	3,00	2,00					6,00
REFRIGERACION	7,19	2,50					17,98
ENTREGA ALIMENTOS	3,50	3,00					10,50
	4,45	2,30					10,24
RECIBO ALIMENTOS	4,25	1,80					7,65
	3,65	0,98					3,58
TUBERIA EXTERNA	40,00	0,40					16,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	80,91						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**80,91**

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Conrado		


OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	15 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022	OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ACABADOS	CÓDIGO DEL ITEM: 6.05	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	UNIDAD	MT2

ANEXOS

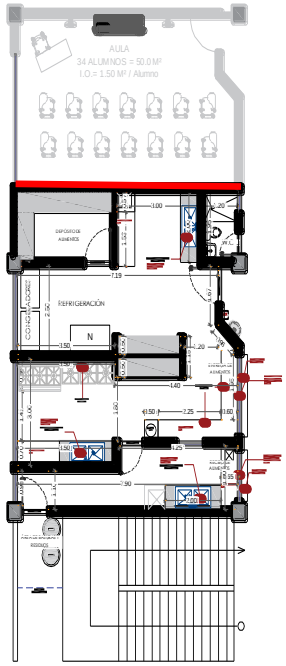



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
MURO DIVISORIO SALON	7,90		3,50				27,65
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	27,65						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	27,65

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	16 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022	OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ACABADOS	CÓDIGO DEL ITEM: 6.06	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	UNIDAD	MT2

ANEXOS

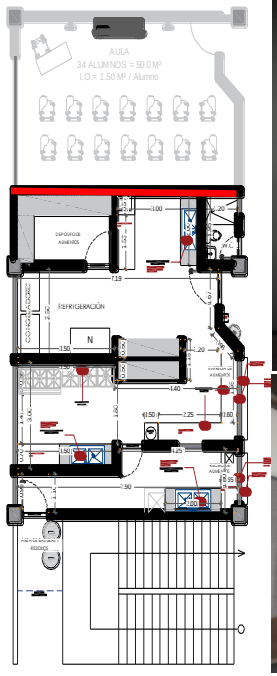



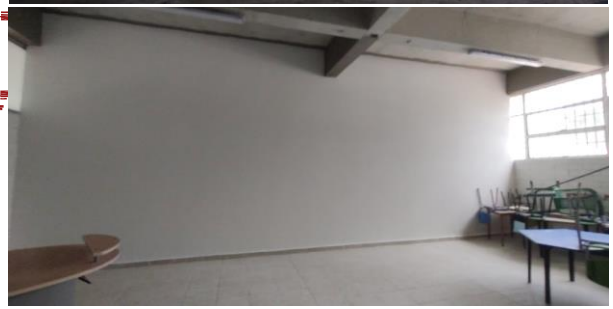

LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
MURO DIVISORIO SALON	7,90		3,50				27,65
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	27,65						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	27,65

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	17 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ACABADOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** 6.15	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON VITRIFICADO DE 30X30 CMS PARA EXTERIORES	**UNIDAD**	MT2


ANEXOS

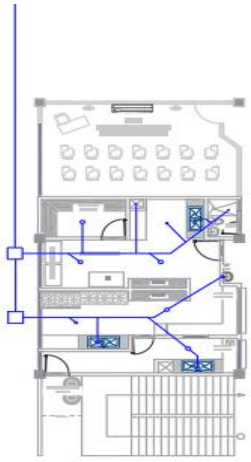



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
TUBERIA EXTERNA	40,00	0,40					16,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	16,00						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**16,00**


OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
		

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8**			**Código:**	**IP-FM-29**
				Versión:	**02**
				Fecha:	**20/02/2023**
				Páginas:	**18 de 30**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: CARPINTERIA METALICA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 7.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD**	UND

ANEXOS









LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
VENTANA FACHADA AULA 1					2	2	4,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	4,00						
					TOTAL PRESENTE ACTA:		4,00

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	19 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ELECTRICO	**CÓDIGO DEL ITEM:** 9.01		**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	**UNIDAD** UND

ANEXOS



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
AULA 1						8	8,00
AULA 2						5	5,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	13,00						
					TOTAL PRESENTE ACTA:		13,00

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	20 de 30


CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ELECTRICO	**CÓDIGO DEL ITEM:** 9.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	**UNIDAD** UND

ANEXOS









LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
CABLEADO LUMINARIAS AULA 1						8	8,00
CABLEADO LUMINARIAS AULA 2						5	5,00
AIRES						2	2,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	15,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**15,00**

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	21 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ELECTRICO	**CÓDIGO DEL ITEM:** 9.03		**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	**UNIDAD** UND

ANEXOS

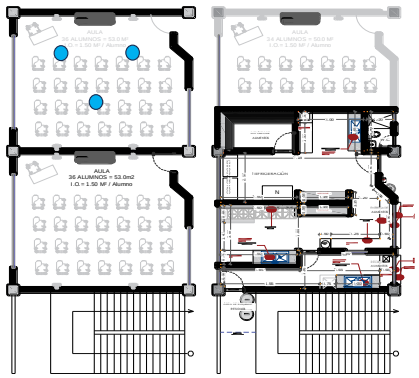

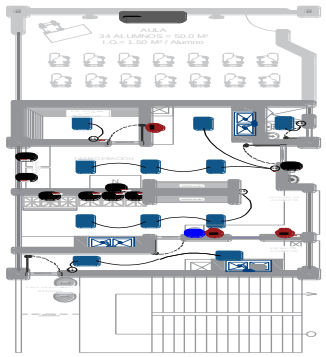


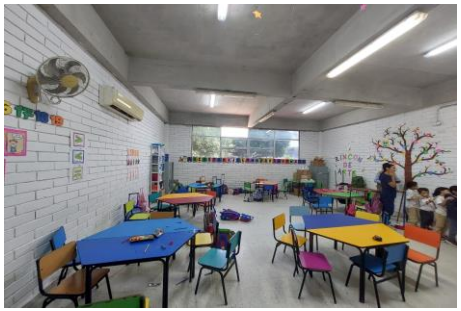



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL UND
AULA 1						3	3,00
AULA DIVISION DRYWAL						1	1,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	4,00						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**4,00**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
		


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	22 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: HIDRAULICO, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE	**CÓDIGO DEL ITEM:**	10.04	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	**UNIDAD** UND

ANEXOS

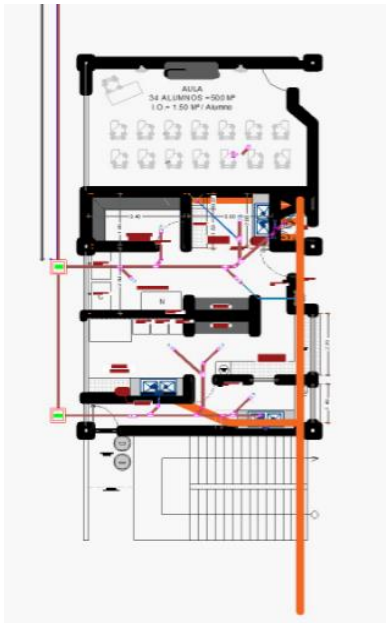

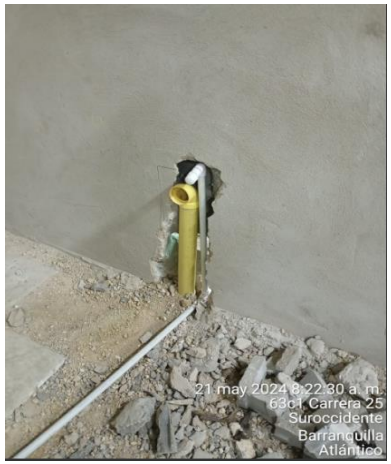

LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
LAVAPAPA					2		2,00
LAVAPLATOS					3		3,00
LAVAMANOS					2		2,00
SANITARIO					1		1,00
DUCHA					1		1,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	9,00						
					TOTAL PRESENTE ACTA:		**9,00**


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


OBSERVACIONES:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8**			**Código:**	**IP-FM-29**
				Versión:	**02**
				Fecha:	**20/02/2023**
				Páginas:	**23 de 30**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: HIDRAULICO, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE	**CÓDIGO DEL ITEM:** 10.05	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	**UNIDAD**	UND

ANEXOS

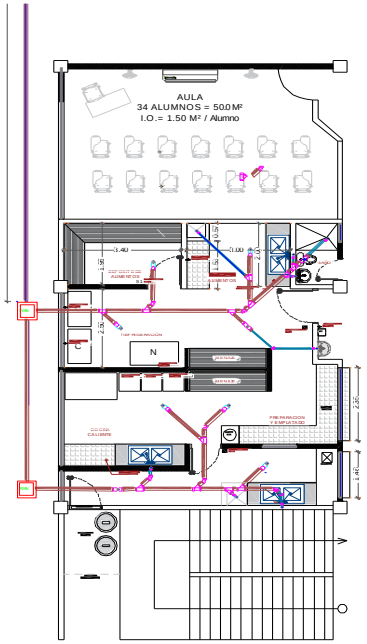

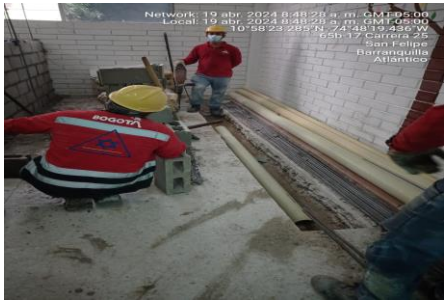



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
LAVAPAPA					2		2,00
DUCHA					1		1,00
LAVAMANOS					2		2,00
LAVAPLATOS					3		3,00
							0,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	8,00						
					TOTAL PRESENTE ACTA:		**8,00**

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Bconraido		


OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	24 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	HIDRAULICO, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE	**CÓDIGO DEL ITEM:** 10.18	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	**UNIDAD** ML

ANEXOS

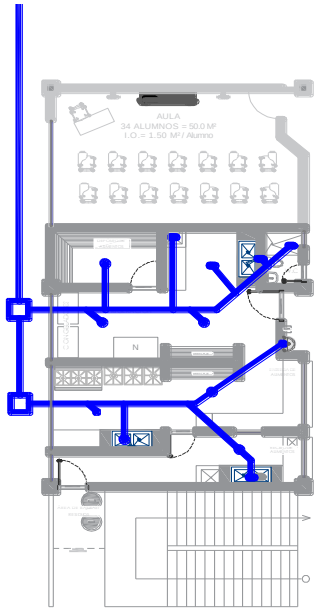



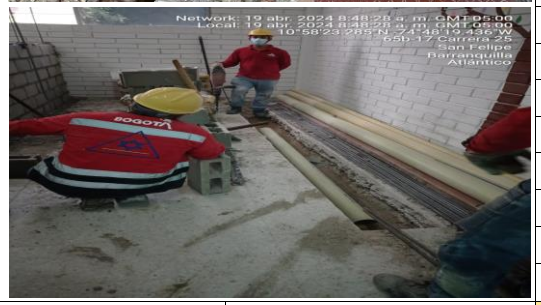

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	DESCUENTO DE PUNTOS	UND	CANT	TOTAL ML
TUBERIA EXTERNA COLEGIO	31,00						31,00
TUBERIA INTERNA COCINA	29,61			12,00			17,61
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	48,61						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	48,61

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Bconraido		


OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	25 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	HIDRAULICO, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE	**CÓDIGO DEL ITEM:** 10.21	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	**UNIDAD** UND

ANEXOS

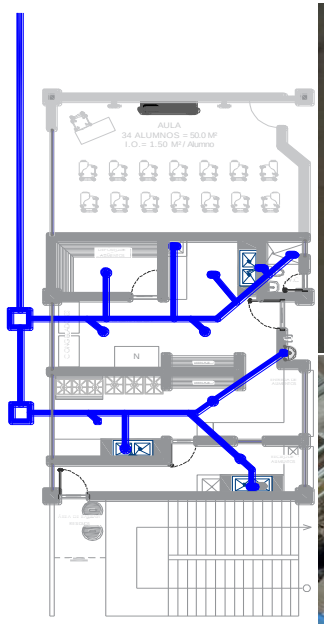



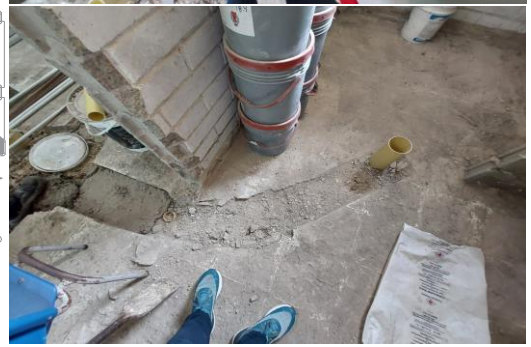

LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
SANITARIO						1	1,00
AREA DEPOSITO ALIMENTOS						1	1,00
AREA DE LAVADO						1	1,00
ZONA DE REFRIGERACION						1	1,00
RECIBO ALIMENTOS						1	1,00
ENTREGA ALIMENTOS						1	1,00
BASURA						1	1,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	7,00						
					TOTAL PRESENTE ACTA:		7,00

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	26 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022	OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP 21	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	UNIDAD	ML

ANEXOS

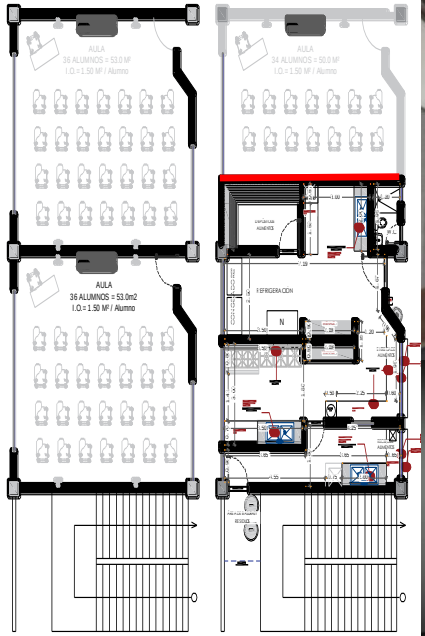





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
MURO DIVISORIO AULA	7,90						7,90
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	7,90						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	7,90


OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Jconrado		

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8**	**Código:**	**IP-FM-29**
		Versión:	**02**
		Fecha:	**20/02/2023**
		Páginas:	**27 de 30**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP 38	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	**UNIDAD**	M3

ANEXOS



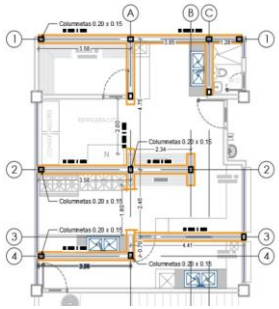









LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**VANOS**	**UND**	**CANT**	**TOTAL**
	LONG	**ANCHO**	**ALTURA**				**M3**
VIGAS DE CIMIENTO	7,90	0,30	0,30				0,71
	4,45	0,30	0,30				0,40
	4,41	0,30	0,30				0,40
	3,43	0,30	0,30				0,31
	1,88	0,30	0,30				0,17
	3,49	0,30	0,30				0,31
	3,58	0,30	0,30				0,32
VIGA SOBRE MURO DESCOMIDE Y ENTREGA ALIMENTOS	4,38	0,15	0,20				0,13
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	2,75						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**2,75**

Vo.Bo. Director CED	**Vo.Bo. Inspector Interventoria**	**Vo.Bo. Director Interventoria**

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	28 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP 40	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CONSTRUCCIÓN MURO EN ETERBOARD DE 8 MM A 2 CARAS, INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	**UNIDAD**	M2

ANEXOS






LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				M2
DIVISION AULA	6,04		3,15				19,03
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	19,03						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**19,03**

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

OBSERVACIONES:


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	29 de 30

CONTRATO:	EDU-345-2022			OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 65	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS

UNIDAD: M2

ANEXOS

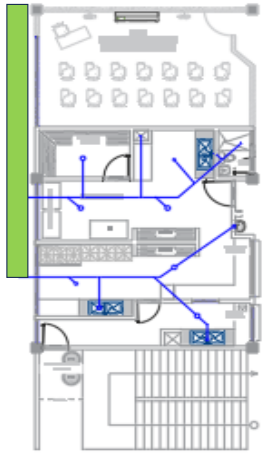





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				M2
TABLON AREA EXTERNA COLEGIO	31,00	0,40					12,40
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	12,40						
TOTAL PRESENTE ACTA:							12,40


OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 8**	**Código:**	**IP-FM-29**
		Versión:	**02**
		Fecha:	**20/02/2023**
		Páginas:	**30 de 30**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	JORGE NICOLAS ABELLO				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP 103	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DINTEL 0.15 X 0.20 MTS EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE VARILLA DE REFUERZO LONGITUDINAL DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8". INCLUYE TRIPLEX FORMALETA	**UNIDAD**	M3

ANEXOS



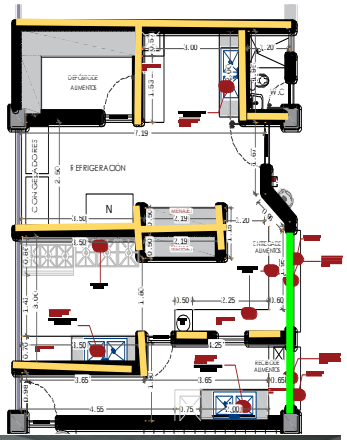





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				M3
VIGAS SOBRE MURO	7,90						7,90
	4,45						4,45
	4,41						4,41
	3,43						3,43
	1,88						1,88
	3,49						3,49
	3,58						3,58
VIGA SOBRE MURO DESCOMIDE Y ENTREGA ALIMENTOS	4,38						4,38
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	33,52						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**33,52**

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

OBSERVACIONES:


CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	1 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	**UNIDAD** MT2

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL MT2
AREA DE INTERVENCION	5,40	5,00					27,00
	7,69	6,24					47,99
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	74,99						
TOTAL PRESENTE ACTA:							74,99

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Bconrado		

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	2 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1.05	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	**UNIDAD**	ML

ANEXOS

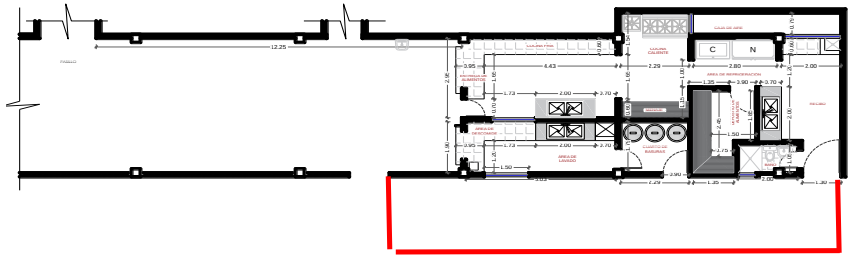



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
PARTE EXTERNA COLEGIO	20,29						20,29
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	20,29						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**20,29**


OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8**			**Código:**	**IP-FM-29**
				Versión:	**02**
				Fecha:	**20/02/2023**
				Páginas:	**3 de 29**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1.07	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	**UNIDAD**	ML

ANEXOS





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
CERRAMIENTO INTERNO	5,00						5,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	5,00						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**5,00**

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	4 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	**UNIDAD** MT2

ANEXOS





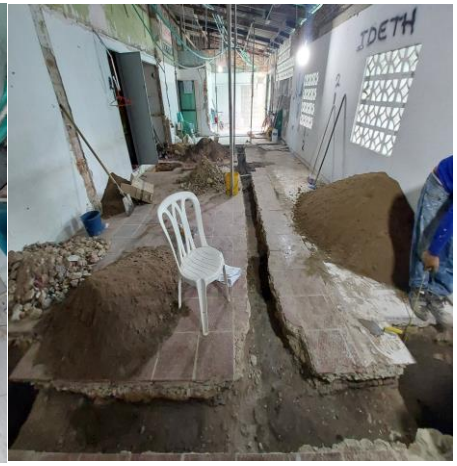

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL MT2
VIGA DE CIMIENTO AREA DE COCINA	4,45	0,30				3	4,01
	7,02	0,30				1	2,11
	3,20	0,30				1	0,96
	2,94	0,30				1	0,88
ZAPATAS AREA DE COCINA	1,20	0,80				6	5,76
TUBERIAS HIDROSANITARIAS	33,32	0,30					10,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	23,71						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**23,71**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	5 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.05	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AEREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD**	M3

ANEXOS

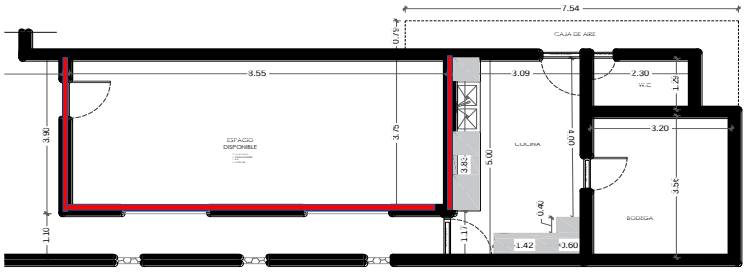





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				M3
VIGA SOBRE MURO AULA	16,50	0,20	0,20				0,66
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	0,66						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	0,66

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	6 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.15	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**UNIDAD** KGS

ANEXOS











LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	KG/ML	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL KGS
COLUMNAS							
Varilla 1/2"	3,00	0,99			4	6	71,28
Varilla 3/8"	0,90	0,56			17	6	51,84
VIGA DE CIMIENTO							
Varilla 1/2"	26,81	0,99			4	1	106,17
Varilla 3/8"	1,20	0,56			153	1	102,95
ZAPATAS							
Varilla 1/2"	14,00	0,99			1	6	83,16
PEDESTAL							
Varilla 1/2"	0,65	0,99			4	6	15,44
Varilla 3/8"	1,20	0,56			4	6	14,98
TRALAPOS VIGA DE CIMIENTO							
Varilla 1/2"	4,47	0,99			4	1	17,69
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	463,51						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**463,51**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Bconrado		

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	7 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022		OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.24	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	UNIDAD: ML

ANEXOS





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL ML
LEVANTE DE MUROS COCINA			2,70			5	13,50
			2,70			7	20,17
			2,70			3	7,07
			2,70			0	0,81
			2,70			3	8,64
			2,70			2	6,08
			2,70			2	5,00
			2,70			1	3,24
			2,70			3	8,64
			2,70			2	4,70
			2,70			2	4,32
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	82,16						
					TOTAL PRESENTE ACTA:		82,16

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	8 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.09	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	**UNIDAD** MT3

ANEXOS

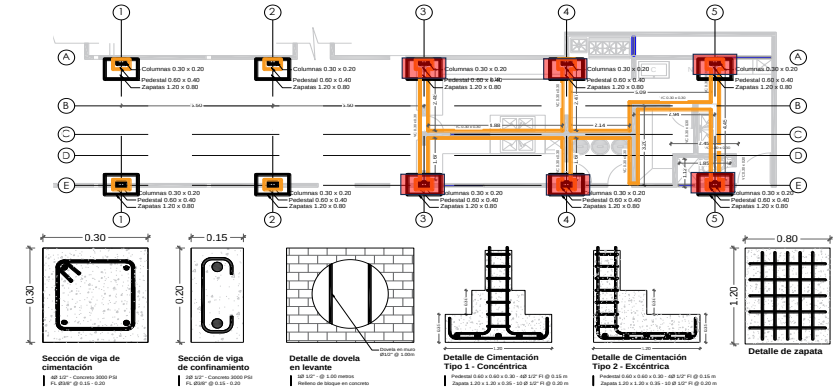



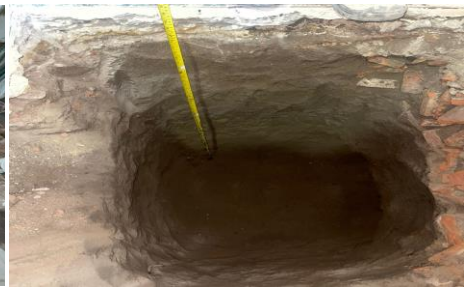

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL MT3
VIGA DE CIMIENTO AREA DE COCINA	4,45	0,30	0,30			3	1,20
	7,32	0,30	0,30			1	0,66
	3,20	0,30	0,30			1	0,29
	2,94	0,30	0,30			1	0,26
ZAPATAS AREA DE COCINA	1,20	0,80	0,35			6	2,02
PEDESTAL AREA DE COCINA	0,40	0,60	0,30			6	0,43
TUBERIAS HIDROSANITARIAS	33,32	0,30	0,40				4,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	8,86						
					TOTAL PRESENTE ACTA:		8,86


OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8**	**Código:**	**IP-FM-29**
		Versión:	**02**
		Fecha:	**20/02/2023**
		Páginas:	**9 de 29**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 2.28	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CORTE DE Llosa EN CONCRETO	**UNIDAD**	ML

ANEXOS








LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
VIGA DE CIMIENTO AREA DE COCINA	4,45					6	26,70
	7,32					2	14,64
	3,20					2	6,40
	2,94					2	5,88
ZAPATAS COCINA	4,00					6	24,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	77,62						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**77,62**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
		

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	10 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD** ML

ANEXOS





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
VANO PUERTA DE RECIBO	6,80						6,80
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	6,80						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	6,80

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	11 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS

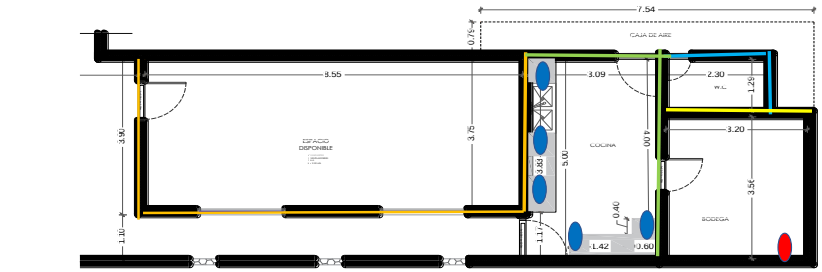





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
VANO PUERTA ACCESO		1,30	2,10				2,73
MURO AULA	16,50		3,00	5,80			43,70
MURO COCINA	8,06		3,00	1,40			22,78
MURO BAÑO	3,60		3,00	1,40			9,40
APOYOS MESON	0,60		0,90			5	2,70
ALACENA	3,20		3,00				9,60
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	90,91						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**90,91**


OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8**	**Código:**	**IP-FM-29**
		Versión:	**02**
		Fecha:	**20/02/2023**
		Páginas:	**12 de 29**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3.06	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS



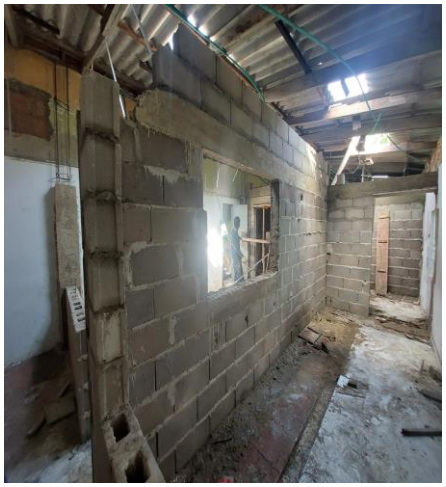



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
AREA DE COCINA	5,00		2,40	4,15			7,85
	7,47		2,40	1,48			16,45
	2,62		2,40	1,40			4,89
	0,60		2,40				1,44
	3,20		2,40				7,68
	2,25		2,40	1,80			3,60
	1,85		2,40				4,44
	1,20		2,40				2,88
	3,20		2,40	1,40			6,28
	1,74		2,40	0,76			3,42
	1,60		2,40	1,92			1,92
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	60,84						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**60,84**


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8**	**Código:**	**IP-FM-29**
		Versión:	**02**
		Fecha:	**20/02/2023**
		Páginas:	**13 de 29**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3.10	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS







LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**VANOS**	**UND**	**CANT**	**TOTAL**
	LONG	**ANCHO**	**ALTURA**				**MT2**
FACHADA COCINA	5,00		2,40	4,15			7,85
CUARTO BASURAS	6,09		2,40	1,80			12,82
DESCOMIDE	8,83		2,40	3,93			17,26
ENTREGA DE ALIMENTOS	10,78		2,40	6,18			19,69
COCINA CALIENTE Y MENAJE	9,99		2,40	6,09			17,89
DEPOSITO ALIMENTOS	8,89		2,40	1,80			19,54
WC	4,10		2,40	0,30			9,54
AREA REFRIGERACION	6,80		2,40	1,80			14,52
RECIBO	13,92		2,40	6,06			27,35
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	146,45						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**146,45**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	**Vo.Bo. Inspector Interventoria**	**Vo.Bo. Director Interventoria**
Jconrado		

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	14 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ACABADOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** 6.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	**UNIDAD** MT2

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
VIGA DE CIMIENTO AREA DE COCINA	4,45	0,30				3	4,01
	7,02	0,30				1	2,11
	3,20	0,30				1	0,96
	2,94	0,30				1	0,88
ZAPATAS AREA DE COCINA	1,20	0,80				6	5,76
TUBERIAS HIDROSANITARIAS	33,32	0,30					10,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	23,71						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**23,71**

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	15 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022	OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ACABADOS	CÓDIGO DEL ITEM: 6.02	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	UNIDAD	MT2

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
COCINA	3,00		2,40			2	14,40
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	14,40						
TOTAL PRESENTE ACTA:							14,40

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	16 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022	OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ACABADOS	CÓDIGO DEL ITEM: 6.04	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UNIDAD	MT2

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL MT2
AULA	8,55	3,75					32,06
PASILLO	8,70	1,10					9,57
COCINA	5,00	3,09					15,45
ALACENA	3,20	3,56					11,39
BAÑO	2,30	1,29					2,97
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	71,44						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	71,44

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	17 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	CARPINTERIA METALICA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 7.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD** UND

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
AULA					2		2,00
COCINA					3		3,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	5,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**5,00**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	18 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: CARPINTERIA METALICA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	7.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD** UND

ANEXOS





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
AULA						2	2,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	2,00						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**2,00**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	19 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022	OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: CARPINTERIA DE MADERA	CÓDIGO DEL ITEM: 8.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UNIDAD	UND

ANEXOS





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
BAÑO						1	1,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	1,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							1,00

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	20 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022	OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ELECTRICO	CÓDIGO DEL ITEM: 9.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UNIDAD	UND

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL UND
COCINA						2	2,00
BAÑO						1	1,00
ALACENA						1	1,00
AULA						4	4,00
PASILLO						2	2,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	10,00						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	10,00

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Jconrado		

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	21 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: ELECTRICO	**CÓDIGO DEL ITEM:** 9.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	**UNIDAD**	UND

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL UND
COCINA						2	2,00
BAÑO						1	1,00
ALACENA						1	1,00
AULA						4	4,00
PASILLO						2	2,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	10,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**10,00**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	22 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	ELECTRICO	**CÓDIGO DEL ITEM:** 9.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	**UNIDAD** UND

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL UND
AULA						4	4,00
COCINA						2	2,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	6,00						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	6,00

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	23 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022	OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP 14	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UNIDAD	UND

ANEXOS

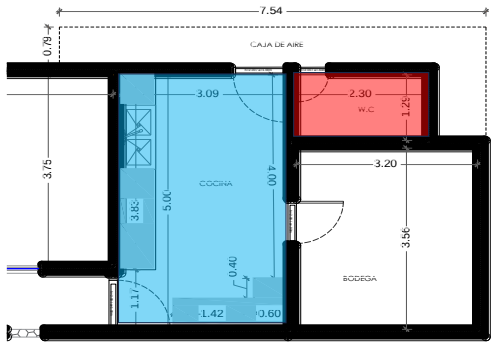





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
LAVAPLATOS COCINA					1		1,00
SANITARIO COCINA					1		1,00
LAVAMANOS COCINA					1		1,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	3,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							3,00

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	24 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP 16	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICION DE MESONES	**UNIDAD** ML

ANEXOS

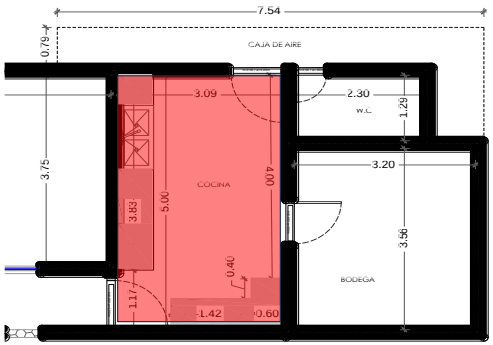





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
MESONES EXISTENTE COCINA	3,83						3,83
	2,42						2,42
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	6,25						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**6,25**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	25 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP 30	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE PUNTO HIDRÁULICO, INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS Y RETIRO DE MATERIAL DE SITIO.	**UNIDAD**	UND

ANEXOS

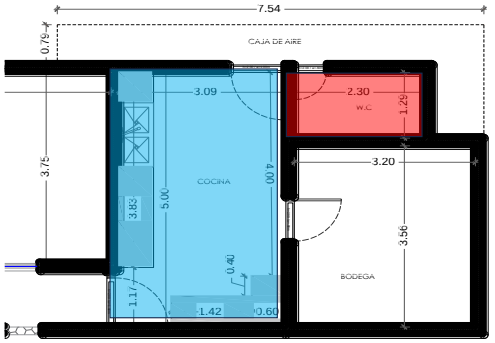





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
COCINA LAVAPLATOS					1		1,00
COCINA SANITARIO					1		1,00
COCINA LAVAMANO					1		1,00
COCINA DESAGUES					4		4,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	7,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**7,00**


OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8**	**Código:**	**IP-FM-29**
		Versión:	**02**
		Fecha:	**20/02/2023**
		Páginas:	**26 de 29**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP 37	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	**UNIDAD**	M3

ANEXOS

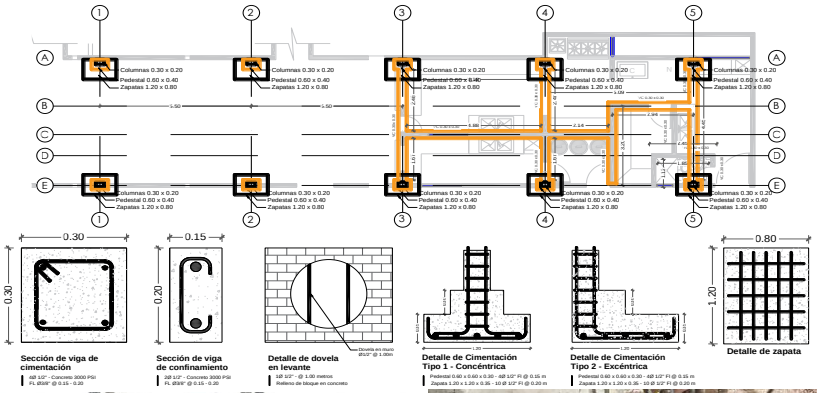





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				M3
ZAPATAS AREA DE COCINA	1,20	0,80	0,35			6	2,02
PEDESTAL AREA DE COCINA	0,40	0,60	0,30			6	0,43
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	2,45						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**2,45**

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

OBSERVACIONES:


CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	27 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022			OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 38	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ANEXOS

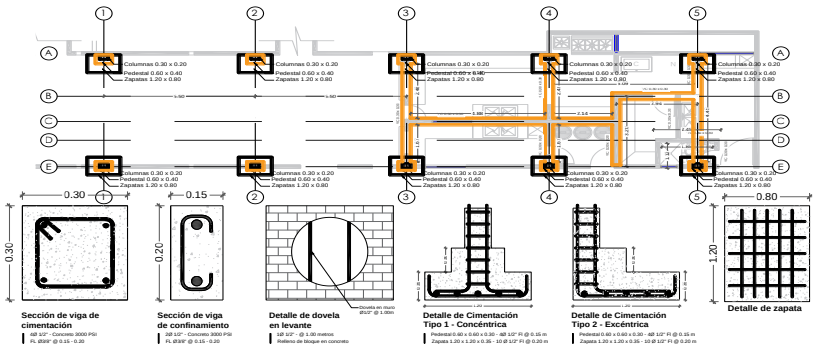





UNIDAD	M3

LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				M3
VIGA DE CIMIENTO AREA DE COCINA	4,45	0,30	0,30			3	1,20
	7,32	0,30	0,30			1	0,66
	3,20	0,30	0,30			1	0,29
	2,94	0,30	0,30			1	0,26
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	2,41						
TOTAL PRESENTE ACTA:							2,41


OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8**	**Código:**	**IP-FM-29**
		Versión:	**02**
		Fecha:	**20/02/2023**
		Páginas:	**28 de 29**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO: NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP 64	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	**UNIDAD**	M3

ANEXOS

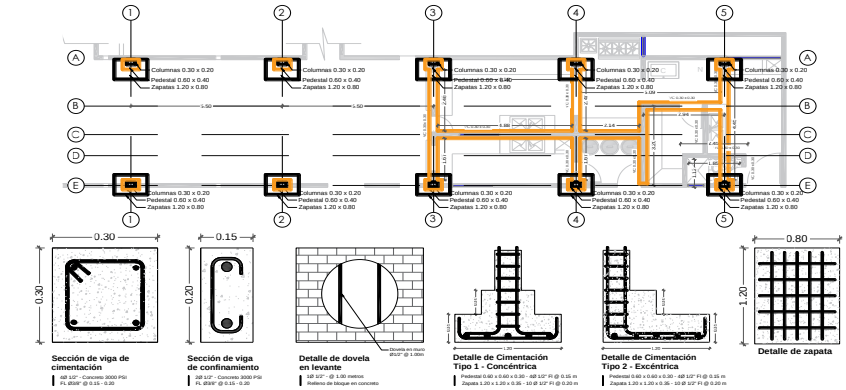







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				M3
COLUMNAS AREA DE COCINA	0,30	0,20	3,00			6	1,08
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	1,08						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,08**

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	**Vo.Bo. Inspector Interventoria**	**Vo.Bo. Director Interventoria**
Conrado		

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No.8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	29 de 29

CONTRATO:	EDU-345-2022			OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
INSTITUCION:	IDETH SEDE 2				
FECHA:	31 DE MAYO 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 103	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DINTEL 0.15 X 0.20 MTS EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE VARILLA DE REFUERZO LONGITUDINAL DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8". INCLUYE TRIPLEX FORMALETA

UNIDAD: M3

ANEXOS

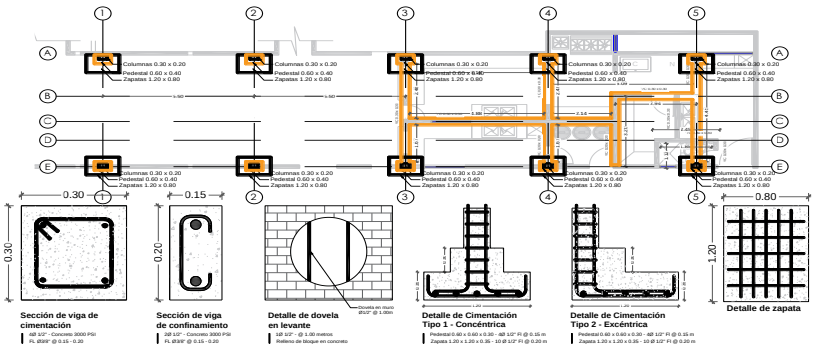





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTURA	VANOS	UND	CANT	TOTAL M3
VIGA SOBRE MURO AREA DE COCINA	4,45					3	13,35
	7,32					1	7,32
	3,20					1	3,20
	2,94					1	2,94
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	26,81						
TOTAL PRESENTE ACTA:							26,81


OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°8**			**Código:**	**IP-FM-29**
				Versión:	**02**
				Fecha:	**20/02/2023**
				Páginas:	**1 de 11**


CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	LA LIBERTAD				
FECHA:	31 de mayo de 2024				
CAPITULO: PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS

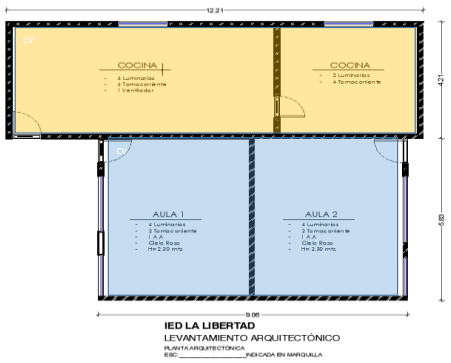





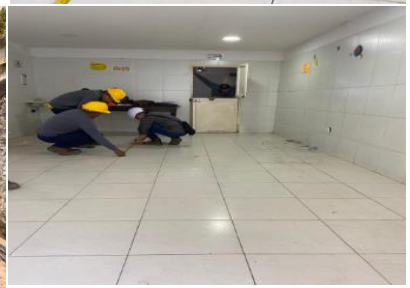

LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
cocina existente	12,21	4,21					51,40
aulas existentes	9,06	5,83					52,82
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	104,22						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**104,22**

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	**Vo.Bo. Inspector Interventoria**	**Vo.Bo. Director Interventoria**
Jconrado		

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°8**	**Código:**	**IP-FM-29**
		Versión:	**02**
		Fecha:	**20/02/2023**
		Páginas:	**2 de 11**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	LA LIBERTAD				
FECHA:	31 de mayo de 2024				
CAPITULO: PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1.07	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	**UNIDAD**	ML

ANEXOS







LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**VANOS**	**UND**	**CANT**	**TOTAL**
	LONG	**ANCHO**	**ALTURA**				**ML**
cerramiento provisional aulas	9,68					1	9,68
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	9,68						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**9,68**

Vo.Bo. Director CED	**Vo.Bo. Inspector Interventoria**	**Vo.Bo. Director Interventoria**

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	3 de 11


CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	LA LIBERTAD				
FECHA:	31 de mayo de 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS





Demolición muro

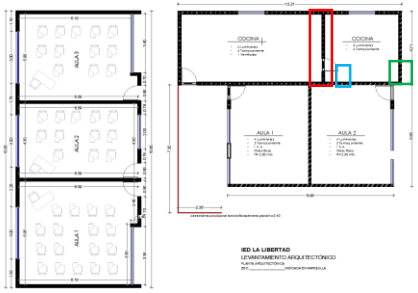



LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
muro de cocina	3,91		3,00	1,80			9,93
vano puerta cocina	0,90		2,00				1,80
ALACENA COCINA	2,24		2,00				4,48
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	16,21						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	16,21

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	4 de 11

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	LA LIBERTAD				
FECHA:	31 de mayo de 2024				
CAPITULO: MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3.08	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS

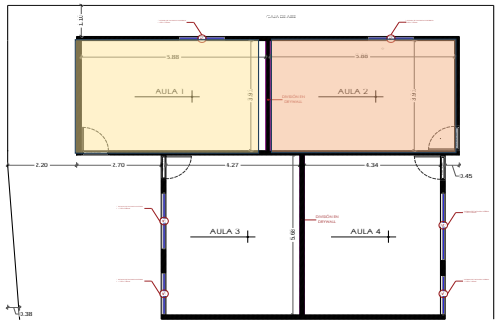







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
AULA 2	8,70		2,12				18,44
	9,00		0,40				3,60
AULA 3	4,27		1,50				6,41
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	28,45						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**28,45**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	5 de 11

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	LA LIBERTAD				
FECHA:	31 de mayo de 2024				
CAPITULO: ACABADOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** 6.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS

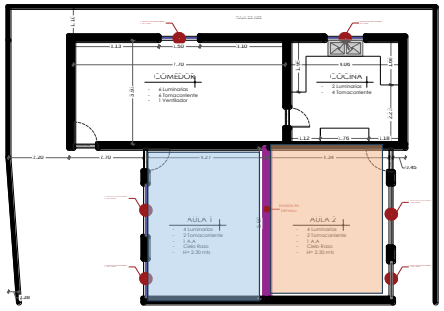


IED LA LIBERTAD
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO
PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC: _____ INDICADA EN MARQUILLA





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
AULA 2 (ceramica mal estado)	0,45	0,45				50	10,13
AULA 1 (ceramica mal estado)	0,45	0,45				20	4,05
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	14,18						
					TOTAL PRESENTE ACTA:		**14,18**


OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
		

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°8**	**Código:**	**IP-FM-29**
		Versión:	**02**
		Fecha:	**20/02/2023**
		Páginas:	**6 de 11**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	LA LIBERTAD				
FECHA:	31 de mayo de 2024				
CAPITULO: ACABADOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** 6.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS

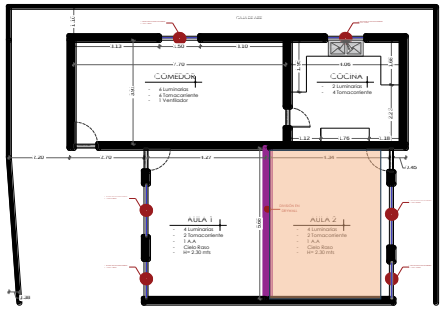


IED LA LIBERTAD
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO
PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC:_____INDICADA EN MARQUILLA





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				MT2
AULA 2	15,67		2,12	4,16			29,06
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	29,06						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**29,06**


OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	**Vo.Bo. Inspector Interventoria**	**Vo.Bo. Director Interventoria**
		

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°8**			**Código:**	**IP-FM-29**
				Versión:	**02**
				Fecha:	**20/02/2023**
				Páginas:	**7 de 11**

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	LA LIBERTAD				
FECHA:	31 de mayo de 2024				
CAPITULO: ACABADOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** 6.04	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD**	MT2

ANEXOS

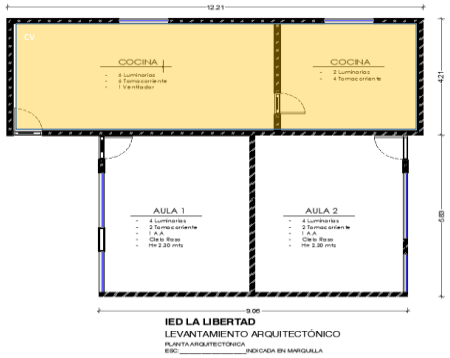







LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**VANOS**	**UND**	**CANT**	**TOTAL**
	LONG	**ANCHO**	**ALTURA**				**MT2**
Antigua cocina	11,91	3,91					46,57
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	46,57						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**46,57**

Vo.Bo. Director CED	**Vo.Bo. Inspector Interventoria**	**Vo.Bo. Director Interventoria**
Jconrado		


OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	8 de 11

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	LA LIBERTAD				
FECHA:	31 de mayo de 2024				
CAPITULO: ELECTRICO	**CÓDIGO DEL ITEM:** 9.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	**UNIDAD**	UND

ANEXOS

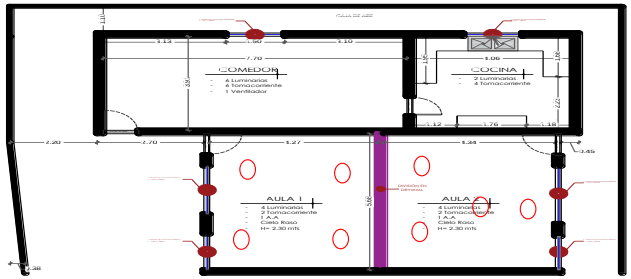

IED LA LIBERTAD
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC:_____INDICADA EN MARQUILLA





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				UND
AULA 1 (LUMINARIA)					4		4,00
AULA 2 (LUMINARIA)					4		4,00
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	8,00						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**8,00**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Jconrado		

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	9 de 11

CONTRATO:	EDU-345-2022		**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
INSTITUCION:	LA LIBERTAD				
FECHA:	31 de mayo de 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	NP 16	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICION DE MESONES

ANEXOS

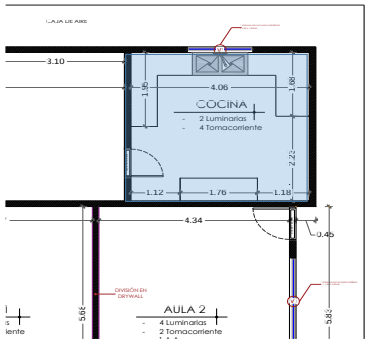







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				ML
cocina	6,33						6,33
	1,76						1,76
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	8,09						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**8,09**

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	10 de 11

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	LA LIBERTAD				
FECHA:	31 de mayo de 2024				
CAPITULO: NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP 24	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ESCARIFICIACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	**UNIDAD**	M2

ANEXOS



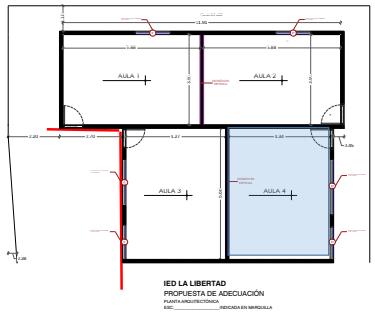





LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				M2
Exterior aulas frente de cocina	15,00		3,00	11,60			45,00
Aula 4	19,04		1,00				19,04
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	64,04						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**64,04**

OBSERVACIONES:


Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°8

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	20/02/2023
Páginas:	11 de 11

CONTRATO:	EDU-345-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
INSTITUCION:	LA LIBERTAD				
FECHA:	31 de mayo de 2024				
CAPITULO: NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP 40	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CONSTRUCCIÓN MURO EN ETERBOARD DE 8 MM A 2 CARAS, INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	**UNIDAD**	M2

ANEXOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	UND	CANT	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA				M2
division aula	3,91		2,50				9,78
Acumulado anterior							
Acumulado a presente acta	9,78						
						TOTAL PRESENTE ACTA:	**9,78**

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Director CED	Vo.Bo. Inspector Interventoria	Vo.Bo. Director Interventoria
Jconrado		
