INFORME MENSUAL N°2

CONVENIO No. 4621 DE 2023: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

PERIODO: 1 al 29 de febrero de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4860 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Ocaña, marzo de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 5
2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 5
2.4 Características Técnicas del Proyecto 6
3. Información convenio solidario. 7
3.1 Información General del convenio 7
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 7
3.3 Seguimiento ítems no previstos N/A 7
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 7
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 8
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 8
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 8
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 8
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 8
4.5 Estado General del Tiempo 8
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 8
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 8
4.8 Informes semanales 8
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
5.1 Información general del contrato 9
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 9
5.3 Informes especialistas 10
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 10
5.5 Información otros programas y aplicativo 10
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 11
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12
8. ANEXOS 13
8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 13
8.2. Registro fotográfico 13

8.3. Bitácora del mes correspondiente: 13

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto MEPI-MN1-IN-15-FR-2

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

Anexo 4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

Anexo 5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Anexo 8 Informes semanales MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), dentro del marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, asignó fondos para apoyar el desarrollo del programa ejecutado por organismos y/o juntas de acción comunal, en cumplimiento de la legislación vigente.

El desarrollo de infraestructura vial y la conectividad con municipios y ciudades de las zonas rurales es crucial para su progreso y mejora en términos de movilidad. Estas comunidades experimentan un crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se fortalece su red vial.

Por consiguiente, la aplicación de técnicas como la estabilización de vías terciarias mediante gaviones desempeña un papel esencial en el mantenimiento y conservación de los caminos en esta área, lo que brinda confianza y seguridad tanto a peatones como a conductores que transitan por esta vía.

El informe siguiente proporciona todos los detalles relacionados con aspectos administrativos, técnicos, financieros, así como información detallada sobre el estado y el progreso del convenio solidario correspondiente al mes de enero.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Norte de Santander, vereda Agua de la Virgen del municipio Ocaña.

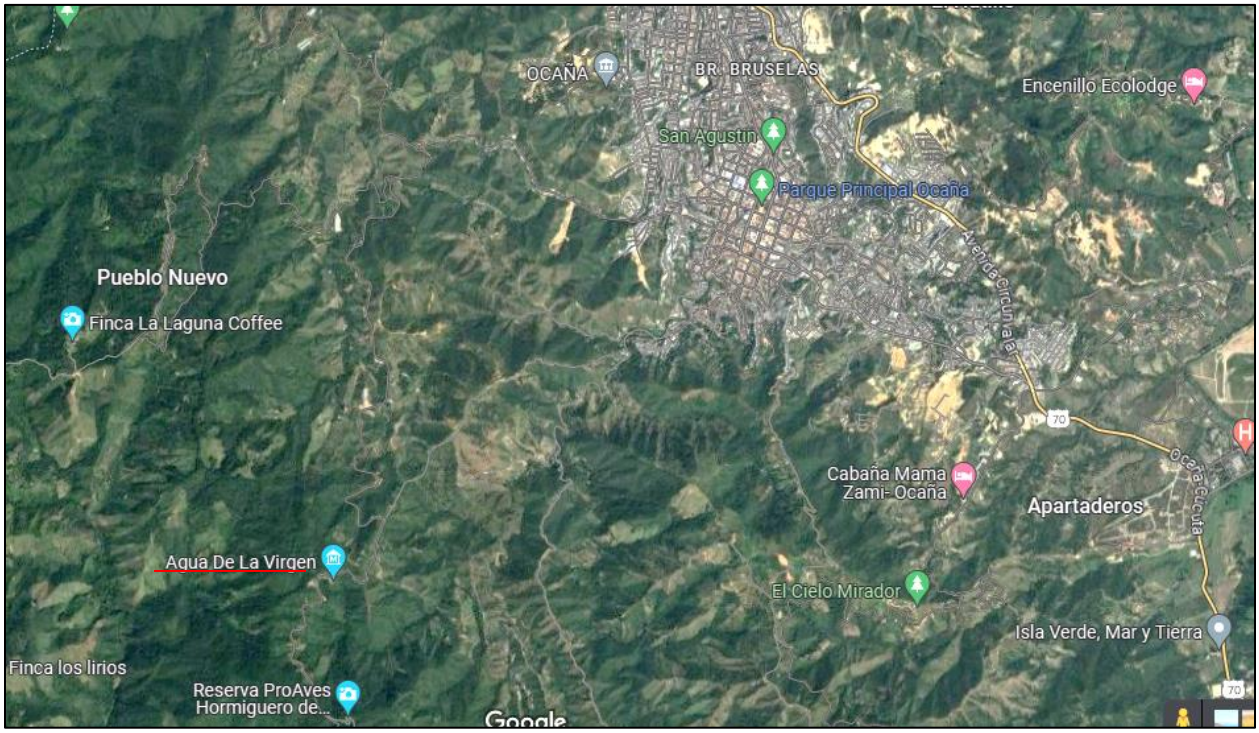


Figura 1 Localización de la vereda Agua de la Virgen


2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto objeto del convenio de referencia se ejecuta en la vereda Agua de la Virgen, zona rural del municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

De su ejecución se beneficia la población de esta vereda directamente, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El tramo vial a ser intervenido se encuentra en la entrada a la vereda Agua de la Virgen en el municipio de Ocaña, un área de interés turístico, con alta afluencia de vehículos siendo crucial abordar la necesidad de intervención, mantenimiento y estabilización de esta vía terciaria.

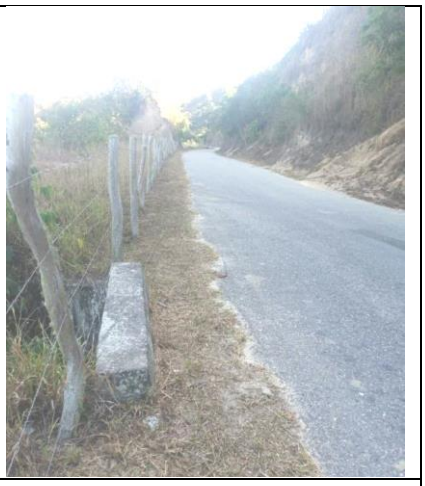	
Estado Inicial de la vía	Estado inicial de la vía

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El presente convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento vial del corredor a intervenir para que garantice una circulación continua y eficaz para el transporte de propios y visitantes de la región.

3. Información convenio solidario.

3.1 Información General del convenio

CONVENIO No.	4621 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTADE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AGUA DE LA VIRGEN
FECHA DE INICIACIÓN	12/12/2023
FECHA DE TERMINACION INCIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	0,61 MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($198.058.806,00)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($198.058.806,00)

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo comprendido entre la reanudación del proyecto el día 01 al 29 de febrero, se realizó gestión documental del proyecto como lo es la solicitud a la junta de la entrega de la topografía, ajuste a los estudios y diseños, hoja de vida del personal (mano de obra calificada).

3.3 Seguimiento ítems no previstos N/A

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Durante este período, las actividades de construcción no se llevan a cabo debido a la falta de recursos. Por otra parte, la supervisión tiene previsto planificar las actividades de construcción física.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 4)

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.8 Informes semanales
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4860 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR	1570 INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CINCO (0,5) MESES.
FECHA INICIACIÓN	15/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
FECHA TERMINACIÓN	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 94,818,000.00 incluido el IVA
ADICIÓN 1	$ 21,182,000.00 incluido el IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 116.000.000,00 incluido el IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Brindar apoyo en la gestión documental del proyecto mediante sesiones de socialización para aclarar los criterios necesarios para iniciar la ejecución del convenio solidario.
- Asistir en la elaboración de informes semanales que ayuden a determinar el progreso del proyecto.
- Contribuir en la creación de cuentas de cobro y en la clarificación de información sobre la topografía del área a intervenir, así como en los ajustes correspondientes a los estudios y diseños. Se resolverán dudas y se establecerán plazos para entregas.
- Llevar a cabo la supervisión integral según lo establecido en el manual de interventoría actual de la entidad, en relación con el contrato 4864 del 2023, asegurando que a través de este se lleven a cabo obras de mitigación que reduzcan el rápido aumento del área afectada por el talud sujeto a estabilización.

5.3 Informes especialistas
(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC
(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo
(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 9)

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La supervisión ha estado brindando apoyo a la junta desde el inicio de las actividades, participando en todos los procesos y tareas iniciales relacionadas con la implementación del convenio, con el objetivo de facilitar el inicio oportuno de las actividades de construcción.

- Hasta la fecha, la junta ha completado la aprobación de su personal técnico y administrativo, incluyendo al ingeniero residente de obra y al contador.

- La supervisión está a la espera de las cuentas de cobro correspondientes a los primeros pagos realizados por la junta, que incluyen conceptos como pólizas, topografía, estudios preliminares, adquisición de equipos, exámenes médicos, entre otros.

- Es crucial que la junta agilice las operaciones tanto documentales como técnicas para garantizar que se pueda dar inicio a las actividades de construcción lo antes posible.

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

Ver anexo 15

ANEXOS

Anexo 1
Resumen Mensual Estado General del Proyecto MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 12/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña **PERIODO MES:** Febrero

CONVENIO No.: 4620

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

PLAZO INICIAL: 0,03 meses
FECHA DE INICIO: 30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 4 meses

VALOR INICIAL : $ 198.058.806,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 198.058.806,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.


Foto 2

Indicar la localización y actividad.

Foto 3	**Foto 4**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**
Foto 5	**Foto 6**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se presenta avance físico, ya que se estan realizando ajustes a los diseños.



Firma

Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2
Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **Ocaña**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Febrero de 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

CONTRATO No. 4621 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4860 del 2023 **INTERVENTORÍA:** 1570 INGENIERIA SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: No se realiza reporte de maquinaria y equipo ya que el Convenio se encuentra en etapa de revisión y ajustes a los de estudios y diseños

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: EDIMER GARCIA PINO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0541179 NTS

Firma
Nombre: LIGIA MERCEDES GÓMEZ ARAQUE
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 542022 – 16095 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 3
Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	12/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No: 4621 del 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Tipo Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1																																																
2																																																
3																																																
4																																																
5																																																
6																																																
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
N																																																

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

No se reporta personal porque el contratista se encuentra en actividades de ajuste a los diseños.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EDIMER GARCIA PINO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0541179 NTS

Firma
Nombre: ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 4
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE OBRA No: 4621 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

MES INFORME MENSUAL: Febrero de 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.651.433,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
			CONTRATO EN ETAPA DE REVISION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS												
TOTALES															

NO SE REALIZA REPORTE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL YA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REVISION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 542022 – 16095 NTS

Firma
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 5
Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No: 4621 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
No se realiza reporte de Estado General del Tiempo ya que en este tiempo se realizaron actividades de ajuste a los diseños.

Firma
Nombre: EDIMER GARCIA PINO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0541179 NTS

Firma
Nombre: LIGIA MERCEDES GÓMEZ ARAQUE
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 542022 – 16095 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 6
Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 12/02/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No.: 4621 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

No se presentan informes de Ensayo de laboratorio ya que la el contratista se encuentra realizando los ajustes a los diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma EDIMER GARCIA

Nombre: EDIMER GARCIA PINO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0541179 NTS

Firma

Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 7
Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12 (Día) 3 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONVENIO No. 4621 del 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,03 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $198.058.806,00

VALOR ACUMULADO: $198.058.806,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4860 del 2023

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20,00	$ 39.611.762,00	27	11	23	31	10	24
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00	$ 9.902.941,00	27	11	23	31	12	26
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00	$ 59.417.642,00	31	12	23	31	12	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100296780

Certificado de modificación o anexo No.: 71803851
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	27	11	23	31	12	23
Patronal,Contratista,Subcontratista,Vehiculos Propios y No propios		$ 232.000.000,00	27	11	23	31	12	23

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100073145

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 71801630
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20,00	$ 39.611.761,20	27	11	23	1	3	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00	$ 9.902.941,00	27	11	23	30	4	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00	$ 59.417.642,00	30	4	24	30	4	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100296780

Certificado de modificación o anexo No.: 71849838
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	27	11	23	30	4	24
Patronal,Contratista,Subcontratista,Vehiculos Propios y No propios		$ 260.000.000,00	27	11	23	30	4	24

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100073354 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 71849843
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8
Informes semanales MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/02/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 4 del 2/02/2023 al 8/02/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

139 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 139 m de placa huella en la vereda Agua de la Virgen, municipio de Ocaña

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No. 4621

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 198.058.806,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 198.058.806,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

INTEGRANTES: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda

CONTRATO No. 4860 del 2023

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 94.818.000,00

VALOR ADICIONES: $ 21.182.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.058.806	$ 198.058.806		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.058.806	$ 198.058.806		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.170.113,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacio, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	___

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ___

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ___

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con las solicitudes a la junta de accion comunal la entrega de la topografia, estudios y diseños, hoja de vida del personal (mano de obra calificada). Por parte de la supervision del contrato se procede a activar el personal de la interventoria (director y residente de interventoria). Por me dio de correo electronico se solicto a la junta de como iban con los procesos para llevar acabo el convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la entrega de la documentacion solicitada.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	Programado Ejecutado
Placa huella	Programado Ejecutado
alcantarillas	Programado Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Topografia y Ajuste de diseño

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA ___

NOMBRE: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda R.L / 1570 INGENIERIA SAS

Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/02/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 5 del 9/02/2023 al 15/02/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

139 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 139 m de placa huella en la vereda Agua de la Virgen, municipio de Ocaña

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No. 4621 — VALOR INICIAL: $ 198.058.806,00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198.058.806,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

INTEGRANTES: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda

CONTRATO No. 4860 del 2023 — VALOR INICIAL: $ 94.818.000,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 21.182.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.058.806	$ 198.058.806		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.058.806	$ 198.058.806		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.170.113,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacio, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	___

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ___

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ___

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En la semana se realizaron los respectivos estudios topograficos para dar empiezo a la ejecucion del convenio

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la ejecucion de la obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	Programado Ejecutado
Placa huella	Programado Ejecutado
alcantarillas	Programado Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Estudio Topografico



Estudio Topografico

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA ___

NOMBRE: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda R.L / 1570 INGENIERIA SAS

Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 23/02/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 6 del 16/02/2023 al 22/02/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

139 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 139 m de placa huella en la vereda Agua de la Virgen, municipio de Ocaña

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No. 4621
FECHA DE INICIO: 30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 198.058.806,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 198.058.806,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS
INTEGRANTES: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda

CONTRATO No. 4860 del 2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 94.818.000,00
VALOR ADICIONES: $ 21.182.000,00
VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.058.806	$ 198.058.806		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.058.806	$ 198.058.806		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.170.113,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacio, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En la semana se realizaron la revisssion de estudios de topografia y ajustes a los diseños. Igualmente estamos a espera de la consignación de los recursos a la junta de acción comunal para dar empiezo a la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la consignación de los recursos para la ejecucion de la placa huella.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	Programado Ejecutado
Placa huella	Programado Ejecutado
alcantarillas	Programado Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Conformacion Veeduria Convenio Solidario

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda R.L / 1570 INGENIERIA SAS

Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 01/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 7 del 23/02/2024 al 29/02/2024 — Último Informe Semanal SI | | (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

139 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 139 m de placa huella en la vereda Agua de la Virgen, municipio de Ocaña

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No. 4621 — VALOR INICIAL: $ 198.058.806,00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198.058.806,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS
INTEGRANTES: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda

CONTRATO No. 4860 del 2023 — VALOR INICIAL: $ 94.818.000,00
FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 21.182.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.058.806	$ 198.058.806		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.058.806	$ 198.058.806		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): $ 146.170.113,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacio, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En la semana se realizó la revision de ajustes a los diseños.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la consignación de los recursos para Ida inicio a la ejecucion de las obras.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	Programado
	Ejecutado
Placa huella	Programado
	Ejecutado
alcantarillas	Programado
	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda R.L / 1570 INGENIERIA SAS

Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 9
Equipo Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 12/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Feb de 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4860 del 2023

INTERVENTORÍA: 1570 INGENIERIA SAS

CONTRATO DE OBRA No. 4621 del 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICUO TIPO CAMIONETA	CHEVROLET TRACKER 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 10
Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 12/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 del 2023

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero de 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

CONTRATO DE OBRA No.: 4621 del 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

NOMBRE ARL: ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Alvaro Castro Peñaranda	1979237	Director de interventoria	$ 1.940.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			33,33%	Alvaro Castro Peñaranda	$1.914.000	$ 133.300	V	Nueva E.P.S.	8629148549	$ 76.600	Porvenir	8629148541	$ 306.300	$ 76.600	$ -	$ -	
2	Ligia Mercedes Gómez Araque	1091660295	Ingeniero Resedente	$ 2.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	Alvaro Castro Peñaranda	$ 1.440.000,00	$ 100.300	V	Nueva E.P.S.	8629148549	$ 57.600	Porvenir	7915251591	$ 230.400	$ 57.600	$ -	$ -	
3																																														
4																																														
5																																														
6																																														
7																																														
8																																														
9																																														
10																																														
N																																														

Anexo 11
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 del 2023

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: Febrero de 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Aguas de la Virgen, municipio Ocaña

CONTRATO DE OBRA No: 4621 del 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1351223	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Contrato principal	$94.818.000,00	$94.818.000,00
	1397723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	ADICIONAL 1	$21.182.000,00	$21.182.000,00
TOTAL						**$116.000.000,00**	**$116.000.000,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$116.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1351223 de 11/12/2023		$ 94.818.000		**CONTRATO PRINCIPAL**
								1397723 de 19/12/2023		$ 116.000.000		**ADICIONAL**
1	**15 AL 31 DE DIC DE 2023**							1351223 de 11/12/2023		$ 116.000.000		**ACTA EN CERO**
2	**1 AL 31 DE ENERO DEL 2024**	$ 7.406.080	$ 1.407.155	$ 8.813.235				1351223 de 11/12/2023	$ 8.813.235	$ 107.186.765		**PRESENTE TRÁMITE**
TOTALES		**$ 7.406.080**	**$ 1.407.155**	**$ 8.813.235**					**$ 8.813.235**	**$ 434.004.765**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 5.376.080,00	$ 1.021.455,20	$ 6.397.535,20
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 2.030.000,00	$ 385.700,00	$ 2.415.700,00
VALOR TOTAL	**$ 7.406.080**	**$ 1.407.155**	**$ 8.813.235**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12
Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 del 2023

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARI, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIALOCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,5 mes

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/02024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $94.818.000,00

VALOR ACUMULADO: $116.000.000,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaime Fernandez

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8%	$ 9.481.800,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16%	$ 18.963.600,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	25%	$ 28.445.400,00	6	12	2023	6	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101213876

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Segusros del Estado SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.600.000,00	22	12	2023	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.200.000,00	15	12	2023	31	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 34.800.000,00	15	12	2023	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101213876

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13
Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14
Registro fotográfico

Anexo 15
Bitácora del mes correspondiente
