	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4014 DE 2023 **Contratista:** JAC VEREDA LA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER

Contrato de Interventoría No. 4860 del 2023 **Interventoría:** 1570 INGENIERIA SAS

Objeto Contrato de Obra: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** Abril de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: Elias Jaimes Fernandez

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL N°4

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4014 DE 2023: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**.**".

PERIODO: 01 al 30 de abril de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4860 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Ocaña, mayo de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 5
2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 5
2.4 Características Técnicas del Proyecto 6
3. Información convenio solidario. 7
3.1 Información General del convenio 7
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 7
3.3 Seguimiento ítems no previstos N/A 7
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 7
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 8
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
5.1 Información general del contrato 9
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 9
5.3 Informes especialistas 10
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 10
5.5 Información otros programas y aplicativo 10
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 11
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12
8. ANEXOS 13
8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 13
8.2. Registro fotográfico 13
8.3. Bitácora del mes correspondiente: 13

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto MEPI-MN1-IN-15-FR-2

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

Anexo 4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

Anexo 5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Anexo 8 Informes semanales MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), dentro del marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, asignó fondos para apoyar el desarrollo del programa ejecutado por organismos y/o juntas de acción comunal, en cumplimiento de la legislación vigente.

El desarrollo de infraestructura vial y la conectividad con municipios y ciudades de las zonas rurales es crucial para su progreso y mejora en términos de movilidad. Estas comunidades experimentan un crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se fortalece su red vial.

El informe siguiente proporciona todos los detalles relacionados con aspectos administrativos, técnicos, financieros, así como información detallada sobre el estado y el progreso del convenio solidario correspondiente al mes de abril.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Norte de Santander, vereda La Esmeralda del municipio Playa de Belén.

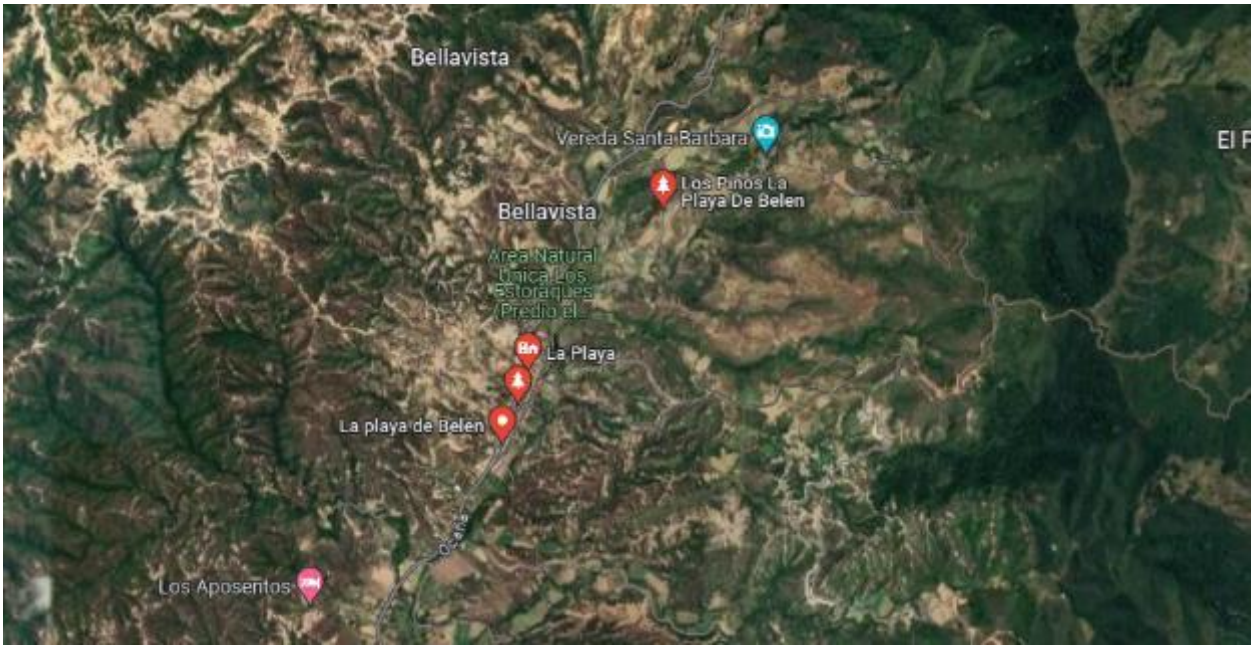


Figura: 1 Localización de la vereda La Esmeralda


2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto objeto del convenio de referencia se ejecuta en la vereda La Esmeralda, zona rural del municipio de La Playa de Belén, en el departamento de Norte de Santander.

De su ejecución se beneficia la población de esta vereda directamente, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El corredor vial a intervenir se encuentra en la vereda La Esmeralda en el municipio de La Playa de Belén, departamento Norte de Santander. Esta es una vía terciara destapada que requiere intervención y mantenimiento para el buen desplazamiento de sus habitantes y visitantes.

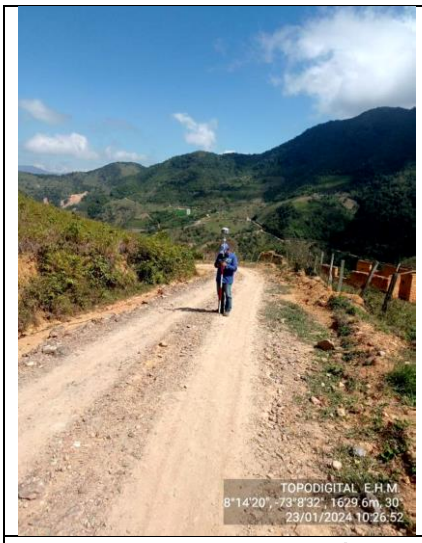	
Estado Inicial de la vía	Estado inicial de la vía

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El presento convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento vial del corredor a intervenir para que garantice una circulación continua y eficaz para el transporte de propios y visitantes de la región.

3. Información convenio solidario.

3.1 Información General del convenio

CONVENIO No.	4014 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA
FECHA DE INICIACIÓN	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	0,5 MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 200.876.460,00)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 200.876.460,00)

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 del mismo mes, se realizaron una serie de actividades donde se trabajó en la construcción de placa huella y la alcantarilla, de igual manera se culminó el proyecto de la mejor manera contribuyendo la accesibilidad y la calidad de la vía en la región

3.3 Seguimiento ítems no previstos N/A

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

En este periodo comprendido del 01 de abril al 30 del mismo mes, se realiza la supervisión a las actividades la instalación de acero de refuerzo, la fundición de la placa huella y la alcantarilla. Así mismo se culminó el proyecto de la mejor manera contribuyendo la accesibilidad y la calidad de la vía en la región
Además, se realizaron informes semanales sobre el avance del proyecto.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 4)

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.8 Informes semanales
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4860 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR	1570 INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CINCO (0,5) MESES.
FECHA INICIACIÓN	15/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
FECHA TERMINACIÓN	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 94,818,000.00 incluido el IVA
ADICIÓN 1	$ 21,182,000.00 incluido el IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 116.000.000,00 incluido el IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Brindar apoyo en la gestión documental del proyecto mediante sesiones de socialización para aclarar los criterios necesarios para iniciar la ejecución del convenio solidario.
- Asistir en la elaboración de informes semanales que ayuden a determinar el progreso del proyecto.
- Contribuir en la creación de cuentas de cobro y en la clarificación de información sobre la topografía del área a intervenir, así como en los ajustes correspondientes a los estudios y diseños. Se resolverán dudas y se establecerán plazos para entregas.
- Llevar a cabo la supervisión integral según lo establecido en el manual de interventoría actual de la entidad, en relación con el contrato 4860 del 2023, asegurando que a través de este se lleven a cabo obras de mitigación que reduzcan el rápido aumento del área afectada por el talud sujeto a estabilización.

5.3 Informes especialistas
(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC
(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo
(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 9)

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las actividades de obra realizadas durante abril se llevaron a cabo de manera satisfactoria y eficiente. Este seguimiento ha garantizado el cumplimiento de los estándares de calidad, la adecuada utilización de los recursos y el cumplimiento de los plazos establecidos.

- Se entrega de manera satisfactoria la finalización del proyecto a la comunidad contribuyendo así la accesibilidad y la calidad de la vía en la región

8. ANEXOS

8.1 ***Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.***

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

Ver anexo 15

ANEXOS

Anexo 1
Resumen Mensual Estado General del Proyecto MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total
DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña
PERIODO MES: abr-24

CONVENIO No.: 4014 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER

PLAZO INICIAL: 0,52 meses
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

VALOR INICIAL : $ 200.876.460,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.876.460,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4860 del 2023
INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	103,00
Estructuras	Alcantarillas	und	1,00
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	65	103
Estructuras	Alcantarillas	und	1	1
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 149.913.892,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.497.417,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.465.151,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199.876.460,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 93.305.513,47	$ 93.305.513,47
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.497.417,00	$ 4.497.417,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 15.465.151,00	$ 15.465.151,00
VALOR EJECUTADO	$ 113.268.081,47	$ 113.268.081,47

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 149.910.980,27
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 149.910.980,27
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 1,00 %

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 8
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción de cunetas en concreto



Construcción de concreto ciclopeo



Placa huella



Placa huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2
Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Abril de 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen

CONTRATO No. 4014 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4860 del 2023 **INTERVENTORÍA:** 1570 INGENIERIA SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Vibrador de concreto electrico de aguja	-	12000 VMP	ESMERALDA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
Mezcladora De Concreto	XH-PCM210	-	ESMERALDA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO				2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	87%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	2	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	2	13%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **Maquinaria en actividades de construccion de placa huella**

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Juan Manuel Gómez Peña
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 545021 - 44191 NTS

Firma
Nombre: LIGIA MERCEDES GÓMEZ ARAQUE
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 542022 – 16095 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 3
Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONVENIO No: 4014 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4860 del 2023

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

NOMBRE ARL:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ACOSTA GARCIA JULIAN JESUS	1004863322	Oficial	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	EPS COOSALUD	76840357	$ 52.000	Proteccion (ING + Proteccion)	76840357	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
2	ALVAREZ QUITIAN DEIBER ALFONSO	1010152174	Obrero	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	EPS-S Coosalud	76840357	$ 52.000	Porvenir	76840357	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
3	ASCANIO PORTILLO ELMAR JOSE	1091592081	Obrero	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	EPS-S Coosalud	76840357	$ 52.000	Colpensiones	76840357	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	SANCHEZ ACOSTA YESID ANDREY	1091596742	Obrero	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	EPS-S Coosalud	76840357	$ 52.000	Colpensiones	76840357	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
5	GUERRERO TORRADO BRAYAN CAMILO	1091682856	Obrero	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	76840357	$ 52.000	Porvenir	76840357	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
6	AMAYA PEÑARANDA JOSE YAID	88283554	Maestro	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	EPS-S Coosalud	76840357	$ 52.000	Colpensiones	76840357	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

No se reporta personal porque el contratista se encuentra en actividades de ajuste a los diseños.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Juan Manuel Gómez Peña
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 545021 - 44191 NTS

Firma
Nombre: ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 4
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE OBRA No: 4014 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER

MES INFORME MENSUAL: Abril de 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 del 2023

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
Actual	1212423	GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL -	10	Nación	4014 DE 2023	$ 199.876.460	-
TOTAL						$ 199.876.460	-

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.651.433,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

NO SE REALIZA REPORTE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL YA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REVISION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	OBRA	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	GASTOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL
MENSUAL 2	$ 17.909.664		$ 10.000.000,00	**27.909.664,00**
MENSUAL 3	$ 38.695.803		$ 20.000.000,00	**58.695.802,80**
MENSUAL 4	$ 93.305.513	$ 4.497.417	$ 15.465.151,00	**113.268.081,47**
*				
*				
*				
*				
*				
VALOR TOTAL	**149.910.980,27**	**4.497.417,00**	**45.465.151,00**	**199.873.548,27**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:LIGIA MERCEDES GÓMEZ ARAQUE
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 542022 – 16095 NTS

Firma
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 5
Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No: 4014 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		720
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Juan Manuel Gómez Peña
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 545021 - 44191 NTS

Firma
Nombre: LIGIA MERCEDES GÓMEZ ARAQUE
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 542022 – 16095 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 6
Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 12/05/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No.: 4014 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Aun no se han realizado Ensayo de laboratorio por parte del contratista ni de interventoría

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Juan Manuel Gómez Peña
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 545021 - 44191 NTS

Firma

Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 7
Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 4014 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,52 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.876.460,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.876.460,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20,00	$ 40.175.292,00	21	10	23	31	10	24
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00	$ 10.043.823,00	21	10	23	31	12	26
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00	$ 60.262.938,00	31	12	23	31	12	28

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100293090

Certificado de modificación o anexo No.: 71789898
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	21	10	23	31	12	23
Patronal,Contratista,Subcontratista,Vehiculos Propios y No propios		$ 232.000.000,00	21	10	23	31	12	23

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100072201 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 7178999
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20,00	$ 40.175.292,00	31	12	23	1	3	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00	$ 10.043.823,00	31	12	23	30	4	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00	$ 60.262.938,00	30	4	24	30	4	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100293090

Certificado de modificación o anexo No.: 71852861
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 1/03/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	21	10	23	30	4	24
Patronal,Contratista,Subcontratista,Vehiculos Propios y No propios		$ 260.000.000,00	21	10	23	30	4	24

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100072201 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 71852864
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 1/03/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8
Informes semanales MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 12 del 29/03/2024 al 4/04/2024 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

160 ML DE PLACA HUELLA Y UNA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 5 MTS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 160 m de placa huella en la vereda la Esmeralda y la contruccion de una alcantarilla de 5 mts, municipio de la Playa de Belen

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No.	4014	VALOR INICIAL:	$ 199.876.460,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.876.460,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

INTEGRANTES: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda

CONTRATO No.	4860 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 94.818.000,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 21.182.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.876.460	$ 199.876.460		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.876.460	$ 199.876.460		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.913.892,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66.806.473,80	44,56%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 66.806.473,80	44,56%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.806.473,80	44,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 66.806.473,80	44,56%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.201.007,00	6,80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.201.007,00	6,80%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 64.566.924,80	56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 64.566.924,80	56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.194.854,40	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.194.854,40	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1351223

PERIODO FACTURADO: 1-29 de febrero del 2024

VALOR FACTURA: $ 24.779.417,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 44,5% — Avance o Atraso Físico %:

Meta Física Ejecutada %: 44,5%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Excavaciones varias sin Clasificar	m3	1,8
*	Subbase Granular Clase C	m3	115,06
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	21,77
*	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F)	m3	12,73
*	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	1035
*	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	71,45
*	Instalación de Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F)	m3	0,71
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	8,45
*	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	578
*	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	6
*	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	m3	30,99

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	1,8			0,8	0,037%
Ejec	1,8			0,8	0,037%
Prog	115,06			115,06	12%
Ejec	115,06			115,06	12%
Prog	21,77			21,77	11,06%
Ejec	21,77			21,77	11,06%
Prog	12,73			12,73	4,31%
Ejec	12,73			12,73	4,31%
Prog	1035			1035,00	4,93%
Ejec	1035			1035,00	4,93%
Prog	71,45			71,45	1,46%
Ejec	71,45			71,45	1,46%
Prog	0,71			0,71	0,26%
Ejec	0,71			0,71	0,26%
Prog	8,45			8,45	4,29%
Ejec	8,45			8,45	4,29%
Prog	578			578	2,69%
Ejec	578			578	2,69%
Prog	6			6	3,03%
Ejec	6			6	3,03%
Prog	11			11	0,48%
Ejec	11			11	0,48%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza construcción de placa huella y construcción de alcantarilla

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construcción de la alcantarilla y placa huella en concreto reforzado, concreto ciclopeo y acero de refuerzo.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestras de concreto



Instalación de Concreto reforzado resistencia 21 Mpa para Placa Huella



Construcción de placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda R.L./ 1570 INGENIERIA SAS

Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña | SEMANA No.: 12 del 29/03/2024 al 4/04/2024 | Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

160 ML DE PLACA HUELLA Y UNA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 5 MTS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 160 m de placa huella en la vereda la Esmeralda y la contruccion de una alcantarilla de 5 mts, municipio de la Playa de Belen

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No.	4014	VALOR INICIAL:	$ 199.876.460,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.876.460,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

INTEGRANTES: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda

CONTRATO No.	4860 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 94.818.000,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 21.182.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.876.460	$ 199.876.460		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.876.460	$ 199.876.460		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.913.892,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 83.424.988,80	55,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 83.424.988,80	55,65%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.424.988,80	55,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 83.424.988,80	55,65%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.618.515,00	11,09%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.618.515,00	11,09%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 70.761.779,20	61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 70.761.779,20	61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.194.854,40	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.194.854,40	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1351223

PERIODO FACTURADO: 1-29 de febrero del 2024

VALOR FACTURA: $ 24.779.417,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ##########
Meta Física Ejecutada %: ##########
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Excavaciones varias sin Clasificar	m3	1,8
*	Subbase Granular Clase C	m3	115,06
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	33,97
*	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F)	m3	18,73
*	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	1635
*	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	71,45
*	Instalación de Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F)	m3	0,71
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	8,45
*	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	578
*	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	6
*	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	m3	30,99

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	1,8			0,8	0,037%
Ejec	1,8			0,8	0,037%
Prog	115,06			115,06	12%
Ejec	115,06			115,06	12%
Prog	33,97			33,97	17,25%
Ejec	33,97			33,97	17,25%
Prog	18,73			18,73	6,34%
Ejec	18,73			18,73	6,34%
Prog	1635			1635,00	7,79%
Ejec	1635			1635,00	7,79%
Prog	71,45			71,45	1,46%
Ejec	71,45			71,45	1,46%
Prog	0,71			0,71	0,26%
Ejec	0,71			0,71	0,26%
Prog	8,45			8,45	4,29%
Ejec	8,45			8,45	4,29%
Prog	578			578	2,69%
Ejec	578			578	2,69%
Prog	6			6	3,03%
Ejec	6			6	3,03%
Prog	11			11	0,48%
Ejec	11			11	0,48%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza construcción de placa huella y cuneta

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construcción de la alcantarilla y placa huella en concreto reforzado, concreto ciclopeo y acero de refuerzo.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Construcción de cunetas en concreto



Construcción de cunetas en concreto



Construcción de cunetas en concreto

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda R.L./ 1570 INGENIERIA SAS

Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 14 del 12/04/2024 al 18/04/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

160 ML DE PLACA HUELLA Y UNA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 5 MTS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 160 m de placa huella en la vereda la Esmeralda y la contruccion de una alcantarilla de 5 mts, municipio de la Playa de Belen

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No. 4014 — VALOR INICIAL: $ 199.876.460,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.876.460,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

INTEGRANTES: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda

CONTRATO No. 4860 del 2023 — VALOR INICIAL: $ 94.818.000,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 21.182.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199.876.460	$ 199.876.460		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.876.460	$ 199.876.460		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.913.892,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 91.457.047,80	61,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 91.457.047,80	61,0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 91.457.047,80	61,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 91.457.047,80	61,01%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.618.515,00	11,09%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.618.515,00	11,09%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 76.956.633,60	66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.956.633,60	66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.194.854,40	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.194.854,40	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1351223

PERIODO FACTURADO: 1-29 de febrero del 2024

VALOR FACTURA: $ 24.779.417,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ########## — Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % ##########

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Excavaciones varias sin Clasificar	m3	1,8
*	Subbase Granular Clase C	m3	115,06
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	36,77
*	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F)	m3	24,73
*	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	2035,002
*	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	71,45
*	Instalación de Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F)	m3	0,71
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	8,45
*	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	578
*	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	6
*	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	m3	30,99

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	1,8			0,8	0,037%
Ejec	1,8			0,8	0,037%
Prog	115,06			115,06	12%
Ejec	115,06			115,06	12%
Prog	36,77			36,77	18,68%
Ejec	36,77			36,77	18,68%
Prog	24,73			24,73	8,37%
Ejec	24,73			24,73	8,37%
Prog	2035,002			2035,00	9,70%
Ejec	2035,002			2035,00	9,70%
Prog	71,45			71,45	1,46%
Ejec	71,45			71,45	1,46%
Prog	0,71			0,71	0,26%
Ejec	0,71			0,71	0,26%
Prog	8,45			8,45	4,29%
Ejec	8,45			8,45	4,29%
Prog	578			578	2,69%
Ejec	578			578	2,69%
Prog	6			6	3,03%
Ejec	6			6	3,03%
Prog	11			11	0,48%
Ejec	11			11	0,48%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibrador de concreto electrico de aguja	1	1
Mezcladora De Concreto	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza construcción de placa huella y cuneta

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construcción de la alcantarilla y placa huella en concreto reforzado, concreto ciclopeo y acero de refuerzo.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Construcción de concreto ciclopeo



Construcción de concreto ciclopeo



Construcción de Huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda R.L./ 1570 INGENIERIA SAS

Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña SEMANA No.: 15 del 19/04/2024 al 25/04/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

160 ML DE PLACA HUELLA Y UNA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 5 MTS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 160 m de placa huella en la vereda la Esmeralda y la contruccion de una alcantarilla de 5 mts, municipio de la Playa de Belen

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No. 4014 — VALOR INICIAL: $ 199.876.460,00
FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.876.460,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS
INTEGRANTES: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda

CONTRATO No. 4860 del 2023 — VALOR INICIAL: $ 94.818.000,00
FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 21.182.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.876.460	$ 199.876.460		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.876.460	$ 199.876.460		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.913.892,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 128.424.331,45	85,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 128.424.331,45	85,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 128.424.331,45	85,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 128.424.331,45	85,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 36.967.283,65	24,66%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 36.967.283,65	24,66%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.151.488,00	72%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 83.151.488,00	72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.194.854,40	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.194.854,40	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1351223
PERIODO FACTURADO: 1-29 de febrero del 2024
VALOR FACTURA: $ 24.779.417,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 85,6% Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 85,6%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1,00
*	Excavaciones varias sin Clasificar	m3	3,95
*	Subbase Granular Clase C	m3	115,06
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	74,48
*	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F)	m3	27,28
*	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	3000,00
*	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	71,45
*	Instalación de Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F)	m3	0,71
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	8,45
*	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	578
*	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	6
*	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	m3	30,99

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	3,95			3,95	0,081%
Ejec	3,95			3,95	0,081%
Prog	115,06			115,06	11,95%
Ejec	115,06			115,06	11,95%
Prog	74,48			74,48	37,83%
Ejec	74,48			74,48	37,83%
Prog	27,28			27,28	9,23%
Ejec	27,28			27,28	9,23%
Prog	3000,002			3000,00	14,29%
Ejec	3000,002			3000,00	14,29%
Prog	71,45			71,45	1,46%
Ejec	71,45			71,45	1,46%
Prog	0,71			0,71	0,26%
Ejec	0,71			0,71	0,26%
Prog	8,45			8,45	4,29%
Ejec	8,45			8,45	4,29%
Prog	578			578,00	2,69%
Ejec	578			578,00	2,69%
Prog	6			6,00	3,03%
Ejec	6			6,00	3,03%
Prog	11			11,00	0,48%
Ejec	11			11,00	0,48%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibrador de concreto electrico de aguja	1	1
Mezcladora De Concreto	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza construcción de placa huella y cuneta

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construcción de la alcantarilla y placa huella en concreto reforzado, concreto ciclopeo y acero de refuerzo.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción de concreto ciclopeo



Construcción de concreto ciclopeo



Construcción de Huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda R.L./ 1570 INGENIERIA SAS

Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña SEMANA No.: 16 del 26/04/2024 al 2/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

160 ML DE PLACA HUELLA Y UNA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 5 MTS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 160 m de placa huella en la vereda la Esmeralda y la contruccion de una alcantarilla de 5 mts, municipio de la Playa de Belen

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No. 4014 — VALOR INICIAL: $ 199.876.460,00
FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.876.460,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS
INTEGRANTES: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda

CONTRATO No. 4860 del 2023 — VALOR INICIAL: $ 94.818.000,00
FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 21.182.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.876.460	$ 199.876.460		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.876.460	$ 199.876.460		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.913.892,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149.910.980,27	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 149.910.980,27	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 149.910.980,27	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 149.910.980,27	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.486.648,82	14,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.486.648,82	14,33%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 89.346.342,40	77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 89.346.342,40	77%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.194.854,40	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.194.854,40	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1351223
PERIODO FACTURADO: 1-29 de febrero del 2024
VALOR FACTURA: $ 24.779.417,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100% Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 100%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1,00
*	Excavaciones varias sin Clasificar	m3	4,37
*	Subbase Granular Clase C	m3	115,06
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	94,00
*	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F)	m3	30,28
*	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	3517,50
*	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	71,45
	Excavaciones en roca en seco	m3	7,7
*	Instalación de Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F)	m3	0,71
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	9,6
*	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	578
*	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	6
*	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	m3	30,99

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	4,37			4,37	0,089%
Ejec	4,37			4,37	0,089%
Prog	115,06			115,06	11,95%
Ejec	115,06			115,06	11,95%
Prog	94,00			94,00	47,75%
Ejec	94,00			94,00	47,75%
Prog	30,28			30,28	10,24%
Ejec	30,28			30,28	10,24%
Prog	3517,5			3517,50	16,76%
Ejec	3517,5			3517,50	16,76%
Prog	71,45			71,45	1,46%
Ejec	71,45			71,45	1,46%
Prog	7,7			7,70	0,34%
Ejec	7,7			7,70	0,34%
Prog	0,71			0,71	0,26%
Ejec	0,71			0,71	0,26%
Prog	9,6			9,60	4,88%
Ejec	9,6			9,60	4,88%
Prog	578			578,00	2,69%
Ejec	578			578,00	2,69%
Prog	6			6,00	3,03%
Ejec	6			6,00	3,03%
Prog	11			11,00	0,48%
Ejec	11			11,00	0,48%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibrador de concreto electrico de aguja	1	1
Mezcladora De Concreto	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza construcción de placa huella y cuneta

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construcción de la alcantarilla y placa huella en concreto reforzado, concreto ciclopeo y acero de refuerzo.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	Programado	100%
	Ejecutado	100%
Placa huella	Programado	100%
	Ejecutado	100%
alcantarillas	Programado	100%
	Ejecutado	100%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción de concreto ciclopeo



Construcción de concreto ciclopeo



Construcción de Huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda R.L./ 1570 INGENIERIA SAS

Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 9
Equipo Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 12/05/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Abril de 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda la Esmeralda, municipio Playa de Belen

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4860 del 2023

INTERVENTORÍA: 1570 INGENIERIA SAS

CONTRATO DE OBRA No. 4014 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA NORTE DE SANTANDER

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
VEHICUO TIPO CAMIONETA	CHEVROLET TRACKER 2022	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
VEHICUO TIPO MOTOCICLETA	YAMAHA MTN155-A 2024	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 10
Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1-31 de marzo del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No.: 4596-2023, 4620-2023, 4621-2023, 4680-2023, 4014-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA ISLITAS; JUNTA ACCION COMUNALVEREDA PUEBLO NUEVO; JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN; JUNTA ACCION COMUNALVEREDA MESA RICA; JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA	1.979.237	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.914.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	33%	1570 INGENIERIA SAS	30	$ 133.300,0	V	NUEVA EPS	29671396	$ 76.600,0	PORVENIR	29671396	$ 306.300,0	$ 76.600,00	$ -	$ -	
2	LIGIA MERCEDES GOMEZ ARAQUE	1.091.660.295	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.700.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 188.000,0	V	NUEVA EPS	29670708	$ 108.000,0	PORVENIR	29670708	$ 432.000,0	$ 108.000,00	$ -	$ -	
3	WILMER LOPEZ AVENDAÑO	88.276.646	INSPECTOR	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 90.500,0	V	NUEVA EPS	29670708	$ 52.000,0	PORVENIR	29670708	$ 208.000,0	$ 52.000,00	$ -	$ -	
4	ESTIVENSON ARLEY VERGEL GÓMEZ	1.091.657.185	INSPECTOR	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 90.500,0	V	SANITAS	29670708	$ 52.000,0	PORVENIR	29670708	$ 208.000,0	$ 52.000,00	$ -	$ -	
5	CARLOS ANDRES ORTIZ LOPEZ	1.004.862.283	INSPECTOR SST	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 90.500,0	V	SANITAS	29670708	$ 52.000,0	PORVENIR	29670708	$ 208.000,0	$ 52.000,00	$ -	$ -	
6	EDUARDO ESTEBAN ALVAREZ ZUÑIGA	1.091.655.834	INSPECTOR	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 90.500,0	V	NUEVA EPS	29670708	$ 52.000,0	COLPENSIONES	29670708	$ 208.000,0	$ 52.000,00	$ -	$ -	
7	DIONISIO PAEZ BARRIGA	13.499.710	INSPECTOR	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 90.500,0	V	SANITAS	29670708	$ 52.000,0	COLPENSIONES	29670708	$ 208.000,0	$ 52.000,00	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 11.114.000,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 24/4/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Representante Legal
1570 INGENIERIA SAS
Matrícula No.: 54202-211214 NTS

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 11
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4860 del 2023

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: 1-31 de marzo del 2024

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No:
4596-2023 JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA ISLITAS
4620-2023 JUNTA ACCION COMUNALVEREDA PUEBLO NUEVO
4621-2023 JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN
4680-2023 JUNTA ACCION COMUNALVEREDA MESA RICA
4014-2023

CONTRATISTA: JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1351223	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Contrato principal	$94.818.000,00	$ 28.537.189,60
2023	1397723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	ADICIONAL 1	$21.182.000,00	$ 21.182.000,00
			TOTAL			$ 116.000.000,00	$ 49.719.189,60

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 116.000.000,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1351223 de 11/12/2023	$ -	$ 94.818.000,00		CONTRATO PRINCIPAL
								1397723 de 19/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ADICIONAL
1	15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -				1351223 de 11/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ACTA EN CERO
2	1 AL 31 DE ENERO DEL 2024	$ 7.406.080,00	$ 1.407.155,20	$ 8.813.235,20				1351223 de 11/12/2023	$ 8.813.235,20	$ 107.186.764,80	RADICADO No 965 DE FECHA 02 MARZO 2024	
3	1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	$ 20.823.040,00	$ 3.956.377,60	$ 24.779.417,60				1351223 de 11/12/2023	$ 33.592.652,80	$ 82.407.347,20	RADICADO No 2020 DE FECHA 3 ABRIL 2024	
4	1 AL 31 DE MARZO DEL 2024	$ 27.469.040,00	$ 5.219.117,60	$ 32.688.157,60				1351223 de 11/12/2023	$ 66.280.810,40	$ 49.719.189,60		PRESENTE TRÁMITE
	TOTALES	$ 55.698.160,00	$ 10.582.650,40	$ 66.280.810,40					$ 66.280.810,40	$ 49.719.189,60		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 46.978.160,00	$ 8.925.850,40	$ 55.904.010,40
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 8.720.000,00	$ 1.656.800,00	$ 10.376.800,00
*			
VALOR TOTAL	$ 55.698.160,00	$ 10.582.650,40	$ 66.280.810,40

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Álvaro Ernesto Castro Peñaranda
Representante Legal
1570 INGENIERIA SAS
Matrícula No.: 54202-211214 NTS

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12
Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 del 2023

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARI, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIALOCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,5 mes

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/02024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 94.818.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaime Fernandez

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8%	$ 9.481.800,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16%	$ 18.963.600,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	25%	$ 28.445.400,00	6	12	2023	6	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101213876

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Segusros del Estado SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.600.000,00	22	12	2023	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.200.000,00	15	12	2023	31	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 34.800.000,00	15	12	2023	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101213876

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-11214NTS

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13
Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RELACION DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO
		VERSIÓN
		PÁGINA

FECHA 12/05/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OF-019- 2024	02 de abril de 2024	ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ RUEDAS	INVITACIÓN A REUNIÓN DE CAPACITACIÓN A JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
OF-020- 2024	17 de abril de 2024	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	Concepto de no Implementación del PAGA y traslado de recursos de Gestión Ambiental.
OF-021- 2024	18 de abril de 2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	AVAL PARA SOLICITUD DE PRORROGA No.2 DEL CONVENIO 4596 DE 2023
OF-022- 2024	18 de abril de 2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	AVAL PARA SOLICITUD DE PRORROGA No.2 DEL CONVENIO 4680 DE 2023
OF-023- 2024	18 de abril de 2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	AVAL PARA SOLICITUD DE PRORROGA No.2 DEL CONVENIO 4014 DE 2023
OF-024- 2024	29 de abril de 2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO No.4860 DEL 2023 DE INTERVENTORÍA
OF-025- 2024	29 de abril de 2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO N° 4860 DEL 2023 DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


Anexo 14
Registro fotográfico

	
Construcción de Cuneta	Construcción de Concreto ciclópeo
	
Construcción de Concreto ciclópeo	Construcción de alcantarilla

	
Construcción de Cuneta	Construcción de Concreto ciclópeo
	
Placa Huella	Placa Huella

Anexo 15
Bitácora del mes correspondiente

01 Abril 2024
Estado del tiempo clima: Soleado
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro
(1) oficial (5) Ayudantes Equipos: Mezcladora, vibro
de concreto y herramienta menor. se continua
fundiendo losas de placa huella en concreto y
Personal de Interventoria: Ing Residente.



Ing Residente obra

02 Abril 2024
Estado del tiempo clima: Soleado
personal del contratista: Ing Residen (1) Maestro

líder

(1) oficial (5) Ayudantes Equipos: Mezcladora, vibro de concreto y herramiente menor. Personal de Interventoria: Ing Residente se realiza continuacion del encofrado de la placa huella

Ing Residente obra

03 Abril 2024
estado del tiempo clima: soleado
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes Equipos: Mezcladora, vibro de concreto, Canguro y herramienta menor Personal de Interventoria: Ing Residente. se inicia relleno con material de excavacion de la alcantarilla y se compacta con canguro.

Ing Residente obra

04 Abril 2023
Estado del tiempo clima: llovia 1 hora.
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes. Equipos: Mezcladora vibro de concreto, Canguro y herramienta menor Personal de Interventoria: Ing Residente se realiza reflonte y relleno en unos sectores de la via y se compacta con canguro. se continua fundiendo losas en concreto D para placa huella e instalacion de acero de refuerzo

Ing Residente obra

líder

5 de Abril 2024
estado de tiempo clima: soleado
personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes equipo: Mezcladora, vibro de concreto y herramienta menor Personal de Interventoria: Ing Residente se continua fundiendo losas en concreto ciclopeo y viga riostra de la placa huella.

J.E.D.6
Ing Residente obra

6 Abril 2024
estado del tiempo clima: soleado
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes equipos: Mezcladora, vibro de concreto y herramienta menor Personal de Interventoria: Ing Residente se realiza instalacion de acero de refuerzo para conata y bordillo.

J.E.D.6
Ing Residente obra

7 Abril 2024
No se labora dia feriado

8 Abril 2024
estado del tiempo Clima: soleado
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes equipos: Mezcladora, vibro de concreto y herramienta menor. se continua con instalacion de acero de refuerzo

líder

de concreta y bordillo se continua encofrando losas huella. —— // ——

J.G.
Ing Residente obra

9 de Abril 2024
Estado del tiempo clima: Soleado
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro — (1) oficial (5) Ayudante Equipos: Mezcladora, vibro de concreto y herramienta menor. — /——
Personal de Interventoria: Ing Residente
se inicia fundida de concreta y bordillo para placa huella y encofrado de losas.

J.G.
Ing Residente obra

10 Abril 2024
Estado del tiempo clima: soleado
Personas del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudante Equipos: Mezcladora, vibro de concreto y herramienta menor.
Personal de Interventoria: Ing Residente
se realiza fundida de bordillo y instalacion de acero para concreta y bordillo. para placa huella.

J.G.
Ing Residente obra

11 de Abril 2024
Estado del tiempo clima: soleado

líder

Personal del Contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudante Equipo: Mezcladora Vibro de concreto y herramienta menor. —/—
Personal de Interventoria: Ing Residente se realiza fundida de losa en concreto D y encofrado. ——/——

Ing Residente obra

12 Abril 2024
Estado del tiempo clima: soleado
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes Equipos: Mezcladora, vibro de concreto y herramienta menor.
Personal de Interventoria: Ing Residente se continua fundiendo concreto ciclopeo viga riostra y cuneta. se realiza instalación de acero para Rampa de acceso a la placa huella. ——/——

Ing Residente obra

13 Abril 2024
Estado del tiempo clima: soleado
Personal del Contratista: Ing Residente (1) Maestro, (1) oficial (5) Ayudantes equipos Mezcladora, vibro concreto y herramienta menor. Personal de Interventoria: Ing Residente Se continua encofrando y se funde losas en concreto D para placa huella. ——/——

Ing Residente obra.

14 de Abril 2024
No se labora día feriado

15 de Abril 2024
Estado del tiempo clima: Soleado
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes equipos: Mezcladora vibro de concreto. Y herramienta menor.
Personal de Interventoria: Ing Residente
se realiza fundida de cuneta, bordillo y Rampa de acceso de la placa huella. se continua encofrando. ——/——

Ing Residente obra

16 ABril 2024
Estado del tiempo clima: Soleado
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes Equipos: Mezcladora, vibro de concreto y herramienta menor.
Personal de Interventoria: Ing Residente.
Se continua fundendo losas de concreto D y losas en concreto ciclopeo para placa huella. Se continua encofrando. ——//——

Ing Residente obra

17 Abril 2024
Estado del tiempo clima:
personal del contratista: Ing Residente obra (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes Equipos:

líder

Mezcladora, vibro de concreto y herramienta menor.
Personal de Interventoria: Ing Residente.
Se continua fundiendo losas en concreto D y sobre ancho en concreto ciclopeo. se continua encofrando para placa huella. ——//——

J.G.G
Ing Residente obra

18 de Abril 2024
estado del tiempo clima: soleado
Personal del contratista: Ing Residente (1) maestro (1) oficial (5) Ayudantes equipos: Mezcladora, vibro de concreto y herramienta menor.
Personal de Interventoria: Ing Residente
Se continua fundiendo losa centro en concreto ciclopeo se funde vigas riostras en concret D, instalacion de acero refuerzo para placa huella.

J.G.G
Ing Residente obra

19 de Abril 2024
estado del tiempo Clima: soleado
Personal del Contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes equipos: Mezcladora, vibro de concreto y herramienta menor
Personal de Interventoria: Ing Residente
se continua fundiendo cunetas, se realza muestra de cilindros en concreto D

J.G.G
Ing Residente obra

líder

20 de Abril 2024
estado del tiempo Clima: Soleado
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes Equipos: Mezcladora vibro de concreto y herramienta menor.
Personal de Interventoria: Ing Residente
se continua encofrando e instalando acero de refuerzo para placa huella. se continua fundiendo bordillos. — // —

J.E.G
Ing Residente obra

21 de Abril 2024
No se labora día festado

22 de Abril 2024
Estado del tiempo Clima: Nublado
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes Equipos: Mezcladora, vibro de concreto y herramienta menor.
Personal de Interventoria: Ing Residente
se continua realizando fundida de losas en concreto D, Instalación de acero para placa huella

J.E.G
Ing Residente obra

23 Abril 2024
Estado del tiempo clima: soleado
Personal de interventoria: Ing Residente —
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes —

líder

Equipos: Mezcladora, vibro de concreto y herramienta menor Se continua encofrando se realiza excavaciones para los vigas riostras e instalacion de acero para placa huella.

Ing Residente obra

24 de Abril 2024
estado del tiempo Clima: soleado
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes Equipos: Mezcladora, vibro de concreto y herramienta menor. Personal de Interventoria: Ing Residente. se continua realizando instalacion acero de refuerzo para cuneta y bordillo. se continua fundiendo sobre ancho y centro en concreto ciclopeo.

Ing Residente obra

25 de Abril 2024
Estado del tiempo Clima: soleado
Personal del contratista: Ing Residente. (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes equipos mezcladora. vibro de concreto y herramienta menor. Personal de Interventora: Ing Residente se continua encofrando y se funde losas y cunetos en concreto D

Ing Residente obra

26 de Abril 2024
Estado del tiempo clima: Soleado
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) Oficial (5) Ayudantes Equipos: Mezcladora, vibro de concreto Personal de Interventoria: Ing Residente: se realiza fundida de bordillos losas en concreto D y losa centro en concreto acpeo — // ——

J.C.G
Ing Residente obra

27 de Abril
estado del tiempo clima: soleado
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudantes Equipos: Mezcladora. vibro de concreto y herramenta menor Personal de Interventoria: Ing Residente se continua fundiendo cunetas y bordillos en concreto D, se realiza instalacion de acero de vigas riostras y fundidos en concreto D. —— // ——

J.C.G
Ing Residente obra

28 de Abril 2024

No se labora día feriado

29 de Abril 2024
Estado del tiempo clima: soleado
Personal del contratista: Ing Residente

líder

(1) Maestro (1) oficial (5) Ayudante equipos: Mezcladora, vibro de concreto y herramiento menor Personal de Interventoria: Ing Residente se continua fundiendo bordillo se realiza instalacion de acero de refuerzo para Rampa final y vigas riostra para luego realizar la fundida en concreto D. — // —

Ing Residente obra

30 de Abril
estado del tiempo Clima: Soleado
Personal del contratista: Ing Residente (1) Maestro (1) oficial (5) Ayudante. Personal de Interventoria: Ing Residente se realiza limpieza con el personal de obra

Ing Residente obra
