2061

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 27 de Septiembre del 2023 **OF-C249 -2023-157**

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

28 SEP 2023
3083
11:26

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META" 1

ASUNTO: Entrega de informe mensual de obra corregido mes de Mayo

Por medio de la presente me permito realizar entrega del informe de obra corregido correspondiente al periodo de mayo realizado por el contratista de obra de tal forma se implementa formato GES-FO-126 se complementan anexos y se entregan informes de seguimiento para lo cual se anexan:

Informe de obra formato GES-FO-126
Informe de gestión SST
Informe de seguimiento plan de manejo ambiental
Informe de seguimiento plan de manejo de transito

Cabe anotar que aun queda pendiente la entrega del informe de seguimiento al plan de gerencia, del mes de mayo el cual no se ha corregido ni entregado a la interventoría.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

2063

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 30 de junio de 2023 OF-C249 -2023-081

Señores:

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

30 JUN 2023
1805
11:00 Feliper.

REF: CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION ~~DE LOS~~ ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION ~~DE LOS~~ ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Entrega de informe mensual de obra No 1

Respetados señores:

Acorde a las obligaciones contractuales adquiridas por la interventoría me permito hacer entrega de la documentación correspondiente al informe mensual de obra entregado por el contratista de obra formato GES-FO 126 se realiza entrega de informe, anexos y soportes acorde a lo implementado en el formato entregado por la entidad.

Se anexan 4 carpetas

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

INFORME DE OBRA No. 01

Periodo de 10, 05, 2023 a 31, 05, 2023
Fecha de Presentación: 08, 06, 2023

INFORMACIÓN BASICA	
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO 1:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
OBJETO PROYECTO 2:	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
OBJETO PROYECTO 3:	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
VALOR DEL PROYECTO 1:	$ 31.845.658.891 BPIN 2022005500024
VALOR DEL PROYECTO 2:	$ 8.805.724.533 BPIN 2022005500022
VALOR DEL PROYECTO 3:	$ 10.220.557.418 BPIN 2022005500094
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR ACTUALIZADO:	$50.871.940.842
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
CORREO ELECTRONICO:	escenariosdeportivos2023@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 de 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
CORREO ELECTRONICO:	interescenariosc@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de Mayo de 2023
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

FECHA DE TERMINACIÓN	09 de Mayo de 2024
12 Meses	0 Días

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO ESCENARIOS MULTIPROPOSITO

MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°8´24"N 73°37´06"W		

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO PISTA DE PATINAJE

MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°8´21"N 73°37´07"W		


LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO PISTA DE ATLETISMO

MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°8´24"N 73°37´13"W		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

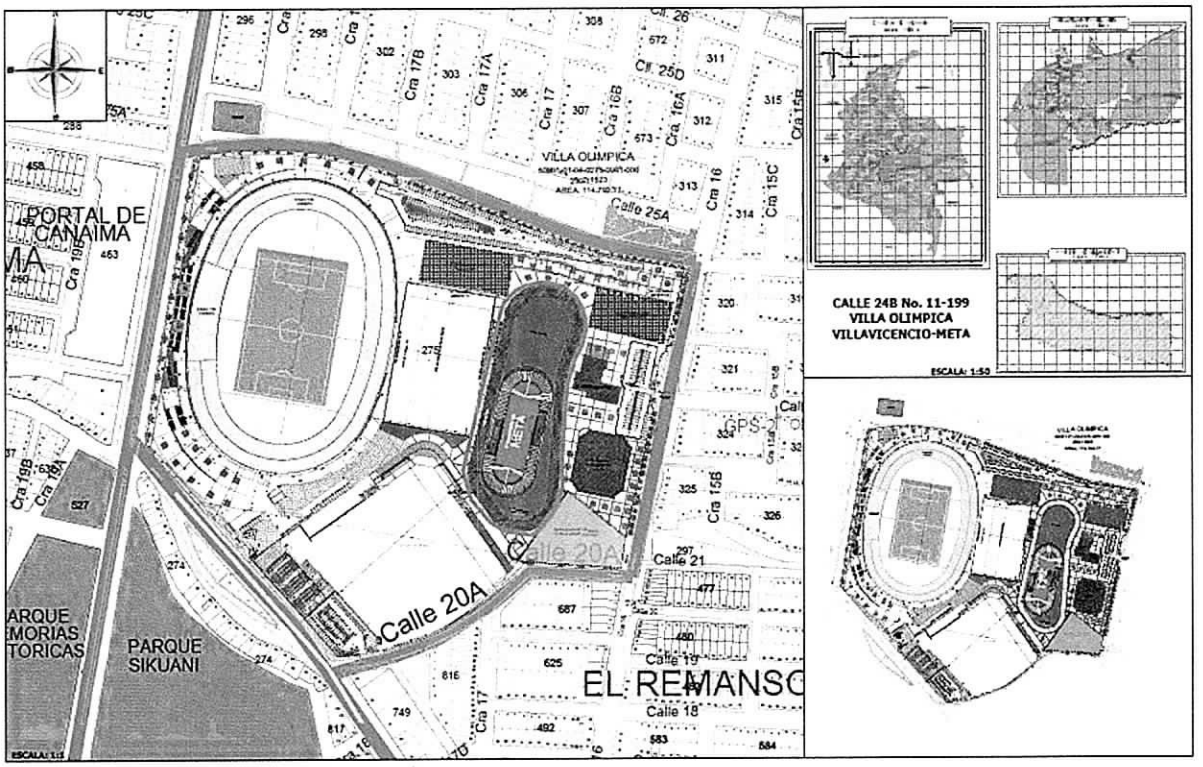

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

2067

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Avance físico

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	0.06%	$ 20,311,140	0.06%	$ 20,311,140	0.07%	$ 22,452,607	0.07%	$ 22,452,607
CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	0.19%	$ 16,297,752	0.19%	$ 16,297,752	0.40%	$ 35,635,088	0.40%	$ 35,635,088
CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	0.026%	$ 2,646,674	0.026%	$ 2,646,674	0.027%	$ 2,805,105	0.027%	$ 2,805,105
CONTRATO No.106 DE 2023	**0.08%**	**$ 39,255,566**	**0.08%**	**$ 39,255,566**	**0.12%**	**$ 60,892,800**	**0.12%**	**$ 60,892,800**


Para el avance físico de cada proyecto se tomó la relación con el presupuesto de cada uno de ellos.


Para el avance físico general del contrato se tomó la suma de las ejecuciones de cada proyecto con relación al valor total del contrato. Se adjunta como anexo el cuadro detallado por cada actividad.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

Grafica Avance Físico

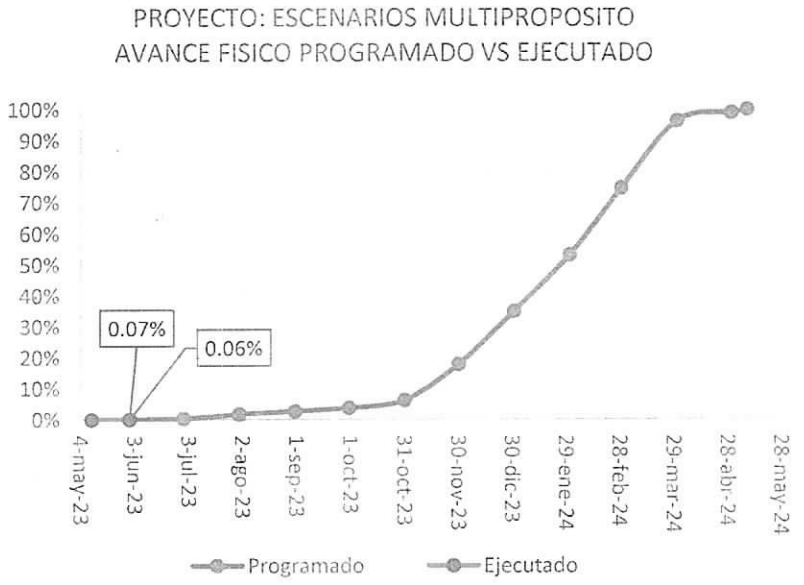

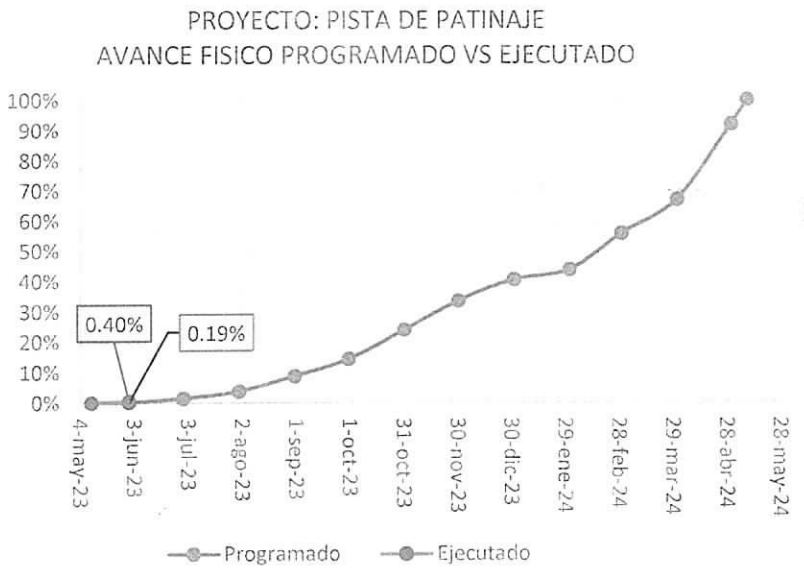


Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia


AL SERVICIO DE LA GENTE

2069

PROYECTO: PISTA DE ATLETISMO
AVANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADO

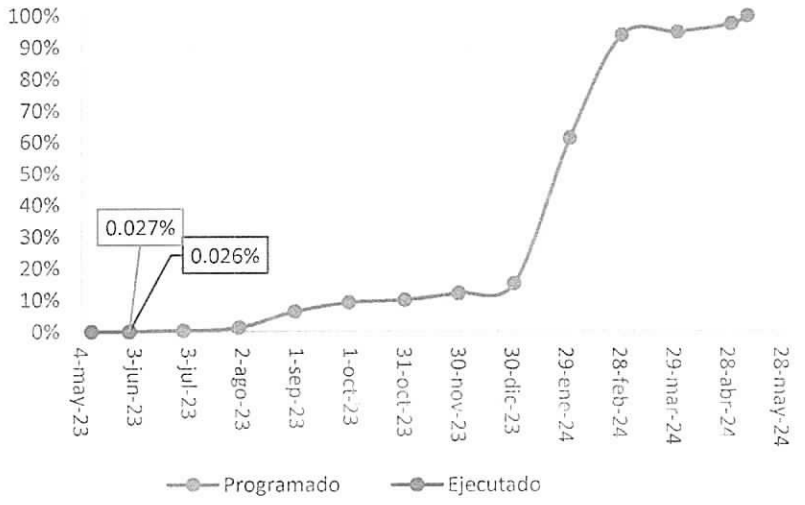

RESUMEN CONTRATO No.106 DE 2023
AVANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADO

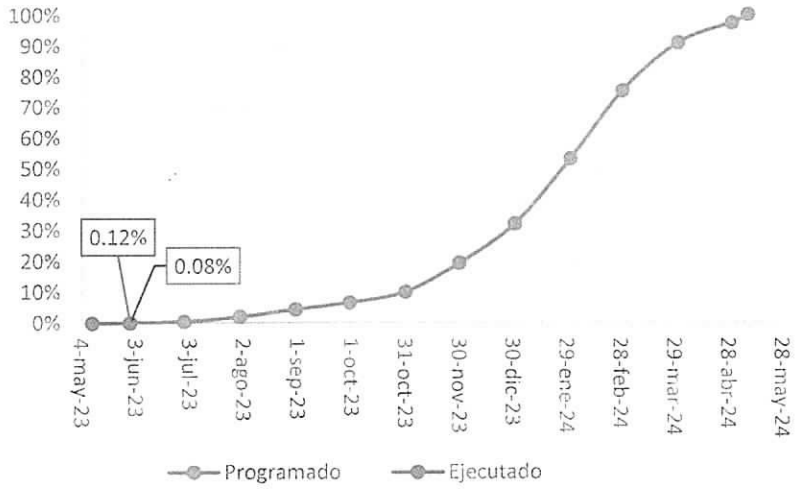

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo de los proyectos, Comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
13-04-2023	Acta	Acta de visita a obra inicial	Contratista-Interventoría	Idermeta
18-04-2023	Acta	Socialización de inicio	Contratista	Comunidad
19-04-2023	Acta	Comité de empalme para inicio de obras fase 2	Contratista-Interventoría	Idermeta
28-04-2023	Acta	Revisión de permisos y licencias	Contratista-Interventoría	Idermeta
28-04-2023	Acta	Revisión de estudios y diseños	Contratista-Interventoría	Idermeta
28-04-2023	Acta	Verificación de servicios públicos	Contratista-Interventoría	Idermeta
28-04-2023	Acta	Verificación de documentación previa al inicio de obra	Contratista-Interventoría	Idermeta
17-05-2023	Acta	Entrega de coliseos menores (voleibol, pesas, lucha, taekwondo, boxeo) y pista de patinaje	Idermeta-Interventoría	Contratista
24-04-2023	PL-120-178	Concepto técnico pista de atletismo	Idermeta	Contratista
26-04-2023	CEDVO-03-2023	Solicitud de información	Rep. Legal Contratista	Interventoría
27-04-2023	CEDVO-04-2023	Solicitud de información	Rep. Legal Contratista	Interventoría
28-04-2023	CEDVO-05-2023	Entrega radicada PMT	Rep. Legal Contratista	Interventoría
02-05-2023	OF-C459-2022-020	Revisión documentación previa acta de inicio	Interventoría	Contratista
05-05-2023	CEDVO-06-2023	Entrega documentación previa al acta de inicio	Rep. Legal Contratista	Interventoría
09-05-2023	CEDVO-07-2023	Cerramiento de obra propuesto	Rep. Legal Contratista	Interventoría
11-05-2023	CEDVO-08-2023	Solicitud memorias A.LL. Fase 1 villa olímpica	Rep. Legal Contratista	Interventoría
11-05-2023	CEDVO-09-2023	Solicitud de conexión provisional a medidor existente	Rep. Legal Contratista	Idermeta

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
12-05-2023	CEDVO-10-2023	Observaciones al diseño pavimento pista de atletismo	Rep. Legal Contratista	Interventoría
12-05-2023	OF-C459-2022-26	Solicitud de documentación inicio de obra	Interventoría	Contratista
12-05-2023	Of-c459-2022-27	Solicitud de documentación para pago de anticipo	Interventoría	Contratista
13-05-2023	CEDVO-11-2023	Aclaraciones a la pista de atletismo	Rep. Legal Contratista	Interventoría
13-05-2023	CEDVO-12-2023	Aclaraciones a los diseños de escenarios deportivos multipropósito	Rep. Legal Contratista	Interventoría
16-05-2023	CEDVO-13-2023	Entrega pólizas actualizadas según acta de inicio	Rep. Legal Contratista	Interventoría
16-05-2023	PL-120-223	Autorización conexión eléctrica a medidor existente	Idermeta	Contratista
17-05-2023	CEDVO-15-2023	Escombreras autorizadas	Rep. Legal Contratista	Cormacarena
17-05-2023	CEDVO-16-2023	Solicitud de aprovechamiento forestal	Rep. Legal Contratista	Sec. Medio Ambiente Villavicencio
17-05-2023	CEDVO-17-2023	Especímenes Arbóreas nativos de la zona	Rep. Legal Contratista	Cormacarena
18-05-2023	CEDVO-18-2023	Solicitud catastro de redes	Rep. Legal Contratista	Gerencia técnica EAAV
19-05-2023	OF-C249-2023-30	Solicitud autorización para contratar		
24-05-2023	CEDVO-21-2023	Informe de Ítem No Previstos en Demoliciones	Rep. Legal Contratista	Interventoría
24-05-2023	OF-C249-2022-31	Solicitud copia de subcontratos	Interventoría	Contratista
24-05-2023	OF-C249-2022-32	Solicitud documentación para pago de anticipo	Interventoría	Contratista
24-05-2023	OF-C249-2022-33	Solicitud documentación inicio de obra	Interventoría	Contratista
25-05-2023	CEDVO-22-2023	Solicitud retiro de material de desmontes	Rep. Legal Contratista	Interventoría
25-05-2023	CEDVO-23-2023	Aclaraciones para los diseños de pista de patinaje	Rep. Legal Contratista	Interventoría

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
25-05-2023	OF-C249-2023-36	Solicitud actualización programación de obra	Interventoría	Contratista
26-05-2023	OF-C249-2023-39	Solicitud informe mensual y envío de anexos del informe	Interventoría	Contratista
29-05-2023	CEDVO-24-2023	Aclaraciones puntos eléctricos de pista de patinaje	Rep. Legal Contratista	Interventoría
29-05-2023	CEDVO-27-2023	Entrega plan de inversión del anticipo	Rep. Legal Contratista	Interventoría
30-05-2023	OF-C249-2022-40	Traslado de circular 006 DNP para elaboración de valla informativa	Interventoría	Contratista
30-05-2023	OF-C249-2022-41	Medidas ambientales, licencias, permisos, escombreras	Interventoría	Contratista
30-05-2023	OF-C249-2022-41	Inversión y manejo de anticipo	Interventoría	Contratista
30-05-2023	OF-C249-2022-43	Seguridad industrial, señalización, manejo de tránsito, implementación PMT aprobado por movilidad	Interventoría	Contratista
30-05-2023	OF-C249-2022-44	Envío de lista documental actualizada para pago formato GES-FO-143.	Interventoría	Contratista
30-05-2023	OF-C249-2022-45	Autocontrol calidad materiales, procesos y productos topografía y bitácora	Interventoría	Contratista
30-05-2023	OF-C249-2022-46	Reiteración entrega perentoria escenarios faltantes	Interventoría	Idermeta
30-05-2023	OF-C249-2022-47	Directrices de disposición entrega de desmontes	Interventoría	Idermeta
30-05-2023	OF-C249-2023-48	Observaciones análisis de precios unitarios	Interventoría	Contratista
31-05-2023	OF-C249-2023-49	Entrega de actas de vecindad	Interventoría	Idermeta

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

- Demora en la entrega de los escenarios deportivos existentes:
  Se propone a la entidad realizar entrega parcial de los escenarios que ya fueron desocupados por las ligas (voleibol, lucha taekwondo, pesas, boxeo y pista de patinaje).

- Solicitud de planos de edificaciones existentes a demoler:
  Se detecto durante la revisión de los planos de diseño y memorias de cantidades de los proyectos, que las plantas arquitectónicas no coincidían con la distribución actual que presentaban a la fecha del recibido, por tal motivo se solicito a la entidad los planos actualizados de dichas edificaciones, pero no fue posible obtenerlos. Es por ello, que se requiere que la comisión topográfica y el personal técnico de obra realice el levantamiento arquitectónico y estructural de las edificaciones a demoler y elaborar los planos récord para el control y seguimiento de las actividades en obra.

- Solicitud de redes existentes:
  Se detecto durante la revisión de los planos de diseño que las redes hidrosanitarias de los nuevos escenarios se conectaban a la red actual de cada servicio, pero estos no estaban planteados en los mismos planos. Se tuvo que emplear la comisión de topografía para realizar el levantamiento de las redes existentes con el fin de determinar posibles intercepciones con las nuevas edificaciones.
  De igual forma pasa con las redes eléctricas existentes en cada escenario.

- Salida segura de vehículos de carga:
  Durante la elaboración del plan de manejo de transito-PMT para el proyecto, se tenía gran preocupación por la seguridad de usuarios del complejo deportivo, en su mayoría niños de las diferentes ligas que fueron reubicadas en el coliseo de tenis de mesa, debido a la circulación diaria que se tiene. Es por ello que se propuso la apertura de una nueva salida hacia la carrera 16 exclusivamente para la salida vehicular y peatonal de la obra.

- Tala de árboles que interfieren con las nuevas edificaciones:
  Se evidencio durante la implantación de las nuevas edificaciones en el predio que existen 10 arboles que interfieren con la cimentación de los coliseos multipropósito, la cimentación de la pista de patinaje y la proyección de nuevos parqueaderos. Por tal motivo se inicio el tramite ante la secretaria de medio ambiente de Villavicencio. Se debe incorporar al presupuesto las actividades de tala de arboles como ítem no previstos.

- Durante el inicio de las actividades de desmontes y demoliciones de cada escenario, se evidencio actividades necesarias para la terminación del capítulo, las cuales no se encuentran incorporadas en el presupuesto de obra y que requieren entonces la aprobación por parte de la entidad contratante. Para ello se radico el debido soporte y los análisis de precios unitarios propuestos por el consorcio para su aprobación.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

2074

4. ESTADO DEL TIEMPO
Frecuencia.

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	0
TORMENTA	0
LLUVIOSO	2
SOLEADO	13

OBSERVACIONES:
Los días 24, 26, 30 y 31 de mayo se presentaron fuertes lluvias en horas de la madrugada, por fuera de la jornada laboral.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

Conceptuar acerca de la adecuada o inadecuada aplicación de los métodos constructivos o actividades desarrolladas para la entrega de los productos

PROYECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTPROPOSITO:

- Una vez se da inicio de obra al contrato de obra No.106 de 2023, se inicia con el cerramiento de obra, el cual se realiza con madera rolliza y tejas de zinc a una altura de 2.00m. Esto con el fin de impedir el paso de personas ajenas al desarrollo del proyecto y los cuales puedan llegar a afectar o verse afectados por las actividades en ejecución.

- Se inicia las actividades de desmontes de aparatos sanitarios, puertas y ventanas de los coliseos que fueron entregados el día 17 de mayo. Los materiales retirados fueron dispuestos en un área determinada para su posterior entrega a la entidad, la cual será la encargada de realizar el retiro de los mismos. Todo el personal cuenta con sus elementos de seguridad industrial, EPP's, equipos y herramienta menor acorde a la actividad a realizar. Se realiza el control y supervisión por parte de la coordinadora SST del consorcio.

- Para el retiro de barandas en el coliseo de voleibol se tuvo que emplear equipo de oxicorte ya que esta se encuentra embebida en las graderías en concreto. Se realizaron cortes cada 6m para facilitar su posterior retiro de obra. Se realiza antes del inicio de cada actividad, la inspección de los equipos a utilizar.

- Seguidamente, se inicia también el desmonte de la fachada del coliseo de Voleibol y la estructura metálica que la soporta. Para ello se emplea equipo de izaje como el manlif, el cual cuenta con canastilla para que el personal pueda tener una posición segura al realizar la actividad. Todo el personal cuenta con sus elementos de seguridad industrial, EPP's y certificación de trabajo en alturas para realizar la actividad. Se realiza el control y supervisión por parte de la coordinadora SST del consorcio.

PROYECTO PISTA DE PATINAJE:

- Para el retiro de barandas de la pista de velocidad y pista de ruta, se tuvo que emplear equipo de oxicorte ya que esta se encuentra embebida en las placas de concreto o muros de contención perimetral. Se realizaron cortes cada 6m para facilitar su posterior retiro de obra. Se realiza antes del inicio de cada actividad, la inspección de los equipos a utilizar.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

- Una vez se retiran las barandas metálicas se inicia la demolición de las placas de concreto de la parte interna de la pista de velocidad, luego la pista de velocidad como tal, a continuación, las placas de andenes y senderos peatonales que se encuentran entre las dos pistas, además de las graderías en concreto existentes, para luego terminar con la demolición del pavimento en asfalto de la pista de velocidad. Esta actividad se realiza con una retroexcavadora sobre orugas. El retiro del material de demolición no está presupuestado en el contrato por lo tanto se informa a interventoría y se propone un ítem contractual que se presenta en otro capítulo del presupuesto. Adicional, para el pago de la disposición final de los escombros y material vegetal se propone incluirlo en el presupuesto del plan de manejo ambiental de cada proyecto.

PROYECTO PISTA DE ATLETISMO:

- Se realiza el levantamiento topográfico del interior del estadio bello horizonte Rey Pele, con el fin de verificar si el espacio disponible para la construcción de la pista de atletismo y sus disciplinas adyacentes, es suficiente. Se entrega en el presente informe el plano de dicho levantamiento y localización. La comisión topográfica empleada cumple con los certificados de calidad de los equipos utilizados, así como del personal idóneo para esta actividad.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Densidad en terreno Ensayo a compresión en cilindros de concreto C.B.R Muestra inalterada Flexión de Vigas de Concreto Rodadura Asfáltica Limite de Consistencia Desgaste Proctor Gradación Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles Granulometría Equivalente de Arena otros (Especificar)	N/A	N/A

Durante la ejecución del presente informe no se ejecutaron pruebas de laboratorio porque nos encontramos en fase de desmontes y demoliciones de las estructuras existentes.

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
9/05/2023	AFILIACIÓN DE PERSONAL	ARL, EPS, CCF
10/05/2023	INICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST	
10/05/2023	ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS SST	
10/05/2023	DESIGNACION DE RESPONSABILIDADES DE SST	
10/05/2023	DETERMINACIÓN DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DEL PERSONAL DEL CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	SE DEJA CERTIFICADO SOPORTE DE NO DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL ALTO RIESGO POR EL CONSORCIO
10/05/2023	ELABORACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL CON INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	SE APLICA CON EL PERSONAL DEL CONSORCIO Y CONTRATISTAS.
12/05/2023	SE ESTABLECE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

13/05/2023	SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
15/05/2023	SE ESTABLECEN PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST.	
16/05/2023	SE ESTABLECE PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL	UNA VEZ IMPLEMENTADA LA ETAPA 1 SE IMPLEMENTACION DE APLICA LA RETENCIÓN Y CODIFICACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO.
17/05/2023	SE ESTABLECE PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SGSST	
19/05/2023	SE ESTABLECE PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	
20/05/2023	SE APLICA EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	SE ESTABLECE MATRIZ INICIAL
21/05/2023	SE ESTABLECE PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.	
22/05/2023	SE ESTABLECE PROCEDIMIENTO DE COMPRAS EN TERMINOS SST.	
23/05/2023	SE ESTABLECE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.	
24/05/2023	SE ESTABLECE FORMATO DE SELECCIÓN A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.	
25/05/2023	INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE MAQUINAS Y/ EQUIPOS	DIARIO
26/05/2023	CHARLAS PREOPERACIONALES AL PERSONAL DE OBRA	DIARIO- SE ANEXA CRONOGRAMA
27/05/2023	CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL	DIARIO
29/05/2023	VERIFICACION DE DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL DE CONTRATISTAS	SEGÚN INGRESO
29/05/2023	CONSOLIDACIÓN DE PERSONAL EN CONTROL	
30/05/2023	LIQUIDACION DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	

Anexo: Formato 112-ECP-FR-015-FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACION / ACCION
Cerramiento de área perimetral.	Al recibir el área de trabajo y para iniciar con las actividades, se procedió a desarrollar el cerramiento del sitio a intervenir, con el fin de que sea restringido el ingreso de personas ajenas al proyecto y así evitar posibles accidentes. Se anexa registro fotográfico de la actividad.	El personal realiza la actividad de manera organizada y a satisfacción.
Poda de césped.	Luego de realizar el cerramiento del sitio de obra, se procedió con la actividad poda de césped, debido a que en ciertas áreas era bastante abundante e interfería con algunas actividades, por tal razón se hizo necesario dicha acción; se anexan evidencias fotográficas de la actividad.	Se realiza la actividad sin ningún contratiempo.
Gestión de licencias ambientales para la explotación de materiales pétreos (Arena, Grava, Base, Sub-base).	Se cuenta con los respectivos permisos para la explotación de materiales pétreos por parte de la corporación autónoma regional (Cormacarena). Anexos documentación adquirida.	N/A
Gestión de licencia del sitio para la disposición final de los RCD ante Cormacarena.	Se hizo entrega de las certificaciones y licencias del ZODME Guatiquia para realizar la actividad de disposición final de los residuos de construcción y demolición. Se anexan los documentos obtenidos.	N/A
Gestión ante la secretaria de medio ambiente para realizar el inventario forestal de individuos arbóreos para su aprovechamiento.	Para realizar el requerimiento ante la secretaria de medio ambiente se realizó un oficio para solicitar la visita del ingeniero forestal para realizar el inventario y caracterización de los individuos arbóreos que se deben talar. Se anexa el oficio con la solicitud.	N/A

Anexo: Formato 112-ECP-FR-016-INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PMA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA-MES
OLIVERIO GOMEZ RIOS	DIRECTOR DE PROYECTOS	100%
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	50%
LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	100%
ZUNEILE PAOLA BOTELLO	PROFESIONAL SST	50%
ADRIANA PAOLA FARFAN	ARQUITECTA PAISAJISTA	30%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACION DE PERSONAL OBRA

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°: 9452115383 – CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

De acuerdo al listado de contratistas reportado por el consorciado ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS, se relacionan las siguientes planillas de pago:

Se presenta planilla de pago N°: 9452116231 – ORGANIZACIÓN SOES.
Se presenta planilla de pago N°: 7877010513 – ORGANIZACIÓN SOES – SERVIALTURAS.
Se presenta planilla de pago N°: 9452116866 – WILSON CARDENAS.
Se presenta planilla de pago N°: 9451405026 – JUAN ANTONIO BARBOSA.

Anexo: Formato 112-ECP-FR-021-V01-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA y oficio de Organización Terracanto SAS fechado del 10 de mayo de 2023.

3. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	35
Empleos directos generados:	9
Empleos indirectos generados:	26

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	1
Etaria (Edad)	20 a 59 años	23
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	2
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	1
Género	Masculino	31
Género	Femenino	4
Población Vulnerable	Desplazados	5
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		**70**

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el periodo del presente informe no se han realizado prorrogas, suspensiones o reinicios al contrato de obra.

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el periodo del presente informe no se han realizado adicionales al contrato de obra.

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el periodo del presente informe no se han realizado modificaciones al contrato de obra.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

2082

2. GARANTIAS:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-81241317-1
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-81327904-1
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	10 DE ABRIL DE 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23-02-2023	23-06-2024	$ 10.174.388.168,40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	23-02-2023	23-06-2024	$ 15.261.582.252,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23-02-2023	23-02-2027	$ 2.543.597.042,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	23-02-2024	23-02-2029	$ 15.261.582.252,60
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23-02-2023	23-02-2024	$ 2.543.597.042,10
DAÑO MORAL	23-02-2023	23-02-2024	$ 2.543.597.042,10
LUCRO CESANTE	23-02-2023	23-02-2024	$ 2.543.597.042,10

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-81241317-1
ANEXO N°	01
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-81327904-1
ANEXO N°	01
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	17 DE MAYO DE 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10-05-2023	09-09-2024	$ 10.174.388.168,40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10-05-2023	09-09-2024	$ 15.261.582.252,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10-05-2023	09-05-2027	$ 2.543.597.042,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	09-05-2023	09-05-2029	$ 15.261.582.252,60
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23-02-2023	09-05-2024	$ 2.543.597.042,10
DAÑO MORAL	23-02-2023	09-05-2024	$ 2.543.597.042,10
LUCRO CESANTE	23-02-2023	09-05-2024	$ 2.543.597.042,10

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTALES					

Durante el periodo del presente informe no se han realizado pagos al contratista.


PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *10-05-2023 AL 31-05-2023*


Avance físico ejecutado 0.12% y avance financiero ejecutado 0%.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	10	33.3%

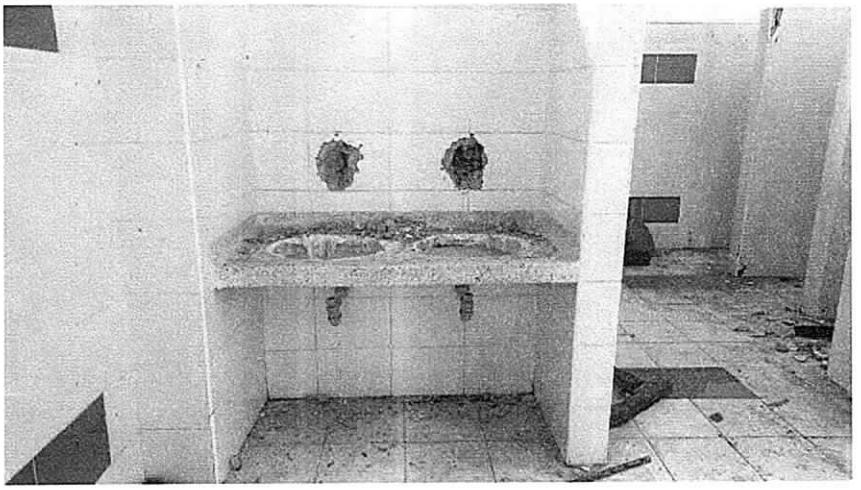

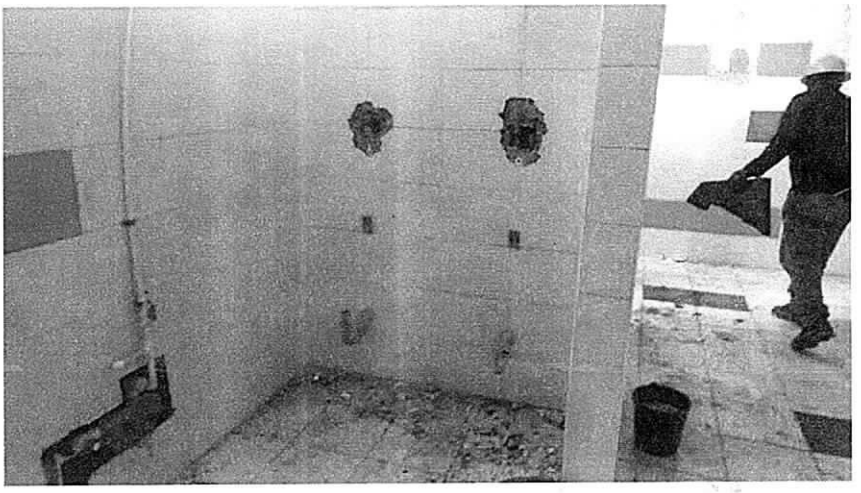


OBSERVACIONES
Se realizo el desmonte de lavamanos en el escenario de voleibol. Se retiran y dejan en sitio asignado para entrega a la entidad.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	11	20.0%

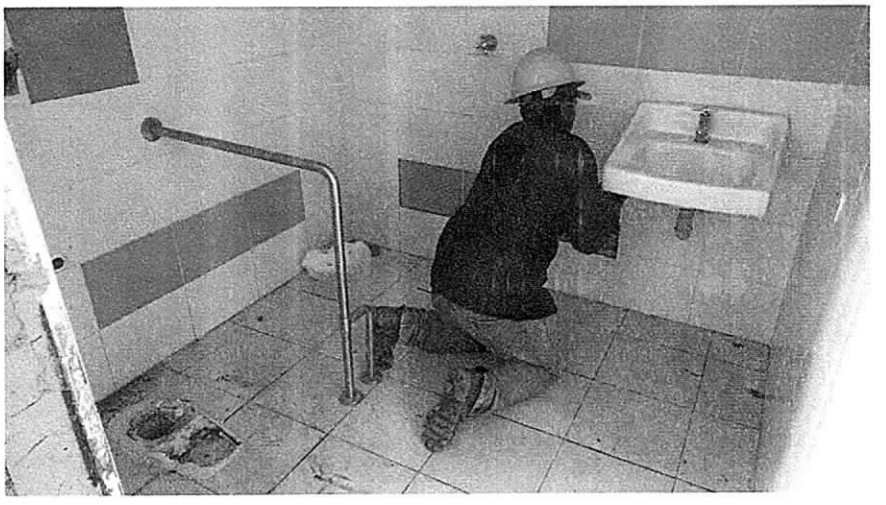





OBSERVACIONES
Se realizo el desmonte de orinales de pared y tazas sanitarias en el escenario de voleibol. Se retiran y dejan en sitio asignado para entrega a la entidad.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE: TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	557.30	12.9%

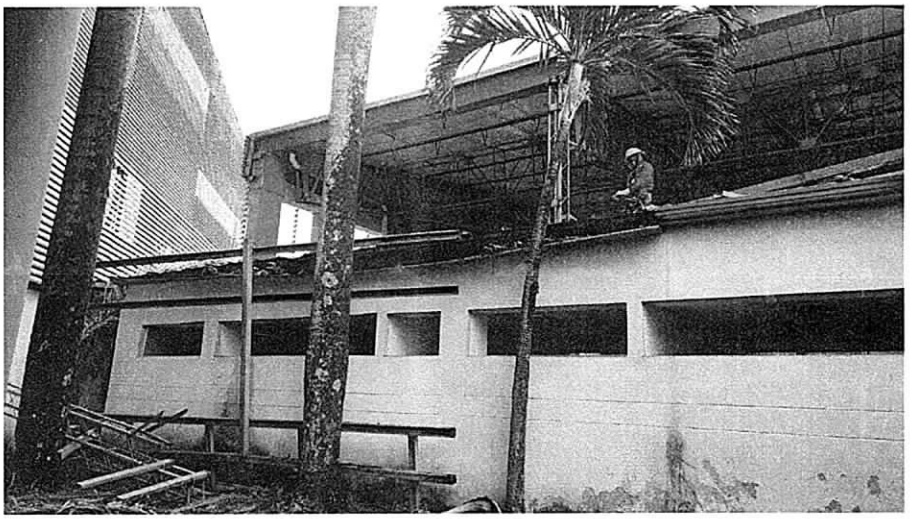

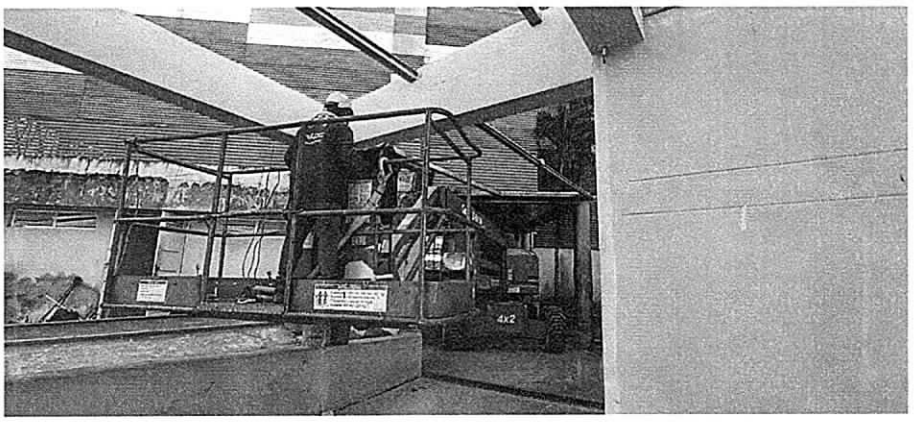



OBSERVACIONES
Se realizo el desmonte de estructura metálica de cubierta (correas y templetes) en el escenario de voleibol. Se retiran y dejan en sitio asignado para entrega a la entidad.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	420.00	1.6%

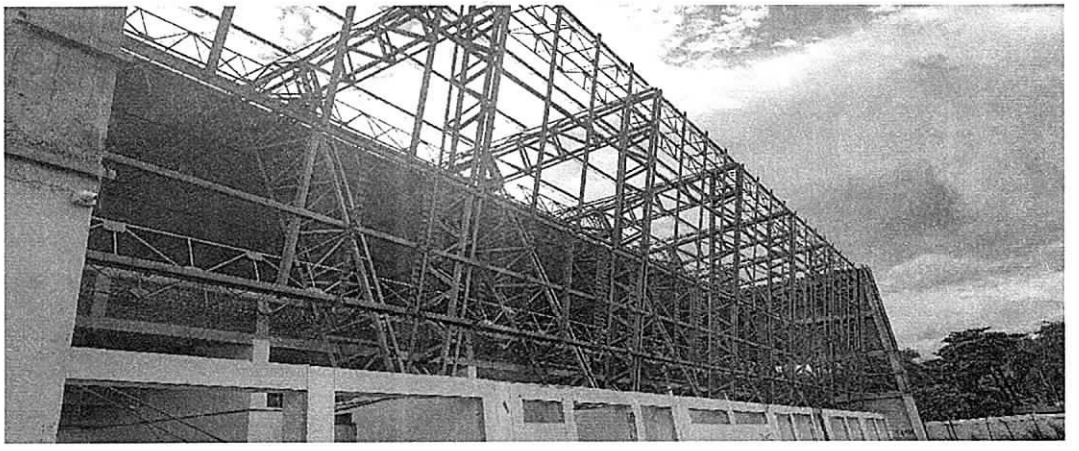

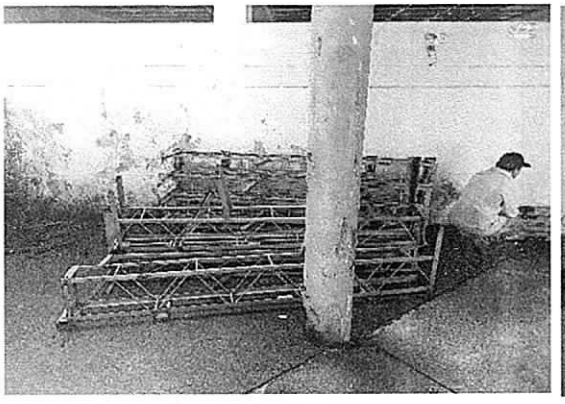



OBSERVACIONES
Se realizo el desmonte de estructura metálica polideportivo que forma parte de la estructura de soporte de las fachadas en miniwave y persianas metálicas en el escenario de voleibol. Se retiran y dejan en sitio asignado para entrega a la entidad.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	**EJECUTADO**	**%**
	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	18.00	31.0%











OBSERVACIONES
Se realizo el desmonte de marcos y puertas en el escenario de voleibol. Se retiran y dejan en sitio asignado para entrega a la entidad.


Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	371.09	11.4%

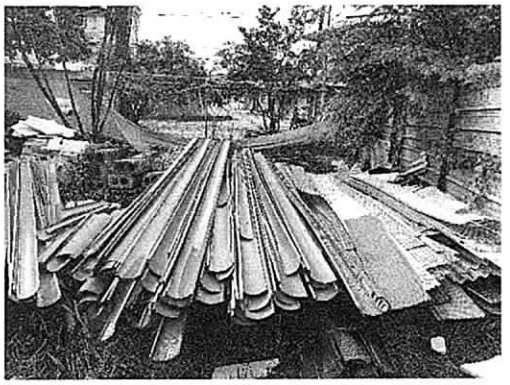

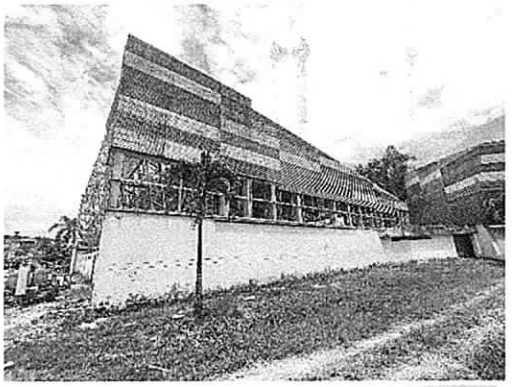

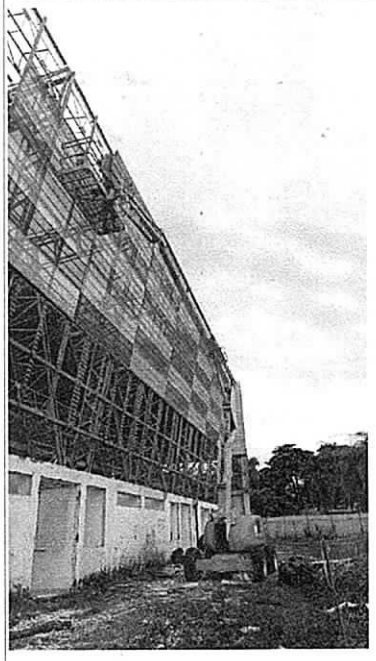







OBSERVACIONES
Se realizo el desmonte de rejas y ventanas (inc fachadas) en el escenario de voleibol. Se retiran y dejan en sitio asignado para entrega a la entidad.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	5.0	45.5%

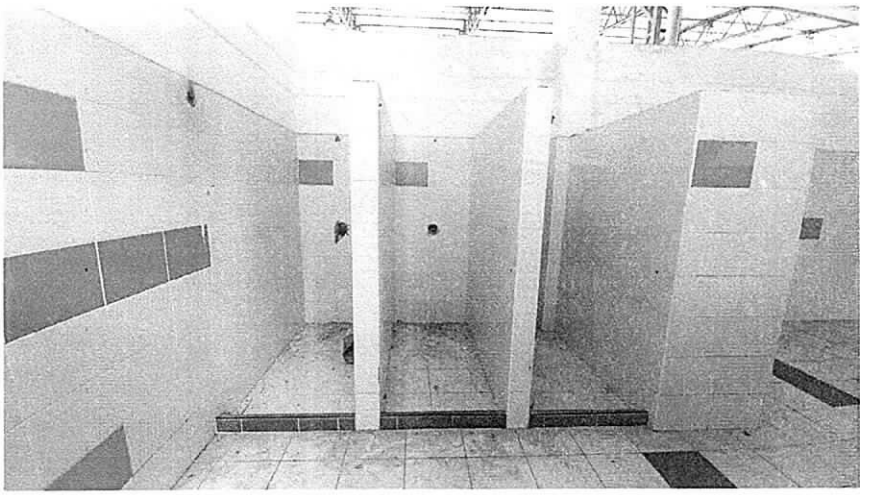

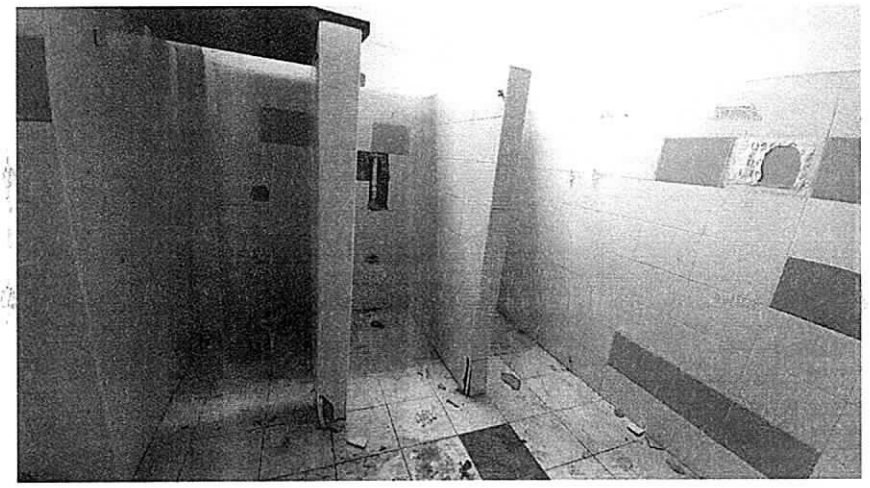

OBSERVACIONES
Se realizo el desmonte de duchas y griferías en el escenario de voleibol. Se retiran y dejan en sitio asignado para entrega a la entidad.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	34.0	1.0%











OBSERVACIONES
Se realizo la demolición de muros en el primer nivel del escenario de voleibol. Se retiran y dejan en sitio asignado para su disposición final.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	11.43	24.9%

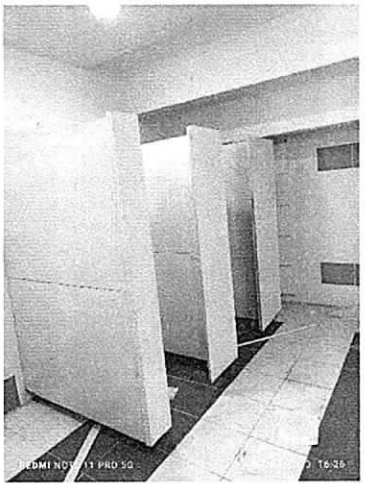

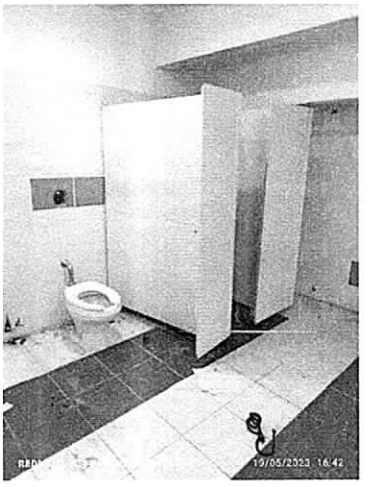





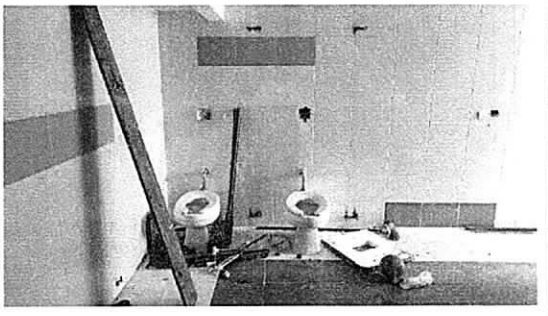

OBSERVACIONES
Se realizo el desmonte de las divisiones modulares en baños del escenario de voleibol. Se retiran y dejan en sitio asignado para su disposición final.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE	EJECUTADO	%
	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	628.26	100.0%







OBSERVACIONES
Se realizo el desmonte de barandas en la pista existente de patinaje de velocidad. Se retiran y dejan en sitio asignado para su disposición final.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE	EJECUTADO	%
	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	51.66	15.4%





OBSERVACIONES
Se realizo la demolición de las placas de concreto de la pista de velocidad existente.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE	EJECUTADO	%
	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	13.30	7.1%






OBSERVACIONES
Se realizo la demolición parcial de pavimento asfaltico en la pista de ruta existente.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE	EJECUTADO	%
	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	6.0	1.6%

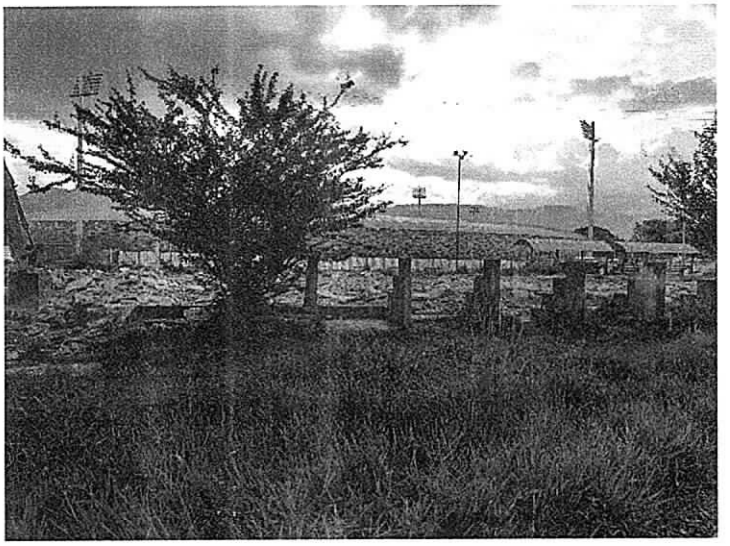



OBSERVACIONES
Se realizo la demolición de concreto reforzado de las graderías en la pista de velocidad existente.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO	EJECUTADO	%
	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	645.0	6.6%







OBSERVACIONES
Se realizo localización y replanteo del área de intervención de la pista de atletismo dentro del estadio. Se levantaron estructuras y cajas existentes.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

6. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- De acuerdo al seguimiento mensual realizado a la fecha de corte del presente informe, se presenta un porcentaje de avance ejecutado por encima de lo programado. Esto teniendo en cuenta que los escenarios no fueron entregados en la fecha de inicio pactada. De todas formas, se tiene un ritmo de trabajo acorde a lo programado.

- Se requiere que la entidad de tramite a la consultoría que realizo los estudios y diseños con el ánimo de evacuar las observaciones presentadas a cada uno de estos con el ánimo continuar con la evaluación presupuestal y ejecución de obra. De igual forma es necesario definir los puntos de acometidas finales de agua potable y aguas negras para los nuevos escenarios.

- Dentro de las actividades no previstas en el contrato, se evidencio la necesidad de realizar una tala de diez (10) árboles que interfieren con la ejecución de la pista de patinaje y escenarios deportivos nuevos. La solicitud ya se realizó a la secretaria de medio ambiente de Villavicencio, y estamos a la espera de visita técnica.

- Durante el inicio de las actividades preliminares para los diferentes escenarios deportivos se evidenciaron actividades No Previstas dentro de contrato que requieren de su autorización para dar finalizado el capítulo de Desmontes y Demoliciones. Estas actividades ya se encuentran en revisión por la interventoría y requieren de la aprobación de la entidad para su ejecución.

- Se solicita a la entidad dar celeridad en el retiro de los materiales de desmontes ya que a la fecha del presente informe no han sido retirados de obra y está generando obstáculos para la circulación de la maquinaria.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

H. ANEXOS

En el presente informe contiene los siguientes soportes documentales:

- Copia de la bitácora de la obra o de las actividades desarrolladas.
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Actas de comité
- Presupuesto de actividades ejecutadas en el mes
- Avance Físico: Programado vs Ejecutado
- Estado del tiempo
- Certificado de Calibración Equipos de Topografía
- Planos de levantamiento arquitectónico de Edificaciones existentes
- Levantamiento topográfico-Sector Escenarios deportivos multipropósito
- Levantamiento topográfico-Sector Pista de patinaje
- Levantamiento topográfico-Sector Pista de Atletismo
- Informe SST
- Informe de Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental
- Informe PMT

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 14 días del mes junio del 2023.

Firma

Nombre: YEISON E. GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:25202-090820 CND

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional:25202-132229CND

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

2100

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

BITACORA DE OBRA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

2101

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			LLUVIAS DURANTE LA NOCHE HASTA LA MADRUGADA
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Mayor permanencia en obra	El personal de contratista e interventoria estan a la espera de iniciar actividades porque la entidad no ha realizado entrega de las escensarios a demoler
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES
Se dar formalidad mendiante acta de inicio al contrato de obra No.106 de 2023

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
10 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

2102

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			LLUVIAS DURANTE LA NOCHE HASTA LA MADRUGADA
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Mayor permanencia en obra	El personal de contratista e interventoria estan a la espera de iniciar actividades porque la entidad no ha realizado entrega de las escensarios a demoler
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante no ha realizado entrega de los escenarios antiguos ni de la pista de atletismo dentro del estadio, por lo tanto no se pueden iniciar actividades de obra. El contratista realiza levantamiento de los coliseos menores existentes porque los planos entregados en los diseños no corresponden a lo fisico.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones

2103

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	12	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Mayor permanencia en obra	El personal de contratista e interventoria estan a la espera de iniciar actividades porque la entidad no ha realizado entrega de las escensarios a demoler
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante no ha realizado entrega de los escenarios antiguos ni de la pista de atletismo dentro del estadio, por lo tanto no se pueden iniciar actividades de obra. El contratista realiza levantamiento de los coliseos menores existentes porque los planos entregados en los diseños no corresponden a lo fisico.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
12 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones

2104

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	5	2023	7:00am	12:00md

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Mayor permanencia en obra	El personal de contratista e interventoria estan a la espera de iniciar actividades porque la entidad no ha realizado entrega de las escensarios a demoler
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante no ha realizado entrega de los escenarios antiguos ni de la pista de atletismo dentro del estadio, por lo tanto no se pueden iniciar actividades de obra. El contratista realiza levantamiento de los coliseos menores existentes porque los planos entregados en los diseños no corresponden a lo fisico.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
13 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

2105

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	5	2023	NO SE LABORA	

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
14 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

2106

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Mayor permanencia en obra	El personal de contratista e interventoria estan a la espera de iniciar actividades porque la entidad no ha realizado entrega de las escensarios a demoler
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante no ha realizado entrega de los escenarios antiguos ni de la pista de atletismo dentro del estadio, por lo tanto no se pueden iniciar actividades de obra. El contratista realiza levantamiento de los coliseos menores existentes porque los planos entregados en los diseños no corresponden a lo fisico. Se inicia el cerramiento de obra.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
15 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

2107

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPO[illegible]Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE [illegible]STIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	2	X				
AYUDANTE	10	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Mayor permanencia en obra	El personal de contratista e interventoria estan a la espera de iniciar actividades porque la entidad no ha realizado entrega de las escensarios a demoler
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante no ha realizado entrega de los escenarios antiguos ni de la pista de atletismo dentro del estadio, por lo tanto no se pueden iniciar actividades de obra. El contratista realiza levantamiento de los coliseos menores existentes porque los planos entregados en los diseños no corresponden a lo fisico. Continua el cerramiento de obra en teja de zinc y madera rolliza. LLega excavadora sobre orugas para inicio de demoliciones.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
16 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	17	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	2	X				
AYUDANTE	10	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Mayor permanencia en obra	El personal de contratista e interventoria estan a la espera de iniciar actividades porque la entidad hasta el dia de hoy hace entrega de los coliseos menores para su intervencion.
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo. El contratista realiza levantamiento de los coliseos menores existentes porque los planos entregados en los diseños no corresponden a lo fisico. Continua el cerramiento de obra.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
17 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

2109

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	2	X				
AYUDANTE	10	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
B.1.1	ML	DESMONTE BARANDAS PATINAJE	238.75	SI	SI
B.1.2	M3	DEMOL. PLACAS PATINAJE	20.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo. El contratista realiza levantamiento de los coliseos menores existentes porque los planos entregados en los diseños no corresponden a lo fisico. continua cerramiento de obra

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
18 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO TIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	19	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	2	X				
AYUDANTE	11	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
B.1.1	ML	DESMONTE BARANDAS PATINAJE	150.00	SI	SI
B.1.2	M3	DEMOL. PLACAS PATINAJE	28.80	SI	SI
B.1.4	M3	DEMOL. CONC. REFORZADO	4.20	SI	SI
A.2.1	UN	DESM. LAVAMANOS	3.00	SI	SI
A.2.2	UN	DESM. SANITARIO	3.00	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	66.00	SI	SI
A.2.8	UN	DESM. DUCHAS Y GRIFERIA	1.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo. El contratista realiza levantamiento de los coliseos menores existentes porque los planos entregados en los diseños no corresponden a lo fisico. Continua cerramiento de obra.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
19 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

2111

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	20	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	2	X				
AYUDANTE	12	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.1	UN	DESM. LAVAMANOS	1.00	SI	SI
A.2.2	UN	DESM. SANITARIO	3.00	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	58.42	SI	SI
A.2.8	UN	DESM. DUCHAS Y GRIFERIA	1.00	SI	SI
A.2.13	M2	DESM. DIVISIONES MODULARES	11.43	SI	SI
B.1.1	ML	DESMONTE BARANDAS PATINAJE	250.00	SI	SI
B.1.30	M3	DEMOL. PAV. ASFALTICO	10	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo. El contratista realiza levantamiento de los coliseos menores existentes porque los planos entregados en los diseños no corresponden a lo fisico. Continua cerramiento de obra.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
20 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X		X	
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	2	X				
AYUDANTE	5	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	6.67	SI	SI
B.1.3	M3	DEM. PAV. ASFALTICO	3.30	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entida l no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo. Debido a las lluvias de la madrugada y mañana, el manlif se enterro en el terreno natural del coliseo de voleibol, siendo necesario el ingreso de una grua para retirarla.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
21 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

2113

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	1	X				
AYUDANTE	5	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.5	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	1	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	60.00	SI	SI
B.1.1	ML	DESM. BARANDAS	17.28	SI	SI
B.1.2	M3	DEMOL. ANDENES, PLACAS	2.86	SI	SI
B.1.4	M3	DEMOL. CONC. REFORZADO	1.80	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
22 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088003863O	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	1	X				
AYUDANTE	15	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.1	UN	DESM. LAVAMANOS	3	SI	SI
A.2.2	UN	DESM. SANITARIOS	3	SI	SI
A.2.5	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	3	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	65	SI	SI
A.2.8	UN	DESM. DUCHAS Y GRIFERIAS	3	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo. El contratista realiza levantamiento de los coliseos menores existentes porque los planos entregados en los diseños no corresponden a lo fisico.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
23 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	24	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	1	X				
AYUDANTE	18	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.1	UN	DESM. LAVAMANOS	2	SI	SI
A.2.2	UN	DESM. SANITARIOS	2	SI	SI
A.2.3	M2	DESM. EST. METAL. CUBIERTA	66	SI	SI
A.2.5	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	3	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	60	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOL. MAMPOSTERIA	11	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo. El contratista realiza levantamiento de los coliseos menores existentes porque los planos entregados en los diseños no corresponden a lo fisico.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
24 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	25	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	1	X				
AYUDANTE	17	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.1	UN	DESM. LAVAMANOS	1.00	SI	SI
A.2.3	M2	DESM. EST. METAL. CUBIERTA	55.00	SI	SI
A.2.5	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	1.00	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	55.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOL. MAMPOSTERIA	15.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo. El contratista realiza levantamiento de los coliseos menores existentes porque los planos entregados en los diseños no corresponden a lo fisico.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
25 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	26	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	3.5 HRS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	1	X				
AYUDANTE	17	X				
CELADOR						
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.3	M2	DESM. EST. METAL. CUBIERTA	70.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOL. MAMPOSTERIA	8.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo. El contratista realiza levantamiento de los coliseos menores existentes porque los planos entregados en los diseños no corresponden a lo fisico.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
25 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

RM

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	27	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	1	X				
AYUDANTE	15	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.3	M2	DESM. EST. METAL. CUBIERTA	60.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo. El contratista realiza levantamiento de los coliseos menores existentes porque los planos entregados en los diseños no corresponden a lo fisico.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
27 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	28	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	1	X				
AYUDANTE	9	X				
CELADOR						
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.3	M2	DESM. EST. METAL CUBIERTA	180.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
DOMINICAL	SE PROGRAMA PERSONAL PARA RECUPERAR EL AVANCE SEMANAL PERDIDO POR TIEMPO DE LLUVIAS

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
28 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

2120

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	29	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	1	X				
AYUDANTE	17	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.3	M2	DESM. EST. METAL. CUBIERTA	76.70	SI	SI
A.2.5	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	6.00	SI	SI
C.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	645.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
29 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

2121

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS EN LA MADRUGADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	1	X				
AYUDANTE	17	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.3	M2	DESM. EST. METAL. CUBIERTA	49.60	SI	SI
A.2.5	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	4.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	31	5	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS EN LA MADRUGADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	1	X				
AYUDANTE	13	X				
CELADOR						
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	1	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.4	KG	DESM. EST. METAL. POLIDEPORTIVO	420.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Comision topografica	Se requiere para realizar levantamiento topografico de las edificaciones existentes, ya que la entidad no cuenta con los planos actualizados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES
La entidad contratante hace entrega de los coliseos menores y pista de patinaje para su intervencion. Queda pendiente la entrega del coliseo de gimnasia y la pista de atletismo

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de mayo de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

NIT: 901.828.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLOMPICA 2023	VERSION 01
		FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 26 de abril del 2023

CEDVO-003-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Recibido
26/04/2023

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: **SOLICITUD DE INFORMACION**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que se viene desarrollando y recolectando la información requerida en su oficio OF-C459-2022-012 del 24 de abril de 2023, me permito solicitar sean aclarados los siguientes aspectos:

- Punto 1. El día 27 de abril de 2023 se reunirán obra e interventoría para realizar en conjunto el ACTA DE VERIFICACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS, teniendo en cuenta que el INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META no cuenta con un formato para dicha acta y la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META tampoco, se van a realizar sobre el formato de acta de comité del IDERMETA.
- Punto 2. El día 27 de abril de 2023 se reunirán obra e interventoría para realizar en conjunto el ACTA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, teniendo en cuenta que el INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META no cuenta con un formato para dicha acta y la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META tampoco, se van a realizar sobre el formato de acta de comité del IDERMETA.
- Punto 3. El día 27 de abril de 2023 se reunirán obra e interventoría para realizar en conjunto el ACTA DE VERIFICACIÓN DE ESTADOS DE REDES Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, teniendo en cuenta que el INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META no cuenta con un formato para dicha acta y la AGENCIA

PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META tampoco, se van a realizar sobre el formato de acta de comité del IDERMETA.

- Punto 4. Para la verificación de fuentes de material y sitio de disposición de escombros RCD, se adjunta licencia ambiental y permiso minero para Zodme y fuentes de agregados.
- Punto 5. El día 13 de abril de 2023 se realizo la visita requerida, con acompañamiento de la interventoría y supervisión de Idermeta. Se solicita a interventoría copia del acta realizada. De igual forma, el consorcio a la fecha no se le ha notificado la conformación de la veeduría, para realizar el recorrido con ellos.
- Punto 6. Se solicita a la interventoría el formato de ACTA DE VECINDAD, para su diligenciamiento. El consorcio a la fecha no ha recibido por parte de la entidad e interventoría, los escenarios existentes y las áreas donde se va a realizar las obras nuevas. Se tenia compromiso entrega el pasado 21 de abril el cual no se cumplió. En reunión posterior, se reprogramo para el próximo viernes 28 de abril de 2023. Una vez se haga entrega de los escenarios se solicita a la interventoría que LAS ACTAS DE VECINDAD sean elaboradas con posterioridad a la firma del acta de inicio y no antes, pues quedarían las áreas sin supervisión del consorcio hasta el inicio de obra, no siendo responsabilidad del consorcio cualquier daño a terceros en este lapso de tiempo.
- Punto 7. Se adjunta documento técnico del Plan de Manejo de Transito y plano de señalización y rutas para cada acceso.
- Punto 8. Se adjunta documentos del siguiente personal:
    - Director de proyectos
    - Director de obra
    - Arquitecto Paisajista
    - Profesional SST
- Punto 9. Se adjunta plan de gerencia ofertado para su revisión y aprobación.
- Punto 10. Se adjunta documentos y soportes de maquinaria ofertada.
- Punto 11. Se adjunta Análisis de AIU
- Punto 12. Se adjunta programación de obra

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

7126

Villavicencio, 27 de abril del 2023

CEDVO-004-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: **SOLICITUD DE INFORMACION**

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar se nos informe si los equipos profesionales que hoy en día hacen uso de la cancha de futbol del estadio Bello Horizonte "Rey Pele", van a continuar realizándolo durante la ejecución del proyecto de construcción de la pista de atletismo.

De ser positiva la respuesta, se solicita a la interventoría se nos informe de la programación de partidos pendientes a jugar durante la temporada actual, los tiempos de receso entre primero y segundo semestre, y calendario para la próxima temporada.

De igual forma, solicitamos se nos indique cuáles serán las restricciones que conllevara estos eventos en el desarrollo normal de las obras contratadas.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

Recibido con aceptación
27/04/2023

Villavicencio, 28 de abril del 2023

CEDVO-005-2023

28/04/2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega radicado PMT

Cordial saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega del radico del Plan de Manejo de Transito -PMT ante la Secretaria de Movilidad del Villavicencio.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

2128

Villavicencio, 28 de abril de 2023.

SECRETARIA DE MOVILIDAD
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
No Radicado 004107
Fecha y Hora 28 ABR 2023
Recibido por Juan 9 28F. 4Planos

Ingeniero
Mauricio Frías
SECRETARIO DE MOVILIDAD
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad

Asunto: PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO **"CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"**

Respetado Ingeniero:

Por medio del presente documento, hacemos entrega del plan de manejo de transito PMT para la construcción del proyecto **"CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"**, ubicado en la comuna 5 de la ciudad. El cual fue desarrollado según el Decreto 145 de 2015 para la ciudad de Villavicencio *"Por el cual se definen los parámetros y contenidos para la elaboración y presentación de estudios de movilidad y planes de manejo de tránsito en el municipio de Villavicencio"*

Agradezco altamente su colaboración, y en espera de la viabilidad del plan de manejo de tránsito por parte de la Secretaría,

Cordialmente,

Mery Gisel Rojas Cardona
R/L CIVILAB INGENIERIA SAS
Calle 41A No 27-37 La Grama

NIT: 901.828.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLOMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 05 de mayo del 2023

CEDVO-005-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega documentación previa acta de inicio corregida.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos solicitados en el oficio C459-2022-020 nos permitimos aclarar:

1. Plan de manejo de manejo de tránsito, anexamos copia de radicado 004107 ante la secretaria de movilidad.
2. Hojas de vida personal ofertado.
   - Director de obra: Se anexan certificados de procuraduría, policía, contraloría, del ingeniero Yeison Esneyder Gomez.
   - Residente obra: Se anexan certificados laborales y de procuraduría, policía, contraloría, del ingeniero Luis Fernando Sarmiento Sabogal.
   - Director de proyecto: Se anexan certificados de procuraduría, policía, contraloría, del Arquitecto Oliverio Gómez Ríos.
   - Profesional SST: Se anexan certificados laborales y de procuraduría, policía, contraloría, de la profesional Zuneile Paola Botello.
   - Arquitecto paisajista: Se anexan certificados laborales y de procuraduría, policía, contraloría, de la Arquitecta Adriana Paola Farfán.
3. Programa de gerencia: se anexa formato 7A de la propuesta.

Recibí Lmoto Gonzalez 05-05-2023.

4. Documentos y soporte de maquinaria ofertada: se anexa la información solicitada en las fichas técnicas de la maquinaria, se anexa formato 7B de la propuesta.

5. Análisis del AIU: Se diligencia el formato GES-FO-31 de la entidad, se anexa copia con firma original.

6. Programación de obra: A la fecha la entidad no ha indicado si se debe ajustar la programación de obra, si ellos como entidad van a dar continuidad a los partidos pendientes de la liga de ascenso y los próximos de la siguiente temporada, por tal motivo se solicita indicar por escrito esta situación, pues de acuerdo al oficio en mención, esto no fue informado al contratista en su proceso de licitación, por lo tanto los días en los cuales no se podrán hacer actividades causara a futuro posibles atrasos y afectaciones económicas por stand-by de personal, maquinaria y equipos, no atribuibles al contratista.

7. Se hace entrega los APU del contrato.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

NIT: 901.828.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLOMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 09 de mayo del 2023

CEDVO-007-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Cerramiento de obra propuesto.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito presentar el plano de cerramiento de obra propuesto por el consorcio.


Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Recibí
Tatiana Lazo
Consorcio Interescenario
11-05-2023
3:50 PM

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

NIT: 901.828.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLOMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

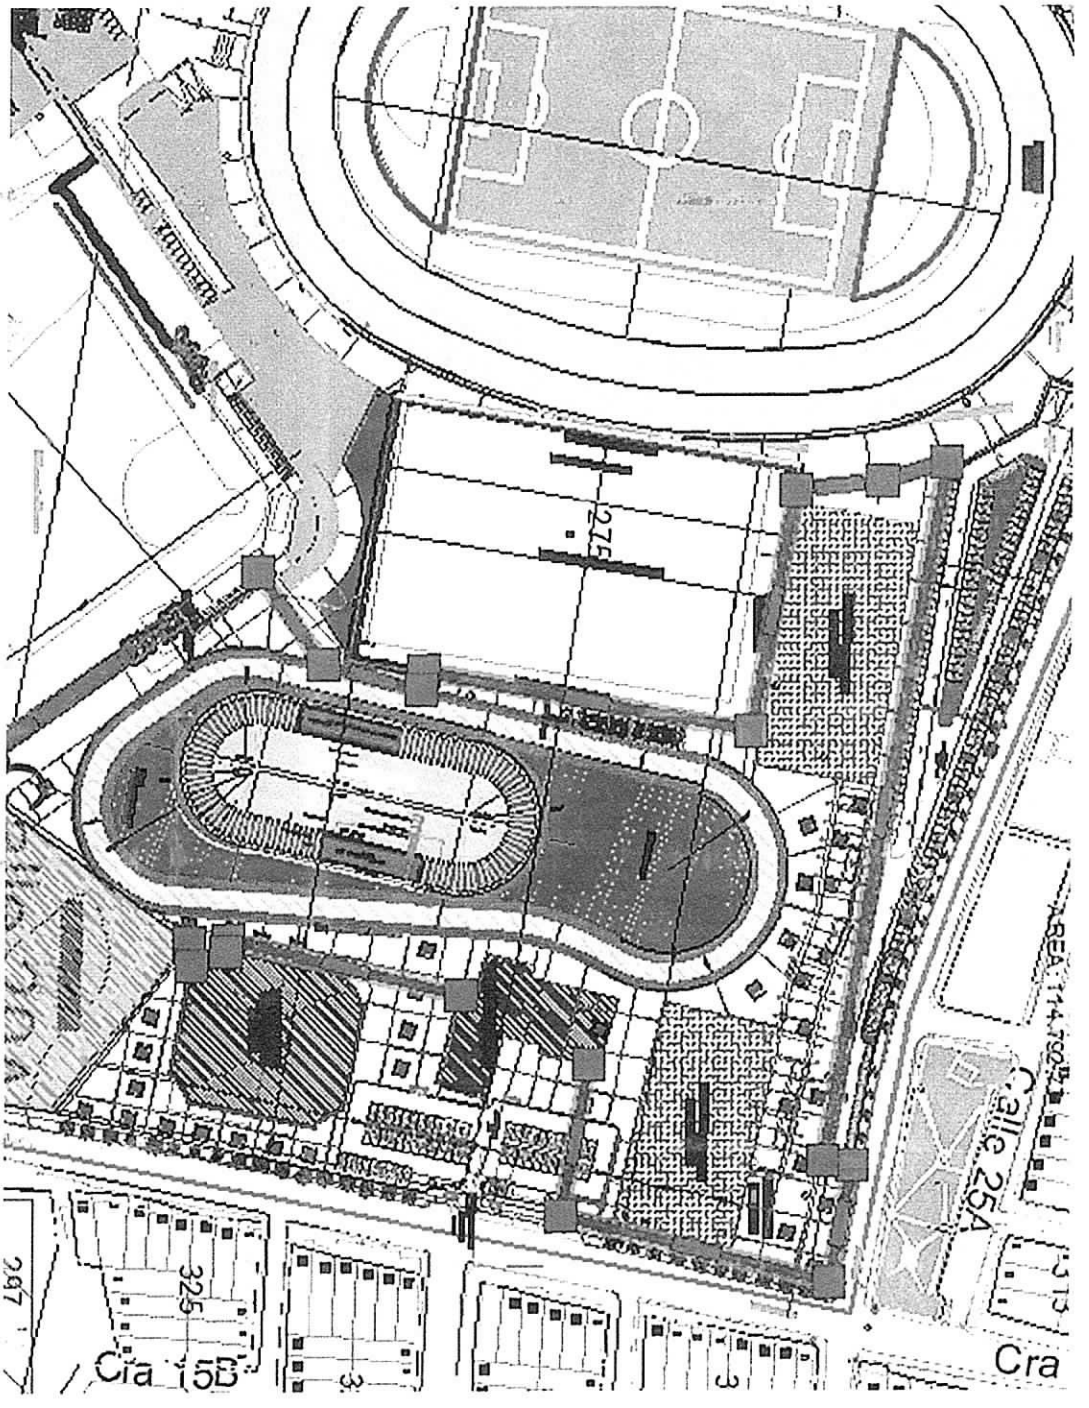

NIT: 901.828.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLOMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 11 de mayo del 2023

CEDVO-008-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Solicitud de información.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito reiterar la solicitud de entrega de memorias de diseño para las redes de A.N, A.LL y RCI del proyecto fase 1, con el fin de verificar si los consumos de los escenarios nuevos que forman parte del contrato de la referencia fueron incluidos en ellas o no.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Recibí
Tatiana Lora
Consorcio Interescenario
11-05-2023
3:50 PM

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

2134

NIT: 901.828.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLOMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 11 de mayo del 2023

CEDVO-009-2023

Señores
INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE DEL META -IDERMETA
Attn. Dr. Fabian Hernán Gonzalo Torres Carrillo
Director
Carrera 16#24-03 Barrio Popular-Olímpico
Sede administrativa Villa Olímpica
Villavicencio-Meta

Recibí
Tatiana Lazo
Consorcio Interescenarios
11-05-2023
3:50pm

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Solicitud de conexión provisional a medidor existente.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar su autorización para tomar nuestra conexión eléctrica provisional del medidor de energía existente para la iluminación de la pista de patinaje, el cual se encuentra alimentado por un transformador de 45KVA ubicado en la carrera 16.

A partir de su entrega el consorcio realizaría el pago del consumo del servicio generado por el mismo.

En espera de una pronta y positiva respuesta a nuestra petición.

Cordialmente,

11 MAY 2023
1005
4:20

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
C.C. interventoría - consorcio interescenarios

Villavicencio, 12 de mayo del 2023

CEDVO-010-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

15/05/2023

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Observaciones al diseño de pavimentos para la pista de atletismo

Cordial saludo,

De manera informar que, una vez revisada la información relacionada con el diseño de pavimentos para la pista de atletismo, se encontraron las siguientes observaciones que requieren de aclaración por el diseñador, así:

Pista de Atletismo

- Dentro del estudio de suelos se describe las características del suelo mediante tres apiques (No.1, No.2 y No.3), de los cuales se calculan 3 valores de CBR corregido (3.2%, 3.3% y 3.1%). En las recomendaciones geotécnicas se indica que se debe hacer un mejoramiento con base granular sobre la subrasante del suelo clasificado como A-6, CL, pero no se evidencia soporte geotécnico de esta recomendación en el estudio.
- En el diseño de pavimentos no se tuvo en cuenta la normatividad de la World Athletics en cuanto a los requerimientos de construcción según la categoría, contenidos en el capitulo C de su Manual de Instalaciones de Atletismo vr. 2019.
- En el diseño de pavimentos el CBR promedio de diseño fue tomado en base a los CBR realizados en la pista de patinaje y no en la de atletismo, por lo tanto, el módulo resiliente de la subrasante cambia.
- Las recomendaciones del diseño de pavimentos en cuanto a las capas de carpetas asfálticas hacen mención solo a las pistas de patinaje.

- No se tiene en cuenta las recomendaciones de construcción de pistas de atletismo según el capítulo C.3 Construcción de la pista, del Manual de Instalaciones de Atletismo vr. 2019 de la World Athletics, en cuanto a la estructura del pavimento.

De igual forma se informa que en el archivo relacionado con las redes del sistema de riego de la cancha de futbol no se indica la profundidad de las redes, el trazado de las líneas eléctricas de rociadores ni el sistema de drenaje de la misma con el fin de evitar futuros daños a las redes existentes cuando se inicien excavaciones.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

Villavicencio, 13 de mayo del 2023

CEDVO-011-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta



15/05/2023

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".


Asunto: Aclaraciones para la pista de atletismo

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar se aclare cuales bordillos existentes en la pista de atletismo fueron construidos bajo el contrato de obra de fase 1 y cuales son antiguos. Esto se requiere para dar inicio a la fabricación de bordillos contemplados en nuestro contrato cuya referencia son A-80.

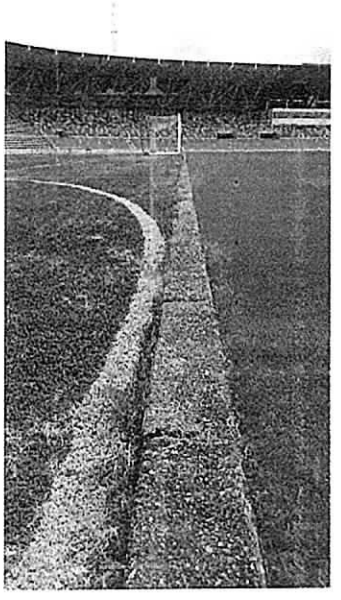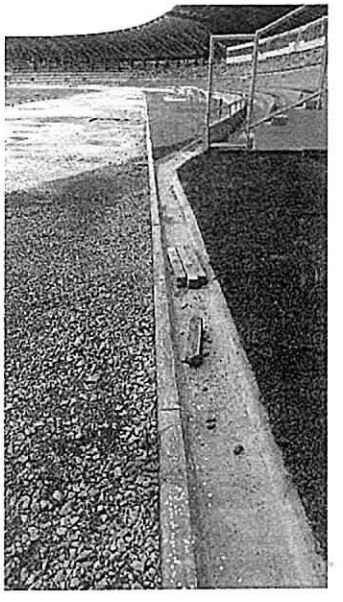
NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLOMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

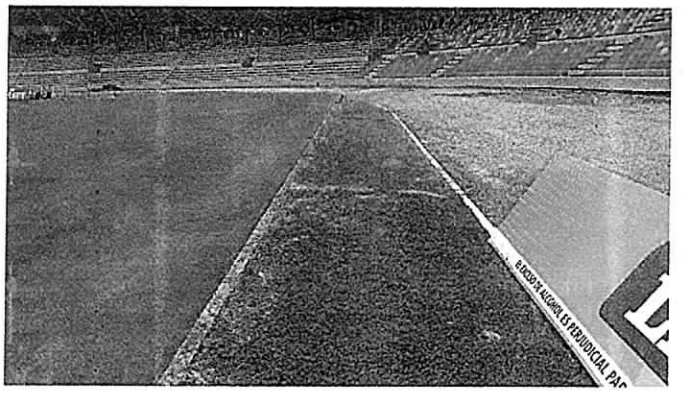

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

2139

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 18 de mayo del 2023

CEDVO-012-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Recibí:
Johathan Gaviria.
23/05/2023
11:44 a.m.
Para revisión - Sin Aprobación

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Aclaraciones para los diseños de escenarios deportivos multipropósito

Cordial saludo,

De manera informar que, una vez revisada la información relacionada con los diseños de los escenarios deportivos multipropósitos, se encontraron las siguientes observaciones que requieren de aclaración por el diseñador, así:

Diseño Arquitectónico

- De acuerdo a la implantación de la cimentación de los escenarios se evidencia la interferencia de redes de A.N. y A.LL, con la cimentación de los mismos. Se deben trasladar las redes existentes o disminuir el área del escenario y ajustarlo al espacio disponible.

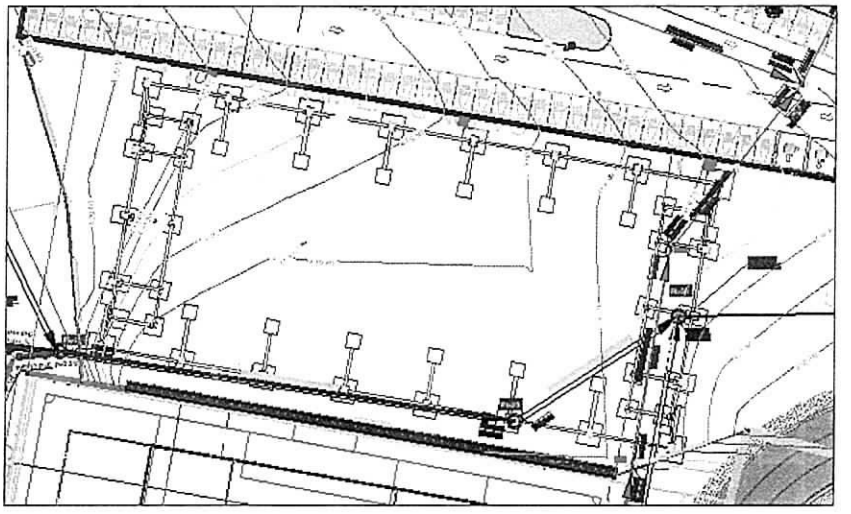


Figura 1. Escenario 1

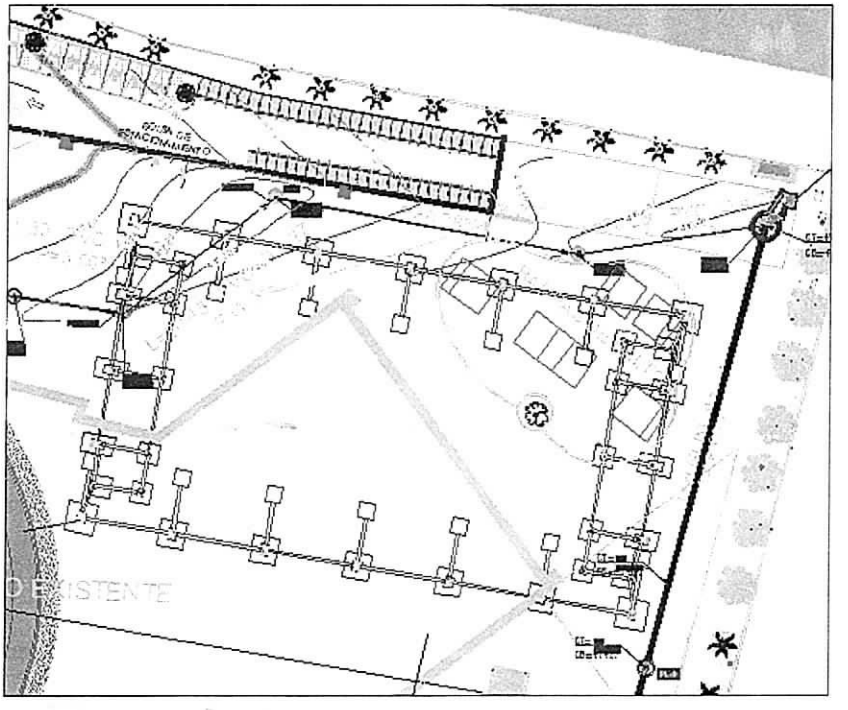


Figura 2. Escenario 2

- De acuerdo al levantamiento topográfico realizado, se evidencia una diferencia en niveles del acabado de sardineles de 1.40m desde el inicio al final del escenario 1, y de 1.0m desde el inicio al final del escenario 2. Esto no se evidencia en los planos arquitectónicos

aprobados por curaduría. Se debe ajustar el urbanismo para adecuar los niveles de éstos con relación a todos los accesos del escenario. De igual forma es necesario definir la profundidad de cimentación final para suplir esta diferencia de niveles.

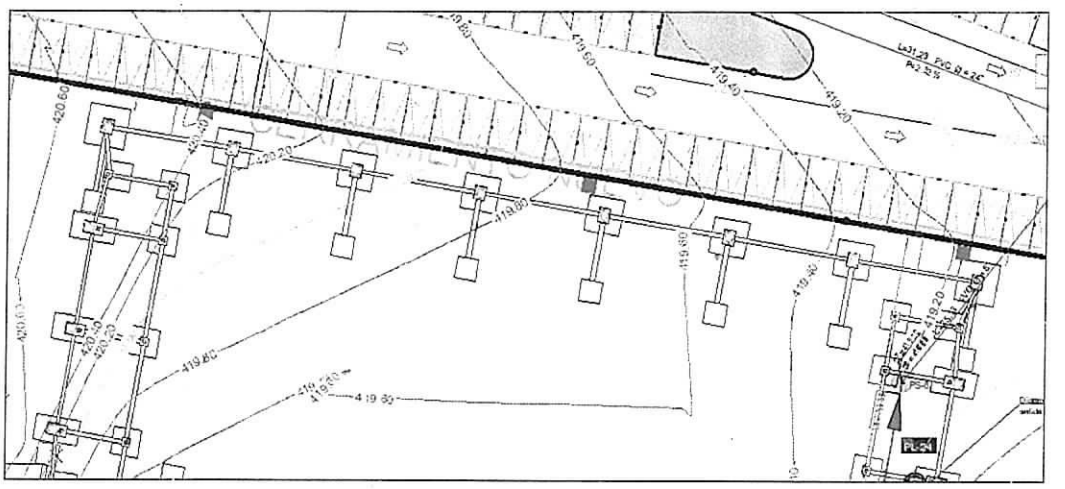


Figura 3. Diferencia de niveles Escenario 1

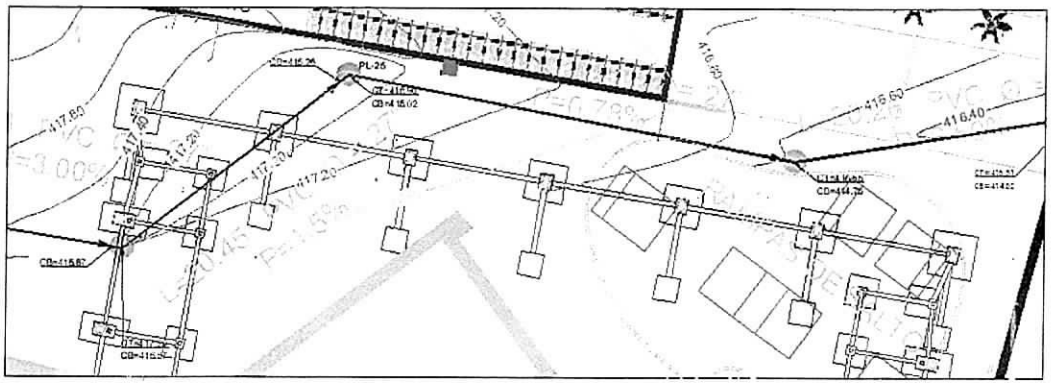


Figura 4. Diferencia de niveles Escenario 2

- A nivel N+0.00, se identifican los diferentes muros en mampostería que existen, pero cuando se pasa a la planta arquitectónica N+2.95m, estos muros desaparecen. Se solicita aclarar la altura de todos los muros del escenario.

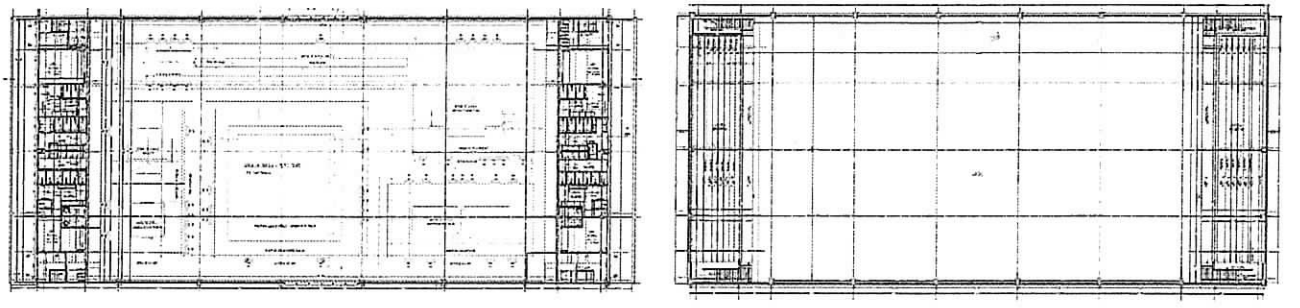


Figura 5. Planta de muros Escenario 1

- No se tiene presupuestado la cumbrera de la cubierta a dos aguas, ni las lima hoyas para la segunda cubierta a un agua de cada escenario.

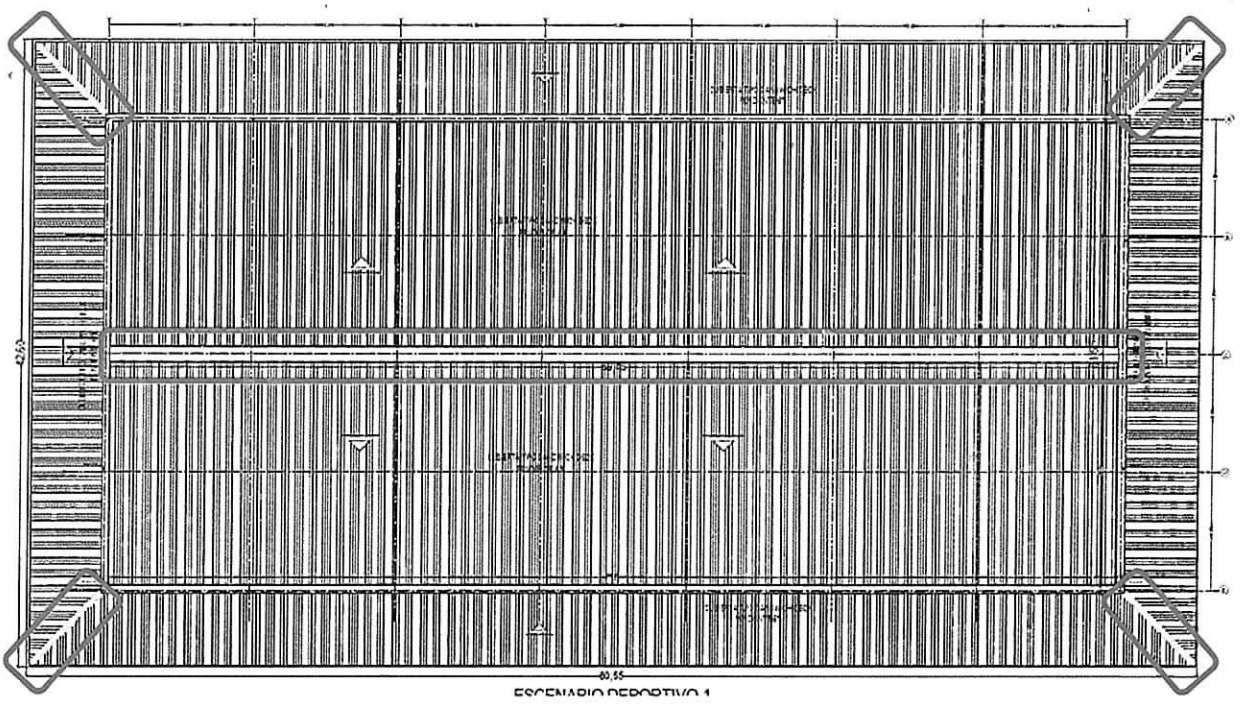


Figura 6. Cumbrera y lima hoyas Escenarios

- En el corte C-C', no se indica si el espacio generado por la cubierta a dos aguas (triangulo) debe llevar persiana o no, pues quedaría expuesto el escenario a posibles entradas de agua al interior.

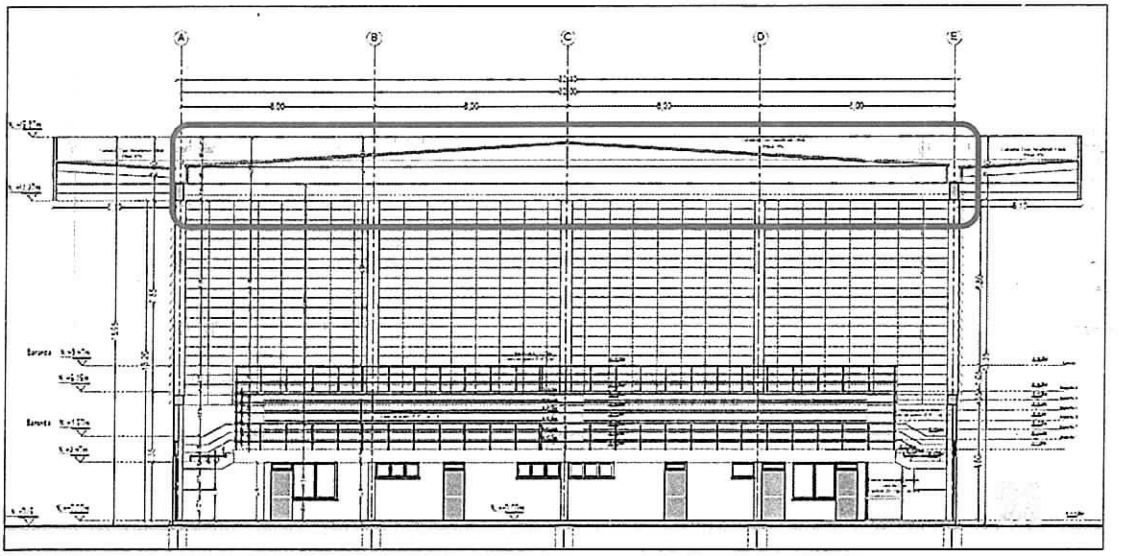


Figura 7. Espacio en cubierta dos aguas escenarios

- No es claro en los planos arquitectónicos, cual es el área final de las fachadas en screen panel.
-



Figura 8. Fachada en screen panel en escenarios

- El diseño de parqueaderos propuesto en el plano de implantación general difiere del real construido. Se debe analizar el impacto en el número de parqueaderos propuestos en licencia de construcción.

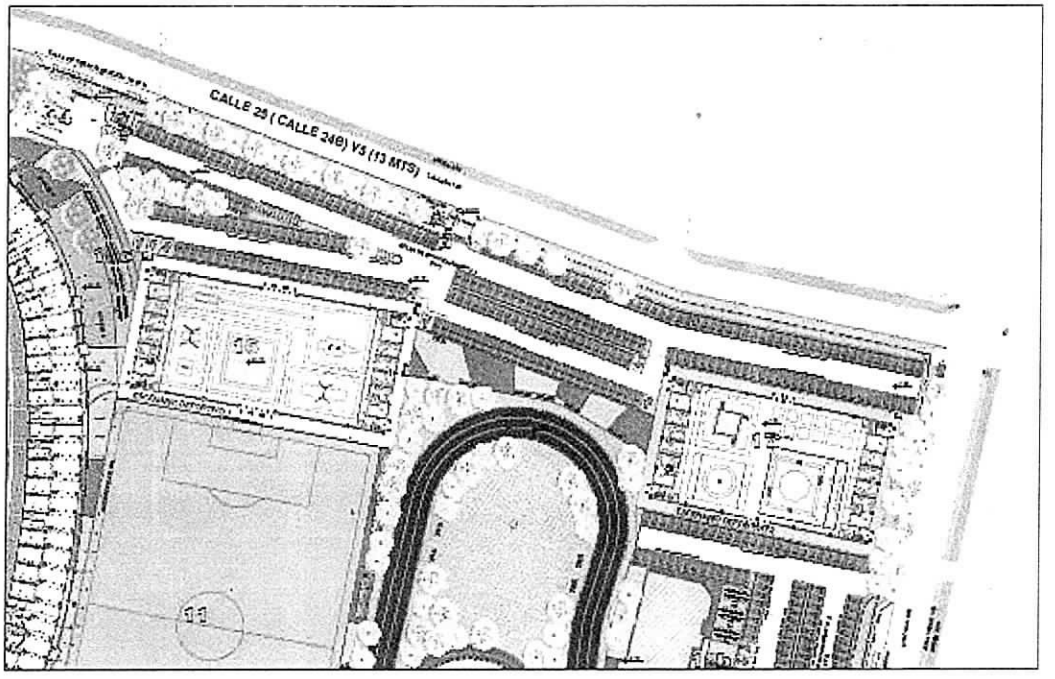


Figura 9. Parqueaderos según plano de implantación general

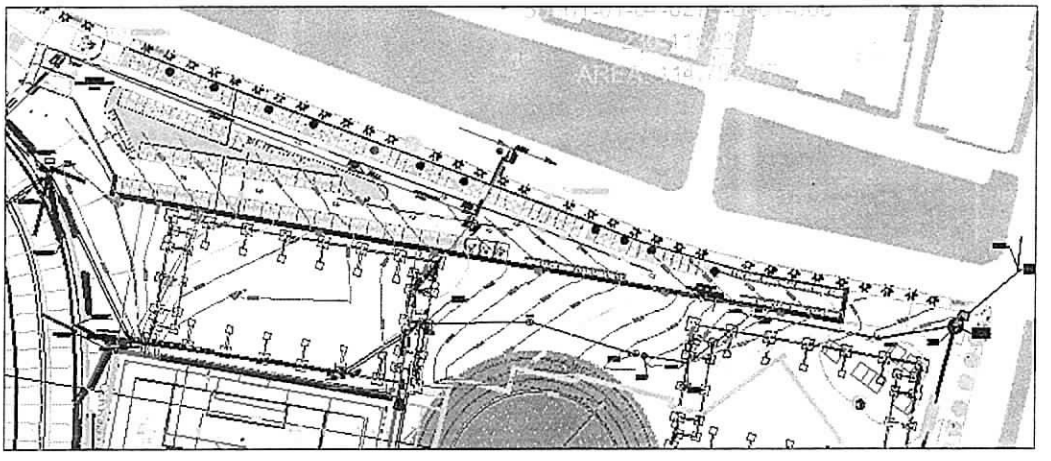


Figura 10. Parqueaderos según levantamiento topográfico.

- La especificación de las puertas metálicas según planos es metálica tipo celosía cal.20, pero en presupuesto se tienen puertas en tablero corrido (ítems 10.1 y 10.2). Se debe definir el tipo de puerta a instalar.

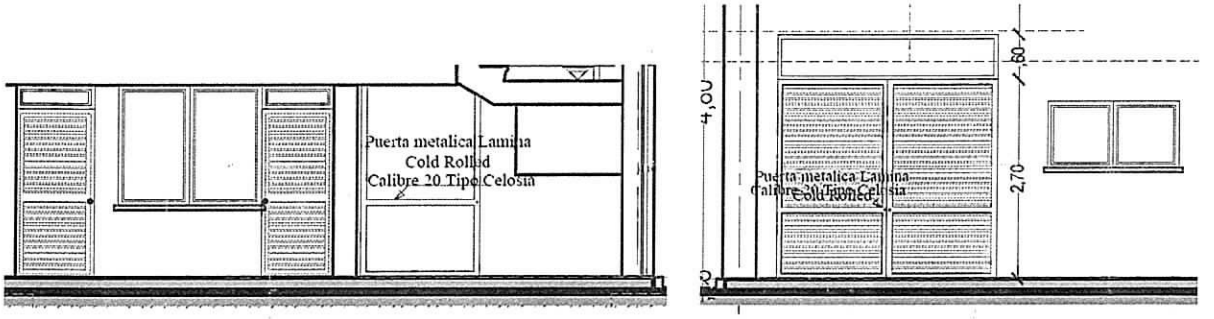


Figura 11. Acabado de puertas.

- Las puertas de salida no contemplan barras antipánico. De igual forma el presupuesto no las incluye. Se solicita aclarar si requiere o no su uso en este tipo de edificación.

- Las especificaciones de las barandas de graderías difieren de las contratadas. Se indica en planos barandas en tubo de acero 4" cal. 14 pero en presupuesto se tiene 4 tubos de 2" y platina de 1/8" cada 0.12m. En planos estructurales no se encuentra soporte del diseño de la misma según la norma NSR-10 para este tipo de escenarios.

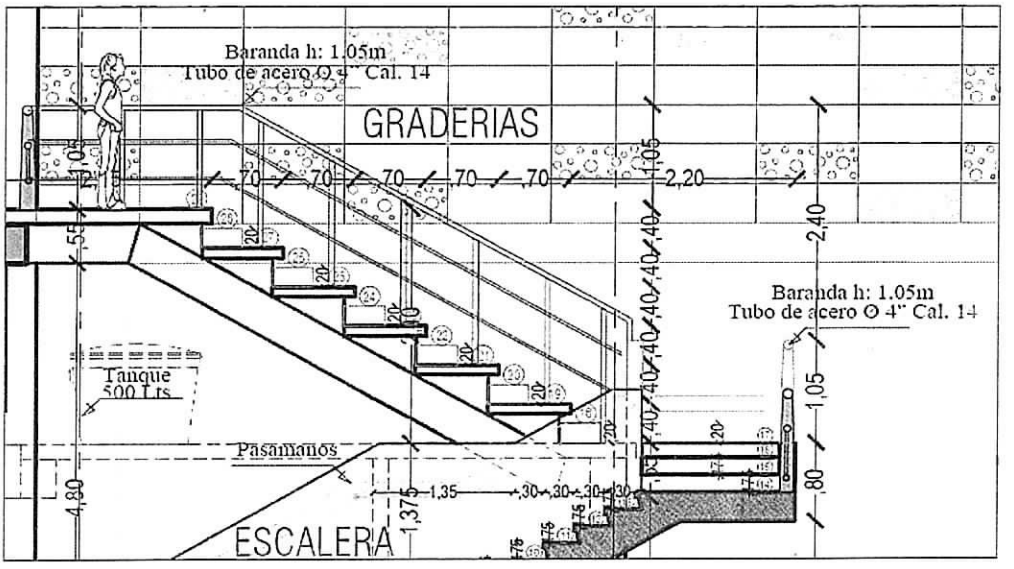


Figura 12. Detalle de baranda para graderías y escaleras.

Diseño Estructural

- De acuerdo con los planos estructurales, se solicita que el nivel de desplante de las vigas de cimentación propuesta en los diseños, sea reubicada sobre la zapata en concreto y no a nivel superior de pedestal, pues la concentración de aceros de viga, pedestal y pernos de anclaje va a interferir entre ellos.

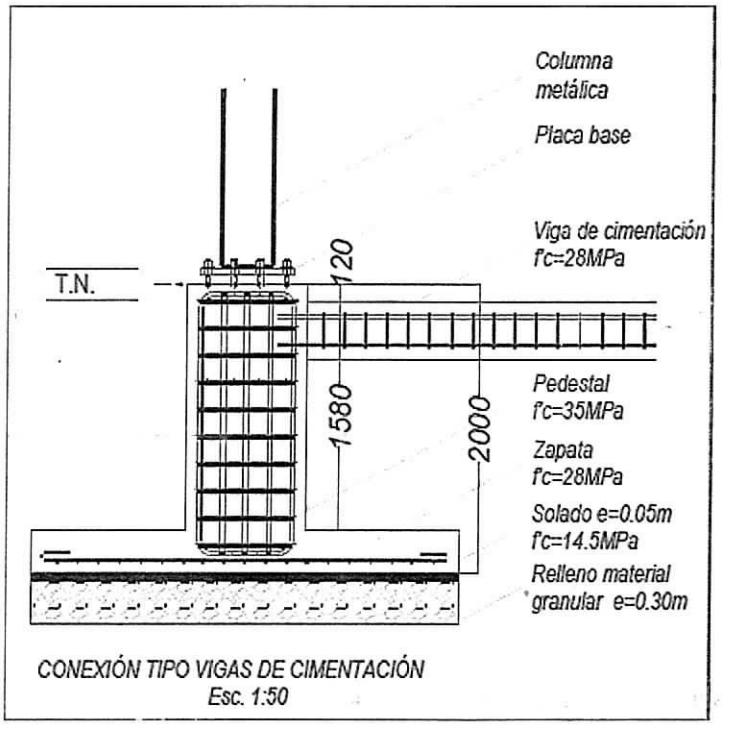


Figura 13. Conexión pedestal – Viga de cimentación según diseños.

- Para las vigas de cimentación y contrapesos de las zapatas A1, A8, E1 y E8, los cuales interfieren con las vigas de cimentación de los ejes A' y D', se solicita que su nivel de desplante sea a nivel de zapata, con esto los aceros de refuerzo de las vigas de contrapeso quedaran por debajo de la altura de los pernos de anclaje de los pedestales y así no se tendrían problemas de interferencia entre aceros y anclajes. Esto no quiere decir que se siga presentando que las vigas de cimentación VC 02' 300x400 queden embebidas en el contrapeso.

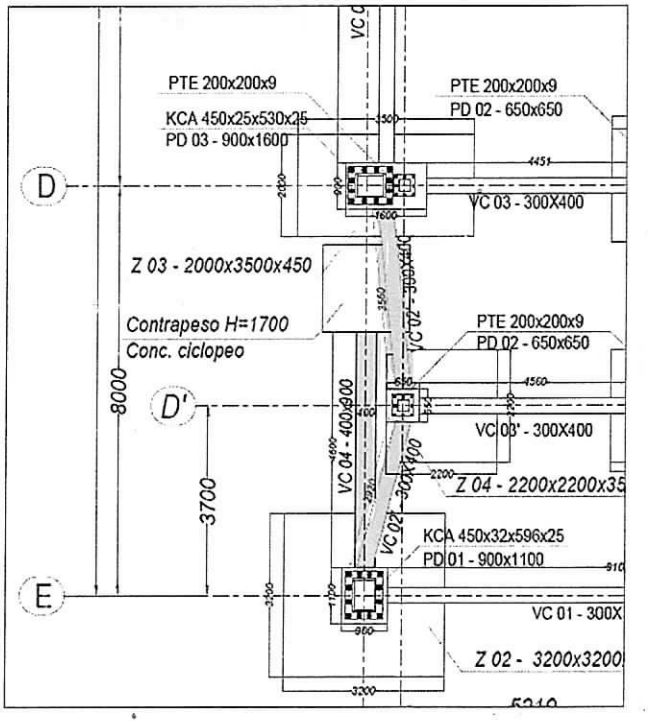


Figura 14. Cruce de vigas de cimentación con contrapeso.

- Es generalizado en los despieces de las vigas de cimentación, que los traslapos del refuerzo longitudinal se encuentren en la zona de confinamiento. Por norma es recomendable trasladarlos fuera de esta zona. De igual forma la longitud de los mismos no concuerda con la tabla de traslapos clase B descrita en los planos. Se requiere confirmar con el diseñador estas observaciones.

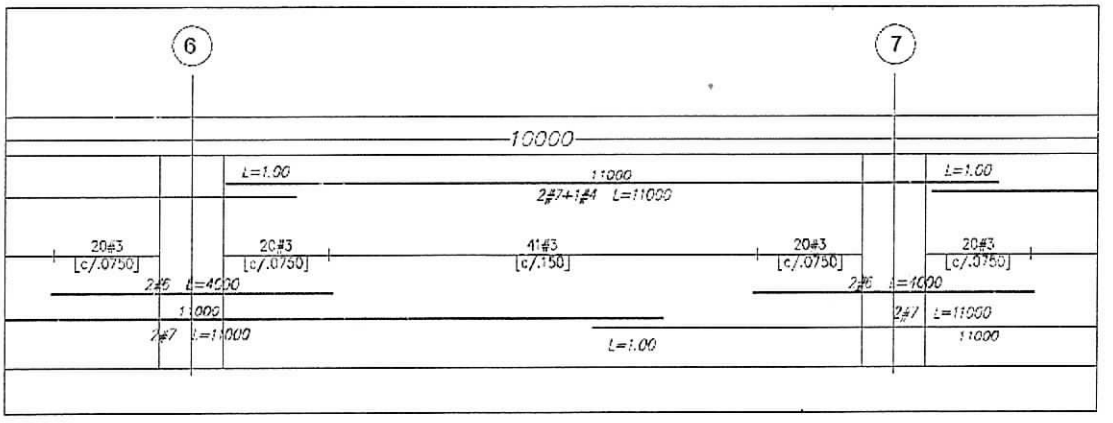


Figura 15. Traslapos en vigas de cimentación.

TRASLAPOS CLASE B (1.3*Ld cm)				
f_y = 420 MPa				
f'c (MPa)	21	28	35	42
Barra N°	m	m	m	m
2	0.39	0.39	0.39	0.39
3	0.55	0.48	0.43	0.39
4	0.73	0.64	0.56	0.52
5	0.91	0.79	0.70	0.64
6	1.09	0.95	0.85	0.77
7	1.56	1.35	1.21	1.11
8	1.78	1.55	1.12	1.03
10	2.24	1.94	1.40	1.27

Figura 16. Tabla de traslapos clase B. (plano 2/16)

- Según planos de diseños las resistencias de los elementos de concreto para la cimentación son según el plano 1/16:
  - Zapatas: 4.000 psi
  - Vigas de cimentación: 4.000 psi
  - Pedestales: 5.000 psi

  Aun así, los pedestales PD-2 son en 4.000 psi.

  En presupuesto los concretos a pagar son en las siguientes resistencias:

  - Zapatas: 3.000 psi
  - Vigas de cimentación: 3.000 psi
  - Pedestales: 3.000 psi

  Se requiere autorización para ejecutar concretos de otras resistencias mediante acta de aprobación de ítems No previstos o acta modificatoria según lo indique la entidad.

- No se encuentra presupuestado el relleno con grouting de nivelación para placas bases de estructura metálica en pedestales. Se requiere autorización para ejecutar esta actividad mediante acta de aprobación de ítems No previstos o acta modificatoria según lo indique la entidad.

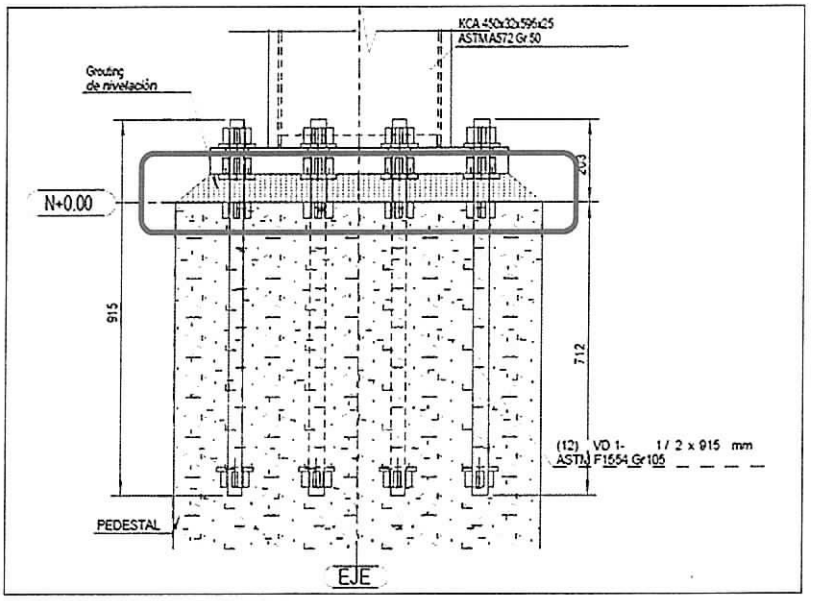


Figura 17. Grouting de nivelación en pedestales.

- No se encuentra presupuestado los pernos de anclajes dispuestos en los pedestales de concreto, los cuales son en acero ASTM F1554 Gr105 y deben ser instalados antes de fundir el concreto de pedestales. Se requiere autorización para ejecutar esta actividad mediante acta de aprobación de ítems No previstos o acta modificatoria según lo indique la entidad.

- No se especifica en planos las especificaciones de diámetro, longitud ni resistencia de los conectores de cortante en las placas en Steel deck (graderías).

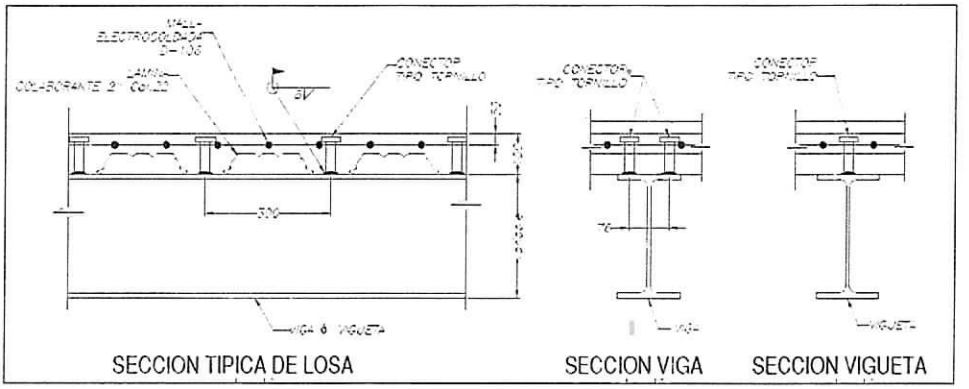


Figura 18. Sección típica de losa.

- No existe acabado sobre las placas de graderías para impedir que se filtren líquidos en las áreas de baños y camerinos ubicados debajo de ellas. Es recomendable aplicar algún acabado impermeable flexible. Igualmente, no se indica ninguna protección del Steel deck (pintura o epóxica), más en las áreas de baños que por temas de vapores puedan corroer prematuramente el acabado galvanizado del mismo. Se recomienda aplicar por lo menos pintura epóxica para su protección en áreas húmedas.

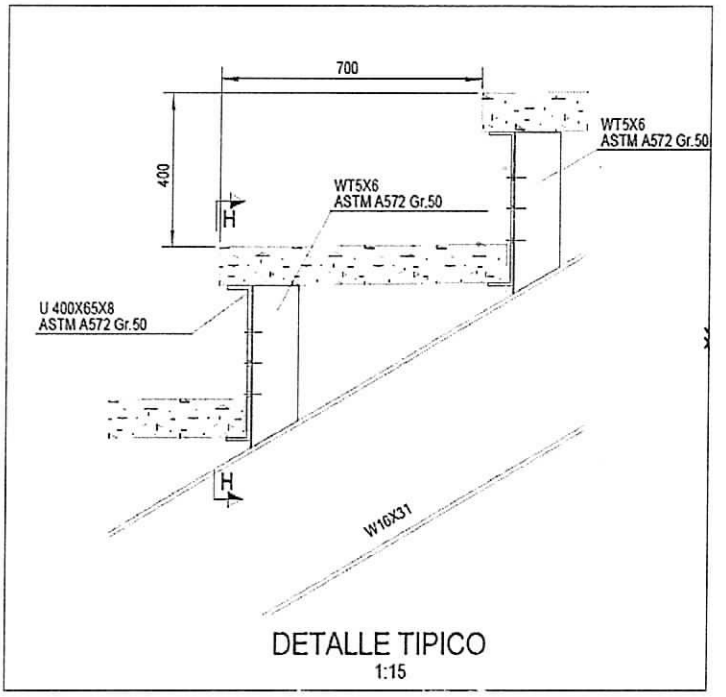


Figura 19. Detalle típico de gradería.
