IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRAFICO



Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@IDERMETA.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META





Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@IDERMETA.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@IDERMETA.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@IDERMETA.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@IDERMETA.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@IDERMETA.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META



Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@IDERMETA.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@IDERMETA.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

2259

IDERMETA

Código: FR-GCA-05
Vigencia: 24/11/2020
Versión: 02
Página 1 de 1

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE ASISTENCIA

REUNIÓN/ACTIVIDAD:	Socialización escenarios Deportivos Mantenimiento pista de patinaje y pista de atletismo en la Villa Olimpica de Villavi	**HORA:**	5:30 pm
LUGAR:	AUDITORIO IDERMETA	**FECHA:**	18/04/2023
NOMBRE RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	OBRA - INTERVENTORIA - SUPERVISIÓN		

No.	Municipio	Nombres y apellidos	Comunidad / Dirección	Teléfono o móvil de Contacto	Correo electrónico / email	Número de Documento de identidad	Grupos etarios						Genero			Enfoque diferencial									Firma
							0-5	6-11	12-17	18-26	27-59	60 o más	Hombre	Mujer	LGBTIQ	Mujer gestante	Victima	Discapacitado	Afro	Indigena	Pobreza extrema	Rom o gitano	Otro		
1	Villavicencio	Jhoana Noriega	Sn Bolivar	3105672274		1122519000			X				X					X							Jhoana Noriega
2	villavicencio	Michell vanegas		3124700958		1122925649			X					X											Michell Vanegas
3	Villavicencio	Jhona vanegas		3213487824		1122925[illegible]			X					X											Jhona
4	Villavicencio	Katerine Balanta		3203566725		1[illegible]0357			X					X											Katerine
5	Villavicencio	Melisa Moreno		3222579240		1122[illegible]289				X															Melisa Moreno
6	Villavicencio	Jeancarlo		3227[illegible]78		1123807[illegible]3				X				X											Jeancarlo
7	V/cio	[illegible]	Saludbal	3125556[illegible]17		1234428[illegible]				X				X											
8	V/cio	Fabio Alexander Castellanos Rodriguez		3143966523		1121[illegible]294					X		X												
9	V/cio	Julio Castro	Futbol	3147784776		8604631					X		X												
10	V/cio	William Castro Neira	FUTBOL	3208646753		8[illegible]323					X		X												William Castro

El IDERMETA, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, se compromete a dar el adecuado tratamiento, disposición y reserva de la información consignada en el presente documento, en cumplimiento a la protección de datos y seguridad de la información.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META

GOBERNACIÓN DEL META

2260

IDERMETA

Código: FR-GCA-05
Vigencia: 24/11/2020
Versión: 02
Página 1 de 1

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE ASISTENCIA

REUNIÓN/ACTIVIDAD:	socialización construcción escenarios Deportivos multip pista patinaje y pista atletica en la villa Olimpica Villavice	**HORA:**	5:30 PM
LUGAR:	AUDITORIO IDERMETA	**FECHA:**	18/04/2023
NOMBRE RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	OBRA INTERVENTORIA - SUPERVISIÓN		

No.	Municipio	Nombres y apellidos	Comunidad / Dirección	Teléfono o móvil de Contacto	Correo electrónico / email	Número de Documento de identidad	Grupos etarios						Genero			Enfoque diferencial								Firma
							0-5	6-11	12-17	18-26	27-59	60 o más	Hombre	Mujer	LGBTIQ	Mujer gestante	Victima	Discapacitado	Afro	Indigena	Pobreza extrema	Rom o gitano	Otro	
1	Villavicencio	Omar Noguera	Km 0 de la 24-32	3134880499	omarnog10 [illegible]	1949153						X	X	X										
2	Villavicencio	Nohelly Barrera Alvarez	porvenir	3202360721	negris.1969@hotmail.com	40.389.794					X			X										
3	Villavicencio	Martha Triana	Buenavista	3219306153	martatriana85@gmail.com	1072836254								X										
4	Villavicencio	Diana Quintero Cárdenas	A. Pinilla Alto	3144654299	inesginitivo1011@gmail.com	1121828480					X													
5	Villavicencio	Lyran Sofia Daza Penagos	Multifamiliares los Centauros	3112603552	lyran.sofia@gmail.com	1121837749			X					X										
6	Villavicencio	Gerardo Javier Torres Rebolledo	Villa Oriente	3174250745	Gjtorresdiaz@gmail.com	73573921					X		X	X										
7	Villavicencio	Victor Manuel Valero Ardila	Barrio Dos Mil	3117367264	manuelvalero@[illegible].com	1121842814					X		X	X										
8	Villavicencio	Alba Luz Ortiz Calderon	Calle 15 # 46-10 Acacias	3115959710	albaluz20479@gmail.com	40431094 acacias								X										
9	Villavicencio	ANDRES PEREZ	ESTERO	3144707458		40189530																		
10	Villavicencio	JHON MONCA		3116039730		1085487911				X														

El IDERMETA, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, se compromete a dar el adecuado tratamiento, disposición y reserva de la información consignada en el presente documento, en cumplimiento a la protección de datos y seguridad de la información.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

226)

IDERMETA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE ASISTENCIA

Código: FR-GCA-05
Vigencia: 24/11/2020
Versión: 02
Página 1 de 1

REUNIÓN/ACTIVIDAD:	Socialización escenarios Deportivos Multipropósito - Polo de entrenamiento Atletismo en la villa Olimpica de Yuri y Villavo	**HORA:**	5:30pm
LUGAR:	AUDITORIO IDERMETA	**FECHA:**	18/04/2023
NOMBRE RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	Obra - interventoria - Supervisión		

No.	Municipio	Nombres y apellidos	Comunidad / Dirección	Teléfono o móvil de Contacto	Correo electrónico / email	Número de Documento de identidad	Grupos etarios						Genero			Enfoque diferencial								Firma
							0-5	6-11	12-17	18-26	27-59	60 o más	Hombre	Mujer	LGBTIQ	Mujer gestante	Victima	Discapacitado	Afro	Indigena	Pobreza extrema	Rom o gitano	Otro	
1	Villavicencio	Jair oswaldo Diaz MEDINA		3142844797	Jadime123456@hotmail.com	8.686.569						X	X											
2	Villavicencio	Bertulfo Rojas Quimbaya	Cra 35 A 16.42	3134531908	bertulfo.RojasQuimbaya@gmail	3.275.506					X		X											
3	Villavicencio	Tatiana lazo	Intructaria	3202014748	tatianalasso08@gmail.com	1121870885								X										Tatiana
4	Villavicencio	Emerson silva Vargas	Atletismo club Bikila	3107534217	emer575510@gmail.com	74814781							X											
5	Villavicencio	Delicio Andres	calle 38	3118742627	@hotmail.com	1032								X										
6	Villavicencio	William enrique Peter Beltron	Lugo Discapacitado fisico	3153245104	Williampe700820@gmail.	1734435					X		X											
7	Villavicencio	Jugar tenis	Liga de tenis	3156036564		1121873402					X													
8	Villavicencio	ALVARO DE JESUS GOMEZ	calle 15 B.	3115070																				
9	Villavicencio	Jairo Guillermo Tovar Cortes	Cra 70 #126 11	3209227554	Jairotoco@hotmail	86.060.961					X													
10		Yoel Ortega		3114544		1001011612																		

El IDERMETA, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, se compromete a dar el adecuado tratamiento, disposición y reserva de la información consignada en el presente documento, en cumplimiento a la protección de datos y seguridad de la información.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

2262

IDERMETA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE ASISTENCIA

Código: FR-GCA-05
Vigencia: 24/11/2020
Versión: 02
Página 1 de 1

REUNIÓN/ACTIVIDAD:	Socialización escenarios Deportivos multiproposito para Atletismo en la villa Olimpica de Villavicencio-Meta	HORA:	5:30 pm
LUGAR:	Auditorio IDERMETA – VILLAVICENCIO	FECHA:	19/04/2023
NOMBRE RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	Obra - Interventoria y Supervisión		

No.	Municipio	Nombres y apellidos	Comunidad / Dirección	Teléfono o móvil de Contacto	Correo electrónico / email	Número de Documento de identidad	Grupos etarios						Genero			Enfoque diferencial									Firma
							0-5	6-11	12-17	18-26	27-59	60 o más	Hombre	Mujer	LGBTIQ	Mujer gestante	Victima	Discapacitado	Afro	Indigena	Pobreza extrema	Rom o gitano	Otro		
1		Samuel Bernal																							Samuel R.
2		Carlos Mario Moreno Carvajal																							Carlos Moreno.
3	V/cio	Juan Carlos Lozano L.	Obra	3153308256		17349127					X		X												
4	V/cio	ASTRID Ruiz G.	obra	3213836936		40341012					X			X											
5	V/cio	Alonso Penaranda	Obra	3006820614	—	88285341					X		X												
6	Villavicencio	Fleder Angelo Gaviria Gomez	Interventoria	3204175266		1.119.892.860					X														
7		Sandra P. Echeverri	Interventoria	3114954469	arasped@gmail.com	52327837					X														
8	Villavicencio	Jenny Osorio	Intervent.	3114946196		40186826					✓			✓											
9	Villavicencio	Yeison G. Gomez E.	Obra	3015466945	direccion.escenarios@gmail.com	86051263					X		X												
10	Villavicencio	Jhon Henry Ortiz Garcia.	Obra.	3102356502	Consorcio Escenarios @gmail.com	7718340128					X		X												

El IDERMETA, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, se compromete a dar el adecuado tratamiento, disposición y reserva de la información consignada en el presente documento, en cumplimiento a la protección de datos y seguridad de la información.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META

GOBERNACIÓN DEL META

2263

IDERMETA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE ASISTENCIA

Código: FR-GCA-05
Vigencia: 24/11/2020
Versión: 02
Página 1 de 1

REUNIÓN/ACTIVIDAD:	Socialización Construcción escenarios Deportivos pista de patinaje y pista Atletismo en la Villa Olímpica Villavicencio	**HORA:**	5:30 PM
LUGAR:	Auditorio IDERMETA	**FECHA:**	18/04/2023
NOMBRE RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	OBRA - INTERVENTORIA - SUPERVISIÓN		

No.	Municipio	Nombres y apellidos	Comunidad / Dirección	Teléfono o móvil de Contacto	Correo electrónico / email	Número de Documento de identidad	Grupos etarios						Genero			Enfoque diferencial									Firma
							0-5	6-11	12-17	18-26	27-59	60 o más	Hombre	Mujer	LGBTIQ	Mujer gestante	Víctima	Discapacitado	Afro	Indígena	Pobreza extrema	Rom o gitano	Otro		
1	Villavicencio	Héctor Yasid Vanegas Bobadilla	Cll 7 sur # 34-79 Cas. Las Palmas	3133078549	bianastar y deportes@gmail.com	79636983					X		X												
2	Villavicencio	Luis Siso Contreras	Urb. Las Cuscas Sol 2	3133807249	luisbuque@	40384824																			
3	Villavicencio	Paula Ipia	Cll 18 Isesa	3142335419	paulaipia01@gmail.com	1121836586					X		X					XX							
4	Villavicencio	Atalia Elena Gil M.	Cll 51 Su N° 31-94.	3143681033	ategilmendez	1121854773					X			X											
5	Villavicencio	Jesus Vicente Reyes	Cl 20 #26A-11	3118826496		93397178								V											
6	Villavicencio	Barla Vargas Gomez	Calle 18C # 14-53	3134924165	barlavargas@hotmail.com	86010466							X			X		X							
7	Villavicencio	Yurley Jorge Rodriguez	Cra 26H 40-38	3104782283	ynduz26@	1122654740					X			X									X		
8	Villavicencio	Andrea Catalina Echeverri Urbano	Calle 25d # 20-22	3174961360	andreaecheverriurbano@gmail.com	1006802416				X				X									X		
9		Gerardo Barrero Sarria	Cll 24 15-63	3133991859	cheo3456	86052117																			
10	Villavicencio	Hugo Montes	Cra 24 # 24A-72.	3152204540		1121868945					X		X												

El IDERMETA, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, se compromete a dar el adecuado tratamiento, disposición y reserva de la información consignada en el presente documento, en cumplimiento a la protección de datos y seguridad de la información.

2264

IDERMETA

Código: FR-GCA-05
Vigencia: 24/11/2020
Versión: 02
Página 1 de 1

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE ASISTENCIA

REUNIÓN/ACTIVIDAD:	Socalización construcción escenarios Repot. Multip pista patinaje y pista atletica en la villa Olimp. Villavicencio	**HORA:**	5:30 PM
LUGAR:	AUDITORIO IDERMETA	**FECHA:**	18/04/2023
NOMBRE RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	OBRA INTERVENTORIA - SUPERVISION		

No.	Municipio	Nombres y apellidos	Comunidad / Dirección	Teléfono o móvil de Contacto	Correo electrónico / email	Número de Documento de Identidad	Grupos etarios						Genero			Enfoque diferencial									Firma
							0-5	6-11	12-17	18-26	27-59	60 o más	Hombre	Mujer	LGBTIQ	Mujer gestante	Victima	Discapacitado	Afro	Indigena	Pobreza extrema	Rom o gitano	Otro		
1	Vlcio	Mario Castro Florez Buitrago	Tecnico CRD	3185886846	mario.2324@hotmail.com	80988896					X			X											
2	Villavicencio	Johan Sebastian Marin Caicedo	Patinaje de Ceneras	3183863509	jhoan.marin@millenos.edu.	1121923567					X		X												
3	Villavicencio	Tatiana Zambrano	Tecnico uno	3223416494	tatiazambrano29@gmail.com	1121980942					X			X											
4	Vlcio	Daniela Mahecha Arias	Unicom	3194454237	daniela.mahecha938@hotmail.com	1121905024					X			X											
5	Vlcio	Yisseth Fernanda Arenas Arguello	Atletismo	3107606366		1121903112					X														
6	Vlcio	Prospero Hugo Barbosa Castillo	Instructor Futsala	3112961661	psychuegoo@hotmail.com	86.060.311			X																
7	Vlcio	José Antonio Fiano G.	Recreacion	3108086414	fianogosa.Antonio@gmail	6191215					X			X											
8	Vlcio	William Alexander Lasso	Deportista	3224371401		1121836687					X														
9	Villavicencio	Erika tatiana Jorigoa Ramirez	Deportista	3219264673		1006875990				X															Erika Ramirez
10	VILLAVICENCIO	MIGUEL RINCON DE PORTA		1122511776		1122511776																			

El IDERMETA, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, se compromete a dar el adecuado tratamiento, disposición y reserva de la información consignada en el presente documento, en cumplimiento a la protección de datos y seguridad de la información.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

2265

IDERMETA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE ASISTENCIA

Código: FR-GCA-05
Vigencia: 24/11/2020
Versión: 02
Página 1 de 1

REUNIÓN/ACTIVIDAD:	Socialización Construcción Escenarios Deportivos multip. pista patinaje y pista de atletismo en la villa Olimpica Villav.	**HORA:**	5:30PM
LUGAR:	AUDITORIO IDERMETA	**FECHA:**	18/04/2023
NOMBRE RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	OBRA - INTERVENTORIA - SUPERVISIÓN		

No.	Municipio	Nombres y apellidos	Comunidad / Dirección	Teléfono o móvil de Contacto	Correo electrónico / email	Número de Documento de identidad	Grupos etarios						Genero			Enfoque diferencial									Firma
							0-5	6-11	12-17	18-26	27-59	60 o más	Hombre	Mujer	LGBTIQ	Mujer gestante	Victima	Discapacitado	Afro	Indigena	Pobreza extrema	Rom o gitano	Otro		
1	V/C/O	Ericd Martinez	IDERMETA	3204232	alatec057@gmail.com	17.312582						X													
2	V/C/O	Pedro Rozo	IDERMETA	3136901030	Pedro3899991@hotmail.com	1121889777																			
3	V/C/O	Sebast... Ve...		3127	Sebast...@G...mail	1121																			
4	V/C/O	Daniel Tabares	IDERMETA	3219465777	daniel tabares2005@Gmail	1122510 5245			X				X												Daniel Tabares
5	V/C/O	Ishara Abigel	IDERMETA	3125870773	isharaangel482@gmail.com	1123436928			X																
6	V/C/O	David Baquero	IDERMETA	3203232952	davidsantiago6757@gmail.com	1006797775				X			X												David B.
7	V/C/O	Zharick Mondragon	IDERMETA	3134086653	mondragonzikey@gmail.com	1029983716			X					X											Zharick M.
8	V/C/O	Sofia Becerra	IDERMETA	3123433726	beterrasofia@gmail.com	1123432580			X					X											Sofia B.
9	V/C/O	Luna Novoa	IDERMETA	3116249674	Lunanovgon@gmail.com	1122511793			X					X											Luna N.
10	V/C/O	Alfredo Romero	Idermeta	311 585 82	Romeroprofes...	1225...			X				X												

El IDERMETA, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, se compromete a dar el adecuado tratamiento, disposición y reserva de la información consignada en el presente documento, en cumplimiento a la protección de datos y seguridad de la información.

2266

IDERMETA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE ASISTENCIA

Código: FR-GCA-05
Vigencia: 24/11/2020
Versión: 02
Página 1 de 1

REUNIÓN/ACTIVIDAD:	Socialización construcción escenarios Deportivos pista de Patinaje y pista Atletica en la Villa Olimpica Villavicencio	**HORA:**	5:30 PM
LUGAR:	AUDITORIO IDERMETA	**FECHA:**	18/04/2023
NOMBRE RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	OBRA - INTERVENTORIA - SUPERVISIÓN		

No.	Municipio	Nombres y apellidos	Comunidad / Dirección	Teléfono o móvil de Contacto	Correo electrónico / email	Número de Documento de identidad	Grupos etarios						Genero			Enfoque diferencial									Firma
							0-5	6-11	12-17	18-26	27-59	60 o más	Hombre	Mujer	LGBTIQ	Mujer gestante	Victima	Discapacitado	Afro	Indigena	Pobreza extrema	Rom o gitano	Otro		
1	V/cio	MARCO ALVAREZ	VIZCAYA	3212337441	marcoal1@hotmail.com	80.110.349					X		X												
2	V/cio	ARGENIS GARCES	LIGA DE ATLETISMO META	3200201	argaycaces@hotmail.com	15 548							X												
3	V/cio	Sebastian Cardona Barrios	LIGA DE DEPORTE DISCA. FISICA	3144743289	sebastian.cardona@unillanos.edu.co	1120874537				X			X												
4	V/cio	Juan Diego Villamil Reyes	Liga de Atletismo	3158524164	Diego8397@gmail.com	1003838410				X			X												
5	V/cio	Samuel Andres Pacheco Arias	liga atletismo	3134592654	Samuel.pacheco@campus.udc.edu.co	1123802216			X				X												
6	V/cio	Angel Steven Morales Orozco	Liga de Atletismo	3133480507	angelstevenmorales@gmail.com	1.120.397.280			X				X												
7	V/cio	[illegible]	[illegible]	3115524021	[illegible]	1.120.370.271								X											
8	V/cio	Felipe Leon	Deportista Liga Boxeo	3118884118		1121829080				X			X												
9	V/cio	Heiba Archila Sonabria	Liga Rugby del Meta	3503985103	ligarugbymeta2018@gmail.com	40396053					X			X											
10	V/cio	Erika Natalia Reyes.	Liga Rugby Meta.	3155717455.	erikareyes-9709@hotmail.com	1121948741				X				X											

El IDERMETA, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, se compromete a dar el adecuado tratamiento, disposición y reserva de la información consignada en el presente documento, en cumplimiento a la protección de datos y seguridad de la información.

2267

IDERMETA

Código: FR-GCA-05
Vigencia: 24/11/2020
Versión: 02
Página 1 de 1

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE ASISTENCIA

REUNIÓN/ACTIVIDAD:	Socialización construcción escenarios Deportivos Motil. Pista de patinaje y Pista atletica en la Villa Olimpica Villavicencio	**HORA:**	5:30 PM
LUGAR:	Auditorio IDERMETA	**FECHA:**	18/04/2023
NOMBRE RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	OBRAS - INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN		

No.	Municipio	Nombres y apellidos	Comunidad / Dirección	Teléfono o móvil de Contacto	Correo electrónico / email	Número de Documento de identidad	Grupos etarios						Genero			Enfoque diferencial										Firma
							0-5	6-11	12-17	18-26	27-59	60 o más	Hombre	Mujer	LGBTIQ	Mujer gestante	Victima	Discapacitado	Afro	Indigena	Pobreza extrema	Rom o gitano	Otro			
1	Meta	Maryluz		3247738788	fongon 57@hotmail.com	1122788865																				Maryluz
2	Villavo	Fanuel A. Gonzalez F.		3202336654	fongon 57@hotmail.com	17.312.738																				
3	Villavo	Hector Abdon C.		3008210657	Yasstore1003@hotmail.com	19065599																				
4	Villavo	Soyda Achon		3005875078	Soydaxxx@hotmail.com	35260777					X															
5	Villavo	Daniel Segura Sandoval		3008527764		1121948215			X																	
6	Villavo	Wilson Javier Parrado Rios		3163072773	parradowilson0551@hotmail.com	86-082.058			X	X																
7	Villavo	Alexander		3204129768		7999785					X		X													
8	Villavo	Mariana Piedrahita		3108710168	mariana.piedrahita@gmail.com	1.122923.332			X					X												Mariana Piedrahita
9	Villavicencio	Sara valentina Ramos León.	Cll 49 BIS 84B	3109557527	valentina.ramos1007@gmail.com	1052243144			X					X												
10	Villavicencio	Heidy viviana Palacios Salgado		3114638508	vivip-208 hotmail.com	40310621					X			X												Sara Ramos Heidy Palacios

El IDERMETA, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, se compromete a dar el adecuado tratamiento, disposición y reserva de la información consignada en el presente documento, en cumplimiento a la protección de datos y seguridad de la información.

2268

IDERMETA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE ASISTENCIA

Código: FR-GCA-05
Vigencia: 24/11/2020
Versión: 02
Página 1 de 1

REUNIÓN/ACTIVIDAD:	Socialización construcción escenarios Deportivos multiple pista de patinaje y pista atletismo en la Villa Olímpica Villavicencio	**HORA:**	5:30 PM
LUGAR:	AUDITORIO IDERMETA.	**FECHA:**	18/04/2023
NOMBRE RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	OBRA – INTERVENTORIA – SUPERVISIÓN		

No.	Municipio	Nombres y apellidos	Comunidad / Dirección	Teléfono o móvil de Contacto	Correo electrónico / email	Número de Documento de identidad	Grupos etarios						Genero			Enfoque diferencial								Firma
							0-5	6-11	12-17	18-26	27-59	60 o más	Hombre	Mujer	LGBTIQ	Mujer gestante	Victima	Discapacitado	Afro	Indigena	Pobreza extrema	Rom o gitano	Otro	
1	VILLAVICENCIO	EDUARD ESPINOSA	INDEPENDIENTE	3233218703	eespinoso-edu@yahoo.es	9253804																		
2	Villavicencio	Santiago Valderrama A.	Lucha	3104001584		1006729414				Y			X											
3	Villavicencio	Diego Alejandro Lopez Neira	Lucha	3125001077	dialejo.2000@gmail	1006876268				X			X											
4	Villavicencio	Jhorman David Perez Sarmiento	Lucha	3148444419	DP264625@gmail	1123801531							X											
5	Villavicencio	Wilfredo Enrique Sorch	Lucha	3108005639	wilfredo.enrique@hotmail.com	1121962732						X	X											
6	VILLAVICENCIO	GABRIEL PERDOMO				1.121.862.030																		GABRIEL P
7	Villavicencio	Kaleth Santiago Ruiz Castro	Lucha	3107607558		1029981395									X								X	
8	VCIO	Cairo Steven Llerena Avila	Boxeo	3103728171		1193221795							X											Cairo
9	Villavicencio	Jeferson Gutierrez Soto	Boxeo	3112006632		1234789518							X											Jeferson G
10	Vcio	[illegible]	[illegible]	3132613481		1123[illegible]																		

El IDERMETA, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, se compromete a dar el adecuado tratamiento, disposición y reserva de la información consignada en el presente documento, en cumplimiento a la protección de datos y seguridad de la información.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

ACTA N° _____	FECHA:	HORA:	
	19/04/2023	Inicio: 4:05 PM	Fin: 4:58 PM
	LUGAR:	SITIO DE LAS OBRAS FASE 1 Y FASE 2	
RESPONSABLE:	IDERMETA-INTERVENTORIA-OBRA		

OBJETIVO O PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

COMITÉ DE EMPALME PARA INICIO DE OBRAS FASE 2 POSTERIOR A VISITA INICIAL DE CAMPO

AGENDA / ORDEN DEL DÍA

SOCIALIZACION DE INICIO FASE 2 Y TERMINACION FASE 1 Y COORDINACION DE INFORMACION REQUERIDA PARA INICIO DE LAS OBRAS.

DESARROLLO

FASE 1: CONTRATO DE OBRA N.º 351 DE 2019 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLIMPICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO MACAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

FASE 2: CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023 "CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

Se da inicio al comité entre fase 1 y fase 2. Asiste por fase uno el ingeniero César Casanova y hace presencia el ingeniero de Duván García por parte de la interventoría, la doctora Bibiana Pan, como supervisora y representante de la entidad contratante hace una presentación de los asistentes y explica que el motivo de la reunión es para informar los inicios de los trabajos con relación a coliseos menores multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo la cual está ubicando dentro del área del estadio por tanto hay unas interrogantes o solicitudes por parte de los ejecutores del nuevo contrato ya que hay obras que requieren, continuidad, empalme o coordinación para su ejecución.

El consorcio fase 2, solicita al contratista de la Villa olímpica y reforzamiento del estadio por medio de la entidad contratante se facilite o haga la entrega de planos récord de las redes que se construyeron en especial la de la pista de atletismo en ocasión del contrato de obra número 106 del 2023, tiene dentro de los puntos a intervenir la pista atlética que está cerca o dentro del estadio la solicitud se hace para evitar traumatismos de las redes existentes que aún están con garantía.

El ingeniero César director de obra de fase 1, informa que la planimetría récord aún no está lista para entregar. La interventoría de fase 2 , aclara que la planimetría no requiere que sea en físico y que puede trabajarse con los archivos digitales con el fin de corroborar cotas distancias, ubicación y que podría ser incluso más útil en la entrega de los archivos en AutoCAD, existentes aunque a los mismos les falte ajustes.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

Por otro lado el contratista de fase 2, representado por el ingeniero Yeisson expresa inquietud por la estructura de la pista de atletismo entregada por la entidad ,ya que en la documentación contractual dice que tiene una estructura de 28 cm pero eso no cumpliría con la estructura de la IAAF, faltaría un aumento en la capa de relleno y sub base lo que estaría dando una estructura total de 50 cm de profundidad por tanto se requiere saber la profundidad que está la red de suministro a lo que el ingeniero César casanova director fase 1, dice que se encuentra esta red de suministro entre los 10 y 15 cm del terreno actual y que la red de señal de los aspersores va paralela que es la que maneja los sensores para que se active el riego y pasa por el lado Nor-oeste del estadio los filtros tienen dos cajas .

El contratista de fase 2, indaga sobre la posible fecha en que pueda hacerles entrega del área de intervención para pista de atletismo, la supervisora de la entidad doctora Bibiana Pan, informa que el estadio estaría comenzando a hacer entrega el 30 de abril a la entidad y después de esta fecha que esté a cargo de IDERMETA entregará a fase 2.

La interventoría de fase 2, solicita que se establezca claramente las medidas de protección a nivel de la obra que aún tiene garantía y estabilidad. Especialmente en el área de estadio donde se encuentra la grama, las sillas los filtros y que por tanto se requiere que detallen cuidadosamente la entrega del espacio y las responsabilidades de cada una de las partes.

El contratista de fase 2, pregunta sobre el actual uso de la cancha a lo que y IDERMETA responde que en el momento están aún en campeonato de fútbol masculino el cual culmina a mediados de mayo.

El contratista de obra fase 2, recuerda que las obras están programadas para un año de ejecución y que hay que articulado los trabajos con el equipo de llaneros ya que abra un periodo donde se tendrá maquinaria que no va a poder retirar del perímetro del estadio cuando esté en ejecución la pista y no sabe si eso es permitido por la federación. Además, que eso genera algún problema con los medios de evacuación, ñas trasmisiones de partidos y el aforo del estadio porque los partidos deberían hacerse a puerta cerrada por seguridad.

La supervisora de IDERMETA, informa que llaneros se le ha hecho informe verbal del encerramiento perimetral que se le va a hacer a la cancha y los directivos del equipo informaron que en el mes de mayo tienen un receso de dos meses y se inicia otro campeonato que la entidad solicita que se programen los trabajos para tener una gran intervención y avance en estos dos meses y posterior a este tiempo hacerlo por sectores.

La interventoría de fase 2, solicita preguntar oficialmente si ese tipo de trabajos es permitido y que se haga la consulta a llaneros fútbol club de las fechas que tiene femeninas y masculinas programadas porque en los partidos con público, el PMU no permite gestión de riesgo cuando hay más de 4000 personas que se tenga cerramientos perimetrales en torno a dónde está la aglomeración de gente.

Lo otro es preguntar a win Sports, si ellos pueden transmitir con este tipo de cerramientos maquinaria y material en el contorno de la cancha.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

En cuanto a las obras fase 1 dice que termina su ejecución para iniciar el proceso de entrega de interventoría y entidad a partir del 30 de marzo. Se solicita por parte de la interventoría y la obra de fase 2 establecer de manera oficial quién realizará el mantenimiento de la cancha quién responde si hay partidos y cómo será la entrega del área de atletismo con relación a estas obras perimetrales existentes que tiene garantía.

La supervisión aclara que el 30 de marzo, se acaban las obras, pero eso no quiere decir que estén recibidas a satisfacción y que hará la consulta para mirar la manera en el cual el arrendatario o llaneros fútbol club hace el ajuste de la programación para el uso del escenario.

El contratista de fase 1 dice que la cancha auxiliar, tejo, espacio público y parqueaderos entregarán a IDERMETA, apartir 30 de abril y recomienda aislarse de la parte intervenir con algún tipo de cerramiento. Adicionalmente entregará los manuales de uso de estos espacios con el acta de terminación.

La interventoría fase 2 reitera la solicitud al contratista de hacer actas de vecindad a las obras existentes y las vías perimetrales o en otras palabras las actas del estado de recibo de cada uno de los espacios intervenidos en fase 1 que colinden con la obra actual.

Uno de los principales interrogantes de fase 2, es saber la resistencia de la placa de concreto de piso existente en maratón y si la misma alcanza a resistir la entrada de maquinaria pesada al sector de la pista de atletismo y la altura que está manejando esa puerta.

El contratista y la interventoría de fase 1 aclara que el parqueadero Norte, no se puede hacer uso hasta después de mediados de mayo por tanto el acceso a las obras construidas sigue siendo por el lado de maratón y aclara con relación a la pregunta hecha al inicio del comité sobre la resistencia de la placa de maratón que es una MR4 MPA , para tránsito Pesado y que por ese sector han entrado PH a la pista que resiste pero no se recomienda entrar maquinaria muy grande por la existencia de bordillos internos que están estabilidad la altura de acceso es de 3.80 mt.

El contratista fase 1 informa que la subestación 3, queda para el servicio de escenario multifuncionales para que de allí se saque la alimentación a los cuartos queda con transformador y la provisional se está haciendo uso en la actualidad y puede servir para la conexión de obra tocaría hacer el trámite ante la EMSA para cambiar el usuario.

El contratista de obra fase 2, le recuerda la entidad que en la visita inicial se planteó la entrega de los planos de coliseos menores o multifuncionales lo cual no se ha efectuado.

Por otro lado, el ing. Yeisson le solicita al director de obra de ing. César Casanova, la información de la red de RCI del estadio para poder calcular la presión y el caudal con el cual se va a trabajar y dar continuidad a la red de la fase 2.

El ing. César informa que la red de acueducto paralela al parqueadero va en 4" pulgadas y la cercana al edificio actual es de 2" pulgadas que el suministro de bombas no hace parte de lo entregado por el estadio, el ing. Yeisson solicita nuevamente la planimetría RCI, para poder

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

calcular presión de baños y escenarios. La interventoría de fase 2, solicita al contratista realizar una consulta al acueducto de las acometidas aprobadas en la disponibilidad fase 2.

Así las cosas, se resumen los siguientes compromisos:

- El 24 de abril inicio de obra
- El 21 de abril aprobación del personal de interventoría
- El 19 de abril inicio de interventoría de fase 2
- Pendiente entrega de planimetría de coliseos menores la cual había sido pactada para el 17 de abril
- El 20 de abril inicio de entrega de coliseos multifuncionales y pista de patinaje
- posterior al 30 de abril fecha de terminación de fase 1, entrega de pista de atletismo y áreas perimetrales intervenidas bajo ese contrato.

Se da por terminado el comité y se deja constancia que hace parte del mismo el formato de asistencia de la entidad contratante.

COMPROMISOS					
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA	ESTADO		
			CE	CFT	NC

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

Nota: Agréguense cuantas celdas se requieran para compromisos y asistentes, igualmente se podrá imprimir la hoja 2 cuantas veces sea necesario para dar continuidad al acta (aplica en los casos que se registre de forma manual).

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

2274

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

ACTA N° _____	FECHA:	HORA:	
	28-04-2023	Inicio: 8 am	Fin: 2 pm
	LUGAR:	OFICINA INTERVENTORIA	
RESPONSABLE:	INTERVENTORIA - OBRA		

OBJETIVO O PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

El objetivo de la reunión está en verificar los diseños entregados por la entidad en cuanto a estudios, planimetría y memorias de cálculo de los diferentes componentes de los tres proyectos, se realizará inventario de la información entregada conjuntamente con el contratista y se dejará constancia de las observaciones encontradas.

AGENDA / ORDEN DEL DÍA

Revisión de estudios y diseños por proyectos

1. Revisión estudios y diseños escenarios multifuncionales
2. Revisión estudios y diseños pista de patinaje
3. Revisión estudios y diseños pista de atletismo

DESARROLLO

se realiza verificación de la información entregada por la entidad contratante por cada proyecto del contrato, se suscribe lista de chequeo inventario de diseños existentes villa olímpica fase 2 la cual se incluye como anexo de la presente acta, en esta se deja evidencia de las observaciones encontradas durante la revisión

PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

Componente topografía:

- Se verifica la documentación entrega Informe estudios técnicos de georreferenciación, memorial de responsabilidad, certificado de calibración de equipos, se revisa paquete de 7 planos topográficos que se relacionan en lista de chequeo anexa

Componente suelos:

- Se revisa estudio geotécnico realizado por la empresa NHSQ en el cual se realizan los diferentes ensayos y estudios del área a intervenir para los escenarios multipropósito

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

10

Componente arquitectónico:

- Se revisa licencia de construcción que se encuentra vigente, con una fecha de plazo hasta el día 29 de septiembre de 2024 según resolución No r22-0319 expedida el 29 de septiembre de 2022 por medio del cual se revalida licencia urbanística de construcción
- Se revisa estado de disponibilidad y viabilidades de servicios públicos, se encuentra que para este proyecto se toman las disponibilidades correspondientes a la fase 1 de villa olímpica, cabe anotar que para fase 2 las conexiones y acometidas, se realizaran a redes ya existentes.
- Se revisa informe arquitectónico de estudios técnicos AIM el cual describe las especificaciones y normatividad que se tuvieron en cuenta como variables para la proyección del diseño arquitectónico.
- Se entrega memorial de responsabilidad del diseñador proyectista.
- Se revisa paquete de diseño compuesto por 20 planos en los que se encuentran la planimetría entregada a curaduría y la planimetría que hace parte del proyecto de estudios y diseños del AIM los cuales están relacionados en la lista de chequeo anexa a esta acta.

Componente estructural:

- Se realiza revisión de informe estructural que hace parte del paquete de estudios y diseños, se entrega memorial de responsabilidad del profesional diseñador
- Se revisa paquete de 16 planos estructurales los cuales hacen parte de la información entregada en la curaduría para licencia de construcción.
- Se anexa a esta acta lista de chequeo inventario de planos y diseños en la que se dejan las observaciones encontradas para cada plano.

Componente hidrosanitario:

- Se revisa estudio hidrosanitario que hace parte del paquete de estudios técnicos entregados por AIM en el cual se encuentra diseño de redes hidráulicas de suministro, redes de redes sanitarias, redes de aguas lluvias y red contraincendios.
- Se realiza revisión a paquete de 3 planos correspondientes a la red sanitaria en la que se especifican diámetros de tubería localización de pozos y cajas de inspección, así como la conexión de descarga a la red existente.
- Se entrega y revisa paquete de 3 planos de la red hidráulica de suministro en la que se especifican las acometidas de cada escenario, los diámetros de tuberías, conexión de aparatos.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

11

- Se revisa planimetría de la red de aguas lluvias se entrega un plano que especifica las bajantes de la cubierta y la conexión de esta tubería a la red y pozo existente, se especifican detalles cajas de inspección diámetros pendientes y de la tubería.
- Se entrega planos de diseños de red contraincendios 3 planos que contienen la implantación de la conexión a red existente, planos de distribución redes y gabinetes de los dos edificios, para este diseño se deja la salvedad que no existe plano red sistema de detección y sistema de alarmas.
- Se entregan 4 planos isométricos correspondientes a diseño de red de aguas lluvias, red hidráulica y red de contraincendios.

Cabe anotar que para la revisión de esta información se anexa lista de chequeo inventario de diseños existentes villa olímpica fase 2 en la que se dejan consignadas las observaciones realizadas en la revisión conjunta.

Componente eléctrico:

- Se verifica informe diseño eléctrico que hace parte del paquete de estudios y diseños entregados por la entidad, contiene cuadro de cargas y memorias de cálculo, se entrega memorial de responsabilidad del profesional diseñador del proyecto
- Existe factibilidad y aprobación del proyecto correspondiente a la fase 1 sin embargo se debe realizar conexión a transformador instalado por lo cual se deben gestionar los trámites ante la EMSA para conexión de medidores que hacen parte de esta fase.
- Se entregan estudios fotométricos para la iluminación del interior de los escenarios, cabe anotar que no se encuentra estudio fotométrico para la iluminación del alumbrado público de las zonas exteriores.
- Se revisa la planimetría entregada, plano de acometidas, diagrama unifilar, apantallamiento, planos de iluminación, tomacorrientes y plano de detalles, se verifica paquete de 8 planos que hacen parte del diseño eléctrico se anexa lista de chequeo inventario de diseños existentes villa olímpica fase 2 en la que se dejan consignadas las observaciones encontradas.

Componente plan de manejo ambiental

- Se verifica estudio técnico plan de manejo ambiental informe que hace parte de la información entregada por AIM, se entrega memorial de responsabilidad del profesional.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta - Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

12

2. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

Componente topografía:

- Se verifica la documentación entrega Informe estudios técnicos de georreferenciación, memorial de responsabilidad del personal profesional.
- Se revisa planimetría entregada un total de 5 planos que contienen la información correspondiente a implantación general, curvas de nivel y secciones transversales por cada escenario, las observaciones encontradas se dejan consignadas en acta lista de chequeo anexa a este documento.

Componente suelos:

- Se revisa estudio geotécnico y subrasante realizado por la empresa NHSQ en el cual se realizan los diferentes ensayos y estudios del área a intervenir para la pista de patinaje.

Componente arquitectónico:

- Se entrega informe arquitectónico que hace parte del paquete de estudios y diseños realizados por el AIM, el cual contiene los parámetros de diseño bajo las normas técnicas y normas reglamentarias para pista de ruta y pista de velocidad.
- Se revisa paquete de 4 planos de diseño entregados, los cuales contiene la implantación general del proyecto planos de obras exteriores, alzados, planta pista de velocidad y pista de ruta, así como plano de señalética
- Las observaciones encontradas se dejan consignadas en el acta lista de chequeo inventario diseños existentes villa olímpica fase 2.

Componente estructural:

- Se revisa informe estructural que contiene cálculos y memorias de muro de contención
- Se entrega memorial de responsabilidad del profesional diseñador
- Se entrega un plano de detalle muro de contención, las observaciones encontradas se dejan consignadas en el acata lista de chequeo inventario adjunta a esta acta.

Componente hidrosanitario:

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta - Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

13

- Se revisa estudio hidrosanitario que hace parte del paquete de estudios técnicos entregados por AIM en el cual se encuentra diseño de redes de aguas lluvias para drenaje de pista, se entrega memorial de responsabilidad del profesional diseñador
- Se revisa un plano que contiene implantación pista de patinaje, red de aguas lluvias y detalles.

Componente eléctrico:

- Se verifica informe diseño eléctrico que hace parte del paquete de estudios y diseños entregados por la entidad, contiene cuadro de cargas y memorias de cálculo, se entrega memorial de responsabilidad del profesional diseñador del proyecto
- Se revisa paquete de 3 planos que contienen, acometida, diagrama unifilar y detalles constructivos las observaciones encontradas se dejan consignadas en el acata lista de chequeo inventario adjunta a esta acta.
- no se evidencia en la planimetría entregada con los diseños, especificaciones, memorias, cálculos etc. de las redes realizadas en fase 1 y la capacidad de la sub estación 3 requerido para verificación de planimetría y proyecto eléctrico a lugar.

Componente ambiental:

- Se verifica estudio técnico plan de manejo ambiental informe que hace parte de la información entregada por AIM, se entrega memorial de responsabilidad del profesional.

Componente diseño de pavimentos:

- Se verifica informe estructura de pavimento que hace parte de los estudios técnicos entregados por el AIM, en este se realiza cálculo de la estructura y recomendaciones de acabado final para la superficie de la pista, se entrega memorial de responsabilidad del profesional.

3. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

Componente suelos:

- Se revisa estudio geotécnico y subrasante realizado por la empresa NHSQ en el cual se realizan los diferentes ensayos y estudios del área a intervenir para la pista, se debe verificar valor de los CBR tomados ya que no corresponden al sitio a ejecutar
- Se entregan soportes de los CBR y PST realizados en las pistas de atletismo y patinaje

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HAGAMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

14

- dentro de la información aportada por la entidad contratante se evidencia en el estudio de suelos 4 CBR de los cuales ninguno se ubica en el sitio donde se va a realizar la pista de atletismo-
- Se solicita a la entidad contratante consulta con la consultoría que realizo los estudios y diseños de la pista con relacional diseño de la estructura de pista de atletismo, ya que no se encuentra coincidencia con los requerimientos que expresa el manual de escenarios deportivos del ministerio de deporte

Componente topografía:

- Se verifica la documentación entrega Informe topográfico que hace parte del paquete de estudios técnicos entregado por el AIM, se entrega memorial de responsabilidad del personal profesional.
- Se revisa planimetría entregada un total de 2 planos que contienen la información correspondiente a localización ovalo interno pista de atletismo estado actual, secciones y perfiles topográficos, las observaciones encontradas se dejan consignadas en acta lista de chequeo anexa a este documento.

Componente arquitectónico:

- Se entrega informe arquitectónico que hace parte del paquete de estudios y diseños realizados por el AIM, el cual contiene los parámetros de diseño bajo las normas técnicas y normas reglamentarias, análisis urbano y recomendaciones para pista de atletismo
- Se entrega memorial de responsabilidad del diseñador proyectista.
- Se revisa paquete de 5 planos de diseño entregados, los cuales contiene la implantación general, plano arquitectónico, localización ovalo interno pista de atletismo certificada, detalles constructivos cárcamo bordillo de confinamiento pista de atletismo, detalles constructivos pista de atletismo, Las observaciones encontradas se dejan consignadas en el acta lista de chequeo inventario diseños existentes villa olímpica fase 2.

Componente hidrosanitario:

- Se revisa estudio hidrosanitario que hace parte del paquete de estudios técnicos entregados por AIM en el cual se encuentra diseño de recolección red de aguas lluvias para drenaje de pista, se entrega memorial de responsabilidad del profesional diseñador

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

15

- Se revisa un plano que contiene implantación pista, red de aguas lluvias y detalles cárcamos, cunetas y bordillos.

Componente diseño de pavimentos:

- Se verifica informe estructura de pavimento que hace parte de los estudios técnicos entregados por el AIM, en este se realiza cálculo de la estructura y recomendaciones de acabado final para la superficie de la pista, se entrega memorial de responsabilidad del profesional. Cabe anotar que se encuentra que el diseño se trabajó con CBR que no corresponde a la zona a intervenir, se debe realizar verificación del diseño y de la estructura final

Componente eléctrico:

- Acorde a las recomendaciones técnicas dejadas en el informe de diseño se cita, "Deben contemplarse salidas de tomacorrientes dobles para la energización de dispositivos en la mesa de jueces, como: consolas, estadísticas, anotadores, entre otros. Las salidas eléctricas deben ser reguladas. También salidas de datos, audio, video, transmisión de información, sonido y gráficos."
- No existen diseños eléctricos que cumplan el requerimiento dado en el diseño arquitectónico. Se debe revisar requerimiento según normativa.
- No se evidencio dentro de la planimetría entregada por la entidad para este escenario planimetría de la ejecución de estadio en fase 1, la cual es indispensable para el planeamiento de la intervención por la información de profundidades y ubicación de tuberías, cálculo de presión, caudal diámetro, ubicación y demás , es relevante el plano de la red de suministro y riego y la de los sensores de la misma, para poder programar coordinar y optimizar los trabajos de intervención en este escenarios, adicionalmente porque dichas obras se encuentran en periodo de garantía y estabilidad de obra .

CONCLUSIONES GENERALES

Las observaciones encontradas en el paquete de diseños entregado por la entidad se dejan consignadas en la lista de chequeo inventario de diseños villa olímpica fase 2, documento que se adjunta como anexo a esta acta, en él se relacionan todos los estudios técnicos y planimetría que tiene

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

como soporte el proyecto, consignando los hallazgos encontrados por los profesionales para cada componente.

Es necesario que la entidad allegue la información solicitada en cuanto a diseños y memorias de cálculo de todas las redes construidas por el contratista de fase 1, puesto que la conexión de los proyectos componentes de fase 2 en cuanto a descargas y acometidas se hace dando continuidad a estas redes existentes.

Se requiere planimetría de las edificaciones existentes en aras de calcular las demoliciones y verificar la ubicación de las edificaciones.

Se requiere planimetría para verificación de redes para ubicación de empalmes. capacidad. cauda y presión de tuberías.

Luego de realizar la revisión conjunta contratista e interventoría se concluye que diseños y estudios técnicos entregados por la entidad están completos, sin embargo, es claro que se deben realizar algunos ajustes conforme a la revisión, correcciones que no son significativas y no presentan inconveniente para poder dar inicio a las actividades de obra.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA	ESTADO		
			CE	CFT	NC
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	realizar solicitud de aclaración por parte de la consultoría a las inquietudes o los posibles ajustes a los diseños según las observaciones descritas en la presente acta y/o lista de inventario o chequeo anexa	05/06/2023			

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

17

2282

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	R/L CONSORCIO INTERESCENARIOS	
JORGUE RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO INTERESCENARIOS	
YEISON ESNEIDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ESECENARIOS DEPORTIVOS	
JHON HENRY ORTIZ GARCIA	R/L CONSORCIO ESECENARIOS DEPORTIVOS	

Nota: Agréguense cuantas celdas se requieran para compromisos y asistentes, igualmente se podrá imprimir la hoja 2 cuantas veces sea necesario para dar continuidad al acta (aplica en los casos que se registre de forma manual).

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta - Colombia

2283

FECHA	28 DE ABRIL DE 2023	CONTRATO 106 DE 2020	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META			
LISTA DE CHEQUEO INVENTARIO DISEÑOS EXISTENTES VILA OLIMPICA FASE 2						
ESCENARIOS MULTIFUNCIONALES						
	NOM3RE ARCHIVO	**CONTENIDO**	**No plano**	**fecha**	**OBSERVACION**
TOPOGRAFIA	110-GPY-FR-075	MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD TARJETA Y VIGENCIA	OFICIO	14/10/2021	
	110-GPY-FR-004	ESTUDIOS TECNICOS GEOREFERENCIACION ESCENARIOS DEPORTIVOS -V04	INFORME		
	8	CERTIFICADO CALIBRACION DE EQUIPOS	OFICIO	1/12/2021	
	PLANO LOCALIZACION	PLANO TOPOGRAFICO DE LOCALIZACION (general)	1 DE 1	1/10/2021	
	CALCULO POLIGONAL	PLANOS TOPOGRAFICOS DE LOCALIZACION (implantacion)	1 DE 1	1/10/2021	
	LEVANTAMIENTO RED SANITARIA PLUVIAL	PLANO DE REDES EXISTENTES	1 DE 1	1/10/2021	NO ESPECIFICA TIPO DE RED EN CONVENCIONES
	LEVANTAMIENTO ZONA DE INFLUENCIA	PLANO CURVAS DE NIVEL	1 DE 1	1/10/2021	
	LEVANTAMIENTO ZONA DE INFLUENCIA 02	PLANO CURVAS DE NIVEL (perfiles)	1 DE 1	1/10/2021	
	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO ESCE	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO EXISTENTE	1 DE 2	1/10/2021	
	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO ESCE	PLANO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (FACHADAS)	2 DE 2	1/10/2021	
SUELOS	EG-044-W-918-21	ESTUDIO GEOTECNICO	INFORME	SEPT DE 2021	
ARQUITECTONICOS ESCENARIOS MULTIFUNCIONALES		LICENCIA DE CONSTRUCCION		13/09/2022	
	0.110-GPYR-FR004 ESTUDIOS TECNICOS	ARQUITECTURA-ESCENARIOS	INFORME	14/10/2021	
		MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD TARJETA Y VIGENCIA	OFICIO	14/10/2021	
	2.2	PLANO DE LOCALIZACION	1 DE 1	13/09/2021	no hace parte de los planos de la licencia , hace parte de los planos proyecto estudios y diseño AIM
	A-ESC-PL-01	GPYR	1 de 10	6/05/2022	especificar niveles de piso y material final acabados de piso
	A-ESC-PL-02	PLANO SEGUNDO NIVEL ESCENARIO 1	2 de 10	6/05/2022	especificar material acabados finales de piso
	A-ESC-PL-03	PLANO CUBIERTAS ESCENARIO 1	3 de 10	6/05/2022	
	A-ESC-PL-04	CORTE LONGITUDINAL A-B CORTE LONGITUDINAL D-D ESCENARIO DEPORTIVO 1	4 de 10	6/05/2022	
	A-ESC-PL-05	FACHADA LONGITUDINAL, FACHADA TRANSVERSAL, CORTE LONGITUDINAL C-C ESCENARIO DEPORTIVO 1	5 de 10	6/05/2022	en cortes y fachadas no se especifica el acabado el material de recubrimiento frontal de la zona de cubierta que se encuentra en voladizo.
	A-ESC-PL-06	PLANO PRIMER NIVEL ESCENARIO 2	6 de 10	6/05/2022	especificar niveles de piso y material final acabados de piso
	A-ESC-PL-07	PLANO SEGUNDO NIVEL ESCENARIO 2	7 de 10	6/05/2022	especificar material acabados finales de piso
	A-ESC-PL-08	PLANO CUBIERTAS ESCENARIO 2	8 de 10	6/05/2022	
	A-ESC-PL-09	CORTE LONGITUDINAL A-B CORTE LONGITUDINAL D-D ESCENARIO DEPORTIVO 2	9 de 10	6/05/2022	
	A-ESC-PL-10	FACHADA LONGITUDINAL, FACHADA TRANSVERSAL, CORTE LONGITUDINAL C-C ESCENARIO DEPORTIVO 2	10 de 10	6/05/2022	en cortes y fachadas no se especifica el acabado el material de recubrimiento frontal de la zona de cubierta que se encuentra en voladizo.
	A-ESC-PL-G-01	CONTIENE IMPLANTACION GENERAL - MODIFICACION VILLA OLIMPICA	2 de 43	6/05/2022	
	A-ESC-PL-G-02	IMPLANTACION GENERAL AREAS DE INTERVENCION VILLA OLIMPICA	1 de 1	6/05/2022	
	A-PAT-PL-01	OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO IMPLANTACION GENERAL ESCENARIOS DEPORTIVOS 1 Y 2 CUADRO DE AREAS	1 de 1	6/05/2022	no se especifica material de acabado de pisos en zonas duras del urbanismo
	A-RUT-EVA-PL-01	PLANO RUTAS DE EVACUACION PRIMER NIVEL ESCENARIO DEPORTIVO 1	1 DE 4	6/05/2022	no se indica señalizacion ni especificacion de las señales
	A-RUT-EVA-PL-02	PLANO RUTAS DE EVACUACION SEGUNDO NIVEL ESCENARIO DEPORTIVO 1	2 de 4	6/05/2022	no se indica señalizacion ni especificacion de las señales
	A-RUT-EVA-PL-03	PLANO RUTAS DE EVACUACION PRIMER NIVEL ESCENARIO DEPORTIVO 2	3 DE 4	6/05/2022	no se indica señalizacion ni especificacion de las señales
	A-RUT-EVA-PL-04	PLANO RUTAS DE EVACUACION SEGUNDO NIVEL ESCENARIO DEPORTIVO 2	4 de 4	6/05/2022	no se indica señalizacion ni especificacion de las señales
	2.10	DETALLES- CARPINTERIAS			no hace parte de los planos de la licencia , hace parte de los planos proyecto estudios y diseño AIM definir marijas antipanicos salidas de emergencia
	2.12	SEÑALETICA - INFORME			no hace parte de los planos de la licencia , hace parte de los planos proyecto estudios y diseño AIM
ESTRUCTURALES	110-GPY-FR-075	MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD TARJETA Y VIGENCIA	OFICIO	20/10/2021	
	1. INFORME ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUC	INFORME ESTRUCTURAL	INFORME	20/10/2021	
	PL-01	ESPECIFIACIONES GENERALES ISOMETRICO ESCENARIO 1 Y 2	1 DE 16	6/05/2022	
	PL-02	PLANTA DE CIMENTACION ESCENARIO 1	2 DE16	6/05/2022	
	PL-03	ELEMENTOS DE CIMENTACION DETALLES Y DESPIECES ESCENARIO 1	3 DE 16	6/05/2022	
	PL-04	CONEXIONES EN LA BASE DETALLES Y DESPIECES ESCENARIO 1	4 DE 16	6/05/2022	
	PL-05	SUPERESTRUCTURA ALZADO DE PORTICOS ESCENARIO 1	5 DE 16	6/05/2022	
	PL-06	ELEMENTOS DE CUBIERTA N +13,20 ESCENARIO 1	6 DE 16	6/05/2022	
	PL-07	ELEMENTOS DE CUBIERTA N + 15,36 ESCENARIO 1	7 DE 16	6/05/2022	
	PL-08	PLANTA DE CIMENTACION ESCENARIO 2	8 DE 16	6/05/2022	
	PL-09	ELEMENTOS DE CIMENTACION DETALLES Y DESPIECES ESCENARIO 2	9 de 16	6/05/2022	
	PL-10	CONEXIONES EN LA BASE DETALLES Y DESPIECES ESCENARIO 2	10 de 16	6/05/2022	
	PL-11	SUPERESTRUCTURA ALZADO DE PORTICOS ESCENARIO 2	11 DE 16	6/05/2022	
	PL-12	ELEMENTOS DE CUBIERTA N +13,20 ESCENARIO 2	12 DE 16	6/05/2022	

2284

FECHA	28 DE ABRIL DE 2023	CONTRATO 106 DE 2020	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META			
LISTA DE CHEQUEO INVENTARIO DISEÑOS EXISTENTES VILA OLIMPICA FASE 2						
	PL-13	ELEMENTOS DE CUBIERTA N + 15,36 ESCENARIO 1	13 DE 16	6/05/2022		
	PL-14	CONEXIONES METALICAS ESCENARIO 1 Y 2	14 DE 16	6/05/2022		
	PL-15	GRADERIAS ESCENARIO 1 Y 2	15 DE 16	6/05/2022		
	PL-16	DETALLE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	16 DE 16	6/05/2022	detalle de muro en bloque de concreto no concuerda con planos arquitectonicos que especifica muro en ladrillo flexi no 5	
HIDROSANITARIOS	HIDRO_COLISEO AIM V1	ESTUDIO HIDROSANITARIO	INFORME	25-10-201		
	110-GPY-FR-075	MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD TARJETA Y VIGENCIA	OFICIO	20/10/2021		
	001 RED SANITARIA ESCENARIOS DEPORTI	IMPLANTACION GENERAL RED SANITARIA	1 DE 3	20/10/2021	se debe verificar conexion a pozos existentes	
	001 RED SANITARIA ESCENARIOS DEPORTI	IMPLANTACION DE ESCENARIO DEPORTIVO 1 RED SANITARIA	2 DE 3	20/10/2021		
	001 RED SANITARIA ESCENARIOS DEPORTI	IMPLANTACION DE ESCENARIO DEPORTIVO 2 RED SANITARIA (detalles)	3 DE 3	20/10/2021		
	002 RED HIDRAULICA ESCENARIOS DEPORT	IMPLANTACION GENERLAL RED HIDRAULICA	1 DE 3	20/10/2021	se debe verificar acometida existente red 4", verificar capacidad de equipo de bombeo existente, la entidad debeh entregar planos recoro redes de contratista fase 1 y planos record de redes las existentes sin ir tervenir	
	002 RED HIDRAULICA ESCENARIOS DEPORT	Implantacion coliseo menor 1 red hidraulica detallado	2 DE 3	20/10/2021	no especifica rde de la se debe verificar medicion de consumo para los escenarios	
	002 RED HIDRAULICA ESCENARIOS DEPORT	Implantacion coliseo menor 2 red hidraulica detallado	3 DE 3	20/10/2021	no existen detalles sanitarios valvula de pared no especifica rde de la tuberia	
	003 RED CONTRAINCENDIOS ESCENARIOS	IMPLANTACION GENERAL RED CONTRAINCENDIO	1 DE 3	20/10/2021	se debe verificar conexión acometica de 6" tipo de tuberia pvc o 900 verificar RDE (18 14) por normatividad PARA CONDUCCION NFPA, NSR NO EXISTE DISEÑO DE RED DE DETECCION NO TIENE DISEÑO DE ALARMAS	
	003 RED CONTRAINCENDIOS ESCENARIOS	IMPLANTACION COLISEO MENOR 1 RED CONTRAINCENDIO	2 DE 3	20/10/2021	no existen detalle de la conexión a gabinetes alturas y niveles por norma no existe plano red de alarmas	
	003 RED CONTRAINCENDIOS ESCENARIOS	IMPLANTACION COLISEO MENOR 2 RED CONTRAINCENDIO DETALLES	3 DE 3	20/10/2021	se debe verificar radio de cobertura de los gabinetes de incendios no existen detalle de la conexión a gabinetes alturas y niveles por norma NO EXISTE PLANO RED DE ALARMAS	
	004 RED DE AGUAS LLUVIAS ESCENARIOS	IMPLANTACION GENERAL RED DE AGUAS LLUVIAS DETALLES	1 DE 1	20/10/2021	verificar construccion de carcamos perimetral de los escenarios que aparece en planos arquitectonicos, no se ve reflejado en este diseño	
	005 RED ISOMETRICOS ESCENARIOS DEPO	ESCENARIO 1 ISOMÉTRICO BATERIA TIPO RED HIDRÁULICA	1 de 4	20/10/2021		
	005 RED ISOMETRICOS ESCENARIOS DEPO	ESCENARIO 2 ISOMÉTRICO BATERIA TIPO RED HIDRÁULICA	2 DE 4	20/10/2021		
	005 RED ISOMETRICOS ESCENARIOS DEPO	ESCENARIO 1 ISOMÉTRICO RED CONTRAINCENDIO	3 DE 4	20/10/2021		
	005 RED ISOMETRICOS ESCENARIOS DEPO	ESCENARIO 2 ISOMÉTRICO RED CONTRAINCENDIO	4 DE 4	20/10/2021		
ELECTRICOS	FACTIBILIDAD NORTE	FACTIBILIDAD NORTE		10/09/2020		
	CARGAS Y REGULACION COLISEO MENORE	CUADROS DE CARGA				
	110-GPY-FR-075	MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD		20/10/2021		
	110-GPY-FR-004 ESTUDIOS TECNICOS ESC	DISEÑO ELECTRICO		20/11/2021		
	APROBACION PROYECTO COMPLEJO DEPO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMPLEJOMDEPORTIVO VILLA OLIMPICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META ARRANQUE NORTE		21/09/2015		
	ESTUDIOS FOTOMETRICOS	ESTUDIOS FOTOMETRICOS		07-19-2021	NO EXISTEN ESTUDIOS FOTOMETRICOS DEL ALUMBRADO PUBLICO	
	3,1 ACOMETIDAS ESCENARIOS DEPORTIVO	PLANO DE ACOMETIDA DE MEDIA Y BAJA TENSION	1 DE 1	20/10/2021		
	3.2 UNIFILAR ESCENARIOS DEPORTIVOS	DIAGRAMA UNIFILAR	1 DE 1	20/10/2021		
	3.3 APANTALLAMIENTO ESCENARIOS DEPO	PLANO APANTALLAMIENTO	1 DE 1	20/10/2021	NO EXISTE PLANO DE DETALLE PUNTAS CAPTORAS	
	3.4 ILUMINACIONN ESCENARIO DEPORTIV	ILUMINACION ESCENARIO DEPORTIVO 1	1 DE 2	20/10/2021	VERIFICAR ALTURA LAMPARASA RESPECTO A LA ALTURA DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA PLANO SIN CONVENCIONES	
	3.4 ILUMINACIONN ESCENARIO DEPORTIV	ILUMINACION ESCENARIO DEPORTIVO 2	2 DE 2	20/10/2021	VERIFICAR ALTURA LAMPARASA RESPECTO A LA ALTURA DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA PLANO SIN CONVENCIONES	
	3.5 TOMAS ESCENARIO DEPORTIVO 1 PL 0	TOMAS ESCENARIO DEFORTIVO 1	1 DE 2	20/10/2021		
	3.5 TOMAS ESCENARIO DEPORTIVO 2 PL 0	TOMAS ESCENARIO DEFORTIVO 2	2 DE 2	20/10/2021		
	3.6 DETALLES ESCENARIOS DEPORTIVOS	PLANO DETALLES CONSTRUCTIVOS	1 DE 1	20/10/2021		
PMA	110-GPY-FR-004	ESTUDIOS TECNICOS PMA COLISEOS MENORES	INFORME	27/10/2021		
	110-GPY-FR-075	MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD		5/11/2021		
PISTA DE PATINAJE						
	NOMBRE ARCHIVO	**CONTENIDO**	**No plano**	**fecha**	**OBSERVACION**	
	110-GPYR-FR-004 ESTUDIOS TECNICOS GE	GEOREFERENCIACION DE LA PISTA DE PATINAJE EXISTENTE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	INFORME	1/10/2021		
	110-GPY-FR-075	MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD	OFICIO	1/10/2021		

20

FECHA	28 DE ABRIL DE 2023	CONTRATO 106 DE 2020	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META		
LISTA DE CHEQUEO INVENTARIO DISEÑOS EXISTENTES VILA OLIMPICA FASE 2					
TOPOGRAFIA	5. PLANOS TOPOGRAFICOS DE LOCALIZACI	LOCALIZACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	1 DE 1	1/10/2021	
	6.2 CURVAS DE NIVEL	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PISTA ECISTENTE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	1 DE 3	1/10/2021	
	6. PLANOS TOPOGRAFICOS	CALCULO POLIGONAL COORDENADAS AJUSTADAS CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	2 DE 3	1/10/2021	
	7. PLANOS ALTIMETRICOS -1	SECCIONES TRANVERSALES PISTA DE PATINAJE EXISTENTE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	2 DE 3	1/10/2021	
	7. PLANOS ALTIMETRICOS -2	SECCIONES TRANVERSALES LEVANTAMIENTO Y PERFIL LONGITUDINAL DE LA PISTA DE PATINAJE EXISTENTE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	3 DE 3	1/10/2021	
SUELOS	ESTUDIO DE SUELOS PISTA DE PATINAJE AI	ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUBRASANTE	INFORME	SEPT DE 2021	
ARQUITECTONICOS PISTA DE PATINAJE	110-GPYR-FR-004 ESTUDIOS TECNICOS AR	INFORME ARQUITECTONICO	INFORME	20/10/2021	
	2.2 LOCALIZACION	PLANO DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	1 DE 1	14/10/2021	
	A-PAT-PL-02	IMPLANTACION PISTA DE PATINAJE , OBRAS EXTERIORES, ALZADO TRANSVERSAL PISTA DE VELOCIDAD, CUADRO DE AREAS	1 DE 1	6/05/2022	
	A-PAT-PL-03	PLANTA ARQUITECTONICA, DISEÑO REGLAMENTARIO, PISTA DE VELOCIDAD, DETALLES CONSTRUCTIVOS	1 DE 1	6/05/2022	verificar recubrimiento policarbonato en detalle arquitectonico debajo de pasamanos
	2.13 RUTA DE EVACUACION Y SEÑALETICA	PLANO SEÑALETICA 5 DE 5	5 DE 5	14/10/2021	
ESTRUCTURAL	INFORME AIM-ESTR-MURO-PATINAJE	INFORME ESTRUCTURAL	INFORME	20/10/2021	
	110-GPY-FR-07E	MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD	OFICIO	20/10/2021	
	E-MURO DE CONTENCION PATINAJE	MURO DE CONTENCION PISTA DE VELOCIDAD	1 DE 1	20/10/2021	
HIDROSANITARIOS	HIDRO PATINAJE AIM V 0	ESTUDIO HIDROSANITARIO	INFORME	24/09/2021	
	110-GPY-FR-07E	MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD	OFICIO	20/10/2021	
	001 ALCANTARILLADO PLUVIAL	IMPLANTACION PISTA DE PATINAJE ,RED DE AGUAS LLUVIAS DETALLES	1 de 1	15/10/2021	no existe diseño de drenaje zona grama solo se especifica diseño de carcamo interno pista de velocidad
ELECTRICO	110-GPYR-FR-004 ESTUDIOS TECNICOS	DISEÑO ELECTRICO			
	3.1 PLANOS ACOMETIDA	PLANO ACOMETIDA	1 DE 1	20/10/2021	NO SE EVIDENCIA PUNTO DE CONEXIÓN ELECTRICA PARA UNA ZONA TECNICA
	3.2 DIAGRAMA UNIFILAR	DIAGRAMA UNIFILAR	1 DE 1	20/10/2021	NO EXISTE ESTUDIO FOTOMETRICO DE LAS ZONAS DE URBANISMO
	3.6 DETALLES CONSTRUCTIVOS	PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS ELECTRICOS	1 DE 1	20/10/2021	
AMBIENTAL	110-GPYR-FR-004 ESTUDIOS TECNICOS PM	INFORME AMBIENTAL	INFORME	5/11/2021	
	110-GPY-FR-07E	MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD	OFICIO	5/11/2021	
DISEÑO DE PAVIMENTOS	PAVIMETO PATINAJE AIM 1	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	OFICIO	NOVIEMBRE DE 2021	
	110-GPY-FR-07E	MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD	OFICIO	DICIEMBRE. DE 2021	
PISTA DE ATLETISMO					
	NOMBRE ARCHIVO	**CONTENIDO**	**No plano**	**fecha**	**OBSERVACION**
SUELOS	EG-SF-024-W-813-20 PISTAS VILLA OLIMPI	ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUBRASANTE	INFORME	JULIO DE 2020	
	R-24-W-813-20 PISTAS VILLA OLIMPICA CB	PISTAS VILLA OLIMPICA CBR	INFORME	JULIO DE 2020	CBR DEPISTA DE PATINAJE Y SONDEOS NO CORRESPONDEN A PISTA DE ATLETISMO
	R-24-W-813-20 PISTAS VILLA OLIMPICA SP	PISTAS VILLA OLIMPICA SPT	INFORME	JULIO DE 2020	
TOPOGRAFIA	INFORME TOPOGRAFICO	INFORME TOPOGRAFICO INGESTRUC	INFORME	2021	
	TOPOGRAFIA 1 DE 2	LOCALIZACION OVALO INTERNO PISTA DE ATLETISMO ESTADO ACTUAL	1 DE 2	may-22	
	TOPOGRAFIA 2 DE 2	SECCIONES Y PERFILES TOPOGRAFICOS	2 DE 2	may-22	
DISEÑOS PISTA DE ATLETISMO	ESTUDIOS TECNICOS ARQUITECTURA PIST	DISEÑO ARQUITECTONICO	INFORME INGESTRUC	2021	
	AREA DE INFLUENCIA	PLANO DE IMPLANTACION	1 DE 2	may-22	
	ARQUITECTONICO 1 DE 3	PLANO ARQUITECTONICO PISTA DE ATLETISMO DETALLES CONSTRUCTIVOS PISTA DE ATLETISMO	1 DE 3	may-22	

2286

FECHA	28 DE ABRIL DE 2023	CONTRATO 106 DE 2020	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META		
LISTA DE CHEQUEO INVENTARIO DISEÑOS EXISTENTES VILA OLIMPICA FASE 2					
ARQUITECTONICO ATLETISMO	ARQUITECTONICO 2 DE 3	LOCALIZACION OVALO INTERNO PISTA DE ATLETISMO CERTIFICADA DETALLES CONSTRUCTIVOS CARCAMO BORDILLO DE CONFINAMIENTO	2 DE 3	may-22	
	ARQUITECTONICO 3 DE 3	LOCALIZACION OVALO INTERNO PISTA DE ATLETISMO CERTIFICADA DETALLES CONSTRUCTIVOS CARCAMO BORDILLO DE CONFINAMIENTO	3 DE 3	may-22	
	PLANO DE LOCALIZACIO	PLANO DE LOCALIZACION	1 DE 1	may-22	
HIDRAULICO	ESTUDIO HIDRAULICO FORMADO	ESTUDIO HIDRAULICO	INFORME	2021	
	HIDRAULICO-PAVIMENTOS	LOCALIZACION OVALO INTERNO PISTA DE ATLETISMO CERTIFICADA DETALLES CONSTRUCTIVOS CARCAMO BORDILLO DE CONFINAMIENTO	1 DE 1	may-22	
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	INFORME INGESTRUC	2021	CBR DEPISTA DE PATINAJE Y SONDEOS NO CORRESPONDEN A PISTA DE ATLETISMO
ELECTRICO		NO EXISTE	87		en el informe de diseño arquitectonico en las recomendaciones finales dejar puntos electricos, salidas de datos audio y video para la zonas de jueces sin embargo en la planimetria entregada no existe diseño de redes electricas.

NOTA: QUEDA PENDIENTE ENTREGA DE PLANOS REDES FASE 1 PLANIMETRIA DE LAS OBRAS EXISTENTES ASI COMO MEMORIAS DE CALCULO DE DISEÑOS CON LAS CUALES SE DEBE EMPALMAR Y SE REQUIEREN PARAS EL CALCULO DE PRESIONES CAUDALES Y DIAMETROS DE CONEXIÓN.

ESTA ACTA SE FIRMA A LOS 28 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023

ING. HECTOR ARMADO GOMEZ JAIMES
Representante legal
CONSORCIO INTERESCENARIOS

ING JORGUE RODRIGUEZ BERNAL
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERESCENARIOS

FIRMAS PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA REVISION

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante legal
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

ING. YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
Director de obra
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

22

2287

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

ACTA N° _____	FECHA:	HORA:	
	28-04-2023	Inicio: 2 am	Fin: 3 pm
	LUGAR:	OFICINA INTERVENTORIA	
RESPONSABLE:	INTERVENTORIA - OBRA		

OBJETIVO O PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

El objetivo de la reunión está en verificar los permisos y licencias con los que cuenta proyecto previo a firma del acta de inicio

AGENDA / ORDEN DEL DÍA

1. REVISIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
3. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

DESARROLLO

- LICENCIA DE CONSTRUCCION:
- Dando cumplimiento del contrato clausula 10 "OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA" numeral 2, Se realiza verificación de la licencia de construcción gestionada en la curaduría urbana No 2, evidenciando que el Complejo Recreativo y Deportivo de la Villa Olímpica de Villavicencio, cuenta con Licencias Urbanísticas otorgadas mediante Resolución 50001-2-11-0130 y Resolución 50001-2-18-0546 del 13 de diciembre del 2018, modificada mediante Resolución No. L-21-0096 de 16 de abril de 2021 y prorrogada mediante Resolución 50001-2-21-1592, para las cuales se adoptó el Plan de Implantación por parte de la secretaria de Planeación Municipal, dando alcance a lo establecido en el Artículo 443 del Acuerdo 287 de 2015, posteriormente se realiza gestión de revalidación de la licencia urbanística aprobada mediante resolución N R-22-0319 expedida el 29 de septiembre de 2022 otorgándole una vigencia de 24 meses más de plazo a partir de la fecha de revalidación, actualizando la fecha al día 29 de septiembre de 2024.

- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:
  Acorde al Numeral 7 del anexo técnico "ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL" Se verifica plan de manejo ambiental (PMA) suministrado en el informe que hace parte del paquete de estudios técnicos entregados por el AIM fechado del día 27-10-2021 cabe anotar que dentro de las obligaciones del contratista esta implementar PMA a los proyectos que se van a ejecutar en la villa olímpica

- Según el numeral 5.1 demanda ambiental se concluye: Dadas las condiciones del proyecto no es necesario gestionar permisos ambientales ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena ya que no se requiere permiso de aprovechamiento

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta - Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

forestal, concesión de aguas, vertimientos, ocupación de cauce, no hay áreas protegidas entre otros.

- Acorde a esta PMA numeral 6.2 aprovechamiento forestal, tampoco se es necesario realizar aprovechamiento debido a que no se encuentran especies arbóreas en el área a de las obras.

- El contratista debe gestionar manejo y disposición de escombros previo al inicio de las actividades de demolición acorde a sitio dispuesto por la administración municipal o lugar que cumpla las exigencias establecidas en la resolución 472 de 2017 que regula el cargue, transporte, manejo y disposición final de los residuos de construcción.

- El contratista entrega documentación para verificación de fuente de material agregados, adjunta licencia ambiental y permiso minero de la empresa ZODME

- PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
- El contratista realiza entrega de plan de manejo de tránsito el día 26 de marzo de 2023, luego de revisión por parte la interventoría, se radicado ante la secretaria de movilidad para aprobación y ejecución, se anexa oficio de radicado ante la entidad y se esperan observaciones o aprobación del mismo.

NOTA: el contratista es responsable de tramitar cualquier tipo de licencias o permisos que por la naturaleza de obra puedan llegar a requerirse como permisos de uso o intervención de espacio público ante planeación municipal y secretaria de control físico de ser necesaria la intervención por tala o traslado de las especies cercanas al perímetro a intervenir inferior a 10 especies debe ser notificado a la secretaria de Medio Ambiente municipal.

El contratista debe verificar los permisos si se requiere comprar, almacenar o hacer disposición final de sustancias, materiales o residuos especiales.

Acorde al numeral 4.3.1 del documento base pliegos definitivos el contratista adquirido el compromiso de realizar la siembra de 10 especímenes arbóreos nativos de la zona al interior del predio o en la zona de influencia en el cual se encuentra la edificación, de esta manera la interventoría realizara seguimiento al cumplimiento de esta obligación.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

2289

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

COMPROMISOS					
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA	ESTADO		
			CE	CFT	NC
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	Entrega aprobación de plan de manejo de tránsito por secretaria de movilidad. Se anexa oficio de radicación.	a la espera de respuesta de la entidad			

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	R/L CONSORCIO INTERESCENARIOS	
JORGUE RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO INTERESCENARIOS	
YEISON ESNEIDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ESECENARIOS DEPORTIVOS	
JHON HENRY ORTIZ GARCIA	R/L CONSORCIO ESECENARIOS DEPORTIVOS	

Nota: Agréguense cuantas celdas se requieran para compromisos y asistentes, igualmente se podrá imprimir la hoja 2 cuantas veces sea necesario para dar continuidad al acta (aplica en los casos que se registre de forma manual).

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACION DEL META

24

2290

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

ACTA N° _____	FECHA:	HORA:	
	28-04-2023	Inicio: 3 am	Fin: 5 pm
	LUGAR:	OFICINA INTERVENTORIA	
RESPONSABLE:	INTERVENTORIA - OBRA		

OBJETIVO O PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

ACTA DE VERIFICACION DE ESTADO DE REDES Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

AGENDA / ORDEN DEL DÍA

Se realiza verificación de estado de redes disponibilidad a conexión de los servicios públicos por cada proyecto componente del contrato

DESARROLLO

Acorde a las obligaciones fijadas en el contrato previas a el acta de inicio se realiza verificación de redes existentes, encontrando que para el proyecto que tiene por OBJETO CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META, la conexión de las redes de agua potable, aguas lluvias, redes de aguas negra, y redes eléctricas se debe realizar a los puntos ya construidos en el proyecto fase 1.

Por tal motivo se ha solicitado a la entidad mediante oficio OF-C459-2022-010 radicado el día 24 de abril de 2023 y oficio OF-C459-2022-014 la entrega de la información de las redes existentes construidas por el contratista de fase 1 incluyendo las memorias de cálculos finales con las que se entrega el proyecto, puesto que es necesario realizar una revisión de las cargas, caudales y demás particularidades que se contemplan para la conexión de las distintas redes.

Se verifican los estudios técnicos entregados por el AIM, para los estudios hidrosanitarios se entrega copia de la disponibilidad dadas al proyecto fase 1 para las redes de aguas lluvias, redes hidráulicas, redes de suministro agua potable se anexa certificación de disponibilidad de servicios públicos por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio EAAV fechada del día 29 de septiembre de 2021.

En cuanto a las redes eléctricas se encuentra que el proyecto fase 1 cuenta con factibilidad y proyecto eléctrico aprobado ante la electrificadora del meta EMSA, para conexión de los escenarios pista de patinaje y coliseos multipropósito se dispone de 225 KVA y se deja la subestación 3 para conexión de fase 2, de este lugar se conectan las obras correspondientes a la acometida, cabe anotar que esta es una red que se toma como existente construida en la fase 1 de villa olímpica.

Nota: El contratista debe tramitar los permisos de acometidas temporales de obra a lugar a nombre del consorcio y entregar soporte del trámite a la interventoría.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE EL META
GOBERNACIÓN DEL META

25

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

No se evidencia oficio de entrega de empresas de servicios públicos con planimetría actualizada para la fase 2 se mantiene disponibilidad de fase 1 "estadio" se solita al contratista iniciar trámite para verificación con empresas de servicios públicos y/o copia del oficio de solitud radicado como se estipula en el estudio previos, OBLIGACIONES DE LAS PARTES – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - literal t

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA	ESTADO		
			CE	CFT	NC
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	Revisión de conexión red de incendios según información entregada por la entidad	a la espera de respuesta de la entidad			
IDERMETA	Entrega diseños , memorias, especificaciones fase 1	a la espera de respuesta de la entidad			
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	Oficio solicitudes de provisionales para cumplimiento obligaciones contratista literal t	A la espera de oficios del contratista			

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	R/L CONSORCIO INTERESCENARIOS	
JORGUE RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO INTERESCENARIOS	

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE EL META
GOBERNACIÓN DEL META

2292

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

YEISON ESNEIDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ESECENARIOS DEPORTIVOS	
JHON HENRY ORTIZ GARCIA	R/L CONSORCIO ESECENARIOS DEPORTIVOS	

Nota: Agréguense cuantas celdas se requieran para compromisos y asistentes, igualmente se podrá imprimir la hoja 2 cuantas veces sea necesario para dar continuidad al acta (aplica en los casos que se registre de forma manual).

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

27

2293

ACTA N° _____	FECHA:	HORA:	
	28-04-2023	Inicio: 9:00am	Fin: 12:00M
	LUGAR:	Idermeta	
RESPONSABLE:			

OBJETIVO O PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

Cómite técnico para verificación de documentación previa a inicio de obra.

AGENDA / ORDEN DEL DÍA

- Solicitar información campeonato Llaneros F.C.
- Verificar documentación presentada por contratista de obra

DESARROLLO

- El día 2 de mayo del 2023 se hace entrega de los escenarios dela villa a intervenir.
- Se firmaría acta de inicio del contrato de obra el 02 de Mayo del 2023.
- El contratista de obra manifiesta lo siguiente:
  - De acuerdo a actividades de medición, indican que las cantidades reales no coinciden con las contractuales.
  - Manifiesta qe exist una traslapo en las redes sanitarias del escenario No 1.
  - Solicita al idermeta la revisión del pavimento existente en la pista de atletismo, teniendo en cuenta que pueda no coincidir los CBR. existents con los requeridos para la nueva pista.
  - El patinodromo será uno de los primeros frents a iniciar, con el cual mediante demoliciones y desmontes se verá un gran avance de obra.

DESARROLLO

- Se solicita al IDERMETA, informar fechas de partidos que se estan desarrollando, tanto de la liga masculina como femenina, el contratista informa qe los materiales requeridos para la construcción de la pista se deben importar, indican qe aprox. se requiere 30 días para la fabricación más el tiempo de la importación, se deben importar pegants, matoial granular de caucho con emulsión, sellante, pinturas.

2294

- El 26-04-23 se hizo atrega del PMT a la interventoría, quin lo revisó y aprobó, el dia de hoy se radica a movilidad.
- Se solicita a la atidad por parte del contratista de obra permiso para hacer uso del medidor de la pista de patinaje, y la obra se hace responsable del recibo de pago de la misa, Idermeta acepta la petición.
- La maquinaria ofertada por el contratista de obra y la programación de obra, ya fue revisada y aceptada por la interventoría.
- Se solicita al contratista de obra la atrega de hojas de vida.
- Las planimetrias entregadas a la interventoría por parte de vila olimpica fase 1 se encuentran incompletas, idermeta indica que oficiará al contratista para hacer atrega del compromiso adquirido semanas antes, se requieren memorias y diseños dela RCI para su verificación y poder confirmar si esta existente cumple con la capacidad.
- Se solicita a la atidad diseños de los escenarios multi-propositos existentes, pero la atidad manifiesta que no existan ningunos diseños o planos.
- El contratista de obra deberá hacer entrga de la nueva carga de los servicios públicos a las entidades correspondientes indicando la nueva carga que acectará las redes de los nuevos escenarios.
- Se hace presente Wilmar Sandoval atenador de Llaneros Futbol club, quien llama al presidat el señor Juan Carlos Trujillo, se los requiere programación de los campeonatos en curso, indican que a Junio se termina el campeonato que esta en curso, llaneros nos enviará programación a correos electronicos del Idermeta, contratista de obra e Interventoría.
- Se le solicita a la entidad que se defina el proceso constructivo que se trabajará en la construcción de la pista de atletismo, se solicita socialización previa al inicio de actividades.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACTIVIDAD**	**FECHA**

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**

2295

Nota: Agréguense cuantas celdas se requieran para compromisos y asistentes, igualmente se podrá imprimir la hoja 2 cuantas veces sea necesario para dar continuidad al acta (aplica en los casos que se registre de forma manual).

IDERMETA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE ASISTENCIA

Código: FR-GCA-05
Vigencia: 24/11/2020
Versión: 02
Página 1 de 1

2296

REUNIÓN/ACTIVIDAD:	Reunión Seguimiento Contrato 249 de 2023 - 106-2023.	**HORA:**	9:00 AM
LUGAR:	Sala de juntas - IDERMETA.	**FECHA:**	28-09-2023
NOMBRE RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	Bibiana Pan. - Supervisora		

No.	Municipio	Nombres y apellidos	Comunidad / Dirección	Teléfono o móvil de Contacto	Correo electrónico / email	Número de Documento de identidad	Grupos etarios						Genero			Enfoque diferencial									Firma
							0-5	6-11	12-17	18-26	27-59	60 o más	Hombre	Mujer	LGBTIQ	Mujer gestante	Victima	Discapacitado	Afro	Indigena	Pobreza extrema	Rom o gitano	Otro		
1	Villavicencio	Flower Emilce Peña	IDERMETA	3168660330	rewolf8425@gmail.com	86.082.962					X		X												
2	Villavicencio	Bertulfo Rojas Quimbaya	IDERMETA	3134531908	Bertulfo.rojas1@gmail.com	3.235.506					X		X												
3	Villavicencio	Hector Armando Gomez Jaimes	Intiventaria IDERMETA	3204752661	Interescenarios6 gmail.com	1119.892.860				X	X														
4	VILLAVICENCIO	ANDRES HERNANDEZ BOADAS	IDERMETA	3256092.86	ANDRESDEPORTISTAS @ GMail.com	80038630					X		X												
5	Vicio	FABIAN AUGUSTO SANCHEZ NIÑO	IDERMETA	3006979959	SUPERVISOR@IDERMETA.GOV.CO	80024161					X		X												
6	Vicio	Luz Adriana Tejmes escobar.	Idermeta	3102581800	luzatejmes.e@hotmail.com	52786795.					X			X											
7	Vicio	Bibiana Pan Mendoza	Idermeta	3138081957	Planeacion@idermeta	40187174					X			X											
8	Vicio	Sofia H. Lopez Prieto	IDERMETA	3104267323		86071.391							X	X											
9	Vicio	Tatiana Lara S.	Intiventaria	3202947484	tatianascenarios@gmail.com	1121870885								X											
10	Vicio	Yerson E. Gomez Guevara	Contratista.	3015466945	direccionescenarios deportivos@gmail.com	86051.263					X														

El IDERMETA, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, se compromete a dar el adecuado tratamiento, disposición y reserva de la información consignada en el presente documento, en cumplimiento a la protección de datos y seguridad de la información.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META

GOBERNACIÓN DEL META

IDERMETA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE ASISTENCIA

Código: FR-GCA-05
Vigencia: 24/11/2020
Versión: 02
Página 1 de 1

2297

INIÓN/ACTIVIDAD:	Reunion Seguimiento contrato 299 de 2023 4106-2023	**HORA:**	10. am.
LUGAR:	Sala de juntas IDERMETA	**FECHA:**	28-abr-2023.

NOMBRE RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Fabian Pan.

	Municipio	Nombres y apellidos	Comunidad / Dirección	Teléfono o móvil de Contacto	Correo electrónico / email	Número de Documento de Identidad	Grupos etarios						Genero			Enfoque diferencial								Firma
							0-5	6-11	12-17	18-28	27-59	60 o más	Hombre	Mujer	LGBTIQ	Mujer gestante	Victima	Discapacitado	Afro	Indigena	Pobreza extrema	Rom o gitano	Otro	
1	Villavicencio.	Jhon Henry Ortiz Garcia.	Manzana 1	3102435 69.	Escenarios Deportivos 2023@Gmail.Com	1121840178					X													
2	Villavicencio	Wilmer A. Sanjuel	Mineros FC.	3002693568	wilmer.sanjuel16@gmail.com	1030591584.					X		X											
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								

I IDERMETA, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, se compromete a dar el adecuado tratamiento, disposición y reserva de la información consignada en el presente documento, en cumplimiento a la protección de datos y seguridad e la información.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META

GOBERNACIÓN DEL META

2298

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD ACTA DE REUNIÓN	Código: FR-GCA-04 Vigencia: 24/11/2020 Versión: 2 Página 1 de 2

ACTA No. 001	**FECHA:**		**HORA:**	
	17/05/2023		Inicio: 11:00 AM	Fin: 12:00 M
	LUGAR:	COLISEOS MENORES (voleibol, pesas, lucha, taekwondo, boxeo), Y PISTA DE PATINAJE		
RESPONSABLES:	DIEGO NARVÁEZ- SUBDIRECTOR TÉCNICO Y JORGE LÓPEZ - ADMINISTRATIVO			

OBJETIVO O PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

REALIZAR LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE COLISEOS MENORES (voleibol, pesas, lucha, taekwondo, boxeo), Y PISTA DE PATINAJE, DEL COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL CALLE LOMBANA, PARA INTERVENCIÓN DE OBRA SEGÚN CONTRATO 106 DE 2023.

AGENDA / ORDEN DEL DÍA

1. ENTREGAR DE FORMA REAL Y MATERIAL LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, PISTA DE PATINAJE Y COLISEOS MENORES, AL CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023, SEGÚN CONTRATO DE OBRA 106 DE 2023, QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META" Y A LA INTERVENTORÍA SEGÚN CONTRATO 249 DE 2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – DEPARTAMENTO DEL META.

DESARROLLO

Se reunieron en el complejo deportivo Villa Olímpica; Jhon Henry Ortiz García, Yeison Gómez Guerrero, representantes del consorcio Escenarios Deportivos, Andrés Hernández, Héctor Gómez Jaimes, representantes de la interventoría, Martha Bibiana Pan Merchán, jefe de planeación y asuntos administrativos del IDERMETA, Diego Narváez Ruiz, subdirector técnico de IDERMETA y Jorge Hernán López Fierro, Administrativo IDERMETA; con el fin de realizar la entrega de los escenarios deportivos, pista de patinaje y coliseos menores(voleibol, pesas, lucha, taekwondo, boxeo), lo anterior teniendo en cuenta que el Instituto de Deporte y Recreación del Meta suscribió recientemente contrato de obra pública N°106 de 2023 con objeto "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA ÓLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META", el cual tiene acta de inicio del 10 de mayo de 2023.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD ACTA DE REUNIÓN	Código: FR-GCA-04 Vigencia: 24/11/2020 Versión: 2 Página 2 de 2

Se cierra la reunión y concluye siendo las 12:00 m.

ASISTENTES


NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jhon Henry Ortiz	Consorcio Escenarios Deportivos	
JORGE H. López Jurado	IDERMETA - ADMINISTRADOR	
Yeison E. Gómez G	Consorcio Escenarios deportivos	
Diego Narváez Ruiz	IDERMETA	Diego Narváez Ruiz
Bibiano Pan	IDERMETA	
Héctor Fernando Gómez	Consorcio Interescenarios	
Andres Hernandez B.	Consorcio Interescenarios.	


Adjunto registro de asistencia presencial.


Se anexa registro fotográfico.


Elaboró: Jorge Hernán López – funcionario Administrativo
Revisó: Diego Narváez – subdirector técnico – IDERMETA.


LUCHA LIBRE




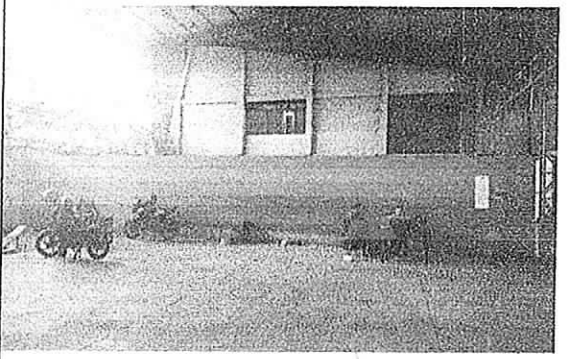

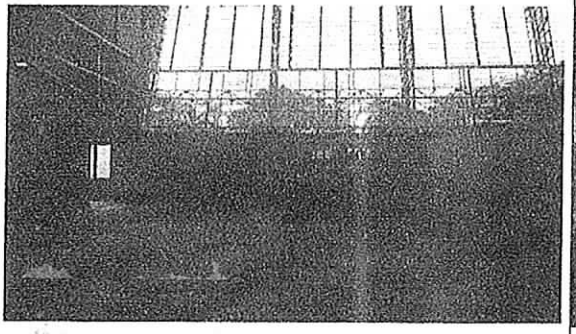


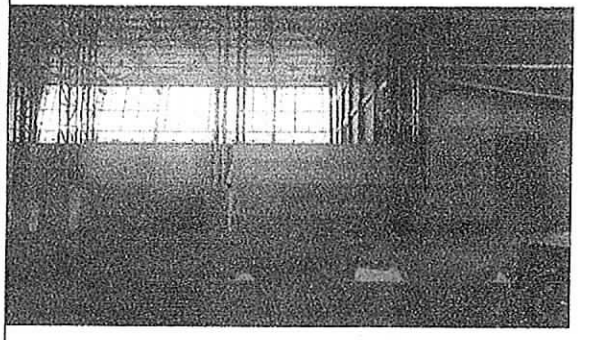


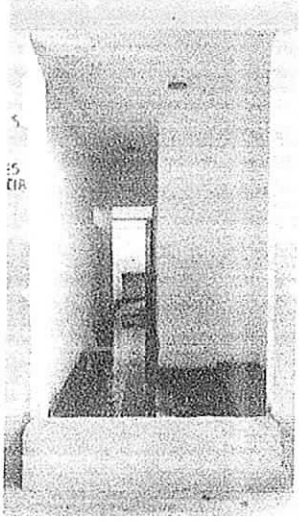






LEVANTAMIENTO DE PESAS

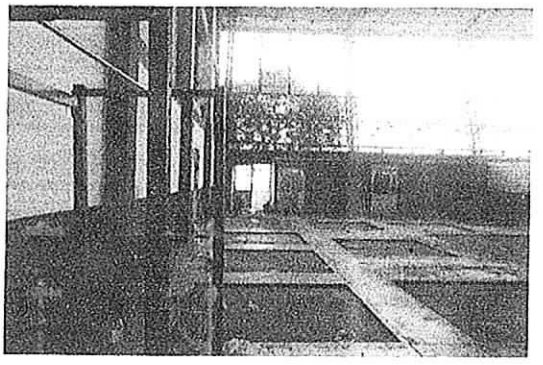


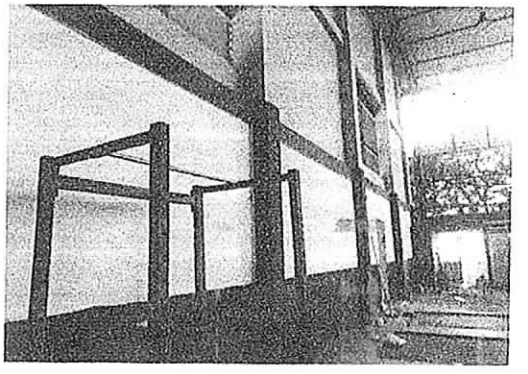

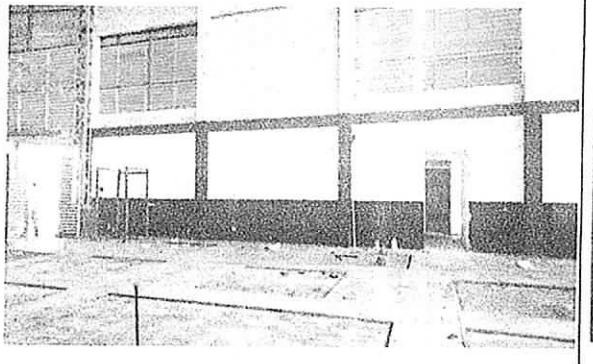


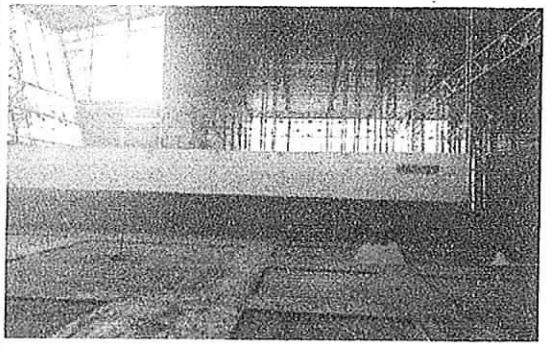


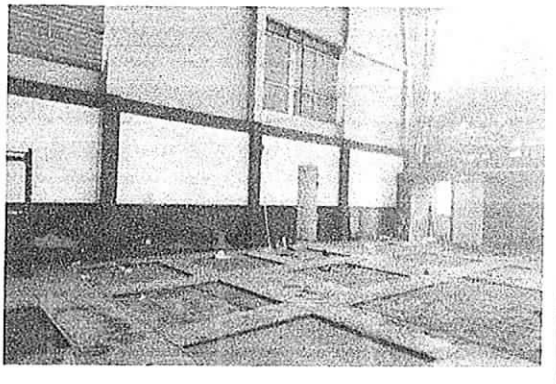


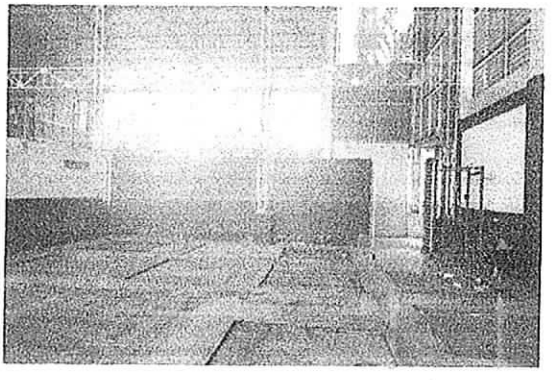



BOXEO

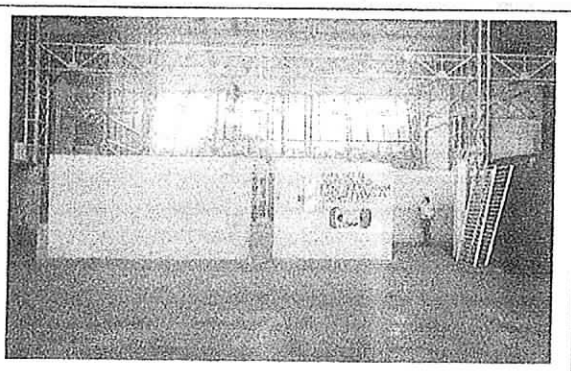

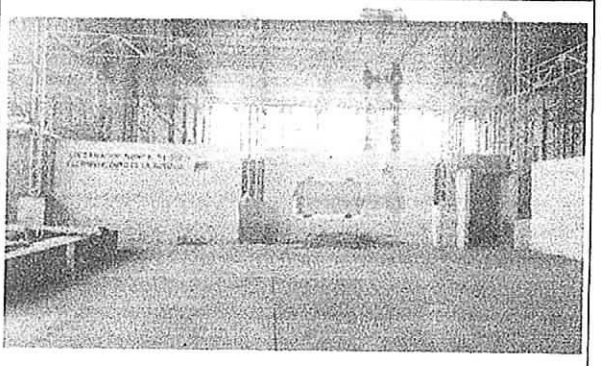

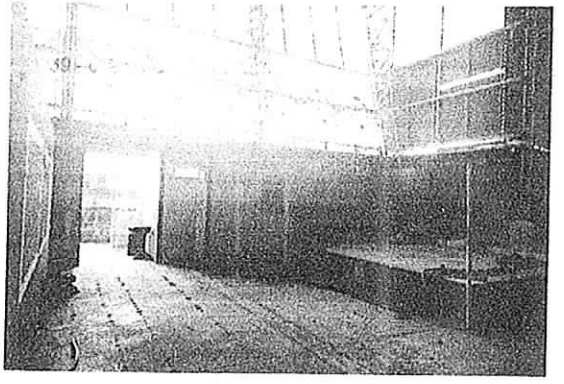


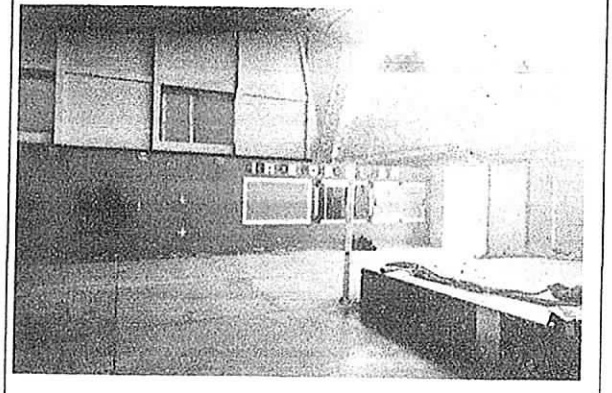


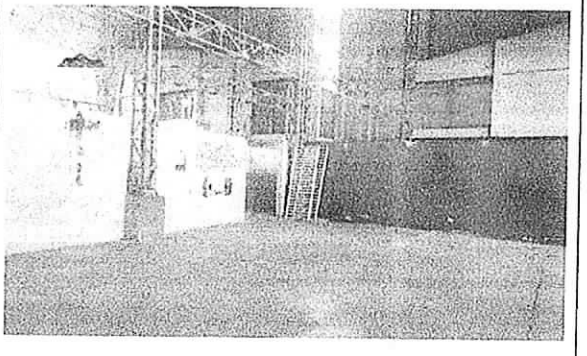






TAEKWONDO




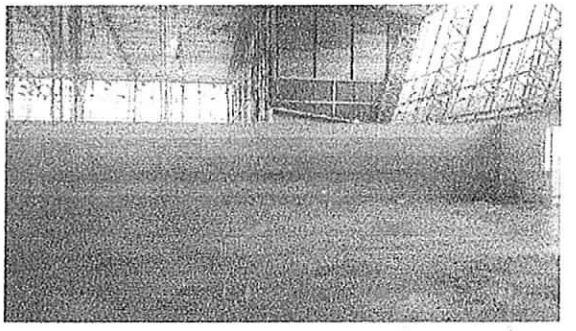

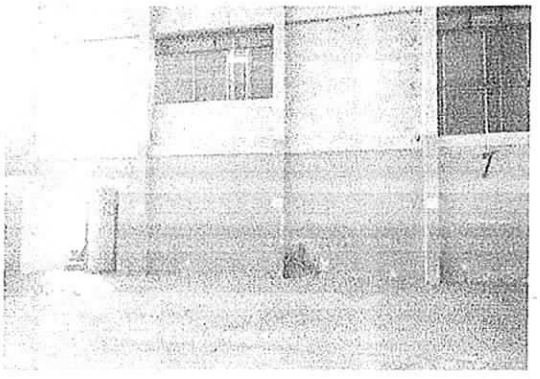


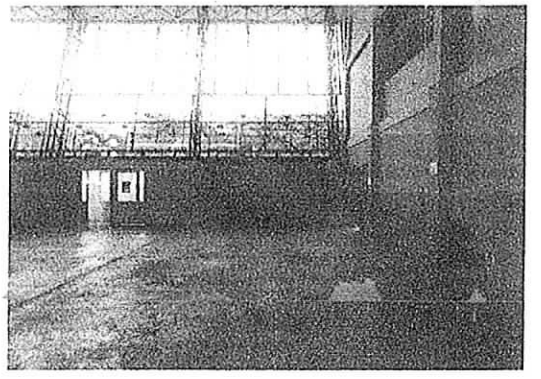

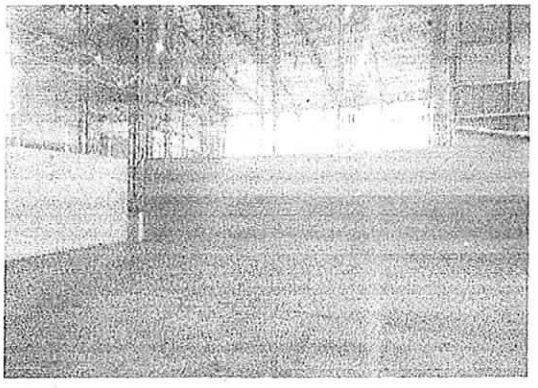


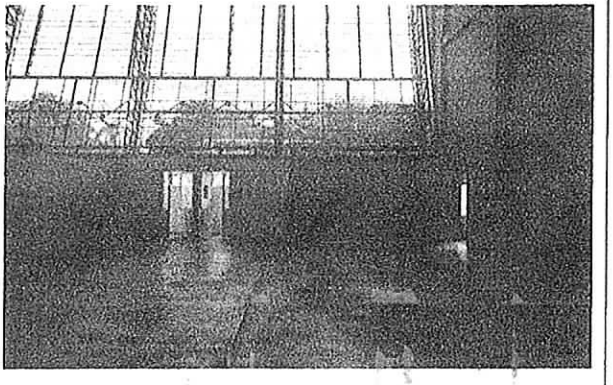


VOLEIBOL

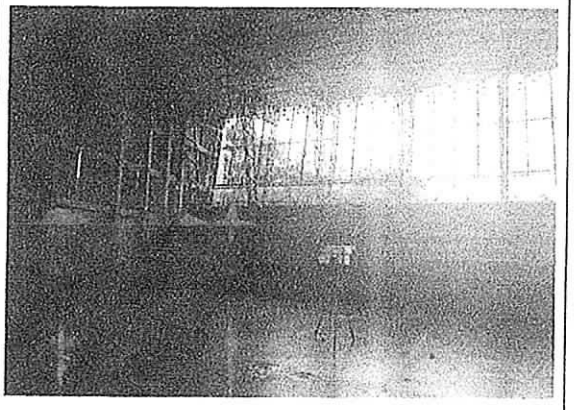




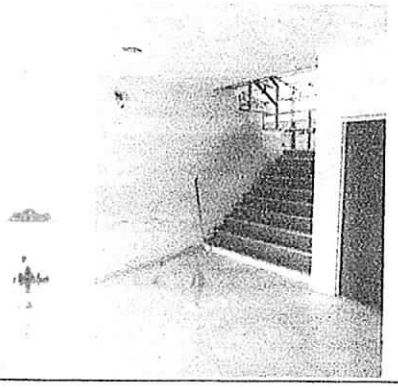




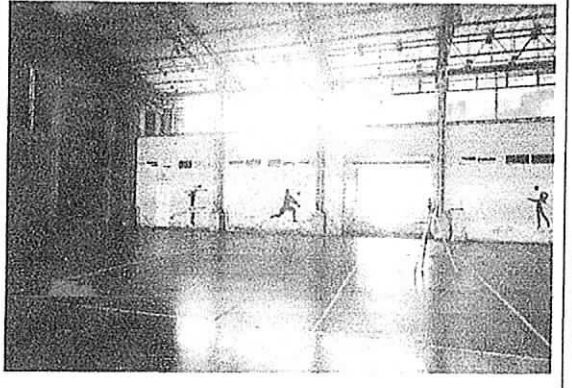


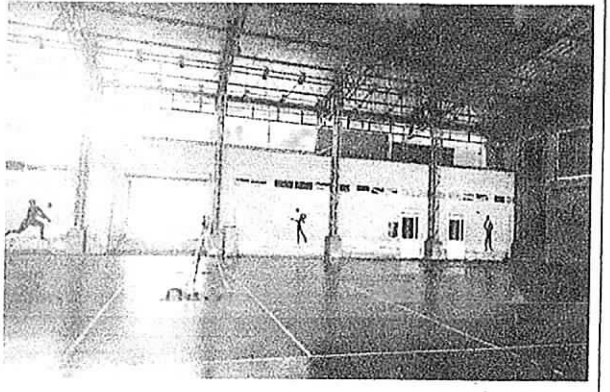

PISTA DE PATINAJE

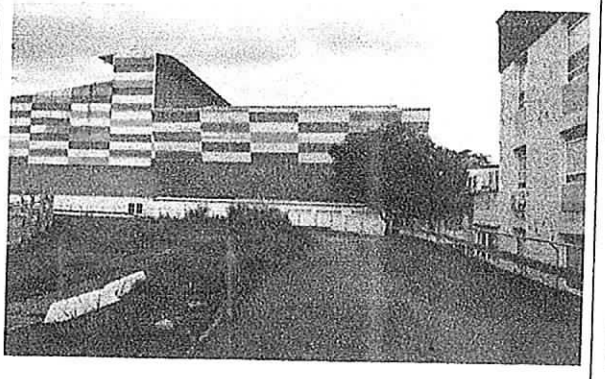




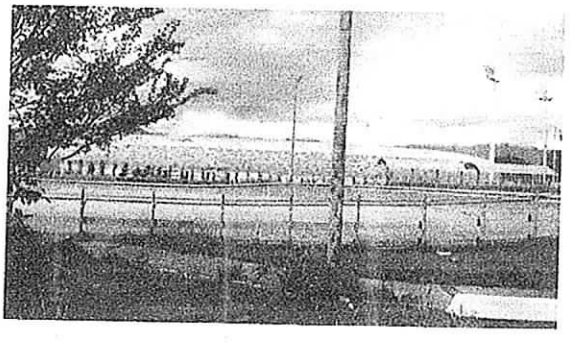





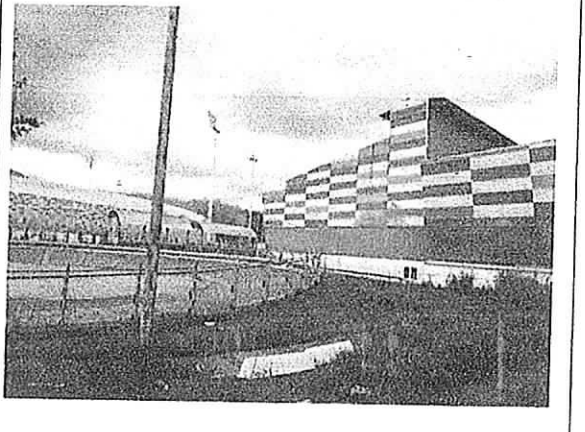

2306

ACTAS DE VECINDAD

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

2307

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

CONTRATO No.	106 de 2023		CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
FECHA			SUPERVISOR:	flower
17	5	2023	OBJETO: CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META	
DD	MM	AA		
ACTA No.:	2			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: INSTITUTO DE RECRFEACION DEL META (IDERMETA)
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: INSTITUTO DE RECRFEACION DEL META (IDERMETA)
Dirección Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - (Popular coliseo tenis de mesa)
Teléfono ___ No. de pisos N.A.
Long. del frente (mts) ___
Matrícula Inmobiliaria No. ___
Cédula catastral ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	■	☐	
2. Alcantarillado	■	☐	
3. Energía	■	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6, Televisión cable	☐	☐	
7, Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO			
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	■	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	■	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	■	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: la estructura se encuentra en buen estado con deterioro normal		GRIETAS Y FISURAS: no se presentan
MUROS: los muros externos y muros internos presentan buen estado en la fachada posterior se evidencia humedades por vegentacion		HUMEDADES: no se evidencian humedades
CUBIERTA: no se evidencian goteras		HUNDIMIENTO PISO: no se presentan en el exterior las zonas duras presentan desagaste norma por uso
PISOS: anivel interior presentan desgaste normal sin embargo a nivel exterior en el enchape de las escaleras se encuentran piezas rotas y filos dañados		DESPLAZAMIENTOS: no se evidencia
FACHADA: la fachada se encuentra en buen estado pañetes y pinturas con desgaste normal		OTRO: Cuál?

FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre: JORGE GIRALDO
C.C. O NIT 86-077.391-VC10

Representante del Contratista
Nombre: Jesus E. Gomez G

Representante de la Interventoría
Nombre Andres Hernandez

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2308

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. la edificacion corresponde al coliseo de tenis de mesa edificacion existente dentro del predio

2. se realiza recorrido de inspeccion sobre todo el perimetro del edificio verificando estado actual de fachadas y de la zona exterior

3. se deja evidencia que pañetes y pinturas de fachada presentan desgaste normal y se encuentran en buen estado

4, las carpinterias son metalicas lamina col rolled se verifica estado de puertas y ventanas las cuales presentan deterioro normal, se verfica estado actual de la vidrieria que se encuentra en buen estado

5. se verifica estado de baranda exterior la cual presenta desgaste normal sin embargo se encuentra en buen estado

6. las zonas duras que circundan la edificacion son andenes en concreto con dilataciones en adoquin cuyas placas presentan desgaste normal

7. En la zona de acceso principal las escaleras evidencian algunas piezas de enchapes dañadas igual que algunos filos.

8. . las zonas verdes se estan utilizando como parqueadero deteriorandose con el trafico de vehiculos

9. para esta acta se verifican las zonas que pueden resultar afectadas con las obras, como es la fachada posterior contra pista de patinaje, donde se realizaran actividades de demolicion, y construccion de la nueva pista

10. se deja evidencia fotografica del estado actual de la edificacion y zonas aledañas

FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre: Jorge Lopez
C.C. O NIT 86.071.341

Representante del Contratista
Nombre: Yaisin E. Gomez G
C.C. O NIT 84.051.363

Representante de la Interventoria
Nombre Andres Hernandez
C.C. O NIT 80038630

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoria
Copia: para el contratista

2309

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

estado actual fachada coliseo tenis de mesa





fachada posterior




fachada posterior detalle de pintura





detalle humedades en muros de fachada

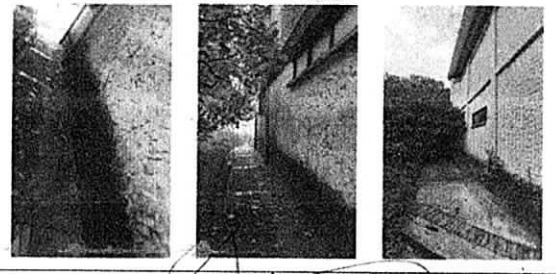

FIRMAS

Firma Responsable Idrmeta

Nombre: JOSE LOPEZ
C.C. O NIT 86051-341 0/10

Representante del Contratista

Nombre: Yeison E Gomez G
C.C. O NIT 86.051.263

Representante de la Interventoría

Nombre Andres Hernandez
C.C. O NIT 80035630

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2310

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

escaleras de acceso a edificio




zona de locales frente a via





fachada locales zona de pista

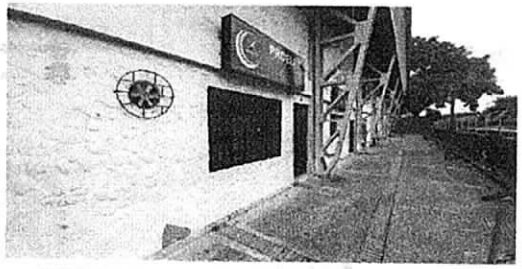





FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre: JORGE GÓMEZ
C.C. O NIT 86.071.391

Representante del Contratista
Nombre: Yeison E. Gomez G
C.C. O NIT 96051.263

Representante de la Interventoria
Nombre Andres Hernandez
C.C. O NIT 80038630


Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoria
Copia: para el contratista

2311

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

CONTRATO No.	106 de 2023		CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
FECHA			SUPERVISOR:	flower
17	5	2023	OBJETO: CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META	
DD	MM	AA		
ACTA No.:	5			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

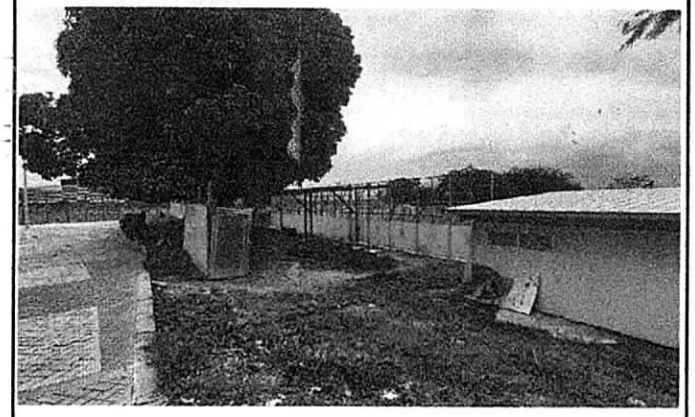

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: INSTITUTO DE RECRFEACION DEL META (IDERMETA)
Tenencia: Propietario _ X Arrendatario _____ Poseedor ___ Otro Cual?_____
Nombre del Propietario: INSTITUTO DE RECRFEACION DEL META (IDERMETA)
Dirección zona canalizaciones electricas
Teléfono _____ No. de pisos N.A.
Long. del frente (mts) N.A
Matrícula inmobiliaria No. N.A
Cédula catastral N.A.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	■	☐	
2. Alcantarillado	■	☐	
3. Energía	■	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6, Televisión cable	☐	☐	
7, Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO				
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	■	Cuál?_____		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☐
4. Institucional	■	Cuál?_____			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:se verifica inspeccion ocular al estado de las zonas de baños y zonas de subestacion electrica encontrando evidenciando su buen estado		GRIETAS Y FISURAS: no se presentan
MUROS: los muros externos presentan buen estado		HUMEDADES: no se evidencian humedades
CUBIERTA: no se evidencian goteras ni filtraciones de las edificaciones de baños y cuarto electrico		HUNDIMIENTO PISO:_no se presentan e
PISOS: se verifica el buen estado de los acabados de piso y placas de las edificaciones de baños y zona de subestacion electrica		DESPLAZAMIENTOS:no se evidencia
FACHADA: las fachadas de las zonas de baños y zona de subestaion se encuentra en buen estado		OTRO:_Cuál?se realiza verificacion al cerramiento del diamente de belsbol en la zona de la subestacion electrica se deja evidencia de su buen estado

FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre: JORGE LOPEZ
C.C. O NIT 86.071.301 VCO

Representante del Contratista
Nombre: Yeison E Gomez G

Representante de la Interventoria
Nombre Andres Hernandez

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoria
Copia: para el contratista

2312

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. se realiza inspeccion ocular a las fachadas y al cerramiento de la zona posteriror del dimante de beisbol, se evidencia su buen estado ya que esta es una obra nueva que hace parte del proyecto fase 1, sin embargo aun se encuentra en obra y no se tiene entrega de esta edificacion, de tal forma se reaaliza recorrido por las zonas donde se va a realizar la canalizacion electrica.

2. se verifica la zona verde donde se realizaran excavaciones encontrando que no tiene ningun tipo de prado especifico.

3. se realiza inspeccion a las graderias existentes entre cancha auxiliar y diamante de softball, se deja evidencia de su mal estado y deterioro, estan construidas en concretos, placas rotas, la estructura de cubierta no tiene la totalidad de la teja.

4. se realiza inspeccion a las fachadas posteriores de la zona de baños, es una obra nueva se deja evidencia del buen estado de carpinterias en alumino para ventanas, pañetes y acabados de pintura

5. se realiza inspeccion a las fachadas de la zona de cuarto electrico subestacion 3, que tambien hace parte del proyecto fas 1 se deja evidencia del buen estado de carpinterias en alumino para ventanas, pañetes y acabados de pintura.

6. debido a que se van a realizar actividades de acometida electrica y conexión a esta subestacion es necesario contar con la planimetria actualizada de redes, para no afectar el sistema electrico cajas y canalizaciones existentes con la construccion de las obras.

7. debido a que esta es una obra nueva que hace parte de la fase 1 del proyecto anterior cabe anotar que es una obra que esta en proceso de entrega razon por la cual la interventoria solicita a la entidad las actas de entrega de obra de esta edificacion cuando estan se suscriban.

8. para esta acta se verifican las zonas que pueden resultar afectadas con las obras, como son las zonas verdes y zona de subestacion electrica.

9. se deja evidencia fotografica del estado actual de la edificacion y zonas aledañas

FIRMAS

Firma Responsable Idermeta	Representante del Contratista	Representante de la Interventoria
Nombre: JORGE LÓPEZ	Nombre: Yeison E Gomez G.	Nombre Carlos Hernandez
C.C. O NIT 86.074-39	C.C. O NIT 82.251.263.	C.C. O NIT 80030631

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

detalle bancas en concreto zona pista de patinaje







detalle zona de baños diamante de beisbol





detalle en muros de fachada y zonas verdes



FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre: Jorge Lopez
C.C. O NIT 86.071.391 VILLO

Representante del Contratista
Nombre: Yeison F. Gomez G
C.C. O NIT 36 557.763

Representante de la Interventoría
Nombre Andres Fernandez
C.C. O NIT 900038630


Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2314


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:


estado actual cerramiento

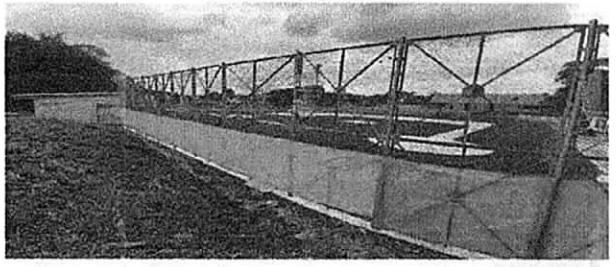




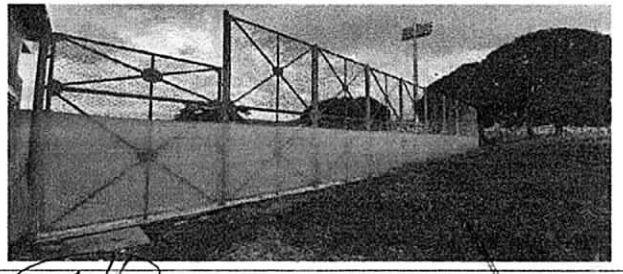

detalle cerramiento diamante de beisbol

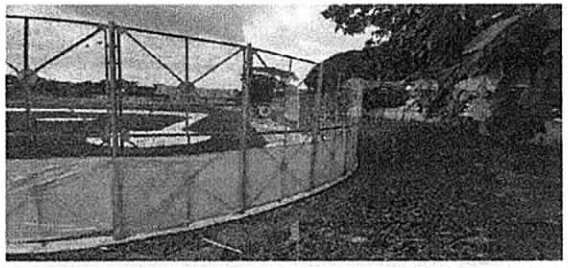

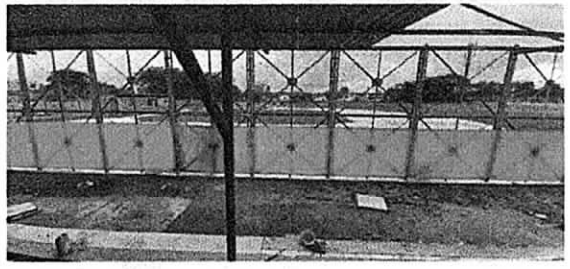



FIRMAS

Firma Responsable Idermeta

Nombre: JORGE LÓPEZ
C.C. O NIT 86071.391 V/cio

Representante del Contratista

Nombre: Nilson E. Gómez G
C.C. O NIT 96 051 263

Representante de la Interventoría


Nombre Andres Hernandez
C.C. O NIT 80 036 311

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:


estrado actual graderias existentes

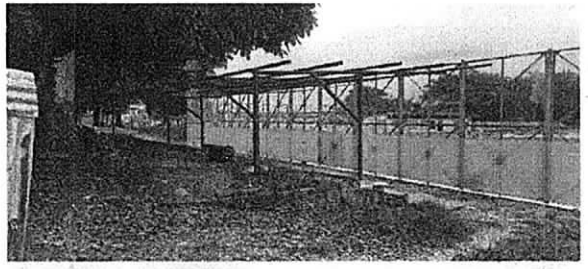



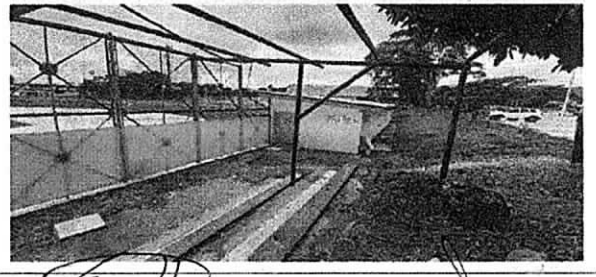

fachada cuarto electrico

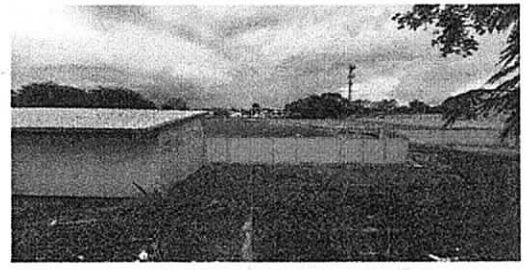





FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre: JORGE LOPEZ
C.C. O NIT 86.071.341 V/C10

Representante del Contratista
Nombre: Yeison G. Gomez G
C.C. O NIT 86.21.263

Representante de la Interventoria
Nombre Carlos Hernandez
C.C. O NIT 80.038.630

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2316

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

CONTRATO No.	106 de 2023		CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
FECHA			SUPERVISOR:	flower
17	5	2023	OBJETO: CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META	
DD	MM	AA		
ACTA No.:	5			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: INSTITUTO DE RECRFEACION DEL META (IDERMETA)

Tenencia: Propietario _ X Arrendatario _____ Poseedor ___ Otro Cual?_____

Nombre del Propietario: INSTITUTO DE RECRFEACION DEL META (IDERMETA)

Dirección Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular

Teléfono _____ No. de pisos N.A.

Long. del frente (mts) N.A

Matrícula Inmobiliaria No. N.A

Cédula catastral N.A.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	■	☐	se realiza acta de vecinada al urbanismo y vias
2. Alcantarillado	■	☐	existentes
3. Energía	■	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6, Televisión cable	☐	☐	
7, Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO				
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	■	Cuál?_____		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	■	Cuál?_____		comercio	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: N.A		GRIETAS Y FISURAS: N.A	
MUROS: N.A		HUMEDADES: N.A	
CUBIERTA: N.A		HUNDIMIENTO PISO: N.A.	
PISOS: se realiza inspeccion ocular a los acabdos de pisos de las zonas de urbanismo espacio publico y la carpeta asfaltica de las vias aledañas		DESPLAZAMIENTOS: N.A.	
FACHADA: N.A		OTRO: _Cuál?	

FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre: [illegible]
C.C. O NIT 86.071.391 Vllco

Representante del Contratista
Nombre: Yeison E Gomez G.

Representante de la Interventoria
Nombre Andres Hernandez

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Código: GES-FO-53
		Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. se realiza recorrido inspeccion sobre todas las zonas de urbanismo que tiene el predio, se verifica estado de las vias, zonas duras, accesos, cerramiento y zonas verdes.

2. se realiza recorrido sobre la via la carrera 16 sobre todo el lindero del predio, se deja registro fotografico de la via que se encuentra en condiciones regulares, pues su pavimento presenta desgaste de la capa asfaltica, huecos y fisuras, la calle tiene varios reparcheos que se han realizado sin embargo es una via con huecos y bastante deteriorada.

3. sobre la carrera 16 se realiza verificacion del cerramiento existente compuesto por malla eslabona, muro en ladrillo tolete a la vista pedestales y vigas en concreto, se evidencia que el ceramietno esta bastante deteriorado, algunos modulos de la malla se encuentran dañados es evidente la falta de mantenimiento a los elementos.

4. se verifica estado del anden sobre la carrera 16, durante el recorrido se encuentran materas en concreto que se deterioren con las raices de los arboles las bancas de la materas tiene dañados los filos y presentan fisuras , el estado de las placas de anden esta deteriorado, se deja evidencia de las obras electricas que se estan realizando afectando el anden.

5. se realiza recorrido sobre la calle 25 encontrando que la via presenta condicones de desgaste de la capa asfaltica, se evidencian reparcheos de asfalto sobre toda la calle, en algunas zonas presenta fisuras de la carpeta.

6. se verifican estado de andenes sobre la calle 25, se verifica estado de las obras nuevas ejecutadas en la fase 1 andenes con acabado de loseta en concreto, sardineles en concreto, en algunas zonas de las losetas no tienen arena entre las juntas lo que puede con el tiempo y las condiciones de lluvia hacer que las losetas se levanten adicionalmente se presenta material vegetal sobre las juntas.

7. sobre esta via se encuentra el parqueadero, construido en concreto se verifican las placas y sardineles evidenciando que se encuentran en buen estado el acceso a parqueo no tiene ningun control, talanquera o porteria actualmente tiene unos sardineles que restringen el acceso de vehiculos

8. para las zonas de urbanismo y zona de parqueadero sobre la calle 25 por ser obras que hacen parte del proyecto fase 1 la interventoria solicita a la entidad la planimetria actualizada del urbanismo y las actas de entrega que se suscriban para estas zonas.

9. se realiza recorrido sobre la carrera 19 verificando y dejando evidencia del estado actual de la via, que se encuentra en condiciones aceptables via que contiene cicloruta con desgaste normal de la carpeta asfaltica, se verifica estado de los andenes y sardineles que sobre la fachada del estadio aue tienen como acabado una zona anden para circulacion en loseta de concreto y deck de concreto sobre el urbanismo.

10. queda pendiente realizar acta para estadio puesto que esta zona no ha sido entregada aun al contratista y es un escenario que esta en constante uso, razon por la cual el acta de vecindad para las actividades de construccion de pista atletica se suscribira cuando la cancha sea entregada.

FIRMAS

Firma Responsable Idermeta	Representante del Contratista	Representante de la Interventoria
Nombre: JORGE LOPEZ	Nombre: Yeison E. Gamez G.	Nombre Andres Hernandez
C.C. O NIT 86-071-391	C.C. O NIT 86.051.263	C.C. O NIT 80036631

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

estado actual sobre la via carrera 16







detalle carpeta de la via carrera 16







FIRMAS

Firma Responsable Ideruta

Nombre: SORCE LÓPEZ
C.C. O NIT 86.071.391 VICIO

Representante del Contratista
Nombre: Yeison E. Gomez G
C.C. O NIT 86.57.263


Representante de la Interventoría
Nombre Andres Hernandez
C.C. O NIT 80058650

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Código: GES-FO-53
		Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

detalle materas y anden carrera 16

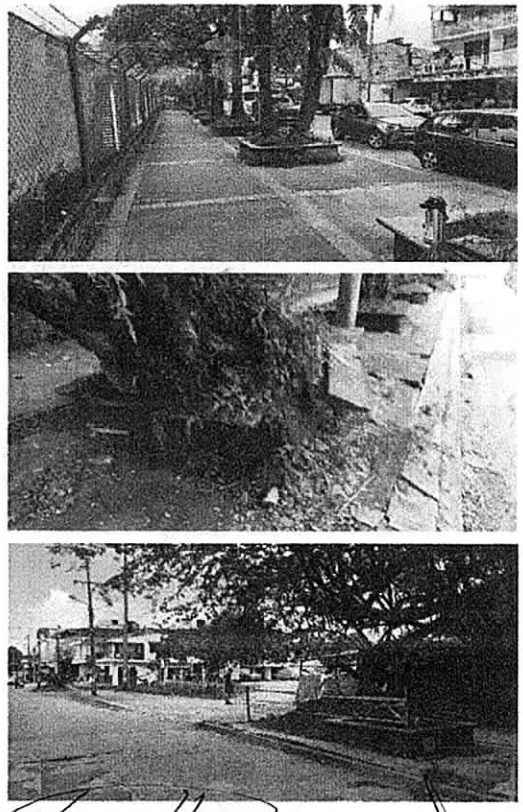

detalle materas placas de anden

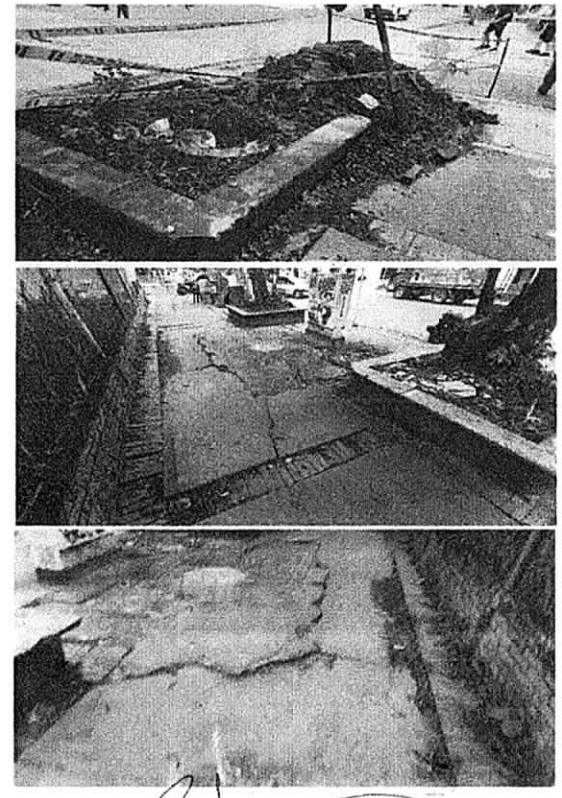

FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre: JORGE GÓMEZ
C.C. O NIT 86.071.391 V/CIO

Representante del Contratista
Nombre: Heiser E. Gomez G.
C.C. O NIT 86.251.263

Representante de la Interventoría
Nombre Andres Hernandez
C.C. O NIT 900038630

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

detalle cerramiento carrera 16







detalle estado cerramiento sobre carrera 16







FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre: JORGE GOMEZ
C.C. O NIT 86.071.391 V/10

Representante del Contratista
Nombre: Yeison E. Gomez G.
C.C. O NIT 86.051.263

Representante de la Interventoría
Nombre Andres Hernandez
C.C. O NIT 80039630

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:


detalle estado actual carpeta asfaltica calle 25





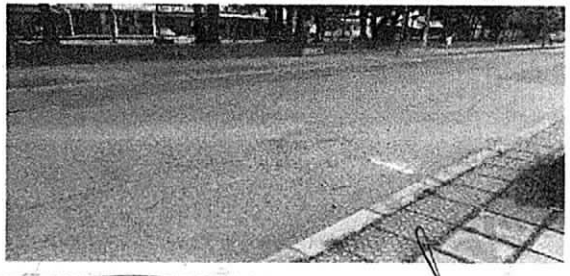

detalle via sobre calle 25

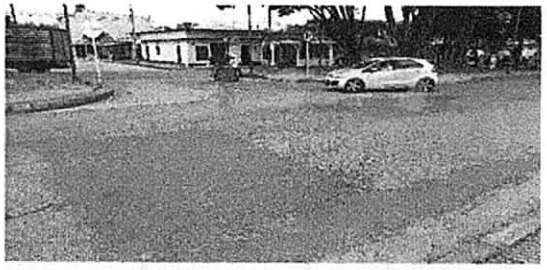





FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre: JORGE LÓPEZ
C.C. O NIT 86.071.391 V/CIO

Representante del Contratista
Nombre: Yeison E. Gomez G
C.C. O NIT 86.058.263

Representante de la Interventoría
Nombre Andres Hernandez
C.C. O NIT 80038650

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:


detalle estado actual loseta anden calle 25








detalle loseta sobre calle 25

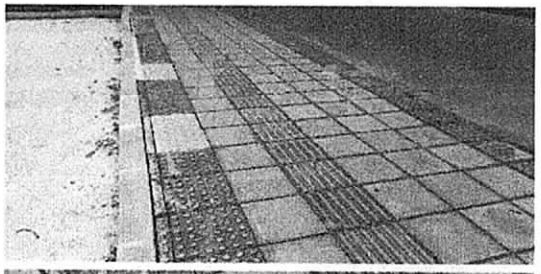

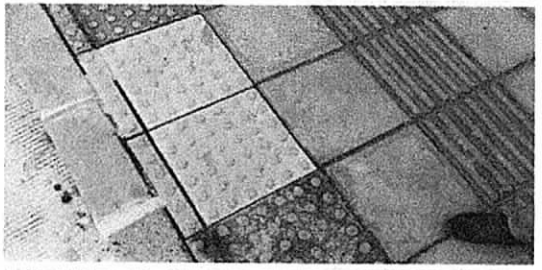



FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre: SOFIA LOPEZ
C.C. O NIT 86.071.391 VILLO

Representante del Contratista
Nombre: Yeison E. Gaines G.
C.C. O NIT 86.071.363

Representante de la Interventoría
Nombre Andrés Hernandez
C.C. O NIT 80.036.631

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

detalle estado actual parqueadero








detalle parqueadero sobre calle 25





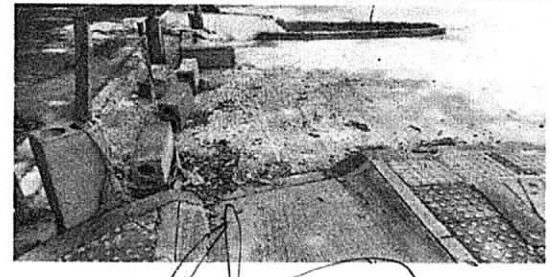

FIRMAS

Firma Responsable Indermeta
Nombre: 86.071-391.
C.C. O NIT
86.071.391

Representante del Contratista
Nombre: Yeison E. Gómez G.
C.C. O NIT 1065126 3

Representante de la Interventoría
Nombre Andrés Hernández
C.C. O NIT 80038630

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2324


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

detalle estado actual carrera 19






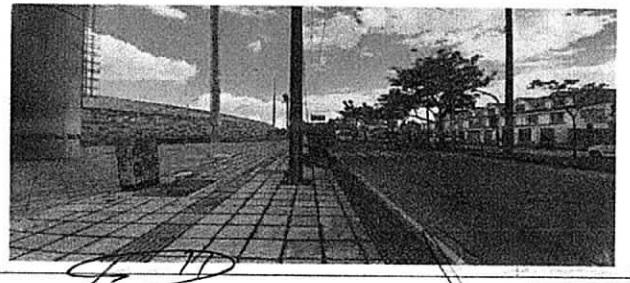

detalle carpeta asfaltica carrera 19



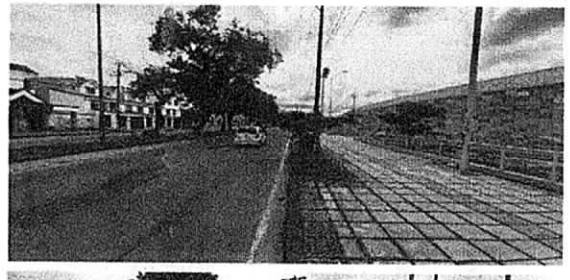



FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre: JORGE LÓPEZ
C.C. O NIT 86.071.391 VICIO

Representante del Contratista
Nombre: Yeisson E. Gomez G
C.C. O NIT 1.060.312.063

Representante de la Interventoría
Nombre Andres Hernandez
C.C. O NIT 80039650

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2325


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

detalle estado andenes sobre carrera 19





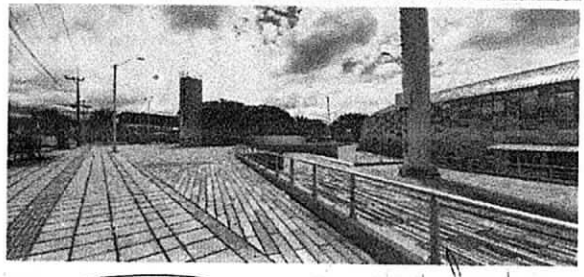

detalle loseta sobre carrera 19







FIRMAS

Firma Responsable Hermeta
Nombre: JOSE GUSTAVO LOPEZ
C.C. O NIT 86.071.391 VILLO

Representante del Contratista
Nombre: Yeison E. Gomez G.
C.C. O NIT 35.051.263

Representante de la Interventoría
Nombre Andres Hernandez
C.C. O NIT 80058630

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2326

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

CONTRATO No.	106 de 2023		**CONTRATISTA:**	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
FECHA			**SUPERVISOR:**	flower
17	5	2023	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META	
DD	MM	AA		
ACTA No.:	1			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: INSTITUTO DE RECRFEACION DEL META (IDERMETA)
Tenencia: Propietario _ X Arrendatario _____ Poseedor ___ Otro Cual?_____
Nombre del Propietario: INSTITUTO DE RECRFEACION DEL META (IDERMETA)
Dirección Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
Teléfono No. de pisos 3
Long. del frente (mts) N.A
Matrícula inmobiliaria No. N.A
Cédula catastral N.A

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	■	☐	
2. Alcantarillado	■	☐	
3. Energía	■	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6, Televisión cable	☐	☐	
7, Otros	■	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO				
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	■	Cuál?_____		

USO ACTUAL				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	■	Cuál?_____		comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:la estructura se encuentra en buen estado con deterioro normal		GRIETAS Y FISURAS: se presentan fisuras en pañetes de fachada
MUROS: los muros externos y muros internos presentan buen estado presencia de humedades internas y externas en fachada		HUMEDADES:fachada presenta humedades en todo el perimetro
CUBIERTA: no se evidencian goteras		HUNDIMIENTO PISO: zonas de adoquin externo parqueadero
PISOS: a nivel interior presentan desgaste normal sin embargo a nivel exterior se presenta hundimiento en zonas de adoquin, las placas en la zona de acceso presentan desgaste		DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:la fachada se enceuntra bastante deteriorada, pañetes desprendios la pintura se encuentra en muy mal estado		OTRO: Cuál?

FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre: JORGE [illegible]
C.C. O NIT 85.[illegible]

Representante del Contratista
Nombre: Yelsan t. Gomez G

Representante de la Interventoria
Nombre Andres Hernandez

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2327

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. la infraestructura del edifico a nivel interior se encuentra en buen estado la construccion en genereal presenta desgaste normal por el uso en los acabados de pintura y enchapes de piso

2. la fachada evidencia la falta de mantenimiento la parte posterior presenta deterioro el páñete presenta varias fisuras y en algunas zonas se encuentra desprendido

3. la pintura de fachada se encuentra en malas condiciones, la fachada posterior se encuentra deteriroro total de la capa de pintura

4, las carpinterias de aluminio ventaneria, puertas de fachada y los vidrios tienen deterioro normal

5. en cuanto a las zonas duras exteriores pisos de la zona de acceso peatonal se evidencia que el acabado en loseta presenta un desgaste normal por el uso, de igual forma se verifican bordillos y sardineles que presentan desgaste por uso.

6. en la zona posterior hacia los parqueaderos el adoquin presenta hundimientos y presenta vegetacion entre las juntas del ladrillo

7 . la superficie del parqueadero no tiene ningun tipo de acabado

8. . las zonas verdes se estan utilizando como parqueadero deteriorandose con el trafico de carros

9. para esta acta se verifican las zonas que pueden resultar afectadas con las obras, como lo es la demolicion de los escenarios existentes y la pista de patinaje

10. se deja evidencia fotografica del estado actual de la edificacion y zonas aledañas

FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre: DIEGO GOMEZ
C.C. O NIT 86.071.391 VICTO

Representante del Contratista
Nombre: Yesson E Gomez G.
C.C. O NIT 86051203

Representante de la Interventoría
Nombre: Andres Hernandez
C.C. O NIT 80830830

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. la infraestructura del edifico a nivel interior se encuentra en buen estado la construccion en genereal presenta desgaste normal por el uso en los acabados de pintura y enchapes de piso

2. la fachada evidencia la falta de mantenimiento la parte posterior presenta deterioro el páñete presenta varias fisuras y en algunas zonas se encuentra desprendido

3. la pintura de fachada se encuentra en malas condiciones, la fachada posterior se encuentra deteriroro total de la capa de pintura

4, las carpinterias de aluminio ventaneria, puertas de fachada y los vidrios tienen deterioro normal

5. en cuanto a las zonas duras exteriores pisos de la zona de acceso peatonal se evidencia que el acabado en loseta presenta un desgaste normal por el uso, de igual forma se verifican bordillos y sardineles que presentan desgaste por uso.

6. en la zona posterior hacia los parqueaderos el adoquin presenta hundimientos y presenta vegetacion entre las juntas del ladrillo

7 . la superficie del parqueadero no tiene ningun tipo de acabado

8. . las zonas verdes se estan utilizando como parqueadero deteriorandose con el trafico de carros

9. para esta acta se verifican las zonas que pueden resultar afectadas con las obras, como lo es la demolicion de los escenarios existentes y la pista de patinaje

10. se deja evidencia fotografica del estado actual de la edificacion y zonas aledañas

FIRMAS

Firma Responsable Idermeta	Representante del contratista	Representante de la Interventoría
Nombre:	Nombre:	Nombre
C.C. O NIT	C.C. O NIT	C.C. O NIT

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

estado actual fachada edifico administrativo





fachada de acceso edifico




fachada posterior





fachada corredor acceso a escenarios

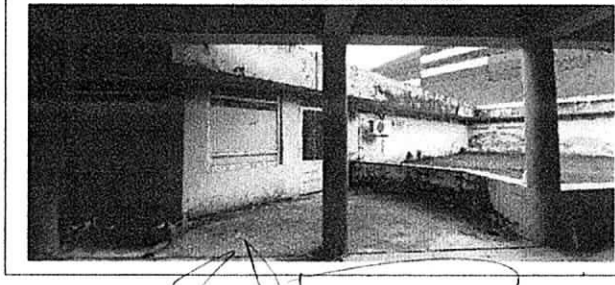

FIRMAS

Firma Responsable Idermeta

Nombre: Victor Ortiz
C.C. O NIT 86.021.397 V/CO

Representante del Contratista

Nombre: Yeison E Gomez G.
C.C. O NIT 86051263

Representante de la Interventoría

Nombre Andres Hernandez
C.C. O NIT 80038630

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2330

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

zonas duras en loseta acceso a edificio







zonas duras y zonas verdes parqueadero







FIRMAS

Firma Responsable Idermeta
Nombre:
C.C. O NIT 80.071.397 Vlab

Representante del Contratista
Nombre: Yeison E. Gomez G
C.C. O NIT 86.051.763

Representante de la Interventoría
Nombre Andres Hernandez
C.C. O NIT 80.036.630


Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista


2331

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

CONTRATO No.			CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
106 de 2023			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
FECHA			SUPERVISOR:	BIBIANA PAN MERCHAN
18	5	2023	OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"	
DD	MM	AA		
ACTA No.:	3			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

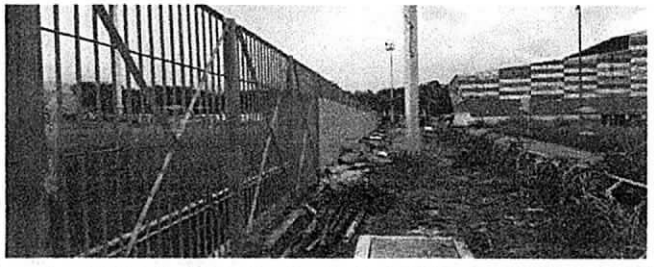

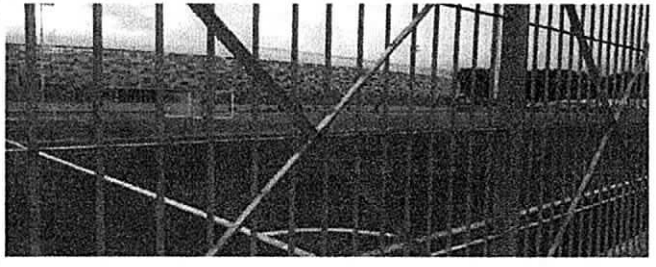

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: IDERMETA

Tenencia: Propietario _ X _ Arrendatario _____ Poseedor ___ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario IDERMETA

Dirección cancha auxiliar estadio bello horizonte rey pele

Teléfono N.A. No. de pisos N.A.

Long. del frente (mts)

Matricula Inmobiliaria No. N.A

Cédula catastral N.A

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	■	☐	
2. Alcantarillado	■	☐	
3. Energía	■	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6, Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO				
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	■	Cuál?		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	■	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	■	Cuál? PARQUEADERO PRIVADO		comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: N.A		GRIETAS Y FISURAS: N.A
MUROS: N.A. N.A		HUMEDADES: N.A.
CUBIERTA: se verifica estado de cubierta de las graderias, se encuentran en buen estado aparentemente no tiene goteras ni filtraciones		HUNDIMIENTO PISO: N.A
PISOS: se verifica superficie de la cancha, construida en grama sintetica la cual se encuentra en buen estado		DESPLAZAMIENTOS: N.A
FACHADA: se revisa cerramiento perimetral el cual esta en buenas condiciones para los elementos metalicos y la pintura del cerramiento evidenciando que se encuentra en buen estado		OTRO: _Cuál? GRADERIAS: Se revisan los diferentes componentes de graderias evidenciando su buen estado, no se encuentra ninguna observacion

FIRMAS

Firma representante IDERMETA

Nombre JORGE LOPEZ

C.C. O NIT 86.071.391

Representante del contratista

Nombre: Yesica E. Gomez G

Representante de la Interventoría

Nombre Andres Hernandez

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2332

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. esta edificacion es una edificacion nueva que ya esta en uso hace parte del proyecto villaolimpica fase 1

2. se realiza recorrido sobre todo el perimetro de la cancha, verificando el estado del cerramiento, se revisa estado actual de sus componentes los cuales estan en buen estado en cuanto a los elementos metalicos que componen el cearramiento asi como los acabados de pintura, adicionalmente se verifica muro en concreto que soporta la estructura el cual esta en buenas condiciones

3. se verifica estado de la grama sintetica la cual esta en perfectas condiciones, no presenta hundimientos y la suoperficie se encuentra en buen estado.

4. se revisa estado de las graderias que quedan dentro de cerramiento y el area de obra de la pista de patinaje, se evidencia que se encuentran en buen estado en su estructura metalica, barandas, cubierta y concretos que componen los elementos de las gradas.

5. se realiza recorrido de inspeccion sobre todo el perimetro de la cancha se verifica estado de las zonas duras, que tienen como acabado deck de concreto el cual se encuentra en buen estado, sin embargo las zonas verdes no tienen algun tipo de prado especifico, la grama actualmente esta deteriorada por el trafico de obra.

6. acorde a la construccion de los escenarios y de la pista de patinaje es necesario contar con la planimetra de redes, para no afectar el sistema electrico o el sistema de drenaje de la cancha, con la construccion de las nuevas obras.

7. debido a que esta es una obra nueva que hace parte de la fase 1 del proyecto anterior y es una canha que esta en uso, la interventoria solicita a la entidad las actas de entrega de obra de esta edificacion.

8. para esta acta se verifican las zonas que pueden resultar afectadas con las obras, como es el lindero posterior contra pista de patinaje, donde se realizaran actividades de demolicion, y construccion de la nueva pista y fachada lateral donde se raiizaran obras de construccion de coliseos multifuncionales.

9. se deja evidencia fotografica del estado actual de la edificacion y zonas aledañas

FIRMAS

Firma representante IDERMETA
Nombre JORGE LOPEZ
C.C. O NIT 86.074.391

Representante del Contratista -
Nombre: Yeison E. Gomez G.

Representante de la Interventoría
Nombre Andres Hernandez

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2333

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

zona de graderias



zona cerramiento perimetral fachada estadio




estado actual malla con polisombra




estado actual pintura cerrmiento



cerramiento perimetral

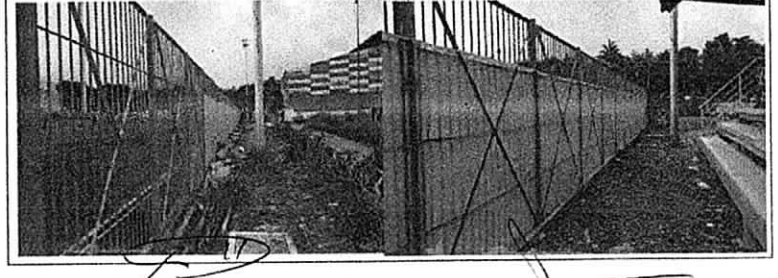

estado actual grama de la cancha

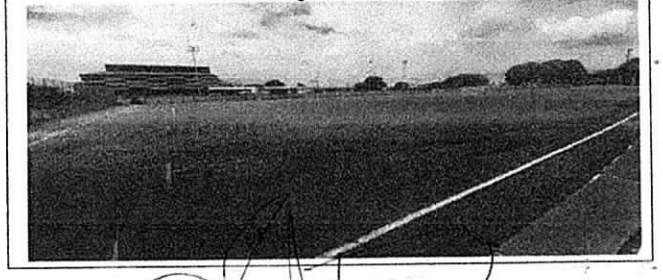

FIRMAS

Firma representante IDERMETA
Nombre JORGE LOPEZ
C.C. O NIT 86.071.391-0

Representante del Contratista
Nombre: Yeison G. Gomez

Representante de la Interventoría
Nombre Andres Hernandez

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2334

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

CONTRATO No.			**CONTRATISTA:**	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023**
106 de 2023			**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO INTERESCENARIOS**
FECHA			**SUPERVISOR:**	**BIBIANA PAN MERCHAN**
18	5	2023	**OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"**	
DD	MM	AA		
ACTA No.:				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario _x_ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?

Nombre del Propietario

Dirección: carrera 16 con calle 20 A esquina

Teléfono: N.A. No. de pisos: N.A.

Long. del frente (mts)

Matrícula Inmobiliaria No.: N.A

Cédula catastral: N.A

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	■	☐	
2. Alcantarillado	■	☐	
3. Energía	■	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO				
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	■	
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	☐	Cuál?		

USO ACTUAL				**ACCESOS VEHICULARES**	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ■ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	■	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	Cuál? PARQUEADERO PRIVADO		comercio	SI ■ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: N.A		GRIETAS Y FISURAS: N.A
MUROS: N.A		HUMEDADES: N.A.
CUBIERTA: N.A		HUNDIMIENTO PISO: N.A
PISOS: N.A		DESPLAZAMIENTOS: N.A
FACHADA: N.A		OTRO: Cuál? CERRAMIENTO: tienen una malla de cerramiento perimetral que en su zona de lindero con la pista de patinaje se encuentra en malas condiciones un tramo no existe

FIRMAS

79508638

Firma propierario

Firma: propietario o responsable

C.C. O NIT Javier Martinez

Representante del Contratista

Nombre: Yeison E. Gomez G

Representante de la Interventoría

Nombre Andres Hernandez

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1.el parqueadero es un lote que no presenta ningun tipo de documentacion, se encuentra localizado sobre la carrera 16 con calle 20 A esquina, contiguo a la villa olimpica, su uso es de parqueadero privado

2. tiene una caseta para control de acceso vehicular construida en teja lamina de zinc que se encuentra deteriorada

3. se verifica estado del cerramiento perimetral que esta construido en malla eslabonada sobre todo el perimetro, sin embargo se deja evidencia del estado actual en la zona que limita con la villa olimpica, zona de pista de patinaje, puesto que este tramo presenta ausencia de cerramiento, el que existe se encuentra en malas condiciones.

4. se deja registro fotografico de lindero entre la pista y el parqueadero esta limitado solo por vegetacion existente

5. se verifica estado del predio que careca de acabados de piso en la zona de parqueo.

6. las zonas duras que circundan la edificacion andenes exteriores que hacen parte del espacio publico son andenes en concreto con dilataciones en adoquin cuyas placas presentan desgaste algunas se encunentran en mal estado

7. En la zona de acceso principal la via de acceso ´presenta desgaste se evidencia mal estado del asafito de la via.

8. para esta acta se verifican las zonas que pueden resultar afectadas con las obras, como es el lindero posterior contra pista de patinaje, donde se realizaran actividades de demolicion, y construccion de la nueva pista

9. se deja evidencia fotografica del estado actual de la edificacion y zonas aledañas

FIRMAS

Firma: propietario o responsable
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista
Nombre: Ruben E. Gomez G

Representante de la Interventoria
Nombre Andres Hernandez


Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2336

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

estado actual malla con polisombra

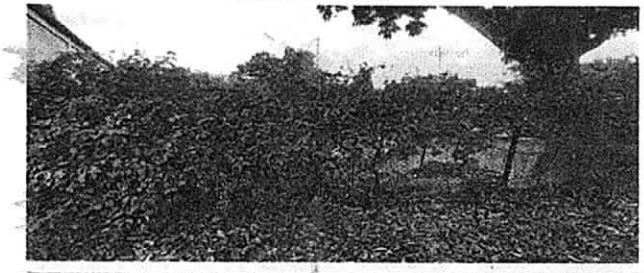



cerramiento perimetral



zona sin malla lindero pista de patinaje







FIRMAS

Firma: propietario o responsable
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista
Nombre: Yeison E. Gomez G

Representante de la Interventoría
Nombre Andres Hernandez

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2337

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-53
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 30/01/2023
	ACTA DE VECINDAD	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA:

estado actual caseta



cerramiento perimetral






estado actual interior del parqueadero





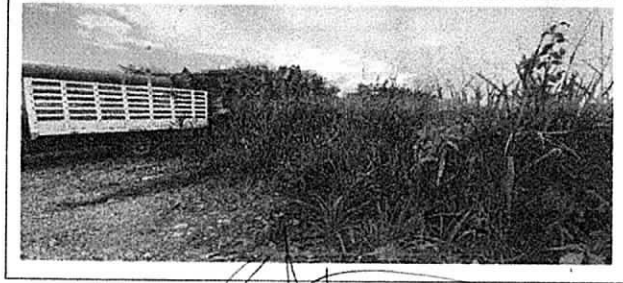

FIRMAS

Firma propietario o responsable
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista
Nombre: Yeison E Gomez G.

Representante de la Interventoria
Nombre Andres Hernandez

Original 1: para el propietario
Original 2: para la Interventoría
Copia: para el contratista

2338

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

2339

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ΣMES	VR. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.						
1.1	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	6436.86	$ 5,438.00	$ 35,003,645	-	-
					$ 35,003,645		
2.00	DESMONTE Y DEMOLICIONES						
2.1	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	30.00	$ 30,524.00	$ 915,720	10.00	305,240
2.2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	55.00	$ 38,155.00	$ 2,098,525	11.00	419,705
2.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4,319.02	$ 18,491.00	$ 79,862,999	557.30	10,305,034
2.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	KG	25,854.30	$ 5,491.00	$ 141,965,961	420.00	2,306,220
2.5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	58.00	$ 82,033.00	$ 4,757,914	18.00	1,476,594
2.6	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	3,250.79	$ 18,021.00	$ 58,582,487	371.09	6,687,413
2.7	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4,319.02	$ 13,760.00	$ 59,429,715	-	-
2.8	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	11.00	$ 15,262.00	$ 167,882	5.00	76,310
2.9	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	487.53	$ 373,009.00	$ 181,853,078	-	-
2.10	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMUN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	3,335.73	$ 14,647.00	$ 48,858,437	34.00	497,998
2.11	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	332.05	$ 431,624.00	$ 143,320,749	-	-
2.12	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	189.77	$ 383,666.00	$ 72,808,297	-	-
2.13	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	45.90	$ 33,079.00	$ 1,518,326	11.43	378,093
					$ 796,140,090		
3.00	EXCAVACIONES Y RELLENOS						
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	4,718.84	$ 38,501.00	$ 181,680,059	-	-
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	5,396.66	$ 63,600.00	$ 343,227,576	-	-
3.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	989.88	$ 31,615.00	$ 31,295,056	-	-
					$ 556,202,691		
4.00	CIMENTACIÓN						
4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	46.78	$ 641,273.00	$ 29,998,751	-	-
4.2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	85.21	$ 1,444,492.00	$ 123,085,163	-	-
4.3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	189.95	$ 1,003,116.00	$ 190,541,884	-	-
4.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124.96	$ 1,075,099.00	$ 134,344,371	-	-
4.5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	108.08	$ 648,730.00	$ 70,114,738	-	-
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	51209.86	$ 8,513.00	$ 435,949,538	-	-
4.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	632.48	$ 821,666.00	$ 519,687,312	-	-
					$ 1,503,721,757		
5.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	993.72	$ 128,414.00	$ 127,607,560	-	-
5.2	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	128.68	$ 1,377,156.00	$ 177,212,434	-	-
5.3	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. GRADERÍAS	M3	99.37	$ 674,689.00	$ 67,043,846	-	-
					$ 371,863,840		
6.00	ESTRUCTURAS EN ACERO						
6.1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	572,164.72	$ 25,806.00	$ 14,765,282,764	-	-
6.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	17,585.47	$ 9,955.00	$ 175,063,354	-	-
					$ 14,940,346,118		
7.00	CUBIERTA Y FACHADA						
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	6,524.58	$ 254,358.00	$ 1,659,579,120	-	-
7.2	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte y remates de cubierta)	M2	5,103.05	$ 1,106,035.00	$ 5,644,151,907	-	-
					$ 7,303,731,027		
8.00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES						
8.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	2,039.46	$ 53,708.00	$ 109,535,318	-	-
8.2	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31.50	$ 1,338,592.00	$ 42,165,648	-	-
8.3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	36.10	$ 1,377,156.00	$ 49,715,332	-	-
8.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	45.99	$ 1,008,399.00	$ 46,376,270	-	-
8.5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.58	$ 1,805,128.00	$ 10,072,614	-	-
8.6	MESON EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.09	$ 1,989,083.00	$ 10,124,432	-	-
8.7	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	25.44	$ 142,180.00	$ 3,617,059	-	-
8.8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2,557.33	$ 26,532.00	$ 67,851,080	-	-
8.9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M3	1,267.50	$ 36,084.00	$ 45,736,470	-	-
8.10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	15,674.34	$ 8,513.00	$ 133,435,656	-	-
					$ 518,629,879		
9.00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
9.1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	60.00	$ 1,411,393.00	$ 84,683,580	-	-
9.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	4.00	$ 900,711.00	$ 3,602,844	-	-
9.3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	24.00	$ 953,654.00	$ 22,887,696	-	-
9.4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	76.00	$ 504,633.00	$ 38,352,108	-	-
9.5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	20.00	$ 161,971.00	$ 3,239,420	-	-
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	4.00	$ 327,907.00	$ 1,311,628	-	-
9.7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	43.84	$ 156,171.00	$ 6,846,537	-	-
9.8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	76.00	$ 387,179.00	$ 29,425,604	-	-
9.9	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UND	2.00	$ 43,672.00	$ 87,344	-	-
					$ 190,436,761		
10.00	CARPINTERÍA METÁLICA						
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20, 2 X 0.90 M	UND	28.00	$ 528,395.00	$ 14,795,060	-	-
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	118.80	$ 720,221.00	$ 85,562,255	-	-
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMINIO	M2	67.80	$ 323,273.00	$ 21,917,909	-	-
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	287.76	$ 310,290.00	$ 89,289,050	-	-

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	∑MES	VR. TOTAL
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO	M2	374.82	$ 1,591,335.00	$ 596,464,185	-	-
					$ 808,026,459		
11.00	OBRAS EXTERIORES						
11.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	941.80	$ 48,109.00	$ 45,309,056	-	-
11.2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	941.80	$ 203,395.00	$ 191,557,411	-	-
11.3	SISTEMA MODULAR SPORT PARA CANCHAS DEPORTIVAS (FLEXIBLES, ALTOS ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA CUALQUIER ESCENARIO DEPORTIVO DE COMPETITIVIDAD)	M2	2,785.14	$ 684,313.00	$ 1,905,907,509	-	-
11.4	SISTEMA MODULAR ESPECIALIZADO PARA PESAS EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO, MEDIDAS DE 30 CMS X 30 CMS Y ESPESOR DE 1.2 CMS	M2	352.74	$ 790,931.00	$ 278,993,001	-	-
11.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	738.00	$ 52,542.00	$ 38,775,996	-	-
11.6	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	745.42	$ 135,684.00	$ 101,141,567	-	-
11.7	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2,318.21	$ 225,626.00	$ 523,048,449	-	-
					$ 3,084,732,989		
12.00	PISOS Y ENCHAPES						
12.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1,811.91	$ 12,127.00	$ 21,973,033	-	-
12.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1,267.50	$ 13,941.00	$ 17,670,218	-	-
12.3	ESTUCO PLASTICO	M2	1,811.91	$ 17,784.00	$ 32,223,007	-	-
					$ 71,866,258		
13.00	INSTALACIONES HIDRAULICAS						
13.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	703.27	$ 5,522.00	$ 3,883,457	-	-
13.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	246.14	$ 68,679.00	$ 16,904,649	-	-
13.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	53.00	$ 247,904.00	$ 13,138,912	-	-
13.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	70.33	$ 119,827.00	$ 8,427,433	-	-
13.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	175.82	$ 63,600.00	$ 11,182,152	-	-
13.6	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	263.47	$ 111,812.00	$ 29,459,108	-	-
13.7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	108.04	$ 38,348.00	$ 4,143,118	-	-
13.8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	77.64	$ 27,720.00	$ 2,152,181	-	-
13.9	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82.92	$ 22,916.00	$ 1,900,195	-	-
13.10	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	107.12	$ 19,078.00	$ 2,043,635	-	-
13.11	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	64.68	$ 171.00	$ 1,036,238	-	-
13.12	TUBERÍA PVCP RDE 9 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	106.64	$ 13,287.00	$ 1,416,926	-	-
13.13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	92.00	$ 58,398.00	$ 5,372,616	-	-
13.14	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24.00	$ 70,289.00	$ 1,686,936	-	-
13.15	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	64.00	$ 80,231.00	$ 5,134,784	-	-
13.16	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 328,362.00	$ 6,567,240	-	-
13.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	3.00	$ 269,530.00	$ 808,590	-	-
13.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø4" UM	UN	2.00	$ 170,877.00	$ 341,754	-	-
13.19	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 23,463.00	$ 469,260	-	-
13.20	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16.00	$ 11,553.00	$ 184,848	-	-
13.21	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30.00	$ 10,536.00	$ 316,080	-	-
13.22	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 6,016.00	$ 120,320	-	-
13.23	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	34.00	$ 3,767.00	$ 128,078	-	-
13.24	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	76.00	$ 43,672.00	$ 3,319,072	-	-
					$ 120,137,582		
14.00	INSTALACIONES SANITARIAS						
14.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	726.77	$ 5,522.00	$ 4,013,224	-	-
14.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	431.37	$ 68,679.00	$ 29,626,060	-	-
14.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	93.46	$ 247,904.00	$ 23,169,108	-	-
14.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	89.01	$ 119,827.00	$ 10,665,801	-	-
14.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	333.22	$ 63,600.00	$ 21,192,792	-	-
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	65.23	$ 101,025.00	$ 6,589,861	-	-
14.7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	229.01	$ 96,834.00	$ 22,175,954	-	-
14.8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	197.28	$ 46,886.00	$ 9,249,670	-	-
14.9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	114.24	$ 38,330.00	$ 4,378,819	-	-
14.10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	121.00	$ 26,096.00	$ 3,157,616	-	-
14.11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	180.00	$ 36,501.00	$ 6,570,180	-	-
14.12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	228.00	$ 21,173.00	$ 4,827,444	-	-
14.13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	84.00	$ 11,892.00	$ 998,928	-	-
14.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	76.00	$ 88,384.00	$ 6,717,184	-	-
14.15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 69,275.00	$ 1,385,500	-	-
14.16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	36.00	$ 70,264.00	$ 2,529,504	-	-
14.17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	24.00	$ 85,727.00	$ 2,057,448	-	-
14.18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	60.00	$ 86,652.00	$ 5,199,120	-	-
14.19	CAJA DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	19.00	$ 706,501.00	$ 13,423,519	-	-
14.20	CAJA DE INSPECCION DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4.00	$ 868,789.00	$ 3,475,156	-	-
14.21	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. DE TRAFICO PESADO	UN	1.00	$ 954,323.00	$ 954,323	-	-
14.22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	UN	1.00	$ 513,723.00	$ 513,723	-	-
14.23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	1.00	$ 502,350.00	$ 502,350	-	-
					$ 183,373,284		
15.00	RED AGUAS LLUVIAS						
15.1	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	343.20	$ 27,178.00	$ 9,327,490	-	-
15.2	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	362.37	$ 46,886.00	$ 16,990,080	-	-
15.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	394.40	$ 201,026.00	$ 79,284,654	-	-
15.4	CAJA DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	24.00	$ 549,517.00	$ 13,188,408	-	-
					$ 118,790,634		
16.00	RED CONTRA INCENDIOS						
16.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	351.36	$ 5,522.00	$ 1,940,210	-	-
16.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	155.02	$ 68,679.00	$ 10,646,619	-	-
16.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	34.00	$ 247,904.00	$ 8,428,736	-	-
16.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	60.31	$ 119,827.00	$ 7,226,766	-	-
16.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	161.14	$ 63,600.00	$ 10,248,504	-	-
16.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	228.88	$ 129,760.00	$ 29,699,469	-	-
16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	78.48	$ 64,546.00	$ 5,065,570	-	-
16.8	TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32.00	$ 91,046.00	$ 2,913,472	-	-
16.9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4.48	$ 65,351.00	$ 292,772	-	-
16.10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12.00	$ 34,276.00	$ 411,312	-	-
16.11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 2,458,986.00	$ 9,835,944	-	-
16.12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28.00	$ 23,027.00	$ 644,756	-	-

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	∑MES	VR. TOTAL
16.13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 14,584.00	$ 58,336	-	-
16.14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 11,594.00	$ 92,752	-	-
					$ 87,505,218		
17.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS						
17.1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	310.00	$ 180,745.00	$ 56,030,950	-	-
17.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4-0 - JUEGO X 3 UNIDADES - TFT151EXT	UN	2.00	$ 489,170.00	$ 978,340	-	-
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE 225 KVA. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	UN	1.00	$ 95,503,711.00	$ 95,503,711	-	-
17.4	PLATINA DE COBRE 1000A PARA EXTENSIÓN DE BARRAJES DE TRANSFORMADOR DE 300KVA	UN	1.00	$ 1,380,564.00	$ 1,380,564	-	-
17.5	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGUN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT'S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1.00	$ 11,356,019.00	$ 11,356,019	-	-
17.6	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1.00	$ 16,738,866.00	$ 16,738,866	-	-
17.7	GENERADOR DIESEL DE 225KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIESEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1.00	$ 183,594,177.00	$ 183,594,177	-	-
17.8	TABLERO DE DISTRIBUCION ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 125A, BARRAJE PRINCIPAL DE 300A, PROTECCION PARA 2 CIRCUITOS TRIFASICOS DE 63A, EN COFRE METALICO DE 80X40X35 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1.00	$ 12,495,386.00	$ 12,495,386	-	-
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO DE SALIDA LED, COLOR VERDE, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 110V-130V, FACTOR DE POTENCIA >0.9, CUADRADA 18X290X4.5 AUTONOMIA 90MINUTOS. DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	44.00	$ 126,242.00	$ 5,554,648	-	-
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA <3.2W, TEMPERATURA DEL COLOR 6000-6500K, VIDA ÚTIL 35000 HORAS, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V-277V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, AUTONOMÍA 90 MINUTOS. IP20 RECTANGULAR 30X13X6 CM, DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	44.00	$ 117,091.00	$ 5,152,004	-	-
17.11	Suministro e instalación de acometida 2x(3x250+250+2T)	ML	36.00	$ 1,203,784.00	$ 43,336,224	-	-
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0+2/0+6T	ML	2.00	$ 246,074.00	$ 492,148	-	-
17.13	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	125.00	$ 61,373.00	$ 7,671,625	-	-
17.14	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	420.00	$ 136,851.00	$ 57,477,420	-	-
17.15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 1,051,638.00	$ 2,103,276	-	-
17.16	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	12.00	$ 604,401.00	$ 7,252,812	-	-
17.17	SALIDA PARA ILUMINACION, INCLUYE TUBERIA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN CON VARILLA ROSCADA Y RIEL OMEGA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS. LA SALIDA INCLUYE LA INCIDENCIA DE LOS ML DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO RAMAL	UN	80.00	$ 399,342.00	$ 31,947,360	-	-
17.18	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1"	ML	240.00	$ 34,209.00	$ 8,210,160	-	-
17.19	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	256.00	$ 126,195.00	$ 32,305,920	-	-
17.20	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	56.00	$ 116,277.00	$ 6,511,512	-	-
17.21	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 189,046.00	$ 756,184	-	-
17.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL METALICO DE 10M , GALVANIZADO CON DOS BRAZOS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO), TOT TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE D E 40 Y 40 EN 1/2"	UN	2.00	$ 3,313,745.00	$ 6,627,490	-	-
17.23	CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO PARA POSTES METALICOS SEGUN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MASTIL METÁLICO	UN	2.00	$ 221,516.00	$ 443,032	-	-
17.24	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 6	UN	9.00	$ 74,202.00	$ 667,818	-	-
17.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X8+8T AWG - THHN	ML	127.00	$ 39,428.00	$ 5,007,356	-	-
17.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO ≥110.9W - IP65 - IK08 - 4.000K - 100/277V - ≥110LUMW O SIMILAR	UN	4.00	$ 2,020,743.00	$ 8,082,972	-	-
17.27	Suministro e instalación LUMINARIA Panel LED <20W, angulo de apertura 120°, 1799 lumenes, eficiencia 72 lm/W, temperatura del color 3000-6000K, vida util 35000 horas, tension de operación 100V-240V, factor de potencia >0,9, IP20. Redonda diametro 30 cm. Debe terner certificado RETILAP	UN	48.00	$ 178,062.00	$ 8,546,976	-	-
17.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA <40W, 3400 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP65, RECTANGULAR 120X11X7 CM, DEBE TERNER	UN	16.00	$ 386,911.00	$ 6,190,576	-	-
17.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL <24W, 2880-4000 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP20, CUADRADA 60X60 CM, DEBE TERNER CERTIFICADO	UN	24.00	$ 155,229.00	$ 3,725,496	-	-
17.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 7W	UN	16.00	$ 152,931.00	$ 2,446,896	-	-
17.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 6W	UN	56.00	$ 135,491.00	$ 7,587,496	-	-
17.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HIGHBAY ≤200W	UN	80.00	$ 1,069,009.00	$ 85,520,720	-	-
17.33	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE	UN	4.00	$ 723,631.00	$ 2,894,524	-	-
17.34	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA, SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	2.00	$ 9,310,924.00	$ 18,621,848	-	-
17.35	CARCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,4X0,4M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8")	ML	15.00	$ 443,690.00	$ 6,655,350	-	-
17.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	476.00	$ 73,037.00	$ 34,765,612	-	-
17.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4.00	$ 437,575.00	$ 1,750,300	-	-
17.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 3/4"	ML	12.00	$ 46,761.00	$ 561,132	-	-
17.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	607.00	$ 59,617.00	$ 36,187,519	-	-
					$ 823,132,419		
18.00	SEÑALETICA						
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION EN LAMINA DE POLIESTILENO CALIBRE DE 40 DE 1 MM DE ESPESOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SOBRE VINILO GRADO DE INGENERIA CON CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	M2	30.76	$ 260,897.00	$ 8,025,192	-	-
					$ 8,025,192		
					$ 31,521,667,843		

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.						
1.00	DEMOLICIONES						
1.1	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	ML	628.26	$ 15,530.00	$ 9,756,878	656.03	10,188,146
1.2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	335.36	$ 373,009.00	$ 125,092,298	51.66	19,269,645
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECANICO	M3	187.28	$ 291,376.00	$ 54,568,897	13.30	3,875,301
1.4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	370.50	$ 383,666.00	$ 142,148,253	6.00	2,301,996
					$ 331,566,326		
2.00	PRELIMINARES						
2.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS.	M2	14,462.44	$ 5,438.00	$ 78,646,749	-	-
2.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1,563.67	$ 38,501.00	$ 60,202,859	-	-
2.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	10,442.12	$ 63,600.00	$ 664,118,832	-	-
					$ 802,968,440		
3.00	CONCRETOS						
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	49.87	$ 641,273.00	$ 31,980,285	-	-

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	∑MES	VR. TOTAL
3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO YCONSTRUCCIÓN	M3	234.60	$ 1,224,357.00	$ 287,234,152	-	-
3.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	20875.47	$ 8,513.00	$ 177,712,876	-	-
3.4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	859.76	$ 131,092.00	$ 112,707,658	-	-
3.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18.82	$ 969,616.00	$ 18,248,173	-	-
3.6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	532.01	$ 9,955.00	$ 5,296,160	-	-
					$ 633,179,304		
4.00	**CIMENTACIÓN**						
4.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIEN"O Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	681.64	$ 128,857.00	$ 87,834,085	-	-
4.2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR	M3	408.98	$ 126,238.00	$ 51,628,817	-	-
4.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA	M3	102.25	$ 1,469,637.00	$ 150,270,383	-	-
4.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	170.41	$ 900,037.00	$ 153,375,305	-	-
4.5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS, CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS	M2	3408.21	$ 53,338.00	$ 181,787,105	-	-
4.6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2 CAPAS	M2	3,408.21	$ 81,390.00	$ 277,394,212	-	-
4.7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50% 3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada para los deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMUSLSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%.	M2	3408.21	$ 228,470.00	$ 778,673,739	-	-
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	452.42	$ 584,647.00	$ 264,505,996	-	-
					$ 1,945,469,642		
5.00	**PISTA DE VELOCIDAD**						
5.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	666.42	$ 128,857.00	$ 85,872,882	-	-
5.2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	399.85	$ 126,238.00	$ 50,476,264	-	-
5.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	99.96	$ 1,469,637.00	$ 146,904,915	-	-
5.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	166.60	$ 900,037.00	$ 149,946,164	-	-
5.5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS, CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA SUPERFICIES	M2	3332.10	$ 53,338.00	$ 177,727,550	-	-
5.6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DE UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2 CAPAS	M2	3332.10	$ 81,390.00	$ 271,199,619	-	-
5.7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50% 3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada paralos deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMUSLSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%.	M2	3332.10	$ 228,470.00	$ 761,284,887	-	-
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA PISTA DE PATINAJE.	ML	238.80	$ 1,163,836.00	$ 277,924,037	-	-
5.9	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 45 CM DE LARGO Y 5 CM DE ANCHO CADA 40 CMS EN LINEA RECTA Y CADA 10 CM EN CURVA, CON UN ESPESOR DE 5 MM, HECHOS EN SINTETICO ACRILICO CARGADO CON CUARZO	UN	290.00	$ 66,749.00	$ 19,357,210	-	-
					$ 1,940,693,528		
6.00	**OBRAS EXTERIORES**						
6.1	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4 5	M2	2,217.11	$ 225,626.00	$ 500,237,661	-	-
6.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1,160.37	$ 128,857.00	$ 149,521,797	-	-
6.3	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	696.22	$ 126,238.00	$ 87,889,420	-	-
6.4	GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	4,641.49	$ 116,423.00	$ 540,376,190	-	-
					$ 1,278,025,068		
7.00	**RED AGUAS LLUVIAS**						
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	235.89	$ 5,522.00	$ 1,302,585	-	-
7.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	226.45	$ 68,679.00	$ 15,552,360	-	-
7.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	49.07	$ 247,904.00	$ 12,164,649	-	-
7.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	94.36	$ 119,827.00	$ 11,306,876	-	-
7.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	132.10	$ 63,600.00	$ 8,401,560	-	-
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	235.89	$ 311,111.00	$ 73,387,974	-	-
7.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6.00	$ 706,501.00	$ 4,239,006	-	-
7.8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1.00	$ 868,789.00	$ 868,789	-	-
7.9	CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,48 A=0,50 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	596.50	$ 134,844.00	$ 80,434,446	-	-
7.10	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD. PARA PISTA DE PATINAJE	ML	596.50	$ 702,956.00	$ 419,313,254	-	-
					$ 626,971,499		
8.00	**REDES ELECTRICAS**						
8.1	MASTIL METALICO TRONCO CONICO OCTOGONAL DE 16-18M FABRICADO EN SECCIONES EMBONADAS, BASE REDONDA 600MM EN 3/4 DE ESPESOR, CANASTILLA DE ANCLAJE CON 8 PERNOS DE 7/8" X 1500MM, CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA ALOJAR DE 1 A 8 REFLECTORES, PELDAÑOS DE ASCENSO Y LINEA DE VIDA A PARTIR DE LOS 4M,GALVANIZADO EN CALIENTE	UN	7.00	$ 19,532,812.00	$ 136,729,684	-	-
8.2	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 478,576.00	$ 3,350,032	-	-

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	∑MES	VR. TOTAL
8.3	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGUN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1.00	$ 11,356,112.00	$ 11,356,112	-	-
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	37.00	$ 261,587.00	$ 9,678,719	-	-
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X2+2+8T AWG THHN	ML	433.00	$ 110,981.00	$ 48,054,773	-	-
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4+4+8T AWG THHN	ML	307.00	$ 95,228.00	$ 29,234,996	-	-
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+8T AWG THHN	ML	96.00	$ 75,487.00	$ 7,246,752	-	-
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8+8+8T AWG THHN	ML	165.00	$ 79,043.00	$ 13,042,095	-	-
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 2"	ML	140.00	$ 115,597.00	$ 16,183,580	-	-
8.10	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1.00	$ 16,738,866.00	$ 16,738,866	-	-
8.11	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	7.00	$ 3,439,120.00	$ 24,073,840	-	-
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 80CW - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	76.00	$ 5,681,030.00	$ 431,758,280	-	-
8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR 60CW - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	16.00	$ 4,128,559.00	$ 66,056,944	-	-
8.14	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA ILUMINACION PATINAJE QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 300A; BARRAJE PRINCIPAL DE 400A, 7 ARRANCADORES DIRECTOR CON PROTECCION DE 50A Y CONTACTOR TRIPOLAR DE 50A EN AC3, ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION, EN COFRE METALICO DE 100X60X40 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1.00	$ 23,478,564.00	$ 23,478,564	-	-
8.15	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	251.54	$ 38,501.00	$ 9,684,542	-	-
8.16	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	157.04	$ 192,100.00	$ 30,167,384	-	-
8.17	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.02	$ 641,273.00	$ 1,295,371	-	-
8.18	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.91	$ 1,377,156.00	$ 8,138,992	-	-
8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	275.63	$ 53,399.00	$ 14,718,366	-	-
8.20	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	2,770.04	$ 8,513.00	$ 23,581,351	-	-
8.21	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.16	$ 936,416.00	$ 18,878,147	-	-
8.22	CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	10.00	$ 604,401.00	$ 6,044,010	-	-
8.23	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	4.00	$ 1,152,233.00	$ 4,608,932	-	-
8.24	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	2.00	$ 1,927,585.00	$ 3,855,170	-	-
8.25	CANALIZACIÓN 18 DUCTOS DE 2" PVC	ML	5.00	$ 405,772.00	$ 2,028,860	-	-
8.26	CANALIZACIÓN 12 DUCTOS DE 2" PVC	ML	33.42	$ 345,633.00	$ 11,551,055	-	-
8.27	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 2" PVC	ML	135.11	$ 179,324.00	$ 24,228,466	-	-
8.28	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 2" PVC	ML	70.44	$ 159,278.00	$ 11,219,542	-	-
8.29	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 2" PVC	ML	77.30	$ 149,255.00	$ 11,537,412	-	-
8.30	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	85.78	$ 61,373.00	$ 5,264,576	-	-
8.31	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	54.59	$ [illegible]	$ 1,873,529	-	-
8.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	154.00	$ 73,037.00	$ 11,247,698	-	-
8.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	7.00	$ 437,575.00	$ 3,063,025	-	-
8.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	39.00	$ 59,617.00	$ 2,325,063	-	-
					$ 1,042,294,728		
					$ 8,601,168,535		

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	∑MES	VR. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META						
1.0	PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	9,706.51	$ 4,349.00	$ 42,213,612	645.00	2,805,105
1.2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	33.43	$ 373,009.00	$ 12,469,691	-	-
NP 1.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	6.00	$ 247,904.00	$ 1,487,424	-	-
					$ 54,683,303		
2.00	EXCAVACION Y RELLENOS						
2.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	42.05	$ 38,501.00	$ 1,618,967	-	-
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	238.98	$ 68,679.00	$ 16,412,907	-	-
2.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	44.16	$ 247,904.00	$ 10,947,441	-	-
					$ 28,979,315		
3.00	OBRAS EXTERIORES						
3.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	954.86	$ 98,611.00	$ 94,159,699	-	-
3.2	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,40 A=0,50. DESARROLLO 1,13 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	412.20	$ 134,844.00	$ 55,582,697	-	-
3.3	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD.	ML	412.20	$ 702,956.00	$ 289,758,463	-	-
					$ 439,500,859		
4.00	FILTROS						
4.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8866.15	$ 14,681.00	$ 130,163,948	-	-
4.2	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1956.86	$ 143,702.00	$ 281,204,696	-	-
					$ 411,368,644		
5.00	SUPERFICIE						
5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	8866.15	$ 4,394.00	$ 38,957,863	-	-
5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	545.95	$ 900,037.00	$ 491,375,200	-	-
5.3	PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA EN SITIO CERTIFICADA IAAF. SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 Y DIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPA ELÁSTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPA POROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM 1 A 4 MM DE COLOR ROJO.	M2	7799.35	$ 1,015,468.00	$ 7,919,990,346	-	-
5.4	DEMARCACION PISTA	ML	4257.65	$ 21,661.00	$ 92,224,957	-	-
					$ 8,542,548,366		
6.00	ACCESORIOS						
6.1	BORDILLO ALUMINIO DESMONTABLE CERTIFICADO IAAF	ML	413.42	$ 254,313.00	$ 105,138,080	-	-
6.2	OBSTACULO CARRERA CERTIFICADO IAAF	UN	8.00	$ 1,008,887.00	$ 8,071,096	-	-
6.3	TACOS DE SALIDA	UN	8.00	$ 560,635.00	$ 4,485,080	-	-
					$ 117,694,256		
7.00	PLACA EN CONCRETO						
7.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	95.25	$ 969,616.00	$ 92,355,924	-	-
7.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3892.26	$ 9,955.00	$ 38,747,448	-	-
7.3	SISTEMA MODULAR DEPORTIVO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TEJIDO EN REJILLA, TABLETAS DE 25 CM X 25 CMS X 12.5 MM	M2	127.26	$ 892,631.00	$ 113,596,221	-	-
					$ 244,699,593		
8.00	GRAMA SINTETICA						
8.1	RELLENO CON GRAVILLA	M3	167.17	$ 102,613.00	$ 17,153,815	-	-

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	∑MES	VR. TOTAL
8.2	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1,114.49	$ 116,423.00	$ 129,752,269	-	-
					$ 146,906,084		
					$ 9,986,380,420		
19.00	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESCENARIOS DEPORTIVOS .**						
19.1	CERTFICACION RETIE REDES DE MEDIA				$ 3,000,000	-	-
19.2	CERTFICACION E INSPCCION DE TRANSFORMADOR				$ 949,266	-	-
19.3	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION				$ 2,975,000	-	-
19.4	RETIE USO FINAL				$ 7,735,000	-	-
19.5	CERTIFICACION RETILAP				$ 9,044,000	-	-
19.6	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA				$ 2,793,954	-	-
20.0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 297,493,828	-	-
					$ 323,991,048		
9.00	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE PATINAJE.**						
9.1	RETIE USO FINAL				$ 7,735,000	-	-
9.2	CERTIFICACION RETILAP				$ 9,044,000	-	-
9.3	PMA				$ 187,776,998	-	-
					$ 204,555,998		
9.00	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE ATLETISMO.**						
9.1	Diagnostico pista de Atletismo IAAF -Identificación de las materias primas IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Inspección visual IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Espesor de la pista EN 1969 -Absorción de impactos y Deformación vertical (12 puntos) EN 14808 y EN 14809 -Deslizamiento (6 puntos) EN 13036-4 -Planimetría de la superficie IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Drenaje IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications				$ 46,400,000	-	-
9.2	PMA				$ 187,776,998	-	-
					$ 234,176,998		
					$ 762,724,044		

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)	$ 50,109,216,798
VALOR TOTAL	$ 50,871,940,842

	$ 60,892,800

2345

AVANCE FISICO: PROGRAMADO Vs EJECUTADO

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRAMADO MENSUAL VALOR TOTAL	%	PROGRAMADO ACUMULADO VALOR TOTAL	%	EJECUTADO MENSUAL VALOR TOTAL	%	EJECUTADO ACUMULADO VALOR TOTAL	%
	CONDICIONES CONTRACTUALES												
	CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO LOCAL DE FÚTBOL EN EL BARRIO VILLA CENAIDA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR												
1.00	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	6436.86	$ 5,438.00	$ 35,003,645	2,174,054.51	6.211%	2,174,054.51	6.211%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 35,003,645								
2.00	DESMONTE Y DEMOLICIONES												
2.1	DESMONTE DE LAVAMANOS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	30.00	$ 30,524.00	$ 915,720	-	0.00%	-	0.000%	305,240.00	0.04%	305,240.00	0.038%
2.2	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	55.00	$ 38,155.00	$ 2,098,525	-	0.00%	-	0.000%	419,705.00	0.05%	419,705.00	0.053%
2.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	4,319.02	$ 18,491.00	$ 79,862,999	-	0.00%	-	0.000%	10,305,034.30	1.29%	10,305,034.30	1.294%
2.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	KG	25,854.30	$ 5,491.00	$ 141,965,961	-	0.00%	-	0.000%	2,306,220.00	0.29%	2,306,220.00	0.290%
2.5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	58.00	$ 82,033.00	$ 4,757,914	-	0.00%	-	0.000%	1,476,594.00	0.19%	1,476,594.00	0.185%
2.6	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	3,250.79	$ 18,021.00	$ 58,582,487	-	0.00%	-	0.000%	6,687,412.89	0.84%	6,687,412.89	0.840%
2.7	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	4,319.02	$ 13,760.00	$ 59,429,715	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
2.8	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	11.00	$ 15,262.00	$ 167,882	-	0.00%	-	0.000%	76,310.00	0.01%	76,310.00	0.010%
2.9	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	487.53	$ 373,009.00	$ 181,853,078	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
2.10	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO COMUN INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	3,335.73	$ 14,647.00	$ 48,858,437	-	0.00%	-	0.000%	497,998.00	0.06%	497,998.00	0.063%
2.11	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	332.05	$ 431,624.00	$ 143,320,749	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
2.12	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	189.77	$ 383,668.00	$ 72,808,297	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
2.13	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	45.90	$ 33,079.00	$ 1,518,326	-	0.00%	-	0.000%	378,092.97	0.05%	378,092.97	0.047%
					$ 796,140,099								
3.00	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	4,718.84	$ 38,501.00	$ 181,680,059	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	5,396.65	$ 63,600.00	$ 343,227,576	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
3.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVEYENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	989.88	$ 31,615.00	$ 31,295,056	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 556,202,691								
4.00	CIMENTACIÓN												
4.1	SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 15.8 MPa (2000 PSI)	M3	46.78	$ 641,273.00	$ 29,998,751	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
4.2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	85.21	$ 1,444,492.00	$ 123,085,163	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
4.3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	189.95	$ 1,003,116.00	$ 190,541,884	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
4.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124.96	$ 1,075,099.00	$ 134,344,371	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
4.5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCION NOMINAL MEZCLA EN OBRA	M3	108.08	$ 648,730.00	$ 70,114,738	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	51209.86	$ 8,513.00	$ 435,949,538	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
4.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	632.48	$ 821,666.00	$ 519,687,312	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 1,503,721,757								
5.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO												
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	993.72	$ 128,414.00	$ 127,607,560	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
5.2	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	128.68	$ 1,377,156.00	$ 177,212,434	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
5.3	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA GRADERIAS	M3	99.37	$ 674,689.00	$ 67,043,845	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 371,863,840								
6.00	ESTRUCTURAS EN ACERO												
6.1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	572,164.72	$ 25,806.00	$ 14,765,282,764	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
6.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA FIGURADO ARMADO COLOCACIÓN Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	17,585.47	$ 9,955.00	$ 175,063,354	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 14,940,346,118								
7.00	CUBIERTA Y FACHADA												
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METALICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS, ESPESOR DE 5"	M2	6,524.58	$ 254,358.00	$ 1,659,579,120	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte y remates de cubierta)	M2	5,103.05	$ 1,106,035.00	$ 5,644,151,907	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 7,303,731,027								
8.00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES												
8.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO= 6:1:4)	M2	2,039.46	$ 53,703.00	$ 109,535,318	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
8.2	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31.50	$ 1,338,592.00	$ 42,165,648	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
8.3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	36.10	$ 1,377,156.00	$ 49,715,332	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
8.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	45.99	$ 1,008,399.00	$ 46,376,270	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
8.5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.58	$ 1,805,128.00	$ 10,072,614	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
8.6	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.09	$ 1,989,063.00	$ 10,124,432	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
8.7	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	25.44	$ 142,180.00	$ 3,617,059	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
8.8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2,557.33	$ 26,532.00	$ 67,851,080	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
8.9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M3	1,267.50	$ 36,084.00	$ 45,736,470	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
8.10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	15,674.34	$ 8,513.00	$ 133,435,656	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 518,629,379								
9.00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS												
9.1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	60.00	$ 1,411,393.00	$ 84,683,580	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
9.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	4.00	$ 900,711.00	$ 3,602,844	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
9.3	ORINAL PARED MEDIANO REF 06862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	24.00	$ 953,654.00	$ 22,887,696	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
9.4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	76.00	$ 504,633.00	$ 38,352,108	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
9.5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	20.00	$ 161,971.00	$ 3,239,420	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS	UND	4.00	$ 327,907.00	$ 1,311,628	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
9.7	ESPEJO 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	43.84	$ 156,171.00	$ 6,846,537	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
9.8	GRIFERIA ANTIVAND. LAVAMANOS T. ACC5106 DOCOL	UND	76.00	$ 387,179.00	$ 29,425,604	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
9.9	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UND	2.00	$ 43,672.00	$ 87,344	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 190,436,761								
10.00	CARPINTERÍA METÁLICA												
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO INCLUYE MARCO CERRADURA LAMINA CAL	UND	28.00	$ 528,395.00	$ 14,795,060	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CAL 18 0.90 X 2.10 MTS	M2	118.80	$ 720,221.00	$ 85,562,255	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMANO	M2	67.80	$ 323,273.00	$ 21,917,909	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/4"ETAPA B MM	ML	287.76	$ 310,290.00	$ 89,289,050	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF 304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASATORES, SEGUN PLANO	M2	374.82	$ 1,591,335.00	$ 596,464,185	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 908,023,469								
11.00	OBRAS EXTERIORES												
11.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	941.80	$ 48,109.00	$ 45,309,056	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
11.2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	941.80	$ 203,395.00	$ 191,557,411	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
11.3	SISTEMA MODULAR SPORT PARA CANCHAS DEPORTIVAS (FLEXIBLES, ALTOS ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA CUALQUIER ESCENARIO DEPORTIVO DE COMPETITIVIDAD)	M2	2,785.14	$ 684,313.00	$ 1,905,907,509	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
11.4	SISTEMA MODULAR ESPECIALIZADO PARA PESAS EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO TERMOPLASTICO. MEDIDAS DE 30 CMS X 30 CMS Y ESPESOR DE 1.2 CMS	M2	352.74	$ 790,931.00	$ 278,993,001	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
11.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	733.00	$ 52,542.00	$ 38,775,996	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
11.6	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X 0.60 BRILLANTE	M2	745.42	$ 135,684.00	$ 101,141,567	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
11.7	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2,318.21	$ 225,626.00	$ 523,048,449	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 3,084,722,969								
12.00	PISOS Y ENCHAPES												
12.1	PINTURA VINILO TIPO 1 SAURO (ALTA CALIDAD)	M2	1,811.91	$ 12,127.00	$ 21,973,033	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
12.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1,267.50	$ 13,841.00	$ 17,670,218	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
12.3	ESTUCO PLASTICO	M2	1,811.91	$ 17,784.00	$ 32,223,997	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 71,866,250								
13.00	INSTALACIONES HIDRÁULICAS												
13.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	703.27	$ 5,522.00	$ 3,883,457	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	246.14	$ 68,679.00	$ 16,904,649	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.3	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	53.00	$ 247,904.00	$ 13,138,912	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	70.33	$ 119,827.00	$ 8,427,433	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	175.82	$ 63,600.00	$ 11,182,152	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.6	TUBERIA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	263.47	$ 111,812.00	$ 29,459,108	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.7	TUBERIA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	108.04	$ 38,348.00	$ 4,143,116	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.8	TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	77.64	$ 27,720.00	$ 2,152,181	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.9	TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82.92	$ 22,916.00	$ 1,900,195	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.10	TUBERIA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	107.12	$ 19,078.00	$ 2,043,635	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.11	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	64.08	$ 16,171.00	$ 1,036,238	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.12	TUBERIA PVCP RDE 9 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	106.64	$ 13,287.00	$ 1,416,926	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.13	PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	92.00	$ 58,398.00	$ 5,372,616	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
13.14	PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24.00	$ 70,289.00	$ 1,686,936	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.15	PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	64.00	$ 80,231.00	$ 5,134,784	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.16	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	20.00	$ 328,362.00	$ 6,567,240	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC CE 0"4" UM	UN	3.00	$ 269,530.00	$ 808,590	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC 4"4" UM	UN	2.00	$ 170,877.00	$ 341,754	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.19	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 23,463.00	$ 469,260	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.20	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16.00	$ 11,553.00	$ 184,848	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.21	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30.00	$ 10,536.00	$ 316,080	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.22	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 6,016.00	$ 120,320	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.23	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24.00	$ 3,787.00	$ 128,078	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
13.24	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	78.00	$ 43,672.00	$ 3,319,072	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 137,582								
14.00	INSTALACIONES SANITARIAS												
14.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA CADENA Y PLANOS	ML	726.77	$ 5,522.00	$ 4,013,224	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	431.37	$ 68,679.00	$ 29,626,060	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	93.46	$ 247,904.00	$ 23,169,105	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	59.01	$ 119,827.00	$ 10,665,801	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO EXTENDIDO NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL (CON PISO PLANO)	M3	333.22	$ 63,600.00	$ 21,192,792	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	65.23	$ 101,025.00	$ 6,589,861	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.7	TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	229.01	$ 96,834.00	$ 22,175,954	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.8	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	197.28	$ 46,886.00	$ 9,249,670	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	114.24	$ 38,330.00	$ 4,378,819	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	121.00	$ 26,096.00	$ 3,157,616	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	180.00	$ 36,501.00	$ 6,570,180	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	228.00	$ 21,173.00	$ 4,827,444	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	84.00	$ 11,892.00	$ 998,928	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	76.00	$ 88,394.00	$ 6,717,184	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	20.00	$ 69,275.00	$ 1,385,500	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	36.00	$ 70,264.00	$ 2,529,504	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	24.00	$ 85,727.00	$ 2,057,448	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	60.00	$ 86,652.00	$ 5,199,120	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.19	CAJA DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO, SUMINISTRO Y ELABORACION	UN	19.00	$ 706,501.00	$ 13,423,519	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.20	CAJA DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO, SUMINISTRO Y ELABORACION	UN	4.00	$ 868,789.00	$ 3,475,156	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.21	LOSA SUPERIOR PARA LAVAMANOS (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.40 M, E=0.125 M FUNDIDA EN SITIO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE TAPA PARA EL DE TRAFICO PESADO	UN	1.00	$ 954,323.00	$ 954,323	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.22	LOSA INTERMEDIA DE 4000 PSI, E=0.15 M, D=1.40 M FUNDIDA EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION, INCLUYE PELDAÑOS SEGUN NORMA	UN	1.00	$ 513,723.00	$ 513,723	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
14.23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M, E=0.20 M, INCLUYE CANUELAS	UN	1.00	$ 502,350.00	$ 502,350	-	0.00%	-	0.000%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 163,373,264								
15.00	RED AGUAS LLUVIAS												
15.1	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	343.20	$ 27,178.00	$ 9,327,490	-	7.85%	-	7.85%	-	0.00%	-	0.000%
15.2	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	392.37	$ 49,686.00	$ 19,990,060	-	14.30%	-	14.30%	-	0.00%	-	0.000%
15.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, L12=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTIVIBRACIONES	ML	394.40	$ 201,026.00	$ 79,284,654	-	66.74%	-	66.74%	-	0.00%	-	0.000%
15.4	CAJA DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO, SUMINISTRO Y ELABORACION	UN	24.00	$ 549,517.00	$ 13,188,408	-	11.10%	-	11.10%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 119,790,614								
16.00	RED CONTRA INCENDIOS												
16.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA CADENA Y PLANOS	ML	351.36	$ 5,522.00	$ 1,940,210	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
16.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	155.02	$ 68,679.00	$ 10,646,619	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
16.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	34.00	$ 247,904.00	$ 8,428,736	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
16.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	60.31	$ 119,827.00	$ 7,226,766	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
16.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO EXTENDIDO NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL (CON PISO PLANO)	M3	161.14	$ 63,600.00	$ 10,248,504	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	228.88	$ 129,760.00	$ 29,699,469	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	78.48	$ 64,546.00	$ 5,065,570	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
16.8	TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32.00	$ 91,046.00	$ 2,913,472	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
16.9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4.48	$ 65,351.00	$ 292,772	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
16.10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12.00	$ 34,276.00	$ 411,312	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
16.11	GARNETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 2,458,586.00	$ 9,835,944	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
16.12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28.00	$ 23,027.00	$ 644,756	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
16.13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 14,584.00	$ 58,336	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
16.14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 11,594.00	$ 92,752	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 97,505,216								
17.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS												
17.1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	310.00	$ 180,745.00	$ 56,030,950	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4/0 - JUEGO X 3 UNIDADES - TE1415EXT	UN	2.00	$ 489,170.00	$ 978,340	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR OCASIONALMENTE SUMERGIDO DE 225 KVA, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UN	1.00	$ 95,503,711.00	$ 95,503,711	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.4	PLATINA DE COBRE 100DA PARA EXTENSIÓN DE BARRAJES DE TRANSFORMADOR DE 225KVA	UN	1.00	$ 1,380,564.00	$ 1,380,564	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.5	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGUN NORMA AE 319 PARA MEDICIÓN SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE 3 CT'S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS INCLUYE MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS CON BLOQUE DE PRUEBAS	UN	1.00	$ 11,356,019.00	$ 11,356,019	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.6	TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON ENCLAVAMIENTO MECANICO CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDA TRIFASICA DE 300A A 208 V	UN	1.00	$ 16,738,866.00	$ 16,738,866	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.7	GENERADOR DIESEL DE 225KW, SISTEMA TRIFASICO CON MOTOR DIESEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1.00	$ 183,594,177.00	$ 183,594,177	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.8	TABLERO DE DISTRIBUCION ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE CONTIENE TOTALIZADOR DE 125A, BARRAJE PRINCIPAL DE 300A, PROTECCION PARA 2 CIRCUITOS TRIFASICOS DE 63A EN CORTE METALICO DE 60X40X35 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1.00	$ 12,495,386.00	$ 12,495,386	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.9	SUMINISTRO E INSTALACION LETRERO DE SALIDA LED, COLOR VERDE, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 110V-130V, FACTOR DE POTENCIA >0.9, CUADRADA, 18X25X4.5, AUTONOMIA 90MINUTOS, DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	44.00	$ 126,242.00	$ 5,554,648	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LUMINARIA LED EMERGENCIA <3.2W, TEMPERATURA DEL COLOR 6000-6500K, VIDA ÚTIL 35000 HORAS, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V-277V, FACTOR DE POTENCIA >0.9, AUTUNOMIA 90 MIUTOS IP20, RECTANGULAR 30X13X6 CM, DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	44.00	$ 117,091.00	$ 5,152,004	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.11	Suministro e instalación de acometida 2x(3x250+250+2T)	ML	36.00	$ 1,203,784.00	$ 43,336,224	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0+2/0+1T	ML	2.00	$ 246,074.00	$ 492,148	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.13	CANALIZACION 2 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	125.00	$ 61,373.00	$ 7,671,625	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.14	ACOMETIDA PARCIAL 3fa#6+1fn#2+1fn#8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	420.00	$ 136,851.00	$ 57,477,420	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 1,051,638.00	$ 2,103,276	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.16	CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274 INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	12.00	$ 604,401.00	$ 7,252,812	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.17	SALIDA PARA LUMINACION INCLUYE TUBERIA EMT, PROPORCIONAL CAJAS INTERRUPTOR ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN CON VARILLA ROSCADA Y RIEL OMEGA EN CABLE BAJO EN HALOGENOS LA SALIDA INCLUYE LA INCIDENCIA DE LOS ML DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA PISO (ITEM BASE)	UN	80.00	$ 399,342.00	$ 31,947,360	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.18	ACOMETICA PARCIAL 2 fase#1/0+2 DUCTO PVC 1"	ML	240.00	$ 34,209.00	$ 8,210,160	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.19	SALIDA DE LAMPARA 110 V-L-N SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	256.00	$ 126,195.00	$ 32,305,920	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.20	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	56.00	$ 116,277.00	$ 6,511,512	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.21	SALIDA TOMA BIFASICO (2fa#10+1fn#14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 189,046.00	$ 756,184	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL METALICO DE 10M, GALVANIZADO CON DOS BRAZOS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGUN DISEÑO), TOT TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4" FLANGE D E 40	UN	2.00	$ 3,313,745.00	$ 6,627,490	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA POSTES METÁLICOS SEGÚN NORMA COCENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MAMPOSTERIA	UN	2.00	$ 221,516.00	$ 443,032	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.24	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL SHFC-1 RANGO APLICACION PRINCIPAL DE CABLE 8 A 2 Y ACTIVIDAD DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	9.00	$ 74,202.00	$ 667,818	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETICA 2X3+8T AWG - THHN	ML	127.00	$ 39,428.00	$ 5,007,356	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO 211/5.9W - PPA - HOR - 4.000K - 1000772 - 2110 UMM - 0.5SM AP	UN	4.00	$ 2,020,743.00	$ 8,082,972	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.27	Suministro e instalación LUMINARIA Panel LED +20W, angulo de apertura 120º, 1799 lumenes, eficiencia 72 lm/W, temperatura del color 3000-6000K, vida útil 35000 horas, tension de operación 100V-240V, factor de potencia >0.9, IP20, Redonda diametro 30 cm. Debe tener certificado RETILAP	UN	45.00	$ 178,062.00	$ 8,546,976	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LUMINARIA LED, HERMETICA +42W, 3400 LUMENES, EFICIENCIA +80 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0.9, IP66, RECTANGULAR 120X11X7 CM, DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	16.00	$ 386,911.00	$ 6,190,576	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LUMINARIA LED, PANEL +24W, 2500 LUMENES, EFICIENCIA +90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0.9, IP66, RECTANGULAR 120X11X7 CM, DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	24.00	$ 155,229.00	$ 3,725,496	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 7W	UN	16.00	$ 152,931.00	$ 2,446,896	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.31	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 5W	UN	56.00	$ 135,491.00	$ 7,587,496	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HIGHBAY <200W	UN	80.00	$ 1,069,009.00	$ 85,520,720	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.33	CAJA DE INSPECCION 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTERMICA, CONECTOR BIMETALICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE	UN	4.00	$ 723,631.00	$ 2,894,524	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.34	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COPPER-COPPER 60% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M, SE USARA SOLDADURA EXOTERMICA, SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	2.00	$ 9,310,924.00	$ 18,621,848	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.35	CARCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0.4X0.4M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X0.00X3/16"	ML	15.00	$ 443,690.00	$ 6,655,350	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRAMADO MENSUAL VALOR TOTAL	%	PROGRAMADO ACUMULADO VALOR TOTAL	%	EJECUTADO MENSUAL VALOR TOTAL	%	EJECUTADO ACUMULADO VALOR TOTAL	%
	CONDICIONES CONTRACTUALES												
17.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON ALUMINIO 6MM INCLUYE CONECTOR CONECTORES Y RAPIDA EN KIT PARA PUENTES	ML	476.00	$ 73,037.00	$ 34,765,612	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0.60M INCLUYE BASE Y BORNES	UN	4.00	$ 437,575.00	$ 1,750,300	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 3/4"	ML	12.00	$ 46,761.00	$ 561,132	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
17.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	607.00	$ 59,617.00	$ 36,187,519	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 823,132,419								
18.00	SEÑALETICA												
18.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION EN LAMINA DE POLIESTILENO CALIBRE DE 40 DE 1 MM DE ESPESOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SOBRE VINILO GRADO DE INGENIERIA CON CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	M2	30.76	$ 260,897.00	$ 8,025,192	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 8,025,192								
					$ 31,521,667,845								

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
1.0	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VEREDA EL POZO, CORREGIMIENTO DE VILLANUEVA, CASA												
1.0	DEMOLICIONES												
1.1	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	ML	628.26	$ 15,530.00	$ 9,756,878	-	0.00%	-	0.00%	10,188,145.90	3.07%	10,188,145.90	3.073%
1.2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASTEO Y CARGUE MANUAL	M3	335.36	$ 373,009.00	$ 125,092,298	-	0.00%	-	0.00%	19,269,644.94	5.81%	19,269,644.94	5.812%
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECANICO	M3	187.28	$ 291,376.00	$ 54,568,897	-	0.00%	-	0.00%	3,875,300.80	1.17%	3,875,300.80	1.169%
1.4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	370.50	$ 383,666.00	$ 142,148,253	-	0.00%	-	0.00%	2,301,996.00	0.69%	2,301,996.00	0.694%
					$ 331,566,326								
2.00	PRELIMINARES												
2.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE COMISION, TOPOGRAFIA, CARTERA Y PLANOS	M2	14,462.44	$ 5,438.00	$ 78,646,749	4,884,700.43	0.61%	4,884,700.43	0.61%	-	0.00%	-	0.000%
2.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1,563.67	$ 38,501.00	$ 60,202,859	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
2.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO MANO	M3	10,442.12	$ 63,600.00	$ 664,118,832	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 802,968,440								
3.00	CONCRETOS												
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	49.87	$ 641,273.00	$ 31,980,285	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	234.60	$ 1,224,357.00	$ 287,234,152	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
3.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	20875.47	$ 8,513.00	$ 177,712,876	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
3.4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	859.76	$ 131,092.00	$ 112,707,658	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
3.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18.82	$ 969,616.00	$ 18,248,173	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
3.6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	532.01	$ 9,955.00	$ 5,296,160	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 633,179,304								
4.00	CIMENTACIÓN												
4.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	681.64	$ 128,657.00	$ 87,694,065	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
4.2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	409.98	$ 126,238.00	$ 51,628,817	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
4.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA	M3	102.25	$ 1,469,637.00	$ 150,270,383	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
4.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	170.41	$ 900,037.00	$ 153,375,305	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
4.5	CORRECTOR NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS CONTIENE AGLUTIANTE LIQUIDO 100% ACRILICO DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS	M2	3408.21	$ 53,338.00	$ 181,787,105	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
4.6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR. 2 CAPAS	M2	3,408.21	$ 81,390.00	$ 277,394,212	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
4.7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sentano acrilico pigmentado. Carga al 50% 3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, creando una superficie adecuada para los deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado. EMULSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%	M2	3408.21	$ 228,470.00	$ 778,673,739	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS 1 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	452.42	$ 584,647.00	$ 264,505,996	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 1,945,469,642								
5.00	PISTA DE VELOCIDAD												
5.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	666.42	$ 128,857.00	$ 85,872,882	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
5.2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE " 1/2" SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	399.65	$ 126,238.00	$ 50,476,264	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
5.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO C ON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA	M3	99.96	$ 1,469,637.00	$ 146,904,915	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
5.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	166.60	$ 900,037.00	$ 149,946,164	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
5.5	CORRECTOR NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS CONTIENE AGLUTIANTE LIQUIDO 100% ACRILICO DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS	M2	3332.10	$ 53,338.00	$ 177,727,550	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
5.6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR. 2 CAPAS	M2	3332.10	$ 81,390.00	$ 271,199,619	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
5.7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sentano acrilico pigmentado. Carga al 50% 3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, creando una superficie adecuada para los deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado. EMULSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%	M2	3332.10	$ 228,470.00	$ 761,284,887	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA PISTA DE PATINAJE	ML	238.80	$ 1,163,836.00	$ 277,924,037	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
5.9	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 45 CM DE LARGO Y 5 CM DE ANCHO CADA 45 CMS EN LINEA RECTA Y CADA 10 CM EN CURVA, CON UN ESPESOR DE 5 MM, HECHOS EN SINTETICO ACRILICO CARGADO CON CUARZO	UN	200.00	$ 66,749.00	$ 19,357,210	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 1,940,693,528								
6.00	OBRAS EXTERIORES												
6.1	LOSETA PUDA 0.4X0.4X0.6	M2	2,217.11	$ 225,626.00	$ 500,237,661	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1,160.37	$ 128,857.00	$ 149,521,797	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.3	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE " 1/2" SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	696.22	$ 126,238.00	$ 87,889,420	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.4	GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	4,641.49	$ 116,423.00	$ 540,376,190	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 1,278,025,068								
7.00	RED AGUAS LLUVIAS												
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	ML	235.89	$ 5,522.00	$ 1,302,585	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
7.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN Hm 0 - 2.00 N. INCLUYE CARGUE	M3	226.45	$ 68,679.00	$ 15,552,360	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
7.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	49.07	$ 247,904.00	$ 12,164,649	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
7.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	94.36	$ 119,827.00	$ 11,306,876	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
7.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO MANO	M3	132.10	$ 63,600.00	$ 8,401,560	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 450MM (18" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	235.89	$ 311,111.00	$ 73,367,974	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
7.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6.00	$ 706,501.00	$ 4,239,006	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
7.8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1.00	$ 868,789.00	$ 868,789	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
7.9	CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0.48 A=0.50 ESPECIFICACIONES SEGUN DISEÑO DE PLANOS	ML	596.50	$ 134,644.00	$ 80,434,446	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
7.10	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CAUDAL PARA PISTA DE PATINAJE	ML	596.50	$ 702,956.00	$ 419,313,254	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 626,971,499								
8.00	REDES ELECTRICAS												
8.1	MASTIL METALICO TRONCO CONICO OCTOGONAL DE 16-18M FABRICADO EN SECCIONES EMBONCADAS, BASE REDONDA 600MM EN 3/4 DE ESPESOR, CANASTILLA DE ANCLAJE CON 8 PERNOS DE 7/8" X 1500MM, CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA ALOJAR DE 1 A 6 REFLECTORES, PELDAÑOS DE ASCENSO Y LINEA DE VIDA A PARTIR DE LOS 4M GALVANIZADO EN CALIENTE	UN	7.00	$ 19,532,812.00	$ 136,729,684	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
8.2	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 478,576.00	$ 3,350,032	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
8.3	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGUN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 300 A AJUSTABLE, 3 CT S TIPO BARRA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS INCLUYE MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDICIA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1.00	$ 11,356,112.00	$ 11,356,112	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	37.00	$ 261,587.00	$ 9,678,719	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2+2+8T AWG THHN	ML	433.00	$ 110,981.00	$ 48,054,773	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4+4+8T AWG THHN	ML	307.00	$ 95,228.00	$ 29,234,996	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRAMADO MENSUAL VALOR TOTAL	%	PROGRAMADO ACUMULADO VALOR TOTAL	%	EJECUTADO MENSUAL VALOR TOTAL	%	EJECUTADO ACUMULADO VALOR TOTAL	%
	CONDICIONES CONTRACTUALES												
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X4+4+4T AWG THHN	ML	96.00	$ 75,487.00	$ 7,246,752	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6+6+6T AWG THHN	ML	165.00	$ 79,043.00	$ 13,042,095	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC DE 2"	ML	140.00	$ 115,597.00	$ 16,183,580	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.10	TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON ENCLAVAMIENTO MECANICO CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFASICOS DE 200A A 208 V.	UN	1.00	$ 16,738,866.00	$ 16,738,866	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.11	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	7.00	$ 3,439,120.00	$ 24,073,840	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR 600W - IP65 - K03 - 5.000K - 120/277V - 1.410 LUMEN 0.5MM AR	UN	76.00	$ 5,681,030.00	$ 431,758,280	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 600W - IP65 - K08 - 5.000K - 120/277V - 1.410 LUMEN 0.5MM AR	UN	16.00	$ 4,128,559.00	$ 66,056,944	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.14	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA ILUMINACION PATINAJE QUE CONTIENE TOTALIZADOR DE 300A, BARRAJE PRINCIPAL DE 400A Y ARRANCADORES DIRECTOR CON PROTECCION DE 50A Y CONTACTOR TRIPOLAR DE 50A EN AC3, ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION, EN CORE METALICO DE 100X60X40 CON BANDEJA DOBLE FONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1.00	$ 23,478,564.00	$ 23,478,564	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.15	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	251.54	$ 38,501.00	$ 9,684,542	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.16	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL + RETIRO DE ESCOMBROS H < 1.5M)	M3	157.04	$ 192,100.00	$ 30,167,384	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.17	SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.02	$ 641,273.00	$ 1,295,371	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.18	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.91	$ 1,377,156.00	$ 8,138,992	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION E MAYOR O IGUAL 15 MPA	LTS	275.63	$ 53,399.00	$ 14,718,366	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.20	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 MPa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	2,770.04	$ 8,513.00	$ 23,581,351	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.21	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.16	$ 936,416.00	$ 18,878,147	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.22	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274 INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	10.00	$ 604,401.00	$ 6,044,010	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.23	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	4.00	$ 1,152,233.00	$ 4,608,932	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.24	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	2.00	$ 1,927,585.00	$ 3,855,170	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.25	CANALIZACIÓN 15 DUCTOS DE 2" PVC	ML	5.00	$ 405,772.00	$ 2,028,860	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.26	CANALIZACIÓN 12 DUCTOS DE 2" PVC	ML	33.42	$ 345,633.00	$ 11,551,055	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.27	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 2" PVC	ML	135.11	$ 179,324.00	$ 24,228,466	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.28	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 2" PVC	ML	70.44	$ 159,278.00	$ 11,219,542	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.29	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 2" PVC	ML	77.30	$ 149,255.00	$ 11,537,412	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.30	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	85.78	$ 61,373.00	$ 5,264,576	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.31	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	54.59	$ 34,320.00	$ 1,873,529	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRON ALUMINIO 6MM INCLUYE CONECTOR, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	154.00	$ 73,037.00	$ 11,247,698	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0.60M INCLUYE BASE Y BORNA EX	UN	7.00	$ 437,575.00	$ 3,063,025	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
6.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	39.00	$ 59,617.00	$ 2,325,063	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.000%
					$ 1,042,294,728								
					$ 8,601,163,535								

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO ZONA RURAL AREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	9,706.51	$ 4,349.00	$ 42,213,612
1.2	DEMOLICION MECANICA ANDENES PLACAS SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	33.43	$ 373,009.00	$ 12,469,691
					$ 54,683,303
2.00	EXCAVACION Y RELLENOS				
2.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	42.05	$ 38,501.00	$ 1,618,967
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	238.88	$ 68,679.00	$ 16,412,907
2.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	44.16	$ 247,904.00	$ 10,947,441
					$ 28,979,315
3.00	OBRAS EXTERIORES				
3.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	954.80	$ 98,611.00	$ 94,159,699
3.2	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO SECCIÓN H=0.40 A=0.50 DESARROLLO 1.13 ESPECIFICACIONES SEGUN DISEÑO DE PLANOS	ML	412.20	$ 134,844.00	$ 55,582,697
3.3	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD	ML	412.20	$ 702,956.00	$ 289,758,463
					$ 439,500,859
4.00	FILTROS				
4.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8866.15	$ 14,681.00	$ 130,163,948
4.2	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS SUMINISTRO EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1956.86	$ 143,702.00	$ 281,204,696
					$ 411,368,644
5.00	SUPERFICIE				
5.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	8866.15	$ 4,394.00	$ 38,957,863
5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN	M3	545.95	$ 900,037.00	$ 491,375,200
5.3	PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA EN SITIO CERTIFICADA IAAF SISTEMA BICAPA O SANDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 Y DIN 18035-6, ESPESOR 13 MM CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-2010, 1 CAPA ELÁSTICA DE 10 A 12 MM DE ESB 1 A 4 MM, CAPA DE TAPA POROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM 1 A 4 MM DE COLOR ROJO	M2	7799.35	$ 1,015,468.00	$ 7,919,990,346
5.4	DEMARCACION PISTA	ML	4257.65	$ 21,661.00	$ 92,224,957
					$ 8,542,548,366
6.00	ACCESORIOS				
6.1	BORDILLO ALUMINIO DESMONTABLE CERTIFICADO IAAF	ML	413.42	$ 254,313.00	$ 105,138,080
6.2	OBSTACULO CARRERA CERTIFICADO IAAF	UN	8.00	$ 1,008,887.00	$ 8,071,096
6.3	TACOS DE SALIDA	UN	8.00	$ 560,635.00	$ 4,485,080
					$ 117,694,256
7.00	PLACA EN CONCRETO				
7.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	95.25	$ 969,616.00	$ 92,355,924
7.2	MALLA ELECTROSOLDADA Fy=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3892.26	$ 9,955.00	$ 38,747,445
7.3	SISTEMA MODULAR DEPORTIVO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO TIPO EN RELIA TABLETAS DE 20 CM X 20 CM Y 3.5 A 4 MM	M2	127.26	$ 892,631.00	$ 113,596,221
					$ 244,699,593
8.00	GRAMA SINTETICA				
8.1	RELLENO CON GRAVILLA	M3	167.17	$ 102,613.00	$ 17,153,815
8.2	GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 25MM 11100GR TRAFICO PESADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1,114.49	$ 116,423.00	$ 129,752,269
					$ 146,906,084
					$ 5,586,330,420
19.00	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESCENARIOS DEPORTIVOS.				
19.1	CERTIFICACION RETIE REDES DE MEDIA				$ 3,000,000
19.2	CERTIFICACION E INSPECCION DE TRANSFORMADOR				$ 949,296
19.3	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION				$ 2,975,000
19.4	RETIE USO FINAL				$ 7,735,000
19.5	CERTIFICACION RETILAP				$ 9,044,000
19.6	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA				$ 2,793,954
20.0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 297,493,828
					$ 323,991,048
9.00	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE PATINAJE.				
9.1	RETIE USO FINAL				$ 7,735,000
9.2	CERTIFICACION RETILAP				$ 9,044,000
9.3	PMA				$ 187,776,998
					$ 204,555,998
9.00	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE ATLETISMO.				
9.1	Diagnostico pista de Atletismo IAAF -Identificación de las materias primas IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Inspección visual IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Espesor de la pista EN 1569 -Absorción de impactos y Deformación vertical (12 puntos) EN 14809 y EN 14809 -Deslizamiento (6 puntos) EN 13036-4 -Planimetría de la superficie IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Drenaje IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications				$ 46,400,000
9.2	PMA				$ 187,776,998
					$ 234,176,998
					$ 762,724,044

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)	$ 50,109,216,798
VALOR TOTAL	$ 60,971,940,642

	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	39,255,565		39,255,565		60,092,800		60,892,800	
Prog. Escenarios Deportivos	20,311,140	0.06%	20,311,140	0.06%	22,452,607	0.07%	22,452,007	0.07%
Prog. Pista de Patinaje	16,297,752	0.19%	16,297,752	0.19%	35,635,088	0.40%	35,635,088	0.40%

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
					Prog. Pista de Atletismo	2,646,674	0.02%	2,646,674	0.02%	2,805,105	0.027%	2,805,105	0.027%
					Programado Contrato	39,255,565	0.08%	39,255,565	0.08%	60,892,800	0.12%	60,892,800	0.12%

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REP. LEGAL CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

ESTADO DEL TIEMPO

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

2352

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Código:F006
Versión: 1
Fecha:25/05/2023

PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO: MAYO 2023

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

CONVENCIONES

TS: Tiempo Seco LLV: Llovizna LL: Lluvia

LLF: Lluvia Fuerte

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL TIEMPO EN LA NOCHE QUE AFECTAN LA OBRA

FECHA	OBSERVACIONES
24/05/2023	LLUVIA FUERTE EN LA NOCHE HASTA LA MADRUGADA DEL 25
26/05/2023	LLUVIA FUERTE DESDE LA MADRUGADA DEL 26
30/05/2023	LLUVIA EN LA MADRUGADA
31/05/2023	LLUVIA EN LA MADRUGADA

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HORA	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
07:00 a 07:30																	TS	TS	TS	TS	LL	TS	TS	TS	TS	LL	TS	TS	TS	TS	TS
07:30 a 08:00																	TS	TS	TS	TS	LL	TS	TS	TS	TS	LL	TS	TS	TS	TS	TS
08:00 a 08:30																	TS	TS	TS	TS	LL	TS	TS	TS	TS	LL	TS	TS	TS	TS	TS
08:30 a 09:00																	TS	TS	TS	TS	LL	TS	TS	TS	TS	LL	TS	TS	TS	TS	TS
09:00 a 09:30																	TS	TS	TS	TS	LL	TS	TS	TS	TS	LL	TS	TS	TS	TS	TS
09:30 a 10:00																	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	LL	TS	TS	TS	TS	TS
10:00 a 10:30																	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	LL	TS	TS	TS	TS	TS
10:30 a 11:00																	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
11:00 a 11:30																	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
11:30 a 12:00																	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
12:00 a 12:30																	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	LL
12:30 a 01:00																	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	LL
01:00 a 01:30																	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	LL
01:30 a 02:00																	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	LL
02:00 a 02:30																	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
02:30 a 03:00																	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
03:00 a 03:30																	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS
03:30 a 04:00																	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS
04:00 a 04:30																	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS
04:30 a 05:00																	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS

Vo.Bo.	Elaboró:	Observaciones:
ING. YEISON E GOMEZ G	ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
Director de obra	Residente de obra	
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	

2353

CERTIFICADOS DE CALIBRACION EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

2354

No. Certificado: 2315

Fecha: 25/03/2023

ACEG Ingeniería S.A.S
NIT: 901.200.504-7

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504 - 7

Certificado de Ajuste

Datos del Cliente			
Clientes	*Juan Antonio Barbosa*	NIT/CC	*17.118.296*
Dirección	*Calle 17 # 37 D – 39 / B. La Esperanza*	Ciudad	*Villavicencio – Meta*
Teléfono	*313 430 95 98*	Fecha Expiración	*25/09/2023*

Datos del Equipo			
Equipo	*Estación Total*	Marca	*Tipo Topcon*
Modelo	*DTM – 624R*	Serial	*511337*
Aumentos	*30X*	Precisión	*2"*

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4 estipulada por el fabricante a continuación se describe los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica	Ajuste	Reparación	Mantenimiento	Cambio de Piezas	No Aplica
Base Nivelante			X		
Frenos y Pasolento Hz y Vt			X		
Teclados y Contactos			X		
Eje Hz y Vt			X		
Sistema de Enfoque			X		
Verticalidad			X		

Inspección Electrónica	Ajuste	Reparación	Mantenimiento	Cambio de Piezas	No Aplica
Distanciómetro			X		
Nonios Hz y Vt			X		
Puntero Láser			X		
Compensador Electrónico			X		
Plomada Laser			X		
Sensores Hz y Vt			X		

2355

No. Certificado: 2315

Fecha: 25/03/2023

ACEG Ingeniería S.A.S
NIT: 901 200 504-7

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504 - 7

Certificado de Ajuste

Ajuste Angular y Distancia

Patrón	Fase 1	Fase 2	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	*90.0000*	*269°54'52"*	*+/-0.0002*	*270.0000*	*0.0000*
Horizontal	*0.0000*	*179°59'54"*	*+/-0.002*	*180.0000*	*0.0000*
Distancia	*8.494*	*8.495*	*+/-0.001*	*8.494*	*0.000*

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo con los procedimientos dados por el fabricante.

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo.

CRISTIAN PULIDO C.
Técnico Laboratorio

2356

No. Certificado: 2316

Fecha: 25/03/2023

ACEG Ingeniería S.A.S
NIT: 901 200 504-7

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504-7

Certificado de Ajuste

Datos del Cliente			
Clientes	*Juan Antonio Barbosa*	**NIT/C.C**	*17.118.296*
Dirección	*Calle 17 # 37 D – 39 / B. La Esperanza*	**Ciudad**	*Villavicencio – Meta*
Teléfono	*313 430 95 98*	**Fecha expiración**	*25/09/2023*

Datos del Equipo			
Equipo	*Nivel Automático*	**Marca**	*Ruide*
Modelo	*RL – C32*	**Serial**	*X205516*
Aumentos	*32X*	**Precisión**	*1,0 mm X Km Doble Nivelación*

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4 estipulada por el fabricante, a continuación, se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Preliminar	Ajuste	Reparación	Mantenimiento	Cambio de Pieza	No Aplica
Base Nivelante			*X*		
Movimientos Laterales-Aumento			*X*		
Compensador Automático			*X*		
Óptica-Lentes-Oculares			*X*		
Niveles			*X*		

Patrón	Valor Leído	Error Medido	Rango	Resultado
Error Detectado	*90°00'00"*	*0,01"*	*1,5mm*	*Operativo*
Error Después de Ajustado	*90°00'00"*	*0,00"*	*1,5mm*	*Operativo*

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo con los procedimientos dados por el fabricante.

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.

El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo.

CRISTIAN PULIDO C.
Técnico Laboratorio

ACEG INGENIERÍA S.A.S.
Celular: 323 203 33 02 / 311 226 34 38 / 313 453 35 45
E- Mail: acegingenieriasas@gmail.com / Web: www.acegingenieria.com
Calle 16 # 37 B - 46 Villavicencio, Meta / Carrera 92 # 45 - 32 Cali, Valle del Cauca

2357

PLANOS LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE EDIFICACIONES EXISTENTES

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

2338

CONTRATO DE OBRA

IDERMETA


CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

106 DE 2023

OBJETO:

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA EN

DEPORTIVO VILLA OLIMPICA EN

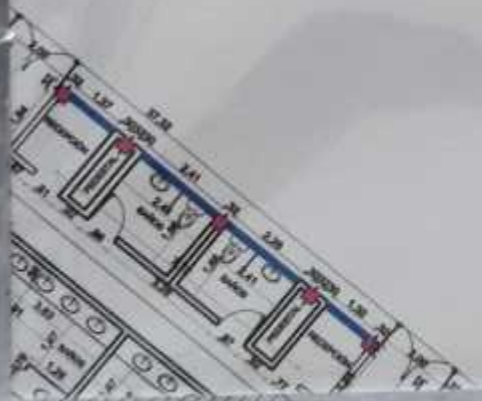

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META

PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

INFORME DE OBRA

Código: GES FO-178

Vigencia: 08/11/2022

Versión: 01

2365

2359

CONTRATO DE OBRA:


IDERMETA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

106 DE 2023

OBJETO:

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA EN

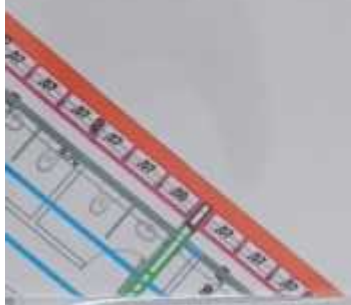

2360

CONTRATO DE OBRA

IDERMETA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

106 DE 2023

OBJETO:

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA EN

DEPORTIVO VILLA OLIMPICA EN

IDERMETA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META

PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

INFORME DE OBRA

Código: GES-FO-126

Vigencia: 09/11/2022

Versión: 01

2365

2361

CONTRATO DE OBRA:

IDERMETA

CONSORCIO ESCENARIOS
DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

106 DE 2023

OBJETO:

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA EN



IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

2365

2362

CONTRATO DE OBRA

IDERMETA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

106 DE 2023

OBJETO

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA EN

PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA EN

9,04

7,58

,75

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
INFORME DE OBRA	Versión: 01

2363

2363

CONTRATO DE OBRA

IDERMETA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

106 DE 2023

OBJETO:

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA EN

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

2365

2361

CONTRATO DE OBRA

IDERMETA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

106 DE 2023

OBJETO

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA EN

2365

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -SECTOR ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.118.296

BARBOSA MAYORGA
APELLIDOS

JUAN ANTONIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-JUN-1945
VILLETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO


22-JUL-1966 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

INDICE DERECHO

A-5200100-89142561-M-0017118296-20060307 03484 00066O 02 1912405B0

2367

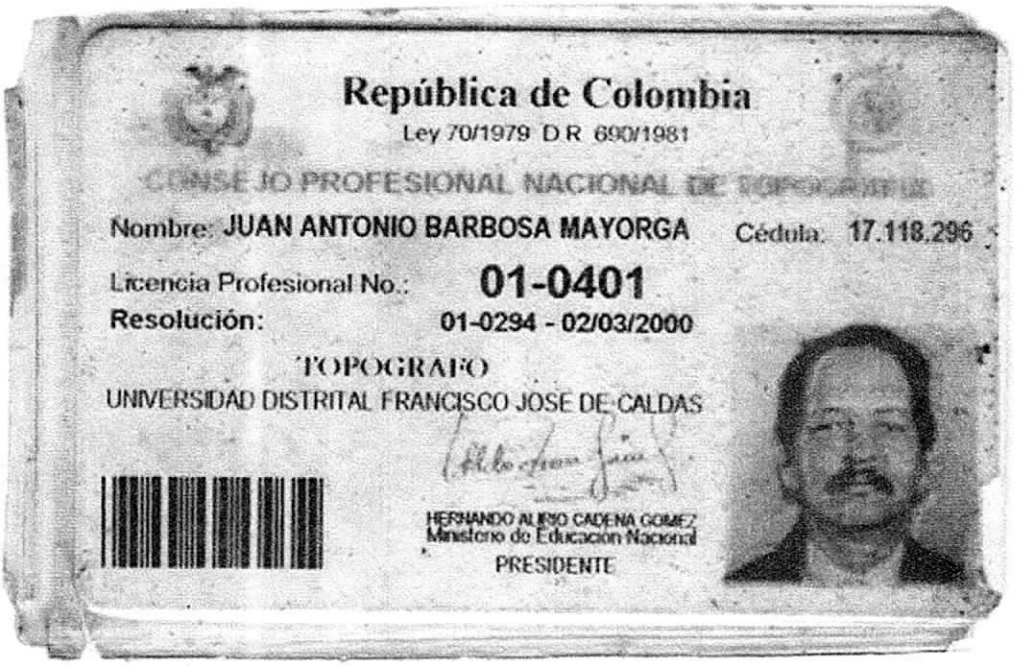

República de Colombia

Ley 70/1979 D.R 690/1981

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: JUAN ANTONIO BARBOSA MAYORGA Cédula: 17.118.296

Licencia Profesional No.: 01-0401

Resolución: 01-0294 - 02/03/2000

TOPOGRAFO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

HERNANDO ALIRIO CADENA GOMEZ
Ministerio de Educación Nacional
PRESIDENTE

2368

República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA
Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 370743/2023

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **JUAN ANTONIO BARBOSA MAYORGA** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 17118296** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TOPÓGRAFO** de la Institución de Educación Superior **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**, bajo la Licencia Profesional **No. 01-0401** con fecha de expedición del **13 de Agosto de 1984.**

Que el(la) Señor(a) **JUAN ANTONIO BARBOSA MAYORGA**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-0401** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **2 días del mes de Marzo de 2023.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

LEVANTAMIENTO REDES HIDROSANITARIAS

2369

PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
3	949597.085	1050866.763	420.600	PL
4	949654.960	1050834.422	420.850	PS
5	949670.279	1050849.676	420.760	PS
6	949639.740	1050926.604	419.240	PS
7	949628.843	1050955.876	418.630	PS
8	949609.249	1050940.140	419.200	PS
9	949583.385	1050935.874	419.190	PS
10	949646.340	1050964.702	418.430	PS
11	949588.728	1050921.473	419.580	PZ
12	949601.254	1050941.236	418.650	PZ
13	949593.451	1050997.118	417.460	PZ
14	949531.668	1050928.843	419.180	PZ
15	949536.238	1050928.903	419.300	Gradas
16	949535.453	1050932.669	419.340	Gradas
17	949547.775	1050934.821	419.380	Gradas
18	949549.982	1050935.175	419.390	Gradas
19	949562.276	1050937.328	419.410	Gradas
20	949562.821	1050933.534	419.290	Gradas
21	949621.786	1050935.544	419.381	9036
22	949587.610	1050949.653	418.303	Muro
23	949583.392	1050935.872	419.187	Pz
24	949582.254	1050933.744	419.381	Muro
25	949592.572	1050874.848	419.415	Muro
26	949592.495	1050874.857	419.452	Muro
27	949593.454	1050869.309	420.867	Muro
28	949600.910	1050868.691	420.630	Cerramiento
29	949614.913	1050867.361	420.638	Cerramiento
30	949609.264	1050940.162	419.195	Pz
31	949592.968	1050999.307	417.469	Pz
32	949591.182	1051011.024	417.205	Pz
33	949603.517	1051027.268	416.974	Pz
34	949597.404	1051059.673	416.560	Pz
35	949600.354	1051079.687	416.358	Pz
36	949601.046	1051080.573	415.166	Salida
37	949603.000	1051082.421	415.189	Salida
38	949628.861	1050955.897	418.638	Pz
39	949639.768	1050926.621	419.242	Pz
40	949608.502	1051051.382	416.860	SARD
41	949601.765	1051050.178	417.051	SARD
42	949604.377	1051035.131	417.340	CAJA
43	949604.548	1051034.227	417.365	CAJA
44	949603.648	1051034.067	417.366	CAJA
45	949609.583	1051005.281	417.939	CAJA
46	949609.741	1051004.396	417.953	CAJA
47	949634.521	1050861.444	420.819	SARD
48	949655.880	1050840.684	420.877	TUBO

LEVANTAMIENTO REDES HIDROSANITARIAS

2370

PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
49	949655.006	1050844.811	420.896	TUBO
50	949615.104	1050972.175	418.645	CAJA
51	949615.253	1050971.289	418.641	CAJA
52	949619.670	1050945.405	419.172	CAJA
53	949619.870	1050944.540	419.190	CAJA
54	949624.856	1050915.730	419.766	CAJA
55	949625.040	1050914.861	419.758	CAJA
56	949625.050	1050914.859	419.758	CAJA
57	949630.202	1050885.263	420.385	CAJA
58	949630.332	1050884.400	420.379	CAJA
59	949632.748	1050863.778	420.795	CAJA
60	949632.496	1050862.773	420.815	CAJA
61	949639.034	1050862.418	420.773	CAJA
62	949639.085	1050862.409	420.773	SARD
63	949601.826	1051080.132	416.190	MURO
64	949601.871	1051080.171	416.190	MURO
65	949603.970	1051081.493	416.520	MURO
66	949603.706	1051081.569	416.150	MURO
67	949603.533	1051082.779	416.190	MURO
68	949602.412	1051082.513	416.190	MURO
69	949602.655	1051081.785	416.161	MURO
70	949602.595	1051081.688	416.056	MURO
71	949601.250	1051081.356	416.085	MURO
72	949600.946	1051080.836	416.118	MURO

JUAN ANTONIO BARBOSA MAYORGA
TOPOGRAFO
MP: 01-0401 C.P.N.T.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
INFORME DE OBRA	Versión: 01

2382

2371

CONTRATO DE OBRA

IDERMETA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

106 DE 2023

OBJETO:

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA EN

AREA: 114.7

2372

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -SECTOR PISTA DE PATINAJE

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
1	949533.996	1050934.385	419.401	D-5BINT
2	949555.914	1050943.181	418.691	PARAMENTO
3	949562.551	1050938.314	419.611	ARBOL
4	949562.445	1050940.823	418.621	CUNETA
5	949562.624	1050940.424	418.641	CUNETA
6	949562.531	1050940.749	418.231	FONDO
7	949562.607	1050940.523	418.231	FONDO
8	949555.537	1050938.704	418.641	CUNETA
9	949555.458	1050939.119	418.641	CUNETA
10	949555.46	1050939.079	418.291	FONDO
11	949555.553	1050938.765	418.291	FONDO
12	949554.49	1050938.901	418.651	ANDEN
13	949553.98	1050940.599	418.641	ANDEN
14	949553.5	1050942.581	418.651	ANDEN
15	949548.838	1050936.018	419.611	ARBOL
16	949538.777	1050933.969	419.581	ARBOL
17	949546.535	1050930.423	419.851	ARBOL
18	949536.294	1050928.652	420.011	ARBOL
19	949547.983	1050938.204	419.021	CAJA
20	949534.102	1050929.31	419.851	POZO
21	949471.158	1050915.308	419.631	MALLA FUTBOL
22	949545.924	1050928.696	419.481	CUNETA
23	949545.979	1050928.479	419.481	CUNETA
24	949545.938	1050928.497	419.161	FONDO
25	949545.897	1050928.654	419.171	FONDO
26	949531.514	1050926.191	419.561	CUNETA
27	949531.136	1050925.864	419.631	CUNETA
28	949531.134	1050925.894	419.301	FONDO
29	949531.419	1050926.114	419.321	FONDO
30	949531.05	1050926.379	419.621	CUNETA
31	949531.075	1050926.3	419.251	B TUBO 10P
32	949531.062	1050926.059	419.351	FONDO
33	949531.086	1050926	419.631	CUNETA
34	949523.55	1050924.689	419.651	CUNETA
35	949523.586	1050925.033	419.651	CUNETA
36	949523.597	1050924.733	419.351	FONDO
37	949523.536	1050925.029	419.361	FONDO
38	949509.063	1050922.129	419.691	CUNETA
39	949508.958	1050922.492	419.691	CUNETA
40	949508.934	1050922.12	419.371	FONDO
41	949508.891	1050922.448	419.371	FONDO
42	949500.073	1050920.535	419.611	CUNETA

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
43	949499.958	1050920.888	419.621	CUNETA
44	949500.011	1050920.561	419.311	FONDO
45	949499.968	1050920.889	419.301	FONDO
46	949485.404	1050918.002	419.501	CUNETA
47	949485.341	1050918.338	419.501	CUNETA
48	949485.354	1050918.008	419.291	FONDO
49	949485.361	1050918.33	419.291	FONDO
50	949471.075	1050915.492	419.411	CUNETA
51	949471	1050915.848	419.441	CUNETA
52	949471.033	1050915.52	419.121	FONDO
53	949470.981	1050915.827	419.151	FONDO
54	949469.924	1050915.031	419.701	POZO
55	949547.698	1050977.831	418.731	PARAMENTO
56	949542.243	1050976.566	418.661	PARAMENTO
57	949536.316	1051001.161	418.321	PARAMENTO
58	949536.038	1051001.122	418.321	PARAMENTO
59	949535.169	1051004.359	418.351	PARAMENTO
60	949534.931	1051004.322	418.331	PARAMENTO
61	949534.846	1051004.677	418.331	PARAMENTO
62	949544.515	1050969.337	418.641	CUNETA
63	949544.708	1050969.441	418.641	CUNETA
64	949544.697	1050969.46	418.391	FONDO
65	949544.523	1050969.358	418.401	FONDO
66	949546.534	1050966.281	418.661	CUNETA
67	949546.763	1050966.437	418.661	CUNETA
68	949546.725	1050966.415	418.361	FONDO
69	949546.579	1050966.344	418.361	FONDO
70	949547.819	1050963.965	418.661	CUNETA
71	949547.985	1050964.167	418.671	CUNETA
72	949547.936	1050964.154	418.351	FONDO
73	949547.803	1050964.044	418.371	FONDO
74	949548.829	1050962.142	418.641	CUNETA
75	949548.622	1050961.947	418.641	CUNETA
76	949548.629	1050961.997	418.361	FONDO
77	949548.791	1050961.969	418.351	FONDO
78	949550.25	1050955.044	418.631	CUNETA
79	949550.491	1050955.171	418.631	CUNETA
80	949550.495	1050955.121	418.351	FONDO
81	949550.279	1050955.056	418.351	FONDO
82	949553.011	1050944.702	418.631	CUNETA
83	949552.694	1050944.649	418.631	CUNETA
84	949552.959	1050944.728	418.301	FONDO
85	949552.788	1050944.726	418.351	FONDO

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
86	949549.958	1050939.495	418.891	ANDEN
87	949549.225	1050941.358	418.891	ANDEN
88	949538.987	1050936.409	419.171	ANDEN
89	949538.349	1050938.349	419.171	ANDEN
90	949530.276	1050930.545	419.551	ANDEN
91	949529.975	1050930.413	419.551	ANDEN
92	949513.887	1050926.678	419.641	ANDEN
93	949497.812	1050922.893	419.661	ANDEN
94	949484.492	1050919.722	419.631	ANDEN
95	949470.841	1050916.539	419.681	ANDEN
96	949485.43	1050920.059	419.661	GRADAS
97	949485.68	1050918.503	419.611	GRADAS
98	949500.193	1050922.679	419.671	GRADAS
99	949500.487	1050921.066	419.621	GRADAS
100	949500.077	1050923.473	419.661	GRADAS
101	949530.378	1050928.808	419.611	GRADAS
102	949530.736	1050926.427	419.661	GRADAS
103	949544.774	1050970.077	418.651	CAJA
104	949419.776	1050923.68	419.431	B-VIA PP
105	949426.127	1050919.745	419.431	B-VIA PP
106	949429.307	1050924.991	419.311	B-VIA PP
107	949435.846	1050920.959	419.301	B-VIA PP
108	949433.34	1050915.239	419.431	B-VIA PP
109	949436.223	1050913.437	419.471	B-VIA PP
110	949438.14	1050919.977	419.301	B-VIA PP
111	949440.466	1050919.689	419.301	B-VIA PP
112	949441.551	1050913.52	419.531	B-VIA PP
113	949449.496	1050913.577	419.581	B-VIA PP
114	949447.2	1050919.861	419.281	B-VIA PP
115	949448.57	1050919.907	419.271	B-VIA PP
116	949449.766	1050920.152	419.261	B-VIA PP
117	949454.741	1050921.122	419.281	B-VIA PP
118	949457.569	1050915.527	419.511	B-VIA PP
119	949464.058	1050917.055	419.451	B-VIA PP
120	949463.144	1050923.086	419.301	B-VIA PP
121	949469.594	1050924.591	419.291	B-VIA PP
122	949471.124	1050918.644	419.381	B-VIA PP
123	949476.99	1050920.058	419.331	B-VIA PP
124	949475.766	1050926.067	419.291	B-VIA PP
125	949482.569	1050927.687	419.301	B-VIA PP
126	949484.089	1050921.739	419.331	B-VIA PP
127	949490.391	1050923.224	419.331	B-VIA PP
128	949489.255	1050929.259	419.301	B-VIA PP

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
129	949495.824	1050930.803	419.291	B-VIA PP
130	949497.729	1050924.932	419.331	B-VIA PP
131	949504.159	1050926.446	419.331	B-VIA PP
132	949502.834	1050932.468	419.291	B-VIA PP
133	949509.282	1050934.003	419.291	B-VIA PP
134	949510.55	1050927.947	419.321	B-VIA PP
135	949516.998	1050929.482	419.331	B-VIA PP
136	949515.861	1050935.538	419.291	B-VIA PP
137	949522.577	1050937.122	419.301	B-VIA PP
138	949524.286	1050931.197	419.331	B-VIA PP
139	949529.108	1050932.337	419.341	B-VIA PP
140	949529.791	1050932.606	419.351	B-VIA PP
141	949529.463	1050932.423	419.351	B-VIA PP
142	949525.151	1050937.724	419.301	B-VIA PP
143	949528.362	1050939.102	419.291	B-VIA PP
144	949526.761	1050938.208	419.301	B-VIA PP
145	949536.809	1050937.449	419.331	B-VIA PP
146	949533.671	1050942.733	419.301	B-VIA PP
147	949537.422	1050945.281	419.311	B-VIA PP
148	949541.104	1050940.377	419.341	B-VIA PP
149	949542.854	1050941.733	419.331	B-VIA PP
150	949544.462	1050943.39	419.331	B-VIA PP
151	949546.364	1050945.989	419.351	B-VIA PP
152	949547.612	1050948.343	419.341	B-VIA PP
153	949548.38	1050950.401	419.341	B-VIA PP
154	949548.888	1050952.171	419.331	B-VIA PP
155	949549.255	1050955.074	419.341	B-VIA PP
156	949539.372	1050946.922	419.311	B-VIA PP
157	949541.068	1050949.036	419.321	B-VIA PP
158	949541.941	1050950.591	419.301	B-VIA PP
159	949542.951	1050954.05	419.291	B-VIA PP
160	949543.124	1050956.588	419.291	B-VIA PP
161	949542.699	1050959.356	419.291	B-VIA PP
162	949541.88	1050961.604	419.301	B-VIA PP
163	949540.819	1050963.434	419.281	B-VIA PP
164	949535.867	1050970.715	419.291	B-VIA PP
165	949549.275	1050956.649	419.331	B-VIA PP
166	949549.053	1050958.959	419.331	B-VIA PP
167	949548.593	1050961.072	419.351	B-VIA PP
168	949547.921	1050963.09	419.341	B-VIA PP
169	949546.033	1050966.707	419.341	B-VIA PP
170	949540.69	1050974.552	419.341	B-VIA PP
171	949535.005	1050972.138	419.301	B-VIA PP

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
172	949534.121	1050974.171	419.311	B-VIA PP
173	949532.304	1050981.482	419.301	B-VIA PP
174	949540.356	1050975.17	419.331	B-VIA PP
175	949540.589	1050974.715	419.331	B-VIA PP
176	949539.917	1050976.423	419.331	B-VIA PP
177	949538.036	1050984.37	419.341	B-VIA PP
178	949537.884	1050984.831	419.341	B-VIA PP
179	949537.206	1050986.628	419.351	B-VIA PP
180	949536.271	1050988.387	419.351	B-VIA PP
181	949535.475	1050989.584	419.351	B-VIA PP
182	949534.08	1050991.17	419.351	B-VIA PP
183	949533.395	1050991.794	419.351	B-VIA PP
184	949531.974	1050992.907	419.351	B-VIA PP
185	949529.957	1050994.068	419.351	B-VIA PP
186	949528.193	1050994.777	419.341	B-VIA PP
187	949526.545	1050995.262	419.351	B-VIA PP
188	949525.551	1050995.433	419.351	B-VIA PP
189	949531.889	1050983.257	419.321	B-VIA PP
190	949531.143	1050984.889	419.321	B-VIA PP
191	949530.681	1050985.618	419.321	B-VIA PP
192	949529.441	1050987.005	419.331	B-VIA PP
193	949528.011	1050988.088	419.321	B-VIA PP
194	949526.114	1050988.987	419.321	B-VIA PP
195	949524.789	1050989.295	419.321	B-VIA PP
196	949509.217	1050942.79	419.191	SEND PP
197	949509.101	1050944.296	419.331	SEND PP
198	949516.072	1050943.672	419.261	SEND PP
199	949516.471	1050942.127	419.181	SEND PP
200	949518.218	1050943.663	419.241	SEND PP
201	949518.746	1050942.286	419.221	SEND PP
202	949520.97	1050944.157	419.181	SEND PP
203	949521.5	1050942.75	419.161	SEND PP
204	949522.651	1050944.776	419.181	SEND PP
205	949523.306	1050943.438	419.161	SEND PP
206	949524.227	1050945.749	419.161	SEND PP
207	949525.016	1050944.501	419.191	SEND PP
208	949525.585	1050946.816	419.161	SEND PP
209	949526.594	1050945.724	419.191	SEND PP
210	949527.118	1050948.257	419.171	SEND PP
211	949528.213	1050947.231	419.171	SEND PP
212	949528.248	1050949.59	419.181	SEND PP
213	949529.422	1050948.71	419.171	SEND PP
214	949529.33	1050951.159	419.191	SEND PP

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
215	949530.598	1050950.386	419.151	SEND PP
216	949530.193	1050952.583	419.181	SEND PP
217	949531.524	1050951.895	419.181	SEND PP
218	949531.035	1050954.146	419.181	SEND PP
219	949532.377	1050953.599	419.181	SEND PP
220	949532.186	1050957.465	419.131	SEND PP
221	949533.565	1050957.09	419.131	SEND PP
222	949534.248	1050960.647	419.111	SEND PP
223	949532.752	1050960.973	419.101	SEND PP
224	949532.916	1050962.628	419.091	SEND PP
225	949534.371	1050962.47	419.091	SEND PP
226	949532.543	1050966.081	419.091	SEND PP
227	949533.978	1050966.352	419.071	SEND PP
228	949531.616	1050969.575	419.061	SEND PP
229	949533.053	1050969.956	419.071	SEND PP
230	949530.23	1050972.755	419.101	SEND PP
231	949531.486	1050973.435	419.071	SEND PP
232	949528.329	1050975.559	419.111	SEND PP
233	949529.453	1050976.54	419.071	SEND PP
234	949509.488	1050944.493	419.521	MALLA PP
235	949515.936	1050946.039	419.991	MALLA PP
236	949520.557	1050947.897	420.101	MALLA PP
237	949523.249	1050949.82	420.101	MALLA PP
238	949525.526	1050952.235	420.111	MALLA PP
239	949527.921	1050956.534	420.121	MALLA PP
240	949529.014	1050961.372	420.141	MALLA PP
241	949528.912	1050964.683	420.101	MALLA PP
242	949527.517	1050969.708	420.111	MALLA PP
243	949524.809	1050974.009	420.081	MALLA PP
244	949520.957	1050977.197	419.931	MALLA PP
245	949517.915	1050978.677	419.791	MALLA PP
246	949513.041	1050979.709	419.521	MALLA PP
247	949509.751	1050979.598	419.391	MALLA PP
248	949508.126	1050979.324	419.321	MALLA PP
249	949500.089	1050977.436	419.221	MALLA PP
250	949490.355	1050975.149	419.221	MALLA PP
251	949479.085	1050972.463	419.211	MALLA PP
252	949469.629	1050970.226	419.221	MALLA PP
253	949458.418	1050967.564	419.201	MALLA PP
254	949452.028	1050966.043	419.381	MALLA PP
255	949443.952	1050964.133	419.981	MALLA PP
256	949439.241	1050962.268	420.071	MALLA PP
257	949435.915	1050959.669	420.071	MALLA PP

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
258	949433.17	1050956.359	420.101	MALLA PP
259	949431.546	1050952.936	420.091	MALLA PP
260	949430.817	1050949.607	420.101	MALLA PP
261	949430.697	1050946.461	420.111	MALLA PP
262	949431.098	1050943.893	420.081	MALLA PP
263	949432.102	1050940.585	420.101	MALLA PP
264	949434.025	1050937.322	420.081	MALLA PP
265	949436.867	1050934.403	419.991	MALLA PP
266	949440.128	1050932.216	419.861	MALLA PP
267	949443.79	1050930.88	419.671	MALLA PP
268	949447.775	1050930.387	419.421	MALLA PP
269	949451.71	1050930.874	419.341	MALLA PP
270	949456.654	1050931.993	419.201	MALLA PP
271	949473.941	1050936.074	419.201	MALLA PP
272	949482.253	1050938.041	419.201	MALLA PP
273	949495.91	1050941.285	419.211	MALLA PP
274	949509.671	1050939.895	419.231	GRADAS PP
275	949497.451	1050937.032	419.261	GRADAS
276	949487.424	1050934.644	419.211	GRADAS
277	949480.074	1050932.955	419.201	GRADAS
278	949473.854	1050931.456	419.261	GRADAS
279	949459.188	1050928.031	419.291	GRADAS
280	949458.559	1050930.854	419.201	GRADAS
281	949473.153	1050934.304	419.171	GRADAS
282	949479.406	1050935.766	419.191	GRADAS
283	949486.763	1050937.485	419.191	GRADAS
284	949496.751	1050939.87	419.141	GRADAS
285	949508.98	1050942.744	419.231	GRADAS
286	949496.163	1050941.242	419.201	SEND PP
287	949496.113	1050939.675	419.141	SEND PP
288	949478.071	1050935.351	419.151	SEND PP
289	949475.739	1050934.877	419.161	SEND PP
290	949479.84	1050927.716	419.271	SEND PP
291	949477.505	1050927.141	419.271	SEND PP
292	949453.481	1050929.645	419.271	SEND PP
293	949452.987	1050931.104	419.261	SEND PP
294	949449.328	1050928.251	419.261	SEND PP
295	949448.949	1050929.648	419.231	SEND PP
296	949445.992	1050927.225	419.271	SEND PP
297	949445.267	1050928.557	419.251	SEND PP
298	949441.822	1050926.511	419.241	SEND PP
299	949442.004	1050928.048	419.241	SEND PP
300	949438.742	1050927.398	419.231	SEND PP

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
301	949439.36	1050928.734	419.221	SEND PP
302	949434.761	1050929.704	419.211	SEND PP
303	949435.65	1050930.89	419.211	SEND PP
304	949433.293	1050933.04	419.251	SEND PP
305	949432.157	1050932.098	419.221	SEND PP
306	949431.148	1050935.476	419.241	SEND PP
307	949429.802	1050934.8	419.231	SEND PP
308	949429.442	1050938.494	419.311	SEND PP
309	949427.906	1050938.095	419.221	SEND PP
310	949428.306	1050941.391	419.281	SEND PP
311	949426.687	1050941.328	419.231	SEND PP
312	949427.391	1050946.861	419.291	SEND PP
313	949425.882	1050946.945	419.241	SEND PP
314	949427.511	1050949.716	419.241	SEND PP
315	949426.088	1050950.137	419.241	SEND PP
316	949428.184	1050953.412	419.241	SEND PP
317	949426.856	1050954.061	419.221	SEND PP
318	949429.556	1050956.716	419.211	SEND PP
319	949428.294	1050957.42	419.281	SEND PP
320	949432.188	1050960.5	419.291	SEND PP
321	949430.626	1050961.042	419.281	SEND PP
322	949434.493	1050962.787	419.281	SEND PP
323	949433.248	1050963.682	419.291	SEND PP
324	949436.955	1050964.704	419.251	SEND PP
325	949436.117	1050965.938	419.251	SEND PP
326	949439.06	1050965.854	419.261	SEND PP
327	949438.258	1050967.131	419.241	SEND PP
328	949442.298	1050966.994	419.251	SEND PP
329	949441.73	1050968.377	419.221	SEND PP
330	949445.576	1050967.855	419.221	SEND PP
331	949444.757	1050969.241	419.171	SEND PP
332	949446.855	1050969.339	419.161	SEND PP
333	949448.645	1050967.69	419.161	SEND PP
334	949449.097	1050969.095	419.161	SEND PP
335	949456.293	1050968.698	419.181	SEND PP
336	949456.382	1050967.14	419.201	SEND PP
337	949466.305	1050971.015	419.151	SEND PP
338	949466.806	1050969.596	419.201	SEND PP
339	949465.533	1050973.878	419.161	SEND PP
340	949466.531	1050974.078	419.161	SEND PP
341	949468.925	1050974.677	419.151	SEND PP
342	949470.063	1050974.897	419.151	SEND PP
343	949467.751	1050979.988	419.191	SEND PP

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
344	949465.255	1050980.404	419.181	SEND PP
345	949463.648	1050987.449	419.251	SEND PP
346	949465.99	1050987.934	419.261	SEND PP
347	949470.654	1050972.042	419.141	SEND PP
348	949471.507	1050970.748	419.191	SEND PP
349	949483.917	1050975.178	419.131	SEND PP
350	949484.446	1050973.782	419.201	SEND PP
351	949502.451	1050978.053	419.201	SEND PP
352	949501.81	1050979.472	419.191	SEND PP
353	949506.77	1050981.213	419.151	SEND PP
354	949506.231	1050982.619	419.151	SEND PP
355	949508.663	1050983.522	419.141	SEND PP
356	949509.212	1050982.137	419.131	SEND PP
357	949513.346	1050982.798	419.151	SEND PP
358	949513.035	1050984.229	419.161	SEND PP
359	949515.93	1050984.393	419.131	SEND PP
360	949516.387	1050982.891	419.131	SEND PP
361	949518.67	1050982.5	419.111	SEND PP
362	949519.69	1050983.674	419.081	SEND PP
363	949518.537	1050982.53	419.131	SEND PP
364	949518.883	1050984.028	419.101	SEND PP
365	949521.793	1050980.995	419.121	SEND PP
366	949522.588	1050982.233	419.101	SEND PP
367	949524.525	1050979.342	419.131	SEND PP
368	949525.241	1050980.575	419.091	SEND PP
369	949526.781	1050977.475	419.091	SEND PP
370	949527.739	1050978.535	419.081	SEND PP
371	949516.933	1050942.41	419.251	LAMPARA PP
372	949487.76	1050935.289	419.201	LAMPARA PP
373	949458.582	1050928.66	419.221	LAMPARA PP
374	949458.209	1050929.406	419.201	CAJA
375	949449.349	1050968.792	419.171	LAMPARA PP
376	949478.566	1050975.865	419.061	LAMPARA PP
377	949506.209	1050982.216	419.181	LAMPARA PP
378	949523.247	1050989.407	419.311	B-VIA PP
379	949520.102	1050995.231	419.331	B-VIA PP
380	949517.77	1050988.181	419.291	B-VIA PP
381	949515.846	1050994.311	419.331	B-VIA PP
382	949507.582	1050985.991	419.271	B-VIA PP
383	949505.695	1050991.964	419.341	B-VIA PP
384	949504.896	1050985.633	419.301	B-VIA PP
385	949503.949	1050991.852	419.331	B-VIA PP
386	949502.807	1050985.546	419.251	B-VIA PP

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
387	949503.143	1050991.906	419.331	B-VIA PP
388	949499.9	1050986.124	419.251	B-VIA PP
389	949502.369	1050991.931	419.331	B-VIA PP
390	949483.735	1050991.054	419.311	B-VIA PP
391	949485.206	1050997.092	419.351	B-VIA PP
392	949481.903	1050991.447	419.311	B-VIA PP
393	949483.231	1050997.515	419.341	B-VIA PP
394	949479.743	1050991.376	419.311	B-VIA PP
395	949465.936	1050988.552	419.311	B-VIA PP
396	949450.443	1050985.339	419.291	B-VIA PP
397	949480.736	1050997.641	419.331	B-VIA PP
398	949479.693	1050997.648	419.331	B-VIA PP
399	949465.129	1050994.771	419.331	B-VIA PP
400	949456.603	1050992.979	419.331	B-VIA PP
401	949435.537	1050988.623	419.321	B-VIA PP
402	949443.037	1050990.162	419.341	B-VIA PP
403	949434.481	1050982.103	419.301	B-VIA PP
404	949429.384	1050986.728	419.321	B-VIA PP
405	949427.453	1050985.54	419.331	B-VIA PP
406	949431.518	1050980.893	419.291	B-VIA PP
407	949421.311	1050973.5	419.301	B-VIA PP
408	949415.449	1050976.888	419.341	B-VIA PP
409	949406.644	1050962.935	419.311	B-VIA PP
410	949405.506	1050969.584	419.341	B-VIA PP
411	949397.3	1050963.675	419.331	B-VIA PP
412	949392.866	1050959.089	419.461	B-VIA PP
413	949397.244	1050963.621	419.321	B-VIA PP
414	949502.016	1050987.105	419.311	D-7INT
415	949465.879	1050988.518	419.311	D-7A INT
416	949404.461	1050960.047	419.281	B-VIA PP
417	949396.066	1050962.546	419.321	B-VIA PP
418	949393.97	1050960.133	419.321	B-VIA PP
419	949402.973	1050957.547	419.281	B-VIA PP
420	949392.417	1050957.117	419.321	B-VIA PP
421	949402.082	1050955.099	419.291	B-VIA PP
422	949391.581	1050953.89	419.361	B-VIA PP
423	949455.816	1050971.491	419.211	GRADAS
424	949465.579	1050973.791	419.211	GRADAS
425	949470.036	1050974.855	419.181	GRADAS
426	949477.341	1050976.601	419.201	GRADAS
427	949483.378	1050978.007	419.211	GRADAS
428	949500.435	1050982.072	419.171	GRADAS
429	949501.104	1050979.252	419.211	GRADAS

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
430	949484.065	1050975.219	419.161	GRADAS
431	949478.052	1050973.764	419.191	GRADAS
432	949470.707	1050971.995	419.181	GRADAS
433	949466.267	1050970.982	419.171	GRADAS
434	949456.542	1050968.725	419.221	GRADAS
435	949521.799	1050999.33	418.091	PARAMENTO
436	949522.092	1050998.148	418.051	PARAMENTO
437	949509.07	1050995.008	418.001	PARAMENTO
438	949506.296	1051007.114	417.931	PARAMENTO
439	949502.334	1051006.144	417.831	PARAMENTO
440	949531.902	1050995.779	418.181	MATERA
441	949533.675	1050996.234	418.201	MATERA
442	949531.51	1050997.365	418.181	MATERA
443	949533.251	1050997.848	418.211	MATERA
444	949528.13	1050998.822	418.121	MATERA
445	949527.712	1051000.487	418.141	MATERA
446	949526.137	1050998.371	418.081	MATERA
447	949525.77	1051000.03	418.111	MATERA
448	949532.414	1050996.908	418.441	ARBOL
449	949537.564	1050986.382	418.211	REJILLA
450	949537.596	1050986.635	418.211	REJILLA
451	949537.32	1050987.578	418.201	REJILLA
452	949537.056	1050987.479	418.201	REJILLA
453	949536.066	1050989.154	418.191	REJILLA
454	949536.276	1050989.309	418.191	REJILLA
455	949536.595	1050988.329	418.201	REJILLA
456	949536.815	1050988.485	418.191	REJILLA
457	949535.73	1050990.083	418.181	REJILLA
458	949535.46	1050989.944	418.181	REJILLA
459	949535.024	1050990.865	418.161	REJILLA
460	949534.816	1050990.69	418.171	REJILLA
461	949534.361	1050991.601	418.171	REJILLA
462	949534.143	1050991.415	418.171	REJILLA
463	949533.611	1050992.29	418.161	REJILLA
464	949533.415	1050992.076	418.161	REJILLA
465	949532.796	1050992.904	418.151	REJILLA
466	949532.641	1050992.683	418.151	REJILLA
467	949531.983	1050993.479	418.151	REJILLA
468	949531.829	1050993.248	418.151	REJILLA
469	949531.154	1050994.012	418.141	REJILLA
470	949530.972	1050993.749	418.131	REJILLA
471	949530.241	1050994.459	418.131	REJILLA
472	949530.117	1050994.22	418.131	REJILLA

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
473	949529.339	1050994.877	418.121	REJILLA
474	949529.227	1050994.619	418.111	REJILLA
475	949528.391	1050995.242	418.101	REJILLA
476	949528.3	1050994.975	418.111	REJILLA
477	949527.448	1050995.536	418.081	REJILLA
478	949527.329	1050995.237	418.091	REJILLA
479	949526.47	1050995.758	418.071	REJILLA
480	949526.419	1050995.484	418.081	REJILLA
481	949525.457	1050995.918	418.051	REJILLA
482	949525.425	1050995.655	418.051	REJILLA
483	949524.476	1050996.03	418.021	REJILLA
484	949524.465	1050995.758	418.021	REJILLA
485	949523.471	1050996.069	418.001	REJILLA
486	949523.472	1050995.769	418.011	REJILLA
487	949522.482	1050996.03	417.991	REJILLA
488	949522.5	1050995.76	417.991	REJILLA
489	949521.495	1050995.951	417.971	REJILLA
490	949521.534	1050995.673	417.981	REJILLA
491	949520.511	1050995.831	417.961	REJILLA
492	949520.56	1050995.554	417.961	REJILLA
493	949507.34	1050992.812	417.961	REJILLA
494	949507.399	1050992.535	417.961	REJILLA
495	949505.928	1050992.502	417.941	REJILLA
496	949505.989	1050992.206	417.941	REJILLA
497	949504.508	1050992.312	417.921	REJILLA
498	949504.516	1050992.052	417.921	REJILLA
499	949504.19	1050991.979	417.951	CUNETA
500	949504.496	1050992.331	417.911	CUNETA
501	949504.48	1050992.28	417.501	FONDO
502	949504.217	1050992.021	417.541	FONDO
503	949502.22	1051002.056	417.771	CUNETA
504	949501.809	1051002.047	417.831	CUNETA
505	949502.172	1051002.173	417.451	FONDO
506	949501.827	1051002.088	417.431	FONDO
507	949498.465	1051007.997	418.161	ANDEN
508	949499.016	1051007.705	418.161	ANDEN
509	949499.385	1051007.451	418.151	ANDEN
510	949499.623	1051007.056	418.151	ANDEN
511	949494.508	1050996.963	418.321	ANDEN
512	949502.825	1050993.437	418.331	ANDEN
513	949502.975	1050992.866	418.341	ANDEN
514	949503.322	1050992.359	418.291	ANDEN
515	949503.811	1050992.103	418.221	ANDEN

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
516	949501.968	1050996.354	418.291	SENDERO
517	949501.45	1050998.603	418.271	SENDERO
518	949495.048	1050994.696	418.321	SENDERO
519	949502.037	1050995.667	418.311	ESCALERA
520	949502.037	1050995.657	418.481	ESCALERA
521	949502.116	1050994.971	418.481	ESCALERA
522	949498.613	1050995.166	418.341	ESCALERA
523	949498.714	1050994.732	418.511	ESCALERA
524	949498.716	1050994.702	418.681	ESCALERA
525	949498.803	1050994.318	418.681	ESCALERA
526	949502.127	1050994.952	418.651	ESCALERA
527	949502.175	1050994.274	418.651	ESCALERA
528	949502.197	1050994.245	418.811	ESCALERA
529	949502.234	1050993.566	418.811	ESCALERA
530	949502.266	1050993.548	418.981	ESCALERA
531	949502.344	1050992.862	418.981	ESCALERA
532	949502.355	1050992.843	419.151	ESCALERA
533	949502.406	1050992.124	419.151	ESCALERA
534	949498.805	1050994.288	418.851	ESCALERA
535	949498.892	1050993.913	418.841	ESCALERA
536	949498.884	1050993.882	419.011	ESCALERA
537	949498.962	1050993.487	419.001	ESCALERA
538	949498.972	1050993.487	419.171	ESCALERA
539	949499.069	1050993.103	419.171	ESCALERA
540	949506.714	1050993.58	417.951	CAJA
541	949503.201	1050993.504	418.211	POSTE
542	949501.508	1050999.77	417.991	ARBOL
543	949499.47	1051005.381	418.191	SILLA
544	949499.208	1051006.977	418.161	SILLA
545	949491.181	1051003.937	418.081	ARBOL
546	949492.633	1050999.669	418.301	ARBOL
547	949489.789	1050996.061	418.371	CASETA PP
548	949493.994	1050996.997	418.211	CASETA
549	949493.492	1050995.007	418.391	CASETA
550	949552.015	1050942.176	418.741	COTA
551	949549.327	1050954.187	418.751	COTA
552	949548.268	1050949.571	418.801	COTA
553	949545.577	1050944.501	418.961	COTA
554	949541.039	1050940.162	419.051	COTA
555	949401.743	1050953.08	419.271	B-VIA PP
556	949392.359	1050957.093	419.311	B-VIA PP
557	949401.834	1050949.487	419.281	B-VIA PP
558	949391.602	1050953.872	419.331	B-VIA PP

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
559	949402.417	1050947.193	419.301	B-VIA PP
560	949391.532	1050950.298	419.371	B-VIA PP
561	949403.59	1050944.608	419.301	B-VIA PP
562	949392.196	1050947.127	419.391	B-VIA PP
563	949405.18	1050942.384	419.301	B-VIA PP
564	949393.668	1050943.862	419.381	B-VIA PP
565	949406.561	1050940.556	419.291	B-VIA PP
566	949395.477	1050941.513	419.411	B-VIA PP
567	949419.187	1050931.348	419.311	B-VIA PP
568	949397.022	1050940.067	419.431	B-VIA PP
569	949425.33	1050927.529	419.311	B-VIA PP
570	949406.748	1050932.901	419.431	B-VIA PP
571	949421.838	1050922.722	419.341	B-VIA PP
572	949413.796	1050927.892	419.421	B-VIA PP
573	949417.735	1050925.332	419.331	B-VIA PP
574	949415.539	1050926.631	419.431	B-VIA PP
575	949419.753	1050936.42	419.491	COTA
576	949423.227	1050934.348	419.491	COTA
577	949412.493	1050941.735	419.561	COTA
578	949420.562	1050944.186	419.301	COTA
579	949408.497	1050948.261	419.481	COTA
580	949418.815	1050952.935	419.201	COTA
581	949409.672	1050957.516	419.391	COTA
582	949423.171	1050961.992	419.121	COTA
583	949417.86	1050966.531	419.271	COTA
584	949431.04	1050967.427	419.081	COTA
585	949424.941	1050971.77	418.981	COTA
586	949440.897	1050972.239	419.071	COTA
587	949432.514	1050977.555	418.991	COTA
588	949447.987	1050976.626	419.231	COTA
589	949446.604	1050981.05	419.221	COTA
590	949455.459	1050977.722	419.291	COTA
591	949452.732	1050983.004	419.201	COTA
592	949461.558	1050978.952	419.201	COTA
593	949470.12	1050986.219	419.111	COTA
594	949475.342	1050984.38	418.981	COTA
595	949490.353	1050998.025	418.201	CASETA
596	949493.411	1051001.728	418.121	SENDERO
597	949492.953	1051003.681	418.121	SENDERO
598	949481.401	1050999.021	418.141	SENDERO
599	949480.896	1051000.93	418.151	SENDERO
600	949480.809	1051000.894	418.161	CUNETA
601	949480.51	1051000.863	418.151	CUNETA

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
602	949480.776	1051000.931	417.851	FONDO
603	949480.52	1051000.863	417.861	FONDO
604	949481.207	1050998.786	418.151	CUNETA
605	949481.122	1050998.57	418.141	CUNETA
606	949481.189	1050998.765	417.881	FONDO
607	949481.193	1050998.565	417.911	FONDO
608	949471.234	1050996.773	418.141	CUNETA
609	949471.195	1050996.47	418.151	CUNETA
610	949471.265	1050996.755	417.951	FONDO
611	949471.322	1050996.519	417.951	FONDO
612	949461.922	1050994.896	418.131	CUNETA
613	949462.014	1050994.582	418.131	CUNETA
614	949462.073	1050994.897	417.971	FONDO
615	949462.122	1050994.62	417.971	FONDO
616	949449.84	1050992.364	418.151	CUNETA
617	949449.949	1050992.091	418.131	CUNETA
618	949449.97	1050992.373	418.001	FONDO
619	949450.007	1050992.125	417.991	FONDO
620	949438.15	1050989.95	418.141	CUNETA
621	949438.131	1050989.658	418.121	CUNETA
622	949437.685	1050989.867	418.141	CUNETA
623	949437.895	1050990.152	418.141	CUNETA
624	949438.14	1050989.949	418.021	FONDO
625	949438.11	1050989.666	418.031	FONDO
626	949437.723	1050989.9	418.021	FONDO
627	949437.887	1050990.132	418.011	FONDO
628	949476.478	1051004.459	418.811	ESCALERA
629	949477.463	1051004.288	418.171	ESCALERA
630	949476.518	1051004.462	418.661	ESCALERA
631	949477.441	1051004.316	418.361	ESCALERA
632	949477.149	1051004.326	418.351	ESCALERA
633	949477.128	1051004.344	418.511	ESCALERA
634	949476.831	1051004.434	418.511	ESCALERA
635	949474.557	1051001.558	418.831	ESCALERA
636	949475.13	1051000.675	418.171	ESCALERA
637	949474.552	1051001.487	418.671	ESCALERA
638	949475.106	1051000.734	418.341	ESCALERA
639	949474.738	1051001.259	418.661	ESCALERA
640	949474.791	1051001.223	418.501	ESCALERA
641	949474.94	1051000.953	418.351	ESCALERA
642	949474.929	1051000.962	418.511	ESCALERA
643	949471.109	1050999.842	418.171	ESCALERA
644	949471.188	1050999.857	418.361	ESCALERA

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
645	949471.067	1051000.15	418.511	ESCALERA
646	949462.973	1050996.354	418.151	ESCALERA
647	949463.405	1050994.479	419.121	ESCALERA
648	949465.174	1050994.844	419.131	ESCALERA
649	949464.757	1050996.78	418.151	ESCALERA
650	949464.74	1050996.738	418.381	ESCALERA
651	949464.817	1050996.363	418.381	ESCALERA
652	949426.507	1050983.87	419.341	D-7BINT
653	949470.637	1051001.703	418.841	PARAMENTO
654	949470.816	1051000.724	418.821	PARAMENTO
655	949453.631	1050997.192	418.171	PARAMENTO
656	949431.599	1050988.167	418.641	LAMPARA
657	949439.014	1050990.351	418.561	LAMPARA
658	949453.813	1050993.465	418.541	LAMPARA
659	949470.883	1050996.919	418.551	LAMPARA
660	949481.798	1050998.798	418.431	LAMPARA
661	949427.822	1050991.56	418.331	MALLA
662	949436.059	1050993.602	418.181	PARAMENTO
663	949435.966	1050994.498	418.181	PARAMENTO
664	949420.164	1050986.412	419.261	ARBOL
665	949418.887	1050984.898	418.991	MALLA
666	949415.109	1050980.022	418.901	POSTE
667	949405.377	1050974.707	418.971	MALLA
668	949390.461	1050964.127	419.551	MALLA
669	949394.522	1050965.114	419.331	POSTE
670	949426.657	1050993.875	418.061	ANDEN
671	949431.94	1050993.163	418.151	ANDEN
672	949428.43	1050992.475	418.101	ANDEN
673	949432.45	1050991.605	418.231	ANDEN
674	949428.639	1050991.778	418.181	ANDEN
675	949428.51	1050991.188	418.261	ANDEN
676	949429.949	1050988.963	418.431	ANDEN
677	949428.294	1050990.832	418.321	ANDEN
678	949427.522	1050990.417	418.421	ANDEN
679	949427.753	1050987.686	418.521	ANDEN
680	949426.372	1050989.795	418.521	ANDEN
681	949415.638	1050978.916	418.951	ANDEN
682	949414.094	1050980.913	418.911	ANDEN
683	949404.209	1050970.786	419.301	ANDEN
684	949432	1050994.029	418.161	CUNETA
685	949431.847	1050993.768	418.141	CUNETA
686	949431.97	1050994.027	417.971	FONDO
687	949431.846	1050993.788	417.981	FONDO

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
688	949438.135	1050989.307	418.141	ANDEN
689	949434.018	1050988.407	418.331	ANDEN
690	949431.285	1050987.643	418.461	ANDEN
691	949428.515	1050986.396	418.581	ANDEN
692	949430.879	1050987.855	418.431	CAJA
693	949424.135	1050983.252	418.791	ANDEN
694	949405.155	1050969.449	419.361	ANDEN
695	949392.404	1050960.304	419.471	ANDEN
696	949407.532	1050971.711	419.251	CAJA
697	949391.575	1050961.398	419.471	ANDEN
698	949391.658	1050959.79	419.491	ANDEN
699	949389.648	1050960	419.491	ANDEN
700	949390.015	1050944.919	419.821	ANDEN
701	949388.061	1050946.335	419.811	ANDEN
702	949388.43	1050945.8	419.811	SENDERO
703	949387.261	1050944.024	419.821	SENDERO
704	949387.823	1050952.584	419.701	ARBOL
705	949385.105	1050945.185	419.861	POSTE
706	949390.522	1050941.706	419.861	GRADAS
707	949388.062	1050938.326	420.771	GRADAS
708	949414.538	1050924.175	419.721	GRADAS
709	949415.705	1050925.981	419.701	SENDERO
710	949412.327	1050921.253	420.611	GRADAS
711	949411.729	1050921.211	420.631	GRADAS
712	949411.262	1050921.429	420.631	GRADAS
713	949409.996	1050918.473	421.611	ARBOL
714	949416.199	1050918.076	420.101	PARAMENTO
715	949405.791	1050921.255	421.871	ARBOL
716	949420.818	1050914.822	420.171	PARAMENTO
717	949401.816	1050923.613	421.791	ARBOL
718	949421.33	1050915.529	420.121	PARAMENTO
719	949431.147	1050908.499	420.131	PARAMENTO
720	949393.061	1050929.374	421.461	ARBOL
721	949413.292	1050913.792	420.131	PARAMENTO
722	949389.448	1050932.438	421.421	ARBOL
723	949385.938	1050935.891	421.051	ARBOL
724	949377.01	1050940.537	421.601	ARBOL
725	949373.102	1050943.952	421.361	ARBOL
726	949369.665	1050946.357	421.111	ARBOL
727	949387.748	1050939.657	420.271	CAJA
728	949388.466	1050940.569	420.271	CAJA
729	949389.547	1050960.163	419.481	SENDERO 2
730	949386.026	1050957.62	419.561	SENDERO 2

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
731	949384.439	1050956.236	419.621	SENDERO 2
732	949383.526	1050955.109	419.661	SENDERO 2
733	949383.265	1050954.54	419.691	SENDERO 2
734	949382.86	1050952.316	419.771	SENDERO 2
735	949380.356	1050952.571	419.741	SENDERO 2
736	949382.697	1050949.928	419.881	SENDERO 2
737	949380.177	1050949.972	419.861	SENDERO 2
738	949382.701	1050947.433	419.961	SENDERO 2
739	949382.902	1050945.151	420.071	SENDERO 2
740	949380.167	1050947.405	419.941	SENDERO 2
741	949380.405	1050944.725	420.031	SENDERO 2
742	949383.546	1050943.111	420.181	SENDERO 2
743	949384.714	1050941.329	420.271	SENDERO 2
744	949381.28	1050941.97	420.161	SENDERO 2
745	949386.311	1050939.566	420.391	SENDERO 2
746	949388.073	1050938.036	420.481	SENDERO 2
747	949384.605	1050937.732	420.381	SENDERO 2
748	949382.847	1050939.644	420.281	SENDERO 2
749	949386.631	1050936.01	420.521	SENDERO 2
750	949390.111	1050936.555	420.481	SENDERO 2
751	949388.69	1050934.53	420.521	SENDERO 2
752	949410.334	1050921.795	420.591	SENDERO 2
753	949408.878	1050919.838	420.651	SENDERO 2
754	949411.591	1050921.031	420.561	SENDERO 2
755	949410.394	1050918.801	420.631	SENDERO 2
756	949411.962	1050921.027	420.491	SENDERO 2
757	949411.945	1050918.559	420.501	SENDERO 2
758	949413.82	1050921.688	420.151	SENDERO 2
759	949413.855	1050918.914	420.291	SENDERO 2
760	949415.262	1050922.151	419.961	SENDERO 2
761	949415.388	1050919.643	420.101	SENDERO 2
762	949417.221	1050922.088	419.771	SENDERO 2
763	949416.252	1050919.754	419.941	SENDERO 2
764	949416.637	1050919.691	419.881	SENDERO 2
765	949434.593	1050911.388	419.851	SENDERO 2
766	949433.338	1050909.275	419.871	SENDERO 2
767	949435.802	1050910.721	419.871	SENDERO 2
768	949434.998	1050908.329	419.871	SENDERO 2
769	949436.604	1050910.446	419.871	SENDERO 2
770	949435.818	1050908.075	419.891	SENDERO 2
771	949448.807	1050911.393	420.011	ANDEN
772	949449.551	1050913.36	419.991	ANDEN
773	949455.073	1050912.675	419.921	GRADAS

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
774	949455.739	1050909.895	420.271	GRADAS
775	949464.892	1050915.028	419.781	GRADAS
776	949465.5	1050912.224	419.891	GRADAS
777	949406.679	1050918.17	421.951	D-9INT
778	949417.903	1050910.517	420.211	PARAMENTO MALLA
779	949410.762	1050912.993	420.811	GRADAS
780	949409.989	1050911.866	420.081	GRADAS
781	949370.607	1050939.496	419.771	GRADAS
782	949371.594	1050940.438	420.331	GRADAS
783	949427.308	1050900.06	419.931	GRADAS
784	949428.693	1050902.042	421.091	GRADAS
785	949442.851	1050902.845	420.661	POSTE
786	949469.673	1050914.191	419.651	CUNETA
787	949469.404	1050914.303	419.651	CUNETA
788	949469.606	1050914.277	419.371	FONDO
789	949469.415	1050914.283	419.361	FONDO
790	949469.246	1050913.991	419.691	CUNETA
791	949469.286	1050913.983	419.361	FONDO
792	949435.562	1050911.295	419.851	ANDEN
793	949436.155	1050913.262	419.861	ANDEN
794	949438.494	1050907.501	419.891	SENDERO 2
795	949438.173	1050910.085	419.891	SENDERO 2
796	949443.513	1050906.982	419.941	SENDERO 2
797	949443.781	1050909.446	419.961	SENDERO 2
798	949446.373	1050909.077	420.001	SENDERO 2
799	949445.835	1050906.634	420.011	SENDERO 2
800	949446.731	1050906.415	420.001	SENDERO 2
801	949446.404	1050909.069	419.971	SENDERO 2
802	949445.924	1050906.62	419.931	SENDERO 2
803	949446.998	1050906.324	419.961	SENDERO 2
804	949447.781	1050908.735	419.991	SENDERO 2
805	949449.171	1050907.92	420.011	SENDERO 2
806	949447.773	1050905.835	419.991	SENDERO 2
807	949447.779	1050911.191	419.951	SENDERO 1
808	949448.866	1050911.277	419.991	SENDERO 1
809	949453.189	1050904.814	420.041	SENDERO 2
810	949451.632	1050902.85	420.071	SENDERO 2
811	949453.404	1050901.32	420.111	SENDERO 2
812	949455.249	1050903.024	420.041	SENDERO 2
813	949456.913	1050900.885	420.081	SENDERO 2
814	949453.807	1050912.426	419.911	SENDERO 1
815	949455.047	1050908.182	419.981	SENDERO 1
816	949459.409	1050901.601	420.061	SENDERO 1

2392

LEVANTAMIENTO PISTA DE PATINAJE

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
817	949461.299	1050902.957	420.021	SENDERO 1
818	949522.955	1050995.534	419.341	B-VIA PP
819	949413.592	1050935.429	419.306	B-VIA PP

JUAN ANTONIO BARBOSA MAYORGA
OPOGRAFO
MP: 01-0401 C.P.N.T.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
INFORME DE OBRA	Versión: 01

2891

2893

CONTRATO DE OBRA

IDERMETA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

106 DE 2023

PROYECTO

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA EN

2394

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -SECTOR PISTA DE ATLETISMO

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

LEVANTAMIENTO PISTA ATLETICA

PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
1	949621.786	1050935.544	419.381	Delta 9036
2	949614.042	1050790.779	421.968	D-1
3	949617.154	1050772.227	421.975	D-2
4	949619.104	1050745.036	421.532	tuberia
5	949622.842	1050738.159	421.509	tuberia
6	949591.845	1050726.181	421.602	Foso
7	949592.564	1050722.193	421.506	Foso
8	949578.829	1050723.905	421.592	Foso
9	949579.554	1050719.915	421.52	Foso
10	949579.254	1050722.526	420.811	fondo
11	949573.45	1050722.983	421.57	Foso
12	949574.102	1050718.978	421.509	Foso
13	949569.639	1050718.21	421.533	Foso
14	949568.99	1050722.214	421.572	Foso
15	949569.385	1050720.839	420.816	fondo
16	949557.223	1050720.182	421.6	Foso
17	949557.906	1050716.275	421.526	Foso
18	949544.889	1050714.054	421.498	Foso
19	949544.236	1050718.018	421.547	Foso
20	949544.644	1050716.672	420.831	fondo
21	949614.042	1050790.779	421.968	D-1
22	949617.1528	1050772.234	421.97	D-2
23	949638.996	1050742.993	421.576	MURO
24	949639.7663	1050742.138	421.63	MURO
25	949642.129	1050739.868	421.608	MURO
26	949638.7584	1050736.665	421.611	MURO
27	949634.8968	1050733.548	421.606	MURO
28	949630.8448	1050730.832	421.626	MURO
29	949626.9651	1050728.542	421.641	MURO
30	949625.3065	1050731.486	421.592	MURO
31	949624.7551	1050732.466	421.466	MURO
32	949636.2218	1050745.531	421.53	PISTA ATLE
33	949637.8314	1050736.109	421.532	PISTA ATLE
34	949628.0397	1050734.412	421.541	PISTA ATLE
35	949617.6711	1050732.609	421.505	PISTA ATLE
36	949608.0622	1050730.974	421.506	PISTA ATLE
37	949480.6006	1050733.435	421.539	PISTA ATLE
38	949478.1759	1050736.5	421.54	PISTA ATLE
39	949475.7128	1050740.279	421.538	PISTA ATLE
40	949473.6038	1050744.295	421.541	PISTA ATLE

LEVANTAMIENTO PISTA ATLETICA

PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
41	949471.8725	1050748.476	421.546	PISTA ATLE
42	949470.3303	1050753.488	421.574	PISTA ATLE
43	949469.622	1050756.867	421.6	PISTA ATLE
44	949469.1062	1050760.976	421.6	PISTA ATLE
45	949468.9189	1050765.397	421.611	PISTA ATLE
46	949469.1934	1050769.934	421.551	PISTA ATLE
47	949469.7569	1050773.704	421.556	PISTA ATLE
48	949470.8202	1050778.382	421.567	PISTA ATLE
49	949472.2512	1050782.664	421.545	PISTA ATLE
50	949473.9191	1050786.421	421.532	PISTA ATLE
51	949476.1877	1050790.619	421.551	PISTA ATLE
52	949478.7346	1050794.365	421.531	PISTA ATLE
53	949481.3358	1050797.54	421.51	PISTA ATLE
54	949484.3063	1050800.581	421.521	PISTA ATLE
55	949487.7472	1050803.534	421.517	PISTA ATLE
56	949491.4247	1050806.182	421.532	PISTA ATLE
57	949495.4195	1050808.446	421.516	PISTA ATLE
58	949499.5957	1050810.322	421.519	PISTA ATLE
59	949504.0829	1050811.882	421.515	PISTA ATLE
60	949508.7697	1050812.98	421.555	PISTA ATLE
61	949518.8394	1050814.754	421.521	PISTA ATLE
62	949528.3003	1050816.406	421.505	PISTA ATLE
63	949538.042	1050818.051	421.532	PISTA ATLE
64	949547.7565	1050819.714	421.556	PISTA ATLE
65	949557.3806	1050821.325	421.539	PISTA ATLE
66	949566.9269	1050822.971	421.525	PISTA ATLE
67	949576.6499	1050824.628	421.512	PISTA ATLE
68	949592.7897	1050827.336	421.521	PISTA ATLE
69	949595.353	1050827.699	421.544	PISTA ATLE
70	949598.3479	1050827.963	421.547	PISTA ATLE
71	949601.1213	1050828.04	421.562	PISTA ATLE
72	949604.1465	1050827.892	421.486	PISTA ATLE
73	949607.1505	1050827.633	421.52	PISTA ATLE
74	949610.0379	1050827.151	421.561	PISTA ATLE
75	949612.9973	1050826.488	421.535	PISTA ATLE
76	949615.9066	1050825.687	421.552	PISTA ATLE
77	949618.7677	1050824.661	421.537	PISTA ATLE
78	949621.5297	1050823.498	421.559	PISTA ATLE
79	949624.2033	1050822.109	421.564	PISTA ATLE
80	949626.8069	1050820.564	421.574	PISTA ATLE
81	949629.3212	1050818.884	421.537	PISTA ATLE

LEVANTAMIENTO PISTA ATLETICA

PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
82	949631.7067	1050817.047	421.535	PISTA ATLE
83	949634.145	1050814.908	421.547	PISTA ATLE
84	949636.289	1050812.824	421.524	PISTA ATLE
85	949638.1425	1050810.796	421.543	PISTA ATLE
86	949640.0089	1050808.39	421.508	PISTA ATLE
87	949641.7141	1050805.953	421.51	PISTA ATLE
88	949643.2857	1050803.4	421.511	PISTA ATLE
89	949644.7006	1050800.729	421.509	PISTA ATLE
90	949645.9764	1050797.967	421.51	PISTA ATLE
91	949647.1025	1050795.087	421.559	PISTA ATLE
92	949649.1204	1050786.85	421.531	PISTA ATLE
93	949649.7346	1050779.969	421.507	PISTA ATLE
94	949649.5463	1050775.201	421.526	PISTA ATLE
95	949648.9843	1050770.679	421.501	PISTA ATLE
96	949647.7871	1050765.693	421.532	PISTA ATLE
97	949646.2952	1050761.296	421.53	PISTA ATLE
98	949643.5254	1050755.51	421.561	PISTA ATLE
99	949641.1321	1050751.643	421.559	PISTA ATLE
100	949638.9814	1050748.701	421.53	PISTA ATLE
101	949621.7121	1050746.537	421.52	PISTA ATLE
102	949617.1663	1050744.032	421.564	PISTA ATLE
103	949612.9251	1050742.395	421.514	PISTA ATLE
104	949608.349	1050741.224	421.547	PISTA ATLE
105	949595.084	1050738.905	421.507	PISTA ATLE
106	949584.6417	1050737.136	421.518	PISTA ATLE
107	949572.7127	1050735.098	421.521	PISTA ATLE
108	949560.9712	1050733.072	421.516	PISTA ATLE
109	949549.0732	1050731.057	421.533	PISTA ATLE
110	949539.1964	1050729.381	421.503	PISTA ATLE
111	949523.989	1050726.842	421.503	PISTA ATLE
112	949519.4909	1050726.364	421.523	PISTA ATLE
113	949515.1143	1050726.431	421.517	PISTA ATLE
114	949510.4618	1050727.004	421.522	PISTA ATLE
115	949506.014	1050728.144	421.556	PISTA ATLE
116	949502.4543	1050729.465	421.516	PISTA ATLE
117	949498.6221	1050731.384	421.565	PISTA ATLE
118	949494.4411	1050734.14	421.523	PISTA ATLE
119	949490.9203	1050737.135	421.534	PISTA ATLE
120	949487.828	1050740.452	421.56	PISTA ATLE
121	949485.152	1050744.12	421.537	PISTA ATLE
122	949482.9303	1050748.054	421.548	PISTA ATLE

LEVANTAMIENTO PISTA ATLETICA

PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
123	949481.1753	1050752.258	421.536	PISTA ATLE
124	949479.9438	1050756.599	421.567	PISTA ATLE
125	949479.1708	1050761.431	421.565	PISTA ATLE
126	949479.0165	1050765.965	421.569	PISTA ATLE
127	949479.3883	1050770.447	421.577	PISTA ATLE
128	949480.2788	1050774.932	421.555	PISTA ATLE
129	949481.6884	1050779.291	421.573	PISTA ATLE
130	949483.5844	1050783.373	421.596	PISTA ATLE
131	949485.8027	1050787.044	421.545	PISTA ATLE
132	949488.1258	1050790.047	421.536	PISTA ATLE
133	949490.9618	1050793.042	421.534	PISTA ATLE
134	949494.4711	1050796.084	421.506	PISTA ATLE
135	949496.9596	1050797.842	421.489	PISTA ATLE
136	949500.3602	1050799.7	421.487	PISTA ATLE
137	949503.1601	1050800.981	421.481	PISTA ATLE
138	949506.3868	1050802.122	421.524	PISTA ATLE
139	949510.1655	1050803.077	421.495	PISTA ATLE
140	949522.1252	1050805.131	421.519	PISTA ATLE
141	949534.6852	1050807.307	421.486	PISTA ATLE
142	949546.8088	1050809.357	421.523	PISTA ATLE
143	949558.9298	1050811.42	421.483	PISTA ATLE
144	949571.5957	1050813.594	421.503	PISTA ATLE
145	949581.6003	1050815.301	421.487	PISTA ATLE
146	949594.6416	1050817.494	421.509	PISTA ATLE
147	949598.6315	1050817.959	421.506	PISTA ATLE
148	949603.1564	1050817.973	421.5	PISTA ATLE
149	949606.6716	1050817.612	421.535	PISTA ATLE
150	949611.1187	1050816.69	421.533	PISTA ATLE
151	949615.4176	1050815.231	421.527	PISTA ATLE
152	949618.1783	1050813.983	421.535	PISTA ATLE
153	949622.1351	1050811.727	421.53	PISTA ATLE
154	949624.6304	1050809.953	421.543	PISTA ATLE
155	949626.7361	1050808.184	421.522	PISTA ATLE
156	949629.1793	1050805.818	421.499	PISTA ATLE
157	949631.4532	1050803.191	421.538	PISTA ATLE
158	949633.2269	1050800.693	421.524	PISTA ATLE
159	949634.7931	1050798.119	421.528	PISTA ATLE
160	949636.2014	1050795.376	421.538	PISTA ATLE
161	949637.4185	1050792.444	421.487	PISTA ATLE
162	949638.4011	1050789.277	421.49	PISTA ATLE
163	949639.232	1050785.339	421.49	PISTA ATLE

LEVANTAMIENTO PISTA ATLETICA

PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
164	949639.6604	1050781.851	421.499	PISTA ATLE
165	949639.7444	1050778.47	421.52	PISTA ATLE
166	949639.5157	1050775.024	421.499	PISTA ATLE
167	949638.932	1050771.335	421.528	PISTA ATLE
168	949638.05	1050767.991	421.548	PISTA ATLE
169	949636.4808	1050763.807	421.552	PISTA ATLE
170	949634.8079	1050760.366	421.559	PISTA ATLE
171	949632.7144	1050757.024	421.555	PISTA ATLE
172	949630.2717	1050753.851	421.522	PISTA ATLE
173	949626.9142	1050750.476	421.547	PISTA ATLE
174	949624.2631	1050748.24	421.61	PISTA ATLE
175	949621.6537	1050746.669	421.841	SARDINE
176	949621.7026	1050746.553	421.606	SARDINE
177	949618.9462	1050745.107	421.837	SARDINE
178	949618.9743	1050745.006	421.643	SARDINE
179	949611.5721	1050743.837	421.806	SARDINE
180	949611.5174	1050743.913	421.806	SARDINE
181	949601.8997	1050742.285	421.807	SARDINE
182	949592.2857	1050740.624	421.795	SARDINE
183	949582.2012	1050738.889	421.803	SARDINE
184	949572.042	1050737.159	421.796	SARDINE
185	949561.8464	1050735.416	421.792	SARDINE
186	949551.568	1050733.677	421.798	SARDINE
187	949541.2766	1050731.92	421.805	SARDINE
188	949531.3435	1050730.227	421.803	SARDINE
189	949521.154	1050728.49	421.8	SARDINE
190	949512.3516	1050727.003	421.817	SARDINE
191	949512.2525	1050726.876	421.709	SARDINE
192	949509.116	1050727.445	421.82	SARDINE
193	949509.0801	1050727.321	421.609	SARDINE
194	949509.1188	1050727.43	421.817	SARDINE
195	949509.0963	1050727.323	421.608	SARDINE
196	949507.4837	1050737.061	421.852	SARDINE
197	949505.7732	1050747.055	421.939	SARDINE
198	949504.1267	1050756.692	421.99	SARDINE
199	949502.3354	1050767.103	421.984	SARDINE
200	949500.613	1050777.215	421.95	SARDINE
201	949498.8057	1050787.494	421.889	SARDINE
202	949497.0736	1050797.686	421.831	SARDINE
203	949496.9741	1050797.776	421.608	SARDINE
204	949499.2266	1050798.989	421.81	SARDINE

LEVANTAMIENTO PISTA ATLETICA

PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
205	949499.1745	1050799.089	421.618	SARDINE
206	949510.0402	1050800.855	421.8	SARDINE
207	949520.6668	1050802.637	421.811	SARDINE
208	949531.1207	1050804.44	421.794	SARDINE
209	949541.5349	1050806.221	421.8	SARDINE
210	949552.0309	1050808.015	421.814	SARDINE
211	949562.2821	1050809.769	421.807	SARDINE
212	949572.91	1050811.588	421.796	SARDINE
213	949583.3428	1050813.366	421.794	SARDINE
214	949593.1633	1050815.081	421.8	SARDINE
215	949599.4694	1050816.133	421.805	SARDINE
216	949599.5121	1050816.22	421.828	SARDINE
217	949606.6633	1050817.453	421.814	SARDINE
218	949606.6495	1050817.593	421.612	SARDINE
219	949609.7123	1050816.914	421.823	SARDINE
220	949609.7329	1050817.029	421.611	SARDINE
221	949611.3762	1050806.946	421.869	SARDINE
222	949613.0321	1050797.164	421.913	SARDINE
223	949614.6947	1050787.526	421.965	SARDINE
224	949616.3978	1050777.427	421.974	SARDINE
225	949618.1242	1050767.281	421.928	SARDINE
226	949620.0061	1050756.169	421.867	SARDINE
227	949631.8136	1050821.701	421.438	MURO
228	949635.709	1050818.556	421.435	MURO
229	949639.9913	1050814.323	421.462	MURO
230	949642.8344	1050810.868	421.489	MURO
231	949645.6495	1050806.775	421.499	MURO
232	949648.5174	1050801.452	421.521	MURO
233	949650.6751	1050796.104	421.53	MURO
234	949652.074	1050791.462	421.533	MURO
235	949653.0712	1050785.461	421.555	MURO
236	949653.403	1050780.641	421.538	MURO
237	949653.2874	1050775.388	421.523	MURO
238	949652.7285	1050770.708	421.509	MURO
239	949651.4786	1050765.107	421.487	MURO
240	949649.551	1050759.453	421.459	MURO
241	949647.4402	1050754.924	421.484	MURO
242	949644.8675	1050750.56	421.546	MURO
243	949641.0764	1050745.38	421.586	MURO
244	949623.7888	1050732.098	421.462	MURO
245	949619.892	1050730.192	421.493	MURO

LEVANTAMIENTO PISTA ATLETICA

PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
246	949615.3564	1050728.123	421.489	MURO
247	949610.7481	1050726.151	421.486	MURO
248	949605.1128	1050723.95	421.485	MURO
249	949600.4006	1050722.23	421.459	MURO
250	949595.6592	1050720.719	421.44	MURO
251	949590.859	1050719.261	421.44	MURO
252	949586.0444	1050717.961	421.432	MURO
253	949581.1713	1050716.728	421.451	MURO
254	949574.8641	1050715.366	421.483	MURO
255	949563.906	1050713.494	421.495	MURO
256	949558.9094	1050712.804	421.492	MURO
257	949552.4926	1050712.17	421.46	MURO
258	949545.1684	1050711.689	421.43	MURO
259	949540.1384	1050711.512	421.49	MURO
260	949535.1875	1050711.471	421.48	MURO
261	949530.174	1050711.523	421.505	MURO
262	949524.1235	1050711.803	421.515	MURO
263	949519.1106	1050712.148	421.54	MURO
264	949512.7123	1050712.863	421.545	MURO
265	949506.103	1050713.933	421.574	MURO
266	949500.5668	1050715.485	421.578	MURO
267	949491.6566	1050719.52	421.477	MURO
268	949487.2876	1050722.318	421.478	MURO
269	949483.3642	1050725.37	421.494	MURO
270	949479.7429	1050728.839	421.484	MURO
271	949476.488	1050732.609	421.511	MURO
272	949473.0133	1050737.599	421.524	MURO
273	949469.9809	1050743.22	421.562	MURO
274	949468.1279	1050747.871	421.57	MURO
275	949467.4188	1050750.159	421.566	MURO
276	949465.4519	1050760.224	421.589	MURO
277	949465.2664	1050763.261	421.56	MURO
278	949465.231	1050766.197	421.575	MURO
279	949465.4253	1050769.249	421.562	MURO
280	949466.1128	1050774.601	421.532	MURO
281	949467.003	1050778.399	421.533	MURO
282	949468.0144	1050781.8	421.509	MURO
283	949469.4219	1050785.491	421.491	MURO
284	949470.4428	1050787.736	421.49	MURO
285	949471.5807	1050789.955	421.466	MURO
286	949472.8226	1050792.093	421.476	MURO
