5064

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 19 de octubre del 2023

CEDVO-111-2023

RECIBIDO 19 OCT 2023
2:44
Tatiana S.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de informe de obra No.04 de agosto de 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito realizar entrega del informe de obra No.04 del proyecto de la referencia correspondiente al mes de Agosto de 2023.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 941 folios

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

INFORME DE OBRA No. 04

Periodo de 01, 08, 2023 a 31, 08, 2023
Fecha de Presentación: 10, 09, 2023

INFORMACIÓN BASICA	
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO 1:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
OBJETO PROYECTO 1:	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
OBJETO PROYECTO 1:	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
VALOR DEL PROYECTO 1:	$ 31.845.658.891 BPIN 2022005500024
VALOR DEL PROYECTO 2:	$ 8.805.724.533 BPIN 2022005500022
VALOR DEL PROYECTO 3:	$ 10.220.557.418 BPIN 2022005500094
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR ACTUALIZADO:	$50.871.940.842
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
CORREO ELECTRONICO:	escenariosdeportivos2023@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 de 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
CORREO ELECTRONICO:	interescenariosc@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de Mayo de 2023
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

FECHA DE TERMINACIÓN	09 de Mayo de 2024
12 Meses	0 Días

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO ESCENARIOS MULTIPROPOSITO

MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°8´24"N 73°37´06"W		

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO PISTA DE PATINAJE

MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°8´21"N 73°37´07"W		


LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO PISTA DE ATLETISMO

MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°8´24"N 73°37´13"W		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

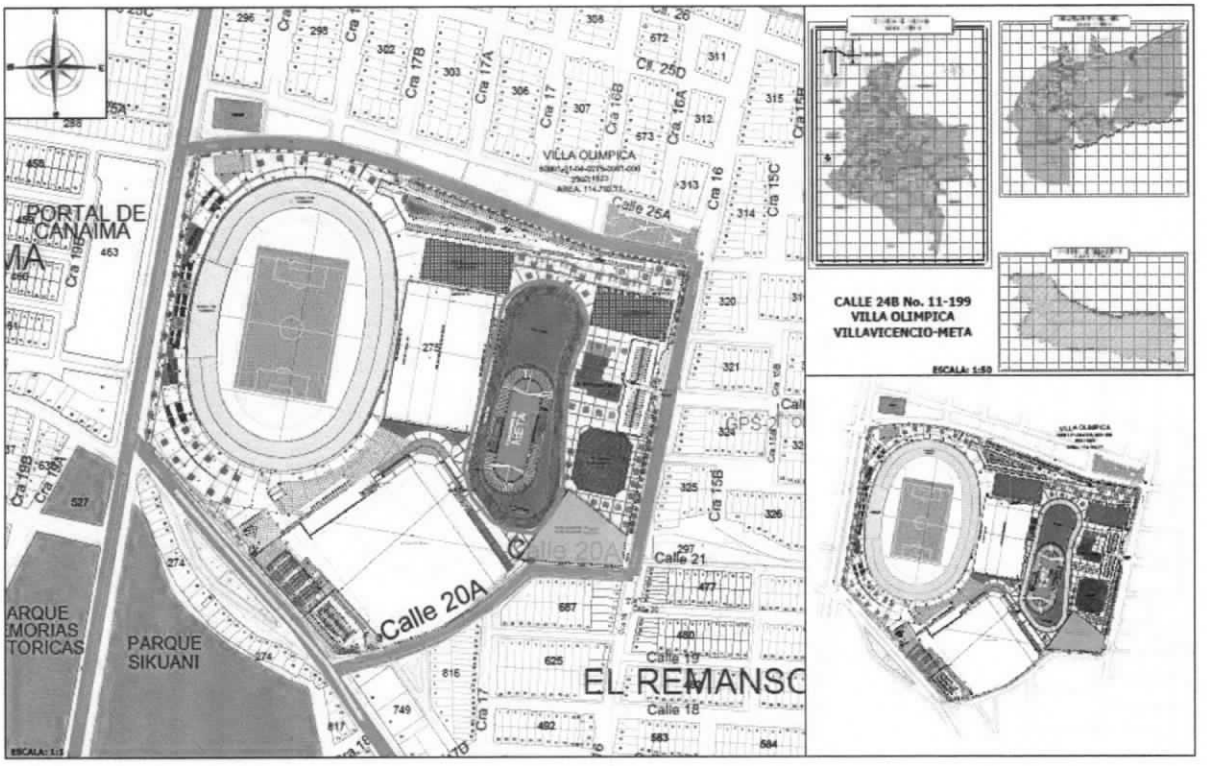

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

3688

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Avance físico

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	0.94%	$ 297.869.040	2.66%	$ 845.694.258	1.62%	$ 515.272.868	3.03%	$ 964.432.937
CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	5.04%	$ 443.413.691	8.83%	$ 777.810.726	1.40%	$ 122.879.350	4.38%	$ 386.049.331
CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	5.07%	$ 518.030.796	6.31%	$ 645.014.621	0.05%	$ 5.565.534	0.43%	$ 44.089.152
CONTRATO No.106 DE 2023	**2.48%**	**$ 1.259.313.527**	**1.98%**	**$ 2.268.519.605**	**1.27%**	**$ 643.717.752**	**2.74%**	**$ 1.394.571.419**

Para el avance físico de cada proyecto se tomó la relación con el presupuesto de cada uno de ellos.


Para el avance físico general del contrato se tomó la suma de las ejecuciones de cada proyecto con relación al valor total del contrato. Se adjunta como anexo el cuadro detallado por cada actividad.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

Grafica Avance Físico



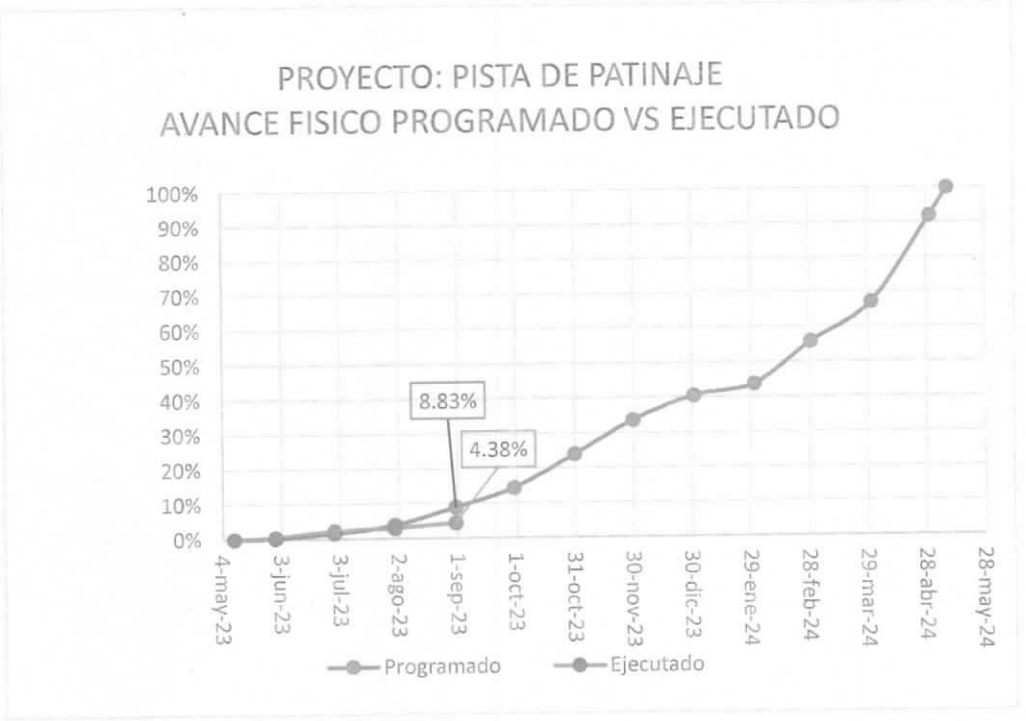

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE





Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo de los proyectos, Comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
01-08-2023	OF-C249-2023-0105	Avance de obra	Interventoría	Contratista
01-08-2023	PL-120-372	Autorización ingreso de personal a obra	Supervisión	Contratista
01-08-2023	PL-120-376	Autorización ingreso de personal a obra	Supervisión	Contratista
01-08-2023	OF-C249-2023-106	Solicitud presunto incumplimiento	Interventoría	Contratista
01-08-2023	OF-C249-2023-0110	Solicitud radicado PMT ante secretaria de movilidad	Interventoría	Contratista
01-08-2023	OF-C249-2023-111	Solicitud informe mensual de obra	Interventoría	Contratista
02-08-2023	CEDVO-058-2023	Solicitud plano aprobado PMT	Contratista	Secretaria Movilidad V/cio
03-08-2023	CEDVO-060-2023	Concepto uso del suelo	Contratista	Curaduría Urbana 2 de V/cio
02-08-2023	CEDVO-061-2023	Solicitud Programación partidos llaneros FC	Contratista	Idermeta
02-08-2023	CEDVO-062-2023	Entrega copia oficio CEDVO-61-2023	Contratista	Interventoría
04-08-2023	CEDVO-063-2023	Remisión orden de giro No.03 anticipo	Contratista	Interventoría
04-08-2023	PL-120-385	Respuesta oficio club llaneros	Supervisión	Contratista
08-08-2023	CEDVO-064-2023	Entrega informe PMT de Julio de 2023	Contratista	Interventoría
08-08-2023	CEDVO-066-2023	Respuesta oficio OF-C249-2023-106	Contratista	Interventoría
09-08-2023	CEDVO-059-2023	Respuesta a oficio OF-249-2023-105	Contratista	Interventoría
09-08-2023	PL-120-394	Comité de obra	Supervisión	Contratista
09-08-2023	PL-120-396	Certificación bancaria para anticipo recursos asignaciones directas	Supervisión	Contratista
09-08-2023	CEDVO-067-2023	Entrega de informes PMT de mayo y junio 2023	Contratista	Interventoría
09-08-2023	CEDVO-068-2023	Entrega Informe al plan de gerencia	Contratista	Interventoría

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
09-08-2023	CEDVO-070-2023	Solicitud de modificación del contrato	Contratista	Interventoría
10-08-2023	CEDVO-071-2023	Remisión orden de giro No.4 anticipo	Contratista	Interventoría
10-08-2023	OF-C249-2023-115	Aprobación y pago orden de giro No.3 anticipo	Interventoría	Contratista
10-08-2023	OF-C249-2023-116	Corrección informe mensual de obra	Interventoría	Contratista
10-08-2023	OF-C249-2023-117	Reiteración corrección documentación entregada	Interventoría	Contratista
11-08-2023	OF-C249-2023-119	Aprobación y pago orden de giro No.4 anticipo	Interventoría	Contratista
14-08-2023	OF-C249-2023-121	Corrección informe de gerencia	Interventoría	Contratista
14-08-2023	PL-120-407	Comité de obra	Supervisión	Interventoría
15-08-2023	PL-120-413	Autorización ingreso de personal a obra	Supervisión	Contratista
15-08-2023	PL-120-414	Respuesta oficio OF-C249-2023-120	Supervisión	Contratista
15-08-2023	CEDVO-072-2023	Entrega de presupuestos ambientales	Contratista	Interventoría
16-08-2023	CEDVO-074-2023	Entrega información plan de inversión de anticipo julio	Contratista	Interventoría
16-08-2023	PL-120-416	Autorización ingreso de personal a obra	Supervisión	Contratista
22-08-2023	CEDVO-074-2023	Entrega informes de seguimiento ambiental mayo 2023	Contratista	Interventoría
22-08-2023	CEDVO-075-2023	Entrega informes de seguimiento ambiental junio 2023	Contratista	Interventoría
22-08-2023	CEDVO-075-2023	Entrega informe PMT de julio 2023	Contratista	Interventoría
22-08-2023	OF-C249-2023-122	Devolución presupuestos PMA	Interventoría	Contratista
23-08-2023	CEDVO-076-2023	Entrega de diseño de mezcla para concretos	Contratista	Interventoría
23-08-2023	OF-C249-2023-126	Reiteración corrección documentación inicial entregada	Interventoría	Contratista

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
24-08-2023	CEDVO-078-2023	Entrega de correcciones de presupuestos ambientales	Contratista	Interventoría
24-08-2023	OF-C249-2023-127	Reiteración implementación informes mensuales y de seguimiento	Interventoría	Contratista
24-08-2023	OF-C249-2023-129	Correcciones a informes de seguimiento ambiental mayo	Interventoría	Contratista
28-08-2023	CEDVO-079-2023	Entrega de detalle de ciclópeo para Vigas de cimentación	Contratista	Interventoría
29-08-2023	PL-120-426	Solicitud estudios y diseños RCI	Supervisión	Contratista
31-08-2023	OF-C249-2023-133	Reiteración solicitud entrega de planos	Interventoría	Contratista
31-08-2023	OF-C249-2023-132	Reiteración solicitud entrega de información documentos faltantes	Interventoría	Contratista

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

Escenarios deportivos multipropósito

- **Demolición de andenes, placas, sardineles en concreto reforzado**
  Una vez se dio terminación a la actividad de desmonte de estructura metálica de los escenarios existentes, se procedió a la demolición de placas de contrapiso, encontrando problemas nuevamente con la red de agua potable existente. Siendo necesario realizar reparaciones para no suspender el servicio al edificio administrativo de Idermeta.
  Se tuvo que realizar demolición mecánica con equipo pesado tipo excavadora con martillo hidráulico, y luego cargue mecánico con excavadora sobre orugas.

- **Demolición de concreto reforzado y cimiento enterrado**
  La mayor parte de las demoliciones en concreto reforzado corresponden a pórticos en concreto en cada fachada lateral de los antiguos coliseos, los cuales se realizaron con equipo mecánico tipo excavadora con martillo hidráulico. Para las demoliciones de cimientos enterrados entre los cuales teníamos pedestales, zapatas y vigas de cimentación, se tuvo que realizar previamente excavación mecánica alrededor de los elementos para tener visual y poder demolerlos. Posteriormente se empleo maquinaria tipo excavadora sobre orugas para retirar los residuos producto de las demoliciones.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

Una vez se retiran las demoliciones a su sitio de acopio se debió compensar las áreas excavadas con relleno seleccionado de rio. Se viene presentando lluvias en horas no laborales que obligan a realizar bombeo de aguas en las excavaciones abiertas, retrasando el proceso de demoliciones y rellenos. Si hizo necesario el retiro de barro generado por la mezcla del suelo natural con las aguas lluvias con el fin de evitar fallos o colchones en el proceso de rellenos.

Durante el inicio de las actividades de desmontes y demoliciones de cada escenario, se evidencio actividades necesarias para la terminación del capítulo, las cuales no se encuentran incorporadas en el presupuesto de obra y que requieren entonces la aprobación por parte de la entidad contratante. Para ello se radico mediante oficio CEDVO-21-2023 del 24 de mayo de 2023, el debido soporte y los análisis de precios unitarios propuestos por el consorcio para su aprobación. La no aprobación de las actividades propuestas puede llegar a generar atrasos en el avance mensual de cada proyecto.

Se requirió por parte de la entidad el plano de aprobación del PMT firmado por el responsable de la secretaria de movilidad de Villavicencio, el cual fue solicitado mediante el oficio CEDVO-058-2023 de fecha 2 de agosto de 2023 pero a la fecha del presente informe no se ha recibido respuesta por la entidad competente.

Se presentaron problemas de disponibilidad de maquinaria pesada para demoliciones en la ciudad debido a la demanda local actual y el cierre de la vía Bogotá -Villavicencio, sin embargo, se logro cumplir en este mes con la totalidad de cantidades contratadas.

También es de aclarar que hay actividades que aún no han sido autorizadas por interventoría y entidad que están marcando atraso significativo como lo es el desmonte de la cubierta metálica tipo sándwich y la estructura metálica de polideportivo que según el levantamiento realizado y cuantificado sobrepasa el 347% de la cantidad contractual, por tal motivo fue que al inicio del contrato se presentaron los respectivos análisis de precios unitarios de las actividades no previstas con el fin de que fueran autorizadas para su ejecución, sin que a la fecha se tenga respuesta alguna.

Como plan de contingencia para no incurrir en atrasos de obra por no tener autorización de realizar actividades no previstas en el desarrollo del capitulo de demoliciones, se aplicó la técnica de compresión del cronograma conocida como "Fast Tracking" al capítulo de cimentación. Previamente validado los diseños de cimentación y despiece de aceros de sus elementos, desde el mes anterior se realizo pedido de acero de refuerzo para la cimentación de los dos escenarios multipropósito. Esta actividad debía iniciar el día 7 de septiembre con excavaciones y 12 de septiembre con solados. Actualmente se lograron iniciar a partir del 17 de agosto del presente año.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

Pista de Patinaje

- **Demoliciones y preliminares**

En cuanto al ítem de preliminares de la pista de patinaje, su ejecución va ser truncada porque existen mayores cantidades de obra en demoliciones de concreto reforzado en los coliseos menores y en la misma pista que no se podrán realizar hasta tanto haya aprobación por parte de la interventoría o entidad. Entre estas tenemos las placas de contrapiso, el muro de contención en concreto simple, desmonte de mástiles, lámparas y tala de árboles.

Se realizo en el presente mes el levantamiento topográfico de las edificaciones existentes dentro del entorno de la pista de patinaje, así como los linderos actuales y se encuentra en rediseño el sistema de Aguas lluvias de las dos pistas.

Se evidencia según levantamiento topográfico que el muro de contención que rodea el 60% de la pista de ruta, va a tener una altura variable de pantalla según las cotas de terminado del urbanismo, siendo necesario rediseñar el muro para diferentes tipos de altura libre sobre nivel de urbanismo, así: 0.50m, 1.00m y 1.50m.

Se realizo revisión del diseño eléctrico encontrando que requiere ajustes en la iluminación de las pistas para dar cumplimiento a las recomendaciones dadas por la Federación Colombiana de Patinaje-FEDEPATIN. Adicional a esto, se indico en diseños iniciales el suministro e instalación de tableros de acometidas generales y planta de generación de energía, los cuales irían en el cuarto técnico construido para el transformador de la subestacion 3, colindante con el escenario de softbol. Según revisión de las instalaciones, el cuarto no cumple con el espacio suficiente para albergar todos los tableros y equipos que se requieren para el contrato. Por tal motivo se tiene que rediseñar un nuevo espacio donde se pueda incluirlos. Este diseño arquitectónico y estructural esta siendo asumido por el consorcio ya que el diseño inicial no los contempla. Se debe analizar si esta futura edificación requiere un nuevo tramite de licenciamiento o esta incluida en la licencia actual.

Pista de atletismo

- **Diseño pista de atletismo**

Se realizan actividades de levantamiento topográfico y se replantea en dibujo la geometría de la pista propuesta en los estudios y diseños encontrándose que la diseñada excede la longitud total en 412.24m. Por lo tanto, se requiere rediseñar la geometría y ajustarla a las tolerancias exigidas por la World Athletics (400.04m). Por otro lado, la entidad manifiesta el interés de cambiar la especificación del acabado final de la pista, por el sistema prefabricado, debido a las solicitudes presentadas por la liga de atletismo del Meta y sus deportistas. Esto implica que el nuevo proveedor entregue la geometría final para que sea certificable. El consorcio está a la espera de que la entidad defina y apruebe el cambio de superficie.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

- **Redes hidrosanitarias existentes**
  Se realiza levantamiento topográfico, de las redes del sistema de riego y desagüe de la cancha de futbol, con el fin de rediseñar los nuevos tramos de descole de las aguas lluvias del sumidero perimetral de la pista de atletismo junto con los desagües de las otras disciplinas como son Ria, salto con pértiga y salto largo.

  El proveedor Mondo envía un plano estándar de la geometría de la pista de atletismo que mejor se adapta al área real del proyecto. Se realizo implantación en la topografía realizada y se evidencio que ésta es mas pequeña lo que hace que los sumideros sobre la zona oriental y occidental queden por dentro del área actual de la cancha de futbol en 60cm contados a partir del bordillo existente que la confina. De igual forma en la parte Norte y Sur, las lunas se reducen en área siendo necesario eliminar del diseño dos de las cuatro pistas para salto con pértiga. En cuanto al tema hidráulico, se hace necesario trasladar hacia el interior la red de suministro de agua junto con el sistema de riego para la cancha de futbol (1.00m aprox.).
  De las redes de aguas lluvias se presenta interferencia en la zona sur con la tubería de 12" que recoge el desagüe de la cancha de futbol. Se recomienda trasladar este tramo mas hacia el interior, justo detrás de la zona de arco de futbol.

  Todas estas observaciones están siendo revisadas por el personal profesional hidráulico del consorcio con el fin de presentar una propuesta de solución a cada una de ellas.

4. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia en jornada laboral

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	0
TORMENTA	0
LLUVIOSO	7
SOLEADO	24

OBSERVACIONES:
Los días 4, 8, 12, 22, y 30 de agosto se presentaron fuertes lluvias en horas de la noche y el día 30 de agosto se presentaron fuertes lluvias en horas de la madrugada.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

Conceptuar acerca de la adecuada o inadecuada aplicación de los métodos constructivos o actividades desarrolladas para la entrega de los productos

PROYECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO:

- Se finaliza la demolición de placas de contrapiso, la cual no se había realizado para facilitar la movilidad de la maquinaria tipo PH, camión grúa y manlif. El primer escenario a demoler placas de contrapiso fue el coliseo de Voleibol y se termino con el coliseo de gimnasia. Para ello se empleo excavadora sobre orugas con martillo hidráulico para las demoliciones y excavadora sobre orugas con valde para el cargue a su sitio de acopio.

- En las demoliciones de cimientos enterrados que se finaliza la cantidad contractual en este periodo, se tuvo que emplear excavadora sobre orugas para realizar la excavación necesaria para descubrir el cimiento enterrado (pedestal, zapata, viga de cimentación, ciclópeos) posteriormente se demuele el cimiento enterrado con excavadora sobre orugas con martillo hidráulico y se realiza el retiro de la demolición al sitio de acopio para su traslado al sitio de disposición final.

- Se inicia la fase de cimentación del escenario multipropósito 2 (32mx60m) ubicado en la esquina Nor-Oriental del predio. De acuerdo a lo manifestado en comités anteriores, la diferencia de niveles en los extremos de cada escenario hace que las profundidades de cada elemento aislado de cimentación sean variables entre -2.0m y -0.65m con relación al nivel arquitectónico definido en los estudios y diseños. Para garantizar que la cimentación pueda transmitir las cargas al nivel del suelo definido en los estudios de suelos, se solicitó concepto técnico del geotecnista con el fin de determinar cuál sería el relleno mínimo bajo aquellas zapatas que, por su nivel topográfico, su cota de cimentación no quedaría a 2m de profundidad del terreno natural. De este análisis se determinó que, para aquellos casos, será necesario instalar por lo menos 1.0m de relleno seleccionado por debajo del nivel de zapatas.

- Se realizó así, el inicio de las excavaciones de cimentación de manera mecánica mediante el uso de excavadora sobre orugas. El material sobrante de excavación por ser arcillas arenosas de baja plasticidad, con trazos de limos, no es recomendable para dar confinamiento a la cimentación, por lo tanto, es retirada de obra y una vez fundidos los elementos de concreto serán rellenados con material seleccionado de rio T.M. 2".

- De igual forma, las excavaciones producto de las demoliciones de los cimientos enterrados fueron rellenadas con material seleccionado de rio T.M. 2" para evitar fallas en el terreno y

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

posibles interferencias con las cimentaciones de los nuevos escenarios y la pista de patinaje.

- Una vez se realizan los rellenos seleccionados de rio hasta la cota de cimentación, se procede a cubrirlos con el concreto para solados. Sobre esta superficie se realiza la localización y replanteo topográfica de las zapatas y pedestales para el armado de las parillas de acero de refuerzo de los mismos.

- Se viene implementando el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de acuerdo a los ajustes realizados en el documento y presupuesto, El consorcio con el apoyo de su profesional ambiental viene realizando las actividades programadas en el mes.

PROYECTO PISTA DE PATINAJE:

- Se realiza replanteo topográfico del muro de contención de la pista de patinaje de ruta para verificar posibles interferencias con edificaciones y redes existentes. Se evidencia 3 puntos críticos como son, graderías de cancha auxiliar, edificio administrativo de Idermeta y lindero con parqueadero publico sector sur-oriental.

- Se terminan las actividades de demoliciones de muros de contención y de realiza acopio para su retiro y disposición final. Se realizo la actividad con excavadora sobre orugas con martillo hidráulico y el cargue con excavadora sobre orugas con valde.

- Se viene implementando el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de acuerdo a los ajustes realizados en el documento y presupuesto, El consorcio con el apoyo de su profesional ambiental viene realizando las actividades programadas en el mes.

PROYECTO PISTA DE ATLETISMO:

- Se termina el transporte de escombros producto de las demoliciones de bordillos de la antigua pista de atletismo, hasta su sitio de disposición final de escombros.

- Se inicia el replanteo topográfico de la nueva pista de atletismo de acuerdo al nuevo diseño estándar suministrado por Mondo. Se esta a la espera de los diseños definitivos para dar cumplimiento a las especificaciones de certificación de pista de atletismo Clase 2.

- Se viene implementando el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de acuerdo a los ajustes realizados en el documento y presupuesto, El consorcio con el apoyo de su profesional ambiental viene realizando las actividades programadas en el mes.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Análisis granulométrico del suelo por tamizado	22-08-2023	INV-E-213-13
Peso específico y absorción de agregados P.E.A y BS	22-08-2023	INV-E-223-13
Relación de humedad-masa unitaria seca en los suelos (ensayo modificado de compactación)	22-08-2023	INV-E-142-13
Diseño de mezclas para concretos elaborados en obra: 2000 psi, 3000 psi, 3500 psi y 4000 psi.	18-08-2023	
Análisis granulométrico de los agregados finos	18-08-2023	INV-E-213-13
Determinación de la cantidad de material que pasa por el tamiz de 75µm (No.200) en los agregados pétreos mediante lavado	18-08-2023	INV-E-214-13
Análisis granulométrico de los agregados gruesos	18-08-2023	INV-E-213-13
Determinación en el laboratorio del contenido de agua (Humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo-agregado	18-08-2023	INV-E-122-13

Durante la ejecución del presente informe se realizaron pruebas para determinar:

- El Proctor modificado del material granular seleccionado de rio T.M. 2" que se empleara en los rellenos de cementación y excavaciones abiertas producto de las demoliciones. Los resultados se adjuntan en el presente informe.

- Diseño de mezclas para concretos elaborados en obra en las resistencias de: 2000 psi, 3000 psi, 3500 psi y 4000 psi. Los resultados se adjuntan en el presente informe.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACION /ACCIÓN
1/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. *IMPLEMENTACIÓN DE INSPECIÓN DE ARNES DE SEGURIDAD. *IMPLEMENTACIÓN DE FORMATO PLAN DE IZAJE. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ELABORACIÓN INFORME MENSUAL. * VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES.	
2/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. * VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CARGUE METALREC. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES. * ACOMPAÑAMIENTO RETIRO DE MATERIAL DEMOLICIÓN.	
3/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * RETIRO DE MATERIAL DEMOLICIÓN - ESTRUCTURA. *AREGLO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL. * RADICACIÓN DE AFILIACIONES.	
4/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * SEÑALIZACIÓN AREA DE CARGUE RETIRO DE TAPETE ATLETISMO. * ORDEN Y ASEO AREA DE CARGUE. *ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE DEMOSTE EN PISTA DE PATINAJE.	
5/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS.	
8/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	
9/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONSORCIO. *ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDAD DE DESCARGUE DE HIERRO PARA PEDESTALES.	

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACION /ACCIÓN
10/08/2023	*CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN BRIGADAS DE EMERGENCIAS. *CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. *ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE TALA. * ACOMPAÑAMIENTO RETIRO DE MATERIALES DE DESMONTE POR LA ENTIDAD.	
11/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE INGRESO Y VISITA PREVIA PARA INICIO DE NUEVAS ACTIVIDADES. * SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN DE AREAS.	
12/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	
14/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	
15/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	
16/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	
17/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * SE ACTIVA PLAN DE EMERGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES.	
18/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * VERIFICACION DE FALLAS O DAÑOS ESTRUCTURALES POR FENOMENOS NATURALES. *ADECUACION DE NUEVOS CAMPAMENTOS.	
19/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	
22/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

3082

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
23/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS FCC. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	
24/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * MOVIMIENTO DE MAQUINA MINI DE ESCENARIOS A PISTAS DE ATLETISMO PARA CARGUE Y RETIRO SE SHOPACK. * ORDEN Y ASEO PISTA DE ATLETISMO. *INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA Y DEMARCACIÓN DE AREAS.	
25/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS FCC. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * AREGLO DE CERRAMIENTO.	
26/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	
28/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA NUEVA PARA DEMOLICIONES.	
29/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. *REINICIO DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIONES. ** INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA NUEVA PARA EXCAVACIONES.	
30/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA. * LIQUIDACION DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.	
31/08/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA. * ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL. *AFILIACIONES DE PERSONAL NUEVO. *INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA Y DEMARCACIÓN DE AREAS.	

Anexo: Formato 112-ECP-FR-015-FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACION / ACCION
ESCENARIOS DEPORTIVOS	En el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades con respecto al área ambiental: 1. Se continuó con el retiro de residuos ordinarios (Poliuretano) generados por la actividad de desmonte de estructura de los escenarios deportivos. 2. Se realizan actividades de orden y aseo en el área de trabajo y entradas a la obra (entrada de volquetas y entrada personal). 3. Los residuos ordinarios se sacan 3 veces por semana a la entrada de las volquetas para que la empresa prestadora del servicio público los retire y realice disposición final en el relleno sanitario del municipio. 4. Cubrimiento de acopios temporales de agregados pétreos. 5. Las unidades sanitarias instaladas en el frente de obra son limpiadas dos veces por semana, se instalan los elementos necesarios para su uso. 6. Inicio de disposición final de RCDs. 7. Se realiza el retiro de los residuos vegetales derivados de la tala mecánica de individuos arbóreos el en el mes de julio; igualmente se retira raíz encontrada en el	N/A

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
	área para su adecuada disposición final.	
PISTA DE PATINAJE	En pista de patinaje se realizó disposición de RCDs en lugar autorizado para su adecuada disposición final (ZODME guatiquia).	N/A
PIESTA DE ATLETISMO	Se realizó disposición final de residuos ordinarios (Shock Pad).	N/A

Anexo: Formato GES-FO-34 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN PMA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
OLIVERIO GOMEZ RIOS	DIRECTOR DE PROYECTOS	100%
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	50%
LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	100%
ZUNEILE PAOLA BOTELLO	PROFESIONAL SST	50%
ADRIANA PAOLA FARFAN	ARQUITECTA PAISAJISTA	30%
CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO	INSPECTOR DE OBRA	100%
CARLOS ANDRES CAICEDO CASTAÑO	INSPECTOR DE OBRA	100%
CAMILO ANDRES FUENTES CARRILLO	INSPECTOR DE OBRA	100%
THERLY YANINY CONTRERAS PEÑA	ING AMBIENTAL	100%
VERONICA STEFANIA CABARCA LIZCA	INSPECTOR SST	100%
JUAN ANTONIO BARBOSA MAYORCA	TOPOGRAFO	100%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACION DE PERSONAL OBRA

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°: 9456283307 – CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS.

De acuerdo al listado de contratistas reportado por el consorciado ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS, se relacionan las siguientes planillas de pago:

Se presenta planilla de pago N°: 1057410866 – CONSORCIO ESCENARIOS - OPERADOR.
Se presenta planilla de pago N°: 9456084629 – WILSON CARDENAS OPERADOR.
Se presenta planilla de pago N°: 9456084909 – WILSON CARDENAS.
Se presenta planilla de pago N°: 9455739216 – WILSON CARDENAS OPERADOR JAVIER MONROY.
Se presenta planilla de pago N°: 1056492210– WILSON CARDENAS OPERADOR JEFFERSON SPIBEN PINEDA.
Se presenta planilla de pago N°: 65763893 – FCC IN BLAU.
Se presenta planilla de pago N°: 65763893 – FCC IN BLAU - CORRECCIÓN.

La siguiente corresponde a los contratistas vinculados por el CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.

Se presenta planilla de pago N°: 9455450347 – JUAN ANTONIO BARBOSA.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

Anexo: Formato 112-ECP-FR-021-V01-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

3. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	41
Empleos directos generados:	19
Empleos indirectos generados:	22

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	2
Etaria (Edad)	20 a 59 años	49
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	3
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	2
Grupos étnicos	Población Raizal	1
Género	Masculino	44
Género	Femenino	6
Población Vulnerable	Desplazados	6
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		**113**

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el periodo del presente informe no se han realizado prorrogas, suspensiones o reinicios al contrato de obra.

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el periodo del presente informe no se han realizado adicionales al contrato de obra.

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el periodo del presente informe no se han realizado modificaciones al contrato de obra.

2. GARANTIAS:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-81241317-1
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-81327904-1
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	10 DE ABRIL DE 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23-02-2023	23-06-2024	$ 10.174.388.168,40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	23-02-2023	23-06-2024	$ 15.261.582.252,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23-02-2023	23-02-2027	$ 2.543.597.042,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	23-02-2024	23-02-2029	$ 15.261.582.252,60
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23-02-2023	23-02-2024	$ 2.543.597.042,10
DAÑO MORAL	23-02-2023	23-02-2024	$ 2.543.597.042,10
LUCRO CESANTE	23-02-2023	23-02-2024	$ 2.543.597.042,10

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-81241317-1
ANEXO N°	01
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-81327904-1
ANEXO N°	01
COMPAÑIA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10-05-2023	09-09-2024	$ 10.174.388.168,40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10-05-2023	09-09-2024	$ 15.261.582.252,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10-05-2023	09-05-2027	$ 2.543.597.042,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	09-05-2023	09-05-2029	$ 15.261.582.252,60
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23-02-2023	09-05-2024	$ 2.543.597.042,10
DAÑO MORAL	23-02-2023	09-05-2024	$ 2.543.597.042,10
LUCRO CESANTE	23-02-2023	09-05-2024	$ 2.543.597.042,10

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES							

Durante el periodo del presente informe no se han realizado pagos parciales al contratista.

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *01-08-2023 AL 31-08-2023*

Avance físico ejecutado 2.74% y avance financiero ejecutado 30%.

El avance financiero ejecutado corresponde al desembolso de anticipo del 30% del presupuesto de obra el cual fue realizado por la entidad el día 22 de junio de 2023. Se realizaron 2 órdenes de operación durante este periodo las cuales se relacionan a continuación:

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR PAGO
ORDEN DE GIRO 1	07-JUL-23	Anticipo Contrato No.01- Organización Terracanto SAS	$ 3.206.552.830,72
ORDEN DE GIRO 2	31-JUL-23	Corte parcial 1 Contrato No.01- Organización Terracanto SAS	$ 289.205.761,34
ORDEN DE GIRO 3	16-AGOS-23	Anticipo Contrato No.04- Industrias del Hierro SAS	$ 3.598.852.877,00
ORDEN DE GIRO 4	14-AGOS-23	Anticipo Contrato No.06- Organización Terracanto SAS	$ 1.053.857.052,24

Se anexa formato GES-FO-43 Informe Plan de Inversión Anticipo de Obra.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	LOCALIZACION. TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.	1120,00	17,4%





OBSERVACIONES
Se realiza localización y replanteo para el nuevo escenario multipropósito 2, localizado en la esquina Nor-Oriental del predio.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	**EJECUTADO**	**%**
	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	438,22	89,9%





OBSERVACIONES
Se realiza la demolición de placas de contrapiso en concreto reforzado mediante maquinaria pesada tipo excavadora sobre orugas con martillo hidráulico.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	332,05	100,0%





OBSERVACIONES
Se realiza la demolición de cimientos enterrados (zapatas, pedestales, vigas de cimentación y ciclópeos) mediante maquinaria pesada tipo excavadora sobre orugas con martillo hidráulico.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

3093

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	1.077,04	22,8%





OBSERVACIONES

Se realiza la actividad de excavación mecánica para destapar los cimientos enterrados que son necesarios demoler y para las excavaciones de la cimentación del escenario 2 (32m x 60m).

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

3094

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	95,80	1,8%





OBSERVACIONES

Se realiza mejoramiento de la cimentación con relleno seleccionado de rio T.M. 2" bajo zapatas aisladas entre 0.30m a 1.0m según profundidad de excavación sobre suelo natural.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	6,10	13,0%





OBSERVACIONES
Se instalan solados en concreto simple de 2000 psi bajo zapatas, vigas de cimentación y contrapesos, según estudios y diseños.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	2.912,30	5,7%





OBSERVACIONES
Se inicia amarre de acero figurado para elementos de zapatas y pedestales del escenario multipropósito 2 (32m x 60m).

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE	EJECUTADO	%
	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	0,04	0,02%





OBSERVACIONES
Se realiza ajuste a la cantidad final de demolición de pavimento asfaltico de la pista de ruta existente.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE	EJECUTADO	%
	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	160,83	43,4%





OBSERVACIONES

Se terminan las demoliciones en concreto reforzado de las graderías y cimentación, y muros de contención zona Sur.


Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE	EJECUTADO	%
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	6.000,00	41,5%





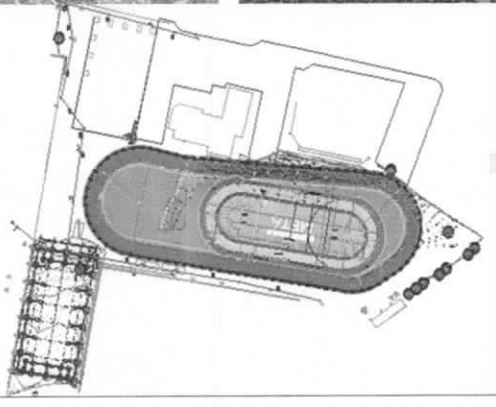



OBSERVACIONES
Se terminan las demoliciones en concreto reforzado de las graderías y cimentación, y muros de contención zona Sur.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE	EJECUTADO	%
	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	221,72	14,2%

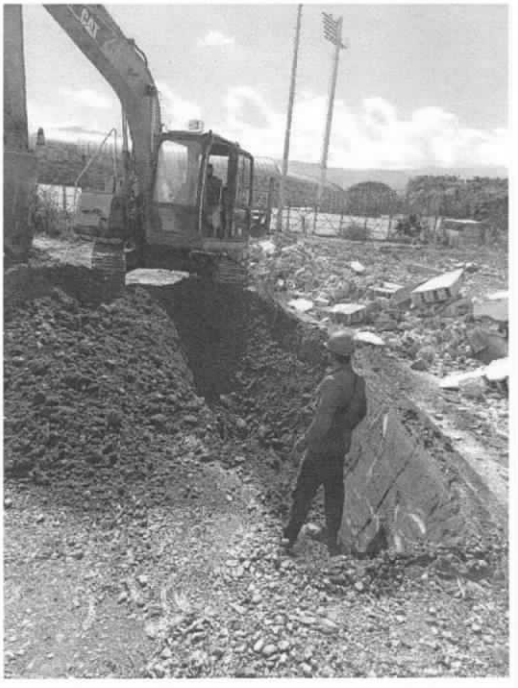

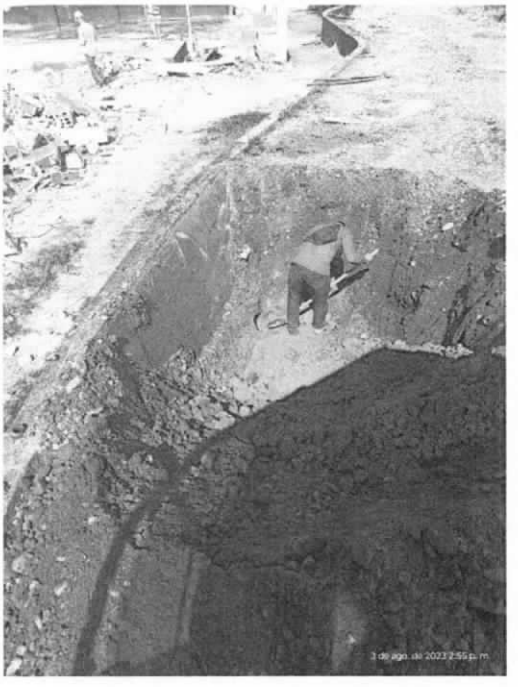

OBSERVACIONES
Se realiza excavación mecánica para la demolición del muro de contención de la pista de ruta existente.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO	EJECUTADO	%
	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	0,19	0,6%





OBSERVACIONES
Se realiza la demolición de los bordillos existentes de la antigua pista de atletismo dentro del estadio Bello Horizonte Rey Pele.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

6. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- De acuerdo al seguimiento mensual realizado a la fecha de corte del presente informe, se presenta un porcentaje de avance ejecutado por debajo de lo programado. En proyecto de escenarios deportivos se lleva un avance mayor a lo planeado, gracias al adelanto que se realizó a la construcción de la cimentación del primer escenario multipropósito. Se debe realizar modificación de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos de actividades que se requieren para dar terminación a las demoliciones y continuidad a la cimentación de los escenarios.

- En el proyecto de pista de patinaje, se presenta un porcentaje de avance por debajo de lo programado. Se debe realizar modificación de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos de actividades que se requieren para dar terminación a las demoliciones, entre estas el muro de contención de la pista de patinaje, el cual es en concreto simple y no concreto reforzado. Se realiza levantamiento topográfico de la nueva pista la cual requiere ajustes en su geometría debido a la interferencia con las graderías de la cancha auxiliar, el edificio administrativo y parqueadero de Idermeta y el lindero con el parqueadero público en la zona sur oriental del predio.

- En el proyecto de pista de atletismo, se presenta un porcentaje de avance por debajo de lo programado. Se debe realizar modificación de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos de actividades que se requieren para dar terminación a las actividades preliminares, entre este retiro de grama sintética. Se realizan mesas técnicas a solicitud de la entidad para definir el acabado de la superficie final de la pista de atletismo de acuerdo a las solicitudes realizadas por la liga de atletismo y sus deportistas. Se evidencia que la geometría de la pista de atletismo es mas grande y no esta acorde a los requerimientos técnicos de la World Athletic. Se recibe nueva geometría por parte del proveedor de acabado prefabricado de la pista-Mondo, como parte de su acompañamiento para futura certificación de la misma. En esta nueva geometría se evidencia que en la luna Norte se debe reducir a 2 los escenarios de salto con pértiga, el sumidero perimetral de la pista debe intervenir por lo menos 0.60m hacia el interior de la actual cancha de futbol, el sistema de riego actual debe ser trasladado por lo menos 1.0m hacia el interior de la cancha de futbol, y las dimensiones de la cancha de futbol se verán reducidas a 64m x 105m, sin dejar de ser reglamentaria para partidos internacionales. Todos estos imprevistos encontrados con la nueva planimetría hacen necesario realizar modificación de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos para continuar con su ejecución.

- El consorcio se encuentra realizando la verificación y/o actualización de los diseños Eléctricos, hidrosanitarios y RCI, de los diferentes escenarios con el fin de adaptarlos a las condiciones reales del predio y sus necesidades.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

H. ANEXOS

En el presente informe contiene los siguientes soportes documentales:

- Copia de la bitácora de la obra o de las actividades desarrolladas.
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Actas de comité
- Presupuesto de actividades ejecutadas en el mes
- Avance Físico: Programado vs Ejecutado
- Control de calidad
- Estado del tiempo
- Informe de Anticipo
- Informe PMT
- Informe SST
- Informe de Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 10 días del mes septiembre del 2023.

Firma

Nombre: YEISON E. GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:25202-090820 CND

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional:25202-132229CND

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

5104

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

BITACORA DE OBRA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

5105

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	1	8	2023	7:00am	G B B

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLÁ OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		LLUVIAS en la tarde DESDE LAS 1:00 pm hasta las 2:30 pm.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias	1,5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA						
OFICIAL	1					
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	2	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.11	M3	DEM. CIMIENTO ENTERRADO	55.35	SI	SI
A.2.9	M3	DEMOL. ANDENES Y PLACAS	54.76	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

5106

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	2	8	2023	7:00am	05:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA						
OFICIAL	1					
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	2	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
C.1.2	M3	DEM. PLACAS Y ANDENES	0.19	SI	SI
C.2.3	VJ	TRANSPORTE ESCOMBROS	6.00	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
REPARACION TUBO 4"	SE HACE LA REPARACION DE LA TUBERIA DE 4" PERTENECIENTE A LA RED PRIMARIA QUE SUMINISTRA EL AGUA A IDERMETA, SE COLOCA TAPON E UNION DE REPARACION.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

5107

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	3	8	2023	7:00am	05:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA						
OFIQIAL	1					
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	2	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.11	M3	DEM. CIMIENTO ENTERRADO	55.34	SI	SI
A.2.9	M3	DEMOL. ANDENES Y PLACAS	54.78	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

5108

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	4	8	2023	7:00am	05:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			LLUVIAS DE 7:30 AM. A 8:00 AM
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	1.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	1	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	3	X				
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	4	X	RESIDENTES			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.9	M3	DEMOL. ANDENES Y PLACAS	54.78	SI	SI
B.2.2	M3	EXCAVACION	44.34	SI	SI
B.1.3	M3	DEMOL. PAVIMENTO	0.04	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	5	8	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		Lluvia de 7:00 am a 12:00 m
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	1	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	2	X				
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
B.2.2	M3	EXCAVACION	44.36	SI	SI
B.1.4	M3	DEMOL. CONCRETO REFRORZADO	40.20	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

5110

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	8	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Lluvia de 4:00 pm a 5:00 pm
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias	1HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	2	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.9	M3	DEMOL. ANDENES Y PLACAS	54.78	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	9	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	2	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
C.2.3	VJ	TRANSPORTE ESCOMBROS	2.00	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	2	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
B.1.4	M3	DEMOL. CONCRETO REFRORZADO	40.21	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	2	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
B.2.2	M3	EXCAVACION	44.34	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	12	8	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			lluvia de 9:00 am a 12:00m
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	3 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	1	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	2	X				
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
B.1.4	M3	DEMOL. CONCRETO REFRORZADO	40.21	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	3	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
B.2.2	M3	EXCAVACION	44.34	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200860038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

5116

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	4	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
B.2.2	M3	EXCAVACION	44.34	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	4	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOL. MAMPOSTERIA	2.78	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	17	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	4	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.9	M3	DEMOL. ANDENES Y PLACAS	54.78	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DE 8:00 AM A 1:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL		X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	5	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.9	M3	DEMOL. ANDENES Y PLACAS	54.78	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

5120

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	19	8	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL		X				
OPERARIO	1	X				
AYUDANTE	3	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.9	M3	DEMOL. ANDENES Y PLACAS	54.78	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	5	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	11	X		EXCAVADORA	4	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.11	M3	DEM. CIMIENTO ENTERRADO	55.34	SI	SI
A.2.9	M3	DEMOL. ANDENES Y PLACAS	54.78	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
REPARACION TUBO 4"	SE HACE LA REPARACION DE LA TUBERIA DE 4" PERTENECIENTE A LA RED PRIMARIA QUE SUMINISTRA EL AGUA A IDERMETA, SE COLOCA TAPON E UNION DE REPARACION.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	5	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	18	X		EXCAVADORA	4	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.11	M3	DEM. CIMIENTO ENTERRADO	55.34	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
REPARACION TUBO 4"	SE HACE LA REPARACION DE LA TUBERIA DE 4" PERTENECIENTE A LA RED PRIMARIA QUE SUMINISTRA EL AGUA A IDERMETA, SE INSTALA CODO PARA CAMBIAR DIRECCION.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otres entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	24	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	5	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	20	X		EXCAVADORA	4	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	179.51	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
REPARACION TUBO 4"	SE HACE LA REPARACION DE LA TUBERIA DE 4" PERTENECIENTE A LA RED PRIMARIA QUE SUMINISTRA EL AGUA A IDERMETA, SE INSTALA CODO Y DOS SEMICODOS PARA CAMBIAR DIRECCION.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088003863O	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

5124

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	25	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	5	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	20	X		EXCAVADORA	4	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
B.1.4	M3	DEMOL. CONCRETO REFRORZADO	40.21	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	179.51	SI	SI
A.4.6	KG	ACERO REFUERZO	728.08	SI	SI
A.3.2	M3	RELLENO SELEC. 2"	19.16	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	26	8	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	5	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	19	X		EXCAVADORA	4	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	179.49	SI	SI
A.3.2	M3	RELLENO SELEC. 2"	19.16	SI	SI
A.4.1	M3	SOLADO	2.03	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

5126

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	28	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			LLUVIA DESDE LAS 10:30 AM HASTA 11:30 AM
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	1 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	6	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	16	X		EXCAVADORA	5	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.11	M3	DEM. CIMIENTO ENTERRADO	55.34	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	179.51	SI	SI
A.4.6	KG	ACERO REFUERZO	728.08	SI	SI
A.3.2	M3	RELLENO SELEC. 2"	19.16	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	29	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	5	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	18	X		EXCAVADORA	4	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	179.51	SI	SI
A.4.6	KG	ACERO REFUERZO	728.08	SI	SI
A.3.2	M3	RELLENO SELEC. 2"	19.16	SI	SI
A.4.1	M3	SOLADO	2.03	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	5	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	18	X		EXCAVADORA	4	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	179.51	SI	SI
A.4.6	KG	ACERO REFUERZO	728.06	SI	SI
A.3.2	M3	RELLENO SELEC. 2"	19.16	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	31	8	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			LLUVIAS DESDE 3:30 PM HASTA LAS 5:00 PM
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	1.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	5	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTE	18	X		EXCAVADORA	4	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	5	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.11	M3	DEM. CIMIENTO ENTERRADO	55.34	SI	SI
A.1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	44.80	SI	SI
B.2.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	240.00	SI	SI
A.4.1	M3	SOLADO	2.04	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
31 de agosto de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

5130

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia


AL SERVICIO DE LA GENTE

5131

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 02 de agosto del 2023

CEDVO-58-2023



Señores
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO
Attn. Ing Adolfo Rodriguez Iriarte
Director de planeación y prospectiva
Calle 37A# 19C-26 Barrio Jordan-Paraiso
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Solicitud copia plano por medio de cual se aprobó el PMT

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito realizar una solicitud para la expedición de una copia sellada y firmada del plano por el cual se aprobó el plan de movilidad y transito (PMT) del contrato en referencia; el cual fue aprobado mediante resolución Acta N° 1703-19.180680.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

Villavicencio, 09 de agosto del 2023

CEDVO-59-2023

09-08-2023
11:24 am.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Respuesta a su oficio OF-C249 -2023-105

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar a la interventoría sean tenidas en cuenta las siguientes consideraciones a lo expuesto en su oficio así:

- Las actividades de demoliciones que se vienen realizando para el proyecto de escenarios multipropósito y pista de patinaje, son actividades de alto riesgo en los cuales no recomendamos realizarlas de forma manual. Solo queda por demoler un pórtico del coliseo de boxeo y por ser de gran altura se requiere de maquinaria pesada para su ejecución. Esta actividad se venia realizando con una excavadora con martillo, pero por compromisos anteriores del propietario tuvo que ser retirada de la obra para realizar la demolición del puente vehicular sobre el parque infantil en el municipio de Villavicencio. Se ha tratado por todos los medios de conseguir otra maquinaria para continuar con las demoliciones, pero el cierre y posterior paso restringido de la vía Bogotá-Villavicencio a impedido que encontremos una disponible tanto local como en la ciudad de Bogotá, ya que en esta última se encuentran ejecutando grandes obras para la construcción del metro y ampliación de las vías de Transmilenio que requieren de este tipo de maquinaria.

- Sin embargo, se logró un acuerdo con la única maquina disponible en Villavicencio, para que el próximo sábado 12 de agosto reinicie labores nuevamente en obra. Según programación de obra la actividad de demolición de concreto reforzado tiene fecha de terminación para el 22 de agosto, tiempo suficiente para poner al día la programación.

- También es de aclarar que hay actividades que aun no han sido autorizadas por interventoría y entidad que están marcando atraso significativo como lo es el desmonte de la cubierta metálica tipo sándwich y la estructura metálica de polideportivo que según el levantamiento realizado y cuantificado sobrepasa el 347% de la cantidad contractual, por tal motivo fue que al inicio del contrato se presentaron los respectivos análisis de precios unitarios de las actividades no previstas con el fin de que fueran autorizadas para su ejecución, sin que a la fecha se tenga respuesta alguna.

- En cuanto a las actividades de demolición en la pista de patinaje, me permito informar que el ítem de demolición mecánica de placas, andenes, sardineles en concreto reforzado llego a su cantidad final contratada desde el mes de junio, siendo necesario la autorización por parte de interventoría o entidad para continuar con su ejecución en los andenes perimetrales solicitado en su oficio. Del capítulo de demoliciones resta la demolición de concreto reforzado los cuales van a ser realizados por la maquina contratada para la siguiente semana.

- En cuanto al ítem de preliminares de la pista de patinaje, su ejecución va ser truncada porque existen mayores cantidades de obra en demoliciones de concreto reforzado en los coliseos menores que no se podrán realizar hasta tanto haya aprobación por parte de la interventoría o entidad.

- Para el proyecto de pista de atletismo, a pesar de hacer la entrega tardía del escenario, ya se realizaron las actividades de demolición de bordillos existente, y estamos a la espera de que la entidad defina el tipo de pista a realizar, pues la actual no cumple con las medidas reglamentarias para su certificación. Una vez se defina la geometría final el consorcio realizara ajustes a la programación para su seguimiento y control.

- Si bien es cierto, existe un retraso según la programación para el mes de julio, en su mayoría dependen de la aprobación para la ejecución de mayores cantidades de obra e ítems no previstos que no fueron bien cuantificados o identificados en la etapa de consultoría.

- Así pues, la implementación de cuadrillas de personal de obra no es viable para las actividades en ejecución, pero si es viable el ingreso de maquinaria como la realizada el pasado 31de julio para continuar con las demoliciones menores y la programada para el 12 de agosto.

- Por otro lado, solicitamos se confirme si la interventoría autoriza el retiro de escombros como lo indica en su oficio, ya que esta actividad no esta contemplada en el contrato y forma parte de la solicitud realizada para aprobación.

- Con relación a las actividades de excavaciones, rellenos y construcción de filtros de la pista de atletismo, es de conocimiento en comités anteriores que no existe claridad en el cumplimiento de la geometría de la pista, que aun no se define el

sistema de acabado de la misma por parte de la entidad y que hay afectaciones al sistema de drenaje, riego y automatización, y área de grama natural de la actual cancha de futbol, con la nueva geometría propuesta por el proveedor de Mondo que aun no ha sido resuelta por la entidad.

Por último, el consorcio está y estará siempre en la disposición de implementar las cuadrillas y maquinaria que se requiera para disminuir cualquier atraso sea atribuible o no al contratista con el animo de llevar a feliz término el contrato. Es así como antes de lo programado ya se tiene programado iniciar este mes con la cimentación de los escenarios multipropósito para lo cual ya contamos con el acero de refuerzo figurado en el sitio de obra a partir de esta semana.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

5135

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 03 de agosto del 2023

CEDVO-060-2023

Señores
CURADURIA URBANA 2 VILLAVICENCIO
Municipio de Villavicencio.
Cuidad

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: **Concepto uso de suelo.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en razón al asunto en mención me permito solicitar el certificado de uso del suelo de los predios donde se desarrolla las actividades de obra de la referencia, para esto a continuación relaciono los datos de dicho predio.

Lote de terreno ubicado en el sector de la villa olímpica en una extensión 114.792.77 m2
Cedula Catastral: 50001-010402750001000
Matricula Inmobiliaria: 230-11523
Dirección Inmueble: Calle 24b #11-199 sector villa olímpica

Cordialmente,

CURADURÍA URBANA SEGUNDA
RADICACIÓN
Radicación No.: 23-2265
Fecha: 03-AGO-23 Hora: 15:10
Firma:

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

Villavicencio, 02 de agosto del 2023

CEDVO-061-2023

IDERMETA
NIT 8220025106
02 AGO 2023
Rad No. 2305
Hora 3:40 Firma

Dra.
BIBIANA PAN MERCHAN
Jefe oficina de planeación y asuntos Administrativos
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Programación partidos

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar la siguiente información, dado que mediante el correo del 25 de julio de consecutivo PL-120-362, recibimos la programación de los partidos que se realizaran en el Estadio Bello Horizonte "Rey Pele", sin embargo, teniendo en cuenta el contrato en referencia actualmente se realizan labores de obra civil para la construcción de la pista de atletismo, comedidamente solicito informar:

1. Sobre la modalidad de los eventos con o sin aforo de público, dado el caso indicar si se deben tomar medidas de seguridad o si es requerido el desalojo del escenario deportivo.

2. Indicar si estos eventos serán transmitidos en vivo, en caso afirmativo indicarnos si se requiere algún tipo de medida especial o el retiro total de la maquinara que se encuentra en la pista de atletismo.

5137

3. Solicitamos también designar e informar la persona encargada a la cual se le debe hacer entregar las instalaciones del área donde se esta trabajando.

Lo anterior es con la finalidad de programar actividades respectivas según sea requerido.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
C.C. interventoría - consorcio interescenarios

5138

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 02 de agosto del 2023

CEDVO-062-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA COPIA OFICIO CEDVO-061-2023 RADICADO IDERMETA

Cordial saludo,

De manera atenta me permito enviar copia del oficio CEDVO-061-2023 radicado en Idermeta.

Cordialmente,

RECIBIDO 02 AGO 2023
Hecto. Gómez

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

5139

Villavicencio, 02 de agosto del 2023

CEDVO-061-2023

Dra.
BIBIANA PAN MERCHAN
Jefe oficina de planeación y asuntos Administrativos
Villavicencio-Meta

IDERMETA
NIT 8[illegible]
340 2305

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Programación partidos

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar la siguiente información, dado que mediante el correo del 25 de julio de consecutivo PL-120-362, recibimos la programación de los partidos que se realizaran en el Estadio Bello Horizonte "Rey Pele", sin embargo, teniendo en cuenta el contrato en referencia actualmente se realizan labores de obra civil para la construcción de la pista de atletismo, comedidamente solicito informar:

1. Sobre la modalidad de los eventos con o sin aforo de público, dado el caso indicar si se deben tomar medidas de seguridad o si es requerido el desalojo del escenario deportivo.

2. Indicar si estos eventos serán transmitidos en vivo, en caso afirmativo indicarnos si se requiere algún tipo de medida especial o el retiro total de la maquinara que se encuentra en la pista de atletismo.

3. Solicitamos también designar e informar la persona encargada a la cual se le debe hacer entregar las instalaciones del área donde se esta trabajando.

Lo anterior es con la finalidad de programar actividades respectivas según sea requerido.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
C.C. interventoría - consorcio interescenarios

5141

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 04 de agosto del 2023

CEDVO-063-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Recibi:
Johathan Gaviria
04/08/2023
8:50 a.m.

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No 03 ANTICIPO

Cordialmente remitimos los documentos soporte de la orden de giro No 03 con cargo al Fideicomiso Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023.

ITEM DEL ANTICIPO	VALOR	DOCUMENTOS SOPORTE
2	$ 3.598.852.877,00	Copia de contrato N°4, copia cuenta de cobro por concepto de anticipo, certificación bancaria, copia cedula de ciudadanía representante legal, RUT y certificado existencia y representación legal, por concepto de pago a tercero por Materiales y subcontratos.

N°	BPIN	NOMBRE DE PROYECTO	AFECTACION
3	2022005500024	Escenarios Deportivos Multipropósitos	$ 3.598.852.877,00
VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO N° 3 POR PROYECTO			$ 3.598.852.877,00

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

5142

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 08 de agosto del 2023

CEDVO-64-2023

SECRETARIA DE MOVILIDAD
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
No. Radicado 7092
Fecha y Hora 14 AGO 2023
Funcionario que recibe 60F

Señores
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO
Attn. Ing Adolfo Rodriguez Iriarte
Director de planeación y prospectiva
Calle 37A# 19C-26 Barrio Jordan-Paraiso
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de informes PMT de Julio de 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito realizar entrega del informe de PMT del proyecto de la referencia según aprobación No. 1703-19.18/0680 del 17 de mayo de 2023, con el cual se realiza el control y registro de las actividades realizadas.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 59 folios

5143

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023 CEDVO-066-2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 08 de agosto del 2023

CEDVO-066-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Tatiana Lazos.
RECIBIDO 08 AGO 2023
5:54 pM

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: OF-C249-2023-0106 del 01 de agosto de 2023.

Cordial saludo,

Conforme a la alerta por presunto incumplimiento contractual según oficio del asunto, y a sus orientaciones según las cuales las obligaciones no cumplidas se subsanan con la entrega de documentos, le informamos que nos encontramos realizando las actividades, gestiones y documentos necesarios para dar cumplimiento, por lo cual, los documentos requeridos se entregarán según la siguiente programación;

a) Informe de seguimiento del plan de gerencia de proyectos de los meses 1 y 2 de ejecución se entregará el 10 de agosto de 2023.

b) Informe de seguimiento del plan de manejo ambiental del mes 1 y 2 de ejecución contractual acompañado de seguimiento del presupuesto e implementación mensual según cronograma de obra, se entregará el 11 de agosto de 2023.

Le solicitamos atentamente permitirnos el plazo aquí indicado.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

5144

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023 CEDVO-066-2023 Página 1 de 1
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	

Villavicencio, 09 de agosto del 2023

CEDVO-067-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega informes PMT de mayo y junio del 2023 entregados a la secretaria de movilidad.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito realizar entrega de los informes de PMT del proyecto de la referencia según aprobación No. 1703-19.18/0680 del 17 de mayo de 2023, con el cual se realiza el control y registro de las actividades realizadas y se anexa el recibido por parte la secretaria de movilidad.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

RECIBIDO 09 AGO 2023
Héctor Gómez

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023 CEDVO-066-2023 Página 1 de 1
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	

Villavicencio, 09 de agosto del 2023

CEDVO-068-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA INFORME SEGUIMINETO PLAN DE GERENCIA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito entregar los informes mencionados en el asusto, de los meses de mayo y junio para su revisión, dando cumplimiento al compromiso adquirido en el oficio CEDVO-066-2023.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo registro fotográfico

RECIBIDO 10 AGO 2023
Héctor Gómez.

5146

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION O1 FORMATO 02 08/03/2023 CEDVO-066-2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 09 de agosto del 2023

CEDVO-070-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Atención Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Solicitud de modificación del contrato.

Cordial saludo,

De manera respetuosa solicito su colaboración para modificar la cláusula décima numeral 37 del contrato, que establece que debo presentar un acta mensual dentro de los primeros cinco dias del mes, toda vez que de la mano con lo establecido en la cláusula 8 a cerca de la forma de pago, el consorcio quedaría obligado a cobrar el avance dentro de dicho periodo, es decir se genera la obligación de cobrar mensualmente.

Por lo anterior, solicito que se aclare la obligación, en el sentido de que los pagos se harán según acta de corte parcial y no contra acta de avance mensual, por lo cual la periodicidad en la radicación de las actas de pago dependerá del avance de la obra, manteniendo la obligación de presentar mensualmente los informes de avance.

Atentamente,

RECIBIDO 14 AGO 2023
Hector Gómez

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo registro fotográfico

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 10 de agosto del 2023

CEDVO-071-2023

Recibido sin aprobación

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No 04 ANTICIPO

Cordialmente remitimos los documentos soporte de la orden de giro No 04 con cargo al Fideicomiso Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023.

ITEM DEL ANTICIPO	VALOR	DOCUMENTOS SOPORTE
2	$ 1.094.804.681,00	Copia de contrato N°6, discriminado de item´s por rubro, copia cuenta de cobro por concepto de anticipo, certificación bancaria, RUT y certificado existencia y representación legal, por concepto de pago a tercero por Materiales y subcontratos.

N°	BPIN	NOMBRE DE PROYECTO	AFECTACION
1	2022005500094	Pista de Atletismo	$ 167.748.565,00
2	2022005500022	Pista de Patinaje	$ 520.349.725,00
3	2022005500024	Escenarios Deportivos Multipropósitos	$ 406.706.391,00
		VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO N° 4 POR PROYECTO	$ 1.094.804.681,00

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

5148

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 15 de agosto del 2023

CEDVO-072-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

15-08-23
4:37 PM
Tatiana S.

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE PRESUPUESTOS AMBIENTALES

Cordial saludo

De manera atenta me permito hacer entrega de las actas de reunión de los planes de manejo ambiental y entrega de presupuestos ambientales por proyecto para su respectiva revisión y aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 16 de agosto del 2023

CEDVO-074-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

REF: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACION PLAN DE INVERSION ANTICIPO DE OBRA MES DE JULIO

Cordial Saludo:

La presente tiene como fin, realizar la entrega de el informe de plan de inversión de anticipo de obra correspondiente a los desembolsos del mes de julio con sus respectivas ordenes de giro.

Agradecemos la atención prestada.

RECIBIDO 17 AGO 2023
Carolina Betancourt

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

5150

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

CONTRATO N°	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

INFORME N°	1	PERIODO INFORME:	1 de julio de 2023	a	31 de julio de 2023

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
NIT:	901682871-2
CORREO ELECTRONICO:	Contabilidadedeportivos@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
CORREO ELECTRONICO:	Interescenariosc@gmail.com
SUPERVISOR:	BIBIANA PAN MERCHAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	FLOWER EMILIO PEÑA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	

VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Días	0
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de mayo de 2023				
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VIGENCIA ACTUAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Días	0
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VALOR DEL PROYECTO					
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL		VALOR ($) ACTUAL
1	2022005500094	10.220.557.418,00	0,00	$	10.220.557.418,00
2	2022005500022	8.805.724.533,00	0,00	$	8.805.724.533,00
3	2022005500024	31.845.658.891,00	0,00	$	31.845.658.891,00
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$	50.871.940.842,00

INFORMACIÓN DE ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO 1:	$ 14.498.503.139,60		
FECHA PAGO ANTICIPO	29 de junio de 2023	No. COMPROBANTE:	01976-01975-01974-01973-01972
FIDUCIA (SI APLICA):	ALIANZA FIDUCIARIA		
BANCO :	BANCOLOMBIA - FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS		
CUENTA DE AHORROS :	4000006842		

INFORME DE INVERSIÓN

ITEM	CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
1	ORDEN DE GIRO 1 - 374088	7 de julio de 2023	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS	$ 3.206.552.830,72	2	ANTICIPO CONTRATO No 1
2	ORDEN DE GIRO 2 - 382769	31 de julio de 2023	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS	$ 289.205.761,34	2	PAGO CORTE No 1 CIMENTACION
TOTAL						$ 3.495.758.592,06

Anexar: Respectivos Soportes y Extracto Cuenta Bancaria Registrada.

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANTICIPO INICIAL	ANTICIPO ADICIONAL	TOTAL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO ANTICIPO
1	Mano de obra	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 12.323.727.668,66	$ -	$ 12.323.727.668,66	$ 3.495.758.592,06	$ 8.827.969.076,60
3	Transporte	$ 1.449.850.313,96	$ -	$ 1.449.850.313,96	$ -	$ 1.449.850.313,96

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40
5	FONSET 5%	$ 763.079.113,00		$ 763.079.113,00		$ -
TOTALES		$ 15.261.582.252,60	$ -	$ 15.261.582.252,60	$ 3.495.758.592,06	$ 11.002.744.547,54

Nota: Se anexa copia de Tarjeta Profesional y vigencia de la Tarjeta Profesional de los contadores que intervienen en el presente informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 31 de julio de 2023

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 278207-T

Firma
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 175215-T

Alianza Fiduciaria

t: (601) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

5152

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE JULIO DEL 2023

FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
CODIGO SIFI 113392

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

5153

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000006842

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTI
Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130
CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	14,499,096,591.25	*SALDO PROMEDIO*	$	11,895,350,842
TOTAL ABONOS	$	7,548,107.64	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	3,508,596,822.05	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	7,548,107.64
SALDO ACTUAL	$	10,998,047,876.84	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,780,500.68	14,500,877,091.93
7/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-960.09	14,500,876,131.84
/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,826,215.89	14,488,049,915.95
/07	PAGO A PROVE ORGANIZACION TE			-3,206,552,831.00	11,281,497,084.95
7/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.42	11,281,496,902.53
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			5,542,528.24	11,287,039,430.77
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			225,078.72	11,287,264,509.49
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43.31	11,287,264,466.18
31/07	TRASL ENTRE FONDOS DE VALORES	OSE CUCUTA		-289,205,761.34	10,998,058,704.84
31/07	VALOR IVA			-1,729.00	10,998,056,975.84
31/07	COMIS TRASLADO EN SUCURSAL			-9,099.00	10,998,047,876.84
	FIN ESTADO DE CUENTA				

5154

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 22 de agosto del 2023

CEDVO-074-2023

RECIBIDO 23 AGO 2023
Recibido sin aprobación
Tatiana Lazo S
8:59 am

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE INFORMES SEGUIMIENTO AMBIENTAL MAYO

Cordial saludo

De manera atenta me permito realizar entrega de los informes de seguimiento ambiental al PMA de los proyectos pista de patinaje y escenarios deportivos correspondiente al mes de mayo, para su revisión.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

5155

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 22 de agosto del 2023

CEDVO-075-2023

RECIBIDO 23 AGO 2023

Recibido sin aprobación
Tatiana Lazo S.
8:59 am

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE INFORMES SEGUIMIENTO AMBIENTAL JUNIO

Cordial saludo

De manera atenta me permito realizar entrega de los informes de seguimiento ambiental al PMA de los proyectos pista de patinaje y escenarios deportivos correspondiente al mes de junio, para su revisión.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

5156

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 22 de agosto del 2023

CEDVO-75-2023

RECIBIDO 28 AGO 2023
Tatiana Lazo
10:53 am

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de informes PMT de Julio de 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito realizar entrega del informe de PMT del proyecto de la referencia según aprobación No. 1703-19.18/0680 del 17 de mayo de 2023, con el cual se realiza el control y registro de las actividades realizadas.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 59 folios

5157

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 23 de agosto del 2023

CEDVO-076-2023

24-08-2023
08:30 am

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLA PARA CONCRETOS

Cordial saludo

De manera atenta me permito hacer entrega del diseño de mezclas de concreto para 2.000psi, 3.000psi, 3.500psi y 4.000psi.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 42 folios

5158

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 24 de agosto del 2023

CEDVO-078-2023

Tatiana Lazo S.
24-08-23
2:41 PM

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE CORRECCIONES DE LOS PRESUPUESTOS AMBIENTALES.

Cordial saludo

Con el presente, me permito entregar los presupuestos de los PMA con las correcciones realizadas.

Quedamos atentos a comentarios

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

5159

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 28 de agosto del 2023

CEDVO-079-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega detalle de ciclópeo para mejoramiento de vigas de cimentación.

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito enviar plano de detalle para mejoramiento de vigas de cimentación con concreto ciclópeo, según reunión con el diseñador estructural.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

RECIBIDO 23 AGO 2023
Carolina Betancourt

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 1 folio

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

5160

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

5161

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 01 de Agosto del 2023

OF-C249 -2023-105

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Atn: JHON HENRY ORTIZ GARCIA R/L
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Avance de obra

Teniendo en cuenta las eventualidades que se han venido presentando durante la ejecución del contrato al día de hoy la interventoría evidencia con preocupación la poca presencia de personal en obra, pues a la fecha solo se reporta la asistencia de 4 personas, sumado a esto se comprueba que las actividades de demolición se encuentran completamente detenidas, si bien es sabido los retrasos que se han generado por la demora de la empresa METALREC encargada de hacer el retiro de los elementos desmontados, es indiscutible que existen zonas que se pueden intervenir como lo es la demolición del muro de contención y andenes perimetrales de la pista de patinaje.

1

Es preocupante el bajo rendimiento en avance y la ejecución ya que la falta de personal afecta el desarrollo de actividades y la programación de obra que a la fecha proyecta el 1,98% de avance equivalente a $ 1.009.206.077,65, comparativo a la ejecución que evidencia 1,60% equivalente a $ 812.538.678, se tiene como resultado de la diferencia el **0,38%** de atraso según la programación actualizada entregada por el contratista.

Para que el desarrollo de actividades tenga mayor rendimiento la interventoría solicita al contratista implementar cuadrillas de personal en obra, así como el ingreso de la maquinaria suficiente para el retiro de los escombros y la ejecución de demoliciones faltantes, con el fin de cumplir el tiempo de las actividades programadas para el mes de julio que se tienen proyectadas como se describe a continuación:

CONSORCIO INTERESCENARIOS

- **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META:**

1.1 LOCALIZACIÓN. TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA. CARTERA Y PLANOS.

2.0 DESMONTE Y DEMOLICIONES

- **CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.**

1.0 DEMOLICIONES
2.0 PRELIMINARES

- **CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META**

1. 0PRELIMINARES
2.0 EXCAVACIÓN Y RELLENOS
4.0 FILTROS

2

Cabe anotar que el cronograma de obra para la pista de atletismo a fecha de hoy contempla actividades de excavaciones rellenos y construcción de filtros, capítulos que no presentan ningún avance a la fecha.

De tal forma es necesario que el contratista de obra implemente un plan de acción que mejore los rendimientos en las actividades y actualice el porcentaje ejecutado con la obra programada actualizada.

Agradezco la atención prestada.

Recibido sin Aceptación
Jenssy Parra
01/08/2023
04:41 pm

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

5163

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 01 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-0106**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

Recibido sin Aceptación
Jenssy Parra
01/08/2023 04:39 PM

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: *ANUNCIO DE SOLICITUD DE DEBIDO PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.*

Cordial saludo.

1

Atendiendo a las condiciones contractuales y las condiciones presentadas en la obra de la referencia, esta interventoría considera que existe mérito para emitir alerta sobre el posible incumplimiento al contrato de obra, por parte del contratista.

En el presente escrito se hará referencia a:

1. Identificación del contrato de obra.
2. Las obligaciones no cumplidas, como hecho motivador de alertas por presunto incumplimiento.
3. Las pruebas del hecho.
4. Concepto de la interventoría acerca de cómo debe ser cumplida la obligación presuntamente incumplida
5. Consecuencias de la persistencia de los hechos

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

En el cuadro que se presenta a continuación se incluyen los datos generales del Contrato de Obra Pública:

Contrato de obra	106 de 2023
Contratante	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
Contratista	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023 Nit. 901.682.871-2 R.L. JHON HENRY ORTIZ GARCIA C.C. No. 1.121.840.118
Fecha del contrato	16 DE FEBRERO DEL 2023
Objeto	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO

	EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.
Fecha de inicio	10 DE MAYO DEL 2023
Plazo inicial	DOCE MESES

2. OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS, COMO HECHO MOTIVADOR DE ALERTAS POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.

La alerta de posible incumplimiento se motiva en los siguientes hechos.

2.1. Teniendo en cuenta la oferta realizada por el contratista CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023 en el proceso licitatorio del contrato de obra y la Cláusula 9 Obligaciones generales del contratista Numeral No. 5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad, este ofertó dentro de su propuesta mediante la suscripción del formato 7A-Gerencia de proyectos, en el cual manifestó expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de implementar, a su costo y riesgo, un programa de Gerencia de Proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del objeto del contrato, para lo cual el contratista debe disponer de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la entidad. A la fecha el contratista no ha presentado hoja de vida de dicho profesional ni ha presentado los informes de seguimiento mensual sobre la implementación y desarrollo del Plan de Gerencia de Proyectos.

2.2. En el Formulario No. 1 - Oferta económica, capitulo CERTIFICACIONES PMT Y/O PMA, OTROS, Subcapítulo CERTIFICACIONES – PMT Y/O PMA, OTROS ESCENARIOS DEPORTIVOS en el ítem No. 20 Plan de Manejo Ambiental, Subcapítulo CERTIFICACIONES – PMT Y/O PMA, OTROS PISTA DE PATINAJE en el ítem No. 9.3 PMA y Subcapítulo CERTIFICACIONES – PMT Y/O PMA, OTROS, PISTA DE ATLETISMO, se evidencia que se debe realizar una implementación mensual por lo cual se ha solicita la presentación del informe de implementación durante el mes, sin que a la fecha se haya tenido respuesta.

2

2.3. En la cláusula 9 Obligaciones generales del contratista Numeral No. 2. Atender oportunamente los requerimientos del interventor y numeral No. 3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen; la interventoría mediante oficios OF-C249 -2023-039 y OF-C249 -2023-061, OF-C249 -2023-080, OF-C249 -2023-083, OF-C249 -2023-085, OF-C249 -2023-090 ha requerido al contratista de obra la entrega del informe de seguimiento al Plan de Gerencia de Proyectos, informe seguimiento al plan de manejo ambiental con su respectivo presupuesto para implementación informe seguimiento plan de manejo de tránsito, los cuales a la fecha no han sido entregados.

2.4. En la cláusula 10 Obligaciones específicas del contratista Numeral No. 23. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto; a la fecha el contratista no ha presentado los informes requeridos.

3. PRUEBAS DEL HECHO.

1. La interventoría mediante oficio OF-C249 -2023-039 de fecha 26 de Mayo del 2023, solicita informe mensual 1 donde se requiere informe de plan de gerencia de proyectos, plan de manejo ambiental.

2. Mediante oficio OF-C249 -2023-061 de fecha 13 de Junio del 2023, la interventoría reitera la presentación del informe mensual No. 1 con sus respectivos informes complementarios.

3. El contratista de obra mediante oficio CEDVO-039-2023 de fecha 21 de Junio del 2023, radica informe mensual de obra No. 1, en donde no incluye los respectivos informes complementarios.

4. La interventoría mediante oficio OF-C249 -2023-080 fechado del 30m de junio donde se reitera la entrega del plan de manejo ambiental actualizado década escenario con su respectivo presupuesto.

5. La interventoría mediante oficio OF-C249 -2023-083 de fecha 6 de Julio del 2023, solicita informe mensual 2 donde también se requiere que el informe incluya los informes de seguimiento de plan de gerencia de proyectos, plan de manejo ambiental.

6. La interventoría mediante oficio OF-C249 -2023-085 de fecha 6 de Julio del 2023, solicitó al contratista de obra el informe de gerencia de proyectos.

7. Mediante oficio OF-C249 -2023-090 de fecha 17 de Julio del 2023, la interventoría reitera la presentación del informe mensual No. 2 con sus respectivos informes complementarios.

8. El contratista de obra mediante oficio CEDVO-052-2023 de fecha 21 de Julio del 2023, radica informe mensual de obra No. 2, en donde no incluye los respectivos informes complementarios.

3

4. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE COMO DEBE SER CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA

Para subsanar todas las obligaciones no cumplidas a la fecha el contratista debe:

4.1. Presentar el informe de seguimiento al plan de gerencia de proyectos del mes 1 y del mes 2.

4.2. Presentar el informe de seguimiento a la implementación del plan de manejo ambiental del mes 1, del mes 2 y su respectivo presupuesto e implementación mensual según el cronograma de obra

5. CONSECUENCIAS DE LA PERSISTENCIA DE LOS HECHOS

De persistir los hechos más allá de las fechas previstas para subsanar los hechos motivadores de las alertas del presente oficio más allá de las fechas descritas a continuación, La Interventoría dará informe detallado a la Entidad Contratante solicitando el inicio del debido proceso por incumplimiento.

1. Informe de implementación al plan de gerencia de proyectos
   Deben estar totalmente subsanados a ***8 de agosto del presente año***,.

2. Informe de seguimiento implementación del plan de manejo ambiental.
   Deben estar totalmente subsanados a ***8 de agosto del presente año***,

Téngase en cuenta de manera especial que dentro de las consecuencias derivadas del posible incumplimiento se encuentra que:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, los particulares que celebran contratos con entidades estatales, colaboran con el logro de los fines del Estado y cumplen una función social, que como tal implica obligaciones. En efecto, la norma reza:

> *Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*
>
> *Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.* (Subraya fuera del texto original).

De acuerdo con lo anterior, El Contratista de obra, al momento de suscribir el contrato, asumió el deber de colaboración para el logro de los fines de la entidad, teniendo que dar especial interés en la dedicación para la ejecución de las obras, los recursos destinados y el cumplimiento de los plazos contractuales, pues además su gestión se considera una función social.

En ese mismo orden de ideas, el estatuto de la contratación pública, dotó a las entidades para que puedan exigir el cumplimiento de las obligaciones a las cuales se comprometió el contratista. Así, el artículo 4º de la referida ley 80 de 1993 señala:

> *ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:*
>
> *1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.*
> *2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.*
> *3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato (...).*

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Por su parte, la Ley 1474 de 2011, respecto de la colaboración que requieren las entidades estatales, para el logro de sus fines y prevenir hechos que atenten contra la moralidad administrativa y el interés público, delimitó las funciones de la interventoría en su artículo 83.

Conforme con lo anterior, la Interventoría, en ejercicio de sus funciones de seguimiento técnico sobre la ejecución del contrato por parte del Contratista de obra, informará a la entidad si el contratista se encuentra en situación de incumplimiento de sus obligaciones se informará por tanto, si la firma contratista de obra no ha cumplido con el objeto contractual conforme con el cronograma de obra y no se ha dado al cumplimiento de generar un plan de contingencia para superar el atraso de las obras.

Valga la pena recordar que esta Interventoría ha advertido al contratista acerca de la no entrega de los informes complementarios al informe mensual de obra de manera oportuna.

Se resalta que, encontrándose el contratista en situación de presunto incumplimiento del contrato de obra, se habilita a la Entidad para iniciar y dar curso al trámite de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Todo lo anterior se menciona con la finalidad de conminar a El Contratista a implementar las condiciones que permitan la subsanación de los hechos mencionados y la obtención del objeto contractual en las condiciones contenidas en el contrato de obra.

Atentamente,

5

ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

C.C. Archivo
DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

5168

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 01 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-110**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Atn: JHON HENRY ORTIZ GARCIA R/L
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Solicitud radicado PMT ante Secretaria de Movilidad

Cordial saludo,

1

De manera respetuosa me dirijo con el fin de solicitar la entrega del radicado del informe de seguimiento del Plan de Manejo de Transito ante la Secretaria de Movilidad.

Una vez radicado, dicho documento deberá ser anexado junto con la entrega del informe de seguimiento del Plan de Manejo de Transito correspondiente a los meses de Mayo y Junio, teniendo en cuenta que dicho Plan se encuentra aprobado por parte de la Secretaría de Movilidad desde el 17 de Mayo del 2023, de acuerdo al oficio 1703-19.18/0680 entregado por la entidad.

Recibido sin Aceptación
Jenssy Parra.
01/08/2023
01:36. Pm

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

5169

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 1 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-111**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: SOLICITUD INFORME MENSUAL DE OBRA 1

Cordial saludo,

De manera respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de solicitar informe mensual de obra No. 3 del periodo correspondiente del mes de Julio.

Se solicita se anexen junto con el documento los siguientes informes de seguimiento:

- Plan de manejo ambiental con soportes de los meses de Mayo, Junio y Julio
- Plan de manejo de transito mes de Julio con el radicado ante Secretaria de Movilidad
- Plan de Gerencia de proyectos meses de Mayo, Junio y Julio
- Programa de seguridad y salud en el trabajo del mes de Julio
- Informe de Manejo de Inversión del Anticipo del mes de Julio

Recibido sin Aceptacion
Jenssy Parra
01/08/2023
04:37 Pm

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

5170

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 10 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-115**

Recibido sin aprobación
10-08-2023
11:00am

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación y pago de Orden de Giro No. 3 anticipo. Fiduciaria Alianza – Fideicomiso No. 113392.

1

Cordial saludo,

Una vez revisados y evaluados los soportes que se adjuntan en el Giro No. 3 Anticipo radicado el día 25 de Julio del 2023, se autoriza el REEMBOLSO de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.598.852.877,00) los cuales se encuentran discriminados en el siguiente ítem:

- MATERIALES Y SUBCONTRATOS: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.598.852.877,00), reembolso a INDUSTRIAS DEL HIERRO SAS.

Destinados única y exclusivamente a la ejecución del contrato de obra No. 106 de 2023.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

5171

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 10 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-116**

Recibido sin aprobación
10-08-2023
11:00am

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: CORRECION INFORME MENSUAL DE OBRA

Por medio de la presente me permito realizar entrega de la documentación radicada respecto a los informes mensual 1 y 2 de obra, luego de la revisión realizada por el apoyo a la supervisión quien concluye algunas observaciones que deben subsanarse en el contenido de los informes entregados.

De tal forma se solicita entrega de la siguiente documentación informes de seguimiento que hace parte de los anexos solicitados por la supervisión para entrega:

- Informe de seguimiento al plan de gerencia
- Informe de seguimiento al plan de manejo ambiental
- Informe de SST
- Informe de PMT con radicado ante secretaria de movilidad

De igual manera se realiza entrega de 4 carpetas correspondientes a informe de obra No1 y 3 carpetas correspondientes a informe de obra No 2, las correcciones del contenido del formato GES-FO-126 se describen para cada página.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

5173

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 10 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-117**

Recibido sin aprobación
10-08-2023
10:59am.

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Reiteración corrección documentación entregada

Reiterando las solicitudes realizadas mediante oficio OF-C249-2023-094 radicado vía correo electrónico el día 21 de julio de 2023 oficio consecutivo OF-C249-2023-103 radicado el 28 de julio se solicita entrega de las correcciones a las observaciones realizadas por el apoyo la supervisión del contrato para la documentación inicial, se precisa que la entrega de los documentos es de carácter urgente ya que esta información debe radicarse de nuevo a la entidad.

Se trasladan las observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión las cuales se describen a continuación:

- Se observa certificado de la agencia nacional minera de la empresa VIALES Y ARIDOS DEL META SAS, pero este no se encuentra vigente.
- El programa de gerencia de proyectos esta sin firmas de los responsables
- Las hojas de vida del personal ofertado deben venir con firma en original
- Se deben entregar exámenes de ingreso de todo el personal ofertado
- Se adjuntan fichas técnicas de equipos menores, pero no se observa fichas técnicas de la maquinaria pesada a utilizar para actividades iniciales como (demolición, desmonte entro otros).
- Se anexa acta de aprobación del AIU, el cual presenta las siguientes observaciones:
  a) Se deben colocar el objeto de los tres (03) proyectos
  b) Se presentan observaciones en el documento, valores no cuadran, porcentajes tampoco. Revisar y ajustar

c) La fecha del documento es del 2022
d) En el calculo total del AIU no se deben incluir las actividades de certificaciones, PMT, PMA y otros

- se solicita que la programación de obra venga firmada por los responsables del proyecto (directores de obra e interventoría)
- Se solicita entrega de los planos aprobados y firmados por todas las partes, de acuerdo a lo presentado en la Secretaría de Movilidad del Municipio

La interventoría reitera la importancia y el apremio para la entrega de esta documentación ajustada con el fin de trasladar en el menor tiempo posible los soportes exigidos por la supervisión del contrato.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

5175

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 11 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-119**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación y pago de Orden de Giro No. 4 anticipo. Fiduciaria Alianza – Fideicomiso No. 113392.

1

Cordial saludo,

Una vez revisados y evaluados los soportes que se adjuntan en el Giro No. 4 Anticipo radicado el día 10 de Agosto del 2023, se autoriza el REEMBOLSO de MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.053.857.052,24) los cuales se encuentran discriminados en el siguiente ítem:

- MATERIALES Y SUBCONTRATOS: MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.053.857.052,24), reembolso a ORGANIZACIÓN TERRACANTO S.A.S.

Destinados única y exclusivamente a la ejecución del contrato de obra No. 106 de 2023.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Recibido sin aprobacion
11/08/2023

5176

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 22 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-122**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: DEVOLUCIÓN PRESUPUESTOS PMA

Cordial saludo,

1

Se realiza la devolución de los presupuestos del plan de manejo ambiental entregados por ustedes, debido a que no concuerdan los precios del estudio de mercado con los precios de los Análisis de Precios Unitarios.

Adicional a esto, se encuentra que en el presupuesto existen ítems cuyo tiempo en meses de ejecución indican que es de 12 meses, tales como lo son la Brigada ambiental, programas de prevención y mitigación ambiental, señalización ambiental, manejo de residuos sólidos, manejo de aguas residuales domésticas y capacitaciones de educación ambiental, las cuales deberán corresponder al plazo que realmente el contratista ha desarrollado estas actividades, las cuales deben ser soportados con su debida documentación.

Agradezco la atención prestada.

Recibido sin aprobacion
22 agosto 2023
3:13 Pm

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

5177

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 23 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-126**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Reiteración corrección documentación inicial entregada

Reiterando las solicitudes realizadas previamente mediante oficio OF-C249-2023-094 radicado vía correo electrónico el día 21 de julio de 2023 oficio consecutivo OF-C249-2023-103 radicado el 28 de julio oficio consecutivo OF-C249 -2023-117 radicado el día 03 de agosto de 2023 se solicita entrega de las correcciones a las observaciones realizadas por el apoyo la supervisión del contrato para la documentación inicial, se deja evidencia de la trazabilidad de la solicitudes que se han venido realizando ya que a la fecha ha transcurrido mas de un mes y no se ha obtenido respuesta por parte del contratista para subsanar la documentación.

A continuación, se describen las observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión que a la fecha no se han subsanado

- El programa de gerencia de proyectos esta sin firmas de los responsables
- Las hojas de vida del personal ofertado deben venir con firma en original
- Se deben entregar exámenes de ingreso de todo el personal ofertado
- Se adjuntan fichas técnicas de equipos menores, pero no se observa fichas técnicas de la maquinaria pesada a utilizar para actividades iniciales como (demolición, desmonte entro otros).
- Se anexa acta de aprobación del AIU, el cual presenta las siguientes observaciones:
  a) Se deben colocar el objeto de los tres (03) proyectos
  b) Se presentan observaciones en el documento, valores no cuadran, porcentajes tampoco. Revisar y ajustar
  c) La fecha del documento es del 2022

d) En el calculo total del AIU no se deben incluir las actividades de certificaciones, PMT, PMA y otros

- se solicita que la programación de obra venga firmada por los responsables del proyecto (directores de obra e interventoría)
- Se solicita entrega de los planos aprobados y firmados por todas las partes, de acuerdo a lo presentado en la Secretaría de Movilidad del Municipio

La interventoría reitera la importancia y el apremio para la entrega de esta documentación ajustada con el fin de trasladar en el menor tiempo posible los soportes exigidos por la supervisión del contrato.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

C.C. Archivo
DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

5179

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 24 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-127**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Reiteración implementación informes mensuales y de seguimiento

Acorde a la documentación entregada por el contratista concerniente a los informes mensuales de obra y los anexos informes de seguimiento, la interventoría ha venido solicitando al contratista la entrega de la documentación en los oficios relacionados a continuación:

OF-C249 -2023-111 radicado el día 01 de Agosto de 2023 mediante el cual se solicita la entrega del informe mensual de ejecución de obra del periodo de julio con sus respectivos anexos

- Informe de seguimiento al plan de gerencia
- Informe de seguimiento al plan de manejo ambiental
- Informe de SST
- Informe de PMT con radicado ante secretaria de movilidad

OF-C249 -2023-116 radicado el día 10 de agosto de 2023 mediante el cual se solicitan las correcciones de los informes mensuales de obra correspondientes al periodo de Mayo y Junio, se solicita al contratista la entrega del informe formato GES-FO-126 según las correcciones estipuladas en la documentación entregada, de igual manera se reitera la entrega de los informes de seguimiento que hacen parte de los anexos solicitados por la interventoría.

5180

CONSORCIO INTERESCENARIOS

OF-C249 -2023-121 radicado el día 14 de Agosto de 2023, mediante el cual se solicita la corrección e implementación de la documentación entregada lo concerniente al Plan de Gerencia.

De tal forma se reitera al contratista el oficio OF-C249 -2023-0106 solicitud presunto incumplimiento en cuanto consecución de las obligaciones contractuales adquiridas en las siguientes cláusulas:

9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA numeral 2. Atender oportunamente las solicitudes del interventor.

numeral 3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen

10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA numeral 1. Remitir al instituto la totalidad e la documentación técnica y financiera suscrita para el desarrollo y ejecución de las obras en informes mensuales, medio físico y magnético que incluya registro fotográfico a color

numeral 23. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto

2

Valga la pena recordar que esta Interventoría ha advertido al contratista acerca de la no entrega de los informes complementarios al informe mensual de obra y del informe de obra en sí mismo de manera oportuna.

Conforme con lo anterior, la Interventoría, en ejercicio de sus funciones de seguimiento técnico sobre la ejecución del contrato de obra, comunica a la entidad la situación de incumplimiento. Puesto que es una circunstancia reiterada como se deja evidencia en los oficios realizados al respecto

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

C.C. Archivo
DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

5181

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 24 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-129**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: CORRECCIONES A INFORMES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE MAYO

Por medio de la presente, me permito devolver la documentación que fue entregada mediante oficio CEDVO-074-2023 con fecha de radicado del 22 de agosto del 2023, se solicita la corrección y nuevamente sean entregadas teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

PISTA DE PATINAJE:

1. Se solicita modificar la fecha del periodo de inicio ya que tienen en el informe como fecha del 15 al 31 de mayo del 2023, pero las actividades de obra iniciaron a partir del día 10 de mayo del 2023, teniendo en cuenta el acta de inicio.

ESCENARIOS DEPORTIVOS:

1. Cambiar la fecha del periodo de inicio ya que tienen del 15 al 31 de mayo del 2023, pero las actividades de obra iniciaron a partir del día 10 de mayo del 2023.

2. Se requiere corregir la información personal del asesor ambiental de la interventoría, corregir el nombre por la profesional Elvis Lulu Caro, Vargas, con su M.P. 25202234415 CND

Atentamente;

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

5182

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 31 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-133**

Recibido sin anexos
31-agosto-2023
9:52am

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

Asunto: REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA PLANOS

Cordial saludo,

1

Por medio del presente me permito reiterar la presentación de los siguientes planos de diseño:

- Se requiere el plano de implantación, indicando el cálculo de áreas, índice de ocupación, cotas y parqueadero, el cual debe radicarse ante la Curaduría.
- Se requieren planos hidrosanitarios y la radicación ante la Empresa de Alcantarillado y Acueducto de Villavicencio.
- Se requiere sean entregados los ajustes de los diseños estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios y eléctricos.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 31 de Agosto del 2023

OF-C249 -2023-132

Recibido sin aceptación
31-agosto-2023
9:52 am

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

Asunto: REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA DE INFORMACIÓN DOCUMENTOS FALTANTES

Cordial saludo,

1

Teniendo en cuenta oficios enviados anteriormente en donde se solicita al contratista la entrega de información y documentos requeridos en el pliego de condiciones, anexo técnico y obligaciones del contratista, nos permitimos realizar el presente documento enlistando lo faltante en este momento:

1. El contratista de obra, en el proceso licitatorio, mediante la suscripción del Formato 8 - Vinculación de personas con discapacidad, indicó que tenía dentro de su nómina 2 trabajadores en condición de discapacidad, y teniendo en cuenta el Articulo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto 392 de 2018 que indica lo siguiente: *Seguimiento durante la ejecución del contrato. Las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre.*

Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.

PARÁGRAFO. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

De acuerdo a lo anterior, se solicita al contratista de obra, la presentación del certificado emitido por el ministerio de trabajo de la vinculación de trabajadores en situación de discapacidad actualizado de la empresa CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS, adjuntando documentos del personal en condición de discapacidad y planillas de seguridad social en donde se pueda constatar la vinculación de las dos personas que fueron ofertadas dentro de la propuesta a partir de la suscripción del contrato de obra.

2. Mediante oficios No. OF-C249 -2023-117 del 10 de Agosto del 2023 y OF-C249 -2023-126 del 23 de Agosto del 2023, les solicitamos al contratista la siguiente información que a la fecha no ha sido entregada a la interventoría:

   - El programa de gerencia de proyectos esta sin firmas de los responsables.
   - Las hojas de vida del personal ofertado deben venir con firma en original.
   - Se deben entregar exámenes de ingreso de todo el personal ofertado.
   - Se adjuntan fichas técnicas de equipos menores, pero no se observa fichas técnicas de la maquinaria pesada a utilizar para actividades iniciales como (demolición, desmonte entro otros).
   - Se anexa acta de aprobación del AIU, el cual presenta las siguientes observaciones:

     a. Se deben colocar el objeto de los tres (03) proyectos
     b. Se presentan observaciones en el documento, valores no cuadran, porcentajes tampoco. Revisar y ajustar.
     c. La fecha del documento es del 2022.
     d. En el cálculo total del AIU no se deben incluir las actividades de certificaciones, PMT, PMA y otros.

   - Se solicita que la programación de obra venga firmada por los responsables del proyecto (directores de obra e interventoría).
   - Se solicita entrega de los planos aprobados y firmados por todas las partes, de acuerdo a lo presentado en la Secretaría de Movilidad del Municipio.

3. Mediante oficio OF-C249 -2023-085 de fecha 6 de Julio del 2023, la interventoría solicito al contratista de obra la presentación de informes de implementación del Programa de Gerencia de Proyectos que debieron presentarse a partir del primer mes de ejecución del contrato y a la fecha no habían sido presentados, mediante el oficio No. CEDVO-068-2023 radicado el 10 de Agosto del 2023, el contratista radicó a la interventoría informes de seguimiento al plan de gerencia de proyectos y mediante oficio OF-C249 -2023-121 de fecha de radicado 15 de Agosto del 2023, se realizó la devolución de la información entregada, ya que los informes entregados carecían de información de acuerdo al Programa de Gerencia de Proyectos entregado, a este momento el contratista no ha radicado las correcciones según lo enlistado por la Interventoría en oficio de devolución.

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: interescenariosc@gmail.com

Adicional se envió oficio OF-C249-2023-106, en donde se le anunció al contratista la solicitud de debido proceso por presunto incumplimiento, en donde se requirió al contratista la presentación de informes de seguimiento mensuales pendientes a la fecha, los cuales no han sido presentados en su totalidad.

4. Mediante oficio No. OF-C459-2022-026 del 12 de Mayo del 2023, la interventoría solicita al contratista la presentación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo requerido en el anexo técnico del proceso licitatorio del contrato de obra, y mediante oficio No. OF-C249-2022-033 la interventoría realiza la reiteración de la solicitud del Plan de seguridad y salud en el trabajo, a la fecha este documento no ha sido entregado, razón por la cual se solicita al contratista la presentación de dicha información.

5. Mediante oficio No. OF-C249 -2023-127 de fecha 24 de agosto del 2023, se requirió al contratista lo siguiente teniendo en cuenta las relaciones de los oficios mencionados:

   OF-C249 -2023-111 radicado el día 01 de Agosto de 2023 mediante el cual se solicita la entrega del informe mensual de ejecución de obra del periodo de julio con sus respectivos anexos

   - Informe de seguimiento al plan de gerencia
   - Informe de seguimiento al plan de manejo ambiental
   - Informe de SST
   - Informe de PMT con radicado ante secretaria de movilidad

   OF-C249 -2023-116 radicado el día 10 de agosto de 2023 mediante el cual se solicitan las correcciones de los informes mensuales de obra correspondientes al periodo de Mayo y Junio, se solicita al contratista la entrega del informe formato GES-FO-126 según las correcciones estipuladas en la documentación entregada, de igual manera se reitera la entrega de los informes de seguimiento que hacen parte de los anexos solicitados por la interventoría.

   OF-C249 -2023-121 radicado el día 14 de Agosto de 2023, mediante el cual se solicita la corrección e implementación de la documentación entregada lo concerniente al Plan de Gerencia.

   De tal forma se reitera al contratista el oficio OF-C249 -2023-0106 solicitud presunto incumplimiento en cuanto consecución de las obligaciones contractuales adquiridas en las siguientes cláusulas:

   9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA numeral 2. Atender oportunamente las solicitudes del interventor.

   Numeral 3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen

   10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA numeral 1. Remitir al instituto la totalidad en la documentación técnica y financiera suscrita para el desarrollo y ejecución de las obras en informes mensuales, medio físico y magnético que incluya registro fotográfico a color

   Numeral 23. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: interescenariosc@gmail.com

Valga la pena recordar que esta Interventoría ha advertido al contratista acerca de la no entrega de los informes complementarios al informe mensual de obra y del informe de obra en sí mismo de manera oportuna, ya que a la fecha el contratista no ha hecho entrega de informes corregidos de los meses 1 y 2, ni del informe mensual de obra correspondiente al mes 3.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

4

Se anexan los oficios mencionados.

5187

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 12 de Mayo del 2023 **OF-C459 -2022-026**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN INICIO DE OBRA 1

Cordial saludo,

En calidad de representante legal de la Interventoría CONSORCIO INTERESCENARIOS, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la siguiente documentación requerida en el inicio de obra de las actividades del contrato 106 del 2023:

1. Certificado de afiliaciones a seguridad social, ARL y parafiscales del personal que estará en la ejecución de la obra Director de obra, residente de obra, director de proyecto, profesional SST, arquitecto paisajista, maestros, ayudantes y oficiales, y cualquier personal administrativo que se encuentre en el sitio de la obra.

2. Curso de trabajo en alturas del personal que desarrollará actividades en alturas superiores a 1.50 metros o más sobre un nivel inferior.

Recibido sin aceptacion. Jhon Henry Ortiz

3. Plan de seguridad y salud en el trabajo (ver anexo técnico)

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
Presentar como mínimo los siguientes documentos:

- Plan de manejo integral de residuos incluyendo escombros, aceites usados, combustibles o desechos peligrosos
- Procedimiento de corte y pulido de materiales.
- Procedimiento para el almacenamiento de materiales en campamentos, centros de acopio y en frentes de obra

Programa de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y sus anexos.

- Panorama de factores de riesgo
- Programa para el control de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia
- Procedimiento seguro, de ingreso de personal vinculado a la obra y visitantes
- Metodología para análisis de puesto de trabajo
- Protocolo de exámenes médicos
- Matriz de elementos de protección.
- Programa de Inducción, Capacitación y Entrenamiento
- Procedimiento para reporte e investigación de accidentes / incidentes de trabajo
- Programa de inspecciones.
- Manejo de sustancias peligrosas (inventario de sustancias químicas y hojas de seguridad (en español).
- Prácticas seguras de almacenamiento
- Procedimiento de almacenamiento de combustible y en general de sustancias peligrosas
- Procedimiento de seguridad eléctrica para frentes de obra e instalaciones locativas temporales y permanentes.
- Programa de mediciones de higiene cuando aplique según los resultados del PFR.
- Programa de trabajo seguro en alturas (instalación y desmonte de andamios, uso de escaleras, equipos contra caídas, acciones preventivas) de acuerdo a las normas legales vigentes
- Procedimiento seguro de espacios confinados.
- Procedimiento seguro para manejo de redes (secas y húmedas).
- Procedimiento seguro de izaje de cargas (planes de izaje críticos y no críticos, acciones preventivas, requerimientos de personal, de maquinaria y equipos)
- Permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y los estándares de seguridad
- Procedimiento de manejo de maquinaria y equipo
- Procedimiento para movilización y traslado de maquinaria y equipo dentro de los frentes de obra, campamentos e instalaciones temporales
- Procedimiento de aseguramiento para el cargue y descargue de maquinaria y equipos
- Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.
- Procedimiento para mantenimiento por fuerza mayor

- Plan de Emergencias y Contingencias para frentes de obra e instalaciones locativas temporales y permanentes.
- Procedimiento de desmantelamiento de instalaciones temporales.
- Cronograma general de actividades SST el cual debe proyectar cobiación y fecha probable.

Así mismo, el Contratista debe elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional requeridos por la Interventor y/o supervisión y/o el IDERP durante el transcurso de la obra.

Todos los procedimientos deben incluir formatos para el seguimiento e la implementación, los cuales se deben diligenciar y entregar a la Interventor y/o supervisión en el informe mensual.

Todos los programas, procedimientos, planes y estándares incluidos en el programa serán revisados y actualizados, mínimos una vez al mes y/o cuando sea requerido, con el fin de garantizar la efectividad de estos. Dicha actualización podrá ser sugerida por el Contratista o solicitada por la Interventor y/o supervisión o el IDERMETA

2

4. De acuerdo a la propuesta económica del contratista, este deberá presentar un Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a los frente de trabajo.



5. Entrega de diseños de mezclas de concreto según corresponda y plan de ensayos.

3

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

5190

Villavicencio, 31 de Agosto del 2023

OF-C249 -2023-132

Recibido sin aceptación
31-agosto-2023
9:52 am

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

Asunto: REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA DE INFORMACIÓN DOCUMENTOS FALTANTES

Cordial saludo,

1

Teniendo en cuenta oficios enviados anteriormente en donde se solicita al contratista la entrega de información y documentos requeridos en el pliego de condiciones, anexo técnico y obligaciones del contratista, nos permitimos realizar el presente documento enlistando lo faltante en este momento:

1. El contratista de obra, en el proceso licitatorio, mediante la suscripción del Formato 8 - Vinculación de personas con discapacidad, indicó que tenía dentro de su nómina 2 trabajadores en condición de discapacidad, y teniendo en cuenta el Articulo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto 392 de 2018 que indica lo siguiente: *Seguimiento durante la ejecución del contrato. Las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre.*

Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.

PARÁGRAFO. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

De acuerdo a lo anterior, se solicita al contratista de obra, la presentación del certificado emitido por el ministerio de trabajo de la vinculación de trabajadores en situación de discapacidad actualizado de la empresa CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS, adjuntando documentos del personal en condición de discapacidad y planillas de seguridad social en donde se pueda constatar la vinculación de las dos personas que fueron ofertadas dentro de la propuesta a partir de la suscripción del contrato de obra.

2. Mediante oficios No. OF-C249 -2023-117 del 10 de Agosto del 2023 y OF-C249 -2023-126 del 23 de Agosto del 2023, les solicitamos al contratista la siguiente información que a la fecha no ha sido entregada a la interventoría:

   - El programa de gerencia de proyectos esta sin firmas de los responsables.
   - Las hojas de vida del personal ofertado deben venir con firma en original.
   - Se deben entregar exámenes de ingreso de todo el personal ofertado.
   - Se adjuntan fichas técnicas de equipos menores, pero no se observa fichas técnicas de la maquinaria pesada a utilizar para actividades iniciales como (demolición, desmonte entro otros).
   - Se anexa acta de aprobación del AIU, el cual presenta las siguientes observaciones:

     a. Se deben colocar el objeto de los tres (03) proyectos
     b. Se presentan observaciones en el documento, valores no cuadran, porcentajes tampoco. Revisar y ajustar.
     c. La fecha del documento es del 2022.
     d. En el cálculo total del AIU no se deben incluir las actividades de certificaciones, PMT, PMA y otros.

   - Se solicita que la programación de obra venga firmada por los responsables del proyecto (directores de obra e interventoría).
   - Se solicita entrega de los planos aprobados y firmados por todas las partes, de acuerdo a lo presentado en la Secretaría de Movilidad del Municipio.

3. Mediante oficio OF-C249 -2023-085 de fecha 6 de Julio del 2023, la interventoría solicito al contratista de obra la presentación de informes de implementación del Programa de Gerencia de Proyectos que debieron presentarse a partir del primer mes de ejecución del contrato y a la fecha no habían sido presentados, mediante el oficio No. CEDVO-068-2023 radicado el 10 de Agosto del 2023, el contratista radicó a la interventoría informes de seguimiento al plan de gerencia de proyectos y mediante oficio OF-C249 -2023-121 de fecha de radicado 15 de Agosto del 2023, se realizó la devolución de la información entregada, ya que los informes entregados carecían de información de acuerdo al Programa de Gerencia de Proyectos entregado, a este momento el contratista no ha radicado las correcciones según lo enlistado por la Interventoría en oficio de devolución.

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: interescenariosc@gmail.com

Adicional se envió oficio OF-C249-2023-106, en donde se le anunció al contratista la solicitud de debido proceso por presunto incumplimiento, en donde se requirió al contratista la presentación de informes de seguimiento mensuales pendientes a la fecha, los cuales no han sido presentados en su totalidad.

4. Mediante oficio No. OF-C459-2022-026 del 12 de Mayo del 2023, la interventoría solicita al contratista la presentación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo requerido en el anexo técnico del proceso licitatorio del contrato de obra, y mediante oficio No. OF-C249-2022-033 la interventoría realiza la reiteración de la solicitud del Plan de seguridad y salud en el trabajo, a la fecha este documento no ha sido entregado, razón por la cual se solicita al contratista la presentación de dicha información. Veronica

5. Mediante oficio No. OF-C249 -2023-127 de fecha 24 de agosto del 2023, se requirió al contratista lo siguiente teniendo en cuenta las relaciones de los oficios mencionados:

   OF-C249 -2023-111 radicado el día 01 de Agosto de 2023 mediante el cual se solicita la entrega del informe mensual de ejecución de obra del periodo de julio con sus respectivos anexos

   - Informe de seguimiento al plan de gerencia
   - Informe de seguimiento al plan de manejo ambiental
   - Informe de SST → Veronica
   - Informe de PMT con radicado ante secretaria de movilidad

   OF-C249 -2023-116 radicado el día 10 de agosto de 2023 mediante el cual se solicitan las correcciones de los informes mensuales de obra correspondientes al periodo de Mayo y Junio, se solicita al contratista la entrega del informe formato GES-FO-126 según las correcciones estipuladas en la documentación entregada, de igual manera se reitera la entrega de los informes de seguimiento que hacen parte de los anexos solicitados por la interventoría.

   OF-C249 -2023-121 radicado el día 14 de Agosto de 2023, mediante el cual se solicita la corrección e implementación de la documentación entregada lo concerniente al Plan de Gerencia.

   De tal forma se reitera al contratista el oficio OF-C249 -2023-0106 solicitud presunto incumplimiento en cuanto consecución de las obligaciones contractuales adquiridas en las siguientes cláusulas:

   9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA numeral 2. Atender oportunamente las solicitudes del interventor.

   Numeral 3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen

   10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA numeral 1. Remitir al instituto la totalidad en la documentación técnica y financiera suscrita para el desarrollo y ejecución de las obras en informes mensuales, medio físico y magnético que incluya registro fotográfico a color

   Numeral 23. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: interescenariosc@gmail.com

Valga la pena recordar que esta Interventoría ha advertido al contratista acerca de la no entrega de los informes complementarios al informe mensual de obra y del informe de obra en sí mismo de manera oportuna, ya que a la fecha el contratista no ha hecho entrega de informes corregidos de los meses 1 y 2, ni del informe mensual de obra correspondiente al mes 3.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

4

Se anexan los oficios mencionados.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

S194

Villavicencio, 24 de Mayo del 2023 **OF-C249 -2022-033**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: REITERACIÓN DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN INICIO DE OBRA

1

Cordial saludo,

En calidad de representante legal de la Interventoría CONSORCIO INTERESCENARIOS, me dirijo a ustedes con el fin reiterar la solicitud de la documentación requerida en el inicio de obra de las actividades del contrato 106 del 2023:

1. Curso de trabajo en alturas del personal que desarrollará actividades en alturas superiores a 1.50 metros o más sobre un nivel inferior.

24/05/2023

Jhon Henry Ortiz

2. Plan de seguridad y salud en el trabajo (ver anexo técnico)

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
Presentar como mínimo los siguientes documentos:

- Plan de manejo integral de residuos incluyendo escombros, aceites usados, combustibles o desechos peligrosos
- Procedimiento de corte y pulido de materiales
- Procedimiento para el almacenamiento de materiales en campamentos, centros de acopio y en frentes de obra

Programa de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y sus anexos

- Panorama de factores de riesgo
- Programa para el control de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia
- Procedimiento seguro, de ingreso de personal vinculado a la obra y visitantes
- Metodología para análisis de puesto de trabajo
- Protocolo de exámenes médicos
- Matriz de elementos de protección
- Programa de Inducción, Capacitación y Entrenamiento
- Procedimiento para reporte e investigación de accidentes / incidentes de trabajo
- Programa de inspecciones
- Manejo de sustancias peligrosas (inventario de sustancias químicas y hojas de seguridad (en español)
- Practicas seguras de almacenamiento
- Procedimiento de almacenamiento de combustible y en general de sustancias peligrosas
- Procedimiento de seguridad eléctrica para frentes de obra e instalaciones locativas temporales y permanentes
- Programa de mediciones de higiene cuando aplique según los resultados del PFR
- Programa de trabajo seguro en alturas (instalación y desmonte de andamios, uso de escaleras, equipos contra caídas, acciones preventivas) de acuerdo a las normas legales vigentes
- Procedimiento seguro de espacios confinados
- Procedimiento seguro para manejo de redes (secas y humedas)
- Procedimiento seguro de izaje de cargas (planes de izaje críticos y no críticos, acciones preventivas, requerimientos de personal de maquinaria y equipos)
- Permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y los estándares de seguridad
- Procedimiento de manejo de maquinaria y equipo
- Procedimiento para movilización y traslado de maquinaria y equipo dentro de los frentes de obra, campamentos e instalaciones temporales
- Procedimiento de aseguramiento para el cargue y descargue de maquinaria y equipos
- Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos
- Procedimiento para mantenimiento por fuerza mayor

- Plan de Emergencias y Contingencias para frentes de obra e instalaciones locativas temporales y permanentes
- Procedimiento de desmantelamiento de instalaciones temporales
- Cronograma general de actividades SST el cual debe proyectar población y fecha probable

Así mismo, el Contratista debe elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional requeridos por la Interventor y/o supervisión y/o el IDERF durante el transcurso de la obra.

Todos los procedimientos deben incluir formatos para el seguimiento a la implementación, los cuales se deben diligenciar y entregar a la Interventor y/o supervisión en el informe mensual.

Todos los programas, procedimientos, planes y estándares incluidos en el programa serán revisados y actualizados, mínimos una vez al mes y/o cuando sea requerido, con el fin de garantizar la efectividad de estos. Dicha actualización podrá ser sugerida por el Contratista o solicitada por la Interventor y/o supervisión o el IDERMETA.

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

3. De acuerdo a la propuesta económica del contratista, este deberá presentar un Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a los frente de trabajo.



4. Entrega de diseños de mezclas de concreto según corresponda y plan de ensayos.

3

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

5197

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 10 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-117**

Recibido sin aprobación
10-08-2023
10:59 am

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Reiteración corrección documentación entregada

Reiterando las solicitudes realizadas mediante oficio OF-C249-2023-094 radicado vía correo electrónico el día 21 de julio de 2023 oficio consecutivo OF-C249-2023-103 radicado el 28 de julio se solicita entrega de las correcciones a las observaciones realizadas por el apoyo la supervisión del contrato para la documentación inicial, se precisa que la entrega de los documentos es de carácter urgente ya que esta información debe radicarse de nuevo a la entidad.

Se trasladan las observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión las cuales se describen a continuación:

- Se observa certificado de la agencia nacional minera de la empresa VIALES Y ARIDOS DEL META SAS, pero este no se encuentra vigente.
- El programa de gerencia de proyectos esta sin firmas de los responsables
- Las hojas de vida del personal ofertado deben venir con firma en original
- Se deben entregar exámenes de ingreso de todo el personal ofertado
- Se adjuntan fichas técnicas de equipos menores, pero no se observa fichas técnicas de la maquinaria pesada a utilizar para actividades iniciales como (demolición, desmonte entro otros).
- Se anexa acta de aprobación del AIU, el cual presenta las siguientes observaciones:
  a) Se deben colocar el objeto de los tres (03) proyectos
  b) Se presentan observaciones en el documento, valores no cuadran, porcentajes tampoco. Revisar y ajustar

c) La fecha del documento es del 2022
d) En el calculo total del AIU no se deben incluir las actividades de certificaciones, PMT, PMA y otros

- se solicita que la programación de obra venga firmada por los responsables del proyecto (directores de obra e interventoría)
- Se solicita entrega de los planos aprobados y firmados por todas las partes, de acuerdo a lo presentado en la Secretaría de Movilidad del Municipio

La interventoría reitera la importancia y el apremio para la entrega de esta documentación ajustada con el fin de trasladar en el menor tiempo posible los soportes exigidos por la supervisión del contrato.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 23 de Agosto del 2023

OF-C249 -2023-126

Jhon Henry Ortiz
7121810119
24/8/23

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

25 AGO 2023
2547

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Reiteración corrección documentación inicial entregada

Reiterando las solicitudes realizadas previamente mediante oficio OF-C249-2023-094 radicado vía correo electrónico el día 21 de julio de 2023 oficio consecutivo OF-C249-2023-103 radicado el 28 de julio oficio consecutivo OF-C249 -2023-117 radicado el día 03 de agosto de 2023 se solicita entrega de las correcciones a las observaciones realizadas por el apoyo la supervisión del contrato para la documentación inicial, se deja evidencia de la trazabilidad de la solicitudes que se han venido realizando ya que a la fecha ha transcurrido mas de un mes y no se ha obtenido respuesta por parte del contratista para subsanar la documentación.

A continuación, se describen las observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión que a la fecha no se han subsanado

- El programa de gerencia de proyectos esta sin firmas de los responsables
- Las hojas de vida del personal ofertado deben venir con firma en original
- Se deben entregar exámenes de ingreso de todo el personal ofertado
- Se adjuntan fichas técnicas de equipos menores, pero no se observa fichas técnicas de la maquinaria pesada a utilizar para actividades iniciales como (demolición, desmonte entro otros).
- Se anexa acta de aprobación del AIU, el cual presenta las siguientes observaciones:
  a) Se deben colocar el objeto de los tres (03) proyectos
  b) Se presentan observaciones en el documento, valores no cuadran, porcentajes tampoco. Revisar y ajustar
  c) La fecha del documento es del 2022

d) En el calculo total del AIU no se deben incluir las actividades de certificaciones, PMT, PMA y otros

- se solicita que la programación de obra venga firmada por los responsables del proyecto (directores de obra e interventoría)
- Se solicita entrega de los planos aprobados y firmados por todas las partes, de acuerdo a lo presentado en la Secretaría de Movilidad del Municipio

La interventoría reitera la importancia y el apremio para la entrega de esta documentación ajustada con el fin de trasladar en el menor tiempo posible los soportes exigidos por la supervisión del contrato.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

2

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

C.C. Archivo
DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

5201

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 24 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-127**

Recibí
Jhon Henry Ortiz
24/08/23

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

2546 R.
11:00

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Reiteración implementación informes mensuales y de seguimiento

Acorde a la documentación entregada por el contratista concerniente a los informes mensuales de obra y los anexos informes de seguimiento, la interventoría ha venido solicitando al contratista la entrega de la documentación en los oficios relacionados a continuación:

OF-C249 -2023-111 radicado el día 01 de Agosto de 2023 mediante el cual se solicita la entrega del informe mensual de ejecución de obra del periodo de julio con sus respectivos anexos

- Informe de seguimiento al plan de gerencia
- Informe de seguimiento al plan de manejo ambiental
- Informe de SST
- Informe de PMT con radicado ante secretaria de movilidad

OF-C249 -2023-116 radicado el día 10 de agosto de 2023 mediante el cual se solicitan las correcciones de los informes mensuales de obra correspondientes al periodo de Mayo y Junio, se solicita al contratista la entrega del informe formato GES-FO-126 según las correcciones estipuladas en la documentación entregada, de igual manera se reitera la entrega de los informes de seguimiento que hacen parte de los anexos solicitados por la interventoría.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

OF-C249 -2023-121 radicado el día 14 de Agosto de 2023, mediante el cual se solicita la corrección e implementación de la documentación entregada lo concerniente al Plan de Gerencia.

De tal forma se reitera al contratista el oficio OF-C249 -2023-0106 solicitud presunto incumplimiento en cuanto consecución de las obligaciones contractuales adquiridas en las siguientes cláusulas:

9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA numeral 2. Atender oportunamente las solicitudes del interventor.

numeral 3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen

10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA numeral 1. Remitir al instituto la totalidad e la documentación técnica y financiera suscrita para el desarrollo y ejecución de las obras en informes mensuales, medio físico y magnético que incluya registro fotográfico a color

numeral 23. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto

2

Valga la pena recordar que esta Interventoría ha advertido al contratista acerca de la no entrega de los informes complementarios al informe mensual de obra y del informe de obra en sí mismo de manera oportuna.

Conforme con lo anterior, la Interventoría, en ejercicio de sus funciones de seguimiento técnico sobre la ejecución del contrato de obra, comunica a la entidad la situación de incumplimiento. Puesto que es una circunstancia reiterada como se deja evidencia en los oficios realizados al respecto

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

C.C. Archivo
DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

3204

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 6 de Julio del 2023 **OF-C249 -2023-085**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: SOLICITUD INFORME DE GERENCIA DE PROYECTOS

Cordial saludo,

1

Teniendo en cuenta la oferta realizada por el contratista CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023 en el proceso licitatorio del contrato de obra, este ofertó dentro de su propuesta mediante la suscripción del formato 7A-Gerencia de proyectos, en el cual manifestó expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de implementar, a su costo y riesgo, un programa de Gerencia de Proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del objeto del contrato, para lo cual el contratista dispondrá de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la entidad.

De acuerdo a lo anterior, se solicita al Contratista de Obra la presentación mensual del informe de Gerencia de Proyectos, ya que junto con el informe mensual de obra No. 1 no se presentó, y este fue solicitado por la interventoría mediante oficio No. OF-C249 -2023-039 del 26 de Mayo del 2023 y el oficio OF-C249 -2023-061 del 13 de Junio del 2023.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Recibi, Jhon Henry Ortiz. 06/07/23.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023 CEDVO-066-2023 Página 1 de 1
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	

Villavicencio, 09 de agosto del 2023

CEDVO-068-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA INFORME SEGUIMINETO PLAN DE GERENCIA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito entregar los informes mencionados en el asusto, de los meses de mayo y junio para su revisión, dando cumplimiento al compromiso adquirido en el oficio CEDVO-066-2023.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo registro fotográfico

RECIBIDO 10 AGO 2023

5206

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 14 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-121**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

Recibido Sin Aceptación
15/08/23

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: CORRECION INFORME DE GERENCIA

Por medio de la presente me permito realizar la devolución de la documentación entregada en oficio CEDVO-068-2023 con fecha de radicado el día 10 de agosto, respecto al informe mensual de seguimiento al plan de gerencia, acorde a el documento base que hace parte de la documentación pre contractual y especifica en el numeral 4.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS en el que se especifica "para efectos del proceso de Contratación, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de **inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto**. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo".

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o de la arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o director de Proyectos de infraestructura deportiva.

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una especialización, maestría o doctorado en

Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de infraestructura deportiva.

Acorde a los especificado en el estudio previo se evidencian falencias en el documento entregado para seguimiento del plan de gerencia, se debe implementar la información entregada por lo que se solicita atender las siguientes observaciones:

1. REUNIÓN INICIAL: Para el inicio del proyecto se realizaron varias reuniones con la participación de la comunidad, interventoría y entidad contratante, que no son tenidas en cuenta ni son mencionadas en el informe siendo estas de importancia en el arranque del proyecto las cuales se describen a continuación:

- reunión de socialización del proyecto
- reunión de visita inicial
- reunión de empalme fase1 y fase 2
- reunión de entrega de las áreas a intervenir
- acta de verificación de diseños
- acta de verificación de permisos y licencias
- acta de verificación de disponibilidad de servicios públicos

se solicita precisar a fondo las generalidades que apenas están nombrados como decisiones con proveedores, contratación de personal y cual es el producto del análisis de la información técnica que se realizó. Adicionalmente no se concluye nada sobre ningún aspecto relevante que al cual se esté realizando algún tipo de seguimiento, no se fijan ni objetivos ni metas no se tiene claridad de los lineamientos generales para seguir en el proyecto, el plan de gerencia estipula un acta de inicio o un documento en el se consignan varios aspectos de tal forma se solicita desarrollar el seguimiento teniendo en cuenta el numeral 5. De plan de gestión en cuanto a procesos de inicio

2

2. ENTREGABLE DEL PROYECTO: los entregables del proyecto están enmarcados dentro de los proceso de planificación numeral 6.2 definición del alcance no se evidencia el documento que se debe establecer para describir como será gestionado el alcance, adicionalmente se dan pautas para implementar la información que hace parte del proceso, no se especifica las etapas o fases determinadas para cada entregable que se implementen haciendo correspondiente seguimiento dentro del periodo de tiempo de este informe.

- ESCENARIOS DEPORTIVOS: Para estos escenarios se tiene una descripción muy escueta del producto final no se especifica que son dos coliseos diferentes en edificaciones independientes teniendo cada uno el desarrollo de diferentes disciplinas.

- PISTA DE ATLETISMO: Se especifica a modo muy general la pista a entregar sin embargo no se especifica el tipo de escenario y bajo que condiciones se debe entregar, acorde a lo descrito en los alcances que se tienen en los estudios previos.

- PISTA DE ATLETISMO: La información consignada no abarca la totalidad de las zonas a entregar que hacen parte integral de la construcción de la pista, se solicita implementar

la información ya que solo se describe de manera superficial el producto final que debe entregarse.

3. GESTION DEL CRONOGRAMA: Si bien se entrega un gráfico de avance por proyecto no se conceptúa teniendo en cuanta las particularidades de cada uno, se solicita realizar un seguimiento más detallado acorde a las actividades realizadas para cada proyecto en este periodo inicial no es claro que tipo de ítems contractuales se realizaron no se tiene una evaluación o conclusión del cronograma, se solicita incluir el corte a la fecha por capítulos o actividades acorde al diagrama de Gannt que es la herramienta fundamental para realizar el seguimiento a la obra y no hace parte del informe entregado.

4. GESTION DE COSTOS: Se describe de manera muy general el estado del proyecto sin embargo no se evidencia un plan de inversión o un seguimiento a los costos generados hasta la fecha por el contrato de obra, para este se realizo un flujo de caja que define la inversión por actividades para cada mes, la interventoría solicitar realizar el seguimiento respecto a esta herramienta que no se relaciona en la documentación del informe

5. GESTION DE LOS RECURSOS: Para este numeral no se describe que recursos hacen parte de la ejecución es necesario describir que personal, equipos e infraestructura se tienen a disposición así mismo realizar un seguimiento según lo planeado en la fase del proyecto, la información entregada es muy deficiente. No es posible evaluar la realidad del proyecto en cuanto a recursos ya que no se entrega ninguna información no existe una descripción clara para realizar el seguimiento.

3

6. GESTION DE LAS COMUNICACIONES: para esta actividad se relacionan las comunicaciones realizadas en una tabla de Excel, sin embargo, no se identifica cual es el proceso que se está implementando con el fin de garantizar que la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la información del proyecto. Cabe anotar que para las comunicaciones realizadas se deben tener en cuenta no solo las que hacen parte de la interacción interventoría y entidad contratante, si no que también la resultante con los proveedores y los actores externos del contrato.

Adicionalmente se encuentra que hacen parte de las comunicaciones actas, informes, comités de obra correos electrónicos etc.

El plan de gerencia describe con claridad los procesos entrega un flujograma y una matriz de comunicaciones que deben implementarse en este informe.

7. GESTION DE LAS ADQUISIOCIONES: No se evidencia la implementación de un proceso claro para llevar a cabo el seguimiento, se solicita implementar un plan de compras concreto o definir cuál es el proceso que se establecerá acorde a lo enunciado en el plan de gerencia ajustado a la realidad de obra teniendo en cuenta la programación del proyecto en sus distintas fases, la interventoría evidencia que no es claro el proceso de adquisición ni el estado de las mismas nombradas dentro del informe

8. GESTION DEL CAMBIO: Se habla de líneas para medición del desempeño y de los cambios en las mismas, sin embargo, en ninguna parte del informe se especifica si se implementa algún

proceso, herramienta que afecte el desarrollo del proyecto según el numeral 8.6 control integrado de cambios se deberán implementar procedimientos y planes de respuesta ante contingencias.

Se debe implementar una estrategia clara para manejo del cambio, el plan de gerencia cita una matriz esquemática para manejar los factores de riesgo en las diferentes fases del proyecto

La interventoría concluye que los informes entregados son deficientes y no reflejan una metodología o la implementación de procesos acorde al plan de gerencia de proyectos avalado inicialmente. De tal forma se solicita implementar la documentación entregada teniendo en cuenta el orden y la estructura que tiene el plan de gerencia:

5. PROCESOS DE INICIO
5.1 REUNION INCIAL
5.2 ACTA DE INICIO DEL PROYECTO
5.3 IDENTIFICACION DE LOS INTERESADOS
6. PROCESOS DE PLANIFICACION
6.1 PLANEACION DEL ALCANCE
6.2 DEFINICION DEL ALCANCE
6.2.1 ENUNCIADO DEL ALCANCE
6.3 PLANEACION DE LA GESTION DEL CRONOGRAMA
6.4 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA
6.5 PLANEACION DE LA GESTION DE COSTOS
6.6 PLANEACION DE LA CALIDAD
6.6.1 POLITICA DE CALIDAD DEL PROYECTO
6.6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
6.6.3 IDENTIFICACION DE LOS REQUISITOS DE LOS INTERESADOS
6.6.4 ROLES Y RESPONSABLES DE LA CALIDAD
6,6,5 METRICAS DE CALIDAD
6.6.6 GESTION DE LOS RECURSOS
6.6.7 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
6.7 PLANEACIÓN DEL RECURSO HUMANO
6.8 PLANEACION DE LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES
6.9 PLANEACION DE LAS ADQUISICIONES
7. PROCESOS DE EJECUCION.
7.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8. PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL
8.1. VALIDAR EL ALCANCE
8.2 CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE
8.3 CONTROL DEL CRONOGRAMA
8.4 CONTROL DE LA CALIDAD
8.5 CONTROL DE LAS COMUNICACIONES
8.6 CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS
9. PROCESOS DE CIERRE
9.1 CERRAR EL PROYECTO

Se anexa a este informe una carpeta con la documentación entregada

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

5210

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 01 de Agosto del 2023

IDERMETA NIT 892099210 6 01 AGO 2023

OF-C249 -2023-0106

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

5:00 Recibido sin Aceptación
Jenssy Parra
01/08/2023 04:38 pm

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: *ANUNCIO DE SOLICITUD DE DEBIDO PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.*

Cordial saludo.

1

Atendiendo a las condiciones contractuales y las condiciones presentadas en la obra de la referencia, esta interventoría considera que existe mérito para emitir alerta sobre el posible incumplimiento al contrato de obra, por parte del contratista.

En el presente escrito se hará referencia a:

1. Identificación del contrato de obra.
2. Las obligaciones no cumplidas, como hecho motivador de alertas por presunto incumplimiento.
3. Las pruebas del hecho.
4. Concepto de la interventoría acerca de cómo debe ser cumplida la obligación presuntamente incumplida
5. Consecuencias de la persistencia de los hechos

1. *IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.*

En el cuadro que se presenta a continuación se incluyen los datos generales del Contrato de Obra Pública:

Contrato de obra	106 de 2023
Contratante	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
Contratista	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023 Nit. 901.682.871-2 R.L. JHON HENRY ORTIZ GARCIA C.C. No. 1.121.840.118
Fecha del contrato	16 DE FEBRERO DEL 2023
Objeto	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO

	EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.
Fecha de inicio	10 DE MAYO DEL 2023
Plazo inicial	DOCE MESES

2. OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS, COMO HECHO MOTIVADOR DE ALERTAS POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.

La alerta de posible incumplimiento se motiva en los siguientes hechos.

2.1. Teniendo en cuenta la oferta realizada por el contratista CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023 en el proceso licitatorio del contrato de obra y la Cláusula 9 Obligaciones generales del contratista Numeral No. 5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad, este ofertó dentro de su propuesta mediante la suscripción del formato 7A-Gerencia de proyectos, en el cual manifestó expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de implementar, a su costo y riesgo, un programa de Gerencia de Proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del objeto del contrato, para lo cual el contratista debe disponer de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la entidad. A la fecha el contratista no ha presentado hoja de vida de dicho profesional ni ha presentado los informes de seguimiento mensual sobre la implementación y desarrollo del Plan de Gerencia de Proyectos.

2

2.2. En el Formulario No. 1 - Oferta económica, capitulo CERTIFICACIONES PMT Y/O PMA, OTROS, Subcapítulo CERTIFICACIONES – PMT Y/O PMA, OTROS ESCENARIOS DEPORTIVOS en el ítem No. 20 Plan de Manejo Ambiental, Subcapítulo CERTIFICACIONES – PMT Y/O PMA, OTROS PISTA DE PATINAJE en el ítem No. 9.3 PMA y Subcapítulo CERTIFICACIONES – PMT Y/O PMA, OTROS, PISTA DE ATLETISMO, se evidencia que se debe realizar una implementación mensual por lo cual se ha solicita la presentación del informe de implementación durante el mes, sin que a la fecha se haya tenido respuesta.

2.3. En la cláusula 9 Obligaciones generales del contratista Numeral No. 2. Atender oportunamente los requerimientos del interventor y numeral No. 3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen; la interventoría mediante oficios OF-C249 -2023-039 y OF-C249 -2023-061, OF-C249 -2023-080, OF-C249 -2023-083, OF-C249 -2023-085, OF-C249 -2023-090 ha requerido al contratista de obra la entrega del informe de seguimiento al Plan de Gerencia de Proyectos, informe seguimiento al plan de manejo ambiental con su respectivo presupuesto para implementación informe seguimiento plan de manejo de tránsito, los cuales a la fecha no han sido entregados.

2.4. En la cláusula 10 Obligaciones específicas del contratista Numeral No. 23. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto; a la fecha el contratista no ha presentado los informes requeridos.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Por su parte, la Ley 1474 de 2011, respecto de la colaboración que requieren las entidades estatales, para el logro de sus fines y prevenir hechos que atenten contra la moralidad administrativa y el interés público, delimitó las funciones de la interventoría en su artículo 83.

Conforme con lo anterior, la Interventoría, en ejercicio de sus funciones de seguimiento técnico sobre la ejecución del contrato por parte del Contratista de obra, informará a la entidad si el contratista se encuentra en situación de incumplimiento de sus obligaciones se informará por tanto, si la firma contratista de obra no ha cumplido con el objeto contractual conforme con el cronograma de obra y no se ha dado al cumplimiento de generar un plan de contingencia para superar el atraso de las obras.

Valga la pena recordar que esta Interventoría ha advertido al contratista acerca de la no entrega de los informes complementarios al informe mensual de obra de manera oportuna.

Se resalta que, encontrándose el contratista en situación de presunto incumplimiento del contrato de obra, se habilita a la Entidad para iniciar y dar curso al trámite de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Todo lo anterior se menciona con la finalidad de conminar a El Contratista a implementar las condiciones que permitan la subsanación de los hechos mencionados y la obtención del objeto contractual en las condiciones contenidas en el contrato de obra.

Atentamente,

5

ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

C.C. Archivo
DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Gmail consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

INGRESO DE PERSONAL

4 mensajes

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 1 de agosto de 2023, 9:32
Para: escenariosdeportivos2023@gmail.com, armconsulting@gmail.com, CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

PL-120-372
Villavicencio, 01 de Agosto de 2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
R/L JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Contrato De Obra N° 106 DE 2023
Escenariosdeportivos2023@gmail.com
Ciudad.

CORSORCIO INTERESCENARIOS
R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Contrato De Interventoría N° 249 DE 2023
interescenariosc@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: INGRESO DE PERSONAL

Cordial saludo

Por medio de la presente solicito ingreso del personal de cargue para el desmonte que se está realizando en la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META .**

En base a lo anterior anexo Cedulas de Ciudadanía , afiliación ARL , para su verificación y posterior autorización de ingreso

--
Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta
Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

2 adjuntos

JUAN ESTEBAN SOLANO ALDANA.pdf
4245K

JAVIER CAMILO MORALES CARO.pdf
4308K

---

consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com> 1 de agosto de 2023, 10:45

Para: Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co>
Cc: armconsulting@gmail.com, CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

Buen dia

Revisado lo anterior se AUTORIZA ingreso de:

Juan Esteban Solano Aldana.
Javier Camilo Morales Caro.

Se les recuerda nuevamente que durante la ejecución de la actividad a desarrollar es OBLIGATORIO el uso de los Elementos de Protección Personal , por lo tanto al evidenciar el incumplimiento
se realizará el retiro del personal de obra.

Cordialmente;

[El texto citado está oculto]

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 1 de agosto de 2023, 11:11
Para: consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

Gracias.
[El texto citado está oculto]

---

consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com> 1 de agosto de 2023, 11:27
Para: sstvilla.2023@gmail.com, direccion.escenariosdeportivos@gmail.com

[El texto citado está oculto]

5215

Gmail consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

Fwd: DOCUMENTOS UZN320

2 mensajes

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 1 de agosto de 2023, 17:10
Para: consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>, CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

PL-120-376
Villavicencio, 01 de Agosto de 2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
R/L JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Contrato De Obra N° 106 DE 2023
Escenariosdeportivos2023@gmail.com
Ciudad.

CORSORCIO INTERESCENARIOS
R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Contrato De Interventoría N° 249 DE 2023
interescenariosc@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: INGRESO DE PERSONAL

Cordial saludo

Por medio de la presente solicito ingreso del personal de cargue para el desmonte que se está realizando en la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META .**
Para el dia Martes 02 de Agosto de 2023

En base a lo anterior anexo Cedulas de Ciudadanía , afiliación ARL , para su verificación y posterior autorización de ingreso

--

---------- Forwarded message ---------
De: **METALREC SAS** <metalrecsas@metalrec.com.co>
Date: mar, 1 ago 2023 a las 16:24
Subject: DOCUMENTOS UZN320
To: <planeacion@idermeta.gov.co>

5216

Área administrativa - Sede Bello
Calle 21C No. 42- 169
Autopista Medellín - Bogotá
Bello - Antioquia
+57 315 612 9526 - +57 324 456 5394
metalrecsas@metalrec.com.co
www.metalrec.com.co

Metalrec

Transforma tu huella

"Además de las obligaciones que emanan de la naturaleza del acuerdo del que da cuenta el presente instrumento el receptor de la información confidencialidad estará obligado a: Mantener la información confidencial en estricta reserva y no revelar ningún dato de la información a ninguna otra parte, relacionada o no, sin el consentimiento previo escrito de Metalrec. Instruir al personal que estará encargado de recibir la información confidencial, debiendo suscribir el correspondiente acuerdo de confidencialidad si fuere necesario, de su obligación de recibir, tratar y usar la información confidencial que reciban como confidencial y destinada únicamente al propósito objeto del acuerdo, en los mismos términos en que se establece en el presente instrumento. Divulgar la información confidencial únicamente a las personas autorizadas para su recepción dentro de la organización. Tratar confidencialmente toda la información recibida directa o indirectamente del divulgador, y no utilizar ningún dato de esa información de ninguna manera distinta al propósito del presente acuerdo. No manejar, usar, explotar, o divulgar la información confidencial a ninguna persona o entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en este instrumento, salvo que sea expresamente autorizado por Metalrec."

--
Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta
Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

ORLANDO GONZALEZ.pdf
1885K

consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com> 1 de agosto de 2023, 18:27
Para: sstvilla.2023@gmail.com, direccion.escenariosdeportivos@gmail.com

[El texto citado está oculto]

ORLANDO GONZALEZ.pdf
1885K

5217

Gmail consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

RESPUESTA OFICIO RADICADO IDERMETA 2320- 2305

2 mensajes

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 4 de agosto de 2023, 15:54
Para: consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

PL-120-385
Villavicencio, 04 de Agosto de 2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
R/L JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Contrato De Obra N° 106 DE 2023
Escenariosdeportivos2023@gmail.com
Ciudad.

CORSORCIO INTERESCENARIOS
R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Contrato De Interventoría N° 249 DE 2023
interescenariosc@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO RADICADO IDERMETA 2320- 2305

Cordial saludo

Por medio de la presente trasladó respuesta del club LLANEROS FC , vía correo electrónico ,dando respuesta a los oficios OF-C249-2023-113 del 03 de Agosto y CEDVO-061-2023 del 02 de Agosto de 2023 .

Atentamente

BIBIANA PAN MERCHÁN
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos IDERMETA

ANEXO: 01 PDF OFICIO LLANEROS

Elaboró: MIGUEL SOTO PIÑERO
Cargo: CPS 438 DE 202

--
Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta

5218

Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

LLANEROS .pdf
714K

---

consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com> 4 de agosto de 2023, 16:35
Para: direccion.escenariosdeportivos@gmail.com

[El texto citado está oculto]

LLANEROS .pdf
714K

5219

Gmail consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

COMITÉ DE OBRA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA ÓLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"

2 mensajes

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 9 de agosto de 2023, 14:53
Para: CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>, consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

PL-120-394
Villavicencio, 09 de agosto de 2023

Al contestar, citar en el asunto:
Respuesta al oficio No PL-120-394

Señores:
CORSORCIO INTERESCENARIOS
R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Contrato De Interventoría N° 249 DE 2023
interescenariosc@gmail.com
Ciudad

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
R/L JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Escenariosdeportivos2023@gmail.com
Carrera 16 # 24-03 Villa Olímpica
Ciudad

Asunto: COMITÉ DE OBRA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA ÓLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"

Cordial saludo

Atentamente me permito convocarlos a comité técnico, con el fin de hacer seguimiento al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META", para el día ***JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 02:00 PM.***

Cordialmente,

BIBIANA PAN MERCHÁN
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos

Elaboró: Adriana Lesmes

Cargo: Profesional - CPS

--
Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta
Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

---

consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com> 9 de agosto de 2023, 14:57
Para: direccion.escenariosdeportivos@gmail.com

[El texto citado está oculto]

Gmail consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

Remisión CERTIFICACIÓN BANCARIA PARA ANTICIPÓ RECURSOS ASIGNACIONES DIRECTAS

2 mensajes

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 9 de agosto de 2023, 15:08
Para: consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

PL-120-396
Villavicencio, 09 de agosto de 2023

Al contestar, citar en el asunto:
Respuesta al oficio PL-120-396.

Señores:
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
R/L JHON HENRY ORTIZ GARCÍA
Escenariosdeportivos2023@gmail.com
Ciudad

Ref. Ct De Obra N° 9106 De 2023 "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Remisión CERTIFICACIÓN BANCARIA PARA ANTICIPÓ RECURSOS ASIGNACIONES DIRECTAS.

Atentamente me permito remitir la certificación bancaria en la cual se debe hacer la consignación mundial de los rendimientos financieros de acuerdo con el correspondiente anticipo.

Cordialmente,

BIBIANA PAN MERCHÁN
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos

Elaboró: Adriana Lesmes
Cargo: Profesional – CPS

--
Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta
Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

CERTIFICACIONES BANCARIAS RENDIMIENTOS - OBRA MULTIPROPOSITO.pdf
396K

consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com> 9 de agosto de 2023, 15:48
Para: contabilidadedeportivos@gmail.com

[El texto citado está oculto]

CERTIFICACIONES BANCARIAS RENDIMIENTOS - OBRA MULTIPROPOSITO.pdf
396K

Gmail consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

REPROGRAMACIÓN COMITÉ DE OBRA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"

2 mensajes

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 14 de agosto de 2023, 14:21
Para: CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>, consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

PL-120-407
Villavicencio, 14 de agosto de 2023

Al contestar, citar en el asunto:
Respuesta al oficio No PL-120-394

Señores:
CORSORCIO INTERESCENARIOS
R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Contrato De Interventoría N° 249 DE 2023
interescenariosc@gmail.com
Ciudad

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
R/L JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Escenariosdeportivos2023@gmail.com
Carrera 16 # 24-03 Villa Olímpica
Ciudad

Asunto: COMITÉ DE OBRA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"

Cordial saludo

Atentamente me permito reprogramar comité técnico, con el fin de hacer seguimiento al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META", para el día ***MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 09:00 AM.***

Cordialmente,

BIBIANA PAN MERCHÁN
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos

Elaboró: Adriana Lesmes

--
Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta
Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

---

consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com> 14 de agosto de 2023, 19:44
Para: direccion.escenariosdeportivos@gmail.com, escenariosdeportivos.ambiental@gmail.com, sstvilla.2023@gmail.com

[El texto citado está oculto]

Gmail consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

Fwd: Autorizacion para entrada de vehiculo

3 mensajes

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 15 de agosto de 2023, 15:40
Para: consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>, CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

PL-120-413
Villavicencio, 15 de Agosto de 2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
R/L JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Contrato De Obra N° 106 DE 2023
Escenariosdeportivos2023@gmail.com
Ciudad.

CORSORCIO INTERESCENARIOS
R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Contrato De Interventoría N° 249 DE 2023
interescenariosc@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: INGRESO DE PERSONAL

Cordial saludo

Por medio de la presente solicito ingreso del personal de cargue para el desmonte que se está realizando en la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META .**

En base a lo anterior anexo Cedulas de Ciudadanía , afiliación ARL , para su verificación y posterior autorización de ingreso

--
Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta
Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

2 adjuntos

poliza.pdf
333K

5226

Idermeta.docx
971K

---

consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com> 15 de agosto de 2023, 15:57
Para: sstvilla.2023@gmail.com

[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

poliza.pdf
333K

Idermeta.docx
971K

---

consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com> 15 de agosto de 2023, 15:58
Para: direccion.escenariosdeportivos@gmail.com, sstvilla.2023@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Planeacion Idermeta** <planeacion@idermeta.gov.co>
Date: mar, 15 ago 2023 a las 15:40
Subject: Fwd: Autorizacion para entrada de vehiculo
To: consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>, CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

poliza.pdf
333K

Idermeta.docx
971K

Gmail consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

Fwd: autorizacion entrada de vehiculos

2 mensajes

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 16 de agosto de 2023, 11:49
Para: consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>, CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

PL-120-416
Villavicencio, 16 de Agosto de 2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
R/L JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Contrato De Obra N° 106 DE 2023
Escenariosdeportivos2023@gmail.com
Ciudad.

CORSORCIO INTERESCENARIOS
R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Contrato De Interventoría N° 249 DE 2023
interescenariosc@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: INGRESO DE PERSONAL

Cordial saludo

Por medio de la presente solicito ingreso del personal de cargue para el desmonte que se está realizando en la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META .**

En base a lo anterior anexo Cedulas de Ciudadanía , afiliación ARL , para su verificación y posterior autorización de ingreso

---------- Forwarded message ---------
De: **Variedades Trini** <variedadestrinicolombia@gmail.com>
Date: mié, 16 ago 2023 a las 9:55
Subject: autorizacion entrada de vehiculos
To: <planeacion@idermeta.gov.co>

5228



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021549786

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WCW041	CHEVROLET	NKR	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.999	BLANCO GALAXIA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	FURGON	DIESEL	2400


NÚMERO DE MOTOR: 397979
REG: N
VIN: 9GDNMR857EB026683
NÚMERO DE SERIE: 9GDNMR857EB026683
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9GDNMR857EB026683
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): SANCHEZ CELIS MARTHA MERCEDES
IDENTIFICACIÓN: C.C. 40386837




RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 128
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32013001331712
I/E: I
FECHA IMPORT.: 12/09/2013
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 01/10/2013
FECHA EXP. LIC. TTO.: 09/11/2020
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA


LT07000435091


5229

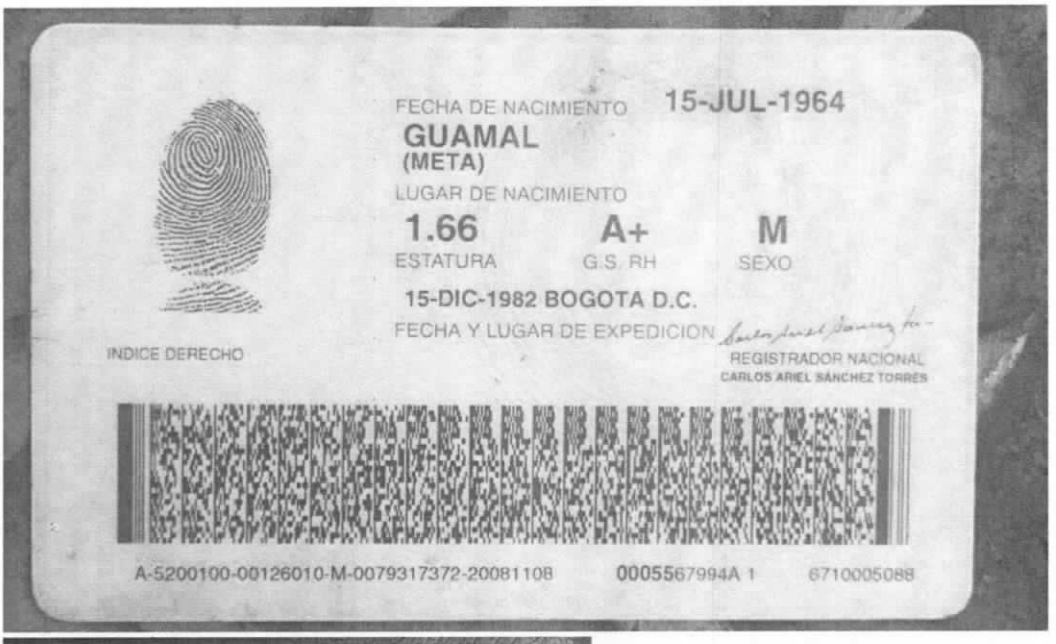
FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1964
GUAMAL
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
15-DIC-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-5200100-00126010-M-0079317372-20081108
0005567994A 1
6710005088

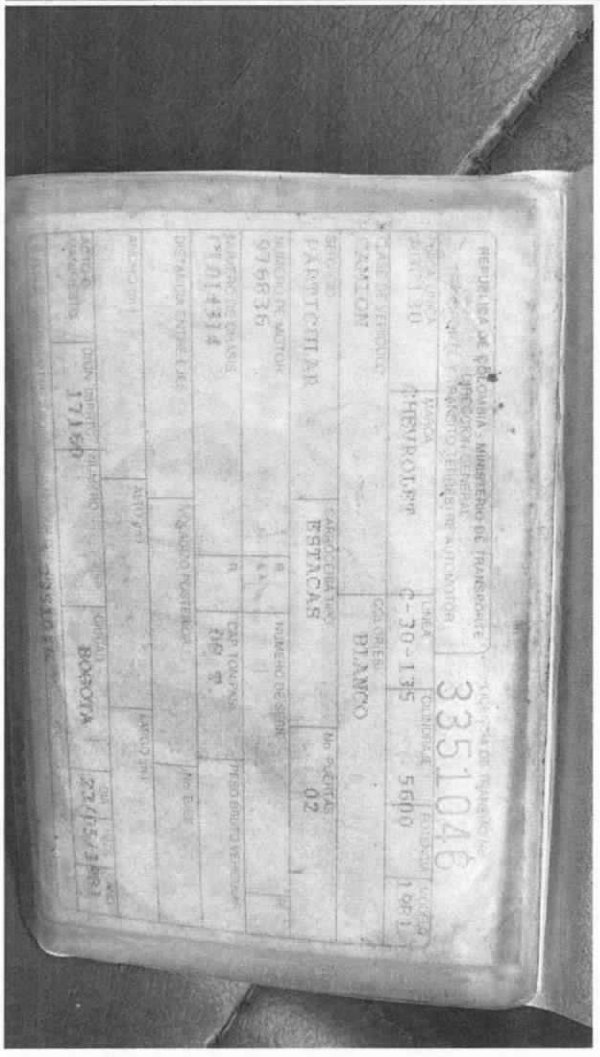
REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE TRANSPORTE
CHEVROLET
C-30-135
BLANCO
ESTACAS
5600
02
BOGOTA
3351046

5230

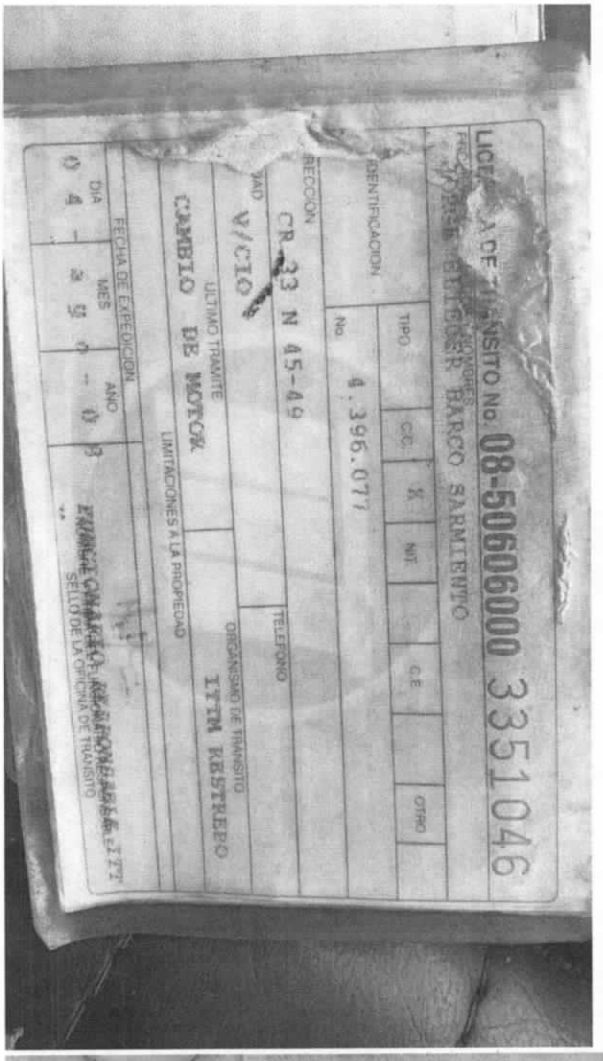

LICENCIA DE TRANSITO No. 08-50606000 3351046
PROPIETARIO BERTHER BARCO SARMIENTO
IDENTIFICACION
TIPO
No 4.396.077
DIRECCION
CR 33 N 45-49
BARRIO V/CIO
ULTIMO TRAMITE
CAMBIO DE MOTOR
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
TELEFONO
ORGANISMO DE TRANSITO
ITTM RESTREPO
FECHA DE EXPEDICION
DIA 0 4
MES 0 9
ANO 0 3
SELLO DE LA OFICINA DE TRANSITO

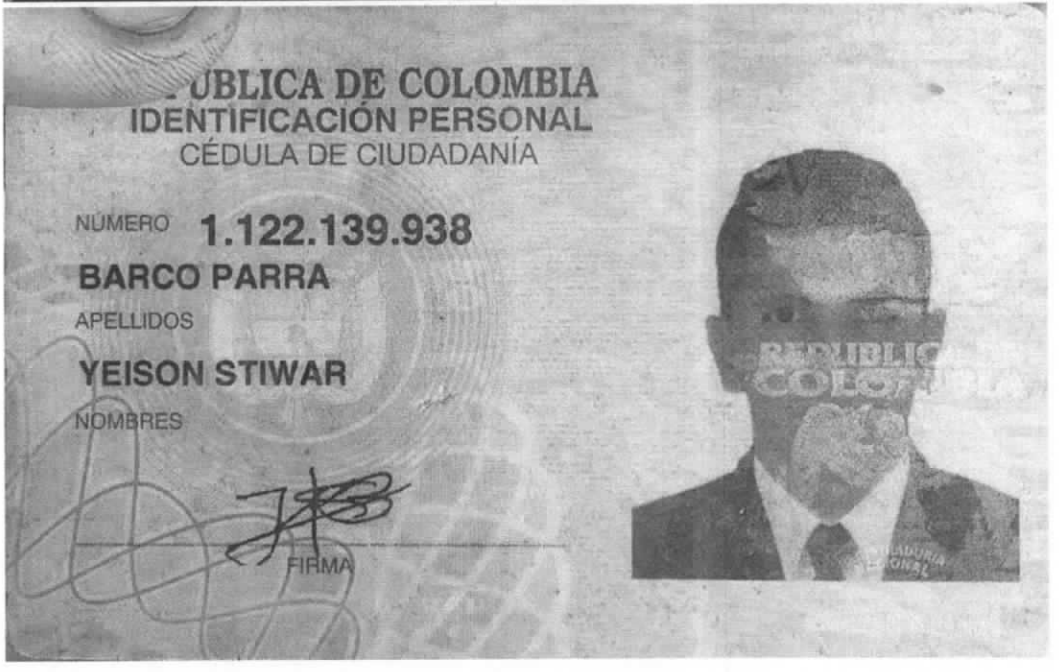
UBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.122.139.938
BARCO PARRA
APELLIDOS
YEISON STIWAR
NOMBRES
FIRMA

5231



FECHA DE NACIMIENTO 14-NOV-1996
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
19-NOV-2014 ACACIAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
P-5200500-00903861-M-1122139938-20170509 0055348610G 1 9999937118

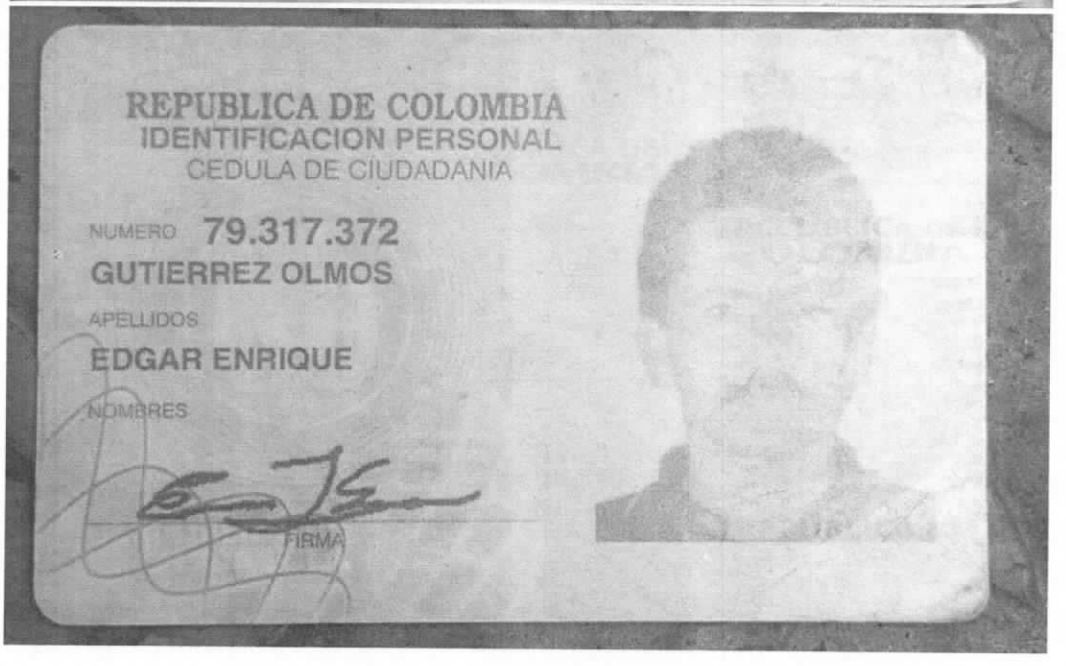

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.317.372
GUTIERREZ OLMOS
APELLIDOS
EDGAR ENRIQUE
NOMBRES
FIRMA

5232



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 161859273

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO
NIT: 900633942
No. de Certificado de Acreditación: 15-OIN-007-001
Fecha de expedición: 2022/10/03
Fecha de vencimiento: 2023/10/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WCW041
CLASE: CAMION
MARCA: CHEVROLET
MODELO: 2014
SERVICIO: Público
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2999
NRO. MOTOR: 397979
NRO. CHASIS: 9GDNMR857EB026683
VIN: 9GDNMR857EB026683
LÍNEA: NKR
COLOR: BLANCO GALAXIA
NOMBRE PROPIETARIO: MARTHA M. SANCHEZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE
RUBERT FERNANDO BELTRAN ACOSTA

Concesión RUNT S.A. / Nit.900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co

--
Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta
Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

3 adjuntos

Cedula Carvajal.pdf
41K

8 Mes Agosto 2023 (2).pdf
402K

poliza.pdf
333K

consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com> 16 de agosto de 2023, 11:50
Para: sstvilla.2023@gmail.com

5233

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

- **Cedula Carvajal.pdf**
  41K
- **8 Mes Agosto 2023 (2).pdf**
  402K
- **poliza.pdf**
  333K

5234

Gmail **consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>**

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 106 DE 2023

2 mensajes

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 18 de agosto de 2023, 11:47
Para: consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

Cordial saludo

ADJUNTO OFICIO PL-120-414 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023 DANDO RESPUETA AL OFICIO OF -C249-2023-120 RADICADO IDERMETA 2432 DEL 14 DE AGOSTO DE 2023

--
Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta
Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

OFICIO PL-120-414 SOLICITUD DE MODIFCACION .pdf
337K

consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com> 18 de agosto de 2023, 15:13
Para: direccion.escenariosdeportivos@gmail.com, sstvillaolimpica 2023 <sstvilla.2023@gmail.com>, escenariosdeportivos.ambiental@gmail.com

[El texto citado está oculto]

OFICIO PL-120-414 SOLICITUD DE MODIFCACION .pdf
337K

5235

Gmail consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

Solicitud estudios y diseños red contra incendios, del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"

2 mensajes

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 29 de agosto de 2023, 15:59
Para: consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>, CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

PL-120-426
Villavicencio, 29 de agosto de 2023

Al contestar, citar en el asunto:
Respuesta al oficio No PL-120-426

Señores:
CORSORCIO INTERESCENARIOS
R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Contrato De Interventoría N° 249 DE 2023
interescenariosc@gmail.com
Ciudad

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
R/L JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Escenariosdeportivos2023@gmail.com
Carrera 16 # 24-03 Villa Olímpica
Ciudad

ASUNTO: Solicitud estudios y diseños red contra incendios, del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"

Cordial saludo

Por medio del presente me permito solicitar a ustedes, remitan al IDERMETA los estudios y diseños completos de la red contra incendios de los escenarios a intervenir por medio del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META", con el fin de hacer la revisión y remitirlos al cuerpo de bomberos de Villavicencio para que sea emitida la aprobación de diseños y vigencia de los mismos.

Cordialmente,

BIBIANA PAN MERCHÁN
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos

5236

Elaboró: Adriana Lesmes
Cargo: Profesional - CPS

--
Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta
Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

---

consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com> 29 de agosto de 2023, 16:58
Para: direccion.escenariosdeportivos@gmail.com

[El texto citado está oculto]

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

ACTAS DE COMITE

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

5238

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	**ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DESMONTADOS**	**Código:** CNCSST-ACT-01 **Versión:** 01 **Fecha:** 02/06/2020	IDERMETA Instituto de Deporte y Recreación del Meta
NIT: 901682871-2	**Fecha de entrega: 10 de agosto del 2023**		

ACTA No. 01-2023	CONTRATO DE OBRA No. 106 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

I. PARTICIPANTES	**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**
Carlos Alberto Arroyo Acosta	
Andres Hernandez Bocanegra	
Jose Lopez	

II OBJETO

Entrega de materiales desmontados a IDERMETA de la pista de patinaje

III ORDEN DEL DÍA

IV LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NO APLICA

5239

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	**ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DESMONTADOS**	**Código:** CNCSST-ACT-01 **Versión:** 01 **Fecha:** 02/06/2020	IDERMETA Instituto de Deporte y Recreación del Meta
NIT: 901682871-2	**Fecha de entrega: 10 de agosto del 2023**		

V VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR
NO APLICA

VI TEMAS TRATADOS

El Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023, Atreves De La Presente Hace Entrega De Los Materiales Desmontados A Idermeta A Su Funcionar Encargado Firmante.

RELACIÓN DE MATERIALES ENTREGADOS:

- 13 UND - MASTIL METALICO DE 3 A 14 M
- 24 UND – LUMINARIA DE 70W A 400W PARA ALTURA DE 4 A 14

NOTA: Los elementos desmontados se encuentran en mal estado debido a ya cumplió el tiempo de vida útil para el que había sido fabricado.

VII. COMPROMISOS PACTADOS	**RESPONSABLES**

VIII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	10	08	2023
	DIA	MES	AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Villavicencio - Meta, a los **DIEZ (10) días del mes de AGOSTO de 2023.**

5240

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	**ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DESMONTADOS**	**Código:** CNCSST-ACT-01 **Versión:** 01 **Fecha:** 02/06/2020	IDERMETA Instituto de Deporte y Recreación del Meta
NIT: 901682871-2	**Fecha de entrega: 10 de agosto del 2023**		

Vo Bo. FUNCIONARIO IDERMETA _____

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO





5241

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	**ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DESMONTADOS**	**Código:** CNCSST-ACT-01 **Versión:** 01 **Fecha:** 02/06/2020	IDERMETA Instituto de Deporte y Recreación del Meta
NIT: 901682871-2	**Fecha de entrega: 10 de agosto del 2023**		



Calle 24 B 11 – 119 Barrio Olimpico
Correo Eletronico: escenariosdeportivos2023@gmail.com
Villa Olimpica - Villavicencio Meta

5242

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	**ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DESMONTADOS**	**Código:** CNCSST-ACT-01	IDERMETA Instituto de Deporte y Recreación del Meta
		Versión: 01	
		Fecha: 02/06/2020	
NIT: 901682871-2	**Fecha de entrega: 10 de agosto del 2023**		





Calle 24 B 11 – 119 Barrio Olimpico
Correo Eletronico: escenariosdeportivos2023@gmail.com
Villa Olimpica - Villavicencio Meta

5243

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

ACTA N° _____	FECHA:	HORA:	
	14/08/2023		
	LUGAR:	Obra.	
RESPONSABLE:	IDERMETA-INTERVENTORIA-OBRA		

OBJETIVO O PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

Revisión traslado de redes hidrosanitaria y RCI

AGENDA / ORDEN DEL DÍA

Comentarios interventoría acerca de la revisión de la propuesta.

DESARROLLO

- RCI:

Conexión a la sifonera existente Fase 1, la tubería 4000 es necesario y no esta incluida contractualmente debe incluirse y son debidos accesorios.

- hidraulica.

Carrera 16 con 25: Conexión rede hidraulica 1 1/2".

Tanque Subterráneo: Construcción tanque agua potable no contractual, 32,24 m3 abastecimiento para un día segun afore 500 personas por coliseo.

Inclusión de bomba c hidroflo

- Bomba 12 HP,
- Inclusión de llaves para aseo en baños.
- Aguas lluvias

Se define en consorio que debe aumentarse la cantidad

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

de bajantes para cubierta, esto debido a que la pendiente de la cubierta lo exigen.
Se llevo a cabo el traslado de las redes que se cruzan con la cimentación, aguas lluvias y sanitaria.

Patinaje

- Se necesita incluir Filtros para la grama sintetica.
- Se necesita incluir geodren plana para el muro de contencion.
- Reduccion de Seccion de carcamo con rejilla plastica, ya que la rejilla es mas pequeña que la sección de diseño a=0,15 Rejilla a= 0,13m.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA	ESTADO		
			CE	CFT	NC

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector Gomez	Representante legal	
Wilson L. Gonzalez R.	Esp. Hidraulico	
Kevin Echeverry	Asesor Redes hidraulicas	
Yeison E. Gomez G	Director de obra.	

Nota: Agréguense cuantas celdas se requieran para compromisos y asistentes, igualmente se podrá imprimir la hoja 2 cuantas veces sea necesario para dar continuidad al acta (aplica en los casos que se registre de forma manual).


Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co


HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

5245

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

REGISTRO FOTOGRAFICO

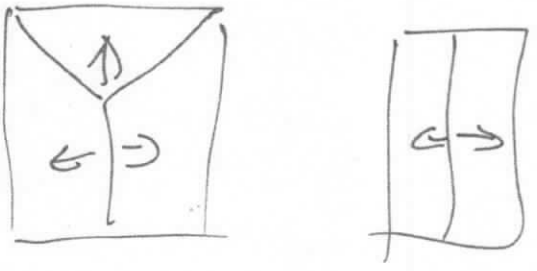

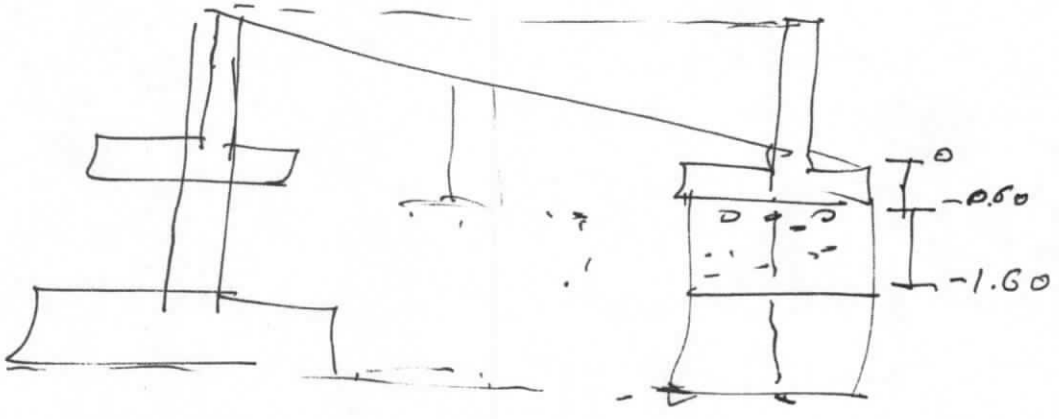

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

5246

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

ACTA N° _____	FECHA:	HORA:	
	18-08-2023	Inicio: 3:30 pm	Fin: 4:30 pm
	LUGAR:	OFICINA INTERVENTORIA	
RESPONSABLE:	INTERVENTORIA – OBRA		

OBJETIVO O PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

El objetivo de la reunión es verificar las observaciones encontradas en el ajuste de diseño estructura para la cimentación

AGENDA / ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de diseño para la cimentación actualizada

DESARROLLO

Se inicia reunión con la participación de especialista estructural de la interventoría e ingeniero calculista que hace parte de la consultoría realizada por el AIM, el objetivo de la reunión es verificar las observaciones encontradas al diseño actualizado.

El especialista estructural que hace parte de la interventoría realiza verificación de los diseños memorias de cálculo, dimensiones de los elementos refuerzos de acero se revisan memorias de calculo para lo cual concluye:

Se solicita mejorar el factor de seguridad de las vigas de cimentación que tienen longitudes mayores a 7.0 m con un elemento a L/2 que frene la rotación causados por los asentamientos que genera efectos torsionales

Se idealiza un elemento tipo dado en concreto ciclópeo de sección de 1.0m x 1.0m x 1.0m, en el centro de la viga, el cual quedaría integrado.

Se realizara detalle del elemento propuesto

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA	ESTADO		
			CE	CFT	NC
INTERVENTORIA	PRESENTARA EL SOPORTE TECNICO DE LAS OBSERVACIONES DESCRITAS	23-08-2023			

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

5247

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-01
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 02

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	R/L CONSORCIO INTERESCENARIOS	
LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO INTERESCENARIOS	
JORGE DAVID MONTENEGRO	ESTRUCTURAL CONSULTORIA AIM	
YEISON ESNEIDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	
DIEGO PARRA	ESPECIALISTA ESTRUCTUTRAL INTERESCENARIOS	

Nota: Agréguense cuantas celdas se requieran para compromisos y asistentes, igualmente se podrá imprimir la hoja 2 cuantas veces sea necesario para dar continuidad al acta (aplica en los casos que se registre de forma manual).

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico – Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

5248

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AGOSTO/2023 Σmes	AGOSTO/2023 VR. TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DE 5 EDIFICIOS DE 3 PISOS MULTIFAMILIARES Y 1 EDIFICIO EN LA VILLA COMERCIAL, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA (CASANARE)								
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	6436.86	$ 5,438.00	$ 35,003,645	1,120.00	$ 6,090,560.00	1,120.00	$ 6,090,560.00
					$ 35,003,645				
2.00	DESMONTE Y DEMOLICIONES								
2.1	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	30.00	$ 30,524.00	$ 915,720	-	$ -	30.00	$ 915,720.00
2.2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	55.00	$ 38,155.00	$ 2,098,525	-	$ -	55.00	$ 2,098,525.00
2.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4,319.02	$ 18,491.00	$ 79,862,999	-	$ -	4,319.02	$ 79,862,998.82
2.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	KG	25,854.30	$ 5,491.00	$ 141,965,961	-	$ -	25,854.30	$ 141,965,961.30
2.5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	58.00	$ 82,033.00	$ 4,757,914	-	$ -	58.00	$ 4,757,914.00
2.6	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	3,250.79	$ 18,021.00	$ 58,582,487	-	$ -	3,250.79	$ 58,582,486.59
2.7	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4,319.02	$ 13,760.00	$ 59,429,715	-	$ -	-	$ -
2.8	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	11.00	$ 15,262.00	$ 167,882	-	$ -	11.00	$ 167,882.00
2.9	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	487.53	$ 373,009.00	$ 181,853,078	438.22	$ 163,460,003.98	487.53	$ 181,853,077.77
2.10	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	3,335.73	$ 14,647.00	$ 48,858,437	-	$ -	3,070.50	$ 44,973,613.50
2.11	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	332.05	$ 431,624.00	$ 143,320,749	332.05	$ 143,320,749.20	332.05	$ 143,320,749.20
2.12	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	189.77	$ 383,666.00	$ 72,808,297	-	$ -	189.77	$ 72,808,296.82
2.13	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	45.90	$ 33,079.00	$ 1,518,326	-	$ -	45.90	$ 1,518,326.10
					$ 796,140,090				
3.00	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	4,718.84	$ 38,501.00	$ 181,680,059	1,077.04	$ 41,467,117.04	1,077.04	$ 41,467,117.04
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	5,396.66	$ 63,600.00	$ 343,227,576	95.80	$ 6,092,880.00	95.80	$ 6,092,880.00
3.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	980.88	$ 31,815.00	$ 31,295,056	-	$ -	-	$ -
					$ 556,202,691				
4.00	CIMENTACIÓN								
4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	46.78	$ 641,273.00	$ 29,998,751	6.10	$ 3,911,765.30	6.10	$ 3,911,765.30
4.2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	85.21	$ 1,444,492.00	$ 123,085,163	-	$ -	-	$ -
4.3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	189.95	$ 1,003,116.00	$ 190,541,884	-	$ -	-	$ -
4.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124.96	$ 1,075,099.00	$ 134,344,371	-	$ -	-	$ -
4.5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCION 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	108.08	$ 648,730.00	$ 70,114,738	-	$ -	-	$ -
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	51209.86	$ 8,513.00	$ 435,949,538	2,912.30	$ 24,792,409.90	2,912.30	$ 24,792,409.90
4.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	632.48	$ 821,666.00	$ 519,687,312	-	$ -	-	$ -
					$ 1,503,721,757				
5.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	993.72	$ 128,414.00	$ 127,607,560	-	$ -	-	$ -
5.2	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	128.68	$ 1,377,156.00	$ 177,212,434	-	$ -	-	$ -
5.3	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. GRADERIAS	M3	99.37	$ 674,689.00	$ 67,043,846	-	$ -	-	$ -
					$ 371,863,840				
6.00	ESTRUCTURAS EN ACERO								
6.1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	572,164.72	$ 25,806.00	$ 14,765,282,764	-	$ -	-	$ -
6.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	17,585.47	$ 9,955.00	$ 175,063,354	-	$ -	-	$ -
					$ 14,940,346,116				
7.00	CUBIERTA Y FACHADA								
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS, ESPESOR DE 2"	M2	6,524.58	$ 254,358.00	$ 1,659,579,120	-	$ -	-	$ -
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte y remates de cubierta)	M2	5,103.05	$ 1,106,035.00	$ 5,644,151,907	-	$ -	-	$ -
					$ 7,303,731,027				
8.00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES								
8.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOe $ 1:4)	M2	2,039.46	$ 53,708.00	$ 109,535,318	-	$ -	-	$ -
8.2	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31.50	$ 1,338,592.00	$ 42,165,648	-	$ -	-	$ -
8.3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	36.10	$ 1,377,158.00	$ 49,715,332	-	$ -	-	$ -
8.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	45.99	$ 1,008,399.00	$ 46,376,270	-	$ -	-	$ -
8.5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.58	$ 1,805,128.00	$ 10,072,614	-	$ -	-	$ -
8.6	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.09	$ 1,989,083.00	$ 10,124,432	-	$ -	-	$ -
8.7	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	25.44	$ 142,180.00	$ 3,617,059	-	$ -	-	$ -
8.8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2,557.33	$ 26,532.00	$ 67,851,080	-	$ -	-	$ -
8.9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M3	1,267.50	$ 36,084.00	$ 45,736,470	-	$ -	-	$ -
8.10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	15,674.34	$ 8,513.00	$ 133,435,656	-	$ -	-	$ -
					$ 518,629,379				
9.00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS								
9.1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	60.00	$ 1,411,393.00	$ 84,683,580	-	$ -	-	$ -
9.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	4.00	$ 900,711.00	$ 3,602,844	-	$ -	-	$ -
9.3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	24.00	$ 953,654.00	$ 22,887,696	-	$ -	-	$ -
9.4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	76.00	$ 504,633.00	$ 38,352,108	-	$ -	-	$ -
9.5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	20.00	$ 161,971.00	$ 3,239,420	-	$ -	-	$ -
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UNB	4.00	$ 327,907.00	$ 1,311,628	-	$ -	-	$ -
9.7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	43.84	$ 156,171.00	$ 6,846,537	-	$ -	-	$ -
9.8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	76.00	$ 387,179.00	$ 29,425,604	-	$ -	-	$ -
9.9	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UND	2.00	$ 43,672.00	$ 87,344	-	$ -	-	$ -
					$ 190,436,761				
10.00	CARPINTERÍA METÁLICA								
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20: 2 X 0.90 M	UND	28.00	$ 528,395.00	$ 14,795,060	-	$ -	-	$ -
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	118.80	$ 720,221.00	$ 85,562,255	-	$ -	-	$ -
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMINIO	M2	67.80	$ 323,273.00	$ 21,917,909	-	$ -	-	$ -
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	287.76	$ 310,290.00	$ 89,289,050	-	$ -	-	$ -
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF 304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGUN PLANO	M2	374.82	$ 1,591,335.00	$ 596,464,185	-	$ -	-	$ -
					$ 808,028,459				
11.00	OBRAS EXTERIORES								
11.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	941.80	$ 48,109.00	$ 45,309,056	-	$ -	-	$ -
11.2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	941.80	$ 203,395.00	$ 191,557,411	-	$ -	-	$ -
11.3	SISTEMA MODULAR SPORT PARA CANCHAS DEPORTIVAS (FLEXIBLES, ALTOS ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA CUALQUIER ESCENARIO DEPORTIVO DE COMPETITIVIDAD)	M2	2,785.14	$ 684,313.00	$ 1,905,907,509	-	$ -	-	$ -
11.4	SISTEMA MODULAR ESPECIALIZADO PARA PESAS EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO, MEDIDAS DE 30 CMS X 30 CMS Y ESPESOR DE 1.2 CMS	M2	352.74	$ 790,931.00	$ 278,993,001	-	$ -	-	$ -
11.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	738.00	$ 52,542.00	$ 38,775,996	-	$ -	-	$ -
11.6	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	745.42	$ 135,684.00	$ 101,141,567	-	$ -	-	$ -
11.7	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2,318.21	$ 225,626.00	$ 523,048,449	-	$ -	-	$ -
					$ 3,084,732,989				
12.00	PISOS Y ENCHAPES								
12.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1,811.91	$ 12,127.00	$ 21,973,033	-	$ -	-	$ -
12.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1,267.50	$ 13,941.00	$ 17,670,218	-	$ -	-	$ -

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

5250

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AGOSTO/2023		ACUMULADO	
						Σmes	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
12.3	ESTUCO PLASTICO	M2	1.811,91	$ 17.784,00	$ 32.223.007	-	$ -	-	$ -
					$ 71.866.258				
13.00	INSTALACIONES HIDRÁULICAS								
13.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	703.27	$ 5.522,00	$ 3.883.457	-	$ -	-	$ -
13.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	246.14	$ 68.679,00	$ 16.904.649	-	$ -	-	$ -
13.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	53,00	$ 247.904,00	$ 13.138.912	-	$ -	-	$ -
13.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	70,33	$ 119.827,00	$ 8.427.433	-	$ -	-	$ -
13.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	175.82	$ 63.600,00	$ 11.182.152	-	$ -	-	$ -
13.6	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	263,47	$ 111.812,00	$ 29.459.109	-	$ -	-	$ -
13.7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	108,04	$ 38.348,00	$ 4.143.118	-	$ -	-	$ -
13.8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	77,64	$ 27.720,00	$ 2.152.181	-	$ -	-	$ -
13.9	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82,92	$ 22.916,00	$ 1.900.195	-	$ -	-	$ -
13.10	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	107,12	$ 19.078,00	$ 2.043.635	-	$ -	-	$ -
13.11	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	64,09	$ 16.171,00	$ 1.036.238	-	$ -	-	$ -
13.12	TUBERÍA PVCP RDE 9 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	106,64	$ 13.297,00	$ 1.418.926	-	$ -	-	$ -
13.13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	92,00	$ 58.368,00	$ 5.372.616	-	$ -	-	$ -
13.14	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24,00	$ 70.289,00	$ 1.686.936	-	$ -	-	$ -
13.15	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	64,00	$ 80.231,00	$ 5.134.784	-	$ -	-	$ -
13.16	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 328.362,00	$ 6.567.240	-	$ -	-	$ -
13.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	3,00	$ 269.530,00	$ 808.590	-	$ -	-	$ -
13.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø4" UM	UN	2,00	$ 170.877,00	$ 341.754	-	$ -	-	$ -
13.19	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 23.463,00	$ 469.260	-	$ -	-	$ -
13.20	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 11.553,00	$ 184.848	-	$ -	-	$ -
13.21	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	$ 10.536,00	$ 316.080	-	$ -	-	$ -
13.22	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 6.016,00	$ 120.320	-	$ -	-	$ -
13.23	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	34,00	$ 3.767,00	$ 128.078	-	$ -	-	$ -
13.24	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	76,00	$ 43.672,00	$ 3.319.072	-	$ -	-	$ -
					$ 120.137.582				
14.00	INSTALACIONES SANITARIAS								
14.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	726,77	$ 5.522,00	$ 4.013.224	-	$ -	-	$ -
14.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	431,37	$ 68.679,00	$ 29.626.060	-	$ -	-	$ -
14.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	93,46	$ 247.904,00	$ 23.169.108	-	$ -	-	$ -
14.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	89,01	$ 119.827,00	$ 10.665.801	-	$ -	-	$ -
14.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	333,22	$ 63.600,00	$ 21.192.792	-	$ -	-	$ -
14.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	65,23	$ 101.025,00	$ 6.589.861	-	$ -	-	$ -
14.7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	229,01	$ 96.834,00	$ 22.175.954	-	$ -	-	$ -
14.8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	197,28	$ 46.886,00	$ 9.249.670	-	$ -	-	$ -
14.9	TUBERÍA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	114,24	$ 38.330,00	$ 4.378.819	-	$ -	-	$ -
14.10	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	121,00	$ 26.096,00	$ 3.157.616	-	$ -	-	$ -
14.11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	180,00	$ 36.501,00	$ 6.570.180	-	$ -	-	$ -
14.12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	228,00	$ 21.173,00	$ 4.827.444	-	$ -	-	$ -
14.13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	84,00	$ 11.892,00	$ 998.928	-	$ -	-	$ -
14.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	76,00	$ 88.384,00	$ 6.717.184	-	$ -	-	$ -
14.15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 69.275,00	$ 1.385.500	-	$ -	-	$ -
14.16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	36,00	$ 70.264,00	$ 2.529.504	-	$ -	-	$ -
14.17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	24,00	$ 85.727,00	$ 2.057.448	-	$ -	-	$ -
14.18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	60,00	$ 86.652,00	$ 5.199.120	-	$ -	-	$ -
14.19	CAJA DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 X 0.80 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO, SUMINISTRO Y ELABORACION	UN	19,00	$ 706.501,00	$ 13.423.519	-	$ -	-	$ -
14.20	CAJA DE INSPECCION DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO, SUMINISTRO Y ELABORACION	UN	4,00	$ 868.789,00	$ 3.475.156	-	$ -	-	$ -
14.21	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UN	1,00	$ 954.323,00	$ 954.323	-	$ -	-	$ -
14.22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE 0.60 M DE DIAM Y 2.00 M PROMEDIO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	UN	1,00	$ 513.723,00	$ 513.723	-	$ -	-	$ -
14.23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	1,00	$ 502.350,00	$ 502.350	-	$ -	-	$ -
					$ 183.373.284				
15.00	RED AGUAS LLUVIAS								
15.1	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	343,20	$ 27.178,00	$ 9.327.490	-	$ -	-	$ -
15.2	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	362,37	$ 46.886,00	$ 16.990.080	-	$ -	-	$ -
15.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	394,40	$ 201.026,00	$ 79.284.654	-	$ -	-	$ -
15.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO, SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	24,00	$ 549.517,00	$ 13.188.408	-	$ -	-	$ -
					$ 118.790.634				
16.00	RED CONTRA INCENDIOS								
16.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	351,36	$ 5.522,00	$ 1.940.210	-	$ -	-	$ -
16.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	155,02	$ 68.679,00	$ 10.646.619	-	$ -	-	$ -
16.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	34,00	$ 247.904,00	$ 8.428.736	-	$ -	-	$ -
16.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	60,31	$ 119.827,00	$ 7.226.766	-	$ -	-	$ -
16.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	161,14	$ 63.600,00	$ 10.248.504	-	$ -	-	$ -
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	228,88	$ 129.760,00	$ 29.699.469	-	$ -	-	$ -
16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	78,48	$ 64.546,00	$ 5.065.570	-	$ -	-	$ -
16.8	TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,00	$ 91.046,00	$ 2.913.472	-	$ -	-	$ -
16.9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4,48	$ 65.351,00	$ 292.772	-	$ -	-	$ -
16.10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 34.276,00	$ 411.312	-	$ -	-	$ -
16.11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 2.458.986,00	$ 9.835.944	-	$ -	-	$ -
16.12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28,00	$ 23.027,00	$ 644.756	-	$ -	-	$ -
16.13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 14.584,00	$ 58.336	-	$ -	-	$ -
16.14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 11.594,00	$ 92.752	-	$ -	-	$ -
					$ 87.505.218				
17.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS								
17.1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	310,00	$ 180.745,00	$ 56.030.950	-	$ -	-	$ -
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4/0 - JUEGO X 3 UNIDADES - TIPO EXT	UN	2,00	$ 489.170,00	$ 978.340	-	$ -	-	$ -
17.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE 225 KVA, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	UN	1,00	$ 95.503.711,00	$ 95.503.711	-	$ -	-	$ -
17.4	PLATINA DE COBRE 1000A PARA EXTENSIÓN DE BARRAJES DE TRANSFORMADOR DE 300KVA	UN	1,00	$ 1.380.564,00	$ 1.380.564	-	$ -	-	$ -
17.5	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGUN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT'S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1,00	$ 11.356.019,00	$ 11.356.019	-	$ -	-	$ -
17.6	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 2000A, A 208 V	UN	1,00	$ 16.738.866,00	$ 16.738.866	-	$ -	-	$ -
17.7	GENERADOR DIESEL DE 225KW, SISTEMA TRIFASICO, CON MOTOR DIESEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1,00	$ 183.594.177,00	$ 183.594.177	-	$ -	-	$ -
17.8	TABLERO DE DISTRIBUCION ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 125A; BARRAJE PRINCIPAL DE 300A, PROTECCION PARA 2 CIRCUITOS TRIFASICOS DE 63A, EN COFRE METALICO DE 80X40X35 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1,00	$ 12.495.386,00	$ 12.495.386	-	$ -	-	$ -
17.9	SUMINISTRO E INSTALACION LETRERO DE SALIDA LED, COLOR VERDE, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 110V-130V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, CUADRADA 18X290X4.5. AUTONOMIA 90MINUTOS. DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	44,00	$ 126.242,00	$ 5.554.648	-	$ -	-	$ -
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA <3.2W, TEMPERATURA DEL COLOR 6000-6500K, VIDA ÚTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 120V-277V, FACTOR DE POTENCIA >0,9. AUTONOMIA 90 MINUTOS. IP20. RECTANGULAR 30X13X6 CM, DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	44,00	$ 117.091,00	$ 5.152.004	-	$ -	-	$ -
17.11	Suministro e instalación de acometida 2x(3x250+250+2T)	ML	36,00	$ 1.203.784,00	$ 43.336.224	-	$ -	-	$ -
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0+2/0+6T	ML	2,00	$ 246.074,00	$ 492.148	-	$ -	-	$ -
17.13	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	125,00	$ 61.373,00	$ 7.671.625	-	$ -	-	$ -
17.14	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	420,00	$ 136.851,00	$ 57.477.420	-	$ -	-	$ -
17.15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 1.051.638,00	$ 2.103.276	-	$ -	-	$ -

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AGOSTO/2023 Σmes	AGOSTO/2023 VR. TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR TOTAL
17.16	CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	12.00	$ 604,401.00	$ 7,252,812	-	$ -	-	$ -
17.17	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERIA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXION Y SISTEMA DE FIJACION CON VARILLA ROSCADA Y RIEL OMEGA, EN CABLE BAJO EN HALOGENOS. LA SALIDA INCLUYE LA INCIDENCIA DE LOS ML DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO RAMAL	UN	80.00	$ 399,342.00	$ 31,947,380	-	$ -	-	$ -
17.18	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1"	ML	240.00	$ 34,209.00	$ 8,210,160	-	$ -	-	$ -
17.19	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACION	UN	256.00	$ 126,195.00	$ 32,305,920	-	$ -	-	$ -
17.20	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	56.00	$ 116,277.00	$ 6,511,512	-	$ -	-	$ -
17.21	SALIDA TOMA SIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 189,046.00	$ 756,184	-	$ -	-	$ -
17.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL METALICO DE 10M , GALVANIZADO CON DOS BRAZOS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGUN DISEÑO), TOT TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE D E 40 X 40 EN 1/2"	UN	2.00	$ 3,313,745.00	$ 6,627,490	-	$ -	-	$ -
17.23	CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO PARA POSTES METÁLICOS SEGUN NORMA CODENSA AP-502 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MASTIL METÁLICO	UN	2.00	$ 221,516.00	$ 443,032	-	$ -	-	$ -
17.24	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	9.00	$ 74,202.00	$ 667,818	-	$ -	-	$ -
17.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X8+8T AWG - THHN	ML	127.00	$ 39,428.00	$ 5,007,356	-	$ -	-	$ -
17.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO ≥110,9W - IP65 - IK08 - 4.000K - 10902ZPV - 2110LUMAN O SIMILAR	UN	4.00	$ 2,020,743.00	$ 8,082,972	-	$ -	-	$ -
17.27	Suministro e instalación LUMINARIA Panel LED <20W, angulo de apertura 120º, 1799 lumenes, eficiencia 72 lm/W, temperatura del color 3000-6000K, vida util 35000 horas, tension de operacion 100V-240V, factor de potencia >0,9, IP20. Redonda diametro 30 cm. Debe tener certificado RETILAP	UN	48.00	$ 178,062.00	$ 8,546,976	-	$ -	-	$ -
17.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA <40W, 3400 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP65 RECTANGULAR 120X11X7 CM, DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	16.00	$ 386,911.00	$ 6,190,576	-	$ -	-	$ -
17.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL <24W, 2880-4000 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP20. CUADRADA 60X60 CM, DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	24.00	$ 155,229.00	$ 3,725,496	-	$ -	-	$ -
17.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 7W	UN	16.00	$ 152,931.00	$ 2,446,896	-	$ -	-	$ -
17.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 6W	UN	56.00	$ 135,491.00	$ 7,587,496	-	$ -	-	$ -
17.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HIGHBAY ≤200W	UN	80.00	$ 1,069,009.00	$ 85,520,720	-	$ -	-	$ -
17.33	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTERMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE.	UN	4.00	$ 723,631.00	$ 2,894,524	-	$ -	-	$ -
17.34	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	2.00	$ 9,310,924.00	$ 18,621,848	-	$ -	-	$ -
17.35	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,4X0,4M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8")	ML	15.00	$ 443,690.00	$ 6,655,350	-	$ -	-	$ -
17.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRON ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES.	ML	476.00	$ 73,037.00	$ 34,765,612	-	$ -	-	$ -
17.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0.60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4.00	$ 437,575.00	$ 1,750,300	-	$ -	-	$ -
17.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 3/4"	ML	12.00	$ 46,761.00	$ 561,132	-	$ -	-	$ -
17.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	607.00	$ 59,617.00	$ 36,187,519	-	$ -	-	$ -
					$ 823,132,419				
18.00	SEÑALETICA								
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION EN LAMINA DE POLIESTILENO CALIBRE DE 40 DE 1 MM DE ESPESOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SOBRE VINILO GRADO DE INGENERIA CON CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	M2	30.76	$ 260,897.00	$ 8,025,192	-	$ -	-	$ -
					$ 8,025,192				
					$ 31,821,667,843				

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
1	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA INC. LIMPIEZA DE VILLA VICENSIO, META								
1.0	DEMOLICIONES								
1.1	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	ML	628.26	$ 15,530.00	$ 9,756,878	-	$ -	628.26	$ 9,756,877.80
1.2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	335.36	$ 373,009.00	$ 125,092,298	-	$ -	335.36	$ 125,092,298.24
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	187.28	$ 291,376.00	$ 54,568,897	0.04	$ 11,655.04	133.00	$ 38,753,008.00
1.4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	370.50	$ 383,666.00	$ 142,148,253	160.83	$ 61,705,002.78	221.30	$ 84,905,285.80
					$ 331,566,326				
2.00	PRELIMINARES								
2.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	M2	14,462.44	$ 5,438.00	$ 78,646,749	6,000.00	$ 32,628,000.00	6,000.00	$ 32,628,000.00
2.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1,563.67	$ 38,501.00	$ 60,202,859	221.72	$ 8,536,441.72	221.72	$ 8,536,441.72
2.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIMANO	M3	10,442.12	$ 63,600.00	$ 664,118,832	-	$ -	-	$ -
					$ 802,968,440				
3.00	CONCRETOS								
3.1	SOLADO. LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	49.87	$ 641,273.00	$ 31,980,285	-	$ -	-	$ -
3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO YCONSTRUCCIÓN	M3	234.60	$ 1,224,357.00	$ 287,234,152	-	$ -	-	$ -
3.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	20875.47	$ 8,513.00	$ 177,712,876	-	$ -	-	$ -
3.4	MURO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	859.76	$ 131,092.00	$ 112,707,656	-	$ -	-	$ -
3.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	M3	18.82	$ 969,616.00	$ 18,248,173	-	$ -	-	$ -
3.6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	532.01	$ 9,955.00	$ 5,296,160	-	$ -	-	$ -
					$ 633,179,304				
4.00	CIMENTACIÓN								
4.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	681.64	$ 128,857.00	$ 87,834,085	-	$ -	-	$ -
4.2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	408.98	$ 126,238.00	$ 51,628,817	-	$ -	-	$ -
4.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LASER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	102.25	$ 1,469,637.00	$ 150,270,383	-	$ -	-	$ -
4.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	170.41	$ 900,037.00	$ 153,375,305	-	$ -	-	$ -
4.5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS	M2	3408.21	$ 53,338.00	$ 181,787,105	-	$ -	-	$ -
4.6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR. 2 CAPAS	M2	3,408.21	$ 81,390.00	$ 277,394,212	-	$ -	-	$ -
4.7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE, EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintetico acrilico pigmentado . Carga al 50%.3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada para los deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMULSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%.	M2	3408.21	$ 228,470.00	$ 778,673,739	-	$ -	-	$ -
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	452.42	$ 584,647.00	$ 264,505,998	-	$ -	-	$ -
					$ 1,945,469,642				
5.00	PISTA DE VELOCIDAD								
5.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	665.42	$ 128,857.00	$ 85,672,882	-	$ -	-	$ -
5.2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	399.85	$ 126,238.00	$ 50,476,264	-	$ -	-	$ -
5.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LASER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	99.96	$ 1,469,637.00	$ 146,904,915	-	$ -	-	$ -
5.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	166.60	$ 900,037.00	$ 149,946,164	-	$ -	-	$ -
5.5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS	M2	3332.10	$ 53,338.00	$ 177,727,550	-	$ -	-	$ -

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AGOSTO/2023 Σmes	AGOSTO/2023 VR. TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR TOTAL
5.6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA PINURA APS DE 30 A 60 MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR. 2 CAPAS	M2	3332.10	$ 81,390.00	$ 271,199,619	-	$ -	-	$ -
5.7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50%.3-Caps protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada paralos deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMULSION 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al rayonado. Carga al 15%.	M2	3332.10	$ 228,470.00	$ 761,284,887	-	$ -	-	$ -
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA PISTA DE PATINAJE	ML	238.80	$ 1,163,836.00	$ 277,924,037	-	$ -	-	$ -
5.9	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 45 CM DE LARGO Y 5 CM DE ANCHO CADA 40 CMS EN LINEA RECTA Y CADA 10 CM EN CURVA, CON UN ESPESOR DE 5 MM, HECHOS EN SINTETICO ACRILICO CARGADO CON CUARZO.	UN	290.00	$ 66,749.00	$ 19,357,210	-	$ -	-	$ -
					$ 1,940,693,528				
6.00	OBRAS EXTERIORES								
6.1	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2,217.11	$ 225,626.00	$ 500,237,661	-	$ -	-	$ -
6.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1,160.37	$ 128,857.00	$ 149,521,797	-	$ -	-	$ -
6.3	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	696.22	$ 126,238.00	$ 87,889,420	-	$ -	-	$ -
6.4	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PEGADO. SUMINISTRO E INSTALACION	M2	4,641.49	$ 116,423.00	$ 540,376,100	-	$ -	-	$ -
					$ 1,278,025,068				
7.00	RED AGUAS LLUVIAS								
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	235.89	$ 5,522.00	$ 1,302,585	-	$ -	-	$ -
7.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	226.45	$ 68,679.00	$ 15,552,360	-	$ -	-	$ -
7.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	49.07	$ 247,904.00	$ 12,164,649	-	$ -	-	$ -
7.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	94.36	$ 119,827.00	$ 11,306,876	-	$ -	-	$ -
7.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIMIANO	M3	132.10	$ 63,600.00	$ 8,401,560	-	$ -	-	$ -
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	235.89	$ 311,111.00	$ 73,387,974	-	$ -	-	$ -
7.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6.00	$ 706,501.00	$ 4,239,006	-	$ -	-	$ -
7.8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1.00	$ 868,789.00	$ 868,789	-	$ -	-	$ -
7.9	CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO. SECCION H=0,48 A=0,50 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	596.50	$ 134,844.00	$ 80,434,446	-	$ -	-	$ -
7.10	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD. PARA PISTA DE PATINAJE	ML	596.50	$ 702,956.00	$ 419,313,254	-	$ -	-	$ -
					$ 626,971,499				
8.00	REDES ELECTRICAS								
8.1	MASTIL METALICO TRONCO CONICO OCTOGONAL DE 16-18M FABRICADO EN SECCIONES EMBONADAS, BASE REDONDA 600MM EN 3/4 DE ESPESOR, CANASTILLA DE ANCLAJE CON 8 PERNOS DE 7/8" X 1500MM, CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA ALOJAR DE 1 A 8 REFLECTORES, PELDAÑOS DE ASCENSO Y LINEA DE VIDA A PARTIR DE LOS 4M,GALVANIZADO EN CALIENTE	UN	7.00	$ 19,532,812.00	$ 136,729,684	-	$ -	-	$ -
8.2	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 478,576.00	$ 3,350,032	-	$ -	-	$ -
8.3	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGUN NORMA AE.319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A.- 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1.00	$ 11,356,112.00	$ 11,356,112	-	$ -	-	$ -
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	37.00	$ 261,587.00	$ 9,678,719	-	$ -	-	$ -
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X2+2+8T AWG THHN	ML	433.00	$ 110,981.00	$ 48,054,773	-	$ -	-	$ -
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4+4+8T AWG THHN	ML	307.00	$ 95,228.00	$ 29,234,996	-	$ -	-	$ -
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+8T AWG THHN	ML	96.00	$ 75,487.00	$ 7,246,752	-	$ -	-	$ -
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8+8+8T AWG THHN	ML	165.00	$ 79,043.00	$ 13,042,095	-	$ -	-	$ -
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 2"	ML	140.00	$ 115,597.00	$ 16,183,580	-	$ -	-	$ -
8.10	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1.00	$ 16,738,866.00	$ 16,738,866	-	$ -	-	$ -
8.11	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	7.00	$ 3,439,120.00	$ 24,073,840	-	$ -	-	$ -
8.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR 800W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ±110LUMW O SIMILAR	UN	76.00	$ 5,681,030.00	$ 431,758,280	-	$ -	-	$ -
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 600W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ±110LUMW O SIMILAR	UN	16.00	$ 4,128,559.00	$ 66,056,944	-	$ -	-	$ -
8.14	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA ILUMINACION PATINAJE QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 300A, BARRAJE PRINCIPAL DE 400A, 7 ARRANCADORES DIRECTOR CON PROTECCION DE 50A Y CONTACTOR TRIPOLAR DE 50A EN AC3; ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION, EN COFRE METALICO DE 100X80X40 CON BANDEJA DOBLEFONDO. PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1.00	$ 23,478,564.00	$ 23,478,564	-	$ -	-	$ -
8.15	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	251.54	$ 38,501.00	$ 9,684,542	-	$ -	-	$ -
8.16	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	157.04	$ 192,100.00	$ 30,167,384	-	$ -	-	$ -
8.17	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.02	$ 641,273.00	$ 1,295,371	-	$ -	-	$ -
8.18	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	5.91	$ 1,377,156.00	$ 8,138,992	-	$ -	-	$ -
8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	275.63	$ 53,399.00	$ 14,718,366	-	$ -	-	$ -
8.20	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	2,770.04	$ 8,513.00	$ 23,581,351	-	$ -	-	$ -
8.21	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.16	$ 936,416.00	$ 18,878,147	-	$ -	-	$ -
8.22	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	10.00	$ 604,401.00	$ 6,044,010	-	$ -	-	$ -
8.23	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	4.00	$ 1,152,233.00	$ 4,608,932	-	$ -	-	$ -
8.24	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	2.00	$ 1,927,585.00	$ 3,855,170	-	$ -	-	$ -
8.25	CANALIZACIÓN 18 DUCTOS DE 2" PVC	ML	5.00	$ 405,772.00	$ 2,028,860	-	$ -	-	$ -
8.26	CANALIZACIÓN 12 DUCTOS DE 2" PVC	ML	33.42	$ 345,633.00	$ 11,551,055	-	$ -	-	$ -
8.27	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 2" PVC	ML	135.11	$ 179,324.00	$ 24,228,466	-	$ -	-	$ -
8.28	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 2" PVC	ML	70.44	$ 159,278.00	$ 11,219,542	-	$ -	-	$ -
8.29	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 2" PVC	ML	77.30	$ 149,256.00	$ 11,537,412	-	$ -	-	$ -
8.30	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	85.78	$ 61,373.00	$ 5,264,576	-	$ -	-	$ -
8.31	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	54.59	$ 34,320.00	$ 1,873,529	-	$ -	-	$ -
8.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	154.00	$ 73,037.00	$ 11,247,698	-	$ -	-	$ -
8.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	7.00	$ 437,575.00	$ 3,063,025	-	$ -	-	$ -
8.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	39.00	$ 59,617.00	$ 2,325,063	-	$ -	-	$ -
					$ 1,042,294,728				
					$ 3,601,168,535				

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
C	CONSTRUCCION DE LA NUEVA PISTA DE PATINAJE DE LA CIUDADELA DEL DEPORTE DE VILLAVICENCIO META								
1.0	PRELIMINARES								
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	9,706.51	$ 4,349.00	$ 42,213,612	-	$ -	4,822.80	$ 20,974,357.20
1.2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	33.43	$ 373,009.00	$ 12,469,691	0.19	$ 70,871.71	26.90	$ 10,033,942.10
					$ 54,683,303				
2.00	EXCAVACION Y RELLENOS								
2.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	42.05	$ 38,501.00	$ 1,618,967	-	$ -	-	$ -
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	238.98	$ 68,679.00	$ 16,412,907	-	$ -	-	$ -
2.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	44.16	$ 247,904.00	$ 10,947,441	8.00	$ 1,983,232.00	8.00	$ 1,983,232.00
					$ 28,979,315				
3.00	OBRAS EXTERIORES								
3.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	954.86	$ 98,611.00	$ 94,159,699	-	$ -	-	$ -

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AGOSTO/2023		ACUMULADO	
						Σmes	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.2	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,40 A=0,50, DESARROLLO 1,13 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	412.20	$ 134,844.00	$ 55,582,697	-	$ -	-	$ -
3.3	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD	ML	412.20	$ 702,956.00	$ 289,758,463	-	$ -	-	$ -
					$ 439,500,859				
4.00	FILTROS								
4.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES,SUMINISTRO E INSTALACION	M2	8866.15	$ 14,681.00	$ 130,163,048	-	$ -	-	$ -
4.2	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1956.86	$ 143,702.00	$ 281,204,696	-	$ -	-	$ -
					$ 411,368,644				
5.00	SUPERFICIE								
5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	8866.15	$ 4,394.00	$ 38,957,863	-	$ -	-	$ -
5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	545.95	$ 900,037.00	$ 491,375,200	-	$ -	-	$ -
5.3	PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA EN SITIO CERTIFICADA IAAF: SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 Y DIN 18035-6, ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACION CON VIASOL EP,P210, 1 CAPA ELÁSTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPA POROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM 1 A 4 MM DE COLOR ROJO.	M2	7799.35	$ 1,015,468.00	$ 7,919,990,346	-	$ -	-	$ -
5.4	DEMARCACION PISTA	ML	4257.65	$ 21,661.00	$ 92,224,957	-	$ -	-	$ -
					$ 8,542,548,366				
6.00	ACCESORIOS								
6.1	BORDILLO ALUMINIO DESMONTABLE CERTIFICADO IAAF	ML	413.42	$ 254,313.00	$ 105,138,080	-	$ -	-	$ -
6.2	OBSTACULO CARRERA CERTIFICADO IAAF	UN	8.00	$ 1,008,887.00	$ 8,071,096	-	$ -	-	$ -
6.3	TACOS DE SALIDA	UN	8.00	$ 560,635.00	$ 4,485,080	-	$ -	-	$ -
					$ 117,694,256				
7.00	PLACA EN CONCRETO								
7.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	95.25	$ 969,616.00	$ 92,355,924	-	$ -	-	$ -
7.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3892.26	$ 9,955.00	$ 38,747,448	-	$ -	-	$ -
7.3	SISTEMA MODULAR DEPORTIVO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TEJIDO EN REJILLA, TABLETAS DE 25 CM X 25 CMS X 12.5 MM	M2	127.26	$ 892,631.00	$ 113,596,221	-	$ -	-	$ -
					$ 244,699,593				
8.00	GRAMA SINTETICA								
8.1	RELLENO CON GRAVILLA	M3	167.17	$ 102,613.00	$ 17,153,815	-	$ -	-	$ -
8.2	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACION	M2	1,114.49	$ 116,423.00	$ 129,752,269	-	$ -	-	$ -
					$ 146,906,084				
					$ 9,986,380,420				
19.00	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESCENARIOS DEPORTIVOS .								
19.1	CERTIFICACION RETIE REDES DE MEDIA		1.00		$ 3,000,000	-	$ -	-	$ -
19.2	CERTIFICACION E INSPCCION DE TRANSFORMADOR		1.00		$ 949,266	-	$ -	-	$ -
19.3	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION		1.00		$ 2,975,000	-	$ -	-	$ -
19.4	RETIE USO FINAL		1.00		$ 7,735,000	-	$ -	-	$ -
19.5	CERTIFICACION RETILAP		1.00		$ 9,044,000	-	$ -	-	$ -
19.6	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA		1.00		$ 2,793,954	-	$ -	-	$ -
20.0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		1.00		$ 297,493,828	0.42	$ 126,137,383.07	0.50	$ 149,252,653.51
					$ 323,991,048				
9.00	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE PATINAJE.								
9.1	RETIE USO FINAL		1.00		$ 7,735,000	-	$ -	-	$ -
9.2	CERTIFICACION RETILAP		1.00		$ 9,044,000	-	$ -	-	$ -
9.3	PMA		1.00		$ 187,776,998	0.11	$ 19,998,250.29	0.46	$ 66,377,419.08
					$ 204,555,998				
9.00	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE ATLETISMO.								
9.1	Diagnostico pista de Atletismo IAAF -Identificación de las materias primas IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Inspección visual IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Espesor de la pista EN 1969 -Absorción de impactos y Deformación vertical (12 puntos) EN 14808 y EN 14809 -Deslizamiento (6 puntos) EN 13036-4 -Planimetría de la superficie IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Drenaje IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications		1.00		$ 46,400,000	-	$ -	-	$ -
9.2	PMA		1.00		$ 187,776,998	0.02	$ 3,511,429.88	0.06	$ 11,097,620.59
					$ 234,176,998				
					$ 762,724,044				

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)	$ 50,109,216,798
VALOR TOTAL	$ 50,871,940,842

	643,717,752	$ 1,394,571,419

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

AVANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADO AGOSTO DE 2023

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

5255

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
	CONSTRUCCIÓN PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL APLICADO EN OBRA EN EL PROYECTO EN LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.												
1.1	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	6436.86	$ 5,438.00	$ 35,003,645	3,103,838.83	8.87%	11,184,758.43	31.95%	6,090,560.00	17.40%	6,090,560.00	17.40%
					$ 35,003,645								
2.00	DESMONTE Y DEMOLICIONES												
2.1	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	30.00	$ 30,524.00	$ 915,720	-	0.00%	915,720.00	0.12%	-	0.00%	915,720.00	0.12%
2.2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	55.00	$ 38,155.00	$ 2,098,525	-	0.00%	2,098,525.00	0.26%	-	0.00%	2,098,525.00	0.26%
2.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4,319.02	$ 18,491.00	$ 79,862,999	-	0.00%	79,862,999.00	10.03%	-	0.00%	79,862,998.82	10.03%
2.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	KG	25,854.30	$ 5,491.00	$ 141,965,961	-	0.00%	141,965,961.00	17.83%	-	0.00%	141,965,961.30	17.83%
2.5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	58.00	$ 82,033.00	$ 4,757,914	-	0.00%	4,757,914.01	0.60%	-	0.00%	4,757,914.00	0.60%
2.6	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	3,250.79	$ 18,021.00	$ 58,582,487	-	0.00%	58,582,487.00	7.36%	-	0.00%	58,582,486.59	7.36%
2.7	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4,319.02	$ 13,760.00	$ 59,429,715	-	0.00%	59,429,715.00	7.46%	-	0.00%	-	0.00%
2.8	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	11.00	$ 15,262.00	$ 167,882	-	0.00%	167,882.00	0.02%	-	0.00%	167,882.00	0.02%
2.9	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	487.53	$ 373,009.00	$ 181,853,078	92,820,841.90	11.66%	181,853,078.00	22.84%	163,460,003.98	20.53%	181,853,077.77	22.84%
2.10	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMUN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	3,335.73	$ 14,647.00	$ 48,858,437	14,861,107.92	1.87%	48,858,437.00	6.14%	-	0.00%	44,973,613.50	5.65%
2.11	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	332.05	$ 431,624.00	$ 143,320,749	88,381,128.55	11.10%	88,381,128.55	11.10%	143,320,749.20	18.00%	143,320,749.20	18.00%
2.12	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	189.77	$ 383,666.00	$ 72,808,297	72,808,297.00	9.15%	72,808,297.00	9.15%	-	0.00%	72,808,296.82	9.15%
2.13	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	45.90	$ 33,079.00	$ 1,518,326	-	0.00%	1,518,326.00	0.19%	-	0.00%	1,518,326.10	0.19%
					$ 796,140,090								
3.00	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	4,718.84	$ 38,501.00	$ 181,680,059	-	0.00%	-	0.00%	41,467,117.04	7.46%	41,467,117.04	7.46%
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	5,396.66	$ 63,600.00	$ 343,227,576	-	0.00%	-	0.00%	6,092,880.00	1.10%	6,092,880.00	1.10%
3.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	989.88	$ 31,615.00	$ 31,295,056	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 556,202,691								
4.00	CIMENTACION												
4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	46.78	$ 641,273.00	$ 29,998,751	-	0.00%	-	0.00%	3,911,765.30	0.26%	3,911,765.30	0.26%
4.2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	85.21	$ 1,444,492.00	$ 123,085,163	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	189.95	$ 1,003,116.00	$ 190,541,884	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124.96	$ 1,075,099.00	$ 134,344,371	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	108.08	$ 648,730.00	$ 70,114,738	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	51209.86	$ 8,513.00	$ 435,949,538	-	0.00%	-	0.00%	24,792,409.90	1.65%	24,792,409.90	1.65%
4.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	632.48	$ 821,666.00	$ 519,687,312	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 1,503,721,757								
5.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO												
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	993.72	$ 128,414.00	$ 127,607,560	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.2	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	128.68	$ 1,377,156.00	$ 177,212,434	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.3	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. GRADERÍAS	M3	99.37	$ 674,689.00	$ 67,043,846	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 371,863,840								
6.00	ESTRUCTURAS EN ACERO												
6.1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	572,164.72	$ 25,806.00	$ 14,765,282,764	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	17,585.47	$ 9,955.00	$ 175,063,354	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 14,940,346,118								
7.00	CUBIERTA Y FACHADA												
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	6,524.58	$ 254,358.00	$ 1,659,579,120	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
7.2	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte y remates de cubierta)	M2	5,103.05	$ 1,106,035.00	$ 5,644,151,907	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

5256

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
8.00	MAMPOSTERIA Y PAÑETES				$ 7,303,731,027								
8.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	2,039.46	$ 53,708.00	$ 109,535,318	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.2	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31.50	$ 1,338,592.00	$ 42,165,648	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	36.10	$ 1,377,156.00	$ 49,715,332	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	45.99	$ 1,008,399.00	$ 46,376,270	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.58	$ 1,805,128.00	$ 10,072,614	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.6	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.09	$ 1,989,083.00	$ 10,124,432	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.7	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	25.44	$ 142,180.00	$ 3,617,059	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2,557.33	$ 26,532.00	$ 67,851,080	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M3	1,267.50	$ 36,084.00	$ 45,736,470	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	15,674.34	$ 8,513.00	$ 133,435,656	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				$ 518,629,679								
9.1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	60.00	$ 1,411,393.00	$ 84,683,580	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	4.00	$ 900,711.00	$ 3,602,844	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	24.00	$ 953,654.00	$ 22,887,696	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	76.00	$ 504,633.00	$ 38,352,108	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	20.00	$ 161,971.00	$ 3,239,420	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS	UND	4.00	$ 327,907.00	$ 1,311,628	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	43.84	$ 156,171.00	$ 6,846,537	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	76.00	$ 387,179.00	$ 29,425,604	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.9	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UND	2.00	$ 43,672.00	$ 87,344	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10.00	CARPINTERÍA METÁLICA				$ 190,436,761								
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20. 2 X 0.90 M.	UND	28.00	$ 528,395.00	$ 14,795,060	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	118.80	$ 720,221.00	$ 85,562,255	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMINIO	M2	67.80	$ 323,273.00	$ 21,917,909	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	287.76	$ 310,290.00	$ 89,289,050	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES. SEGÚN PLANO.	M2	374.82	$ 1,591,335.00	$ 596,464,185	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
11.00	OBRAS EXTERIORES				$ 808,028,459								
11.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	941.80	$ 48,109.00	$ 45,309,056	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
11.2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	941.80	$ 203,395.00	$ 191,557,411	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
11.3	SISTEMA MODULAR SPORT PARA CANCHAS DEPORTIVAS (FLEXIBLES, ALTOS ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA CUALQUIER ESCENARIO DEPORTIVO DE COMPETITIVIDAD)	M2	2,785.14	$ 684,313.00	$ 1,905,907,509	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
11.4	SISTEMA MODULAR ESPECIALIZADO PARA PESAS EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO, MEDIDAS DE 30 CMS X 30 CMS Y ESPESOR DE 1.2 CMS	M2	352.74	$ 790,931.00	$ 278,993,001	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
11.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	738.00	$ 52,542.00	$ 38,775,996	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
11.6	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	745.42	$ 135,684.00	$ 101,141,567	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
11.7	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2,318.21	$ 225,626.00	$ 523,048,449	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
12.00	PISOS Y ENCHAPES				$ 3,084,732,989								
12.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1,811.91	$ 12,127.00	$ 21,973,033	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
12.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1,267.50	$ 13,941.00	$ 17,670,218	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
12.3	ESTUCO PLASTICO	M2	1,811.91	$ 17,784.00	$ 32,223,007	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.00	INSTALACIONES HIDRÁULICAS				$ 71,856,258								
13.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	703.27	$ 5,522.00	$ 3,883,457	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	246.14	$ 68,679.00	$ 16,904,649	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	53.00	$ 247,904.00	$ 13,138,912	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS	M3	70.33	$ 119,827.00	$ 8,427,433	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	175.82	$ 63,600.00	$ 11,182,152	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.6	TUBERIA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	263.47	$ 111,812.00	$ 29,459,108	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

5257

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
13.7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	108.04	$ 38,348.00	$ 4,143,118	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	77.64	$ 27,720.00	$ 2,152,181	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.9	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82.92	$ 22,916.00	$ 1,900,195	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.10	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	107.12	$ 19,078.00	$ 2,043,635	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.11	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	64.08	$ 16,171.00	$ 1,036,238	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.12	TUBERÍA PVCP RDE 9 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	106.64	$ 13,287.00	$ 1,416,926	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	92.00	$ 58,398.00	$ 5,372,616	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.14	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24.00	$ 70,289.00	$ 1,686,936	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.15	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	64.00	$ 80,231.00	$ 5,134,784	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.16	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 328,362.00	$ 6,567,240	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	3.00	$ 269,530.00	$ 808,590	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø4" UM	UN	2.00	$ 170,877.00	$ 341,754	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.19	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 23,463.00	$ 469,260	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.20	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16.00	$ 11,553.00	$ 184,848	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.21	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30.00	$ 10,536.00	$ 316,080	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.22	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 6,016.00	$ 120,320	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.23	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	34.00	$ 3,767.00	$ 128,078	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.24	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	76.00	$ 43,672.00	$ 3,319,072	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.00	INSTALACIONES SANITARIAS				$ 120,137,582								
14.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	726.77	$ 5,522.00	$ 4,013,224	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	431.37	$ 68,679.00	$ 29,626,060	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	93.46	$ 247,904.00	$ 23,169,108	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	89.01	$ 119,827.00	$ 10,665,801	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	333.22	$ 63,600.00	$ 21,192,792	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	65.23	$ 101,025.00	$ 6,589,861	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	229.01	$ 96,834.00	$ 22,175,954	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	197.28	$ 46,886.00	$ 9,249,670	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	114.24	$ 38,330.00	$ 4,378,819	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	121.00	$ 26,096.00	$ 3,157,616	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	180.00	$ 36,501.00	$ 6,570,180	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	228.00	$ 21,173.00	$ 4,827,444	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	84.00	$ 11,892.00	$ 998,928	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	76.00	$ 88,384.00	$ 6,717,184	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 69,275.00	$ 1,385,500	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	36.00	$ 70,264.00	$ 2,529,504	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	24.00	$ 85,727.00	$ 2,057,448	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	60.00	$ 86,652.00	$ 5,199,120	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.19	CAJA DE INSPECCION DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	19.00	$ 706,501.00	$ 13,423,519	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.20	CAJA DE INSPECCION DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4.00	$ 868,789.00	$ 3,475,156	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.21	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UN	1.00	$ 954,323.00	$ 954,323	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø IN1=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	UN	1.00	$ 513,723.00	$ 513,723	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	1.00	$ 502,350.00	$ 502,350	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
15.00	RED AGUAS LLUVIAS				$ 153,373,284								
15.1	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	343.20	$ 27,178.00	$ 9,327,490	-	0.00%	-	7.85%	-	0.00%	-	0.00%
15.2	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	362.37	$ 46,886.00	$ 16,990,080	-	0.00%	-	14.30%	-	0.00%	-	0.00%
15.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	394.40	$ 201,026.00	$ 79,284,654	-	0.00%	-	66.74%	-	0.00%	-	0.00%
15.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	24.00	$ 549,517.00	$ 13,188,408	-	0.00%	-	11.10%	-	0.00%	-	0.00%
16.00	RED CONTRA INCENDIOS				$ 118,790,634								
16.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	351.36	$ 5,522.00	$ 1,940,210	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	155.02	$ 68,679.00	$ 10,646,619	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	34.00	$ 247,904.00	$ 8,428,736	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	60.31	$ 119,827.00	$ 7,226,766	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	161.14	$ 63,600.00	$ 10,248,504	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

5258

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	228.88	$ 129,760.00	$ 29,699,469	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	78.48	$ 64,546.00	$ 5,065,570	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.8	TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32.00	$ 91,046.00	$ 2,913,472	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4.48	$ 65,351.00	$ 292,772	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12.00	$ 34,276.00	$ 411,312	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 2,458,986.00	$ 9,835,944	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28.00	$ 23,027.00	$ 644,756	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 14,584.00	$ 58,336	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 11,594.00	$ 92,752	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 87,505,218								
17.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS												
17.1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	310.00	$ 180,745.00	$ 56,030,950	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4-0 - JUEGO X 3 UNIDADES - TFT151EXT	UN	2.00	$ 489,170.00	$ 978,340	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE 225 KVA. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UN	1.00	$ 95,503,711.00	$ 95,503,711	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.4	PLATINA DE COBRE 1000A PARA EXTENSIÓN DE BARRAJES DE TRANSFORMADOR DE 300KVA	UN	1.00	$ 1,380,564.00	$ 1,380,564	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.5	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGUN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS. CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1.00	$ 11,356,019.00	$ 11,356,019	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.6	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1.00	$ 16,738,866.00	$ 16,738,866	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.7	GENERADOR DIÉSEL DE 225KW, SISTEMA TRIFASICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1.00	$ 183,594,177.00	$ 183,594,177	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.8	TABLERO DE DISTRIBUCION ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 125A; BARRAJE PRINCIPAL DE 300A, PROTECCION PARA 2 CIRCUITOS TRIFASICOS DE 63A, EN COFRE METALICO DE 80X40X35 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1.00	$ 12,495,386.00	$ 12,495,386	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO DE SALIDA LED, COLOR VERDE, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 110V-130V, FACTOR DE POTENCIA >0.9. CUADRADA 18X290X4.5. AUTONOMIA 90MINUTOS. DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	44.00	$ 126,242.00	$ 5,554,648	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA <3.2W, TEMPERATURA DEL COLOR 6000-6500K, VIDA ÚTIL 35000 HORAS, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V-277V, FACTOR DE POTENCIA >0.9. AUTONOMÍA 90 MINUTOS. IP20. RECTANGULAR 30X13X6 CM, DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	44.00	$ 117,091.00	$ 5,152,004	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.11	Suministro e instalación de acometida 2x(3x250+250+2T)	ML	36.00	$ 1,203,784.00	$ 43,336,224	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0+2/0+6T	ML	2.00	$ 246,074.00	$ 492,148	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.13	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	125.00	$ 61,373.00	$ 7,671,625	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.14	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	420.00	$ 136,851.00	$ 57,477,420	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 1,051,638.00	$ 2,103,276	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.16	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274. INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	12.00	$ 604,401.00	$ 7,252,812	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.17	SALIDA PARA ILUMINACION, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN CON VARILLA ROSCADA Y RIEL OMEGA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS. LA SALIDA INCLUYE LA INCIDENCIA DE LOS ML DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO RAMAL	UN	80.00	$ 399,342.00	$ 31,947,360	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.18	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1"	ML	240.00	$ 34,209.00	$ 8,210,160	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.19	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	256.00	$ 126,195.00	$ 32,305,920	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.20	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	56.00	$ 116,277.00	$ 6,511,512	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.21	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 189,046.00	$ 756,184	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL METALICO DE 10M , GALVANIZADO CON DOS BRAZOS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO). TOT TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE D E 40 X 40 EN 1/2"	UN	2.00	$ 3,313,745.00	$ 6,627,490	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.23	CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO PARA POSTES METALICOS SEGUN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MASTIL METÁLICO	UN	2.00	$ 221,516.00	$ 443,032	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.24	EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	9.00	$ 74,202.00	$ 667,818	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X8+8T AWG - THHN	ML	127.00	$ 39,428.00	$ 5,007,356	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO ≥110,9W - IP65 - IK08 - 4.000K - 100/277V - ≥110LUMW O SIMILAR	UN	4.00	$ 2,020,743.00	$ 8,082,972	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.27	Suministro e instalación LUMINARIA Panel LED <20W, angulo de apertura 120°, 1799 lumenes, eficiencia 72 lm/W, temperatura del color 3000-6000K, vida util 35000 horas, tension de operación 100V-240V, factor de potencia >0,9, IP20. Redonda diametro 30 cm. Debe terner certificado RETILAP	UN	48.00	$ 178,062.00	$ 8,546,976	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

5259

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
17.28	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HERMETICA <40W, 3400 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0.9, IP65, RECTANGULAR 120X11X7 CM, DEBE TERNER	UN	16.00	$ 386,911.00	$ 6,190,576	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.29	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED PANEL <24W, 2600-4000 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0.9, IP20, CUADRADA 60X60 CM, DEBE TERNER CERTIFICADO	UN	24.00	$ 155,229.00	$ 3,725,496	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 7W	UN	16.00	$ 152,931.00	$ 2,446,896	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 6W	UN	56.00	$ 135,491.00	$ 7,587,496	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HIGHBAY ≤200W	UN	80.00	$ 1,069,009.00	$ 85,520,720	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.33	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE	UN	4.00	$ 723,631.00	$ 2,894,524	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.34	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	2.00	$ 9,310,924.00	$ 18,621,848	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.35	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0.4X0.4M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3/M (1/8")	ML	15.00	$ 443,690.00	$ 6,655,350	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	476.00	$ 73,037.00	$ 34,765,612	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4.00	$ 437,575.00	$ 1,750,300	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 3/4"	ML	12.00	$ 46,761.00	$ 561,132	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	607.00	$ 59,617.00	$ 36,187,519	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 823,132,419								
18.00	SEÑALETICA												
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION EN LÁMINA DE POLIESTILENO CALIBRE DE 40 DE 1 MM DE ESPESOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SOBRE VINILO GRADO DE INGENERIA CON CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	M2	30.76	$ 260,897.00	$ 8,025,192	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 8,025,192								
					$ 31,521,667,843								

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
B	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.												
1.0	DEMOLICIONES												
1.1	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	ML	628.26	$ 15,530.00	$ 9,756,878	-	0.00%	9,756,878.00	2.94%	-	0.00%	9,756,877.80	2.94%
1.2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	335.36	$ 373,009.00	$ 125,092,298	-	0.00%	125,092,298.00	37.73%	-	0.00%	125,092,298.24	37.73%
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	187.28	$ 291,376.00	$ 54,568,897	-	0.00%	54,568,897.00	16.46%	11,655.04	0.00%	38,753,008.00	11.69%
1.4	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	370.50	$ 383,666.00	$ 142,148,253	57,747,727.78	17.42%	142,148,253.00	42.87%	61,705,002.78	18.61%	84,905,285.80	25.61%
					$ 331,566,326								
2.00	PRELIMINARES												
2.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	M2	14,462.44	$ 5,438.00	$ 78,646,749	6,973,754.70	0.87%	25,130,094.02	3.13%	32,628,000.00	4.06%	32,628,000.00	4.06%
2.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1,563.67	$ 38,501.00	$ 60,202,859	10,159,232.46	1.27%	10,159,232.46	1.27%	8,536,441.72	1.06%	8,536,441.72	1.06%
2.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	10,442.12	$ 63,600.00	$ 664,118,832	69,846,980.61	8.70%	69,846,980.61	8.70%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 802,968,440								
3.00	CONCRETOS												
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	49.87	$ 641,273.00	$ 31,980,285	8,128,322.44	1.28%	8,128,322.44	1.28%	-	0.00%	-	0.00%
3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO YCONSTRUCCIÓN	M3	234.60	$ 1,224,357.00	$ 287,234,152	62,576,011.69	9.88%	62,576,011.69	9.88%	-	0.00%	-	0.00%
3.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	20875.47	$ 8,513.00	$ 177,712,876	51,134,365.26	8.08%	51,134,365.26	8.08%	-	0.00%	-	0.00%
3.4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	859.76	$ 131,092.00	$ 112,707,658	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
3.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	M3	18.82	$ 969,616.00	$ 18,248,173	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
3.6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	532.01	$ 9,955.00	$ 5,296,160	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 633,179,304								
4.00	CIMENTACIÓN												
4.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	681.64	$ 128,857.00	$ 87,834,085	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	408.98	$ 126,238.00	$ 51,628,817	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	102.25	$ 1,469,637.00	$ 150,270,383	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	170.41	$ 900,037.00	$ 153,375,305	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

5260

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
4.5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS	M2	3408.21	$ 53,338.00	$ 181,787,105	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2 CAPAS.	M2	3,408.21	$ 81,390.00	$ 277,394,212	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50% 3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada para los deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMULSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%.	M2	3408.21	$ 228,470.00	$ 778,673,739	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	452.42	$ 584,647.00	$ 264,505,996	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 1,945,469,642	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.00	PISTA DE VELOCIDAD												
5.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	666.42	$ 128,857.00	$ 85,872,882	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	399.85	$ 126,238.00	$ 50,476,264	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA	M3	99.96	$ 1,469,637.00	$ 146,904,915	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	166.60	$ 900,037.00	$ 149,946,164	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA	M2	3332.10	$ 53,338.00	$ 177,727,550	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2	M2	3332.10	$ 81,390.00	$ 271,199,619	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50% 3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada paralos deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMULSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%	M2	3332.10	$ 228,470.00	$ 761,284,887	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA PISTA DE PATINAJE	ML	238.80	$ 1,163,836.00	$ 277,924,037	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.9	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 45 CM DE LARGO Y 5 CM DE ANCHO CADA 40 CMS EN LINEA RECTA Y CADA 10 CM EN CURVA, CON UN ESPESOR DE 5 MM, HECHOS EN SINTETICO ACRILICO CARGADO CON CUARZO.	UN	290.00	$ 66,749.00	$ 19,357,210	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 1,940,693,528	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6.00	OBRAS EXTERIORES												
6.1	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2,217.11	$ 225,626.00	$ 500,237,661	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1,160.37	$ 128,857.00	$ 149,521,797	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6.3	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	696.22	$ 126,238.00	$ 87,889,420	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6.4	GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	4,641.49	$ 116,423.00	$ 540,376,190	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 1,278,025,068	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
7.00	RED AGUAS LLUVIAS												
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	235.89	$ 5,522.00	$ 1,302,585	418,688.04	0.07%	418,688.04	0.07%	-	0.00%	-	0.00%
7.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	226.45	$ 68,679.00	$ 15,552,360	15,552,360.00	2.48%	15,552,360.00	2.48%	-	0.00%	-	0.00%
7.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	49.07	$ 247,904.00	$ 12,164,649	7,907,021.85	1.26%	7,907,021.85	1.26%	-	0.00%	-	0.00%
7.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	94.36	$ 119,827.00	$ 11,306,876	11,306,876.00	1.80%	11,306,876.00	1.80%	-	0.00%	-	0.00%
7.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	132.10	$ 63,600.00	$ 8,401,560	8,401,560.00	1.34%	8,401,560.00	1.34%	-	0.00%	-	0.00%
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	235.89	$ 311,111.00	$ 73,387,974	73,387,974.00	11.71%	73,387,974.00	11.71%	-	0.00%	-	0.00%
7.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6.00	$ 706,501.00	$ 4,239,006	1,530,752.17	0.24%	1,530,752.17	0.24%	-	0.00%	-	0.00%

5261

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
7.8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1.00	$ 868,789.00	$ 868,789	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
7.9	CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,48 A=0,50 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	596.50	$ 134,844.00	$ 80,434,446	20,443,755.03	3.26%	20,443,755.03	3.26%	-	0.00%	-	0.00%
7.10	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD. PARA PISTA DE PATINAJE	ML	596.50	$ 702,956.00	$ 419,313,254	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 626,971,499								
8.00	REDES ELECTRICAS												
8.1	MASTIL METALICO TRONCO CONICO OCTOGONAL DE 16-18M FABRICADO EN SECCIONES EMBONADAS, BASE REDONDA 600MM EN 3/4 DE ESPESOR, CANASTILLA DE ANCLAJE CON 8 PERNOS DE 7/8" X 1500MM, CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA ALOJAR DE 1 A 8 REFLECTORES, PELDAÑOS DE ASCENSO Y LINEA DE VIDA A PARTIR DE LOS 4M,GALVANIZADO EN CALIENTE	UN	7.00	$ 19,532,812.00	$ 136,729,684	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.2	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 478,576.00	$ 3,350,032	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.3	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGUN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1.00	$ 11,356,112.00	$ 11,356,112	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	37.00	$ 261,587.00	$ 9,678,719	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2+2+6T AWG THHN	ML	433.00	$ 110,981.00	$ 48,054,773	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4+4+8T AWG THHN	ML	307.00	$ 95,228.00	$ 29,234,996	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+8T AWG THHN	ML	96.00	$ 75,487.00	$ 7,246,752	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8+8+8T AWG THHN	ML	165.00	$ 79,043.00	$ 13,042,095	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 2"	ML	140.00	$ 115,597.00	$ 16,183,580	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.10	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1.00	$ 16,738,866.00	$ 16,738,866	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.11	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	7.00	$ 3,439,120.00	$ 24,073,840	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 800W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUMW O SIMILAR	UN	76.00	$ 5,681,030.00	$ 431,758,280	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 600W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUMW O SIMILAR	UN	16.00	$ 4,128,559.00	$ 66,056,944	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.14	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA ILUMINACION PATINAJE QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 300A, BARRAJE PRINCIPAL DE 400A, 7 ARRANCADORES DIRECTOR CON PROTECCION DE 50A Y CONTACTOR TRIPOLAR DE 50A EN AC3, ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION, EN COFRE METALICO DE 100X60X40 CON BANDEJA DOBLEFONDO. PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1.00	$ 23,478,564.00	$ 23,478,564	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.15	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	251.54	$ 38,501.00	$ 9,684,542	1,967,172.59	0.19%	1,967,172.59	0.19%	-	0.00%	-	0.00%
8.16	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	157.04	$ 192,100.00	$ 30,167,384	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.17	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.02	$ 641,273.00	$ 1,295,371	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.18	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.91	$ 1,377,156.00	$ 8,138,992	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	275.63	$ 53,399.00	$ 14,718,366	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.20	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	2,770.04	$ 8,513.00	$ 23,581,351	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.21	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.16	$ 936,416.00	$ 18,878,147	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.22	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	10.00	$ 604,401.00	$ 6,044,010	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.23	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	4.00	$ 1,152,233.00	$ 4,608,932	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.24	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	2.00	$ 1,927,585.00	$ 3,855,170	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.25	CANALIZACIÓN 18 DUCTOS DE 2" PVC	ML	5.00	$ 405,772.00	$ 2,028,860	2,028,860.00	0.19%	2,028,860.00	0.19%	-	0.00%	-	0.00%
8.26	CANALIZACIÓN 12 DUCTOS DE 2" PVC	ML	33.42	$ 345,633.00	$ 11,551,055	11,551,055.00	1.11%	11,551,055.00	1.11%	-	0.00%	-	0.00%
8.27	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 2" PVC	ML	135.11	$ 179,324.00	$ 24,228,466	6,057,116.50	0.58%	6,057,116.50	0.58%	-	0.00%	-	0.00%
8.28	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 2" PVC	ML	70.44	$ 159,278.00	$ 11,219,542	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.29	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 2" PVC	ML	77.30	$ 149,255.00	$ 11,537,412	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.30	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	85.78	$ 61,373.00	$ 5,264,576	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.31	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	54.59	$ 34,320.00	$ 1,873,529	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	154.00	$ 73,037.00	$ 11,247,698	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	7.00	$ 437,575.00	$ 3,063,025	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	39.00	$ 59,617.00	$ 2,325,063	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 1,042,294,728								
					$ 8,601,166,535								
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								

5262

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
C	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META												
1.0	PRELIMINARES												
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	9,706.51	$ 4,349.00	$ 42,213,612	3,778,584.35	6.91%	13,616,220.27	24.90%	-	0.00%	20,974,357.20	38.36%
1.2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	33.43	$ 373,009.00	$ 12,469,691	-	0.00%	12,469,691.00	22.80%	70,871.71	0.13%	10,033,942.10	18.35%
2.00	EXCAVACION Y RELLENOS				$ 54,683,303								
2.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	42.05	$ 38,501.00	$ 1,618,967	-	0.00%	1,618,967.00	5.59%	-	0.00%	-	0.00%
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	238.98	$ 68,679.00	$ 16,412,907	8,343,227.73	28.79%	8,343,227.73	28.79%	-	0.00%	-	0.00%
2.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	44.16	$ 247,904.00	$ 10,947,441	4,706,570.28	16.24%	6,012,799.04	20.75%	1,983,232.00	6.84%	1,983,232.00	6.84%
3.00	OBRAS EXTERIORES				$ 28,979,315								
3.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	954.86	$ 98,611.00	$ 94,159,699	28,718,708.20	6.53%	28,718,708.20	6.53%	-	0.00%	-	0.00%
3.2	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,40 A=0,50, DESARROLLO 1,13 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	412.20	$ 134,844.00	$ 55,582,697	18,836,358.43	4.29%	18,836,358.43	4.29%	-	0.00%	-	0.00%
3.3	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD.	ML	412.20	$ 702,956.00	$ 289,758,463	98,195,923.57	22.34%	98,195,923.57	22.34%	-	0.00%	-	0.00%
4.00	FILTROS				$ 439,500,859								
4.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8866.15	$ 14,681.00	$ 130,163,948	106,775,113.59	25.96%	130,163,948.00	31.64%	-	0.00%	-	0.00%
4.2	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1956.86	$ 143,702.00	$ 281,204,696	230,675,727.19	56.08%	281,204,696.00	68.36%	-	0.00%	-	0.00%
5.00	SUPERFICIE				$ 411,368,644								
5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	8866.15	$ 4,394.00	$ 38,957,863	-	0.00%	-	0.46%	-	0.00%	-	0.00%
5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	545.95	$ 900,037.00	$ 491,375,200	-	0.00%	-	5.75%	-	0.00%	-	0.00%
5.3	PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA EN SITIO CERTIFICADA IAAF SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 Y DIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPA ELÁSTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPA POROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM 1 A 4 MM DE COLOR ROJO.	M2	7799.35	$ 1,015,468.00	$ 7,919,990,346	-		-		-		-	
5.4	DEMARCACION PISTA	ML	4257.65	$ 21,661.00	$ 92,224,957	-	0.00%	-	92.71%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 8,542,548,366	-	0.00%	-	1.08%	-	0.00%	-	0.00%
6.00	ACCESORIOS												
6.1	BORDILLO ALUMINIO DESMONTABLE CERTIFICADO IAAF	ML	413.42	$ 254,313.00	$ 105,138,080	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6.2	OBSTACULO CARRERA CERTIFICADO IAAF	UN	8.00	$ 1,008,887.00	$ 8,071,096	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6.3	TACOS DE SALIDA	UN	8.00	$ 560,635.00	$ 4,485,080	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
7.00	PLACA EN CONCRETO				$ 117,694,256								
7.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	95.25	$ 969,616.00	$ 92,355,924	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
7.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3892.26	$ 9,955.00	$ 38,747,448	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
7.3	SISTEMA MODULAR DEPORTIVO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TEJIDO EN REJILLA, TABLETAS DE 25 CM X 25 CMS X 12.5 MM	M2	127.26	$ 892,631.00	$ 113,596,221	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.00	GRAMA SINTETICA				$ 244,699,593								
8.1	RELLENO CON GRAVILLA	M3	167.17	$ 102,613.00	$ 17,153,815	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.2	GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1,114.49	$ 116,423.00	$ 129,752,269	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 146,906,084								
					$ 9,960,380,420								
19.00	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESCENARIOS DEPORTIVOS .												
19.1	CERTFICACION RETIE REDES DE MEDIA				$ 3,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
19.2	CERTFICACION E INSPCCION DE TRANSFORMADOR				$ 949,266	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
19.3	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION				$ 2,975,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
19.4	RETIE USO FINAL				$ 7,735,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
19.5	CERTIFICACION RETILAP				$ 9,044,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
19.6	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA				$ 2,793,954	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
20.0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 297,493,828	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 323,991,048	25,893,826.29	7.99%	93,309,030.41	28.80%	126,137,383.07	38.93%	149,252,653.51	46.07%
9.00	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE PATINAJE.												
9.1	RETIE USO FINAL				$ 7,735,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

5263

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
9.2	CERTIFICACION RETILAP				$ 9,044,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.3	PMA				$ 187,776,998	16,294,104.95	7.97%	58,716,201.97	28.70%	19,998,250.29	9.78%	86,377,419.08	42.23%
					$ 204,555,998								
9.00	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE ATLETISMO.												
9.1	Diagnostico pista de Atletismo IAAF -Identificación de las materias primas IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Inspección visual IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Espesor de la pista EN 1969 -Absorción de impactos y Deformación vertical (12 puntos) EN 14808 y EN 14809 -Deslizamiento (6 puntos) EN 13036-4 -Planimetría de la superficie IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Drenaje IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications				$ 46,400,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.2	PMA				$ 187,776,998	18,000,582.16	7.69%	45,834,081.44	19.57%	3,511,429.86	1.50%	11,097,620.58	4.74%
					$ 234,176,998								
					$ 762,724,044								
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)				$ 50,109,216,798								
	VALOR TOTAL				$ 50,871,940,842	1,259,313,527		2,268,519,605		643,717,752		1,394,571,419	

	PROGRAMADO				EJECUTADO			
Prog. Escenarios Deportivos	297,869,040	0.94%	845,694,258	2.66%	515,272,868	1.62%	964,432,937	3.03%
Prog. Pista de Patinaje	443,413,691	5.04%	777,810,726	8.83%	122,879,350	1.40%	386,049,331	4.38%
Prog. Pista de Atletismo	518,030,796	5.07%	645,014,621	6.31%	5,565,534	0.05%	44,089,152	0.43%
Programado Contrato	1,259,313,527	2.48%	2,268,519,605	4.46%	643,717,752	1.27%	1,394,571,419	2.74%

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

CONTROL DE CALIDAD

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia
