7227

BITACORA DE OBRA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

7228

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	1	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	19	X		EXCAVADORA	3	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	8	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.3	M3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA	8.94	SI	SI
A.4.6	KG	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	719.74	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	106.07	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
A.3.2.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RÍO	9.75	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7229

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	2	9	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	18	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	8	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.1	M3	SOLADO CONCRETO 13.8 MPA	1.35	SI	SI
A.4.6	KG	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	719.74	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	106.07	SI	SI
A.2.1.	UN	DESMONTE DE LAVAMANOS	22.00	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
A.3.2.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RÍO	9.75	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7230

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	4	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	105 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	17	X		EXCAVADORA	3	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	8	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.3.	M3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA	12.09	SI	SI
A.4.6	KG	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	719.74	SI	SI
A.2.2	UNIDAD	DESMONTE DE SANITARIOS	20.00	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
A.3.2.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RÍO	9.75	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820080038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7231

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	5	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			LLUVIAS DE 8:30 AM A 10:00 AM
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	1.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	22	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	1	X		NIVEL	1	
OTRO	8	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.6	KG	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	719.74	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	106.07	SI	SI
A.2.3.	M2	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	381.76	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
A.3.2.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RÍO	9.75	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090620 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7232

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	6	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	105 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	20	X		EXCAVADORA	3	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	8	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.3	M3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA	5.08	SI	SI
A.4.1	M3	SOLADO CONCRETO 13.8 MPA	1.35	SI	SI
A.4.6	KG	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	719.74	SI	SI
A.2.7	M2	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO	1328.00	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
B.2.3.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RÍO	140.3	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820080038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7233

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	7	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	20	X		EXCAVADORA	3	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	8	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	106.07	SI	SI
A.2.7	M2	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO	1328.00	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
A.3.2.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RÍO	9.75	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7234

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	8	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DE 4:30 PM A 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	0.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	19	X		EXCAVADORA	3	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	8	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TECNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.3	M3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA	11.52	SI	SI
A.4.1	M3	SOLADO CONCRETO 13.8 MPA	1.35	SI	SI
A.2.7	M2	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO	1328.00	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088003863O	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones.

7235

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	9	9	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	17	X		EXCAVADORA	3	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	8	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.1	M3	SOLADO CONCRETO 13.8 MPA	1.35	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	106.07	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
A.3.2.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RÍO	9.75	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088003863O	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79963 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7236

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	12	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	18	X		EXCAVADORA	3	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	8	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.1	M3	SOLADO CONCRETO 13.8 MPA	1.35	SI	SI
A.4.6	KG	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	719.74	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	106.07	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
A.3.2.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RÍO	9.75	SI	SI
B.1.2	M3	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES	194	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7237

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	21	X		EXCAVADORA	3	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	8	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200860039630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7238

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE 8:30 AM HASTA LAS 11:00 AM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	2.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	21	X		EXCAVADORA	3	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	8	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.3	M3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA	9.58	SI	SI
A.4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPA	0.83	SI	SI
A.4.5	M3	PLACA PIEDRA CONCRETO CICLOPEO	9.83	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25106200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7239

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	21	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	8	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.5	KG	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	719.74	SI	SI
A.3.1.	M3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	106.07	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
A.3.2.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RÍO	9.75	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088003630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7240

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	9	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	21	X		EXCAVADORA	3	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	8	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.6	KG	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	719.74	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	106.07	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
A.3.2.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RÍO	9.75	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7241

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	23	X		EXCAVADORA	3	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	6	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.1	M3	SOLADO CONCRETO 13.8 MPA	1.35	SI	SI
B.2.2	M3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	79.14	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
A.3.2.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RIO	9.75	SI	SI
C.2.2.	M3	EXCAVACION MANUAL	47.6	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7242

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	19	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	23	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	8	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
B.2.2	M3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	79.14	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.50	SI	SI
A.3.2.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RÍO	9.75	SI	SI
C.1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	482.22	SI	SI
C.2.2.	M3	EXCAVACION MANUAL	47.6	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200860036630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	20	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	24	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	9	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.1	M3	SOLADO CONCRETO 13.8 MPA	1.35	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO	106.07	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.69	SI	SI
A.3.2.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RÍO	9.75	SI	SI
C.1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	482.22	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7244

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 8:00 AM HASTA LAS 8:30 AM
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias	0.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	21	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	9	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.3	M3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA	7.99	SI	SI
A.4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPA	0.83	SI	SI
A.4.5	M3	PLACA PIEDRA CONCRETO CICLOPEO	9.83	SI	SI
A.4.6	KG	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	719.74	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
C.1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	482.22	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088036630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7245

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	22	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	9	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.1	M3	SOLADO CONCRETO 13.8 MPA	1.35	SI	SI
A.4.6	KG	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	719.74	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	106.07	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
C.1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	482.22	SI	SI
C.2.2.	M3	EXCAVACION MANUAL	47.6	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820080038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090620 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7246

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	21	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	9	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.3	M3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA	22.56	SI	SI
A.4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPA	0.83	SI	SI
A.4.5	M3	PLACA PIEDRA CONCRETO CICLOPEO	9.83	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
C.1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	482.22	SI	SI
C.2.2.	M3	EXCAVACION MANUAL	47.6	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820080038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7247

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	25	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	105 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	24	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	4	X		NIVEL	3	
OTRO	9	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.1	M3	SOLADO CONCRETO 13.8 MPA	1.35	SI	SI
A.4.6	KG	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	719.74	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	106.07	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
C.1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	482.22	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7248

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	26	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE 4:00 PM HASTA 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias	1HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	24	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	4	X		NIVEL	3	
OTRO	9	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
B.1.1.	ML	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	30.54	SI	SI
C.1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	482.22	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088003863O	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090620 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7249

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	27	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	24	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPOGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	4	X		NIVEL	3	
OTRO	9	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.6	KG	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	719.74	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	106.07	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
A.3.2.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RÍO	9.75	SI	SI
C.2.1.	M3	EXCAVACION MECANICA	14	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7250

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	28	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE 3:30 HASTA LAS 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias	1.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	24	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	4	X		NIVEL	3	
OTRO	9	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.3	M3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA	21.71	SI	SI
A.4.5	KG	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	719.74	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
C.1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	482.22	SI	SI
C.2.1.	M3	EXCAVACION MECANICA	14	SI	SI
C.2.2.	M3	EXCAVACION MANUAL	47.6	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por los cuales se desarrollo la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7251

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	29	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	21	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	4	X		NIVEL	3	
OTRO	9	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.6	KG	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	719.74	SI	SI
A.3.1	M3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	106.07	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
A.3.2.	M3	RELLENO CON MATERIAL DE RÍO	9.75	SI	SI
C.1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	482.22	SI	SI
C.2.1.	M3	EXCAVACION MECANICA	14	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7252

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	9	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			LLUVIAS DESDE 7:30 HASTA LAS11:00 AM
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	3.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	21	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	4	X		NIVEL	3	
OTRO	9	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.4.3	M3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA	21.71	SI	SI
A.4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPA	0.83	SI	SI
A.4.5	M3	PLACA PIEDRA CONCRETO CICLOPEO	9.83	SI	SI
A.4.1	M3	SOLADO CONCRETO 13.5 MPA	1.35	SI	SI
A1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	121.60	SI	SI
C.1.1.	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	482.22	SI	SI
C.2.3.	VJ	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	36	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de septiembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

7253

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

7254

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 05 de septiembre del 2023

CEDVO-082-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

RECIBIDO 05 SEP 2023
Tatiana Lozo S.
11:48 am

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No 05

Cordialmente remitimos los documentos soporte de la orden de giro No 05 con cargo al Fideicomiso Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023.

ITEM DEL ANTICIPO	VALOR	DOCUMENTOS SOPORTE
2	$ 108.247.535,00	Factura electrónica No FE 10, copia de corte de obra N°2, certificación bancaria y RUT, por concepto de pago a tercero por Materiales y subcontratos.

N°	BPIN	NOMBRE DE PROYECTO	AFECTACION
1	2022005500094	Pista de Atletismo	$ 1.234.024,00
2	2022005500022	Pista de Patinaje	$ 19.131.108,00
3	2022005500024	Escenarios Deportivos Multipropósitos	$ 87.882.403,00
		VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO N° 4 POR PROYECTO	$ 108.247.535,00

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

7255

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 5 de septiembre del 2023

CEDVO-083-2023

RECIBIDO 06 SEP 2023
Tatiana Lalo
9:05 AM

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega Ajustes a diseño RCI Escenarios Deportivos Multipropósito.

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito enviar informe de Ajustes a los estudios y diseños del diseño de Red Contra incendios de los Escenarios Deportivos Multipropósito del contrato de la referencia.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 269 folios, 5 planos

7256

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 6 de septiembre del 2023

CEDVO-084-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

RECIBIDO 06 SEP 2023
Carolina B
9:05 a.m.

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega respuesta oficio OF-C249-2023-126.

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes documentos:

- Hojas de vida del personal ofertado con firma original.
- Exámenes de ingreso del personal ofertado.
- Se anexa análisis de AIU con las correcciones solicitadas.
- Programación impresa y firmada por el director de obra.

Aclaraciones

1. Las fichas técnicas anexadas son las de la maquinaria ofertadas, cumpliendo con el pliego de condiciones del proceso. La maquinaria utilizada para demoliciones y desmontes marcadas como actividades iniciales, toda la documentación es revisada por el profesional de seguridad y salud en el trabajo dando cumplimiento a los lineamientos y compromisos adquiridos, estos soportes fueron entregados en los informes mensuales de obra que se vienen entregando.

7257

4.2.2 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignará dos (2) puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación.

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.

50

Código:	CCE-EICP-GI-14	Versión:	3

DOCUMENTO BASE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código:	CCE-EICP-GI-14	Página:	51 de 71
Versión No.:	3		

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo.

TOMADO PLIEGO DE CONDIONES DEFINITIVO

2. Los planos del PMT solicitados en este oficio ya fueron entregados a la secretaria de movilidad (ver anexo oficio de entrega), pero no ha sido posibles la recolección de firmas, se le viene haciendo seguimiento cada tres días mediante llamadas telefónicas a la misma secretaria hasta lograr el cometido.
3. El programa de gerencia de proyectos ya hace parte de otro oficio el cual dentro de la programación esta para entrega el día lunes 11 de septiembre de 2023.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: __ folios, CD con datos

7258

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 6 de septiembre del 2023

CEDVO-084-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega Informe de Geo referenciación GPS para levantamientos y replanteos topográficos.

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito enviar informe de Geo referenciación de los GPS-01 y GPS-02 los cuales serán usados para los levantamientos y replanteos topográficos de los proyectos a construir dentro del contrato de la referencia.

Cordialmente,

RECIBIDO 06 SEP 2023
Carolina B
9:05 a.m.

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 4 folios, CD con datos

7259

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 7 de septiembre del 2023

CEDVO-086-2023

RECIBIDO 12 SEP 2023
Tatiana Lara S
3:00 p.m.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega ajustes de diseños hidrosanitarios.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir ajustes a los diseños hidrosanitarios del contrato de la referencia de acuerdo a las observaciones presentadas en el informe de revisión de estudios y diseños.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: ___ folios, CD con datos

7260

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 7 de septiembre del 2023

CEDVO-087-2023

RECIBIDO 12 SEP 2023
Tatiana Lazo S
3:00 PM

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega ajustes de diseños eléctricos para la construcción de la pista de patinaje y pista de atletismo.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir ajustes a los diseños eléctricos de los proyectos Pista de Patinaje y Pista de Atletismo del contrato de la referencia de acuerdo a las observaciones presentadas en el informe de revisión de estudios y diseños.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: ___ folios, CD con datos

7261

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 8 de septiembre del 2023

CEDVO-088-2023

08/SEPT/2023
Hora Recibe 11:
4:50 pm.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega documentos que hacen parte del PMT.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir los planos solicitados en el oficio OF-C249-2023-126. Anexo a este oficio se hacen llegar correspondencia recibida de la secretaria de movilidad de movilidad de Villavicencio, con consecutivos 1703-19.18/1118 y el 1703-19.18/1119, donde dan aceptación al seguimiento del PMT elaborado por el consorcio que ejecuta el contrato en referencia.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 2 folios, 2 planos

7262

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 14 de septiembre del 2023

CEDVO-091-2023

15/09/2023
Org Andres H
2:53pm.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Observaciones en replanteo de pista de ruta de patinaje.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito informar que, realizado el replanteo para la construcción de los muros de la pista de ruta de patinaje, nos encontramos con los siguientes inconvenientes:

- *GRADERIAS CANCHA AUXILIAR*: El muro de contención de la pista queda a 96cm de la esquina de los pedestales, siendo mínimo el paso peatonal por este sector entre las graderías y la pista. Adicional, la cubierta de las graderías se proyecta 70cm más allá de los pedestales quedando la caída de agua a tan solo 26cm del muro de pista, lo cual podría causar deterioro prematuro para las barandas y el acabado de la pista y escorrentía hacía el interior de la pista. Se podría solucionar instalando canales de aguas lluvias a las cubiertas y construyendo un sumidero paralelo al muro de la pista con el fin de recoger las aguas de escorrentía superficial y conexión de bajantes.

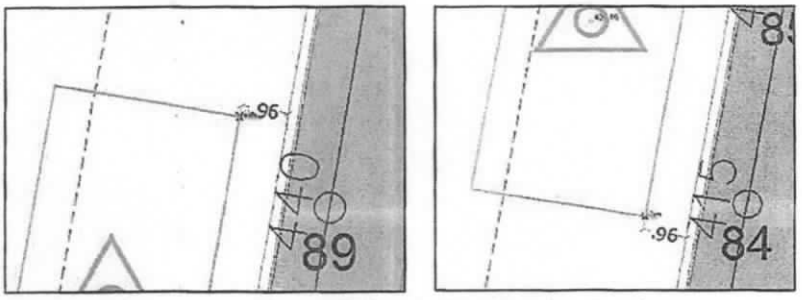


Figura 1. Graderías Cancha Auxiliar

- *EDIFICIO IDERMETA*: El muro de contención de la pista queda a 120cm de la esquina de edificio administrativo de Idermeta, siendo mínimo el paso peatonal por este sector entre las graderías y la edificación. Se podría solucionar modificando la geometría de la pista de ruta de patinaje.

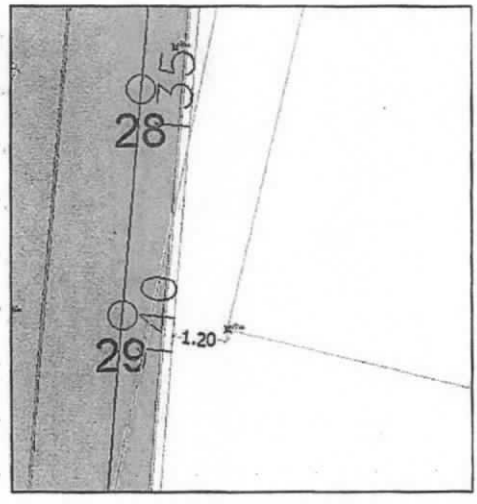


Figura 2. Edificio Idermeta

- *LINDERO CON PARQUEADERO PUBLICO*: El muro de contención de la pista queda a 39cm de la línea de paramento con el parqueadero publico existente, interrumpiendo la circulación peatonal por este sector. Se podría solucionar modificando la geometría de la pista de ruta de patinaje.

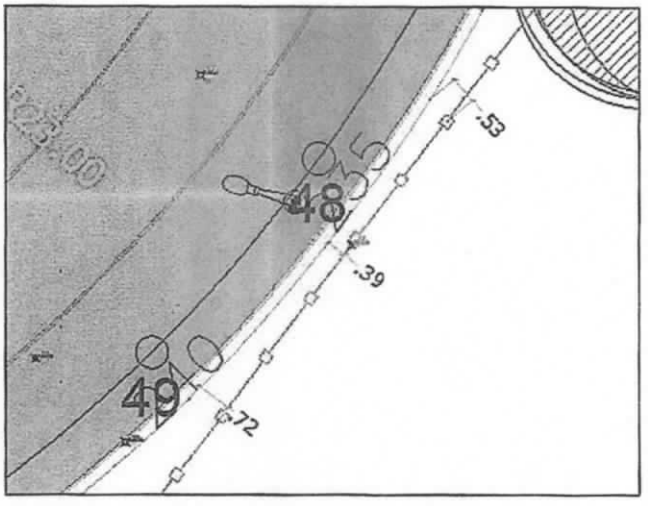


Figura 3. Lindero parqueadero publico

- *PROYECCION PARQUEADEROS IDERMETA*: El muro de contención de la pista interfiere con la proyección de parqueaderos de Idermeta establecidos en el plano de implantación general de los proyectos. Adicional requiere un paso mínimo de circulación peatonal. Se podría solucionar modificando la geometría de la pista de ruta de patinaje.



Figura 4. Proyección parqueaderos públicos Idermeta

En resumen, los puntos críticos encontrados durante el replanteo del escenario son los indicados en la siguiente figura:

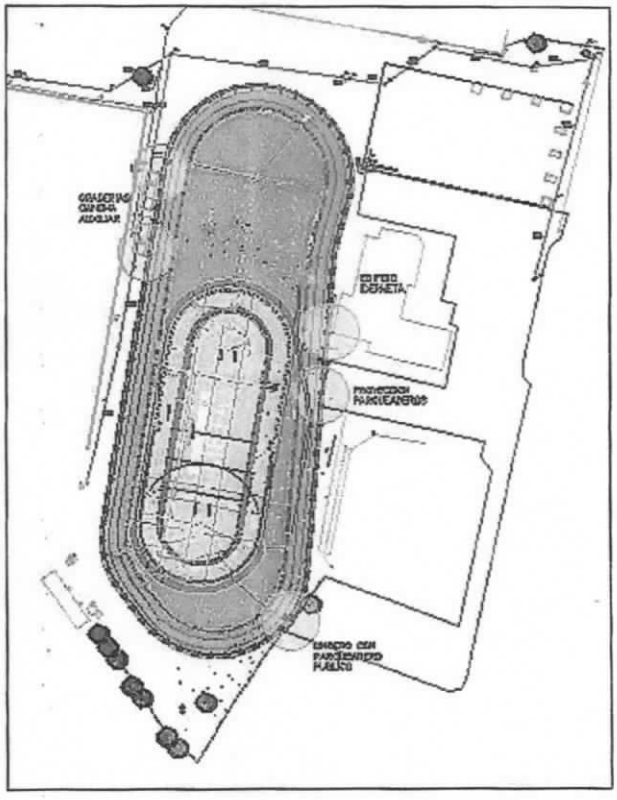


Figura 5. Puntos críticos pista de ruta

De acuerdo a lo anterior, se solicita realizar los ajustes en la geometría de la pista de ruta conservando las especificaciones mínimas requeridas por la federación nacional de patinaje - FEDEPATIN.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: plano de levantamiento dwg

7266

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 15 de septiembre del 2023

CEDVO-92-2023

7937
15 SEP 2023

Señores
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO
Attn. Ing Adolfo Rodriguez Iriarte
Director de planeación y prospectiva
Calle 37A# 19C-26 Barrio Jordan-Paraiso
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de informes PMT de Agosto de 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito realizar entrega del informe de PMT del proyecto de la referencia según aprobación No. 1703-19.18/0680 del 17 de mayo de 2023, con el cual se realiza el control y registro de las actividades realizadas.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 51 folios

7267

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 15 de septiembre del 2023

CEDVO-093-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

15/09/2023
2:55 pm

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE INFORMES PMT DE AGOSTO DE 2023

Cordial saludo

De manera atenta me permito realizar entrega del informe de PMT del proyecto de la referencia según aprobación N° 1703-19. 18/0680 del 17 de mayo de 2023, con el cual se realiza el control y registro de las actividades realizadas.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

7268

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 16 de septiembre del 2023

CEDVO-094-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Corrección a informe de Georreferenciación topográfica del proyecto

Cordial saludo

De manera atenta me permito remitir informe corregido de la georreferenciación topográfica realizada al proyecto debido a la perdida de vigencia y perdida de uno de los BMS en terreno de la georreferenciación entregada en los estudios y diseños.

Cordialmente,

RECIBIDO 18 SEP 2023
Carolina B.
9:05 a.m.

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 10 folios

7269

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 18 de septiembre del 2023

CEDVO-095-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

RECIBIDO 18 SEP 2023
11:32 am
Tatiana

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No 05 ANTICIPO

Cordialmente remitimos los documentos soporte de la orden de giro No 05 con cargo al Fideicomiso Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023.

ITEM DEL ANTICIPO	VALOR	DOCUMENTOS SOPORTE
3	$ 907.601.278,00	Copia de contrato N°2, copia cuenta de cobro por concepto de anticipo, certificación bancaria, copia cedula de ciudadanía representante legal, RUT y certificado existencia y representación legal, por concepto de transporte.

N°	BPIN	NOMBRE DE PROYECTO	AFECTACION
3	2022005500024	Escenarios Deportivos Multipropósitos	$ 907.601.278,00
		VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO N° 5 POR PROYECTO	$ 907.601.278,00

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

7270

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 18 de septiembre del 2023

CEDVO-096-2023

RECIBIDO 13 SEP 2023
2:45 PM
Tatiana2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO DE OBRA MES DE AGOSTO.

Cordial saludo

La presente tiene como fin, realiza la entrega del informe de plan de inversión de anticipo de obra correspondiente a los desembolsos del mes de agosto con sus respectivas ordenes de giro.

Agradecemos la atención prestada.

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

7271

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 19 de septiembre del 2023

CEDVO-097-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

RECIBIDO 19 SEP 2023
Sin Aprobación
8:50 am
Tatiana Lara S

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE INFORMES MENSUALES CON AJUSTES SOLICTADOS POR LA ENTIDAD.

Cordial saludo

La presente tiene como fin, realizar la entrega de los informes del mes de mayo y junio del presente año, con los ajustes realizados, los cuales fueron hechos por la entidad.

Agradecemos la atención prestada.

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

7272

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 20 de septiembre del 2023

CEDVO-98-2023

RECIBIDO 20 SEP 2023
10:43 AM
Tatiana Lara S

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de informes PMT de agosto de 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito realizar entrega del informe de PMT del proyecto de la referencia según aprobación No. 1703-19.18/0680 del 17 de mayo de 2023, con el cual se realiza el control y registro de las actividades realizadas.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 52 folios

Villavicencio, 20 de septiembre del 2023

CEDVO-099-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

RECIBIDO 21 SEP 2023
Carolina P
2:55 p.m.

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto:
RTA *OFICIO OF-C249-2023-140.* SEÑALIZACIONES

Cordial saludo,

De manera atenta y muy respetuosamente, nos permitimos responder observaciones realizadas mediante oficio en mención.

1. **Señalización de material de acopio para zapatas:** Damos por entendido que hacen referencia al material empleado para realizar las zapatas, tal como el hierro, área que se encuentra señalizada desde el inicio de la zona hasta donde, está destinada a ser zona de acopio, y dando cumplimiento a lo **APLICABLE** de ficha citada, como, por ejemplo:

- Preparación de las áreas de almacenamiento temporal. (Ver evidencia fotográfica 1).
- Aislamiento y protección contra intemperie, de las áreas de almacenamiento temporal. (Ver evidencia fotográfica 2) y dejando claro que finalizada la jornada laboral se protege con plástico negro como se ve según hora en la imagen.
- Limpieza periódica de las áreas de almacenamiento temporal. (Ver evidencia fotográfica 3)
- Señalización del Zona de acopio. (Ver evidencia fotográfica 3).



Evidencia fotográfica 1.

Evidencia fotográfica 2.





Evidencia fotográfica 3.

Colombia
6 de septiembre de 2023

2. **Señalización de zona de acopio de relleno:** Se realiza señalización de la zona la cual no se encontraba señalizada.



3. **Señalización de zona de Excavación para zapatas:** La zona que requieren se encuentra señalizada no se señaliza, dado a que se encuentra en intervención por lo cual tenemos el movimiento de la maquinaria y del personal en el área incluyendo la parte interna de la misma, lo cual si se realiza delimitación impediría el desarrollo de la tarea.

4. **Señalización de senderos peatonales:** La realización de senderos peatonales no se realiza debido al movimiento de la maquinaria y los vehículos que intervienen en el desarrollo de las tareas, de igual manera se informa, que de acuerdo a las actividades realizadas diariamente no es posible estipular un sendero fijo para realizar, ya que si se han dado cuenta en las cortas visitas realizadas el movimiento de equipos grandes es constante durante toda la jornada, por tanto y si es posible solicitamos a la interventoría una visita más extensa y permanente durante el completo horario laboral para que de tal manera y evidenciando las actividades en sitio verifique lo antes mencionado y de esta manera corrija y realice observaciones verbales a los profesionales en campo, antes de realizar este tipo de oficios sin antes realizar una sola sugerencia o solicitud de manera verbal, no solo de este punto sino de todos los puntos tratados tanto en este oficio, como en todos los oficios anteriores.

5. **Señalización de ruta de volquetas:** Es de suma importancia que se realice primero la verificación de lo mencionado en la solicitud, ya que de acuerdo con lo establecido y aprobado en el PMT se instaló la señalización de acuerdo con el documento que se tramito directamente ante la secretaria de movilidad del municipio de Villavicencio,

sin embargo, se solicita a la interventoría verificar lo anterior en los informes junio y julio, entregado a la secretaria y a ustedes, dado que la evidencia fue remitida antes de la elaboración de estas observaciones; con referencia al tráfico de volquetas en el interior del frente de obra, no es posible establecer una ruta fija para el movimiento de los vehículos puesto que de acuerdo a lo mencionado en el ítem anterior, la obra se encuentra en constante movimiento impidiendo así, lo solicitado.

6. **Orden y aseo en el área de trabajo y mantenimiento de la limpieza de la entrada y salida de volquetas y maquinaria pesada:** de acuerdo al anexo fotográfico adjunto en el oficio NO evidenciamos residuos que requieran o ameriten dicha observación, sin embargo, ya que tal vez esto si no ha sido evidenciado por ustedes informamos que se realiza limpieza de la vía, las entradas de la obra y zonas de trabajo retirando el exceso del material natural de la ejecución de la obra controlando las emisiones de material particulado en zona de influencia del proyecto y accidentalidad de población trabajadora.

















Para finalizar, en el presupuesto ambiental existen solo dos ítems de señalización, de los cuales el ítem 3 según lo mencionado en el oficio, es el único que cuenta con rubro mensual; sin embargo, no se está incumpliendo con lo presupuestado porque las áreas que requieren señalización con cita de peligro se encuentran delimitadas. Adicional se anexa evidencia fotográfica de lo anteriormente mencionado.

7278

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1









Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

7279

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 22 de septiembre del 2023

CEDVO-100-2023

RECIBIDO 25 SEP 2023
Hora 2:56 pm
Zorna Ramirez.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de informe de obra No.03 de julio de 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito realizar entrega del informe de obra No.03 del proyecto de la referencia correspondiente al mes de Julio de 2023.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 585 folios

7280

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 22 de septiembre del 2023

CEDVO-101-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

RECIBIDO SEP 2023
25/09/23
9:01 am
Lorena Rodriguez

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega ajuste en geometría pista de ruta de patinaje

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los ajustes de la geometría de la pista de ruta de patinaje, teniendo en cuenta los puntos críticos del oficio CEDVO-091-2023 entregado el 15 de septiembre de 2023 y las recomendaciones mínimas indicadas en su oficio OF-C249-2023-153 de fecha 19 de septiembre de 2023 y la Normativa -Escenarios de Patinaje 2023 de la Federación Colombiana de Patinaje-FEDEPATIN.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: plano en dwg.

7281

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 28 de septiembre del 2023

CEDVO-104-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta.

RECIBIDO 3 0 JUL 2023
Hora: 09:01am
Lorena Ramírez

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: DOCUMENTOS ANEXO TECNICO.

Cordial saludo,

De manera atenta y muy respetuosa, nos permitimos remitir nuevamente documentos solicitados en relación con el anexo técnico.

Damos claridad que son documentos iniciales, por tanto, en la medida de la ejecución de las actividades en campo se pueden generar cambios y nuevas versiones las cuales a su medida serán informadas y remitidas como se viene realizando.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Elaboró: Verónica Cabarca
Anexo: 687 folios

7282

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

7283

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 6 de Septiembre del 2023

OF-C249 -2023-137

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

Recib.
Jhon Henry Ortiz.
1121840718.
06/09/23.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

Asunto: Solicitud de Comprobantes de pago FIC- Mensualizado.

1

Cordial saludo,

De acuerdo al Decreto 2375 de 1974 por el cual se crea el Fondo para la Industria de la Construcción – FIC, el cual tiene como finalidad atender los programas y modos de formación profesional integral desarrollados por la entidad, que guarden relación con los diferentes oficios y ocupaciones de la industria de la construcción, y atender con cargo a él, el pago de los apoyos de sostenimiento que corresponda a los aprendices que reciben formación profesional en esos oficios.

La contribución FIC está a cargo de los empleadores de la actividad económica de la construcción, quienes deberán contribuir mensualmente al mismo con una suma igual a una vez el salario mínimo mensual legal, por cada cuarenta (40) trabajadores que laboren en cada una de las obras bajo sus responsabilidad, y proporcionalmente por fracción de cuarenta (40).
El Decreto 1047 de 1983 "Por medio del cual se reglamenta el Decreto número 2375 de 1974 en lo relacionado con el funcionamiento del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC", establece en su artículo 2º: "El Fondo será administrado por el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, con la asesoría de la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL; de igual manera en su artículo 3°. faculta al SENA como administrador del fondo a establecer los procedimientos necesarios relacionados con la liquidación, recaudo y control de los valores correspondientes al FIC, así como también para regular la administración, funcionamiento y destinación específica del mismo.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Ahora, de acuerdo al Artículo 6° de la Resolución 1449 del 2012, de conformidad con el Decreto 083 de 1976, establece que los propietarios o contratistas principales serán responsables de la contribución al FIC sobre el costo total de la obra, en los casos que no demuestren que sus subcontratistas cancelaron el FIC.

De acuerdo a lo anterior, y por medio del presente me permito solicitar los comprobantes de pago de la contribución al Fondo para la Industria de la Construcción – FIC, que como contratistas de obra deben estar realizando desde el primer mes de ejecución del contrato.

En adelante deberán allegarnos mes a mes este certificado de pago.

La información completa acerca de la normatividad, liquidación y pago de esta contribución la encuentran en la página del SENA en el siguiente enlace:

https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/pagosCertificaciones.aspx

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZJAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: interescenariosc@gmail.com

7285

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 12 de Septiembre del 2023

OF-C249 -2023-146

Recibido sin aceptación
9:50am
14. Septiembre. 2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: *ANUNCIO DE SOLICITUD DE DEBIDO PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.*

Cordial saludo.

1

Atendiendo a las condiciones contractuales y presentadas en la obra de la referencia, y teniendo en cuenta lo indicado por la entidad mediante correo electrónico enviado el día 11 de Septiebre del 2023 donde indica lo siguiente: *"Solicitud de entrega inmediata de los informes mensuales de obra de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023, según las obligaciones contractuales. Es importante indicar que se debe tener un seguimiento estricto y detallado por la interventoría en el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratista de obra. En el caso de no cumplimiento se solicita al interventor a tomar las medidas pertinentes"*. Por lo que esta interventoría considera que existe mérito para emitir alerta sobre el posible incumplimiento al contrato de obra, por parte del contratista.

En el presente escrito se hará referencia a:

1. Identificación del contrato de obra.
2. Las obligaciones no cumplidas, como hecho motivador de alertas por presunto incumplimiento.
3. Las pruebas del hecho.
4. Concepto de la interventoría acerca de cómo debe ser cumplida la obligación presuntamente incumplida
5. Consecuencias de la persistencia de los hechos

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

En el cuadro que se presenta a continuación se incluyen los datos generales del Contrato de Obra Pública:

Contrato de obra	106 de 2023
Contratante	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
Contratista	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023 Nit. 901.682.871-2

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

	R.L. JHON HENRY ORTIZ GARCIA C.C. No. 1.121.840.118
Fecha del contrato	16 DE FEBRERO DEL 2023
Objeto	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.
Fecha de inicio	10 DE MAYO DEL 2023
Plazo inicial	DOCE MESES

2. OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS, COMO HECHO MOTIVADOR DE ALERTAS POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.

La alerta de posible incumplimiento se motiva en los siguientes hechos.

2.1. En el Formulario No. 1 - Oferta económica, capitulo CERTIFICACIONES PMT Y/O PMA, OTROS, Subcapítulo CERTIFICACIONES – PMT Y/O PMA, OTROS ESCENARIOS DEPORTIVOS en el ítem No. 20 Plan de Manejo Ambiental, Subcapítulo CERTIFICACIONES – PMT Y/O PMA, OTROS PISTA DE PATINAJE en el ítem No. 9.3 PMA y Subcapítulo CERTIFICACIONES – PMT Y/O PMA, OTROS, PISTA DE ATLETISMO, se evidencia que se debe realizar una implementación mensual por lo cual se ha solicita la presentación del informe de implementación durante el mes, sin que a la fecha se haya tenido respuesta de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.

2

2.2. En la cláusula 9 Obligaciones generales del contratista Numeral No. 2. Atender oportunamente los requerimientos del interventor y numeral No. 3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen; la interventoría mediante oficios OF-C249-2023-111, OF-C249-2023-116, OF-C249-2023-127, OF-C249-2023-132, OF-C249-2023-136, OF-C249-2023-121, OF-C249-2023-122, OF-C249-2023-135, ha requerido al contratista de obra la entrega de se reitera la presentación de las correcciones de los informes mensuales correspondientes a los meses de Mayo y Junio con sus respectivos informes de seguimiento al plan de manejo ambiental, al plan de gerencia de proyectos, al plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se reitera la presentación del informe mensual de obra e informes de seguimiento correspondiente al mes de Julio y se solicita la presentación del informe mensual de obra e informes de seguimiento correspondiente al mes de Agosto, los cuales a la fecha no han sido entregados.

2.3. En la cláusula 10 Obligaciones específicas del contratista Numeral No. 23. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto; a la fecha el contratista no ha presentado los informes requeridos.

3. PRUEBAS DEL HECHO.

1. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-111 de fecha 1 de Agosto del 2023, solicita entrega informe mensual de ejecución de obra del periodo de Julio, donde se requiere la presentación de informes de seguimiento.

2. Mediante oficio OF-C249-2023-116 de fecha 10 de Agosto del 2023, la interventoría realiza devolución de informes mensuales correspondientes a Mayo y Junio del 2023.

3. El contratista de obra mediante oficio CEDVO-068-2023 de fecha 10 de agosto del 2023, entrega de informe de seguimiento al plan de gerencia correspondiente a los meses de Mayo y Junio.

4. El contratista de obra mediante oficio CEDVO-072-2023 de fecha 15 de agosto del 2023, realiza entrega de presupuestos ambientales de los proyectos del contrato de obra.

5. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-121 de fecha 15 de Agosto del 2023, se realiza la devolución de informes de seguimiento al plan de gerencia de proyectos para correcciones.

6. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-122 de fecha 22 de Agosto del 2023, realiza devolución de presupuestos del plan de manejo ambiental.

7. El contratista de obra mediante oficio CEDVO-074-2023 de fecha 23 de agosto del 2023, realiza entrega de informe de seguimiento ambiental del mes de Mayo.

8. El contratista de obra mediante oficio CEDVO-075-2023 de fecha 23 de agosto del 2023, realiza entrega de informe de seguimiento ambiental del mes de Junio.

3

9. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-128 y OF-C249-2023-129 fechado del 24 de Agosto del 2023, se realiza devolución de informes de seguimiento al plan de manejo ambiental de los meses de Mayo y Junio.

10. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-127 fechado del 24 de Agosto del 2023, se reitera la presentación de informes mensuales de obra e informes de seguimiento a plan de gerencia de proyectos, plan de manejo ambiental, SST y plan de manejo de tránsito.

11. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-132 de fecha 31 de Agosto del 2023, se reitera la presentación de los informes de seguimiento al plan de gerencia de proyectos, se reitera la presentación de del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, se reitera la presentación de informes corregidos del mes de Mayo y Junio, se reitera la presentación del informe mensual del mes de Julio con los respectivos informes de seguimiento a plan de gerencia de proyectos, plan de manejo ambiental, SST y plan de manejo de tránsito.

12. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-135 de fecha 6 de Septiembre del 2023, se realiza devolución de presupuestos del plan de manejo ambiental.

13. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-136 de fecha 6 de Septiembre del 2023, se reitera la presentación de las correcciones de los informes mensuales correspondientes a los meses de Mayo y Junio con sus respectivos informes de seguimiento, se reitera la presentación del informe mensual de obra e informes de seguimiento correspondiente al mes de Julio y se solicita la presentación del informe mensual de obra e informes de seguimiento correspondiente al mes de Agosto.

4. *CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE COMO DEBE SER CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA*

Para subsanar todas las obligaciones no cumplidas a la fecha el contratista debe:

4.1. Presentar las correcciones al informe de seguimiento a la implementación del plan de manejo ambiental del mes Mayo y del mes Junio, correcciones de los presupuestos ambientales de los proyectos del contrato, informe de seguimiento a la implementación del plan de manejo ambiental del mes Julio y del mes Agosto.

4.2. Presentar las correcciones al informe de obra del mes Mayo y del mes Junio, y presentar informes de obra de los meses de Julio y Agosto.

4.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo técnico, con los respectivos informes de seguimiento de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.

4.4. Presentar el informe de seguimiento del plan de manejo de transito con el radicado en la secretaria de movilidad del mes de Agosto.

4.5. Presentar las correcciones al informe de seguimiento al Plan de Gerencia de Proyectos del mes Mayo y del mes Junio, y presentar informes de seguimiento de los meses de Julio y Agosto.

4.6. Presentar informe de manejo de anticipo del mes de Agosto.

5. *CONSECUENCIAS DE LA PERSISTENCIA DE LOS HECHOS*

De persistir los hechos más allá de las fechas previstas para subsanar los hechos motivadores de las alertas del presente oficio más allá de las fechas descritas a continuación, La Interventoría dará informe detallado a la Entidad Contratante solicitando el inicio del debido proceso por incumplimiento.

1. Correcciones al Informe de implementación al plan de gerencia de proyectos de los meses mayo y Junio y presentación de los informes de seguimiento de los meses de Julio y Agosto.
   Deben estar totalmente subsanados a ***19 de Septiembre del presente año***.

2. Correcciones al Informe de seguimiento al plan de Manejo ambiental de los meses mayo y Junio y presentación de los informes de seguimiento de los meses de Julio y Agosto.
   Deben estar totalmente subsanados a ***19 de Septiembre del presente año***.

3. Correcciones de los presupuestos del plan de manejo ambiental.
   Deben estar totalmente subsanados a ***19 de Septiembre del presente año***.

4. Correcciones de los informes mensuales de obra de los meses de Mayo y Junio y presentación de los informes mensuales de obra de los meses de Julio y Agosto.
   Deben estar totalmente subsanados a ***19 de Septiembre del presente año***.

5. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo técnico, con los respectivos informes de seguimiento de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto
   Deben estar totalmente subsanados a ***19 de Septiembre del presente año***.

6. Presentación del informe de manejo de anticipo del mes de Agosto.
   Deben estar totalmente subsanados a ***19 de Septiembre del presente año***.

Téngase en cuenta de manera especial que dentro de las consecuencias derivadas del posible incumplimiento se encuentra que:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, los particulares que celebran contratos con entidades estatales, colaboran con el logro de los fines del Estado y cumplen una función social, que como tal implica obligaciones. En efecto, la norma reza:

> *Artículo 3°.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*
>
> *Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.* (Subraya fuera del texto original).

5

De acuerdo con lo anterior, El Contratista de obra, al momento de suscribir el contrato, asumió el deber de colaboración para el logro de los fines de la entidad, teniendo que dar especial interés en la dedicación para la ejecución de las obras, los recursos destinados y el cumplimiento de los plazos contractuales, pues además su gestión se considera una función social.

En ese mismo orden de ideas, el estatuto de la contratación pública, dotó a las entidades para que puedan exigir el cumplimiento de las obligaciones a las cuales se comprometió el contratista. Así, el artículo 4° de la referida ley 80 de 1993 señala:

> *ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:*
>
> *1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.*
> *2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.*
> *3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato (...).*

Por su parte, la Ley 1474 de 2011, respecto de la colaboración que requieren las entidades estatales, para el logro de sus fines y prevenir hechos que atenten contra la moralidad administrativa y el interés público, delimitó las funciones de la interventoría en su artículo 83.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Conforme con lo anterior, la Interventoría, en ejercicio de sus funciones de seguimiento técnico sobre la ejecución del contrato por parte del Contratista de obra, informará a la entidad si el contratista se encuentra en situación de incumplimiento de sus obligaciones se informará por tanto, si la firma contratista de obra no ha cumplido con el objeto contractual conforme con el cronograma de obra y no se ha dado al cumplimiento de generar un plan de contingencia para superar el atraso de las obras.

Valga la pena recordar que esta Interventoría ha advertido al contratista acerca de la no entrega de los informes complementarios al informe mensual de obra de manera oportuna.

Se resalta que, encontrándose el contratista en situación de presunto incumplimiento del contrato de obra, se habilita a la Entidad para iniciar y dar curso al trámite de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Todo lo anterior se menciona con la finalidad de conminar a El Contratista a implementar las condiciones que permitan la subsanación de los hechos mencionados y la obtención del objeto contractual en las condiciones contenidas en el contrato de obra.

Atentamente,

ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

6

C.C. Archivo
DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se anexa copia de oficios mencionados y oficio enviado por la entidad solicitando informes mensuales de obra del contratista de obra.

7291

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

Solicitud informes mensuales de obra - contrato 106 de 2023

1 mensaje

Floower Peña <floower.pena@idermeta.gov.co>
Para: Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co>, idermetasupervision@gmail.com
CC: interescenariosc@gmail.com

11 de septiembre de 2023, 12:02

Buenas tardes, adjunto oficio con la solicitud de entrega inmediata de los informes mensuales de obra de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023, según las obligaciones contractuales. Es importante indicar que se debe tener un seguimiento estricto y detallado por la interventoría en el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratista de obra. En el caso de no cumplimiento se solicita al interventor a tomar las medidas pertinentes.

--
Floower Emilio Peña
Ingeniero civil, Especialista en Gerencia de Proyectos
IDERMETA
Imagen

remision informes mensuales.docx
140K

7292

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-03
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	OFICIOS	Versión: 02

Villavicencio, 11 de septiembre de 2023

Señores:

CONSORCIO INTERESCENARIOS
HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Representante Legal
Contrato de Interventoría No. 249 de 2023
Email: armconsulting@gmail.com

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Contrato de Obra No. 106 de 2023

Asunto: Remisión de informes mensuales de obra

Cordial Saludo.

Como apoyo a la supervisión designado para el contrato de interventoría 249 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META –IDERMETA y el CONSORCIO INTERESCENARIOS, solicito a la interventoría y a la obra del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATIINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META, entregar de manera inmediata los siguientes informes mensuales del proyecto:

Informe de obra correspondiente al periodo del mes de mayo de 2023
Informe de obra correspondiente al periodo del mes de junio de 2023
Informe de obra correspondiente al periodo del mes de julio de 2023
Informe de obra correspondiente al periodo del mes de agosto de 2023

Es importante indicar que los informes de obra para los meses de mayo y junio de 2023, fueron devueltos a la interventoría con el objetivo de realizar ajustes a observaciones emitidas por el grupo supervisor. A la fecha no se han recibido dichos informes con sus ajustes.

Para los informes de julio y agosto de 2023, esta supervisión no cuenta con dichos informes.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: THU-FO-03
IDERMETA	PROCESO DE TALENTO HUMANO	Vigencia: 31/01/2023
	OFICIOS	Versión: 02

Es de aclarar que de acuerdo a las obligaciones contractuales, los informes tanto de obra como de interventoría se deben radicar los cinco (05) primeros días de cada mes.

De igual forma es importante indicar que la supervisión ejercida a través de la oficina asesora de planeación, debe contar con la información del avance de cada proyecto, con el objetivo de cumplir lo establecido por el DNP, dado a que estos proyectos cuentan con recursos provenientes del sistema general de regalías.

Cordialmente,

Floower Emilio Peña

FLOOWER EMILIO PEÑA
Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría 249 de 2023

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

7294

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 1 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-111**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: SOLICITUD INFORME MENSUAL DE OBRA

1

Cordial saludo,

De manera respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de solicitar informe mensual de obra No. 3 del periodo correspondiente del mes de Julio.

Se solicita se anexen junto con el documento los siguientes informes de seguimiento:

- Plan de manejo ambiental con soportes de los meses de Mayo, Junio y Julio
- Plan de manejo de transito mes de Julio con el radicado ante Secretaria de Movilidad
- Plan de Gerencia de proyectos meses de Mayo, Junio y Julio
- Programa de seguridad y salud en el trabajo del mes de Julio
- Informe de Manejo de Inversión del Anticipo del mes de Julio

Recibido sin Aceptación
Jenssy Parra
01/08/2023
04:37 pm

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

7295

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 10 de Agosto del 2023 **OF-C249 -2023-116**

Recibido sin aprobación
10-08-2023
10:00 am

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: CORRECION INFORME MENSUAL DE OBRA

Por medio de la presente me permito realizar entrega de la documentación radicada respecto a los informes mensual 1 y 2 de obra, luego de la revisión realizada por el apoyo a la supervisión quien concluye algunas observaciones que deben subsanarse en el contenido de los informes entregados.

De tal forma se solicita entrega de la siguiente documentación informes de seguimiento que hace parte de los anexos solicitados por la supervisión para entrega:

- Informe de seguimiento al plan de gerencia
- Informe de seguimiento al plan de manejo ambiental
- Informe de SST
- Informe de PMT con radicado ante secretaria de movilidad

De igual manera se realiza entrega de 4 carpetas correspondientes a informe de obra No1 y 3 carpetas correspondientes a informe de obra No 2, las correcciones del contenido del formato GES-FO-126 se describen para cada página.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

7297

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023 CEDVO-066-2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 09 de agosto del 2023

CEDVO-068-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA INFORME SEGUIMINETO PLAN DE GERENCIA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito entregar los informes mencionados en el asusto, de los meses de mayo y junio para su revisión, dando cumplimiento al compromiso adquirido en el oficio CEDVO-066-2023.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo registro fotográfico

RECIBIDO 10 AGO 2023

7298

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 15 de agosto del 2023

CEDVO-072-2023

15-08-23
4:37pm
Tatiana

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE PRESUPUESTOS AMBIENTALES

Cordial saludo

De manera atenta me permito hacer entrega de las actas de reunión de los planes de manejo ambiental y entrega de presupuestos ambientales por proyecto para su respectiva revisión y aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

7299

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 14 de Agosto del 2023

OF-C249 -2023-121

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

Recibido Sin aceptación
15/08/23

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: CORRECION INFORME DE GERENCIA

Por medio de la presente me permito realizar la devolución de la documentación entregada en oficio CEDVO-068-2023 con fecha de radicado el día 10 de agosto, respecto al informe mensual de seguimiento al plan de gerencia, acorde a el documento base que hace parte de la documentación pre contractual y especifica en el numeral 4.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS en el que se especifica "para efectos del proceso de Contratación, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de **inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto**. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo".

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o de la arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o director de Proyectos de infraestructura deportiva.

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una especialización, maestría o doctorado en

Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de infraestructura deportiva.

Acorde a los especificado en el estudio previo se evidencian falencias en el documento entregado para seguimiento del plan de gerencia, se debe implementar la información entregada por lo que se solicita atender las siguientes observaciones:

1. REUNIÓN INICIAL: Para el inicio del proyecto se realizaron varias reuniones con la participación de la comunidad, interventoría y entidad contratante, que no son tenidas en cuenta ni son mencionadas en el informe siendo estas de importancia en el arranque del proyecto las cuales se describen a continuación:

- reunión de socialización del proyecto
- reunión de visita inicial
- reunión de empalme fase1 y fase 2
- reunión de entrega de las áreas a intervenir
- acta de verificación de diseños
- acta de verificación de permisos y licencias
- acta de verificación de disponibilidad de servicios públicos

se solicita precisar a fondo las generalidades que apenas están nombrados como decisiones con proveedores, contratación de personal y cual es el producto del análisis de la información técnica que se realizó. Adicionalmente no se concluye nada sobre ningún aspecto relevante que al cual se esté realizando algún tipo de seguimiento, no se fijan ni objetivos ni metas no se tiene claridad de los lineamientos generales para seguir en el proyecto, el plan de gerencia estipula un acta de inicio o un documento en el se consignan varios aspectos de tal forma se solicita desarrollar el seguimiento teniendo en cuenta el numeral 5. De plan de gestión en cuanto a procesos de inicio

2

2. ENTREGABLE DEL PROYECTO: los entregables del proyecto están enmarcados dentro de los proceso de planificación numeral 6.2 definición del alcance no se evidencia el documento que se debe establecer para describir como será gestionado el alcance, adicionalmente se dan pautas para implementar la información que hace parte del proceso, no se especifica las etapas o fases determinadas para cada entregable que se implementen haciendo correspondiente seguimiento dentro del periodo de tiempo de este informe.

- ESCENARIOS DEPORTIVOS: Para estos escenarios se tiene una descripción muy escueta del producto final no se especifica que son dos coliseos diferentes en edificaciones independientes teniendo cada uno el desarrollo de diferentes disciplinas.

- PISTA DE ATLETISMO: Se especifica a modo muy general la pista a entregar sin embargo no se especifica el tipo de escenario y bajo que condiciones se debe entregar, acorde a lo descrito en los alcances que se tienen en los estudios previos.

- PISTA DE ATLETISMO: La información consignada no abarca la totalidad de las zonas a entregar que hacen parte integral de la construcción de la pista, se solicita implementar

la información ya que solo se describe de manera superficial el producto final que debe entregarse.

3. GESTION DEL CRONOGRAMA: Si bien se entrega un gráfico de avance por proyecto no se conceptúa teniendo en cuanta las particularidades de cada uno, se solicita realizar un seguimiento más detallado acorde a las actividades realizadas para cada proyecto en este periodo inicial no es claro que tipo de ítems contractuales se realizaron no se tiene una evaluación o conclusión del cronograma, se solicita incluir el corte a la fecha por capítulos o actividades acorde al diagrama de Gannt que es la herramienta fundamental para realizar el seguimiento a la obra y no hace parte del informe entregado.

4. GESTION DE COSTOS: Se describe de manera muy general el estado del proyecto sin embargo no se evidencia un plan de inversión o un seguimiento a los costos generados hasta la fecha por el contrato de obra, para este se realizo un flujo de caja que define la inversión por actividades para cada mes, la interventoría solicitar realizar el seguimiento respecto a esta herramienta que no se relaciona en la documentación del informe

5. GESTION DE LOS RECURSOS: Para este numeral no se describe que recursos hacen parte de la ejecución es necesario describir que personal, equipos e infraestructura se tienen a disposición así mismo realizar un seguimiento según lo planeado en la fase del proyecto, la información entregada es muy deficiente. No es posible evaluar la realidad del proyecto en cuanto a recursos ya que no se entrega ninguna información no existe una descripción clara para realizar el seguimiento.

3

6. GESTION DE LAS COMUNICACIONES: para esta actividad se relacionan las comunicaciones realizadas en una tabla de Excel, sin embargo, no se identifica cual es el proceso que se está implementando con el fin de garantizar que la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la información del proyecto. Cabe anotar que para las comunicaciones realizadas se deben tener en cuenta no solo las que hacen parte de la interacción interventoría y entidad contratante, si no que también la resultante con los proveedores y los actores externos del contrato.

Adicionalmente se encuentra que hacen parte de las comunicaciones actas, informes, comités de obra correos electrónicos etc.

El plan de gerencia describe con claridad los procesos entrega un flujograma y una matriz de comunicaciones que deben implementarse en este informe.

7. GESTION DE LAS ADQUISIOCIONES: No se evidencia la implementación de un proceso claro para llevar a cabo el seguimiento, se solicita implementar un plan de compras concreto o definir cuál es el proceso que se establecerá acorde a lo enunciado en el plan de gerencia ajustado a la realidad de obra teniendo en cuenta la programación del proyecto en sus distintas fases, la interventoría evidencia que no es claro el proceso de adquisición ni el estado de las mismas nombradas dentro del informe

8. GESTION DEL CAMBIO: Se habla de líneas para medición del desempeño y de los cambios en las mismas, sin embargo, en ninguna parte del informe se especifica si se implementa algún

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

7202

Villavicencio, 22 de Agosto del 2023

OF-C249 -2023-122

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: DEVOLUCIÓN PRESUPUESTOS PMA

Cordial saludo,

Se realiza la devolución de los presupuestos del plan de manejo ambiental entregados por ustedes, debido a que no concuerdan los precios del estudio de mercado con los precios de los Análisis de Precios Unitarios.

1

Adicional a esto, se encuentra que en el presupuesto existen ítems cuyo tiempo en meses de ejecución indican que es de 12 meses, tales como lo son la Brigada ambiental, programas de prevención y mitigación ambiental, señalización ambiental, manejo de residuos sólidos, manejo de aguas residuales domésticas y capacitaciones de educación ambiental, las cuales deberán corresponder al plazo que realmente el contratista ha desarrollado estas actividades, las cuales deben ser soportados con su debida documentación.

Agradezco la atención prestada.

Recibido sin aprobación
22 agosto 2023
3:13 pm

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

7303

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 22 de agosto del 2023

CEDVO-074-2023

RECIBIDO 23 AGO 2023

Recibido sin aprobación
Tatiana Lara S
8:59 am

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE INFORMES SEGUIMIENTO AMBIENTAL MAYO

Cordial saludo

De manera atenta me permito realizar entrega de los informes de seguimiento ambiental al PMA de los proyectos pista de patinaje y escenarios deportivos correspondiente al mes de mayo, para su revisión.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

7304

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 22 de agosto del 2023

CEDVO-075-2023

RECIBIDO 23 AGO 2023
Recibido sin aprobación
Tatiana Soto S.
8:59 am

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE INFORMES SEGUIMIENTO AMBIENTAL JUNIO

Cordial saludo

De manera atenta me permito realizar entrega de los informes de seguimiento ambiental al PMA de los proyectos pista de patinaje y escenarios deportivos correspondiente al mes de junio, para su revisión.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

7305

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 24 de Agosto del 2023

OF-C249 -2023-129

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

Jhon Henry Ortiz
24/08/23

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: CORRECCIONES A INFORMES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE MAYO

1

Por medio de la presente, me permito devolver la documentación que fue entregada mediante oficio CEDVO-074-2023 con fecha de radicado del 22 de agosto del 2023, se solicita la corrección y nuevamente sean entregadas teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

PISTA DE PATINAJE:

1. Se solicita modificar la fecha del periodo de inicio ya que tienen en el informe como fecha del 15 al 31 de mayo del 2023, pero las actividades de obra iniciaron a partir del día 10 de mayo del 2023, teniendo en cuenta el acta de inicio.

ESCENARIOS DEPORTIVOS:

1. Cambiar la fecha del periodo de inicio ya que tienen del 15 al 31 de mayo del 2023, pero las actividades de obra iniciaron a partir del día 10 de mayo del 2023.
2. Se requiere corregir la información personal del asesor ambiental de la interventoría, corregir el nombre por la profesional Elvis Lulu Caro, Vargas, con su M.P. 25202234415 CND

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

7306

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 24 de Agosto del 2023

OF-C249 -2023-128

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

Recibí,
Jhon Henry Ortiz.
2:30
24/08/2023.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: CORRECCIONES A INFORMES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE JUNIO

1

Por medio de la presente, me permito devolver la documentación que fue entregada mediante oficio CEDVO-075-2023 con fecha de radicado del 22 de agosto del 2023, se solicita la corrección y nuevamente sean entregadas teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

PISTA DE PATINAJE:

1. En relación con la ficha de Manejo Adecuado de los Materiales de Construcción, solicitamos adjuntar los comprobantes de los materiales utilizados en la obra.
2. Se requiere corregir la información personal del asesor ambiental de la interventoría, corregir el nombre por la profesional Elvis Lulu Caro Vargas, con M.P.

ESCENARIOS DEPORTIVOS:

1. En la ficha de Manejo Adecuado de los Materiales de Construcción, solicitamos adjuntar los comprobantes de los materiales utilizados en la obra.
2. Realizar las correcciones necesarias en el seguimiento de la ficha de Manejo de Remoción de Cobertura Vegetal y Descapote, teniendo en cuenta que el acta de comité en la cual se aprobaron los cambios en los PMA se realizó en el mes de Julio del 2023.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

3. Los registros fotográficos presentados no son legibles; se requiere que aumenten su tamaño para una mejor visualización.

4. Agradecemos su colaboración y recordamos que, para poder recibir los documentos solicitados, es fundamental que estén debidamente firmados.

PISTA DE ATLETISMO:

1. Se solicita la presentación del informe de seguimiento del Plan de Manejo Ambiental de la pista de atletismo, teniendo en cuenta que este escenario fue entregado por la entidad en el mes de junio del 2023.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que pueda ser necesaria.

Atentamente:

2

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

7308

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 24 de Agosto del 2023

OF-C249 -2023-127

Recibí
Jhon Henry Ortiz
24/08/23

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

2546
11:00

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Reiteración implementación informes mensuales y de seguimiento

Acorde a la documentación entregada por el contratista concerniente a los informes mensuales de obra y los anexos informes de seguimiento, la interventoría ha venido solicitando al contratista la entrega de la documentación en los oficios relacionados a continuación:

OF-C249 -2023-111 radicado el día 01 de Agosto de 2023 mediante el cual se solicita la entrega del informe mensual de ejecución de obra del periodo de julio con sus respectivos anexos

- Informe de seguimiento al plan de gerencia
- Informe de seguimiento al plan de manejo ambiental
- Informe de SST
- Informe de PMT con radicado ante secretaria de movilidad

OF-C249 -2023-116 radicado el día 10 de agosto de 2023 mediante el cual se solicitan las correcciones de los informes mensuales de obra correspondientes al periodo de Mayo y Junio, se solicita al contratista la entrega del informe formato GES-FO-126 según las correcciones estipuladas en la documentación entregada, de igual manera se reitera la entrega de los informes de seguimiento que hacen parte de los anexos solicitados por la interventoría.

7309

CONSORCIO INTERESCENARIOS

OF-C249 -2023-121 radicado el día 14 de Agosto de 2023, mediante el cual se solicita la corrección e implementación de la documentación entregada lo concerniente al Plan de Gerencia.

De tal forma se reitera al contratista el oficio OF-C249 -2023-0106 solicitud presunto incumplimiento en cuanto consecución de las obligaciones contractuales adquiridas en las siguientes cláusulas:

9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA numeral 2. Atender oportunamente las solicitudes del interventor.

numeral 3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen

10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA numeral 1. Remitir al instituto la totalidad e la documentación técnica y financiera suscrita para el desarrollo y ejecución de las obras en informes mensuales, medio físico y magnético que incluya registro fotográfico a color

numeral 23. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto

2

Valga la pena recordar que esta Interventoría ha advertido al contratista acerca de la no entrega de los informes complementarios al informe mensual de obra y del informe de obra en sí mismo de manera oportuna.

Conforme con lo anterior, la Interventoría, en ejercicio de sus funciones de seguimiento técnico sobre la ejecución del contrato de obra, comunica a la entidad la situación de incumplimiento. Puesto que es una circunstancia reiterada como se deja evidencia en los oficios realizados al respecto

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

C.C. Archivo
DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

CONSORCIO INTERESCENARIOS

7310

Villavicencio, 31 de Agosto del 2023

OF-C249 -2023-132

Recibido sin copias
31-agosto-2023
9:52 am

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

Asunto: REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA DE INFORMACIÓN DOCUMENTOS FALTANTES

Cordial saludo,

1

Teniendo en cuenta oficios enviados anteriormente en donde se solicita al contratista la entrega de información y documentos requeridos en el pliego de condiciones, anexo técnico y obligaciones del contratista, nos permitimos realizar el presente documento enlistando lo faltante en este momento:

1. El contratista de obra, en el proceso licitatorio, mediante la suscripción del Formato 8 - Vinculación de personas con discapacidad, indicó que tenía dentro de su nómina 2 trabajadores en condición de discapacidad, y teniendo en cuenta el Articulo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto 392 de 2018 que indica lo siguiente: *Seguimiento durante la ejecución del contrato. Las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre.*

Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.

PARÁGRAFO. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

De acuerdo a lo anterior, se solicita al contratista de obra, la presentación del certificado emitido por el ministerio de trabajo de la vinculación de trabajadores en situación de discapacidad actualizado de la empresa CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS, adjuntando documentos del personal en condición de discapacidad y planillas de seguridad social en donde se pueda constatar la vinculación de las dos personas que fueron ofertadas dentro de la propuesta a partir de la suscripción del contrato de obra.

2. Mediante oficios No. OF-C249 -2023-117 del 10 de Agosto del 2023 y OF-C249 -2023-126 del 23 de Agosto del 2023, les solicitamos al contratista la siguiente información que a la fecha no ha sido entregada a la interventoría:

   - El programa de gerencia de proyectos esta sin firmas de los responsables.
   - Las hojas de vida del personal ofertado deben venir con firma en original.
   - Se deben entregar exámenes de ingreso de todo el personal ofertado.
   - Se adjuntan fichas técnicas de equipos menores, pero no se observa fichas técnicas de la maquinaria pesada a utilizar para actividades iniciales como (demolición, desmonte entro otros).
   - Se anexa acta de aprobación del AIU, el cual presenta las siguientes observaciones:

     a. Se deben colocar el objeto de los tres (03) proyectos
     b. Se presentan observaciones en el documento, valores no cuadran, porcentajes tampoco. Revisar y ajustar.
     c. La fecha del documento es del 2022.
     d. En el cálculo total del AIU no se deben incluir las actividades de certificaciones, PMT, PMA y otros.

   - Se solicita que la programación de obra venga firmada por los responsables del proyecto (directores de obra e interventoría).
   - Se solicita entrega de los planos aprobados y firmados por todas las partes, de acuerdo a lo presentado en la Secretaría de Movilidad del Municipio.

3. Mediante oficio OF-C249 -2023-085 de fecha 6 de Julio del 2023, la interventoría solicito al contratista de obra la presentación de informes de implementación del Programa de Gerencia de Proyectos que debieron presentarse a partir del primer mes de ejecución del contrato y a la fecha no habían sido presentados, mediante el oficio No. CEDVO-068-2023 radicado el 10 de Agosto del 2023, el contratista radicó a la interventoría informes de seguimiento al plan de gerencia de proyectos y mediante oficio OF-C249 -2023-121 de fecha de radicado 15 de Agosto del 2023, se realizó la devolución de la información entregada, ya que los informes entregados carecían de información de acuerdo al Programa de Gerencia de Proyectos entregado, a este momento el contratista no ha radicado las correcciones según lo enlistado por la Interventoría en oficio de devolución.

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: interescenariosc@gmail.com

Adicional se envió oficio OF-C249-2023-106, en donde se le anunció al contratista la solicitud de debido proceso por presunto incumplimiento, en donde se requirió al contratista la presentación de informes de seguimiento mensuales pendientes a la fecha, los cuales no han sido presentados en su totalidad.

4. Mediante oficio No. OF-C459-2022-026 del 12 de Mayo del 2023, la interventoría solicita al contratista la presentación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo requerido en el anexo técnico del proceso licitatorio del contrato de obra, y mediante oficio No. OF-C249-2022-033 la interventoría realiza la reiteración de la solicitud del Plan de seguridad y salud en el trabajo, a la fecha este documento no ha sido entregado, razón por la cual se solicita al contratista la presentación de dicha información.

5. Mediante oficio No. OF-C249 -2023-127 de fecha 24 de agosto del 2023, se requirió al contratista lo siguiente teniendo en cuenta las relaciones de los oficios mencionados:

OF-C249 -2023-111 radicado el día 01 de Agosto de 2023 mediante el cual se solicita la entrega del informe mensual de ejecución de obra del periodo de julio con sus respectivos anexos

- Informe de seguimiento al plan de gerencia
- Informe de seguimiento al plan de manejo ambiental
- Informe de SST
- Informe de PMT con radicado ante secretaria de movilidad

3

OF-C249 -2023-116 radicado el día 10 de agosto de 2023 mediante el cual se solicitan las correcciones de los informes mensuales de obra correspondientes al periodo de Mayo y Junio, se solicita al contratista la entrega del informe formato GES-FO-126 según las correcciones estipuladas en la documentación entregada, de igual manera se reitera la entrega de los informes de seguimiento que hacen parte de los anexos solicitados por la interventoría.

OF-C249 -2023-121 radicado el día 14 de Agosto de 2023, mediante el cual se solicita la corrección e implementación de la documentación entregada lo concerniente al Plan de Gerencia.

De tal forma se reitera al contratista el oficio OF-C249 -2023-0106 solicitud presunto incumplimiento en cuanto consecución de las obligaciones contractuales adquiridas en las siguientes cláusulas:

9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA numeral 2. Atender oportunamente las solicitudes del interventor.

Numeral 3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen

10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA numeral 1. Remitir al instituto la totalidad en la documentación técnica y financiera suscrita para el desarrollo y ejecución de las obras en informes mensuales, medio físico y magnético que incluya registro fotográfico a color

Numeral 23. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto

Valga la pena recordar que esta Interventoría ha advertido al contratista acerca de la no entrega de los informes complementarios al informe mensual de obra y del informe de obra en sí mismo de manera oportuna, ya que a la fecha el contratista no ha hecho entrega de informes corregidos de los meses 1 y 2, ni del informe mensual de obra correspondiente al mes 3.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

4

Se anexan los oficios mencionados.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

7314

Villavicencio, 6 de Septiembre del 2023

OF-C249 -2023-135

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

Recibi,
Jhon Henry Ortiz
1121840118
2:43 pm
Miercoles · 6 de Septiembr

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

Asunto: DEVOLUCIÓN PRESUPUESTOS AMBIENTAL

1

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito hacer devolución de los presupuestos ambientales de los tres proyectos, teniendo en cuenta las siguientes observaciones y las que se encuentran escritas dentro de los documentos presentados por ustedes:

- De acuerdo a conversaciones tenidas en cuenta con el Director de Obra, el material proveniente de excavación que no se usa en la obra será dispuesto en el botadero de ZODME, por lo que se debe tener en cuenta dicha cantidad para ser incluida en la elaboración del presupuesto.
- En cada uno de los presupuestos, estudios de mercado y apus, debe ser ingresado la firma del Representante legal del Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
- El nombre del ítem que se encuentre en el presupuesto debe ser el mismo que se discrimine en el APU.
- Revisar las unidades de los ítems tanto en el presupuesto, como en los APUS y Estudio de Mercado.
- Tener en cuenta el valor de las cotizaciones al ingresarlas en el estudio de mercado, ya que algunos de estos valores no incluyen IVA y dicho impuesto que debe ser tenido en cuenta.
- Con respecto a la fila dentro del presupuesto TASAS Y/O IMPUESTOS (K), se solicita se discrimine en un documento anexo, a que equivalen estos valores y/o porcentajes.
- Tener en cuenta que en el presupuesto inicial de cada proyecto, ya incluía algunos de los materiales que se presentan en esta modificación, por lo que el valor no podrá ser modificado.

- Se solicita que para la presentación de las correcciones sean presentadas nuevamente las observaciones que se anexan con el presente documento, por lo que se solicita tener en cuenta la información que se encuentran escritas en las hojas de las que se hace devolución.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: interescenariosc@gmail.com

7316

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Se solicita se anexen junto con el documento los siguientes informes de seguimiento:

- Plan de manejo ambiental con soportes de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.
- Plan de manejo de transito mes de Agosto con el radicado ante Secretaria de Movilidad
- Plan de Gerencia de proyectos meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto
- Programa de seguridad y salud en el trabajo del meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.
- Informe de Manejo de Inversión del Anticipo del mes de Agosto

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

7317

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 12 de septiembre del 2023

OF-C249 -2023-144

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

Recibido sin aceptación
12 Septiembre 2023
3:05 Pm

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Solicitud de Procedimientos de Medición del **SONÓMETRO y ANEMÓMETRO**

Estimados,

Me dirijo a ustedes con respeto para presentar la siguiente solicitud:

- De acuerdo con el presupuesto ambiental de nuestro proyecto, se ha destacado la importancia de realizar mediciones con el **SONÓMETRO** para llevar un control preciso de los niveles de contaminación auditiva. Es esencial enfatizar que estas mediciones deben realizarse cumpliendo rigurosos estándares técnicos y bajo la supervisión de la interventoría, además se debe contar con el soporte de su realización, de lo contrario estas no podrán ser pagadas.
- Adicionalmente, solicitamos al contratista que nos proporcione los mismos procedimientos detallados para las actividades relacionadas con el **ANEMÓMETRO**, ya que esta actividad también está incluida en el presupuesto ambiental de los proyectos **(escenarios deportivos, pista de atletismo y pista de patinaje).**

Por lo tanto, requerimos que el contratista nos entregue procedimientos detallados de acuerdo con lo establecido en el presupuesto. Asimismo, solicitamos un informe escrito que documente la ejecución de estas actividades, respaldado por evidencias fotográficas que demuestren el desarrollo del proceso.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

7318

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 12 de septiembre del 2023

OF-C249 -2023-145

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

Recibido sin aceptación
12 Septiembre 2023
3:05 Pm

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Reiteración de presentación de Corrección de Informes de seguimiento Ambiental e informes pendientes

Cordial saludo,

- Me permito dirigirme a ustedes con el fin de solicitar nuevamente la corrección de los informes de seguimiento ambientales que fueron devueltos, tal como se indicó en los oficios **OF-C249-2023-128** y **OF-C249-2023-129**, radicados el día 24 de agosto del presente año. Hasta la fecha (12 de septiembre de 2023), no hemos recibido ninguna respuesta o entrega de los informes con sus respectivas correcciones correspondientes a los meses de **MAYO** y **JUNIO**. Es de suma importancia para nosotros contar con estos informes actualizados y corregidos en la mayor brevedad posible.

- Así mismo, solicitamos al contratista la entrega de los informes de seguimiento ambiental correspondientes a los meses de **JULIO** y **AGOSTO**, dado que también se encuentran pendientes de entrega, a pesar de encontrarnos ya en el mes de septiembre el contratista no ha remitido la información.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

7319

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 14 de septiembre del 2023

OF-C249 -2023-150

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

Recibido sin aceptación
14 septiembre 2023
9:50 am

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Solicitudes de interventoría.

Estimados,

Por medio de la presente se reitera las solicitudes realizadas en el oficio **OF-C249-2023-130**, radicado el 28 de agosto del 2023, es de suma importancia que el contratista presente los informes solicitados.

Se solicita entrega de la documentación en lo referente al manejo de las raíces de las especies arbóreas que fueron taladas en el proyecto teniendo en cuenta el clausulado del contrato:

- En la **cláusula 9** Obligaciones generales del contratista Numeral No. 2. Atender oportunamente los requerimientos del interventor y numeral No. 3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

- En la **cláusula 10** Obligaciones específicas del contratista Numeral No. 23. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

7320

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 19 de Septiembre del 2023

OF-C249 -2023-153

Recibido sin aProbación
19-09-2023
3:58 pm

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
ATT. JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CEDVO-091-2023 ASUNTO: OBSERVACIONES DE REPLANTEO DE PISTA DE RUTA DE PATINAJE

Respetados señores:

En respuesta al oficio de asunto con acuso de recibo 15/09/2023, donde manifiestan varios inconvenientes encontrados al realizar los trabajos preliminares para la implantación de la pista de patinaje en el sector de ruta, nos permitimos informar que, por instrucción de la entidad contratante en el mes de agosto 2023, los diseños realizados por la consultoría deberán ser ajustados por el contratista con VoBo de interventoría. Así las cosas para este tipo de ajuste se solicita al contratista, basarse en lo establecido por Federación Colombiana de Patinaje (FEDEPATIN) en la NORMATIVA ESCENARIOS DE PATINAJE 2023 (versión 8 de marzo 2023) la cual indica en numeral 2. PISTA DE RUTA (THE ROAD) DE 400 MT:

...."Circuito cerrado se acogen las disposiciones dictadas en la General Regulations Edition 2018 – 2023, donde se enuncia que este tipo de pistas no podrán tener una longitud menor a 250 pero se recomienda tener una longitud de 400 metros o mayor, hasta 600 metros y que su ancho de pista no podrá ser inferior a 6 metros, pero se recomienda que este ancho sea de ocho (8) metros, además se evaluaran por parte de FEDEPATIN. Parámetros de cumplimiento de geometría en curvas, pasamanos de protección, acabado y recubrimiento, solo se HOMOLOGARAN aquellas pistas que cumplan con los parámetros de geometría establecidos por WORLD SKATE, WORLD SKATE AMERICA Y FEDEPATIN y cumplan con lo establecido en las fichas de HOMOLOGACIÓN. (ART 110.1 Y 111 COMISIÓN TÉCNICA DE PATINAJE DE VELOCIDAD -REGLAMENTO 2023) ..." (el subrayado es nuestro)

..."Su medición se realizará según la normativa establecida por el WORLD SKATE Y WORLD SKATE AMERICA Y FEDEPATIN en la mitad del circuito cuando sólo una parte del ancho de la ruta pueda ser usado, el radio de curva mínimo no podrá ser inferior a los 18.00m. En rectas se conserva una pendiente

del 1% en curvas el 1.5% hacia el interior de curva…" (el subrayado es nuestro)

Se recomienda que en uno de sus costados pueda tener una recta de unos 110 metros como mínimo y que cumpla con los parámetros de peraltes mínimos, específico para la Carrera de 100 m sprint.

…" En lo posible Los rectilíneos deben representar el 60 % del total del circuito, los desniveles nunca podrán exceder del 5%. Las excepciones a esta regla nunca deberán superar el 25% de toda la carrera…"(el subrayado es nuestro).

La superficie de la ruta debe ser uniforme y suficientemente lisa, sin fallas ni fisuras. La curvatura transversal del recorrido no debe superar el 5% de su amplitud desde el punto interior del circuito hasta el exterior…"

Se recomienda instalación de recubrimiento según especificaciones de FEDEPATIN.

- GEOMETRIA DE LA PISTA RUTA

TIPO DE PISTA	ANCHO	Numero de curvas	RADIO (Interior) DE CURVA mínima	Longitud de medida entre
VERSION 2023	No menor a 6 metros, se recomienda 8 metros	variable	Superior a 18.00m.	No debe ser menor a 250 metros, se recomienda entre 400 a 600 metros

2

Así las cosas, la presente interventoría considera relevante la realización de los ajustes a lugar correspondientes a la realidad encontrada en sitio teniendo como base los parámetros mínimos antes enumerados y presentar la nueva geometría de la pista de ruta para ser evaluada y viabilizada por las partes.

Cabe reiterar lo manifestado en documentos anteriores por la presente interventoría en cuanto a que el escenario en cumplimiento en lo establecido en el MGA del proyecto debe cumplir los estándares para alto rendimiento y escuela, aclarando que el contrato de la referencia NO contiene dentro del presupuesto ningún tipo de certificación, que de ser requerido por la entidad contratante deberá ser incluido en un contrato adicional para lo cual sería beneficioso contar con el servicio de revisión de planimetría certificada para este tipo de escenarios que brinda FEDEPATIN.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

7322

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 27 de Septiembre del 2023

OF-C249 -2023-156

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

Recibido sin observación
2:10 pm
27 septiembre

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

Asunto: SOLICITUD PRESUPUESTOS AMBIENTAL

1

Cordial saludo,

Por medio del presente documento me permito solicitar la presentación de las correcciones entregadas por la interventoría al contratista de obra con relación a los presupuestos ambientales, los cuales fueron devueltos mediante oficio No. OF-C249-2023-135 radicado el día 6 de septiembre del 2023 y a la fecha no se ha recibido ninguna información, seguidamente mediante oficio No. OF-C249-2023-146 radicado el día 14 de Septiembre del 2023, se requirió nuevamente la presentación de los presupuestos ambientales de cada uno de los proyectos, en dicho oficio se dio como plazo máximo para presentar esta información el día 19 de septiembre del 2023, pero a hoy el contratista de obra no ha hecho entrega de esta documentación.

Se reitera nuevamente lo indicado en el oficio No. OF-C249 -2023-080 radicado el día 30 de Junio del 2023: Aclaramos que no se podrán incluir gastos de este rubro con fecha anterior a la aprobación del presupuesto por parte de la interventoría y de la Entidad Contratante.

De igual manera se requirió al contratista mediante oficio No. OF-C249-2023-144 radicado el

día 12 de Septiembre del 2023, acerca de procedimientos de medición del Sonómetro y Anemómetro, que dichos procedimientos se deberían realizar bajo la supervisión de la interventoría pero a la fecha el contratista de obra no ha informado en que momento realice dichas actividades. Se solicita al contratista la presentación de un cronograma en donde se indique fecha y hora en que se realizaran estos procedimientos.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: interescenariosc@gmail.com

7324

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 6 de Septiembre del 2023

OF-C249 -2023-135

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

Recibi:
Jhon Henry Ortiz
1121840110
2:43 pm
Miercoles 6 de Septiembre

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

Asunto: DEVOLUCIÓN PRESUPUESTOS AMBIENTAL

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito hacer devolución de los presupuestos ambientales de los tres proyectos, teniendo en cuenta las siguientes observaciones y las que se encuentran escritas dentro de los documentos presentados por ustedes:

- De acuerdo a conversaciones tenidas en cuenta con el Director de Obra, el material proveniente de excavación que no se usa en la obra será dispuesto en el botadero de ZODME, por lo que se debe tener en cuenta dicha cantidad para ser incluida en la elaboración del presupuesto.
- En cada uno de los presupuestos, estudios de mercado y apus, debe ser ingresado la firma del Representante legal del Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
- El nombre del ítem que se encuentre en el presupuesto debe ser el mismo que se discrimine en el APU.
- Revisar las unidades de los ítems tanto en el presupuesto, como en los APUS y Estudio de Mercado.
- Tener en cuenta el valor de las cotizaciones al ingresarlas en el estudio de mercado, ya que algunos de estos valores no incluyen IVA y dicho impuesto que debe ser tenido en cuenta.
- Con respecto a la fila dentro del presupuesto TASAS Y/O IMPUESTOS (K), se solicita se discrimine en un documento anexo, a que equivalen estos valores y/o porcentajes.
- Tener en cuenta que en el presupuesto inicial de cada proyecto, ya incluía algunos de los materiales que se presentan en esta modificación, por lo que el valor no podrá ser modificado.

- Se solicita que para la presentación de las correcciones sean presentadas nuevamente las observaciones que se anexan con el presente documento, por lo que se solicita tener en cuenta la información que se encuentran escritas en las hojas de las que se hace devolución.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

7326

CONSORCIO INTERESCENARIOS

14 SEP 2023 3:15 2900

Villavicencio, 12 de Septiembre del 2023

OF-C249 -2023-146

Recibido sin aceptacion
9:50 am
14 septiembre 2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: *ANUNCIO DE SOLICITUD DE DEBIDO PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.*

Cordial saludo.

1

Atendiendo a las condiciones contractuales y presentadas en la obra de la referencia, y teniendo en cuenta lo indicado por la entidad mediante correo electrónico enviado el día 11 de Septiebre del 2023 donde indica lo siguiente: *"Solicitud de entrega inmediata de los informes mensuales de obra de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023, según las obligaciones contractuales. Es importante indicar que se debe tener un seguimiento estricto y detallado por la interventoría en el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratista de obra. En el caso de no cumplimiento se solicita al interventor a tomar las medidas pertinentes".* Por lo que esta interventoría considera que existe mérito para emitir alerta sobre el posible incumplimiento al contrato de obra, por parte del contratista.

En el presente escrito se hará referencia a:

1. Identificación del contrato de obra.
2. Las obligaciones no cumplidas, como hecho motivador de alertas por presunto incumplimiento.
3. Las pruebas del hecho.
4. Concepto de la interventoría acerca de cómo debe ser cumplida la obligación presuntamente incumplida
5. Consecuencias de la persistencia de los hechos

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

En el cuadro que se presenta a continuación se incluyen los datos generales del Contrato de Obra Pública:

Contrato de obra	106 de 2023
Contratante	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
Contratista	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023 Nit. 901.682.871-2

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

	R.L. JHON HENRY ORTIZ GARCIA C.C. No. 1.121.840.118
Fecha del contrato	16 DE FEBRERO DEL 2023
Objeto	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.
Fecha de inicio	10 DE MAYO DEL 2023
Plazo inicial	DOCE MESES

2. OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS, COMO HECHO MOTIVADOR DE ALERTAS POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.

La alerta de posible incumplimiento se motiva en los siguientes hechos.

2.1. En el Formulario No. 1 - Oferta económica, capitulo CERTIFICACIONES PMT Y/O PMA, OTROS, Subcapítulo CERTIFICACIONES – PMT Y/O PMA, OTROS ESCENARIOS DEPORTIVOS en el ítem No. 20 Plan de Manejo Ambiental, Subcapítulo CERTIFICACIONES – PMT Y/O PMA, OTROS PISTA DE PATINAJE en el ítem No. 9.3 PMA y Subcapítulo CERTIFICACIONES – PMT Y/O PMA, OTROS, PISTA DE ATLETISMO, se evidencia que se debe realizar una implementación mensual por lo cual se ha solicita la presentación del informe de implementación durante el mes, sin que a la fecha se haya tenido respuesta de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.

2.2. En la cláusula 9 Obligaciones generales del contratista Numeral No. 2. Atender oportunamente los requerimientos del interventor y numeral No. 3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen; la interventoría mediante oficios OF-C249-2023-111, OF-C249-2023-116, OF-C249-2023-127, OF-C249-2023-132, OF-C249-2023-136, OF-C249-2023-121, OF-C249-2023-122, OF-C249-2023-135, ha requerido al contratista de obra la entrega de se reitera la presentación de las correcciones de los informes mensuales correspondientes a los meses de Mayo y Junio con sus respectivos informes de seguimiento al plan de manejo ambiental, al plan de gerencia de proyectos, al plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se reitera la presentación del informe mensual de obra e informes de seguimiento correspondiente al mes de Julio y se solicita la presentación del informe mensual de obra e informes de seguimiento correspondiente al mes de Agosto, los cuales a la fecha no han sido entregados.

2.3. En la cláusula 10 Obligaciones específicas del contratista Numeral No. 23. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto; a la fecha el contratista no ha presentado los informes requeridos.

3. PRUEBAS DEL HECHO.

1. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-111 de fecha 1 de Agosto del 2023, solicita entrega informe mensual de ejecución de obra del periodo de Julio, donde se requiere la presentación de informes de seguimiento.

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

2. Mediante oficio OF-C249-2023-116 de fecha 10 de Agosto del 2023, la interventoría realiza devolución de informes mensuales correspondientes a Mayo y Junio del 2023.

3. El contratista de obra mediante oficio CEDVO-068-2023 de fecha 10 de agosto del 2023, entrega de informe de seguimiento al plan de gerencia correspondiente a los meses de Mayo y Junio.

4. El contratista de obra mediante oficio CEDVO-072-2023 de fecha 15 de agosto del 2023, realiza entrega de presupuestos ambientales de los proyectos del contrato de obra.

5. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-121 de fecha 15 de Agosto del 2023, se realiza la devolución de informes de seguimiento al plan de gerencia de proyectos para correcciones.

6. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-122 de fecha 22 de Agosto del 2023, realiza devolución de presupuestos del plan de manejo ambiental.

7. El contratista de obra mediante oficio CEDVO-074-2023 de fecha 23 de agosto del 2023, realiza entrega de informe de seguimiento ambiental del mes de Mayo.

8. El contratista de obra mediante oficio CEDVO-075-2023 de fecha 23 de agosto del 2023, realiza entrega de informe de seguimiento ambiental del mes de Junio.

9. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-128 y OF-C249-2023-129 fechado del 24 de Agosto del 2023, se realiza devolución de informes de seguimiento al plan de manejo ambiental de los meses de Mayo y Junio.

10. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-127 fechado del 24 de Agosto del 2023, se reitera la presentación de informes mensuales de obra e informes de seguimiento a plan de gerencia de proyectos, plan de manejo ambiental, SST y plan de manejo de tránsito.

11. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-132 de fecha 31 de Agosto del 2023, se reitera la presentación de los informes de seguimiento al plan de gerencia de proyectos, se reitera la presentación de del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, se reitera la presentación de informes corregidos del mes de Mayo y Junio, se reitera la presentación del informe mensual del mes de Julio con los respectivos informes de seguimiento a plan de gerencia de proyectos, plan de manejo ambiental, SST y plan de manejo de tránsito.

12. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-135 de fecha 6 de Septiembre del 2023, se realiza devolución de presupuestos del plan de manejo ambiental.

13. La interventoría mediante oficio OF-C249-2023-136 de fecha 6 de Septiembre del 2023, se reitera la presentación de las correcciones de los informes mensuales correspondientes a los meses de Mayo y Junio con sus respectivos informes de seguimiento, se reitera la presentación del informe mensual de obra e informes de seguimiento correspondiente al mes de Julio y se solicita la presentación del informe mensual de obra e informes de seguimiento correspondiente al mes de Agosto.

4. *CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE COMO DEBE SER CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN PRESUNTAMENTE INCUMPLIDA*

Para subsanar todas las obligaciones no cumplidas a la fecha el contratista debe:

4.1. Presentar las correcciones al informe de seguimiento a la implementación del plan de manejo ambiental del mes Mayo y del mes Junio, correcciones de los presupuestos ambientales de los proyectos del contrato, informe de seguimiento a la implementación del plan de manejo ambiental del mes Julio y del mes Agosto.

4.2. Presentar las correcciones al informe de obra del mes Mayo y del mes Junio, y presentar informes de obra de los meses de Julio y Agosto.

4.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo técnico, con los respectivos informes de seguimiento de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.

4.4. Presentar el informe de seguimiento del plan de manejo de transito con el radicado en la secretaria de movilidad del mes de Agosto.

4.5. Presentar las correcciones al informe de seguimiento al Plan de Gerencia de Proyectos del mes Mayo y del mes Junio, y presentar informes de seguimiento de los meses de Julio y Agosto.

4

4.6. Presentar informe de manejo de anticipo del mes de Agosto.

5. *CONSECUENCIAS DE LA PERSISTENCIA DE LOS HECHOS*

De persistir los hechos más allá de las fechas previstas para subsanar los hechos motivadores de las alertas del presente oficio más allá de las fechas descritas a continuación, La Interventoría dará informe detallado a la Entidad Contratante solicitando el inicio del debido proceso por incumplimiento.

1. Correcciones al Informe de implementación al plan de gerencia de proyectos de los meses mayo y Junio y presentación de los informes de seguimiento de los meses de Julio y Agosto. Deben estar totalmente subsanados a ***19 de Septiembre del presente año***.

2. Correcciones al Informe de seguimiento al plan de Manejo ambiental de los meses mayo y Junio y presentación de los informes de seguimiento de los meses de Julio y Agosto. Deben estar totalmente subsanados a ***19 de Septiembre del presente año***.

3. Correcciones de los presupuestos del plan de manejo ambiental. Deben estar totalmente subsanados a ***19 de Septiembre del presente año***.

4. Correcciones de los informes mensuales de obra de los meses de Mayo y Junio y presentación de los informes mensuales de obra de los meses de Julio y Agosto. Deben estar totalmente subsanados a ***19 de Septiembre del presente año***.

5. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo técnico, con los respectivos informes de seguimiento de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto
   Deben estar totalmente subsanados a ***19 de Septiembre del presente año***.

6. Presentación del informe de manejo de anticipo del mes de Agosto.
   Deben estar totalmente subsanados a ***19 de Septiembre del presente año***.

Téngase en cuenta de manera especial que dentro de las consecuencias derivadas del posible incumplimiento se encuentra que:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, los particulares que celebran contratos con entidades estatales, colaboran con el logro de los fines del Estado y cumplen una función social, que como tal implica obligaciones. En efecto, la norma reza:

> *Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*
>
> *Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.* (Subraya fuera del texto original).

De acuerdo con lo anterior, El Contratista de obra, al momento de suscribir el contrato, asumió el deber de colaboración para el logro de los fines de la entidad, teniendo que dar especial interés en la dedicación para la ejecución de las obras, los recursos destinados y el cumplimiento de los plazos contractuales, pues además su gestión se considera una función social.

En ese mismo orden de ideas, el estatuto de la contratación pública, dotó a las entidades para que puedan exigir el cumplimiento de las obligaciones a las cuales se comprometió el contratista. Así, el artículo 4º de la referida ley 80 de 1993 señala:

> *ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:*
>
> *1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.*
> *2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.*
> *3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato (...).*

Por su parte, la Ley 1474 de 2011, respecto de la colaboración que requieren las entidades estatales, para el logro de sus fines y prevenir hechos que atenten contra la moralidad administrativa y el interés público, delimitó las funciones de la interventoría en su artículo 83.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Conforme con lo anterior, la Interventoría, en ejercicio de sus funciones de seguimiento técnico sobre la ejecución del contrato por parte del Contratista de obra, informará a la entidad si el contratista se encuentra en situación de incumplimiento de sus obligaciones se informará por tanto, si la firma contratista de obra no ha cumplido con el objeto contractual conforme con el cronograma de obra y no se ha dado al cumplimiento de generar un plan de contingencia para superar el atraso de las obras.

Valga la pena recordar que esta Interventoría ha advertido al contratista acerca de la no entrega de los informes complementarios al informe mensual de obra de manera oportuna.

Se resalta que, encontrándose el contratista en situación de presunto incumplimiento del contrato de obra, se habilita a la Entidad para iniciar y dar curso al trámite de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Todo lo anterior se menciona con la finalidad de conminar a El Contratista a implementar las condiciones que permitan la subsanación de los hechos mencionados y la obtención del objeto contractual en las condiciones contenidas en el contrato de obra.

Atentamente,

ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

6

C.C. Archivo
DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se anexa copia de oficios mencionados y oficio enviado por la entidad solicitando informes mensuales de obra del contratista de obra.

7332

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 30 de Junio del 2023

OF-C249 -2023-080

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

1716
2:50

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACTUALIZADO

1

Cordial saludo,

De manera respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de reiterar la solicitud del Plan de Manejo Ambiental actualizado de cada escenario con su debido presupuesto, cabe resaltar que dicha solicitud ya se realizó con anterioridad en los oficios No. OF-C459-2022-026 de fecha 12 de Mayo del 2023 y el No. OF-C249-2022-033 de fecha 24 de Mayo del 2023, los cuales se encuentran anexos en el presente documento, y a la fecha no se ha recibido ninguna información respecto al requerimiento realizado.

Aclaramos que no se podrán incluir gastos de este rubro con fecha anterior a la aprobación del presupuesto por parte de la interventoría y de la Entidad Contratante.

Agradezco la atención prestada.

Recibí
Jhon Henry Ortiz
30/06/23.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

C.C. INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

7333

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 12 de septiembre del 2023 **OF-C249 -2023-144**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

Recibido sin aceptación
12 septiembre 2023
3:03 pm

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Solicitud de Procedimientos de Medición del **SONÓMETRO** y **ANEMÓMETRO**

Estimados,

Me dirijo a ustedes con respeto para presentar la siguiente solicitud:

- De acuerdo con el presupuesto ambiental de nuestro proyecto, se ha destacado la importancia de realizar mediciones con el **SONÓMETRO** para llevar un control preciso de los niveles de contaminación auditiva. Es esencial enfatizar que estas mediciones deben realizarse cumpliendo rigurosos estándares técnicos y bajo la supervisión de la interventoría, además se debe contar con el soporte de su realización, de lo contrario estas no podrán ser pagadas.
- Adicionalmente, solicitamos al contratista que nos proporcione los mismos procedimientos detallados para las actividades relacionadas con el **ANEMÓMETRO**, ya que esta actividad también está incluida en el presupuesto ambiental de los proyectos **(escenarios deportivos, pista de atletismo y pista de patinaje).**

Por lo tanto, requerimos que el contratista nos entregue procedimientos detallados de acuerdo con lo establecido en el presupuesto. Asimismo, solicitamos un informe escrito que documente la ejecución de estas actividades, respaldado por evidencias fotográficas que demuestren el desarrollo del proceso.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

7334

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 29 de Septiembre del 2023

OF-C249 -2023-158

Recibido sin aprobación
29-Septiembre-2023
Hora: 4:32 pm

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación y pago de Orden de Giro No. 6 anticipo. Fiduciaria Alianza – Fideicomiso No. 113392.

1

Cordial saludo,

Una vez revisados y evaluados los soportes que se adjuntan en el Giro No. 6 Anticipo radicado el día 27 de Septiembre del 2023, se autoriza el REEMBOLSO de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 132.265.723,00), los cuales se encuentran discriminados en el siguiente ítem:

- MATERIALES Y SUBCONTRATOS: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 132.265.723,00), reembolso a ORGANIZACIÓN TERRACANTO S.A.S.

Destinados única y exclusivamente a la ejecución del contrato de obra No. 106 de 2023.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

7335

	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	
	AUTORIZACIÓN PAGO ORDEN DE GIRO	FID. 113392

CONTRATO N°	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

OBJETO CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL DEL	$ 50.871.940.842
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
NIT:	901.682.871-2
CORREO ELECTRÓNICO:	escenariosdeportivos2023@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS.
CORREO ELECTRÓNICO:	interescenariosc@gmail.com

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	ANTICIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR ORDEN DE GIRO 6	VALOR ACTUAL
1	2022005500094	$ 2.912.858.864	$ 2.317.444.283	$ 2.769.855,00	$ 2.314.654.428
2	2022005500022	$ 2.509.631.492	$ 540.917.112	$ 6.361.693,58	$ 534.555.419
3	2022005500024	$ 9.076.012.784	$ 2.584.071.945	$ 123.114.174,42	$ 2.460.957.770
TOTAL		$ 14.498.503.139,60	$ 5.442.433.340,30	$ 132.265.723,00	$ 5.310.167.617,30

PLAN DE INVERSIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR SOLICITADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 579.940.126	$ 579.940.126	$ -	$ 579.940.126
2	Materiales y subcontratos de	$ 12.323.727.669	$ 4.175.259.147	$ 132.265.723,00	$ 4.042.993.424
3	Transporte	$ 1.449.850.314	$ 542.249.036	$ -	$ 542.249.036
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.030,60	$ 144.985.031	$ -	$ 144.985.031
TOTAL		$ 14.498.503.139,60	$ 5.442.433.340,30	$ 132.265.723,00	$ 5.310.167.617,30

VALOR A PAGAR: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE

Los valores de la presente acta de autorización pago de orden de giro son aprobados el día 29 de septiembre de 2023.

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

7336

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 14 de septiembre del 2023

OF-C249 -2023-150

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

Recibido sin aceptación
14 septiembre 2023
9:50 am

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Solicitudes de interventoría.

Estimados,

Por medio de la presente se reitera las solicitudes realizadas en el oficio **OF-C249-2023-130**, radicado el 28 de agosto del 2023, es de suma importancia que el contratista presente los informes solicitados.

Se solicita entrega de la documentación en lo referente al manejo de las raíces de las especies arbóreas que fueron taladas en el proyecto teniendo en cuenta el clausulado del contrato:

- En la **cláusula 9** Obligaciones generales del contratista Numeral No. 2. Atender oportunamente los requerimientos del interventor y numeral No. 3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

- En la **cláusula 10** Obligaciones específicas del contratista Numeral No. 23. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

7337

Gmail consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

AUTORIZACIÓN RETIRO DE MATERIAL.

2 mensajes

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 5 de septiembre de 2023, 10:15
Para: CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>, consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

PL-120-439
Villavicencio, 05 de septiembre de 2023

Al contestar, citar en el asunto:
Respuesta al oficio PL-120-439

Señores:
CORSORCIO INTERESCENARIOS
R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Contrato De Interventoría N° 249 DE 2023
interescenariosc@gmail.com
Ciudad

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
R/L JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Escenariosdeportivos2023@gmail.com
Carrera 16 # 24-03 Villa Olímpica
Ciudad

Ref. Contrato de obra pública **N° 106 de 2023** "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: AUTORIZACIÓN RETIRO DE MATERIAL.

Cordial saludo

Por medio del presente me permito comunicarles que la supervisión, autoriza el retiro del material de escombro que se encuentra frente a la cancha sintética auxiliar del escenario Villa olímpica de Villavicencio.

A continuación se adjuntan las imágenes del material el cual expresamente se autoriza el retiro.

Cordialmente

BIBIANA PAN MERCHÁN
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos

Elaboró: Adriana Lesmes
Cargo: Profesional – CPS

–

7338

Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta
Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

3 adjuntos



PHOTO-2023-09-04-08-37-55.jpg
352K



PHOTO-2023-09-04-08-37-55 3.jpg
408K



PHOTO-2023-09-04-08-37-55 2.jpg
270K

consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023
<escenariosdeportivos2023@gmail.com>
Para: escenariosdeportivos.ambiental@gmail.com

5 de septiembre de 2023, 11:05

PSI
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos



PHOTO-2023-09-04-08-37-55.jpg
352K

7339



PHOTO-2023-09-04-08-37-55 3.jpg
408K



PHOTO-2023-09-04-08-37-55 2.jpg
270K

7340

Gmail consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

Reunión Planeación Departamental.

2 mensajes

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 11 de septiembre de 2023, 11:50
Para: CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>, consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

PL-120-446
Villavicencio, 11 de septiembre de 2023

Al contestar, citar en el asunto:
Respuesta al oficio No PL-120-446

Señores:
CORSORCIO INTERESCENARIOS
R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Contrato De Interventoría N° 249 DE 2023
interescenariosc@gmail.com
Ciudad

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
R/L JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Escenariosdeportivos2023@gmail.com
Carrera 16 # 24-03 Villa Olímpica
Ciudad

Ct de obra N°106 de 2023:"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Reunión planeación departamental.

Cordial saludo

Por medio del presente me permito convocarlos a reunión el **día miércoles 13 de septiembre de 2023, a las 10:00 am en LA GOBERNACIÓN DEL META – CUARTO PISO**, reunión que se dispuso con la oficina de planeación departamental con el fin de finiquitar los temas relacionados con las modificatorias del contrato de obra de la referencia.

Cordialmente,

BIBIANA PAN MERCHÁN
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos

Elaboró: Adriana Lesmes
Cargo: Profesional – CPS

7341

--
Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta
Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 12 de septiembre de 2023, 16:55
Para: CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>, consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

Hacer caso omiso a la anterior comunicación.

[El texto citado está oculto]

7342

Gmail consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

REMISION INFORMES MENSUALES

2 mensajes

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 23 de septiembre de 2023, 9:21
Para: armconsulting@gmail.com, CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>, consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

PL-120-469
Villavicencio, 22 de septiembre de 2023

Señores:
CONSORCIO INTERESCENARIOS
HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Representante Legal
Contrato de Interventoría No. 249 de 2023
Email: armconsulting@gmail.com

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Contrato de Obra No. 106 de 2023

Asunto: Remisión de informes mensuales de obra

Cordial Saludo.

Por me dio de la presente solicito a la interventoría y a la obra del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATIINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META, entregar de manera inmediata los siguientes informes mensuales del proyecto:

Informe de obra correspondiente al periodo del mes de mayo de 2023
Informe de obra correspondiente al periodo del mes de junio de 2023
Informe de obra correspondiente al periodo del mes de julio de 2023
Informe de obra correspondiente al periodo del mes de agosto de 2023

Es importante indicar que los informes de obra para los meses de mayo y junio de 2023, fueron devueltos a la interventoría con el objetivo de realizar ajustes a observaciones emitidas por el grupo supervisor. A la fecha no se han recibido dichos informes con sus ajustes.

Para los informes de julio y agosto de 2023, esta supervisión no cuenta con dichos informes.

Es de aclarar que de acuerdo a las obligaciones contractuales, los informes tanto de obra como de interventoría se deben radicar los cinco (05) primeros días de cada mes.

2313

De igual forma es importante indicar que la supervisión ejercida a través de la oficina asesora de planeación, debe contar con la información del avance de cada proyecto, con el objetivo de cumplir lo establecido por el DNP, dado a que estos proyectos cuentan con recursos provenientes del sistema general de regalías.

Cordialmente,

MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
Jefe Oficina Asesora de Planeación

--
Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta
Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

---

consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com> 25 de septiembre de 2023, 7:21
Para: Direccion escenarios deportivos <direccion.escenariosdeportivos@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

7344

ACTAS DE COMITE

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

7315

NO SE REALIZARON ACTAS DE COMITÉ PARA LA PRESENTE FECHA DEL INFORME

7346

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

7317

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNO.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEPT/2023 Σmes	SEPT/2023 VR. TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR TOTAL
	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.								
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	6436.86	$ 5,438.00	$ 35,003,645	3,040.00	$ 16,531,520.00	4,160.00	$ 22,622,080.00
					$ 35,003,645				
2.00	DESMONTE Y DEMOLICIONES								
2.1	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	30.00	$ 30,524.00	$ 915,720	22.00	$ 671,528.00	52.00	$ 1,587,248.00
2.2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	55.00	$ 38,155.00	$ 2,098,525	20.00	$ 763,100.00	75.00	$ 2,861,625.00
2.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4,319.02	$ 18,491.00	$ 79,862,999	381.78	$ 7,059,493.98	4,700.80	$ 86,922,492.80
2.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	KG	25,854.30	$ 5,491.00	$ 141,965,961	-	$ -	25,854.30	$ 141,965,961.30
2.5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	58.00	$ 82,033.00	$ 4,757,914	-	$ -	58.00	$ 4,757,914.00
2.6	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	3,250.79	$ 18,021.00	$ 58,582,487	-	$ -	3,250.79	$ 58,582,486.59
2.7	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4,319.02	$ 13,760.00	$ 59,429,715	3,984.00	$ 54,819,840.00	3,984.00	$ 54,819,840.00
2.8	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	11.00	$ 15,262.00	$ 167,882	-	$ -	11.00	$ 167,882.00
2.9	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	487.53	$ 373,009.00	$ 181,853,078	-	$ -	487.53	$ 181,853,077.77
2.10	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	3,335.73	$ 14,647.00	$ 48,858,437	-	$ -	3,070.50	$ 44,973,613.50
2.11	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	332.05	$ 431,624.00	$ 143,320,749	-	$ -	332.05	$ 143,320,749.20
2.12	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	189.77	$ 383,666.00	$ 72,808,297	-	$ -	189.77	$ 72,808,296.82
2.13	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	45.90	$ 33,079.00	$ 1,518,326	-	$ -	45.90	$ 1,518,326.10
					$ 796,140,090				
3.00	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	4,718.84	$ 38,501.00	$ 181,680,059	1,484.96	$ 57,172,444.96	2,562.00	$ 98,639,562.00
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	5,396.66	$ 63,600.00	$ 343,227,576	146.30	$ 9,304,680.00	242.10	$ 15,397,560.00
3.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	989.88	$ 31,615.00	$ 31,295,056	-	$ -	-	$ -
					$ 556,202,691				
4.00	CIMENTACIÓN								
4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	46.78	$ 641,273.00	$ 29,998,751	13.50	$ 8,657,185.50	19.60	$ 12,568,950.80
4.2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	85.21	$ 1,444,492.00	$ 123,085,163	-	$ -	-	$ -
4.3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	189.95	$ 1,003,116.00	$ 190,541,884	105.06	$ 105,387,366.96	105.06	$ 105,387,366.96
4.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124.96	$ 1,075,099.00	$ 134,344,371	3.32	$ 3,569,328.68	3.32	$ 3,569,328.68
4.5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	108.08	$ 648,730.00	$ 70,114,738	39.31	$ 25,501,576.30	39.31	$ 25,501,576.30
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	51209.86	$ 8,513.00	$ 435,949,538	10,076.40	$ 85,780,393.20	12,988.70	$ 110,572,803.10
4.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	632.48	$ 821,666.00	$ 519,687,312	-	$ -	-	$ -
					$ 1,503,721,757				
5.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	993.72	$ 128,414.00	$ 127,607,560	-	$ -	-	$ -
5.2	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	128.68	$ 1,377,156.00	$ 177,212,434	-	$ -	-	$ -
5.3	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA, GRADERÍAS	M3	99.37	$ 674,689.00	$ 67,043,846	-	$ -	-	$ -
					$ 371,863,840				
6.00	ESTRUCTURAS EN ACERO								
6.1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	572,164.72	$ 25,806.00	$ 14,765,282,764	-	$ -	-	$ -
6.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	17,585.47	$ 9,955.00	$ 175,063,354	-	$ -	-	$ -
					$ 14,940,346,118				
7.00	CUBIERTA Y FACHADA								
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	6,524.58	$ 254,358.00	$ 1,659,579,120	-	$ -	-	$ -
7.2	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte y remates de cubierta)	M2	5,103.05	$ 1,106,035.00	$ 5,644,151,907	-	$ -	-	$ -
					$ 7,303,731,027				
8.00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES								
8.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	2,039.46	$ 53,708.00	$ 109,535,318	-	$ -	-	$ -
8.2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31.50	$ 1,338,592.00	$ 42,165,648	-	$ -	-	$ -
8.3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	36.10	$ 1,377,156.00	$ 49,715,332	-	$ -	-	$ -
8.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	45.99	$ 1,008,399.00	$ 46,376,270	-	$ -	-	$ -
8.5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.58	$ 1,805,128.00	$ 10,072,614	-	$ -	-	$ -
8.6	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.09	$ 1,989,083.00	$ 10,124,432	-	$ -	-	$ -
8.7	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	25.44	$ 142,180.00	$ 3,617,059	-	$ -	-	$ -
8.8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2,557.33	$ 26,532.00	$ 67,851,080	-	$ -	-	$ -
8.9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M3	1,267.50	$ 36,084.00	$ 45,736,470	-	$ -	-	$ -
8.10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	15,674.34	$ 8,513.00	$ 133,435,656	-	$ -	-	$ -
					$ 518,629,879				
9.00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS								
9.1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	60.00	$ 1,411,393.00	$ 84,683,580	-	$ -	-	$ -
9.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	4.00	$ 900,711.00	$ 3,602,844	-	$ -	-	$ -
9.3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	24.00	$ 953,654.00	$ 22,887,696	-	$ -	-	$ -
9.4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	76.00	$ 504,633.00	$ 38,352,108	-	$ -	-	$ -
9.5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	20.00	$ 161,971.00	$ 3,239,420	-	$ -	-	$ -
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	4.00	$ 327,907.00	$ 1,311,628	-	$ -	-	$ -
9.7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	43.84	$ 156,171.00	$ 6,846,537	-	$ -	-	$ -
9.8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	76.00	$ 387,179.00	$ 29,425,604	-	$ -	-	$ -
9.9	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UND	2.00	$ 43,672.00	$ 87,344	-	$ -	-	$ -
					$ 190,436,781				
10.00	CARPINTERÍA METÁLICA								
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20: 2 X 0.90 M	UND	28.00	$ 528,395.00	$ 14,795,060	-	$ -	-	$ -
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	118.80	$ 720,221.00	$ 85,562,255	-	$ -	-	$ -
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMINIO	M2	67.80	$ 323,273.00	$ 21,917,909	-	$ -	-	$ -
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	287.76	$ 310,290.00	$ 89,289,050	-	$ -	-	$ -
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	M2	374.82	$ 1,591,335.00	$ 596,464,185	-	$ -	-	$ -
					$ 808,028,459				
11.00	OBRAS EXTERIORES								
11.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	941.80	$ 48,109.00	$ 45,309,056	-	$ -	-	$ -

7348

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

						SEPT/2023		ACUMULADO	
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Σ mes	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11.2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	941.80	$ 203,395.00	$ 191,557,411	-	$ -	-	$ -
11.3	SISTEMA MODULAR SPORT PARA CANCHAS DEPORTIVAS (FLEXIBLES, ALTOS ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA CUALQUIER ESCENARIO DEPORTIVO DE COMPETITIVIDAD)	M2	2,785.14	$ 684,313.00	$ 1,905,907,509	-	$ -	-	$ -
11.4	SISTEMA MODULAR ESPECIALIZADO PARA PESAS EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO, MEDIDAS DE 30 CMS X 30 CMS Y ESPESOR DE 1.2 CMS	M2	352.74	$ 790,931.00	$ 278,993,001	-	$ -	-	$ -
11.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	738.00	$ 52,542.00	$ 38,775,996	-	$ -	-	$ -
11.6	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	745.42	$ 135,684.00	$ 101,141,567	-	$ -	-	$ -
11.7	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2,318.21	$ 225,626.00	$ 523,048,449	-	$ -	-	$ -
					$ 3,084,732,989				
12.00	PISOS Y ENCHAPES								
12.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1,811.91	$ 12,127.00	$ 21,973,033	-	$ -	-	$ -
12.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1,267.50	$ 13,941.00	$ 17,670,218	-	$ -	-	$ -
12.3	ESTUCO PLASTICO	M2	1,811.91	$ 17,784.00	$ 32,223,007	-	$ -	-	$ -
					$ 71,866,258				
13.00	INSTALACIONES HIDRÁULICAS								
13.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	703.27	$ 5,522.00	$ 3,883,457	-	$ -	-	$ -
13.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	246.14	$ 68,679.00	$ 16,904,649	-	$ -	-	$ -
13.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	53.00	$ 247,904.00	$ 13,138,912	-	$ -	-	$ -
13.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	70.33	$ 119,827.00	$ 8,427,433	-	$ -	-	$ -
13.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	175.82	$ 63,600.00	$ 11,182,152	-	$ -	-	$ -
13.6	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	263.47	$ 111,812.00	$ 29,459,108	-	$ -	-	$ -
13.7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	108.04	$ 38,348.00	$ 4,143,118	-	$ -	-	$ -
13.8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	77.64	$ 27,720.00	$ 2,152,181	-	$ -	-	$ -
13.9	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82.92	$ 22,916.00	$ 1,900,195	-	$ -	-	$ -
13.10	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	107.12	$ 19,078.00	$ 2,043,635	-	$ -	-	$ -
13.11	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	64.08	$ 16,171.00	$ 1,036,238	-	$ -	-	$ -
13.12	TUBERÍA PVCP RDE 9 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	106.64	$ 13,287.00	$ 1,416,926	-	$ -	-	$ -
13.13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	92.00	$ 58,398.00	$ 5,372,616	-	$ -	-	$ -
13.14	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24.00	$ 70,289.00	$ 1,686,936	-	$ -	-	$ -
13.15	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	64.00	$ 80,231.00	$ 5,134,784	-	$ -	-	$ -
13.16	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 328,362.00	$ 6,567,240	-	$ -	-	$ -
13.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	3.00	$ 269,530.00	$ 808,590	-	$ -	-	$ -
13.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø4" UM	UN	2.00	$ 170,877.00	$ 341,754	-	$ -	-	$ -
13.19	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 23,463.00	$ 469,260	-	$ -	-	$ -
13.20	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16.00	$ 11,553.00	$ 184,848	-	$ -	-	$ -
13.21	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30.00	$ 10,536.00	$ 316,080	-	$ -	-	$ -
13.22	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 6,016.00	$ 120,320	-	$ -	-	$ -
13.23	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	34.00	$ 3,767.00	$ 128,078	-	$ -	-	$ -
13.24	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	76.00	$ 43,672.00	$ 3,319,072	-	$ -	-	$ -
					$ 120,137,582				
14.00	INSTALACIONES SANITARIAS								
14.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	726.77	$ 5,522.00	$ 4,013,224	-	$ -	-	$ -
14.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	431.37	$ 68,679.00	$ 29,626,060	-	$ -	-	$ -
14.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	93.46	$ 247,904.00	$ 23,169,108	-	$ -	-	$ -
14.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	89.01	$ 119,827.00	$ 10,665,801	-	$ -	-	$ -
14.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	333.22	$ 63,600.00	$ 21,192,792	-	$ -	-	$ -
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	65.23	$ 101,025.00	$ 6,589,861	-	$ -	-	$ -
14.7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	229.01	$ 96,834.00	$ 22,175,954	-	$ -	-	$ -
14.8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	197.28	$ 46,886.00	$ 9,249,670	-	$ -	-	$ -
14.9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	114.24	$ 38,330.00	$ 4,378,819	-	$ -	-	$ -
14.10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	121.00	$ 26,096.00	$ 3,157,616	-	$ -	-	$ -
14.11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	180.00	$ 36,501.00	$ 6,570,180	-	$ -	-	$ -
14.12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	228.00	$ 21,173.00	$ 4,827,444	-	$ -	-	$ -
14.13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	84.00	$ 11,892.00	$ 998,928	-	$ -	-	$ -
14.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	76.00	$ 88,384.00	$ 6,717,184	-	$ -	-	$ -
14.15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 69,275.00	$ 1,385,500	-	$ -	-	$ -
14.16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	36.00	$ 70,264.00	$ 2,529,504	-	$ -	-	$ -
14.17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	24.00	$ 85,727.00	$ 2,057,448	-	$ -	-	$ -
14.18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	60.00	$ 86,652.00	$ 5,199,120	-	$ -	-	$ -
14.19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	19.00	$ 706,501.00	$ 13,423,519	-	$ -	-	$ -
14.20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4.00	$ 868,789.00	$ 3,475,156	-	$ -	-	$ -
14.21	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UN	1.00	$ 954,323.00	$ 954,323	-	$ -	-	$ -
14.22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	UN	1.00	$ 513,723.00	$ 513,723	-	$ -	-	$ -
14.23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	1.00	$ 502,350.00	$ 502,350	-	$ -	-	$ -
					$ 183,373,284				
15.00	RED AGUAS LLUVIAS								
15.1	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	343.20	$ 27,178.00	$ 9,327,490	-	$ -	-	$ -
15.2	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	362.37	$ 46,886.00	$ 16,990,080	-	$ -	-	$ -
15.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	394.40	$ 201,026.00	$ 79,284,854	-	$ -	-	$ -
15.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	24.00	$ 549,517.00	$ 13,188,408	-	$ -	-	$ -
					$ 118,790,834				
16.00	RED CONTRA INCENDIOS								
16.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	351.36	$ 5,522.00	$ 1,940,210	-	$ -	-	$ -
16.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	155.02	$ 68,679.00	$ 10,646,619	-	$ -	-	$ -
16.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	34.00	$ 247,904.00	$ 8,428,736	-	$ -	-	$ -
16.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	60.31	$ 119,827.00	$ 7,226,766	-	$ -	-	$ -
16.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	161.14	$ 63,600.00	$ 10,248,504	-	$ -	-	$ -
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	228.88	$ 129,760.00	$ 29,699,469	-	$ -	-	$ -
16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	78.48	$ 64,546.00	$ 5,065,570	-	$ -	-	$ -
16.8	TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32.00	$ 91,046.00	$ 2,913,472	-	$ -	-	$ -
16.9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4.48	$ 65,351.00	$ 292,772	-	$ -	-	$ -
16.10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12.00	$ 34,276.00	$ 411,312	-	$ -	-	$ -
16.11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 2,458,986.00	$ 9,835,944	-	$ -	-	$ -
16.12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28.00	$ 23,027.00	$ 644,756	-	$ -	-	$ -
16.13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 14,584.00	$ 58,336	-	$ -	-	$ -
16.14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 11,594.00	$ 92,752	-	$ -	-	$ -
					$ 87,505,218				

7349

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEPT/2023 Σ mes	SEPT/2023 VR. TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR TOTAL
17.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS								
17.1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	310.00	$ 180,745.00	$ 56,030,950	-	$ -	-	$ -
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4-0 - JUEGO X 3 UNIDADES - TFT151EXT	UN	2.00	$ 489,170.00	$ 978,340	-	$ -	-	$ -
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE 225 KVA, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UN	1.00	$ 95,503,711.00	$ 95,503,711	-	$ -	-	$ -
17.4	PLATINA DE COBRE 1000A PARA EXTENSIÓN DE BARRAJES DE TRANSFORMADOR DE 300KVA	UN	1.00	$ 1,380,564.00	$ 1,380,564	-	$ -	-	$ -
17.5	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1.00	$ 11,356,019.00	$ 11,356,019	-	$ -	-	$ -
17.6	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1.00	$ 16,738,866.00	$ 16,738,866	-	$ -	-	$ -
17.7	GENERADOR DIÉSEL DE 225kW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1.00	$ 183,594,177.00	$ 183,594,177	-	$ -	-	$ -
17.8	TABLERO DE DISTRIBUCION ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 125A; BARRAJE PRINCIPAL DE 300A, PROTECCION PARA 2 CIRCUITOS TRIFASICOS DE 63A, EN COFRE METALICO DE 80X40X35 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1.00	$ 12,495,386.00	$ 12,495,386	-	$ -	-	$ -
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO DE SALIDA LED, COLOR VERDE, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 110V-130V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, CUADRADA 18X290X4.5. AUTONOMIA 90MINUTOS. DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	44.00	$ 126,242.00	$ 5,554,648	-	$ -	-	$ -
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA <3.2W, TEMPERATURA DEL COLOR 6000-6500K, VIDA ÚTIL 35000 HORAS, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V-277V, FACTOR DE POTENCIA >0.9. AUTONOMÍA 90 MINUTOS. IP20. RECTANGULAR 30X13X6 CM. DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	44.00	$ 117,091.00	$ 5,152,004	-	$ -	-	$ -
17.11	Suministro e instalación de acometida 2x(3x250+250+2T)	ML	36.00	$ 1,203,784.00	$ 43,336,224	-	$ -	-	$ -
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0+2/0+6T	ML	2.00	$ 246,074.00	$ 492,148	-	$ -	-	$ -
17.13	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	125.00	$ 61,373.00	$ 7,671,625	-	$ -	-	$ -
17.14	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	420.00	$ 136,851.00	$ 57,477,420	-	$ -	-	$ -
17.15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 1,051,638.00	$ 2,103,276	-	$ -	-	$ -
17.16	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	12.00	$ 604,401.00	$ 7,252,812	-	$ -	-	$ -
17.17	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN CON VARILLA ROSCADA Y RIEL OMEGA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS. LA SALIDA INCLUYE LA INCIDENCIA DE LOS ML DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO RAMAL	UN	80.00	$ 399,342.00	$ 31,947,360	-	$ -	-	$ -
17.18	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1"	ML	240.00	$ 34,209.00	$ 8,210,160	-	$ -	-	$ -
17.19	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	256.00	$ 126,195.00	$ 32,305,920	-	$ -	-	$ -
17.20	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	56.00	$ 116,277.00	$ 6,511,512	-	$ -	-	$ -
17.21	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 189,046.00	$ 756,184	-	$ -	-	$ -
17.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL METALICO DE 10M , GALVANIZADO CON DOS BRAZOS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO), TOT TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE D E 40 X 40 EN 1/2"	UN	2.00	$ 3,313,745.00	$ 6,627,490	-	$ -	-	$ -
17.23	CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO PARA POSTES METALICOS SEGUN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MASTIL METÁLICO	UN	2.00	$ 221,516.00	$ 443,032	-	$ -	-	$ -
17.24	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	9.00	$ 74,202.00	$ 667,818	-	$ -	-	$ -
17.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X8+8T AWG - THHN	ML	127.00	$ 39,428.00	$ 5,007,356	-	$ -	-	$ -
17.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO ≥110.9W - IP65 - IK08 - 4.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	4.00	$ 2,020,743.00	$ 8,082,972	-	$ -	-	$ -
17.27	Suministro e instalación LUMINARIA Panel LED <20W, angulo de apertura 120°, 1799 lumenes, eficiencia 72 lm/W, temperatura del color 3000-6000K, vida util 35000 horas, tension de operación 100V-240V, factor de potencia >0,9, IP20. Redonda diametro 30 cm. Debe terner certificado RETILAP	UN	48.00	$ 178,062.00	$ 8,546,976	-	$ -	-	$ -
17.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA <40W, 3400 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0.9, IP65, RECTANGULAR 120X11X7 CM. DEBE TERNER	UN	16.00	$ 386,911.00	$ 6,190,576	-	$ -	-	$ -
17.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL <24W, 2880-4000 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0.9, IP65, CUADRADA 60X60 CM. DEBE TERNER CERTIFICADO	UN	24.00	$ 155,229.00	$ 3,725,496	-	$ -	-	$ -
17.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 7W	UN	16.00	$ 152,931.00	$ 2,446,896	-	$ -	-	$ -
17.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 6W	UN	56.00	$ 135,491.00	$ 7,587,496	-	$ -	-	$ -
17.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HIGHBAY ≤200W	UN	80.00	$ 1,069,009.00	$ 85,520,720	-	$ -	-	$ -
17.33	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE	UN	4.00	$ 723,631.00	$ 2,894,524	-	$ -	-	$ -
17.34	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	2.00	$ 9,310,924.00	$ 18,621,848	-	$ -	-	$ -
17.35	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0.4X0.4M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8")	ML	15.00	$ 443,690.00	$ 6,655,350	-	$ -	-	$ -
17.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	476.00	$ 73,037.00	$ 34,765,612	-	$ -	-	$ -
17.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4.00	$ 437,575.00	$ 1,750,300	-	$ -	-	$ -
17.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 3/4"	ML	12.00	$ 46,761.00	$ 561,132	-	$ -	-	$ -
17.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	607.00	$ 59,617.00	$ 36,187,519	-	$ -	-	$ -
					$ 823,132,419				
18.00	SEÑALETICA								
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION EN LAMINA DE POLIESTILENO CALIBRE DE 40 DE 1 MM DE ESPESOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SOBRE VINILO GRADO DE INGENERIA CON CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	M2	30.76	$ 260,897.00	$ 8,025,192	-	$ -	-	$ -
					$ 8,025,192				
					$ 31,521,957,843				

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
B	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.								
1.0	DEMOLICIONES								
1.1	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	ML	628.26	$ 15,530.00	$ 9,756,878	30.54	$ 474,286.20	658.80	$ 10,231,164.00
1.2	DEMOLICIÓN MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	335.36	$ 373,009.00	$ 125,092,298	194.00	$ 72,363,746.00	529.36	$ 197,456,044.24
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	187.28	$ 291,376.00	$ 54,568,897	-	$ -	133.00	$ 38,753,008.00
1.4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	370.50	$ 383,666.00	$ 142,148,253	-	$ -	221.30	$ 84,905,285.80
					$ 331,566,326				
2.00	PRELIMINARES								
2.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA,CARTERA Y PLANOS.	M2	14,462.44	$ 5,438.00	$ 78,646,749	-	$ -	6,000.00	$ 32,628,000.00
2.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1,563.67	$ 38,501.00	$ 60,202,859	158.28	$ 6,093,938.28	380.00	$ 14,630,380.00
2.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	10,442.12	$ 63,600.00	$ 664,118,832	2,105.00	$ 133,878,000.00	2,105.00	$ 133,878,000.00
					$ 802,968,440				
3.00	CONCRETOS								
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	49.87	$ 641,273.00	$ 31,980,285	-	$ -	-	$ -
3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO YCONSTRUCCIÓN	M3	234.60	$ 1,224,357.00	$ 287,234,152	-	$ -	-	$ -
3.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	20875.47	$ 8,513.00	$ 177,712,876	-	$ -	-	$ -

7350

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEPT/2023		ACUMULADO	
						Σ mes	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	859.76	$ 131,092.00	$ 112,707,658	-	$ -	-	$ -
3.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18.82	$ 969,616.00	$ 18,248,173	-	$ -	-	$ -
3.6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	532.01	$ 9,955.00	$ 5,296,160	-	$ -	-	$ -
					$ 633,179,304				
4.00	CIMENTACIÓN								
4.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	681.64	$ 128,857.00	$ 87,834,085	-	$ -	-	$ -
4.2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	408.98	$ 126,238.00	$ 51,628,817	-	$ -	-	$ -
4.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	102.25	$ 1,469,637.00	$ 150,270,383	-	$ -	-	$ -
4.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	170.41	$ 900,037.00	$ 153,375,305	-	$ -	-	$ -
4.5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS	M2	3408.21	$ 53,338.00	$ 181,787,105	-	$ -	-	$ -
4.6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2 CAPAS	M2	3,408.21	$ 81,390.00	$ 277,394,212	-	$ -	-	$ -
4.7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50%.3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada para los deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMUSLSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%.	M2	3408.21	$ 228,470.00	$ 778,673,739	-	$ -	-	$ -
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	452.42	$ 584,647.00	$ 264,505,996	-	$ -	-	$ -
					$ 1,945,469,642				
5.00	PISTA DE VELOCIDAD								
5.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	666.42	$ 128,857.00	$ 85,872,882	-	$ -	-	$ -
5.2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	399.85	$ 126,238.00	$ 50,476,264	-	$ -	-	$ -
5.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	99.96	$ 1,469,637.00	$ 146,904,915	-	$ -	-	$ -
5.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	166.60	$ 900,037.00	$ 149,946,164	-	$ -	-	$ -
5.5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA	M2	3332.10	$ 53,338.00	$ 177,727,550	-	$ -	-	$ -
5.6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2	M2	3332.10	$ 81,390.00	$ 271,199,619	-	$ -	-	$ -
5.7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50%.3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada paralos deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMUSLSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%	M2	3332.10	$ 228,470.00	$ 761,284,887	-	$ -	-	$ -
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA PISTA DE PATINAJE.	ML	238.80	$ 1,163,836.00	$ 277,924,037	-	$ -	-	$ -
5.9	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 45 CM DE LARGO Y 5 CM DE ANCHO CADA 40 CMS EN LINEA RECTA Y CADA 10 CM EN CURVA, CON UN ESPESOR DE 5 MM, HECHOS EN SINTETICO ACRILICO CARGADO CON CUARZO.	UN	290.00	$ 66,749.00	$ 19,357,210	-	$ -	-	$ -
					$ 1,940,693,528				
6.00	OBRAS EXTERIORES								
6.1	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2,217.11	$ 225,826.00	$ 500,237,661	-	$ -	-	$ -
6.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1,160.37	$ 128,857.00	$ 149,521,797	-	$ -	-	$ -
6.3	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	696.22	$ 126,238.00	$ 87,889,420	-	$ -	-	$ -
6.4	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	4,641.49	$ 116,423.00	$ 540,376,190	-	$ -	-	$ -
					$ 1,278,025,068				
7.00	RED AGUAS LLUVIAS								
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	235.89	$ 5,522.00	$ 1,302,585	-	$ -	-	$ -
7.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	226.45	$ 68,679.00	$ 15,552,360	-	$ -	-	$ -
7.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	49.07	$ 247,904.00	$ 12,164,649	-	$ -	-	$ -
7.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	94.36	$ 119,827.00	$ 11,306,876	-	$ -	-	$ -
7.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	132.10	$ 63,600.00	$ 8,401,560	-	$ -	-	$ -
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	235.89	$ 311,111.00	$ 73,387,974	-	$ -	-	$ -
7.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6.00	$ 706,501.00	$ 4,239,006	-	$ -	-	$ -
7.8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1.00	$ 868,789.00	$ 868,789	-	$ -	-	$ -
7.9	CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,48 A=0,50 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	596.50	$ 134,844.00	$ 80,434,446	-	$ -	-	$ -
7.10	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD. PARA PISTA DE PATINAJE	ML	596.50	$ 702,956.00	$ 419,313,254	-	$ -	-	$ -
					$ 626,971,499				
8.00	REDES ELECTRICAS								
8.1	MASTIL METALICO TRONCO CONICO OCTOGONAL DE 16-18M FABRICADO EN SECCIONES EMBONADAS, BASE REDONDA 600MM EN 3/4 DE ESPESOR, CANASTILLA DE ANCLAJE CON 8 PERNOS DE 7/8" X 1500MM, CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA ALOJAR DE 1 A 8 REFLECTORES, PELDAÑOS DE ASCENSO Y LINEA DE VIDA A PARTIR DE LOS 4M,GALVANIZADO EN CALIENTE	UN	7.00	$ 19,532,812.00	$ 136,729,684	-	$ -	-	$ -
8.2	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 478,576.00	$ 3,350,032	-	$ -	-	$ -
8.3	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1.00	$ 11,356,112.00	$ 11,356,112	-	$ -	-	$ -
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	37.00	$ 261,587.00	$ 9,678,719	-	$ -	-	$ -
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2+2+8T AWG THHN	ML	433.00	$ 110,981.00	$ 48,054,773	-	$ -	-	$ -
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4+4+8T AWG THHN	ML	307.00	$ 95,228.00	$ 29,234,996	-	$ -	-	$ -

7351

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEPT/2023 Σ mes	SEPT/2023 VR. TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR TOTAL
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+8T AWG THHN	ML	96.00	$ 75,487.00	$ 7,246,752	-	$ -	-	$ -
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8+8+8T AWG THHN	ML	165.00	$ 79,043.00	$ 13,042,095	-	$ -	-	$ -
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 2"	ML	140.00	$ 115,597.00	$ 16,183,580	-	$ -	-	$ -
8.10	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1.00	$ 16,738,866.00	$ 16,738,866	-	$ -	-	$ -
8.11	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	7.00	$ 3,439,120.00	$ 24,073,840	-	$ -	-	$ -
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 600W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	76.00	$ 5,681,030.00	$ 431,758,280	-	$ -	-	$ -
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 600W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	16.00	$ 4,128,559.00	$ 66,056,944	-	$ -	-	$ -
8.14	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA ILUMINACION PATINAJE QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 300A; BARRAJE PRINCIPAL DE 400A, 7 ARRANCADORES DIRECTOR CON PROTECCION DE 50A Y CONTACTOR TRIPOLAR DE 50A EN AC3; ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION, EN COFRE METALICO DE 100X60X40 CON BANDEJA DOBLEFONDO. PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1.00	$ 23,478,564.00	$ 23,478,564	-	$ -	-	$ -
8.15	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	251.54	$ 38,501.00	$ 9,684,542	-	$ -	-	$ -
8.16	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	157.04	$ 192,100.00	$ 30,167,384	-	$ -	-	$ -
8.17	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.02	$ 641,273.00	$ 1,295,371	-	$ -	-	$ -
8.18	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.91	$ 1,377,156.00	$ 8,138,992	-	$ -	-	$ -
8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	275.63	$ 53,399.00	$ 14,718,366	-	$ -	-	$ -
8.20	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	2,770.04	$ 8,513.00	$ 23,581,351	-	$ -	-	$ -
8.21	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.16	$ 936,416.00	$ 18,878,147	-	$ -	-	$ -
8.22	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	10.00	$ 604,401.00	$ 6,044,010	-	$ -	-	$ -
8.23	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	4.00	$ 1,152,233.00	$ 4,608,932	-	$ -	-	$ -
8.24	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	2.00	$ 1,927,585.00	$ 3,855,170	-	$ -	-	$ -
8.25	CANALIZACIÓN 18 DUCTOS DE 2" PVC	ML	5.00	$ 405,772.00	$ 2,028,860	-	$ -	-	$ -
8.26	CANALIZACIÓN 12 DUCTOS DE 2" PVC	ML	33.42	$ 345,633.00	$ 11,551,055	-	$ -	-	$ -
8.27	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 2" PVC	ML	135.11	$ 179,324.00	$ 24,228,466	-	$ -	-	$ -
8.28	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 2" PVC	ML	70.44	$ 159,276.00	$ 11,219,542	-	$ -	-	$ -
8.29	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 2" PVC	ML	77.30	$ 149,255.00	$ 11,537,412	-	$ -	-	$ -
8.30	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	85.78	$ 61,373.00	$ 5,264,576	-	$ -	-	$ -
8.31	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	54.59	$ 34,320.00	$ 1,873,529	-	$ -	-	$ -
8.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	154.00	$ 73,037.00	$ 11,247,698	-	$ -	-	$ -
8.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	7.00	$ 437,575.00	$ 3,063,025	-	$ -	-	$ -
8.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	39.00	$ 59,617.00	$ 2,325,063	-	$ -	-	$ -
					$ 1,042,294,728				
					$ 8,501,168,535				

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEPT/2023 Σ mes	SEPT/2023 VR. TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR TOTAL
C	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META								
1.0	PRELIMINARES								
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	9,706.51	$ 4,349.00	$ 42,213,612	4,822.20	$ 20,971,747.80	9,645.00	$ 41,946,105.00
1.2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	33.43	$ 373,009.00	$ 12,469,691	-	$ -	26.90	$ 10,033,942.10
					$ 54,683,303				
2.00	EXCAVACIÓN Y RELLENOS								
2.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	42.05	$ 38,501.00	$ 1,618,967	42.00	$ 1,617,042.00	42.00	$ 1,617,042.00
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	238.98	$ 68,679.00	$ 16,412,907	238.00	$ 16,345,602.00	238.00	$ 16,345,602.00
2.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	44.16	$ 247,904.00	$ 10,947,441	36.00	$ 8,924,544.00	44.00	$ 10,907,776.00
					$ 28,979,315				
3.00	OBRAS EXTERIORES								
3.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	954.86	$ 98,611.00	$ 94,159,699	-	$ -	-	$ -
3.2	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,40 A=0,50. DESARROLLO 1,13 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	412.20	$ 134,844.00	$ 55,582,697	-	$ -	-	$ -
3.3	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD.	ML	412.20	$ 702,956.00	$ 289,758,463	-	$ -	-	$ -
					$ 439,500,859				
4.00	FILTROS								
4.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8866.15	$ 14,681.00	$ 130,163,948	-	$ -	-	$ -
4.2	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1956.86	$ 143,702.00	$ 281,204,696	-	$ -	-	$ -
					$ 411,368,644				
5.00	SUPERFICIE								
5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	8866.15	$ 4,394.00	$ 38,957,863	-	$ -	-	$ -
5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	545.95	$ 900,037.00	$ 491,375,200	-	$ -	-	$ -
5.3	PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA EN SITIO CERTIFICADA IAAF: SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 Y DIN 18035-6. ESPESOR 13 MM. CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPA ELÁSTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPA POROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM 1 A 4 MM DE COLOR ROJO.	M2	7799.35	$ 1,015,468.00	$ 7,919,990,346	-	$ -	-	$ -
5.4	DEMARCACION PISTA	ML	4257.65	$ 21,661.00	$ 92,224,957	-	$ -	-	$ -
					$ 8,542,548,366				
6.00	ACCESORIOS								
6.1	BORDILLO ALUMINIO DESMONTABLE CERTIFICADO IAAF	ML	413.42	$ 254,313.00	$ 105,138,080	-	$ -	-	$ -
6.2	OBSTACULO CARRERA CERTIFICADO IAAF	UN	8.00	$ 1,008,887.00	$ 8,071,096	-	$ -	-	$ -
6.3	TACOS DE SALIDA	UN	8.00	$ 560,835.00	$ 4,485,080	-	$ -	-	$ -
					$ 117,694,256				
7.00	PLACA EN CONCRETO								
7.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	95.25	$ 969,616.00	$ 92,355,924	-	$ -	-	$ -
7.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3892.26	$ 9,955.00	$ 38,747,448	-	$ -	-	$ -
7.3	SISTEMA MODULAR DEPORTIVO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TEJIDO EN REJILLA, TABLETAS DE 25 CM X 25 CMS X 12.5 MM	M2	127.26	$ 892,631.00	$ 113,596,221	-	$ -	-	$ -
					$ 244,699,593				
8.00	GRAMA SINTETICA								
8.1	RELLENO CON GRAVILLA	M3	167.17	$ 102,613.00	$ 17,153,815	-	$ -	-	$ -
8.2	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1,114.49	$ 116,423.00	$ 129,752,269	-	$ -	-	$ -
					$ 146,906,084				
					$ 9,986,380,420				

19.00	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESCENARIOS DEPORTIVOS .								
19.1	CERTFICACION RETIE REDES DE MEDIA		1.00		$ 3,000,000	-	$ -	-	$ -
19.2	CERTFICACION E INSPCCION DE TRANSFORMADOR		1.00		$ 949,266	-	$ -	-	$ -
19.3	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION		1.00		$ 2,975,000	-	$ -	-	$ -
19.4	RETIE USO FINAL		1.00		$ 7,735,000	-	$ -	-	$ -
19.5	CERTIFICACION RETILAP		1.00		$ 9,044,000	-	$ -	-	$ -
19.6	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA		1.00		$ 2,793,954	-	$ -	-	$ -
20.0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		1.00		$ 297,493,828	0.20	$ 59,615,192.51	0.70	$ 208,867,846.02

7352

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEPT/2023		ACUMULADO	
						Σ mes	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
					$ 323,991,048				
9.00	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE PATINAJE.								
9.1	RETIE USO FINAL		1.00		$ 7,735,000	-	$ -	-	$ -
9.2	CERTIFICACION RETILAP		1.00		$ 9,044,000	-	$ -	-	$ -
9.3	PMA		1.00		$ 187,776,998	0.13	$ 24,514,604.94	0.59	$ 110,892,024.02
					$ 204,555,998				
9.00	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE ATLETISMO.								
9.1	Diagnostico pista de Atletismo IAAF -Identificación de las materias primas IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Inspección visual IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Espesor de la pista EN 1969 -Absorción de impactos y Deformación vertical (12 puntos) EN 14808 y EN 14809 -Deslizamiento (6 puntos) EN 13036-4 -Planimetría de la superficie IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Drenaje IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications		1.00		$ 46,400,000	-	$ -	-	$ -
9.2	PMA		1.00		$ 187,776,998	0.04	$ 7,199,732.83	0.10	$ 18,297,353.41
					$ 234,176,998				
					$ 762,724,044				

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)	$ 50,109,216,798
VALOR TOTAL	$ 50,871,940,842

	$ 727,216,894
	$ 2,121,788,314

353

AVANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADO SEPTIEMBRE DE 2023

7354

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.												
1.1	LOCALIZACION. TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.	M2	6436.86	$ 5,438.00	$ 35,003,645	2,926,085.95	8.36%	14,110,844.38	40.31%	16,531,520.00	47.23%	22,622,080.00	64.63%
					$ 35,003,645								
2.00	DESMONTE Y DEMOLICIONES												
2.1	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	30.00	$ 30,524.00	$ 915,720	-	0.00%	915,720.00	0.12%	671,528.00	0.08%	1,587,248.00	0.20%
2.2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	55.00	$ 38,155.00	$ 2,098,525	-	0.00%	2,098,525.00	0.26%	763,100.00	0.10%	2,861,625.00	0.36%
2.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4,319.02	$ 18,491.00	$ 79,862,999	-	0.00%	79,862,999.00	10.03%	7,059,493.98	0.89%	86,922,492.80	10.92%
2.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	KG	25,854.30	$ 5,491.00	$ 141,965,961	-	0.00%	141,965,961.00	17.83%	-	0.00%	141,965,961.30	17.83%
2.5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	58.00	$ 82,033.00	$ 4,757,914	-	0.00%	4,757,914.01	0.60%	-	0.00%	4,757,914.00	0.60%
2.6	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	3,250.79	$ 18,021.00	$ 58,582,487	-	0.00%	58,582,487.00	7.36%	-	0.00%	58,582,486.59	7.36%
2.7	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4,319.02	$ 13,760.00	$ 59,429,715	-	0.00%	59,429,715.00	7.46%	54,819,840.00	6.89%	54,819,840.00	6.89%
2.8	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	11.00	$ 15,262.00	$ 167,882	-	0.00%	167,882.00	0.02%	-	0.00%	167,882.00	0.02%
2.9	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	487.53	$ 373,009.00	$ 181,853,078	-	0.00%	181,853,078.00	22.84%	-	0.00%	181,853,077.77	22.84%
2.10	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	3,335.73	$ 14,647.00	$ 48,858,437	-	0.00%	48,858,437.00	6.14%	-	0.00%	44,973,613.50	5.65%
2.11	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	332.05	$ 431,624.00	$ 143,320,749	54,939,620.45	6.90%	143,320,749.00	18.00%	-	0.00%	143,320,749.20	18.00%
2.12	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	189.77	$ 383,666.00	$ 72,808,297	-	0.00%	72,808,297.00	9.15%	-	0.00%	72,808,296.82	9.15%
2.13	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	45.90	$ 33,079.00	$ 1,518,326	-	0.00%	1,518,326.00	0.19%	-	0.00%	1,518,326.10	0.19%
					$ 796,140,090								
3.00	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	4,718.84	$ 38,501.00	$ 181,680,059	63,588,020.65	11.43%	63,588,020.65	11.43%	57,172,444.96	10.28%	98,639,562.00	17.73%
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	5,396.66	$ 63,600.00	$ 343,227,576	72,935,859.90	13.11%	72,935,859.90	13.11%	9,304,680.00	1.67%	15,397,560.00	2.77%
3.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	989.88	$ 31,615.00	$ 31,295,056	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 556,202,691								
4.00	CIMENTACIÓN												
4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	46.78	$ 641,273.00	$ 29,998,751	10,199,575.34	0.68%	10,199,575.34	0.68%	8,657,185.50	0.58%	12,568,950.80	0.84%
4.2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	85.21	$ 1,444,492.00	$ 123,085,163	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	189.95	$ 1,003,116.00	$ 190,541,884	123,852,224.60	8.24%	123,852,224.60	8.24%	105,387,366.96	7.01%	105,387,366.96	7.01%
4.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124.96	$ 1,075,099.00	$ 134,344,371	-	0.00%	-	0.00%	3,569,328.68	0.24%	3,569,328.68	0.24%
4.5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	108.08	$ 648,730.00	$ 70,114,738	-	0.00%	-	0.00%	25,501,576.30	1.70%	25,501,576.30	1.70%
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	51209.86	$ 8,513.00	$ 435,949,538	-	0.00%	-	0.00%	85,780,393.20	5.70%	110,572,803.10	7.35%
4.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	632.48	$ 821,666.00	$ 519,687,312	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 1,503,721,757								
5.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO												
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	993.72	$ 128,414.00	$ 127,607,560	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.2	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	128.68	$ 1,377,156.00	$ 177,212,434	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.3	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. GRADERÍAS	M3	99.37	$ 674,689.00	$ 67,043,846	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 371,863,840								
6.00	ESTRUCTURAS EN ACERO												
6.1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	572,164.72	$ 25,806.00	$ 14,765,282,764	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	17,585.47	$ 9,955.00	$ 175,063,354	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 14,940,346,118								
7.00	CUBIERTA Y FACHADA												
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	6,524.58	$ 254,358.00	$ 1,659,579,120	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

7355

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
7.2	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte y remates de cubierta)	M2	5,103.05	$ 1,106,035.00	$ 5,644,151,907	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 7,303,731,027								
8.00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES												
8.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	2,039.46	$ 53,708.00	$ 109,535,318	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31.50	$ 1,338,592.00	$ 42,165,648	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	36.10	$ 1,377,156.00	$ 49,715,332	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	45.99	$ 1,008,399.00	$ 46,376,270	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.58	$ 1,805,128.00	$ 10,072,614	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.6	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.09	$ 1,989,083.00	$ 10,124,432	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.7	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	25.44	$ 142,180.00	$ 3,617,059	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2,557.33	$ 26,532.00	$ 67,851,080	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M3	1,267.50	$ 36,084.00	$ 45,736,470	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	15,674.34	$ 8,513.00	$ 133,435,656	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 518,629,879								
9.00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS												
9.1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	60.00	$ 1,411,393.00	$ 84,683,580	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	4.00	$ 900,711.00	$ 3,602,844	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	24.00	$ 953,654.00	$ 22,887,696	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	76.00	$ 504,633.00	$ 38,352,108	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	20.00	$ 161,971.00	$ 3,239,420	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	4.00	$ 327,907.00	$ 1,311,628	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	43.84	$ 156,171.00	$ 6,846,537	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	76.00	$ 387,179.00	$ 29,425,604	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.9	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UND	2.00	$ 43,672.00	$ 87,344	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 190,436,761				0.00%				
10.00	CARPINTERÍA METÁLICA												
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UND	28.00	$ 528,395.00	$ 14,795,060	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	118.80	$ 720,221.00	$ 85,562,255	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMINIO	M2	67.80	$ 323,273.00	$ 21,917,909	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	287.76	$ 310,290.00	$ 89,289,050	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	M2	374.82	$ 1,591,335.00	$ 596,464,185	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 808,028,459								
11.00	OBRAS EXTERIORES												
11.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	941.80	$ 48,109.00	$ 45,309,056	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
11.2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	941.80	$ 203,395.00	$ 191,557,411	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
11.3	SISTEMA MODULAR SPORT PARA CANCHAS DEPORTIVAS (FLEXIBLES, ALTOS ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA CUALQUIER ESCENARIO DEPORTIVO DE COMPETITIVIDAD)	M2	2,785.14	$ 684,313.00	$ 1,905,907,509	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
11.4	SISTEMA MODULAR ESPECIALIZADO PARA PESAS EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO, MEDIDAS DE 30 CMS X 30 CMS Y ESPESOR DE 1.2 CMS	M2	352.74	$ 790,931.00	$ 278,993,001	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
11.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	738.00	$ 52,542.00	$ 38,775,996	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
11.6	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	745.42	$ 135,684.00	$ 101,141,567	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
11.7	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2,318.21	$ 225,626.00	$ 523,048,449	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 3,084,732,989								
12.00	PISOS Y ENCHAPES												
12.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1,811.91	$ 12,127.00	$ 21,973,033	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
12.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1,267.50	$ 13,941.00	$ 17,670,218	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
12.3	ESTUCO PLASTICO	M2	1,811.91	$ 17,784.00	$ 32,223,007	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 71,866,258								
13.00	INSTALACIONES HIDRÁULICAS												
13.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	703.27	$ 5,522.00	$ 3,883,457	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	246.14	$ 68,679.00	$ 16,904,649	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	53.00	$ 247,904.00	$ 13,138,912	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	70.33	$ 119,827.00	$ 8,427,433	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

7356

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
13.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	175.82	$ 63,600.00	$ 11,182,152	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.6	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	263.47	$ 111,812.00	$ 29,459,108	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	108.04	$ 38,348.00	$ 4,143,118	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	77.64	$ 27,720.00	$ 2,152,181	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.9	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82.92	$ 22,916.00	$ 1,900,195	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.10	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	107.12	$ 19,078.00	$ 2,043,635	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.11	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	64.08	$ 16,171.00	$ 1,036,238	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.12	TUBERÍA PVCP RDE 9 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	106.64	$ 13,287.00	$ 1,416,926	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	92.00	$ 58,398.00	$ 5,372,616	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.14	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24.00	$ 70,289.00	$ 1,686,936	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.15	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	64.00	$ 80,231.00	$ 5,134,784	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.16	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 328,362.00	$ 6,567,240	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	3.00	$ 269,530.00	$ 808,590	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø4" UM	UN	2.00	$ 170,877.00	$ 341,754	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.19	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 23,463.00	$ 469,260	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.20	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16.00	$ 11,553.00	$ 184,848	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.21	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30.00	$ 10,536.00	$ 316,080	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.22	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 6,016.00	$ 120,320	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.23	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	34.00	$ 3,767.00	$ 128,078	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.24	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	76.00	$ 43,672.00	$ 3,319,072	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 120,137,582								
14.00	INSTALACIONES SANITARIAS												
14.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	726.77	$ 5,522.00	$ 4,013,224	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	431.37	$ 68,679.00	$ 29,626,060	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	93.46	$ 247,904.00	$ 23,169,108	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	89.01	$ 119,827.00	$ 10,665,801	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	333.22	$ 63,600.00	$ 21,192,792	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	65.23	$ 101,025.00	$ 6,589,861	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	229.01	$ 96,834.00	$ 22,175,954	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	197.28	$ 46,886.00	$ 9,249,670	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	114.24	$ 38,330.00	$ 4,378,819	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	121.00	$ 26,096.00	$ 3,157,616	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	180.00	$ 36,501.00	$ 6,570,180	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	228.00	$ 21,173.00	$ 4,827,444	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	84.00	$ 11,892.00	$ 998,928	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	76.00	$ 88,384.00	$ 6,717,184	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 69,275.00	$ 1,385,500	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	36.00	$ 70,264.00	$ 2,529,504	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	24.00	$ 85,727.00	$ 2,057,448	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	60.00	$ 86,652.00	$ 5,199,120	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.19	CAJA DE INSPECCION DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	19.00	$ 706,501.00	$ 13,423,519	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.20	CAJA DE INSPECCION DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4.00	$ 868,789.00	$ 3,475,156	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.21	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UN	1.00	$ 954,323.00	$ 954,323	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	UN	1.00	$ 513,723.00	$ 513,723	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14.23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	1.00	$ 502,350.00	$ 502,350	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 183,373,284								
15.00	RED AGUAS LLUVIAS												
15.1	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	343.20	$ 27,178.00	$ 9,327,490	-	0.00%	-	7.85%	-	0.00%	-	0.00%
15.2	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	362.37	$ 46,886.00	$ 16,990,080	-	0.00%	-	14.30%	-	0.00%	-	0.00%
15.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	394.40	$ 201,026.00	$ 79,284,654	-	0.00%	-	66.74%	-	0.00%	-	0.00%
15.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	24.00	$ 549,517.00	$ 13,188,408	-	0.00%	-	11.10%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 118,790,634								
16.00	RED CONTRA INCENDIOS												
16.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	351.36	$ 5,522.00	$ 1,940,210	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

7357

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
16.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	155.02	$ 68,679.00	$ 10,646,619	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	34.00	$ 247,904.00	$ 8,428,736	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	60.31	$ 119,827.00	$ 7,226,766	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	161.14	$ 63,600.00	$ 10,248,504	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	228.88	$ 129,760.00	$ 29,699,469	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	78.48	$ 64,546.00	$ 5,065,570	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.8	TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32.00	$ 91,046.00	$ 2,913,472	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4.48	$ 65,351.00	$ 292,772	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12.00	$ 34,276.00	$ 411,312	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 2,458,986.00	$ 9,835,944	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28.00	$ 23,027.00	$ 644,756	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 14,584.00	$ 58,336	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 11,594.00	$ 92,752	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 87,505,218								
17.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS												
17.1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	310.00	$ 180,745.00	$ 56,030,950	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4-0 - JUEGO X 3 UNIDADES - TFT151EXT	UN	2.00	$ 489,170.00	$ 978,340	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE 225 KVA, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UN	1.00	$ 95,503,711.00	$ 95,503,711	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.4	PLATINA DE COBRE 1000A PARA EXTENSIÓN DE BARRAJES DE TRANSFORMADOR DE 300KVA	UN	1.00	$ 1,380,564.00	$ 1,380,564	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.5	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE. 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1.00	$ 11,356,019.00	$ 11,356,019	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.6	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1.00	$ 16,738,866.00	$ 16,738,866	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.7	GENERADOR DIÉSEL DE 225KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1.00	$ 183,594,177.00	$ 183,594,177	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.8	TABLERO DE DISTRIBUCION ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 125A; BARRAJE PRINCIPAL DE 300A, PROTECCION PARA 2 CIRCUITOS TRIFASICOS DE 63A, EN COFRE METALICO DE 80X40X35 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1.00	$ 12,495,386.00	$ 12,495,386	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO DE SALIDA LED, COLOR VERDE, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 110V-130V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, CUADRADA 18X290X4.5. AUTONOMIA 90MINUTOS. DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	44.00	$ 126,242.00	$ 5,554,648	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA <3.2W, TEMPERATURA DEL COLOR 6000-6500K, VIDA ÚTIL 35000 HORAS, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V-277V, FACTOR DE POTENCIA >0,9. AUTONOMÍA 90 MINUTOS. IP20. RECTANGULAR 30X13X6 CM, DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	44.00	$ 117,091.00	$ 5,152,004	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.11	Suministro e instalación de acometida 2x(3x250+250+2T)	ML	36.00	$ 1,203,784.00	$ 43,336,224	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0+2/0+6T	ML	2.00	$ 246,074.00	$ 492,148	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.13	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	125.00	$ 61,373.00	$ 7,671,625	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.14	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	420.00	$ 136,851.00	$ 57,477,420	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 1,051,638.00	$ 2,103,276	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.16	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	12.00	$ 604,401.00	$ 7,252,812	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.17	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN CON VARILLA ROSCADA Y RIEL OMEGA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS. LA SALIDA INCLUYE LA INCIDENCIA DE LOS ML DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO RAMAL	UN	80.00	$ 399,342.00	$ 31,947,360	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.18	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1''	ML	240.00	$ 34,209.00	$ 8,210,160	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.19	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	256.00	$ 126,195.00	$ 32,305,920	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.20	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	56.00	$ 116,277.00	$ 6,511,512	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.21	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 189,046.00	$ 756,184	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL METALICO DE 10M , GALVANIZADO CON DOS BRAZOS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO). TOT TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE D E 40 X 40 EN 1/2"	UN	2.00	$ 3,313,745.00	$ 6,627,490	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.23	CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO PARA POSTES METALICOS SEGUN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MÁSTIL METÁLICO	UN	2.00	$ 221,516.00	$ 443,032	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
17.24	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	9.00	$ 74,202.00	$ 667,818	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X8+8T AWG - THHN	ML	127.00	$ 39,428.00	$ 5,007,356	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO ≥110,9W - IP65 - IK08 - 4.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	4.00	$ 2,020,743.00	$ 8,082,972	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.27	Suministro e instalación LUMINARIA Panel LED <20W, angulo de apertura 120º, 1799 lumenes, eficiencia 72 lm/W, temperatura del color 3000-6000K, vida util 35000 horas, tension de operación 100V-240V, factor de potencia >0,9, IP20. Redonda diametro 30 cm. Debe terner certificado RETILAP	UN	48.00	$ 178,062.00	$ 8,546,976	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA <40W, 3400 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP65, RECTANGULAR 120X11X7 CM. DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	16.00	$ 386,911.00	$ 6,190,576	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL <24W, 2880-4000 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP20, CUADRADA 60X60 CM. DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	24.00	$ 155,229.00	$ 3,725,496	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 7W	UN	16.00	$ 152,931.00	$ 2,446,896	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 6W	UN	56.00	$ 135,491.00	$ 7,587,496	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HIGHBAY ≤200W	UN	80.00	$ 1,069,009.00	$ 85,520,720	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.33	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE	UN	4.00	$ 723,631.00	$ 2,894,524	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.34	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	2.00	$ 9,310,924.00	$ 18,621,848	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.35	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,4X0,4M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8")	ML	15.00	$ 443,690.00	$ 6,655,350	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	476.00	$ 73,037.00	$ 34,765,612	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0.60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4.00	$ 437,575.00	$ 1,750,300	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 3/4"	ML	12.00	$ 46,761.00	$ 561,132	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	607.00	$ 59,617.00	$ 36,187,519	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 823,132,419								
18.00	SEÑALETICA												
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION EN LAMINA DE POLIESTILENO CALIBRE DE 40 DE 1 MM DE ESPESOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SOBRE VINILO GRADO DE INGENERIA CON CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	M2	30.76	$ 260,897.00	$ 8,025,192	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 8,025,192								
					$ 31,521,667,843								

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
B	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.												
1.0	DEMOLICIONES												
1.1	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	ML	628.26	$ 15,530.00	$ 9,756,878	-	0.00%	9,756,878.00	2.94%	474,286.20	0.14%	10,231,164.00	3.09%
1.2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	335.36	$ 373,009.00	$ 125,092,298	-	0.00%	125,092,298.00	37.73%	72,363,746.00	21.82%	197,456,044.24	59.55%
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	187.28	$ 291,376.00	$ 54,568,897	-	0.00%	54,568,897.00	16.46%	-	0.00%	38,753,008.00	11.69%
1.4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	370.50	$ 383,666.00	$ 142,148,253	-	0.00%	142,148,253.00	42.87%	-	0.00%	84,905,285.80	25.61%
					$ 331,566,326								
2.00	PRELIMINARES												
2.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA,CARTERA Y PLANOS.	M2	14,462.44	$ 5,438.00	$ 78,646,749	6,574,376.67	0.82%	31,704,470.69	3.95%	-	0.00%	32,628,000.00	4.06%
2.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1,563.67	$ 38,501.00	$ 60,202,859	13,420,220.65	1.67%	23,579,453.11	2.94%	6,093,938.28	0.76%	14,630,380.00	1.82%
2.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	10,442.12	$ 63,600.00	$ 664,118,832	122,518,474.18	15.26%	192,365,454.79	23.96%	133,878,000.00	16.67%	133,878,000.00	16.67%
					$ 802,968,440								
3.00	CONCRETOS												
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	49.87	$ 641,273.00	$ 31,980,285	14,257,877.06	2.25%	22,386,199.50	3.54%	-	0.00%	-	0.00%
3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO YCONSTRUCCIÓN	M3	234.60	$ 1,224,357.00	$ 287,234,152	109,764,479.51	17.34%	172,340,491.20	27.22%	-	0.00%	-	0.00%
3.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	20875.47	$ 8,513.00	$ 177,712,876	89,694,706.28	14.17%	140,829,071.54	22.24%	-	0.00%	-	0.00%
3.4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	859.76	$ 131,092.00	$ 112,707,658	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
3.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18.82	$ 969,616.00	$ 18,248,173	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
3.6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	532.01	$ 9,955.00	$ 5,296,160	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 633,179,304								
4.00	CIMENTACIÓN												

7359

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
4.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	681.64	$ 128,857.00	$ 87,834,085	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	408.98	$ 126,238.00	$ 51,628,817	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	102.25	$ 1,469,637.00	$ 150,270,383	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	170.41	$ 900,037.00	$ 153,375,305	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS	M2	3408.21	$ 53,338.00	$ 181,787,105	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2 CAPAS	M2	3,408.21	$ 81,390.00	$ 277,394,212	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50%.3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada para los deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMUSLSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%.	M2	3408.21	$ 228,470.00	$ 778,673,739	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	452.42	$ 584,647.00	$ 264,505,996	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 1,945,469,642								
5.00	PISTA DE VELOCIDAD												
5.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	666.42	$ 128,857.00	$ 85,872,882	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	399.85	$ 126,238.00	$ 50,476,264	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	99.96	$ 1,469,637.00	$ 146,904,915	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	166.60	$ 900,037.00	$ 149,946,164	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA SUPERFICIES	M2	3332.10	$ 53,338.00	$ 177,727,550	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2 CAPAS	M2	3332.10	$ 81,390.00	$ 271,199,619	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50%.3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada para los deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMUSLSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%	M2	3332.10	$ 228,470.00	$ 761,284,887	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA PISTA DE PATINAJE.	ML	238.80	$ 1,163,836.00	$ 277,924,037	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.9	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 45 CM DE LARGO Y 5 CM DE ANCHO CADA 40 CMS EN LINEA RECTA Y CADA 10 CM EN CURVA, CON UN ESPESOR DE 5 MM, HECHOS EN SINTETICO ACRILICO CARGADO CON CUARZO.	UN	290.00	$ 66,749.00	$ 19,357,210	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 1,940,693,528								
6.00	OBRAS EXTERIORES												
6.1	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2,217.11	$ 225,626.00	$ 500,237,661	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1,160.37	$ 128,857.00	$ 149,521,797	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6.3	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	696.22	$ 126,238.00	$ 87,889,420	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6.4	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	4,641.49	$ 116,423.00	$ 540,376,190	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 1,278,025,068								
7.00	RED AGUAS LLUVIAS												
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	235.89	$ 5,522.00	$ 1,302,585	553,081.73	0.09%	971,769.77	0.15%	-	0.00%	-	0.00%
7.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	226.45	$ 68,679.00	$ 15,552,360	-	0.00%	15,552,360.00	2.48%	-	0.00%	-	0.00%
7.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	49.07	$ 247,904.00	$ 12,164,649	4,257,627.15	0.68%	12,164,649.00	1.94%	-	0.00%	-	0.00%
7.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	94.36	$ 119,827.00	$ 11,306,876	-	0.00%	11,306,876.00	1.80%	-	0.00%	-	0.00%

7360

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
7.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	132.10	$ 63,600.00	$ 8,401,560	-	0.00%	8,401,560.00	1.34%	-	0.00%	-	0.00%
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	235.89	$ 311,111.00	$ 73,387,974	-	0.00%	73,387,974.00	11.71%	-	0.00%	-	0.00%
7.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6.00	$ 706,501.00	$ 4,239,006	2,708,253.83	0.43%	4,239,006.00	0.68%	-	0.00%	-	0.00%
7.8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1.00	$ 868,789.00	$ 868,789	868,789.00	0.14%	868,789.00	0.14%	-	0.00%	-	0.00%
7.9	CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,48 A=0,50 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	596.50	$ 134,844.00	$ 80,434,446	35,860,357.18	5.72%	56,304,112.21	8.98%	-	0.00%	-	0.00%
7.10	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD. PARA PISTA DE PATINAJE	ML	596.50	$ 702,956.00	$ 419,313,254	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 626,971,499								
8.00	REDES ELECTRICAS												
8.1	MASTIL METALICO TRONCO CONICO OCTOGONAL DE 16-18M FABRICADO EN SECCIONES EMBONADAS, BASE REDONDA 600MM EN 3/4 DE ESPESOR, CANASTILLA DE ANCLAJE CON 8 PERNOS DE 7/8" X 1500MM, CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA ALOJAR DE 1 A 8 REFLECTORES, PELDAÑOS DE ASCENSO Y LINEA DE VIDA A PARTIR DE LOS 4M,GALVANIZADO EN CALIENTE	UN	7.00	$ 19,532,812.00	$ 136,729,684	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.2	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 478,576.00	$ 3,350,032	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.3	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1.00	$ 11,356,112.00	$ 11,356,112	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	37.00	$ 261,587.00	$ 9,678,719	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2+2+8T AWG THHN	ML	433.00	$ 110,981.00	$ 48,054,773	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4+4+8T AWG THHN	ML	307.00	$ 95,228.00	$ 29,234,996	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+8T AWG THHN	ML	96.00	$ 75,487.00	$ 7,246,752	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8+8+8T AWG THHN	ML	165.00	$ 79,043.00	$ 13,042,095	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 2"	ML	140.00	$ 115,597.00	$ 16,183,580	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.10	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1.00	$ 16,738,866.00	$ 16,738,866	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.11	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	7.00	$ 3,439,120.00	$ 24,073,840	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 800W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	76.00	$ 5,681,030.00	$ 431,758,280	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 600W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	16.00	$ 4,128,559.00	$ 66,056,944	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.14	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA ILUMINACION PATINAJE QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 300A; BARRAJE PRINCIPAL DE 400A, 7 ARRANCADORES DIRECTOR CON PROTECCION DE 50A Y CONTACTOR TRIPOLAR DE 50A EN AC3; ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION, EN COFRE METALICO DE 100X60X40 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1.00	$ 23,478,564.00	$ 23,478,564	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.15	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	251.54	$ 38,501.00	$ 9,684,542	7,717,369.41	0.74%	9,684,542.00	0.93%	-	0.00%	-	0.00%
8.16	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	157.04	$ 192,100.00	$ 30,167,384	14,078,112.53	1.35%	14,078,112.53	1.35%	-	0.00%	-	0.00%
8.17	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.02	$ 641,273.00	$ 1,295,371	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.18	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.91	$ 1,377,156.00	$ 8,138,992	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	275.63	$ 53,399.00	$ 14,718,366	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.20	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	2,770.04	$ 8,513.00	$ 23,581,351	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.21	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.16	$ 936,416.00	$ 18,878,147	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.22	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	10.00	$ 604,401.00	$ 6,044,010	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.23	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	4.00	$ 1,152,233.00	$ 4,608,932	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.24	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	2.00	$ 1,927,585.00	$ 3,855,170	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.25	CANALIZACIÓN 18 DUCTOS DE 2" PVC	ML	5.00	$ 405,772.00	$ 2,028,860	-	0.00%	2,028,860.00	0.19%	-	0.00%	-	0.00%
8.26	CANALIZACIÓN 12 DUCTOS DE 2" PVC	ML	33.42	$ 345,633.00	$ 11,551,055	-	0.00%	11,551,055.00	1.11%	-	0.00%	-	0.00%
8.27	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 2" PVC	ML	135.11	$ 179,324.00	$ 24,228,466	18,171,349.50	1.74%	24,228,466.00	2.32%	-	0.00%	-	0.00%
8.28	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 2" PVC	ML	70.44	$ 159,278.00	$ 11,219,542	11,219,542.00	1.08%	11,219,542.00	1.08%	-	0.00%	-	0.00%

7361

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
8.29	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 2" PVC	ML	77.30	$ 149,255.00	$ 11,537,412	11,537,412.00	1.11%	11,537,412.00	1.11%	-	0.00%	-	0.00%
8.30	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	85.78	$ 61,373.00	$ 5,264,576	5,264,576.00	0.51%	5,264,576.00	0.51%	-	0.00%	-	0.00%
8.31	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	54.59	$ 34,320.00	$ 1,873,529	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	154.00	$ 73,037.00	$ 11,247,698	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	7.00	$ 437,575.00	$ 3,063,025	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	39.00	$ 59,617.00	$ 2,325,063	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 1,042,294,728								
					$ 8,601,168,535								
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
C	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META												
1.0	PRELIMINARES												
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	9,706.51	$ 4,349.00	$ 42,213,612	3,562,189.66	6.51%	17,178,409.93	31.41%	20,971,747.80	38.35%	41,946,105.00	76.71%
1.2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	33.43	$ 373,009.00	$ 12,469,691	-	0.00%	12,469,691.00	22.80%	-	0.00%	10,033,942.10	18.35%
					$ 54,683,303								
2.00	EXCAVACION Y RELLENOS												
2.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	42.05	$ 38,501.00	$ 1,618,967	-	0.00%	1,618,967.00	5.59%	1,617,042.00	5.58%	1,617,042.00	5.58%
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	238.98	$ 68,679.00	$ 16,412,907	8,069,679.28	27.85%	16,412,907.01	56.64%	16,345,602.00	56.40%	16,345,602.00	56.40%
2.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	44.16	$ 247,904.00	$ 10,947,441	4,437,031.01	15.31%	10,449,830.05	36.06%	8,924,544.00	30.80%	10,907,776.00	37.64%
					$ 28,979,315								
3.00	OBRAS EXTERIORES												
3.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	954.86	$ 98,611.00	$ 94,159,699	50,375,438.97	11.46%	79,094,147.17	18.00%	-	0.00%	-	0.00%
3.2	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,40 A=0,50. DESARROLLO 1,13 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	412.20	$ 134,844.00	$ 55,582,697	33,040,825.44	7.52%	51,877,183.87	11.80%	-	0.00%	-	0.00%
3.3	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD.	ML	412.20	$ 702,956.00	$ 289,758,463	172,245,308.56	39.19%	270,441,232.13	61.53%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 439,500,859								
4.00	FILTROS												
4.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8866.15	$ 14,681.00	$ 130,163,948	-	0.00%	130,163,948.00	31.64%	-	0.00%	-	0.00%
4.2	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1956.86	$ 143,702.00	$ 281,204,696	-	0.00%	281,204,696.00	68.36%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 411,368,644								
5.00	SUPERFICIE												
5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	8866.15	$ 4,394.00	$ 38,957,863	-	0.00%	-	0.46%	-	0.00%	-	0.00%
5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	545.95	$ 900,037.00	$ 491,375,200	-	0.00%	-	5.75%	-	0.00%	-	0.00%
5.3	PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA EN SITIO CERTIFICADA IAAF: SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 Y DIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPA ELÁSTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPA POROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM 1 A 4 MM DE COLOR ROJO.	M2	7799.35	$ 1,015,468.00	$ 7,919,990,346	-	0.00%	-	92.71%	-	0.00%	-	0.00%
5.4	DEMARCACION PISTA	ML	4257.65	$ 21,661.00	$ 92,224,957	-	0.00%	-	1.08%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 8,542,548,366								
6.00	ACCESORIOS												
6.1	BORDILLO ALUMINIO DESMONTABLE CERTIFICADO IAAF	ML	413.42	$ 254,313.00	$ 105,138,080	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6.2	OBSTACULO CARRERA CERTIFICADO IAAF	UN	8.00	$ 1,008,887.00	$ 8,071,096	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
6.3	TACOS DE SALIDA	UN	8.00	$ 560,635.00	$ 4,485,080	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 117,694,256								
7.00	PLACA EN CONCRETO												
7.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	95.25	$ 969,616.00	$ 92,355,924	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
7.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3892.26	$ 9,955.00	$ 38,747,448	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
7.3	SISTEMA MODULAR DEPORTIVO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TEJIDO EN REJILLA, TABLETAS DE 25 CM X 25 CMS X 12.5 MM	M2	127.26	$ 892,631.00	$ 113,596,221	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 244,699,593								
8.00	GRAMA SINTETICA												
8.1	RELLENO CON GRAVILLA	M3	167.17	$ 102,613.00	$ 17,153,815	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.2	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1,114.49	$ 116,423.00	$ 129,752,269	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					$ 146,906,084								
					$ 9,986,380,420								

7362

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						PROGRAMADO				EJECUTADO			
						MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%
19.00	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESCENARIOS DEPORTIVOS .**												
19.1	CERTFICACION RETIE REDES DE MEDIA				$ 3,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
19.2	CERTFICACION E INSPCCION DE TRANSFORMADOR				$ 949,266	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
19.3	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION				$ 2,975,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
19.4	RETIE USO FINAL				$ 7,735,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
19.5	CERTIFICACION RETILAP				$ 9,044,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
19.6	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA				$ 2,793,954	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
20.0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 297,493,828	24,410,919.94	7.53%	117,719,950.35	36.33%	59,615,192.51	18.40%	208,867,846.02	64.47%
					$ 323,991,048								
9.00	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE PATINAJE.**												
9.1	RETIE USO FINAL				$ 7,735,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.2	CERTIFICACION RETILAP				$ 9,044,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.3	PMA				$ 187,776,998	15,360,962.37	7.51%	74,077,164.34	36.21%	24,514,604.94	11.98%	110,892,024.02	54.21%
					$ 204,555,998								
9.00	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE ATLETISMO.**												
9.1	Diagnostico pista de Atletismo IAAF -Identificación de las materias primas IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Inspección visual IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Espesor de la pista EN 1969 -Absorción de impactos y Deformación vertical (12 puntos) EN 14808 y EN 14809 -Deslizamiento (6 puntos) EN 13036-4 -Planimetría de la superficie IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Drenaje IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications				$ 46,400,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.2	PMA				$ 187,776,998	16,969,711.81	7.25%	62,803,793.25	26.82%	7,199,732.83	3.07%	18,297,353.41	7.81%
					$ 234,176,998								
					$ 762,724,044								

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)					**$ 50,109,216,798**								
VALOR TOTAL					**$ 50,871,940,842**	**1,125,380,059**		**3,393,899,663**		**727,216,894**		**2,121,788,314**	

	PROGRAMADO				EJECUTADO			
Prog. Escenarios Deportivos	352,852,307	1.11%	1,198,546,565	3.76%	434,833,650	1.37%	1,399,266,587	4.39%
Prog. Pista de Patinaje	483,827,567	5.49%	1,261,638,293	14.33%	237,324,575	2.70%	623,373,906	7.08%
Prog. Pista de Atletismo	288,700,185	2.82%	933,714,805	9.14%	55,058,669	0.54%	99,147,821	0.97%
Programado Contrato	**1,125,380,059**	**2.21%**	**3,393,899,663**	**6.67%**	**727,216,894**	**1.43%**	**2,121,788,314**	**4.17%**

1,390,751,819.46
392,530,838
998,220,981

7363

CONTROL DE CALIDAD

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

7364

NHSQ INGENIERIA
NIt: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 213	01/JULIO/2023	F-LAB-018-V8


PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FUENTE DE MATERIAL:	—
DIRIGIDO A:	TRITUMAX S.A.S.	DESTINO:	SUBBASE GRANULAR
NIT:	901633050-3	O.T./MUESTRA Nº:	CAR-120-9131-23
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	FECHA DE RECEPCIÓN:	25-sep-23
DEPARTAMENTO:	META	FECHA DE ENSAYO:	26-sep-23
TIPO DE MATERIAL:	SUBBASE GRANULAR	FECHA DE EMISIÓN:	27-sep-23


CONDICIONES AMBIENTALES:				EQUIPOS UTILIZADOS:			
TEMPERATURA °C:	32.0	HUMEDAD RELATIVA %:	54.0	HORNO Nº:	EQ-001	BALANZA Nº	EQ-033 Y EQ-034

Nº DE RECIPIENTE:	360
MASA DEL RECIPIENTE	767.9 g
MASA INICIAL SECA + RECIPIENTE	18760.1 g
MASA INICIAL SECA	17992.2 g
MASA FINAL SECA	17987.0 g

RESULTADOS								
NORMA	MODULO DE FINURA	TAMAÑO MAXIMO DEL MATERIAL		TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL MATERIAL		D10 (mm)	
ART-320-22						D30 (mm)	
BANDA GRANULOMETRICA	5.6	Pulg	mm	Pulg	mm	D60 (mm)	
SBG-38		2"	50.0	1 -1/2"	37.5	Cu	
						Cc	

TAMIZ		MASA RETENIDA (g)	PORCENTAJE RETENIDO (%)	PORCENTAJE RETENIDO ACUMULADO (%)	PORCENTAJE PASA (%)	PARAMETROS DE LA NORMA	
Pulgadas	mm					INFERIOR	SUPERIOR
2 -1/2"	63.0	0.0	0.00%	0.00	100%	100%	100%
2"	50.0	0.0	0.00%	0.00	100%	100%	100%
1 -1/2"	37.5	846.4	4.71%	4.71	95%	100%	100%
1"	25.0	2835.0	15.76%	20.47	80%	75%	95%
1/2"	12.5	4489.4	24.96%	45.43	55%	55%	85%
3/8"	9.5	817.1	4.54%	49.97	50%	45%	75%
Nº4	4.75	1583.3	8.80%	58.77	41%	30%	60%
Nº10	2.00	1212.2	6.74%	65.51	34%	20%	45%
Nº40	0.425	3632.0	20.19%	85.70	14%	8%	30%
Nº200	0.075	2296.6	12.77%	98.47	2%	2%	15%
	FONDO	275.0	1.53%	100.00	0%	CALCULO ERROR	0.03%
	TOTAL	17987.0	100.00%			GRADO DE ACEPTACIÓN	< 0.3%

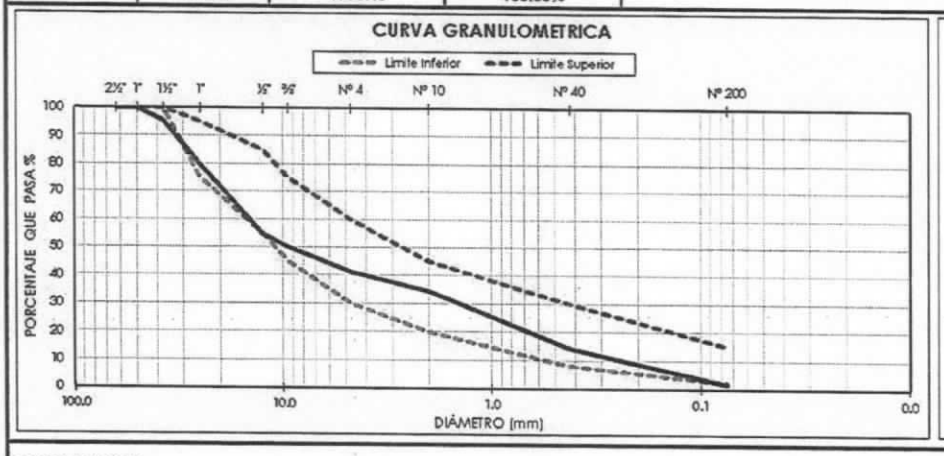

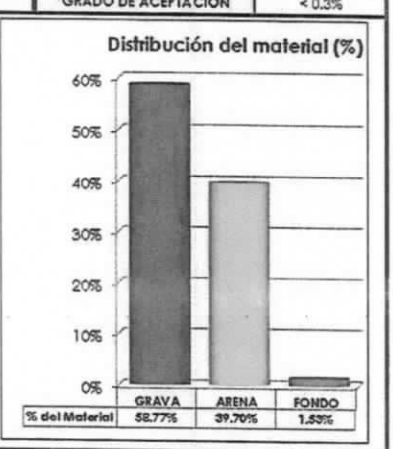

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
CARLOS EDUARDO ROMERO BENITEZ	
Líder de Laboratorio	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
PROCESÓ	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio
Ing. ANA LILIANA PAN URRIOLA	
Analista Especialista	

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO BRINDA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

"FIN DEL INFORME"

7365

NHSQ SAS INGENIERIA
Nit: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 213	01/JULIO/2023	f-LAB-018-V8


PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FUENTE DE MATERIAL:	—
DIRIGIDO A:	TRITUMAX S.A.S.	DESTINO:	SUBBASE GRANULAR
NIT:	901 633050-3	O.T./MUESTRA Nº:	CAR-120-9131-23
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	FECHA DE RECEPCIÓN:	25-sep-23
DEPARTAMENTO:	META	FECHA DE ENSAYO:	26-sep-23
TIPO DE MATERIAL:	SUBBASE GRANULAR	FECHA DE EMISIÓN:	27-sep-23


CONDICIONES AMBIENTALES:				EQUIPOS UTILIZADOS:			
TEMPERATURA °C:	32.0	HUMEDAD RELATIVA %:	54.0	HORNO Nº:	EQ-001	BALANZA Nº	EQ-033 Y EQ-034

Nº DE RECIPIENTE:	380
MASA DEL RECIPIENTE	767.9 g
MASA INICIAL SECA + RECIPIENTE	18760.1 g
MASA INICIAL SECA	17992.2 g
MASA FINAL SECA	17987.0 g

RESULTADOS						D10 (mm)	
NORMA	MODULO DE FINURA	TAMAÑO MAXIMO DEL MATERIAL		TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL MATERIAL		D30 (mm)	
ART-320-22						D60 (mm)	
BANDA GRANULOMETRICA	5.6	Pulg	mm	Pulg	mm	Cu	
SBG-50		2"	50.0	1 -1/2"	37.5	Cc	

TAMIZ		MASA RETENIDA (g)	PORCENTAJE RETENIDO (%)	PORCENTAJE RETENIDO ACUMULADO (%)	PORCENTAJE PASA (%)	PARAMETROS DE LA NORMA	
Pulgadas	mm					INFERIOR	SUPERIOR
2 -1/2"	63.0	0.0	0.00%	0.00	100%	100%	100%
2"	50.0	0.0	0.00%	0.00	100%	100%	100%
1 -1/2"	37.5	846.4	4.71%	4.71	95%	70%	95%
1"	25.0	2835.0	15.76%	20.47	80%	60%	90%
1/2"	12.5	4489.4	24.96%	45.43	55%	45%	75%
3/8"	9.5	817.1	4.54%	49.97	50%	40%	70%
Nº4	4.75	1583.3	8.80%	58.77	41%	25%	55%
Nº10	2.00	1212.2	6.74%	65.51	34%	15%	40%
Nº40	0.425	3632.0	20.19%	85.70	14%	6%	25%
Nº200	0.075	2296.6	12.77%	98.47	2%	2%	15%
	FONDO	275.0	1.53%	100.00	0%	CALCULO ERROR	0.03%
	TOTAL	17987.0	100.00%			GRADO DE ACEPTACIÓN	< 0.3%

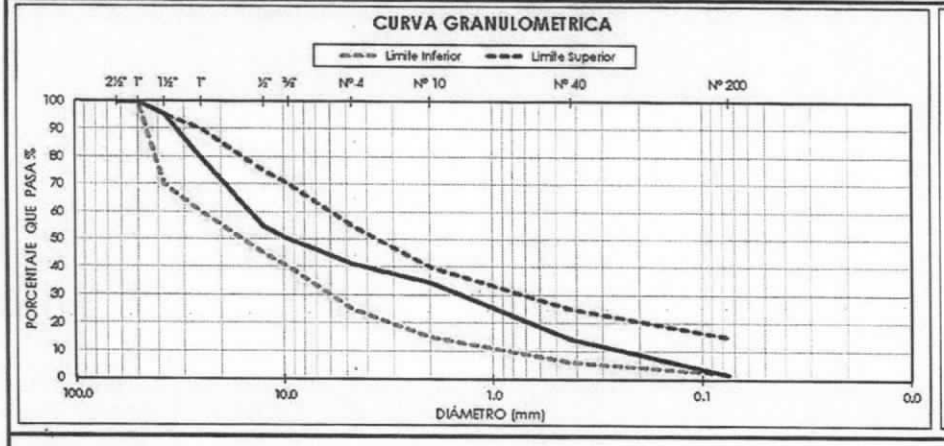

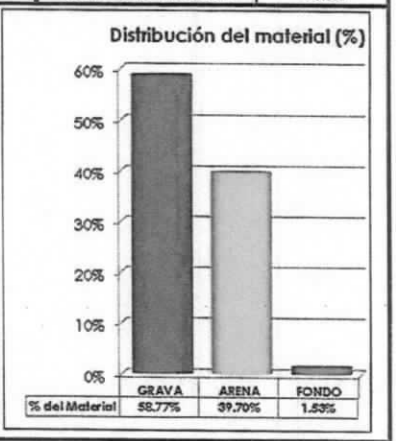

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
CARLOS EDUARDO ROMERO BENITEZ	
Lider de Laboratorio	
PROCESÓ	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Ing. ANA LILIANA PAN URRIOLA	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio
Analista Especialista	

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE; POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO BRINDA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

"FIN DEL INFORME"

-7366

NHSQ SAS INGENIERIA
NIt: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 161	01/JUIO/2023	F-LAB-012-V7

PROYECTO:	CONSTRUCCIÒN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.				
DIRIGIDO A:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	NIT:	901682871-2	O.T./MUESTRA N°	DEN-001-731-9013-23
CONTACTO:	ING. YEISON GOMEZ	EMAIL:	escenariosdeportivos2023@gmail.com	FECHA DE EMISIÓN:	30/08/2023
TIPO DE MATERIAL:	MATERIAL GRANULAR			MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO
FUENTE DE MATERIAL:	RIO GUATIQUIA			DEPARTAMENTO:	META

SITIO DE TOMA	NÚMERO DE ENSAYO			MG-1	MG-2	MG-3	--	--	--	--
	LOCALIZACIÓN			ZAPATA # 2	ZAPATA # 4 GRADERIAS	ZAPATA # 4	--	--	--	--
	FECHA DEL ENSAYO:			30-ago-23	30-ago-23	30-ago-23	--	--	--	--
	DESCRIPCIÓN/CAPA			RELLENO	RELLENO	RELLENO	--	--	--	--
DATOS DE ENTRAL	MASA INICIAL DEL FRASCO + ARENA	(g)		7300	7146	7080	--	--	--	--
	MASA FINAL DEL FRASCO + ARENA	(g)		1600	1570	1520	--	--	--	--
	MASA DE LA ARENA USADA	(g)		5700	5576	5560	--	--	--	--
	CONSTANTE DEL CONO DE ARENA	--		1620	1620	1620	--	--	--	--
	DENSIDAD DE LA ARENA	(g/cm³)		1,340	1,340	1,340	--	--	--	--
	VOLUMEN DEL HUECO	(cm³)		3045	2952	2940	--	--	--	--
	MASA MAT. PASA ¾" NETO HUMEDO	(g)		4908	4988	4756	--	--	--	--
	MASA MAT. RETIENE ¾" NETO HUMEDO	(g)		1972	1772	1987	--	--	--	--
	MASA DEL SUELO EXTRAIDO HUMEDO	(g)		6880	6760	6743	-	-	-	-
	HUMEDAD NATURAL	(%)		7,50	6,80	7,00	--	--	--	--
	MASA MAT. PASA ¾" SECO	(g)		4566	4670	4445	--	--	--	--
	MASA MAT. RETIENE ¾" SECO	(g)		1834	1659	1857	--	--	--	--
	MASA DEL SUELO EXTRAIDO SECO	(g)		6400	6330	6302	--	--	--	--
CALCULO DE LA DENSIDAD	DENSIDAD MAX. LAB (PROCTOR)	(g/cm³)		2.149	2,149	2.149	--	--	--	--
		(KN/m³)		21,08	21,08	21,08	--	--	--	--
		(lbf/pie³)		134,2	134,2	134,2	--	--	--	--
	DENSIDAD HUMEDA EN EL TERRENO	(g/cm³)		2.2596	2,2898	2.2933	-	-	-	-
	DENSIDAD SECA EN EL TERRENO	(g/cm³)		2,1020	2,1440	2.1433	--	--	--	--
		(KN/m³)		20,61	21,03	21,02	--	--	--	--
		(lbf/pie³)		131,2	133,9	133,8	--	--	--	--
	PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN	(%)		**97,8**	**99,8**	**99,7**	--	--	--	--
REGIDA	PORCENTAJE MATERIAL SECO PASA ¾"	(%)		71,34	73,79	70,53	--	--	--	--
	PORCENTAJE MATERIAL SECO RETIENE ¾"	(%)		28,66	26,21	29,47	--	--	--	--
	HUMEDAD CORREGIDA	(%)		5,92	5,54	5,53	--	--	--	--
	MASA MAT. EXTRAIDO SECO CORREGIDO	(g)		6496	6405	6390	--	--	--	--
CALCULO DE LA DENSIDA.	DENSIDAD SECA EN EL TERRENO CORREGIDA	(g/cm³)		2,1333	2,1696	2,1731	--	--	--	--
	GRAVEDAD ESPECIFICA MAT. RETIENE ¾"	(g/cm³)		2,63	2,63	2,63	-	-	-	-
	DENSIDAD MÁXIMA CORREGIDA (PROCTOR)	(g/cm³)		2,2566	2,2470	2,2598	--	--	--	--
	PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN	(%)		**94,5**	**96,6**	**96,2**	--	--	--	--
	PORCENTAJE MEDIO DE COMPACTACIÓN CORREGIDO (%)							**95,8**		

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

TIPO DE MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	K(90)= 0,819	Gci= 95,8	CUMPLE:	SI
RELLENO (No clasifica como A-1, A-2-4 o A-3)	**GCI(90) ≥ 95**	**DESVIACIÓN= 1,07**	**Gci(90)= 95**		

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN	
Auxiliar de Laboratorio	
PROCESÓ	
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO	**Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO**
Analista de Ingeniería	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO BRINDA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

"FIN DEL INFORME"

7367

NHSQ SAS INGENIERIA
NIt: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 161	01/JULIO/2023	F-LAB-012-V7

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.				
DIRIGIDO A:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	**NIT:**	901682871-2	**O.T./MUESTRA N°**	DEN-002-731-9109-23
CONTACTO:	ING. YEISON GOMEZ	**EMAIL:**	escenariosdeportivos2023@gmail.com	**FECHA DE EMISIÓN:**	21/09/2023
TIPO DE MATERIAL:	MATERIAL GRANULAR			**MUNICIPIO:**	VILLAVICENCIO
FUENTE DE MATERIAL:	RIO GUATIQUIA			**DEPARTAMENTO:**	META

SITIO DE TOMA	NÚMERO DE ENSAYO		MG-4	MG-5	MG-6	MG-7	--	--	--
	LOCALIZACIÓN		ZAPATA Z4- D'7'	ZAPATA Z3 -D8	ZAPATA Z4- 7'D'	ZAPATA 1 -Z1- A4	--	--	--
	FECHA DEL ENSAYO:		21-sep-23	21-sep-23	21-sep-23	21-sep-23	-	-	-
	DESCRIPCIÓN/CAPA		RELLENO	RELLENO	RELLENO	RELLENO	-	-	-
DATOS DE ENTRA.	MASA INICIAL DEL FRASCO + ARENA	(g)	7208	7062	6910	6900	-	-	-
	MASA FINAL DEL FRASCO + ARENA	(g)	1772	1800	1650	1680	-	-	-
	MASA DE LA ARENA USADA	(g)	5436	5262	5260	5220	-	-	-
	CONSTANTE DEL CONO DE ARENA	--	1606	1606	1606	1606	-	-	-
	DENSIDAD DE LA ARENA	(g/cm³)	1,350	1,350	1,350	1,350	-	-	-
	VOLUMEN DEL HUECO	(cm³)	2837	2708	2707	2677	-	-	-
	MASA MAT. PASA ¾" NETO HUMEDO	(g)	3618	3756	3538	3650	-	-	-
	MASA MAT. RETIENE ¾" NETO HUMEDO	(g)	3012	2432	2778	2500	-	-	-
	MASA DEL SUELO EXTRAIDO HUMEDO	(g)	6630	6188	6316	6150	-	-	-
	HUMEDAD NATURAL	(%)	7.00	7,50	6.50	6.00	-	-	-
	MASA MAT. PASA ¾" SECO	(g)	3381	3494	3322	3443	-	-	-
	MASA MAT. RETIENE ¾" SECO	(g)	2815	2262	2608	2358	-	-	-
	MASA DEL SUELO EXTRAIDO SECO	(g)	6196	5756	5931	5802	-	-	-
CALCULO DE LA DENSIDAD	DENSIDAD MAX. LAB (PROCTOR)	(g/cm³)	2.149	2.149	2.149	2.149	-	-	-
		(KN/m³)	21,08	21,08	21,08	21,08	-	-	-
		(lbf/pie³)	134,2	134,2	134,2	134,2	-	-	-
	DENSIDAD HUMEDA EN EL TERRENO	(g/cm³)	2,3369	2,2850	2,3335	2,2973	-	-	-
	DENSIDAD SECA EN EL TERRENO	(g/cm³)	2,1841	2,1255	2,1911	2,1673	-	-	-
		(KN/m³)	21,42	20,84	21,49	21,25	-	-	-
		(lbf/pie³)	136,4	132,7	136,8	135,3	-	-	-
	PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN	(%)	**101,6**	**98,9**	**102,0**	**100,9**	--	--	--
CALCULO DE LA DENSID. CORREGIDA	PORCENTAJE MATERIAL SECO PASA ¾"	(%)	54,57	60,70	56,02	59,35	-	-	-
	PORCENTAJE MATERIAL SECO RETIENE ¾"	(%)	45,43	39,30	43,98	40,65	-	-	-
	HUMEDAD CORREGIDA	(%)	4,73	5,34	4,52	4,37	-	-	-
	MASA MAT. EXTRAIDO SECO CORREGIDO	(g)	6331	5874	6043	5893	-	-	-
	DENSIDAD SECA EN EL TERRENO CORREGIDA	(g/cm³)	2,2314	2,1691	2,2326	2,2011	-	-	-
	GRAVEDAD ESPECIFICA MAT. RETIENE ¾"	(g/cm³)	2,63	2,63	2,63	2,63	-	-	-
	DENSIDAD MÁXIMA CORREGIDA (PROCTOR)	(g/cm³)	2,3247	2,2994	2,3167	2,3049	--	--	--
	PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN	(%)	**96,0**	**94,3**	**96,3**	**95,5**	--	--	--
	PORCENTAJE MEDIO DE COMPACTACIÓN CORREGIDO (%)						**95,5**		

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

TIPO DE MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	K(90)= 0,819	Gci= 95,5	CUMPLE:		
RELLENO (No clasifica como A-1, A-2-4 o A-3)	**GCI(90) ≥ 95**	**DESVIACIÓN= 0,86**	**Gci(90)= 95**			

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN	
Auxiliar de Laboratorio	
PROCESÓ	
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO	**Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO**
Analista de Ingeniería	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO BRINDA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

OFICINAS Y LABORATORIO: Carrera 34 N° 21-34 Barrio San Benito, Villavicencio – Meta. Tels. 3115021033-3115979859-6733005. E-mail: laboratorio@nhsqingenieria.com – www.nhsqingenieria.com

"FIN DEL INFORME"

7368

ESTADO DEL TIEMPO

7369

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Código:F006

Versión: 1

PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

Fecha:25/05/2023

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

CONVENCIONES

TS: Tiempo Seco **LLV:** Llovizna **LL:** Lluvia

LLF: Lluvia Fuerte

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HORA	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
07:00 a 07:30	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS
07:30 a 08:00	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	LL
08:00 a 08:30	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		LL	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	LL	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	LL
08:30 a 09:00	TS	TS		TS	LL	TS	TS	TS	TS		LL	TS	TS	LL	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	LL
09:00 a 09:30	TS	TS		TS	LL	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	LL	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	LL
09:30 a 10:00	TS	TS		TS	LL	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	LL	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	LL
10:00 a 10:30	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	LL	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	LL
10:30 a 11:00	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	LL	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	LL
11:00 a 11:30	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS
11:30 a 12:00	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS
12:00 a 12:30	TS			TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS	
12:30 a 01:00	TS			TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS	
01:00 a 01:30	TS			TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS	
01:30 a 02:00	TS			TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS	
02:00 a 02:30	TS			TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS	
02:30 a 03:00	TS			TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS	
03:00 a 03:30	TS			TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS	
03:30 a 04:00	TS			TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	LL	TS	
04:00 a 04:30	TS			TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS	LL	TS	LL	TS	
04:30 a 05:00	TS			TS	TS	TS	TS	LL	TS		TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS	LL	TS	LL	TS	

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL TIEMPO EN LA NOCHE QUE AFECTAN LA OBRA

FECHA	OBSERVACIONES
4/09/2023	LLUVIA EN LA MADRUGADA
7/09/2023	LLUVIA EN LA NOCHE
11/09/2023	LLUVIA EN LA NOCHE
15/09/2023	LLUVIA EN LA NOCHE
29/09/2023	LLUEVE EN LA NOCHE

Vo.Bo.	Elaboró:	Observaciones:
ING. YEISON E GOMEZ G	**ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL**	
Director de obra **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023**	Residente de obra **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023**	

7370

INFORME DE ANTICIPO

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

7371

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

CONTRATO N°	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

INFORME N°	3	PERIODO INFORME:	1 de septiembre de 2023	a	30 de septiembre de 2023

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
NIT:	901682871-2
CORREO ELECTRONICO:	Contabilidadedeportivos@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
CORREO ELECTRONICO:	interescenariosc@gmail.com
SUPERVISOR:	BIBIANA PAN MERCHAN
APOYO A LA SUPERVISION:	FLOWER EMILIO PEÑA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	

VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Días	0
FECHA DE INICIACION:	10 de mayo de 2023				
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VIGENCIA ACTUAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Días	0
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VALOR DEL PROYECTO					
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL		VALOR ($) ACTUAL
1	2022005500094	10.220.557.418,00	0,00	$	10.220.557.418,00
2	2022005500022	8.805.724.533,00	0,00	$	8.805.724.533,00
3	2022005500024	31.845.658.891,00	0,00	$	31.845.658.891,00
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$	50.871.940.842,00

INFORMACIÓN DE ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO 1:	$ 14.498.503.139,60		
FECHA PAGO ANTICIPO	29 de junio de 2023	No. COMPROBANTE:	01976-01975-01974-01973-01972
FIDUCIA (SI APLICA):	ALIANZA FIDUCIARIA		
BANCO :	BANCOLOMBIA - FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS		
CUENTA DE AHORROS :	4000006842		

INFORME DE INVERSIÓN

ITEM	CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
1	ORDEN DE GIRO 5 - 434235	20 de septiembre de 2023	GRUPO VIARQ LTDA	$ 907.601.278,00	3	ANTICIPO CONTRATO No 02
TOTAL						$ 907.601.278,00

Anexar: Respectivos Soportes y Extracto Cuenta Bancaria Registrada.

7372

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANTICIPO INICIAL	ANTICIPO ADICIONAL	TOTAL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO ANTICIPO
1	Mano de obra	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 12.323.727.668,66	$ -	$ 12.323.727.668,66	$ -	$ 4.175.259.147,36
3	Transporte	$ 1.449.850.313,96	$ -	$ 1.449.850.313,96	$ 907.601.278,00	$ 542.249.035,96
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40
5	FONSET 5%	$ 763.079.113,00		$ 763.079.113,00		$ -
TOTALES		$ 15.261.582.252,60	$ -	$ 15.261.582.252,60	$ 907.601.278,00	$ 5.442.433.340,30

Nota: Se anexa copia de Tarjeta Profesional y vigencia de la Tarjeta Profesional de los contadores que intervienen en el presente informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, 13 de octubre de 2023

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 278207-T

Firma
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 175215-T

7373

Alianza Fiduciaria

t: (601) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
CODIGO SIFI 113392

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 4/17/2023 rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7374

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000006842

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTI

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	6,350,728,999.29	*SALDO PROMEDIO*	$	6,019,319,438
TOTAL ABONOS	$	7,702,153.90	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	911,233,184.14	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,696,153.90
SALDO ACTUAL	$	5,447,197,969.05	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,339,911.10	6,353,068,910.39
19/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,006,000.00	6,354,074,910.39
19/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00	6,357,074,910.39
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			130,102.32	6,357,205,012.71
20/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,256.34	6,357,203,756.37
20/09	PAGO A PROV GRUPO VIARQ LTDA			-907,601,278.00	5,449,602,478.37
20/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,630,411.09	5,445,972,067.28
20/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-238.71	5,445,971,828.57
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,226,140.48	5,447,197,969.05
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7375

INFORME PMT SEPTIEMBRE/2023

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contáctenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

7376

INFORME MENSUAL

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO



CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
NIT: 901682871-2

CONTRATO N° 106 de 2023

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2023

VILLAVICENCIO META

CONTENIDO

Tabla 2
1 INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO GENERAL 4
2.1 Objetivos Específicos 4
3. ALCANCE 5
4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 5
5. CATEGORIA DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 6
6. CONOCIMIENTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA 6
6.1 Clasificación zona de Influencia 7
6.2 Localización del Proyecto 8
7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE ZONA DE INFLUENCIA 9
8. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO 14
Tabla 2 Información legal del proyecto 14
9. ATENCIÓN A USUARIOS Y HABITANTES DE LA ZONA 15
10. PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 15
10.1 Información y divulgación del plan de manejo de tránsito 16
10.2 Atención vecinos y usuarios 17
10.3 Medios de difusión a utilizar. 18
10.4 Quejas y reclamos 18
10.5 Implementación del plan manejo de tránsito 18
11. ACTIVIDADES DE OBRA EN EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 20
11.1 Instalación de señalización PMT. 22
11.2 Supervisión por parte del consorcio 23
11.3 Charlas de seguridad a trabajadores 24
11.4 Mantenimiento de señalización en obra 25
11.5 Puntos de emergencia en obra 25
12. DISPONIBILIDAD E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA EL PMT 26
12.1 Características de la señalización. 26
12.2 Equipo y maquinaria 27
12.3 Señalización informativa de obra. 28
13. COORDINACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL PLAN (PMT). 29

1 INTRODUCCIÓN

En el presente documento se presenta el informe mensual del mes de **septiembre** de la implementación del plan de manejo de tránsito realizado por el Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023, del Contrato de obra No. 106 del 2023. "**CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".**

La implementación se realiza de acuerdo con la viabilidad otorgada por la secretaria de Movilidad de la Alcaldía Municipal de Villavicencio-Meta, mediante oficio **1703-19.18/0680 del17 de mayo del 2023** y lo emanado en la resolución No.1885 de 2015 "Manual de Señalización adoptado por el Ministerio del Transporte".

El informe se ha estructurado sobre los datos generales, tales como, los responsables del proyecto, la descripción de este, los tiempos, rutas y movimientos, así como las actividades a realizar, seguido de las características generales del entorno, la características físicas y operativas del área del proyecto, la característica del tránsito y la forma de ejecución sin generar mayores impactos en la comunidad. Para la definición de este PMT, se tiene como base de referencia el documento correspondiente al Manual de señalización 2015 y el Nuevo Código de Tránsito 2002, el cual se asume como viable y se acoge para la elaboración del documento único a presentar, realizando los ajustes necesariospara garantizar los requerimientos, de la **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta.**

2. OBJETIVO GENERAL

Mitigar los impactos generados por la obra durante la **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta,** con el fin de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil en los desplazamientos para los trabajadores de la obra, visitantes y vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito.

El proyecto no contempla la intervención de la calzada o algún elemento de su diseño trasversal, debido a esto no se presenta ningún tipo de diseño de señalización horizontal y/o vertical definitivo ya que la señalización a utilizar será de manera temporal de acuerdo al capítulo 4 del Manual de señalización vial 2015.

El PMT es una herramienta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado en las condiciones normales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas y comunidad en general) causados por la ejecución de una obra vial o aquellas que intervenganel espacio público, de manera que siempre se favorezca la seguridad de los usuarios de la vía, de los ciudadanos en general y de quienes participan en la construcción de la obra.

2.1 Objetivos Específicos

- Procurar la seguridad e integridad de los conductores, y trabajadores de laobra.
- Evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales.
- Ofrecer a los usuarios y personal una señalización clara y de fácil interpretación.
- Prestar atención continua a la seguridad en las vías dentro del área de influenciade la obra en ejecución.

3. ALCANCE

Identificar los impactos que pueda generar la **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta,** en el tránsito y vecinos del sector, e implementar medidas que conlleven a la mitigación de los mismos, mediante la implementación de señalización adecuada de acuerdoal Manual de señalización Vial.

4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

- Las estrategias para el manejo temporal del tránsito por obras civiles o constructivas debenapoyarse en los siguientes principios fundamentales:

- Prevención de accidentes viales en el área de trabajo

- La seguridad de los trabajadores en áreas de control de tránsito debe ser un elemento fundamental y de alta prioridad en todo el proyecto.

- Establecer criterios para mantener la limpieza en las zonas aledañas.

- Seleccionar y cuantificar los dispositivos que serán necesarios durante el desarrollo del proyecto.

- Diseñar, programar e implementar coherentemente las rutas alternativas y/o desvíos requeridos para la ejecución de la obra de manera que no afecten lo mínimo posible al transporte público y particular.

5. CATEGORIA DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Señalización Vial 2015, el PMT del **Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023** se clasifica como categoría 1, de acuerdo al numeral **4.5.4.1.** Obras de Interferencias Mínimas

"Son aquellas en que los espacios de circulación son muy poco afectados por las intervenciones y no hay afectación sobre zonas aledañas. Hay poca o nula intervención en los espacios de circulación peatonal. El impacto de la obra sobre el tránsito de vehículos puede ser mitigado por la misma infraestructura a intervenir sin esperar que los flujos sean desviados. La señalización necesaria se puede lograr siguiendo uno o más de los esquemas".

6. CONOCIMIENTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA

El Complejo Deportivo Villa Olímpica se encuentra localizado en la Comuna Número 5 de la ciudad de Villavicencio, la cual está compuesta por los barrios Popular, Dos Mil, Olímpico, Villa Ortiz, Camelias, Cataluña, Bello Horizonte, Nueva Floresta, Estero, Bochica, Macunaima, Ariguani, Vizcaya, Hacaritama, Villa Mélida, Ciudadela San Antonio, Aguas Claras, Danubio, Doña Luz, Remanso, Menegua y Buenos Aires.

El Complejo Deportivo se encuentra en un polígono delimitado de Sur a Norte por la Avenida los Maracos o Carrera 18 y la Calle 25 y de Oriente a Occidente por la Carrera 16 y la Avenida Carrera 19, respectivamente. En la actualidad hay accesibilidad a las instalaciones del Complejo Deportivo por la Calle 25 y la Carrera 16.

6.1 Clasificación zona de Influencia

Con base en la información descrita en el numeral anterior, la clasificación de las vías que actualmente existen en el área de influencia del proyecto fue clasificada como se observa a continuación (véase TABLA).

VIA	DESDE	HASTA	CLASIFICACION VIAL	PERFIL VIAL
Av. Cra 19	Calle 15	Calle 25	Vía arterial	V-3
Cra. 18 av. maracos	Av. Cra. 19	Cra. 16	Vía arterial	V-3
Calle 25	Av. Cra. 19	Cra. 16	Vía Local	V-4
Cra. 16	Calle 25	Cra. 18	Vía Local	V-5
Calle 15	Av. Cra. 19	Cra. 16	Vía Local	V-5

Tabla 1 Clasificación vial en el área de influencia

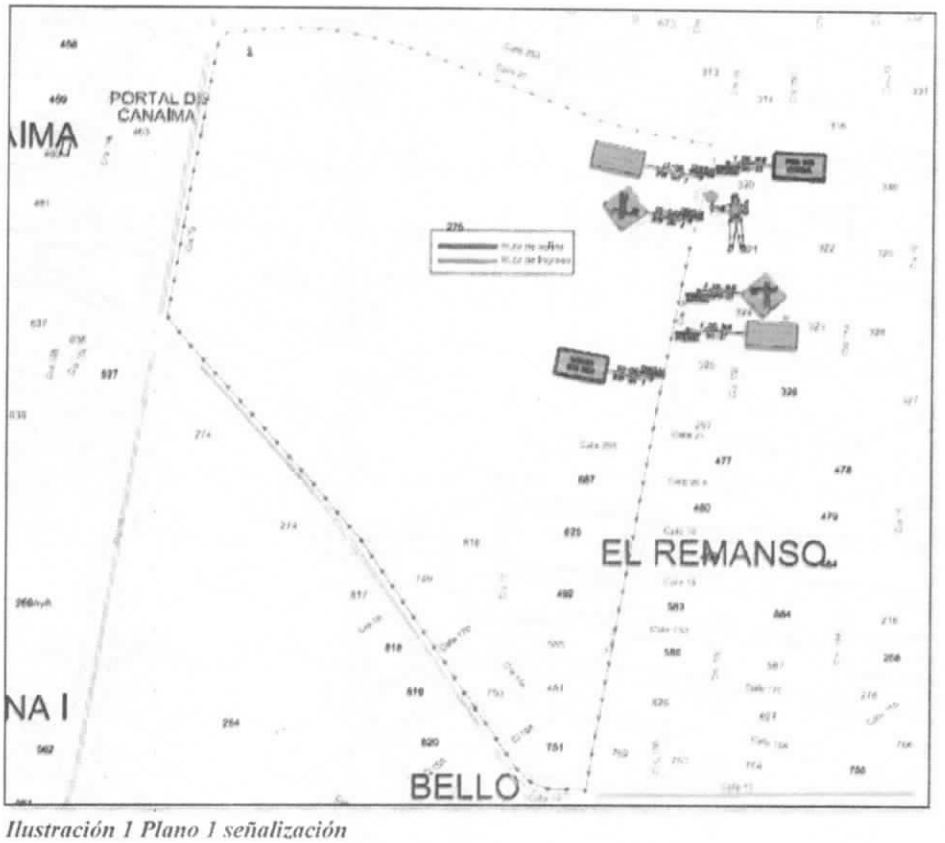


Ilustración 1 Plano 1 señalización

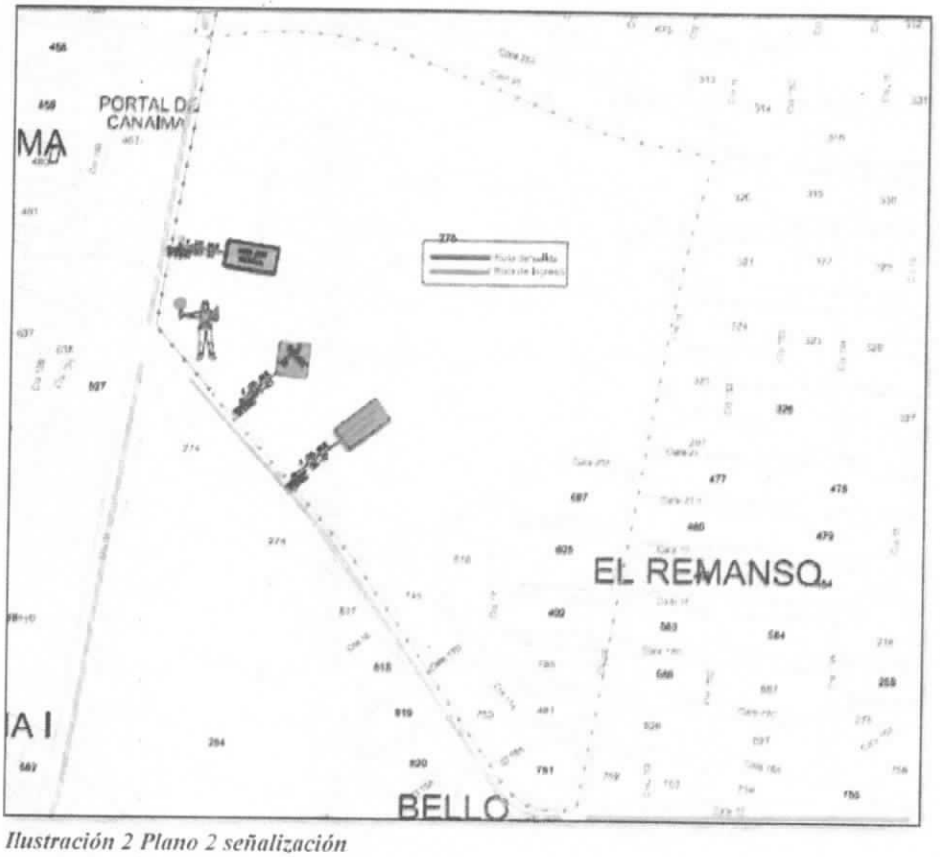


Ilustración 2 Plano 2 señalización

6.2 Localización del Proyecto

La zona donde se está ejecutando la obra del presente plan de manejo de tránsito, se encuentra ubicada en un polígono delimitado de Sur a Norte por la Avenida los Maracos o Carrera 18 y la Calle 25 y de Oriente a Occidente por la Carrera 16 y la Avenida Carrera 19, respectivamente. En la actualidad hay accesibilidad a las instalaciones del Complejo Deportivo por la Calle 25 y la Carrera 16.

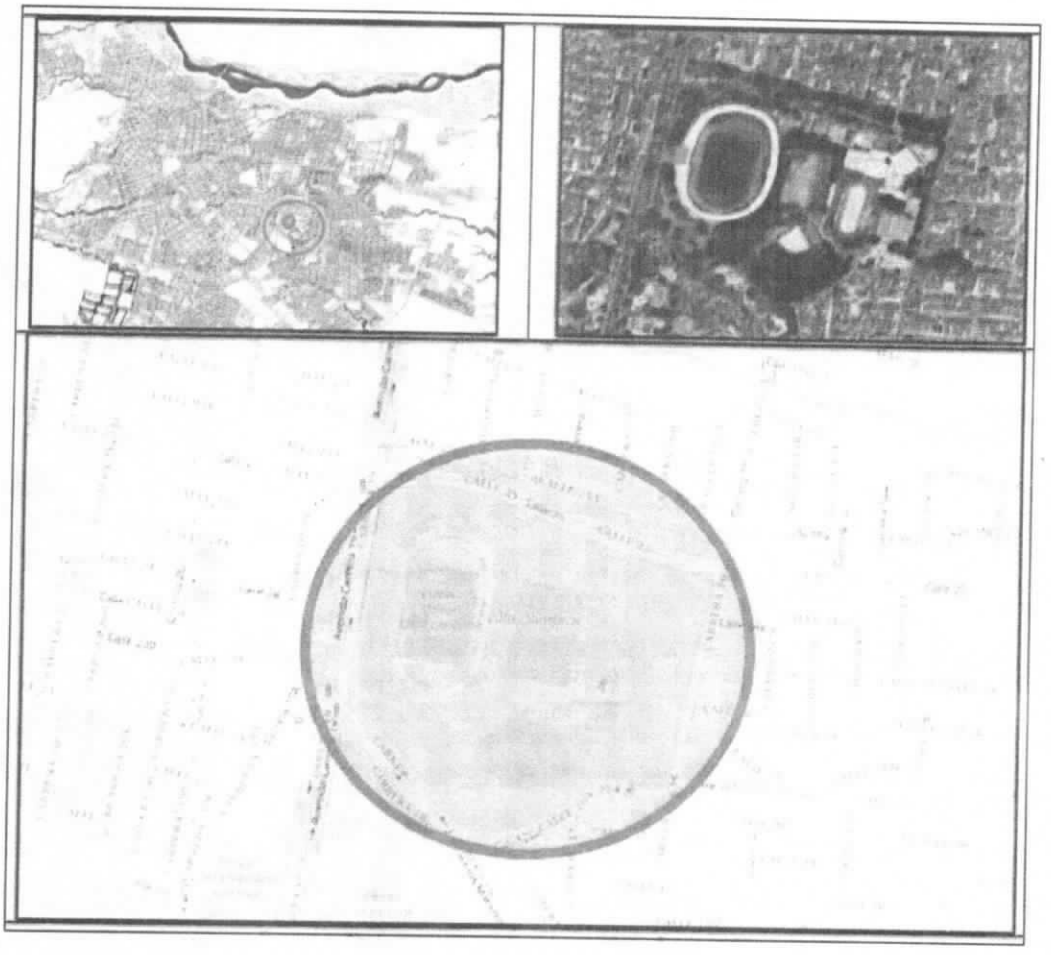


Ilustración 3 Localización de proyecto

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE ZONA DE INFLUENCIA

Los segmentos viales por donde se realizará el ingreso y salida de maquinaria corresponden a la Carrera 16 para las actividades de la construcción de los escenarios multipropósitos y la Carrera 18 (Avenida maracos) para el desarrollo de las actividades de construcción de la pista de atletismo. las cuales como se menciona anteriormente se ubican en la comuna 5. las características de estas vías localizadas dentro del área de influencia de la zona a intervenir se indican a continuación.

Además, se realiza una descripción de la infraestructura vial que se encuentra dentro del área de influencia.

A continuación, se presenta la descripción y caracterización de las vías principales que estándirectamente relacionadas con el funcionamiento del proyecto.

- **AVENIDA CARRERA 19**

La Avenida Carrera 19 entre la Calle15 y la Calle 25 pertenece a la malla vial arterial de la ciudad de Villavicencio, con un perfil V-3 de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT para la capital del departamento del Meta. Presenta dos calzadas vehiculares con dos carriles de circulación cada una de estas, con una carpeta de rodadura asfáltica (pavimento flexible), para uso del tránsito mixto. Presenta doble circulación norte – sur y viceversa, con un ancho promedio por calzada de aproximadamente 9,0 metros y separador central en material blando con un ancho aproximado de 1,0 metros. En ambos costados de la vía cuenta con infraestructura propia para la movilidad peatonal, con anchos que varía entre los 5 y 6 metros.

En cuanto a señalización vertical, señalización horizontal y controles semafóricos, sobre la Avenida Carrera 19 entre la Calle 15 y la Calle 25, se localizado dos intersecciones semaforizadas, una a la altura de la Calle 15 o Carrera 18 y la segunda sobre la Calle 25, las cuales permiten el paso seguro de peatones; y así mismo las maniobras vehiculares presentes en cada una de las intersecciones.

La demarcación se encuentra en regulares condiciones, las marcas viales presentan un desgaste significativo y sin retrorreflexión; la señalización vertical se encuentra en regulares condiciones.

En la actualidad, lo concurrido de este corredor hace que por este transiten una cantidad significativa de rutas de transporte público ya que este es un punto de gran concurrencia. A continuación, en la tabla se presentan las rutas identificadas en esta vía.



Ilustración 4 Registro fotográfico de la Carrera 19

- **CARRERA 18 (AVENIDA LOS MARACOS)**

La Avenida Los Maracos o Carrera 18 entre la Avenida Carrera 19 y la Carrera 16 pertenece a la malla vial arterial de la ciudad de Villavicencio, con un perfil V-3 de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT para la capital del departamento del Meta. Presenta dos calzadas vehiculares con dos carriles cada una, con una carpeta de rodadura asfáltica (pavimento flexible), para uso del tránsito mixto. Presenta doble circulación Oriente a Occidente y viceversa, con un ancho promedio por calzada de 8.0 metros y separador central en material blando, con un ancho aproximado de 0.5 metros. En ambos costados de la vía cuenta con infraestructura propia para la movilidad peatonal, con anchos que varían entre los 3 y 4 metros.

En cuanto señalización vertical, señalización horizontal y controles semafóricos, sobre la Avenida Los Maracos (Carrera 18) entre la Carrera 19 y la Carrera 16, se localizan dos intersecciones semaforizadas, una a la altura de la Avenida Carrera 19 y la segunda sobre la Carrera 16, las cuales permiten el paso seguro de peatones; y así mismo las manobras vehiculares presentes en cada una de las intersecciones. La demarcación se encuentra en buenas condiciones, las marcas viales presentan una condición aceptable; y así mismo la señalización vertical se encuentra en condiciones favorables.

En la actualidad, por este corredor transitan rutas de transporte publico producto de la concurrencia del sector, a continuación, en la tabla se presentan las rutas identificadas en esta vía.

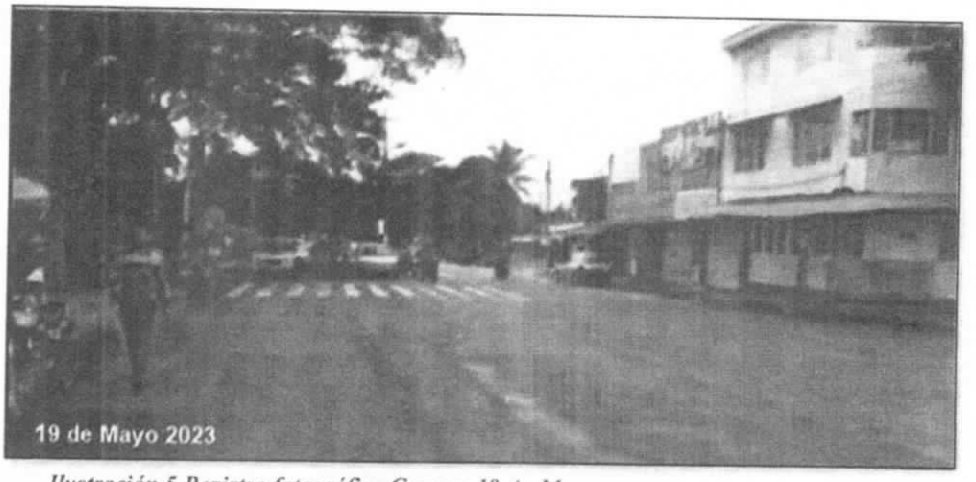


Ilustración 5 Registro fotográfico Carrera 18 Av Maracos

- **CARRERA 16**

La Carrera 16 entre la Calle 15 y la Calle 25 pertenece a la malla vial local de la ciudad de Villavicencio, con un perfil V-5 de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT para la capital del departamento del Meta. Presenta una única calzada vehicular con dos carriles, con una carpeta de rodadura asfáltica (pavimento flexible) en mal estado, para uso del tránsito mixto. Presenta doble circulación Norte - Sur y viceversa, con un ancho promedio de calzada de 7,5 metros.

En ambos costados de la vía cuenta con infraestructura propia para la movilidad peatonal, con anchos que varían entre los 3 y 4 metros.

En cuanto señalización vertical, señalización horizontal y controles semafóricos, sobre la Carrera 16 entre la Calle 15 y la Calle 25, se localizan dos intersecciones semaforizadas, una a la altura de la Calle 15 o Avenida los Maracos (Carrera 18) y la segunda sobre la Calle 25, las cuales permiten el paso seguro de peatones; y así mismo las manobras vehiculares presentes en cada una de las intersecciones. La demarcación se encuentra en malas condiciones, las marcas viales presentan un desgaste significativo y sin retrorreflexión; la señalización vertical se encuentra en regulares condiciones.

En la actualidad, por este corredor transitan rutas de transporte publico producto de la concurrencia del sector, a continuación, en la tabla se presentan las rutas identificadas en esta vía.



Ilustración 6 Registro Fotográfico Carrera 16

- **CALLE 25**

La Calle 25 entre la Carrera 19 y la Carrera 16 pertenece a la malla vial local de la ciudad de Villavicencio, con un perfil V-4 de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT para la capital del departamento del Meta. Presenta una única calzada vehicular con dos carriles, con una carpeta de rodadura asfáltica (pavimento flexible) en mal estado, para uso del tránsito mixto. Presenta doble circulación Oriente – Occidente y viceversa, con un ancho promedio de calzada de 7,5 metros. En ambos costados de la vía cuenta con infraestructura propia para la movilidad peatonal, con anchos que varían entre los 3 y 4 metros.

En cuanto señalización vertical, señalización horizontal y controles semafóricos, sobre la Calle 25 entre la Carrera 19 y la Carrera 16, se localizan dos intersecciones semaforizadas, una a la altura de la Carrera 19 y la segunda sobre la Carrera 16, las cuales permiten el paso seguro de peatones; y así mismo las manobras vehiculares presentes en cada una de las intersecciones. La demarcación se encuentra en malas condiciones, las marcas viales presentan un desgaste significativo y sin retrorreflexión; la señalización vertical se encuentra en regulares condiciones.

En la actualidad, por este corredor transitan rutas de transporte publico producto de la concurrencia del sector. a continuación, en la siguiente tabla se presentan las rutas identificadas en esta vía.

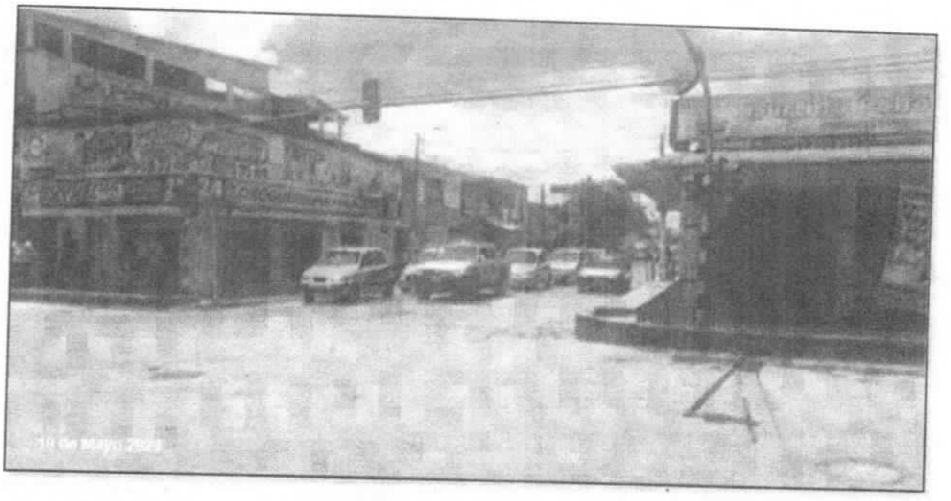


Ilustración 7 Registro Fotográfico Calle 25

8. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO

La responsabilidad de la obra está a cargo de las siguientes instituciones y personas:

PROYECTO	Construcción escenarios deportivos multipropósito. pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta.
CONTRATO	**N° 106 DE 2023**
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto de Deporte y Recreación del Meta
REPRESENTANTE LEGAL:	Fabián Hernán Gonzalo Torres Carrillo –director general director@idermet.gov.co
CONTRATISTA:	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
DIRECTOR DE OBRA	ING. YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO direccion.escenariosdeportivos@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON HENRY ORTIZ GARCIA

Tabla 2 Información legal del proyecto

9. ATENCIÓN A USUARIOS Y HABITANTES DE LA ZONA

El Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023 como contratista del proyecto **'construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta'**, tendrá a disposición de la ciudadanía los medios necesariospara recibir quejas, reclamos y sugerencias como estrategia de veeduría, así mismo recibirá a representantes comunitarios, comerciantes, residentes y otros para atender sus quejas, reclamos y sugerencias en cuanto al Plan de Manejo de Transito implementado.

En la atención a la comunidad y cualquier persona se atenderá en la siguiente dirección carrera 16 N 24-2 a 24-58, villa olímpica, en el cual se seguirá el siguiente proceso:

1. Recibir, registrar e iniciar el proceso de atención de quejas y reclamos, informando al reclamante cómo se atenderá su solicitud.

2. Dar solución a cualquier inquietud.

3. Hacer seguimiento a la ejecución de la respuesta o acción necesaria para atender laqueja o reclamo.

4. Informar al solicitante sobre la respuesta o acción llevada a cabo para atender la quejao reclamo.

10. PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

La ejecución del plan de manejo de tránsito de la **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta,** se realiza de acuerdo con la viabilidad otorgada por la secretaria de Movilidad de la Alcaldía Municipal de Villavicencio-Meta, mediante oficio **1703-19.18/0680 del 17 de MAYO DE 2023** y lo emanado en la resolución No.1885 de 2015 "Manual de Señalización adoptado por el Ministerio del Transporte".

Mediante esta resolución se da inicio a la implementación del plan de manejo de tránsito del **Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.**

Una vez aprobado el Plan de Manejo de Tránsito por las autoridades y entidades competentes, se procederá a realizar su implementación en la zona de obra.

El ingeniero residente de la obra supervisará la correcta implementación del PMT aprobado por la Secretaría de Movilidad y en caso de ser necesario realizarán ajustes o retroalimentaciones al Plan de Manejo de Tránsito. El grupo constructor será encargado de realizar labores de revisión, limpieza, reposición, recuperación y arreglo de las señales viables a volver a instalar.

10.1 Información y divulgación del plan de manejo de tránsito

La divulgación e información del plan de manejo de tránsito, se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra y será responsabilidad del componente ambiental del mismo.

- Mensajes informativos y de sensibilización hacia la obra y colaboración de la ciudadanía, donde se informa sobre la duración y tipo de obra, desvíos y precauciones a tomar.

- La información al usuario durante este periodo de ambientación, se realiza a travésde acciones de prevención y mitigación por la construcción de las obras, ambientando a la población acerca de los beneficios que conlleva la construcciónde la misma.

- Antes de iniciar las obras, se le debe informar a la comunidad sobre el proyecto,su proceso, la duración de la construcción y sus implicaciones, molestias que generará la obra y los beneficios que se obtendrán con la construcción del proyectopor parte de la concesionaria.

- Se indica de manera clara los desvíos y precauciones a tomar.

- Instalación de señalización en torno a lo implementado en el PMT.

10.2 Atención vecinos y usuarios

El Consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023, responsable de la obra pondrá a disposición de laciudadanía los medios necesarios para recibir las quejas, reclamos y sugerencias como estrategia de veeduría.

El consorcio recibirá a representantes comunitarios, comerciantes, residentes y otros para atender sus quejas, reclamos y sugerencias en cuanto al plan de manejo de tránsito implementado.

En la atención a la comunidad y cualquier persona, se seguirá el siguiente proceso:

- Recibir, registrar e iniciar el proceso de atención de quejas y reclamos, informandoal reclamante cómo se atenderá su solicitud.

- Remitir a la dependencia interna del constructor o a la entidad oficial a que corresponda, el formato de registro de la queja.

- Hacer seguimiento a la ejecución de la respuesta o acción necesaria para atenderla queja o reclamo.

- Informar al solicitante sobre la respuesta o acción llevada a cabo para atender la queja o reclamo.

- Difundir a través de las organizaciones locales a los municipios del Área de Influencia Directa las respuestas y acciones ejecutadas para atender quejas y reclamos de la comunidad.

- El Consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023, a través de la oficina destinada para tal efecto, gestionará la cantidad y ubicación de los buzones de sugerencias para aquellas personas que quieran presentar sus inquietudes por escrito, generando así un canal de comunicación directo. La difusión de estos, será responsabilidad del consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023.

10.3 Medios de difusión a utilizar.

La gestión Comunitaria es parte integral del proyecto y tiene como objetivo principal el de fortalecer y conservar las relaciones con las comunidades directamente afectadas relacionadas con la ejecución del proyecto, a través de los mecanismos de información, atención a emergencias y eventual resolución de conflictos.

De forma previa a la iniciación de los trabajos se dará a conocer el proyecto a la comunidad afectada de acuerdo con los criterios establecidos por la Oficina de Gestión Social de Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023., informando los horarios de trabajo y coordinando los horarios de acceso a los parqueaderos de las viviendas en la zona, será divulgado por medio de Volantes informativos a la población del Área de Influencia de la ciudad de Villavicencio.

10.4 Quejas y reclamos

En el consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023, hasta la fecha no se han presentado quejas o reclamos por parte del personal aledaño a la obra, sin embargo, el consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023 está a disposición de la población para atender cualquier inconformidad.

10.5 Implementación del plan manejo de tránsito

El plan de manejo de tránsito se implementará de la siguiente manera:

- Si bien no se realizarán obras de rehabilitación de calzada vehicular y por consiguiente no se efectuarán cierres parciales ni totales de ninguna vía, en la zona de obra se dispondrá de un cerramiento en poli sombra, poli malla y/o dispositivos canalizadores (colombinas y cinta plástica), así como de la señalización indicada en los planos de diseño de los PMT anexos a este documento técnico.

- Para la etapa de suministro de material y/o cargue de escombros producto de la obra, se efectuará este procedimiento al interior del predio; es decir, dentro del lote objeto de intervención, con lo cual no se afectará el normal comportamiento del tránsito en la zona de influencia de la obra.

- Existen en la zona de la obra, presencia de rutas de transporte público colectivo urbano, las mismas no se verán afectadas.

- No se realizarán desvíos con ocasión de las obras a desarrollar.

- Las labores no implican afectación de andenes y en el lugar de las obras no existe infraestructura para bici usuarios: no obstante, se cuenta con una zona de aproximadamente 2.00 mts de espacio público, las cuales serán destinadas para la conformación de senderos peatonales.

- El cargue y descargue del material se realizará directamente dentro de la zona de obra, sin tener afectación a vías aledañas, de tal manera que se retire el material periódicamente en horas valle. Se contará con un auxiliar de tránsito para controlar la entrada y la salida al predio de los vehículos de cargue y descargue del material de obra.

- Para el manejo y disposición de escombros y desechos de construcción se tendrá en cuenta lo dispuesto en el decreto municipal 254 de 2012. Para el manejo y disposición de escombros y desechos de construcción se tendrá en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente.

- La disposición de material resultante de demolición se realizará en las instalaciones del sector Guatiquia.

- Las disposiciones de material sobrante proveniente de las excavaciones se realizarán en un predio privado.

- Disponibilidad de celulares y radios para la comunicación en los extremos de la obra.

- Disponibilidad del área HSEQ.

- Rotulación de volquetas con la aprobación del PMT.

- Inicio de actividades Implementado el plan de manejo de tránsito. se realizarán los ajustes que se exijan en terreno, de acuerdo con las condiciones operacionales del momento, por parte del Contratista y la Interventoría.

11. ACTIVIDADES DE OBRA EN EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

En el periodo correspondiente al mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades en la obra **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta.**

- Mantenimiento preventivo de las señales de tránsito para el ingreso y salida de volquetas y vehículos en general de la obra, con el fin de que la población aledaña tenga presente que entran y salen vehículos de carga continuamente.

- Ajuste y adecuación de la lona que fue instalada como cerramiento de obra, en la zona de cancha auxiliar y la entrada principal.

- Dentro de obra se verifica constantemente el mantenimiento de señalización de medidas preventivas, con el fin de prevenir algún tipo de accidente del personal trabajador del proyecto.

- Supervisión por parte del área SST en la implementación del plan de manejo de tránsito, supervisión por parte de interventoría, verificando el cumplimiento a la implementación y funcionamiento del PMT.

- Se inician actividades con respecto a la extracción de material sobrante de escombros de los escenarios deportivos antiguos tales como taekwondo, voleibol, lucha, gimnasia, boxeo y levantamiento de pesas, a la fecha 30 de septiembre no se ha terminado con la extracción de los escombros.

- El ingreso de volquetas con material de relleno de 3 pulgadas, se realiza de manera diaria, con el fin de tener suministro para el relleno de la cimentación de los escenarios nuevos que se van a realizar.

- Se inician las demoliciones de la fase 2 de pista de patinaje, donde se comienza a extraer material sobrante de escombros a medida que la zona va dando el espacio.

  - Se verifica el Ingreso de vehículos propios de la obra, automóviles motocicletas y ciclas.

  - Control estricto de ingreso para todos los vehículos que ingresan a la obra.

  - Rotulación de las volquetas con el numero de aprobación del PMT.

  - Socialización del plato y ruta del PMT

11.1 Instalación de señalización PMT.

Se realiza instalación de señalización fuera y dentro de la obra con el fin de que los conductores tengan cuidado a la hora de entrar con sus respectivo cargue de material, se instala a las afueras de la obra la señalización reglamentaria para el ingreso vehicular entrante a la obra, así mismo en la entrada la obra se cuenta con el personal idóneo el cual realiza control de ingreso a cada uno de los conductores.



Ilustración 8 Señalización del PMT

11.2 Supervisión por parte del consorcio

En obra se realiza de manera diaria la supervisión por parte del consorcio en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

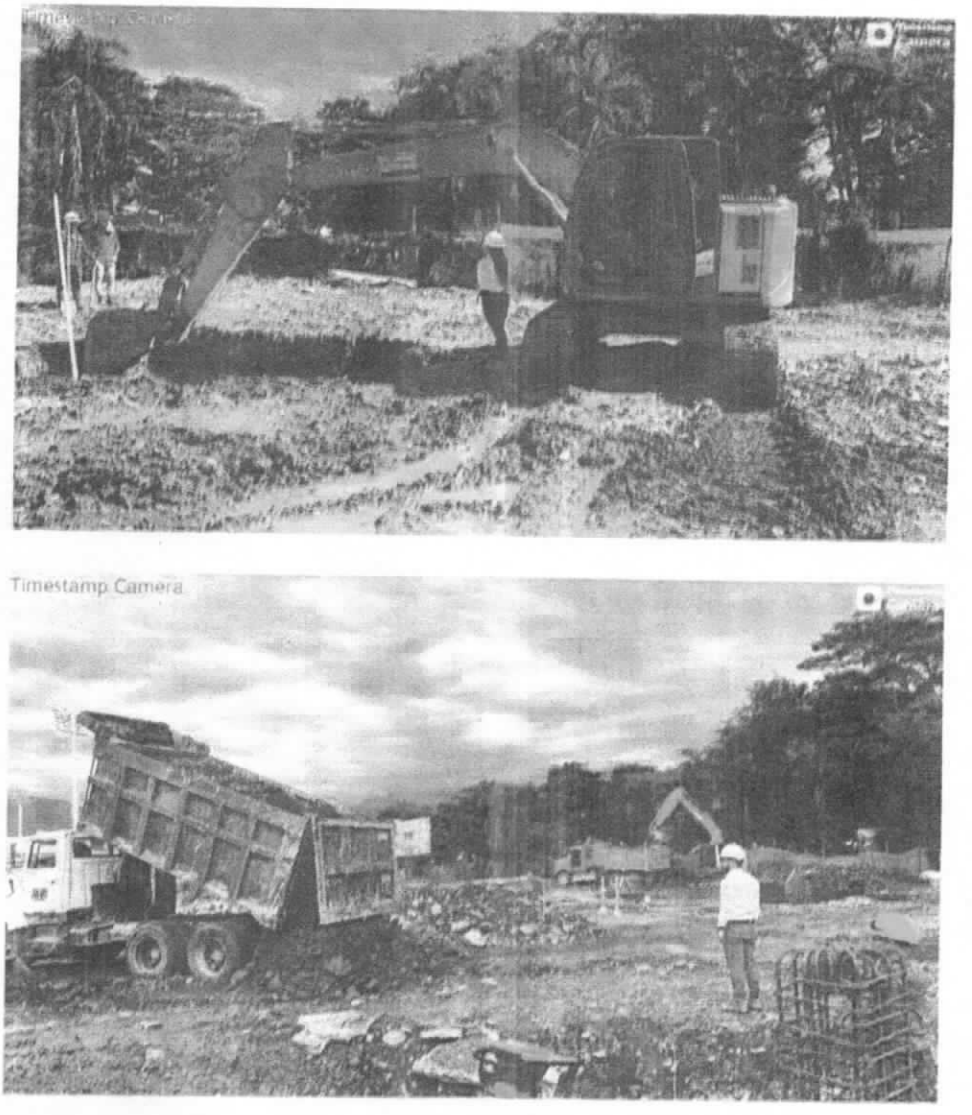


Ilustración 9 Supervisión por parte del área de sst

11.3 Charlas de seguridad a trabajadores

Diariamente se realizan charlas de seguridad a todo el personal trabajador de la obra con el fin de concientizar a los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial.





Ilustración 10 Charlas de seguridad

11.4 Mantenimiento de señalización en obra

Se verifica que la lona instalada en el cerramiento de la obra esté en buenas condiciones y así garantizar el paso a solo personal de la obra.

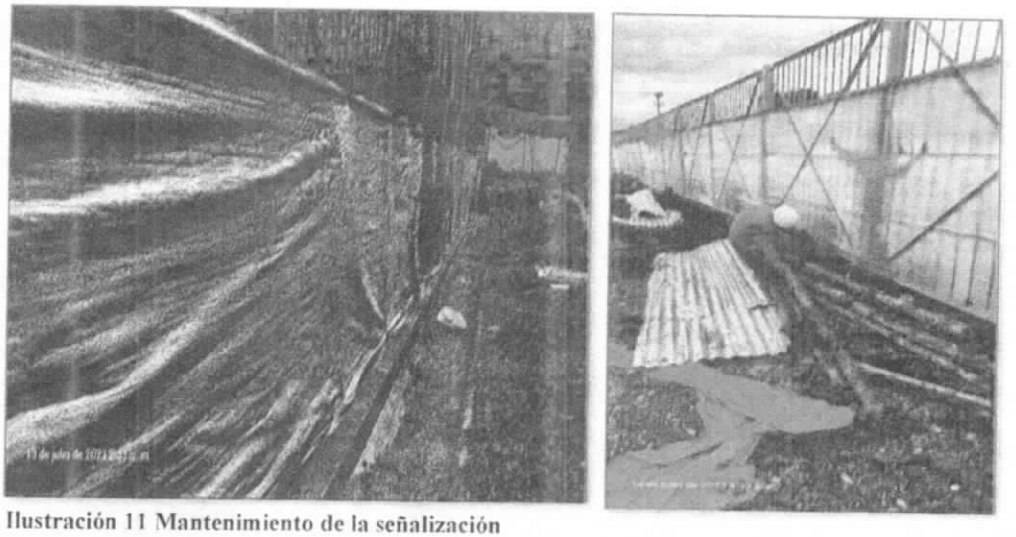


Ilustración 11 Mantenimiento de la señalización

11.5 Puntos de emergencia en obra

En la obra se cuenta con 3 puntos de emergencia ubicados en zonas donde se están ejecutando actividades en caso de un accidente, así mismo el consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023, tiene conformada por 4 personas, una brigada integral de emergencia, en caso de alguna eventualidad que se llegue a presentar en la obra.



Ilustración 12 Equipos de emergencia

12. DISPONIBILIDAD E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA EL PMT

Se cuenta con la señalización reglamentaria para el ingreso y salida de los vehículos, se instala señalización en puntos estratégicos fuera de la obra en torno a lo autorizado en el PMT, así mismo se cuenta con el personal idóneo para la ejecución de la labor.

12.1 Características de la señalización.

La señalización implementada garantiza que la información sea clara a los usuarios de la vía y los conductores en la zona interna de la obra.

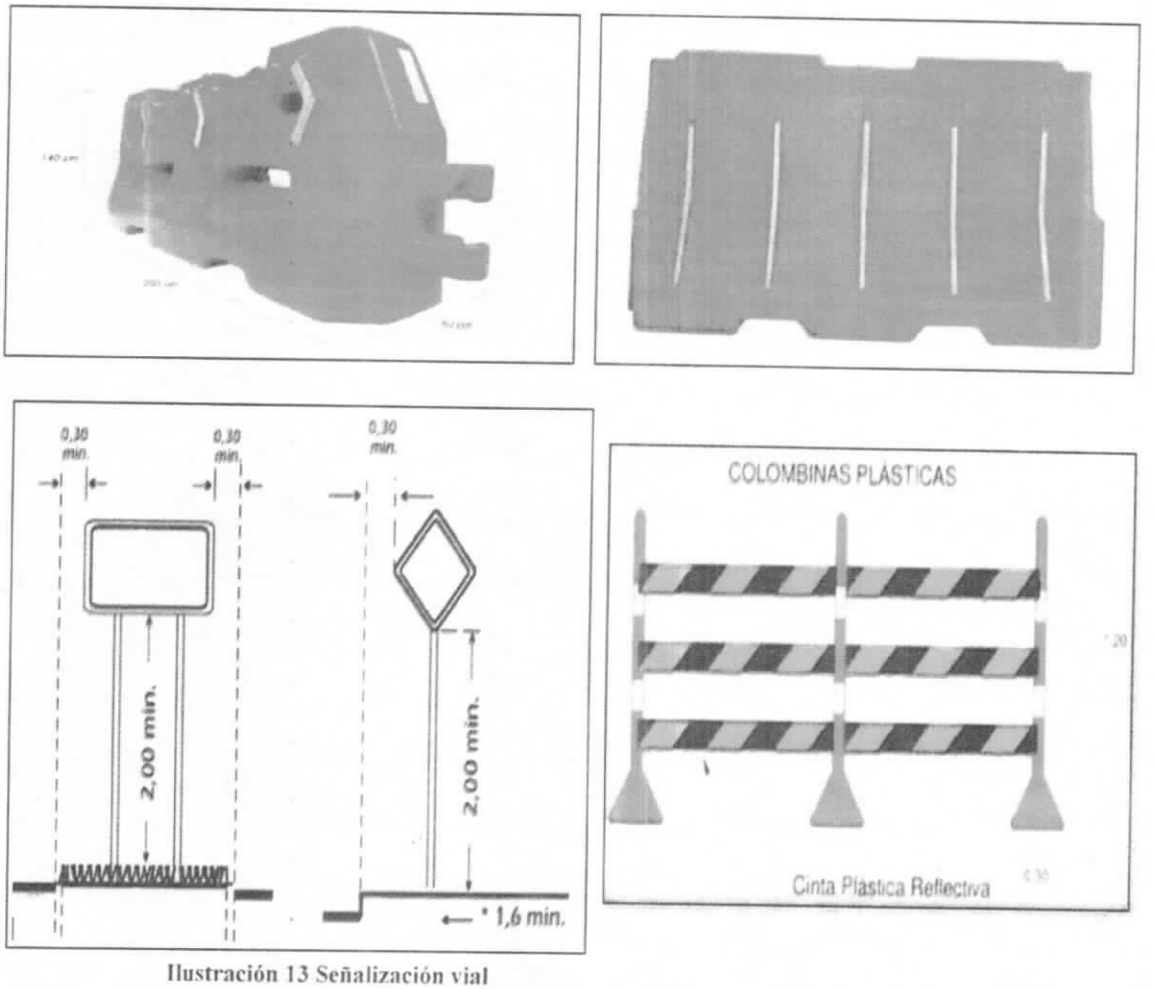


Ilustración 13 Señalización vial

12.2 Equipo y maquinaria

La maquinaria para la correcta ejecución de la obra, consta principalmente de:

- Volquetas.
- Minicargador
- Grua Ph.
- Retroexcavadora.
- Herramientas Básicas y equipos de construcción.

Esporádicamente ingresan a obra vehículos de carga pesada, tractomulas y camiones por parte de los

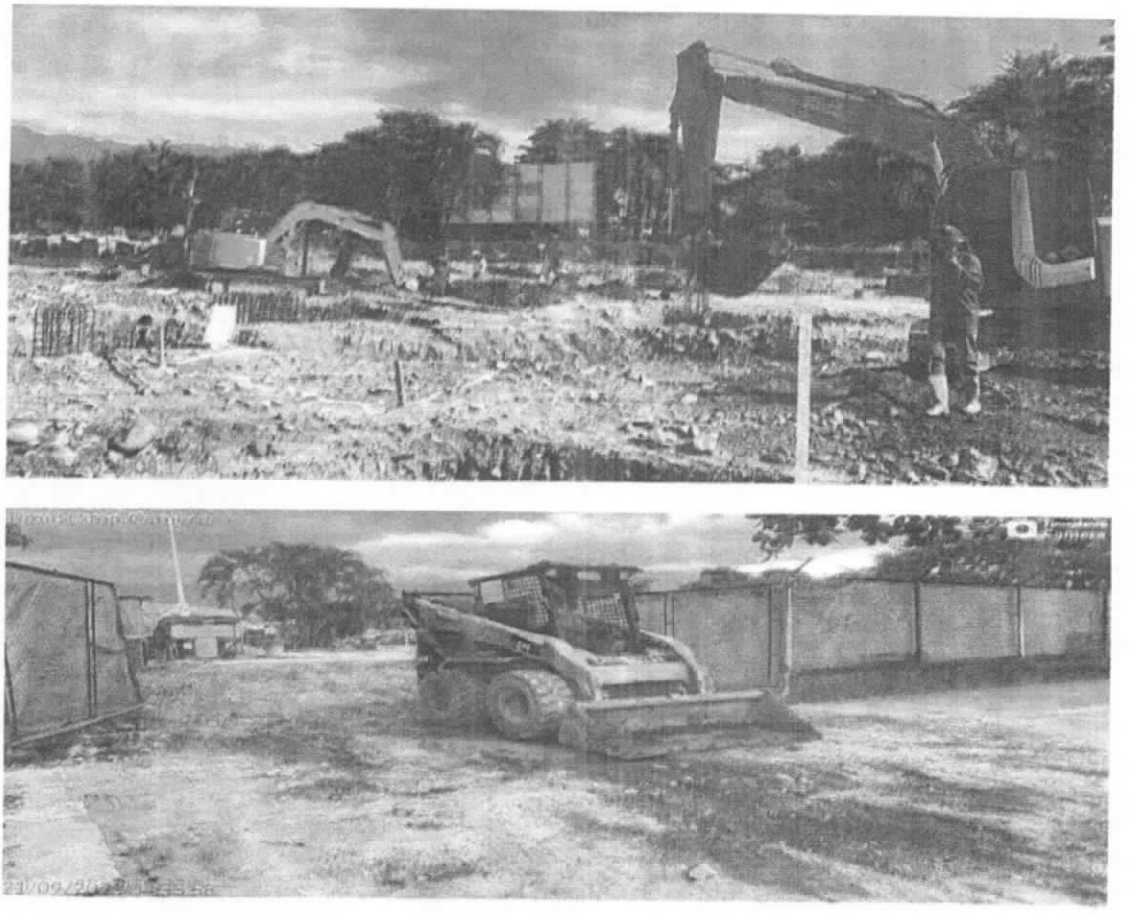


Ilustración 14 Maquinaria en obra

Elaboro: Ing. Yeison Esneider Gómez Guerrero
Director de obra

12.3 Señalización informativa de obra.

Corresponde a señales informativas de entrada y salida de volquetas. fin de obra y paletero. que se ubicarán cada 50 metros de distancia desde el punto donde se ubica la última señal. en ambos costados. informando sobre la precaución de paso vehicular existente. en forma general para la ejecución de la labor.



Ilustración 15 Señalización instalada en obra

13. COORDINACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL PLAN (PMT).

La obra de **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta,** cuenta con persona de seguridad ysalud en el trabajo, quien es la encargada de la supervisión de las actividades realizadas en la obra, así mismo se cuenta con una persona certificada en seguridad vial a quien se le designa roles para las actividades del manejo de tránsito en la obra al momento de la circulación de peatones y vehículos.



Ilustración 16 personal de apoyo vial

14. SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.

El plan de manejo de tránsito es supervisado por el director de obra, Ing. Yeison Esneider Gómez Guerrero, quien es el encargado de la supervisión y ejecución de las actividades que se realizan a diario, así mismo es supervisado por el ingeniero residente y a su vez por la persona encargada del área de seguridad y salud en el trabajo del consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023.







Ilustración 17 Supervisión en obra

15. CONCLUSIONES

- No se presentaron accidentes o incidentes en la obra en este periodo del mes de septiembre del 2023
- La implantación del PMT es supervisado por el director de obra quien es el encargado de dirigir la obra, así mismo es supervisado por la interventoría quien está muy pendiente de todo lo relacionado con vehículos y maquinaria pesada que entra a obra.
- En el mes de septiembre se contó un ingreso moderado de vehículos y maquinaria, ya que la obra se encuentra en una etapa de extracción de material sobrante de escombros y desmontes.
- Se cuenta con la bitácora diaria correspondientes al mes de septiembre del 2023.

16. ANEXOS

- 1703-F-Mov-11-V1 Formato Registro Bitácora PMT septiembre 2023
- 1703-F-Mov-11-V1 Formato de Evaluación Plan de Manejo de Transito Señalización y Desvíos septiembre 2023 (1-07AL31-07)


4107

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



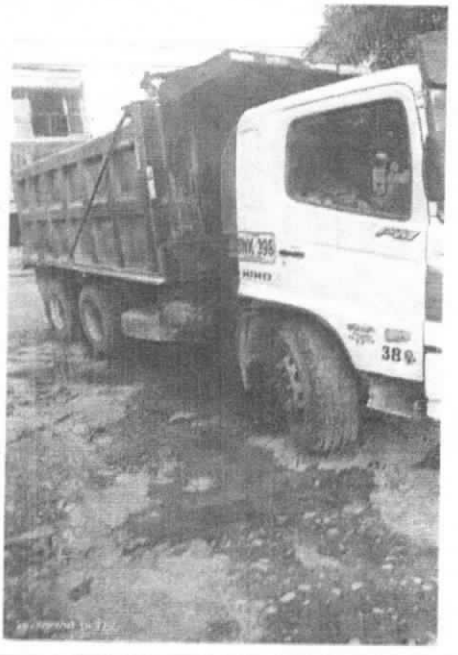

FIRMA RESIDENTE

XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO






FIRMA RESIDENTE

XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material.	

FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

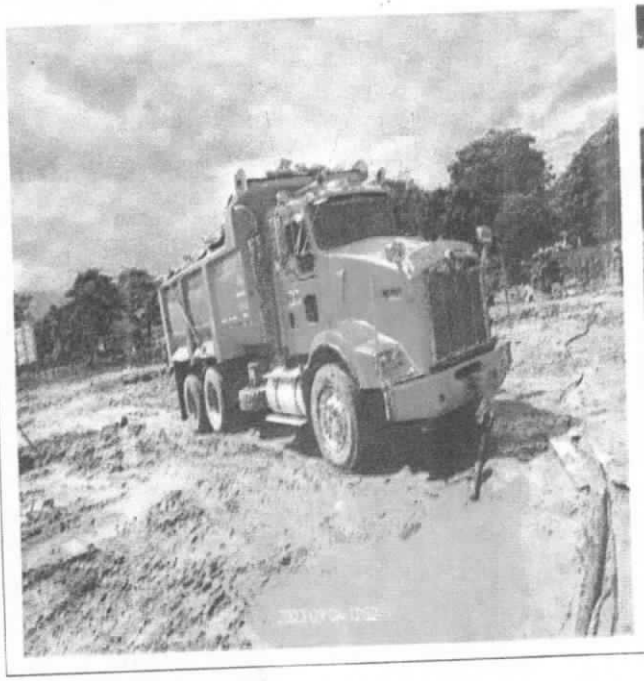




FIRMA RESIDENTE

XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

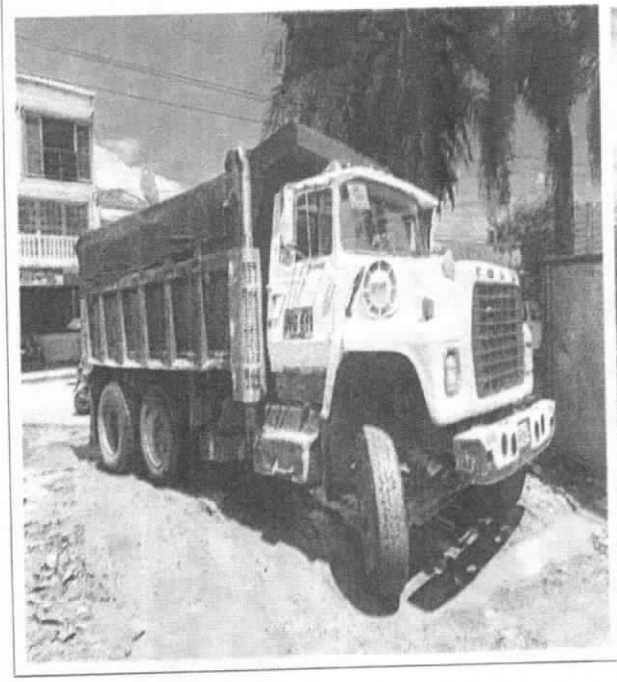



FIRMA RESIDENTE

XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

7411

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje, se hace el retiro de 9 viajes.	

FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO






FIRMA RESIDENTE

XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

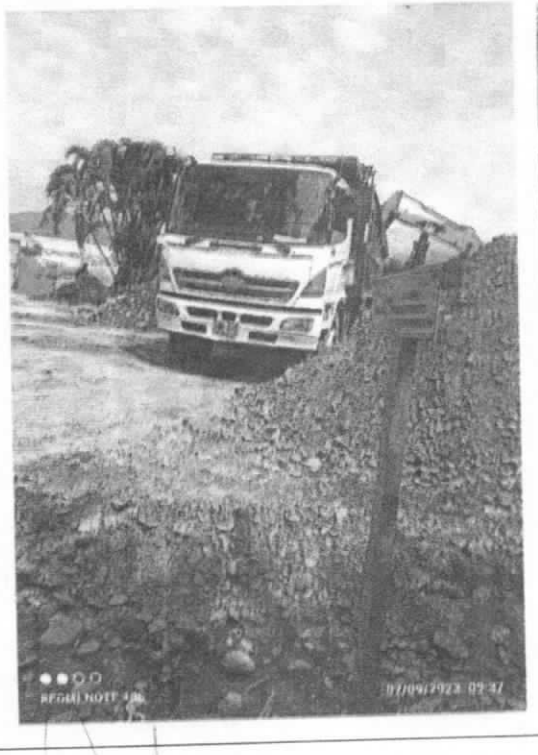




FIRMA RESIDENTE


XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 8 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

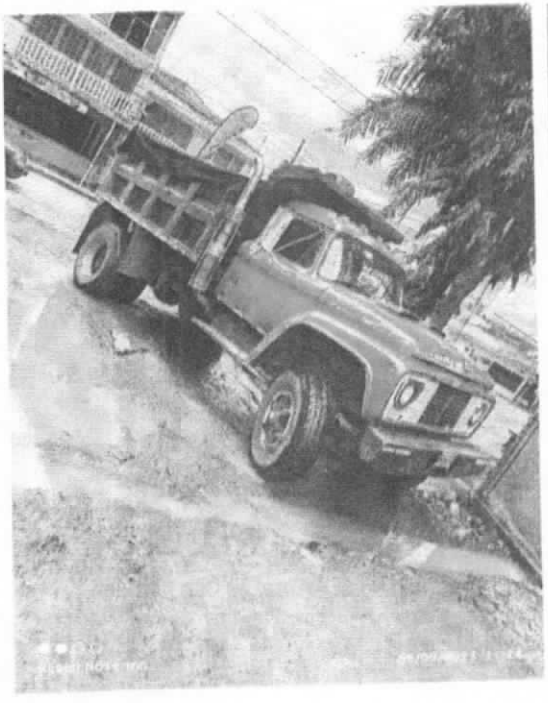

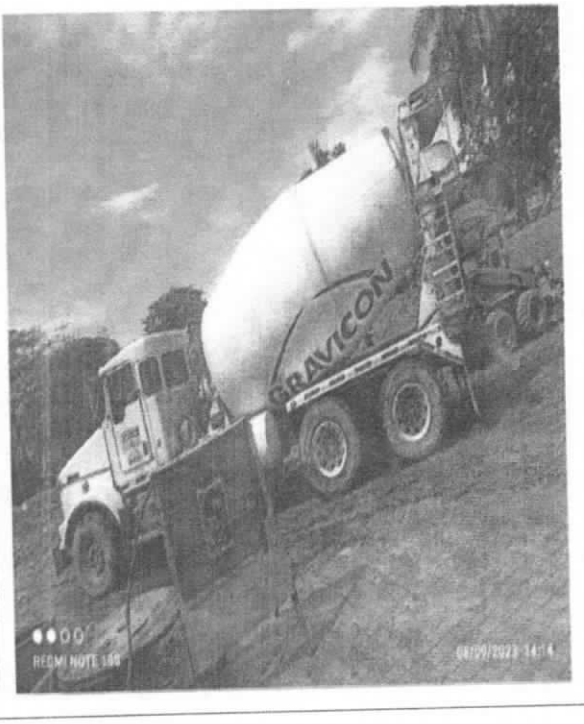

FIRMA RESIDENTE

XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO






FIRMA RESIDENTE


XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

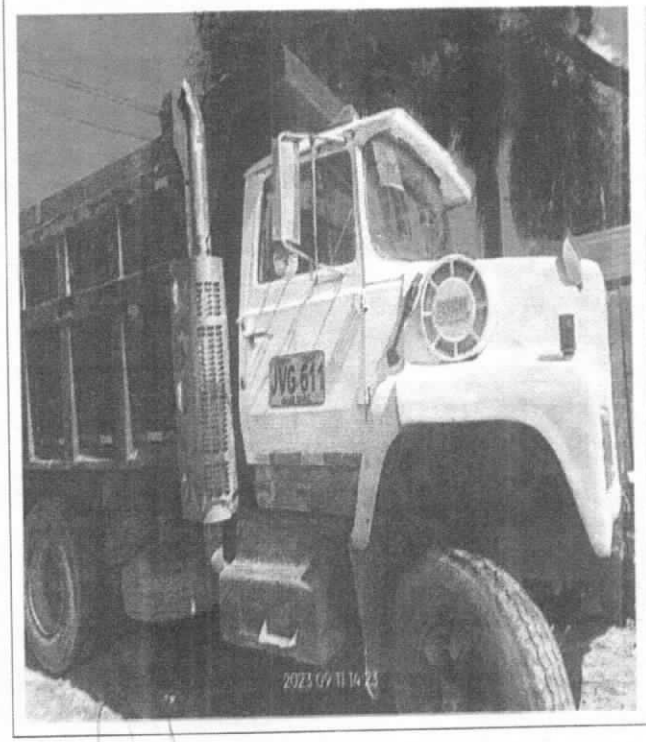

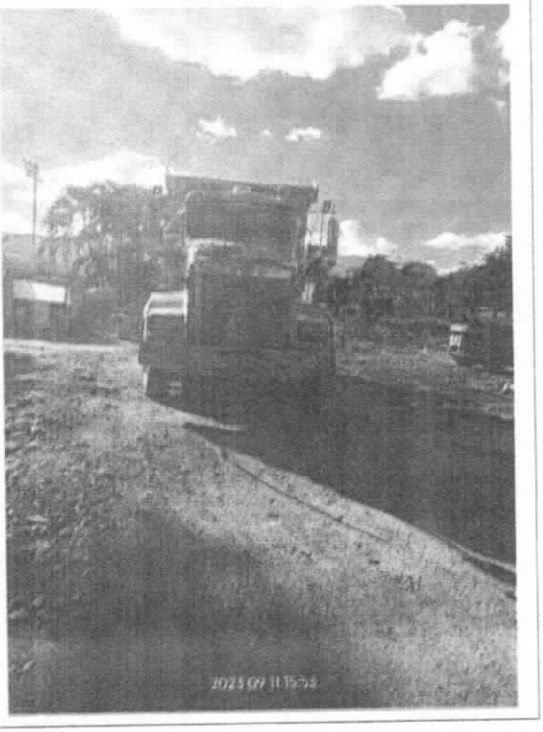


FIRMA RESIDENTE


XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

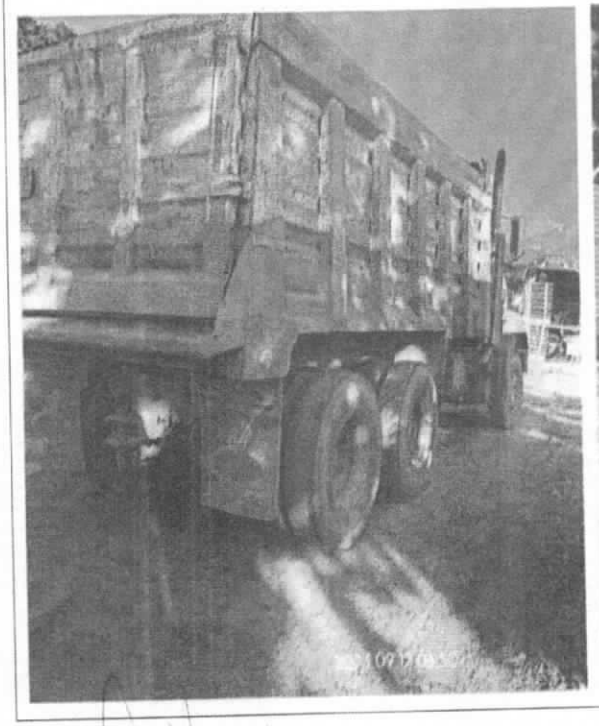

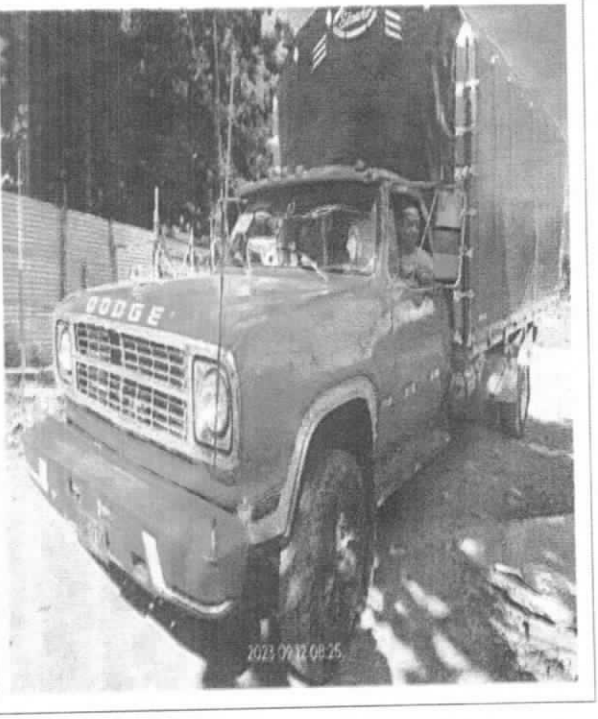

FIRMA RESIDENTE


XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



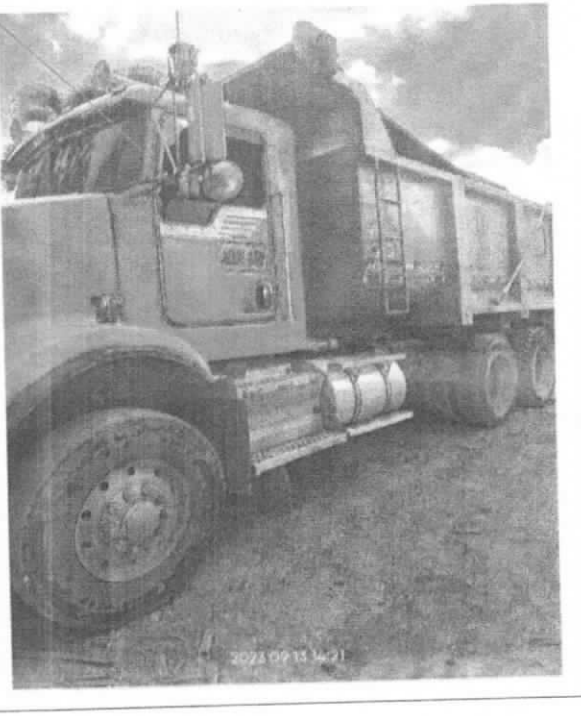


FIRMA RESIDENTE

XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

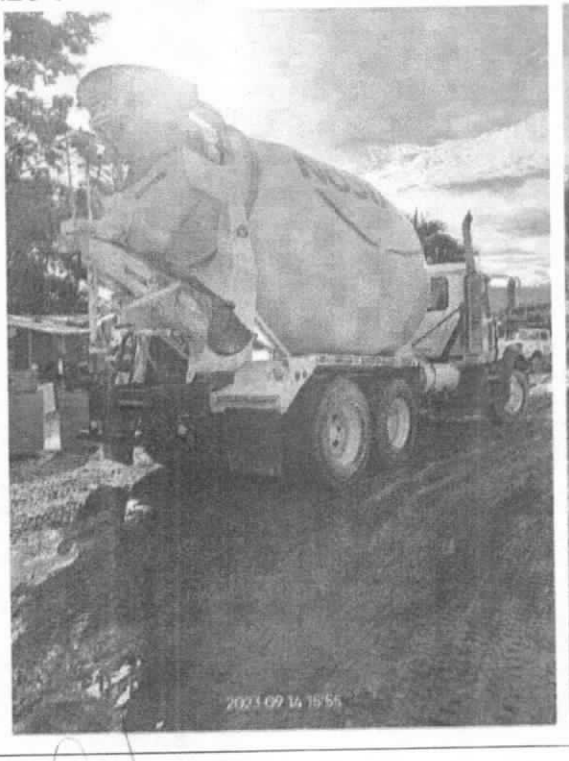




FIRMA RESIDENTE


XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

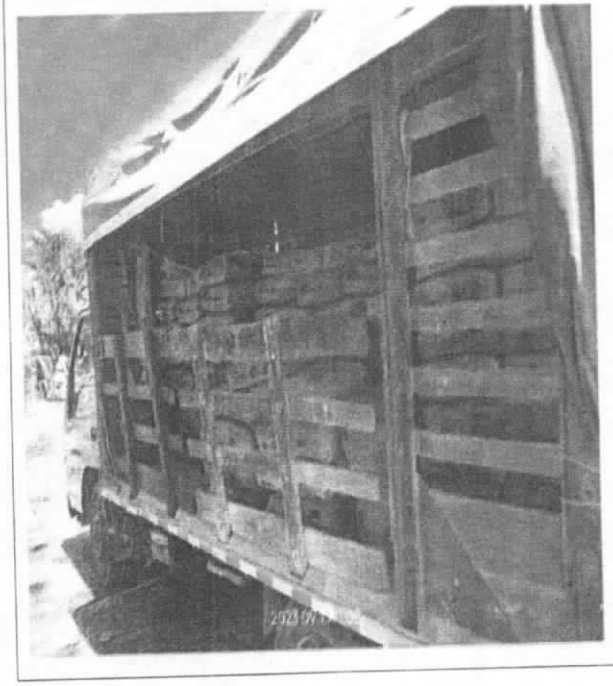

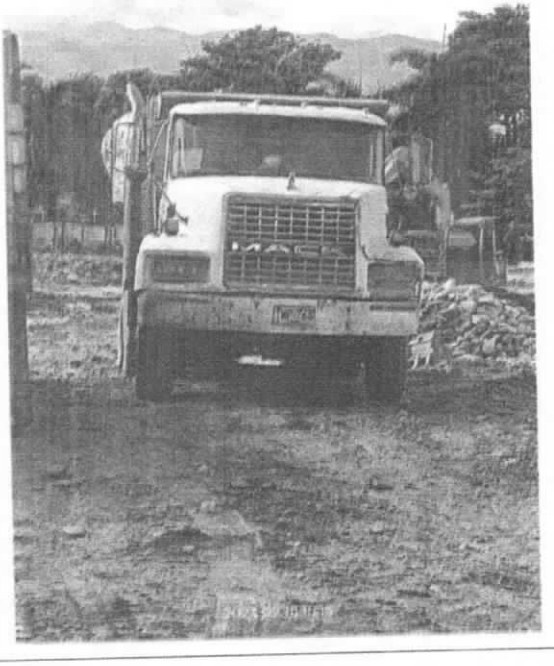

FIRMA RESIDENTE


XIMENA BRAVO


FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

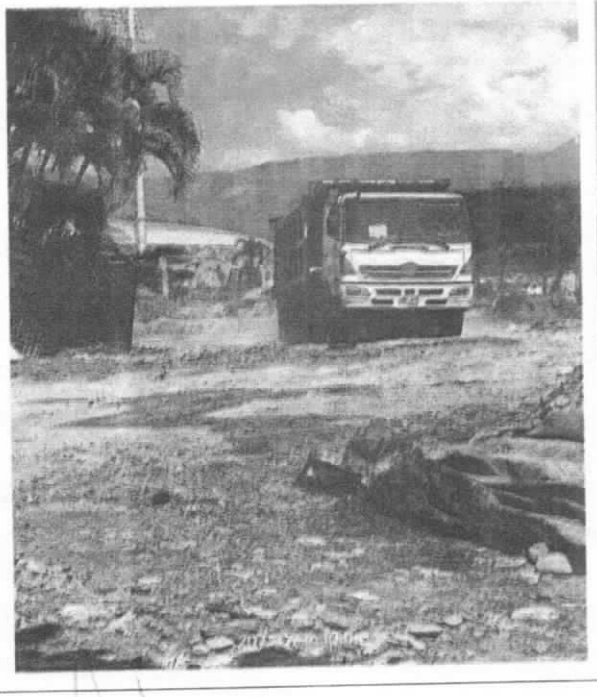

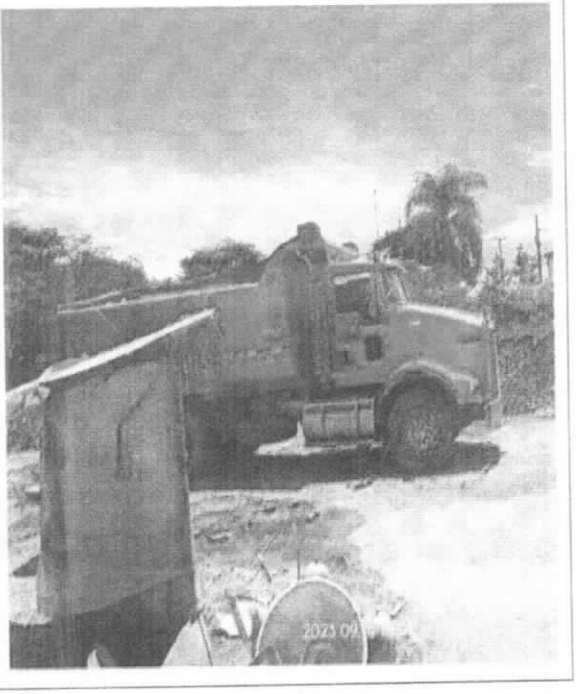

FIRMA RESIDENTE

XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE


XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



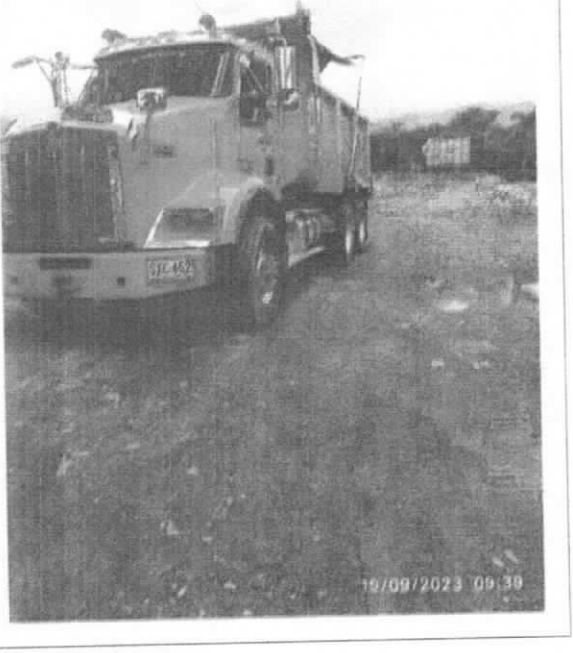

FIRMA RESIDENTE

XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE


Ximena Bravo
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



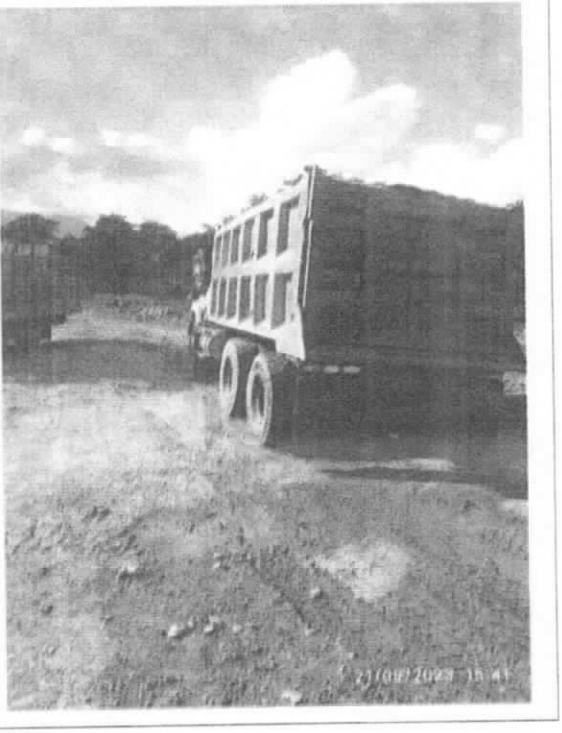

FIRMA RESIDENTE


Ximena Bravo

FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

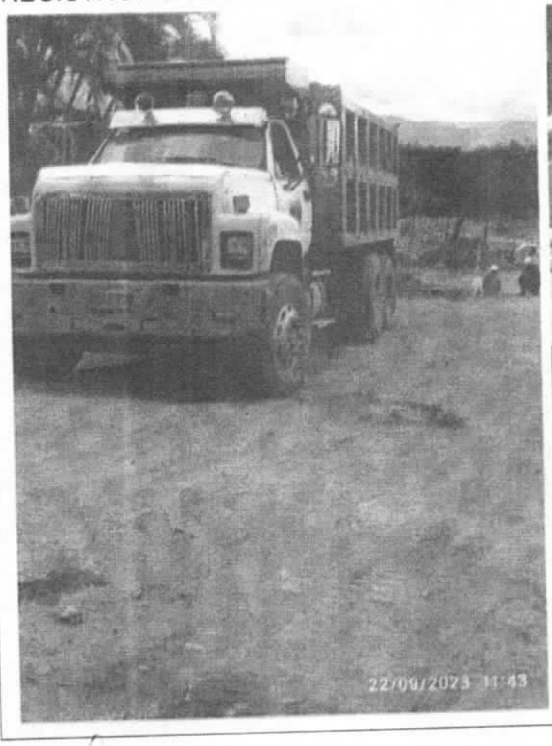



FIRMA RESIDENTE

XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE


XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



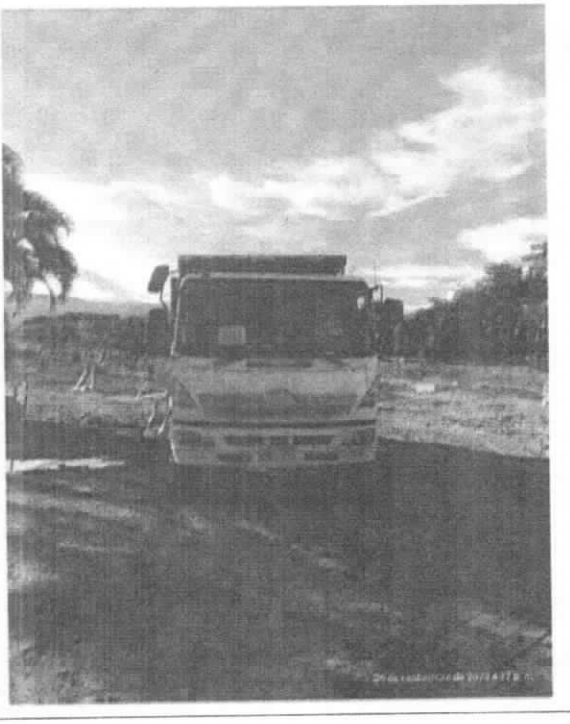

FIRMA RESIDENTE

XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA RESIDENTE

XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO






FIRMA RESIDENTE


XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

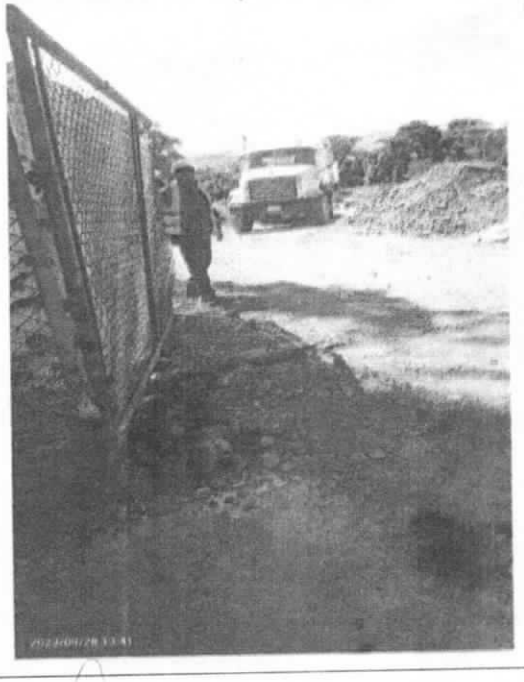

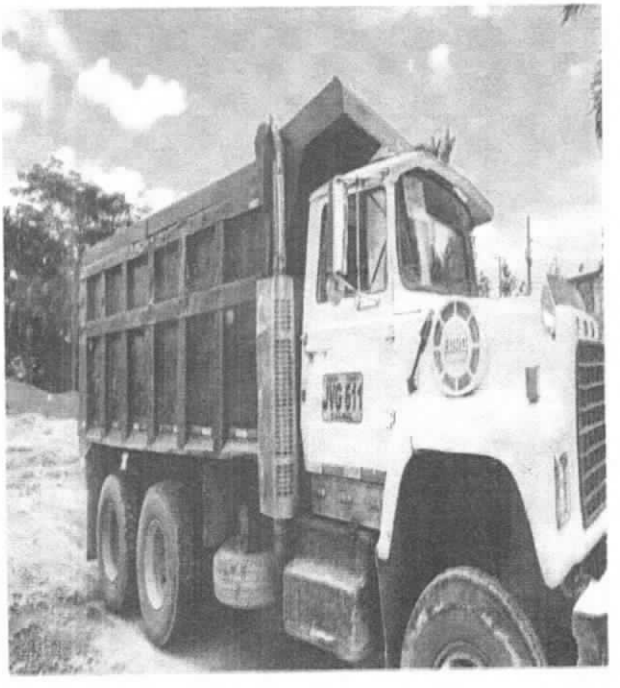

FIRMA RESIDENTE


XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



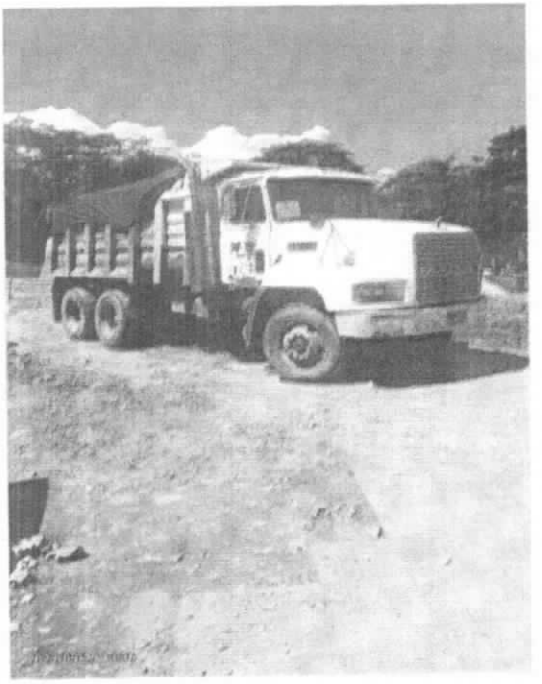


FIRMA RESIDENTE

XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de material	

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

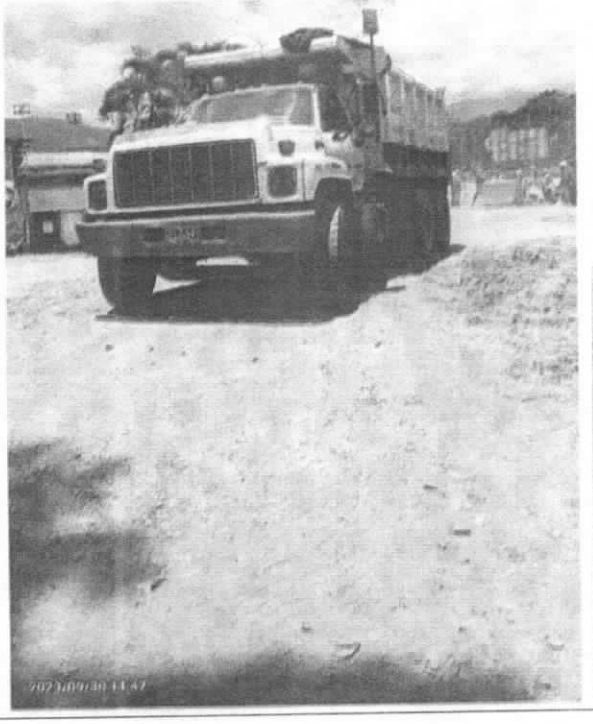



FIRMA RESIDENTE

XIMENA BRAVO
FIRMA HSEQ



CALIFICACIÓN MENSUAL DE TRÁNSITO								
CORRESPONDIENTE AL PERIODO			DEL		1/9/2023		AL	30/9/2023
ITEM	PARÁMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	100%	90%	50%	0%	NO APLICA	OBSERVACIONES	
1	**Señalización Vertical y Dispositivos**							
	Pasacalles					X		
	Señales Reglamentarias	100%						
	Señales Preventivas	100%						
	Señales Informativas	100%					SEÑALIZACION CARRERA 18	
	Señalización luminosa					X		
	Canalizaciones (Cintas, delineadores tubulares, maletines, etc.)	100%					SE INSTALO CINTA REFLECTIVA DENTRO DE LA OBRA	
	Barricadas					X	NO HAY INTERVENCIÓN EN LA VIA	
	Señalización Horizontal							
	Separación de Carriles					X		
	Paraderos					X		
	Pasos peatonales y líneas de pare					X		
	Vías de desvío					X		
2	**Manejo Peatonal**							
	Señales Informativas	100%					SEÑALIZACION CARRERA 18 NUEVA	
	Canalización de Senderos					X	ZONA PEATONAL HABILITADA	
	Adecuación de rampas					X		
	Adecuación superficie zonas peatonales	100%						
	Adecuación Paraderos					X		
	Adecuación superficie Paraderos					X		
	Iluminación					X		
3	**Estado de las vías**							
	Corredor a Intervenir					X	EL PROYECTO NO INTERVIENE NINGUN CORREDOR	
	Vías de desvío					X	EL PROYECTO NO INTERVIENE NINGUNA VIA	
4	**Manejo de Intersecciones o intercambiadores**							
	Tiempo de ejecución (duración)	100%					12 MESES	
	Implementación del PMT correspondiente	100%						
5	**Cumplimiento de Parámetros de Tránsito**							
	Velocidad					X		
	Accidentalidad					X		
6	**Cumplimiento de compromisos**							
	Cumplimientos de compromisos	100%						
7	**Tiempos de vigencia de los PMT**							
	Tiempos de vigencia de los PMT	100%					6 MESES	
8	**Personal asignado al PMT**							
	Personal profesional	100%						
	Auxiliares de Tránsito	100%					VIALISTAS APOYO ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS Y VOLQUETAS	
	Brigada de Mantenimiento	100%						
	Asistencia y participación en los Comités de Tránsito					X		
9	**Informes Mensuales de Tránsito**							
	Entrega puntual	100%						
10	**Inconformidades al PMT**							
	Número de Soluciones dadas / Quejas recibidas	100%						
	CALIFICACIÓN MENSUAL	90%	0%	0%	0%			

PERIODO EVALUADO: 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ING LEONEL ROA RUIZ
INTERVENTORÍA

ING YEISON ESNEIDER GOMEZ
CONTRATISTA

1. Señalización: Para efectos de la evaluación del cumplimiento del Contratista en cuanto a la señalización que debe disponer de acuerdo con lo señalado en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, se entenderá que una señal (sea esta vertical u horizontal) es considerada para efectos de este numeral como efectivamente ejecutada, cuando cumple con las características físicas señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos y cuando se encuentra dispuesta durante el tiempo allí señalado.

Esta evaluación se debe aplicar a cada nivel de señalización y demarcación en forma independiente.
La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:

• Si el Contratista ejecuta el 100% de las actividades señaladas en el Plan de manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 100%.

• Si el Contratista ejecuta menos del 100%, pero más del 90% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 90%.

• Si el Contratista ejecuta menos del 90%, pero más del 70% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 50%.

• Si el Contratista ejecuta el 70% o menos de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 0%.

2. Manejo Peatonal: Para efectos de la evaluación del cumplimiento en cuanto al manejo peatonal, que debe realizar y mantener el contratista, se entenderá que el manejo peatonal ha sido efectivamente ejecutado cuando los senderos peatonales han sido debidamente implementados conforme al Plan de Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos.

La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:
• Si el Contratista ejecuta el 100% de las actividades de manejo peatonal señaladas en el Plan de manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 100%.

• Si el Contratista ejecuta menos del 100%, pero más del 90% de las actividades de manejo peatonal señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 90%.

• Si el Contratista ejecuta menos del 90%, pero más del 70% de las actividades de manejo peatonal señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 50%.

• Si el Contratista ejecuta el 70% o menos de las actividades de manejo peatonal señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 0%.

3. Estado de las vías:
Para efectos de la evaluación del Contratista en cuanto al estado de condición de las vías, sobre el corredor y las vías utilizadas como desvío, se efectuará la siguiente evaluación:

• Si, durante el mes correspondiente, todo el corredor y todas las vías utilizadas como desvíos se encuentran en buen estado, la calificación del Contratista será del 100%.

• Si, durante el mes correspondiente, menos del 100% pero más del 90% del corredor y las vías utilizadas como desvíos se encuentran en buen estado, la calificación del Contratista será del 90%

• Si, durante el mes correspondiente, menos del 90% pero más del 70% del corredor y las vías utilizadas como desvíos se encuentran en buen estado, la calificación del Contratista será del 50%.

• Si, durante el mes correspondiente, el 70% o menos del corredor y las vías utilizadas como desvíos se encuentran en buen estado, la calificación del Contratista será del 0%.

4. Manejo de Intersecciones e Intercambiadores:
Se evalúa el cumplimiento del Contratista en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos para las intersecciones e intercambiadores en las cuales se ejecutaron Obras de Construcción durante el mes correspondiente con las condiciones de tiempo, horario, forma, indicadas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos.

La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:

• Si el Contratista ejecuta el 100% de las actividades señaladas en el Plan de manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 100%.

• Si el Contratista ejecuta menos del 100%, pero más del 90% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 90%.

• Si el Contratista ejecuta menos del 90%, pero más del 70% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 50%.

• Si el Contratista ejecuta el 70% o menos de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 0%.

5. Cumplimiento de los parámetros de control de Tránsito:
El cumplimiento de los parámetros de control de Tránsito se calificará si o no, es decir que en caso de no alcanzar los valores acordados se dará por no cumplido y la calificación será 0%, en caso contrario será 100%.

El cumplimiento de los parámetros del tránsito se dará teniendo en cuenta los indicadores fijados en la construcción de la linea base.

6. Cumplimiento de Compromisos: Como resultado de los comités semanales de seguimiento del PMT, se acordarán acciones concretas a seguir por el Contratista, dichas actividades se consignarán en las actas precisando los alcances y tiempos para su ejecución. Estos compromisos serán evaluados si se cumplieron o no, con 100% para el cumplimiento y 0% para el caso contrario.

7. Tiempos de vigencia de los PMT: Los PMT se aprueban con una vigencia establecida por el contratista, por lo tanto, se tendrá en cuneta su cumplimiento. Estos compromisos serán evaluados si se cumplieron o no, con 100% para el cumplimiento y 0% para el caso contrario.

8. Personal asignado al Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos:
Del personal profesional y de apoyo con que debe contar el contratista, se evalúa su efectiva disponibilidad, la asistencia a los comités de Tránsito (de acuerdo a la periodicidad establecida con la SMV mediante acta), su presencia en la vía y su dotación.

- Si el personal del Contratista cumple el 100% en asistencia, disponibilidad, cumplimiento y dotación, el Contratista recibirá una calificación del 100%.

- Si el personal del Contratista cumple en menos del 100%, pero más del 90% en asistencia, disponibilidad, cumplimiento y dotación, el Contratista recibirá una calificación del 90%.

- Si el personal del Contratista cumple en menos del 90%, pero más del 70% en asistencia, disponibilidad, cumplimiento y dotación, el Contratista recibirá una calificación del 50%.

- Si el personal del Contratista cumple el 70% o menos en asistencia, disponibilidad, cumplimiento y dotación, el Contratista recibirá una calificación del 0%.

9. Informes mensuales de Tránsito

Se evalúa la entrega y contenido de los informes de seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, lo cual debe realizarse dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes y debe contener los diferentes aspectos planteados.

- 100% si el informe ha sido entregado a tiempo y su contenido cumple con el 100% de lo solicitado.

- 50% si el informe ha sido entregado entre los 11 y 15 días del mes o su contenido cumple entre el 70% y el 100% de lo solicitado.

- 0% si el informe ha sido entregado después del día 15 o si, aún entregado a tiempo, su contenido no cumple con, por lo menos el 70% de lo solicitado.

10. Inconformidades al PMT

Se entenderán como inconformidades al PMT, las manifestaciones que en tal sentido formulen las comunidades y/o usuarios o en forma directa a la SMV . En igual sentido se considerarán favorablemente las soluciones que el Contratista tome en forma directa para atender las inconformidades recibidas. Para la parametrización de la calificación se tomarán en consideración, en porcentaje, el número de soluciones dadas sobre el número de quejas presentadas, teniendo en cuenta la siguiente fórmula

(Soluciones dadas/quejas recibidas) x 100
- Si el procentaje del producto de esta fórmula está entre el 100% y el 91% tendrá una calificación de 100%.
- Si se encuentra entre el 90% y el 71% tendrá una calificación de 90%.
- Si se encuentra entre el 70% y el 49% tendrá una calificación del 50%.
- Si es inferior al 49% tendrá una calificación de 0%.

CAUSALES DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS DEL CONTRATISTA.
La SMV podrá imponer las multas señaladas en la Cláusula de la minuta del Contrato MULTAS y por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el PMT, cuando el Contratista, entre otras:
1. No alcance la calificación de por lo menos el 80% en las listas de chequeo según la evaluación presentada por la Interventoría en el informe mensual.
2. Incumpla en tres (3) o más periodos mensuales consecutivos uno o varios ítems de las listas de chequeo.
3. Incumpla los requerimientos oficiados por la Interventoría o la SMV, en tres (3) o más ocasiones.

7436

INFORME SST

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

7437

CONTRATO N.° 106 -2023

PERIODO
De 01 septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023

Villavicencio, Meta



CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

NIT: 901.828.871 – 2
Carrera 16 # 24-03 villa olímpica.
escenariosdeportivos2023@gmail.com
Cel: 310 2453562

INFORME DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SST
PERIODO
De 01 septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	VERÓNICA CABARCA LIZCA	SST	VERONICA CABARCA.
APROBÓ	ZUNEILE PAOLA ARIAS BOTELLO	SST	

TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
OBJETIVOS 6
OBJETIVO GENERAL: 6
OBJETIVOS ESPECIFICOS 6
INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 7
ACTIVIDADES SGSST EJECUTADAS EN EL PERIODO: 8
RELACIÓN DE TRABAJADORES EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2023 11
PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES: 12
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES: 13
AUSENTISMO LABORAL: 13
CHARLAS DE SEGURIDAD - PREOPERACIONALES. 13
SUMINISTRO DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: 14
ORDEN Y ASEO 15
SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO DE MOVIMIENTO DE MAQUINARIA. 16
VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA. 16
CONCLUSIONES 17

7440

LISTA DE ANEXOS

Anexo N°1 *Asistencia diaria.*
Anexo N°2 *Inspección de EPP.*
Anexo N°3 *Asistencia actividades.*
Anexo N°4 *Entrega de dotación y EPP.*
Anexo N°5 *Preoperacional de maquinaria.*
Anexo N°6 *Control de equipos.*
Anexo N°7 *Informe SST – FCC IN BLAU.*
Anexo N°8 *GES-FO-33 Acta de relación de personal de obra e interventoría.*
Anexo N°9 *GES-FO-39 Acta control y seguimiento seguridad social y parafiscal.*

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la ejecución del contrato 106 - 2023 y los procedimientos establecidos, el presente documento pone en manifiesto las consideraciones y actividades reglamentarias para el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, velando por la calidad de vida, la salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades, el desempeño y desarrollo personal y social, promovidas a través del plan de salud y seguridad en el trabajo implementado durante todas las etapas constructivas de este proyecto.

La obra de Construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio - Departamento del Meta, puede presentar importantes impactos en la población trabajadora, que deben ser regulados a través del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

El presente documento se relaciona las actividades que se han desarrollado como parte del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el periodo de septiembre del 2023.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo, esto para eliminar o reducir cualquier riesgo que esté relacionado con las actividades que pueda desencadenar un accidente de trabajo o enfermedad laboral.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- *Realizar seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.*
- *Identificar los peligros y evaluar los riesgos presentes durante la ejecución de las actividades de los trabajadores.*
- *Generar acciones de Promoción y Prevención.*
- *Evaluar condiciones de SST en obra, en pro de prevenir condiciones no seguras que atenten contra la integridad física y mental del trabajador, brindando los EPP pertinentes y señalando los espacios no seguros transitados en obra.*
- *Presentar las evidencias correspondientes de acuerdo con la ejecución de las actividades desarrolladas en la ejecución de los proyectos en los diferentes frentes de trabajo.*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN BASICA	
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
VALOR DEL PROYECTO:	$ 31.845.658.891
	$ 8.805.724.533
	$ 10.228.557.418
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR ACTUALIZADO:	$50.871.940.842
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
CORREO ELECTRONICO:	Escenariosdeportivos2023@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 de 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
CORREO ELECTRONICO:	sstvilla.2023@gmail.com

7444

ACTIVIDADES SGSST EJECUTADAS EN EL PERIODO:

En el presente documento relaciona las actividades desarrolladas en obra, como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, realizadas durante el mes de setiembre de 2023.

Las actividades son ejecutadas teniendo en cuenta las necesidades de obra civil, y bajo estricto cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad para la Prevención y mitigación del COVID-19, tanto para los trabajadores como para contratistas que hacen parte del proyecto VILLA OLIMPICA – CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLIMPICA Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADIO MACAL.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
1/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. *IMPLEMENTACIÓN DE INSPECIÓN DE ARNES DE SEGURIDAD. *IMPLEMENTACIÓN DE FORMATO PLAN DE IZAJE. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * AFILIACIONES DE PERSONAL NUEVO. * VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS USADOS POR FCC. * ORDEN Y ASEO EN ALMACEN. * INDUCCION PERSONAL NUEVO. * LIQUIDACION DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.	
2/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. * VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CARGUE METALREC. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES. * ELABORACIÓN DE NUEVOS CAMPAMENTOS - INSTALACIONES TEMPORALES. * ORDEN Y ASEO PISTA DE ATLETISMO. * AFILIACIONES DE PERSONAL NUEVO. * MOVIMIENTO DE MINI DE ESCENARIOS A ATLETISMO. * ACOMPAÑAMIENTO EN DEMOLICIONES EN PATINAJE.	
4/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL Y CONTRATISTAS * RETIRO DE MATERIAL DEMOLICIÓN - ESTRUCTURA. *AREGLO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL. * RADICACIÓN DE AFILIACIONES. * VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES. * ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE FUNDIDA.	
5/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * SEÑALIZACIÓN AREA DE CARGUE RETIRO DE TAPETE ATLETISMO. * ORDEN Y ASEO AREA DE CARGUE. *ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE DEMOSTE EN PISTA DE PATINAJE.	

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
6/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE FUNDIDA. * VERIFICACION DE PLANILLAS DE CONTRATISTAS.	
7/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	
8/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONSORCIO. * ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE FUNDIDA.	
9/9/2023	*CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN BRIGADAS DE EMERGENCIAS. *CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	
11/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE INGRESO Y VISITA PREVIA PARA INICIO DE NUEVAS ACTIVIDADES. *RETIRO DE RESTANTES DE DESMONTE. * INGRESO DE NUEVA MAQUINA.	
12/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ORDEN Y ASEO EN EL INGRESO DE OBRA. * AREGLO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA.	
13/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ORDEN Y ASEO.	
14/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	
16/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
18/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * AREGLO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN.	
19/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES REVISIÓN DE CAJAS EN ATLETISMO.	
20/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. *AREGLO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA.	
21/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS FCC. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * CAPACITACIÓN MANEJO DE ABRASIVOS POR PROVEHEDOR. * ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE FUNDIDA. * ASEO EXTERNO EN VIA.	
22/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN ESCENARIOS 2. *AREGLO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA.	
23/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE FUNDIDA. * AREGLO DE SEÑALIZACIÓN.	
25/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS FCC. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * AREGLO DE SEÑALIZACIÓN. * DEMARCACIÓN DE VOLQUETAS PARA CIRCULACIÓN DE ACUERDO A APROBACIÓN DEL PMT.	
26/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. *AREGLO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA.	

7447

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACION /ACCIÓN
27/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. *INSTALACIÓN DE PUNTO DE EMERGENCIAS EN PISTA DE ATLETISMO. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE ATLETISMO.	
28/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA.	
29/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA. * MOVIMIENTO DE MAQUINARIA DE ESCENARIOS A PISTA DE ATLETISMO. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE ATLETISMO. * ELABORACIÓN INFORMDE DE SEGUIMIENTO PMT. * INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN NUEVA AREA DE INTERVENCIÓN.	
30/9/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA. * ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE FUNDIDA.	

RELACIÓN DE TRABAJADORES EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2023

De acuerdo con el control generado en obra se diligencia el formato GES-FO-33 ACTA DE REALACIÓN DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA, documento el cual se anexa al final de este informe.

- ***Ver tabla de anexos - GES-FO-33 acta de relación de personal de obra e interventoría.***

De igual manera se informa también, que el personal que ingresa a obra cuenta con la documentación al día y en regla, El área de la Seguridad y salud en el trabajo vela por el cumplimiento de las normas de la seguridad y salud en el trabajo establecidas en el proyecto y se realiza verificación documental previo al ingreso.

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	64
Empleos directos generados:	31
Empleos indirectos generados:	33

PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES:

Se realiza supervisión y seguimiento por parte del Área de Seguridad y salud en el trabajo, a los contratistas sobre la respectiva certificación del pago de la seguridad social, pensión, y riesgos Laborales de las personas que laboran para el contrato N° 106-2023.

A los contratistas se les exige el cumplimiento de la normatividad vigente en este aspecto, por esto actualmente deben enviar la documentación requerida para el ingreso a obra y esta permanece en el archivo digital de obra y se presenta anexa en estos informes mensuales.

Los Contratista atienden los lineamientos establecidos, presentando las planillas de pago de EPS, ARL, Pensiones y Parafiscales, las cuales anexas a este informe se presentan las siguientes:

Se presenta planilla de pago N°: 9457636115– CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS.
Se presenta planilla de pago N°: 1058226316 – CONSORCIO ESCENARIOS – OPERADOR MINI CAMILO ANDRES CASTAÑEDA.
Se presenta planilla de pago N°: 71548795 – CONSORCIO ESCENARIOS – OPERADOR RETRO 75 ELVER EDUARDO ORTIZ.
Se presenta planilla de pago N°: 9457449254 – CONSORCIO ESCENARIOS – OPERADOR RETRO 135 EDILSON FERNEY CHIVATA.
Se presenta planilla de pago N°: 9457612426 – WILSON CARDENAS OPERADOR.
Se presenta planilla de pago N°: 9457602720 – WILSON CARDENAS.
Se presenta planilla de pago N°: 9457074984 – WILSON CARDENAS OPERADOR JAVIER MONROY.
Se presenta planilla de pago N°: 1057268451– WILSON CARDENAS OPERADOR JEFFERSON SPIBEN PINEDA.
Se presenta planilla de pago N°: 9457636115 – FCC IN BLAU.

Las anteriores planillas de pago de aportes fueron aportadas por la sociedad ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS, la cual es miembro del CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.

Las actividades ejecutadas corresponden a las actividades necesarias a mano de obra especializada para la ejecución de los capítulos de obra informados en este presente periodo.
La siguiente corresponde a los contratistas vinculados por el CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.

Se presenta planilla de pago N°: 9456624580 – TOPOGRAFIA JUAN ANTONIO BARBOSA.

Se presenta planilla de pago N°: 27966156 E– TOPOGRAFIA JONATHAN MALAVER.
Se presenta planilla de pago N°: 27965942 I– TOPOGRAFIA JONATHAN MALAVER.

Se presenta planilla de pago N°: 9457595370 E– TOPOGRAFIA RAUL VELASCO.
Se presenta planilla de pago N°: 27890188 I– TOPOGRAFIA RAUL VELASCO.

NOTA; *Se deja claridad que algunas planillas que se anexan corresponden al mes anterior dado que se paga según los últimos dígitos de la identificación del aportante, por lo cual algunos contratistas se encuentran en vigencia en las fechas en las que se presenta este informe y por tal motivo no se anexa la planilla correspondiente al mes del informe.*

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES:

Los exámenes médicos ocupacionales, se realizan al personal que va a ingresar a laborar directa e indirectamente en la obra, en el caso de los contratistas hace parte de los requisitos documentales de ingreso, para así vigilar el cumplimiento de este.

El examen periódico, y retiro se realiza conforme al tiempo de duración del trabajador.

Dando así cumplimiento en este periodo al examen de ingreso.

- ***Exámenes médicos ocupacionales anexo a la documentación de ingreso del personal del mes.***

AUSENTISMO LABORAL:

El ausentismo laboral es la inasistencia al trabajo por periodos de uno o más días, lo cual se genera un gran impacto sobre el desarrollo y avance de la ejecución, pero además sobre la empresa quien ve afectada su productividad, lo que al final se traduce en una desaceleración y bajo rendimiento.

El ausentismo laboral se refleja ya sea por accidentes, enfermedades, motivos personales etc., y de lo cual se presenta e informa en este informe.

- ***Ver tabla de anexos – No se presentaron ausencias.***


CHARLAS DE SEGURIDAD - PREOPERACIONALES.

Las actividades relacionadas con la formación, capacitación, charlas de seguridad y salud en el trabajo, fortalecimiento de la comunicación interna, y desarrollo de valores, entre otros; han permitido que el clima laboral mejore especialmente en la dimensión laboral.

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de seguridad y salud en el trabajo. Se trata de lograr que todos los trabajadores de la empresa, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro y confortable.

Por otra parte, de esta forma se da cumplimiento a la normatividad legal vigente, la cual obliga a los empleadores a informar a sus trabajadores, a que riesgos pueden estar expuestos durante la ejecución de sus labores que tiene como objetivo proveer

formalmente a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de la seguridad y salud en el trabajo.

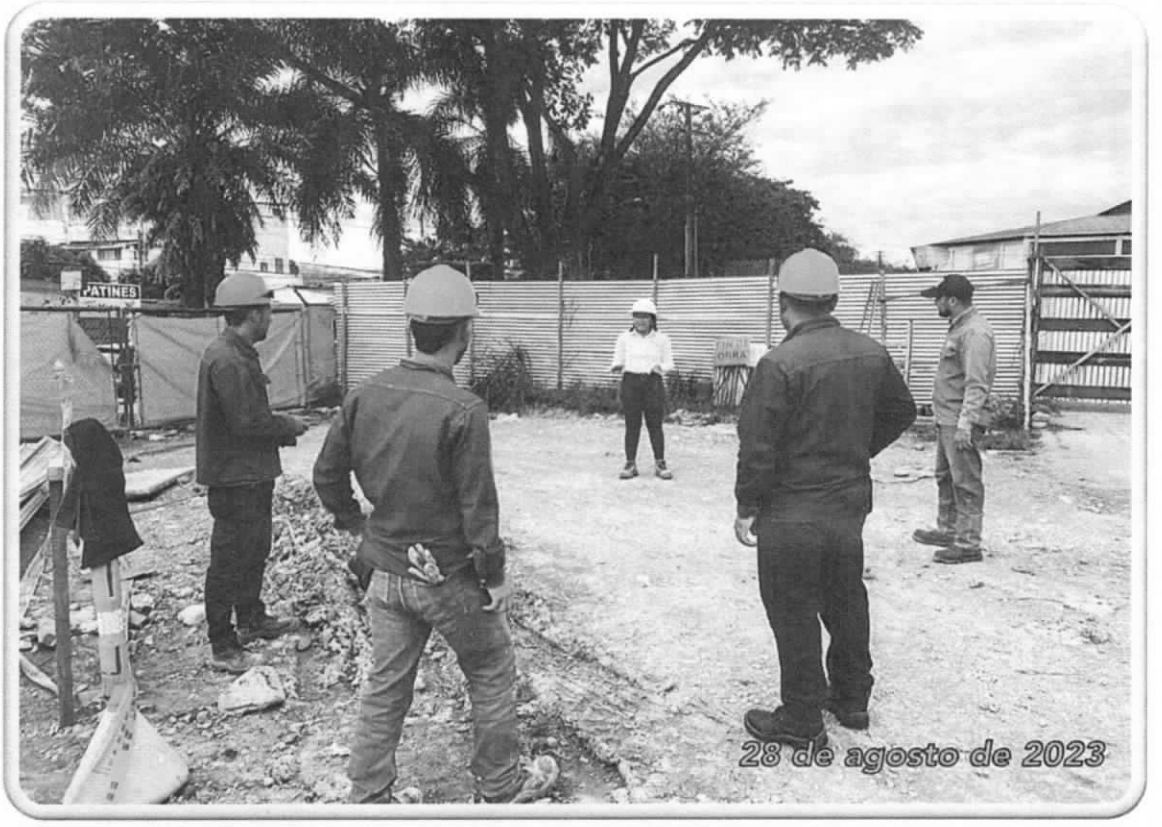

- ***Ver tabla de anexos - Registro Asistencia Charlas de seguridad.***

SUMINISTRO DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:

Los elementos de protección personal deben utilizarse como medida de protección de acuerdo a los establecido en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos de protección personal, su formación y la educación de los empleados que los deben de utilizar en las diferentes actividades que desarrollan dentro del proyecto, en donde además se busca la prevención y disminución de incidentes y accidentes laborales, además del control de los riesgos laborales.

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta.
Para la selección de los elementos de protección personal se tiene como base la matriz de elementos de protección, donde se hace relación el cargo, la actividad a ejecutar y la protección a utilizar.

Se cuenta con el registro de entrega de los elementos de protección personal, individual y de elementos, tanto de ingreso como el cambio cada que se requiere, para así mitigar los riegos presentes durante la ejecución de las actividades.

Para la reposición el trabajador debe hacer entrega de los elementos de protección que desea cambiar.

- ***Ver tabla de anexos - Entrega de Epp y Elementos de Bioseguridad.***

ORDEN Y ASEO

Los lugares de trabajo deben permanecer limpios y ordenados, esto con el fin de optimizar el uso del espacio, mejorar la eficiencia del trabajo, evitar problemas sanitarios, incidentes o accidentes laborales y en general, por conservar un entorno más seguro para toda la población vinculada directa o indirectamente a la obra.

Para ello se cuenta en cada frente de trabajo con un punto ecológico, debidamente señalizado y demarcado para la disposición adecuada de los residuos.

- ***SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.***






7452


SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO DE MOVIMIENTO DE MAQUINARIA.

Se realiza movimiento de maquinaria por la ruta aprobada en el PMT con acompañamiento de señalizador paletero de ida y regreso.

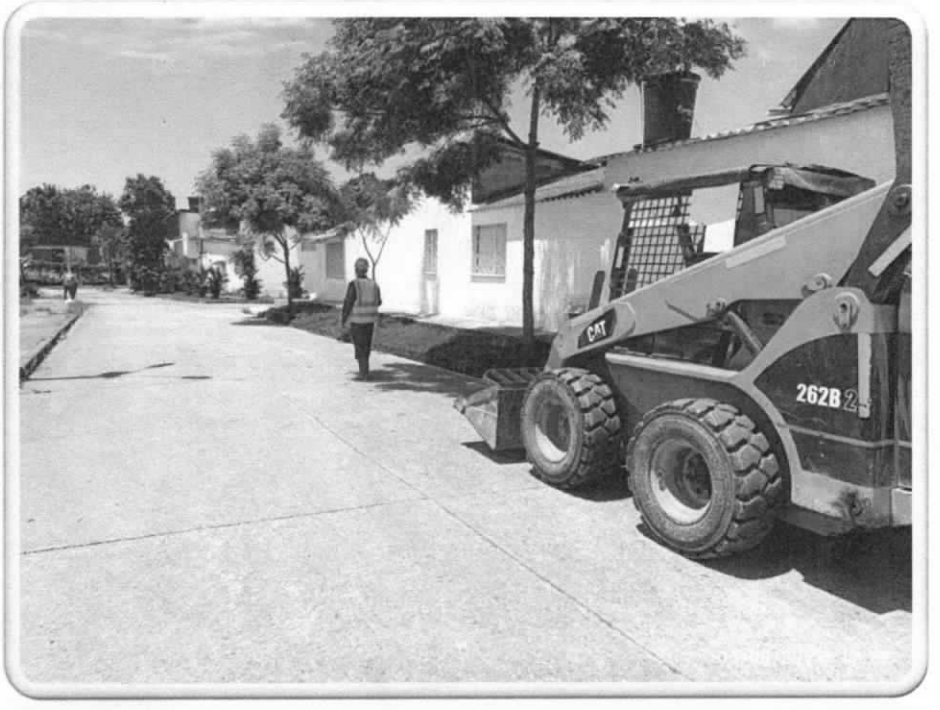

VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA.



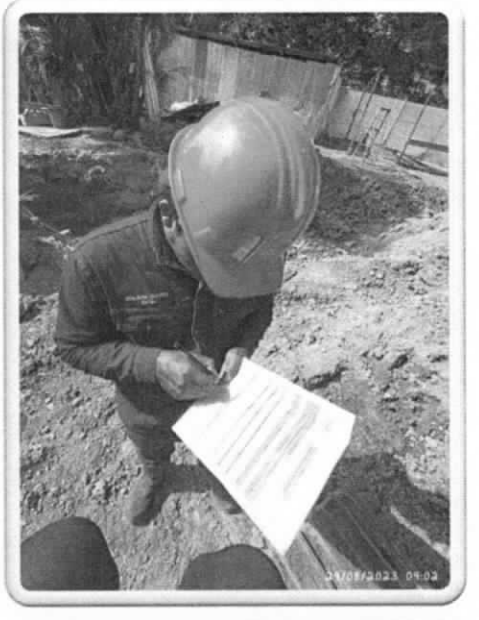

CONCLUSIONES

Durante el periodo de tiempo evaluado en el presente informe, se han evidenciado las diferentes prácticas implementadas en la obra "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META" que pretenden el mejoramiento continuo de la seguridad y salud del trabajador, bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud e el trabajo, Siguiendo las normas establecidas para así lograr minimizar los riesgos presentes en las actividades que se ejecutan día a día.

7454

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASISTENCIA DIARIA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

7455

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	FCC IN BLAU	FECHA:	25-09-2023 / 01-10-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JENNY CAROLINA GIRALDO MARIN	INSPECTOR SST							
2	CESAR ORLANDO CAÑON JIMENEZ	COORDINADOR	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00			
3	YERSON FABIAN MORENO ACHURY	AYUDANTE							
4	BRAYAN ALBERTO ORTIZ	AYUDANTE							
5	DIEGO FERNANDO ENCISO	AYUDANTE							
6	ARLEY ARTURO GUERRA	AYUDANTE							
7	LIBANIEL GONZALEZ MARTINEZ	AYUDANTE							
8	GERMAIN FEIJOO MONTOYA	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	
9	MIGUEL ANGEL NARVAEZ	AYUDANTE							
10	DERFY GUACARAPE MANFARA	AYUDANTE	7:00 5:50	7:00	7:00	7:00	7:00		
11	JOHN FREDY VELANDIA	AYUDANTE	7am 5pm	7am 5pm	7am 5pm	7am 5pm	7am 5pm	7am	
12	JUAN DAVID MARTINEZ	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00	
13	GERMAN PEREIRA FERREIRA	AYUDANTE	7:00	7:00	7:00	7:00			
14	WILMER ANDRES JARABA MORA	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00	
15	OMAR IVAN PEREZ HENAO	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00	
16	JOSE FERNANDO PEREZ TRIANA	AYUDANTE	5:00	7:00	7:00	7:00			
17	WILSON TRIANA CAVIELES	AYUDANTE	5:30	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: FCC IN BLAU | **FECHA:** 25-09-2023 / 01-10-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	WILSON EDGARDO RMIREZ FUQUENE	AYUDANTE	Wilson Ramirez 700 A 530 P	Wilson Ramirez 700 A 500 P	Wilson Ramirez 700 A 500 P	Wilson Ramirez 700 A 500 P	Wilson Ramirez 700 A 500 P	Wilson Ramirez 700 A	
2	JOAN SEBASTIAN TARAZONA FLOREZ	AYUDANTE	Jhoan 7:00 5:00	Jhoan 7:00 5:00	Jhoan 7:00 5:00	Jhoan 7:00 5:00	Jhoan 7:00 5:00	Jhoan 7:00	
3	JOSE MONTOYA	AYUDANTE	7 AM	7 AM	7 AM	7 AM	7 AM	7 AM	
4	JEAN SMORTO	AYUDANTE	7 AM	7:00 5:00	7:00 AM 1:00	7:00 AM	7:00 AM	7:00 AM	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

7452

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA:	25-09-2023 / 01-10-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	YEISON GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12:00	
2	CARLOS ANDRES CAICEDO CASTAÑO	RESIDENTE DE OBRA	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12:30	
3	VERONICA CABARCA LIZCA	COORDINADOR SST	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12:00	
4	CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12:00	
5	THERLY YANINY CONTRERAS	AMBIENTAL	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00			
6	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00 5:00	6:00 6:00	6:00 6:00	6:00 6:00	6:00	
7	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00	
8	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	7:00 6:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00	
9	EDINSON CARLOS JAIR PEÑA	ALMACENISTA	7:00 5:00	7:00 5:10	7:00 5:10	7:00 5:15	7:00 5:00	7:00 12:15	
10	JHON NEYDER CASTILLO SANCHEZ	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12:00	
11	CAMILO ANDRES FUENTES CARRILLO	RESIDENTE DE OBRA	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:30	7:00 12:30	
12	LAURA XIMENA BRAVO	INSP SST	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 1:00pm	
13	ISAAC JOSE PUPO	APRENDIZ	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12:00	

7458

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS | **FECHA:** 25-09-2023 / 01-10-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	CARLOS JAVIER FERNANDEZ GUERRERO	AYUDANTE	J 6:00 6:00	J 6:00 5:00	J 7:00 5:00	J 7:00 5:00	J 7:00 5:00	J 7:00	
2	JOSE ANGEL CRUZ	AYUDANTE	Jose Angel 7AM 5PM	Jose Angel 7AM 5PM	Jose Angel 7AM 5PM	Jose Angel 7AM 5PM	Jose Angel 7AM 5PM	Jose Angel 7AM	
3	BRAYAN STEVEN HERNADEZ CAMPOS	AYUDANTE	—	—	—	—	—	—	
4	JUAN JOSE SUTA	INSP CIVIL	7:00 am 5:00 PM	7 AM 5 PM	7 AM 5 pm	7 AM 5 pm	7AM 5:pm	7:00 12:00	
5	BRAYAN GRATEROL	AYUDANTE	7:00 10:AM						
6	Jonathan G	Ayudante	Jonathan 7:00 6:00	Jonathan 7:00 5:00	Jonath 7:00 5:30	Jonathan 7:00 5:00	Jonathan 7:00 5:00	Jonath 7:00	
7	CRISTIAN GIRALDO	INGENIERO	Cristian 7:00 5:00	Cristian 7:00 5:00	Cristian 7:00 5:00	Cristian 7:00 5:00	Cristian 7:00 5:00	Cristian 7:00 1:00	
8									
9									
10									
11									
12									
13									

7459

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: TOPOGRAFIA JUAN BARBOSA | **FECHA:** 25-09-2023 / 01-10-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
1	PABLO JOSE WILCHES	TOPOGRAFO	7:00AM	5:00PM	7:00AM	5:00PM	7:00AM	5:00P.M	7:00AM	5:00P.M	7:00AM	5:00P.M	7:00AM	12:00P.M		
2	YEISON FLORES	CADENERO	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	12:00		
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																

7460

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	TOPOGRAFIA MALAVER	FECHA:	25-09-2023 / 01-10-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JONATHAN MALAVER NEIRA	TOPOGRAFO	5:00 5pm	7a 5pm	7am 5pm	7a 5pm	7a		
2	HERNANDO OLIMPO ESCALANTE LOPEZ	CADENERO	7:00AM 5:00PM	7:00AM 5:00PM	7:00AM 5:00PM	7:00AM 5:00PM	7:00	7:00 1:00	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

7161

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: TOPOGRAFIA VELASCO | **FECHA:** 25-09-2023 / 01-10-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
1	RAUL VELASCO	TOPOGRAFO	7:00	5:00	700	500	700	500	7:00		700		700	12		
2	OSCAR MENDEZ	TOPOGRAFO	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	8:00	7:00	12:00		
3	ANGEL SANABRIA	TOPOGRAFO	7:00	5:00	7:00	5:pm	7:00	5:pm	7:00	5:00	7:00	5.pm	7:00	12:00		
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																

7462

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: MAQUINARIA **FECHA:** 25-09-2023 / 01-10-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	ELVER EDUARDO ORTIZ	OPERADOR	ECUER ORTIZ 6:50 5:00	ECUER ORTIZ 7:00 5:00	ECUER ORTIZ 7:00 5:00	ECUER ORTIZ 7:00 4:50	ECUER ORTIZ 6:55		
2	EDILSON FERNEY CHIVATA	OPERADOR	6 5	7 5	7 5	7 5	7 5	7 5	
3	CAMILO ANDRES CASTAÑEDA GOMEZ	OPERADOR	7 5	7 5	7 5	7 5	7 5	7 10	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

7463

CORPORACIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: WILSON CARDENAS | **FECHA:** 25-09-2023 / 01-10-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JEISON CARDENAS	AYUDANTE	Jeison Cardenas 7:00 5:00	Jeison C. 7:00 5:00	Jeison Cardenas 7:00 5:00	Jeison C. 7:00 5:00	Jeison C. 7:00 5:00	Jeison C. 7:00 5:00	
2	ALEXANDER PEÑALOZA	AYUDANTE	Alexander P. 7:00 5:00	Alexander 7:00 5:00	Alexander 7:00 5:00	Alexander 7:00 5:00	Alexander 7:00 5:00	Alexander 7:00 5:00	
3	OMAR ALOSA	AYUDANTE			Jeison C.				
4	JESUS BETANCOURT	AYUDANTE			Jesus B. 7:00 5:00				
5	Hard Barbosa	AYUDANTE		Hard B. 7:00 5:00	Hard B. 7:00 5:00				
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

7c164

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA:	18-09-2023 / 24-09-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	YEISON GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 12:00	
2	CARLOS ANDRES CAICEDO CASTAÑO	RESIDENTE DE OBRA	7:00 | 5:00	7:00 | 5:15	7:00 | 5:00	7:00 | 5:15	7:00 | 5:15	7:00 | 12:30	
3	VERONICA CABARCA LIZCA	COORDINADOR SST	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 12:00	
4	CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 12:00	
5	THERLY YANINY CONTRERAS	AMBIENTAL	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00		
6	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	2:00 | 5:00	— | —	7:00 | 12:00	
7	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	6:00 | 5:00	6:00 | 6:00	6:00 | 6:00	6:00 | 6:00	6:00 | 6:00	6:00	
8	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 12:00	
9	EDINSON CARLOS JAIR PEÑA	ALMACENISTA	7:00 | 5:10	7:00 | 5:10	7:00 | 5:15	6:55 | 5:10	6:55 | 5:15	6:55	
10	JHON NEYDER CASTILLO SANCHEZ	AYUDANTE	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 12:00	
11	CAMILO ANDRES FUENTES CARRILLO	RESIDENTE DE OBRA	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 12:00	
12	LAURA XIMENA BRAVO	INSP SST	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 12:00	
13	ISAAC JOSE PUPO	APRENDIZ	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA:	18-09-2023 / 24-09-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	CARLOS JAVIER FERNANDEZ GUERRERO	AYUDANTE	Jose 7:00 5:00	Jose 7:00 5:00	Jose 7:00 5:00	Jose 7:00 5:00	Jose 7:00 5:00	Jose 7:00 12:00	
2	JOSE ANGEL CRUZ	AYUDANTE	Jose Angel 7AM 5PM	Jose Angel 7AM 5PM	Jose Angel 7AM 5PM	Jose Angel 7AM	Jose Angel 7AM 5PM	Jose Angel 7AM 12:00 PM	
3	BRAYAN STEVEN HERNADEZ CAMPOS	AYUDANTE	— —						
4	Jonathan Ramos	Ayudante		Jonathan 7:00 5:00	Jonathan 7:00 5:00	Jonathan 7:00 5PM	Jonathan 7:00 5:00	Jonathan 7:00 12:00	
5	Brayan Gratero	Ayu		7:00			Brayan Gratero 7:00 5:00	Brayan Gratero 7:00 12:00	
6	Juan Jose Soto	Ing Residente			Juan Soto 7:00 5:00	Juan Soto 7:00 5:00	Juan Soto 7:00 5:00	Juan Soto 7:00 12:00	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

7466

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	TOPOGRAFIA VELASCO	FECHA:	18-09-2023 / 24-09-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	RAUL VELASCO	TOPOGRAFO					7:00 5:00	7:04	
2	OSCAR MENDEZ	TOPOGRAFO					7:00 5:00	7:00	
3	ANGEL SANABRIA	TOPOGRAFO					octavio s 7:21 5:03	octavio s. 7:00	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

7467

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	WILSON CARDENAS	FECHA:	18-09-2023 / 24-09-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	WILSON CARDENAS	CONTRATISTA							
2	JEISON CARDENAS	AYUDANTE	Jason C. 7:00 5:00	Jeison C. 7:00 17:00	Jeison C. 7:00 10:00	Jeison C. 9:00 5:00	Jeison C. 9:00 5:00	Jeison C. 7:00 5:00	
3	JAVIER MONRROY	OPERADOR	Falla						
4	ALEXANDER PEÑALOZA	AYUDANTE	7.00 5.00	7.00 5.00	7.00 10.00	7.00 5.00	7.00 5.00	7.00 17.00	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

7468

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2022

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	TOPOGRAFIA JUAN BARBOSA	FECHA:	18-09-2023 / 24-09-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
1	PABLO JOSE WILCHES	TOPOGRAFO	7:00 AM	5:00 P.M	7:00 AM	5:00 P.M	7:30 A.M	5:00 P.M	7:00 A.M	5:00 P.M	7:00 AM	5:00 P.M	7:00 AM	12 M		
2	YEISON FLORES	CADENERO	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	12:00		
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																

7469

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2022

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	TOPOGRAFIA MALAVER	FECHA:	18-09-2023 / 24-09-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
1	JONÁTHAN MALAVER NEIRA	TOPOGRAFO	7am	5pm	7am	5pm	7am	5pm	7am	5pm	7am	5pm	7am	12.00		
2	HERNANDO OLIMPO ESCALANTE LOPEZ	CADENERO	7:00AM	5:00PM	7:00AM	5:00PM	7:00AM	5:00PM	7:00AM	5:00PM	7:00AM	5:00PM	7:00AM	12:00PM		
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																

7470

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: MAQUINARIA **FECHA:** 18-09-2023 / 24-09-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	ELVER EDUARDO ORTIZ	OPERADOR	6:45 | 5. PM	7:00 | 5:00	6:50 | 5.00	6:50 | 5:00	6:50 | 5:00	6.50 | 12:00	
2	EDILSON FERNEY CHIVATA	OPERADOR	7 | 5	7 | 5	7 | 5	7 | 5	7 | 5	7 | 5	
3	CAMILO ANDRES CASTAÑEDA GOMEZ	OPERADOR	7 | 5	7 | 5	7 | 5	7 | 5	7 | 5.	7 | 12	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

7471

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: FCC IN BLAU **FECHA:** 18-09-2023 / 24-09-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	WILSON EDGARDO RMIREZ FUQUENE	AYUDANTE	Wilson Ramirez 700:A 500:P	Wilson Ramirez 700:A 500:P	Wilson Ramirez 700:A 500:P	Wilson Ramirez 700:A 500:P	Wilson Ramirez 700:A 500:P	Wilson Ramirez 700:A 7:30:P	
2	JOAN SEBASTIAN TARAZONA FLOREZ	AYUDANTE	Jhoan 7:00 500	Jhoan 7:00 5:00	Jhoan 7:00 5:00	Jhoan 7:00 5:00	Jhoan 7:00 5:00	Jhoan 7:00	
3	José Hector Montoya	oficial							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

7472

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2022

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	FCC IN BLAU	FECHA:	18-09-2023 / 24-09-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JENNY CAROLINA GIRALDO MARIN	INSPECTOR SST							
2	CESAR ORLANDO CAÑON JIMENEZ	COORDINADOR							
3	YERSON FABIAN MORENO ACHURY	AYUDANTE							
4	BRAYAN ALBERTO ORTIZ	AYUDANTE							
5	DIEGO FERNANDO ENCISO	AYUDANTE							
6	ARLEY ARTURO GUERRA	AYUDANTE							
7	LIBANIEL GONZALEZ MARTINEZ	AYUDANTE							
8	GERMAIN FEIJOO MONTOYA	AYUDANTE							
9	MIGUEL ANGEL NARVAEZ	AYUDANTE							
10	DERFY GUACARAPE MANFARA	AYUDANTE							
11	JOHN FREDY VELANDIA	AYUDANTE							
12	JUAN DAVID MARTINEZ	AYUDANTE							
13	GERMAN PEREIRA FERREIRA	AYUDANTE							
14	WILMER ANDRES JARABA MORA	AYUDANTE							
15	OMAR IVAN PEREZ HENAO	AYUDANTE							
16	JOSE FERNANDO PEREZ TRIANA	AYUDANTE							
17	WILSON TRIANA CAVIELES	AYUDANTE							

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS | **FECHA:** 11-09-2023 / 17-09-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	YEISON GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	
2	CARLOS ANDRES CAICEDO CASTAÑO	RESIDENTE DE OBRA	PRIMERA	PRIMERA	PRIMERA	PRIMERA	PRIMERA	PRIMERA	
3	VERONICA CABARCA LIZCA	COORDINADOR SST	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	
4	CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	
5	THERLY YANINY CONTRERAS	AMBIENTAL	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	
6	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	7:00 | 4:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00	
7	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	7:00 | 5:00	7:00 | 5:0	7:00 | 5:0	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00	
8	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	6:00 | 6:00	6:00 | 6:00	6:00 | 6:00	6:00 | 6:00	6:00 | 6:00	6:00 | 6:00	
9	EDINSON CARLOS JAIR PEÑA	ALMACENISTA	6:55 | 5:00	6:50 | 5:10	6:55 | 5:10	7:00 | 6:10	7:00	7:00 | 12:10	
10	JHON NEYDER CASTILLO SANCHEZ	AYUDANTE	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00		
11	CAMILO ANDRES FUENTES CARRILLO	RESIDENTE DE OBRA	PRIMERA	PRIMERA	PRIMERA	PRIMERA	PRIMERA	PRIMERA	
12	LAURA XIMENA BRAVO	INSP SST	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	
13	ISAAC JOSE PUPO	APRENDIZ	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00	7:00 | 5:00		

7174

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA:	11-09-2023 / 17-09-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	CARLOS JAVIER FERNANDEZ GUERRERO	AYUDANTE			Javier E 7AM 5PM	Javier 7:00 5:00	Javier F 7:00 5:00	F 7:00	
2	JOSE ANGEL CRUZ	AYUDANTE			Jose Angel 7AM 5PM	Jose Angel 7AM 5PM	Jose Angel 7AM 5PM	Jose Angel 7AM	
3	BRAYAN STEVEN HERNADEZ CAMPOS	AYUDANTE			L 7:00 5:00	L 7:00 5:00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

7475

CONSORCIO RECREANDO DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	FCC IN BLAU	FECHA:	11-09-2023 / 17-09-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JENNY CAROLINA GIRALDO MARIN	INSPECTOR SST				Carolina G 7:00 5:00	Carolina G 7:00 5:00	Carolina G 7:00	
2	CESAR ORLANDO CAÑON JIMENEZ	COORDINADOR							
3	YERSON FABIAN MORENO ACHURY	AYUDANTE	Yerson M 7:00 Sim	Yerson M 7:00 Sim	Yerson M 7:00 Sim	Yerson M 7:00 Sim	Yerson M 7:00 Sim	Yerson M 7:00	
4	BRAYAN ALBERTO ORTIZ	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00 5:00		7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12	
5	DIEGO FERNANDO ENCISO	AYUDANTE	ENCISO T 7:00 5:00						
6	ARLEY ARTURO GUERRA	AYUDANTE							
7	LIBANIEL GONZALEZ MARTINEZ	AYUDANTE							
8	GERMAIN FEIJOO MONTOYA	AYUDANTE	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	
9	MIGUEL ANGEL NARVAEZ	AYUDANTE							
10	DERFY GUACARAPE MANFARA	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00	
11	JOHN FREDY VELANDIA	AYUDANTE	7 am	7 am 5 PM	7 am 5 pm	7 am 6 pm	7 am	7 am	
12	JUAN DAVID MARTINEZ	AYUDANTE	Juan David 7:00 5:00	Juan David 7:00 5:00	Juan David 7:00 5:00	Juan David M A 7:00 5	Juan David 7:00 5:00	Juan David 7:00	
13	GERMAN PEREIRA FERREIRA	AYUDANTE	7:00 3:00	German pereira 7:00 5:00	7:00	German pereira 7:00 4:00	7:00 Cesar M 7:00 Cesar	7:00	
14	WILMER ANDRES JARABA MORA	AYUDANTE	Wilmer Jaraba 7:00 5:00	Wilmer Jaraba 7:00 5:00	Wilmer Jaraba 7:00 5:00	Wilmer Jaraba 7:00 5:00	Wilmer Jaraba 7:00 5:00	Wilmer Jaraba 7:00 5:00	
15	OMAR IVAN PEREZ HENAO	AYUDANTE	Omar Ivan 7:00 5:00	Omar Ivan 7:00 5:00	Omar Ivan 7:00 5:00	Omar Ivan 7:00 6:00	Omar Ivan 7:00 5:00	Omar Ivan 7:00 12:00	
16	JOSE FERNANDO PEREZ TRIANA	AYUDANTE	Jose Perez 0700	Jose Perez 0700	Jose P 0700	Jose P 0700	Jose P 0700	Jose P 0700	
17			0						

.7476

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	FCC IN BLAU	FECHA:	11-09-2023 / 17-09-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	WILSON TRIANA CAVIELES	AYUDANTE	6:00 35	07	07	07	07	07 | 17	
2	JOAN SEBASTIAN TARAZONA FLOREZ	AYUDANTE	Jhoan 7:00 | 5:00	sebastian 7:00	Jhoan 7:00 | 5:00	Jhoan 7:00 | 5:00	Jhoan 7:00 | 5:00	Jhoan 7:00	
3	WILSON EDGARDO RMIREZ FUQUENE	AYUDANTE		wilson Ramirez 7:00A | 5:00P	wilson Ramirez 7:00A | 5:00P	wilson Ramirez 7:00 A | 6:00A	wilson Ramirez 7:00 A	wilson Ramirez 7:00A	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
