12903

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023 Página 1 de 1
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	

Villavicencio, 21 de diciembre del 2023

CEDVO-145-2023

21-12-2023
3:00pm
Dra Andrea H

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de informe mensual de noviembre 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe mensual de obra No.07 correspondiente al mes de noviembre del 2023.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo:____folios

INFORME DE OBRA No. 07

Periodo de 01, 11, 2023 a 30, 11, 2023
Fecha de Presentación: 10, 12, 2023

INFORMACIÓN BASICA	
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO 1:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
OBJETO PROYECTO 2:	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
OBJETO PROYECTO 3:	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
VALOR DEL PROYECTO 1:	$ 31.845.658.891 BPIN 2022005500024
VALOR DEL PROYECTO 2:	$ 8.805.724.533 BPIN 2022005500022
VALOR DEL PROYECTO 3:	$ 10.220.557.418 BPIN 2022005500094
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR ACTUALIZADO:	$ 50.871.940.842
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
CORREO ELECTRONICO:	escenariosdeportivos2023@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 de 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
CORREO ELECTRONICO:	interescenariosc@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de Mayo de 2023
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

FECHA DE TERMINACIÓN	09 de Mayo de 2024
12 Meses	0 Días

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO ESCENARIOS MULTIPROPOSITO

MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°8´24"N 73°37´06"W		

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO PISTA DE PATINAJE

MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°8´21"N 73°37´07"W		

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO PISTA DE ATLETISMO


MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°8´24"N 73°37´13"W		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

12906

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

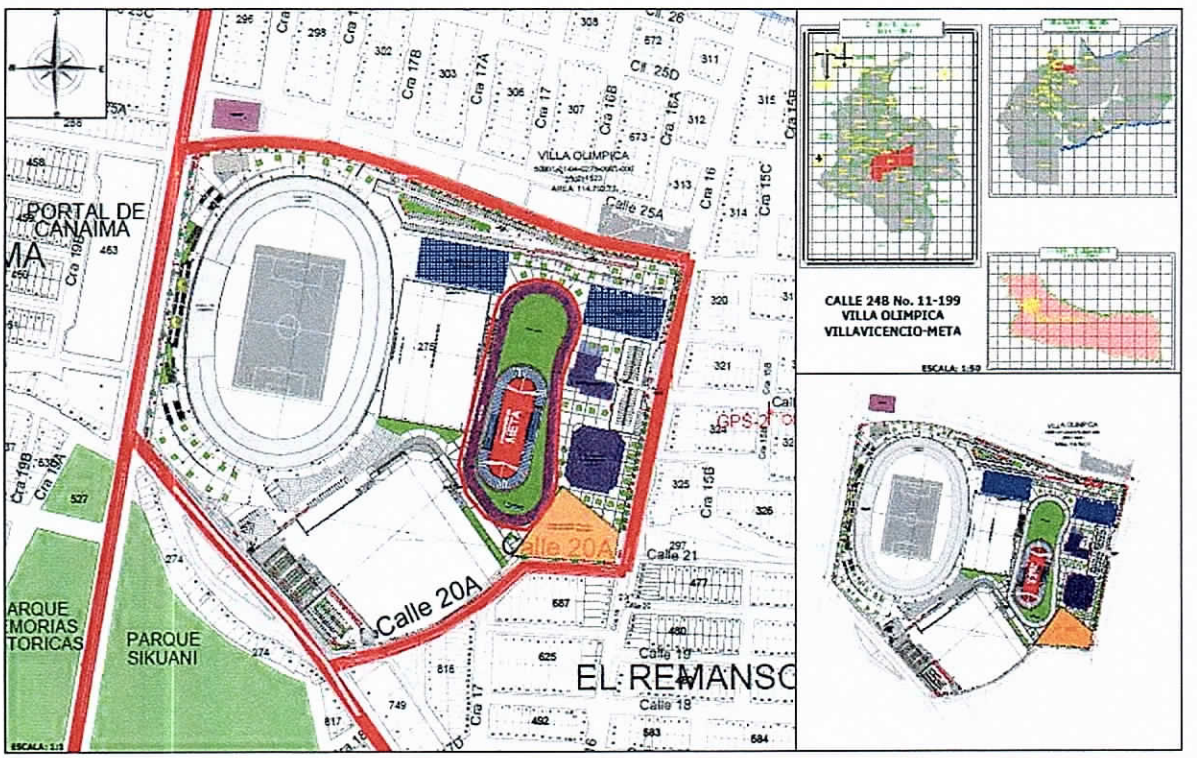

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Avance físico


ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	11.59%	$ 3,690,859,734	17.87%	$ 5,691,073,303	0.98%	$ 310,604,627	7.54%	$ 2,401,711,964
CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	9.63%	$ 848,323,258	33.54%	$ 2,953,646,241	0.30%	$ 26,260,424	8.46%	$ 745,084,235
CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	2.10%	$ 215,046,483	12.07%	$ 1,233,260,833	0.29%	$ 29,670,066	1.57%	$ 160,275,351
CONTRATO No.106 DE 2023	**9.35%**	**$ 4,754,229,475**	**19.42%**	**$ 9,877,980,377**	**0.72%**	**$ 366,535,117**	**6.50%**	**$ 3,307,071,551**


Para el avance físico de cada proyecto se tomó la relación con el presupuesto de cada uno de ellos.

Para el avance físico general del contrato se tomó la suma de las ejecuciones de cada proyecto con relación al valor total del contrato. Se adjunta como anexo el cuadro detallado por cada actividad.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Gráfica Avance Físico

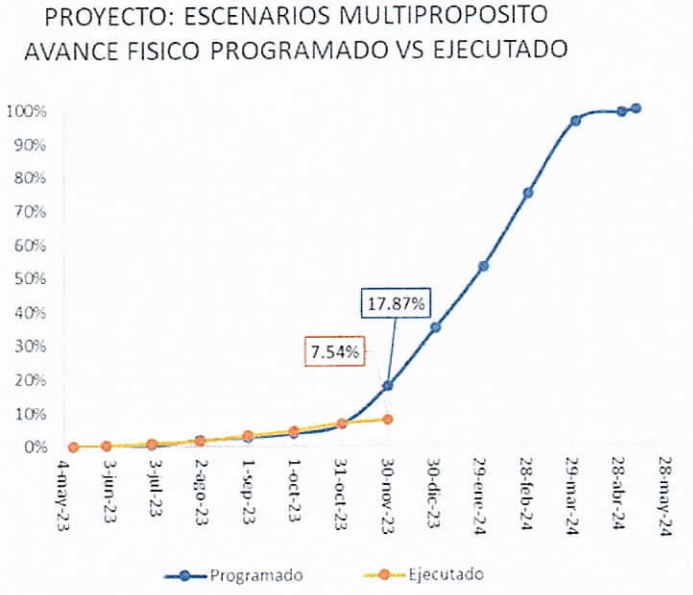


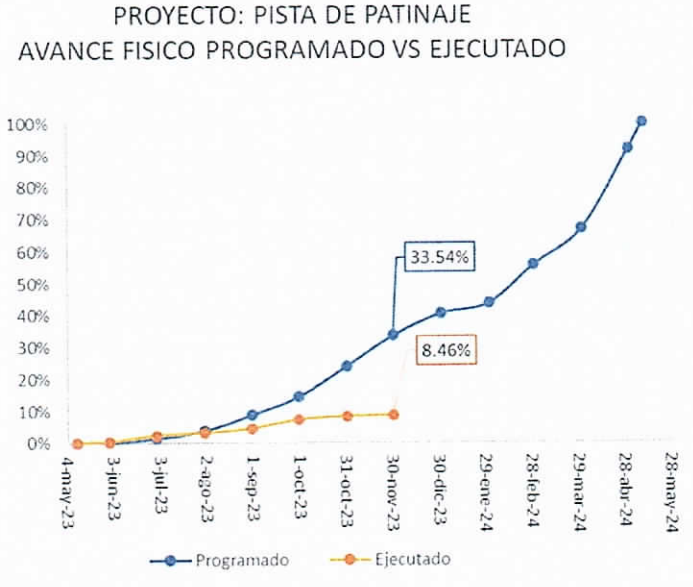


Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

PROYECTO: PISTA DE ATLETISMO
AVANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADO

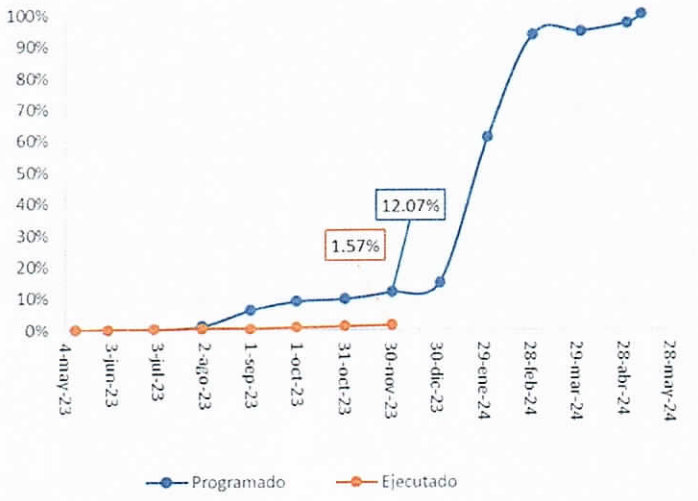

RESUMEN CONTRATO No.106 DE 2023
AVANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADO

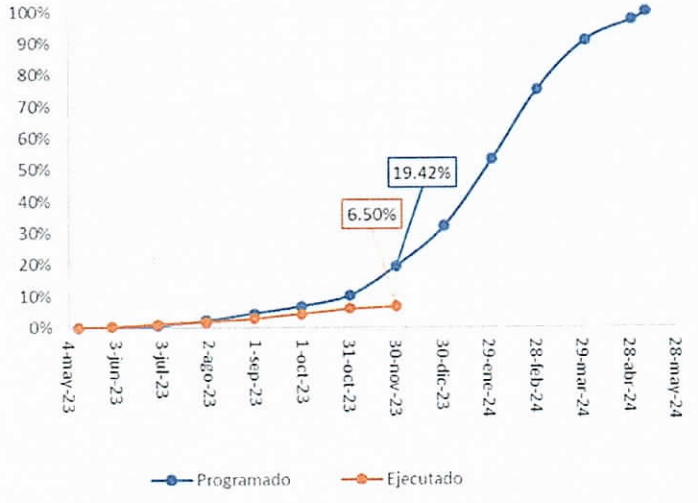

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo de los proyectos, Comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
07-11-2023	OF-C249-2023-180	Aprobación y pago Orden de Giro No.8 anticipo. Fiduciaria Alianza Fideicomiso No. 113392	Interventoría	Contratista
09-11-2023	OF-C249-2023-181	Aprobación y pago Orden de Giro No.10 anticipo. Fiduciaria Alianza Fideicomiso No. 113392	Interventoría	Contratista
10-11-2023	OF-C249-2023-182	Traslado oficio Federación Colombiana de patinaje FPC 01 20231107000001	Interventoría	Contratista
10-11-2023	OF-C249-2023-183	Aprobación y pago Orden de Giro No.09 anticipo. Fiduciaria Alianza Fideicomiso No. 113392	Interventoría	Contratista
14-11-2023	OF-C249-2023-184	Aprobación y pago Orden de Giro No.11 anticipo. Fiduciaria Alianza Fideicomiso No. 113392	Interventoría	Contratista
14-11-2023	OF-C249-2023-185	Aprobación reprogramación Plan de inversión del Anticipo	Interventoría	Contratista
17-11-2023	OF-C249-2023-187	Aprobación y pago Orden de Giro No.12 anticipo. Fiduciaria Alianza Fideicomiso No. 113392	Interventoría	Contratista
21-11-2023	OF-C249-2023-189	Respuesta correo Electrónico de fecha lunes 20 de noviembre, 09:33AM	Interventoría	Contratista
23-11-2023	OF-C249-2023-190	Reiteración del informe de gerencia de proyectos	Interventoría	Contratista
23-11-2023	OF-C249-2023-191	Solicitud del seguimiento del	Interventoría	Contratista

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		programa de seguridad industrial y salud ocupacional.		
30-11-2023	OF-C249-2023-194	Reiteración Solicitud del seguimiento del programa de seguridad industrial y salud ocupacional.	Interventoría	Contratista
30-11-2023	OF-C249-2023-195	Reiteración del informe de gerencia de proyectos	Interventoría	Contratista
01-11-2023	CEDVO-119-2023	Solicitud de prorroga para el PMT de escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo	Contratista	Secretaría de Movilidad de Villavicencio
01-11-2023	CEDVO-120-2023	Entrega de informe PMT de octubre 2023	Contratista	Interventoría
01-11-2023	CEDVO-121-2023	Entrega de informe PMT de octubre 2023	Contratista	Secretaría de Movilidad de Villavicencio
02-11-2023	CEDVO-122-2023	Remisiones orden de giro No 08 Anticipo	Contratista	Interventoría
02-11-2023	CEDVO-123-2023	Entrega de planos de montaje de anclajes actualizado	Contratista	Interventoría
02-11-2023	CEDVO-124-2023	Entrega de ajuste estructural a fachada y cubierta	Contratista	Interventoría
03-11-2023	CEDVO-125-2023	Remisiones orden de giro No 09 Anticipo	Contratista	Interventoría
03-11-2023	CEDVO-126-2023	Remisiones orden de giro No 10 Anticipo	Contratista	Interventoría
04-11-2023	CEDVO-127-2023	Reprogramación plan de inversión del anticipo	Contratista	Interventoría
07-11-2023	CEDVO-128-2023	Observaciones SST	Contratista	Organización Terracanto SAS
08-11-2023	CEDVO-129-2023	Entrega correcciones de la modificación No 01 pista de atletismo	Contratista	Interventoría
10-11-2023	CEDVO-129-2023	Remisiones orden de giro No 11 Anticipo	Contratista	Interventoría
10-11-2023	CEDVO-130-2023	Entrega de solicitud de modificación No 01 Pista de patinaje	Contratista	Interventoría

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
10-11-2023	CEDVO-130-2023	Respuesta oficio OF-C249-2023-174	Contratista	Interventoría
16-11-2023	CEDVO-131-2023	Remisiones orden de giro No 12 Anticipo	Contratista	Interventoría
23-11-2023	CEDVO-132-2023	Entrega de ajuste estructural a uros de contención de pista de ruta	Contratista	Interventoría
21-11-2023	CEDVO-135-2023	Entrega de informe plan de inversión anticipo de obra mes de octubre	Contratista	Interventoría
21-11-2023	CEDVO-136-2023	Entrega de informe mensual de octubre 2023	Contratista	Interventoría
23-11-2023	CEDVO-137-2023	Entrega de ajuste estructural a pedestal A-8 escenario 1	Contratista	Interventoría
27-11-2023	CEDVO-138-2023	Observaciones ambientales	Contratista	Interventoría
27-11-2023	CEDVO-139-2023	Observaciones seguridad social	Contratista	Interventoría
28-11-2023	CEDVO-140-2023	Entrega de corrección planos de montaje de anclajes	Contratista	Interventoría
29-11-2023	CEDVO-141-2023	Intervención en la zona verde de la cancha de fútbol	Contratista	Interventoría

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

Escenarios deportivos multipropósito

- **Cimentación**

En los días de lluvia, las excavaciones que se realizaron para la estructura de cimentación presentaron inundaciones con agua de lluvia, siendo necesario realizar bombeo del agua con motobombas, rellenos, solados y la limpieza de aceros para continuar con la actividad.

Se instala pernos de anclaje en pedestales según planos de montaje en los escenarios 1 y escenario 2, sectores occidental y norte, consecutivamente.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

- **Instalaciones hidráulicas, sanitarias y red de aguas lluvias**

Se realiza la construcción de cámaras de inspección con la losa inferior y el cilindro en concreto, en la excavación presentó problema de inundación por la escorrentía del agua lluvia, mitigando el problema con motobombas.

Por otro lado, La empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio-EAAV ESP, emitió el comunicado de disponibilidad inmediata de servicios de acueducto y alcantarillado, para los escenarios deportivos, bajo el consecutivo CDIS-023-2023 del 28 de noviembre 2023, donde habilita la disponibilidad del servicio de acueducto, alcantarillado sanitario, pero no la disponibilidad de alcantarillado pluvial.

En la misiva, informan que la empresa EDESA ESP, se encuentra en estado de ejecución de un proyecto para la renovación de la red de alcantarillado pluvial existente en la carrera 16 entre calle 25 y calle 26.

Pista de Patinaje

- **Ajustes a estudios y diseños**

La federación colombiana de patinaje FEDEPATIN, aprueba la geometría de la pista de ruta trazada en los planos presentados a la asesoría técnica del 11 de octubre de 2023; mediante el comunicado FPC 01 20231107000001 del 07 de noviembre de 2033.

En este sentido, se da inicio con la localización de la pista de ruta, que, por la topografía del terreno se hace necesario la construcción de un muro de contención en la zona norte, sur y oriente, y así garantizar una superficie plana. Se procedió a fundir el concreto de limpieza para la construcción de los muros.

Sin embargo, El consorcio realiza entrega a interventoría de la solicitud de modificación en valor y tiempo del proyecto pista de atletismo para revisión, aprobación y trámite ante la secretaria de planeación departamental. En esta solicitud de incluyen las menores y menores cantidades de obra e ítems no previstos para llevar a feliz término el objeto contratado.

Pista de atletismo

- **Diseño pista de atletismo**

Se encuentra a la espera de aprobación de la modificación en valor y tiempo del proyecto pista de atletismo el cual se presentó en el mes de octubre 2023, para iniciar las actividades de obra de la pista atlética.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

4. **ESTADO DEL TIEMPO**
   Frecuencia en jornada laboral

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	0
LLUVIA FUERTE	1
LLUVIOSO	14
SOLEADO	11

OBSERVACIONES:
Desde el 2 hasta el 30 noviembre se presentaron fuertes lluvias en horas de la noche.

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. **PROCESO CONSTRUCTIVO**

Conceptuar acerca de la adecuada o inadecuada aplicación de los métodos constructivos o actividades desarrolladas para la entrega de los productos

PROYECTO ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO:

- Se continúan realizando las excavaciones mecánicas de los escenarios, hasta la cota de cimentación determinada en los planos estructurales, teniendo en cuenta la profundidad mínima según las recomendaciones geotécnicas.
- Igualmente, los rellenos para el mejoramiento de la subrasante, se vienen realizando con material seleccionado de rio T.M. 2", y compactado de forma manual mediante el uso de compactador tipo canguro, hasta obtener el 90% de compactación según la prueba de ensayo del Proctor modificado realizado previamente en laboratorio al material utilizado. Se realizan pruebas de densidades para verificar el cumplimiento de los porcentajes mínimos de compactación requeridos.
- Para el manejo de concretos, se viene fabricando en obra el concreto de solados según las proporciones por bulto indicadas en los diseños de mezcla realizado a los materiales empleados en obra. Para los concretos de ciclópeos, y los elementos estructurales propios de la cimentación (zapatas, vigas de cimentación, pedestales, contrapesos), se viene

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

empleando mezclas premezcladas de la resistencia de cada elemento. Se verifica a la llegada de obra el asentamiento de cada camión que llega a obra antes de proceder a su vaciado. Se toman muestras de concreto en cilindros metálicos los cuales son posteriormente enviados al laboratorio para su rotura, control y verificación de la resistencia requerida. Esta labor de control la desarrolla paralelamente la interventoría.

- Previo a cada fundida de elementos estructurales se realiza limpieza del acero de refuerzo y se verifican los recubrimientos exigidos para cada uno.

- Para el caso de los pedestales, previamente se viene realizando replanteo topográfico de precisión con el fin de evitar desviaciones por fuera de las permitidas, las cuales pueden llegar a afectar el montaje de la estructura metálica. Se emplean plantillas metálicas para la instalación de pernos de anclajes los cuales son replanteados topográficamente antes y después de la fundida de cada pedestal; así se garantiza las tolerancias máximas permitidas de 6mm en cualquier dirección.

- En la instalación de tubería de agua potable, pluvial y sanitaria, que se viene realizando, se llevan a cabo las recomendaciones de instalación del fabricante en cuanto a profundidad de zanjas, protección con cama y atraque en arena, lubricante mineral para el empalme de tubos y accesorios y la protección con dados en concreto en los accesorios para prevenir fugas por golpes de ariete al presurizar la red, en el caso de redes a presión. El material por encima de cota clave del tubo viene siendo remplazado por material seleccionado de rio T.M. 2" con el fin de evitar hundimientos futuros en la etapa de acabado del urbanismo o vías en parqueaderos.

- Los elementos para la construcción de pozos de inspección (placa base, cilindro, placa tapa) se vienen construyendo de acuerdo a lo indicado en los planos de diseño hidrosanitarios.

- Se viene implementando el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de acuerdo a los ajustes realizados en el documento y presupuesto, El consorcio con el apoyo de su profesional ambiental viene realizando las actividades programadas en el mes.

PROYECTO PISTA DE PATINAJE:

- Se realizan trabajos de localización, excavación y solados para los muros de contención. El cual confinaría el terreno donde se construirá la pista de patinaje.

- Los muros de contención estarán localizados en la zona norte, sur y oriente del área útil del proyecto, contará con muros en concreto con alturas máximas de desde 0.50m a 1.70m libres.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

- Se viene implementando el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de acuerdo a los ajustes realizados en el documento y presupuesto, El consorcio con el apoyo de su profesional ambiental viene realizando las actividades programadas en el mes.

PROYECTO PISTA DE ATLETISMO:

- Se encuentra inactiva la mayoría de las actividades de este escenario hasta tanto se de aprobación de las mayores y/o menores cantidades de obra e ítems no previstos presentados en la solicitud de modificación No.01 presentado a la interventoría.

- Se realiza instalación de geotextil en la zona occidental del la pista de atletismo, como única cantidad contractual.

- Se viene implementando el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de acuerdo a los ajustes realizados en el documento y presupuesto, El consorcio con el apoyo de su profesional ambiental viene realizando las actividades programadas en el mes.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia de compresión de cilindros de concreto	29-11-2023	INV-E-410
Densidad o masa unitaria del suelo en el terreno-Método del Cono de arena	29-11-2023	INV-E-161

Durante la ejecución del presente informe se realizaron pruebas para determinar:

- Resistencia de compresión para elementos de cimentación de escenarios 1 y 2.
- Toma de densidades en terreno para los rellenos de cimentación del escenario 2.

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
1/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. *IMPLEMENTACIÓN DE INSPECIÓN DE ARNES DE SEGURIDAD. *IMPLEMENTACIÓN DE FORMATO PLAN DE IZAJE. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. * LIQUIDACION DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. * ACOMPAÑAMIENTO FUNDIDA. * VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ROTULACIÓN.	
2/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES. * ORDEN Y ASEO ESCENARIOS. * ACOMPAÑAMIENTO VISITA INTERVENTORIA EN ATLETISMO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS.	
3/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL Y CONTRATISTAS * VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES. *MOVIMIENTO DE MAQUINARIA DE ESCENARIO A PISTA DE ATLETISMO. * ORDEN Y ASEO EN PORTERIA ESCENARIOS. * MOVIMIENTO DE PUNTO DE EMERGENCIA EN ESCENARIOS.	
4/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. *ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN CALIENTE, CONTRATISTA WILSON CARDENAS.	
6/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	
7/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ACOMPAÑAMIENTO EN FUNDIDA. * SEÑALIZACIÓN ENTRADA DE ESTADIO - PISTA ATLETICA. * VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN A MAQUINA 135. * ORDEN Y ASEO ENTRADA PRINCIPAL ESTADIO.	
8/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
9/11/2023	*CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN BRIGADAS DE EMERGENCIAS. *CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO.	
10/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	
11/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ARREGLO DE SEÑALIZACIÓN ENTRADA PRINCIPAL ESTADIOS - PISTA ATLETICA.	
13/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ORDEN Y ASEO PERSONAL CONSORCIO.	
14/11/2023	*CHARLA PRACTIVA SOBRE MANEJO DE EXTINTORES. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO.	
15/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES ATLETISMO. *INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y PREVENTIVA EN OBRA. * INSPECCIÓN DE BOTIQUIN EN TODOS LOS ESCENARIOS.	
16/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * INSPECCIÓN DE EXTINTORES EN TODOS LOS ESCENARIOS. * INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO. * RECORRIDO CON INTERVENTORIA EN ESCENARIOS Y PISTA ATLETICA.	
17/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ACOMPAÑAMIENTO FUNDIDA FCC - PEDESTALES. * INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO. * SEÑALIZACIÓN DE EXCAVACIONES EN ESCENARIOS. * ORDEN Y ASEO ALMACEN.	

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
18/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE CABLEADO.	
20/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS FCC. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ORDEN Y ASEO ATLETISTMO Y ALMACEN. * ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN. * REUNIÓN COPASST. * VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ROTULACIÓN. * SUSPENDIÓN DE ACTIVIDADES EN PISTA ATLETICA POR EVENTO. * SEÑALIZACIÓN EN ESCENARIOS.	
21/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * ORDEN Y ASEO TERMINADA LA JORDANA CONTRATISTA FCC. * ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDAD DE FUNDIDA.	
22/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * INSPECCIÓN INDUSTRIAL EN ESCENARIOS. * MOVIMIENTO DE MAQUINARIA ENTRE PISTA ATLETICA Y ESCENARIOS. * SOCIALIZACIÓN CON EL PERSONAL EN GENERAL DE OBRA.	
23/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. * INSPECCIÓN DE CAMILLAS EN TODOS LOS ESCENARIOS. * MOVIMIENTO DE MAQUINARIA ENTRE ESCENARIOS Y PISTA ATLETICA.	
24/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS.	
25/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE ATLETISMO. * ACTIVIDAD DE BIENESTAR LABORAL - PERSONAL CONSORCIO.	

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
27/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * ORDEN Y ASEO ESCENARIOS Y PATINAJE CON CONTRATISTA WILSON CARDENAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA. * ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE FUNDIDA. * MOVIMIENTO DE MAQUINARIA ENTRE ESCENARIOS A PISTA ATLETICA. * INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO.	
28/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA. * MOVIMIENTO DE MAQUINARIA DE ESCENARIOS A PISTA DE ATLETISMO. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE FUNDIDA DE SOLADOS EN PISTA ATLETICA.	
29/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA EN PISTA ATLETICA. * ORDEN Y ASEO ESCENARIOS Y PATINAJE. * PAUSAS ACTIVAS. * ELABORACIÓN DE PREOPERACIONAL DE TRNZADORA. * INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO.	
30/11/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * ACOMPAÑAMIENTO EN FUNDIDA, ESCENARIOS Y PISTA ATLETICA. * ARREGLO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL.	

Anexo: Formato 112-ECP-FR-015-FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
	Las actividades realizadas en el mes con respecto al área ambiental se describen en los siguientes numerales: 1. Jornada de orden y aseo en el área de trabajo y entradas a la	

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ESCENARIOS DEPORTIVOS	obra (entrada de volquetas y entrada personal). 2. Señalización en la obra con cinta peligro en excavaciones y agregados pétreos acopiados temporalmente y ser extendidos. 3. Se cambian las bolsas plásticas del punto ecológico, los residuos ordinarios y orgánicos se sacan 3 veces por semana a la entrada de las volquetas para que Bioagricola los retire y realice disposición final en el relleno sanitario del municipio. 4. Para el presente mes fue necesario el cambio de lugar de las baterías sanitarias dado que en donde se instalaron inicialmente se debían realizar excavaciones para la instalación de nueva tubería, Se realiza limpieza de las unidades sanitarias dos veces por semana y se le pone los elementos necesarios para su uso (papel higiénico y papelera). 5. Disposición de material de excavaciones, este material no es reutilizado porque no tiene las condiciones necesarias para ser reutilizado en las actividades de obra civil. Se dispone en el ZODME Guatiquia. 6. Se realizan monitoreos ambientales (Sonometro y Anemometro) para la actividad de nivelación de terreno en escenario 1.	N/A
PISTA DE PATINAJE	Se realizan monitoreos ambientales de emisiones con equipos (Sonometro y Anemometro) en la actividad de excavación de material para la cimentación del muro de contención de la pista; al punto ecológico instalado se le cambian las bolsas de las canecas	N/A

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

	para ser sacadas a la puerta principal y retiradas por el camión recolector de Bioagricola.	
PIESTA DE ATLETISMO	1. Se realiza actividad de disposición de material de excavación en (ZODME Guajitquia). 2. Se dejan acopios temporales de agregados pétreos los cuales son señalizados y cubiertos con plástico negro. 3. Se instala el acopio de sustancias químicas para que sea almacenado el combustible de los equipos que operan en el área. 4. Se realiza jornada de orden y aseo en el área de influencia del proyecto, cabe resaltar que como en el periodo comprendido al informe, no hay mucho personal el cual genere gran cantidad de residuos sólidos, por tal razón solo se cambian las bolsas 1 vez por semana. Los residuos son sacados a la puerta del complejo deportivo para que la empresa prestadora del servicio de recolección los disponga en el relleno sanitario del municipio. 5. Se realizan monitoreos ambientales (Sonometro y Anemometro) en actividades de mezcla de concreto y excavación de material.	N/A

Anexo: Formato GES-FO-34 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN PMA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION
OLIVERIO GOMEZ RIOS	DIRECTOR DE PROYECTOS	100%
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	50%
JORGE DAVID MONTENEGRO LOPEZ	ESP. EN ESTRUCTURAS	50%
LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	100%
ZUNEILE PAOLA BOTELLO	PROFESIONAL SST	50%
ADRIANA PAOLA FARFAN	ARQUITECTA PAISAJISTA	30%
CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO	INSPECTOR DE OBRA	100%
CARLOS ANDRES CAICEDO CASTAÑO	INSPECTOR DE OBRA	100%
CAMILO ANDRES FUENTES CARRILLO	INSPECTOR DE OBRA	100%
THERLY YANINY CONTRERAS PEÑA	ING AMBIENTAL	100%
VERONICA STEFANIA CABARCA LIZCA	INSPECTOR SST	100%
LAURA XIMENA BRAVO AMAYA	INSPECTOR SST	100%
CRISTINA GIRALDO GONZALEZ	INSPECTOR DE OBRA	100%
JUAN JOSE SUTA AGUILAR	INSPECTOR DE OBRA	100%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACION DE PERSONAL OBRA

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La siguiente corresponde a los contratistas vinculados por el CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.

Se presenta planilla de pago N°: 9457878513 – TOPOGRAFIA JUAN ANTONIO BARBOSA.

Se presenta planilla de pago N°: 28257557 E– TOPOGRAFIA JONATHAN MALAVER.
Se presenta planilla de pago N°: 27979218 I– TOPOGRAFIA JONATHAN MALAVER.

Se presenta planilla de pago N°: 9459001356 E– TOPOGRAFIA RAUL VELASCO.
Se presenta planilla de pago N°: 28098861 I– TOPOGRAFIA RAUL VELASCO.

De acuerdo al listado de contratistas reportado por el consorciado ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS, se relacionan las siguientes planillas de pago:

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

Se presenta planilla de pago N°: 9458807031– CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS.
Se presenta planilla de pago N°: 72155735 – CONSORCIO ESCENARIOS – OPERADOR RETRO 75 ELVER EDUARDO ORTIZ.
Se presenta planilla de pago N°: 9458964962 – CONSORCIO ESCENARIOS – OPERADOR RETRO 135 EDILSON FERNEY CHIVATA.
Se presenta planilla de pago N°: 9458184756 – WILSON CARDENAS.
Se presenta planilla de pago N°: 67052213 – FCC IN BLAU

Anexo: Formato 112-ECP-FR-021-V01-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

NOTA; *Se deja claridad que algunas planillas que se anexan corresponden al mes anterior dado que se paga según los últimos dígitos de la identificación del aportante, por lo cual algunos contratistas se encuentran en vigencia en las fechas en las que se presenta este informe y por tal motivo no se anexa la planilla correspondiente al mes del informe.*

3. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	63
Empleos directos generados:	24
Empleos indirectos generados:	39

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	24
Etaria (Edad)	20 a 59 años	57
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	4
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	1
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	56
Género	Femenino	7
Población Vulnerable	Desplazados	10
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	5

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Total		164

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el periodo del presente informe no se han realizado prorrogas, suspensiones o reinicios al contrato de obra.

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el periodo del presente informe no se han realizado adicionales al contrato de obra.

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el periodo del presente informe no se han realizado modificaciones al contrato de obra.

2. GARANTIAS:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-81241317-1
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-81327904-1
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	10 DE ABRIL DE 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23-02-2023	23-06-2024	$ 10.174.388.168,40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	23-02-2023	23-06-2024	$ 15.261.582.252,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23-02-2023	23-02-2027	$ 2.543.597.042,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	23-02-2024	23-02-2029	$ 15.261.582.252,60
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23-02-2023	23-02-2024	$ 2.543.597.042,10
DAÑO MORAL	23-02-2023	23-02-2024	$ 2.543.597.042,10
LUCRO CESANTE	23-02-2023	23-02-2024	$ 2.543.597.042,10

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-81241317-1
ANEXO N°	01
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-81327904-1
ANEXO N°	01
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10-05-2023	09-09-2024	$ 10.174.388.168,40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10-05-2023	09-09-2024	$ 15.261.582.252,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10-05-2023	09-05-2027	$ 2.543.597.042,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	09-05-2023	09-05-2029	$ 15.261.582.252,60
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23-02-2023	09-05-2024	$ 2.543.597.042,10
DAÑO MORAL	23-02-2023	09-05-2024	$ 2.543.597.042,10
LUCRO CESANTE	23-02-2023	09-05-2024	$ 2.543.597.042,10

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES							

Durante el periodo del presente informe no se han realizado pagos parciales al contratista.

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *01-11-2023 AL 30-11-2023*

Avance físico ejecutado en el mes del presente informe 0.41% y avance financiero ejecutado 30%.

El avance financiero ejecutado corresponde al desembolso de anticipo del 30% del presupuesto de obra el cual fue realizado por la entidad el día 22 de junio de 2023. Se realizo una orden de operación durante este periodo la cual se relaciona a continuación:

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR PAGO
ORDEN DE GIRO 1	07-JUL-23	Anticipo Contrato No.01- Organización Terracanto SAS	$ 3.206.552.830,72
ORDEN DE GIRO 2	31-JUL-23	Corte parcial 1 Contrato No.01- Organización Terracanto SAS	$ 289.205.761,34
ORDEN DE GIRO 3	16-AGOS-23	Anticipo Contrato No.04- Industrias del Hierro SAS	$ 3.598.852.877,00
ORDEN DE GIRO 4	14-AGOS-23	Anticipo Contrato No.06- Organización Terracanto SAS	$ 1.053.857.052,24
ORDEN DE GIRO 5	20-SEPT-23	Anticipo Contrato No.02- Grupo Viarq Ltda	$ 907.601.278,00
ORDEN DE GIRO 6	03-OCT-23	Corte 2 Contrato No.01- Organización Terracanto SAS	$ 132.265.723,00
ORDEN DE GIRO 7	03-OCT-23	Anticipo Contrato No.10- Organización Terracanto SAS	$ 2.007.157.131,00

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ORDEN DE GIRO 8	8-NOV-23	Corte parcial 3 Contrato No.01- Organización Terracanto SAS	$ 86,126,323,00
ORDEN DE GIRO 9	14-NOV-23	Consorcio escenarios deportivos Reembolso por concepto de alquiler de maquinaria	$ 144,985,030,60
ORDEN DE GIRO 10	14-NOV-23	Consorcio escenarios deportivos Reembolso por concepto de mano de obra	$ 200,790,003,00
ORDEN DE GIRO 11	15-NOV-23	Consorcio escenarios deportivos Reembolso por concepto de mano de obra	$ 36,132,107,00
ORDEN DE GIRO 12	17-NOV-23	Civideportes SAS Anticipo contrato N°9	$ 241,751,169,00

Se anexa formato GES-FO-43 Informe Plan de Inversión Anticipo de Obra.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	LOCALIZACION. TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.	724.30	11.3%



OBSERVACIONES
Se realiza localización y replanteo con equipos de topografía de precisión en los escenarios 1 y 2, localización de estructura de cimentación Zapatas, Vigas y pedestales, igualmente se localiza y verifica la instalación de pernos de anclaje para la estructura metálica de los escenarios.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.1	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	1,585.24	33.6%



OBSERVACIONES

Se realiza excavación mecánica para la construcción de zapatas, vigas de cimentación y contrapesos de la cimentación de los dos escenarios multipropósito.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4.1	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	2.61	5.6%



OBSERVACIONES
Se instalan solados en concreto simple de 2000 psi bajo zapatas, vigas de cimentación y contrapesos, para los dos escenarios, según estudios y diseños.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4.2	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	27.60	32.40%



OBSERVACIONES
Se funden concretos de pedestales del escenario 1 y 2. La resistencia de los elementos se realiza en 5.000 psi según lo indican las memorias y planos de diseños estructurales.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4.3	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	1.69	0.9%



OBSERVACIONES
Se funden concretos de zapatas para la nueva cimentación de los escenarios 1 y 2. La resistencia de los elementos se realiza en 4.000 psi según lo indican las memorias y planos de diseños estructurales.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4.4	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO**	**EJECUTADO**	**%**
	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	37.75	30.2%



OBSERVACIONES

Se funden concretos para las vigas de cimentación entre pedestales y de contrapesos en la nueva cimentación de los escenarios. La resistencia de los elementos se realiza en 4.000 psi según lo indican las memorias y planos de diseños estructurales.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4.5	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	EJECUTADO	%
	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	14.63	13.5%



OBSERVACIONES
Se funden concretos ciclópeos para los contrapesos en la nueva cimentación de los escenarios. La resistencia de los elementos se realiza en 3.000 psi según lo indican las memorias y planos de diseños estructurales. Proporción: 60C/40P

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4.6	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO**	**EJECUTADO**	**%**
	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	4876.38	9.5%



OBSERVACIONES
Se continua con el amarre de acero figurado para elementos de zapatas, vigas de cimentación, contrapesos y pedestales del escenario multipropósito 1 y 2.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6.1	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO**	**EJECUTADO**	**%**
	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	4066.00	0.7%




OBSERVACIONES

Se instalan los pernos de anclaje en los pedestales, se observa en la fotografía que los pernos deben armarse y amarrar en el acero de refuerzo, previamente a la fundición del concreto. Estos se instalan según planos de diseño.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
14.22	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO**	**EJECUTADO**	**%**
	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	3.00	100%

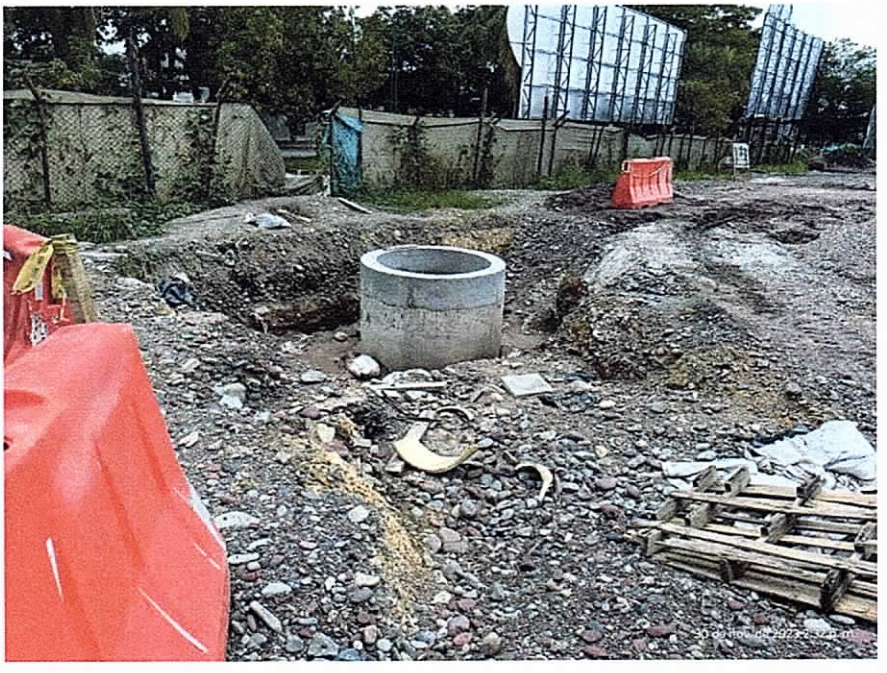

OBSERVACIONES
Las cámaras de inspección se localizan según diseño de aguas lluvia y sanitario, estas son construidas después de instalar la tubería. Los pasos o peldaños quedan embebidos en el concreto del cilindro

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
14.23	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO**	**EJECUTADO**	**%**
	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	1.00	100%



OBSERVACIONES

La losa inferior de la cámara de inspección se construye en concreto reforzado posterior a la instalación de la tubería.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.2	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE	EJECUTADO	%
	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	475.83	30.4%



OBSERVACIONES
Se realiza excavación mecánica para la construcción de la zarpa del muro de contención de la pista de patinaje, en los costados norte – oriente - sur.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.1	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE	EJECUTADO	%
	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	6.40	12.80%



OBSERVACIONES
Se instalan solados en concreto simple de 2000 psi para la construcción del muro de contención para la pista de patinaje, según estudios y diseños.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4.1	**CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO**	**EJECUTADO**	**%**
	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1110.00	12.5%



OBSERVACIONES
Se instala geotextil tejido en la pista de atletismo según diseño de la estructura de pavimento, este se instala en la rasante con el fin de separar el material de relleno y el material natural, la longitud de traslapo se realiza según la ficha técnica del producto.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- De acuerdo con el seguimiento mensual realizado a la fecha de corte del presente informe, se presenta un porcentaje de avance ejecutado por debajo de lo programado. El proyecto de escenarios deportivos lleva un avance del 7.54% vs 17.87% del programado. Se deben realizar traslado de redes de Aguas Lluvias e hidráulicas dentro del predio las cuales interfieren con la cimentación del escenario 01. Se debe realizar modificación de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos de actividades que requieren para para continuar con actividades de cimentación de los escenarios. La solicitud de modificación fue entregada a la interventoría para su revisión y posterior tramite ante la entidad.

- El proyecto de pista de patinaje lleva un avance del 8.46% vs 33.54% del programado. Se debe realizar modificación de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos de actividades que se requieren para dar continuidad a ciertas actividades como muro de contención de la pista de patinaje, el cual es en concreto simple y no concreto reforzado. Fedepatin emitió el concepto favorable a la geometría de la pista de ruta, los que nos permitió continuar con la localización y el descapote, como también, las excavaciones y solados para los muros de contención. Sin embargo, no se puede continuar con la construcción de estos elementos hasta tanto no quede aprobada el acta de modificación.

- El proyecto de pista de atletismo lleva un avance del 1.57% vs 12.07% del programado. Se debe realizar modificación de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos de actividades que se requieren para dar continuidad con la construcción de la pista atlética, la actividad contractual que se puede adelantar es la instalación del geotextil para la estructura del pavimento, actividad que se adelanta con todas las precauciones siguiendo las recomendaciones de instalación de producto.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

H. ANEXOS

En el presente informe contiene los siguientes soportes documentales:

- Copia de la bitácora de la obra o de las actividades desarrolladas.
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Actas de comité
- Presupuesto de actividades ejecutadas en el mes
- Avance Físico: Programado vs Ejecutado
- Control de calidad
- Estado del tiempo
- Informe de Anticipo
- Informe PMT
- Informe SST
- Informe de Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 07 días del mes diciembre del 2023.

Firma

Nombre: YEISON E. GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:25202-090820 CND

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional:25202-132229CND

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

12945

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

BITACORA DE OBRA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

12946

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	1	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 9:00 AM HASTA LAS 12:00 PM Y DE 3:30 PM A 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	4.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	19	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	9	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.2	M3	PEDESTAL EN CONCRETO 5000 PSI	3.94	SI	SI
A4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 4000 PSI	5.39	SI	SI
A6.1	KG	ACERO ESTRUCTURAL	580.86	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12947

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	2	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			LLUVIAS DESDE LAS 9:00 AM A 9:30 AM Y DE 1:00 PM A 2:30 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	2 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	19	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	9	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A4.6	KG	ACERO DE REFUERZO	812.73	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12948

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	3	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 7:00 AM HASTA LAS 9:00 AM Y DE 12:30 A 2:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	3.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	18	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A14.23	UND	LOSA INFERIOR BASE PARA POZO	1.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12949

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	4	11	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	16	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	11	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12.950

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	6	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	0	X				
AYUDANTES	13	X				
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	0	X				
CADENERO	0	X				
OTRO	0	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	7	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	1	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	22	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A4.2	M3	PEDESTAL EN CONCRETO 5000 PSI	3.94	SI	SI
A4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 4000 PSI	5.39	SI	SI
A6.1	KG	ACERO ESTRUCTURAL	580.86	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	8	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 7:00 AM HASTA LAS 12:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	1	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	22	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A4.1	M3	SOLADO CONCRETO 2000 PSI	0.44	SI	SI
A4.6	KG	ACERO DE REFUERZO	812.73	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	9	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 4:00 PM HASTA LAS 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias	1 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	23	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.6	KG	ACERO DE REFUERZO	812.73	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12954

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	24	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.6	KG	ACERO DE REFUERZO	812.73	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12955

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	11	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 9:00 AM HASTA LAS 10:00 AM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	1 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	23	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A4.1	M3	SOLADO CONCRETO 2000 PSI	0.44	SI	SI
C4.1	M2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS	185.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12956

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 7:00 AM HASTA LAS 9:00 AM Y DE 3:30 A 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	3.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	0	X				
AYUDANTES	6	X				
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	0	X				
CADENERO	0	X				
OTRO	0	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12957

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	23	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.2	M3	PEDESTAL EN CONCRETO 5000 PSI	3.94	SI	SI
A4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 4000 PSI	5.39	SI	SI
A4.5	M3	CICLOPEO EN CONCRETO 3000 PSI	7.32	SI	SI
A6.1	KG	ACERO ESTRUCTURAL	580.86	SI	SI
A14.22	UND	CILINDRO CONCRETO 4000PSI	1.00	SI	SI
C4.1	M2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS	185.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 7:00 AM HASTA LAS 8:00 AM Y DE 2:00 PM A 3:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	2 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	24	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A4.1	M3	SOLADO CONCRETO 2000 PSI	0.44	SI	SI
A4.6	KG	ACERO DE REFUERZO	812.73	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088003863O	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			LLUVIAS DESDE LAS 9:00 AM HASTA LAS 9:30 AM Y DE 4:00 PM A 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	1.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	22	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	7	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12960

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	17	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 3:00 PM HASTA LAS 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias	2 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	1	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	23	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	7	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.2	M3	PEDESTAL EN CONCRETO 5000 PSI	3.94	SI	SI
A4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 4000 PSI	5.39	SI	SI
A4.5	M3	CICLOPEO EN CONCRETO 3000 PSI	7.32	SI	SI
A6.1	KG	ACERO ESTRUCTURAL	580.86	SI	SI
C4.1	M2	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS	185.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088003863O	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	11	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	21	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	7	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12962

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	20	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	26	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	11	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 1:30 PM HASTA LAS 5:00 PM
TORMENTA		X		
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias	3.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	26	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	11	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.2	M3	PEDESTAL EN CONCRETO 5000 PSI	3.94	SI	SI
A4.3	M3	ZAPATA EN CONCRETO 4000 PSI	1.69	SI	SI
A4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 4000 PSI	5.39	SI	SI
A6.1	KG	ACERO ESTRUCTURAL	580.86	SI	SI
A14.22	UND	CILINDRO CONCRETO 4000PSI	1.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088003863O	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12964

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	26	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	11	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.1	M3	SOLADO CONCRETO 2000 PSI	0.44	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 8:30 AM HASTA LAS 9:30 AM Y DE 4:00 A 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias	2 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	2	
AYUDANTES	27	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A4.1	M3	SOLADO CONCRETO 2000 PSI	0.44	SI	SI
C4.1	M2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS	185.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12966

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	24	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 7:00 AM HASTA LAS 8:00 AM Y DE 11:00 AM A 12:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	2 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	2	
AYUDANTES	27	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
B2.2	M3	EXCAVACION MECANICA	95.17	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12967

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	25	11	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	2	
AYUDANTES	27	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.6	KG	ACERO DE REFUERZO	812.73	SI	SI
B2.2	M3	EXCAVACION MECANICA	95.17	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	27	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 3:00 PM HASTA LAS 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias	2 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	2	
AYUDANTES	32	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	11	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.2	M3	PEDESTAL EN CONCRETO 5000 PSI	3.94	SI	SI
A4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 4000 PSI	5.39	SI	SI
A6.1	KG	ACERO ESTRUCTURAL	580.86	SI	SI
A14.22	UND	CILINDRO CONCRETO 4000PSI	1.00	SI	SI
C4.1	M2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS	185.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones.

12.969

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	28	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	2	
AYUDANTES	32	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A4.1	M3	SOLADO CONCRETO 2000 PSI	0.44	SI	SI
B2.2	M3	EXCAVACION MECANICA	95.17	SI	SI
C4.1	M2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS	185.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12970

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	29	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE 9:00 AM A 10:00 AM Y 3:00 PM HASTA LAS 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	4 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	2	
AYUDANTES	30	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	11	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
B2.2	M3	EXCAVACION MECANICA	95.17	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 1:30 AM HASTA LAS 3:30 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias	2 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	2	
AYUDANTES	31	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	11	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.2	M3	PEDESTAL EN CONCRETO 5000 PSI	3.94	SI	SI
A4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 4000 PSI	5.39	SI	SI
A6.1	KG	ACERO ESTRUCTURAL	580.86	SI	SI
B2.2	M3	EXCAVACION MECANICA	95.17	SI	SI
B3.1	M3	SOLADO LIMPIEZA 2000 PSI	6.40	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820080038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

12972

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

CORRESPONDENCIA ENVIADA

12973

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 01 de noviembre del 2023

GEDVO-119-2023

SECRETARIA DE MOVILIDAD
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
No Radicado 009051
Fecha y Hora 01 NOV 2023
Juan G

2 F
1 cd.
2 Planos

Señores
SECRETARIA DE MOVILIDAD
Adolfo Rodríguez Iriarte
Director de planeación y prospectiva
Carrera 37 N°19C-26 Barrio jordán- paraíso
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL PMT DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO.

Cordial saludo

Por medio de la presente me permiso solicitar, prórroga del Plan de Manejo de Transito (PMT) para el proyecto de la referencia, el cual fue aprobado mediante oficio **1703-19.18/0680 del 17 de mayo del 2023** dando inicio desde el 17 de mayo del 2023 y teniendo como vencimiento el 17 de noviembre del año 2023.

Nos permitimos informar que la prórroga solicitada conservará las mismas condiciones iniciales aprobadas como son:

1. **Tiempo de Aprobación y horarios**

   Horario de labores aprobado

- Lunes a viernes de 07:00 am a 05:30 pm
- Sábados de 7:00 am a 1:00 pm

2. **Actividades ejecutadas que tienen un avance físico a la fecha del 4.17%**

- Demolición
- Desmonte de escenarios existentes
- Retiro de escombros
- Tal de árboles y arbustos

- Demolición pista de patinaje
- Demolición pista atlética
- Retiro de grama sintética

Actividades a ejecución y por ejecutar equivalente al 95.83%

- Realizar obras preliminares
- Ejecutar obras en concreto
- Construir Pista de Ruta
- Construir Pista de Velocidad
- Desarrollar Urbanismo
- Instalar manejo de red de aguas lluvias
- Instalar Redes Eléctricas
- Elaborar y/o solicitar las certificaciones Retie
- Elaborar y/o solicitar las certificaciones Retilap
- Implementar Plan de Manejo Ambiental
- Desarrollar interventoría
- Realizar supervisión
- Instalación de estructura metálica

3. Maquinaria a Utilizar

El equipo a utilizar para la realización de las obras es el siguiente:

- Volquetas
- Minicargador
- Vibrocompatador
- Retroexcavadora
- Herramientas Básicas y equipos de construcción

4. Modificaciones viales

No se presenta ningún desvío ni modificación viales.

5. Cargue y descargue de material

El cargue y descargue del material se realizará directamente dentro de la zona de obra, sin tener afectación a vías aledañas, de tal manera que se retire el material periódicamente en el horario aprobado.

Se cuenta con dos auxiliares de tránsito para controlar la entrada y la salida al predio de los vehículos de cargue y descargue del material de obra.

6. Compromiso del contratista

Cumplir con lo establecido en el Plan de manejo de tránsito, señalización y desvíos.

7. Estado actual de la obra.

Se tiene una ejecución acumulada del proyecto del 4.17 % el otro 95.83% se encuentra en ejecución con una fecha proyectada de terminación para el mes de mayo del 2024.



Cordialmente;

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 28 folios, 02 planos, 01 cd.

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01
		FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 1 de noviembre del 2023

CEDVO-120-2023

RECIBIDO 01 NOV 2023
4:34 PM
Tatiana Pato S.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE INFORME PMT DE OCTUBRE DE 2023

Cordial saludo

De manera atenta me permito realizar entrega del informe PMT del mes de octubre, del proyecto de la referencia según aprobación N° 1703-19. 18/0680 del 17 de mayo de 2023, con el cual se realiza el control y registro de las actividades realizadas.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 60 folios,

12977

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 01 de noviembre del 2023

CEDVO-121-2023

SECRETARIA DE MOVILIDAD
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
No. Radicado 2023-009050
Fecha y Hora 01 NOV 2023
Folios 59F

Señores
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO
Attn. Ing Adolfo Rodriguez Iriarte
Director de planeación y prospectiva
Calle 37A# 19C-26 Barrio Jordan-Paraiso
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE INFORME PMT DE OCTUBRE DE 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito realizar entrega del informe PMT del mes de octubre, del proyecto de la referencia según aprobación No. 1703-19.18/0680 del 17 de mayo de 2023, con el cual se realiza el control y registro de las actividades realizadas.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 59 folios,

12.978

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 02 de noviembre de 2023

CEDVO-0122-2023

RECIBIDO 03 NOV 2023
9:57 am
Tatiana Pazo S.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No 08 ANTICIPO

Cordialmente remitimos los documentos soporte de la orden de giro No 08 con cargo al Fideicomiso Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023.

ITEM DEL ANTICIPO	VALOR	DOCUMENTOS SOPORTE
2	$ 86.126.323,00	Copia del corte de obra No 3, factura electrónica N°14, RUT, certificación existencia y representación legal y certificado bancario, por concepto de pago de materiales y subcontrato de obra.

N°	BPIN	NOMBRE DE PROYECTO	AFECTACION
1	2022005500094	Pista de atletismo	$ 3.392.016,00
2	2022005500022	Pista de Patinaje	$ 82.734.307,00
		VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO N° 8 POR PROYECTO	**$ 86.126.323,00**

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

12979

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 02 de noviembre de 2023

CEDVO-0123-2023

RECIBIDO 02 NOV 2023
11:30 AM
Tatiana S.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de planos de montaje de anclajes actualizado

De manera atenta me permito remitir planos de montaje de anclajes de pernos actualizados para la estructura de los Escenarios 1 y 2. Se realiza ajuste de posición de pernos en los ejes A y E.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 2 planos, CD

12980

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 02 de noviembre del 2023

CEDVO-124-2023

RECIBIDO 02 NOV 2023
RECIBIDO 02 NOV 2023
RECIBIDO 02 NOV 2023
11:28 am
Tahmoro S

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de ajuste estructural a fachada y cubierta

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los ajustes realizados en la distribución de correas en fachadas y cubierta para los escenarios multipropósito de acuerdo a la arquitectura de los estudios y diseños.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: CD con archivo dwg, oficio modificaciones, tabla de peso

12981

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 03 de noviembre de 2023

CEDVO-0125-2023

RECIBIDO 07 NOV 2023
8:41 am

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No 09 ANTICIPO

Cordialmente remitimos los documentos soporte de la orden de giro No 09 con cargo al Fideicomiso Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023.

ITEM DEL ANTICIPO	VALOR	DOCUMENTOS SOPORTE
4	$ 144.985.031,40	Relación reembolso de facturas, facturas electrónicas, RUT, certificación existencia y representación legal de cada uno de los proveedores y certificado bancario del consorcio, por concepto de pago alquiler de maquinaria y equipos.

N°	BPIN	NOMBRE DE PROYECTO	AFECTACION
1	2022005500094	Pista de atletismo	$ 29.128.588,64
2	2022005500022	Pista de Patinaje	$ 25.096.314,92
3	2022005500024	Escenarios deportivos multipropósitos	$ 90.760.127,83
VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO N° 9 POR PROYECTO			$ 144.985.031,40

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

12982

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 03 de noviembre de 2023

CEDVO-0126-2023

RECIBIDO 07 NOV 2023
8:41 am
Tatiana S

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No 10 ANTICIPO

Cordialmente remitimos los documentos soporte de la orden de giro No 10 con cargo al Fideicomiso Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023.

ITEM DEL ANTICIPO	VALOR	DOCUMENTOS SOPORTE
1	$ 201.865.683,00	Relación reembolso, planillas de pago de seguridad social y aportes a parafiscales, copia de consignaciones y/o transferencias bancarias, documentos soporte de pago de nómina electrónica, resumen individual de nómina electrónica, por concepto de pago de mano de obra.

N°	BPIN	NOMBRE DE PROYECTO	AFECTACION
1	2022005500094	Pista de atletismo	$ 40.554.815,71
2	2022005500022	Pista de Patinaje	$ 34.942.949,73
3	2022005500024	Escenarios deportivos multipropósitos	$ 126.367.917,56
		VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO N° 10 POR PROYECTO	**$ 201.865.683,00**

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

12983

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 04 de noviembre de 2023

CEDVO-0127-2023

RECIBIDO 07 NOV 2023
5:41 PM
Tatiana Pazos

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REPROGRAMACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

De acuerdo con el plan de inversión del anticipo y su ejecución en los diferentes rubros, así como las necesidades reales de inversión, actualmente se requiere una mayor destinación para el rubro de materiales y subcontratos de obra.

La ejecución actual se resume en el siguiente balance,

PLAN DE INVERSIÓN				
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	EJECUTADO	SALDO
1	Mano de obra	$ 579.940.125,58		$ 579.940.125,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 12.323.727.668,66	10.287.891.375,04	$ 2.035.836.293,62
3	Transporte	$ 1.449.850.313,96	907.601.278,00	$ 542.249.035,96
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.031,40		$ 144.985.031,40
TOTAL		**$ 14.498.503.139,60**	**11.195.492.653,04**	**$ 3.303.010.486,56**

PLAN DE INVERSIÓN POR PROYECTO 2022005500094 ATLETISMO				
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	EJECUTADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 116.514.354,58	$ -	$ 116.514.354,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 2.475.930.034,75	$ 598.204.436,05	$ 1.877.725.598,70
3	Transporte	$ 291.285.886,44	$ -	$ 291.285.886,44
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 29.128.588,64		$ 29.128.588,64
TOTAL		**$ 2.912.858.864,41**	**$ 598.204.436,05**	**$ 2.314.654.428,36**

PLAN DE INVERSIÓN POR PROYECTO 2022005500022 PATINAJE				
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	EJECUTADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 100.385.259,68		$ 100.385.259,68
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 2.133.186.768,11	$ 1.975.076.073,18	$ 158.110.694,93
3	Transporte	$ 250.963.149,19	$ -	$ 250.963.149,19
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 25.096.314,92		$ 25.096.314,92
TOTAL		**$ 2.509.631.491,90**	**$ 1.975.076.073,18**	**$ 534.555.418,71**

PLAN DE INVERSIÓN POR PROYECTO 2022005500024 MULTIPROPOSITO				
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	EJECUTADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 363.040.511,33		$ 363.040.511,33
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 7.714.610.865,80	$ 7.714.610.865,80	$ -
3	Transporte	$ 907.601.278,33	$ 907.601.278,00	$ 0,33
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 90.760.127,83		$ 90.760.127,83
TOTAL		$ 9.076.012.783,30	$ 8.622.212.143,81	$ 453.800.639,49

Como se observa en la tabla anterior, el ítem número tres (3) TRANSPORTE, tiene un remanente que tal y como se dijo anteriormente por la ejecución del contrato no es necesario ejecutarla y se requiere para ser invertido en el ítem numero dos (2) MATERIALES Y SUBCONTRATOS DE OBRA. Con este cambio el balance en el plan de inversión del anticipo quedaría de la siguiente forma;

PLAN DE INVERSIÓN						
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	MODIFICACION	REPROGRAMACION	EJECUTADO	SALDO
1	Mano de obra	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$12.323.727.668,66	$ 542.249.035,63	$ 12.865.976.704,29	$ 10.287.891.375,04	$ 2.578.085.329,25
3	Transporte	$ 1.449.850.313,96	-$ 542.249.035,63	$ 907.601.278,33	$ 907.601.278,00	$ 0,33
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40
TOTAL		$ 14.498.503.139,60	$ -	$ 14.498.503.139,60	$ 11.195.492.653,04	$ 3.303.010.486,56

PLAN DE INVERSIÓN POR PROYECTO 2022005500094 ATLETISMO						
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	MODIFICACION	REPROGRAMACION	EJECUTADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 116.514.354,58	$ -	$ 116.514.354,58	$ -	$ 116.514.354,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 2.475.930.034,75	$ 291.285.886,44	$ 2.767.215.921,19	$ 598.204.436,05	$ 2.169.011.485,14
3	Transporte	$ 291.285.886,44	-$ 291.285.886,44	$ -	$ -	$ -
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 29.128.588,64	$ -	$ 29.128.588,64	$ -	$ 29.128.588,64
TOTAL		$ 2.912.858.864,41	$ -	$ 2.912.858.864,41	$ 598.204.436,05	$ 2.314.654.428,36

PLAN DE INVERSIÓN POR PROYECTO 2022005500022 PATINAJE						
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	MODIFICACION	REPROGRAMACION	EJECUTADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 100.385.259,68	$ -	$ 100.385.259,68	$ -	$ 100.385.259,68
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 2.133.186.768,11	$ 250.963.149,19	$ 2.384.149.917,30	$ 1.975.076.073,18	$ 409.073.844,12
3	Transporte	$ 250.963.149,19	-$ 250.963.149,19	$ -	$ -	$ -
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 25.096.314,92	$ -	$ 25.096.314,92	$ -	$ 25.096.314,92
TOTAL		$ 2.509.631.491,90	$ -	$ 2.509.631.491,90	$ 1.975.076.073,18	$ 534.555.418,71

12985

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

PLAN DE INVERSIÓN POR PROYECTO 2022005500024 MULTIPROPOSITO						
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	MODIFICACION	REPROGRAMACION	EJECUTADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 363.040.511,33	$ -	$ 363.040.511,33	$ -	$ 363.040.511,33
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 7.714.610.865,80	$ -	$ 7.714.610.865,80	$ 7.714.610.865,80	$ -
3	Transporte	$ 907.601.278,33	$ -	$ 907.601.278,33	$ 907.601.278,00	$ 0,33
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 90.760.127,83	$ -	$ 90.760.127,83	$ -	$ 90.760.127,83
TOTAL		$ 9.076.012.783,30	$ -	$ 9.076.012.783,30	$ 8.622.212.143,81	$ 453.800.639,49

Por lo anterior, solicitamos la respectiva aprobación de la reprogramación en el plan de inversión del anticipo justificada según lo descrito anteriormente; dicha información se soporta en el anexo GES-FO-145 PLAN DE INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN PAGO ANTICIPO OBRA.

Quedamos atentos a respuesta.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

12986

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 07 de noviembre del 2023

CEDVO-128-2023

Recibido 9-Nov-2023
Vanessa Sandoval.

Señores
ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS
Attn. Ing Juan Carlos Lozano León
Representante legal
Calle 14 sur # 48b -61 Serramonte.
Villavicencio-Meta


Referencia: Contrato 06 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: OBSERVACIONES SST.

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicito de manera inmediata soportes y evidencia de entrega de dotación y elementos de protección personal al personal en la ejecución de las actividades en obra, dado que en las fechas 01/11/2023 y 07/11/2023 en las fundidas se ha evidenciado al personal sin los elementos necesarios y de acuerdo con la exposición al riesgo químico tal cual como se evidencia en los siguientes registros:

Fecha: 01 de noviembre de 2023

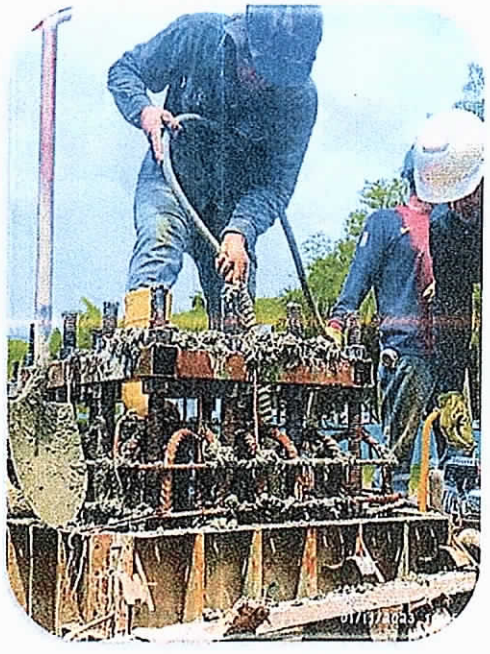









Fecha: 07 de noviembre 2023



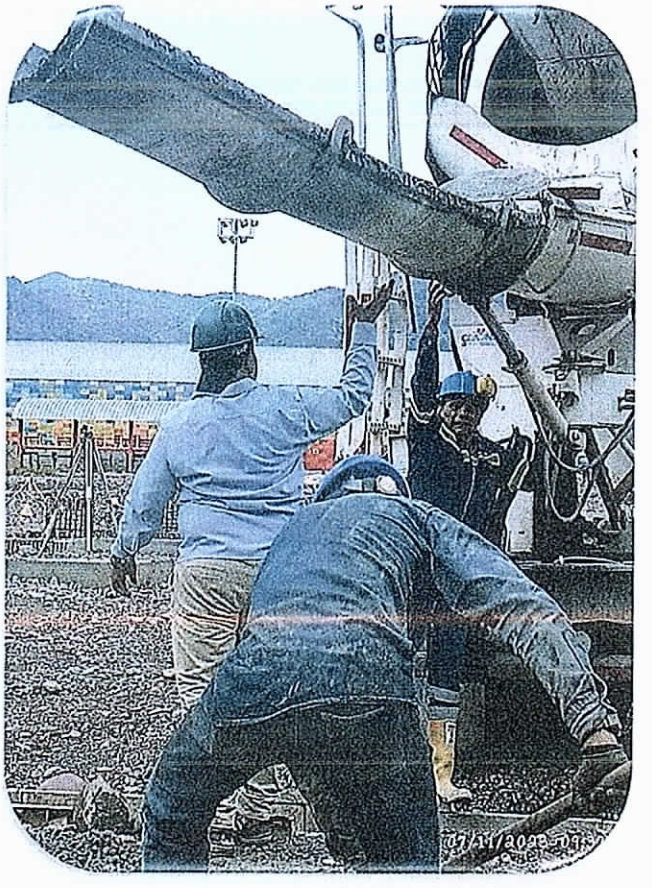



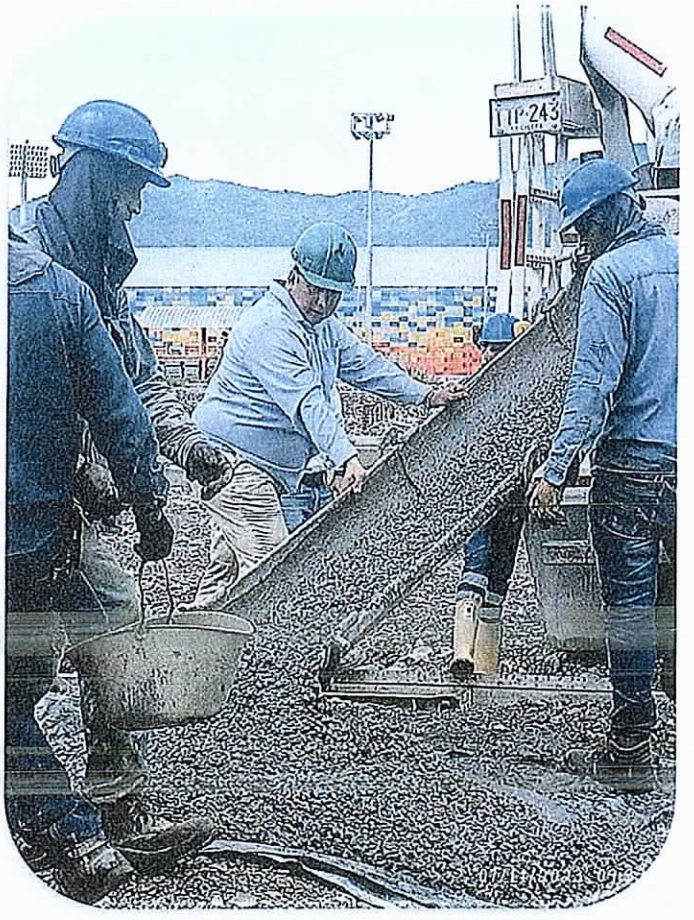

Se realizó el llamado de atención de manera verbal, se realizaron recomendaciones, pero en esta fecha nuevamente se evidencia la ausencia de estos elementos y autocuidado por parte del personal.

Además, se evidenció la manipulación del mixer por un trabajador, observación que se le realizó en campo al inspector SST en obra del contratista, la cual procede a realizarle la recomendación al mismo y este hace caso omiso y contesta continuando con el acto inseguro.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.1.4.1. **Calzado y vestido de labor**. Para efectos de la *obligación consagrada en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, se considera como calzado y vestido de labor el que se requiere para desempeñar una función o actividad determinada.*

El overol o vestido de trabajo de qué trata el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo debe ser apropiado para la clase de labores que desempeñen los trabajadores y de acuerdo con el medio ambiente donde ejercen sus funciones.

***Decreto 1072 de 2015 PARÁGRAFO** 4. El empleador o contratante debe corregir las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas y riesgos asociados a la tarea.*

Citado lo anterior, se le informa al contratista que, evidenciado nuevamente, se realizará suspensión inmediata de actividades en obra ya que, incumpliendo con lo mencionado, también está incumpliendo con la cláusula contractual ***6.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA***.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: Ficha técnica cemento empleado - Cemex

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Esta FDS cumple con la legislación colombiana, según la fecha de revisión arriba mencionada.

1.1. IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

Nombre del Producto:	Cemento Hidráulico
Otros nombres:	Cemento, Cemento Uso General, Cemento UG, Cemento Estructural, Cemento Superresistente, Fibrocemento, Cemento Uso Ambiente Marino, Cemento MRS, Cemento Alta Resistencia Temprana, Cemento ART, Cemento Portland, Clinker Portland, Cemento Tipo I, Cemento Blanco.
Descripción del Producto:	Polvo fino constituido por una mezcla de Clinker, sulfato de calcio y materiales adicionales, finamente molidos, el cual, al ser mezclado con el agua, forma una pasta que endurece al aire o bajo agua.
Uso previsto:	Conglomerante hidráulico en la fabricación de hormigones, morteros y pastas, especialmente diseñados para construir.

1.2. INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE

Productor/Fabricante:	CEMEX Colombia S.A. Calle 99 No. 9A – 54 Bogotá- Colombia.
Información Técnica:	+57 (1) 6039000

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA.

Sistema Globalmente Armonizado	Corrosión cutánea, Categoría 1. Lesiones oculares graves. Categoría 1. Sensibilización cutánea. Categoría 1. Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) (irritación del tracto respiratorio). Categoría 3. Carcinógeno (inhalación). Categoría 1A

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Pictogramas de Peligro:



Palabra de advertencia:	Peligro	
Frases de Peligro (Frases H):	H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves
	H317	Puede causar reacciones alérgicas en la piel
	H335	Puede irritar las vías respiratorias
	H350	Puede provocar cáncer (Vía respiratoria)
Frases de Prudencia (Frases P):	Prevención	
	P201	Leer instrucciones antes del uso

P202	No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
P260	Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles
P264	Lávese bien las manos luego de manejar este producto
P270	No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto
P271	Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado
P280	Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/cara
P281	Utilice el equipo de protección personal como se requiere
Intervención	
P314	Obtenga atención médica si se siente indispuesto
P308+P313	Si se expone o está preocupado: Obtenga atención médica
P304+P340+ P312	SI SE INHALA: Remueva a la víctima a un área donde haya aire fresco y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame al al médico si se siente indispuesto.
P302+P325+ P362 +P363	SI ES EN LA PIEL: Lávese con mucha agua y jabón. Quítese la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volverla a utilizar
P332+P313	Si ocurre irritación de la piel: Obtenga atención médica.
P305+P351 +P338+P310	SI ES EN LOS OJOS: Enjuáguese cautelosamente con agua por varios minutos. Remueva los lentes de contacto, si los tiene y puede removerlos fácilmente. Continúe enjuagándose. Llame inmediatamente al médico.
Almacenamiento	
	Almacene el producto en un área que se mantenga seca y ventilada y donde se minimice la generación de polvo.
Eliminación	
P501	Eliminar el contenido conforme la reglamentación local

2.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El contacto del cemento húmedo con la piel, puede causar irritación, dermatitis o quemaduras.
Puede provocar daños en elementos hechos de aluminio u otros metales no-nobles.
Trazas de químicos, presentes naturalmente podrían detectarse en el análisis químico. Estos constituyentes pueden incluir residuo insoluble, el cual parte puede ser cuarzo libre (sílice cristalina), óxido de calcio (también conocido como Cal o cal viva), óxido de magnesio, sulfato de potasio, sulfato de sodio, compuestos de cromo y compuestos de niquel.

SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 SUSTANCIA/MEZCLA

Cemento hidráulico, mezcla de diversos componentes.

Nombre	# CAS	Concentración (% en masa)
Clinker de cemento Portland	65997-15-1	55-96
Cuarzo (Sílice cristalina) *	14808-60-7	0-16
Cromo hexavalente**	7440-47-3	**
Carbonato de calcio	1317-65-3	2-30
Sulfato de calcio	7778-18-9	3-9

Notas
- Cualquier concentración ilustrada como un rango se usa para proteger la confidencialidad, también se debe a las variaciones en los registros de formulaciones de la producción.
- Aditivos químicos pueden ser utilizados y estar presentes en rangos promedio menores a 1%.

- * Análisis cuantitativo de fases mineralógicas realizado por espectrometría de difracción de rayos X. En la muestra no se tuvo en cuenta la fase amorfa, por lo tanto, de presentarse, las fases identificadas pueden estar sobre estimadas.
- ** El cromo hexavalente se incluye debido a su asociación como componente sensible a la piel.
- No hay ingredientes adicionales presentes que, dentro del conocimiento actual del fabricante y en las concentraciones aplicables, sean clasificados como peligrosos a la salud o al medio ambiente y que requieran ser reportados en esta sección.

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

General

No es necesario el uso de equipos de protección individual por parte de las personas que dispensen los primeros auxilios. Los trabajadores que dispensen primeros auxilios deben evitar entrar en contacto con cemento húmedo o mezclas húmedas que lo contengan.
Asegurar que el personal médico es consciente de los materiales involucrados y tomar precauciones para protegerse a sí mismos.

Inhalación

Si una persona presenta trastornos por la inhalación de grandes cantidades de cemento, se debe trasladar inmediatamente a un lugar al aire libre.
En caso de paro respiratorio emplear el método de reanimación cardiopulmonar (RCP), mantener al paciente abrigado y acostado.
Conseguir atención médica tan pronto como sea posible.

Contacto con la piel

Si la piel entra en contacto con cemento, es necesario lavar inmediatamente con agua y jabón la zona del cuerpo afectada; en su defecto, utilice un detergente suave (pH neutro) para eliminar el cemento.
Solicitar asistencia médica siempre que se produzca irritación o quemadura cáustica.

Contacto con los ojos

No frotar los ojos para evitar daños de la córnea por estrés mecánico. Buscar atención médica inmediatamente. Llamar al médico. Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes.
Continuar lavándose durante al menos 15 minutos.

Ingestión

No inducir el vómito.
Si la víctima está consciente, enjuagar la boca para eliminar el material o polvo e ingerir agua en abundancia.
Solicitar asistencia médica de inmediato.

4.2 SÍNTOMAS/EFECTOS POR EXPOSICIONES AGUDAS

Inhalación

La inhalación repetida de polvo de cemento durante un largo periodo de tiempo incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares.

Contacto con la piel

El cemento puede tener un efecto irritante sobre la piel húmeda (debido al sudor o la humedad) después de un contacto prolongado o puede causar dermatitis de contacto tras el contacto repetido sin protección adecuada.
El contacto prolongado con cemento húmedo, sin la protección adecuada, puede provocar graves quemaduras ya que se desarrollan sin sentir dolor (por ejemplo, al arrodillarse en mortero o pasta de cemento fresco, incluso llevando pantalones).
Para más información ver Referencia IV.

Contacto con los ojos

El contacto directo con polvo de cemento (húmedo o seco) puede provocar lesiones graves, potencialmente irreversibles

Ingestión	No se espera que sea una vía de entrada importante. Puede causar quemaduras en boca, garganta y estómago

4.3 SÍNTOMAS/EFECTOS POR SOBRE-EXPOSICIÓN

Inhalación	Síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación del tracto respiratorio y causar tos.
Contacto con la piel	Los síntomas pueden incluir los siguientes: puede ocurrir dolor o irritación, enrojecimiento y ampollas, quemaduras de la piel, ulceración y necrosis.
Contacto con los ojos	Síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, lagrimeo y enrojecimiento.
Ingestlón	Los síntomas pueden incluir los siguientes: dolores de estómago.

4.4 RECOMENDACIONES PARA ATENCIÓN MEDICA INMEDIATA

Si grandes cantidades han sido inhaladas o digeridas	Buscar tratamiento médico y contacte a un especialista en tratamientos por Envenenamiento.
Notas para el especialista medico	Tratar los síntomas.
Protección para los socorristas	Ninguna acción deberá ser tomada que pueda implicar un riesgo para el personal o para aquellos sin entrenamiento adecuado. Puede ser peligroso para la persona que proporciona la ayuda el dar reanimación respiratoria de boca a boca. Lave la ropa contaminada con abundante agua antes de retirarla, o use guantes.

SECCIÓN 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN

Medios de extinción adecuados:	No es inflamable. Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
Medios de extinción no adecuados:	No utilice agua o compuestos halogenuros, excepto cuando grandes cantidades de agua puedan ser utilizadas para inundar pequeñas cantidades de cal.

5.2 PELIGROS ESPECIALES PROCEDENTES DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Peligros específicos:	No hay riesgos de incendios o explosiones
Productos de Combustión Peligrosos:	Pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos metálicos.

5.3 CONSEJOS PARA BOMBEROS

Equipos de Protección Especial:	Elementos de respiración autónoma de presión positiva (SCBA) y ropa protectora ante el fuego.
Precauciones Especiales:	Evacuar el área. Luchar contra el fuego con las precauciones normales a una distancia razonable. Mover los contenedores presentes en el área incendiada si estos presentan un riesgo.

SECCIÓN 6 MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Para personal que no sea de emergencia:	Ninguna acción deberá ser tomada que envuelva riesgo personal o sin un adiestramiento adecuado. Evalúe las áreas alrededor. Mantenga al personal que no

sea necesario y sin protección de entrar al área afectada. No toque o camine sobre el material derramado. Prevea ventilación adecuada. Utilice un respirador apropiado cuando la ventilación no sea adecuada. Utilice equipo de protección personal apropiado.

Para personal socorrista Evacuar alrededores si es necesario. Evitar la entrada a de personal innecesario y no protegido. No respirar el polvo. Proporcionar una ventilación adecuada.
Para los equipos de protección personal, remitirse a la sección 8.

6.2 PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES

Precauciones ambientales Evite la dispersión, escorrentía y contacto con el suelo del material derramado. Notifique a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación al medio ambiente (alcantarillas, canales, suelo o aire).

6.3 MÉTODOS Y MATERIALES DE AISLAMIENTO Y LIMPIEZA

Derrames pequeños Usar el equipo de protección personal apropiado como se describe en la sección 8 para la limpieza, contención y eliminación de derrame.
Nota: consulte la sección 1 para obtener información sobre los contactos de emergencia y la Sección 13 para la eliminación de residuos.

Cemento seco

Minimizar generación de polvo. Limpiar con una aspiradora con un sistema de filtración suficiente para extraer e impedir la recirculación del polvo (Se recomienda una aspiradora equipada con un filtro de alta eficiencia para aire con partículas (HEPA). Otras alternativas para limpiar el polvo son: fregar, cepillado húmedo o baldeo (suave para evitar levantar polvo) y luego recoger la mezcla en un contenedor. Si no es posible, limpiar mezclando directamente con agua (ver apartado cemento húmedo)
NO UTILICE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIAR DERRAMES.

Cemento húmedo

Recoger el cemento húmedo y depositarlo en un contenedor apropiado. Dejar que el material se seque y endurezca antes de su eliminación tal y como se describe en la Sección 13.

Derrames grandes Usar el equipo de protección personal apropiado como se describe en la sección 8 para la limpieza, contención y eliminación de derrame.
Nota: consulte la sección 1 para obtener información sobre los contactos de emergencia y la Sección 13 para la eliminación de residuos.

Cemento seco

Utilice medidas de control del polvo y cuidadosamente recoja mediante cucharón o pala y póngalo en un recipiente limpio y seco para su posterior reutilización o eliminación. NO UTILICE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIAR DERRAMES.

Cemento húmedo

Recoger el cemento húmedo y depositarlo en un contenedor apropiado. Dejar que el material se seque y endurezca antes de su eliminación tal y como se describe en la Sección 13.

SECCIÓN 7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Medidas de protección Usar equipo de protección y personal adecuado (ver sección 8). Las personas con un historial de problemas de sensibilización de la piel no deben ser empleadas en cualquier proceso en el que se utiliza este producto. Evitar la exposición obteniendo y siguiendo las instrucciones especiales antes del uso. No manipular hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad. No permitir que entre en los

ojos o que haga contacto con la piel o la ropa. No respirar el polvo. No ingerir. Usar sólo con ventilación adecuada. Usar respirador apropiado cuando la ventilación sea inadecuada.

Consejos de higiene

Comer, beber y fumar debería estar prohibido en las zonas donde este material es manipulado, almacenado y procesado. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y fumar.

Condiciones para almacenamiento seguro

Almacenar y manipular de acuerdo con las reglamentaciones y normas actuales.
El cemento a granel debe almacenarse en lugar seco (minimizando la condensación), a cubierto, limpio y a salvo de contaminación.
Peligro de sepultamiento: El cemento puede acumularse o adherirse a las paredes de los espacios confinados, pudiendo soltarse, derrumbarse o caer inesperadamente. Para prevenir el riesgo de enterramiento o de asfixia no entrar en espacios confinados como silos, contenedores, cubas u otros recipientes que se utilicen para almacenar o contengan cemento sin adoptar las medidas de seguridad apropiadas.
El producto envasado, debe almacenarse en sacos cerrados, en un entorno fresco, seco, protegido de corrientes de aire excesivas que puedan afectar a la calidad del cemento.
Los sacos deben apilarse de manera estable.
No utilizar recipientes de aluminio para el almacenamiento o el transporte de mezclas que contengan cemento húmedo debido a la incompatibilidad de los materiales.

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 VALORES LIMITES OCUPACIONALES

NOMBRE DEL COMPONENTE	# CAS	ACGIH TLV (8 horas)
Clinker de Cemento Portland	65997-15-1	1 mg/m^3 8 horas (Fracción Respirable)
Cuarzo (Sílice Cristalina)	14808-60-7	0.025 mg/m^3 8 horas (Fracción Respirable)
Carbonato de calcio	1317-65-3	10 mg/m^3 8 horas (Fracción total)
Sulfato de calcio	7778-18-9	10 mg/m^3 8 horas (Fracción respirable)
Partículas (Insoluble o poco soluble) no definidas de otra manera	N/A	3 mg/m^3 (Fracción Respirable) 10 mg/m^3 (Fracción Total o Inhalable)

8.2 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS

Usar sólo con ventilación adecuada. Si las operaciones del usuario generan polvo, utilizar procesos de acopio de polvo, sistemas de ventilación locales u otros controles de ingeniería para mantener exposición de los trabajadores a contaminantes del aire por debajo de los límites legales o recomendados.
Las emisiones provenientes de la ventilación o equipo para proceso de trabajo se deben verificar para asegurarse de que cumplen con los requisitos de legislación de protección del medio ambiente.

8.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Protección ojos/rostro

Gafas de seguridad que cumplan con el estándar aprobado deber ser utilizadas cuando una evaluación de riesgo indique que es necesario para evitar la exposición a polvo, gases, neblina o salpicaduras de líquidos. Si es posible el contacto, se debe utilizar la siguiente protección, a menos que la evaluación haya indicado un grado mayor de protección: gafas contra salpicaduras de productos químicos o protector de cara. Si existe riesgo por inhalación, podrá ser requerido un respirador de cara completa en su lugar.

Protección para manos

Guantes impermeables resistentes a químicos, que cumplan con los estándares

aprobados deben ser utilizados en todo momento cuando se manejen productos químicos y la evaluación de riesgo indica que es necesario. Considere las especificaciones del guante por el fabricante, verifique durante el uso de los guantes si todavía mantienen las propiedades de protección. Se debe notar que el tiempo de ruptura de cualquier material de los guantes puede ser distinto por los distintos fabricantes de guantes. En el caso de mezclas, que consisten de varias sustancias, el tiempo de protección de los guantes no podrá ser calculado certeramente.

Protección para el cuerpo

No es necesario cuando este empaquetado. Si el polvo se genera durante el uso: Usar botas impermeables, resistentes al agua, resistentes a la abrasión y álcali-resistente y camisas protectoras de manga larga y pantalones largos para proteger la piel del contacto con polvo húmedo. Para reducir la exposición pie y tobillo, utilice botas que sean lo suficientemente altas como para evitar el ingreso de polvo dentro de ellas. No permitir polvo dentro de botas, zapatos o guantes. Retirar la ropa y equipo de protección que este satura con polvo y lavar inmediatamente las áreas expuestas del cuerpo.

Protección respiratoria

Utilizar respirador con filtro de partículas propiamente ajustado, cumpliendo con un estándar aprobado, si una evaluación de riesgos indica que esto es necesario. La selección del respirador debe estar basada en niveles de exposición conocidos o anticipados, los peligros del producto y el factor asignado de protección del respirador seleccionado.

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Nota: Las propiedades físicas y químicas se proporcionan únicamente para consideraciones de seguridad, salud y medio ambiente y pueden no representar por completo las especificaciones del producto. Consulte al proveedor para información adicional.

9.1 INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS FUNDAMENTALES

Estado físico	Sólidos suspendidos (pasta)	Comentarios
Color	Gris o blanco	-
Olor	No tiene olor distintivo	-
Umbral de olor	No disponible	-
pH (en agua)	12 a 13	(Solución Saturada) a 25ºC
Punto de fusión	No disponible	-
Punto de ebullición	>1000 °C (>1832 °F)	-
Punto de inflamabilidad	No inflamable. No combustible	-
Tiempo de combustión	No disponible	-
Velocidad de combustión	No disponible	-
Velocidad de evaporación	No disponible	-
Inflamabilidad (Solido, gas)	No disponible	-
Límite superior e inferior explosivo (Inflamable)	No aplica	-
Presión de vapor	No aplica	-
Densidad del vapor	No aplica	-
Densidad relativa	2.7 a 3.2	-
Solubilidad	Ligeramente soluble en agua	-
Solubilidad en agua	0.1% a 1%	-
Coeficiente de partición Octanol/Agua	No aplica	-

Estado físico	Sólidos suspendidos (pasta)	Comentarios
Temperatura de autoignición	No aplica	-
Temperatura de descomposición	No disponible	-
SADT	No disponible	-
Viscosidad	No aplica	-

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad Reacciona lentamente con el agua formando compuestos hidratados, liberando calor y produciendo una solución fuertemente alcalina hasta que la reacción es substancialmente completa.

Estabilidad química El producto es estable.

Posibilidad de reacciones peligrosas En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán reacciones peligrosas.

Condiciones a evitar No hay datos específicos.

Materiales incompatibles Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes, ácidos, sales de aluminio y sales amonio. El polvo de cemento es altamente alcalino y reacciona con los ácidos para producir una reacción violenta, generando calor. Gases o vapores tóxicos pueden emanarse dependiendo el ácido implicado. Polvo de aluminio, elementos alcalinos y alcalinotérreos reacciona en mortero o concreto, liberando gas de hidrógeno. La caliza se inflama en contacto con flúor y es incompatible con ácidos, alumbre, sales de amonio y magnesio. Sílice reacciona violentamente con agentes oxidantes potentes como el flúor, trifluoruro de boro, trifluoruro de cloro, trifluoruro de manganeso y difluoruro de oxígeno produciendo posibles incendios o explosiones. Silicatos se disuelven fácilmente en ácido fluorhídrico produce un gas corrosivo, tetrafluoruro de silicio.

Productos de descomposición peligrosos Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no deberían presentarse por descomposición productos peligrosos.

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 VÍAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN

Inhalación Puede causar irritación del tracto respiratorio. Los síntomas pueden incluir los siguientes: irritación del tracto respiratorio, tos.

Contacto con la piel Puede causar irritación en la piel. Puede causar quemaduras serias en presencia de humedad. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación, enrojecimiento, ampollas, quemaduras en la piel, ulceraciones y necrosis.

Contacto con los ojos Causa daño serio en los ojos. Puede causar quemaduras serias en presencia de humedad. Síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, lagrimeo, enrojecimiento.

Ingestión Puede causar quemaduras en boca, garganta y estómago. Síntomas adversos pueden incluir dolor de estómago.

11.2 EFECTOS AGUDOS Y CRÓNICOS

Efectos inmediatos Se desconoce los efectos significativos o peligros críticos.

(Agudos)	
Efectos crónicos potenciales	La inhalación de polvo repetida o prolongada pudiera ocasionar una irritación crónica del tracto respiratorio. Si existe sensibilidad al cromo hexavalente, una reacción cutánea alérgica grave puede ocurrir después de exposición a niveles muy bajos.
Carcinogenicidad	El Cemento Portland no se considera un carcinógeno. El cuarzo (sílice cristalina) se considera un peligro por inhalación. La exposición excesiva a cuarzo (sílice cristalina) pudiera causar silicosis, una enfermedad pulmonar no-cancerosa. El cuarzo (Sílice cristalina) es considerado un riesgo por inhalación. IARC ha clasificado el cuarzo (Sílice cristalina) como una sustancia del grupo 1, carcinogénico para humanos. Esta clasificación se basa en los resultados de laboratorio obtenidos en animales (Inhalación e implantación) y estudios epidemiológicos que fueron considerados suficientes para carcinogenicidad. Para más información, ver Referencias IV y XI.
Mutagenicidad	No se conocen efectos significantes o peligros críticos. Para más información, ver Referencias IX y X.
Teratogenicidad	No se conocen efectos significantes o peligros críticos.
Efectos en la fertilidad	No se conocen efectos significantes o peligros críticos.

11.3DATOS NUMÉRICO-TOXICOLÓGICOS

Toxicidad Aguda (Inhalación CL 50)	No disponible.
Toxicidad Aguda (Oral DL 50)	No disponible.
Toxicidad Aguda (Dérmica DL 50)	No disponible.

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad	El producto no es peligroso para el medio ambiente. Ensayos de ecotoxicidad de cemento Portland con Daphnia magna [Referencia V] y Selenastrum coli (ver Referencia VI) han demostrado un mínimo impacto toxicológico, por lo que no se han podido determinar valores de LC50 y EC50 (ver Referencia VII). No hay indicación sobre toxicidad de la fase sedimentaria (ver Referencia VIII). En caso de derrame accidental de grandes cantidades de cemento al agua se puede producir una débil subida de su pH, que bajo ciertas circunstancias podría representar cierta toxicidad para la vida acuática.
Persistencia y degradabilidad	No relevante. Después de fraguar, el cemento no presenta ningún riesgo.
Bioacumulación potencial	No relevante. Después de fraguar, el cemento no presenta ningún riesgo.
Movilidad en suelos	No relevante. Después de fraguar, el cemento no presenta ningún riesgo.
Otros efectos adversos	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 13 INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Recuperar el material derramado cuando sea posible. El material no contaminado puede ser reutilizado. Desechar el desperdicio en conformidad con las regulaciones locales, estatales y federales aplicables.

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

El cemento no está afectado por la legislación internacional de transporte de mercancías peligrosas (IMDG, IATA, ADR/RID). Mercancía no peligrosa según la reglamentación de transporte. No es necesario adoptar ninguna precaución especial aparte de las mencionadas en la sección 8.

No.UN	No disponible
Clase de peligro en el transporte	Ninguno.
Grupo de embalaje/envase	No aplica
Peligros para el medio ambiente	Ninguno
Precauciones especiales	Ninguno

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Ley 55 de 1993 Presidencia de la Republica	Por medio de la cual se aprueba el convenio No. 170 y la recomendación No. 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.
Decreto 1973 de 1995 Ministerio de relaciones exteriores	Por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 25 de junio de 1990
Decreto 1609 de 2002 Ministerio de Transporte	Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
Decreto 4741 de 2005. Presidencia de la Republica	Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Decreto 1079 de 2015 Ministerio de Transporte	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
Decreto 1076 de 2015 Presidencia de la Republica	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Decreto 1496 de 2018 Ministerio del Trabajo	Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.
Resolución 1023 de 2005 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	Por el cual se adoptan las guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación. En las cuales se incluye la siguiente guía: Guías ambientales de almacenamiento y transporte por carreteras de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos

SECCIÓN 16 OTRAS INFORMACIONES

Esta ficha de datos de seguridad sustituye a la ficha de seguridad anterior del Cemento de fecha 2016-03-11.

Calificaciones de NFPA 704 (Asociación Nacional de Protección contra Incendios)

Salud: 3
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 1
Riesgo Específico: Ninguno

Aviso al lector

El cemento solamente debe usarse bajo la supervisión de un profesional en construcción, y ser aplicado por un experto.

La clave para usar el producto de manera segura exige que el usuario reconozca que el cemento reacciona químicamente con el agua, y que algunos de los productos intermedios de esta reacción (que son aquellos presentes cuando un producto del cemento está "fraguando") presentan un riesgo más grave que el del cemento seco en sí mismo.

Mientras que la información provista en esta ficha de seguridad se considera que brinda un resumen útil de los riesgos del cemento como se usa comúnmente, la ficha no puede anticipar y proporcionar la totalidad de la información que podría ser necesaria en todas las situaciones. Los usuarios inexpertos de los productos deberían obtener una capacitación correcta antes de usar este producto.

EL VENDEDOR NO GARANTIZA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITAMENTE, CON RESPECTO AL PRODUCTO O LA COMERCIALIZACION O APTITUD DEL MISMO PARA NINGÚN PROPÓSITO, NI ACERCA DE LA PRECISIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROVISTA POR CEMEX, excepto que el producto deba cumplir con especificaciones contractuales. CEMEX, considera que la información provista en el presente documento es precisa al momento de prepararse o está preparada a partir de fuentes consideradas confiables, aunque es responsabilidad del usuario investigar y comprender otras fuentes de información pertinentes para cumplir con todas las leyes y los procedimientos aplicables la manipulación y uso seguros del producto, y para determinar la conveniencia del producto para su uso pretendido. En particular, los datos provistos en esta hoja de seguridad no tratan los riesgos que pueden presentar otros materiales mezclados con cemento. Los usuarios deberían analizar otras hojas de seguridad relevantes antes de trabajar con productos derivados como, por ejemplo, el concreto o morteros secos.

Referencias

La información contenida en esta ficha de seguridad ha sido compilada a partir de las siguientes fuentes:

I. Ficha de datos de seguridad del cemento. Cemex España Operaciones, S.L.U. Revisión 14. Edición 01/06/2016.
II. Hoja de datos de seguridad Cemento Portland. Cemex Houston. Revisión: Mayo-2015.
III. Hoja de seguridad de materiales Cemento Portland. Cemex Puerto Rico, Inc. Versión 1. Emisión 20/04/2016.
IV. Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf
V. U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4th ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).
VI. U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5th ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).
VII. Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
VIII. Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

IX. Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol, 2009 Sept; 22(9): 1548-58
X. Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008
XI. Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

Abreviaciones

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
 # CAS - Chemical Abstract Service = Número del Servicio de Resúmenes Químicos
CFR - Code of Federal Regulations = Código de Regulaciones Federales
IARC - International Agency for Research on Cancer = Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer
NTP - National Toxicology Program = Programa Nacional de Toxicología
OSHA — Occupational Safety and Health Administration = Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
TLV - Threshold Limit Value = Valor Límite Umbral
TWA - Time-Weighted Averag = Tiempos Medios Ponderado
UN- Naciones unidas

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 8 de noviembre del 2023

CEDVO-129-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Arq Andrés H.
RECIBIDO 03 NOV 2023
4:13pm

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA CORRECCIONES MODIFICACIÓN No.01 PISTA DE ATLETISMO

Cordial saludo

De manera atenta me permito entregar las correcciones de la modificación del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META", el cual forma parte del contrato de la referencia.

La presenta tiene como fin hacer entrega de las observaciones realizadas por ustedes de la modificación en mayores y menores de cantidades de obra e ítems no previstos para llevar a feliz término la terminación del proyecto

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo:____folios, ___ planos

13 003

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01
		FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 10 de noviembre de 2023

CEDV0-0129-2023

10-11-23
Tatiana S.
9:45 AM

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No 11 ANTICIPO

Cordialmente remitimos los documentos soporte de la orden de giro No 11 con cargo al Fideicomiso Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023.

ITEM DEL ANTICIPO	VALOR	DOCUMENTOS SOPORTE
1	$ 36.132.107,00	Relación reembolso, comprobantes de egreso, soportes de pago, cuentas de cobro, RUT´s y certificación bancaria del consorcio, por concepto de pago de mano de obra.

N°	BPIN	NOMBRE DE PROYECTO	AFECTACION
1	2022005500094	Pista de atletismo	$ 10.123.000,00
2	2022005500022	Pista de Patinaje	$ 6.119.640,00
3	2022005500024	Escenarios deportivos multipropósitos	$ 19.889.467,00
		VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO N° 11 POR PROYECTO	$ 36.132.107,00

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

Villavicencio, 10 de noviembre del 2023

CEDVO-130-2023

Recibido
10/11/23
Tatiana Paez S.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No.01 PISTA DE PATINAJE

Cordial saludo

De manera atenta me permito entregar solicitud de modificación del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.", el cual forma parte del contrato de la referencia.

La presenta solicitud contempla modificación en mayores y menores de cantidades de obra e ítems no previstos para llevar a feliz término la terminación del proyecto. Para ello se requiere realizar modificación con adición en valor y tiempo así:

CUADRO RESUMEN	
CONTRATO:	**$8.805.724.533**
MODIFICACIONES (+)	$6.603.849.916
MODIFICACIONES (-)	$2.513.645.052
VALOR ADICIONAL	**$4.090.204.864**
VALOR TOTAL	**$12.895.929.397**

13 005

En cuanto al tiempo de ejecución final, el proyecto tiene una duración actual de 12 meses y se requiere 4 meses más para para la terminación de las mayores cantidades e ítems no previstos en el presente informe, una vez sea aprobado por la entidad.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo:____folios, ___ planos

13.006

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 10 de noviembre de 2023

CEDVO-0130-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Recibido
10/11/2023

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: RESPUESTA OFICIO OF-C249-2023-174 SOLICITUD DE COMPROBANTES PAGO FIC

Por medio del presente documento nos permitimos dar respuesta a los oficios OF-C249-2023-174 Y OF-C249-2023-137, adjuntando los respectivos soportes de pago del fic a la fecha.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

13.007

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 16 de noviembre de 2023

CEDVO-0131-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No 12 ANTICIPO

Cordialmente remitimos los documentos soporte de la orden de giro No 12 con cargo al Fideicomiso Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023.

ITEM DEL ANTICIPO	VALOR	DOCUMENTOS SOPORTE
1	$ 241.751.169,00	Cuenta de cobro, copia de contrato N°9, RUT, certificado existencia y representación legal, copia de cedula del representante legal, certificación bancaria, por concepto de pago de materiales y sub contratos de obra.

N°	BPIN	NOMBRE DE PROYECTO	AFECTACION
1	2022005500094	Pista de atletismo	$ 46.808.582,17
2	2022005500022	Pista de Patinaje	$ 194.942.586,83
VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO N° 12 POR PROYECTO			$ 241.751.169,00

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

RECIBIDO 15 NOV 2023
Carolina B.
5:15 p.m.

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

13.008

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 23 de noviembre del 2023

CEDVO-132-2023

Recibido
28/11/23
4:40PM
Tatiana S.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de ajuste estructural a muros de contención de pista de ruta

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de las memorias de cálculo y plano estructural de los muros perimetrales de la pista de patinaje de ruta, de acuerdo a las diferentes alturas libres del urbanismo.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 37 folios y 1 plano

13009

Villavicencio, 21 de noviembre del 2023

CEDVO-135-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Tatiana Pedro S
21-11-23

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO DE OBRA MES DE OCTUBRE.

Cordial saludo

La presente tiene como fin, realiza la entrega del informe de plan de inversión de anticipo de obra correspondiente a los desembolsos del mes de octubre con sus respectivas ordenes de giro.

Agradecemos la atención prestada.

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

013.010

Villavicencio, 21 de noviembre del 2023

CEDVO-136-2023

22-11-2023
Dra 85 #5 H
11:22 am.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de informe mensual de octubre 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe mensual de obra No.06 correspondiente al mes de octubre de 2023.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo 853 folios

13011

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 23 de noviembre del 2023

CEDVO-137-2023

Recibido
28/11/23
4:40 pm

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de ajuste estructural a pedestal A-8 escenario 1

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega del ajuste estructural del pedestal A-8 en el escenario 1, el cual obedece al cruce obligado de la tubería de Aguas Lluvias existente que interfiere con la zapata y pedestal en mención.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 21 folios

13012

NIT: 901.682.871 – 2	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023**	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023-IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 27 de noviembre del 2023

CEDVO-138-2023

Señores
ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS
Attn. Ing Juan Carlos Lozano León
Representante legal
Calle 14 sur # 48b -61 Serramonte.
Villavicencio-Meta

Recivido
Vanessa Sandoval
5:21 pm

Referencia: Contrato 06 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: OBSERVACIONES AMBIENTALES.

Cordial saludo,

Por medio del presente, se solicita que en los días posteriores al presente documento, se realicen jornadas de orden y aseo en las áreas de intervención del contratista Wilson Cárdenas, considerando que en recorridos realizados se han encontrado distintos residuos en las zonas de trabajo, acto que esta estrictamente prohibido, dado que para realizar la disposición de los residuos se cuentan con puntos ecológicos en cada escenario los cuales son de total conocimiento de los colaboradores; simultáneamente, se solicita que de manera inmediata se cambie de lugar el punto de hidratación el cual se encuentra en un lugar que no cumple con las condiciones óptimas para su funcionamiento de acuerdo con la resolución 2400 de 1979 del ministerio del trabajo y la seguridad social, considerando que, está instalado a la intemperie, expuesto al sol y al agua.

Cabe resaltar que previo a este oficio, se realizaron las respectivas observaciones de manera verbal en varias ocasiones tanto por el área SST como por el área AMBIENTAL y se dieron las recomendaciones, las cuales a la fecha no se han aplicado.

Citado lo anterior, se anexa el registro fotográfico, para que se realicen las respectivas correcciones de lo antes citado.

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01
		FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023-IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1



Observaciones: Botella de gaseosa.



Observaciones: Lona vacia.



Observaciones: Plástico tirado y pisado por el agregado pétreo.



Observaciones: Lonas de material tiradas y estibas de madera dañadas.

13 014

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023-IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1



Observaciones: Residuos plásticos.



Observaciones: Lonas de material en el suelo.



Observaciones: Lonas de material y plástico en el suelo.



Observaciones: Punto de hidratación en área no autorizada.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 27 de noviembre del 2023

CEDVO-139-2023

Señores
ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS
Attn. Ing Juan Carlos Lozano León
Representante legal
Calle 14 sur # 48b -61 Serramonte.
Villavicencio-Meta

Recivido
Vanessa Sandoval
5:22pm

Referencia: Contrato 06 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: OBSERVACIONES SEGURIDAD SOCIAL.

Anexo relaciono documentación solicitada al contratista a la fecha con novedades, las cuales deben ser soportadas con liquidación y paz y salvo.

Documentación la cual está sujeta a verificación previa a la remisión de cortes a la oficina administrativa para su correspondiente pago.

NOMBRE COMPLETO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
YERSON FABIAN MORENO ACHURY	16/08/2023	30/09/2023
DIEGO FERNANDO ENCISO	15/09/2023	30/09/2023
BRAYAN ALBERTO ORTIZ	17/08/2023	30/09/2023
MIGUEL ANGEL NARVAEZ	23/08/2023	08/09/2023
DERFY GUACARAPE MANFARA	23/08/2023	30/09/2023
WILSON TRIANA CAVIELES	05/09/2023	30/09/2023
LIBANIEL GONZALEZ MARTINEZ	23/08/2023	15/10/2023
OMAR IVAN PEREZ HENAO	28/08/2023	06/10/2023
JOSE HECTOR MONTOYA MANJARRES	21/09/2023	21/10/2023
LEWIS MONTERO BALVIN	23/09/2023	21/10/2023

Se realiza verificación de documentos anexos a corte # 7, 3 liquidaciones de las cuales 1 manifiesta que no ha sido paga ni ha firmado ningún tipo de documento, las otras 2 no fue posible verificarlas, los trabajadores no contestan.

Además de que visualmente las firmas en los documentos no corresponden a la misma entre la liquidación y la paz y salvo.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: Ficha técnica cemento empleado - Cemex

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 28 de noviembre del 2023

CEDVO-140-2023

Recibido
28/11/23
4:40 PM
Tatiana S.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de corrección planos de montaje de anclajes

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la corrección de los planos de montaje de anclajes de pernos en los escenarios multipropósito.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 2 planos

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 29 de noviembre del 2023

CEDVO-141-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

RECIBIDO 30 NOV 2023
10:34 am
Tatiana Paz S.

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Intervención en la zona verde de la cancha de futbol.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito informar que, según programación de obra el 04 de diciembre daremos inicio con la construcción del cárcamo perimetral en la zona interna de la pista atlética, para ello es necesario intervenir la zona verde de la cancha de futbol. Como se aprecia en las siguientes imágenes:

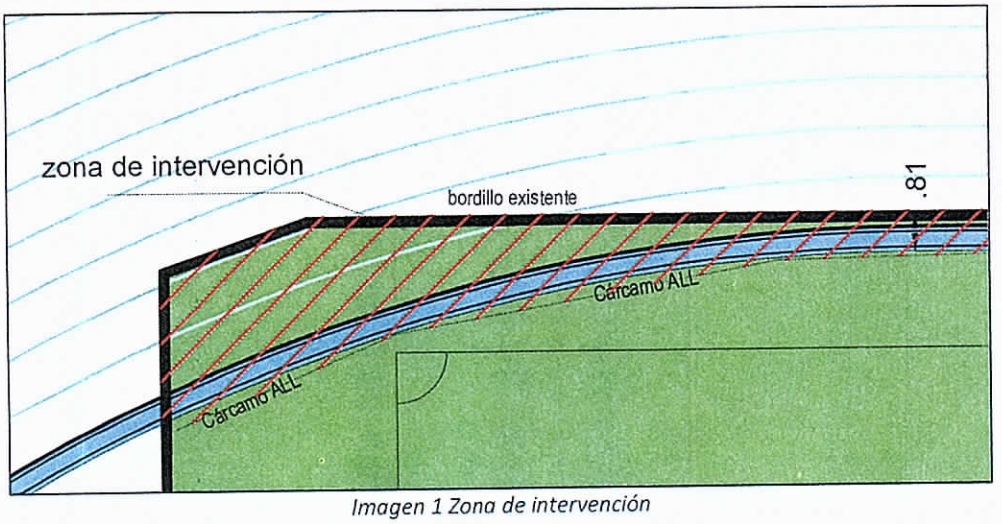


Imagen 1 Zona de intervención

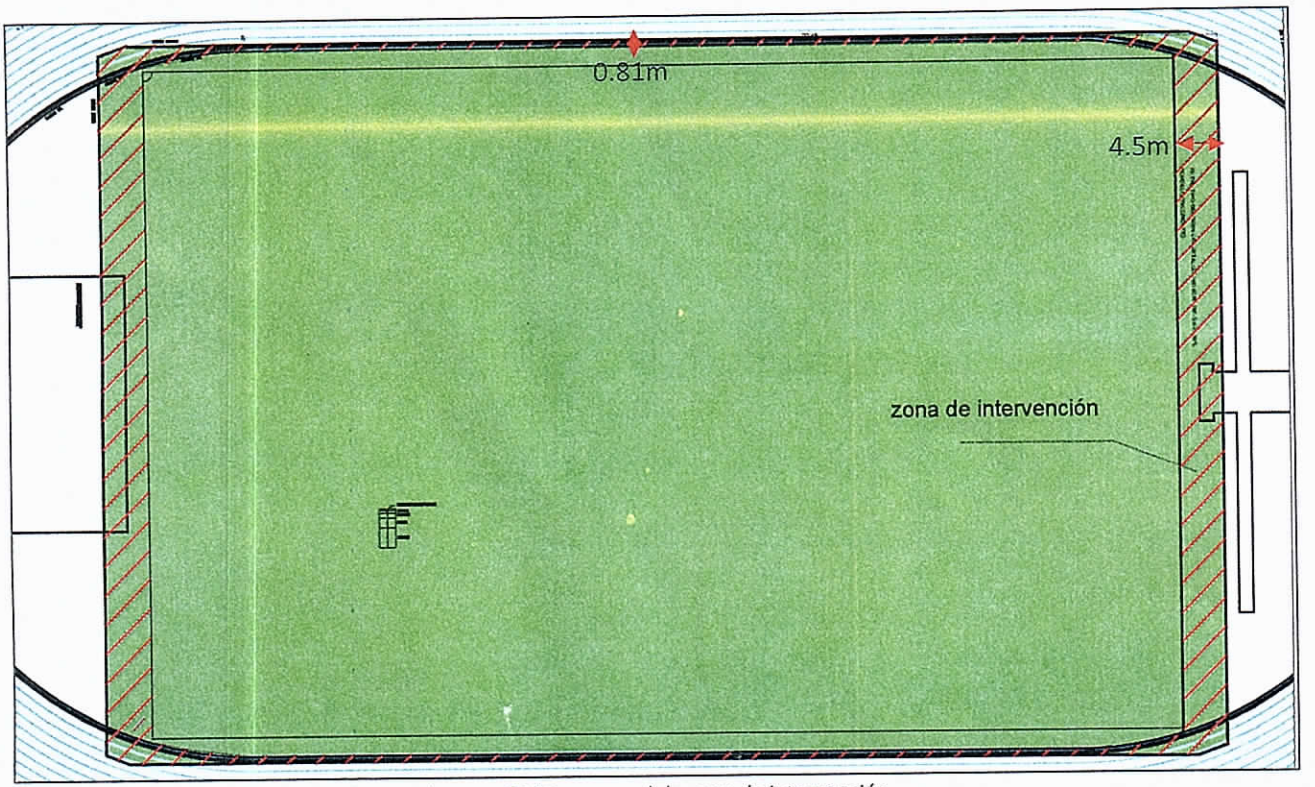


Imagen 2 Vista general de zona de intervención

La intervención que se realizará es para instalación de tuberías y cárcamo ALL.

Se solicita, dejar de usar el campo de futbol para evitar contratiempos.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 2 planos

13.020

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

13 021

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 7 de Noviembre del 2023

OF-C249 -2023-180

Recibido sin aceptación
07-Noviembre-2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación y pago de Orden de Giro No. 8 anticipo. Fiduciaria Alianza – Fideicomiso No. 113392.

1

Cordial saludo,

Una vez revisados y evaluados los soportes que se adjuntan en el Giro No. 8 Anticipo radicado el día 3 de Noviembre del 2023, se autoriza el REEMBOLSO de OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 86.126.323,00), los cuales se encuentran discriminados en el siguiente ítem:

- MATERIALES Y SUBCONTRATOS PARA PISTA DE ATLETISMO Y PISTA DE PATINAJE: OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 86.126.323,00), reembolso a ORGANIZACIÓN TERRACANTO S.A.S.

Destinados única y exclusivamente a la ejecución del contrato de obra No. 106 de 2023.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

13022

	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	
	AUTORIZACIÓN PAGO ORDEN DE GIRO	FID. 113392

CONTRATO N°	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

OBJETO CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL DEL	$ 50.871.940.842
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
NIT:	901.682.871-2
CORREO ELECTRÓNICO:	escenariosdeportivos2023@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS.
CORREO ELECTRÓNICO:	interescenariosc@gmail.com

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	ANTICIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR ORDEN DE GIRO 8	VALOR ACTUAL
1	2022005500094	$ 2.912.858.864	$ 2.314.654.428	$ 3.392.016	$ 2.311.262.413
2	2022005500022	$ 2.509.631.492	$ 534.555.419	$ 82.734.307	$ 451.821.111
3	2022005500024	$ 9.076.012.784	$ 453.800.639		$ 453.800.639
TOTAL		$ 14.498.503.139,60	$ 3.303.010.486,30	$ 86.126.323,00	$ 3.216.884.163,30

PLAN DE INVERSIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR SOLICITADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 579.940.126	$ 579.940.126		$ 579.940.126
2	Materiales y subcontratos de	$ 12.323.727.669	$ 2.035.836.293	$ 86.126.323,00	$ 1.949.709.970
3	Transporte	$ 1.449.850.314	$ 542.249.036		$ 542.249.036
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.030,60	$ 144.985.031		$ 144.985.031
TOTAL		$ 14.498.503.139,60	$ 3.303.010.486,30	$ 86.126.323,00	$ 3.216.884.163,30

VALOR A PAGAR: OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE

Los valores de la presente acta de autorización pago de orden de giro son aprobados el día 03 de noviembre de 2023.

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

13023

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 9 de Noviembre del 2023

OF-C249 -2023-181

Recibido sin aceptación
09 -Noviembre -2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación y pago de Orden de Giro No. 10 anticipo. Fiduciaria Alianza – Fideicomiso No. 113392.

1

Cordial saludo,

Una vez revisados y evaluados los soportes que se adjuntan en el Giro No. 10 Anticipo radicado el día 7 de Noviembre del 2023, se autoriza el REEMBOLSO de DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 200.790.003,00), los cuales se encuentran discriminados en el siguiente ítem:

- MANO DE OBRA PARA PISTA DE ATLETISMO, PISTA DE PATINAJE Y ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITOS: DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 200.790.003,00), reembolso a CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023.

Destinados única y exclusivamente a la ejecución del contrato de obra No. 106 de 2023.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

13 024

	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	
	AUTORIZACIÓN PAGO ORDEN DE GIRO	FID. 113392

CONTRATO N°	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

OBJETO CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL DEL	$ 50.871.940.842
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
NIT:	901.682.871-2
CORREO ELECTRÓNICO:	escenariosdeportivos2023@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS.
CORREO ELECTRÓNICO:	interescenariosc@gmail.com

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	ANTICIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR ORDEN DE GIRO 10	VALOR ACTUAL
1	2022005500094	$ 2.912.858.864	$ 2.282.133.824	$ 40.338.711,60	$ 2.241.795.113
2	2022005500022	$ 2.509.631.492	$ 426.724.796	$ 34.756.749,52	$ 391.968.047
3	2022005500024	$ 9.076.012.784	$ 363.040.511	$ 125.694.541,88	$ 237.345.970
TOTAL		$ 14.498.503.139,60	$ 3.071.899.131,90	$ 200.790.003,00	$ 2.871.109.128,90

PLAN DE INVERSIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR SOLICITADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 579.940.126,00	$ 579.940.125,58	$ 200.790.003,00	$ 379.150.122,58
2	Materiales y subcontratos de	$ 12.323.727.669,00	$ 1.949.709.970,36	$ -	$ 1.949.709.970,36
3	Transporte	$ 1.449.850.314,00	$ 542.249.035,96	$ -	$ 542.249.035,96
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.030,60	$ -	$ -	$ -
TOTAL		$ 14.498.503.139,60	$ 3.071.899.131,90	$ 200.790.003,00	$ 2.871.109.128,90

VALOR A PAGAR: DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRES PESOS MCTE

Los valores de la presente acta de autorización pago de orden de giro son aprobados el dia 09 de noviembre de 2023.

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

13025

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 10 de Noviembre del 2023

OF-C249 -2023-182

Recibido sin observación
10 Noviembre 2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Traslado oficio Federación Colombiana de Patinaje FPC 01 20231107000001

1

Cordial saludo,

Me permito realizar traslado de oficio FPC 01 20231107000001 entregado por la Federación Colombiana de Patinaje, en la cual se da asesoría técnica para el diseño y construcción escenario de patinaje de alto rendimiento.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

13.026

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE

Haciendo historia desde 1954

OFICIO SOLICITUD NORMATIVA ESCENARIOS DE PATINAJE -2023

VERSION8– NOVIEMBRE 2023

Bogotá, 07 de noviembre de 2023

FPC 01 20231107000001

ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PARA HOMOLOGACIÓN ESCENARIO DE PATINAJE PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

ASESORÍA TÉCNICA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DE PATINAJE DE ALTO RENDIMIENTO

Para: **Señor**
FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO
Director General
Instituto de Deporte y Recreación del Meta - IDERMETA
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META
Carrera 16 #24 – 03 Barrio Olimpico – Popular
6701469 – 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

De: **JORGE IVÁN ROLDAN PÉREZ**
Dependencia: AREA TÉCNICA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE

Asunto: Respuesta al oficio N° DG-100-412 del 11 de octubre de 2023 - SOLICITUD REVISIÓN CAMBIO DE GEOMETRIA PISTA DE RUTA.
En referencia al CONTRATO DE OBRA N°106 DE 2023 – "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

REVISIÓN BAJO NORMATIVA 2023 PARA AVAL DE PROYECTO EN SU ETAPA DE PLANIFICACION E INICIO DE EJECUCION DE OBRA PARA POSTERIOR **HOMOLOGACIÓN** DEL ESCENARIO – TEMA PUNTUAL NUEVA GEOMETRIA

Fecha ASESORÍA			*OBSERVACIONES*
DD	*/ MM /*	*AAAA*	
25	*10*	*2023*	*REVISIÓN SEGÚN OFICIO FECHADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (IDERMETA) EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2023 Y SE DARESPUESTA AL OFICIO SIN VISITA TECNICA Y SOBRE VALORACION EN PLANOS.*

WORLD SKATE

MINISTERIO DEL DEPORTE

WORLD SKATE

COLOMBIA

13.027

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE

Haciendo historia desde 1954

DATOS GENERALES		
NORMATIVA 2023 APLICABLE A:	01. PISTA DE CARRERAS Y ZONA CENTRAL	AN
	02. PISTA DE RUTA	X
	03. ZONA DE SERVICIOS	NA
CIUDAD	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META	
UBICACIÓN PUNTUAL	COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL CALLE LOMBANA – VILLA OLIMPICA	
ENTIDAD NORMATIVA	FEDEPATIN, WORLD SKATE AMERICA Y WORLD SKATE	
ETAPA DE PLANIFICACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA ESCENARIO NUEVO	ETAPA DE PLANIFICACIÓN - EJECUCIÓN DE ESCENARIOPARA COMPETENCIAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMACIÓN DEFINICION DE GEOMETRIA PISTA DE RUTA	

La Federación es un organismo deportivo de derecho privado, constituida como una asociación, sin ánimo de lucro, dotado de personería jurídica, que impulsa programas de interés público y social y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y tendrán a su cargo el manejo técnico y administrativo de su deporte y la representación internacional del mismo

El objeto de **La Federación Colombiana de Patinaje - FEDEPATIN** es fomentar, patrocinar y organizar lapráctica del deporte de Patinaje sobre ruedas y en hielo en sus diferentes modalidades deportivas, en las diferentes ramas y categorías, dentro del ámbito nacional, teniendo a su cargo el manejo técnico y administrativo y cumplir con las demás actividades reglamentadas en el presente estatuto y en las disposiciones legales e impulsar programas de interés público y social.

Al reglamentar la práctica del patinaje, La Federación en su campo técnico se ajustará a las normas internacionales que lo rigenpor parte de Las Federaciones Deportivas (World Skate WS, World Skate America WSA)

Dado lo anterior propender que las prácticas de estas actividades se hagan en escenarios que cumplan con la reglamentación y/o normativa vigente según su tipo, es aquí donde **FEDEPATIN** presta su asesoría técnica básica y recomienda los diferentes parámetros a tener en cuenta según sea su disciplina deportiva enfocada a la práctica del patinaje cuando esta requiere ser reglamentaria.

En la actualidad deportiva muchas ciudades y poblaciones son sedes de Campeonatos del mundo, Campeonatos Continentales y campeonatos Nacionales que tienen que ver con disciplinas deportivas de Patinaje, por lo que es importante la oportunidad de dejarle a la comunidad escenarios para prácticas de alto rendimiento y escuela que conlleve a tener nuevos deportistas y así aumente el número potencial de usuarios y aficionados a este gran deporte.

SOBRE EL DISEÑO DE ESCENARIOS DE PATINAJE

Después de evaluar en nuestro país los diferentes escenarios de patinaje, y la preocupación generada en su mayoría por el **NO** cumplimiento de la reglamentación oficial, **FEDEPATIN** a través de sus asesores técnicos externos, ha encontrado la necesidad sentida de establecer parámetros que materialicen el cumplimiento de la normalización de las pistas de carreras y ruta, y defina las necesidades que den soluciones óptimas para el servicio, confort y seguridad de los usuarios, sean estos deportistas o espectadores.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE

Haciendo historia desde 1954

Una vez revisada la solicitud realizada por usted vía email con oficio adjunto fechado el 11 de octubre de 2023 y realizada la revisión planimétrica por el arquitecto Alexander Salas asesor técnico externo autorizado por FEDEPATIN, el día 25 de octubre de 2023 y dado su interés en **LA ASESORÍA TÉCNICA** en la etapa de planificación de obra que permita a futuro **HOMOLOGAR** el escenario deportivo para competencias de orden nacional y continental, le informamos lo siguiente:

La presente consulta se centra en la **GEOMETRIA** de la pista de ruta según actualización planimetrica, para lo cual nos referiremos a la normativa vigente (2023) para este tema y la cual se enuncia a continuación:

PISTA DE RUTA (THE ROAD) DE 400 METROS

Recorrido de competición que se encuentra en una instalación al aire libre o en una instalación cubierta y presenta un circuito cerrado asimétrico donde los patinadores han de cubrirlo una o más veces de acuerdo a la distancia del evento

Circuito cerrado se acogen las disposiciones dictadas en la **General Regulations Edition 2018 - 2023** donde se enuncia que este tipo de pistas no podrán tener una longitud menor a 250 pero se recomienda tener una longitud de 400 metros o mayor, hasta 600 metros y que su ancho de pista no podrá ser inferior a 6metros, pero se recomienda que este ancho sea de ocho (8) metros, además se evaluaran por parte de **FEDEPATIN.** Parámetros de cumplimiento de geometría en curvas, pasamanos de protección, acabado y recubrimiento, solo se HOMOLOGARÁN aquellas pistas que cumplan con los parámetros de geometría establecidos por WORLD SKATE, WORLD SKATE AMERICA Y FEDEPATIN y cumplan con lo establecido en las fichas de HOMOLOGACIÓN. (ART 110.1 Y 111 COMISIÓN TÉCNICA DE PATINAJE DE VELOCIDAD - REGLAMENTO 2023)

Su medición se realizará según la normativa establecida por el WORLD SKATE Y WORLD SKATE AMERICA Y FEDEPATIN en la mitad del circuito cuando sólo una parte del ancho de la ruta pueda ser usado, el radio de curva mínimo no podrá ser inferior a los 18,00m. En rectas se conserva una pendiente del 1% en curvas el 1.5% hacia el interior de curva.

Se recomienda que en uno de sus costados pueda tener una recta de unos 110 metros como mínimo y que cumpla con los parámetros de peraltes mínimos, específico para la Carrera de 100 m sprint.

- Se demarcan tres (3) carriles de dos metros sesenta (2.60) m con líneas de cinco (5) cm. Las condiciones de carrera deben ser idénticas en cada uno de los carriles, en caso de no ser así, en los recorridos de menos de ocho (8) m de ancho, pueden demarcarse sólo dos (2) carriles.
- El patinador debe patinar en su carril. El patinador que toque la línea blanca se considera fuera de su carril (falta técnica) y será descalificado DSQ-TF.

En lo posible Los rectilíneos deben representar el 60 % del total del circuito, los desniveles nunca podrán exceder del 5%. Las excepciones a esta regla nunca deberán superar el 25% de toda la carrera.

Las curvas de todos los recorridos de competencia deben tener una delimitación natural o ser delimitadas con señales móviles que sean muy visibles. Estas señales no deben ser colocadas sobre el recorrido de lacompetencia, para evitar que constituyan un peligro para los patinadores.

Durante las carreras sólo los jueces y los patinadores estarán autorizados a estar en la carrera. Sólo los delegados y el equipo médico podrán entrar en la carrera cuando hayan sido autorizados por el Juez Árbitro. (Art.78.6 - COMISIÓN TÉCNICA DE PATINAJE DE VELOCIDAD - REGLAMENTO 2023)


La línea de meta debe estar marcada con una línea blanca de cinco (5) centímetros de ancho, debiendo noestar en una curva. La referencia para la llegada es el borde interior de esta línea. La foto-finish se colocaráen este borde interior de la línea de meta

La superficie de la ruta debe ser uniforme y suficientemente lisa, sin fallas ni fisuras. La curvatura transversal del recorrido no debe superar el 5% de su amplitud desde el punto interior del circuito hasta el exterior.

Se recomienda colocar pasamanos de protección en todo el perímetro exterior y en las zonas donde haya cambio de curvas o establecidas o que requieran protección especial. (Se evaluarán los puntos críticos y deser necesario se solicitara la instalación de esta protección donde sea necesario).

Se recomienda instalación de recubrimiento según especificaciones de FEDEPATIN.

PLANO DE JUSTIFICACION

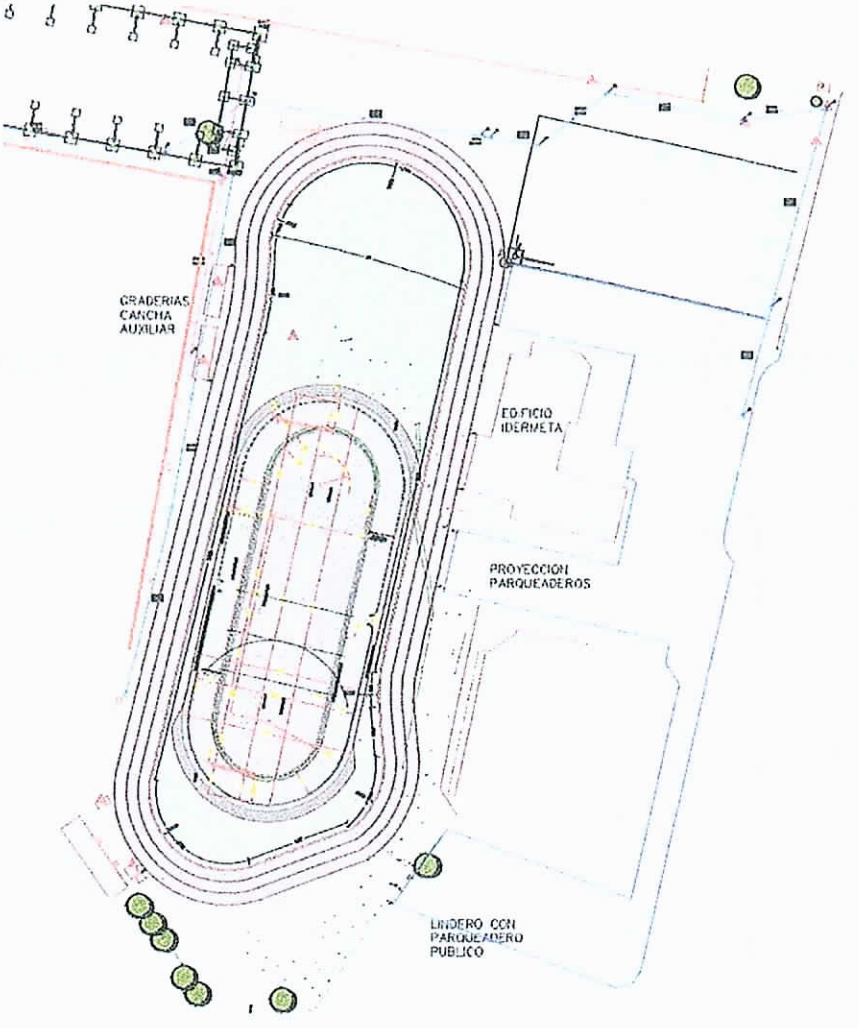

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
PATINAJE
Haciendo historia desde 1954


GEOMETRIA DE LA PISTA RUTA

TIPO DE PISTA	ANCHO	Numero de curvas	RADIO (interior) DE CURVA mínima	Longitud de medida entre
VERSION 2023	No menor a 6 metros, se recomienda 8 metros	variable	Superior a 18,00m.	No debe ser menor a 250 metros, se recomienda entre 400 a 600 metros

INTERIOR DE PISTAS en la superficie que queda al interior de la pista de ruta para la versión 2023 se recomienda que estas sean destinadas para actividades acordes al patinaje, sin que esto incida en la homologación del escenario. (Se revisarán parámetros técnicos) Dichas actividades deberán permitir la visual al interior de toda la pista sin crear obstáculos, no se permitirán elementos construidos al interior conotras actividades deportivas ajenas al patinaje y que se conviertan en barrera visual, si esto se diera será causal para NO HOMOLOGAR el escenario.

CONCLUSIONES ANALISIS DE PISTA DE RUTA

Revisando los ajustes realizados a la geometría al proyecto inicial, lo anterior debido a intervenciones físicas realizadas en el complejo deportivo, encontramos los siguiente en el nuevo trazado presentado:

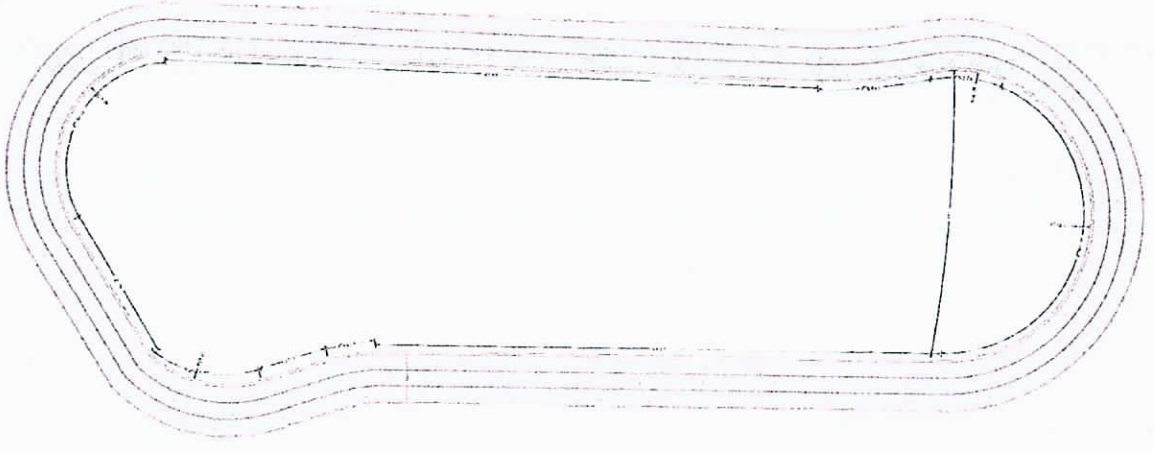


Como se aprecia en la imagen (Plano de proyecto actualizado por IDERMETA, encontramos una PISTA DE RUTA, cuyo trazado y geometría es analizado bajo normativa 2023, estableciendo que esta presenta una longitud de 406.10 metros medidos a línea de borde y de 431.24 metros a centro de pista, CUMPLIENDO ASI con normativa lo cual permite estar en rango entre 250 y 600 metros, así mismo cumple en su ancho de 8 metros.

En cuanto a curvas tenemos cinco (5), tres (3) cerradas y dos (2) contracurvas las cuales una vez analizadas cumplen con normativa al tener radios superiores a 18 metros.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
PATINAJE
Haciendo historia desde 1954

Siendo este un escenario nuevo **LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE** informa

FEDEPATIN luego de analizadas las condicionantes planteadas por el municipio, y los cambios presentados a la geometría de pista de Ruta, se **APRUEBA** el trazado en los planos presentados, los cuales pueden ser utilizados para el trazado de la pista formal y serán la referencia geométrica para su correcta construcción.

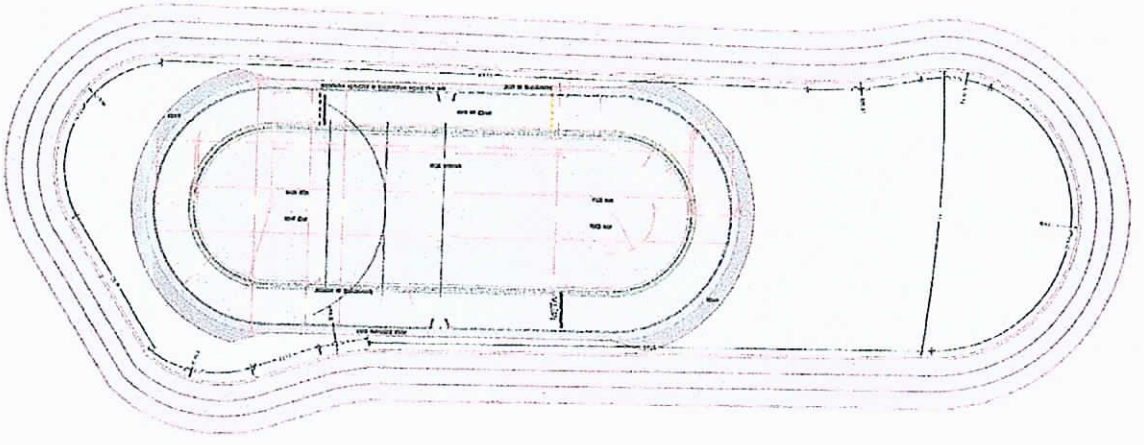

Cabe anotar que, para **HOMOLOGAR** el escenario, no solo se revisa su geometría, también deberá cumplir con aspectos técnicos como peraltes mínimos, evacuación de aguas y aspectos de seguridad (Pasamanos y recubrimientos en pista entre otros) planteados en la normativa 2023 y que no fueron revisados por no contar con la información completa.

Desde lo urbano se recomienda a futuro destinar el lote adjunto por el costado occidental para que el escenario pueda contar con una zona de servicios básicos (graderías, camerinos, w.c. públicos, zonas de ventas, etc), lo cual debido a la calidad en sus pistas de alto rendimiento y escuela, hace que en la actualidad estas no puedan ser aprovechadas al máximo para eventos masivos.

ASESORIA TECNICA PARA SEGUIMIENTO EN LA ETAPA DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO A OBRA PARA LA HOMOLOGACION

Es en este punto donde es importante la recomendación de tener el acompañamiento constante por parte de un técnico conocedor y con experiencia en este tipo de escenarios, durante la etapa de planificación y en su etapa de ejecución, aspecto que deriva a tener las pistas (carreras, central y Ruta) y zonas de servicio, avaladas para iniciar de requerirse el trámite de HOMOLOGACION ante la FEDEPATIN para Colombia, Esto facilitara detectar posibles errores a tiempo y dará agilidad en procesos constructivos que eviten reprocesos que pueden afectar la programación de obra y los tiempos de entrega.
(Los costos de asesoría técnica, visitas técnicas serán determinados a criterio de las partes y el costo de homologación será determinado por FEDEPATIN según tarifa anual)

Para FEDEPATIN es muy importante que los escenarios cumplan con las especificaciones y reglamentación para su construcción y que permitan ser homologados bajo los parámetros de calidad y

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
PATINAJE
Haciendo historia desde 1954

confort, tanto para el deportista como para el usuario espectador, por lo que es de estricto control y seguimiento los componentes de geometría, seguridad y velocidad que definen que un escenario de este tipo sea apto para competencias de alto rendimiento de tipo Mundial, nacional y escuela.

El concepto en el presente oficio está enfocado solo en aspectos de **GEOMETRIA DE LA PISTA DE RUTA** del escenario de patinaje y su concepto positivo de viabilidad se da como respuesta al email presentado por la administración municipal con su adjunto PDF N° DG-100-412 del 11 de octubre de 2023

Este escenario de requerirse podrá ser **HOMOLOGADO**, Una vez cumpla con aspectos técnicos y de especificaciones lo cual quedará formalizado mediante documento escrito firmado por el presidente ejecutivo, basado en las fichas y cumplimiento de las normas establecidas.

JORGE IVÁN ROLDAN PÉREZ
AREA TECNICA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE
gerenciadeportiva@fedepatin.org.co

ASESORÍA TÉCNICA EXTERNA RECOMENDADA POR FEDEPATIN
Arquitecto JOHN ALEXANDER SALAS MORALES
Celular y WhatsApp (+57) 3168338314 o 3177552088 Medellín
E-mail: alexpatin16@yahoo.com

INFORMACION BASADA EN LA SPEED TECHNICAL COMMISSION RULEBOOK 2023
FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE

13.033

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 10 de Noviembre del 2023

OF-C249 -2023-183

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

Recibido Sin aceptación
10 Noviembre 2023

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación y pago de Orden de Giro No. 09 anticipo. Fiduciaria Alianza – Fideicomiso No. 113392.

Cordial saludo,

1

Una vez revisados y evaluados los soportes que se adjuntan en el Giro No. 9 Anticipo radicado el día 7 de Noviembre del 2023, se autoriza el REEMBOLSO de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 144.985.031,40), los cuales se encuentran discriminados en el siguiente ítem:

- ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PISTA DE ATLETISMO, PISTA DE PATINAJE Y ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITOS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 144.985.031,40), reembolso a COMERCIALIZADORA LEON P SAS.

Destinados única y exclusivamente a la ejecución del contrato de obra No. 106 de 2023.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

13034

	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	
	AUTORIZACIÓN PAGO ORDEN DE GIRO	FID. 113392

CONTRATO N°	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

OBJETO CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL DEL	$ -
VALOR ADICIONAL:	$ 50.871.940.842
VALOR TOTAL DEL	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
NIT:	901.682.871-2
CORREO ELECTRÓNICO:	escenariosdeportivos2023@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS.
CORREO ELECTRÓNICO:	interescenariosc@gmail.com

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	ANTICIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR ORDEN DE GIRO 9	VALOR ACTUAL
1	2022005500094	$ 2.912.858.864	$ 2.311.262.413	$ 29.128.588,64	$ 2.282.133.824
2	2022005500022	$ 2.509.631.492	$ 451.821.111	$ 25.096.314,92	$ 426.724.796
3	2022005500024	$ 9.076.012.784	$ 453.800.639	$ 90.760.127,83	$ 363.040.511
TOTAL		$ 14.498.503.139,60	$ 3.216.884.163,30	$ 144.985.031,40	$ 3.071.899.131,90

PLAN DE INVERSIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR SOLICITADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 579.940.126,00	$ 579.940.125,58		$ 579.940.125,58
2	Materiales y subcontratos de	$ 12.323.727.669,00	$ 1.949.709.970,36		$ 1.949.709.970,36
3	Transporte	$ 1.449.850.314,00	$ 542.249.035,96		$ 542.249.035,96
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.030,60	$ 144.985.031,40	$ 144.985.031,40	$ -
TOTAL		$ 14.498.503.139,60	$ 3.216.884.163,30	$ 144.985.031,40	$ 3.071.899.131,90

VALOR A PAGAR: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE

Los valores de la presente acta de autorización pago de orden de giro son aprobados el día 07 de noviembre de 2023.

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERESCENARIOS

13.035

Villavicencio, 14 de Noviembre del 2023

OF-C249 -2023-184

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación y pago de Orden de Giro No. 11 anticipo. Fiduciaria Alianza – Fideicomiso No. 113392.

Cordial saludo,

1

Una vez revisados y evaluados los soportes que se adjuntan en el Giro No. 11 Anticipo radicado el día 10 de Noviembre del 2023, se autoriza el REEMBOLSO de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 36.132.107,00), los cuales se encuentran discriminados en el siguiente ítem:

- MANO DE OBRA PARA PISTA DE ATLETISMO, PISTA DE PATINAJE Y ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITOS: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 36.132.107,00), reembolso a ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS.

Destinados única y exclusivamente a la ejecución del contrato de obra No. 106 de 2023.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Recibí
14/11/23

13 036

	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	
	AUTORIZACIÓN PAGO ORDEN DE GIRO	FID. 113392

CONTRATO N°	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

OBJETO CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL DEL	$
VALOR ADICIONAL:	$ 50.871.940.842
VALOR TOTAL DEL	$ -
OBJETO PROYECTO:	50.871.940.842
	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094
	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
NIT:	901.682.871-2
CORREO ELECTRÓNICO:	escenariosdeportivos2023@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS.
CORREO ELECTRÓNICO:	interescenariosc@gmail.com

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	ANTICIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR ORDEN DE GIRO 11	VALOR ACTUAL
1	2022005500094	$ 2.912.858.864	$ 2.241.795.113	$ 10.123.000,00	$ 2.231.672.113
2	2022005500022	$ 2.509.631.492	$ 391.968.047	$ 6.119.640,00	$ 385.848.407
3	2022005500024	$ 9.076.012.784	$ 237.345.970	$ 19.889.467,00	$ 217.456.503
TOTAL		$ 14.498.503.139,60	$ 2.871.109.129,70	$ 36.132.107,00	$ 2.834.977.022,70

PLAN DE INVERSIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR SOLICITADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 579.940.126,00	$ 379.150.123,00	$ 36.132.107,00	$ 343.018.016,00
2	Materiales y subcontratos de	$ 12.323.727.669,00	$ 1.949.709.970,70	$ -	$ 1.949.709.970,70
3	Transporte	$ 1.449.850.314,00	$ 542.249.036,00	$ -	$ 542.249.036,00
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.030,60	$ 0,00	$ -	$ 0,00
TOTAL		$ 14.498.503.139,60	$ 2.871.109.129,70	$ 36.132.107,00	$ 2.834.977.022,70

VALOR A PAGAR: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS MCTE

Los valores de la presente acta de autorización pago de orden de giro son aprobados el día 13 de noviembre de 2023.

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERESCENARIOS

13037

Villavicencio, 14 de Noviembre del 2023

OF-C249 -2023-185

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación reprogramación Plan de Inversión del Anticipo

Cordial saludo,

1

De manera respetuosa me permito aprobar la reprogramación del plan de inversión del anticipo radicada el día 07 de Noviembre del 2023.

Se anexa formato GES-FO-145 Plan de Inversión y autorización pago anticipo obra firmado por Contratista de Obra e Interventoría.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Recibí
14/11/23

C.C. INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META

13 038

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-145
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	PLAN DE INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN PAGO ANTICIPO OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

OBJETO CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842,00
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842,00
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094 CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
NIT:	901.682.871-2
CORREO ELECTRÓNICO:	escenariosdeportivos2023@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS.
CORREO ELECTRÓNICO:	interescenariosc@gmail.com
SUPERVISOR:	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/a

VIGENCIA INICIAL

TIEMPO DE EJECUCIÓN	Meses	12	Dias	0
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de mayo de 2023			
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024			

VIGENCIA ACTUAL

TIEMPO DE EJECUCIÓN	Meses	12	Dias	0
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024			

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	2022005500094	$ 10.220.557.418		$ 10.220.557.418,00
2	2022005500022	$ 8.805.724.533		$ 8.805.724.533,00
3	2022005500024	$ 31.845.658.891		$ 31.845.658.891,00
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$ 50.871.940.842,00

REGISTROS PRESUPUESTALES

Los registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

RP IDERMETA N°	SPGR No.	FECHA	RUBRO	VALOR
337	5623	7/03/2023	00AD.4302.1604.2022.00550.0024	$ 31.521.667.843,00
338	5723	7/03/2023	00AD.4302.1604.2022.00550.0024	$ 323.991.048,00
339	5923	7/03/2023	00AD.4302.1604.2022.00550.0094	$ 9.986.380.420,00
340	6023	7/03/2023	00AD.4302.1604.2022.00550.0094	$ 234.176.998,00
341	5823	7/03/2023	00AD.4302.1604.2022.00550.0022	$ 8.805.724.533,00

13039

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-145
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	PLAN DE INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN PAGO ANTICIPO OBRA	Versión: 02

ESTADO DE CONTRATO Y PÓLIZAS Describa las pólizas actualizadas con el último acto administrativo celebrado.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA N°	VIGENCIA		FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	Cumplimiento del contrato	SGPL-81241317-1	10/05/2023	9/09/2024	17 de mayo de 2023	$ 10.174.388.168,40
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	Buen manejo y correcta inversion del anticipo	SGPL-81241317-1	10/05/2023	9/09/2024	17 de mayo de 2023	$ 15.261.582.252,60
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indenizaciones laborales	SGPL-81241317-1	10/05/2023	9/05/2027	17 de mayo de 2023	$ 2.543.597.042,10
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	Estabilidad y calidad de las obras	SGPL-81241317-1	9/05/2024	9/05/2029	17 de mayo de 2023	$ 15.261.582.252,60
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	RCE - Predios, labores y operaciones	LBCO-81327904-1	10/05/2023	9/05/2024	17 de mayo de 2023	$ 2.543.597.042,10

ANTICIPO Seleccione (X) el anticipo a tramitar.

VALOR ANTICIPO RECURSOS INICIALES:	X	$	15.261.582.252,60
DESCUENTOS(-)		$	763.079.113,00
GIRO NETO A LA FIDUCIA		$	14.498.503.139,60

PLAN DE INVERSIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	%
1	Mano de obra	$ 579.940.125,58	4%
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 12.865.976.704,29	85%
3	Transporte	$ 907.601.278,33	10%
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.031,40	1%
	TOTAL	$ 14.498.503.139,60	100%

VALOR A PAGAR: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS Y SESENTA CENTAVOS(14.498.503.139,60)

Nota: 1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor liquido del anticipo
Nota 2. El descuento practicado al anticipo corresponde al Fonsec
Los valores del presente plan de inversión de anticipo son aprobados y autorizados para el pago el dia 11 de mayo de 2023

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 278207-T

Firma
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 175215-T

Anexar: Copia de Tarjeta profesional y Vigencia de la Tarjeta Profesional de los contadores respectivamente.

13.040

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAMIRO ANDRÉS BARRAGAN BETANCOURT** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121930422 de VILLAVICENCIO (META) y Tarjeta Profesional No 278207-T SI tiene vigente su Inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****

EL CONTADOR PUBLICO NO SE CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VALIDO UNICAMENTE PARA PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLE OLIMPICA 2023
NIT 901.682.871

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

278207-T

RAMIRO ANDRÉS
BARRAGAN BETANCOURT
C.C. 1121930422
RES. INSCRIPCION 173 DEL 23/02/2021
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

300320 313942

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4453 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 49 Of 301 en Bogotá D.C

1304

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

175215-T



LEIDY CAROLINA
BETANCOURT BETANCOURT
C.C. 1121852769
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186698

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA USO DEL
CONSORCIO INTERESCENARIOS,
NIT. 901680672-4
NOVIEMBRE DE 2023

104243

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 06 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideas.com

13042

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

8 7 B 7 9 A 9 F 1 A 9 9 C D 1 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121852769 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 175215-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

13093

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 17 de Noviembre del 2023

OF-C249 -2023-187

Recibido sin observación
17 noviembre 2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación y pago de Orden de Giro No. 12 anticipo. Fiduciaria Alianza – Fideicomiso No. 113392.

Cordial saludo,

Una vez revisados y evaluados los soportes que se adjuntan en el Giro No. 12 Anticipo radicado el día 15 de Noviembre del 2023, se autoriza el REEMBOLSO de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 241.751.169,00), los cuales se encuentran discriminados en el siguiente ítem:

- MANO DE OBRA PARA PISTA DE ATLETISMO Y PISTA DE PATINAJE: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 241.751.169,00) reembolso a CIVIDEPORTES SAS.

Destinados única y exclusivamente a la ejecución del contrato de obra No. 106 de 2023.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

13.044

CONSORCIO INTERESCENARIOS

OF-C249 -2023-189

Villavicencio, 21 de noviembre del 2023

Recibo Jenssy Parra
24 Noviembre 2023
Hora 2:46 Pm

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. JHON HENRY ORTIZ GARCÍA, Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023. "interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de los escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio, departamento del Meta"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023. "construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio, departamento del Meta"

ASUNTO: RESPUESTA CORREO ELECTRONICO DE FECHA LUNES 20 DE NOVIEMBRE, 09:33 AM

Respetados señores,

1

La presente es con el fin de dar respuesta al correo del asunto en el cual ponen en conocimiento la problemática vivida el día de ayer 2023, por unas actividades realizadas por IDERMETA de fútbol infantil dentro del área de trabajo, las cuales no fueron informadas previamente al CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023.

Por lo tanto y aclarando que lo anterior tampoco fue socializado con la presente interventoría y que entendemos los percances a nivel de programación y responsabilidad extracontractual por posible daño a terceros que ocasionan este tipo de imprevistos.

Solicitamos se sirvan realizar y entregar un reporte detallado donde se valoren sus posibles pérdidas económicas y evidencien los riesgos y responsabilidades que afectaron a su juicio el desarrollo del presente contrato.

Sin otro particular y a esperas de su pronta respuesta.

Atentamente:

Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. Consorcio Interescenarios

13 045

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 23 de noviembre del 2023

OF-C249 -2023-190

Recibio Jenny Para
24 Noviembre 2023
Hora 2:46 Pm

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: REITERACION DEL INFORME DE GERENCIA DE PROYECTOS

Cordial saludo,

1

Me permito reiterar la solicitud pendiente con respecto al Informe de Gerencia de Proyectos correspondiente al contrato que, hasta la fecha, no hemos recibido por parte de su equipo.

En relación con la propuesta presentada por el CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023 durante el proceso de licitación para el contrato de obra, se recuerda el compromiso explicitado a través del formato **7A-Gerencia de Proyectos**. En dicho documento, el contratista afirmó, bajo juramento, su responsabilidad de implementar, por cuenta propia y asumiendo los riesgos inherentes, un programa integral de Gerencia de Proyectos.

Este compromiso se estableció con el propósito expreso de garantizar la efectiva y eficiente ejecución del alcance y objetivos contemplados en el contrato. Como parte fundamental de esta disposición, se estipuló que el contratista debería contar con un profesional especializado en áreas de ingeniería o arquitectura, cuyas competencias se ajusten a los requerimientos y estándares establecidos por nuestra entidad.

Hasta la presente fecha, no hemos recibido el Informe de Gerencia de Proyectos comprometido en su propuesta. Este documento es de vital importancia para el seguimiento y control del progreso del proyecto, así como para asegurar la alineación con los plazos y la efectividad en la gestión previamente convenida.

Por tanto, le instamos a tomar las medidas pertinentes para la pronta presentación de este informe.

En concordancia con los requerimientos anteriores, se reitera la solicitud al Contratista de Obra

CONSORCIO INTERESCENARIOS

para la presentación mensual del informe de Gerencia de Proyectos. Hasta la fecha, dicho informe correspondiente al mes **No. 1** no ha sido recibido, Aun cuando fue solicitado por la interventoría en múltiples ocasiones.

Los oficios emitidos con los números **OF-C249 -2023-039** del **26 de mayo** del 2023, **OF-C249 -2023-061** del **13 de junio** del 2023, **OF-C249 -2023-085** del **06 de Julio** del 2023, **OF-C249 -2023-132** del **31 de agosto** del 2023 y **OF-C249 -2023-146** radicado el **14 de septiembre** del 2023 han sido las instancias en las cuales se ha requerido la entrega de este informe mensual, se anexan dichos oficios mencionados.

Cabe resaltar que el no cumplimiento de un compromiso ofertado en el proceso licitatorio resulta en un incumplimiento contractual por parte del contratista.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: interescenariosc@gmail.com

13 047

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 23 de noviembre del 2023

OF-C249 -2023-191

Recibio Jenny Parra
24 Noviembre 2023
Hora: 2:44 pm

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: SOLICITUD DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

1

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el suministro regular de los seguimientos mensuales concernientes al programa de seguridad industrial y salud ocupacional, tal y como fue acordado y establecido en nuestras reuniones anteriores. Es fundamental recordar que se acordó específicamente la entrega de estos informes de manera mensual, iniciando desde el mes de mayo y prosiguiendo a lo largo del período de ejecución del contrato.

Destacamos la importancia de este seguimiento continuo, por lo que agradecemos su compromiso en proporcionar estos informes de forma regular y oportuna.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta y entrega de los informes requeridos. Agradecemos de antemano su pronta atención y disposición para cumplir con esta solicitud.

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional o aclaración que puedan requerir.

Atentamente,

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

13.048

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 30 de noviembre del 2023

OF-C249 -2023-194

30 Noviembre 2023
Hora 4:27 Pm

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: REITERACION SOLICITUD DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

Cordial saludo,

1

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el suministro regular de los seguimientos mensuales concernientes al programa de seguridad industrial y salud ocupacional, tal y como fue acordado y establecido en nuestras reuniones anteriores. Es fundamental recordar que se acordó específicamente la entrega de estos informes de manera mensual, iniciando desde el mes de mayo y prosiguiendo a lo largo del período de ejecución del contrato.

Destacamos la importancia de este seguimiento continuo, por lo que agradecemos su compromiso en proporcionar estos informes de forma regular y oportuna.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta y entrega de los informes requeridos.

Agradecemos de antemano su pronta atención y disposición para cumplir con esta solicitud.

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional o aclaración que puedan requerir.

Atentamente,

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

C.C. **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA**
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN

CONSORCIO INTERESCENARIOS

13049

Villavicencio, 30 de noviembre del 2023

OF-C249 -2023-195

30 Noviembre 2023
Hora 4:26 Pm

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: REITERACION DEL INFORME DE GERENCIA DE PROYECTOS

Cordial saludo,

1

Me permito reiterar la solicitud pendiente con respecto al Informe de Gerencia de Proyectos correspondiente al contrato que, hasta la fecha, no hemos recibido por parte de su equipo.

En relación con la propuesta presentada por el CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023 durante el proceso de licitación para el contrato de obra, se recuerda el compromiso explicitado a través del formato **7A-Gerencia de Proyectos**. En dicho documento, el contratista afirmó, bajo juramento, su responsabilidad de implementar, por cuenta propia y asumiendo los riesgos inherentes, un programa integral de Gerencia de Proyectos.

Este compromiso se estableció con el propósito expreso de garantizar la efectiva y eficiente ejecución del alcance y objetivos contemplados en el contrato. Como parte fundamental de esta disposición, se estipuló que el contratista debería contar con un profesional especializado en áreas de ingeniería o arquitectura, cuyas competencias se ajusten a los requerimientos y estándares establecidos por nuestra entidad.

Hasta la presente fecha, no hemos recibido el Informe de Gerencia de Proyectos comprometido en su propuesta. Este documento es de vital importancia para el seguimiento y control del progreso del proyecto, así como para asegurar la alineación con los plazos y la efectividad en la gestión previamente convenida.

Por tanto, le instamos a tomar las medidas pertinentes para la pronta presentación de este informe.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

13050

En concordancia con los requerimientos anteriores, se reitera la solicitud al Contratista de Obra para la presentación mensual del informe de Gerencia de Proyectos. Hasta la fecha, dicho informe correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre no han sido recibidos.

Los oficios emitidos con los números **OF-C249 -2023-039** del **26 de mayo** del 2023, **OF-C249 -2023-061** del **13 de junio** del 2023, **OF-C249 -2023-085** del **06 de Julio** del 2023, **OF-C249 -2023-132** del **31 de agosto** del 2023, **OF-C249 -2023-146** radicado el **14 de septiembre** del 2023 y **OF-C249 -2023-190** radicado el **24 de Noviembre** del 2023, han sido las instancias en las cuales se ha requerido la entrega de este informe mensual, se anexan dichos oficios mencionados.

Cabe resaltar que el no cumplimiento de un compromiso ofertado en el proceso licitatorio resulta en un incumplimiento contractual por parte del contratista.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

2

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

C.C. **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA**
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN

13051

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

ACTAS DE COMITE

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

13052

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

NO SE REALIZARON ACTAS DE COMITÉ PARA LA PRESENTE FECHA DEL INFORME
