INFORME MENSUAL N°3

CONVENIO No. 3967 DE 2023: "Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.".

PERIODO: 1 al 31 de marzo de 2024



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4870 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, EN LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Ocaña, marzo de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3967 **Contratista:** JAC de la vereda Boca de la Cienaga

Contrato de Interventoría No. 4870 del 2023 **Interventoría:** Ingenius Solutions S.A.S

Objeto Contrato de Obra: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** Marzo de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	15
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	16
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7
2.4	Características técnicas del proyecto		7
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		8
3.1	Información general del contrato		8
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		8
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		8
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		8
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		9
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	33
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	9
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	9
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	9
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	9
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	9
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	9
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	9
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		9
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		10
5.1	Información general del contrato		10
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		10
5.3	Informes especialistas y profesionales		11
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		11
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		11
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	11
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	11
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	11
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	11
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	11
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		11
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	11
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	11
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	11
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	11
7	**Conclusiones y recomendaciones**		12
8	**Anexos**		13
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		13
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		13
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		13

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: Elias Jaimes Fernandez

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 5
2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 5
2.4 Características Técnicas del Proyecto 6
3. Información convenio solidario. 7
3.1 Información General del convenio 7
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 7
3.3 Seguimiento ítems no previstos 7
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 8
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 8
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 8
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 8
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 8
4.4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio 8
4.5 Estado General del Tiempo 8
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 8
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 9
4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 9
4.10 Otros documentos seguimiento mensual: 9
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
5.1 Información general del contrato 9
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 10
5.3 Informes especialistas 10
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 10
5.5 Información otros programas y aplicativo 10
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 10
6.1 Equipo Contrato de Interventoría 10
6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 10
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 10
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 10
6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 10
6.7 Otros documentos seguimiento mensual 10

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11
8. ANEXOS 12
8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 12
8.2. Registro fotográfico 12
8.3. Bitácora del mes correspondiente: 12

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Anexo 4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

Anexo 5 Estado General del Tiempo

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Anexo 8 Informe Semanal

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total destinó recursos para el desarrollo del programa que ejecutan los organismos y/o juntas de acción comunal dentro del marco de la ley.

Es importante el desarrollo vial y la comunicación con municipios y ciudades de las comunidades rurales para su avance y mejoramiento en materia de movilidad, estas comunidades logran un desarrollo para sus habitantes en la medida que avanza su infraestructura vial.

Es así que la implementación de la estabilización de vías terciarias por medio de gaviones juega un papel importante en el estado y conservación de las vías de esta vereda lo que genera confianza y seguridad para los transeúnte y paso vehicular por el corredor vial.

En el siguiente informe se encuentra toda la información concerniente en cuanto al ámbito administrativo, técnico, financiero y la información que permite conocer el estado y avance del convenio solidario del mes de marzo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Bolívar, en la zona rural del Municipio de Morales, en el corregimiento de la Boca de la Ciénaga, en la vía central del corregimiento.

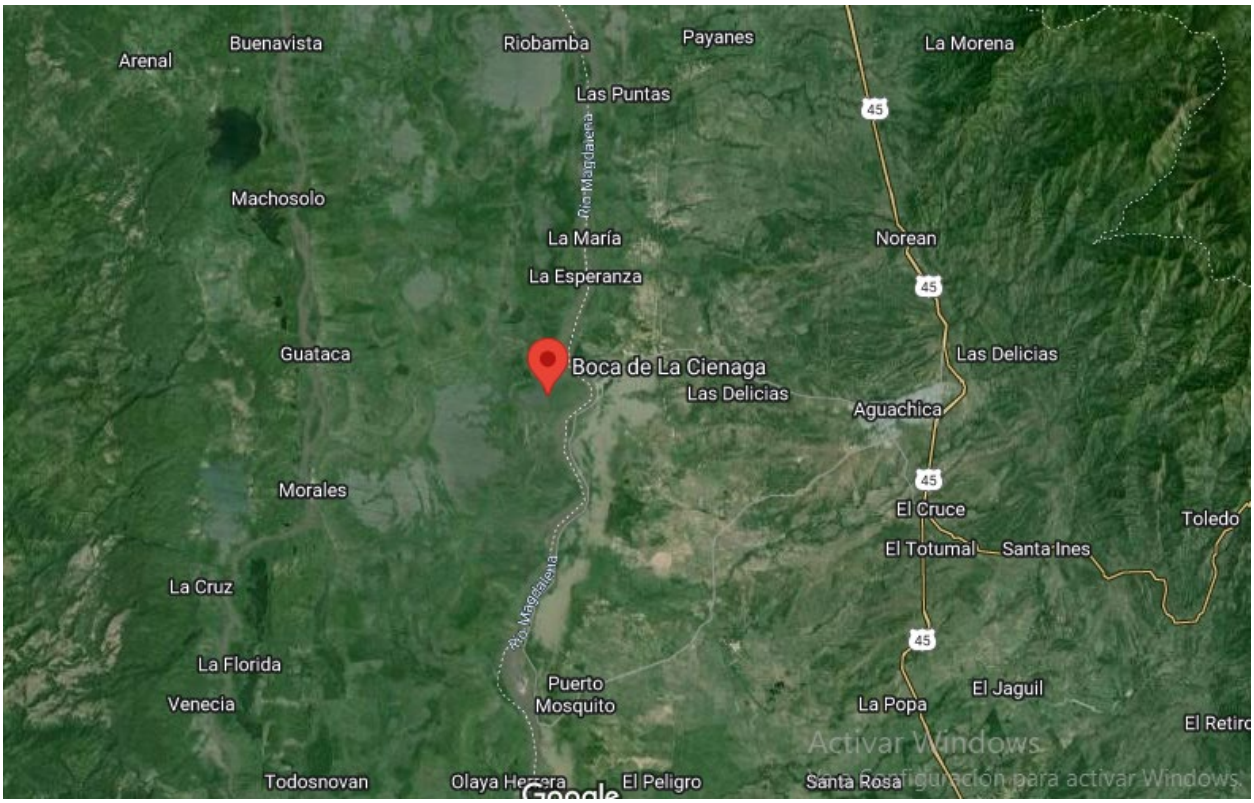



***Figura 1**. Localización de la vereda Boca de la Ciénega*

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto objeto del convenio de referencia se ejecuta en la vereda Boca de la Ciénega, zona rural del municipio de Morales, Bolívar. De su ejecución se beneficia la población de esta vereda directamente, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El corredor vial a intervenir se encuentra en la intersección de la vereda Boca de la Ciénaga, esta es una vía terciara destapada que requiere intervención, mantenimiento y estabilización de algunos sitios críticos ya que la socavación por parte del río ha generado que se desestabilice el corredor vial.

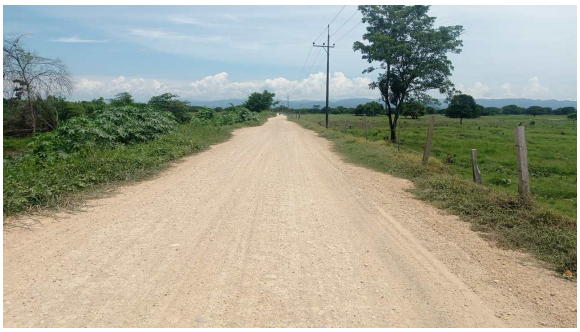	
Estado Inicial de la vía 15-01-2024	Estado inicial de la vía 15-01-2024

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El presento convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento vial del corredor a intervenir para que garantice una circulación continua y eficaz para el transporte de propios y visitantes de la región.

- Construcción de muro en gaviones de malla de alambre de acero y dren horizontal
- Construcción de alcantarilla en concreto reforzado

3. Información convenio solidario.

3.1 Información General del convenio

CONVENIO No.	3967 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JAC DE LA VEREDA BOCA DE LA CIÉNAGA
FECHA DE INICIACIÓN	18/12/2023
FECHA DE TERMINACION INCIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CINCO (0.5) MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 202.970.546,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 202.970.546,00 INCLUIDO IVA

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Las actividades de obra tienen inicio la primera semana de marzo, donde se efectúa excavación mecánica de acuerdo a previo replanteo topográfico en campo, actividad que tiene duración de 4 días, posteriormente se inicia la instalación del solado de limpieza y el armado de los gaviones con el tendido del correspondiente del geotextil, dicha actividad se efectúa de manera reiterada hasta finalizar el mes de marzo.

Durante el periodo comprendido durante todo el mes de marzo, se llevaron a cabo los ajustes a estudios y diseños de acuerdo a lo comprendido en el contrato, de igual manera se adelantan actividades administrativas como lo son la autorización de pago mediante cheque para cubrir costos de materiales de construcción: agregados pétreos y materiales de ferretería, medidas ambientales y dotación, exámenes médicos de ingreso y el cobro de retención en la fuente para la DIAN.

Se efectúa gestión documental del proyecto como es la conformación de la veeduría ciudadana, así como también se llevó a cabo comité operativo de manera presencial y virtual con el fin de dar claridad en el avance financiero y físico del proyecto, además de establecer las funciones y alcance de las veedurías con el fin de dar continuidad y finalización al convenio en felices términos.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

Con los ajustes a estudios y diseños se establece un Ítem NO previsto, denominado “Material Granular Drenante” con código de pago 673.2, este queda aprobado por la interventoría y será contemplado en la programación de obra que debe presentar el contratista para poder dar inicio a obra. Dicho ítem no se ejecuta durante el periodo de evaluación, por lo que no se registran cantidades de obra de este.

ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS No. 1							
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
673.2		Material Granular Drenante	M3	33	$ 131.398,00	$ 4.336.134,00	$ 0

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Durante el periodo evaluado se consolida la conformación de la veeduría ciudadana y se determina la programación de obra ajustada al componente presupuestal definitivo de los estudios y diseños, de esta manera se inician labores con las actividades iniciales de acuerdo a procesos constructivos, dando un registro a la fecha de cierre del periodo de evaluación de un avance de obra del 15.11 %

Por su parte la interventoría solicita llevar a cabo un comité técnico de obra, para solicitar plan de mejora de avance de obra ya que esta se está ejecutando por debajo de la programación de obra, por lo que se requieren tomar medidas de contingencia para incrementar rendimientos que permitan cumplir con el objeto del contrato en las fechas previstas.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio
Ver Anexo 4

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.10 Otros documentos seguimiento mensual:

- Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3(Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4870 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, EN LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	EUDOMAR PAEZ TORRADO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CINCO (0,5) MESES.
FECHA INICIACIÓN	15/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2	UN (1) MES
FECHA TERMINACIÓN	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 96.091.300,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$ 19.908.700,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 116.000.000,00 INCLUIDO IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Acompañamiento en los procesos de gestión documental del proyecto mediante socialización para aclarar los parámetros que se deben tener en cuenta en cuanto a las funciones de la veeduría ciudadana del convenio solidario. Envío de oficios de correspondencia para mantener bajo cumplimiento a la junta de aquellos aspectos necesarios para darle una buena ejecución al convenio solidario.

- Elaboración de informes semanales como seguimiento y control a las actividades desarrolladas por la junta, de esta manera se controla el avance del convenio solidario.

- Apoyo en generación de cuentas de cobro, aclaración de información tributaria, financiera y contable. Visitas técnicas con el fin de establecer seguimiento y control a la ejecución de obra y garantizar cumplimiento de los parámetros establecidos por el INVIAS.

- Realizar la interventoría integral en los términos que se indique en manual de interventoría vigente de la Entidad, al convenio 3967 del 2023, garantizando que se dé correcto cumplimiento al objeto del contrato.

5.3 Informes especialistas
(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC
(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo
(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría
No aplica

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.7 Otros documentos seguimiento mensual

- Programa de Inversión del anticipo y Seguimiento a la inversión del Anticipo

No Aplica

- Seguimiento al Plan de Cargas

No Aplica

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Dada la aprobación de los ajustes a estudios y diseños y de la programación de obra, se inician actividades, con el fin de dar cumplimiento a los términos contractuales.
- La interventoría ha brindado acompañamiento a la junta desde la orden de inicio de actividades en todos los procesos y actividades iniciales a la ejecución del convenio con el fin de brindar apoyo y seguimiento y control en el desarrollo y ejecución de las actividades.
- A la fecha la junta tiene un avance de obra del 15.11% .
- La interventoría autoriza los pagos para suministro de material, medidas ambientales, exámenes médicos, auxilio de transporte del presidente de la J.A.C, medidas ambientales y dotación, con el fin de garantizar el buen avance de ejecución del convenio solidario.
- Es necesario se agilizar operaciones de tipo documental y técnico por parte de la junta para que incremente el rendimiento de las actividades de obra física

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

Ver anexo 15

ANEXOS

Anexo 1

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña **PERIODO MES:** Marzo de 2024

CONVENIO No.: 3967

OBJETO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolivar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: Junta de accion comunal de la vereda Boca de la Cienega Morales

PLAZO INICIAL: 0,5 meses
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 3 meses

VALOR INICIAL : $ 202.970.546,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 202.970.546,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Elias Jaimes Fernandez

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	
Estructuras	Alcantarillas	Und	
	Gaviones	m^3	444
Mantenimiento		Ml	
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	0	0
Estructuras	Alcantarillas	Und	0	0
	Gaviones	m^3	44	44
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 151.939.121,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.558.174,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.473.251,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 201.970.546,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 22.972.608,00	$ 22.972.608,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.293.604,00	$ 12.751.302,00
VALOR EJECUTADO	$ -	

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 66.843.866,33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 22.972.608,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 34,37%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 13
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Replanteo con topografia



Inicio de excavacion mecanica



Control de niveles de excavacion



Avance en excavacion mecanica



Inicio de instalacion de geotextil y de armado de gaviones



Avance en armado de Gaviones

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **Ocaña**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Marzo de 2024 **PROYECTO:** Mejoramiento vial en el marco del Programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, Municipio Morales

CONTRATO No. 3967 **CONTRATISTA:** JAC de la vereda Boca de la Cienaga

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4870 **INTERVENTORÍA:** Ingenius Solutions S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROCARGADORA														A	A	A	A																
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Convenio en etapa de revisión y ajustes a los de estudios y diseños

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: RUTH ESTER JIMENEZ GONZALEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-422009

Firma
Nombre: Jonathan Rico Arteaga
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 3

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No: 3967 **CONTRATISTA:** Junta de accion comunal de la Vereda Boca de la Cienega,Morales

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Marzo de 2024 **PROYECTO:** Mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, municipio Morales, Bolivar

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOVANI GONZALEZ CAÑA	13565644	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	J.A.C VEREDA BOCA DE LA CIENEGA			V	NUEVA EPS									
2	FREDILBERTO FLOREZ PACHECO	1048996049	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X				V	NUEVA EPS									
3	KILMER DIAZ RIOS	1731979	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X				V	NUEVA EPS									
4	JOSEGREGORIO RIOS BADILLO	1062874571	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X				V	NUEVA EPS									
5	CARLOSFRANCISCO RIOS DIAZ	5030671	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X				V	NUEVA EPS									
6	MAINORJOSE RIOS CRUZ	1062874334	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X				V	NUEVA EPS									
7																			
8																			
9																			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

Convenio en etapa de revisión y ajustes a los de estudios y diseños

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RUTH ESTER JIMENEZ GONZALEZ
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-422009

Firma
Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 4

Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 3

UNIDAD EJECUTORA Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 3967 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JAC de la vereda Boca de la Cienaga

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S. **CONTRATO No.** 4870 del 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 15 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 202.970.546,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:**

FECHA DE REANUDACIÓN: 15 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 202.970.546,00

PLAZO (MESES): 4 meses

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	Carlos Julio Florez Escudero	5.030.637			$ 50.304.796,47	$ 11.799.890,53	$ 62.104.687,00
2	JACOME & JACOME SAS ZOMAC	901781444 -5			$ 2.272.020,84	$ 532.943,16	$ 2.804.964,00
3	Sobeida Franco Hernandez	26.767.921			$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00
4	FERRETERIA QUINTERO LA GRAN ESQUINA SAS	901256880-2			$ 30.314.954,70	$ 7.110.915,30	$ 37.425.870,00
5	DIAN (RETENCION EN LA FUENTE)				$ 330.000,00		$ 330.000,00
6	Mirenny Diaz Diaz	45743849-8			$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
7	IPS A PRUEBA AGUACHICA E.U	900218061 - 1			$ 371.498,40	$ 87.141,60	$ 458.640,00
8	Sobeida Franco Hernandez (Nomina)	26.767.921			$ 3.289.920,00	$ -	$ 3.289.920,00
9				TOTAL	$ 87.583.190,41	$ 19.530.890,59	**$ 107.114.081,00**

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 87.583.190	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 94.633.426
VALOR IVA	$ 19.530.891	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 20.938.353
TOTAL PAGOS	$ 107.114.081	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 115.571.779

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: Sobeida Franco Hernández
Nombre: Sobeida Franco Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: Eudomar Paez Torrado
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma:
Nombre: Ruth Ester Jimenez Gonzalez
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 68202-422009

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA 1 de 2	.

FECHA: 05/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** Marzo de 2024

ACTA FINAL □

CONVENIO No : 3967 (Indique número y año)

OBJETO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JAC de la vereda Boca de la Cienaga (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023 INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S

PLAZO INICIAL: 0,5 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024 (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 201.970.546,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**:

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 201.970.546,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
			LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml		$ 78.907	$ -				$ -		
			CONSTRUCCION PLACA HUELLA								$ -		
	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	m^3		$ 30.671	$ -				$ -		
	320-13		Subbase Granular Clase C	m^3		$ 222.630	$ -				$ -		
	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m^3		$ 833.601	$ -				$ -		
	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m^3		$ 603.462	$ -				$ -		
	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg		$ 7.139	$ -				$ -		
			CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES								$ -		
	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	m^3	245	$ 30.671	$ 7.514.395			245	$ 7.514.395	245	$ 7.514.395
	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	m^3	11	$ 551.069	$ 6.061.759			3,75	$ 2.066.509	3,75	$ 2.066.509
	610-13		Relleno para Estructuras con Recebo	m^3	24	$ 76.973	$ 1.847.352				$ -		$ -
	673-13		Geotextil Tipo no tejido	m^2	126	$ 8.812	$ 1.110.312			95	$ 837.140	95	$ 837.140
	681 - 13		Gaviones de malla de alambre de acero	m^3	444	$ 285.331	$ 126.686.964			44	$ 12.554.564	44	$ 12.554.564
	674 -13		Dren horizontal 4"	ml	82	$ 51.211	$ 4.199.302				$ -		
			ITEMS NO PREVISTOS								$ -		
	673-13	N.P.1	Material Granular Drenante	m^3	33	$ 131.398	$ 4.336.134				$ -		
			SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA				**$ 151.756.218**				$ 22.972.608		$ 22.972.608
*			PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)				$ 4.558.174						
*			GASTOS ADMINISTRATIVOS				$ 45.472.520				$ 4.293.604		$ 12.751.302
*			**VALOR ESTIMADO CONVENIO**				$ 201.786.912				***$ 27.266.212***		***$ 35.723.910***
*											$ 27.266.212		
*													
*													
*			**VALOR TOTAL**										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

FECHA 05/04/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 27.266.211,00		$ 27.266.211
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ 27.266.212

VALOR PRESENTE ACTA: $ 27.266.211 **VALOR EN LETRAS:** Veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil doscientos once M/Cte

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Sobeida Franco Hernández
Nombre:Sobeida Franco Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: Ruth Ester Jimenez Gonzalez
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profesional No.: 68202-422009NTS

Firma:
Nombre: Eudomar Paez Torrado
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 5
Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No: 3967 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA,MORALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Marzo de 2024 **PROYECTO:** Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius Solutions S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		720
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: RUTH ESTER JIMENEZ GONZALEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-422009

Firma
Nombre: Jonathan Rico Arteaga
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 6
Resumen Ensayos de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 5/04/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña,Norte de Santader

CONVENIO No.: 3967 **CONTRATISTA:** JAC de la vereda Boca de la Cienaga, Municio de Morales,Bolivar

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Marzo de 2024 **PROYECTO:** Mejoramiento vial en el marco del Programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, Municipio Morales

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius Solutions S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: RUTH ESTER JIMENEZ GONZALEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-422009



Firma
Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo7

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA 5 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 3967 **CONTRATISTA:** Junta de accion comunal de la vereda Boca de la Cienega,Morales

OBJETO DEL CONTRATO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,5 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 202.970.546,00

VALOR ACUMULADO: $ 202.970.546,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius Solutions S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.594.110,00	18	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.148.528,00	18	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.891.164,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290873

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	18	10	2023	31	12	2023
Patronal,Contratista,Subcontratista,Vehiculos Propios y No propios		$ 232.000.000,00	18	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071383 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.594.110,00	31	12	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.148.528,00	31	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.891.164,00	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290873

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	18	10	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB–100071383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8
Informe Semanal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, municipio Morales, Bolivar

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 8 del 29/02/2024 al 7/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

136,5 m3 DE GAVIONES

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 136,5m3 de gaviones, en la vereda Boca de la Cienaga, municipio de Morales.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JAC de la vereda Boca de la Cienaga			INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
				INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONVENIO No.	3967	VALOR INICIAL:	$ 202.970.546,00	CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19.908.700,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202.970.546,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 202.970.546	$ 202.970.546		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.970.546	$ 202.970.546		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 151.939.121,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.457.698,00	4,17%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.514.395,00	5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 7.514.395,00	5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.514.395,00	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: Al momento el convenio cuenta con programacion de obra aprobada,de manera que se lleva a cabo control de avance fisicoy financ

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Estudios y diseños	GL	1
* Construccion de Gaviones	GL	1
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	0,05				3,2%
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía el paso de Boca de la Cienega

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Entrega de programacion de obra de la junta,y aprobacion de esta. Se avanza en la creacion de la veeduria del convenio,asi como en la cotizacion de material de obra para inicio de actividades de obra fisica. Instalacion de valla del convenio, y proyeccion de cuentas de cobro pendientes por generar. A la fecha no hay inicio de obra fisica para el convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera el inicio de actividades de obra fisica,como lo son las actividades preliminares y el suministro de material de obra,de igual manera la conformacion de la veeduria y del comité operativo.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella		Programado
		Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Oficio de informacion de incumplimiento de plazos



Instalacion de valla del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Formalizacion en personeria de la veeduria y generacion de cuentas de cobro para autorizacion de recursos para material de obra.

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Jonathan Rico Arteaga

Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, municipio Morales, Bolivar

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 9 del 7/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

136,5 m3 DE GAVIONES

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 136,5m3 de gaviones, en la vereda Boca de la Cienaga, municipio de Morales.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JAC de la vereda Boca de la Cienaga			INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
				INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONVENIO No.	3967	VALOR INICIAL:	$ 202.970.546,00	CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19.908.700,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202.970.546,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 202.970.546	$ 202.970.546		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.970.546	$ 202.970.546		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 151.939.121,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 21.694.211,00	14,28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 7.514.395,00	4,95%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 14.179.816,00	6,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.457.698,00	4,17%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21.694.211,00	14,28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.514.395,00	4,95%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 14.179.816,00	9,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.179.816,00	9,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.514.395,00	4,9%

Observaciones: Al momento el convenio cuenta con programacion de obra aprobada,de manera que se lleva a cabo control de avance fisicoy financ

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 6% — Avance o Atraso Físico %: 6%

Meta Física Ejecutada %: ###

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Construccion de Gaviones	m3	444
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	42,7				6,2%
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía el paso de Boca de la Cienega

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Inicio de actividades de obra.Replanteo mediante topografia e inicio de excavacion mecanican sin clasificar,se desarrolla esta misma actividad durante toda la semana,considerando que se debe llevar a cabo un acta de mayores cantidades para este item del presupuesto.Se autoriza pago de Retencion en la fuente,medidas ambientales y dotacion,asi como recursos para suministro de material de obra y agregados petreos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera el inicio de instalacion de gaviones y de relleno con material de recebo

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella		Programado
		Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Replanteo de gaviones



Inicio de excavacion mecanica



Control de niveles de Excavacion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Formalizacion en personeria de la veeduria e inicio de construccion de los Gaviones

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Jonathan Rico Arteaga

Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, municipio Morales, Bolivar

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña — SEMANA No.: 10 del 14/03/2024 al 20/03/2024 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

136,5 m3 DE GAVIONES

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 136,5m3 de gaviones, en la vereda Boca de la Cienaga, municipio de Morales.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC de la vereda Boca de la Cienaga		
CONVENIO No.	3967	VALOR INICIAL:	$ 202.970.546,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202.970.546,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19.908.700,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 202.970.546	$ 202.970.546		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.970.546	$ 202.970.546		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 116.000.000	$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 151.939.121,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 44.269.038,67	29,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 14.412.677,75	9,49%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 29.856.360,92	14,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.857.698,00	4,36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.269.038,67	29,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14.412.677,75	9,49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 29.856.360,92	19,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.574.827,67	14,9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.898.282,75	4,5%

Observaciones: Al momento el convenio cuenta con programacion de obra aprobada,de manera que se lleva a cabo control de avance fisicoy financiero del proyecto de manera semanal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 6% — Avance o Atraso Físico %: 5%
Meta Física Ejecutada %: 1%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Construccion de Gaviones	m3	444
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	42,7				6,2%
Ejec	8				1,2%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via el paso de Boca de la Cienega — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se finaliza excavacion mecanica en material variado sin clasificar, de esta manera se instalan 75 m^2 de concreto pobre como solado de limpieza,y se da inicio a la instalacion de los gaviones con el respectivo geotextil y filtro.Mediante oficio OFI-4870-2023-032 se realiza una solicitud mesa de trabajo y/o comité operativo para el alcance veeduria con el fin de realizar mediante el dialogo la socializacion de incorfomidades e inquietudes a cerca de la ejecucion del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Gaviones	29,14	Programado
	9,49	Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalacion de solado de limpieza



Inicio de armado de gaviones



Armado de Gaviones

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Jonathan Rico Arteaga

Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, municipio Morales, Bolivar

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña SEMANA No.: 10 del 14/03/2024 al 20/03/2024 Último Informe Semanal SI □ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

136,5 m3 DE GAVIONES

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 136,5m3 de gaviones, en la vereda Boca de la Cienaga, municipio de Morales.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC de la vereda Boca de la Cienaga		
CONVENIO No.	3967	VALOR INICIAL:	$ 202.970.546,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202.970.546,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19.908.700,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 202.970.546	$ 202.970.546		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 202.970.546	$ 202.970.546		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 151.756.218,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 63.591.765,83	41,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 56.791.247,51	37,42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 6.800.518,32	3,35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 14.609.374,00	7,20%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 95.218.278,05	62,74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 71.400.621,51	47,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 23.817.656,54	15,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.988.898,24	18,4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.952.979,00	7,9%

Observaciones: Al momento el convenio cuenta con programacion de obra aprobada,de manera que se lleva a cabo control de avance fisicoy financiero del proyecto de manera semanal.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.686.937,78	70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65.776.805,20	57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.567.768,58	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.040.000,00	7%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 28% Avance o Atraso Físico %: 21%
Meta Física Ejecutada %: 6%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Construccion de Gaviones	m3	444
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	192				27,7%
Ejec	44				6,3%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via el paso de Boca de la Cienega
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Latitud: 8°20'13,61" N Longitud:73°43'8,51" O	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se realizo la instalacion de 44 m3 de gaviones

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Gaviones	29,14	Programado
	9,49	Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Armado 44 m3 de gaviones

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Jonathan Rico Arteaga

Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 9
Equipo Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Marzo de 2024 **PROYECTO:** Mejoramiento vial en el marco del Programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, Municipio Morales

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4870 del 2023 **INTERVENTORÍA:** Ingenius Solutions S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3967 **CONTRATISTA:** JAC de la vereda Boca de la Cienaga

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICUO TIPO CAMIONETA	DUSTER DYNAMIQUE 2016	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	BAJAJ PULSAR NS160 FE 2023 PLACA NRH 45G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 10

Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17 / 4 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 DEL 2023

INTERVENTOR: INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1-31 de marzo del 2024

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No.: 3796-2023, 3825-2023, 3981-2023, 3967-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSI BOLIVAR; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA

NOMBRE ARL: POSITIVA SAS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	EUDOMAR PAEZ TORRADO	13.361.189	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.940.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33%	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.	30	$ 10.200,0	I	NUEVA EPS	1743112236	$ 77.600,0				$ 77.600,00	$ -	$ -	
2	JONATHAN RICO ARTEAGA	1.003.196.883	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.700.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		30	$ 188.000,0	V	SANITAS	1743112236	$ 108.000,0	COLPENSIONES	1743112236	$ 432.000,0	$ 108.000,00	$ -	$ -	
3	CONTRERAS JIMENEZ SINDY MARCELA	1.003.257.511	INSPECTORA SST	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		30	$ 90.500,0	V	NUEVA EPS CM	1743112236	$ 52.000,0	PORVENIR	1743112236	$ 208.000,0	$ 52.000,00			
4	SANTIAGO PEÑA EDWIN	1.007.971.534	INSPECTOR	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		30	$ 90.500,0	V	NUEVA EPS	1743112236	$ 52.000,0	PROTECCION	1743112236	$ 208.000,0	$ 52.000,00			
5	PEÑARANDA VERGEL YOZEF FARID	1.090.456.303	INSPECTOR	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		30	$ 90.500,0	V	SANITAS	1743112236	$ 52.000,0	PORVENIR	1743112236	$ 208.000,0	$ 52.000,00			
6	EUDOMAR PAEZ TORRADO	13.361.189	ESPECIALISTA DE VIAS	$ 833.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17%		30	$ 4.400,0	I	NUEVA EPS	1743112236	$ 33.400,0				$ 33.400,00			
7	CABANA DIAZ JESUS MIGUEL	1.122.406.859	ESPECIALISTA DE GEOTECNIA	$ 2.450.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25%		30	$ 12.800,0	I	SANITAS	1743112236	$ 98.000,0	PORVENIR	1743112236	$ 392.000,0	$ 98.000,00			
8	BARBOSA ESLEIDE YLIANA	37.180.439	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 3.136.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	32%		30	$ 16.400,0	I	NUEVA EPS	1743112236	$ 125.500,0	PORVENIR	1743112236	$ 501.800,0	$ 125.500,00			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 2.320.000,00																																													

El Interventor adjunta la certificación de fecha 25/4/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO *
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 11
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17 / 4 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vias Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 4870 DEL 2023

INTERVENTOR: INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 1-31 de marzo del 2024

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No: 3796-2023, 3825-2023, 3981-2023, 3967-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSI BOLIVAR; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1357323	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	Contrato principal	$96.091.300,00	$ -
2023	1398423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	ADICIONAL 1	$19.908.700,00	$ -
TOTAL						$ 116.000.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 116.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1357323 de 11/12/2023	$ -	$ 96.091.300,00		CONTRATO PRINCIPAL
								1398423 de 19/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ADICIONAL
1	**15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**	$ -	$ -	$ -				1357323 de 11/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ACTA EN CERO
2	**1 AL 31 DE ENERO DEL 2024**	$ 7.409.080,00	$ 1.407.725,20	$ 8.816.805,20				1357323 de 11/12/2023	$ 8.816.805,20	$ 107.183.194,80	RADICADO 963 DE FECHA 02 MARZO 2024	
3	**1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**	$ 20.853.040,00	$ 3.962.077,60	$ 24.815.117,60				1357323 de 11/12/2023	$ 33.631.922,80	$ 82.368.077,20	RADICADO 2167 DE FECHA 06 ABRIL 2024	
4	**1 AL 30 DE MARZO DEL 2024**	$ 30.872.400,00	$ 5.865.756,00	$ 36.738.156,00				1357323 de 11/12/2023	$ 70.370.078,80	$ 45.629.921,20		PRESENTA ACTA EN TRÁMITE
TOTALES		**$ 59.134.520,00**	**$ 11.235.558,80**	**$ 70.370.078,80**					**$ 70.370.078,80**	**$ 45.629.921,20**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 49.871.520,00	$ 9.475.588,80	$ 59.347.108,80
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 9.263.000,00	$ 1.759.970,00	$ 11.022.970,00
*			
VALOR TOTAL	$ 59.134.520,00	$ 11.235.558,80	$ 70.370.078,80

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12
Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023

INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para los convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y las organizaciones de acción comunal de los municipios de arenal, Norosi y morales del departamento del Bolívar, en la dirección territorial Ocaña para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,5 mes

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/02024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 96.091.300,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaime Fernandez

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8%	$ 9.609.130,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17%	$ 19.218.260,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	25%	$ 28.827.390,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B–100043670

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 12/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.600.000,00	6	12	2023	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.200.000,00	6	12	2023	31	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 34.800.000,00	31	12	2023	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043670

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/12/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13

Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE** **RELACION DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA 5/04/2024

RELACION DE CORRESPONDENCIA

I. INFORMACIÓN GENERAL

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFI-4870-2023-025	7/03/2024	JAC VEREDA BOCA DE LA CIENEGA	Riesgo de Incumplimiento de plazos
OFI-4870-2023-032	19/03/2024	VEEDURIA VEREDA BOCA DE LA CIENEGA	Solicitud mesa de trabajo y/o comité operativo para el alcance veeduria.
OFI-4870-2023-040	20/03/2024	RESIDENTE DE OBRA JAC VEREDA BOCA DE LA CIENEGA	SOLICITUD INFORME TECNICO E INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-053	30/03/2024	RESIDENTE DE OBRA JAC VEREDA BOCA DE LA CIENEGA	SOLICITUD ENTREGA “Informe inversión buen manejo desembolso” y “Plan Inversión Desembolso Mensual”

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 152192316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 14
Registro fotográfico






CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL
INVIAS


CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL
INVIAS










AMINOS
OMUNITARIOS
LAPAZ TOTAL
INVIAS







Anexo 15
Bitácora del mes correspondiente

04 Marzo de 2024
Convenio Nº 3967
Contratista: J.A.C Vereda Boca de la Cienega
Interventoria: Ingenius Solutions S.A.S
Clima: Soleado
Hora Inicio: 7:00 am
Personal en obra: No
Actividades. El personal tecnico de la parte se mantuvo realizando programación de obra y estudio de mercado, con el compromiso de iniciar obra lo mas pronto posible.
Hora finalizacion: 5:00 pm
Observaciones: No se da inicio de obra fisica aun.

Ruth Pew Ariza
Ing Residente Interventoria

Ing. Res. Obra.

05 Marzo de 2024.
Convenio Nº 3967
Contratista: J.A.C Vereda. Boca de la Cienega.
Interventoria: Ingenius Solutions. S.A.S.
Clima: Soleado
Hora Inicio: 7:00 am
Personal en obra: No
Actividades: Estudio de mercado, calculo de cantidades de obra, gestion tecnica y documental.
Hora finalizacion: 5:00 pm

Ruth Pew Ariza
Ing Residente Interventoria

Ing. Res. Obra.

06 Marzo de 2024.
Convenio Nº 3967.
Contratista: J.AC Vereda. Boca de la Cienega.
Interventoria: Ingenius Solutions S.A.S
Clima: Soleado
Hora Inicio: 7:00 am.

Personal en Obra: No
Actividades: Entrega de Programación de Obra de la T.A.C a la interventoría, la cual es revisada para su respectiva aprobación, se expiden cuentas de cobro para suministro de material.
Hora finalización: 5:00 pm.

Ing. Residente Interventoría

Ing. Res. Obra.

07 Marzo de 2024.
Consumo N= 3967
Contratista: T.A.C Vereda Boca de la Quebrada.
Interventoría: Ingeniw Solutions. S.A.S.
Clima: Soleado.
Hora Inicio: 7:00 am.
Personal en Obra: No.
Actividades: Instalación de valla del consumo, presentación de cuentas de cobro de materiales de Construcción, Retiro de la Broca, Potencia y elementos de medidas ambientales, exámenes medicos de ingreso.
Hora finalización: 5:00 pm

Ing Residente Interventoría

Ing. Res. obra.

08 Marzo de 2024.
Consumo N= 3967
Contratista: T.A.C Vereda Boca de la Quebrada.
Interventoría: Ingeniw Solutions SAS
Clima: Soleado.
Hora Inicio: 7:00 am.
Personal en obra: No.
Actividades: Autorización de Pago mediante firma de cheque de Bonos ayuda de Dotación y Medidas ambientales $ 2'804.964, retirados en la Fonte $ 330.000, Examenes medicos, $ 458.640, Materiales de ferretería $ 37' 42 y Agregados Petreos: $ 62'104.687, de esta manera se proyectan realizar pronto inicio de obra.

Hora finalizacion: 5:00 pm
Observaciones: No hay Inicio de Obra a la fecha

Ing. Residente Interventoria Ing. Res. obra.

04 Marzo de 2024.
Convenio N= 3967
Contratista: JAC Vereda Boca de la Ciénaga
Clima: Soleado
Hora Inicio: 7:00 am.
Personal en obra: No (Ingeniero, comisión topografica, trabajadores
Actividades:
- Se realiza trabajos de replanteo con equipos topograficos
- se realiza trabajos de limpieza y descapote del area a intervenir.
Hora de finalización: 12:00

observaciones: Durante la realización del replanteo, se verificaron las cotas proyectadas en los diseños. los cuales no coincidían con el terreno encontrado en obra, por lo cual es necesario realizar una nueva implantación del proyecto de acuerdo a las medidas y cotas del terreno en campo.

Ing Residente Interventoria Ing. Residente de obra

10 Marzo de 2024
convenio N= 3967
contratista: JAC vereda Boca de la Cienega.
No se laboró.

11 marzo de 2024
convenio N= 3967
contratista: JAC vereda Boca de la Ciengga.
Clma: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
personal en obra: Ingeniero, Maestro, trabojadores
Actividades.
- Se da inicio con los trabajos de excavacion mecanica.

Hora de finalizacion: 4:30 pm.
observaciones: N/A.

Ing. Residente Interventoría

Ing. Residente de obra.

12 Marzo de 2024.
convenio N= 3967.
contratista: JAC vereola Boca de la Cienega.
clima: Soleado.
Hora de inicio: 7:00 Am
personal en obra: Ingeniero, Maestro, trabajadores.
Actividades.
- Se continúa con los trabajos de excavación mecanica, durante el día se realiza la verificación de niveles.
- Se registro el ingreso de material (Mallas para gavion, cemento, tubería pvc 4", geotextil NT, alambre de acero galvanizado).
Hora de finalización: 4:30 pm.
observaciones: N/A.

Ing. Residente Interventoría

Ing. Residente de obra.

024

13 Marzo de 2024
Convenio N° 3967
Contratista: JAC vereda de Boca de la Ciénaga.
Clima: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
personal de obra: Ingeniero, Maestro, trabajadores.)
Actividades
→ Se continúa con los trabajos de excavación mecanica y verificacion de niveles.
→ Se da inicio con los trabajos de armado de los cajones en malla galvanizada para gavión.
Hora de finalización: 4:30 pm.
observaciones: N/A

Ing. Residente de Interventoría Ing. Residente de obra.

14 Marzo de 2024.
Convenio N° 3967
Contratista: JAC Vereda de Boca de la Ciénega.
Clima: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
personal de obra: Ingeniero, Maestro, Trabajadores.
Actividades.
- Se continúa con los trabajos de excavación mecanica y verificación de niveles.
→ Se continúa con los trabajos de armado de las mallas para gavión.
+ se da ingreso de 1 volqueta con piedra para gavión.
Hora de finalización: 4:30 pm
Observaciones: N/A.

Ing. Residente de Interventoría Ing. Residente de obra.

15 Marzo de 2024
convenio N= 3967
Contratista: JAC vereda de boca de la cienego.
Clima: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
personal de obra: Ingeniero, Maestro, Trabajadores
Actividades.
- se da inicio de replanteo y nivelación del areá a intervenir, para dar inicio con el vaciado de concreto,
- se continúa con el armado de mallas para gavión.
Hora de finalización: 4:30 pm
observaciones:

Ing. Res. Interventoría Ing. Res. Obra.

16 Marzo de 2024
convenio N= 3967
contratista: JAC vereda Boca de la Cienega.
Clima: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
personal de obra: Ingeniero, Maestro, trabajadores
Actividades.
- se da inicio con los trabajos de vaciado de Concreto de limpieza y nivelación del terreno, espesor = 5cm / 25 metros.
Hora de finalización: 4:30 pm
Equipos: Mezcladora de concreto.
observaciones:

Ing. Res de interventoría Ing. Res de obra.

17 de Marzo de 2024
Convenio N° 3967
Contratista: JAC vereda Boca de la Cienega.
No se laboró.

18 de Marzo de 2024
Convenio N° 3967
Contratista: JAC vereda Boca de la Cienaga.
Clima: soleado
Hora de Inicio: 7:00 am
personal de obra: Ingeniero, Maestro, Trabajadores.
Actividades.
- Se da inicio con los trabajos de armado de la formaleta, luego se instala la malla para gavión, se realiza el aplomado.
- Se da inicio del llenado de los gaviones con piedra.
Hora de finalización: 4:30 pm
observaciones: Se da ingreso de 1 viaje de piedra de cantera.

Ing. Res de obra Ing. Res Interventoría.

19 de Marzo de 2024.
Convenio N° 3967
Contratista: JAC Vereda Boca de la Cienaga.
Clima: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
personal de obra: Ingeniero, Maestro, trabajadores(
Actividades.
- se continúa con los trabajos de armado de formaleta y llenado de piedras para gavión.
- se realiza instalacion del geotextil no tejido para el filtro.
Hora de finalización: 4:30 pm.
Equipos: Herramienta menor
observaciones:..

se consulta con interventoría acerca de las mayores cantidades que se contempla para el filtro, debido a los cambios que surgieron en campo por la topografía del terreno, en donde se observa el aumento de la altura del filtro con respecto a la altura contemplada en el presupuesto.

Ing. Residente Interventoría Ing. Residente de Obra.

20 de Marzo de 2024
convenio N° 3967
contratista: JAC Vereda Boca de la Ciénaga.
clima: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
persona de obra: Ingeniero, Maestro, trabajadores (7)
Actividades:
- Se continúa con los trabajos de armado de formaleta, instalación de malla galvanizada, y llenado de piedra para gavión.
Equipos: Herramienta menor.
Hora de finalización: 4:30 pm.
Observaciones.

Ing. Res Interventoría Ing. Res de obra.

21 de marzo de 2024
convenio N° 3967.
Contratista: JAC vereda Boca de la ciénaga.
Clima: soleado
Hora de inicio: 7:00 am
personal de obra: Ingeniero, Maestro, trabajadores (7)
Actividades.
* Se continúa con los trabajos de instalación de malla, galvanizado, armado de formaleta y llenado con piedra para gavión.

Equipos: Herramienta menor.
Hora de salida: 1:30 pm
Observaciones: se realiza visita a la cantera, para revisión del material que se esta entregando.

Res. Ing Interventoría Res. Ing obra.

21 Marzo de 2024.
convenio N° 3967.
Contratista: JAC Vereda Boca de la Ciénaga.
Clima: Soleado
Hora de Inicio: 7:00 am
personal de obra: Ingeniero, Maestro, trabajadores (7)
Actividades.
* Se continúa con los trabajos de instalacion de malla galvanizada, armado de formaleta y llenado con piedra para gavión.
* Se recibe 3 viajes de piedra para gavión.
Hora de finalización: 4:30 pm
Equipos: Herramienta menor.
observaciones:

Ing. Res Interventoría Ing. Res de obra.

22 de Marzo de 2024
Convenio N° 3967
Contratista: JAC Vereda Boca de la Ciénaga.
Clima: Soleado
Hora de Inicio: 7:00 am
personal de obra: Ingeniero, Maestro, trabajadores (7)
Actividades.
* Se continúa con los trabajos de instalación de la malla galvanizada, armado de formaleta y llenado de gavion con piedra.
Equipos: Herramienta menor.

Hora de finalización: 4:50 pm
observaciones:

Ing. Res Interventoría Ing. Res de obra.

23 de marzo de 2024
Convenio 3967
contratista: JAC vereda Boca de la cienaga.
Clima: soleado
Hora de inicio: 7:00 am
personal de obra: Ingeniero, Maestro, trabajadores (7).
Actividades.
- se continúa con los trabajos de instalación de malla galvanizada, armado de formaleta y llenado de gavión con piedra.

Equipos: Herramienta menor.
Hora de salida: 12:00
Observaciónes: Se realiza comité de obra tecnico, virtual con presencia de la interventoría, Residente de obra, contador, presidente de la JAC y veedoría.
- se presenta accidente de obra, uno de los trabajadores sufre cortada en la mano, se recomendo acercarse al hospital para ser revisado (no tenía guante de protección).

Ing. Res Interventoría Ing. Res de obra.

24 de marzo de 2024.
Convenio 3967
Contratista: JAC vereda Boca de la cienaga.
clima: soleado
Hora de inicio: No se labora.

25 Marzo de 2024
Convenio 3967
Contratista: JAC vereda Boca de la Cienaga
Clima: Soleado
Hora de inicio: no se labora. (Festivo)

26 de marzo de 2024.
Convenio 3967
Contratista: JAC vereda Boca de la Cienaga
Clima: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
Personal de obra: Ingeniero, Maestro, trabajadores (6)
Actividades.
- Se continúa con los trabajos de instalación de la malla galvanizada, armado de formaleta y llenado de gavión con piedra.
* Se realiza trabajos de partir piedra por medio de Maquinaria.
Equipos: Herramienta menor, pajarita.
Hora de Salida: 4:30 pm
observaciones: se da ingreso de 1 viaje de material filtrante.

Ing. Res Interventoría Ing. Res obra.

27 de marzo de 2024.
Convenio 3967
Contratista: JAC vereda Boca de la Cienaga.
Clima Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
Personal de obra: Ingeniero, Maestro, trabajadores (6)
Actividades
- Se continúa con los trabajos de instalación de la malla galvanizada, armado de formaleta y llenado
