SOLUTIONS

INFORME MENSUAL N°2

CONVENIO No. 3967 DE 2023: "Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.".

PERIODO: 1 al 29 de febrero de 2024



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4870 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, EN LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Ocaña, Marzo de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 5
2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 5
2.4 Características Técnicas del Proyecto 6
3. Información convenio solidario. 7
3.1 Información General del convenio 7
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 7
3.3 Seguimiento ítems no previstos 7
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 8
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 8
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 8
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 8
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 8
4.4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio 8
4.5 Estado General del Tiempo 8
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 8
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 8
4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 8
4.10 Otros documentos seguimiento mensual: 8
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
5.1 Información general del contrato 9
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 9
5.3 Informes especialistas 10
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 10
5.5 Información otros programas y aplicativo 10
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 10
6.1 Equipo Contrato de Interventoría 10
6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 10
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 10
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 10
6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 10
6.7 Otros documentos seguimiento mensual 10

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10
8. ANEXOS 12
8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 12
8.2. Registro fotográfico..... 12
8.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales**¡Error! Marcador no definido.**
8.4. Bitácora del mes correspondiente: 12

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Anexo 4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

Anexo 5 Estado General del Tiempo

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Anexo 8 Informe Semanal

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total destinó recursos para el desarrollo del programa que ejecutan los organismos y/o juntas de acción comunal dentro del marco de la ley.

Es importante el desarrollo vial y la comunicación con municipios y ciudades de las comunidades rurales para su avance y mejoramiento en materia de movilidad, estas comunidades logran un desarrollo para sus habitantes en la medida que avanza su infraestructura vial.

Es así que la implementación de la estabilización de vías terciarias por medio de gaviones juega un papel importante en el estado y conservación de las vías de esta vereda lo que genera confianza y seguridad para los transeúnte y paso vehicular por el corredor vial.

En el siguiente informe se encuentra toda la información concerniente en cuanto al ámbito administrativo, técnico, financiero y la información que permite conocer el estado y avance del convenio solidario del mes de febrero.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Bolívar, en la zona rural del Municipio de Morales, en el corregimiento de la Boca de la Ciénaga, en la vía central del corregimiento.

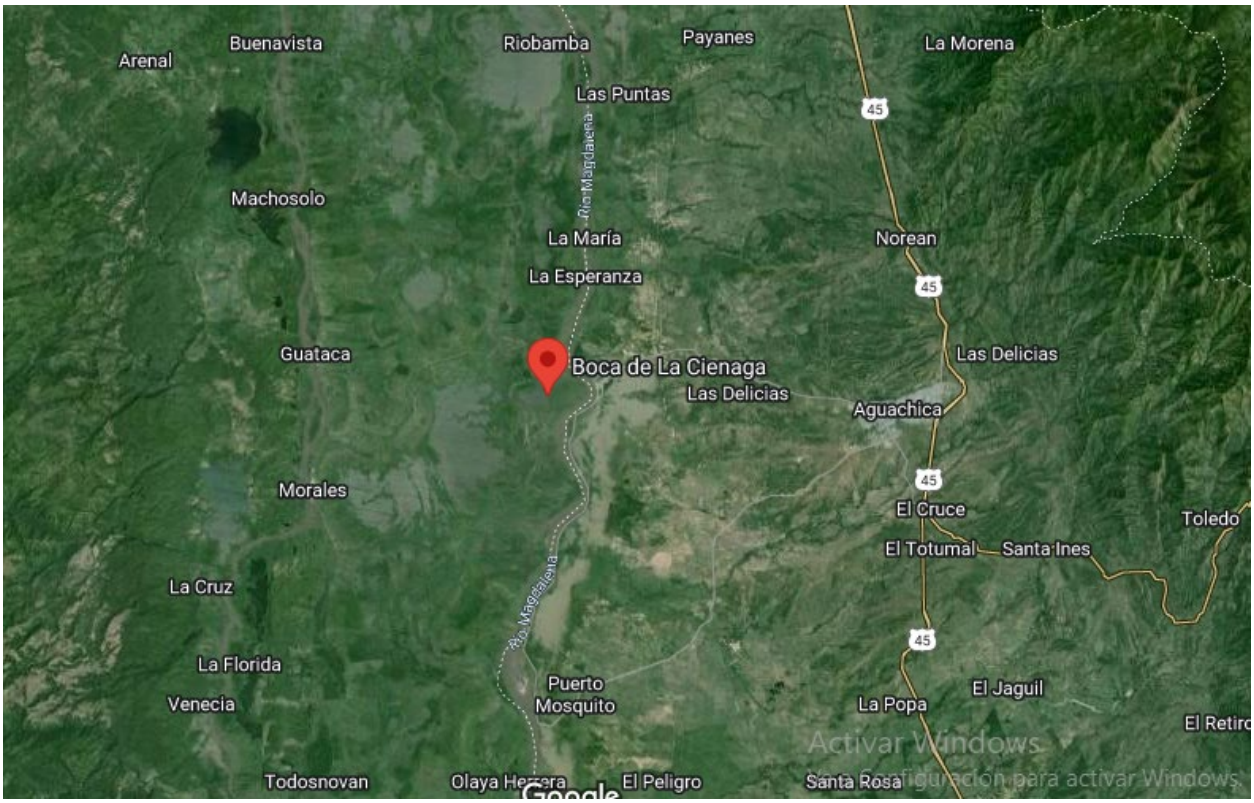



Figura 1. Localización de la vereda Boca de la Ciénega

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto objeto del convenio de referencia se ejecuta en la vereda Boca de la Ciénega, zona rural del municipio de Morales, Bolívar. De su ejecución se beneficia la población de esta vereda directamente, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El corredor vial a intervenir se encuentra en la intersección de la vereda Boca de la Ciénaga, esta es una vía terciara destapada que requiere intervención, mantenimiento y estabilización de algunos sitios críticos ya que la socavación por parte del río ha generado que se desestabilice el corredor vial.

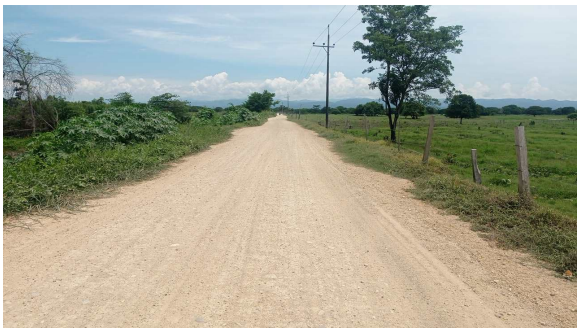	
Estado Inicial de la vía 15-01-2024	Estado inicial de la vía 15-01-2024

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El presento convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento vial del corredor a intervenir para que garantice una circulación continua y eficaz para el transporte de propios y visitantes de la región.

- Construcción de muro en gaviones de malla de alambre de acero y dren horizontal
- Construcción de alcantarilla en concreto reforzado

3. Información convenio solidario.

3.1 Información General del convenio

CONVENIO No.	3967 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JAC DE LA VEREDA BOCA DE LA CIÉNAGA
FECHA DE INICIACIÓN	18/12/2023
FECHA DE TERMINACION INCIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CINCO (0.5) MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 202.970.546,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 202.970.546,00 INCLUIDO IVA

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo comprendido durante todo el mes de febrero, se realizó en primera instancia la topografía base del proyecto, así como los ensayos necesarios para llevar a cabo ajustes a estudios y diseños de acuerdo a lo comprendido en el contrato, de igual manera se adelantan actividades administrativas que se ejecutan con autorización de pago mediante cheque para cubrir costos de pólizas del convenio, caja menor, dotación, auxilio de transporte.

Se adelanta gestión documental del proyecto quedando el compromiso de la conformación de la veeduría ciudadana, así como también se llevó a cabo una reunión conjunta en la casa de la cultura MARTIN GAMARRA del municipio de Gamarra – Cesar por parte de la interventoría con el presidente de la junta de acción comunal donde se aclaran los parámetros que se deben tener en cuenta durante la ejecución del convenio solidario. En esta reunión se lleva a cabo seguimiento a la ejecución del convenio, se establecen parámetros para dar inicio a ejecución física de la obra, ya que cuenta con aprobación de ajustes a estudios y diseños. En este sentido la junta queda por elaborar la programación de obra y estudio de mercado para dar inicio los primeros días del mes de marzo.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

Con los ajustes a estudios y diseños se establece un Item NO previsto, denominado “Material Granular Drenante” con código de pago 673.2, este queda aprobado por la interventoría y será contemplado en la programación de obra que debe presentar el contratista para poder dar inicio a obra.

ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS No. 1							
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
673.2		Material Granular Drenante	M3	33	$ 131.398,00	$ 4.336.134,00	$ 0

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Durante el periodo evaluado el contrato de obra se encuentra en fase de aprobación de ajustes a estudios previos y a diseños, el contratista entrega ajustes a estudios y diseños a mediados de mes, los cuales son revisados y aprobados, de esta manera se solicita la creación de la veeduría ciudadana y la programación de obra ajustada a los estudios y diseños definitivos.

Por su parte la interventoría proyecta realizar una correcta revisión de la programación de obra para inicio de actividades de obra física, de igual manera se estima realizar los primeros pagos para suministro de material y de obra contemplados en el presupuesto de obra, de tal manera que la junta empiece a tener flujo de caja y a marcar avance de obra.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio
Ver Anexo 4

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.10 Otros documentos seguimiento mensual:

- Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3(Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4870 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, EN LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	EUDOMAR PAEZ TORRADO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CINCO (0,5) MESES.
FECHA INICIACIÓN	15/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2	UN (1) MES
FECHA TERMINACIÓN	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 96.091.300,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$ 19.908.700,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 116.000.000,00 INCLUIDO IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Acompañamiento en los procesos de gestión documental del proyecto mediante socialización para aclarar los parámetros que se deben tener en cuenta para dar inicio en la ejecución del convenio solidario. Envío de oficios de correspondencia para mantener bajo cumplimiento a la junta de aquellos aspectos necesarios para darle una buena ejecución al convenio solidario.

- Elaboración de informes semanales como seguimiento y control a las actividades desarrolladas por la junta, de esta manera se controla el avance del convenio solidario.

- Apoyo en generación de cuentas de cobro, aclaración de información tributaria, financiera y contable. Revisión de la topografía de la zona a intervenir y los correspondientes ajustes a los estudios y diseños, para garantizar cumplimiento de los parámetros establecidos por el INVIAS.

- Realizar la interventoría integral en los términos que se indique en manual de interventoría vigente de la Entidad, al convenio 3967 del 2023, garantizando que se dé correcto cumplimiento al objeto del contrato.

5.3 Informes especialistas
(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC
(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo
(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría
No aplica

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.7 Otros documentos seguimiento mensual

- Programa de Inversión del anticipo y Seguimiento a la inversión del Anticipo

No Aplica

- Seguimiento al Plan de Cargas

No Aplica

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Dada la reanudación de las actividades de obra a mitad del mes de enero, las actividades realizadas durante gran parte del mes de febrero se basaron en temas de índole documental y administrativo.
- La interventoría ha brindado acompañamiento a la junta desde la orden de inicio de actividades en todos los procesos y actividades iniciales a la ejecución del convenio con el fin de brindar apoyo para pronto inicio de actividades de obra.
- A la fecha la junta tiene aprobado los ajustes a estudios y diseños, de esta manera se da viabilidad a la ejecución del convenio.
- La interventoría autoriza los pagos de las cuentas de cobro de la junta de la vereda Boca de la Ciénega, por concepto de pagos de pólizas, topografía, estudios previos, dotación, caja menor y auxilio al dignatario.
- Es necesario se agilizar operaciones de tipo documental y técnico por parte de la junta para que se de inicio de actividades de obra física lo mas pronto posible

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

Ver anexo 15

ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3967 **Contratista:** JAC de la vereda Boca de la Cienaga

Contrato de Interventoría No. 4870 del 2023 **Interventoría:** Ingenius Solutions S.A.S

Objeto Contrato de Obra: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** Febrero de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	15
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	16
1	**INTRODUCCION**		5
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7
2.4	Características técnicas del proyecto		7
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		8
3.1	Información general del contrato		8
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		8
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		8
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		8
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		9
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	33
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	9
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	9
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	9
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	9
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	9
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	9
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	9
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		9
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		10
5.1	Información general del contrato		10
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		10
5.3	Informes especialistas y profesionales		11
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		11
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		11
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	11
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	11
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	11
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	11
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	11
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		11
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	11
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	11
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	11
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	11
7	**Conclusiones y recomendaciones**		12
8	**Anexos**		13
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		13
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		13
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		13

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: Elias Jaimes Fernandez

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 1

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña **PERIODO MES:** Febrero de 2024

CONVENIO No.: 3967

OBJETO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: Junta de accion comunal de la vereda Boca de la Cienega,Morales

PLAZO INICIAL: 0,5 meses
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 3 meses

VALOR INICIAL : $ 202.970.546,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 202.970.546,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Elias Jaimes Fernandez

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	
Estructuras	Alcantarillas	Und	
	Muro de Contención	m^3	
Mantenimiento		Ml	
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	0	0
Estructuras	Alcantarillas	Und	0	0
	Muro de Contención	m^3	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 151.939.121,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.558.174,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.473.251,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 201.970.546,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 8.457.698,00	$ 8.457.698,00
VALOR EJECUTADO	$ -	

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CUENTA DE COBRO N°1
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENEGA
NIT 900952320-0
DEBE A:
LUIS DAVID SILVA GOMEZ
C.C 1098776615 DE BUCARAMANGA
LA SUMA DE
$1.500.000,00.
POR CONCEPTO DE:
SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA.

Cuentas de cobro tramitadas



Solicitud de informe topografico y Ajustes a Estudios y Diseños



Socializacion en casa de la cultura Gamarra,Cesar



Cuentas de cobro tramitadas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesion 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **Ocaña**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Febrero de 2024 **PROYECTO:** Mejoramiento vial en el marco del Programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, Municipio Morales

CONTRATO No. 3967 **CONTRATISTA:** JAC de la vereda Boca de la Cienaga

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4870 **INTERVENTORÍA:** Ingenius Solutions S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):


OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Convenio en etapa de revisión y ajustes a los de estudios y diseños

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.



Firma
Nombre: RUTH ESTER JIMENEZ GONZALEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-422009



Firma
Nombre: Jonathan Rico Arteaga
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 3

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No: 3967 **CONTRATISTA:** Junta de accion comunal de la Vereda Boca de la Cienega,Morales

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero de 2024 **PROYECTO:** Mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, municipio Morales, Bolivar

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S.

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

Convenio en etapa de revisión y ajustes a los de estudios y diseños

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RUTH ESTER JIMENEZ GONZALEZ
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-422009

Firma
Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 4

Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 2

UNIDAD EJECUTORA Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 3967 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

VIA INTERVENIDA: VIA EL PASO DE BOCA DE LA CIENEGA

CONTRATISTA: JAC de la vereda Boca de la Cienaga

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S. **CONTRATO No.** 4870 del 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	15 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 202.970.546,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE REANUDACIÓN:	15 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 202.970.546,00
PLAZO (MESES):	4 meses						
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO	30 (Día)	DE	4 (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	Compañía Mundial de Seguros S.A	860037013-6	71781665	30/01/2024	$ 1.407.535,44	$ 330.162,64	$ 1.737.698,08
2	Sobeida Franco Hernandez	26.767.921	158	8/02/2024	$ 350.000,00	$ -	$ 350.000,00
3	Sobeida Franco Hernandez	26.767.921	cuenta de cobro 002	31/01/2024	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00
4	Fabriany M. Ascanio Contreras	1.091.653.811		31/01/2024	$ 3.426.300,00	$ 803.700,00	$ 4.230.000,00
5	Mirenny Diaz Diaz	45743849-8		13/02/2024	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
6	Luis David Silva Gomez	1.098.776.615		7/02/2024	$ 1.166.400,00	$ 273.600,00	$ 1.440.000,00
8				TOTAL	$ 7.050.235,44	$ 1.407.462,64	**$ 8.457.698,08**

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 7.050.235	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 7.050.235
VALOR IVA	$ 1.407.463	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 1.407.463
TOTAL PAGOS	$ 8.457.698	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 8.457.698

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: Sobeida Franco Hernández
Nombre: Sobeida Franco Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: Eudomar Paez Torrado
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma:
Nombre: Ruth Ester Jimenez Gonzalez
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 68202-422009

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 1 de 2 05/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** Febrero de 2024

ACTA FINAL ☐

CONVENIO No : 3967 (Indique número y año)

OBJETO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JAC de la vereda Boca de la Cienaga (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023 INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S

PLAZO INICIAL: 0,5 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 201.970.546,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**:

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 201.970.546,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
			LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml		$ 78.907	$ -				$ -		
			CONSTRUCCION PLACA HUELLA								$ -		
	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	m^3		$ 30.671	$ -				$ -		
	320-13		Subbase Granular Clase C	m^3		$ 222.630	$ -				$ -		
	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m^3		$ 833.601	$ -				$ -		
	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m^3		$ 603.462	$ -				$ -		
	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg		$ 7.139	$ -				$ -		
			CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES								$ -		
	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	m^3	245	$ 30.671	$ 7.514.395				$ -		
	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	m^3	11	$ 551.069	$ 6.061.759				$ -		
	610-13		Relleno para Estructuras con Recebo	m^3	24	$ 76.973	$ 1.847.352				$ -		
	673-13		Geotextil Tipo no tejido	m^2	126	$ 8.812	$ 1.110.312				$ -		
	681 - 13		Gaviones de malla de alambre de acero	m^3	444	$ 285.331	$ 126.686.964				$ -		
	674 -13		Dren horizontal 4"	ml	82	$ 51.211	$ 4.199.302				$ -		
			ITEMS NO PREVISTOS								$ -		
	673-13	N.P.1	Material Granular Drenante	m^3	33	$ 131.398	$ 4.336.134				$ -		
			SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA				**$ 151.756.218**						
*			PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)				$ 4.558.174						
*			GASTOS ADMINISTRATIVOS				$ 45.472.520				$ 8.457.698		
*			**VALOR ESTIMADO CONVENIO**				$ 201.786.912						
*													
*													
*													
*			**VALOR TOTAL**										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 2 de 2 05/03/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 7.050.235,00	$ 1.407.463,00	$ 8.457.698
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ 7.050.235

VALOR PRESENTE ACTA: $ 8.457.698 **VALOR EN LETRAS:** Ocho millones cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos noventa y ocho M/Cte

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Sobeida Franco Hernández
Nombre: Sobeida Franco Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: Ruth Ester Jimenez Gonzalez
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profesional No.: 68202-422009NTS

Firma:
Nombre: Eudomar Paez Torrado
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 5
Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No: 3967 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA,MORALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero de 2024 **PROYECTO:** Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius Solutions S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			696
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: RUTH ESTER JIMENEZ GONZALEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-422009

Firma
Nombre: Jonathan Rico Arteaga
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 6
Resumen Ensayos de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 4/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña,Norte de Santader

CONVENIO No.: 3967 **CONTRATISTA:** JAC de la vereda Boca de la Cienaga, Municio de Morales,Bolivar

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero de 2024 **PROYECTO:** Mejoramiento vial en el marco del Programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, Municipio Morales

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius Solutions S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: RUTH ESTER JIMENEZ GONZALEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-422009



Firma
Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo7

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4 (Día) 3 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONVENIO No. 3967

CONTRATISTA: Junta de accion comunal de la vereda Boca de la Cienega,Morales

OBJETO DEL CONTRATO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,5 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 202.970.546,00

VALOR ACUMULADO: $ 202.970.546,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4870 del 2023

INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.594.110,00	18	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.148.528,00	18	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.891.164,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290873

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	18	10	2023	31	12	2023
Patronal,Contratista,Subcontratista,Vehiculos Propios y No propios		$ 232.000.000,00	18	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071383

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.594.110,00	31	12	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.148.528,00	31	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.891.164,00	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290873

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	18	10	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB–100071383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8
Informe Semanal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, municipio Morales, Bolivar

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña SEMANA No.: 4 del 2/02/2024 al 8/02/2024 Último Informe Semanal SI □ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

136,5 m3 DE GAVIONES

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 136,5m3 de gaviones, en la vereda Boca de la Cienaga, municipio de Morales.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC de la vereda Boca de la Cienaga		
CONVENIO No.	3967	VALOR INICIAL:	$ 202.970.546,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202.970.546,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19.908.700,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 202.970.546	$ 202.970.546		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 202.970.546	$ 202.970.546		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 15.016.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 100.983.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 151.939.121,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades y avance del proyecto se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños,as

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.853.957,87	9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15.016.805,20	13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.853.957,87	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.200.000,00	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via el paso de Boca de la Cienega
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

De manera reiterada se solicita al presidente de la Junta de accion comunal entregar topogarfia y estudios previos,asi como las respectivas cuentas de cobro de las polizas y topografia para su revisión y aprobación, se dan recomendaciones para la elaboración de uniformes de personal de obra y para valla publicitaria del contrato, así mismo se aclaran dudas y se acuerdan plazos para entregas. Posterior a la reunion se envia correo electronico con informacion adicional e importante en lo correspondiente a los documentos necesarios para avanzar en la correcta ejecución de los uniformes y la valla en el marco del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se espera la entrega de la documentacion solicitada y se estima realizar seguimiento a la topografía y ajuste a los estudios y diseños, asi como la revision de cuenta de cobro de las polizas para su respectivo pago y la generacion de firma de chequera con autorizacion de giro de recursos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


Ajustes a Estudios y diseños	Programado
	Ejecutado
Placa huella	Programado
	Ejecutado
alcantarillas	Programado
	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Evidencia envio correo con diseño de las vallas



Correo con solicitud de entrega de Topografia y estudios previos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Solicitud de entrega inmediata mediante oficiio el dia 07/02/2024 de la documentación topográfica correspondiente; la información detallada sobre la revisión y/o ajuste a estudios y diseños. Solicitud de las las cuentas de cobro correspondientes a la revisión y/o ajuste a estudios y diseños, así también como la topografia, la actualización de pólizas, y de igual manera dela compra de dotación.

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Jonathan Rico Arteaga

Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, municipio Morales, Bolivar

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña SEMANA No.: 5 del 9/02/2024 al 15/02/2024 Último Informe Semanal SI □ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

136,5 m3 DE GAVIONES

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 136,5m3 de gaviones, en la vereda Boca de la Cienaga, municipio de Morales.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC de la vereda Boca de la Cienaga		
CONVENIO No.	3967	VALOR INICIAL:	$ 202.970.546,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202.970.546,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19.908.700,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 202.970.546	$ 202.970.546		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 6.717.698		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 202.970.546	$ 196.252.848		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 21.216.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 94.783.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 151.939.121,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 6.717.698,00	3,30%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.717.698,00	3,30%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades y avance del proyecto se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños,as

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21.707.915,74	19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.216.805,20	18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.853.957,87	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.200.000,00	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Topografía	GL	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via el paso de Boca de la Cienega

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Revision y aprobacion de ajustes y estudios previos,asi como las respectivas cuentas de cobro de las polizas, estudios previos,Auxilio de transporte al presidente de la J.A.C y valla publicitaria, todas son aprobadas y autorizadas para pago inmediato, se dan recomendaciones para la elaboración de uniformes de personal , así mismo se aclaran dudas y se acuerdan plazos para entregas. Se realiza solicitud de informe de topografia con el fin de dar inicio a actividades de obra lo mas pronto posible.Se acuerda compromiso de entrega y la generacion de las cuentas de cobro faltantes.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se espera la entrega de la documentacion solicitada y se estima realizar seguimiento a la topografía , asi como la revision de cuenta de cobro de la topografia,examenes medicos y caja menor para su respectiva de firma de chequera con autorizacion de giro de recursos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella		Programado
		Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

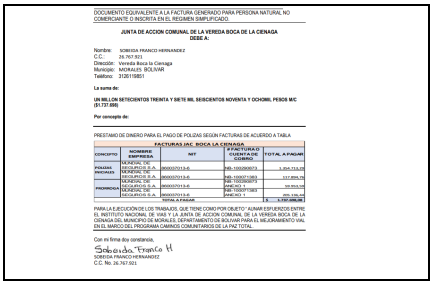

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA
DEBE A:

Nombre: SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
C.C.: 26.767.921
Direccion: Vereda Boca la Cienaga
Municipio: MORALES BOLIVAR
Telefono: 3126119851

La suma de:

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHOMIL PESOS M/C ($1.737.690)

Por concepto de:

PRESTAMO DE DINERO PARA EL PAGO DE POLIZAS SEGÚN FACTURAS DE ACUERDO A TABLA

FACTURAS JAC BOCA LA CIENAGA


CONCEPTO	NOMBRE EMPRESA	NIT	# FACTURA O CUENTA DE COBRO	TOTAL A PAGAR
POLIZAS MORALES	MUNDIAL "SE" SEGUROS S.A.	8600370313-6	RBL-1000960673	1.204.713,00
	MUNDIAL "SE" SEGUROS S.A.	8600370313-6	RBL-1000912953	117.809,00
PROYINCCA	MUNDIAL "SE" SEGUROS S.A.	8600370313-6	RBL-1000912953 AMCO0-3	59.916,00
	MUNDIAL "SE" SEGUROS S.A.	8600370313-6	AMCO0-3	355.252,00
			TOTAL A PAGAR	$ 1.737.690,00

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE TIENE COMO POR OBJETO " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIÉNAGA DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Con mi firma doy constancia,

SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
C.C. No. 26.767.921

Cuenta de cobro de polizas del convenio



Monteles - Bolivar, febrero 08 de 2024

CUENTA DE COBRO No. 004

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO.

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA
DEBE A:

Nombre: SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
C.C.: 26.767.921
Dirección: Vereda Boca la Cienaga
Municipio: MORALES BOLIVAR
Telefono: 3126119851

La suma de:

TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C ($350.000)

Por concepto de:

PRÉSTAMO DE DINERO PARA EL PAGO DE VALLA PUBLICITARIA DEL CONVENIO, QUE TIENE COMO POR OBJETO " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Con mi firma doy constancia,

SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
C.C. No. 26.767.921

Cuenta de cobro Valla Publicitaria



JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA DEL MUNICI MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

NIT. NIT. 900.055.260-0

DEBE A:

FABRIANY M. ASCANIO CONTRERAS
CC. 1.095.653.851 de Ocaña Norte de Santander

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000)

por concepto Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños, para el convenio No. 3967 VEREDA BOCA DE LA CIENAGA DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL

Favor consignar a la siguiente cuenta de ahorros N° 05328600892000002052 de Banc nombre de Fabriany M. Ascanio Contreras.

Fabriany M. Ascanio C.

FABRIANY M. ASCANIO CONTRERAS
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS
CC. 1.095.653.851

CUENTA DE COBRO No. 002

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO.

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA
DEBE A:

Nombre: SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
C.C.: 26.767.921
Direccion: Vereda Boca la Cienaga
Municipio: MORALES BOLIVAR
Telefono: 3126119851

La suma de:

CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C ($400.000)

Por concepto de:

PRÉSTAMO DE DINERO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MOTOTAXIS PARA LA MOVILIDADDEL REPRESENTANTE LEGAL EN LA RUTINA DE LA VEREDA BOCA LA CIENAGA A MORALES, CAMARA Y VUELVA BOCA DURANTE EL MES DE ENERO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE TIENE COMO POR OBJETO " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIÉNAGA DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Con mi firma doy constancia,

SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
C.C. No. 26.767.921

Anexo soporte del pago

Cuentas de cobro Auxilio de transporte y Estudios y Diseños

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Solicitud de las las cuentas de cobro correspondientes a la toprafia,examenes medicos y dotacion de personal.

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Jonathan Rico Arteaga

Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 23/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, municipio Morales, Bolivar

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña SEMANA No.: 6 del 16/02/2024 al 22/02/2024 Último Informe Semanal SI □ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

444 m3 DE GAVIONES

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 444 m3 de gaviones, en la vereda Boca de la Cienaga, municipio de Morales.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC de la vereda Boca de la Cienaga		
CONVENIO No.	3967	VALOR INICIAL:	$ 202.970.546,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202.970.546,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19.908.700,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 202.970.546	$ 202.970.546		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 8.457.698		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 202.970.546	$ 194.512.848		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 27.416.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 88.583.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 151.939.121,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.740.000,00	0,86%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.457.698,00	4,17%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades y avance del proyecto se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños,as

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 32.561.873,61	28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.416.805,20	24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.853.957,87	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.200.000,00	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Topografía	GL	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via el paso de Boca de la Cienega

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	latitud: 8° 20' 13.61"N	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Longitud: 73° 43' 8.51"O	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Revision y aprobacion de las cuentas de cobro de la topografia y caja menor,se dan recomendaciones para la elaboración de uniformes de personal , así mismo se aclaran dudas y se acuerdan plazos para entregas. Se realiza solicitud de puesta al dia en documentacion para dar inicio a actividades de obra lo mas pronto posible.Se acuerda compromiso de entrega y la generacion de las cuentas de cobro faltantes.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se espera la entrega de la documentacion solicitada , asi como la revision de cuenta de cobro de los examenes medicos para su respectiva de firma de chequera con autorizacion de giro de recursos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella		Programado
		Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Moreles Bolivar, febrero 13 de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
NIT. 900.595.268-0

DEBE A:

MIDENNY DIAZ DIAZ
NIT: 45.742.849-8


LA SUMA DE $300.000
(TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de: Suministro de papeleria

Atentamente,

MIDENNY DIAZ DIAZ
C.C. 45.742.849 de Moreles

Cuenta de cobro de caja menor



07-02-2024

CUENTA DE COBRO N°1

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENEGA

NIT 900995268-0

DEBE A:

LUIS DAVID SILVA GOMEZ

C.C 1098776615 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE

$1.500.000,00.

POR CONCEPTO DE:

SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA.

Atentamente:

LUIS DAVID SILVA GOMEZ

C.C 1098776615 DE BUCARAMANGA

CEL:3222010810

Cuenta de cobro de la Topografia

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Solicitud de las las cuentas de cobro correspondientes a examenes medicos y dotacion de personal.

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Jonathan Rico Arteaga

Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, municipio Morales, Bolivar

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña SEMANA No.: 7 del 23/02/2024 al 29/02/2024 Último Informe Semanal SI □
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Boca de la Ciénaga del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

444 m3 DE GAVIONES

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 444 m3 de gaviones, en la vereda Boca de la Cienaga, municipio de Morales.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JAC de la vereda Boca de la Cienaga		
CONVENIO No.	3967	VALOR INICIAL:	$ 202.970.546,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 202.970.546,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	Ingenius solutions S.A.S.		
INTEGRANTES:	Eudomar Paez Torrado		
CONTRATO No.	4870 del 2023	VALOR INICIAL:	$ 96.091.300,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 19.908.700,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 116.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 202.970.546	$ 202.970.546		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 8.457.698		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 202.970.546	$ 194.512.848		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 33.616.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 82.383.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 151.939.121,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.740.000,00	0,86%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.457.698,00	4,17%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades y avance del proyecto se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños,as

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43.415.903,46	37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 33.616.805,20	29%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.853.957,87	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.200.000,00	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Topografía	GL	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via el paso de Boca de la Cienega
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	latitud: 8° 20' 13.61"N	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Longitud: 73° 43' 8.51"O	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza seguimiento a los tramites de conformacion de las veeedurias y el comité operativo. Se lleva a cabo reunion con la interventoria el dia 24 de febrero con el fin de evaluar el estado actual del convenio quedando como compromiso conformar las veedurias e iniciar estudio de mercado y analisis del sector para suministro de materiales de obra con el fin de dar inicio oportuno a las actividades físicas de ejecucion a comienzos del mes de marzo. De igual manera se realiza comite tecnico con el ingeniero residente de la junta para acordar el compontente tecnico de los ajustes a estudios y diseños y formalizar el acuerdo de ambas partes en lo estimado finalmente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la entrega de programacion de obra en conjunto con el inicio de actividades de obra física,como lo son las actividades preliminares y el suministro de material de obra,de igual manera la conformacion de la veeduria y del comité operativo.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella		Programado
		Ejecutado
alcantarillas		Programado
		Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Reunion de seguimiento a avance de Convenios solidarios



InGenius SOLUTIONS

OFI-4070-2023-024

Ocaña, 27 de febrero del 2024

Señora
SOMEIDA FRANCO HERNANDEZ
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BOCA DE LA DANTA
juntadeaccioncomunalvereda@gmail.com
CORREGIMIENTO
MORALES- SOLCHAR

Referencia: Convenio Solidario No. 3967 de 2023

Asunto: Falta de Programa de Obra y Riesgo de Incumplimiento de Plazos

Cordial saludo,


Dado que en la fecha actual aún no hemos recibido el programa de obra correspondiente, Es imperativo señalar que el plazo contractual establecido vence el próximo 30 de abril de 2024. Esta situación nos genera preocupación debido al riesgo de incumplimiento de los plazos establecidos. Consideramos que la fecha límite para el inicio de las obras es el 1 de marzo para así poder cumplir con los plazos.

Solicitamos su pronta atención a este asunto, ya que un retraso en la entrega del programa de obra podría afectar significativamente nuestra capacidad para cumplir con los plazos establecidos. Estamos a su disposición para cualquier aclaración o información que pueda agilizar esta gestión de manera efectiva.

Atentamente,

Estefanny Rojas Torrado
Gerente de Proyectos
A.L. INGENIUS SOLUTIONS SAS

Solicitud de programacion de obra para inicio de actividades



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Entrega de programacion de obra,formalizacion en personeria de la veeduria y generacion de cuentas de cobro para autorizacion de recursos para material de obra.

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Jonathan Rico Arteaga

Matrícula Profesional No.: 121037-0508543 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 9
Equipo Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Febrero de 2024

PROYECTO: Mejoramiento vial en el marco del Programa caminos comunitarios para la paz, vereda Boca de la Cienaga, Municipio Morales

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4870 del 2023

INTERVENTORÍA: Ingenius Solutions S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3967

CONTRATISTA: JAC de la vereda Boca de la Cienaga

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICUO TIPO CAMIONETA	DUSTER DYNAMIQUE 2016	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOTOCICLETA	BAJAJ PULSAR NS160 FE 2023 PLACA NRH 45G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 10

Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 DEL 2023

INTERVENTOR: INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1-29 de febrero del 2024

PROYECTO: Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 43+000

CONVENIO No.: 3796-2023, 3825-2023, 3981-2023, 3967-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSI BOLIVAR; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA

NOMBRE ARL: POSITIVA SAS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	EUDOMAR PAEZ TORRADO	13.361.189	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.940.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	33%	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.	30	$ 135.100,0	V	NUEVA EPS	7919882152	$ 77.600,0				$ 77.600,00	$ -	$ -	
2	JONATHAN RICO ARTEAGA	1.003.196.883	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.700.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 188.000,0	V	SANITAS	7919882152	$ 108.000,0	COLPENSIONES	7919882152	$ 432.000,0	$ 108.000,00	$ -	$ -	
3	CONTRERAS JIMENEZ SINDY MARCELA	1.003.257.511	INSPECTORA SST	$ 1.200.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 90.500,0	V	NUEVA EPS CM	7919882152	$ 52.000,0	PORVENIR	7919882152	$ 208.000,0	$ 52.000,00			
4	REYES MARTINEZ RAFAEL DAVID	1.007.971.534	INSPECTOR	$ 1.200.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		16	$ 48.300,0	V	NUEVA EPS	7919882152	$ 27.800,0	PROTECCION	7919882152	$ 111.000,0	$ 27.800,00			
5	BACCA TELLEZ EDGAR FELIPE	1.065.916.155	INSPECTOR	$ 1.200.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		16	$ 48.300,0	V	NUEVA EPS	7919882152	$ 27.800,0	PROTECCION	7919882152	$ 111.000,0	$ 27.800,00			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 2.320.000,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 19/3/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO *
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firma
Firmado digitalmente por : ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 11
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 4870 DEL 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 1-29 de febrero del 2024 **PROYECTO:** Aquaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 43+000

CONVENIO No: 3796-2023, 3825-2023, 3981-2023, 3967-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSI BOLIVAR; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1357323	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	Contrato principal	$96.091.300,00	$ -
2023	1398423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	ADICIONAL 1	$19.908.700,00	$ -
			TOTAL			$ 116.000.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 116.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1357323 de 11/12/2023	$ -	$ 96.091.300,00		CONTRATO PRINCIPAL
								1398423 de 19/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ADICIONAL
1	**15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**	$ -	$ -	$ -				1357323 de 11/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ACTA EN CERO
2	**1 AL 31 DE ENERO DEL 2024**	$ 7.409.080,00	$ 1.407.725,20	$ 8.816.805,20				1357323 de 11/12/2023	$ 8.816.805,20	$ 107.183.194,80	RADICADO 963 DE FECHA 02 MARZO 2024	
3	**1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**	$ 20.853.040,00	$ 3.962.077,60	$ 24.815.117,60				1357323 de 11/12/2024	$ 33.631.922,80	$ 82.368.077,20		PRESENTE TRÁMITE
	TOTALES	**$ 28.262.120,00**	**$ 5.369.802,80**	**$ 33.631.922,80**					**$ 33.631.922,80**	**$ 82.368.077,20**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 21.929.120,00	$ 4.166.532,80	$ 26.095.652,80
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 6.333.000,00	$ 1.203.270,00	$ 7.536.270,00
*			
VALOR TOTAL	$ 28.262.120,00	$ 5.369.802,80	$ 33.631.922,80

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12
Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023

INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para los convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y las organizaciones de acción comunal de los municipios de arenal, Norosi y morales del departamento del Bolívar, en la dirección territorial Ocaña para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,5 mes

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/02024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 96.091.300,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaime Fernandez

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8%	$ 9.609.130,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17%	$ 19.218.260,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	25%	$ 28.827.390,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B–100043670

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 12/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.600.000,00	6	12	2023	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.200.000,00	6	12	2023	31	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 34.800.000,00	31	12	2023	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043670

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/12/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13

Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE** **RELACION DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA 4/03/2024

RELACION DE CORRESPONDENCIA

I. INFORMACIÓN GENERAL

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFI-4870-2023-006	16/01/2024	JAC VEREDA BOCA DE LA CIENEGA	Actualizar Polizas conforme a la prorroga N°1 al convenio
OFI-4870-2023-007	18/01/2024	JAC VEREDA BOCA DE LA CIENEGA	Solicitud de hoja de vida del personal calificad: hojas de vida ingeniero residente y contador publico para el desarrollo del convenio solidario de la referencia.
OFI-4870-2023-011	29/01/2024	JAC VEREDA BOCA DE LA CIENEGA	Aprobación hojas de vida ingeniero residente y contador publico para el desarrollo del convenio solidario de la referencia.
OFI-4870-2023-012	7/02/2024	JAC VEREDA BOCA DE LA CIENEGA	Solicitud Urgente de Documentación Correspondiente al Convenio para el inicio de ejecución de las obras
OFI-4870-2023-017	15/02/2024	PERSONERIA MUNICIPAL MORALES	Conformación Veedurías Convenio Solidario No. 3967 de 2023
	26/02/2024	JAC VEREDA BOCA DE LA CIENEGA	Aprobacion parcial de ajustes a estudios y diseños
OFI-4870-2023-024	27/02/2024	JAC VEREDA BOCA DE LA CIENEGA	Falta de Programa de Obra y Riesgo de Incumplimiento de Plazos

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 152192316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 14
Registro fotográfico

InGenius

SOLUTIONS

Ocaña, 26 de febrero del 2024

Señora
SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENEGA
veredabocadelacienega@gmail.com
sobefranher2020@gmail.com
MORALES-CESAR

Asunto: Aprobación Parcial Ajustes a los Estudios y Diseños

Cordial Saludo,

Con toda atención me permito indicarle que, revisados los Ajustes a los Estudios y Diseños por el grupo de especialistas de esta firma interventora el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, estos emiten concepto favorable de aceptación, manifestando que se ajustan según lo indicado en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documento base en la ejecución del proyecto.

Con base en lo anteriormente expuesto, esta Interventoria emite su concepto de aprobación parcial a los ajustes a estudios y diseños a partir de la fecha del presente.

Atentamente,

Eudomar Páez Torrado
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

InGenius

SOLUTIONS

OFI-4870-2023-012

Ocaña, 07 de febrero del 2024

Señora
SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOCA DE LA CIENEGA
veredabocalacienega@gmail.com
3126119851
MORALES- BOLIVAR

Referencia: Convenio Solidario No. 3967 de 2023

Asunto: Solicitud Urgente de Documentación Correspondiente al Convenio para el inicio de ejecución de las obras

Cordial Saludo,

Nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar de manera inmediata la entrega de los siguientes documentos e información relacionada con el convenio:

Solicitamos la entrega inmediata de la documentación topográfica correspondiente. Necesitamos la información detallada sobre la revisión y/o ajuste a estudios y diseños.

Por favor, envíenos las cuentas de cobro correspondientes a la revisión y/o ajuste a estudios y diseños, así también como la topografía, la actualización de pólizas, y de igual manera de la compra de dotación.

Agradecemos de antemano su pronta atención a esta solicitud, ya que la información mencionada es crucial para el inicio de las actividades de obra, la JAC debe realizar la entrega a esta interventoría.

Quedamos a la espera de recibir dicha documentación a la mayor brevedad posible. En caso de cualquier pregunta o aclaración adicional, no dude en contactarnos.

InGenius

SOLUTIONS

OFI-4870-2023-017

Ocaña, 15 de febrero del 2024

Señor(a)
PERSONERO MUNICIPAL
personeriamorales@personeria-moralesbol.gov.co
5698162
MORALES- BOLIVAR

Asunto: Conformación Veedurías Convenio Solidario No. 3967 de 2023

Cordial Saludo,

Con toda atención me permito indicarle que el Instituto Nacional de Vías - INVIAS suscribió el convenio solidario No. 3967 del 2023 con la junta de acción comunal de la vereda BOCA DE LA CIENEGA, el cual se encuentra actualmente en etapa de ejecución.

Con base en lo anterior y dado que el citado convenio cuenta con un factor social, el cual es muy importante para el desarrollo del proyecto, me permito solicitar su valioso apoyo como personero municipal a fin de llevar a cabo la conformación de veeduría ciudadana.

Para lo pertinente, se adjunta a la presente acta de constitución de veeduría ciudadana.

Agradezco la atención prestada, quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente,

Eudomar Páez Torrado
C.C. 13.361.189
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

InGenius

SOLUTIONS

OFI-4870-2023-024

Ocaña, 27 de febrero del 2024

Señora
SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ
PRESIDENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOCA DE LA CIENEGA
veredabocadelacienega@gmail.com
3126119851
MORALES- BOLIVAR

Referencia: Convenio Solidario No. 3967 de 2023

Asunto: Falta de Programa de Obra y Riesgo de Incumplimiento de Plazos

Cordial saludo,

Dado que en la fecha actual aún no hemos recibido el programa de obra correspondiente. Es imperativo señalar que el plazo contractual establecido vence el próximo 30 de abril de 2024. Esta situación nos genera preocupación debido al riesgo de incumplimiento de los plazos acordados. Se considera que la fecha límite para el inicio de las obras es el 1 de marzo para así poder cumplir con los plazos.

Solicitamos su pronta atención a este asunto, ya que un retraso en la entrega del programa de obra podría afectar significativamente nuestra capacidad para cumplir con los plazos establecidos en el contrato. Apreciamos su comprensión y cooperación para abordar esta cuestión de manera efectiva.

Atentamente,

Eudomar Páez Torrado
C.C. 13.361.189
R.L. / INGENIUS SOLUTIONS SAS

Anexo 15
Bitácora del mes correspondiente

008

Ing Residente Interventoria

31 Enero 2024.
Convenio N= 3967
Contratista: J.A.C Vereda Boca de la Ciruega
Interventoria: Ingenius Solutions. S A S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra:
Actividades: Seguimiento y Gestion Documental
Hora finalizacion: 5:00 pm
Observacion Personal SST.

Ing Residente Interventoria

01 Febrero de 2024.
Convenio N= 3967
Contratista: J.A.C Vereda Boca de la Ciruega
Interventoria: Ingenius Solutions. S A S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra:
Actividades: Seguimiento y Control a Gestion Documental Solicitud topografia y ajustes a estudios y Diseños Viales
Hora finalizacion: 7:00 pm
observacion Personal. SST.

Ing. Residente Interventoria

02 Febrero de 2024.
Convenio N= 3967
Contratista: J.A.C Vereda Boca de la Ciruega
Interventoria: Ingeniur Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado.
Personal en Obra:
Actividades: Se genero polizas actualizadas de Prorroga del Proyecto para pronto pago por parte de la junta, Gestion documental
Hora Finalizacion: 5:00 pm
Observacion Personal SST: NO

Ing. Residente Interventoria

03 Febrero de 2024.
Convenio N= 3967
Contratista: J.A.C Vereda Boca de la Ciruega
Interventoria. Ingeniur Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am.
Clima: Soleado
Personal en obra:
Actividades: Aprobacion cuenta de cobro polizas y autorizacion de pago, gestion documental, apoyo y seguimiento a la junta
Hora de Finalizacion: 12:00 m

Ing. Residente Interventoria

05 Febrero de 2024.
Convenio N= 3967
Contratista: J.A.C Vereda Boca de la Ciruega
Interventoria: Ingeniur Solutions S.A.S
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra

Actividades: Autorización de Pagos de cuentas de cobro aprobadas a la fecha, Solicitud. Hoja de vida de Maestro de obra; Documentación contrato.
Hora Finalización: 5:00 pm

Ing. Residente interventoría

06 Feb 2024.
Convenio Nº 3967
Contratista: T.A.C Vereda Boca de la Ciénaga
Interventoría: Ingenius Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra:
Actividades: Aprobacion Hoja de vida Maestro de obra, Solicitud Estudios y Diseños previos, Entrega Información de diseño de valla publicitaria y uniformes
Hora finalizacion: 5:00 pm

Ing. Residente Interventoría

07 Feb 2024.
Convenio Nº 3967
Contratista: T.A.C Vereda Boca de la Ciénaga
Interventoría: Ingenius Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra.
Actividades: Solicitud mediante Correo electronico de obras Complementarias del convenio. Cuentas de Cobro y Estudios

Ing. Residente Interventoría

08 Feb 2024
Convenio N° 3967
Contratista: J.A.C Veredas Boca de la Ciénaga
Interventoría: Ingenius Solutions S.A.S.
Hora Inicio: 7:00 am
Clima Soleado:
Personal en Obra:
Actividades: Recepción Cuentas de Cobro y estudios Previos, Gestión documental, Seguimiento y apoyo a la supervisión
Hora Finalización: 5:00 pm

Ing. Residente Interventoría

09 Feb 2024
Convenio N° 3967
Contratista: J.A.C Veredas Boca de la Ciénaga
Interventoría: Ingenius Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am.
Clima: Soleado
Personal en obra.
Actividades: Actas mediante firma a chequeo de pago de polizas, Ajustes a Estudios y diseños, Auxilio de transporte para el seguimiento y valla publicitaria.
Hora finalización: 5:00 pm

Ing. Residente Interventoría

10 Feb 2024
Convenio N° 3967
Contratista: J.A.C Veredas Boca de la Ciénaga
Interventoría: Ingenius Solutions S.A.S
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal en obra:

Actividades. Acompañamiento y Seguimiento con gestion documental a la junta, Solicitud topografia,
Hora finalizacion: 5:00 pm.

Ing. Residente Interventoria

12 Feb 2024
Convenio Nº 3967
Contratista: J.A.C Boca de la Cienaga
Interventoria: Ingenius Solutions. S.A.S
Clima: Soleado
Hora Inicio: 7:00 am
Personal en obra:
Actividad: Seguimiento y apoyo a la junta Gestion Documental
Hora finalizacion: 5:00 pm

Ing. Residente Interventoria

13 Feb 2024
Convenio Nº 3967
Contratista: J.A.C Boca de la Cienaga
Interventoria. Ingenius Solutions S.A.S
Clima: Soleado
Hora Inicio: 7:00 am
Personal en obra:
Actividades: Seguimiento y apoyo a la junta, Gestion Documental
Hora finalizacion: 5:00 pm

Ing. Residente Interventoria

14 Feb 2024.
Convenio Nº 3967
Contratista: T.A.C. Boca de la Ciénaga
Interventoría: Ingenieros Solutions S.A.S
Clima: Soleado
Hora Inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Actividades: Solicitud Urgente topografía base del Proyecto para su pronta revisión, apoyo a Cuentas de cobro por generar
Hora de Finalización: 5:00pm

15 Feb 2024.
Convenio Nº 3967
Contratista: T.A.C Boca de la Ciénaga
Interventoría Ingenieros Solutions. S.A.S
Clima: Soleado
Hora Inicio: 7:00 am
Personal en obra:
Actividades: Se retoma Solicitud de topografía, Cuentas de cobro de botación, caja menor y examenes de ingreso para personal de obra, se Solicita la creación de medidores para inicio de Obra.
Observaciones del Personal SST.

Ing. Residente Interventoría

16 Feb 2024.
Convenio Nº 3967
Contratista: T.A.C Boca de la Ciénaga
Interventoría: Ingenieros Solutions. S.A.S
Clima: Soleado

014

Hora Inicio: 7:00 am
Personal en obra: NO
Actividades: Solicitud Cuentas de Cobro Pendientes, inmediatez en entrega de ajustes a estudios y Diseños
Hora Finalizacion: 5:00 pm.
Observaciones Personal SST: NO

Ing. Residente Interventoría

17 Feb 2024
Convenio N° 3967
Contratista: J.A.C Boca de la Quebrada
Interventoría: Ingenius Solutions. SAS
Clima: Soleado
Hora Inicio: 7:00 am
Personal en Obra: NO
Actividades: Apoyo y Seguimiento en gestión tecnica y documental a la J.A.C
Hora finalización: 12:00 m
Observaciones Personal SST. NO

Ing. Residente Interventoría

14 Feb 2024.
Convenio N° 3967
Contratista: J.A.C Boca de la Quebrada
Interventoría: Ingenius Solutions S.A.S
Clima: Soleado
Hora Inicio: 7:00 am.
Personal en obra: NO
Actividades: Revision de Documentación: Topografia y Ajustes a Estudio y Diseños Pavos

Hora finalización: 5:00 pm
Observaciones Personal SST: NO.

Ing. Residente Interventoría

20 Feb 2024.
Convenio N°: 3967.
Contratista.: J.A.C Boca de la Ciénaga
Interventoría: Ingenius Solutions S.A.S
Clima: Soleado
Hora: 7:00 am.
Personal en obra: NO.
Actividades: Revisar y Aprobación cuentas de cobro, autorización de pagos, se autorizan pago. mediante orden de pago de: Botellas, Exámenes medicos, Topografía, Valla publicitaria, Auxilio de transporte y Polizas.
Hora Finalización: 5:00 pm

Ing. Residente Interventoría

21 Feb 2024.
Convenio N° 3967
Contratista: J.A.C Boca de la Ciénaga
Interventoría: Ingenius Solutions. S.A.S
Clima: Soleado
Hora: 7:00 am
Personal en obra: NO
Actividades: Seguimiento y Control a ajuste a estudios y Diseños para su respectiva autorización
Hora Finalización: 5:00 pm

Ing. Residente Interventoría

22 Feb 2024
Convenio Nº 3967
Contratista: J.A.C Vereda Boca de la Ciénega
Interventoría: Ingenius Solutions SAS
Clima: Soleado
Hora Inicio: 7:00 am
Personal en Obra: NO
Actividades: Gestión documental, apoyo y seguimiento en temas técnicos y administrativos a la junta.
Hora Finalización: 5:00 pm

Ing. Residente interventoría

23 Feb 2024.
Convenio Nº 3967.
Contratista: J.A.C Vereda Boca de la Ciénega.
Interventoría: Ingenius Solutions S.A.S
Clima: Soleada
Hora Inicio: 7:00 am
Personal en Obra: NO
Actividades: Gestión documental, actividades seguimiento residente hes entrega parcial de ajustes de orfeolos y diseños.

Ing Residente interventoría

24 Feb 2024.
Convenio Nº 3967.
Contratista: J.A.C Vereda Boca de la Ciénega
Interventoría: Ingenius Solutions
Clima: Soleado
Hora Inicio: 7:00 am
Personal en Obra: NO

Actividades: Reunion en Casa de la cultura, Bamana, cesar, Se realizo Socializacion de aspectos Sociales como la conformacion de las veedurias y los comites operativos, así como se hace seguimiento a temas tecnicos para avance de obra, queda compromiso de la creacion de las veedurias y a la espera de entrega definitiva de ajustes a estudios y diseños.

Hora finalizacion: 12:00 m

Ing Residente Interventoria

26 Feb 2024.

Consecutivo Nº 3967

Contratista: J.A.C Vereda Boca de la Ciruga

Interventoria: Ingenieros Solutions. S.A.S

Clima: Soleado

Hora inicio: 7:00 am

Personal en obra: NO.

Actividades: Entrega final de ajustes a estudios y diseños de parte de la interventoria a la junta, aprobados y firmados presencialmente, se proyecta mesa de trabajo con ingeniero residente de obra para aprobacion de nuevo componente presupuestal

Hora finalizacion: 5:00 pm

Ing Residente Inte..

27 Feb 2024.

Consecutivo Nº 3967

Contratista: J.A.C Vereda Boca de la Ciruga

Interventoria: Ingenieros Solutions. S.A.S

Clima: Soleado

Hora Inicio: 7:00 am

Personal en obra: NO

Actividades: Seguimiento y apoyo a estimacion de cantidades de obra, se solicita mediante oficio la programacion de obra y se espera punto inicio de actividades por parte de la Interventoria

Hora finalización: 5:00 pm

Ing Residente Interventoría

28 Feb 2024
Convenio Nº 3967
Contratista: J.A.C Vereda Boca de la Ciénaga
Interventoría: Ingenius Solutions. SAS
Clima: Soleado
Hora inicio: 7:20 am
Personal en Obra: NO
Actividades: Se lleva a cabo comité técnico de obra entre ingenieros residentes de obra e interventoría, se registra acta 001, se deja contemplado revisión a componente presupuestal del convenio con sus precios unitarios y cantidades finales ajustadas al alcance presupuestal del convenio, se fijan compromisos como la programación de Obra. y el mismo de calculo y cotizaciones de materiales de obra.

29. Feb. 2024.
Convenio Nº 3967
Contratista: J.A.C Vereda Boca de la Ciénaga
Interventoría: Ingenius Solutions. S.A.S
Clima: Soleado
Hora Inicio: 7:00 am
Personal en Obra: NO
Actividades: Se adelanta programación de obra, así como calculo de materiales de Obra, para dar inicio a la ejecución física, se solicita creación de vinculos y cuentas de cobro para gestionar los pagos de compra de materiales y gastos operativos.
Hora finalización: 5:00 pm.

Ing. Residente Interventoría
