
SOLUTIONS

INFORME MENSUAL N°2

CONVENIO No. 4788 DE 2023: "Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de Las Pailas del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total."

PERIODO: 1 a 31 de Marzo de 2024

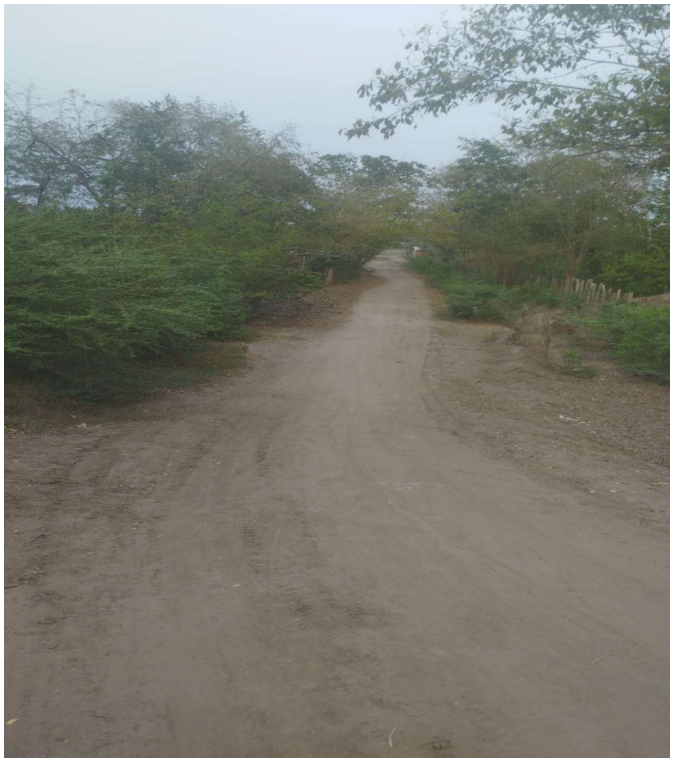

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4871 DE 2023

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Gamarra, Abril de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 5
2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 5
2.4 Características Técnicas del Proyecto 6
3. Información convenio solidario....7
3.1 Información General del convenio 7
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 7
3.3 Seguimiento ítems no previstos 7
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 7
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA....7
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 7
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 7
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 8
***4.4* Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio** 8
4.5 Estado General del Tiempo 8
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 8
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 8
4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 8
4.10 Otros documentos seguimiento mensual: 8
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
5.1 Información general del contrato 9
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 9
5.3 Informes especialistas 9
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 9
5.5 Información otros programas y aplicativo 9
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 10
6.1 Equipo Contrato de Interventoría 10
6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 10
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 10
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 10
6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 10
6.7 Otros documentos seguimiento mensual 10
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....11

8. ANEXOS 12

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 12

8.2. Registro fotográfico.....12

8.3. Bitácora del mes correspondiente: 12

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Anexo 4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

Anexo 5 Estado General del Tiempo

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Anexo 8 Informe Semanal

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

A través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total se avanza en el objetivo de mejorar el tránsito por las vías terciarias del país. Es así como gracias a la firma de estos nuevos convenios solidarios en esta zona del departamento de Bolivar que benefician a comunidades del sur del Bolívar, se invertirán en kilómetros de vías terciarias para su mejoramiento y mantenimiento.

El gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total destinó recursos para el desarrollo del programa que ejecutan los organismos y/o juntas de acción comunal dentro del marco de la ley.

Las intervenciones en estos caminos veredales y comunitarios se basan en mejoramientos de vías mediante construcción de placa huella, mantenimiento rutinario de obras de drenaje y construcción de elementos de estabilización de taludes, entre otros.

Este programa es un vehículo para activar la participación comunitaria en todo el territorio nacional, jalonando el desarrollo local y así aportar en el propósito de encontrar la justicia social, ambiental y económica de los colombianos de la ruralidad.

En el siguiente informe se encuentra toda la información concerniente en cuanto al ámbito administrativo, técnico, financiero y la información que permite conocer el estado y avance del convenio solidario del mes de marzo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto a ejecutar se encuentra localizado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Bolívar, en el corregimiento de Las Pailas, se tiene como punto de referencia inicial en la coordenada 8°15'5.49"N 73°45'59.54"O y punto de referencia final en la coordenada 8°15'16.80"N 73°46'1.41"O de la vía central de Las Pailas – Morales, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Ocaña del INVIAS.

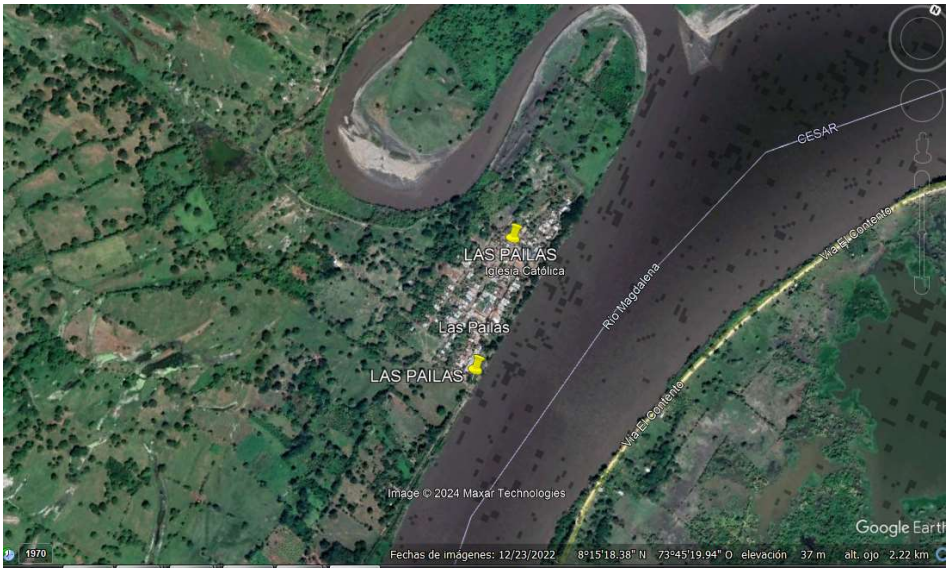


Figura: 1 Localización de puntos de referencia inicial y final del corredor vial corregimiento de Las Pailas, Morales.

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto objeto del convenio de referencia se ejecuta en el corregimiento de Las Pailas, zona rural del municipio de Morales, Bolivar. De su ejecución se beneficia la población de este corregimiento directamente, y del corregimiento el Dique, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales de Gamarra y demás municipios de esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El corredor vial a intervenir se encuentra en la calle central del corregimiento de Las Pailas, la vía se encuentra destapada y requiere intervención, mantenimiento y estabilización de algunos

sitios críticos ya que la lluvia y el efecto del intemperismo han generado que se desestabilice el corredor vial, lo que ocasiona malestar para los transeúntes.

	
Estado Inicial de la vía 21-02-2024	Estado inicial de la vía 21-02-2024

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El alcance del proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella.

El presente convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento vial del corredor a intervenir para que garantice una circulación continua, rápida y continua para el transporte de propios y visitantes de la región, de este modo se contempla la construcción de lo siguiente.

- Mejoramiento con la construcción de ciento veinte (120) metros lineales de placa huella.
- Mantenimiento rutinario con la limpieza y rocería de obras menores presentes en el corredor vial del corregimiento.
- Mejoramiento con la construcción de una (1) alcantarilla que garantice estabilidad y manejo de escorrentía superficial.

3. Información convenio solidario.

3.1 Información General del convenio

CONVENIO No.	4788 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JAC DEL CORREGIMIENTO DE LAS PALAS DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
FECHA DE INICIACIÓN	21/02/2024
FECHA DE TERMINACION INCIAL	30/04/2024
PLAZO INICIAL	SETENTA (70) DIAS
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 200.417.596,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 200.417.596,00 INCLUIDO IVA

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Se espera el desembolso a la cuenta conjunta de la junta de acción comunal para el desarrollo y ejecución del convenio solidario.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

N/A

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

En el periodo del mes de marzo no se obtiene ningún avance de obra y tampoco avance administrativo ya que la junta de acción comunal aún no cuenta con el recurso económico que debe girar el ente nacional para dar inicio a las actividades previas encaminadas a la ejecución del contrato.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio
Ver Anexo 4

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.10 Otros documentos seguimiento mensual:

- Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3(Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4871 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
INTERVENTOR	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	EUDOMAR PAEZ TORRADO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS
FECHA INICIACIÓN	15/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2	UN (1) MES
FECHA TERMINACIÓN	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 95.674.800,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$ 20.325.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 116.000.000,00 INCLUIDO IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

El interventor del convenio solidario 4788 de 2023 está a la espera del desembolso del recurso para dar inicio con la ejecución de este.

5.3 Informes especialistas

(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo

(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría

No aplica

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.7 Otros documentos seguimiento mensual

- Programa de Inversión del anticipo y Seguimiento a la inversión del Anticipo

No Aplica

- Seguimiento al Plan de Cargas

No Aplica

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se requiere tener el recurso del convenio para poder dar inicio a la ejecución del convenio.

- Se espera que giren a la mayor brevedad el recurso y poder dar luz verde al inicio de actividades previas de ejecución de obra.

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

Ver anexo 15

ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPIMN-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 de 1

Contrato de Obra No. 4789 de 2023 **Contratista:** JAC del corregimiento Las Pallas del municipio de Morales departamento de Bolívar

Contrato de Interventoría No. 4871 de 2023 **Interventoría:** CONSORCIO JAL

Objeto Contrato de Obra:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Las Pallas del municipio de Morales, departamento de Bolívar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

INFORME MENSUAL No. ------ **MES O PERIODO:** MARZO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		5
2.2	Municipios en la zona de influencias y beneficios de la ejecución del proyecto		5
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	Seguimiento items no previstos		7
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoria		7
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	* Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		9
5.1	Información general del contrato		9
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		9
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento exitado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la entidad		N/A
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		11
8	**Anexos**		12
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitacora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios. conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por ELIAS JAMES FERNANDEZ

Firma

Nombre: ELIAS JAMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. **de fecha**

Original: informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 1

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 05/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA
PERIODO MES: MARZO

CONVENIO No.: 4788 de 2023
OBJETO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Las Pailas del municipio de Morales, departamento de Bolivar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.
CONTRATISTA: JAC del corregimiento de Las Pailas del municipio de Morales departamento de Bolivar

PLAZO INICIAL: 70 Días
FECHA DE INICIO: 21/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 70 Días

VALOR INICIAL : $ 200.417.596,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.417.596,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4871
INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa huella	Ml	120
Estructuras	Alcantarilla	Und	1
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Plcaha huella	Ml	0	0
Estructuras	Alcantarilla	Und	0	0
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 149.470.117,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.484.104,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.463.375,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199.417.596,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 0,00	$ 0,00
VALOR EJECUTADO	$ 0,00	$ 0,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 3	**Foto 4**
Foto 5	**Foto 6**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre Eudomar Páez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **OCAÑA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 a 31 marzo de 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Las Pailas, municipio Morales

CONTRATO No. 4788 de 2023 **CONTRATISTA:** JAC del corregimiento de Las Pailas del municipio de Morales departamento de Bolivar

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4871 de 2023 **INTERVENTORÍA:** InGenius Solutions S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																													
			TOTAL ACTIVO																													
			TOTAL EN REPARACIÓN																													
			TOTAL INACTIVO																													

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A la fecha no se ha dado inicio a obra por lo tanto no se cuenta con maquinaria y equipo en obra

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Humberto De La Hoz Álvarez
Residente de Obra Matrícula
Profesional No.: 54202091479 NTS

Firma

Nombre: Diego Amado Prado Bayona
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 3

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	05/04/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No: 4788 de 2023 **CONTRATISTA:** JAC DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 a 31 marzo de 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Las Pailas, municipio Morales

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4871 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido): A la fecha no se ha dado ingreso al personal de obra

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:Humberto De La Hoz Álvarez
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202091479 NTS

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 4
Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 2

UNIDAD EJECUTORA: **Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **OCAÑA**

CONVENIO No. 4788 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Las Pailas del municipio de Morales, departamento de Bolivar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

VÍA INTERVENIDA: vía central de Las Pailas

CONTRATISTA: JAC del corregimiento Las Pailas del municipio de Morales departamento de Bolivar

INTERVENTOR: InGenius Solutions S.A.S. 4871 de 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	21 (Día)	DE	2 (Mes)	DE	2024 (Año)	$ 200.417.596,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	$ 200.417.596,00
PLAZO (MESES):						
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1						$ -	$ -
						$ -	$ -
	CONVENIO EN ESPERA DE DESEMBOLSO DE RECURSO ECONOMICO					$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
							$ -
				TOTAL	$ -	$ -	$ -

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ -	**PAGOS ACUMULADOS**	$ -
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ -
TOTAL PAGOS	$ -	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ -

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: MOICES ESTRADA PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma:
Nombre: Humberto De La Hoz Álvarez
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:54202091479 NTS

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 05/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** MARZO

ACTA FINAL ☐

CONVENIO No : 4788 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Las Pailas del municipio de Morales, departamento de Bolivar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JAC del corregimiento Las Pailas del municipio de Morales departamento de Bolivar (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871 DE 2023 INTERVENTOR: InGenius Solutions S.A.S.

PLAZO INICIAL: (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 21/02/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 200.417.596,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 200.417.596,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
			LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
1	800.1P	PART.	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	Ml		$ -	$ -						
			CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA										
2	600-22		Ecavaciones varias sin clasificar	M3	76	$ 30.671	$ 2.330.996				$ -	$ -	$ -
3	320-22		subbase granular clase c	M3	93	$ 173.907	$ 16.173.351				$ -	$ -	$ -
4	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPA(D) -mezcla in situ	M3	67,6	$ 803.746	$ 54.333.230				$ -		$ -
5	630-22		Concreto ciclopeo resistencia 14MPa (G)	M3	35,6	$ 517.092	$ 18.408.475				$ -		$ -
6	640-22		Acero de refuerzo de Fy=4200 kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3237	$ 7.218	$ 23.364.666				$ -	$ -	$ -
			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS										
7	600-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	54,70	$ 30.671,00	$ 1.677.703,70						
8	600-22		Excavaciones en roca en seco	M3		$ 67.043,00	$ -						
9	630-22		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50	$ 566.604,00	$ 283.302,00						
10	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,60	$ 803.746,00	$ 7.715.961,60						
11	640-22		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	579,00	$ 7.218,00	$ 4.179.222,00						
12	610-22		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	5,47	$ 80.377,00	$ 439.662,19						
13	661-22		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00	$ 800.828,00	$ 4.804.968,00						
14	610-22		Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	25,40	$ 23.366,00	$ 593.496,40						
			ÍTEM NO PREVISTOS										
15	311-22		Afirmado (Terraplenes - Según diseño Geometrico)	m 3	108	$ 140.365	$ 15.159.420				$ -		$ -
			SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA				$ 149.464.454				$ -		$ -
*			**PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)**				$ 4.483.934				$ -		$ -
*			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**				$ 45.463.375				$ -		$ -
*			**VALOR ESTIMADO CONVENIO**				$ 199.411.763				$ -		$ -
*													
*													
*													
*			**VALOR TOTAL**										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ -	$ -	$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ -

VALOR PRESENTE ACTA: $ - **VALOR EN LETRAS:**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

CONVENIO EN ESPERA DE DESEMBOLSO DEL RECURSO ECONÓMICO

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: MOISES ESTRADA PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: Humberto De La Hoz Álvarez
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista Matrícula
Profesional No.: 54202091479 NTS

Firma:
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 5
Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No: 4788 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 a 31 marzo de 2024 **PROYECTO:** MANTENMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ, CORREGIMINETO DE LAS PAILAS, MUNICIPIO DE MORALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4871 de 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	743
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:Humberto De La Hoz Álvarez
Residente de Obra Matrícula
Profesional No.:54202091479 NTS

Firma
Nombre: DIEGO AMADO PRADO BAYONA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 6
Resumen Ensayos de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA 05/04/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No.: 4788 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 a 31 marzo de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ,CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS, MUNICIPIO MORALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado ensayos de laboratorio

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Humberto De La Hoz Álvarez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202091479 NTS

Firma

Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo7

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) / 4 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 4788 de 2023 **CONTRATISTA:** JAC del Corregimiento de Las Pailas del municipio de Morales departamento de Bolivar

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ, CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS, MUNICIPIO MORALES

FECHA DE INICIO: 21/02/2024

PLAZO INICIAL: 70 Días

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.417.596,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.417.596,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4871 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento		$ -		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ -		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ -		
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Eudomar Páez Torado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8
Informe Semanal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 07/03/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Las Pailas, municipio de Morales

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 2 del 01/03/2024 al 07/03/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Las Pailas del municipio de Morales, departamento de Bolivar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

120 ML DE PLACA HUELLA Y CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de 120 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla en el corregimiento de Las Pailas, municipio de Morales.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC del corregimiento La Pailas del municipio de Morales departamento de Bolivar

CONVENIO No. 4788
FECHA DE INICIO: 21/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

VALOR INICIAL: $ 200.417.596,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.417.596,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.
INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4871 del 2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00
VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00
VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.417.596	$ 200.417.596		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.417.596	$ 200.417.596		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 41.611.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 74.388.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.470.177,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: Se espera desembolos para el inicio de ejecución

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 52.753.109,54	45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 41.611.805,20	36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.515.706,08	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.040.000,00	7%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	Ml	120
*	Alcantarilla	Und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via central de Las Pailas- Morales

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se espera desembolos para el inicio de ejecución

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera desembolos para el inicio de ejecución

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	Programada
	Ejecutado
Placa huella	Programada
	Ejecutado
alcantarillas	Programada
	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se espera desembolos para el inicio de ejecución

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/03/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Las Pailas, municipio de Morales

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 3 del 08/03/2024 al 14/03/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Las Pailas del municipio de Morales, departamento de Bolivar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

120 ML DE PLACA HUELLA Y CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de 120 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla en el corregimiento de Las Pailas, municipio de Morales.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC del corregimiento La Pailas del municipio de Morales departamento de Bolivar

CONVENIO No. 4788

FECHA DE INICIO: 21/02/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

VALOR INICIAL: $ 200.417.596,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 200.417.596,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4871 del 2023

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.417.596	$ 200.417.596		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.417.596	$ 200.417.596		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 49.651.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 66.348.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.470.177,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: Se espera desembolos para el inicio de ejecución

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 62.268.815,63	54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 49.651.805,20	43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.515.706,08	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.040.000,00	7%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	Ml	120
*	Alcantarilla	Und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via central de Las Pailas- Morales

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se espera desembolos para el inicio de ejecución

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera desembolos para el inicio de ejecución

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	Programada
	Ejecutado
Placa huella	Programada
	Ejecutado
alcantarillas	Programada
	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se espera desembolos para el inicio de ejecución

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contralista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Las Pailas, municipio de Morales

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 4 del 15/03/2024 al 21/03/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Las Pailas del municipio de Morales, departamento de Bolivar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

120 ML DE PLACA HUELLA Y CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de 120 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla en el corregimiento de Las Pailas, municipio de Morales.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC del corregimiento La Pailas del municipio de Morales departamento de Bolivar

CONVENIO No. 4788

FECHA DE INICIO: 21/02/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

VALOR INICIAL: $ 200.417.596,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 200.417.596,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4871 del 2023

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.417.596	$ 200.417.596		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.417.596	$ 200.417.596		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 57.691.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 58.308.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.470.177,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: Se espera desembolos para el inicio de ejecución

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 71.784.521,71	62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 57.691.805,20	50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.515.706,08	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.040.000,00	7%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	Ml	120
*	Alcantarilla	Und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via central de Las Pailas- Morales

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se espera el desembolso del recurso económico para así dar inicio con las actividades previas del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera desembolos para el inicio de ejecución

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	Programada
	Ejecutado
Placa huella	Programada
	Ejecutado
alcantarillas	Programada
	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se espera desembolos para el inicio de ejecución

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/03/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento de Las Pailas, municipio de Morales

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 5 del 22/03/2024 al 28/03/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento Las Pailas del municipio de Morales, departamento de Bolivar para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

120 ML DE PLACA HUELLA Y CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de 120 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla en el corregimiento de Las Pailas, municipio de Morales.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC del corregimiento La Pailas del municipio de Morales departamento de Bolivar

CONVENIO No. 4788

FECHA DE INICIO: 21/02/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

VALOR INICIAL: $ 200.417.596,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 200.417.596,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4871 del 2023

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2023

VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

VALOR ADICIONES: $ 20.325.200,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.417.596	$ 200.417.596		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.417.596	$ 200.417.596		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 65.731.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 50.268.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.470.177,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: Se espera desembolos para el inicio de ejecución

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.300.227,79	70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65.731.805,20	57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.515.706,08	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.040.000,00	7%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	Ml	120
*	Alcantarilla	Und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via central de Las Pailas- Morales

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se espera el desembolso del recurso económico para así dar inicio con las actividades previas del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera desembolos para el inicio de ejecución

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	Programada
	Ejecutado
Placa huella	Programada
	Ejecutado
alcantarillas	Programada
	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se espera desembolos para el inicio de ejecución

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: Diego Amado Prado Bayona

Matrícula Profesional No.: 1210370552787 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 9
Equipo Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 a 31 marzo de 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Las Pailas, municipio Morales

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4871 de 2023

INTERVENTORÍA: InGenius Solutions S.A.S.

CONTRATO DE OBRA No. 4788 de 2023

CONTRATISTA: JAC del corregimiento de Las Pailas del municipio de Morales departamento de Bolivar

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO TIPO CAMIONETA	COROLLA CROSS 2023 PLACA LYY027	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	HONDA XR150L 2020 PLACA EKQ70F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 10

Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871 de 2021

INTERVENTOR: INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1-31 de marzo del 2024

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No.: 4481-2023; 4480-2023; 4566-2023; 4301-2023; 4788-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO CASCAJAL, MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANDIAN DEL MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS MUNICIPIO DE MORALES

NOMBRE ARL: POSITIVA SAS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EUDOMAR PAEZ TORRADO	13.361.189	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.914.000,00	X … X (31)	33%	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.	30	$ 10.000,0	I	SANITAS	1743112236	$ 76.600,0				$ 76.600,00	$ -	$ -	
2	DIEGO ARMANDO PRADO BAYONA	1.094.580.311	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.700.000,00	X … X (31)	100%		30	$ 188.000,0	V	SANITAS	1743112236	$ 108.000,0	COLPENSIONES	1743112236	$ 432.000,0	$ 108.000,00	$ -	$ -	
3	SUAREZ SANJUAN YINA MARCELA	1.004.863.995	INSPECTORA SST	$ 1.300.000,00	X … X (31)	100%		30	$ 90.500,0	V	NUEVA EPS	1743112236	$ 52.000,0	COLPENSIONES	1743112236	$ 208.000,0	$ 52.000,00	$ -	$ -	
4	REYES MARTINEZ RAFAEL DAVID	1.007.971.534	INSPECTOR	$ 1.300.000,00	X … X (31)	100%		30	$ 90.500,0	V	NUEVA EPS	1743112236	$ 52.000,0	PROTECCION	1743112236	$ 208.000,0	$ 52.000,00	$ -	$ -	
5	BACCA TELLEZ EDGAR FELIPE	1.065.916.155	INSPECTOR	$ 1.300.000,00	X … X (31)	100%		30	$ 90.500,0	V	SANITAS	1743112236	$ 52.000,0	PORVENIR	1743112236	$ 208.000,0	$ 52.000,00	$ -	$ -	
6	VARGAS BLANCO CRISTIAN CAMILO	1.065.896.219	INSPECTOR	$ 1.300.000,00	X … X (31)	100%		30	$ 90.500,0	V	ASMETSALUD	1743112236	$ 52.000,0	PORVENIR	1743112236	$ 208.000,0	$ 52.000,00	$ -	$ -	
7	EUDOMAR PAEZ TORRADO	13.361.189	ESPECIALISTA DE VIAS	$ 833.000,00	X … X (31)	17%		30	$ 4.400,0	I	SANITAS	1743112236	$ 33.400,0				$ 33.400,00	$ -	$ -	
8	CABANA DIAZ JESUS MIGUEL	1.122.406.859	ESPECIALISTA DE GEOTECNIA	$ 2.450.000,00	X … X (31)	25%		30	$ 12.800,0	I	SANITAS	1743112236	$ 98.000,0	PORVENIR	1743112236	$ 392.000,0	$ 98.000,00	$ -	$ -	
9	BARBOSA ESLEIDE YLIANA	37.180.439	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 3.136.000,00	X … X (31)	32%		30	$ 16.400,0	I	NUEVA EPS	1743112236	$ 125.500,0	PORVENIR	1743112236	$ 501.800,0	$ 125.500,00	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 16.233.000,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 25/4/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO *
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 11
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 4871 de 2021 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 1-31 de marzo del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No: 4481-2023, 4480-2023, 4566-2023, 4301-2023, 4788-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO CASCAJAL, MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANDIAN DEL MUNICIPIO DE GAMARRA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS MUNICIPIO DE MORALES

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1357423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	Contrato principal	$95.674.800,00	$ -
22023	1397923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	ADICIONAL 1	$20.325.200,00	$ -
TOTAL						$ 116.000.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 116.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1357423 de 11/12/2023	$ -	$ 95.674.800,00		CONTRATO PRINCIPAL
								1397923 de 19/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ADICIONAL
1	**15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**	$ -	$ -	$ -				1357423 de 11/12/2023	$ -	$ 116.000.000,00		ACTA EN CERO
2	**1 AL 31 DE ENERO DEL 2024**	$ 7.409.080,00	$ 1.407.725,20	$ 8.816.805,20				1357423 de 11/12/2023	$ 8.816.805,20	$ 107.183.194,80	RADICADO N° 964 DE FECHA 02 MARZO 2024	
3	**1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**	$ 20.803.040,00	$ 3.952.577,60	$ 24.755.617,60				1357423 de 11/12/2023	$ 33.572.422,80	$ 82.427.577,20	RADICADO N° 2602 DE FECHA 14 ABRIL 2024	
4	**1 AL 31 DE MARZO DEL 2024**	$ 33.984.400,00	$ 6.457.036,00	$ 40.441.436,00				1357423 de 11/12/2023	$ 74.013.858,80	$ 41.986.141,20		PRESENTE ACTA EN TRÁMITE
TOTALES		**$ 62.196.520,00**	**$ 11.817.338,80**	**$ 74.013.858,80**					**$ 74.013.858,80**	**$ 41.986.141,20**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 52.703.520,00	$ 10.013.668,80	$ 62.717.188,80
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 9.493.000,00	$ 1.803.670,00	$ 11.296.670,00
*			
VALOR TOTAL	$ 62.196.520,00	$ 11.817.338,80	$ 74.013.858,80

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12
Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4871 de 2023

INTERVENTOR: INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 95.674.800,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 9.567.480,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 19.134.960,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30,00%	$ 28.702.440,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No B-100043689

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/04/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 11.600.000,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 23.200.000,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30,00%	$ 34.800.000,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No B-100043689

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 11.600.000,00	6	12	2023	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 23.200.000,00	6	12	2023	31	3	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 34.800.000,00	31	12	2023	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No B-100043680

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/04/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 11.600.000,00	6	12	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 23.200.000,00	6	12	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 34.800.000,00	31	12	2023	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No B-100043680

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13


Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE** **RELACION DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA 05/04/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFI-4871-2023-029	20/03/2024	MOICES ESTRADA PEREZ PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4871-2023-034	20/03/2024	HUMBERTO DE LA HOZ ALVARES RESIDENTE DE OBRA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS	SOLICITUD INFORME TECNICO E INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4871-2023-039	20/03/2024	LUZ MARINA LEON CAMPOS CONTADOR PUBLICO JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS	SOLICITUD INFORME FINANCIERO E INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4871-2023-044	20/03/2024	ALBEIRO GUTIERREZ BADILLO PRESIDENTE VEEDURIA CIUDADANA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4871-2023-049	30/03/2024	JESUS ELIECER SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS	SOLICITUD ENTREGA “Informe inversión buen manejo desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Mensual”

Firma 

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 14
Registro fotográfico

Anexo 15
Bitácora del mes correspondiente

Contrato de Interventoria N° 4871 de 2023.
Objeto: Interventoria técnica, administrativa, financiera y legal para los convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y las organizaciones de acción comunal del municipio de Morales en el departamento Bolivar y de los municipios de Aguachica y Gamarra del departamento Cesar, en la dirección territorial Ocaña para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

Contratista: Ingenius Solutions S.A.S NIT: 901.753.215-6

V/R: $116.000.000 Incluido I.V.A

Convenio solidario N° 4788 de 2023
Objeto: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vias y la junta de acción comunal del corregimiento de las Paibas del municipio de Morales, departamento de Bolivar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

Contratista: J.A.C corregimiento las Paibas

V/R: $ 200.417.596 Incluido I.V.A

Fecha de inicio: Febrero 21 de 2024.

Powered by CamScanner

01 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se espera desembolso de recurso económico para el inicio de la ejecución del convenio.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

02 y 03 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio:
Días no laborados.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

04 Marzo 2024.
Estado de tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am
Actividades: Se espera desembolso del recurso económico
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoría.

líder

Powered by CamScanner

05 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: A la espera de desembolso del recurso.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado P.
Diego Amado Prado Bayana
Ing. Residente de Interventoria

06 Marzo 2024
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno
Actividades: Se espera desembolso del recurso.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado P.
Diego Amado Prado Bayana.
Ing. Residente de Interventoria.

07 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: A la espera de desembolso de recurso
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado P.
Diego Amado Prado Bayana.
Ing. Residente de Interventoria.

líder:=

Powered by CamScanner

08 Marto 2024.
Estado del trempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: se espera desembolso del recurso.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

09 Marto 204.
Estado del trempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: se espera desembolso del recurso.
Hora de finalización: 12:00 pm

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoría.

10 Marto 2024.
Estado del trempo: soleado.
Dia no laborado.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

11 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Espera del desembolso del recurso y dar poder dar inicio en la ejecución del convenio.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoría.

12 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se espera desembolso de recurso para dar inicio
Hora de finalización. 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoría.

13 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se espera desembolso del recurso para dar inicio en la ejecución.
Hora de finalización: 5:00 pm

Diego Amado Prado Bayona
líder= Ing. Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

14 Marzo 2024.
Estado del tiempo: lluvias moderadas entre 3:00 pm y 11:00pm
Hora de inicio: 7:00 am.
Actividades: Espera de desembolso del recurso.
Hora de finalización: 5:00 pm

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoria.

15 Marzo 2024.
Estado del tiempo: Nublado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno
Actividades: Se espera el desembolso del recurso.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoría

16 Marzo 2024.
Estado del tiempo:
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra:
Actividades: Se espera desembolso para iniciar ejecución.
Hora de finalización: 12:00 pm

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoría.

líder

Powered by CamScanner

17 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Día No laborado.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

18 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se espera desembolso del recurso económico.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

19 Marzo 2024.
Estado del tiempo: Nublado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se espera el desembolso de recurso económico
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona.
Ing. Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

20 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se espera desembolso ya que hasta la fecha no han depositado el recurso económico y no se ha dado inicio a la ejecución de las actividades.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Ing. Residente de Interventoría.

21 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado
Hora de inicio: 7:00 am
Personal en obra: Ninguno
Actividades: Se está a la espera de desembolso del recurso.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Residente de Interventoría.

22 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno
Actividad: Se continua a la espera del desembolso.
Hora de finalización: 5:00 pm.

Diego Amado Prado Bayona
Residente de Interventoría.

líder:=

Powered by CamScanner

23 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00am
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se espera el desembolso del recurso.
Hora de finalización: 5:00 pm

Diego Amado Prado Bayona
Residente de Interventoría.

24 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Día no laborado.

Diego Amado Prado Bayona.
Residente de Interventoría.

25 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Día no laborado.

Diego Amado Prado Bayona.
Residente de Interventoría.

26 Marzo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Hora de inicio: 7:00am
Personal en obra: Ninguno
Actividades: Se continua a la espera del desembolso
Hora de finalización: 5:00 pm

líder:

Powered by CamScanner

27 Marzo 2024.
Estado del tiempo. Nublado
Hora de inicio: 7:00 am.
Personal en obra: Ninguno.
Actividades: Se continua a la espera del desembolso del recurso económico.
Hora de finalización: 5:00 pm.

28, 29, 30, 31 Marzo 2024.
Días No laborados.
Estado del tiempo: Soleado.

Diego Amado P.
Diego Amado Prado Baupna
Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner
