CONSORCIO INTERESCENARIOS

2950

Villavicencio, 27 de Septiembre del 2023 **OF-C249 -2023-150**

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

27 SEP 2023
3074
4:45

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META" 1

ASUNTO: entrega informe mensual interventoría a obra corregido mes de Junio
Entrega de informe mensual de obra corregido mes de junio

Por medio dPe la presente me permito realizar la entrega del informe mensual de interventoría a obra correspondiente al mes de Junio se complementa la información y los anexos, se realizan las correcciones correspondientes del formato GES-FO-35 acorde a las observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión.

De igual manera se anexa el informe de obra corregido por el contratista para el cual se implementa formato GES-FO-126 se complementan anexos y se entregan informes de seguimiento para lo cual se anexan:

Informe de obra formato GES-FO-126
Informe de gestión SST
Informe de seguimiento plan de manejo ambiental
Informe de seguimiento plan de manejo de transito

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Cabe anotar que aun queda pendiente la entrega del informe de seguimiento al plan de gerencia, el cual no se ha corregido ni entregado a la interventoría.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

2952

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 01 de Agosto de 2023 **OF-C249 -2023-107**

Señores:

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLÍMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

IDERMETA
NIT
02 AGO 2023
Radicado 2293
Hora 9:50

REF: CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Entrega de informe mensual de obra No 2

Respetados señores:

Acorde a las obligaciones contractuales adquiridas por la interventoría me permito hacer entrega de la documentación correspondiente al informe mensual de obra entregado por el contratista de obra formato GES-FO 126 se realiza entrega de informe, anexos y soportes acorde a lo implementado en el formato entregado por la entidad.

Se anexan 3 carpetas

Atentamente:


HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

cambiar carpetas

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 de 2023	PROYECTO N°	2022005500024 2022005500094 2022005500022

INFORME MENSUAL No 2 INTERVENTORIA A OBRA

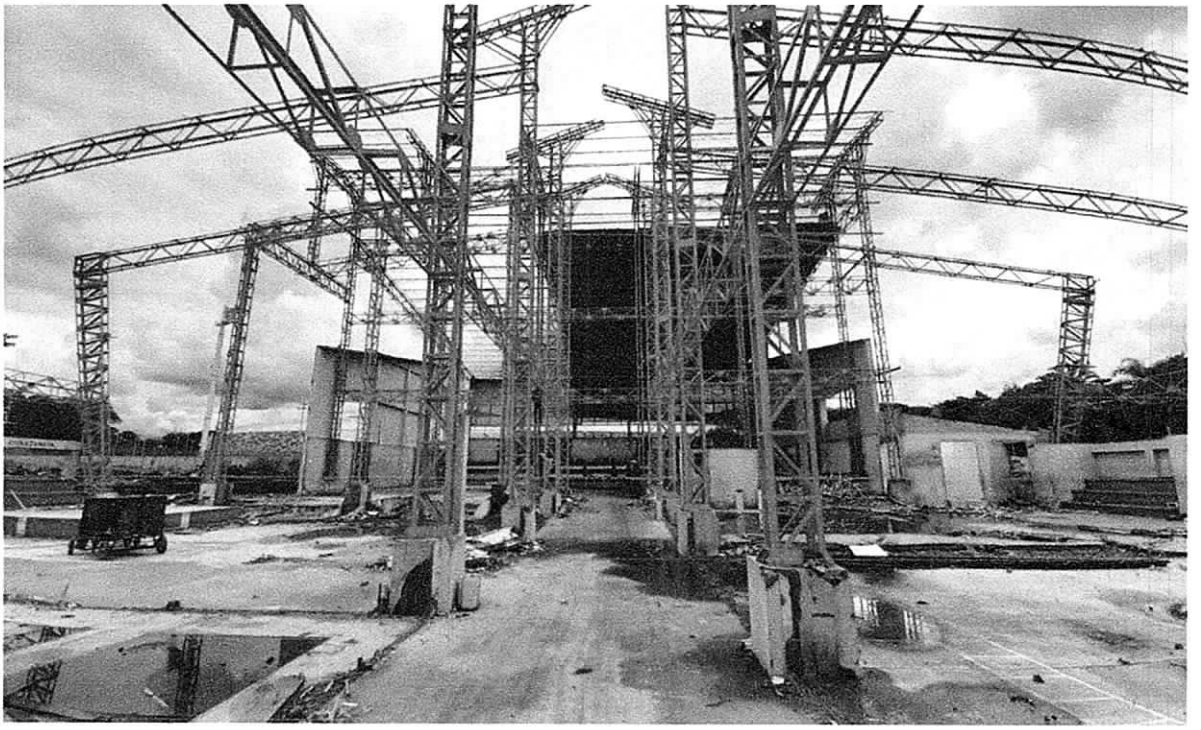

CONTRATO DE INTERVENTORIA 249 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALPARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATO DE OBRA 106 DE 2023

CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

JUNIO DE 2023

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

Periodo informado	Desde	01/06/2023	Hasta	30/06/2023

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE OBRA	
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	$50.871.940.842
OBJETO PROYECTO 1: 2022005500024	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.
VALOR DEL PROYECTO:	$ 31.845.658.891,00
OBJETO PROYECTO 2: 2022005500094	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.
VALOR DEL PROYECTO:	$ 10.220.557.418,00
OBJETO PROYECTO 3: 2022005500022	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.
VALOR DEL PROYECTO:	$ 8.805.724.533,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
CORREO ELECTRÓNICO:	escenariosdeportivos2023@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	10/05/2023
PRORROGA:	N.A.
SUSPENSIÓN:	N.A.
TIEMPO:	N.A.
REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	09/05/2024

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 20223
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO 1: 2022005500024	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITOS EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.
OBJETO PROYECTO 2: 2022005500094	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.
OBJETO PROYECTO 3: 2022005500022	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.
CORREO ELECTRÓNICO:	INTERESCENARIOSC@GMAIL.COM

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	BIBIANA PAN MERCHAN
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	811-2022 062-2023 381-2023 206-2023
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	FLOOWER EMILIO PEÑA FABIAN ALBERTO SAAVEDRA RIOS LUZ ADRIANA LESMES ESCOBAR BERTULFO ROJAS QUIMBAYO

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO ESCENARIOS MULTIPROPOSITO			
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	VEREDA:	
CORREGIMIENTO:		BARRIO:	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°8'24"N 73°37´06W´´		

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO PISTA DE ATLETISMO			
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	VEREDA:	
CORREGIMIENTO:		BARRIO:	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°08'24"N 73°37'13"W		

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTOPISTA DE PATINAJE			
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	VEREDA:	
CORREGIMIENTO:		BARRIO:	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°8'21"N 73°37'07"W		


Los proyectos se localizan dentro de la villa Olimpia de Villavicencio localizada en el barrio olímpico comuna 05 de la ciudad de Villavicencio, meta.



1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

AVANCE FÍSICO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.

GRAFICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO TOTAL:

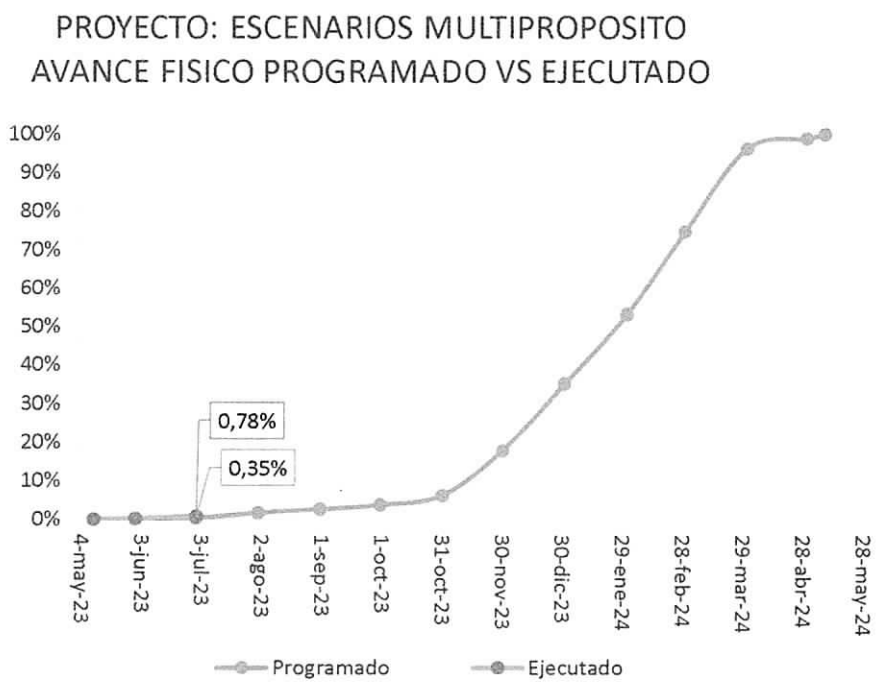

CUADRO RESUMEN AVANCE POR PERIODO:

ESCENARIOS MULTIPROPOSITO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO
10-may-23	0,00%	0,00%
31-may-23	0,06%	0,07%
30-jun-23	0,28%	0,71%
ACUMULADO	0,35%	0,78%

OBSERVACIONES CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA:

El avance mensual para este periodo de junio corresponde a 0.71% sin embargo el acumulado total corresponde al 0.78%, el avance acumulado programado correspondiente a 0.35%, de tal forma se refleja que la obra presenta una ejecución mayor a la programación actualizada entregada por el contratista de obra.

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	%	$	%	$	%	$	%	$
LOCALIZACION. TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.	6.21	$ 2.980.779,14	6.21	$5.154.833,65	0.0	0.0	0.0	0.0
DESMONTE Y DEMOLICIONES	7.78	$61.945.052,15	7.78	$61.945.052,15	28.27	$225.104.370,32	31.09	$247.556.977
EXCAVACIONES Y RELLENOS								
CIMENTACIÓN								
ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
ESTRUCTURAS EN ACERO								
CUBIERTA Y FACHADA								
MAMPOSTERÍA Y PAÑETES								
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS								
CARPINTERÍA METÁLICA								
OBRAS EXTERIORES								
PISOS Y ENCHAPES								
INSTALACIONES HIDRÁULICAS								
INSTALACIONES SANITARIAS								
RED AGUAS LLUVIAS								

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	%	$	%	$	%	$	%	$
RED CONTRA INCENDIOS								
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS								
SEÑALETICA								
CERTIFICACIONES-PMT Y/O PMA, OTROS. ESCENARIOS DEPORTIVOS .	7.68	$24.867.198,81	13.27	$ 43.004.284,19	0.00	0.00	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

GRAFICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO TOTAL:



CUADRO RESUMEN AVANCE POR PERIODO:

	PROGRAMADO	EJECUTADO
10-may-23	0,00%	0,00%
31-may-23	0,19%	0,40%
30-jun-23	1,32%	1,83%
ACUMULADO	1.51%	2.23%

OBSERVACIONES CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA:

Para el presente informe de junio el avance del periodo corresponde a 1.83%, acumulando un total ejecutado equivalente a 2.23%%, respecto al avance total programado correspondiente a 1.51% el proyecto tiene un avance mayor al planeado a la fecha.

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	%	$	%	$	%	$	%	$
DEMOLICIONES	28.41	$94.194.179,15	28.41	$94.194.179,15	48.6	$161.155.724,4	59.4	$196.790.812,02
PRELIMINARES	0.83	$ 6.697.262,22	1.44	$11.581.962,65	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETOS								
CIMENTACIÓN								
PISTA DE VELOCIDAD								
OBRAS EXTERIORES								
RED AGUAS LLUVIAS								
REDES ELECTRICAS								
CERTIFICACIONES-PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE PATINAJE.	5.58%	$11.413.051,48	5.58%	$11.413.051,48	0.00	0.00	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

GRAFICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO TOTAL:



CUADRO RESUMEN AVANCE POR PERIODO:


PISTA DE ATLETISMO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO
10-may-23	0,00%	0,00%
31-may-23	0,03%	0,03%
30-jun-23	0,27%	0,18%
ACUMULADO	0,30%	0,21%

OBSERVACIONES CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA:

El avance mensual para este periodo de junio corresponde a 0.18% sin embargo el acumulado total corresponde al 0.21%, el avance acumulado programado correspondiente a 0.30%, de tal forma se refleja un rezago en la programación para la ejecución de este proyecto.

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	%	$	%	$	%	$	%	$
PRELIMINARES	29.44	$16.098.463,64	34.28	$18.745.137,26	33.23	$18.169.252,2	38.36	$20.974.357,20
EXCAVACION Y RELLENOS	1.88	$ 545.277,08	1.88	$ 545.277,08	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS EXTERIORES								
FILTROS								
SUPERFICIE								
ACCESORIOS								
PLACA EN CONCRETO								
GRAMA SINTETICA								
CERTIFICACIONES-PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE ATLETISMO.	4.64	$10.863.787,47	4.64	$10.863.787,47	0.00	0.00	0.00	0.00

GRAFICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO TOTAL CONTRATO DE OBRA 106:

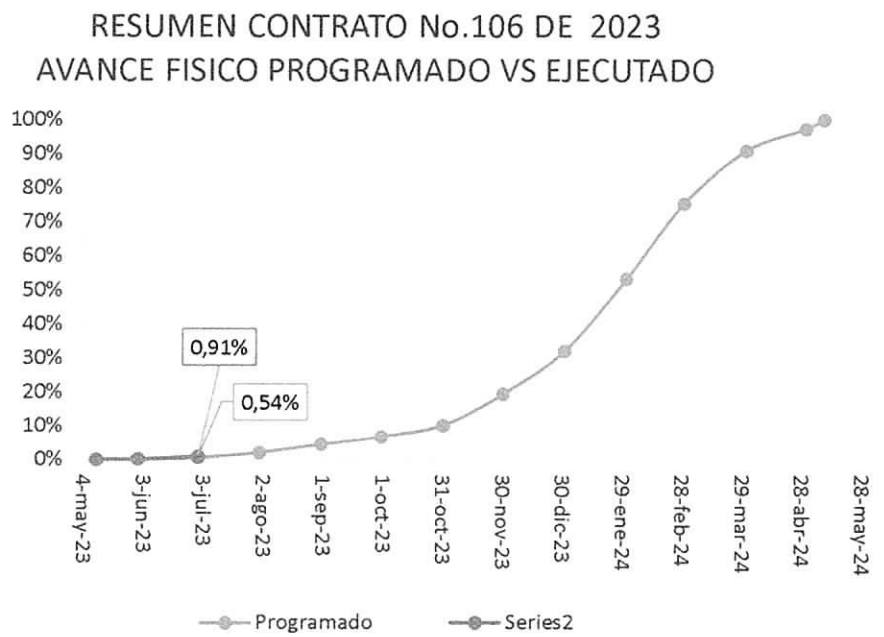

CUADRO RESUMEN AVANCE POR PERIODO:

RESUMEN CONTRATO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO
10-may-23	0,00%	0,00%
31-may-23	0,08%	0,12%
30-jun-23	0,46%	0,79%
ACUMULADO	0,54%	0,91%

OBSERVACIONES CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA:

Se realiza cálculo del avance total del contrato de obra, durante este periodo de tiempo el avance ejecutado mes de junio corresponde a 0.79% sin embargo el acumulado total corresponde al 0.91%, el avance acumulado programado correspondiente a 0.54%, de tal forma se refleja que la ejecución total de los tres proyectos sumados, se encuentra por encima de lo programado

2. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

A continuación, se relaciona la correspondencia tramitada durante el periodo de este informe concerniente a oficios y correos electrónicos canales estipulados para la comunicación:

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
01/06/2023	OF-C249-2023-050	Soporte vinculación de los subcontratistas con el consorcio escenarios deportivos	Consorcio Interescenarios	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
01/06/2023	OF-C249-2023-051	Respuesta a oficios del contratista de obra – Aclaraciones alcance y consultoría	Consorcio Interescenarios	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
01/06/2023	OF-C249-2023-052	Solicitud planimetría física y digital archivo CAD de	Consorcio Interescenarios	IDERMETA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		implantación record fase 1		
01/06/2023	OF-C249-2023-053	Reiteración aclaración experiencia en perfil	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
01/06/2023	OF-C249-2023-054	Entrega documentación para anticipo de obra	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
07/06/2023	OF-C249-2023-055	Reiteración solicitud plano físico y digital archivo CAD de implantación record fase 1	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
07/06/2023	OF-C249-2023-056	Reiteración respuesta perentoria oficios con relación a consultoría	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
07/06/2023	OF-C249-2023-057	Solicitud respuesta OF-C249-2022-043 Seguridad Industrial, señalización, manejo transito implementación PMT aprobado por Movilidad	Consorcio Interescenarios	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
07/06/2023	OF-C249-2023-058	Traslado oficios de oba consultoria y presupuesto oficial	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
08/06/2023	Correo electrónico	Entrega programación de obra actualizada	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
08/06/2023	Correo electrónico	Solicitud entrega programación actualizada en medio fisico	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
08/06/2023	OF-C249-2023-059	Oficios de Obra e Interventoría pendientes por respuesta	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
08/06/2023	OF-C249-2023-060	Directrices de disposición entrega de desmontes	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
14/06/2023	OF-C249-2023-060	Traslado documentación PMT	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
13/06/2023	OF-C249-2023-061	Reiteración solicitud informe mensual de obra No. 1 y envío de anexos del informe	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
13/06/2023	OF-C249-2023-062	Solicitud programación de obra impresa	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
14/06/2023	OF-C249-2023-066	Entrega formato actualizado bitácora de movilidad	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
15/06/2023	OF-C249-2023-063	Entrega análisis de precios unitarios	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
15/06/2023	OF-C249-2023-064	Entrega documentación pendiente residente de obra	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
15/06/2023	OF-C249-2023-065	Entrega informes diagnostico	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
15/06/2023	OF-C249-2023-067	Respuesta oficio CEDVO-034-2023 Entrega Formatos	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
16/06/2023	OF-C249-2023-068	Traslado oficio y programación de obra impresa	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
16/06/2023	OF-C249-2023-069	Traslado oficio de entrega	Consorcio Interescenarios	IDERMETA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		aprovechamiento forestal		
20/06/2023	OF-C249-2023-070	Reiteración respuesta oficios de obra e interventoría y actualización progamación GESPROY con acta de inicio	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
22/06/2023	OF-C249-2023-071	Entrega actas de vecindad de la pista atlética	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
26/06/2023	OF-C249-2023-072	Oficio reiteración retiro elementos de obra altamente inflamables	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
26/06/2023	OF-C249-2023-073	Solicitud entrega de zonas ocupadas por fase 1	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
26/06/2023	OF-C249-2023-074	Solicitud de informe relacionado al incidente del conato de incendio presentado 24/06/2023 en instalaciones de obra	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
26/06/2023	OF-C249-2023-075	Corrección informe de obra	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
28/06/2023	OF-C249-2023-077	Devolución remisión orden de pago de giro No. 01 Anticipo	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
28/06/2023	OF-C249-2023-078	Solicitud certificación Zodme Guatiquia SAS	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
30/06/2023	OF-C249-2023-076	Solicitud de procedimiento para retiro de escombros e implementación del PMT	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
30/06/2023	OF-C249-2023-079	Solicitud de entrega de procedimientos de actividades relacionados con la seguridad y salud en el trabajo	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
30/06/2023	OF-C249-2023-080	Reiteración solicitud de plan de manejo ambiental actualizado	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
30/06/2023	OF-C249-2023-081	Entrega de informe mensual de obra No. 1	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
30/06/2023	OF-C249-2023-082	Entrega de informes mensuales de interventoría No 1	Consorcio Interescenarios	IDERMETA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
02/06/2023	CEDVO-028-2023	Respuesta a su oficio OF-C249-2023-048	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
05/06/2023	PL-120-251	Programación Comité de obra	Planeación IDERMETA	Consorcio Interescenarios
06/06/2023	CEDVO-029-2023	Aprobación PMT	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
07/06/2023	PL-120-257	Concepto jurídico acerca de personal de obra	Planeación IDERMETA	Consorcio Interescenarios
08/06/2023	PL-120-262	Autorización ingreso personal desmonte	Planeación IDERMETA	Consorcio Interescenarios
13/06/2023	CEDVO-026-2023	Aclaraciones para los diseños de pista de atletismo	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
13/06/2023	CEDVO-033-2023	Documento PMT	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
15/06/2023	CEDVO-034-2023	Solicitud de formatos	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
16/06/2023	CEDVO-035-2023	Entrega de programación impresa	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
16/06/2023	CEDVO-036-2023	Entrega de permiso de aprovechamiento forestal	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
16/06/2023		Ingreso personal retiro	Planeación IDERMETA	Consorcio Interescenarios
16/06/2023		Comité técnico – especificaciones pista de atletismo	Planeación IDERMETA	Consorcio Interescenarios
21/06/2023	CEDVO-039-2023	Entrega de informe de obra No. 1	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
21/06/2023	PL-120-278	Obligación contractual – informes mensuales de obra y de gestión de interventoría	Planeación IDERMETA	Consorcio Interescenarios
23/06/2023	CEDVO-040-2023	Recolección de residuos	Consorcio Escenarios	Consorcio Interescenarios

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		especiales (Poliuterano)	Deportivos Villa Olimpica 2023	
21/06/2023	PL-120-282	Información y control de comunicaciones y oficios	Planeación IDERMETA	Consorcio Interescenarios
21/06/2023	PL-120-283	Ingreso de personal	Planeación IDERMETA	Consorcio Interescenarios
21/06/2023	PL-120-286	Remisión manual de uso estadio Bello Horizonte	Planeación IDERMETA	Consorcio Interescenarios
27/06/2023	CEDVO-041-2023	Entrega informe mensual corregido	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
27/06/2023	CEDVO-042-2023	Remisión orden de Giro No. 01 Anticipo	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
27/06/2023	PL-120-293	Solicitud de programación y flujo de inversión del personal de la interventoría	Planeación IDERMETA	Consorcio Interescenarios
28/06/2023	PL-120-297	Solicitud de informes mensuales	Planeación IDERMETA	Consorcio Interescenarios
29/06/2023	CEDVO-043-2023	Respuesta oficio OF-C249-2023-078	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios


3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

ESCENARIOS MULTIPROPOSITO

Diseño Arquitectónico

Durante este periodo se realiza la implantación de los dos escenarios coliseos multipropósito teniendo en cuenta los diseños y la planimetría aprobada entregada en la licencia de construcción, se verifica con equipo de topografía, cotas de niveles y se realiza inventario de

las redes existentes, para acueducto, alcantarillado y redes de aguas lluvias, acorde a lo informado y reportado en los oficios y comités de obra desarrollados con la entidad se evidencia la necesidad de realizar ajustes al diseño para la implantación de los dos escenarios multipropósito buscando evitar el cruce de la cimentación con las redes hidrosanitarias existentes, se debe solicitar la disponibilidad ante la empresa de acueducto y alcantarillado con el fin de ajustar el diseño hidrosanitario y su trazado final acorde a los puntos de conexión que autorice esta entidad.

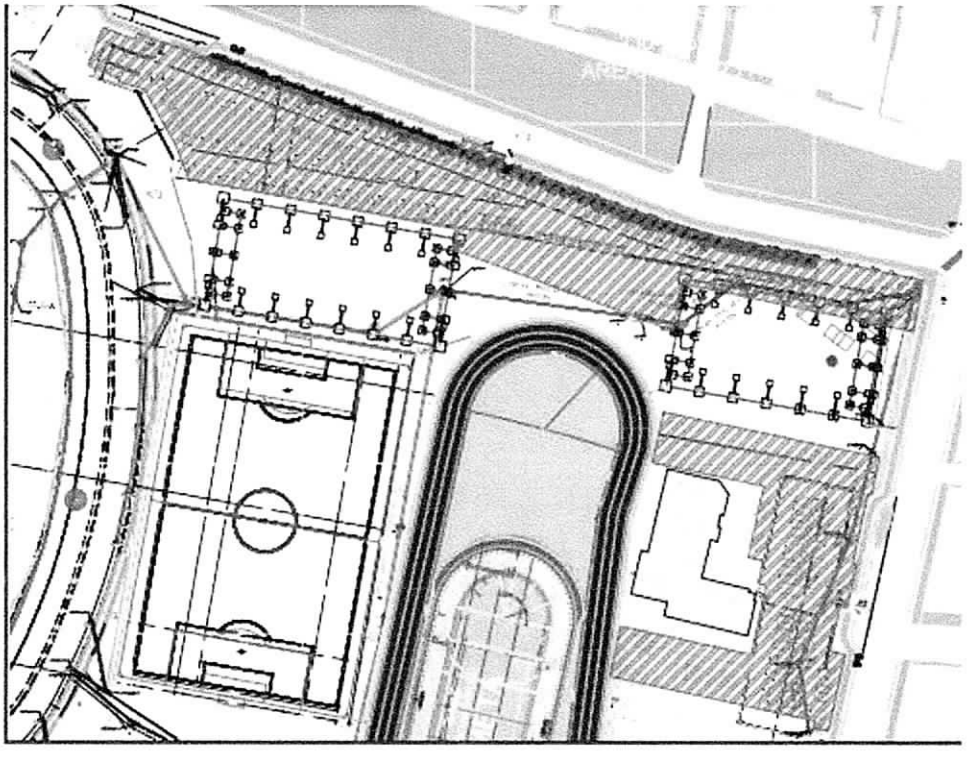

Adicionalmente se encuentra que para implantar las dos edificaciones se deben realizar ajustes en cuanto a la arquitectura y el urbanismo para cada uno de los escenarios pues se debe contemplar el manejo por medio de rampas y escaleras de la diferencia de nivel que existe actualmente, ya que el diseño inicial contemplo la implantación de la edificación en un terreno completamente plano no se tuvieron en cuenta las cotas de nivel, por lo cual la interventoría realizara comités de obra para definir el diseño del urbanismo perimetral accesos de los escenarios y definir los cambios pertinentes teniendo en cuenta la normatividad NTC 4143" ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS Y ESPACIOS URBANOS. RAMPAS FIJAS ADECUADAS Y BÁSICAS" NTC 6047 "ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO ESPACIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA, REQUISITOS

Acorde a las revisiones y observaciones encontradas en la revisión conjunta realizada con el contratista de obra se debe ajustar el diseño de detalles arquitectónicos como lo es el caso de las carpinterías metálicas puertas de acceso ya que el ítem presupuestado difiere del diseño, adicionalmente se verifica cumplimiento de normativa y se debe incluir apertura con chapa de emergencia para las salidas que sean para evacuación de personas según la normatividad para este tipo de escenarios TITULO J NSR 10

En cuanto a la arquitectura de los escenarios se plantea realizar los ajustes en mesas de trabajo comités de obra conjuntos contratista e interventoría con el fin de solucionar los detalles y las observaciones realizadas a los diseños complementando la información de la planimetría entregada inicialmente. a los cuales la consultaría no dio respuesta y se requiere dar pronta solución con el ánimo de cumplir la programación propuesta por el contratista.

Diseño Estructural

Acorde a las observaciones encontradas en la implantación de la cimentación de los edificios en la revisión de la planimetría respecto a las cotas, niveles y detalles que fueron informados a la entidad, se realiza comité de obra mesa de trabajo con los especialistas estructurales de la interventoría y contratista con el fin de subsanar y corregir los hallazgos para los cuales se debe ajustar el diseño de cimentación en cuanto a las siguientes determinantes:

Se debe ajustar el diseño de la viga ya que se presenta cruce de aceros de refuerzo de las vigas con la tornillería de las platinas de anclaje de a la estructura en la parte superior de los pedestales

Se debe ajustar el diseño de los contrapesos ya que se presenta cruce de las vigas de cimentación con las vigas de los contrapesos

Se deben ajustar los traslapos en el despiece de los aceros ya que en algunos elementos no cumplen con la normativa

Se debe ajustar el presupuesto ya que la resistencia de los concretos en los elementos de cimentación diseñados no corresponde con la especificación que se presupuestó para esta actividad

Se debe incluir dentro de las cantidades del presupuesto la actividad de concreto grouting ya que por método constructivo se debe utilizar este material para asegurar el traslado de la carga de la platina de manera uniforme al pedestal

Posterior a la revisión de cantidades se evidencia la necesidad de incluir los pernos de anclajes que deben instalarse en los pedestales de concreto previo a su fundida.

Es necesario revisar según la especificación y la norma el diámetro, longitud y resistencia de los conectores de cortante en las placas en Steel deck para la construcción de las graderías

Se debe contemplar acabado sobre las placas de graderías con el fin de sellar juntas e impedir filtraciones de líquidos a la zona que se encuentra debajo de ellas.

Es necesario incluir protección del Steel deck (pintura o epóxica), para las áreas de baños ya que la humedad puede corroer prematuramente el acabado galvanizado del mismo, se debe aplicar pintura epóxica o un material de acabado que recubra la superficie que funcione para protección en áreas húmedas.

Se debe ajustar el detalle en plano 16/16 de estructura para los elementos no estructurales, ya que el material de los muros corresponde a bloque de concreto confinado con dovelas y vigas aéreas, actividades que no se encuentran presupuestadas razones por la cual la interventoría recomienda ajustar a muros de bloque flexa confinado.

Es necesario verificar que el tipo de preparación para debe tener el metal para la construcción de la estructura pues de acuerdo con el numeral 1.5 del plano 1/16, la estructura metálica deberá pintarse con un sistema tricapa. De igual forma según el numeral 1.7, la estructura metálica y la parte inferior del Steel deck debe cumplir con el sistema de recubrimiento retardante al fuego adicionalmente se debe incluir dentro de actividad como ítem nuevo ya que no es una actividad que este dentro del presupuesto inicial.

Todas las consultas con relación a lo entregado por la consultaría se trasladaron sin tener una pronta respuesta por el AIM por tanto se procedió a realizar el ajuste de los diseños por parte de los especialistas estructurales del contratista de obra y de interventoría los cuales han realizado comités internos con el fin de dar vía libre al inicio de los capítulos estructurales preliminares cumpliendo los parámetros técnicos y normativa vigente y adicionalmente dar cumplimiento al cronograma propuesto.

Diseño Sanitario

Para esta actividad es necesario realizar el trámite de solicitud de disponibilidad ante la entidad EEAV con el fin de determinar cuáles son los puntos de conexión en los que se van a hacer entrega de las redes, de tal forma es necesario realizar un ajuste a los diseños de redes sanitarias y redes hidráulicas pues estos deben adaptarse a la implantación de la cimentación de los escenarios multipropósito para que no haya cruce de las redes con los elementos componentes de la cimentación. Para lo anteriormente descrito los especialistas de obra e interventoría han realizado comités internos ajustando los parámetros técnicos a presentar a la EAAV adicionalmente se ha realizado consultas a la oficina técnica de EAAV con el fin de que los

diseños a presentar se ajusten a las condiciones técnicas del sector que requiere la empresa prestadora del servicio.

El contratista solicito por oficio a la EAAV el catastro de redes del sector y está a la espera de la respuesta de la entidad prestadora de servicio y se solicitó a la entidad contratante la entrega de planimetría récord georreferenciada de las redes ejecutadas en el contrato de Fase 1.

Diseño Hidráulico

Acorde a las revisiones encontradas al diseño inicial entregado es necesario realizar ajuste al trazado pues este se conecta de la red existente del edifico la cual no cuenta con la presión constante y suficiente para el funcionamiento de los aparatos sanitarios que están planteados con salidas antivandálicas que necesitan presión para su funcionamiento, de tal forma es necesario realizar la gestión de disponibilidad y la consulta a la empresa de acueducto con el fin de identificar la red más cercana al edifico para conexión de suministro de agua.

Es necesario ajustar la red acorde a las salidas para los aparatos que requieren fluxómetro y puntos antivandálicos, pues estos requieren una especificación para la llegada según la ficha técnica.

Para lo anteriormente descrito los especialistas de obra e interventoría han realizado comités internos ajustando los parámetros técnicos a presentar a la EAAV adicionalmente se ha realizado consultas a la oficina técnica de EAAV con el fin de que los diseños a presentar se ajusten a las condiciones técnicas del sector que requiere la empresa prestadora del servicio.

El contratista solicito por oficio a la EAAV el catastro de redes del sector y está a la espera de la respuesta de la entidad prestadora de servicio y se solicitó a la entidad contratante la entrega de planimetría récord georreferenciada de las redes ejecutadas en el contrato de Fase 1.

Diseño Red Contra incendios

Para la red de incendios es necesario realizar ajuste de diseño acorde a la red existente encontrada en el sitio, ya que la planteada inicialmente no está acorde a la realidad construida, se debe realizar cálculo de teniendo en cuenta conexión a la red construida en el estadio ya que para esta se tiene tanque de reserva y se debe tener en cuenta si el diseño inicial contemplo la carga de los dos escenarios.

Para esta red se debe incluir dentro del presupuesto la tubería C-900 o acero SCH40 sandblastiada con recubrimiento epóxico, según lo que contemple el ajuste en diseño ya que en el presupuesto inicial no se incluyó este tipo de tubería para la red que va enterrada.

Se debe realizar ajuste de acuerdo al título J de la norma NSR10 y la norma NFPA, el sistema de RCI para este tipo de escenarios, que debe contemplar rociadores, gabinetes, sistema de detección y alarmas de pánico.

PISTA DE PATINAJE

Acorde a las revisiones realizadas al presupuesto con las actividades a realizar se debe ajustar las a cantidades y las actividades nuevas que se deben incluir y no fueron presupuestadas para el capítulo de las demoliciones, cabe anotar que el contratista debe iniciar la consolidación de un acta de modificación en la que se determine el alcance real al presupuesto inicial

Diseño Arquitectónico

Es necesario especificar el tipo de pista que se requiere bajo las determinantes de uso final ya que de esto depende el peralte de las curvas

se debe incluir dentro del presupuesto las barandas según detalle en diseño ya que por normativa y seguridad se especifica una baranda con características diferentes a la contratada

según la Normativa-Escenarios de Patinaje-2020, expedida por la Federación Colombiana de Patinaje-FEDEPATIN y la Norma Invias vigente, las carpetas asfálticas que conforma la superficie de rodadura deben incluir las emulsiones asfálticas CRL-1 y CRR-1, razón por la cual se deben ajustar estas actividades que no se presupuestaron inicialmente.

Se debe ajustar el diseño de la iluminación ya que la distribución de mástiles propuesta en los diseños, no cumple con la normativa - Escenarios de Patinaje-2020, expedida por la Federación Colombiana de Patinaje-FEDEPATIN para las pistas, Pues no se está iluminando la zona de pista de ruta, de tal forma se debe realizar estudio fotométrico con el fin de establecer qué tipo de luminaria y que ubicación debe tener cada mástil.

Cabe aclarar que el diseño entregado por la entidad contratante se proyecta bajo unos diseños y parámetros dados por la FEDEPATIN para una pista de entrenamiento sin homologación.

Diseño Estructural

La interventoría en conjunto con obra realiza revisión a memorias de cálculo y planimetría con el fin de definir la especificación final del concreto para construcción de varios elementos estructurales según los requerimientos técnicos y de normativa vigentes y la realidad actual de las obras a ejecutar.

Diseño Sanitario y pluvial

Se evidencio en la revisión inicial de diseños la necesidad de ajustar el diseño de la red pluvial dentro de las actividades realizadas en este periodo por los equipos de especialistas de obra e interventoría está el ajuste de estos diseños con el fin de mejorar la capacidad esto debe incluir los drenajes de la zona de grama sintética que se debe construir entre las dos pistas adicionalmente se debe calcular un sistema de drenaje perimetral en la pista de ruta con el fin de dar manejo a las aguas lluvias que viene por escorrentía superficial hacia el parqueadero.

El contratista y la interventoría solicitaron por oficio a la entidad contratante la entrega de planimetría récord georreferenciada de las redes ejecutadas en el contrato de Fase 1.

.

PISTA DE ATLETISMO

Es necesario realizar un nuevo estudio de suelos para ajustar el diseño de pavimento ya que los datos encontrados en la documentación entregada en la consultoría no son claros se encuentra que se toman equivocadamente los CBR de la pista de patinaje para realizar el diseño de la estructura de la pista.

Se debe ajustar el diseño de pavimentos contemplando cuenta la normatividad de la World Athletics en cuanto a los requerimientos de construcción según la categoría, contenidos en el capítulo C de su Manual de Instalaciones de Atletismo vr. 2019.

Para verificar la red existente se solicitó a la entidad los planos récord de la tubería para riego y de las redes que hacen parte del drenaje de la cancha, durante este periodo de tiempo se realiza levantamiento real de la pista existente para verificar la implantación y el diseño inicial.

Acorde a las solicitudes y observaciones realizadas durante este periodo de tiempo por la entidad IDERMETA la cual traslada las recomendaciones dadas por la liga de atletismo del meta en cabeza del señor Héctor Aguirre Castillo presidente de la liga para el acabado final de la pista de atletismo, la interventoría realizara concepto técnico teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del sistema contratado en cuanto al sistema que se solicita instalar.

El contratista y la interventoría solicitaron por oficio a la entidad contratante la entrega de planimetria récord georreferenciada de las redes ejecutadas en el contrato de Fase 1.

CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA

Acorde a las revisiones de la documentación técnicas entregadas por la entidad contratante se han realizado observaciones y/o a los ajustes a los diferentes diseños de los escenarios, la interventoría ha venido revisando conjuntamente con el contratista las diferentes opciones para cada escenario, con el personal especialista que hace parte de la interventoría, de tal forma los ajustes y determinaciones para así mismo mantener informada a la entidad contratante ya que estos afectan el alcance del presupuesto de igual forma se está trabajando en la presentación de un acta de modificación de cantidades de obra para la inclusión de ítem no previstos y ajuste de cantidades acorde a las necesidades actuales, las especificaciones y la normativa vigente actualizado el alcance real del presupuesto de obra.

El contratista solicito por oficio a la EAAV el catastro de redes del sector y está a la espera de la respuesta de la entidad prestadora de servicio y se solicitó a la entidad contratante la entrega de planimetría récord georreferenciada de las redes ejecutadas en el contrato de Fase 1, al igual que una implantación récord de lo ejecutado en fase 1 con el fin de evidenciar posibles cruces que puedan afectar las garantías aún vigentes de ese contrato el cual se encuentra en etapa de recibo final y liquidación.

4. GESTIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	El director de Interventoría dirige la ejecución del contrato de interventoría en los aspectos técnicos, legales, administrativos, financieros y ambientales. Para este periodo se realiza respuesta de oficios a solicitudes del contratista, la elaboración de informes de interventoría.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Realiza la cuantificación de las cantidades ejecutadas, para este periodo lo concerniente a actividades de demoliciones y desmontes de los coliseos existentes se realiza revisión de cantidades y actividades que no se presupuestaron inicialmente para proyección de acta de modificación, adicionalmente se realiza supervisión de los procedimientos de cada actividad acorde al cumplimiento de las

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
	especificaciones técnicas, de igual forma verifica la correcta ejecución de los distintos planes de seguridad en el trabajo y plan de manejo ambiental, verifica y realiza control de calidad a los elementos y materiales utilizados en los diferentes procesos constructivos
INGENIERO ELECTRICISTA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Para este periodo de tiempo el especialista eléctrico se ha encargado de realizar la revisión de las observaciones realizadas por el contratista a los diseños eléctricos entregados por la entidad verificando presupuesto y cantidades de obra proyectadas para la ejecución
ASESOR O ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Para este periodo de tiempo se ha venido realizando la revisión de las observaciones encontradas en la cimentación de los escenarios, de tal forma se trabaja con el contratista para ajustar los diseños acordes a las mesas de trabajo realizadas conjuntamente
ASESOR O ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	El especialista hidráulico realiza revisión y trabaja conjuntamente con el contratista de obra para verificar los ajustes que se deben realizar a las redes hidrosanitarias que se cruzan con la cimentación del proyecto, así mismo se trabaja en los ajustes que se deben realizar a la red de suministro y la red del sistema contraincendios
ASESOR O ESPECIALISTA AMBIENTAL	Para este periodo de tiempo se realiza revisión de los PMA realizados encontrados en la documentación inicial entregada en el proyecto, de tal forma se solicita actualizar y corregir el PMA acorde las determinantes del proyecto, de igual forma se realiza visita a obra con el fin de velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental.
ASESOR O PROFESIONAL Y/O EN SALUD OCUPACIONAL	Para este periodo de tiempo se realiza seguimiento al plan de salud ocupacional, velando por el cumplimiento de la normativa se verifican documentaciones para el correcto ingreso del personal en obra, se verifican preoperacionales, permisos de trabajo, se

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
	lleva control de los equipos, se verifican pagos de planillas de seguridad social entregadas por el contratista.

4. 1. GESTIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	El director de Interventoría, dirige la ejecución del contrato de interventoría en los aspectos técnicos, legales, administrativos, financieros y ambientales.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Realiza la cuantificación de las cantidades ejecutadas para las demoliciones y desmontes realizadas en la pista de velocidad, pista de ruta y graderías existentes, de igual forma supervisa, los procedimientos de cada actividad se verifica la correcta ejecución de los distintos planes de seguridad en el trabajo y plan de manejo ambiental para cada proyecto, verifica y realiza control de calidad a los elementos y materiales utilizados en los diferentes procesos constructivos
INGENIERO ELECTRICISTA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se realiza verificación de las observaciones realizadas por el contratista para el diseño de la iluminación de la pista de igual forma se revisan las alternativas y ajustes de diseños que se deben realizar a las acometidas y a los puntos que deben implementarse en la pista verificando presupuesto y cantidades de obra proyectadas para verificar el alcance real de este capítulo del presupuesto.
ASESOR O ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Para este periodo se trabaja conjuntamente con el contratista de obra en el ajuste que debe realizarse a la red de aguas lluvias y drenaje de la grama sintética que no fueron contemplados en el diseño inicial.
ASESOR O ESPECIALISTA AMBIENTAL	Para este periodo de tiempo se realiza revisión del PMA encontrado en la documentación inicial entregada en el proyecto, de tal forma

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
	se solicita actualizar y corregir el PMA acorde las determinantes del proyecto, de igual forma se realiza visita a obra con el fin de velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental.
ASESOR O PROFESIONAL Y/O EN SALUD OCUPACIONAL	Realiza seguimiento al plan de salud ocupacional, velando por el cumplimiento de la normativa acorde a todos los procedimientos realizados en la construcción del proyecto, supervisa la aplicación de la ley respecto a las afiliaciones y seguridad en el trabajo de todos los trabajadores de la obra.

4.2. GESTIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Para este periodo se realiza respuesta de oficios a solicitudes del contratista, la elaboración de informes de interventoría dirige la ejecución del proyecto en los aspectos técnicos, legales, administrativos, financieros y ambientales.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Para este periodo se ha venido trabajando en la verificación de niveles y de la implantación real de la pista, se verifica ejecución de cantidades y avance, de igual forma supervisa, los procedimientos de cada actividad, verifica la correcta ejecución de los distintos planes de seguridad en el trabajo y plan de manejo ambiental para cada proyecto, verifica y realiza control de calidad a los elementos y materiales utilizados en los diferentes procesos constructivos
INGENIERO ELECTRICISTA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Para este periodo de tiempo el especialista eléctrico se ha encargado de realizar la revisión de los diseños eléctricos entregados por la entidad verificando presupuesto y cantidades de obra proyectadas para la ejecución

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
ASESOR O ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Para este periodo se ha venido verificando el sistema de redes hidráulicas existentes dentro de la pista para el sistema de drenaje, sistema de riego y sistema de red de incendios.
ASESOR O ESPECIALISTA AMBIENTAL	Para este periodo de tiempo se realiza revisión del PMA encontrado en la documentación inicial entregada en el proyecto, de tal forma se solicita actualizar y corregir el PMA acorde las determinantes del proyecto, de igual forma se realiza visita a obra con el fin de velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental.
ASESOR O PROFESIONAL Y/O EN SALUD OCUPACIONAL	Realiza seguimiento al plan de salud ocupacional, velando por el cumplimiento de la normativa acorde a todos los procedimientos realizados en la construcción del proyecto, supervisa la aplicación de la ley respecto a las afiliaciones y seguridad en el trabajo de todos los trabajadores de la obra.

5. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia.

ESTADO	N° DE DÍAS
NUBLADO	0
TORMENTA	0
LLUVIOSO	14
SOLEADO	16

OBSERVACIONES
Se anexan a esta acta cuadro de control del tiempo en el cual se lleva el registro a diario del estado del tiempo para este periodo

A. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. NORMAS TÉCNICAS CITADAS EN EL PROCESO

NORMA	APLICACIÓN	RESULTADO
MANUAL ESCENARIOS DEPORTIVOS	VERIFICACION DE DISEÑOS Y ESPECIFICAIONES	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES PARA CADA ESCENARIO
NORMATIVA ESCENARIOS DE PATINAJE 2016 (FCP).	VERIFICACION DE DISEÑOS Y ESPECIFICAIONES	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES DIMENSION Y PERLATES
NORMA INSTALACION PISTA DE ATLETISMO IAAF	VERIFICACION DE DISEÑOS Y ESPECIFICAIONES	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Durante este periodo de tiempo se realiza entrega de permiso de aprovechamiento forestal emitido por la secretaria de ambiente la alcaldía de Villavicencio, de tal forma se realiza inventario y autorización de tala de 8 especies arbóreas que se encuentran dentro del área de construcción de los escenarios multipropósito y pista de patinaje, la interventoría realiza de traslado de documento a la entidad, se realiza entrega de certificación de la empresa ZODME quien será la encargada de la disposición de los escombros resultantes de las demoliciones, se realiza entrega de informe de seguimiento al plan de manejo ambiental, se reitera la solicitud al contratista mediante oficio OF-C249-2023-080 de la entrega de presupuesto ajustado a la realidad y ejecución del proyecto.

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: Durante este periodo se realiza seguimiento a la implementación del PMT acorde a lo estipulado en el documento aprobado por la secretaria de movilidad, de tal forma se realiza entrega de bitácora e informe a la interventoría para aprobación, la interventoría solicita al contratista la copia del radicado ante la secretaria de movilidad de la documentación entregada correspondiente al mes de junio.

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GERENCIA DE PROYECTOS: La interventoría solicita al contratista mediante oficio consecutivo OFC-249-2023-061 a radicación del plan de gerencia el cual debe entregarse anexo al informe de obra este requerimiento está pendiente de cumplimiento por parte del contratista.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.

2,00 DESMONTE Y DEMOLICIONES

2,1 DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

Para este periodo de tiempo se realiza desmonte de lavamanos de pedestal y de sobreponer de los mesones de baños público y camerinos de las zonas de boxeo y zonas de gimnasia para el desarrollo de esta actividad se realiza el retiro de lavamanos incluyendo accesorios, griferías y tuberías de conexión y desagüe, posteriormente se acopia en el lugar dispuesto por IDERMETA para su inventariado y entrega.

2,2 DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

Consiste en el retiro de sanitario incluyendo accesorios, tanques de agua y tuberías de conexión Y desagüe, esta actividad se ejecuta en los baños públicos, baños de coliseo, baños de zona de pesas y zona de gimnasia, cabe anotar que algunos elementos se dañan en el proceso de desmonte ya que están fijados con cemento blanco, sin embargo, el material se acopia en el lugar dispuesto por IDERMETA para su entrega.

2,3 DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

Para el desarrollo de esta actividad se realiza por medio de manlift y personal sujetado a la estructura se verifican procedimientos de maniobras en alturas, se verifican continuamente permisos para cada actividad, para este periodo se realiza el desmonte de los elementos que constituyen la estructura metálica para cubierta, correas, vigas, contravientos, cerchas, de las zonas de coliseo de voleibol, zona de pesas y zona de luchas, para esta actividad se realiza toma de medidas para cada elemento se verifican calibres, se realiza corte de los elementos que posteriormente se acopian en lugar dispuesto por IDERMETA para su inventario y retiro.

2,4 DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

Consiste en el desmonte de los elementos que constituyen la estructura metálica del polideportivo, pórticos, vigas tipo cajón, columnas y demás elementos componentes del polideportivo que soporta la fachada y cubierta, esta actividad se realiza en la zona de coliseo de voleibol, coliseo de pesas boxeo, luchas y taekwondo, la interventoría realiza verificación de

toma de medidas para cada elemento se comprueban calibres, para el desmonte se realiza corte de los elementos y se acopian en lugar dispuesto por IDERMETA para su posterior retiro.

2,5 DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

Se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, puertas y sus marcos previamente indicados en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares, de tal forma se realiza desmonte de marcos y puertas metálicas de zonas de acceso a baños, puertas de camerinos y bodegas, cabe anotar que en el desmonte de los elementos algunos elementos se dañan en el proceso de retiro, esta actividad se cuantifica para inventario y se acopia para entrega a IDERMETA.

2,6 DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

Para esta actividad se incluye el desmonte de miniwave cerramiento de las fachadas, se ejecuta con apoyo de man lift es una actividad que contempla trabajo en alturas por lo que se verifican preoperacionales de la maquinaria y permisos trabajo, adicionalmente se realiza desmonte de ventaneria en aluminio de fachadas exteriores y ventaneria de ventilación de los baños de las distintas zonas, se verifica cantidad de elementos a desmontar para el caso de las fachadas en miniwave se cuantifica con equipo de topografía los elementos que hacen parte del cerramiento para realizar levantamiento de todos los escenarios.

2,8 DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

Consiste en los trabajos necesarios para desmontar y retirarlas zonas sometidas a adecuación, las duchas y griferías previamente indicadas en los planos arquitectónicos, se retira tubería de conexión, ducha y pomo de control, se inventaría cantidad de duchas retiradas, se acopia y entrega a IDERMETA.

2,10 DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.

Consiste en los trabajos necesarios para demoler y retirar muro en ladrillo tolete macizo / común incluyendo el retiro de los escombros generados, para esta actividad se realiza verificación de medidas m2 se realiza levantamiento arquitectónico, se verifican alturas y se realiza demolición manual de los muros divisorios y los que hacen parte de la fachada en las zonas de coliseo de voleibol, zona de pesas, zona de boxeo, zona de luchas y taekwondo. El material producto de la demolición se acopia en lugar determinado por la interventoría para su posterior retiro y disposición.

2,12 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.

Para esta actividad se realiza demolición de los elementos de confinamiento de la mampostería, columnas, vigas y dinteles, se realiza demolición de graderías de la zona de coliseo de voleibol se utiliza martillo mecánico y herramienta menor para el desarrollo de esta actividad, se realiza corte de los aceros de refuerzo y retiro de material de escombros acopio en lugar acordado con la interventoría para su posterior retiro

2,13 DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

Consiste en el desmonte de divisiones modulares metálicas con sus respectivos marcos, accesorios y anclajes, incluyendo el retiro de los escombros o residuos generados, se realiza medida de los elementos componentes de la división antes de realizar desmonte, se cuantifican las divisiones de zona de camerinos en voleibol y zona de camerinos de la zona de gimnasia posteriormente se acopia en el lugar dispuesto por IDERMETA para su entrega

CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

1,1 DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO

consiste en el desmonte todos los elementos que constituyen la estructura de baranda, incluyendo el retiro de los escombros o residuos generados, para esta actividad se realiza corte de parales y pasamanos con oxicorte posteriormente se realiza acopio y entrega del material a IDERMETA.

1,2 DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

Consiste en los trabajos necesarios para demolición mecánica total o parcial de andenes, placas o sardineles en concreto reforzado, se realiza verificación de los m2 con levantamiento topográfico de las cantidades a demoler, se verifican espesores para cubicar los m3 y se realiza demolición mecánica, posteriormente se realiza retiro de los escombros y material generado producto de la demolición la interventoria verifica lugar y licencia de lugar certificado para la disposición de los escombros.

1,3 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.

Esta actividad corresponde a la demolición del pavimento de la pista de ruta existente, la actividad comprende demolición de pavimento asfáltico, incluye trasiego, cargue mecánico y disposición final de los materiales producto de la demolición, con mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución, para cuantificar las cantidades se realiza teniendo en cuenta los planos del proyecto específico, de tal forma se realiza verificación de los m2 con levantamiento topográfico de las cantidades a demoler, se verifican espesores para cubicar los m3 y se realiza demolición mecánica, posteriormente se realiza retiro y disposición de escombros del material producto de la demolición.

1,4 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.

Esta actividad se ejecuta para la demolición de las graderías existentes, se realiza demolición de placas, machones de soporte y vigas de cimentación, La actividad comprende demolición de concreto reforzado, incluye trasiego y cargue manual, con los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución. Para cuantificar las cantidades se realiza verificación de los m2 con levantamiento topográfico de los elementos a demoler, se verifican espesores para cubicar los m3 y se realiza demolición mecánica, posteriormente se realiza retiro y disposición de escombros del material producto de la demolición.

CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

1.0 PRELIMINARES

1,1 "LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA - CANCHASDEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS "

Durante este periodo de tiempo se realiza implantación de la pista según diseños se revisan niveles existentes encontrando que la cancha de futbol se encuentra mas alta respecto a la cota de la pista de atletismo, se verifica las zonas de salto y pista encontrando que los diseños deben ajustarse ya que el levantamiento topográfico real tomado en obra no concuerda con el plano de diseño entregado dentro de la documentación inicial.

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

Escenarios multipropósito

- Se continúan actividades de desmonte de elementos para los escenarios coliseos existentes en zonas de voleibol, zona de pesas, boxeo, zona de taekwondo y zona de lucha, Se realizan actividades de desmontes de estructura metálica para cubierta y fachadas, actividad para la que se emplea equipos como manlift para realizar actividades de corte de la estructura que posteriormente se desmonta con poleas.

- Para el desmonte de la estructura se realiza con grúa PH para los elementos que conforman el pórtico principal de la estructura, previo al desarrollo de la actividad se verifican fichas técnicas de operación y procedimientos para aprobación de la maniobra por interventoría.

- Se continúan actividades de desmonte de fachadas, para esta actividad se realiza procedimiento trabajo en alturas utilizando igualmente el manlift para realizar el desmonte de las laminas que se acopian en sitio para inventario y entrega a la entidad IDERMETA.

- Se continúan actividades de desmonte de cielorrasos en drywall, actividades de desmonte de lámparas de iluminación, desmonte de aparatos eléctricos tableros, tomas y retiro de cableado se realiza retiro de acometidas eléctricas cableado de los dos escenarios, los elementos se cuantifican para inventario y se acopian para entrega a ia entidad.

- Se realizan actividades de desmonte de aparatos sanitarios, lavamanos y duchas en la ejecución de la actividad se retiran griferías y elementos de fijación, todos los aparatos se inventarían para acopiarlos y entregarlos a la entidad.

- Se realizan actividades de desmonte de carpinterías metálicas como divisiones de baños, puertas, ventaneria y rejas, para el desarrollo de esta actividad se realiza desarmado de los elementos y entrega a la entidad para inventario y retiro.

- se inician actividades para el escenario de gimnasia entregado por la entidad a partir del día 5 de junio de 2023, se inicia con el desmonte de aparatos sanitarios, carpinterías, barandas, lámparas, y elementos de fachada y cubierta, se realiza desmonte de estructura metálica, se inician actividades de demolición de muros en mampostería, demolición de elementos de concreto reforzado

- Se realizan actividades de demolición de mampostería, concretos y cielorrasos componentes del módulo de gimnasia, para esta actividad se realiza demolición manual, con martillo demoledor, se realiza acopio dentro de la obra.

- Todos los elementos desmontados se han venido cuantificando por medio de inventario con el fin de realizar acta de entrega para retiro por parte de la entidad.

- Durante el proceso de demoliciones la interventoría ha venido verificando los procedimientos entregados por el contratista para cada actividad, de igual forma se verifican las fichas de operación de las maquinarias en obra grúa PH, retroexcavadora, camión grúa y manlift , así como las herramientas de demolición como pulidoras, taladros y rotomartillos.

- Durante este periodo se ha venido realizando el control de entrega y uso de los elementos de protección personal por parte del personal encargado de seguridad en el trabajo.

- Para el retiro de los escombros y la disposición se solicita al contratista la entrega de certificado de disposición final que debe anexar de la empresa autorizada por la entidad ambiental para esta actividad.

Pista de patinaje

- Se realizan actividades de retiro de barandas metálicas, proceso que se realiza con oxicorte, se realiza cuantificado de los elementos y entrega a personal encargado por IDERMETA

- Se realizan actividades de demolición de placas de concreto, graderías de la pista de patinaje de velocidad y pista de ruta.
- Se realiza demolición de cárcamos y sardineles que se encuentran perimetrales a la pista de patinaje para esta actividad se realiza acopio del material retiro y disposición de los escombros.

- Se realiza demolición de capa de asfalto de la pista de ruta actividad realizada con maquinaria, el material escombro resultante de la actividad se carga en volquetas con retroexcavadora orugada y se carga en volquetas.

- Todos los elementos desmontados se han venido cuantificando por medio de inventario con el fin de realizar acta de entrega para retiro por parte de la entidad.

- Los elementos escombros provenientes de la demolición se retiran y se realiza disposición en lugar autorizado por la corporación ambiental cormacarena.

- Durante el proceso de demoliciones la interventoría ha venido verificando los procedimientos entregados por el contratista para cada actividad, de igual forma se verifican las fichas de operación de las maquinarias en obra retroexcavadora, así como las herramientas de demolición como pulidoras, taladros y rotomartillos.

- Durante este periodo se ha venido realizando el control de entrega y uso de los elementos de protección personal por parte del personal encargado de seguridad en el trabajo.

Pista de atletismo

- Luego de realizar la implantación se evidencian diferencias de nivel respecto al nivel de la cancha de futbol de tal forma se deben realizar ajustes al diseño arquitectónico con el fin de solucionar la diferencia en los accesos y el nivel generado en la altura del cárcamo perimetral.

- Es necesario realizar estudio de suelos con el fin de verificar la capacidad del terreno y realizar de igual forma el ajuste a la estructura de la pista atlética acorde a la normativa y los manuales técnicos de la wordl Athletics.

- Durante este periodo se ha venido realizando el control de entrega y uso de los elementos de protección personal por parte del personal encargado de seguridad en el trabajo.

4. VERIFICACIÓN MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
N.A.	N.A.	
N.A.	N.A.	

Durante este periodo de tiempo no se desarrollan actividades que necesiten ensayos de control de calidad

5. VERIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Implementación de inspección de arnés de seguridad ○ Implementación formato plan de izaje ○ Inspección de EPP y contratistas	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
02/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Visita de IDERMETA ○ Verificación de documentación cargue METALREC ○ Afiliación a personal nuevo	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
	○ Liquidación de planilla de seguridad del consorcio ○ Inspección de EPP y contratistas	
03/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Inspección de EPP y contratistas	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
05/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas ○ Verificación de permisos de actividades	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
06/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
07/06/2023	○ Implementación de preoperacional de mezcladoras portátiles ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
08/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas ○ Verificación de seguridad social de contratistas	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
09/06/2023	○ Capacitación de personal en brigadas de emergencias ○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas ○ Supervisión del retiro de material METAREC	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
10/06/2023	○ Elaboración de fichas de seguridad de productos químicos ○ Acompañamiento instalación de líneas de vida sobre cubierta ○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
12/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas ○ Señalización de áreas ○ Acompañamiento sobre cubiertas de actividades ○ Verificación de permisos de actividades	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
13/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
14/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas ○ Revisión y verificación de procedimientos	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
15/06/2023	○ Alimentación de matriz de gestión de la información ○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
16/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
17/06/2023	○ Implementación de procedimiento para la elaboración de evaluaciones medicas ○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
19/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
20/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
21/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
22/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
23/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas ○ Inspección de seguridad industrial ○ Verificación de documentación para retiro de material de desmonte	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
24/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
	○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas ○ Instalación de señalización	
26/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Elaboración de procedimiento de retiro de escombros ○ Subsanación del evento 24/06/2023 ○ Recarga e inspección de extintores	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
27/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas ○ Subsanación del evento 24/06/2023	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
28/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratista ○ Subsanación del evento 24/06/2023	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
29/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratista ○ Subsanación del evento 24/06/2023	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS
30/06/2023	○ Charla preoperacional ○ Acompañamiento de actividades en obra ○ Verificación de preoperacionales de actividades y equipos ○ Inspección de EPP y contratistas ○ Acompañamiento sobre cubierta de actividades ○ Inspección de botiquines en obra y STOP	VERIFICADO EN REGISTROS ENTREGADOS

Dentro de la gestión de la implementación de las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizaron en los 3 proyectos, (escenarios deportivos, pista de patinaje y atletismo) se evidencia el cumplimiento del contratista de la normativa, aplicación de procedimientos a los cuales se le realizaron sus respectivas observaciones y recomendaciones en puntos donde se evidenciaba falta de información y corrección. Dentro de las actividades realizadas se mencionan las siguientes:

- Se realizo la verificación de la seguridad social de los contratistas y consorcio, los cuales cumplieron los aportes establecidos a todos los subsistemas de seguridad social.
- Se realizaron afiliaciones a seguridad social al personal nuevo
- Se realizaron exámenes ocupacionales de ingreso
- Se realizo la verificación de la asistencia a charlas y capacitaciones realizadas al personal que se encuentra en los 3 proyectos
- La entrega de elementos de protección personal al personal
- La supervisión en las actividades diarias en obra
- El diligenciamiento de los permisos de trabajo en alturas
- Verificación de documentación de maquinaria, volquetas y operarios
- Revisión y observaciones a procedimientos de actividades
- Verificación de inspecciones de seguridad, botiquín y extintores.

Anexo: registro "ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL"
Registro "ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA"

6. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Empleos directos generados	9
Empleos indirectos generados	26
Total empleos generados	35

ACTORES POR ÁMBITO CONTEXTUAL – LOCAL

EMPLEO	CANTIDAD
Población Urbana y/o Rural	26
Agrícola	
Ganadero	
Escolar	
Comercial	9
Hoteles	

EMPLEO	CANTIDAD
TOTAL	35

7. VERIFICACIÓN MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Permiso de aprovechamiento forestal	La secretaria de medio ambiente otorgo el permiso de aprovechamiento forestal para talar los individuos arbóreos que interfieren con el proceso constructivo.	Se anexa el documento con el concepto.
Jornada de orden y aseo	Se realizo jornada de orden y aseo en áreas de los baños y escenarios deportivos los 22 y 23 de junio.	El personal se organizó para realizar esta jornada en tiempos de lluvia para no tener tiempos muertos.
Apertura de puerta provisional	Se realiza tala de palmera ubicada en la entrada provisional al proyecto y retiro de la matera en donde se encontraba.	La tala de la palmera se realizó teniendo en cuenta las medidas de seguridad correspondientes.
Adecuación de la vía de acceso al proyecto	Por la inestabilidad del terreno por donde ingresan las volquetas que realizan el retiro de RCDs, se decide nivelar nivelar el área con material de relleno para mejorar las condiciones y evitar accidentes con los vehículos de carga pesada.	Satisfactoriamente se realizó el relleno de materiales para dar estabilidad en el ingreso de volquetas.
Cargue de residuos de demolición	Las volquetas ingresan al área de pista de patinaje al realizar el retiro de RCDs que se encuentran en el lugar	Las volquetas realizan el retiro de los RCDs con el cargue permitido y encarpadas.
Instalación de la señalización del PMT	Se instalan las señales aprobadas en el PMT	Se observa instalación de señalización en vías públicas para información a terceros.

Se relacionan las actividades desarrolladas en el contrato general para los proyectos desarrollados

REGISTRO FOTOGRAFICO:

JORNADA DE ORDEN Y ASEO



APERTURA DE PUERTA PROVISIONAL



INSTALACION SEÑALIZACION PMT


Anexo: Registro "ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL"

B. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE OBRA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DÍAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Durante este periodo de tiempo no se generó ningún acto prorroga, suspensión.

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Durante este periodo de tiempo no se generó ningún acto adiciona o modificación al contrato de obra

2. **GARANTÍAS:**

A continuación, se realiza descripción de las pólizas generadas para el contrato de obra publica

POLIZA DE ACTUALIZACION SERIEDAD DE OFERTA ACORDE A MINUTA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-81241317-2
ANEXO N°	0
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-81327904-1
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	10-04-2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/02/2023	23/06/2024	$ 10.174.388.168,40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	23/02/2023	23/06/2024	$ 15.261.582.252,60
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINZACIONES	23/02/2023	23/02/2027	$ 2.543.597.042,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	23/02/2024	23/02/2029	$ 15.261.582.252,60
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/02/2023	23/02/2024	$ 2.543.597.042,10

POLIZA ACTUALIZADA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-81241317-2
ANEXO N°	1
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-81327904-1
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	17-05-2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/05/2023	09/09/2024	$ 10.174.388.168,40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	10/05/2023	09/09/2024	$ 15.261.582.252,60
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINZACIONES	10/05/2023	09/05/2027	$ 2.543.597.042,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	10/05/2023	09/05/2029	$ 15.261.582.252,60
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10/05/2023	09/05/2024	$ 2.543.597.042,10

C. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

N° ACTA	N° EGRESO	FECHA	% EJECUCIÓN	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
TOTALES							

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 01/06/2023 ***AL*** 30/06/2023

Avance físico ejecutado 0,91% y avance financiero ejecutado 0%


A la fecha no se ha generado ningún tipo de pago al contrato de obra

D. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2,1	DESMONTE Y DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	20 und	66.67%

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD

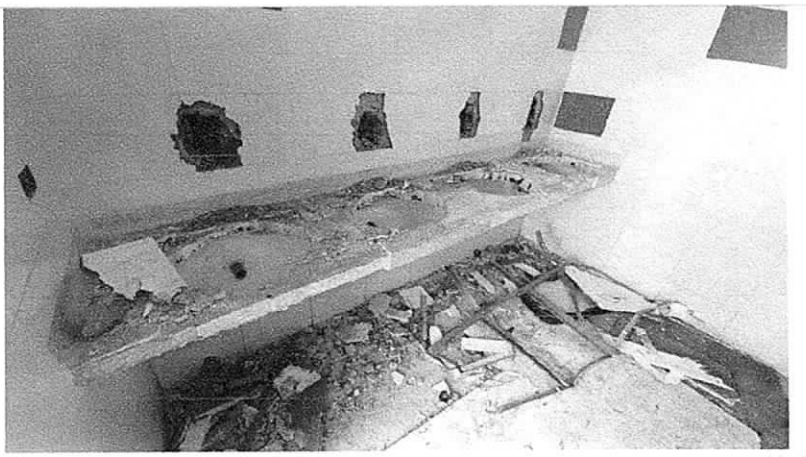

OBSERVACIONES

SE REALIZA DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS LAVAMANOS DE PEDESTAL Y DE SOBREPONER EN BATERIAS DE BAÑOS

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DESMONTE Y DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
2,2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	44 und	80%



OBSERVACIONES

SE REALIZA DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS APARATOS CERAMICOS SANITARIOS DE BAÑOS DE CAMERINOS DE ZONA DE VOLIEBOLL, CAMERINOS ZONA DE PESAS, CAMERINOS ZONA DE GIMNASIA


ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DESMONTE Y DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
2,3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	3530.91 m2	81.75%



OBSERVACIONES

SE REALIZA DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA CORREAS, CORTAVIENTOS Y PERFILERIA DE LA ZONA DE COLISEO, DE VOLEIBALL, ZONA DE BOXEO, ZONA DE LUCHA, ZONA DE PESAS Y ZONA DE TAEKWONDO

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DESMONTE Y DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
2,4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	18.150,00 kg	70.20%

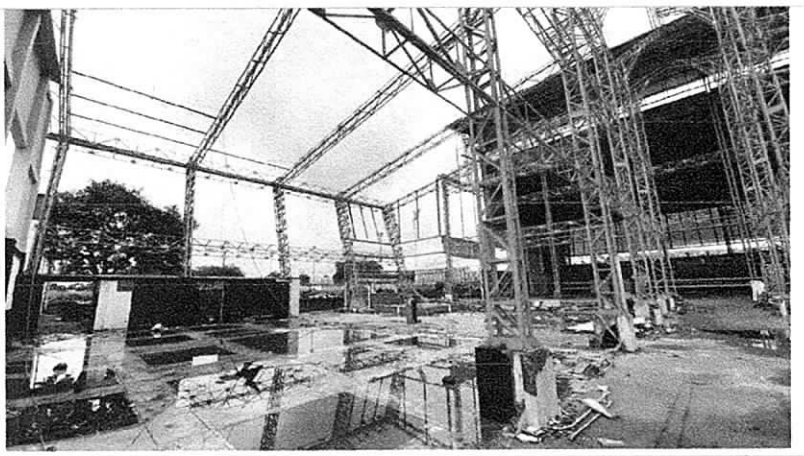

OBSERVACIONES

SE REALIZA DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE POLIDEPORTIVO, PERFILES TIPO CAJON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA FACHADAS, CERCHAS Y VIGAS DE PORTICOS PARA LAS ZONAS DE VOLEYBALL, ZONA DE LUCHAS, BOXEO Y PESAS.


ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DESMONTE Y DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
2,5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	40 und	68.97%



OBSERVACIONES

SE REALIZA DESMONTE Y RETIRO DE MARCOS Y PUERTAS METALICAS, SE REALIZA ACOPIO Y ENTREGA A IDERMETA DE LOS ELEMENTOS DESMONOTADOS SE DESMONTAN PUERTAS DE BAÑOS, ACCESO CAMERINOS, ACCESO BODEGAS DE COLISEOS MENORES


ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2,6	DESMONTE Y DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	1.875,40 m2	57.69%

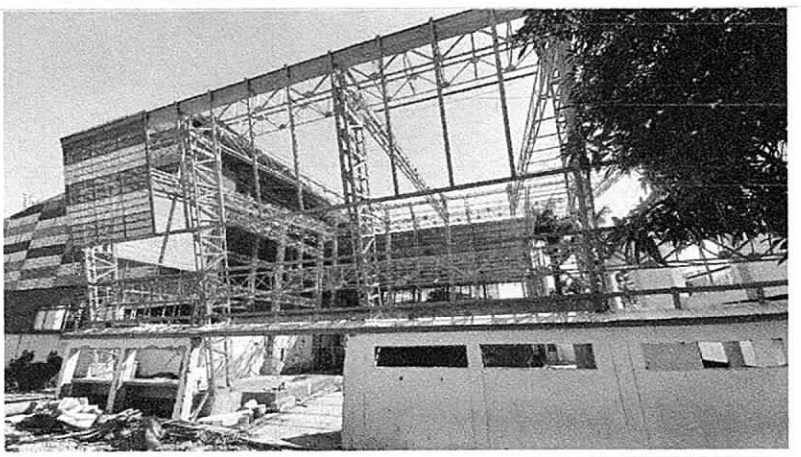

OBSERVACIONES

SE REALIZA DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA EN ALUMINIO, SE REALIZA DESMONTE DE REJA TIPO MALLA ESABONADA SOBREPUESTA A LA VENTANERIA, SE REALIZA DESMONTE DE FACHADA MICROPERFORADA. ZONA DE VOLEYBOL, ZONA DE PESAS, BOXEO, ZONA DE LUCHA Y TAEKONDO

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2,8	DESMONTE Y DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	6 und	54.55%

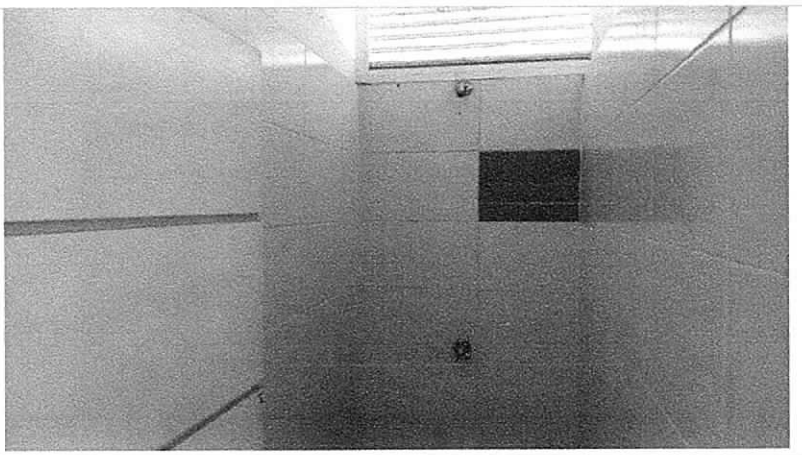

OBSERVACIONES


SE REALIZA DESMONTE Y RETIRO DE DUCHAS Y GRIFERIA DE LOS BAÑOS DE LOS CAMERINOS

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2,10	DESMONTE Y DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	1136.50 m2	34.07%
			

OBSERVACIONES

SE REALIZA DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO BLOQUE DE ARCILLA PARA ZAONA DE CAMERINOS Y BODEGAS DE VOLEIBOL SE REALIZA DEMOLICION DE MUROS PARA ZONA DE BOXEO Y ZONA DE LUCHAS


ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2,12	DESMONTE Y DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	7.59 m3	4.00%

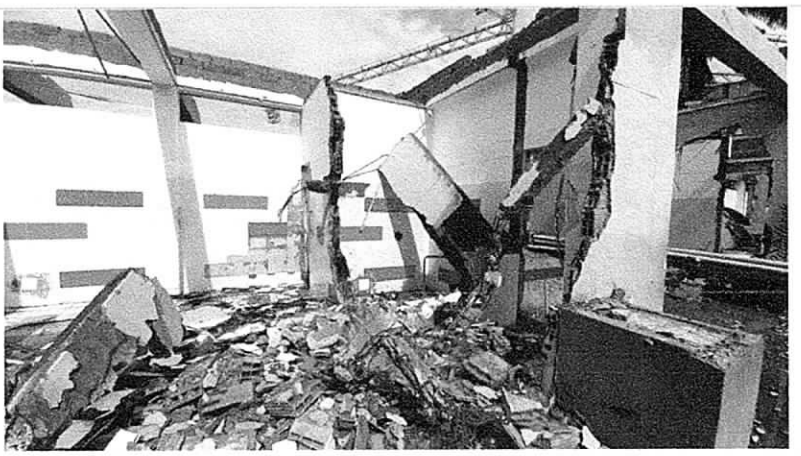

OBSERVACIONES

SE REALIZA DEMOLICION DE COMLUMNAS Y VIGAS DE CONFINAMIENTO DE LA MAMPOSTERIA PARA ZONA DE COLISEO DE VOLEYBOL

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2,13	DESMONTE Y DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	34.47 m2	75.10%

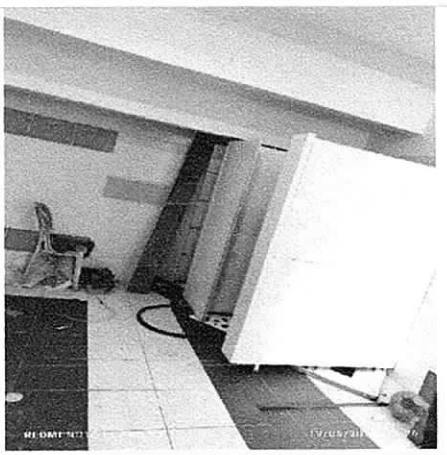

OBSERVACIONES

SE REALIZA DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES DE LAS CABINAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES A LA ZONA DE COLISEO DE VOLEIBOL Y CAMERINOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
1.1	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	-27.77 ML	-4.42%



OBSERVACIONES

PARA ESTE PERIODO SE CORRIJE VALOR DEL DESMONTE REALIZADO POR ERROR DE DIGITACION EN EL INFORME ANTERIOR

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
1.2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	283.7 m2	86.4%



OBSERVACIONES

SE REALIZA DEMOLICION DE LA PLACA DE LA PISTA INCLUYE ANDENES PERIMETRALES, PLACA INTERIOR SARDINELES CARCAMO SENDEROS PEATONALES


ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	119.66 m2	63.89%



OBSERVACIONES

CORRESPONDE A LA PAVIMENTO DE LA PISTA DE RUTA

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.4	DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	54.47 m3	14.7%

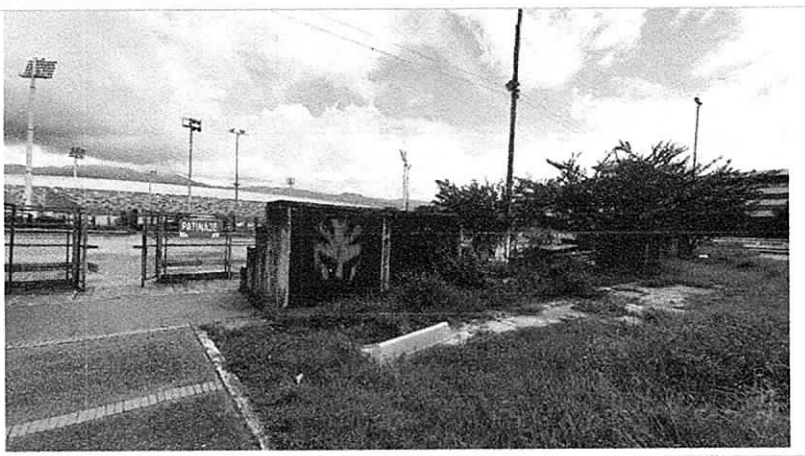

OBSERVACIONES

CORRESPONDE A LAS TARIMAS EN CONCRETO Y A LA CIMENTACION DE LAS TARIMAS EXISTENTES DE LA PISTA

CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DEMOLICIONES	EJECUTADO	%
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	4177.80m2	43.04%
			
OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES DE REPLANTEO DE BORDILLOS Y NIVELES DE ACABADO DE PISTA			

E. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Durante este periodo se realiza entrega de los escenarios pendientes zona de gimnasia y pista de atletismo mediante acta suscrita el día 05 de junio, de tal forma se inician y la intervención de la zona de gimnasia actividades de preliminares localización y replanteo de la pista atlética, de igual forma se inicia intervención desmontes en la zona de gimnasia.

- Acorde a las solicitudes realizadas mediante oficios y en los distintos comités de obra realizados con la entidad IDERMETA y la liga de atletismo del meta, en cuanto a la solicitud para el cambio del acabado final de la pista, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por el señor Héctor Aguirre Castillo presidente de la liga, la interventoría realizara revisión de cumplimiento de las especificaciones y normativa según la world Athletics entidad certificadora a nivel mundial con quien debe homologarse a pista, para el acabado propuesto prefabricado respecto al acabado contratado ítem 5.3 "PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA EN SITIO CERTIFICADA IAAF: SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 Y DIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPA ELÁSTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPA POROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM 1 A 4 MM DE COLOR ROJO." Con el fin de verificar el cumplimiento de especificaciones teniendo en cuenta lo estipulado en los estudios previos y el anexo técnico del proyecto.

- Se está a la espera de la respuesta de la solicitud realizada por oficio a la EAAV el catastro de redes del sector y está a la espera de la respuesta de la entidad prestadora de servicio y se solicitó a la entidad contratante la entrega de planimetría récord georreferenciada de las redes ejecutadas en el contrato de Fase 1.

- De acuerdo a las observaciones presentadas en el presente informe numeral 2.problemas presentados y mecanismos de solución propuestos el contratista de obra en conjunto con la interventoría se encuentran en proceso de realizar los ajustes a los diseños según las observaciones encontradas para cada proyecto, adicionalmente se viene trabajando en la consolidación del presupuesto mediante la presentación de un acta de modificación de cantidades de obra e inclusión de ítem no previstos acorde a cumplimiento de las especificaciones y la normativa vigentes para cada escenario.

Durante el periodo correspondiente al informe mensual de Interventoría N° 2, el contrato de obra No. 106 de 2023, ha presentado según la programación ajustada con el acta de inicio:

avance físico mensual	0,12%
total, ejecutado acumulado	0,91%
acumulado programado actualizado	0,54%

De acuerdo con las cantidades ejecutadas, las cuales fueron verificadas por esta interventoría, se obtiene un avance acumulado por capítulo, como se expone a continuación:

- **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.**

2,00 DESMONTE Y DEMOLICIONES: 31.09%

- **CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.**

1.0 DEMOLICIONES: 59.4%

- **CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META**

1.0 PRELIMINARES: 38.36%

F. ANEXOS

- Cuadro de resumen cantidades ejecutadas.
- Copia de la bitácora de la obra o de las actividades desarrolladas.
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Control de Seguridad Industrial.
- Control de equipos.
- Estado del tiempo.
- Copia afiliaciones del personal y pagos de seguridad social.
- Manejo Ambiental.
- Informe seguimiento plan de manejo de transito

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 30 días del mes Junio del 2023

Firma
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:
2520279953 CND

Firma
Nombre: ANDRÉS HERNANDEZ BOLAÑOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:
A251082008-80038630

Firma
Nombre: JORGUE A. RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:
2520268176 CND

3012

CUADRO DE RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS JUNIO DE 2023

EJECUTADO MES DE JUNIO 2023							ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL	% MES	CANT, ACUM.	% ACUMULADO
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.							
2,00	DESMONTE Y DEMOLICIONES							
2,1	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	20,00	$ 30.524,00	$ 610.480,0	66,67%	30,00	100,00%
2,2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	44,00	$ 38.155,00	$ 1.678.820,0	80,00%	55,00	100,00%
2,3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	3.530,91	$ 18.491,00	$ 65.290.056,8	81,75%	4.088,21	94,66%
2,4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	KG	18.150,00	$ 5.491,00	$ 99.661.650,0	70,20%	18.570,00	71,83%
2,5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	40,00	$ 82.033,00	$ 3.281.320,0	68,97%	58,00	100,00%
2,6	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	1.875,40	$ 18.021,00	$ 33.796.583,4	57,69%	2.246,49	69,11%
2,8	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	6,00	$ 15.262,00	$ 91.572,0	54,55%	11,00	100,00%
2,10	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	1.136,50	$ 14.647,00	$ 16.646.315,5	34,07%	1.170,50	35,09%
2,12	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	7,59	$ 383.666,00	$ 2.912.024,9	4,00%	7,59	4,00%
2,13	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	34,47	$ 33.079,00	$ 1.140.233,1	75,10%	45,90	100,00%
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL	% MES	CANT, ACUM.	% ACUMULADO

3013

CUADRO DE RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS JUNIO DE 2023								
EJECUTADO MES DE JUNIO 2023							ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL	% MES	CANT, ACUM.	% ACUMULADO
B	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.							
1.0	DEMOLICIONES							
1,1	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	ML	- 27,77	$ 15.530,00	-$ 431.268,1	-4,42%	628,26	100,00%
1,2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	283,70	$ 373.009,00	$ 105.822.653,3	84,60%	335,36	100,00%
1,3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	119,66	$ 291.376,00	$ 34.866.052,2	63,89%	132,96	71,00%
1,4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	54,47	$ 383.666,00	$ 20.898.287,0	14,70%	60,47	16,32%
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL	% MES	CANT, ACUM.	% ACUMULADO
C	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META							
1.0	PRELIMINARES							
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	4.177,80	$ 4.349,00	$ 18.169.252,2	43,04%	4.822,80	49,69%

3014

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

COPIA BITACORA DE OBRA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

3015

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	1	6	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	166 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL				MANLIF	1	
OPERARIO	2	X		EXCAVADORA	1	
AYUDANTE	12	X				
CELADOR				ESTACION	1	
TOPOGRAFO	1	X				
CADENERO	2	X		COMPUTADOR	1	
OTRO	2	X	INSP. OBRA			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.1	UN	DESMONTE LAVAMAMOS	5.00	SI	SI
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCTURA CUBIERTA	200.00	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	55.00	SI	SI
B.1.2	M3	DEMOL. PLACAS Y ANDENES	32.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
Luego de realizar actividades de implantación de los escenarios multipropósito y la pista de patinaje se evidencia la necesidad de realizar la tala de 8 árboles que interfieren en la construcción, de tal forma el contratista solicita acompañamiento a la secretaria del medio ambiente quien realiza la visita el dia de hoy, durante el recorrido de inspección se toma la medida de los anchos de los tallos y se identifican los arboles que deben intervenirse, la Ing. ambiental encargada de la visita realizara informe y posterior comunicación de las observaciones encontradas en la visita

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
1 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3016

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminacion de labores
	2	6	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIA FUERTE AL MEDIO DIA Y DESPUES DE 4:00PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias	1.5 HRS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	2	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	10	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR						
TOPOGRAFO	1	X		ESTACIÓN	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.1	UN	DESMONTE LAVAMANOS	5.00	SI	SI
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCTURA CUBIERTA	200.00	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	55.00	SI	SI
B.1.2	M3	DEMOL. PLACAS Y ANDENES	32.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
el dia de hoy se realiza inventario y acta de entrega de los elementos desmontados hasta la fecha, de tal forma se cuantifican las cantidades de cubierta, estructura metalica, fachadas, carpinterias, luminarias, aparatos sanitarios, correspondientes en su mayoria a la zona de coliseo de voleybol y escenario multifuncional zona de boxeo y pesas, tambien se cuantifican las baranads y pasamanos desmontados de la zona de patinaje, se realiza entrega a el Ing. Jorge Lopez persona encargada por la entidad para la entrega de los elementos desmontados

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
2 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820085038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3017

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	3	6	2023	7:00am	12:00md

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	105 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MANANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	2	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	12	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR						
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.1	UN	DESMONTE LAVAMAMOS	2.00	SI	SI
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCTURA CUBIERTA	200.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	20.00	SI	SI
A.2.12	M3	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	1.50	SI	SI
B.1.2	M3	DEMOL. PLACAS Y ANDENES	32.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se realizan actividades de demolicion y desmontes en la zona de esceanrios multifuncionales, se realizan actividades de demolicion de placas y andenes en la zona de pista de patinaje, se realiza levantamiento con equipo topografico para cuantificacion de cantidades.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
3 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

3018

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
	4	6	2023	NO SE LABORO	

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
4 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones

3019

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	5	6	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	2	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	11	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR						
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A 2.1	UN	DESMONTE LAVAMANOS	5.00	SI	SI
A 2.2	M2	DESM. ESTRUCTURA CUBIERTA	200.00	SI	SI
A 2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.00	SI	SI
A 2.8	UN	DESM. DUCHAS Y GRIFERIAS	4.00	SI	SI
A 2.10	M2	DEMOL. MUROS	55.00	SI	SI
A 2.13	M2	DESM. DIVISIONES MODULARES	10.00	SI	SI
B 1.2	M3	DEMOL. PLACAS Y ANDENES	12.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los descortes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde deba justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
para el dia de hoy se realiza recorrido con encargado por la entidad el ing. Jorge Lopez para realizar entrega de los escenarios de coliseo de gimnasia y pista de atletismo del estadio, se realiza recorrido de las zonas se deja evidencia fotografica del estaso de las mismas y se suscribe acta de entrega, cabe anotar que para la zona de gimnasia no se realiza retiro de la espuma y de los elementos que se encuentran dentro de los fosos de salto, es necesario solicitar a la entidad para que determine el lugar de disposicion final de estos elementos pues la empresa designada para retirar los elementos desmontados informa que ellos no realizaran este retiro, adicionalmente se realiza suscripcion de acta de vecindad con el fin de evidenciar el estado actual de las zonas a intervenir en la pista, accesos, chancha de futbol, igualmente se deja registro fotografico y las observaciones encontradas durante el recorrido en el acta.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
5 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones

3020

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	6	6	2023	7.00am	5.00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	2	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	12	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.1	UN	DESMONTE LAVAMANOS	3.00	SI	SI
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCTURA CUBIERTA	200.00	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.00	SI	SI
A.2.8	UN	DESM. DUCHAS Y GRIFERIAS	2.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOL. MUROS	55.00	SI	SI
A.2.13	M2	DESM. DIVISIONES MODULARES	10.00	SI	SI
B.1.2	M3	DEMOL. PLACAS Y ANDENES	32.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
en la zona de escenarios multifuncionales se realizan actividades de desmontes para la zona de baños de camerinos zona de boxeo y coliseo de voleybol se continuan actividades de desmonte de estructura de cubierta desmonte de aparatos sanitarios, para la zona de pista de patinaje se realizan actividades de placas, andenes perimetrales, anden interno y demolicion de sardineles.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
6 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3021

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	7	6	2023	7.00am	5.00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL				MANLIF	1	
OPERARIO	2	X		EXCAVADORA	1	
AYUDANTE	12	X				
CELADOR				ESTACION	1	
TOPOGRAFO	1	X				
CADENERO	2	X		COMPUTADOR	1	
OTRO	2	X	INSP. OBRA			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.2	UN	DESMONTE SANITARIOS	6.00	SI	SI
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCTURA CUBIERTA	200.00	SI	SI
A.2.4	KG	DESM. ESTRUC. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A.2.5	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOL. MUROS	55.00	SI	SI
A.2.13	M2	DESM. DIVISIONES MODULARES	10.00	SI	SI
B.1.2	M3	DEMOL. PLACAS Y ANDENES	32.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES

en la zona de escenarios multifuncionales se realizan actividade de desmontes para la zona de baños de camerinos zona de boxeo y coliseo de voleybol se continuan actividades de desmonte de estructura de cubierta desmonte de aparatos sanitarios, para la zona de pista de patinaje se realizan actividades de placas, andenes perimetrales, anden interno y demolicion de sardineles

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitacora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
7 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820080038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3022

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	8	6	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500004
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°.	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X		X	LLUVIA DESDE LAS 9:00am a 1:00pm
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	4.0 HRS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	2	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	12	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.2	UN	DESMONTE SANITARIOS	6.00	SI	SI
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCTURA CUBIERTA	200.00	SI	SI
A.2.4	KG	DESM. ESTRUC. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOL. MUROS	55.00	SI	SI
A.2.13	M2	DESM. DIVISIONES MODULARES	4.47	SI	SI
B.1.2	M3	DEMOL. PLACAS Y ANDENES	32.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
En la zona de escenarios multifuncionales se realizan actividades de desmontes para la zona de baños de camerinos zona de boxeo y coliseo de voleybol se continuan actividades de desmonte de estructura de cubierta desmonte de aparatos sanitarios, para la zona de pista de patinaje se realizan actividades de placas, andenes perimetrales, anden interno y demolicion de sardineles, durante el dia se presentan lluvias que retrazan actividades debido a que no se pueden utilizar equipos de oxicorte y actividades de trabajo en altura

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
8 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: A2510820080036630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3023

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	9	6	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MANANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	2	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	11	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR						
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A 2.2	UN	DESMONTE SANITARIOS	6.00	SI	SI
A 2.3	M2	DESM. ESTRUCTURA CUBIERTA	200.00	SI	SI
A 2.4	KG	DESM. ESTRUC. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A 2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.00	SI	SI
A 2.10	M2	DEMOL. MUROS	55.00	SI	SI
B 1.2	M3	DEMOL. PLACAS Y ANDENES	32.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
El dia de hoy la entidad idermeta por medio de la supervision del contrato autoriza el ingreso de 7 personas para realizar el cargue del material de desmontes y su retiro en tractomula de los elementos demontados inventariados en acta, se continuan actividades de desmontes en la zona de escenarios multifuncionales, se realizan actividades de demoliciones de muros divisorios y muros de fachadas, para la pista de patinaje se realizan actividades de demolicion de placas

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitacora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
9 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional A25105200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones.

3024

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	6	2023	7.00am	2.00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL						
OPERARIO	2	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	11	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR						
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A 2.2	UN	DESMONTE SANITARIOS	3.00	SI	SI
A 2.3	M2	DESM. ESTRUCTURA CUBIERTA	200.00	SI	SI
A 2.4	KG	DESM. ESTRUC. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A 2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.00	SI	SI
A 2.10	M2	DEMOL. MUROS	10.00	SI	SI
A 2.12	M3	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	2.00	SI	SI
B 1.2	M3	DEMOL. PLACAS Y ANDENES	32.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

*Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se continuan actividades de desmontes en zona de coliseo multifuncional realizando desmontes de estructura de cubierta, estructura en fachadas se realiza desmonte de laminas de minivave de fachadas desmonte de marcos y ventanas , se continuan actividades de demolicion de muros internores, para la pista de patinaje

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
10 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: A2510820080038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones.

3025

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	6	2023	7:00am	3:30pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA	X	X		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	1	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	2	X				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A 2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

11 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3026

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	12	6	2023	7:00am	1:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	1	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	12	X				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCT. CUBIERTA	200.00	SI	SI
A.2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se ejecutan actividades en zonas de escenarios multifuncionales se continuan con desmontes de estructura de cubierta, estructura polideportivo desmonte de carpinteria aluminio

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
12 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: A2510820085O038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3027

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	6	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	108 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	0			MANLIF	1	
AYUDANTE	13	X				
CELADOR	1	X				
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	2	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.2	UN	DESMONTE SANITARIOS	6.00	SI	SI
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCT. CUBIERTA	200.00	SI	SI
A.2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	55.00	SI	SI
B.1.3	M3	DEMOL. PAVIMENTO ASFALTICO	35	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
Se continuan actividades de desmonte de apuratos sanitarios en baños, se continuan actividades de estructura desmonte de persiana de fachadas, y demolicion de muros divisonos y facahada en zona de luchas y taekwondo, en zona de pista de patinaje se realizan actividades de demolicion de pavimento asfaltico de la pista de ruta existente

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
13 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3028

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	6	2023	7.00am	5.00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIA EN LA MAÑANA DE 7.00am a 9.00am
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	2.0 HRS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	2	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	13	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	1	X				
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	2	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.2	UN	DESMONTE SANITARIOS	6.00	SI	SI
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCT. CUBIERTA	200.00	SI	SI
A.2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	55.00	SI	SI
B.1.1	M3	DEMOL. PAVIMENTO ASFALTICO	35	SI	SI
B.1.4	M3	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	20	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se continuan actividades de desmonte de aparatos sanitarios en baños, se continuan actividades de estructura desmonte de persiana de fachadas, y demolicion de muros divisorios y fachada en zona de luchas y taekwondo, en zona de pista de patinaje se realizan actividades de demolicion de pavimento asfaltico de la pista de ruta existente se presentan lluvias en el inicio de mañana lo que retraza el arranque de actividades de desmontes de estructura de cubierta

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
14 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: A2510820080038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3029

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	6	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIA EN LA TARDE DE 2:30pm a 3:30pm
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias	1.0 HRS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	2	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	12	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	1	X				
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	2	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.2	UN	DESMONTE SANITARIOS	6.00	SI	SI
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCT. CUBIERTA	200.00	SI	SI
A.2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	300.00	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	55.00	SI	SI
B.1.3	M3	DEMOL. PAVIMENTO ASFALTICO	35	SI	SI
B.1.4	M3	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	20	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	se realiza levantamiento de los costados existentes porque la entidad no tiene los puntos de estos y se requieren para el control y seguimiento de las demoliciones y excavaciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se continuan actividades de desmonte de aparates sanitarios en baños, se continuan actividades de estructura desmonte de persiana de fachadas, y demolicion de muros divisorios y fachada en zona de luchas y taekwondo, en zona de pista de patinaje se realizan actividades de demolicion de pavimento asfaltico de la pista de ruta existente y demolicion de graderias placas machones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
15 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: A2510820880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3030

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	6	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		LLUVIA EN LA MAÑANA DE 7:00am a 8:00am EN LA TARDE DE 2:00pm a 5:00pm
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	4.0 HRS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	2	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	13	X		EXCAVADORA	1	
CELADOR	1	X				
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPLTADOR	2	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TECNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.2	UN	DESMONTE SANITARIOS	5.00	SI	SI
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCT. CUBIERTA	200.00	SI	SI
A.2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	55.00	SI	SI
B.1.3	M3	DEMOL. PAVIMENTO ASFALTICO	14.56	SI	SI
B.1.4	M3	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	14.47	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se continuan actividades de desmonte de aparatos sanitarios en baños, se continuan actividades de estructura desmonte de persiana de fachadas, y demolicion de muros divisorios y fachada en zona de luchas y taekwondo, en zona de pista de patinaje se realizan actividades de demolicion de pavimento asfaltico de la pista de ruta existente y demolicion de graderias placas machones, durante el dia de hoy se presentan lluvias durante todo el transcurso de la tarde lo que reatrza actividades de trabajos en altuya y trabajos de desmonte de estructuras de cubierta

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
16 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: A2510820080038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	17	6	2023	7:00am	12:00md

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	100 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIA EN LA MAÑANA DE 7:00am a 8:00am. EN LA TARDE DE 2:00pm a 5:00pm
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	4.0 HRS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	1	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	13	X				
CELADOR	1	X				
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	2	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCT. CUBIERTA	100.00	SI	SI
A.2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A.2.6	M2	DESM. REJAS Y VENTANAS	125.40	SI	SI
A.2.19	M2	DEMOLICION MUROS	20.00	SI	SI
A.2.12	M3	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	2.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se continuan actividades de estructura desmonte de persiana de fachadas, demolicion de muros divisorios en zona de boxeo y pesas para pista de patinaje se realizan actividades de demolicion de de graderias placas machones, se presentan lluvias intensas en el trascurso de toda la jornada de la tarde, razon por la cual nno se puede ejecutar ninguna actividad de desmonte de estructura

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
17 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional A2510820080038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones

3037

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	19	6	2023	7:00am	1:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	105 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIA EN LA MAÑANA DE 7:00am a 8:00am. EN LA TARDE DE 2:00pm a 5:00pm
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	4.0 HRS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	1	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	10	X				
CELADOR	1	X				
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

EPP: Elementos de Proteccion Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A 2.3	M2	DESM. ESTRUCT. CUBIERTA	200.00	SI	SI
A 2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se continuan actividades de desmonte de estructura metalica de cubierta de escenarios multifuncionales, se rpesentan lluvias fuertes en la jornada de la tarde lo que no permite el desarrollo de ninguna actividad

*Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
19 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	Firma
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: A2510820050038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

*Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3033

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	20	6	2023	7:00am	05:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	1	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	12	X				
CELADOR	1	X				
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	2	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCT. CUBIERTA	200.00	SI	SI
A.2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	55.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se continuan actividades de desmontes de estructuras de cubierta y fachadas en escenarios multifuncionales, se continuan actividades de demolicion de muros interiores para el dia de hoy se realiza inventario y suscripcion de acta de entrega de elementos desmontados de las zonas de luchas, taekwondo y boxeo, se toman medidas y cantidades para realizar entrega a Ing Jorge Lopez persona encargada por idermeta para realizar la entrega, se deja evidencia en acta y registro fotografico del material

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
20 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820080038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3034

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	6	2023	7.00am	05.00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	1	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	11	X				
CELADOR	1	X				
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	2	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCT. CUBIERTA	200.00	SI	SI
A.2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A.2.5	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	2.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	55.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los cotisers existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde deba justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se continuana actividades de desmontes en zona de escenarios gimnasia, se realiza desmonte de estructura de cubierta, desmontes de carpinteras metalicas y demolicion de muros de zonas de baños

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
21 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3035

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	6	2023	7 00am	05 00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MANANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	1	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	13	X				
CELADOR	1	x				
TOPÓGRAFO	1	x		ESTACION	1	
CADENERO	1	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	2	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.3	M2	DESM. ESTRUCT. CUBIERTA	30.91	SI	SI
A.2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A.2.5	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	5.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	55.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se continuara actividades de desmontes en zona de escenarios gimnasia, se realiza desmonte de estructura de cubierta, desmontes de carpinterias metalicas y demolicion de muros de zonas de baños

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
22 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: A2510820086038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3036

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	6	2023	7.00am	05:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	1	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	12	X				
CELADOR	1	X				
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X				
OTRO	2	X	NSP. OBRA	COMPUTADOR	2	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A.2.5	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	5.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	55.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se continuana actividades de desmontes en zona de escenarios gimnasia, se realiza desmonte de estructura de cubierta, desmontes de carpinterias metalicas y demolicion de muros de zonas de baños

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
23 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3037

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	24	6	2023	7.00am	01.00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MANANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	1	X		MANLIF	1	
AYUDANTE	13	X				
CELADOR	1	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	2	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A 2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A 2.5	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	3.00	SI	SI
A 2.10	M2	DEMOLICION MUROS	20.00	SI	SI
A 2.12	M3	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	2.00	SI	SI
C 1.1	M2	LOCAL. TOPOGRAFICO	1500.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
durante el dia de hoy se continuan actividades de desmontes de estructura de cubierta se retiran elementos como contavientos, correas y templetes de la estructura de cubierta de la zona de gimnasia, se realizan actividades de desmontes de carpinteria metalica y demoliciones de muros interiores, para la zona de pista de patinaje se realizan actividades de demolicion de graderias y cimentacion de graderias, durante el dia de hoy se presenta una situacion de conato de incendio, se inicia una configracion en las zonas de foso de saltos de la zona de gimnasia los cuales tienen espumas y colchonetas que no fueron retiradas por la entidad, adicionalmente debajo de estos elementos se encuentra una gran cantidad de llantas de carros que se usaban para rellenar los fosos material que por su caracter inflamable es peligroso con las actividades desarrolladas en obra, se pide asistencia del cuerpo de bomberos quien controlo la conflagracion y reporto el evento como un conato de incendio, la interventoria solicita al contratista suspender las actividades hasta tanto estos fosos no se desocupen y se retire el material q esta contenido en ellos

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
24 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3038

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Version: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	26	6	2023	7.00am	05.00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLOVIZNAS Y LLUVIA DESDE LAS 2.00pm
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	3.0 HRS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	6	X				
CELADOR	1	X				
TOPOGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	1	X				
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	2	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A.2.6	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	5.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	55.00	SI	SI
C.1.1	M2	LOCAL. TOPOGRAFICO	1500.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde deje justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se continuaria actividades de desmontes en zona de escenarios gimnasia, se realiza desmonte de estructura de cubierta, desmontes de carpinterias metalicas y demolicion de muros de zonas de baños durante la jornada de hoy se presentan lluvias en el transcurso de toda la tarde lo que retraza actividades de desmontes de estructura de cubierta

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
26 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presentan visitas de profesionales especializados, u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3039.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	27	6	2023	7:00am	05:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLOVIZNAS Y LLUVIA DESDE LAS 4:00pm
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias	1.0 HRS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO					1	
AYUDANTE	11	X				
CELADOR	1	X				
TOPÓGRAFO					1	
CADENERO						
OTRO	2	X	INSP. OBRA	COMPUTADOR	2	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A 2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A 2.5	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	5.00	SI	SI
A 2.10	M2	DEMOLICION MUROS	65.00	SI	SI
C.1.1	M2	LOCAL TOPOGRAFICO	1177.80	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se continuan actividades de demolicion de muros interiores en zona de gimnasia, se realizan actividades de demolicion de muros de baños y camerinos

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
27 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	REGIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820080038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3040

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
	28	6	2023	7:00am	05:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MANANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLOVIZNAS Y LLUVIA DESDE LAS 4:00pm
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	1.0 HRS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	1	X		EXCAVADORA	1	
AYUDANTE	13	X				
CELADOR	1	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X		NIVEL	1	
OTRO	2	X	BRIGADA BOAL			

EPP: Elementos de Proteccion Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A.2.5	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	5.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	55.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los colisajes existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones
SUMINISTRO E INST. CRUDO DE RIO	Se requiere usar relleno crudo de rio para adecuar la via de acceso para ingreso de vehiculos de carga para retiro de materiales de desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES
se continuan actividades de demolicion de muros interiores en zona de gimnasia, se realizan actividades de demolicion de muros de baños y camerinos, durante el dia de hoy se inician actividades de retiro de material procedente de las demoliciones realizadas en la pista de patinaje, para el ingreso de las volquetas y de vehiculos a obra es necesario acopiar material relleno de rio para mejorar el acceso y evitar que los vehiculos se entirren con el transito, se solicita al contratista que despues de realizar el retiro entregue la certificacion de disposicion de los escombros.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
28 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: A25108200880038830	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones

3041

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	29	6	2023	7:00am	05:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	105 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X				
OFICIAL				EXCAVADORA	1	
OPERARIO	1	X				
AYUDANTE	13	X				
CELADOR	1	X				
TOPÓGRAFO	1	X		ESTACION	1	
CADENERO	2	X		NIVEL	1	
OTRO	2	X	INSP. DE OBRA			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	900.00	SI	SI
A.2.5	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	5.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	55.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones
SUMINISTRO E INST. CRUDO DE RIO	Se requiere usar relleno crudo de rio para adecuar la via de acceso para ingreso de vehiculos de carga para retiro de materiales de desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES

se continuan actividades de demolicion de muros interiores en zona de gimnasia, se realizan actividades de desmonte de estructura de cubierta, para la zona de pista de patinaje se continuan actividades de retiro de material procedente de las demoliciones , para el ingreso de las volquetas y de vehiculos a obra es necesario acopiar material relleno de rio para mejorar el acceso y evitar que los vehiculos se entierren con el transito.

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
29 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AZ51082008800386330	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	6	2023	7:00am	05:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	166 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIA A PARTIR DE LAS 3:45pm
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias	1.5HRS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL				EXCAVADORA	1	
OPERARIO	1	X				
AYUDANTE	12	X				
CELADOR	1	X		ESTACION	1	
TOPOGRAFO	1	X		NIVEL	1	
CADENERO	1	X				
OTRO	2	X	INSP. DE OBRA			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A.2.4	KG	DESM. ESTRUCT. POLIDEPORTIVO	150.00	SI	SI
A.2.5	UN	DESM. MARCOS Y PUERTAS	5.00	SI	SI
A.2.10	M2	DEMOLICION MUROS	21.50	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
COMISION TOPOGRAFICA	Se realiza levantamiento de los coliseos existentes porque la entidad no tiene los planos de estos y se requieren para el control y seguimiento de los desmontes y demoliciones
SUMINISTRO E INST. CRUDO DE RIO	Se requiere usar relleno chudo de rio para adecuar la via de acceso para ingreso de vehiculos de carga para retiro de materiales de desmontes y demoliciones

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES

se continuan actividades de demontes y demoliciones en zona de coliseo de gimnasia se realiza desmonte de elemntos de estructura de cubierta desmontes y demolicion de muros en mamposteria ,se continuan actividades de retiro de material de demolicon de pista, la interventoria realiza control de volumenes y control de los viajes retirados para esta actividad de igual forma se cuantifican las cantidades de material que se acopia para mejoramiento del acceso con el trafico de las volquetas. durante la jornada de hoy se esuspenden actividades de desmonte de estructuras en la tarde puesto que las lluvias no premiten ejecutar la actividad

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitacora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de junio de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200860038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones

3043

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

CORRESPONDENCIA GENERADA (ENVIADA)

3044

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 1 de Junio de 2023

OF C249 2023 050

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
Atn: JHON HENRY ORTIZ GARCIA R/L
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: SOPORTE DE VINCULACIÓN DE LOS SUBCONTRATISTAS CON EL CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

Respetados Señores:

Se solicita inmediatamente se envíe soporte de trabajo entre el contratista de obra y subcontratista de obra, esto debido a que la seguridad social que se está presentando, se encuentra a nombre de un subcontratista y la interventoría desconoce de esta vinculación, esto genera que la interventoría no pueda cumplir con sus obligaciones de seguimiento a la gestión que respecta con la vigilancia de cumplimiento al sistema integral de seguridad social en salud y parafiscales.

Agradecemos de antemano una pronta respuesta a nuestra petición.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

C.C. INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META – IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

3645

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

OF-C249 -2023-050 SOLICITUD CONTRATOS SUBCONTRATISTA

1 mensaje

1 de junio de 2023, 10:38

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>
Para: escenariosdeportivos2023@gmail.com
CC: Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co>

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
Atn: JHON HENRY ORTIZ GARCIA R/L
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

Cordial saludo,

Se remite oficio de solicitud de información.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO INTERESCENARIOS
R.L. HECTOR ARMANDO GOMEZ J.

OF-C249 -2022-050 Solicitud contratos.pdf
368K

3046.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 01 de junio de 2023

OF-C249 -2022-051

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
Atn: JHON HENRY ORTIZ GARCIA R/L
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIOS DEL CONTRATISTA DE OBRA – ACLARACIONES ALCANCE Y CONSULTORIA

Respetados Señores:

Una vez revisados y detallado las solicitudes y vacíos técnicos o documentales expresados por el contratista de obra en los oficios:

- CEDVO-010- 2023 OBSERVACIONES AL DISEÑO DE PAVIMENTOS.pdf
- CEDVO-011- 2023 ACLARACIONES PISTA DE ATLETISMO.pdf
- CEDVO-012-2023-ACLARACIONES DISEÑOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULPROPOSITO.pdf
- CEDVO-018-2023 CATASTRO DE REDES.pdf
- CEDVO-021-2023 ITEM NO PREVISTOS DEMOLICIONES .pdf
- CEDVO-023-2023 ACLARACIONES PISTA PATINAJE.pdf

Y determinando que los mismos debe ser despejado por parte de la consultoría que elaboro el proyecto general y/o la entidad contratante la cual conoce las necesidades exactas que se buscaba subsanar

CONSORCIO INTERESCENARIOS

con los contratos de la referencia y que cualquier ajuste, cambio o inclusión debe ser avalado inicialmente por IDERMETA y plasmado en una posterior modificación, la presente interventoría ha realizado traslado de dichos oficios a la entidad contratante y adicionalmente solito mediante oficio OF C249 -2022-048 de fecha 31 de mayo de 2023, la **programación de un comité técnico** con asistencia de la consultoría, la supervisión, la interventoría y el contratista con el ánimo de despejar las dudas técnicas y administrativas que se tienen y tener directrices claras con relación al objetivo perseguido por el contratante y el alcance real del contrato de obra Nº 106 de 2023.

Así las cosas, se está a la espera de la respuesta de IDERMETA, para poder dar directrices y respuestas claras a sus solicitudes.

Sin otro particular

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

RESPUESTA OFICIOS CONSULTORIA

1 mensaje

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com> 1 de junio de 2023, 15:37
Para: escenariosdeportivos2023@gmail.com

OF-C249 -2022-051 RESPUESTA OFICIOS ACLARACION CONSULTORIA .pdf
441K

3049

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 01 de junio de 2023

OF-C249 -2022-052

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 N°24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: SOLICITUD PLANIMETRIA FISICA Y DIGITAL ARCHIVO CAD DE IMPLANTACION RECORD FASE 1

Respetados Señores:

Teniendo como precedente el inicio de las obras preliminares y estando en el momento de tomar decisiones técnicas y constructivas para el inicio de las obras civiles, la presente interventoría ve la necesidad de solicitar la entrega de un plano de implantación record de la **fase 1** de edificaciones y urbanismo, el cual se requiere:

- Georreferenciado o amarrado a una red pasiva (placa IGAC) o a una activa (Red MAGNA-ECO) del IGAC, e identificar los puntos de amarre, en caso de estar georreferenciado a partir de vértices IGAC, deben aportar la información del punto geodésico.
- Tener en cuenta que el levantamiento debe presentarse bajo el sistema de referencia Magna Sirgas.
- Se requiere en físico (impresión) y magnético.
- El archivo magnético debe ser DWG es el formato del software AutoCAD de Autodesk o similares.

Lo anterior se requiere para unificar en planimetría y altimetría el proyecto y verificación de necesidades de niveles óptimos para las obras a ejecutar.

Sin otro particular esperamos pronta respuesta de nuestra solicitud.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

3050

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

SOLICITUD PLANO IMPLANTACION FASE 1 VILLA OLIMPICA VILLAVICENCIO

1 mensaje

1 de junio de 2023, 16:14

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>
Para: Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co>

OF-C249 -2022-052 IMPLANTACION RECORD FASE 1 .pdf
77K

3051

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 01 de Junio de 2023

OF-C249 -2022-053

Señores:

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

02 JUN 2023
1382
10.10

REF: CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: reiteración aclaración experiencia en perfil.

Respetados señores:

Teniendo en cuenta la solicitud radicada en el oficio con consecutivo OF-C459 -2022-023 y OF-C459 -2023-035 para el asunto aprobación de personal de obra pendiente, se reitera aclaración a la entidad para la consulta realizada del perfil de profesional de residente de obra, esto con el fin de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra en la Clausula 9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA numeral 4 (Disponer del personal idóneo, así como los recursos logísticos, materiales y/o equipos necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y calidad establecidos.) de tal manera poder radicar la información pendiente entregada por el contratista para este cargo.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

3052

Villavicencio, 01 de Junio de 2023

OF-C249 -2022-054

Señores:

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Entrega documentación para anticipo de obra.

Respetados señores:

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la documentación correspondiente al pago de anticipo de obra, según lo dispuesto en la lista de chequeo formato GES-FO-143 de la entidad anexando los documentos y soportes de contratista e interventor, para aprobación de este pago

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

07 JUN 2023
1342
3:30

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

3053

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

cita revisión expediente curaduría urbana 2

1 mensaje

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com> 6 de junio de 2023, 14:47
Para: escenariosdeportivos2023@gmail.com

Buenas tardes por medio de la presente informamos que la cita para revisión de expediente licencia del proyecto se agendó para el día miércoles 07 de junio a las 10 Am., esto con el fin de que el contratista delegue la persona que va a asistir para realizar el acompañamiento.

cordialmente

HECTOR ARMANDO GOMEZ
R/L CONSORCIO INTERESCENARIOS

3054

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 07 de junio de 2023

OF-C249 -2022-055

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 N°24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: **REITERACION** SOLICITUD PLANO FISICO Y DIGITAL ARCHIVO CAD DE IMPLANTACION RECORD FASE 1

Respetados Señores:

Teniendo el oficio OF-C 249 -2022-052 de fecha 01 de junio de 2023 y la **NECESIDAD PERENTORIA** de tomar decisiones técnicas y constructivas para el inicio de las obras civiles, la presente interventoría ve la necesidad de reiterar la entrega de un plano de implantación record de la **fase 1** de edificaciones y urbanismo, el cual contenga:

- Georreferenciado o amarrado a una red pasiva (placa IGAC) o a una activa (Red MAGNA-ECO) del IGAC, e identificar los puntos de amarre, en caso de estar georreferenciado a partir de vértices IGAC, deben aportar la información del punto geodésico.
- Tener en cuenta que el levantamiento debe presentarse bajo el sistema de referencia Magna Sirgas.
- Se requiere en físico (impresión) y magnético.
- El archivo magnético debe ser DWG es el formato del software AutoCAD de Autodesk o similares.

Lo anterior se requiere para unificar planimetría y altimetría del proyecto y verificación de necesidades de niveles óptimos para las obras a ejecutar y determinar en planos los límites físicos con relación ejecutados y por ejecutar en cada fase.

Sin otro particular esperamos pronta respuesta de nuestra solicitud.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

3055

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

reiteracion plano implantacion fase 1

1 mensaje

7 de junio de 2023, 11:49

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>
Para: Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co>

OF-C249 -2022-055 REITERACION IMPLANTACION RECORD FASE 1 .pdf
78K

3056

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 07 de JUNIO de 2023

OF-C249 -2022-056

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 N°24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: **REITERACION RESPUESTA PERENTORIA** OFICIOS CON RELACION A CONSULTORIA

Respetados Señores:

1

Nos permitimos reiterar la respuesta a nuestro oficio of-c249-2022-048, lo anterior soportado en la necesidad de tener respuesta a las inquietudes sobre la planimetría y demás documentación de la consultoría entregada por la entidad contratante, para dar inicio de manera acertada a la ejecución física. A la fecha está pendiente la contestación a los oficios trasladados a la entidad que se enumeran a continuación:

- CEDVO-010- 2023 OBSERVACIONES AL DISEÑO DE PAVIMENTOS.pdf
- CEDVO-011- 2023 ACLARACIONES PISTA DE ATLETISMO.pdf
- CEDVO-012-2023-ACLARACIONES DISEÑOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULPROPOSITO.pdf
- CEDVO-018-2023 CATASTRO DE REDES.pdf
- CEDVO-021-2023 ITEM NO PREVISTOS DEMOLICIONES .pdf
- CEDVO-023-2023 ACLARACIONES PISTA PATINAJE.pdf

Todos los temas contenidos en esta documentación son de carácter técnico y requieren apoyo de la consultoria y definición por parte de la entidad contratante para poder dar pautas de inicio a las obras civiles, revisión y ajuste al presupuesto para establecer alcances reales, acordes a las necesidades actuales del proyecto y determinar pautas de inicio a los diferentes frentes de obra.

Sin otro particular esperamos pronta respuesta de nuestra solicitud,

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

cc. Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023

3057

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

reiteracion respuesta consultoria

1 mensaje

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com> 7 de junio de 2023, 12:03
Para: Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co>, escenariosdeportivos2023@gmail.com

OF-C249 -2022-056 REITERACION RESPUESTAS OF PENDIENTES .pdf
86K

3058

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 07 de junio de 2023

OF-C249 -2022-057

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
Atn: JHON HENRY ORTIZ GARCIA R/L
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: SOLICITUD RESPUESTA OF-C249 -2022-043 -SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEÑALIZACION, MANEJO TRANSITO IMPLEMENTACIÓN PMT APROBADO POR MOVILIDAD

Respetado Ingeniero:

En atención a su oficio CEDVO-029-2023 en el cual remiten radicado de aprobación por parte de movilidad del PMT Nº 1703-19.18/0680 del 17 de mayo de 2023, nos permitimos reiterar que debe tenerse en cuenta lo solicitado en el ofuio del asunto dentro de los cual estaría pendiente con relaciona a este punto en particular:

- copia del informe o plan de manejo de transito aprobado y la planimetría a la interventoría del documento inicial.
- Se debe remitir copia del oficio de radicación de los informes mensuales remitidos a secretaria de movilidad municipal y su respuesta de aprobación por parte de la entidad.
- Se debe remitir copia de las prórrogas, suspensiones o modificaciones que se radican a secretaria de movilidad con sus respectivos soportes

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

3059

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

COMPLEMENTO RESPUESTA APROB PMT

1 mensaje

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>
Para: escenariosdeportivos2023@gmail.com

7 de junio de 2023, 14:36

OF-C249 -2022-057 respuesta of aprobacion PMT.pdf
77K

3060

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 07 de JUNIO de 2023

OF-C249 -2022-058

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 N°24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: **TRASLADO OFICIOS DE OBRA CONSULTORIA Y PRESUPUESTO OFICIAL**

Respetados Señores:

1

En atención a los oficios radicados por el contratista y los cuales se enlistan y anexan al presente, nos permitimos hacer traslado para su conocimiento revisión y fines pertinentes. por considerar que deben ser analizados por parte de la consultoría o la entidad para definir el horizonte real del contrato de la referencia.

- CEDVO-023-2023 APROBACION PMT ACLARACION DISEÑOS PISTA PATINAJE
- CEDVO-024-2023 ACLARACION PUNTOS ELECTRICOS PISTA PATINAJE
- CEDVO-029-2023 APROBACION PMT

Se reitera que todos los temas contenidos en esta documentación son de carácter técnico y requieren apoyo de la consultoria y definición por parte de la entidad contratante para poder dar pautas de inicio a las obras civiles, revisión y ajuste al presupuesto para establecer alcances reales, acordes a las necesidades actuales del proyecto y determinar pautas de inicio a los diferentes frentes de obra.

Sin otro particular esperamos pronta respuesta de nuestra solicitud.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

cc. Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023

3061

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

TRASLADO OFICIOS DE OBRA PMT- CONSULTORIA -PRESUPUESTO OF

1 mensaje

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com> 7 de junio de 2023, 14:35
Para: Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co>

4 archivos adjuntos

- **OFICIO CEDVO-029-2023 Aprobación PMT.pdf** 2492K
- **OFICIO CEDVO-024-2023 Aclaraciones puntos electricos de pista de patinaje.pdf** 564K
- **OFICIO CEDVO-023-2023 Aclaraciones para los diseños de pista de patinaje.pdf** 2807K
- **OF-C249 -2022-058 traslado oficls de obra .pdf** 77K

3062

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

programación de obra actualizada

1 mensaje

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com> 8 de junio de 2023, 08:00
Para: Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co>

Villavicencio, 08 de Junio de 2023

Señores:

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
[redacted]
CARRERA 16 N°24-03 BARRIO OLIMPICOVILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Entrega programación de obra actualizada

dando cumplimiento a las obligaciones contractuales se realiza entrega de programación de obra actualizada a la fecha de inicio aprobada por la interventora atendiendo las solicitud realizada por la entidad, se anexa archivo en archivo project para su revisión.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Programacion inicial.mpp
590K

3063

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

programación de obra

1 mensaje

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com> 8 de junio de 2023, 08:02
Para: escenariosdeportivos2023@gmail.com

por medio de la presente se solicita entrega de programación actualizada en medio físico pliego con el fin de hacer traslado de esta información a la entidad

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

3064

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 08 de JUNIO de 2023

OF-C249 -2022-059

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: **OFICIOS DE OBRA E INTERVENTORIA PENDIENTES POR RESPUESTA**

1

Respetados Señores:

En atención a lo revisado y acordado en comité técnico del día de hoy 08 de junio de 2023, nos permitimos adjuntar al presente los oficios de obra e interventoría pendientes por respuesta de la entidad contratante con relaciona a información o aclaración de los diseños entregados por la consultoría a ejecutar.

- CEDVO 08-2023 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.pdf
- CEDVO 10 2023 OBSERVACIONES AL DISEÑO DE PAVIMENTOS.pdf
- CEDVO 11 2023 ACLARACIONES PISTA DE ATLETISMO.pdf
- CEDVO 024-2023 Aclaraciones puntos electricos de pista de patinaje.pdf
- CEDVO-012-2023-ACLARACIONES DISEÑOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULPROPOSITO.pdf
- CEDVO-018-2023 CATASTRO DE REDES.pdf
- CEDVO-021-2023 ITEM NO PREVISTOS DEMOLICIONES .pdf
- CEDVO-023-2023 ACLARACIONES PISTA PATINAJE.pdf
- OF-C249 -2022-024 traslado oficios.pdf
- OF-C249 -2022-047 INDICACION OFICIAL DISPOSICION FINAL DESMONTES .pdf
- OF-C249 -2022-048 RESPUESTAS TRASLADOS OF PENDIENTES Y SOLICITUD COMITE .pdf
- OF-C249 -2022-051 RESPUESTA OFICIOS ACLARACION CONSULTORIA .pdf
- OF-C249 -2022-052 IMPLANTACION RECORD FASE 1 .pdf
- OF-C249 -2022-055 REITERACION IMPLANTACION RECORD FASE 1 .pdf
- OF-C249 -2022-056 REITERACION RESPUESTAS OF PENDIENTES .pdf
- OF-C249 -2022-059 traslado oficios de obra .pdf

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Se reitera lo informado en comité los temas contenidos en esta documentación son de carácter técnico y requieren apoyo de la consultoría y definición por parte de la entidad contratante para poder dar pautas de inicio a las obras civiles, revisión y ajuste al presupuesto para establecer alcances reales, acordes a las necesidades actuales del proyecto y determinar pautas de inicio a los diferentes frentes de obra.

Sin otro particular esperamos pronta respuesta de nuestra solicitud,

Atentamente.

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

cc. Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

3066

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

OFCIOS PENDIENTES POR RESPUESTA COLISEOS MULTIPLES

1 mensaje

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com> 8 de junio de 2023, 16:46
Para: Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co>, bibiana_pan@hotmail.com, escenariosdeportivos2023@gmail.com

2 archivos adjuntos

CORRESPONDENCIA POR CONTESTAR.zip
15569K

OF-C249 -2022-059 OF PENDIENES POR CONTESTAR .pdf
95K

3067

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 08 de Junio de 2023

OF-C249 -2022-060

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 N°24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

3

ASUNTO: DIRECTRICES DE DISPOSICIÓN ENTREGA DE DESMONTES

Respetados Señores:

Por medio de la presente me permito reiterar el oficio enviado OF-C249 -2022-047 vía correo electrónico con fecha del 30 de mayo de 2023 por medio del cual se requieren directrices oficiales de lugar, nombre y celular de contacto de la persona designada por el IDERMETA, para hacer inventario, levantar el acta y hacer entrega de dicho material. Adicionalmente se solicita informar que personal para cargue y que vehículos realizaran el ingreso, por lo que se solicita la documentación afiliaciones del personal al sistema de seguridad social acorde a los parámetros establecidos para el ingreso a una obra.

sin otro particular esperamos pronta respuesta de nuestras solicitudes, Atentamente:

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

3068

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

oficio 249-2022-060

1 mensaje

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>
Para: Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co>

8 de junio de 2023, 16:55

buenas tardes envio adjunto oficio

OF-C249 -2022- 060 reiteracion entrega desmontes.docx
415K

CONSORCIO INTERESCENARIOS

3069

Villavicencio, 13 de Junio del 2023

OF-C249 -2023-060

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 N°24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: TRASLADO DOCUMENTACIÓN PMT

Cordial saludo,

En calidad de representante legal de la interventoría al contrato de obra No. 106 de 2023, me permito hacer traslado de la documentación del plan de manejo de transito entregado por el contratista de obra.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

14 JUN 2023
1562
420

3070

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 13 de Junio del 2023

OF-C249 -2023-061

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1 Y ENVÍO DE ANEXOS DEL INFORME

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el informe mensual de obra No. 1, con el fin de adelantar la revisión por parte de la interventoría, se relacionan anexos que se deben presentar junto con este informe:

- Registro fotográfico detallado.
- Copia de la bitácora de la obra o de las actividades desarrolladas.
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Control de Seguridad Industrial.
- Control de equipos.
- Estado del tiempo.
- Manejo Ambiental.
- Actas de comité técnico.
- Copia afiliaciones del personal y pagos de seguridad social.
- Copia de los ensayos de laboratorio, certificados de calidad de los materiales, y demás documentos que soporten el control de calidad.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Adicionalmente se solicitan los siguientes informes de seguimiento:

- Plan de manejo ambiental
- Plan de manejo de transito
- Gerencia de proyectos
- Programa de seguridad y salud en el trabajo

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

3072

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

OF-C249 -2023-061 REITERACIÓN SOLICITUD INFORME MENSUAL DE OBRA

1 mensaje

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>
Para: escenariosdeportivos2023@gmail.com

13 de junio de 2023, 15:09

Cordial saludo.

Remito Oficio con anexos para informe mensual de obra.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente.

CONSORCIO INTERESCENARIOS
Interventoría

11 archivos adjuntos

- **GES-FO-23 FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA.xlsx**
  71K
- **GES-FO-22 REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA.xlsx**
  38K
- **GES-FO-34 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN PMA.xlsx**
  41K
- **GES-FO-36 ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.xlsx**
  117K
- **GES-FO-33 ACTA DE REALACIÓN DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA.xlsx**
  119K
- **GES-FO-37 CONTROL DE SST.xlsx**
  53K
- **GES-FO-39 ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA.xlsx**
  118K
- **GES-FO-40 BITACORA DE OBRA.xlsx**
  39K
- **GES-FO-19 FORMATO DE MEMORIA DE CALCULO DE OBRA.xlsx**
  118K
- **GES-FO-126 INFORME DE OBRA (1).docx**
  137K
- **OF-C459 -2022-061 CONTRATISTA OBRA REITERACION SOLICITUD INFORME.pdf**
  323K

3073

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 13 de Junio del 2023

OF-C249 -2023-062

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: SOLICITUD PROGRAMACIÓN DE OBRA IMPRESA

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la programación de obra impresa, la cual debe estar actualizada de acuerdo a la fecha de inicio del contrato de obra.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

3074

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

OF-C249 -2023-062 SOLICITUD PROGRAMACION DE OBRA IMPRESA

1 mensaje

13 de junio de 2023, 15:15

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>
Para: escenariosdeportivos2023@gmail.com

Cordial saludo,

Remito Oficio.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO INTERESCENARIOS
Interventoría

OF-C459 -2022-062 CONTRATISTA OBRA SOLICITUD PROGRAMACION IMPRESA.pdf
304K

3075

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 30 de Junio del 2023 **OF-C249 -2023-079**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META".

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META".

ASUNTO: SOLICITUD DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1

Cordial saludo,

De manera respetuosa nos permitimos solicitar la entrega de los procedimientos de las actividades a realizar en el contrato dela referencia en donde se contemple la intervención y controles desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto con el fin de hacer el seguimiento correspondiente y verificar el cumplimiento de los mismos.

Los documentos pueden ser entregados en medio magnético, físico o por correo electrónico (Interescenariosc@gmail.com).

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ
PROFESIONAL SST – CONSORCIO INTERESCENARIOS

Recibe Jhon Henry Ortiz. 30/06/23

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

3076

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 30 de Junio del 2023 **OF-C249 -2023-080**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

30 JUN 2023
1916
2.50

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACTUALIZADO 1

Cordial saludo,

De manera respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de reiterar la solicitud del Plan de Manejo Ambiental actualizado de cada escenario con su debido presupuesto, cabe resaltar que dicha solicitud ya se realizó con anterioridad en los oficios No. OF-C459-2022-026 de fecha 12 de Mayo del 2023 y el No. OF-C249-2022-033 de fecha 24 de Mayo del 2023, los cuales se encuentran anexos en el presente documento, y a la fecha no se ha recibido ninguna información respecto al requerimiento realizado.

Aclaramos que no se podrán incluir gastos de este rubro con fecha anterior a la aprobación del presupuesto por parte de la interventoría y de la Entidad Contratante.

Agradezco la atención prestada.

Recibí
Jhon Henry Ortiz
30/06/23.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

C.C. INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

3077

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 30 de junio de 2023

OF-C249 -2023-081

Señores:

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Entrega de informe mensual de obra No 1

Respetados señores:

Acorde a las obligaciones contractuales adquiridas por la interventoría me permito hacer entrega de la documentación correspondiente al informe mensual de obra entregado por el contratista de obra formato GES-FO 126 se realiza entrega de informe, anexos y soportes acorde a lo implementado en el formato entregado por la entidad.

Se anexan 4 carpetas

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

3 0 JUN 2023
1805
11:00 Folios.

3078

CONSORCIO INTERESCENARIOS

OF-C249 -2023-082

Villavicencio, 30 de junio de 2023

Señores:

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 N°24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Entrega de informes mensuales de interventoría No 1

Respetados señores:

Acorde a las obligaciones contractuales adquiridas por la interventoria me permito hacer entrega de la documentación correspondiente al informe mensual de interventoría y de informe mensual de gestión de la interventoria acorde al formato GES-FO 35 indicado por la entidad de tal forma se realiza entrega de informe, anexos y soportes acorde a lo implementado en el formato.

Se anexan 3 carpetas

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL CONSORCIO INTERESCENARIOS

30 JUN 2023
1806 FELICR.
LIDO

3079

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

CORRESPONDENCIA GENERADA (RECIBIDA)

3080

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA — CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 02 de junio del 2023

CEDVO-028-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Respuesta a su oficio OF-C249-2023-048

Cordial saludo,

De manera atenta me permito enviar la corrección de los items mencionados en su oficio, así como los apus básicos de concretos junto con las listas de cuadrillas, equipos y materiales con los cuales fueron elaborada la propuesta.

Por otro lado, los presupuestos para la implementación del Plan de Manejo Ambiental forman parte de los estudios y diseños entregados por la entidad. Sin embargo, en la revisión que estamos realizando se ha identificado actividades en los componentes que no fueron incluidos como son la disposición final de RCD, material vegetal, material de desperdicio dejado por las ligas en los coliseos existentes, brigada Boal, auxiliares de tránsito, señalización vial para implementación del PMT, etc. Una vez se termine la revisión se pondrá en consideración el nuevo presupuesto propuesto por el consorcio para dar alcance total a cada proyecto.

Quedamos a la espera de sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023.
Anexo: 34 folios

3:10 pm.
RECIBIDO 02 JUN 2023

3081

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 05 de junio del 2023

CEDVO-029-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Aprobación PMT.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito enviar aprobación del Plan de Manejo de Transito-PMT para el contrato de la referencia emitido por la Secretaria de Movilidad de Villavicencio.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 7 folios

RECIBIDO 06 JUN 2023
Hora 8:39 am

3082

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA DE MOVILIDAD
DIRECCION DE PLANEACION Y PROSPECTIVA

1703-19.18/0680
(Al contestar cite este número)
Villavicencio, mayo 17 de 2023

Señora:
MERY GISEL ROJAS CARDONA
Representante Legal CIVILAB INGENIERIA SAS
3208619983
Calle 41ª N° 27-37 La Grama
gisell-rp@hotmail.com
Ciudad.

REFERENCIA: RADICADO 4107 DEL 28 DE ABRIL DE 2023

ASUNTO: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO **"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".**

Cordial Saludo,

De acuerdo con la referencia y en respuesta a su solicitud, la Secretaria de Movilidad de la ciudad de Villavicencio emite **CONCEPTO DE VIABILIDAD** para el desarrollo del Plan de Manejo de Tránsito **"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"**. La Secretaria de Movilidad, dando aplicación a lo establecido en la Ley 769 de 2002, Decreto Municipal No. 145 de 2015, el Capítulo 4 del Manual de Señalización de 2015 (Resolución No. 1885 de 2015, expedido por el Ministerio del Transporte), las recomendaciones establecidas en el Manual de Señalización Vial 2022 y los parámetros definidos en el PMT presentado; formando parte integral del presente concepto se emite concepto de viabilidad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Señalización Vial y el Código Nacional de Tránsito.·

CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO

1. **Tiempo de Aprobación y Horarios.**

Se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito por un periodo de seis (06) meses, a partir de la fecha de este documento; adicional es importante recalcar que en conjunto de esta viabilidad se requiere la firma del formato de Comité de Obras, documento que forma parte integral de la presente viabilidad. Por lo tanto, para su renovación deberá ser por medio de una solicitud, dando cumplimiento a los requerimientos para el mismo con su respectiva retroalimentación y sus respectivos ajustes, deberá allegarse a la Secretaria de Movilidad Quince (15) días calendarios antes de la finalización del periodo en que se aprobó el PMT en mención, para su respectiva evaluación de las medidas implementadas.

➢ Horario de Labores Aprobado	Lunes a viernes:	07:30am a 05:30pm
	Sábados:	07:00am a 01:00 pm

De necesitarse horario de labores nocturnos, se deberá informar a la Secretaría de Movilidad con anticipación.

2. Obras a Realizar

La presente viabilidad se otorga para el desarrollo del Plan de Manejo de Tránsito "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

La obra se encuentra localizada en el Barrio Dos Mil, perteneciente a la comuna N° 5.

El proyecto tiene dentro de si las siguientes componentes:

- La construcción de escenarios multipropósitos
- La construcción de la pista de atletismo

Dentro de las actividades a realizar se encuentran:

- Señalización
- Desmonte y demoliciones
- Obras preliminares
- Ejecutar obras en concreto
- Construir pista de ruta
- Construir pista de velocidad
- Urbanismo
- Red de aguas lluvia
- Redes eléctricas, etc.

3. Maquinaria a Utilizar.

- Volquetas
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Retroexcavadora
- Herramientas básicas y equipos de construcción

4. Modificaciones Viales.

No se presenta ninguna modificación vial, dado el caso que se requiera durante la ejecución del proyecto se debe informar a la secretaria de Movilidad para su estudio y aprobación.

El contratista mantendrá controladores viales para organizar tanto el flujo de vehículos como el de peatones; además de regular en el momento que los vehículos de obra o volquetas realicen maniobras de acceso y salida.

La secretaria de movilidad, le informa que, en caso de hacer alguna intervención en vía, que requiera cierres y afecte la movilidad del sector debe presentarse un Plan de Manejo de Transito especifico.


cabe aclarar que las labores a realizar serán dentro del predio de la Villa Olímpica, por tanto, no implican afectación de andenes ni ninguna alteración o cierre en vía.

5. **Cargue y descargue de materiales**

El cargue y descargue del material se realizará directamente dentro de la zona interna de obra, sin tener afectación a vías aledañas, de tal manera que se retire el material periódicamente en horas valle o de menos afluencia o tránsito vehicular. Se contará con auxiliares de tránsito para controlar la entrada y salida al predio de los vehículos de cargue y descargue del material de obra. (lo anterior conforme al decreto 254 de 2012).


- **Ruta de desplazamiento de vehículos de obra para el desarrollo de actividades de construcción de escenarios multipropósitos:**

  + para el acceso de los vehículos, provenientes de escombreras y canteras, se propone ingresar por la Carrera 19, posteriormente tomar la Calle 25, y luego girar a la derecha por la Carrera 16 donde se realizará el acceso al predio.

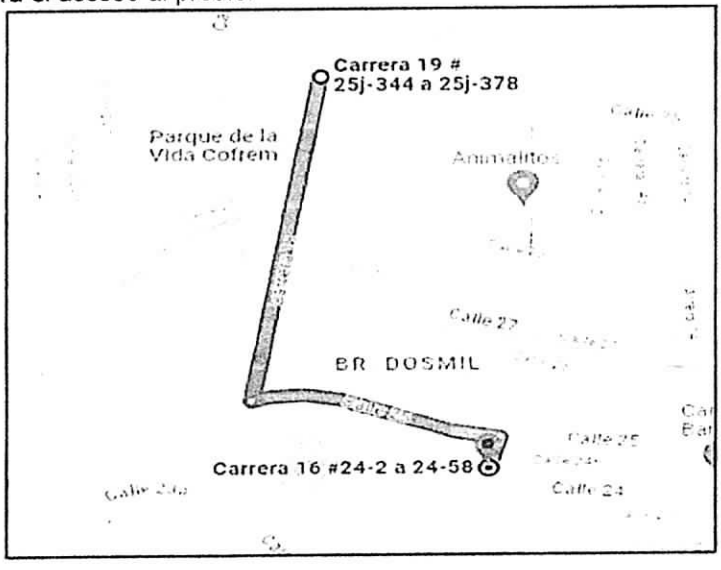


Se aclara que los ingresos propuestos a la obra no afectaran los parqueaderos que actualmente operan en la Villa Olímpica; por el contrario, se proponen accesos temporales para el desarrollo de la obra.

+ para la salida se propone usar la Carrera 16, posteriormente se toma la Carrera 18 Av Maracos, hasta llegar a la Carrera 19 Av. Circunvalar con dirección a la Av. Catama.

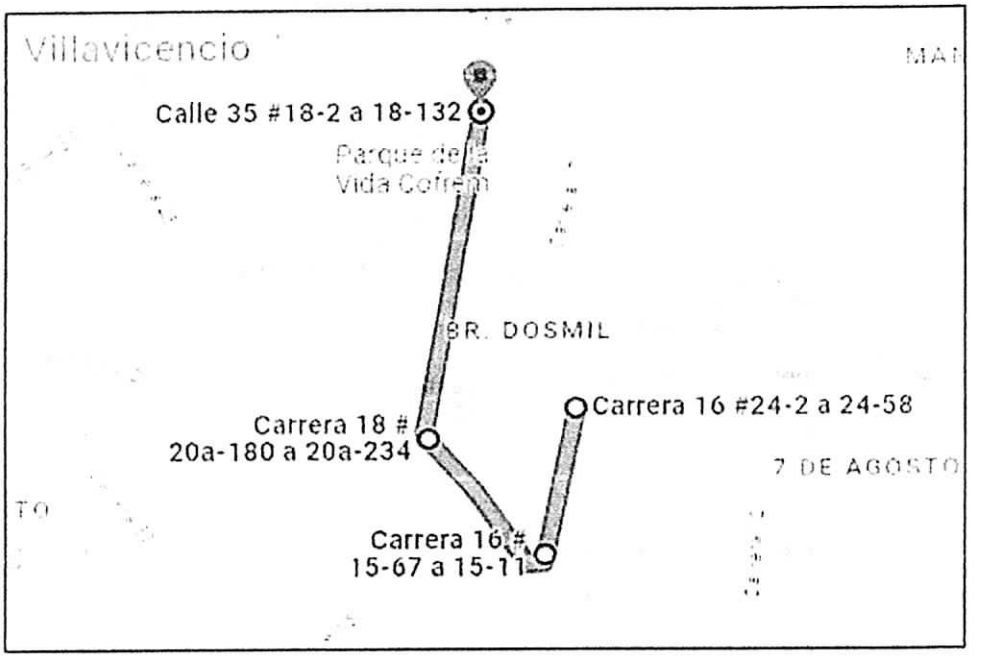


- **Ruta de desplazamiento de vehículos de obra para el desarrollo de actividades de la pista de atletismo:**

+ se propone ingresar por la Av. Catama, Carrera 19, para luego tomar la Calle 25, y luego girar a la derecha por la Carrera 16 hasta llegar a la Av Maracos Carrera 18 donde se llegará al acceso del predio. (el acceso en este caso será el que esta construido para los vehículos que ingresan al Estadio, pero cabe destacar que no se entorpecerá en ningún momento)

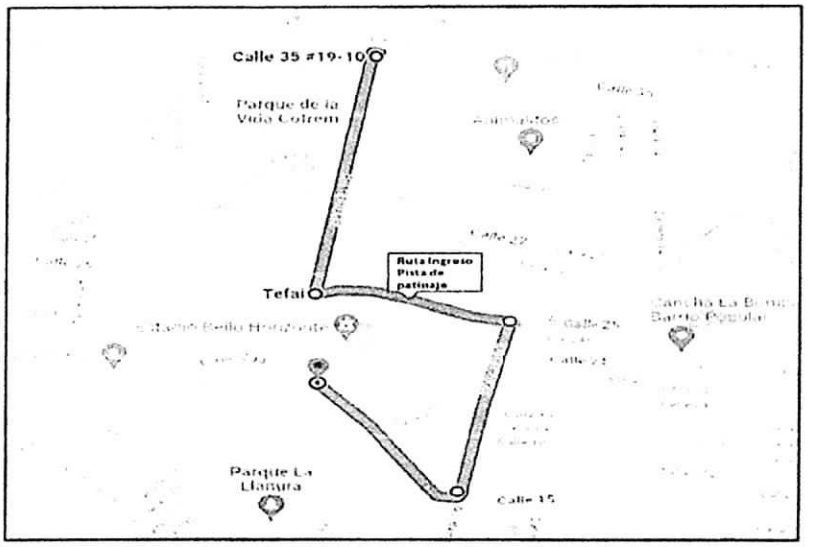

+ para la salida se realizará por la Carrera 18 Av Maracos, sentido hacia la Carrera 19 Av Circunvalar, hasta llegar a la Av Catama.

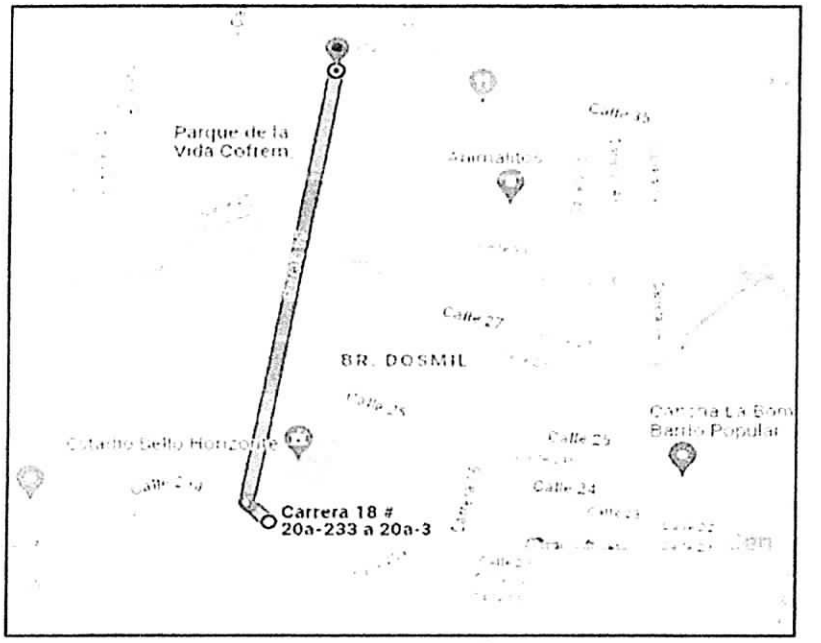

6. **Manejo de escombros**

Para la etapa de suministro de material y/o carga de escombros producto de la obra, se efectuará este procedimiento al interior del predio; es decir, dentro del lote objeto de intervención, con lo cual no se afectará el normal comportamiento del tránsito en la zona de influencia de la obra.

Para el manejo y disposición de escombros y desechos de construcción se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto Municipal 254 de 2012, y todo lo dispuesto en normatividad vigente.

La disposición de material resultante de excavación se realizará en las instalaciones del sector Guatiquia y el material resultante de las demoliciones se realizará en las instalaciones de la empresa Bioagricola Vía Caños Negros.

7. **Compromisos del Contratista.**

Cumplir estrictamente con lo descrito en la Plan de Manejo de Tránsito presentado, así como instalar la señalización provisional de acuerdo con lo establecido en el PMT presentado y ajustada a lo establecido en el Capítulo 4 del Manual de Señalización adoptado por el Ministerio del Transporte mediante Resolución 1885 de 2015, antes de iniciar las obras y realizar la socialización de los desvíos que se llevaran a cabo, así como de las labores a desarrollar en cada uno de los tramos.

En todo caso la señalización instalada debe estar fabricada en materiales definidos por el Manual de señalización vial que garanticen su reflectividad.

Ubicación de personal auxiliar de tránsito y personal necesario para realizar labores de aseo en la vía, no se podrán dejar materiales granulados esparcidos en la vía que puedan generar accidentes a los usuarios de las vías, especialmente a los peatones, motociclistas o ciclistas.

REQUISITOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE DEBE CUMPLIR EL SOLICITANTE: *Antes de iniciar las actividades deben estar instalados y señalizados adecuadamente los implementos para prevención de accidentes y de Seguridad Vial, de conformidad con los documentos y planos presentados y radicados ante la Secretaria de Movilidad, dirección de planeación y prospectiva, para este caso específico (conos, vallas, cintas de acordonar, iluminación, bandereros entre otros elementos de prevención, señalización temporal y reguladores viales según corresponda) los cuales deben cumplir las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito, ley 769 de 2002 y Manual de Señalización*, los cuales deben ser verificados por las autoridades de tránsito, quienes son las encargadas de hacer cumplir el CNT, previa suscripción acta de cumplimiento (anexa) quienes serán los responsables del cierre una vez se inicie las actividades, el no cumplimiento de estos requisitos, DEJA SIN EFECTOS LEGALES la presente viabilidad. Y el solicitante no podrá realizar la actividad y de hacerlo sin el cumplimiento de los requisitos legales **asume toda la responsabilidad civil y penal de los hechos que puedan generar daños a las personas o las cosas, que se afecten por esta actividad.**

Se debe realizar el seguimiento y control mediante el registro de informe diario y seguimiento realizados, trazabilidad de comunicaciones con Secretaría de Movilidad, registro fotográfico (con fecha, lugar y hora estampada); y evaluación por parte de la interventoría y área SISO. Al respecto la Secretaría de

3088

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA DE MOVILIDAD
DIRECCION DE PLANEACION Y PROSPECTIVA

Movilidad cuenta con las siguientes herramientas que facilita para que sea adoptado el seguimiento y control que se solicita por esta dependencia: evaluación mensual; deberá presentar mensualmente informes ante la Secretaría de Movilidad que evidencie el control y registro de las actividades realizadas, ajustes o modificaciones, por lo tanto, adjuntamos junto con esta viabilidad los formatos a tener en cuenta para realizar los informes mensuales, si requiere tenerlos en formato digital puede solicitarlos al siguiente correo electrónico (planeacionmovilidad@villavicencio.gov.co) o acercarse a las instalaciones de la Dirección de Planeación y Prospectiva de la Secretaria de Movilidad.

VILLAVICENCIO ESTA CAMBIANDO CONTIGO

Cordialmente,

ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE
Director de Planeación y Prospectiva

Anexos: N/A
Copia: N/A

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Vo Bo: N/A	N/A	N/A
Revisó: N/A	N/A	N/A
Elaboro: Paula Rodriguez	Contratista PyP	

3089

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 15 de junio de 2023

OF-C249 -2023-063

Señores:

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

15 JUN 2023
1591
245

REF: CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Entrega análisis de precios unitarios

Respetados señores:

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la documentación correspondiente a los análisis de precios unitarios realizados por el contratista de obra para propuesta económica del contrato, la interventoría realiza revisión y aprobación de precios, lista de insumos, cuadrillas, y equipos dando cumplimiento a las obligaciones contractuales dispuestas en el clausulado del contrato de interventoría.

Se anexan dos carpetas
Folios_300

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

3090

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 15 de Junio de 2023

OF-C249 -2023-064

Señores:

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 N°24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Entrega documentación pendiente residente de obra

Respetados señores:

Acorde a las comunicaciones realizadas en oficio OF-C459 -2022-023, OF-C249 -2023-035 y OF-C249-2022-053, luego que la entidad realizara aclaración de las observaciones realizadas por la interventoría, se realiza entrega de la documentación pendiente y del acta de aprobación de personal para el residente de obra, revisada y aprobada por la interventoría de tal forma se completa la documentación entregada inicialmente.

Se anexa
39 Folios

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

15 JUN 2023
1590
245

3091

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 15 de Junio de 2023

OF-C249 -2023-065

Señores:

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: Entrega informes de diagnostico

Respetados señores:

Acorde a las obligaciones contractuales que hacen parte del contrato de interventoría me permito realizar entrega de informes de diagnostico correspondientes a los proyectos componentes del contrato de obra

Se anexa
44 Folios

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

15 JUN 2023
1589
2:45

3092

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 14 de Junio del 2023

OF-C249 -2023-066

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: ENTREGA FORMATO ACTUALIZADO BITÁCORA DE MOVILIDAD

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes con el fin de hacer entrega de formato actualizado de bitácora entregado por movilidad, el cual se deberá anexar junto con los informes mensuales.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

OF-C249 -2023-066 ENTREGA FORMATO ACTUALIZADO BITACORA MOVILIDAD

1 mensaje

14 de junio de 2023, 21:21

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>
Para: escenariosdeportivos2023@gmail.com

Cordial saludo,

Remito Oficio con anexo.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO INTERESCENARIOS
Interventoria

2 archivos adjuntos

OF-C249 -2022-066 CONTRATISTA OBRA ENTREGA BITACORA MOVILIDAD.pdf
306K

1703-F-MOV-11-V1 REGISTRO DE BITACORA DIARIA.docx
169K

3014

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 15 de Junio del 2023

OF-C249 -2023-067

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CEDVO-034-2023 – ENTREGA FORMATOS

Cordial saludo,

De manera respetuosa me dirijo a ustedes teniendo en cuenta su solicitud realizada, de acuerdo a esto me permito anexar junto con el presente documento Formato para acta de recibo parcial, lista de chequeo para pagos, lista de chequeo para modificatorias y formato para modificación de cantidades de obra.

Se aclara que el IDERMETA, no cuenta con formatos para modificatoria de cantidades de obra, por lo que se deberá usar el formato del AIM, el cual se anexa y deberá ser ajustado con la información y logos del IDERMETA.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

3095

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

OF-C249 -2022-067 ENTREGA FORMATOS ACTAS Y LISTAS DE CHEQUEO

1 mensaje

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com> 15 de junio de 2023, 18:03
Para: escenariosdeportivos2023@gmail.com

Cordial saludo,

Remito Oficio con anexo.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO INTERESCENARIOS
Interventoría

5 archivos adjuntos

- **112-ECP-FR-025 ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.xlsx**
  141K
- **GES-FO113 LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA MODIFICATORIA DE CONTRATOS (1).docx**
  60K
- **GES-FO-42 ACTA DE PAGO DE OBRA.xlsx**
  124K
- **GES-FO-56 RECONOCIMIENTO Y PAGO PARCIALES O FINAL.docx**
  97K
- **OF-C249 -2022-067 CONTRATISTA OBRA ENTREGA FORMATOS ACTAS Y LISTA DE CHEQUEO.pdf**
  308K

3096

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 16 de Junio del 2023

OF-C249 -2023-068

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLÍMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: TRASLADO OFICIO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA IMPRESA

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito dar traslado a oficio y programación de obra impresa entregada por el contratista de obra.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

16 JUN 2023
16 17
4:40

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

3097

Villavicencio, 16 de Junio del 2023

OF-C249 -2023-069

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLÍMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

ASUNTO: TRASLADO OFICIO DE ENTREGA APROVECHAMIENTO FORESTAL

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito dar traslado a oficio por medio del cual hacen entrega del permiso de aprovechamiento forestal emitido por la secretaria de medio ambiente.

Agradezco la atención prestada.

16 JUN 2023
7618
440

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

3098

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 20 de JUNIO de 2023

OF-C249 -2022-070

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 N°24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: **REITERACION RESPUESTA OFICIOS DE OBRA E INTERVENTORIA Y ACTUALIZACION PROGRAMACION GESPROY CON ACTA DE INICIO.**

1

Respetados Señores:

En atención a los oficios radicados por el contratista y la interventoria los cuales se enlistan a continuación, nos permitimos reiterar la **necesidad perentoria de la respuesta dada por la consultoría** o quien determine la entidad contratante para definir el horizonte real del contrato de la referencia.

OFICIOS DE INTERVENTORIA

- OF-C249 -2022-024 traslado oficios.pdf
- OF-C249 -2022-047 INDICACION OFICIAL DISPOSICION FINAL DESMONTES .pdf
- OF-C249 -2022-048 RESPUESTAS TRASLADOS OF PENDIENTES Y SOLICITUD COMITE .pdf
- OF-C249 -2022-051 RESPUESTA OFICIOS ACLARACION CONSULTORIA .pdf
- OF-C249 -2022-052 IMPLANTACION RECORD FASE 1 .pdf
- OF-C249 -2022-055 REITERACION IMPLANTACION RECORD FASE 1 .pdf
- OF-C249 -2022-056 REITERACION RESPUESTAS OF PENDIENTES .pdf
- OF-C249 -2022-058 traslado oficios de obra .pdf

3099

CONSORCIO INTERESCENARIOS

OFICIOS DE OBRA

- CEDVO 08-2023 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.pdf
- CEDVO 10 2023 OBSERVACIONES AL DISEÑO DE PAVIMENTOS.pdf
- CEDVO 11 2023 ACLARACIONES PISTA DE ATLETISMO.pdf
- CEDVO 024-2023 Aclaraciones puntos electricos de pista de patinaje.pdf
- CEDVO-012-2023-ACLARACIONES DISEÑOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULPROPOSITO.pdf
- CEDVO-018-2023 CATASTRO DE REDES.pdf
- CEDVO-021-2023 ITEM NO PREVISTOS DEMOLICIONES .pdf
- CEDVO-023-2023 ACLARACIONES PISTA PATINAJE.pdf

Se reitera que todos los temas contenidos en esta documentación son de carácter técnico y requieren apoyo de la consultoria y definición por parte de la entidad contratante para poder dar pautas de inicio a las obras civiles, revisión y ajuste al presupuesto para establecer alcances reales, acordes a las necesidades actuales del proyecto y determinar pautas de inicio a los diferentes frentes de obra.

Adicionalmente solicitamos se alimente la **PLATAFORMA GESPROY,** por parte de la entidad con la programación entregada con el ajuste de la **FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS,** con el fin de que los reportes se realicen de la forma más ajustada a la realidad contractual.

2

Sin otro particular esperamos pronta respuesta de nuestra solicitud,

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

cc. Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

RESPUESTA OFICIO Y ACTUALIZACION GESPROY

1 mensaje

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>
Para: Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co>, bibiana_pan@hotmail.com
CC: escenariosdeportivos2023@gmail.com

20 de junio de 2023, 13:34

OF-C249 -2022-070 reiteracion resp oficios y programacion gesproy.pdf
144K

3|01

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 22 de Junio de 2023

OF-C249 -2023-071

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 N°24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

Respetados Señores:

Acorde a las obligaciones adquiridas en el contrato de obra y contrato de interventoría me permito adjuntar acta de vecindad correspondiente a la pista atlética del estadio suscritas por las partes, contratista, obra, entidad, en aras de dejar evidencia del estado de las zonas previo al inicio de la intervención de obras en las distintas zonas de la villa olímpica.

Agradecemos de antemano su atención.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R/L. CONSORCIO INTERESCENARIOS

22 JUN 2023
1676
9:52

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

3102

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 26 de Junio de 2023

OF-C249 -2023-072

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

26 JUN 2023
11:55 1919

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

Respetados Señores:

Por medio de la presente me permito remitir a ustedes el oficio enviado por el contratista consecutivo CEDVO-040-2023 radicado el día 23 de junio de 2023 por medio del cual se informa que la empresa bioagricola del llano no realiza disposición de espumas y material dejado en los fosos de la zona de gimnasia así como de la espuma poliuretano que se desmonta de la teja de cubierta, de tal forma se solicita a la entidad la directriz para realizar la entrega de llantas, láminas de madera resortada, espumas y demás elementos dejados en los fosos, así como el poliuretano que se ha venido desmontando puesto que la empresa **METALREC** autorizada por la entidad para retirar los elementos desmontados, expresa que este material no será recogido por ellos, lo que se vuelve una problemática para la obra ya que debido al desarrollo de actividades de desmontes no hay espacio suficiente en obra para acopiar este material que por su área representa una gran ocupación de volumen.

CONSORCIO INTERESCENARIOS


Registro fotográfico:

Detalle poliuretano desmonte de cubierta



Acopio poliuretano



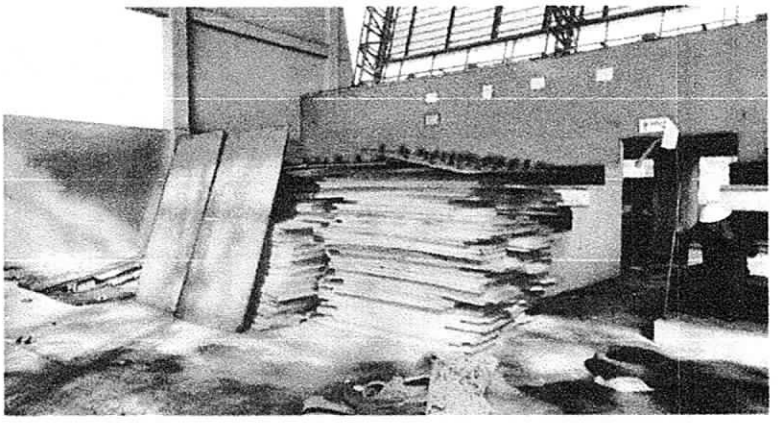

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Laminas de maderas resortadas



Llantas en fosos de gimnasia






Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Espumas fosos de gimnasia



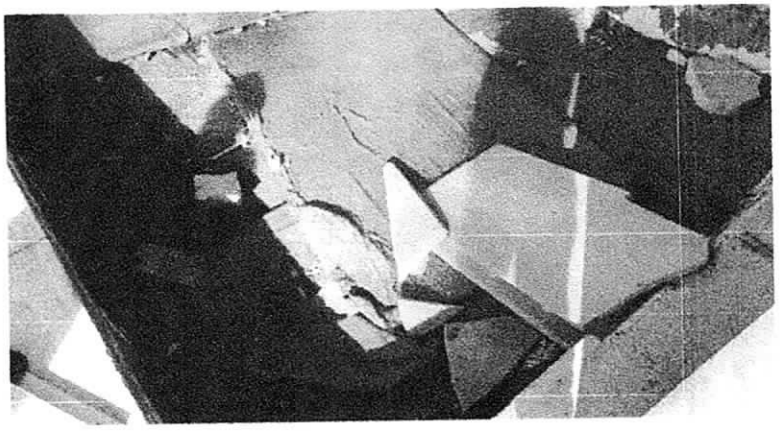



Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Se reitera la premura con la que se debe retirar los elementos de la obra ya que son materiales altamente inflamables son residuos especiales los cuales la entidad debe definir qué empresa o persona realizara su retiro.

Agradecemos de antemano su atención.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

3107

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 26 de Junio de 2023

OF-C249 -2023-073

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

26 JUN 2023
1720
1145

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No **249 DE 2023**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No **106 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

1

Respetados Señores:

Acorde a las actividades que se están desarrollando en la construcción de los escenarios multipropósito es necesario la entrega de las zonas ocupadas por el contratista del proyecto correspondiente a la fase 1, ya que a la fecha se evidencian materiales de obra, campamentos, y escombros dejados en el sitio en el cual se iniciara la construcción del proyecto, por lo cual se informa a la entidad para que solicite al contratista realizar los retiros ya que no se pueden iniciar actividades de descapotes y replanteos hasta que la zona se encuentre desocupada, es evidente la gran cantidad de losetas, sardineles y materiales de obra que se encuentran acopiados en el lugar, la demora en los retiros genera afectaciones a la programación de obra pues el material se encuentra localizado en el sitio donde se debe realizar el emplazamiento del proyecto para iniciar actividades preliminares.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Registro fotográfico:

Estibas de loseta y deck de concreto







Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78


Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Campamento de lámina de zinc con material de obra



Campamentos lamina de zinc acopio de material eléctrico

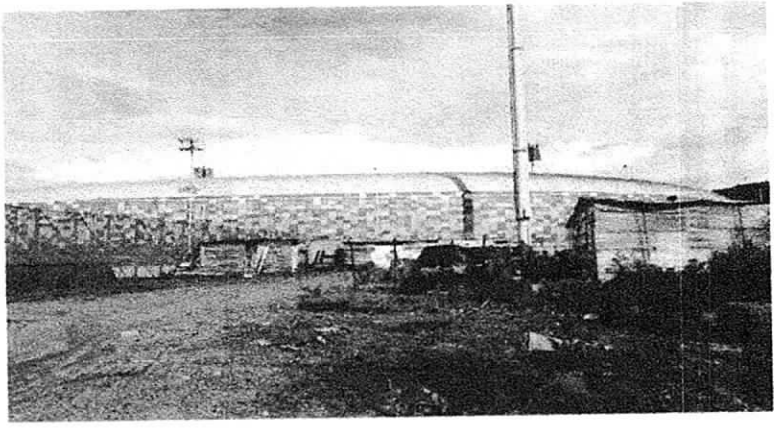

Detalle sobrantes de obra tanques, acero, escombros



Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78


Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Tope llantas materiales de obra



Acopio de sardineles sobre varias zonas

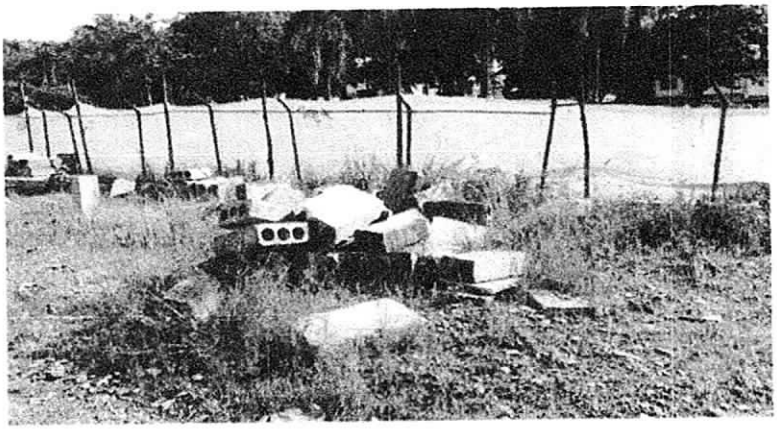

Arenilla cancha auxiliar



Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Es necesario el retiro del material ya que interfiere con las labores que deben realizarse en la obra adicionalmente se informa que cualquier daño o perdida de materiales no será responsabilidad de la obra pues estas zonas fueron entregadas por IDERMETA sin embargo aún se encuentran ocupadas por el contratista de fase 1.

Agradecemos de antemano su atención.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

3112

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 26 de junio del 2023

OF-C249 -2023-074

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME RELACIONADO AL INCIDENTE DEL CONATO DE INCENDIO PRESENTADO EL 24/06/2023 EN INSTALACIONES DE OBRA.

Cordial saludo,

De manera respetuosa me dirijo a ustedes para reiterar la solicitud verbal realizada el día sábado 24/06/2023, con relación a la entrega de informe detallado del conato de incendio sucedido en las instalaciones de obra, acompañado de la copia del plan de emergencias y controles vigente que se tiene en la obra de la referencia para hacer frente a estos eventos.

1

Adicionalmente se solicita anexar los siguientes documentos al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de obra:

- Plan de prevención y preparación de emergencias con las brigadas que se hayan conformado y los controles que incluyen para la atención de emergencias.
- En el informe se debe detallar lo sucedido teniendo en cuenta los controles existentes y los que se implementaran para evitar la ocurrencia de uno nuevo.
- Matriz de peligros donde se contemple este peligro.
- Listado de equipos de emergencia con los que se cuenta en obra para la atención de emergencias, (extintores, botiquín, camillas entre otros).

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ
PROFESIONAL SST – CONSORCIO INTERESCENARIOS

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Recibido Para Estudio
11:28am - 26-06-23
Thaly Contreras

3113

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 26 de Junio de 2023

OF-C249 -2023-075

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
Atn: JHON HENRY ORTIZ GARCIA R/L
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE OBRA No **459 DE 2023**
"CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: corrección informe de obra

Respetados Señores:

1

Acorde a la revisión realizada al informe de obra entregado el día 21 de junio de 2023 mediante oficio CEDVO-039-2023, nos permitimos solicitar la corrección de las siguientes observaciones:

1. cuadro de información básica.
VALOR DE PROYECTO: especificar el proyecto a cuál corresponde cada valor

2. REGISTRO FOTOGRAFICO: para este anexo se debe colocar el registro actividad ejecutada por cada capítulo con el porcentaje de cada actividad según el presupuesto, no corresponde al total del capítulo.

3. ACTAS GENERADAS: Falta incluir copia de las actas de vecindad realizadas.

4. FORMATO GES FO 34: Informe implementación PMA en el cuadro correspondiente a verificación programas ambientales se relaciona a la CAR avalando permisos, sin embargo, se entregan conceptos y licencias avaladas por CORMACARENA, se debe corregir formato.

5. Los anexos entregados se deben adjuntar de forma organizada acorde a el orden estipulado en el formato GES-FO-26

- Registro fotográfico detallado
- Copia de la bitácora de la obra o de las actividades desarrolladas.
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Control de Seguridad Industrial.
- Control de equipos.
- Estado del tiempo
- Manejo Ambiental
- Actas de comité técnico.
