10341

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023 Página 1 de 1
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	

Villavicencio, 13 de septiembre del 2023

CEDVO-110-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO DE OBRA MES DE SEPTIEMBRE.

Cordial saludo

La presente tiene como fin, realiza la entrega del informe de plan de inversión de anticipo de obra correspondiente a los desembolsos del mes de septiembre con sus respectivas ordenes de giro.

Agradecemos la atención prestada.

RECIBIDO 17 OCT 2023

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

10.342

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

CONTRATO N°	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

INFORME N°	3	PERIODO INFORME:	1 de septiembre de 2023	a	30 de septiembre de 2023

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
NIT:	901682871-2
CORREO ELECTRONICO:	Contabilidadedeportivos@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
CORREO ELECTRONICO:	interescenariosc@gmail.com
SUPERVISOR:	BIBIANA PAN MERCHAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	FLOWER EMILIO PEÑA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	

VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCION	12	Meses	0	Días	0
FECHA DE INICIACION:	10 de mayo de 2023				
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VIGENCIA ACTUAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Días	0
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VALOR DEL PROYECTO					
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL		VALOR ($) ACTUAL
1	2022005500094	10.220.557.418,00	0,00	$	10.220.557.418,00
2	2022005500022	8.805.724.533,00	0,00	$	8.805.724.533,00
3	2022005500024	31.845.658.891,00	0,00	$	31.845.658.891,00
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$	50.871.940.842,00

INFORMACIÓN DE ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO 1:	$ 14.498.503.139,60		
FECHA PAGO ANTICIPO	29 de junio de 2023	No. COMPROBANTE:	01976-01975-01974-01973-01972
FIDUCIA (SI APLICA):	ALIANZA FIDUCIARIA		
BANCO :	BANCOLOMBIA - FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS		
CUENTA DE AHORROS :	4000006842		

INFORME DE INVERSIÓN

ITEM	CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
1	ORDEN DE GIRO 5 - 434236	20 de septiembre de 2023	GRUPO VIARQ LTDA	$ 907.601.278,00	3	ANTICIPO CONTRATO No 02
TOTAL						$ 907.601.278,00

Anexar: Respectivos Soportes y Extracto Cuenta Bancaria Registrada.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANTICIPO INICIAL	ANTICIPO ADICIONAL	TOTAL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO ANTICIPO
1	Mano de obra	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 12.323.727.668,66	$ -	$ 12.323.727.668,66	$ -	$ 4.175.259.147,36
3	Transporte	$ 1.449.850.313,96	$ -	$ 1.449.850.313,96	$ 907.601.278,00	$ 542.249.035,96
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40
5	FONSET 5%	$ 763.079.113,00		$ 763.079.113,00		$ -
TOTALES		$ 15.261.582.252,60	$ -	$ 15.261.582.252,60	$ 907.601.278,00	$ 5.442.433.340,30

Nota: Se anexa copia de Tarjeta Profesional y vigencia de la Tarjeta Profesional de los contadores que intervienen en el presente informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, 13 de octubre de 2023

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 278207-T

Firma
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 175215-T

10344

Alianza Fiduciaria

t: (601) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
CODIGO SIFI 113392

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 4/17/2023 rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10315

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000006842

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTI

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	6,350,728,999.29	*SALDO PROMEDIO*	$	6,019,319,438
TOTAL ABONOS	$	7,702,153.90	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	911,233,184.14	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,696,153.90
SALDO ACTUAL	$	5,447,197,969.05	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,339,911.10	6,353,068,910.39
19/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,006,000.00	6,354,074,910.39
19/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00	6,357,074,910.39
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			130,102.32	6,357,205,012.71
20/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,256.34	6,357,203,756.37
20/09	PAGO A PROV GRUPO VIARQ LTDA			-907,601,278.00	5,449,602,478.37
20/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,630,411.09	5,445,972,067.28
20/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-238.71	5,445,971,828.57
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,226,140.48	5,447,197,969.05
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10 346

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 12 de octubre de 2023

CEDVO-108-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

RECIBIDO 12 OCT 2023
Carolina Betancourt
10:37 a.m.

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ROTURA TUBERIA SUMIDEROS.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito informar que durante la excavación mecánica de las zapatas del escenario multipropósito 1, se detectó una tubería de descarga de aguas lluvias proveniente de los sumideros del parqueadero nuevo en la zona norte. Esta red no se encontraba identificada en los planos hidráulicos entregados por la entidad ni por el anterior contratista de obra.

Durante la excavación la tubería PVC sufrió rotura por la maquina siendo necesario sellar temporalmente la salida de agua desde el sumidero.

Esta nueva red necesariamente debe ser reubicada para lo cual será necesario intervenir el pavimento en concreto para redireccionarla a los nuevos pozos propuestos para el desvío de la tubería de A.LL. de 24". Por ser esta estructura recientemente construida y en cobertura de estabilidad se solicita a la interventoría y entidad autorización para su intervención.

10347

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

10.348

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ENTREGA DE DOTACION Y EPP

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

10.349

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN
SST-F005-01 19/05/2023

EL PERSONAL RELACIONADO A CONTINUACIÓN SE COMPROMETE A:

"DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.I Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.I UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD. LOS EPP ESTÁN BAJO MI RESPONSABILIDAD, CUIDADO Y SU USO SERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LAS LABORES PROPIAS A LOS QUE SON DESTINADOS. LA ENTREGA DE LOS MISMOS SE REALIZARÁ ACORDE CON MIS FUNCIONES Y SOLAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO. EN CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS EQUIPOS YA NOMBRADOS, NOTIFICARÉ A LA EMPRESA O A LA PERSONA ENCARGADA DE LA ENTREGA DE DICHOS EQUIPOS".

RESPONSABLE JAIR PEÑA FECHA: 01-10-2023 AL 31-10-2023

No.	NOMBRE TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL										FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
				GAFAS	CASCO	GUANTES	BOTAS	TAPA OIDOS	TAPA BOCAS	IMPERMEABLE	ARNES	DOTACION	OTRO		
1	JOSE ANGEL CRUZ	17265332	AYUD	11	1	1 1		1	1	1				JOSÉ ANGEL	VAQUETA - POLIURETANO OSCURAS - INSERCION - INDUS
2	JAVIER FERNANDEZ	86072014	AYUD	11	1	1 1 1 1	11	1	1	1				JAVI. F	CAUCHO - POLIURETANO OSCURAS - INDUSTRIAL - INSERCI
3	STEVEN HERNANDEZ	1121951112	AYUD	1	1	11		1	1						VAQUETA - POLIURETANO AMARILLO - OSCURAS
4	LAURA BRAVO AMAYA	1.121939501	INSPECTORA	11		1									OSCURAS - POLIURETANO
5	Jonatan Ramirez	1.121.939.490	AYUD	11	1	1 1 1	1	1	1	1					OSCURAS - AMARILLO - VAC
6	YULIAN GRUESO	6977576	Ayuda	1	1	11	11	1	1						POLIURETANO - INSERCION VAQUETA - POLIURETAN
7	Juan José Suta A.	1.193.090.858	Ing.			1 1 1		1	1						OSCURAS - AMARILLO - INSERC POLIURETANO
8	Victor H Giraldo	1.121.836.666	Ayud.	11		1 1 1		1	1					Victor Giraldo	LENTE OSCURO - POLIURETA VAQUETA - INSERCION
9	Jeilor Vizcaino	1.121.817.078	AY	11		1 1 1		1	1						POLIURETANO - VAQUETA LENTE OSCURO - INSERCION
10	Yordano Romero	5374170	AYUDANTE	11		1 1 1		1	1					YORDANO	VAQUETA - LENTE OSCURO POLIURETANO - INSERCION
11	Yhon Nicolas Castillo	1121960876	AYUD	11		1 1 1		1	1						VAQUETA - POLIURETANO LENTE OSCURO - INSERCION
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															

LAURA BRAVO
FIRMA INSPECTOR SST

10.350

ENTREGA INICIAL DE DOTACION Y EPP

SST-F005-01
21/05/2023

Nombre: CARLOS HERNANDEZ
Cargo: AYUDANTE
C.C. No.: 86.072.014

ITEM	DESCRIPCION	TALLA	CANTIDAD
1	IMPERMEABLE	XL	1
2	BOTAS DE CAUCHO	41	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Notas y Observaciones

Autorizado por: LAURA BRAVO Fecha: 06-10-2023

Entregado, **Recibido,**

LAURA BRAVO.

10.351

ENTREGA INICIAL DE DOTACION Y EPP

SST-F005-01
21/05/2023

Nombre: JONATHAN RAMOS
Cargo: AYUDANTE
C.C. No.: C.V. 17174490 PPT 4873060

ITEM	DESCRIPCION	TALLA	CANTIDAD
1	IMPERMEABLE		1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Notas y Observaciones

Autorizado por: XIMENA BRAVO Fecha: 06-10-2023

Entregado,

XIMENA BRAVO

Recibido,

JONATHAN R

10.352

ENTREGA INICIAL DE DOTACION Y EPP

SST-F005-01
21/05/2023

Nombre: JOSE ANGEL CRUZ
Cargo: AYUDANTE
C.C. No.: 1726522

ITEM	DESCRIPCION	TALLA	CANTIDAD
1	IMPERMEABLE	XL	1
2	BOTAS DE CAUCHO	40	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Notas y Observaciones

Autorizado por: LAURA BRAVO Fecha: 06-10-2023

Entregado, **Recibido,**

LAURA BRAVO X JOSE ANGEL

10.353

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ENTREGA DE DOTACION Y EPP

10.354

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

SST-F005-01 19/05/2023

EL PERSONAL RELACIONADO A CONTINUACIÓN SE COMPROMETE A:

"DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.I Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.I UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD. LOS EPP ESTÁN BAJO MI RESPONSABILIDAD, CUIDADO Y SU USO SERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LAS LABORES PROPIAS A LOS QUE SON DESTINADOS. LA ENTREGA DE LOS MISMOS SE REALIZARÁ ACORDE CON MIS FUNCIONES Y SOLAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO. EN CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS EQUIPOS YA NOMBRADOS, NOTIFICARÉ A LA EMPRESA O A LA PERSONA ENCARGADA DE LA ENTREGA DE DICHOS EQUIPOS".

RESPONSABLE JAIR PEÑA FECHA: 01-10-2023 AL 31-10-2023

No.	NOMBRE TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL										FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
				GAFAS	CASCO	GUANTES	BOTAS	TAPA OIDOS	TAPA BOCAS	IMPERMEABLE	ARNES	DOTACION	OTRO		
1	JOSE ANGEL CRUZ	13265332	AYUD	11	1	1111		1	1	1				JOSÉ ANGEL	VAQUETA - POLIURETANO OSCURAS - INYECCION - INDUS
2	JAVIER FERNANDEZ	86072014	AYUD	11	1	111111	11	1	1	1					CAUCHO - POLIURETANO OSCURAS - INDUSTRIAL - INSERCI
3	STEVEN HERNANDEZ	1121951112	AYUD	1	1	11		1	1						VAQUETA - POLIURETANO AMARILLO - OSCURAS
4	LAURA BRAVO AMAYA	1.121939501	INSPECTORA	11		1									OSCURAS - POLIURETANO
5	[illegible]	17.174.[illegible]	AYUD	11	1	1111	1	1	1	1					OSCURAS - AMARILLO - VAC
6	[illegible]	6977526	Ayuda	1	1	11	11	1	1						POLIURETANO - INYECCION
7	Juan Jose Suta A.	1.193.090.[illegible]	Ing.			111		1	1						VAQUETA - POLIURETANO OSCURAS - AMARILLO - INSERC
8	Victor H Giraldo	1.121.83[illegible]	Ayud.	11		1111		1	1					Victor Giraldo	POLIURETANO
9	[illegible]	1.121.817.[illegible]	AY	11		1111		1	1						LENTE OSCURO - POLIURETA - VAQUETA - INSERCION
10	[illegible]	5374176	AYUDANTE	11		1111		1	1						POLIURETANO - VAQUETA LENTE OSCURO - INYECCION
11	Juan [illegible]	1121[illegible]	AYUD	11		1111		1	1						VAQUETA - POLIURETANO LENTE OSCURO - INSERCION
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															

LAURA BRAVO
FIRMA INSPECTOR SST

10.355

ENTREGA INICIAL DE DOTACION Y EPP

SST-F005-01
21/05/2023

Nombre: CARLOS HERNANDEZ
Cargo: AYUDANTE
C.C. No.: 86.072.014

ITEM	DESCRIPCION	TALLA	CANTIDAD
1	IMPERMEABLE	XL	1
2	BOTAS DE CAUCHO	41	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Notas y Observaciones

Autorizado por: LAURA BRAVO Fecha: 06-10-2023

Entregado, **Recibido,**

LAURA BRAVO.

10.356

ENTREGA INICIAL DE DOTACION Y EPP

SST-F005-01
21/05/2023

Nombre: JONATHAN RAMOS
Cargo: AYUDANTE
C.C. No.: C.V. 1717449O PPT 4873060

ITEM	DESCRIPCION	TALLA	CANTIDAD
1	IMPERMEABLE		1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Notas y Observaciones

Autorizado por: XIMENA BRAVO Fecha: 06-10-2023

Entregado,

XIMENA BRAVO

Recibido,

JONATHAN

10357

ENTREGA INICIAL DE DOTACION Y EPP

SST-F005-01
21/05/2023

Nombre: JOSE ANGEL CRUZ
Cargo: AYUDANTE
C.C. No.: 17265332

ITEM	DESCRIPCION	TALLA	CANTIDAD
1	IMPERMEABLE	XL	1
2	BOTAS DE CAUCHO	40	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Notas y Observaciones

Autorizado por: LAURA BRAVO Fecha: 06-10-2023

Entregado, LAURA BRAVO

Recibido, X JOSE ANGEL

10358

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INSPECCIÓN DE EPP

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

10 359

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: VERONICA CABARCA PROYECTO: 106 - 2023 FECHA: 06-10-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		CAMISETA ✓
2	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		CAMISETA ✓
3	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CAMISETA ✓
4	JHON NEYDER CASTILLO SANCHEZ	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CAMISETA ✓
5	JOSE ANGEL CRUZ CASTILLO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CAMISETA ✓
6	CARLOS JAVIER FERNANDEZ GUERRERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CAMISETA ✓
7	JONATHAN RAMOS ROMERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CAMISETA ✓
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			

FIRMA RESPONSABLE

10.360

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: VERONICA CABARCA PROYECTO: 106 - 2023 FECHA: 13-10-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CASCO HOV
2	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CASCO HOV
3	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CASCO HOV
4	JHON NEYDER CASTILLO SANCHEZ	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CASCO HOV
5	JOSE ANGEL CRUZ CASTILLO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		CASCO HOV
6	CARLOS JAVIER FERNANDEZ GUERRERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		CASCO HOV
7	JONATHAN RAMOS ROMERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		CASCO HOV
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			

FIRMA RESPONSABLE

10.361

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: VERONICA CABARCA PROYECTO: 106 - 2023 FECHA: 20-10-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																		OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		GAFA CHAQ		
2	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		GAFA CHAQ		
3	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		GAFA CHAQ		
4	JHON NEYDER CASTILLO SANCHEZ	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		GAFA CHAQ		
5	JOSE ANGEL CRUZ CASTILLO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		GAFA CHAQ		
6	CARLOS JAVIER FERNANDEZ GUERRERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		GAFA CHAQ		
7	JONATHAN RAMOS ROMERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		GAFA CHAQ		
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					

FIRMA RESPONSABLE

10362

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: VERONICA CABARCA PROYECTO: 106 - 2023 FECHA: 27-10-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																	OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		CAMISETA	
2	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CAMISETA	
3	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		CAMISETA	
4	JHON NEYDER CASTILLO SANCHEZ	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		CAMISETA	
5	JOSE ANGEL CRUZ CASTILLO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CAMISETA	
6	CARLOS JAVIER FERNANDEZ GUERRERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CAMISETA	
7	JONATHAN RAMOS ROMERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CAMISETA	
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

FIRMA RESPONSABLE

10.363

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INSPECCION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

10.364

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

SST-F020-01 10/05/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 20-10-2023

ORDEN	No. DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA		UBICACIÓN	CONDICIONES DEL EXTINTOR															
				ACT.	PROX.		PRESION		SELLO/ GARANTÍA		MANOMETRO		RECIPIENTE		MANIJA		MANGUERA		PINTURA		SEÑALIZACION / DEMARCACIÓN	
							B	M	S	N	B	M	B	M	B	M	B	M	S	N	S	N
1	1	ABC	10 L	07-2023	07-2024	ESCENARIO 1	B		S		B		B		B		B		S		S	
2	2	ABC	10 L	09-2023	09-2024	ESCENARIO 2	B		S		B		B		B		B		S		S	
3	3	ABC	10 L	09-2023	09-2024	P. PATINAJE	B		S		B		B		B		B		S		S	
4	4	ABC	10L	09-2023	09-2024	P. ATLETISMO	B		S		B		B		B		B		S		S	
5	5	ABC	10 L	07-2023	09-2024	PORTERIA	B		S		B		D		D		D		S		S	
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						

No.	RESUMEN ESTADO DE EXTINTORES Y/O GABINETES CONTRA INCENDIOS	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA	
				INICIO	FIN
1	SE ENCUENTRAN VIGENTES	SE REALIZA MONITOREO Y SEGUIMIENTO, DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN	AREA SST	10-2023	10-2023
2					
3					
4					

CONVENCIONES:

B: BIEN S: SI
M: MAL N:NO

10365

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN CAMILLA DE EMERGENCIA
SST-F124-01 01/09/2023

Proyecto: 106 DEL 2023	Fecha de Inspección: 20-10-2023	Localización: Obra - Escenarios Deportivos
Inspección realizada por: VERONICA CABARCA	cargo: Coordinador SST	

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadoras para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	ESCENARIO 1	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		
2	ESCENARIO 2	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
3	P. PATINAJE	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	P. ATLETISMO	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		
5	PORTERIA	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

Firma responsable de la inspección

10.366

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

SST-F003-01 19/04/2023

Nombre del que Inspecciona	VERONICA CABARCA
Cargo	COORDINADOR SST
Fecha de Inspección	19/10/2023
Ubicación del Botiquín	ESCENARIO 2

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
Aplicadores Asepticos	B	1	19/07/2027
Tapabocas	B	1	No aplica
Bajalenguas Asepticos	B	6	20/08/2027
gasa esteril	B	1	No aplica
Algodón	B	1	No aplica
guantes sinteticos	B	1	No aplica
Guantes Desechables	B	1	No aplica
Visturi	B	1	No aplica
Curas	B	8	No aplica
Copitos	B	12	No aplica
Condon	B	1	20/05/2026
Toalla Impregnada	B	1	10/03/2025
Botella Agua	B	1	No aplica
Gel Antibacterial	B	1	15/07/2024
Inmovilizador Cervical	B	1	No aplica
Toalla Higienica	B	1	No aplica
Venda Elastica	B	1	No aplica
Cinta Microporosa 2 yardas	B	1	30/10/2023
ensendedor	B	1	No aplica
Maleta botiquin	B	1	No aplica

OBSERVACIONES:

10.367

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

SST-F003-01 19/04/2023

Nombre del que Inspecciona	VERONICA CABARCA
Cargo	COORDINADOR SST
Fecha de Inspección	19/10/2023
Ubicación del Botiquín	PISTA DE PATINAJE

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
Aplicadores Asepticos	B	1	19/07/2027
Tapabocas	B	1	No aplica
Bajalenguas Asepticos	B	12	20/08/2027
gasa esteril	B	1	No aplica
Algodón	B	1	No aplica
guantes sinteticos	B	1	No aplica
Guantes Desechables	B	1	No aplica
Visturi	B	1	No aplica
Curas	B	6	No aplica
Copitos	B	24	No aplica
Condon	B	1	20/05/2026
Toalla Impregnada	B	1	10/03/2025
Botella Agua	B	1	No aplica
Gel Antibacterial	B	1	15/07/2024
Inmovilizador Cervical	B	1	No aplica
Toalla Higienica	B	1	No aplica
Venda Elastica	B	1	No aplica
Cinta Microporosa 2 yardas	B	1	30/10/2023
ensendedor	B	1	No aplica
Maleta botiquin	B	1	No aplica

OBSERVACIONES:

16368

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

SST-F003-01 19/04/2023

Nombre del que Inspecciona	VERONICA CABARCA
Cargo	COORDINADOR SST
Fecha de Inspección	19/10/2023
Ubicación del Botiquín	PISTA DE ATELTISMO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
Aplicadores Asepticos	B	1	19/07/2027
Tapabocas	B	2	No aplica
Bajalenguas Asepticos	B	10	20/08/2027
Pito	B	1	No aplica
Algodón	B	1	No aplica
Jeringa Desechable	B	1	20/08/2027
Guantes Desechables	B	1	No aplica
Cutter Cuchillo	B	1	No aplica
Venda Adhesiva	B	1	mar-27
Copitos	B	24	No aplica
Condon	B	1	20/05/2026
Banda Adhesiva	B	1	No aplica
Acetaminofen	B	1	No aplica
Toalla Impregnada	B	1	1/06/2026
Tela	B	1	No aplica
Botella Agua	B	1	No aplica
Venda Algodón Laminado	B	1	may-27
Jabon Yodado 7%	B	1	18/01/2025
Gel Antibacterial	B	1	15/07/2024
Inmovilizador Cervical Desechable	B	1	No aplica
Venda Elastica 4"x 5 Yardas	B	1	ene-26
Venda Elastica 3"x 5 Yardas	B	2	feb-28
Suero Fisiologico	B	1	jul-25
Gasa No Tejida Esteril	B	2	No aplica
Inmovilizador Cervical	B	1	No aplica
Toalla Higienica	B	1	No aplica
Venda Elastica	B	1	No aplica

OBSERVACIONES:

10.369

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

SST-F003-01 19/04/2023

Nombre del que Inspecciona	VERONICA CABARCA
Cargo	COORDINADOR SST
Fecha de Inspección	19/10/2023
Ubicación del Botiquín	ESCENARIO 1

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
Aplicadores Asepticos	B	1	19/07/2027
Tapabocas	B	1	No aplica
Bajalenguas Asepticos	B	10	20/08/2027
gasa esteril	B	1	No aplica
Algodón	B	1	No aplica
guantes sinteticos	B	1	No aplica
Guantes Desechables	B	1	No aplica
Visturi	B	1	No aplica
Curas	B	3	No aplica
Copitos	B	9	No aplica
Condon	B	1	20/05/2026
Toalla Impregnada	B	1	10/03/2025
Botella Agua	B	1	No aplica
Gel Antibacterial	B	1	15/07/2024
Inmovilizador Cervical	B	1	No aplica
Toalla Higienica	B	1	No aplica
Venda Elastica	B	1	No aplica
Cinta Microporosa 2 yardas	B	1	30/10/2023
ensendedor	B	1	No aplica
Maleta botiquin	B	1	No aplica

OBSERVACIONES:

10 370

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

SST-F003-01 19/04/2023

Nombre del que Inspecciona	VERONICA CABARCA
Cargo	COORDINADOR SST
Fecha de Inspección	19/10/2023
Ubicación del Botiquin	OFICINA ESCENARIO 1

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
Termometro	B	1	19/07/2027
Termometro Digital	B	1	No aplica
Termometro Infrarrojo	B	1	20/08/2027
Kit de Ferulas Inmovilizadora	B	1	No aplica
Cuello Ortopedico Multitallas	B	1	No aplica
Cuellos Ortopedicos	B	6	20/08/2027
Ferulas Maleables	B	2	No aplica
Vendas Elasticas 6"xs	B	4	No aplica
Venda Elasticas 4"xs	B	2	mar-27
Vendas Algodón Laminado 5"xs	B	2	No aplica
Vendas Algodón Laminado 4"xs	B	3	20/05/2026
Jabones Desinfectante	B	2	No aplica
Isodine Solucion	B	7	No aplica
Sales de Rehidratacion	B	10	1/06/2026
Exparadrapo	B	2	No aplica
Juego Tendido Cama Amarilla	B	1	No aplica
Medidor Prueba Alcoholemia	B	1	may-27
Cajas Guantes Para Examen	B	2	18/01/2025
Bolsas Suero Fisiologico	B	3	15/07/2024
Jeringa de 10 mln	B	2	No aplica
Jeringa de 5 mln	B	1	ene-26
Paquetes x20 Bajalenguas Antiseptico	B	8	feb-28
Aplicadores Asepticos x20	B	2	jul-25
Curitas	B	11	No aplica
Gasas Precortadas	B	2	No aplica
	B		No aplica
	B		No aplica

OBSERVACIONES:

10.371

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INSPECCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

AL SERVICIO DE LA GENTE

10372

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
SST-F082-01 19/05/2023

FECHA:	19-10-2023	HORA:	4:00 PM
ÁREA:	ESCENARIOS DEPORTIVOS		
REALIZADA POR:	LAURA BRAVO		

No	ASPECTOS A EVALUAR	S	N	NA	CALIFICACIÓN A	CALIFICACIÓN B	CALIFICACIÓN C	OBSEVACIONES
	1. ASPECTO FISICO							
1.1	Existe buena Iluminación (Artificial o Natural)	✓						
1.2	Las luminarias están en buen estado (Todas las bombillas o tubos funcionan, no tienen espacios negros en los extremos)	✓						
1.3	Hay buena ventilación en el área	✓						
1.4	Para los trabajos Nocturnos existe iluminación suficiente.			✓				
	2. ASPECTO LOCATIVO							
2.1	Las áreas de trabajo están señalizadas y demarcadas	✓						
2.2	Las escaleras y accesos son seguras			✓				
2.3	Los andamios están bien armados y seguros			✓				
2.4	Techos en buen estado (goteras)	✓						
2.5	Las sillas están en buen estado o son seguras	✓						
2.6	Los escritorios están en buen estado (porta teclado, archivadores), son seguros.	✓						
2.7	Disposición del puesto de trabajo (ergonomía)	✓						
2.8	Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran libres de obstáculos.	✓						
2.9	Los pasillos son adecuados en cuanto a accesibilidad, demarcación y dimensiones.			✓				
2.10	Los techos , paredes, puertas , ventanas y superficies de Trabajo se encuentran en buen estado.	✓						
2.11	El estado de los pisos es adecuado , las superficies son seguras y aptas para el trabajo ,limpios, secos, libres de grasa y aceites.	✓						
2.12	Las condiciones de almacenamiento (elementos , archivo papeleria) son adecuados	✓						
2.13	El almacenamiento de sustancias quimicas es adecuado	✓						
2.14	La limpieza en las areas es adecuada	✓						
2.15	Las areas estan señalizadas y demarcadas	✓						
	3. ASPECTO ELECTRICO							
3.1	Los cables eléctricos están entubados	✓						
3.2	Tomas e interruptores están en buen estado	✓						
3.3	Los equipos están conectados a la toma correspondiente (computadores a toma regulada, transformadores a Normales)	✓						
3.4	Cables en buen estado	✓						
3.5	Los tableros, cajas y circuitos están identificados	✓						
	4. ASPECTO DE SEGURIDAD							
4.1	La actividad realizada cuenta con permisos de trabajos, están en sitio y divulgados	✓						
4.2	Se diligenciarón Reportes de Trabajos de SST	✓						
4.3	Los extintores son los adecuados al tipo de riesgo del área	✓						
4.4	Los productos químicos están identificados y rotulados con HMIS III	✓						
4.5	Se cuenta con hojas de seguridad de los productos químicos	✓						
4.6	Suministro de Agua Potable	✓						
4.7	Areas de circulación despejadas	✓						
4.8	Se cuenta con Vehiculo y/o comunicación para emergencias	✓						
	5. ASPECTO DE ORDEN Y ASEO							
5.1	Hay basura en el piso o lugares diferentes a la caneca		✓					
5.2	Clasificación de residuos sólidos en forma correcta	✓						
5.3	Las Vías y acceso están despejadas, evitando Riesgo de Caída	✓						
5.4	Se encuentra el área de trabajo limpio, aseado y en orden.	✓						
5.5	Existe punto ecológico para recolección y clasificación de residuos sólidos en la fuente, de acuerdo al código de colores establecido	✓						
5.6	Se evidencia adecuada clasificación de residuos en el lugar de acopio temporal	✓						
5.7	El área ha intervenir cuenta con permiso ambiental	✓						
5.8	Se realizo campaña visual o capacitaciones en temas ambientales	✓						

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
SST-F082-01 19/05/2023

FECHA:	19-10-2023	HORA:	4:00 PM
ÁREA:	ESCENARIOS DEPORTIVOS		

No	ASPECTOS A EVALUAR	S	N	NA	CALIFICACIÓN A	CALIFICACIÓN B	CALIFICACIÓN C	OBSERVACIONES
	6.ASPECTO ELÉCTRICO							
6.1	Los terminales, cables , tomas ,interruptores, tacos , cajas y acometidas se encuentran buen estado	✓						
6.2	Los tomacorrientes están identificados según voltaje.	✓						
6.3	El tablero de circuitos eléctricos tiene tapa.	✓						
6.4	El tablero de circuitos eléctricos y tomacorrientes se encuentran despejadas y señalizadas.	✓						
6.5	Existe polo a tierra en máquinas y equipos.	✓						
6.6	Los equipos eléctricos y/o tomacorrientes están expuestos a proyecciones de agua.	✓						
6.7	Se realiza inspección y mantenimiento a los cables e instalaciones eléctricas. Fecha de último mantenimiento.	✓						
6.8	En oficinas los equipos eléctricos de cómputo cuentan con supresores de pico y/o estabilizadores de corriente antes de su conexión a toma corrientes.	✓						
6.9	Los cables se encuentran entubados o en canaleta.	✓						
	7. Instalaciones eléctricas temporales							
7.1	Cables vulcanizados en buenas condiciones	✓						
7.2	Se realizan empalmes sólo mediante enchufes y tomacorrientes.	✓						
7.3	Los cables y conexiones no pasan por zonas expuestas a bordes afilados, impactos, aprisionamientos, rozamiento mecánico.		✓					
7.4	Los cables y conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor.		✓					
7.5	Los cables no tienen contacto con agua, en caso de ser así, los cables y conexiones cuentan con aislamiento a prueba de agua.		✓					
7.6	Los cables y conexiones no pasan por vías de circulación, caso contrario están protegidos o enterrados.		✓					
	8. ASPECTO MECANICO							
8.1	Las maquinas y equipos se encuentran en buen estado	✓						
8.2	Las maquinas y equipos se encuentran limpias y libres de materiales innecesarios	✓						
8.3	Las herramientas utilizadas se encuentran en buen estado.	✓						
8.4	Existe y se implementa Programa de mantenimiento a las maquinas , equipos y herramientas	✓						
	9. ASPECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL							
9.1	Existe # adecuado de baños con relacion al sexo y # de Trabajadores	✓						
9.2	Las condiciones de las instalaciones sanitarias son adecuadas	✓						
9.3	La clasificacion y recoleccion de la basura es adecuada.	✓						
9.4	Se utiliza recipientes para basura con tapa y bolsa plástica	✓						
9.5	El servicio sanitario posee la dotacion adecuada (dispensador de jabon , papel etc)	✓						
9.6	Se tiene asignado un sitio para el almacenamiento de basura	✓						

CONVENCIONES:
S:SI, N:NO NA: no aplica
A: Grado de Acción Inmediata
B : Grado de Acción Pronta
C: Grado de Acción Posterior

INSPECCIONADO POR: LAURA BRAVO	REVISADO POR: VERONICA CADAVID
Firma: XIMENA BRAVO	Firma:
Nombre: LAURA XIMENA BRAVO	Nombre: VERONICA CADAVID U
Cargo: INSP SST	Cargo: COORD. SST

10.371

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

CONTROL DE EQUIPOS

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

10.375

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONTROL DIARIO MAQUINARIA

CONTRATO OBRA No:	106 DE 2023	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO INTERVENTORIA No:	249 DE 2023	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	CONTRATANTE:	IDERMETA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERESCENARIOS	PERIODO:	1-oct-23 AL 31/10/2023

OCTUBRE

MAQUINARIA	REF	DIAS																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HERRAMIENTA MENOR			L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L
RETROEXCAVADORA			L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L
ESTACION TOPOGRAFIA			L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L
BENITIN			L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L
RANA MECANICA			L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L		L	L

OBSERVACIONES:

SE VERIFICAN FICHAS TECNICAS Y PREOPERACIONALES DE EQUIPO Y MAQUINARIA UTILIZADOS

CONVENCIONES	
L	LABORO
NL	NO LABORO
V	VARADA
M	MANTENIMIENTO
S	SALIDA OBRA

ELABORO: ARQ. ANDRES HERNANDEZ
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

REVISO: ING LEONEL ROA
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10.376

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

10.377

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONTROL DE LLUVIAS

CONTRATO OBRA No:	106 DE 2023	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO INTERVENTORIA No:	249 DE 2023	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	CONTRATANTE:	IDERMETA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERESCENARIOS	PERIODO:	1-oct-23 AL 31/10/2023

HORAS	OCTUBRE DIAS																															TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
06:00 AM - 07:00 AM																																
07:00 AM - 08:00 AM		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	LL	S	LL	S		S	LL	S	S	S	S		LL	S	
08:00 AM - 09:00 AM		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	LL	S	LL	LL		S	LL	S	S	S	S		S	S	
09:00 AM - 10:00 AM		LL	S	S	S	S	S		S	S	LL	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	LL	LL	S	S	S		S	S	
10:00 AM - 11:00 AM		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	LL	LL	S	S	S		S	S	
11:00 AM - 12:00 M		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	LL	LL	S	S	S		S	S	
12:00 M - 01:00 PM		S	S	LL	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	LL	LL	S	S	S		S	S	
01:00 PM - 02:00 PM		S	S	LL	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	LL	S	S	S		S	S	
02:00 PM - 03:00 PM		S	S	S	S	S	S		LL	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	
03:00 PM - 04:00 PM		S	S	S	S	S	S		LL	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	LL	S		S	LL	
04:00 PM : 05:00 PM		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	LL	S		S	LL	
05:00 PM - 06:00 PM																																
06:00 PM - 07:00 PM																																
TOTAL HR. LLUVIA		1,0		2,0					2,0		1,0							2,0		2,0	1,0			5,0	4,0		2,0			1,0	2,0	25,0
HR. PERDIDAS TRABAJO																																0,0

OBSERVACIONES: PREDOMINA EL CLIMA SOLEADO EN EL PERIODO DE TIEMPO

CONVENCIONES	
LL	LLUVIA
S	SOL
N	NUBLADO

ELABORO: ARQ ANDRES HERNANDEZ B
CARGO: RESIDENTE INTERVENTORIA

REVISO: ING LEONEL ROA
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10.378

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD ACTA DE REUNIÓN	Código: FR-GCA-04 Vigencia: 24/11/2020 Versión: 2 Página 1 de 4

ACTA DE COMITE	**FECHA:**	**HORA:**	
	06/10/2023	Inicio: 2:30 PM	Fin:
	LUGAR:	SALA DE JUNTAS – Instituto de Deporte y Recreación del Meta IDERMETA	
RESPONSABLES:	BIBIANA PAN MERCHAN – JEFE DE PLANEACIÓN		

OBJETIVO O PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

SEXTO COMITÉ DE OBRA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META", CT 106 DE 2023

AGENDA / ORDEN DEL DÍA


COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA – SOLICITUD PARA TEMAS CON AJUSTE GEOMETRÍA PISTA DE PATINAJE

DESARROLLO

Se da inicio al comité solicitado por la interventoria con el fin de tratar el tema de la implantación y necesidad de ajuste de la pista de patinaje, da inicio la Dra. Jenny Osorio de interventoría informando que, al hacer la implantación de la pista de patinaje, se encontró que la pista de patinaje quedaba muy cerca con un lindero o construcción realizado en fase 1 y esto ocasionaba la interrupción del urbanismo, interviene el Ing. Yeison Gómez, Director de obra y explica que en efecto, al implantarse con los planos entregados por la consultoría la graderia de la cancha auxiliar el muro de contención proyectado para la pista quedaría a 96 cm de la esquina del pedestal , siendo un paso peatonal mínimo y la caída de agua de.la cubierta queda a 26 cm de la pista lo que ocasionaria una escorrentía de agua superficial hacia la pista. Por otra parte, explica el Ing. de obra, que el edificio de IDERMETA quedaría con relaciona al muro de contención proyectado para la pista as 1.20 m de la esquina del edificio dejando un espacio de circulación mínimo entre la graderia y la edificación.

Por el sector colindante con el lindero con el parqueadero publico el muro de contención de la pista queda a 39 cm de la línea de paramento con el parqueadero existente , interrumpiendo la circulación peatonal en este sector, adicionalmente en el sector donde se plantean los futuros parqueaderos para IDERMETA el muro planteado en pista se sobrepone o interfiere con la circulación peatonal todo lo anterior genera la necesidad de un ajuste a la geometria de la pista lo cual ya fue verificado por interventoría y se estaría en cumplimiento de las normas de FEDEPATÍN, que son:

- mínimo 400 metros de longitud
- que los radios de las curvas sean mayores a 18 metros
- que, de los 400 metros lineales, 240 deben ser tramos rectos. Se muestra diapositiva con comparativo de geometria entregada por entidad vs la planteada

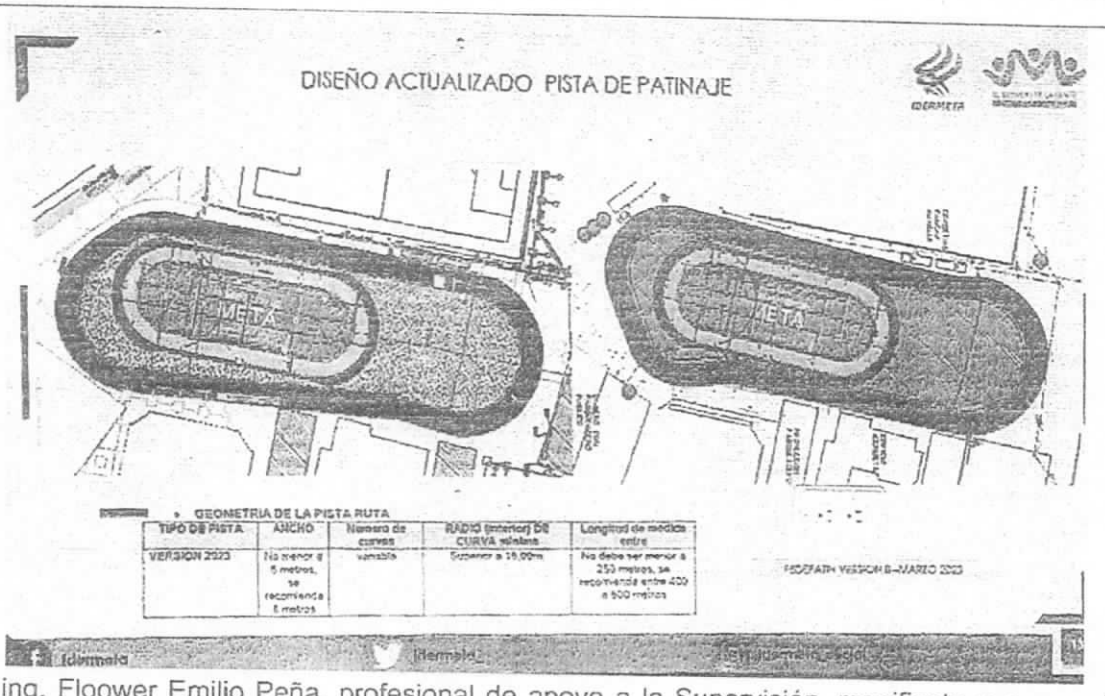

El ing. Floower Emilio Peña, profesional de apoyo a la Supervisión, manifiesta que para la supervisión es muy importante, establecer que lo más importante es que los diseños cumplan con los requerimientos de FEDEPATIN, que el escenario sea completamente funcional y que sea de total uso de los deportistas, motivo por el cual vamos a incluir a la liga de patinaje para la realización de la consulta de los cambios.

Adicionalmente el ing. Floower Emilio Peña indica que, según la interventoría, el plano de implantación entregado por el IDERMETA de la pista de patinaje, no tuvo en cuenta los linderos del predio del parqueadero, por lo anterior según revisión de obra e interventoría la pista no cabría en los espacios actuales. el ingeniero Floower Emilio peña, llama la atención en la demora en la entrega de ese diagnóstico, dado a que ya han pasado 5 meses del proyecto, el contratista de obra y la interventoría indican que solo se evidencio esto después de realizar el levantamiento total de fase 1 y 2, ya qué nunca fue entregado el plano record con coordenadas de amarre y las coordenadas entregadas de manera informal no coincidían con lo encontrado en obra por tanto se debió realizar el levantamiento total de todo lo encontrado en el predio con un RTK con 2 puntos nuevos y posteriormente la implantación del proyecto a ejecutar .

Se hace un llamado al interventor a tomar medidas diligentes, teniendo en cuenta que a la fecha según programación aprobada por la interventoría ya se deberían comenzar actividades de obra para la pista de patinaje. se solicita al interventor allegar un documento con los diseños y las consideraciones de la geometría de la pista para realizar una solicitud de concepto a FEDEPATIN.

El interventor manifiesta en cabeza de la Dra. Jenny Osorio que ya se realizó por parte de interventoría la respuesta al contratista al OFICIO CEDVO-091-2023. Asunto: observaciones de replanteo de pista de ruta de patinaje; OF-C249 -2023-153, al cual el contratista entrego

propuesta una nueva geometria la cual se trae hoy a comité para su pertinente conocimiento, revisión y demás

La presente interventoría realizo la revisión según la normativa de FEDEPATIN para escenarios de patinaje 2023 versión 8 – marzo 2023, tomando en cuenta el numeral 2. Pista de ruta (the road) de 400 metros estableciendo que los parámetros establecidos en la tabla de nombre geometría de pista de ruta se cumplen, quedando pendiente que se eleve la consulta a FEDEPATIN por parte de IDERMETA para que verifique la nueva geometría. La interventoría informa que ya radico a la entidad el oficio con la consulta y la propuesta para la pista de patinaje, por tanto, solicita a la entidad realizara consulta a FEDEPATIN.

Para concluir patinaje la interventoria se permite recordar que no está incluida la revisión y certificación planimetría como tampoco la certificación del escenario dentro de los ítems contractuales y qué es un escenario que está clasificado en el MGA como alto rendimiento no competencia.

En cuanto al proyecto de coliseos multipropósito, la obra e interventoría indican la necesidad de realizar un traslado de un tramo de la red hidráulica, con el objetivo de no intervenir el proyecto de fase 1 de la villa olímpica (parqueadero). el ing. Floower Emilio peña y la Dra. Bibiana indican que todo lo dicho debe ser soportado y argumentado. (los diseños no se pueden cambiar ni modificar si no existen razones técnicas, jurídicas y administrativas totalmente argumentadas), la interventoría indica que el soporte técnico es no intervenir las obras realizadas en la fase 1 que aún tienen estabilidad y calidad además de independizar las fases. La interventoria indica que se está esperando la documentación de IDERMETA para poder radicar en la solicitud de cambio de punto de conexión de las redes a EAAV.

En relación con el proyecto de pista de atletismo, la obra e interventoría indican la necesidad de realizar un traslado de la red de riego perimetrales al interior de la cancha de fútbol. la Dra. Bibiana y el Ing. Floower Emilio peña, indican que es importante no realizar daños a las actividades realizadas en el contrato de obra 351 de 2019, el contratista de obra dice que según la información dada por el Ing. César Casanova de fase 1 estas obras no fueron ejecutadas en el proyecto de fase Nº 1. El Cárcamo que está se debe mover 70 cm hacia el interior de la cancha igual que el sistema eléctrico de las válvulas obras que tienen estabilidad, por tanto, requieren autorización se evidencian la existencia de unas cajas dentro de la pista de atletismo no hay manera de reubicarlas tendrían que sellarse y por tanto debería tener tapas reforzadas.

El ing. Floower Emilio Peña, manifiesta su preocupación de la no definición del acabado de la pista de atletismo, el ing. Supervisión indica las causas negativas que esto le acarrea al proyecto de igual forma reitera que nunca ha estado de acuerdo con cambios al acabado final de la pista, recalca la necesidad de cumplir con la programación de obra, con el objetivo de dar cumplimiento al alcance, costo y tiempo. Se le recuerda por parte de interventoría al IDERMETA, que con el cambio del acabado de la pista de atletismo que había un sistema híbrido, ya que hay una parte en situ y otra es prefabricada, lo que se detallaría en el plano

definitivo todo lo anterior generaría la necesidad de hacer una actualización planimetria en la curaduría Segunda.

compromisos:

- La entidad realizara consulta a FEDEPATIN, con relación a la pertinencia de la nueva geometría el día lunes 9 de octubre de 2023.
- La Dra. Bibiana indica que se debe programar comité de avance para dentro de ocho días
- Se le recuerda a la entidad que está pendiente una respuesta a EAAV, sobre entrega redes fase 1 por parte de Ing. Floower
- Se le solicita a la entidad por parte de obra la entrega de los documentos pendientes para finalizar la radicación tramite de disponibilidad y revisión de planos EAAV.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA
N.A	N.A	N.A
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
SE ANEXA HOJA DE ASISTENCIA		

Adjunto registro de asistencia presencial.

Elaboró: Martha Bibiana Pan Merchán - Jefe Oficina Asesora de Planeación IDERMETA
Revisó: Martha Bibiana Pan Merchán - Jefe Oficina Asesora de Planeación IDERMETA

10.382

IDERMETA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO GESTIÓN DE ESTRATEGICA
CONTROL DE ASISTENCIA

Código: FR-GES-FO-115
Vigencia: 31/01/2023
Versión: 02
Página 1 de 1

REUNIÓN/ACTIVIDAD:	Reunión Diseños Pista Patinaje	HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Sala de juntas IDERMETA	FECHA:	Octubre 6/2023
NOMBRE RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	Bibiana Pan Sepulveda.		

No.	Municipio	Nombres y apellidos	Comunidad / Dirección	Teléfono o móvil de Contacto	Correo electrónico / email	Número de Documento de identidad	Grupos etarios						Genero			Enfoque diferencial								Firma
							0-5	6-11	12-17	18-26	27-59	60 o más	Hombre	Mujer	LGBTIQ	Mujer gestante	Victima	Discapacitado	Afro	Indigena	Pobreza extrema	Rom o gitano	Otro	
1	Villavicencio	Jenny Osorio	Interventoria	3114926196	interescenarios@gmail.com	40186696					✓			✓										
2	Villavicencio	Hector Gómez	Interventoria	3204752661	interescenarios@gmail.com	1.119.292.863					✓			✓										
3	Villavicencio	Andres Hernandez	Interventoria	3127892856	interescenarios@gmail.com	80038630					✓			✓										
4	Villavicencio	Jhon Henry Ortiz Garcia	Consorcio Escenarios	3102453562	Consorcioescenarios2023@gmail.com	9721840118					X			✓										
5	Villavicencio	Eloaver Emilio Ieza	IDERMETA	3168660330	rewo1F842@gmail.com	86.082.462					X													
6	Villavicencio	Bibiana Pan	IDERMETA	3138081957	Planeacion@idermeta.gov	40187179					X			X										
7	Villavicencio	Bertullo Rojas Quintero	IDERMETA	3134531902	bertullo.rojas@gmail.com	7.245.506					✓			X										
8	Vicio	FABIAN ALBERTO SANABRIA MOJ	IDERMETA	3006972959	IDMTICA@IDERMETA.GOV.CO	80024161					X			X										
9																								
10																								

El IDERMETA, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, se compromete a dar el adecuado tratamiento, disposición y reserva de la información consignada en el presente documento, en cumplimiento a la protección de datos y seguridad de la información.

10.383

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

COPIAS AFILIACION Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-39
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 - 2023	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA:	JUAN ANTONIO BARBOSA MAYORGA
NIT:	17118296
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 - 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS

NUMERO DE PLANILLA:	9457878513				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		1 de octubre de 2023		a		31 de octubre de 2023			
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS LABORALES		I.C.B.F.	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL A PAGAR
					EPS	Valor	Pensión	Valor	ARL	Valor				
WILCHES PABLO	TOPOGRAFO	1.121.864.458	$ 1.160.000	30	SANITAS	$ 46.400	PROTECCION	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
FLOREZ YEISON	CADENERO	1.124.825.890	$ 1.160.000	30	SALUD TORAL	$ 145.000	COLFONDOS	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ 34.800	$ 23.200	$ 46.400	$ 515.800
Total														$ 875.000

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia _____

Firma:
Nombre: JHON HENRRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202090820CND

Firma:
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 2520279953CND

Firma:
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 175215-T

10.385

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17118296		BARBOSA MAYORGA JUAN ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 17 No. 37 D 19	VILLAVICENCIO-META	6631715	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	234449144	9457878513	E	2023/11/24	2023/10/23	BANCOLOMBIA	0	$1,593,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$284,200			$4,640,000	$185,600			$4,640,000		$323,200		$1,160,000	$58,000		$1,593,400
Centro de Trabajo: FUERA DE OBRA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$191,400			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$1,160,000	$58,000		$875,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$191,400			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$1,160,000	$58,000		$875,000
1	CC	1124825890	FLOREZ YEISON	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
2	CC	1121894458	WILCHES PABLO	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
3	CC	80220968	OSUNA ANDRES	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	1006773720	YASQUEZ CESAR	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total		**Afiliados(4)**				$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$284,200			$4,640,000	$185,600			$4,640,000		$323,200		$1,160,000	$58,000		$1,593,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17118296		BARBOSA MAYORGA JUAN ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 17 No. 37 D 19	VILLAVICENCIO-META	6631715	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	234449144	9457878513	E	2023/11/24	2023/10/23	BANCOLOMBIA	0	$1,593,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$742,400	$0	$0	$742,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$323,200	$0	$0	$323,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$323,200	$0	$0	$323,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$185,600	$0	$0	$185,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$284,200	$0	$0	$284,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$0	$0	$34,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
TOTAL				4	$1,593,400	$0	$0	$1,593,400

2023/10/23 02:49 PM

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-39
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 - 2023	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA:	FCC IN BLAU SAS
NIT:	901.504.060
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 - 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS

NUMERO DE PLANILLA:	66394093				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de septiembre de 2023			a	30 de septiembre de 2023		
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Días Cotizados	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS LABORALES		I.C.B.F.	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL A PAGAR
					EPS	Valor	Pensión	Valor	ARL	Valor				
JENNY CAROLINA GIRALDO MARIN	INSPECTOR SST	1121884190	$ 1.650.000	30	COMPENSAR	$ 66.000	PROTECCION	$ 264.000	SURA	$ 114.900	$ -	$ -	$ 66.000	$ 510.900
YERSON FABIAN MORENO ACHURY	AYUDANTE	1006532891	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
DIEGO FERNANDO ENCISO	AYUDANTE	1121821140	$ 1.160.000	30	SALUD TOTAL	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
BRAYAN ALBERTO ORTIZ	AYUDANTE	1121894212	$ 1.160.000	30	COMPENSAR	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
CESAR ORLANDO CAÑON JIMENEZ	COORDINADOR OBRA	73126939	$ 1.160.000	30	COMPENSAR	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
ARLEY ARTURO GUERRA	OFICIAL	479034	$ 1.160.000	30	COMPENSAR	$ 46.400	COLPENSIONES	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
LIBANIEL GONZALEZ MARTINEZ	OFICIAL	17334205	$ 1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
GERMAIN FEIJOO MONTOYA	HERRERO	4403939	$ 1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 46.400	PROTECCION	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
MIGUEL ANGEL NARVAEZ	HERRERO	1005650371	$ 1.160.000	8	FAMISANAR	$ 12.400	PORVENIR	$ 49.500	SURA	$ 21.600	$ -	$ -	$ 12.400	$ 95.900
DERFY GUACARAPE MANFARA	AYUDANTE	1007495295	$ 1.160.000	30	SALUD TOTAL	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
JOHN FREDY VELANDIA	HERRERO	86047229	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
JUAN DAVID MARTINEZ	HERRERO	1006855970	$ 1.160.000	30	CAJACOPI	$ 46.400	COLFONDOS	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
GERMAN PEREIRA FERREIRA	AYUDANTE	73557184	$ 1.160.000	30	SANITAS	$ 46.400	COLFONDOS	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
WILMER ANDRES JARABA MORA	HERRERO	1014016963	$ 1.160.000	30	SANITAS	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
OMAR IVAN PEREZ HENAO	OFICIAL	1121706061	$ 1.160.000	30	SALUD TOTAL	$ 46.400	COLPENSIONES	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
JOSE FERNANDO PEREZ TRIANA	AYUDANTE	1116203742	$ 1.160.000	30	CAJACOPI	$ 46.400	COLPENSIONES	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
JOAN SEBASTIAN TARAZONA FLOREZ	AYUDANTE	1120353213	$ 1.160.000	27	NUEVA EPS	$ 41.800	PORVENIR	$ 167.100	SURA	$ 72.700	$ -	$ -	$ 41.800	$ 323.400
WILSON TRIANA CAVIELES	AYUDANTE	86005035	$ 1.160.000	27	FAMISANAR	$ 41.800	PORVENIR	$ 167.100	SURA	$ 72.700	$ -	$ -	$ 41.800	$ 323.400
WILSON EDGARDO RAMIREZ FUQUENE	AYUDANTE	79693185	$ 1.160.000	27	FAMISANAR	$ 41.800	PORVENIR	$ 167.100	SURA	$ 72.700	$ -	$ -	$ 41.800	$ 323.400

Pagado: 13/10/2023 | Empresa NI901504060 FCC IN BLAU SAS | Planilla Nro: 66394093 | Periodo Cotización: septiembre de 2023 | Periodo Servicio: octubre de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TDA	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1120353213	JOHN SEBASTIAN TARAZONA FLOREZ	01	00	X																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.044.000	$ 167.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.044.000	$ 41.800	6,960	$ 1.044.000	$ 2.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.044.000	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.400
CC 1121706081	OMAR IVAN PEREZ HENAO	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 10.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 1121821140	DIEGO FERNANDO ENCISO TORRES	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 10.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 1121884190	JENNY CAROLINA GIRALDO MARIN	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.650.000	$ 66.000	6,960	$ 1.650.000	$ 15.900	(CCF34) COFREM	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900
CC 1121894212	BRYAN ALBERTO ORTIZ LOPANO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 10.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 12631791	ROQUE SEGUNDO ZARATE VILLAMIL	01	00	X																	0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 232.000	$ 37.200	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 1.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 16697205	JHON JAIRO CARABALI LOPEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 10.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 17334205	LIBANIEL GONZALEZ MARTINEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 10.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 18281159	VICTOR MANUEL URBANO	01	00	X	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$2.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 4403939	GERMAN FEIJOO MONTOYA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 10.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 479034	ARLEY ARTURO GUERRA RAMIREZ	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 10.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 5883546	JOSE ANCIZAR ARCHILA	01	05	X																	0	0	26	26	26	(NINAF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.005.334	$ 40.300	6,960	$ 1.005.334	$ 13.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.600
CC 72204017	WILFRIDO ANTONIO CERVANTES CUESTAS	01	00											X							0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 928.000	$ 111.400	(EPS010) EPS SURA	$ 928.000	$ 0	0,000	$ 928.000	$ 0	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 928.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.400
CC 72204017	WILFRIDO ANTONIO CERVANTES CUESTAS	01	00																		0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 232.000	$ 37.200	(EPS010) EPS SURA	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 1.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 73126939	CESAR ORLANDO CAÑON JIMENEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 10.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 73168240	JUAN CARLOS CAÑON LOPEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 10.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 73557184	GERMAN PEREIRA FERREIRA	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 10.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 79259918	OMAR ELQUIN MORENO NAVARRO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 10.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 79444874	HENRY ANTONIO NIVIA SANCHEZ	01	00	X																	0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 232.000	$ 37.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 1.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 79616478	ALBER DARIO GONZALEZ GONZALEZ	01	00	X																	0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 232.000	$ 37.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 1.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 79693185	WILSON EDGARDO RAMIREZ FUGUENE	01	00	X																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.044.000	$ 167.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.044.000	$ 41.800	6,960	$ 1.044.000	$ 2.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.044.000	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.400
CC 79747344	MAURICIO ALEJANDRO CAÑON LOPEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 10.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 86005036	WILSON TRIANA CAVIELES	01	00	X	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.044.000	$ 167.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.044.000	$ 41.800	6,960	$ 1.044.000	$ 2.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.044.000	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.400
CC 86047229	JOHN FREDY VELANDIA ALVAREZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 10.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 32.881.337	$ 33.888.671	$ 33.888.671	$ 33.888.671	$ 5.225.200	$ 1.319.200	$ 2.296.300	$ 1.319.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.159.900	$ 42.800	$ 10.202.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 21 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

10389

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-14, 07:46:26 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66394093

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 13/10/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FCC IN BLAU SAS		
Documento	NI901504060	**Dirección**	CL 18CAL SUR #57 - 25
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3008024477
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CANON LOPEZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 73168240
Total Afiliados	42	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003661758	JHONATAN SEBASTIAN CASTRO CASTRO	01	00	X																0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 696.000	$ 111.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 696.000	$ 27.900	6,960	$ 696.000	$ 48.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1006550371	MIGUEL ANGEL NARVAEZ CHAMORRO	01	00		X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	6,960	$ 309.334	$ 21.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1006532891	YERSON FABIAN MORENO ACHURY	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1006855970	JUAN DAVID MARTINEZ ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1007351877	OSCAR YESID GALINDO ROBERTO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1007495295	DERFY GUACARAPARE MANFARA	01	00		X															6	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 1010205710	JOSE LUIS OCAMPO RODRIGUEZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 10123468	JOSE HECTOR MONTOYA MANJARRES	01	00	X																0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 425.334	$ 68.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 425.334	$ 17.100	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 1016055612	CRISTIAN LIBARDO GOMEZ REDONDO	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 232.000	$ 37.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 16.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1022944486	LUIS CARLOS FARFAN AVENDAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 1031174527	JOAN SEBASTIAN PAEZ RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 1052739624	LEWIS MONTERO BALVIN	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 309.334	$ 12.400	6,960	$ 309.334	$ 21.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1065576250	MELQUISIDED BALCAZAR VERDECIA	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 154.667	$ 6.200	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 1065542991	JOSE LUIS LOQUEÑAS PEREZ	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 232.000	$ 37.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 16.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1065806949	OSCAR EDUARDO HINOJOSA DURAN	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1066859376	KEYNER JESSITH PIÑEREZ SORACA	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 232.000	$ 37.200	(EPSIC1) DUSAKAWI EPS	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 16.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1067726285	YURAINYS PAOLA CHIMA GALICIA	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900
CC 1104016963	WILMER ANDRES JARABA MORA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 1116203742	JOSE FERNANDO PEREZ TRIANA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

10390

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-39
PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 - 2023					PROYECTO N°		BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094									
JOSE HECTOR MONTOYA MANJARRES	OFICIAL	10123468	$	1.160.000	11	NUEVA EPS	$ 17.100	COLFONDOS	$ 68.100	SURA	$ 29.700	$ -	$ -	$ 17.100	$	132.000
LEWIS MONTERO BALVIN	AYUDANTE	1052739524	$	1.160.000	8	MUTUAL SER	$ 12.400	PORVENIR	$ 49.500	SURA	$ 21.600	$ -	$ -	$ 12.400	$	95.900
															$	6.833.700

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día _____

Firma:
Nombre: JHONHENRRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202090820CND

Firma:
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 2520279953CND

Firma:
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 175215-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901682871	2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	ESTADIO BELLO HORIZONTE	VILLAVICENCIO-META	3108042477	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	223080306	9457636115	E	2023/10/18	2023/10/17	BANCOLOMBIA	0	$13,273,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1032423197	ARIAS BOTELLO ZUNEILE PAOLA																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$48,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1121930422	BARRAGAN BETANCOURT RAMIRO ANDRES	X																		230201	30	$2,521,009	$403,400	EPS037	30	$2,521,009	$100,900	CCF34	30	$2,521,009	$108,900	14-11	30	$2,521,009	$175,500	30	$0	$0	SI	$780,700
3	CC	1121929501	BRAYO AMAYA LAURA XIMENA	X								X										230301	30	$1,273,914	$203,900	EPS005	30	$1,273,914	$51,000	CCF34	30	$1,273,914	$51,000	14-11	30	$1,273,914	$88,700	30	$0	$0	SI	$394,600
4	CC	1121887775	CABARCA LIZCA VERONICA STEFANIA																			230301	30	$1,890,756	$302,600	EPS002	30	$1,890,756	$75,700	CCF34	30	$1,890,756	$75,700	14-11	30	$1,890,756	$131,600	30	$0	$0	SI	$585,600
5	CC	1121844675	CAICEDO CASTAÑO CARLOS ANDRES																			230301	30	$1,890,756	$302,600	EPS037	30	$1,890,756	$75,700	CCF34	30	$1,890,756	$75,700	14-11	30	$1,890,756	$131,600	30	$0	$0	SI	$585,600
6	CC	1123160526	CASTILLO SANCHEZ JHON NEYDER									X										230201	30	$1,490,723	$238,600	EPS041	30	$1,490,723	$59,700	CCF34	30	$1,490,723	$59,700	14-11	30	$1,490,723	$103,800	30	$0	$0	SI	$461,800
7	CC	1122815443	CONTRERAS PEÑA THERLY YANINY																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$48,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	17265332	CRUZ CASTILLO JOSE ANGEL	X								X										230301	18	$733,021	$117,300	EPS002	18	$733,021	$29,400	CCF34	18	$733,021	$29,400	14-11	18	$733,021	$51,100	18	$0	$0	SI	$227,200
9	CC	39804588	FARFAN ACUÑA ADRIANA PAOLA																			230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$48,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
10	CC	86072014	FERNANDEZ GUERRERO CARLOS JAVIER	X								X										230301	18	$751,532	$120,300	EPS005	18	$751,532	$30,100	CCF34	18	$751,532	$30,100	14-11	18	$751,532	$52,400	18	$0	$0	SI	$232,900
11	CC	1121959006	FUENTES CARRILLO CAMILO ANDRES																			25-14	30	$1,890,756	$302,600	EPS005	30	$1,890,756	$75,700	CCF34	30	$1,890,756	$75,700	14-11	30	$1,890,756	$131,600	30	$0	$0	SI	$585,600
12	CC	14839553	GARCIA CLAVIJO JAVIER LEONARDO		X																	230301	17	$657,334	$105,200	EPS005	17	$657,334	$26,300	CCF34	17	$657,334	$28,300	14-11	17	$657,334	$45,800	17	$0	$0	SI	$203,600
13	CC	1121833213	GIRALDO GONZALEZ CRISTINA	X																		230301	30	$2,521,009	$403,400	EPS002	30	$2,521,009	$100,900	CCF34	30	$2,521,009	$108,900	14-11	30	$2,521,009	$175,500	30	$0	$0	SI	$780,700
14	CC	1121836660	GIRALDO CARREÑO VICTOR HUGO									X										230301	30	$1,490,723	$238,600	CCFC55	30	$1,490,723	$59,700	CCF34	30	$1,490,723	$59,700	14-11	30	$1,490,723	$103,800	30	$0	$0	SI	$461,800
15	CC	79349455	GOMEZ RIOS OLIVERIO																			231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$48,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
16	CC	86051263	GOMEZ GUERRERO YEISON ESNEYDER																			230301	30	$5,042,017	$857,400	EPS005	30	$5,042,017	$201,700	CCF34	30	$5,042,017	$351,000	14-11	30	$5,042,017	$351,000	30	$0	$0	SI	$1,611,800
17	PT	6917526	GRATEROL GUTIERREZ BRAYAN ENRRIQUE	X	X																	25-14	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
18	CC	1020839935	GUTIERREZ CRUZ MIGUEL ANGEL	X																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$48,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
19	CC	1121951112	HERNANDEZ CAMPOS BRAYAN STEVEN	X	X																	230301	2	$77,334	$12,400	EPSC34	2	$77,334	$3,100	CCF34	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0	SI	$24,000
20	CC	1121913852	HUMOA ACEVEDO CARLOS ALBERTO																			230301	30	$1,890,756	$302,600	EPS002	30	$1,890,756	$75,700	CCF34	30	$1,890,756	$75,700	14-11	30	$1,890,756	$131,600	30	$0	$0	SI	$585,600
21	CC	2762914	MORANTE ASPRILLA VICTOR MANUEL									X										230201	30	$1,752,340	$280,400	EPS002	30	$1,752,340	$70,100	CCF34	30	$1,752,340	$70,100	14-11	30	$1,752,340	$122,000	30	$0	$0	SI	$542,600
22	CC	1121840118	ORTIZ GARCIA JHON HENRY																			230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF34	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
23	CC	17266958	PEÑA HERRERA EDINSON CARLOS JAIR									X										230301	30	$1,178,511	$188,600	EPS005	30	$1,178,511	$47,200	CCF34	30	$1,178,511	$47,200	14-11	30	$1,178,511	$82,100	30	$0	$0	SI	$365,100
24	CC	1137974624	PUPO MENDOZA ISAAC JOSE	X																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$48,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
25	PT	4873060	RAMOS ROMERO JONATHAN JAVIER	X								X										25-14	12	$488,681	$78,200	EPS041	12	$488,681	$19,600	CCF34	12	$488,681	$19,600	14-11	12	$488,681	$34,100	12	$0	$0	SI	$151,500
26	PT	5374170	RAMOS ROMERO YORDANO ALBERTO									X										25-14	30	$1,503,064	$240,500	EPS041	30	$1,503,064	$60,200	CCF34	30	$1,503,064	$60,200	14-11	30	$1,503,064	$104,700	30	$0	$0	SI	$465,600
27	CC	79849620	SARMIENTO SABOGAL LUIS FERNANDO																			25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$48,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
28	CC	1193090239	SUTA AGUILAR JUAN JOSE	X								X										230301	11	$468,890	$75,100	EPS002	11	$468,890	$18,800	CCF34	11	$468,890	$18,800	14-11	11	$468,890	$32,700	11	$0	$0	SI	$145,400

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

10393

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901682871	2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	ESTADIO BELLO HORIZONTE	VILLAVICENCIO-META	3108042477	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	223080306	9457636115	E	2023/10/18	2023/10/17	BANCOLOMBIA	0	$13,273,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$6,882,800	$0	$0	$6,882,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,017,300	$0	$0	$1,017,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$3,826,300	$0	$0	$3,826,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,853,600	$0	$0	$1,853,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,973,000	$0	$0	$2,973,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$2,973,000	$0	$0	$2,973,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,708,800	$0	$0	$1,708,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	$1,708,800	$0	$0	$1,708,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	$1,708,800	$0	$0	$1,708,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$59,700	$0	$0	$59,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$3,100	$0	$0	$3,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$149,100	$0	$0	$149,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$176,600	$0	$0	$176,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$139,500	$0	$0	$139,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$563,200	$0	$0	$563,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$571,200	$0	$0	$571,200
TOTAL				29	$13,273,400	$0	$0	$13,273,400

2023/10/17 10:46 AM

10.544

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-39
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 - 2023	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA:	CAMILO ANDRES CASTAÑEDA GOMEZ
NIT:	1.019.008.320
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 - 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS

NUMERO DE PLANILLA:	1058226316				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de septiembre de 2023			a	30 de septiembre de 2023				
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Días Cotizados	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS LABORALES		I.C.B.F.	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL A PAGAR
					EPS	Valor	Pensión	Valor	ARL	Valor				
CAMILO ANDRES CASTAÑEDA GOMEZ	OPERADOR	1019008320	$ 1.160.000	30	SALUD TOTAL	$ 145.000	PORVENIR	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ -	$ 411.400
Total														$ 411.400

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

OBSERVACIONES GENERALES
Se genera un valor adicional por mora de $2,700 lo cual es la diferencia del valor total del pago en la planilla.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día _____

Firma:
Nombre: JHON HENRRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202090820CND

Firma:
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 2520279953CND

Firma:
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 175215-T

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-39
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 - 2023	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA:	ESTRUCTURAS TECNICAS LIMITADA
NIT:	900.067.574
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 - 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS

NUMERO DE PLANILLA:	71548795				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		1 de septiembre de 2023		a		30 de septiembre de 2023			
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Días Cotizados	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS LABORALES		I.C.B.F.	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL A PAGAR
					EPS	Valor	Pensión	Valor	ARL	Valor				
EDILSON FERNEY CHIVATA SALAZAR	OPERADOR	1121848218	$ 1.160.000	30	SANITAS	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	POSITIVA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
Total														$ 359.200

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día _____

Firma:
Nombre: JHON HENRRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 252020900820CND

Firma:
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 2520279953CND

Firma:
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 175215-T

10.396

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-11, 04:45:22 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1058226316

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 11/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAMILO ANDRES CASTAÑEDA GOMEZ		
Documento	CC1019008320	**Dirección**	CL 36B #16 - 01
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6656565
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRS	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1019008320	CAMILO ANDRES CASTAÑEDA GOMEZ	57	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6.960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 2.700	$ 414.100

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

10.397

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067574	9	ESTRUCTURAS TECHICAS LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRR 35 #34-39	VILLAVICENCIO-META	2533409	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	60770682	94574#9254	E	2023/10/18	2023/10/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,693,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Hombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)							$15,157,334	$2,425,200			$15,157,334	$606,400			$15,157,334	$606,400			$15,157,334		$1,055,800		$0	$0		$4,693,800
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,436,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,436,800
1	CC	1013606215	VEGA OCAMPO ERIKA KATHERINE		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1001298109	VELASCO GUZMAN GABRIELA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	79131779	VELASCO CHAVES ILDEFONSO		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	1016013121	YELASCO REYES JONATHAN ALEXANDER		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Centro de Trabajo: MAQUINARIA (10 Afiliados)							$9,357,334	$1,497,200			$9,357,334	$374,400			$9,357,334	$374,400			$9,357,334		$651,800		$0	$0		$2,897,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (10 Afiliados)							$9,357,334	$1,497,200			$9,357,334	$374,400			$9,357,334	$374,400			$9,357,334		$651,800		$0	$0		$2,897,800
5	CC	1121839798	BARBOSA BARBOSA JOHN JAIRO		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	1121848218	CHIVATA SALAZAR EDILSON FERNEY		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	1122121203	CORREA JHON FREDY	X	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
8	CC	17268186	IZQUIERDO ROJAS CARLOS ANDRES		25-14	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC	1130643251	OBANDO REYTA RICARDO		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
10	CC	79941362	OLAYA ARIAS OMAR		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
11	CC	86063044	REY MARTINEZ JULIO CESAR		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
12	CC	86068604	ROMERO GOMEZ BERNEY		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
13	CC	1121956438	TORRES BOTERO BRAYAN SEBASTIAN	X	23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
14	CC	1121825518	VILLEGAS MIRANDA FABIAN DAVID		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Centro de Trabajo: UNIPALMA (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
15	CC	1121890967	REYES YARON JENNY ESMERALDA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(15)							$15,157,334	$2,425,200			$15,157,334	$606,400			$15,157,334	$606,400			$15,157,334		$1,055,800		$0	$0		$4,693,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067574	9	ESTRUCTURAS TECNICAS LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRR 35 #34-39	VILLAVICENCIO-META	2533409	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	60770682	9457449254	E	2023/10/18	2023/10/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,693,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$2,425,200	$0	$0	$2,425,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$191,800	$0	$0	$191,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,305,400	$0	$0	$1,305,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$742,400	$0	$0	$742,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,055,800	$0	$0	$1,055,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$1,055,800	$0	$0	$1,055,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$606,400	$0	$0	$606,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	15	$606,400	$0	$0	$606,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$606,400	$0	$0	$606,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$139,200	$0	$0	$139,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$96,000	$0	$0	$96,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$232,000	$0	$0	$232,000
TOTAL				15	$4,693,800	$0	$0	$4,693,800

10.399

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-39
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 - 2023	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA:	CONSUESMAR SAS
NIT:	830508211-0
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 - 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS

NUMERO DE PLANILLA:	72155735				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		1 de octubre de 2023		a		31 de octubre de 2023			
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Días Cotizados	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS LABORALES		I.C.B.F.	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL A PAGAR
					EPS	Valor	Pensión	Valor	ARL	Valor				
ELVER EDUARDO ORTIZ BUITRAGO	OPERADOR	1051210770	$ 1.160.000	30	CAJACOPI	$ 46.400	COLFONDOS	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
Total														$ 359.200

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

OBSERVACIONES GENERALES
Se genera un valor adicional por mora de $2,100 lo cual es la diferencia del valor total del pago en la planilla.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia _____

Firma:
Nombre: JHON HENRRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 252020900820CND

Firma:
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 2520279953CND

Firma:
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 175215-T

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 – 6701465
:contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

10.400

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830508211-0	CONSUESMAR SAS	CL 2 B # 32 B 28	3108153554	ingmalog@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	02/11/2023	72155735	$359.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	80.800				80.800	0	0	80.800			808	80.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	46.400	0	0	46.400	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.400
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	80.800	80.800
CCF	1	46.400	46.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	359.200	359.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

10401

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830508211-0	CONSUESMAR SAS		CL 2 B # 32 B 28	3108153554	ingmalog@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	02/11/2023	72155735	$359.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegio	Trabajo	Extranjero	Cotiza exterior	Error	PMO	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1051210770	ORTIZ BUITRAGO ELVER EDUARDO	1	0			S																	231001	1,160,000	185,600	0	0	0	0	CCFC55	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	89,800	CCF34	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SARMIENTO SABOGAL LUIS FERNANDO	RESIDENTE DE O[illegible]	79849620	$ [illegible]0.000	30	SALUD TOTAL	$ 46.400	[illegible]ENSIONES	$ 185.600	[illegible]RA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
SUTA AGUILAR JUAN JOSE	RESIDENTE	1193090239	$ 468.890	11	SALUD TOTAL	$ 18.800	PORVENIR	$ 75.1[illegible]	[illegible]SURA	$ 32.700	$ -	$ -	$ 18.800	$ 145.400
JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	SUPERNUMERARIO	1121817035	$ 1.406.809	30	COMPENSAR	$ 56.300	PORVENIR	$ 225.100	SURA	$ 98.000	$ -	$ -	$ 56.300	$ 435.700
Total														**$ 13.273.400**

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día _____

Firma:
Nombre: JHON HENRRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202090820CND

Firma:
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 2520279953CND

Firma:
Nombre: EDWIN ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 175215-T

10.403

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL ME	Código: GES-FO-39
PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 - 2023	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
NIT:	901682871 - 2
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 - 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS

NUMERO DE PLANILLA:	9457636115				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de septiembre de 2023					a	30 de septiembre de 2023			
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS LABORALES		I.C.B.F.	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL A PAGAR
					EPS	Valor	Pensión	Valor	ARL	Valor				
ARIAS BOTELLO ZUNEILE PAOLA	SST	1032423397	$ 1.160.000	30	SANITAS	$ 46.400	PROTECCION	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
BARRAGAN BETANCOURT RAMIRO ANDRES	CONTADOR	1121930422	$ 2.521.009	30	NUEVA EPS	$ 100.900	PROTECCION	$ 403.400	SURA	$ 175.500	$ -	$ -	$ 100.900	$ 780.700
BRAVO AMAYA LAURA XIMENA	AUX SST	1121939501	$ 1.273.914	30	SANITAS	$ 51.000	PROTECCION	$ 203.900	SURA	$ 88.700	$ -	$ -	$ 51.000	$ 394.600
CABARCA LIZCA VERONICA STEFANIA	SST	1121887775	$ 1.890.756	30	SALUD TOTAL	$ 75.700	PORVENIR	$ 302.600	SURA	$ 131.600	$ -	$ -	$ 75.700	$ 585.600
CAICEDO CASTAÑO CARLOS ANDRES	RESIDENTE	1121844675	$ 1.890.756	30	NUEVA EPS	$ 75.700	PORVENIR	$ 302.600	SURA	$ 131.600	$ -	$ -	$ 75.700	$ 585.600
CASTILLO SANCHEZ JHON NEYDER	AYUDANTE	1123160526	$ 1.490.723	30	NUEVA EPS	$ 59.700	PROTECCION	$ 238.600	SURA	$ 103.800	$ -	$ -	$ 59.700	$ 461.800
CONTRERAS PEÑA THERLY YANINY	AMBIENTAL	1122815443	$ 1.160.000	30	SANITAS	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
CRUZ CASTILLO JOSE ANGEL	AYUDANTE	17265332	$ 733.021	18	SALUD TOTAL	$ 29.400	PORVENIR	$ 117.300	SURA	$ 51.100	$ -	$ -	$ 29.400	$ 227.200
FARFAN ACUÑA ADRIANA PAOLA	DIBUJANTE	39804588	$ 1.160.000	30	COMPENSAR	$ 46.400	PROTECCION	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
FERNANDEZ GUERRERO CARLOS JAVIER	AYUDANTE	86072014	$ 1.160.000	18	SANITAS	$ 30.100	PORVENIR	$ 120.300	SURA	$ 52.400	$ -	$ -	$ 30.100	$ 232.900
FUENTES CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE	1121959006	$ 1.890.756	30	SANITAS	$ 75.700	COLPENSIONES	$ 302.600	SURA	$ 131.600	$ -	$ -	$ 75.700	$ 585.600
GARCIA CLAVIJO JAVIER LEONARDO	CONDUCTOR	14839553	$ 1.160.000	17	SANITAS	$ 26.300	PORVENIR	$ 105.200	SURA	$ 45.800	$ -	$ -	$ 26.300	$ 203.600
GIRALDO GONZALEZ CRISTINA	RESIDENTE	1121833213	$ 2.521.009	30	SALUD TOTAL	$ 100.900	PORVENIR	$ 403.400	SURA	$ 175.500	$ -	$ -	$ 100.900	$ 780.700
GIRALDO CARREÑO VICTOR HUGO	AYUDANTE	1121836660	$ 1.520.340	30	CAJACOPI	$ 59.700	PORVENIR	$ 238.600	SURA	$ 103.800	$ -	$ -	$ 59.700	$ 461.800
GOMEZ RIOS OLIVERIO	GERENTE DE OBRA	79349455	$ 1.160.000	30	COMPENSAR	$ 46.400	COLFONDOS	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
GOMEZ GUERRERO YEISON ESNEYDER	DIRECTOR DE OBRA	86051263	$ 5.042.017	30	SANITAS	$ 201.700	PORVENIR	$ 857.400	SURA	$ 351.000	$ -	$ -	$ 201.700	$ 1.611.800
GRATEROL GUTIERREZ BRAYAN ENRRIQUE	AYUDANTE	6917526	$ 154.667	4	SALUD TOTAL	$ 6.200	COLPENSIONES	$ 24.800	SURA	$ 10.800	$ -	$ -	$ 6.200	$ 48.000
GUTIERREZ CRUZ MIGUEL ANGEL	AUX CONTABLE	1020839935	$ 1.160.000	30	FAMISANAR	$ 46.400	PROTECCION	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
HERNANDEZ CAMPOS BRAYAN STEVEN	AYUDANTE	1121951112	$ 77.334	2	CAPITAL SALUD	$ 3.100	PORVENIR	$ 12.400	SURA	$ 5.400	$ -	$ -	$ 3.100	$ 24.000
HUMOA ACEVEDO CARLOS ALBERTO	RESIDENTE	1121913852	$ 1.890.756	30	SALUD TOTAL	$ 75.700	PORVENIR	$ 302.600	SURA	$ 131.600	$ -	$ -	$ 75.700	$ 585.600
MORANTE ASPRILLA VICTOR MANUEL	SUPERNUMERARIO	2762914	$ 1.752.340	30	SALUD TOTAL	$ 70.100	PROTECCION	$ 280.400	SURA	$ 122.000	$ -	$ -	$ 70.100	$ 542.600
ORTIZ GARCIA JHON HENRY	REPRESENTANTE LEGAL	1121840118	$ 3.500.000	30	SALUD TOTAL	$ 140.000	PROTECCION	$ 560.000	SURA	$ 243.600	$ -	$ -	$ 140.000	$ 1.083.600
PEÑA HERRERAEDINSON CARLOSJAIR	ALMACENIST	17266958	$ 1.178.511	30	SANITAS	$ 47.200	PORVENIR	$ 188.600	SURA	$ 82.100	$ -	$ -	$ 47.200	$ 365.100
PUPO MENDOZA ISAAC JOSE	AUX DE INGENIERIA	1137974624	$ 1.160.000	30	SANITAS	$ 46.400	COLPENSIONES	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
RAMOS ROMERO JONATHAN JAVIER	AYUDANTE	4873060	$ 488.671	12	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 19.600	COLPENSIONES	$ 78.200	SURA	$ 34.100	$ -	$ -	$ 19.600	$ 151.500
RAMOS ROMERO YORDANO ALBERTO	AYUDANTE	5374170	$ 1.503.064	30	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 60.200	COLPENSIONES	$ 240.500	SURA	$ 104.700	$ -	$ -	$ 60.200	$ 465.600

10.404

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-33
PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
ACTA DE REALACIÓN DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 - 2023	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO META
OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
CONTRATISTA	JONATHAN MALAVER NEIRA
NIT	1122122473
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 - 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de octubre de 2023	a	31 de octubre de 2023				AFILIACIÓN								Ingreso Base de Cotización
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	EPS	%	PENSIÓN	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
JONATHAN MALAVER NEIRA	TOPOGRAFO	1.122.122.473	CONTRATISTA	6/09/2023		$ 1.160.000	SANITAS	12,50%	PORVENIR	16%	POSITIVA	$ 6,96	0	0%	$ 1.160.000
HERNANDO OLIMPO ESCALANTE LOPEZ	CADENERO	1.121.822.297	CONTRATISTA	5/09/2023		$ 1.550.000	CAPITAL SALUD	12,50%	PROTECCION	16%	SURA	$ 6,96	COFREM	4%	$ 1.550.000

Nota 1: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos, incluso los trabajadores independientes.
Nota 2: Se Anexa a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el

Firma:
Nombre: JHON HENRRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: [illegible] BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: YEISON SNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 252020908 20CND

Firma:
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 252027995 3CND

Firma:
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 176215-T

OBSERVACIONES:

10.405

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-33
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REALACIÓN DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA	Versión: 02

CONTRATO Nº	106 - 2023	PROYECTO Nº	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO META
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
CONTRATISTA:	RAUL ALBERTO VELASCO AVILA
NIT:	79783556
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº	249 - 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de octubre de 2023	a	31 de octubre de 2023				AFILIACIÓN								
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	EPS	%	PENSIÓN	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	Ingreso Base de Cotización
RAUL ALBERTO VELASCO AVILA	TOPOGRAFO	79.783.556	CONTRATISTA	25/09/2023		$ 1.520.000	SANITAS	12,5%	COLPENSIONES	16%	POSITIVA	6.96%	0	0%	$ 1.520.000
OSCAR IVAN MENDEZ LOZANO	CADENERO	1.122.650.304	CONTRATISTA	25/09/2023		$ 1.160.000	CAJACOPI	4%	COLPENSIONES	16%	SURA	6.96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
ANGEL OCTAVIO SANABRIA SARMIENTO	CADENERO	1.121.824.582	CONTRATISTA	25/09/2023		$ 1.160.000	SALUD TOTAL	4%	COLPENSIONES	16%	SURA	6.96%	COFREM	4%	$ 1.160.000

Nota 1: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.
Nota 2: Se Anexa a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el

Firma:
Nombre: JHON HENRRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nº Matricula Profesional: 25202769520ND

Firma:
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRIGAN BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA
Nº Matricula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: YEISON ESNYDER GOMEZ SUESCUN
DIRECTOR DE OBRA
Nº Matricula Profesional: 25202090820CND

Firma
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORIA
Nº Matricula Profesional: 175215

OBSERVACIONES:

10.406

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-33
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REALACIÓN DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA	Versión: 02

CONTRATO Nº	196 - 2023	PROYECTO Nº	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO PISTA DEPATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO META
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
CONTRATISTA:	TOPOGRAFIA JUAN BARBOSA
NIT:	17118296
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	249 - 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de octubre de 2023	a	31 de octubre de 2023				AFILIACIÓN								Ingreso Base de Cotización
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	EPS	%	PENSIÓN	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
PABLO JOSE WILCHES CRUZ	TOPOGRAFO	1.121.894.458	CONTRATISTA	9/08/2023		$ 1.160.000	SANITAS	4.00%	PROTECCION	16%	SURA	6.96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
YEISON ANDRES FLOREZ CRUZ	CADENERO	1.124.825.890	CONTRATISTA	2/09/2023		$ 1.160.000	SALUD TOTAL	4.00%	COLFONDOS	16%	SURA	6.96%	COFREM	4%	$ 1.160.000

Nota 1: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos, incluso los trabajadores independientes.
Nota 2: Se Anexa a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el

Firma:
Nombre: JHONNEIDER V ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA
Nº Matricula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
Nº Matricula Profesional: 252C090820CND

Firma:
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nº Matricula Profesional: 252027995CND

Firma:
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORIA
Nº Matricula Profesional: 175215-T

OBSERVACIONES:

10.407

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-33
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE REALACIÓN DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 - 2023	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO META.
OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA	WILSON CARDENAS
NIT	17343650
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 - 2023
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERESCENARIOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de octubre de 2023	a	31 de octubre de 2023				AFILIACIÓN								
Nombres y Apellidos	Cargo yo oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	EPS	%	PENSIÓN	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	Ingreso Base de Cotización
JEISON CARDENAS	AYUDANTE	1.121.934.582	CONTRATISTA	15/09/2023		1.160.000	MEDIMAS	4.00%	PORVENIR	16%	SURA	$ 6.96	COFREM	4%	1.160.000

Nota 1: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.
Nota 2: Se Anexa a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el

Firma:
Nombre: JHON HENRRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202799ICND

Firma:
Nombre: ADRIANO ANDRES BARRADAN BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 252020920820CND

Firma:
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 179215-T

OBSERVACIONES:

10.468

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-33
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 - 2023	PROYECTO N°	BPIN 202100550024 - BPIN 202300550022 - BPIN 202300550094

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO META
OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
NIT	901682071 - 2
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	249 - 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCENARIOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE	1 de octubre de 2023	a	31 de octubre de 2023

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACION								Ingreso Base de Cotización
							EPS	%	PENSIÓN	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	79.749.820	DIRECTO	10/05/2023		$ 1.150.000	SALUD TOTAL	4,00%	COLPENSIONES	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.150.000
OLIVERIO GOMEZ RIOS	GERENTE DE OBRA	79.149.465	DIRECTO	10/05/2023		$ 1.160.000	COMPENSAR	4,00%	COLFONDOS	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
ZURIBLE PAOLA ARIAS BOTELLO	SST	1.032.423.397	DIRECTO	10/05/2023		$ 1.160.000	SANITAS	4,00%	PROTECCION	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
ADRIANA PAOLA FARFAN ACUÑA	PAISAJISTA	39.604.555	DIRECTO	10/05/2023		$ 1.160.000	COMPENSAR	4,00%	PROTECCION	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	86.061.263	DIRECTO	10/05/2023		$ 5.042.017	SANITAS	4,00%	PORVENIR	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 5.042.017
CARLOS ANDRES CACEDO CASTAÑO	RESIDENTE DE OBRA	1.121.844.675	DIRECTO	10/05/2023		$ 1.890.756	NUEVA EPS	4,00%	PORVENIR	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.890.756
VERONICA STEFANIA CEBALLOS LECA	COORDINADOR SST	1.121.867.775	DIRECTO	10/05/2023		$ 1.890.756	SALUD TOTAL	4,00%	PORVENIR	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.890.756
VICTOR MANUEL MORANTES ASPRILA	NOCTURNO	2.762.914	DIRECTO	24/05/2023		$ 1.160.000	SALUD TOTAL	4,00%	PROTECCION	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	1.121.913.662	DIRECTO	1/06/2023		$ 1.890.756	SANITAS	4,00%	PORVENIR	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.890.756
THERLY YAMINY CONTRERAS PEÑA	AMBIENTAL	1.122.515.443	DIRECTO	9/06/2023		$ 1.160.000	SANITAS	4,00%	PORVENIR	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	1.121.817.035	DIRECTO	20/06/2023	24/10/2023	$ 1.160.000	COMPENSAR	4,00%	PORVENIR	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
CAMILO ANDRES FUENTES CARRILLO	RESIDENTE DE OBRA	1.121.959.008	DIRECTO	11/07/2023		$ 1.890.756	COMPENSAR	4,00%	COLPENSIONES	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.890.756
VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	1.121.335.669	DIRECTO	14/07/2023		$ 1.160.000	SANITAS	4,00%	PORVENIR	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	$ 324.170	DIRECTO	14/07/2023		$ 1.160.000	CAJACOPI	4,00%	COLPENSIONES	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
EDILSON CARLOS JAIR PEÑA HERRERA	ALMACENISTA	17.203.955	DIRECTO	4/09/2023		$ 1.160.000	SANITAS	4,00%	PORVENIR	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
JHON NEYDER CASTILLO SANCHEZ	AYUDANTE	1.123.140.526	DIRECTO	10/06/2023		$ 1.160.000	NUEVA EPS	4,00%	PROTECCION	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
LAURA XIMENA BRAVO AMAYA	AUXILIAR SST	1.121.939.561	DIRECTO	1/09/2023		$ 1.260.504	SANITAS	4,00%	PORVENIR	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.260.504
ISAAC JOSE PUPO MENDOZA	AUXILIAR	1.137.974.624	DIRECTO	1/09/2023		$ 1.160.000	SANITAS	4,00%	COLPENSIONES	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
RAMIRO ANDRES BARRAGAN	CONTADOR	1.121.930.422	DIRECTO	1/09/2023		$ 2.521.009	NUEVA EPS	4,00%	PROTECCION	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 2.521.009
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CRUZ	AUX CONTABLE	1.020.839.915	DIRECTO	1/09/2023		$ 1.160.000	FAMISANAR	4,00%	PROTECCION	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
CRISTINA GIRALDO GONZALEZ	BIG RESIDENTE	1.121.813.213	DIRECTO	1/09/2023		$ 2.521.009	SALUD TOTAL	4,00%	PORVENIR	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 2.521.009
JOSE ANGEL CRUZ CASTILLO	AYUDANTE	17.265.337	DIRECTO	12/09/2023		$ 1.160.000	SALUD TOTAL	4,00%	PORVENIR	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
CARLOS JAVIER FERNANDEZ GUERRERO	AYUDANTE	86.072.014	DIRECTO	12/09/2023		$ 1.160.000	SANITAS	4,00%	PORVENIR	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
JONATHAN RAMOS ROMERO	AYUDANTE	4873.066	DIRECTO	19/09/2023		$ 1.160.000	NUEVA EPS	4,00%	COLPENSIONES	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
JUAN JOSE SUTA AGUILAR	INSPECTOR	1.191.090.239	DIRECTO	20/09/2023		$ 1.260.504	SALUD TOTAL	4,00%	PORVENIR	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.260.504
EDILSON FERNEY CHIVATA SALAZAR	OPERADOR	1.121.844.218	SUBCONTRATO	1/09/2023		$ 1.160.000	SANITAS	4,00%	PORVENIR	16%	POSITIVA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
ELVER EDUARDO ORTIZ	OPERADOR	1.051.210.770	SUBCONTRATO	11/09/2023		$ 1.160.000	CAJACOPI	4,00%	COLFONDOS	16%	SURA	6,96%	COFREM	4%	$ 1.160.000
NICOLAS RODRIGUEZ RESTREPO	OPERADOR	1.006.794.719	SUBCONTRATO	6/10/2023	12/10/2023	$ 1.160.000	SANITAS	12,5%	PORVENIR	16%	POSITIVA	6,96%	0	0%	$ 1.160.000
PAUL DIMATE TORRES	OPERADOR	80.500.121	SUBCONTRATO	21/10/2023		$ 1.160.000	SALUD TOTAL	12,5%	PORVENIR	0%	POSITIVA	6,96%	0	0%	$ 1.160.000

Nota 1: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos, incluso los trabajadores independientes.
Nota 2: Se Anexa a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinon en ella, el

Firma
Nombre: JHON FREDY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional 252027953-CND

Firma
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matricula Profesional 278207 - T

Firma
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional 253020000820 CND

Firma
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional 335210-T

OBSERVACIONES:

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-39
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	Versión: 02

10.409

CONTRATO N°	106 - 2023	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA:	JONATHAN MALAVER NEIRA
NIT:	1122122473
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 - 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS

NUMERO DE PLANILLA:	27965942				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		1 de septiembre de 2023		a		30 de septiembre de 2023			
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS LABORALES		I.C.B.F.	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL A PAGAR
					EPS	Valor	Pensión	Valor	ARL	Valor				
JONATHAN MALAVER NEIRA	TOPOGRAFO	1.122.122.473	$ 1.160.000	30	SANITAS	$ 145.000	PORVENIR	$ 185.600	POSITIVA	$ 80.800	$ -	$ -	$ -	$ 411.400
Total														$ 411.400

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día _____

Firma:
Nombre: JHON HENRRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202090820CND

Firma:
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 2520279953CND

Firma:
Nombre: YAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 175215-T

10.410

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1122122473	0	JONATHAN MALAVER NEIRA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
25-290	CLL 6 A N 39 62		3153163401			TOPOZENITH@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27965942	I	2023-10-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	411.400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27965942	2023-10-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 1122122473	MALAVER NEIRA JONATHAN	1.160.000																	0		30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0.06960	0	0	0	0	57	0	411.400	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1122122473	0	JONATHAN MALAVER NEIRA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
25-290	CLL 6 A N 39 62		3153163401			TOPOZENITH@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27965942	I	2023-10-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	411.400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27965942		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	80.800	0	0	0	80.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	80.800	0	0	0	80.800
Gran Total					411.400	0	0	0	411.400

10.411

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNBDL	FNBUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonto de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 1122122473	MALAVER NEIRA JONATHAN	1.160.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,069600	0	0	0	0	0	57	6	411.400	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1122122473	0	JONATHAN MALAVER NEIRA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
25-290	CLL 6 A N 39 62		3153163401			TOPOZENITH@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27965942	I	2023-10-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	411.400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27965942		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	80.800	0	0	0	80.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	80.800	0	0	0	80.800
Gran Total					411.400	0	0	0	411.400

10.412

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-39
PROCESO DE GESTIÓN ESTRATEGICA	Vigencia: 31/01/2023
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 - 2023	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA:	JONATHAN MALAVER NEIRA
NIT:	1122122473
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 - 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS

NUMERO DE PLANILLA:	57966156				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		1 de septiembre de 2023		a		30 de septiembre de 2023			
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Días Cotizados	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS LABORALES		I.C.B.F.	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL A PAGAR
					EPS	Valor	Pensión	Valor	ARL	Valor				
ESCALANTE LOPEZ HERNANDO OLIMPO	CADENERO	1.121.822.297	$ 1.343.334	26	CAPITAL SALUD	$ 168.000	PROTECCIÓN	$ 215.000	SURA	$ 93.500	$ 40.400,00	$ 26.900,00	$ 53.800	$ 597.600
Total														$ 597.600

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día _____

Firma:
Nombre: JHON HENRRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202090820CND

Firma:
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 2520279953CND

Firma:
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 175215-T

10.413

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1122122473	0	JONATHAN MALAVER NEIRA	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
25-290	CLL 6 A N 39 62		3153163401			TOPOZENITH@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27966156	E	2023-10-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	597.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27966156	2023-10-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS#	AFP#	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot	Sub Tipo Cot.			
1	CC 1121822297	ESCALANTE LOPEZ HERNANDO OLIMPO	1.550.000	F	X															0			28	26	26	26	PROTECCION-230201	1.343.334	215.000	0		EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.343.334	168.000	COFREM-CCF34	1.343.334	53.800	1.343.334	93.500	0.06960	1.343.334	26.900	40.400	0	0	01	0	597.600	N	5429901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1122122473	0	JONATHAN MALAVER NEIRA	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
25-290	CLL 6 A N 39 62		3153163401			TOPOZENITH@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27966156	E	2023-10-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	597.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27966156		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.343.334	1.343.334	1.343.334	1.343.334	1.343.334

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	215.000	0	0	0	215.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	215.000	0	0	0	215.000
EPS(Administradoras: 1)				1	168.000	0	0	0	168.000
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	168.000	0	0	0	168.000
ARP(Administradoras: 1)				1	93.500	0	0	0	93.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	93.500	0	0	0	93.500
CCF(Administradoras: 1)				1	53.800	0	0	0	53.800
COFREM	CCF34	892000146	3	1	53.800	0	0	0	53.800
SENA(Administradoras: 1)				1	26.900	0	0	0	26.900
SENA	PASENA	899999034	1	1	26.900	0	0	0	26.900
ICBF(Administradoras: 1)				1	40.400	0	0	0	40.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	40.400	0	0	0	40.400
Gran Total					597.600	0	0	0	597.600

10414

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-39
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 - 2023	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
CONTRATISTA:	RAUL ALBERTO VELASCO AVILA
NIT:	79783558
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 - 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS

NUMERO DE PLANILLA:	9457595370				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de septiembre de 2023			a	30 de septiembre de 2023		
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS LABORALES		I.C.B.F.	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL A PAGAR
					EPS	Valor	Pensión	Valor	ARL	Valor				
OSCAR IVAN MENDEZ LOZANO	CADENERO	1.122.650.304	$ 386.667	10	CAJACOPI	$ 15.500	COLPENSIONES	$ 61.900	SURA	$ 27.000	$ -	$ -	$ 15.500	$ 119.900
ANGEL OCTAVIO SANABRIA SARMIENTO	CADENERO	1.121.824.582	$ 386.667	10	SALUD TOTAL	$ 15.500	COLPENSIONES	$ 61.900	SURA	$ 27.000	$ -	$ -	$ 15.500	$ 119.900
Total														$ 239.800

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día _____

Firma:
Nombre: JHON HENRRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2520209O820CND

Firma:
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 2520279953CND

Firma:
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 175215-T

10.415

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79783558		VELASCO AVILA RAUL ALBERTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RAUL VELASCO	VILLA OLIMPICA	VILLAVICENCIO-META	3138571664	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	223464357	9457595370	E	2023/10/13	2023/10/17	BANCOLOMBIA	4	$890,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RAUL VELASCO (4 Afiliados)																							$2,861,334	$458,000			$2,861,334	$114,600			$2,861,334	$114,600			$2,861,334		$199,400		$0	$0		$886,600
Centro de Trabajo: ESCENARIOS DEPORTIVOS (2 Afiliados)																							$773,334	$123,800			$773,334	$31,000			$773,334	$31,000			$773,334		$54,000		$0	$0		$239,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$773,334	$123,800			$773,334	$31,000			$773,334	$31,000			$773,334		$54,000		$0	$0		$239,800
1	CC	1122650304	MENDEZ LOZANO OSCAR IVAN	X																	25-14	10	$386,667	$61,900	CCFC55	10	$386,667	$15,500	CCF34	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
2	CC	1121824582	SANABRIA SARMIENTO ANGEL OCTAVIO	X																	25-14	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF34	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
Centro de Trabajo: ESPACIOS DEPORTIVOS (2 Afiliados)																							$2,088,000	$334,200			$2,088,000	$83,600			$2,088,000	$83,600			$2,088,000		$145,400		$0	$0		$646,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$2,088,000	$334,200			$2,088,000	$83,600			$2,088,000	$83,600			$2,088,000		$145,400		$0	$0		$646,800
3	CC	19001565	COBOS MONTALVO ANGELMIRO	X																	23020 1	27	$1,044,000	$167,100	EPS005	27	$1,044,000	$41,800	CCF34	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	6.960%	$72,700	27	$0	$0	Si	$323,400
4	CC	1121713123	PEREZ BAHOZ EDINSON	X																	23030 1	27	$1,044,000	$167,100	CCFC55	27	$1,044,000	$41,800	CCF34	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	6.960%	$72,700	27	$0	$0	Si	$323,400
Total Afiliados(4)																							$2,861,334	$458,000			$2,861,334	$114,600			$2,861,334	$114,600			$2,861,334		$199,400		$0	$0		$886,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79783558		VELASCO AVILA RAUL ALBERTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RAUL VELASCO	VILLA OLIMPICA	VILLAVICENCIO-META	3138571664	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	223464357	9457595370	E	2023/10/13	2023/10/17	BANCOLOMBIA	4	$890,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$458,000	$2,000	$0	$460,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$123,800	$600	$0	$124,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$167,100	$700	$0	$167,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$167,100	$700	$0	$167,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$199,400	$900	$0	$200,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$199,400	$900	$0	$200,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$114,600	$500	$0	$115,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$114,600	$500	$0	$115,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$114,600	$600	$0	$115,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$57,300	$300	$0	$57,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$15,500	$100	$0	$15,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$41,800	$200	$0	$42,000
TOTAL				4	$886,600	$4,000	$0	$890,600

2023/10/17 11:59 AM

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-39
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 - 2023	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
CONTRATISTA:	RAUL ALBERTO VELASCO AVILA
NIT:	79783558
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 - 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS

NUMERO DE PLANILLA:	27890188				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		1 de septiembre de2023		a		30 de septiembre de 2023			
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Días Cotizados	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS LABORALES		I.C.B.F.	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL A PAGAR
					EPS	Valor	Pensión	Valor	ARL	Valor				
RAUL ALBERTO VELASCO AVILA	TOPOGRAFO	79.783.558	$ 1.520.000	30	SANITAS	$ 190.000	COLPENSIONES	$ 243.200	POSITIVA	$ 105.800	$ -	$ -	$ -	$ 539.000
				Total										$ 539.000

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día _____

Firma:
Nombre: JHON HENRRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 252020900820CND

Firma:
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 2520279953CND

Firma:
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 175215-T

10.417

RE. EN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79783558	0	RAUL ALBERTO VELASCO AVILA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CL 42 A N 16 B 32 ESTE		3138571664			RAUL.VELASCO.ING@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27890188	I	2023-10-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	539.000	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27890188	2023-10-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot	Sub Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 79783558	VELASCO AVILA RAUL ALBERTO	1.160.000										X							0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.520.000	243.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.520.000	190.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.520.000	105.800	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	539.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79783558	0	RAUL ALBERTO VELASCO AVILA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CL 42 A N 16 B 32 ESTE		3138571664			RAUL.VELASCO.ING@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27890188	I	2023-10-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	539.000	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27890188		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.520.000	1.520.000	1.520.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	243.200	0	0	0	243.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	243.200	0	0	0	243.200
EPS(Administradoras: 1)				1	190.000	0	0	0	190.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	190.000	0	0	0	190.000
ARP(Administradoras: 1)				1	105.800	0	0	0	105.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	105.800	0	0	0	105.800
Gran Total					539.000	0	0	0	539.000

10.418

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79783558	VELASCO AVILA RAUL ALBERTO	1.160.000										X							0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.520.000	243.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.520.000	190.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.520.000	105.800	0,00960	0	0	0	0	0	57	0	539.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79783558	0	RAUL ALBERTO VELASCO AVILA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CLL 42 A N 16 B 32 ESTE		3138571664			RAUL.VELASCOLING@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27890188	I	2023-10-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	539.000	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27890188		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.520.000	1.520.000	1.520.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	243.200	0	0	0	243.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	243.200	0	0	0	243.200
EPS(Administradoras: 1)				1	190.000	0	0	0	190.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	190.000	0	0	0	190.000
ARP(Administradoras: 1)				1	105.800	0	0	0	105.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	105.800	0	0	0	105.800
Gran Total					539.000	0	0	0	539.000

10.419

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-39
PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	Versión: 02

CONTRATO Nº	106 - 2023	PROYECTO Nº	BPIN 2022005500024 - BPIN 2022005500022 - BPIN 2022005500094

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETICA EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA:	WILSON CARDENAS
NIT:	17343650
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 - 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS

NUMERO DE PLANILLA:	9457602720				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de septiembre de 2023					a	30 de septiembre de 2023		
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Días Cotizados	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS LABORALES		I.C.B.F.	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL A PAGAR
					EPS	Valor	Pensión	Valor	ARL	Valor				
CARDENAS HERNANDEZ JEISON FABIAN	AYUDANTE	1121934582	$ 1.160.000	30	SANITAS	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	SURA	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
					Total									$ 359.200

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día _____

Firma:
Nombre: JHON HENRRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202090820CND

Firma:
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 2520279953CND

Firma:
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 278207 - T

Firma:
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 175215-T

aportes en línea

Planilla Resumen

10.420

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17343650		CARDENAS SABOGAL WILSON ERIBERTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VILLA OLIMPICA	cra 43 21 43	VILLAVICENCIO-META	6660954	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	222842003	9457602720	E	2023/10/12	2023/10/17	BANCOLOMBIA	5	$722,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO VILLA OLIMPICA (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
1	CC	17323749	CALENTURA PARDO PEDRO PABLO		X																230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1121934582	CARDENAS HERNANDEZ JEISON FABIAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(2)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17343650		CARDENAS SABOGAL WILSON ERIBERTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VILLA OLIMPICA	cra 43 21 43	VILLAVICENCIO-META	6660954	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	222842003	9457602720	E	2023/10/12	2023/10/17	BANCOLOMBIA	5	$722,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$371,200	$2,000	$0	$373,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,000	$0	$186,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$1,000	$0	$186,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$161,600	$900	$0	$162,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$161,600	$900	$0	$162,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$500	$0	$93,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$92,800	$500	$0	$93,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800	$600	$0	$93,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTAL				2	$718,400	$4,000	$0	$722,400

2023/10/17 11:02 AM

10.421

COPIAS ENSAYOS DE LABORATORIO

10.422

NHSQ SAS INGENIERIA HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE Nit: 901047361-5	**CONSECUTIVO:** DEN-001-734-23 **PAGINAS:** 1 DE 5	

DENSIDAD UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E-161-13

Este documento es propiedad de NHSQ INGENIERÍA S.A.S. y no debe ser modificado, copiado o difundido por ningún medio a persona alguna no autorizada sin el permiso o aprobación del propietario. El solicitante o usuario será responsable por cualquier uso indebido. Este documento no es válido sin la firma y sello en original.

DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	FECHA DE ENTREGA:
META	VILLAVICENCIO	14/OCTUBRE/2023

SOLICITANTE:	PROYECTO:
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023 NIT: 901682871-2	CONSTRUCCIÒN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

ELABORÓ:	REVISÓ	APROBÓ:
ING. KAREN YESENIA FAJARDO B. Analista de Ingenieria	**ING. HAIVER DAVID OLIVO M.** Coord. de ingenieria y laboratorio	**ING. NESTOR HERNÁN SUAREZ Q.** Esp. en Geotecnia Vial y Pavimentos Esp. en Patologia de la Construcción M.P. 25202-158140 CND

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**

NHSQ SAS INGENIERIA NIt: 901047361-5	LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE		
	RESULTADOS DE DENSIDADES		
	CONSTRUCCIÒN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.		
	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO:	CONSECUTIVO:
	31/07/2023	IF-LAB-016-V7	DEN-001-734-23
ESTE DOCUMENTO ES VALIDO CON LA FIRMA Y SELLO EN ORIGINAL DE NHSQ INGENIERÍA S.A.S			

Villavicencio, 14 de octubre de 2023

Señores:
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
NIT: 901682871-2
Ciudad.

Ref. CONSTRUCCIÒN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.
Tema: Resultados prueba de compactación de Relleno

Cordial saludo,

Atendiendo su solicitud, damos a conocer los resultados obtenidos en el terreno con el fin de hallar el grado de compactación de la capa de relleno tomadas en el presente año. A continuación, se anexan cinco (05) densidades (MG-8* a MG-12*).

Este documento consta de cinco (05) páginas y no debe reproducirse sin la aprobación por escrito del laboratorio, los resultados contenidos en él se relacionan únicamente las densidades tomadas en el sitio descrito en cada formato.

Espero que todas las labores realizadas por este laboratorio sean de su entera satisfacción, cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Recuerde que usted es lo más importante para nuestra empresa.

Atentamente.

Ing. NÉSTOR HERNÁN SUAREZ Q.
Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos
Especialista en Patología de la Construcción
Gerente NHSQ INGENIERIA S.A.S

Anexo 1. Resultados de laboratorio

10425

NHSQ INGENIERIA
NIT: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 161	01/JULIO/2023	F-LAB-012-V7

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.				
DIRIGIDO A:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	**NIT:**	901682871-2	**O.T./MUESTRA Nº**	DEN-003-731-W1325-23
CONTACTO:	ING. YEISON GOMEZ	**EMAIL:**	escenariosdeportivos2023@gmail.com	**FECHA DE EMISIÓN:**	3/10/2023
TIPO DE MATERIAL:	MATERIAL GRANULAR			**MUNICIPIO:**	VILLAVICENCIO
FUENTE DE MATERIAL:	RIO GUATIQUIA			**DEPARTAMENTO:**	META

SITIO DE TOMA	NÚMERO DE ENSAYO		MG-8*	MG-9*	--	--	--	--	--
	LOCALIZACIÓN		CONTRAPESO A6 - ESCENARIO 1	ZAPATA I6 C7 - ESCENARIO 1	--	--	--	--	--
	FECHA DEL ENSAYO:		3-oct-23	3-oct-23	--	--	--	--	--
	DESCRIPCIÓN/CAPA		RELLENO	RELLENO	--	--	--	--	--
DATOS DE ENTRADA	MASA INICIAL DEL FRASCO + ARENA	(g)	7316	7210	--	--	--	--	--
	MASA FINAL DEL FRASCO + ARENA	(g)	1886	1810	--	--	--	--	--
	MASA DE LA ARENA USADA	(g)	5432	5400	--	--	--	--	--
	CONSTANTE DEL CONO DE ARENA	--	1606	1606	--	--	--	--	--
	DENSIDAD DE LA ARENA	(g/cm³)	1,350	1,350	--	--	--	--	--
	VOLUMEN DEL HUECO	(cm³)	2834	2810	--	--	--	--	--
	MASA MAT. PASA ¾" NETO HUMEDO	(g)	3599	3536	--	--	--	--	--
	MASA MAT. RETIENE ¾" NETO HUMEDO	(g)	2965	3015	--	--	--	--	--
	MASA DEL SUELO EXTRAIDO HUMEDO	(g)	6564	6551	-	-	-	-	-
	HUMEDAD NATURAL	(%)	6,80	7,00	--	--	--	--	--
	MASA MAT. PASA ¾" SECO	(g)	3370	3305	--	--	--	--	--
	MASA MAT. RETIENE ¾" SECO	(g)	2776	2818	--	--	--	--	--
	MASA DEL SUELO EXTRAIDO SECO	(g)	6146	6122	--	--	--	--	--
CALCULO DE LA DENSIDAD	DENSIDAD MAX. LAB (PROCTOR)	(g/cm³)	2,149	2,149	--	--	--	--	--
		(KN/m³)	21,08	21,08	--	--	--	--	--
		(lbf/pie³)	134,2	134,2	--	--	--	--	--
	DENSIDAD HUMEDA EN EL TERRENO	(g/cm³)	2,3161	2,3310	-	-	-	-	-
	DENSIDAD SECA EN EL TERRENO	(g/cm³)	2,1686	2,1785	--	--	--	--	--
		(KN/m³)	21,27	21,36	--	--	--	--	--
		(lbf/pie³)	135,4	136,0	--	--	--	--	--
	PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN	(%)	**100,9**	**101,4**	--	--	--	--	--
CALCULO DE LA DENSIDAD CORREGIDA	PORCENTAJE MATERIAL SECO PASA ¾"	(%)	54,83	53,98	--	--	--	--	--
	PORCENTAJE MATERIAL SECO RETIENE ¾"	(%)	45,17	46,02	--	--	--	--	--
	HUMEDAD CORREGIDA	(%)	4,63	4,70	--	--	--	--	--
	MASA MAT. EXTRAIDO SECO CORREGIDO	(g)	6274	6257	--	--	--	--	--
	DENSIDAD SECA EN EL TERRENO CORREGIDA	(g/cm³)	2,2136	2,2264	--	--	--	--	--
	GRAVEDAD ESPECIFICA MAT. RETIENE ¾"	(g/cm³)	2,63	2,63	-	-	-	-	-
	DENSIDAD MÁXIMA CORREGIDA (PROCTOR)	(g/cm³)	2,3236	2,3272	--	--	--	--	--
	PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN	(%)	**95,3**	**95,7**	--	--	--	--	--
	PORCENTAJE MEDIO DE COMPACTACIÓN CORREGIDO (%)							**95,5**	

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

TIPO DE MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	K(90)= 0,819	Gci= 95,5	CUMPLE	SI	
RELLENO (No clasifica como A-1, A-2-4 o A-3)	**GCI(90) ≥ 95**	**DESVIACIÓN= 0,28**	**Gci(90)= 95**			

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ		REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN		
Auxiliar de Laboratorio		
PROCISÓ		
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO		**Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO**
Analista de Ingenieria		Coordinador de Ingenieria y Laboratorio

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO EMITIRÁ OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

10.426

NHSQ INGENIERIA
NIT: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 161	01/JULIO/2023	F-LAB-012-V7

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.				
DIRIGIDO A:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	**NIT:**	901682871-2	**O.T./MUESTRA N°**	DEN-004-731-W1325-23
CONTACTO:	ING. YEISON GOMEZ	**EMAIL:**	escenariosdeportivos2023@gmail.com	**FECHA DE EMISIÓN:**	14/10/2023
TIPO DE MATERIAL:	MATERIAL GRANULAR			**MUNICIPIO:**	VILLAVICENCIO
FUENTE DE MATERIAL:	RIO GUATIQUIA			**DEPARTAMENTO:**	META

SITIO DE TOMA	NÚMERO DE ENSAYO		MG-10*	MG-11*	MG-12*	--	--	--	--
	LOCALIZACIÓN		**CONTRAPESO A6 - ESCENARIO 2**	**ZAPATA 24 D7' - ESCENARIO 2**	**ZAPATA 24 D7' - ESCENARIO 2**	--	--	--	--
	FECHA DEL ENSAYO:		14-oct-23	14-oct-23	14-oct-23	--	--	--	--
	DESCRIPCIÓN/CAPA		RELLENO	RELLENO	RELLENO	--	--	--	--
DATOS DE ENTRADA	MASA INICIAL DEL FRASCO + ARENA	(g)	7565	7416	7351	--	--	--	--
	MASA FINAL DEL FRASCO + ARENA	(g)	1995	1806	1826	--	--	--	--
	MASA DE LA ARENA USADA	(g)	5570	5610	5525	--	--	--	--
	CONSTANTE DEL CONO DE ARENA	--	1606	1606	1606	--	--	--	--
	DENSIDAD DE LA ARENA	(g/cm³)	1,350	1,350	1,350	--	--	--	--
	VOLUMEN DEL HUECO	(cm³)	2936	2966	2903	--	--	--	--
	MASA MAT. PASA ¾" NETO HUMEDO	(g)	3786	3771	3741	--	--	--	--
	MASA MAT. RETIENE ¾" NETO HUMEDO	(g)	3001	3112	2965	--	--	--	--
	MASA DEL SUELO EXTRAIDO HUMEDO	(g)	6787	6883	6706	-	-	-	-
	HUMEDAD NATURAL	(%)	7,00	7,10	6,90	--	--	--	--
	MASA MAT. PASA ¾" SECO	(g)	3538	3521	3500	--	--	--	--
	MASA MAT. RETIENE ¾" SECO	(g)	2805	2906	2774	--	--	--	--
	MASA DEL SUELO EXTRAIDO SECO	(g)	6343	6427	6273	--	--	--	--
CALCULO DE LA DENSIDAD	DENSIDAD MAX. LAB (PROCTOR)	(g/cm³)	2,149	2,149	2,149	--	--	--	--
		(KN/m³)	21,08	21,08	21,08	--	--	--	--
		(lbf/pie³)	134,2	134,2	134,2	--	--	--	--
	DENSIDAD HUMEDA EN EL TERRENO	(g/cm³)	2,3114	2,3207	2,3101	-	-	-	-
	DENSIDAD SECA EN EL TERRENO	(g/cm³)	2,1602	2,1668	2,1609	--	--	--	--
		(KN/m³)	21,19	21,25	21,19	--	--	--	--
		(lbf/pie³)	134,9	135,3	134,9	--	--	--	--
	PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN	(%)	**100,5**	**100,8**	**100,6**	--	--	--	--
CALCULO DE LA DENSIDAD CORREGIDA	PORCENTAJE MATERIAL SECO PASA ¾"	(%)	55,78	54,79	55,79	--	--	--	--
	PORCENTAJE MATERIAL SECO RETIENE ¾"	(%)	44,22	45,21	44,21	--	--	--	--
	HUMEDAD CORREGIDA	(%)	4,79	4,79	4,73	--	--	--	--
	MASA MAT. EXTRAIDO SECO CORREGIDO	(g)	6477	6568	6403	--	--	--	--
	DENSIDAD SECA EN EL TERRENO CORREGIDA	(g/cm³)	2,2058	2,2146	2,2057	--	--	--	--
	GRAVEDAD ESPECIFICA MAT. RETIENE ¾"	(g/cm³)	2,63	2,63	2,63	-	-	-	-
	DENSIDAD MÁXIMA CORREGIDA (PROCTOR)	(g/cm³)	2,3197	2,3238	2,3196	--	--	--	--
	PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN	(%)	**95,1**	**95,3**	**95,1**	--	--	--	--
	PORCENTAJE MEDIO DE COMPACTACIÓN CORREGIDO (%)							**95,2**	

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

TIPO DE MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	K(90)= 0,819	Gci= 95,2	CUMPLE:	SI	
RELLENO (No clasifica como A-1, A-2-4 o A-3)	**GCI(90) ≥ 95**	**DESVIACIÓN= 0,12**	**Gci(90)= 95**			

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ		REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN		
Auxiliar de Laboratorio		
PROCESÓ		
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO		**Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO**
Analista de Ingeniería		Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO BRINDA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

NHSQ SAS INGENIERIA HACEMOS LO CORRECTO. CORRECTAMENTE	**CONSECUTIVO:** CON-001-734-23 **PAGINAS:** 1 DE 8	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification CO18.01105

INV-E 410-13 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Este documento es propiedad de NHSQ INGENIERÍA y no debe ser modificado, copiado o difundido por ningún medio a persona alguna no autorizada sin el permiso o aprobación del propietario. El solicitante o usuario será responsable por cualquier uso indebido. Este documento no es válido sin la firma en original.

DEPARTAMENTO:	**MUNICIPIO:**	**FECHA DE ENTREGA:**
META	VILLAVICENCIO	28/OCTUBRE/2023

ELABORADO Y APROBADO:	**VERSIÓN**	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**
Ing. NESTOR HERNÁN SUAREZ Q. Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos Especialista en Patología de la Construcción M.P. 25202-158140 CND			

SOLICITANTE:	**PROYECTO:**
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023 NIT: 901682871-2	CONSTRUCCIÒN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

Villavicencio, 28 de octubre de 2023

Señores:
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
NIT: 901682871-2
Ciudad.

Ref. CONSTRUCCIÒN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.
Tema: Informe de resistencia a la compresión de concretos.

Cordial saludo,

A continuación, se entrega el resumen de las muestras de concreto remitidas a este laboratorio, para su correspondiente rotura, con el fin de determinar la resistencia a la compresión a siete, catorce, veintiuno y veintiocho días de curado. Se adjunta la falla de sesenta y dos (62) cilindros de concreto.

El ensayo está basado en la norma INV-E 410-13, consiste en aplicar una carga axial de compresión a cilindros moldeados, a una velocidad de carga prescrita, hasta que se presente la falla.

El presente informe consta de ocho (08) páginas y no debe reproducirse sin la aprobación por escrito del laboratorio, los resultados contenidos en él se relacionan únicamente con las muestras ensayadas.

Espero que todas las labores realizadas sean de su entera satisfacción, cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Recuerde que usted es lo más importante para nuestra empresa.

Atentamente.

Ing. NÉSTOR HERNÁN SUAREZ Q.
Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos
Especialista en Patología de la Construcción
Gerente NHSQ INGENIERIA S.A.S

Anexo 1. Resultados de laboratorio


10430

NHSQ SAS INGENIERIA
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE
NIT: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 410	01/AGOSTO/2023	F-LAB-011-V8

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.			TIPO DE FALLA	
DIRIGIDO A:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA	NIT:	901682871-2		
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	CORREO:	escenariosdeportivos2023@gmail.com		
DEPARTAMENTO:	META	CELULAR:	3133089713		
FECHA DE RECEPCIÓN:	VER REMISION	CONTACTO:	ING. CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO		
DESCRIPCIÓN:	CONCRETO ELABORADO EN EL SITIO DE LA OBRA			FECHA DE EMISIÓN:	sábado, 28 de octubre de 2023

EQUIPOS UTILIZADOS: PRENSA DOBLE RANGO Nº: EQ-100 Y EQ-101 | BALANZA Nº: EQ-029 | FLEXOMETRO: EQ-161 | PIE D REY Nº: EQ-158

No. MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA *	RESISTENCIA DE DISEÑO *		ASENTAMIENTO (cm) *	FECHA DE TOMA *	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIÁMETRO (mm)	MASA (g)	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA		PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA
		(PSI)	(MPa)										(PSI)	(MPa)		
GV-1	ZAPATAS ESCENARIOS 2-Z2-A1, Z4 A'1', Z3 B1□	f'c 4000 PSI	28	6	31-ago.-23	28	28-sep-23	151,67	12905	18067,13	2367,8	620,0	4.999	35,0	125,0%	3
						28	28-sep-23	151,67	12950	18067,13	2383,9	622,3	5.018	35,1	125,4%	3
						56	26-oct-23	150,33	13295	17749,30	2455,9	725,9	5.958	41,7	149,0%	3
						56	26-oct-23	151,67	13045	18067,13	2375,1	755,3	6.090	42,6	152,3%	3
GV-2	ZAPATAS -ESCENARIOS 2-Z2E1, Z4D'1', Z3C1, Z3D1□	f'c 4000 PSI	28	6	4-sep.-23	21	25-sep-23	152,33	13085	18224,72	2382,7	711,1	5.684	39,8	142,1%	1
						21	25-sep-23	152,00	13115	18145,84	2395,8	706,6	5.673	39,7	141,8%	1
						28	2-oct-23	151,67	12915	18067,13	2356,6	751,7	6.061	42,4	151,5%	1
						28	2-oct-23	151,67	12980	18067,13	2358,1	750,0	6.047	42,3	151,2%	1
GV-3	ZAPATAS ESCENARIOS 2 Z4D'1', Z4D1', Z4C1	f'c 4000 PSI	28	6	6-sep.-23	21	27-sep-23	152,00	13035	18145,84	2355,2	750,0	6.021	42,1	150,5%	4
						21	27-sep-23	152,00	13150	18145,84	2391,7	737,8	5.923	41,5	148,1%	4
						28	4-oct-23	152,33	12985	18224,72	2351,5	774,2	6.189	43,3	154,7%	4
						28	4-oct-23	151,00	12880	17907,86	2389,5	775,2	6.306	44,1	157,7%	5
GV-4	ZAPATAS -ESCENARIO 2-Z4B1', Z4A'1',Z1E2, Z1E3, Z1E4	f'c 4000 PSI	28	6,5	8-sep.-23	21	29-sep-23	151,33	12875	17986,22	2367,7	632,3	5.121	35,8	128,0%	1
						21	29-sep-23	152,67	13045	18306,16	2341,5	633,3	5.040	35,3	126,0%	1
						28	6-oct-23	151,00	12820	17907,86	2381,0	674,7	5.488	38,4	137,2%	3
						28	6-oct-23	150,00	12900	17671,46	2433,3	680,3	5.608	39,3	140,2%	3

Nota: Inserte o elimine celdas si es necesario.



OBSERVACIONES:

EJECUTÓ		REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN		
Auxiliar de Laboratorio		
PROCESÓ		
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO		Ing. HOLVER DAVID SOTO MELGAREJO
Analista de Ingeniería		Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.
EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.
ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

"FIN DEL INFORME"


1043

NHSQ SAS INGENIERIA
HACEMOS LO CORRECTO. CORRECTAMENTE
NIt: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO. CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 410	01/AGOSTO/2023	F-LAB-011-V8

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.			TIPO DE FALLA	
DIRIGIDO A:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA	NIT:	901682871-2		
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	CORREO:	escenariosdeportivos2023@gmail.com		
DEPARTAMENTO:	META	CELULAR:	3133089713		
FECHA DE RECEPCIÓN:	VER REMISION	CONTACTO:	ING. CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO		
DESCRIPCIÓN:	CONCRETO ELABORADO EN EL SITIO DE LA OBRA			FECHA DE EMISIÓN:	sábado, 28 de octubre de 2023

EQUIPOS UTILIZADOS: PRENSA DOBLE RANGO N°: EQ-100 Y EQ-101 BALANZA N°: EQ-029 FLEXOMETRO: EQ-161 PIE D REY N°: EQ-158

No. MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA *	RESISTENCIA DE DISEÑO * (PSI)	RESISTENCIA DE DISEÑO * (MPa)	ASENTAMIENTO (cm) *	FECHA DE TOMA *	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIÁMETRO (mm)	MASA (g)	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (MPa)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA
GV-5	CONTRAPESO-ESCENARIO 2 E1-A1	f´c 3000 PSI	21	7	14-sep.-23	14	28-sep-23	152,00	12945	18145,84	2326,2	406,4	3.263	22,8	108,8%	1
						14	28-sep-23	150,33	12845	17749,30	2383,1	396,4	3.253	22,8	108,4%	5
						28	12-oct-23	150,33	13195	17749,30	2403,3	430,3	3.532	24,7	117,7%	5
						28	12-oct-23	151,67	12915	18067,13	2367,0	431,3	3.478	24,3	115,9%	5
GV-6	ZAPATAS -ESCENARIO 2 Z1E5, Z1E6, Z1E7□	f´c 4000 PSI	28	5,5	14-sep.-23	14	28-sep-23	151,30	13040	17979,09	2352,3	545,9	4.423	31,0	110,6%	3
						14	28-sep-23	151,67	12715	18067,13	2327,8	539,8	4.352	30,5	108,8%	3
						28	12-oct-23	150,00	12730	17671,46	2401,2	595,2	4.907	34,3	122,7%	1
						28	12-oct-23	150,67	12830	17829,68	2398,6	594,6	4.858	34,0	121,4%	4
GV-7	ZAPATAS -ESCENARIO 2 C7-B7-A7'	f´c 4000 PSI	28	6	21-sep.-23	7	28-sep-23	151,33	13055	17986,22	2343,9	452,4	3.664	25,6	91,6%	4
						14	5-oct-23	152,00	12925	18145,84	2353,3	513,5	4.122	28,9	103,1%	5
						28	19-oct-23	153,33	13140	18464,78	2364,2	664,0	5.238	36,7	131,0%	1
						28	19-oct-23	152,33	13325	18224,72	2402,5	678,4	5.423	38,0	135,6%	4
GV-8	CONTRAPESOS ESCENARIOS 2□	f´c 3000 PSI	21	6	21-sep.-23	7	28-sep-23	151,33	12985	17986,22	2275,0	284,3	2.303	16,1	76,8%	3
						14	5-oct-23	151,67	13010	18067,13	2363,5	304,5	2.455	17,2	81,8%	5
						28	19-oct-23	153,33	13140	18464,78	2364,2	500,3	4.105	28,7	136,8%	1
						28	19-oct-23	152,33	13325	18224,72	2402,5	519,7	4.154	29,1	138,5%	4

Nota: Inserte o elimine celdas si es necesario.



OBSERVACIONES:

EJECUTÓ		REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN		
Auxiliar de Laboratorio		
PROCESÓ		
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO		Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Analista de Ingeniería		Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SUMINISTRADA A ENSAYO.
EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.
ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE
ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS

"FIN DEL INFORME"


10432

NHSQ SAS INGENIERIA
HACEMOS LO CORRECTO. CORRECTAMENTE
NIT: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO. CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 410	01/AGOSTO/2023	F-LAB-011-V8

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.			TIPO DE FALLA	
DIRIGIDO A:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA	**NIT:**	901682871-2		
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**CORREO:**	escenariosdeportivos2023@gmail.com		
DEPARTAMENTO:	META	**CELULAR:**	3133089713		
FECHA DE RECEPCIÓN:	VER REMISION	**CONTACTO:**	ING. CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO		
DESCRIPCIÓN:	CONCRETO ELABORADO EN EL SITIO DE LA OBRA			**FECHA DE EMISIÓN:**	sábado, 28 de octubre de 2023

EQUIPOS UTILIZADOS: **PRENSA DOBLE RANGO Nº:** EQ-100 Y EQ-101 **BALANZA Nº:** EQ-029 **FLEXOMETRO:** EQ-161 **PIE D REY Nº:** EQ-158

No. MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA *	RESISTENCIA DE DISEÑO *		ASENTAMIENTO (cm) *	FECHA DE TOMA *	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIÁMETRO (mm)	MASA (g)	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA		PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA
		(PSI)	(MPa)										(PSI)	(MPa)		
GV-9	ZAPATAS ESCENARIO 1 E2-E8, Z1-E4-E5-E6-E7	f'c 4000 PSI	28	16,51	23-sep.-23	28	21-oct-23	151,00	12945	17907,86	2396,2	627,8	5.107	35,7	127,7%	4
						28	21-oct-23	151,67	12835	18067,13	2365,4	633,5	5.108	35,8	127,7%	1
						56	18-nov-23									
						56	18-nov-23									
GV-10	ZAPATAS ESCENARIOS 2 Z2, A7,Z4,D7,C7□	f'c 4000 PSI	28	15,24	23-sep.-23	28	21-oct-23	150,33	13175	17749,30	2463,6	615,0	5.048	35,3	126,2%	4
						28	21-oct-23	151,67	13190	18067,13	221,1	615,2	4.960	34,7	124,0%	1
						56	18-nov-23									
						56	18-nov-23									
GV-11	ZAPATAS ESCENARIO 1 Y 2 Z1-A6-Z1-A4,A5,E2,E3,Z4-D`7-Z3D8,C8	f'c 4000 PSI	28	13,97	28-sep.-23	21	19-oct-23	152,33	12940	18224,72	2361,5	532,2	4.254	29,8	106,3%	4
						21	19-oct-23	152,00	12920	18145,84	2360,2	536,4	4.306	30,1	107,7%	1
						28	26-oct-23	151,33	13125	17986,22	2390,0	580,7	4.703	32,9	117,6%	2
						28	26-oct-23	151,67	12945	18067,13	2372,5	586,1	4.726	33,1	118,1%	5
GV-12	CONTRAPISO ESCENARIO 1 E 8□	f'c 3000 PSI	21	16,51	30-sep.-23	21	21-oct-23	152,67	13010	18306,16	2355,9	459,8	3.659	25,6	122,0%	1
						21	21-oct-23	151,00	13210	17907,86	2453,4	455,2	3.703	25,9	123,4%	4
						28	**28-oct-23**	**151,00**	**13075**	**17907,86**	**2399,1**	**467,3**	**3.801**	**26,6**	**126,7%**	**4**
						28	**28-oct-23**	**151,67**	**12955**	**18067,13**	**2374,3**	**470,0**	**3.790**	**26,5**	**126,3%**	**5**

Nota: Inserte o elimine celdas si es necesario.



OBSERVACIONES:

EJECUTÓ		REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN		
Auxiliar de Laboratorio		
PROCESÓ		
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO		Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Analista de Ingenieria		Coordinador de Ingenieria y Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SUMINISTRADA A ENSAYO.
EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.
ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
ESTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.


10.433

NHSQ SAS INGENIERIA
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE
NIt: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 410	01/AGOSTO/2023	F-LAB-011-V8

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.			TIPO DE FALLA	
DIRIGIDO A:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA	**NIT:**	901682871-2		
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**CORREO:**	escenariosdeportivos2023@gmail.com		
DEPARTAMENTO:	META	**CELULAR:**	3133089713		
FECHA DE RECEPCIÓN:	VER REMISION	**CONTACTO:**	ING. CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO		
DESCRIPCIÓN:	CONCRETO ELABORADO EN EL SITIO DE LA OBRA			**FECHA DE EMISIÓN:**	sábado, 28 de octubre de 2023

EQUIPOS UTILIZADOS: **PRENSA DOBLE RANGO Nº:** EQ-100 Y EQ-101 **BALANZA Nº:** EQ-029 **FLEXOMETRO:** EQ-161 **PIE D REY Nº:** EQ-158

No. MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA *	RESISTENCIA DE DISEÑO * (PSI)	RESISTENCIA DE DISEÑO * (MPa)	ASENTAMIENTO (cm) *	FECHA DE TOMA *	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIÁMETRO (mm)	MASA (g)	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (MPa)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f´c	TIPO DE FALLA
GV-13	ZAPATAS ESCENARIOS Z1A2-Z1-A3	f´c 4000 PSI	28	20,32	30-sep.-23	21	21-oct-23	151,00	13205	17907,86	2444,3	450,3	3.663	25,6	91,6%	5
						21	21-oct-23	151,33	12880	17986,22	2363,4	451,3	3.655	25,6	91,4%	4
						28	**28-oct-23**	**150,33**	**12930**	**17749,30**	**2422,9**	**506,3**	**4.156**	**29,1**	**103,9%**	**4**
						28	**28-oct-23**	**151,33**	**13100**	**17986,22**	**2398,4**	**505,3**	**4.093**	**28,6**	**102,3%**	**4**
GV-14	CONTRAPESO A2-A3-A4-A5 ESCENARIO 2 Y ESCENARIO 1	f´c 3000 PSI	21	15,24	6-oct-23	14	20-oct-23	152,00	13170	18145,84	2405,9	437,5	3.512	24,6	117,1%	4
						14	20-oct-23	152,67	13110	18306,16	2387,2	454,7	3.618	25,3	120,6%	1
						28	3-nov-23									
						28	3-nov-23									
GV-15	ZAPATAS Z4-A71-Z4 B7- VIGAS 1/3 ESCENARIO 2	f´c 4000 PSI	28	15,24	6-oct-23	14	20-oct-23	151,00	12770	17907,86	2366,5	393,6	3.202	22,4	80,0%	1
						14	20-oct-23	151,00	13045	17907,86	2425,5	403,6	3.283	23,0	82,1%	1
						28	3-nov-23									
						28	3-nov-23									
GV-16	CONTRAPESO ESCENARIO 2 A2-A5	f´c 3000 PSI	21	16,51	9-oct-23	14	23-oct-23	151,33	13175	17986,22	2396,4	477,8	3.870	27,1	129,0%	2
						14	23-oct-23	151,00	13320	17907,86	2415,0	462,8	3.765	26,4	125,5%	4
						28	6-nov-23									
						28	6-nov-23									

Nota: Inserte o elimine celdas si es necesario.



OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN	
Auxiliar de Laboratorio	
PROCESÓ	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio
Analista de Ingeniería	

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SUMINISTRADA A ENSAYO.
EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.
ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

"FIN DEL INFORME"


10 434

NHSQ SAS INGENIERIA
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE
NIT: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 410	01/AGOSTO/2023	F-LAB-011-V8

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.			TIPO DE FALLA	
DIRIGIDO A:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA	**NIT:**	901682871-2		
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**CORREO:**	escenariosdeportivos2023@gmail.com		
DEPARTAMENTO:	META	**CELULAR:**	3133089713		
FECHA DE RECEPCIÓN:	VER REMISION	**CONTACTO:**	ING. CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO		
DESCRIPCIÓN:	CONCRETO ELABORADO EN EL SITIO DE LA OBRA			**FECHA DE EMISIÓN:**	sábado, 28 de octubre de 2023

EQUIPOS UTILIZADOS: **PRENSA DOBLE RANGO Nº:** EQ-100 Y EQ-101 **BALANZA Nº:** EQ-029 **FLEXOMETRO:** EQ-161 **PIE D REY Nº:** EQ-158

No. MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA *	RESISTENCIA DE DISEÑO * (PSI)	RESISTENCIA DE DISEÑO * (MPa)	ASENTAMIENTO (cm) *	FECHA DE TOMA *	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIÁMETRO (mm)	MASA (g)	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (MPa)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f´c	TIPO DE FALLA
GV-17	ZAPATA Z4-67 ESCENARIO 1-VIGAS 2/3 VC4□	f´c 4000 PSI	28	15,24	9-oct.-23	14	23-oct-23	150,67	13140	17829,68	2411,0	412,1	3.367	23,6	84,2%	4
						14	23-oct-23	151,00	13100	17907,86	2401,0	426,6	3.471	24,3	86,8%	2
						28	6-nov-23									
						28	6-nov-23									
GV-18	CONTRAPESO ESCENARIO 1	f´c 3000 PSI	21	16,51	13-oct-23	7	20-oct-23	150,67	12870	17829,68	2392,8	320,3	2.617	18,3	87,2%	1
						14	27-oct-23	150,67	12915	17829,68	2406,5	427,7	3.494	24,5	116,5%	4
						28	10-nov-23									
						28	10-nov-23									
GV-19	ZAPATAS ESCENARIO 2 Z4-D7 - Z3- D7□	f´c 4000 PSI	28	13,97	13-oct-23	7	20-oct-23	150,67	13095	17829,68	2434,6	383,4	3.133	21,9	78,3%	1
						14	27-oct-23	151,00	13170	17907,86	2435,2	484,6	3.942	27,6	98,6%	4
						28	10-nov-23									
						28	10-nov-23									
GV-20	ZAPATA Z4 A' 7'-Z3 D'1"	f´c 4000 PSI	28	16,51	14-oct-23	7	21-oct-23	150,67	13085	17829,68	2435,5	315,3	2.576	18,0	64,4%	1
						14	**28-oct-23**	**152,00**	**12865**	**18145,84**	**2363,3**	**399,7**	**3.208**	**22,5**	**80,2%**	**3**
						28	11-nov-23									
						28	11-nov-23									

Nota: Inserte o elimine celdas si es necesario.



OBSERVACIONES:

EJECUTÓ		REVISÓ Y APROBÓ
JOSE FERNANDO AGUIRRE MARIN		
Auxiliar de Laboratorio		
PROCESÓ		Ing. HAIVER DAVID OLAYA MELGAREJO
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO		Coordinador de Ingeniería y Laboratorio
Analista de Ingeniería		

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SUMETIDA A ENSAYO
EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS
ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE
ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

"FIN DEL INFORME"

10.435

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

INFORME MANEJO DEL ANTICIPO

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

10.436

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

CONTRATO N°	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

INFORME N°	4	PERIODO INFORME:	1 de octubre de 2023	a	31 de octubre de 2023

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO. PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
NIT:	901682871-2
CORREO ELECTRONICO:	Contabilidadedeportivos@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	249 DE 2023
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
CORREO ELECTRONICO:	interescenariosc@gmail.com
SUPERVISOR:	BIBIANA PAN MERCHAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	FLOWER EMILIO PEÑA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	

VIGENCIA INICIAL

TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Días	0
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de mayo de 2023				
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VIGENCIA ACTUAL

TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Días	0
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	2022005500094	10.220.557.418,00	0,00	$ 10.220.557.418,00
2	2022005500022	8.805.724.533,00	0,00	$ 8.805.724.533,00
3	2022005500024	31.845.658.891,00	0,00	$ 31.845.658.891,00
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$ 50.871.940.842,00

INFORMACIÓN DE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO 1:	$ 14.498.503.139,60		
FECHA PAGO ANTICIPO	29 de junio de 2023	No. COMPROBANTE:	01976-01975-01974-01973-01972
FIDUCIA (SI APLICA):	ALIANZA FIDUCIARIA		
BANCO:	BANCOLOMBIA - FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS		
CUENTA DE AHORROS:	4000006842		

INFORME DE INVERSIÓN

ITEM	CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
1	ORDEN DE GIRO 7 - 442376	4 de octubre de 2023	ORGANIZACION TERRACANTO SAS	$ 2.007.157.131,00	2	ANTICIPO 40% CONTRATO No 10
2	ORDEN DE GIRO 6 - 441745	2 de octubre de 2023	ORGANIZACION TERRACANTO SAS	$ 132.265.723,00	2	CORTE 2 DE OBRA CONTRATO 01
TOTAL						$ 2.139.422.854,00

Anexar Respectivos Soportes y Extracto Cuenta Bancaria Registrada

10.437

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCION	ANTICIPO INICIAL	ANTICIPO ADICIONAL	TOTAL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO ANTICIPO
1	Mano de obra	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 12.323.727.668,66	$ -	$ 12.323.727.668,66	$ 2.139.422.854,00	$ 2.035.836.293,36
3	Transporte	$ 1.449.850.313,96	$ -	$ 1.449.850.313,96	$ -	$ 542.249.035,96
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40
5	FONSET 5%	$ 763.079.113,00		$ 763.079.113,00		$ -
TOTALES		$ 15.261.582.252,60	$ -	$ 15.261.582.252,60	$ 2.139.422.854,00	$ 3.303.010.486,30

Nota: Se anexa copia de Tarjeta Profesional y vigencia de la Tarjeta Profesional de los contadores que intervienen en el presente informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 21 de noviembre de 2023

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 278207-T

Firma
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 175215-T

10.438

Alianza Fiduciaria

t: (601) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE OCTUBRE DEL 2023

FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
CODIGO SIFI 113392

Respetados Señores:OCTUBREOCTUBRE128OCTUBRE1015734

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 4/17/2023 rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10439

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000006842

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTI

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	5,447,197,969.05	*SALDO PROMEDIO*	$	3,506,638,590
TOTAL ABONOS	$	2,225,226.40	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	2,139,444,596.62	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,225,226.40
SALDO ACTUAL	$	3,309,978,598.83	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			111,481.01	5,447,309,450.06
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43.31	5,447,309,406.75
2/10	TRASL ENTRE FONDOS DE VALORES	C.SERV.EMP BOGOTA		-132,265,723.00	5,315,043,683.75
2/10	VALOR IVA			-1,729.00	5,315,041,954.75
2/10	COMIS TRASLADO EN SUCURSAL			-9,099.00	5,315,032,855.75
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			217,554.52	5,315,250,410.27
4/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43.31	5,315,250,366.96
4/10	TRASL ENTRE FONDOS DE VALORES	OSE CUCUTA		-2,007,157,131.00	3,308,093,235.96
4/10	VALOR IVA			-1,729.00	3,308,091,506.96
4/10	COMIS TRASLADO EN SUCURSAL			-9,099.00	3,308,082,407.96
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,896,190.87	3,309,978,598.83
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

10.440

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

INFORME PMT

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

10.441

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad

INFORME MENSUAL

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO



CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
NIT: 901682871-2

CONTRATO N° 106 de 2023

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

PERIODO:

OCTUBRE 2023

VILLAVICENCIO META

Elaboro: Ing. Yeison Esneider Gómez Guerrero
Director de Obra

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO GENERAL 5
2.1 Objetivos Específicos 5
3. ALCANCE 6
4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 6
5. CATEGORIA DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 7
6. CONOCIMIENTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA 7
6.1 Clasificación zona de Influencia 8
6.2 Localización del Proyecto 9
7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE ZONA DE INFLUENCIA 10
8. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO 16
Tabla 2 Información legal del proyecto 16
9. ATENCIÓN A USUARIOS Y HABITANTES DE LA ZONA 16
10. PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 17
10.1 Información y divulgación del plan de manejo de tránsito 18
10.2 Atención vecinos y usuarios 18
10.3 Medios de difusión a utilizar. 19
10.4 Quejas y reclamos 20
10.5 Implementación del plan manejo de tránsito 20
11. ACTIVIDADES DE OBRA EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 22
11.1 Instalación de señalización PMT. 24
11.2 Supervisión por parte del consorcio 25
11.3 Charlas de seguridad a trabajadores 26
11.4 Mantenimiento de señalización en obra 27
11.5 Puntos de emergencia y ecológicos en obra 27
12. DISPONIBILIDAD E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA EL PMT 28
12.1 Características de la señalización. 28
12.2 Equipo y maquinaria 29
12.3 Señalización informativa de obra. 30
13. COORDINACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL PLAN (PMT). 31
14. SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 32
15. CONCLUSIONES 33

16. ANEXOS 33

Tabla

Tabla 1 Clasificación vial en el área de influencia 8

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 Plano 1 señalización 8
Ilustración 2 Plano 2 señalización 9
Ilustración 3 Localización de proyecto 10
Ilustración 4 Registro fotográfico de la Carrera 19 12
Ilustración 5 Registro fotográfico Carrera 18 Av Maracos 13
Ilustración 6 Registro Fotográfico Carrera 16 14
Ilustración 7 Registro Fotográfico Calle 25 15
Ilustración 8 Señalización del PMT 24
Ilustración 9 Supervisión por parte del área de sst 25
Ilustración 10 Charlas de seguridad 26
Ilustración 11 Mantenimiento de la señalización 27
Ilustración 12 Equipos de emergencia 27
Ilustración 13 Señalización vial 28
Ilustración 14 Maquinaria en obra 29
Ilustración 15 Señalización instalada en obra 30
Ilustración 16 personal de apoyo vial 31
Ilustración 17 Supervisión en obra 32

1 INTRODUCCIÓN

En el presente documento se presenta el informe mensual del mes de **octubre** de la implementación del plan de manejo de tránsito realizado por el Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023, del Contrato de obra No. 106 del 2023, "**CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".**

La implementación se realiza de acuerdo con la viabilidad otorgada por la secretaria de Movilidad de la Alcaldía Municipal de Villavicencio-Meta, mediante oficio **1703-19.18/0680 del17 de mayo del 2023** y lo emanado en la resolución No.1885 de 2015 "Manual de Señalización adoptado por el Ministerio del Transporte".

El informe se ha estructurado sobre los datos generales, tales como, los responsables del proyecto, la descripción de este, los tiempos, rutas y movimientos, así como las actividades a realizar, seguido de las características generales del entorno, la características físicas y operativas del área del proyecto, la característica del tránsito y la forma de ejecución sin generar mayores impactos en la comunidad. Para la definición de este PMT, se tiene como base de referencia el documento correspondiente al Manual de señalización 2015 y el Nuevo Código de Tránsito 2002, el cual se asume como viable y se acoge para la elaboración del documento único a presentar, realizando los ajustes necesarios para garantizar los requerimientos, de la **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta.**

2. OBJETIVO GENERAL

Mitigar los impactos generados por la obra durante la **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta,** con el fin de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil en los desplazamientos para los trabajadores de la obra, visitantes y vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito,

El proyecto no contempla la intervención de la calzada o algún elemento de su diseño trasversal, debido a esto no se presenta ningún tipo de diseño de señalización horizontal y/overtical definitivo ya que la señalización a utilizar será de manera temporal de acuerdo al capítulo 4 del Manual de señalización vial 2015.

El PMT es una herramienta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado en las condiciones normales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas y comunidad en general) causados por la ejecución de una obra vial o aquellas que intervenganel espacio público, de manera que siempre se favorezca la seguridad de los usuarios de la vía, de los ciudadanos en general y de quienes participan en la construcción de la obra.

2.1 Objetivos Específicos

- Procurar la seguridad e integridad de los conductores, y trabajadores de laobra.
- Evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales.
- Ofrecer a los usuarios y personal una señalización clara y de fácil interpretación.
- Prestar atención continua a la seguridad en las vías dentro del área de influenciade la obra en ejecución.

3. ALCANCE

Identificar los impactos que pueda generar la **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta,** en el tránsito y vecinos del sector, e implementar medidas que conlleven a la mitigación de los mismos, mediante la implementación de señalización adecuada de acuerdoal Manual de señalización Vial.

4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

- Las estrategias para el manejo temporal del tránsito por obras civiles o constructivas deben apoyarse en los siguientes principios fundamentales:
- Prevención de accidentes viales en el área de trabajo
- La seguridad de los trabajadores en áreas de control de tránsito debe ser unelemento fundamental y de alta prioridad en todo el proyecto.
- Establecer criterios para mantener la limpieza en las zonas aledañas.
- Seleccionar y cuantificar los dispositivos que serán necesarios durante el desarrollo del proyecto.
- Diseñar, programar e implementar coherentemente las rutas alternativas y/o desvíos requeridos para la ejecución de la obra de manera que no afecten lo mínimo posible al transporte público y particular.

5. CATEGORIA DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Señalización Vial 2015, el PMT del **ConsorcioEscenarios deportivos villa olímpica 2023** se clasifica como categoría 1, de acuerdo al numeral **4.5.4.1.** Obras de Interferencias Mínimas

"Son aquellas en que los espacios de circulación son muy poco afectados por las intervenciones y no hay afectación sobre zonas aledañas. Hay poca o nula intervención en los espacios de circulación peatonal. El impacto de la obra sobre el tránsito de vehículos puede ser mitigado por la misma infraestructura a intervenir sin esperar que los flujos sean desviados. La señalización necesaria se puede lograr siguiendo uno o más de los esquemas".

6. CONOCIMIENTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA

El Complejo Deportivo Villa Olímpica se encuentra localizado en la Comuna Número 5 de la ciudad de Villavicencio, la cual está compuesta por los barrios Popular, Dos Mil, Olímpico, Villa Ortiz, Camelias, Cataluña, Bello Horizonte, Nueva Floresta, Estero, Bochica, Macunaima, Ariguani, Vizcaya, Hacaritama, Villa Mélida, Ciudadela San Antonio, Aguas Claras, Danubio, Doña Luz, Remanso, Menegua y Buenos Aires.

El Complejo Deportivo se encuentra en un polígono delimitado de Sur a Norte por la Avenida los Maracos o Carrera 18 y la Calle 25 y de Oriente a Occidente por la Carrera 16 y la Avenida Carrera 19, respectivamente. En la actualidad hay accesibilidad a las instalaciones del Complejo Deportivo por la Calle 25 y la Carrera 16.

6.1 Clasificación zona de Influencia

Con base en la información descrita en el numeral anterior, la clasificación de las vías que actualmente existen en el área de influencia del proyecto fue clasificada como se observa a continuación (véase TABLA).

VIA	DESDE	HASTA	CLASIFICACION VIAL	PERFIL VIAL
Av. Cra 19	Calle 15	Calle 25	Vía arterial	V-3
Cra. 18 av. maracos	Av. Cra. 19	Cra. 16	Vía arterial	V-3
Calle 25	Av. Cra. 19	Cra. 16	Vía Local	V-4
Cra. 16	Calle 25	Cra. 18	Vía Local	V-5
Calle 15	Av. Cra. 19	Cra. 16	Vía Local	V-5

Tabla 1 Clasificación vial en el área de influencia



Ilustración 1 Plano 1 señalización

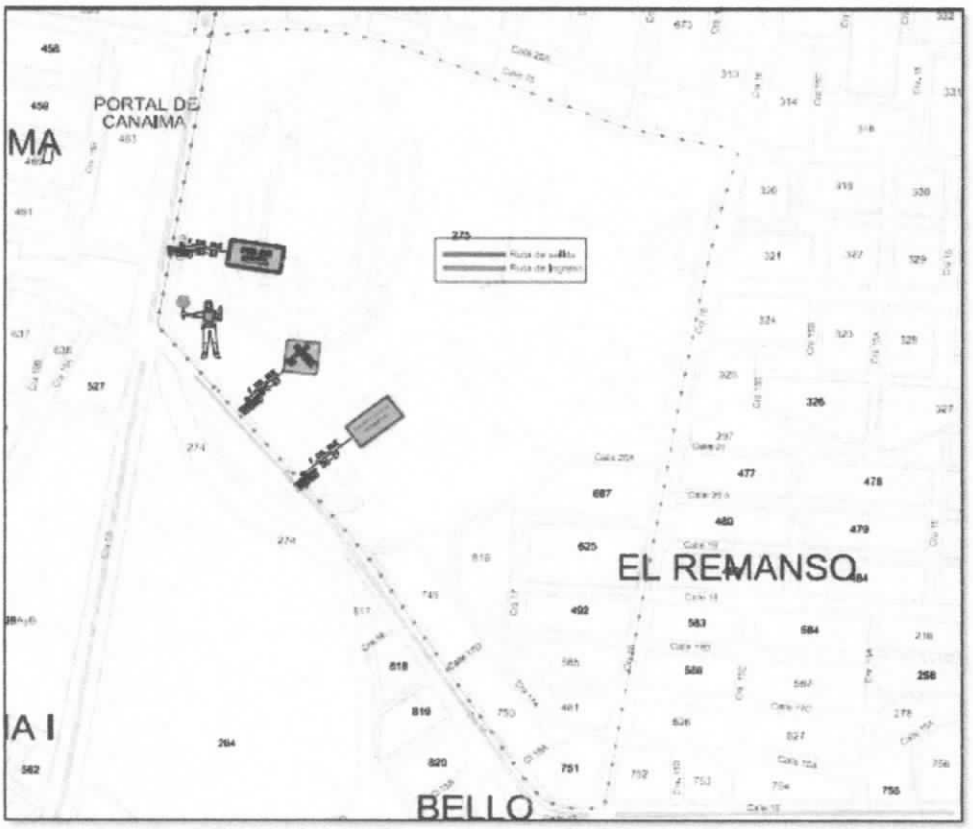


Ilustración 2 Plano 2 señalización

6.2 Localización del Proyecto

La zona donde se está ejecutando la obra del presente plan de manejo de tránsito, se encuentra ubicada en un polígono delimitado de Sur a Norte por la Avenida los Maracos o Carrera 18 y la Calle 25 y de Oriente a Occidente por la Carrera 16 y la Avenida Carrera 19, respectivamente. En la actualidad hay accesibilidad a las instalaciones del Complejo Deportivo por la Calle 25 y la Carrera 16.

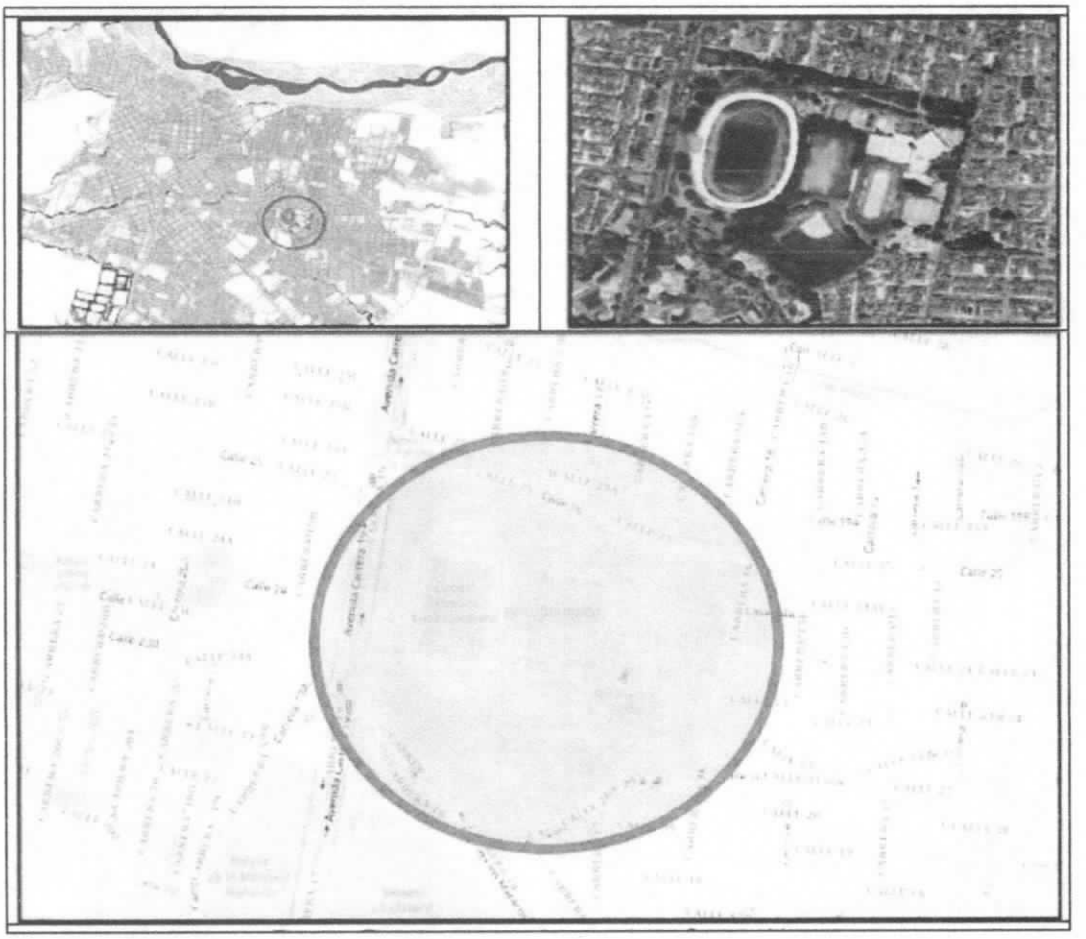


Ilustración 3 Localización de proyecto

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE ZONA DE INFLUENCIA

Los segmentos viales por donde se realizará el ingreso y salida de maquinaria corresponden a la Carrera 16 para las actividades de la construcción de los escenarios multipropósitos y la Carrera 18 (Avenida maracos) para el desarrollo de las actividades de construcción de la pista de atletismo, las cuales como se menciona anteriormente se ubican en la comuna 5, las características de estas vías localizadas dentro del área de influencia de la zona a intervenir se indican a continuación.

Además, se realiza una descripción de la infraestructura vial que se encuentra dentro del área de influencia.

A continuación, se presenta la descripción y caracterización de las vías principales que están directamente relacionadas con el funcionamiento del proyecto.

- **AVENIDA CARRERA 19**

La Avenida Carrera 19 entre la Calle15 y la Calle 25 pertenece a la malla vial arterial de la ciudad de Villavicencio, con un perfil V-3 de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT para la capital del departamento del Meta. Presenta dos calzadas vehiculares con dos carriles de circulación cada una de estas, con una carpeta de rodadura asfáltica (pavimento flexible), para uso del tránsito mixto. Presenta doble circulación norte – sur y viceversa, con un ancho promedio por calzada de aproximadamente 9,0 metros y separador central en material blando con un ancho aproximado de 1,0 metros. En ambos costados de la vía cuenta con infraestructura propia para la movilidad peatonal, con anchos que varía entre los 5 y 6 metros.

En cuanto a señalización vertical, señalización horizontal y controles semafóricos, sobre la Avenida Carrera 19 entre la Calle 15 y la Calle 25, se localizado dos intersecciones semaforizadas, una a la altura de la Calle 15 o Carrera 18 y la segunda sobre la Calle 25, las cuales permiten el paso seguro de peatones; y así mismo las maniobras vehiculares presentes en cada una de las intersecciones.

La demarcación se encuentra en regulares condiciones, las marcas viales presentan un desgaste significativo y sin retrorreflexión; la señalización vertical se encuentra en regulares condiciones.

En la actualidad, lo concurrido de este corredor hace que por este transiten una cantidad significativa de rutas de transporte público ya que este es un punto de gran concurrencia. A continuación, en la tabla se presentan las rutas identificadas en esta vía.



Ilustración 4 Registro fotográfico de la Carrera 19

- **CARRERA 18 (AVENIDA LOS MARACOS)**

La Avenida Los Maracos o Carrera 18 entre la Avenida Carrera 19 y la Carrera 16 pertenece a la malla vial arterial de la ciudad de Villavicencio, con un perfil V-3 de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT para la capital del departamento del Meta. Presenta dos calzadas vehiculares con dos carriles cada una, con una carpeta de rodadura asfáltica (pavimento flexible), para uso del tránsito mixto. Presenta doble circulación Oriente a Occidente y viceversa, con un ancho promedio por calzada de 8,0 metros y separador central en material blando, con un ancho aproximado de 0,5 metros. En ambos costados de la vía cuenta con infraestructura propia para la movilidad peatonal, con anchos que varían entre los 3 y 4 metros.

En cuanto señalización vertical, señalización horizontal y controles semafóricos, sobre la Avenida Los Maracos (Carrera 18) entre la Carrera 19 y la Carrera 16, se localizan dos intersecciones semaforizadas, una a la altura de la Avenida Carrera 19 y la segunda sobre la Carrera 16, las cuales permiten el paso seguro de peatones; y así mismo las manobras vehiculares presentes en cada una de las intersecciones. La demarcación se encuentra en buenas condiciones, las marcas viales presentan una condición aceptable; y así mismo la señalización vertical se encuentra en condiciones favorables.

En la actualidad, por este corredor transitan rutas de transporte publico producto de la concurrencia del sector, a continuación, en la tabla se presentan las rutas identificadas en esta vía.



Registro fotográfico Carrera 18 Av Maracos

- **CARRERA 16**

La Carrera 16 entre la Calle 15 y la Calle 25 pertenece a la malla vial local de la ciudad de Villavicencio, con un perfil V-5 de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT para la capital del departamento del Meta. Presenta una única calzada vehicular con dos carriles, con una carpeta de rodadura asfáltica (pavimento flexible) en mal estado, para uso del tránsito mixto. Presenta doble circulación Norte - Sur y viceversa, con un ancho promedio de calzada de 7,5 metros.

En ambos costados de la vía cuenta con infraestructura propia para la movilidad peatonal, con anchos que varían entre los 3 y 4 metros.

En cuanto señalización vertical, señalización horizontal y controles semafóricos, sobre la Carrera 16 entre la Calle 15 y la Calle 25, se localizan dos intersecciones semaforizadas, una a la altura de la Calle 15 o Avenida los Maracos (Carrera 18) y la segunda sobre la Calle 25, las cuales permiten el paso seguro de peatones; y así mismo las manobras vehiculares presentes en cada una de las intersecciones.

La demarcación se encuentra en malas condiciones, las marcas viales presentan un desgaste significativo y sin retrorreflexión; la señalización vertical se encuentra en regulares condiciones.

En la actualidad, por este corredor transitan rutas de transporte publico producto de la concurrencia del sector, a continuación, en la tabla se presentan las rutas identificadas en esta vía.



Ilustración 6 Registro Fotográfico Carrera 16

- **CALLE 25**

La Calle 25 entre la Carrera 19 y la Carrera 16 pertenece a la malla vial local de la ciudad de Villavicencio, con un perfil V-4 de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT para la capital del departamento del Meta. Presenta una única calzada vehicular con dos carriles, con una carpeta de rodadura asfáltica (pavimento flexible) en mal estado, para uso del tránsito mixto. Presenta doble circulación Oriente – Occidente y viceversa, con un ancho promedio de calzada de 7,5 metros. En ambos costados de la vía cuenta con infraestructura propia para la movilidad peatonal, con anchos que varían entre los 3 y 4 metros.

En cuanto señalización vertical, señalización horizontal y controles semafóricos, sobre la Calle 25 entre la Carrera 19 y la Carrera 16, se localizan dos intersecciones semaforizadas, una a la altura de la Carrera 19 y la segunda sobre la Carrera 16, las cuales permiten el paso seguro de peatones; y así mismo las manobras vehiculares presentes en cada una de las intersecciones. La demarcación se encuentra en malas condiciones, las marcas viales presentan un desgaste significativo y sin retrorreflexión; la señalización vertical se encuentra en regulares condiciones.

En la actualidad, por este corredor transitan rutas de transporte publico producto de la concurrencia del sector, a continuación, en la siguiente tabla se presentan las rutas identificadas en esta vía.

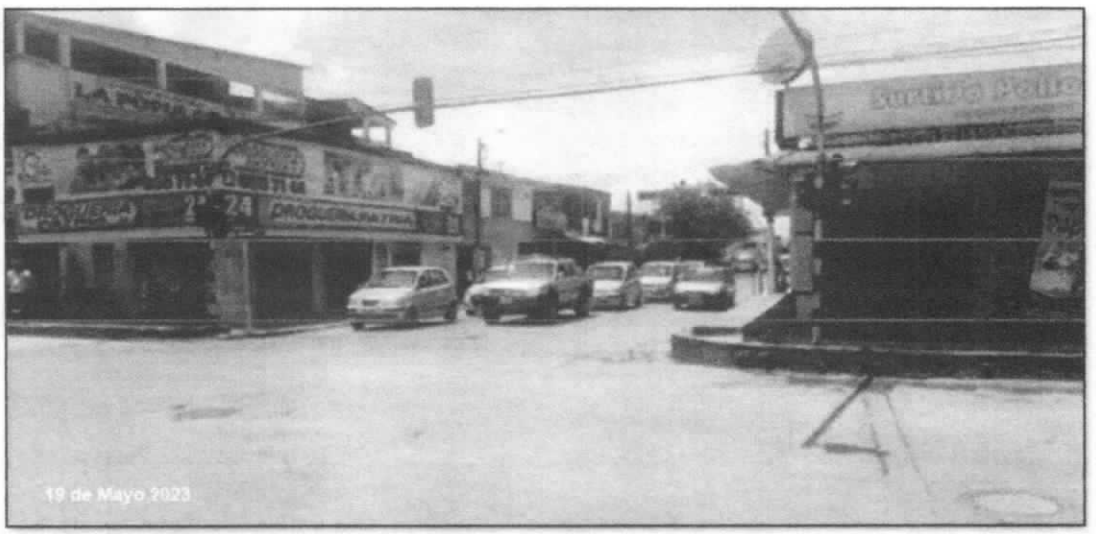


Ilustración 7 Registro Fotográfico Calle 25

8. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO

La responsabilidad de la obra está a cargo de las siguientes instituciones y personas:

PROYECTO	Construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta.
CONTRATO	**N° 106 DE 2023**
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto de Deporte y Recreación del Meta
REPRESENTANTE LEGAL:	Fabián Hernán Gonzalo Torres Carrillo –director general director@idermet.gov.co
CONTRATISTA:	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
DIRECTOR DE OBRA	ING. YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO direccion.escenariosdeportivos@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON HENRY ORTIZ GARCIA

Tabla 2 Información legal del proyecto

9. ATENCIÓN A USUARIOS Y HABITANTES DE LA ZONA

El Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023 como contratista del proyecto **'construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta',** tendrá a disposición de la ciudadanía los medios necesariospara recibir quejas, reclamos y sugerencias como estrategia de veeduría, así mismo recibiráa representantes comunitarios, comerciantes, residentes y otros para atender sus quejas, reclamos y sugerencias en cuanto al Plan de Manejo de Transito implementado.

En la atención a la comunidad y cualquier persona se atenderá en la siguiente dirección carrera 16 N 24-2 a 24-58, villa olímpica, en el cual se seguirá el siguiente proceso:

1. Recibir, registrar e iniciar el proceso de atención de quejas y reclamos, informando al reclamante cómo se atenderá su solicitud.

2. Dar solución a cualquier inquietud.

3. Hacer seguimiento a la ejecución de la respuesta o acción necesaria para atender laqueja o reclamo.

4. Informar al solicitante sobre la respuesta o acción llevada a cabo para atender la quejao reclamo.

10. PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

La ejecución del plan de manejo de tránsito de la **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta,** se realiza de acuerdo con la viabilidad otorgada por la secretaria de Movilidad de la Alcaldía Municipal de Villavicencio-Meta, mediante oficio **1703-19.18/0680 del 17 de MAYO DE 2023** y lo emanado en la resolución No.1885 de 2015 "Manual de Señalización adoptado por el Ministerio del Transporte".

Mediante esta resolución se da inicio a la implementación del plan de manejo de tránsito del **Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023**.

Una vez aprobado el Plan de Manejo de Tránsito por las autoridades y entidades competentes, se procederá a realizar su implementación en la zona de obra.

El ingeniero residente de la obra supervisará la correcta implementación del PMT aprobado por la Secretaría de Movilidad y en caso de ser necesario realizarán ajustes o retroalimentaciones al Plan de Manejo de Tránsito. El grupo constructor será encargado de realizar labores de revisión, limpieza, reposición, recuperación y arreglo de las señales viables a volver a instalar.

10.1 Información y divulgación del plan de manejo de tránsito

La divulgación e información del plan de manejo de tránsito, se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra y será responsabilidad del componente ambiental del mismo.

- Mensajes informativos y de sensibilización hacia la obra y colaboración de la ciudadanía, donde se informa sobre la duración y tipo de obra, desvíos y precauciones a tomar.

- La información al usuario durante este periodo de ambientación, se realiza a través de acciones de prevención y mitigación por la construcción de las obras, ambientando a la población acerca de los beneficios que conlleva la construcciónde la misma.

- Antes de iniciar las obras, se le debe informar a la comunidad sobre el proyecto,su proceso, la duración de la construcción y sus implicaciones, molestias que generará la obra y los beneficios que se obtendrán con la construcción del proyectopor parte de la concesionaria.

- Se indica de manera clara los desvíos y precauciones a tomar.

- Instalación de señalización en torno a lo implementado en el PMT.

10.2 Atención vecinos y usuarios

El Consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023, responsable de la obra pondrá a disposición de laciudadanía los medios necesarios para recibir las quejas, reclamos y sugerencias como estrategia de veeduría.

El consorcio recibirá a representantes comunitarios, comerciantes, residentes y otros para atender sus quejas, reclamos y sugerencias en cuanto al plan de manejo de tránsito implementado.

En la atención a la comunidad y cualquier persona, se seguirá el siguiente proceso:

- Recibir, registrar e iniciar el proceso de atención de quejas y reclamos, informando al reclamante cómo se atenderá su solicitud.

- Remitir a la dependencia interna del constructor o a la entidad oficial a que corresponda, el formato de registro de la queja.

- Hacer seguimiento a la ejecución de la respuesta o acción necesaria para atenderla queja o reclamo.

- Informar al solicitante sobre la respuesta o acción llevada a cabo para atender la queja o reclamo.

- Difundir a través de las organizaciones locales a los municipios del Área de Influencia Directa las respuestas y acciones ejecutadas para atender quejas y reclamos de la comunidad.

- El Consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023, a través de la oficina destinada para tal efecto, gestionará la cantidad y ubicación de los buzones de sugerencias para aquellas personas que quieran presentar sus inquietudes por escrito, generando así un canal de comunicación directo. La difusión de estos, será responsabilidad del consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023.

10.3 Medios de difusión a utilizar.

La gestión Comunitaria es parte integral del proyecto y tiene como objetivo principal el de fortalecer y conservar las relaciones con las comunidades directamente afectadas relacionadas con la ejecución del proyecto, a través de los mecanismos de información, atención a emergencias y eventual resolución de conflictos.

De forma previa a la iniciación de los trabajos se dará a conocer el proyecto a la comunidad afectada de acuerdo con los criterios establecidos por la Oficina de Gestión Social de Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023, informando los horarios de trabajo y coordinando los horarios de acceso a los parqueaderos de las viviendas en la zona, será divulgado por medio de Volantes informativos a la población del área de Influencia de la ciudad de Villavicencio.

10.4 Quejas y reclamos

En el consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023, hasta la fecha no se han presentado quejas o reclamos por parte del personal aledaño a la obra, sin embargo, el consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023 está a disposición de la población para atender cualquier inconformidad.

10.5 Implementación del plan manejo de tránsito

El plan de manejo de tránsito se implementará de la siguiente manera:

- Si bien no se realizarán obras de rehabilitación de calzada vehicular y por consiguiente no se efectuarán cierres parciales ni totales de ninguna vía, en la zona de obra se dispondrá de un cerramiento en poli sombra, poli malla y/o dispositivos canalizadores (colombinas y cinta plástica), así como de la señalización indicada en los planos de diseño de los PMT anexos a este documento técnico.

- Para la etapa de suministro de material y/o cargue de escombros producto de la obra, se efectuará este procedimiento al interior del predio; es decir, dentro del lote objeto de intervención, con lo cual no se afectará el normal comportamiento del tránsito en la zona de influencia de la obra.

- Existen en la zona de la obra, presencia de rutas de transporte público colectivo urbano, las mismas no se verán afectadas.

- No se realizarán desvíos con ocasión de las obras a desarrollar.

- Las labores no implican afectación de andenes y en el lugar de las obras no existe infraestructura para bici usuarios: no obstante, se cuenta con una zona de aproximadamente 2.00 mts de espacio público, las cuales serán destinadas para la conformación de senderos peatonales.

- El cargue y descargue del material se realizará directamente dentro de la zona de obra, sin tener afectación a vías aledañas, de tal manera que se retire el material periódicamente en horas valle. Se contará con un auxiliar de tránsito para controlar la entrada y la salida al predio de los vehículos de cargue y descargue del material de obra.

- Para el manejo y disposición de escombros y desechos de construcción se tendrá en cuenta lo dispuesto en el decreto municipal 254 de 2012. Para el manejo y disposición de escombros y desechos de construcción se tendrá en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente.

- La disposición de material resultante de demolición se realizará en las instalaciones del sector Guatiquia.

- Las disposiciones de material sobrante proveniente de las excavaciones se realizarán en un predio privado.

- Disponibilidad de celulares y radios para la comunicación en los extremos de la obra.

- Disponibilidad del área HSEQ.

- Rotulación de volquetas con la aprobación del PMT.

- Inicio de actividades Implementado el plan de manejo de tránsito, se realizarán los ajustes que se exijan en terreno, de acuerdo con las condiciones operacionales del momento, por parte del Contratista y la Interventoría.

11. ACTIVIDADES DE OBRA EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023

En el periodo correspondiente al mes de octubre se realizaron las siguientes actividades en la obra **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta.**

- Mantenimiento preventivo de las señales de tránsito para el ingreso y salida de volquetas y vehículos en general de la obra, con el fin de que la población aledaña tenga presente que entran y salen vehículos de carga continuamente.

- Ajuste y adecuación de la lona que fue instalada como cerramiento de obra, en la zona de cancha auxiliar y la entrada principal.

- Dentro de obra se verifica constantemente el mantenimiento de señalización de medidas preventivas, con el fin de prevenir algún tipo de accidente del personal trabajador del proyecto.

- Se les socializa la importancia de las señales de tránsito.

- Supervisión por parte del área SST en la implementación del plan de manejo de tránsito, supervisión por parte de interventoría, verificando el cumplimiento a la implementación y funcionamiento del PMT.

- Se inician actividades con respecto a la extracción de material sobrante de los escenarios deportivos antiguos tales como taekwondo, voleibol, lucha, gimnasia, boxeo y levantamiento de pesas, a la fecha 31 de octubre no se ha terminado con la extracción de material.

- El ingreso de volquetas con material de relleno, se realiza de manera diaria, con el fin de tener suministro para el relleno de la cimentación de los escenarios nuevos que se van a realizar.

- Se inician extracción de material de excavación sobrante a medida que la zona va dando el espacio.

- Se verifica el Ingreso de vehículos propios de la obra, automóviles motocicletas y ciclas.

- Revisión documental de las volquetas y del operador que cuente con la seguridad social vigente.

- Control estricto de ingreso para todos los vehículos que ingresan a la obra.

- Rotulación de las volquetas con el numero de aprobación del PMT.

- Socialización del plato y ruta del PMT

- Se implementan medidas de orden y aseo en la parte de portería y las calles aledañas, ya que las volquetas dejan residuos que debemos limpiar para no ocasionar algún accidente en la vía.

- Se realizan charlas de seguridad y salud en el trabajo a los conductores de las volquetas, para concientizarlos de las medidas preventivas del cargue y descargue de material y la importancia de la inteligencia vial.

11.1 Instalación de señalización PMT.

Se realizo la instalación de señalización fuera y dentro de la obra con el fin de que los conductores tengan cuidado a la hora de entrar con sus respectivo cargue de material, se instala a las afueras de la obra la señalización reglamentaria para el ingreso vehicular entrante a la obra, así mismo en la entrada la obra se cuenta con el personal idóneo el cual realiza control de ingreso a cada uno de los conductores.

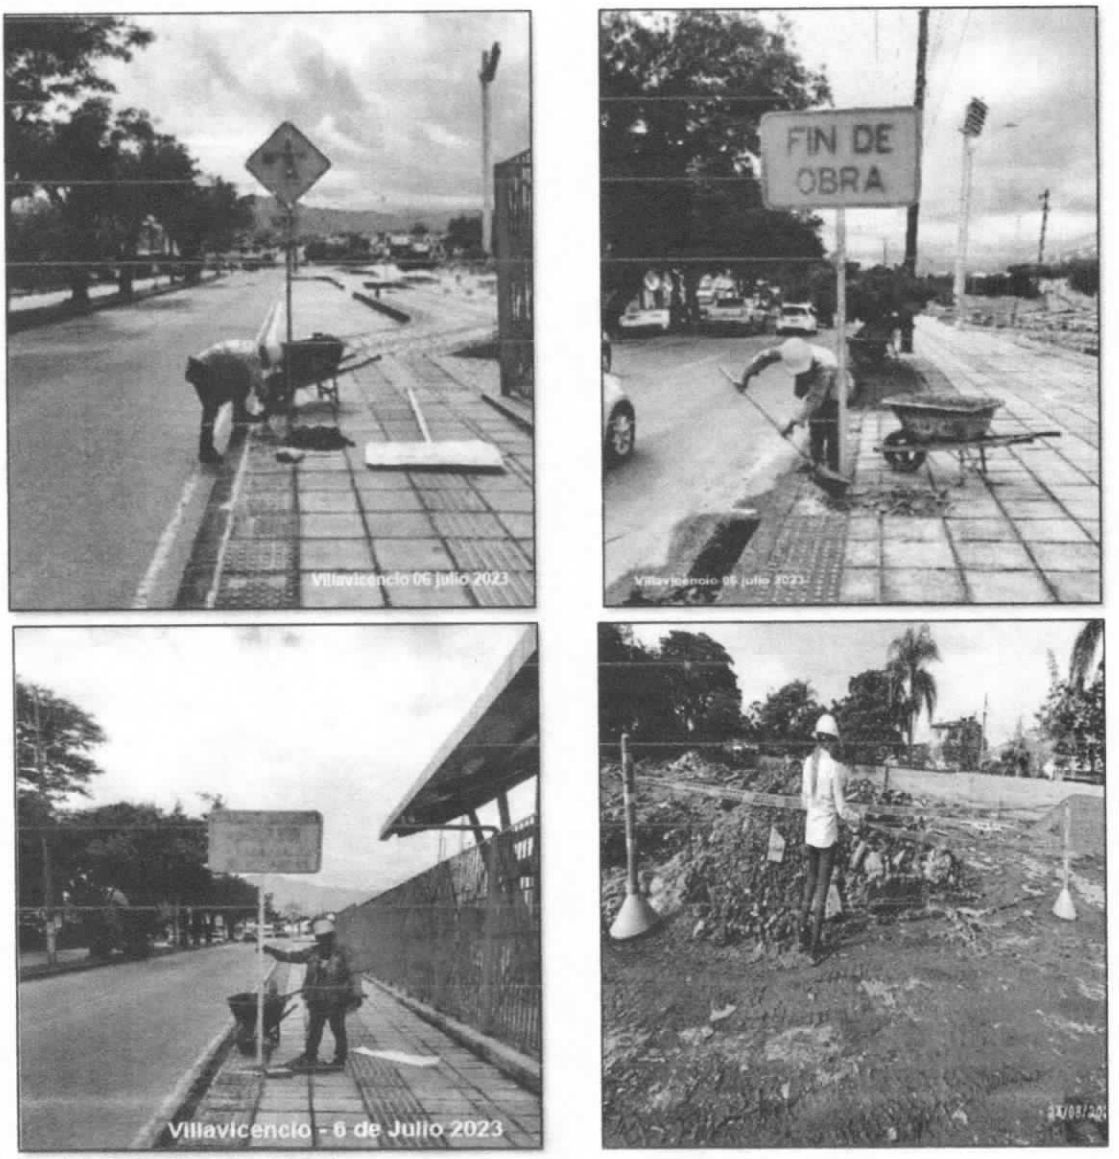


Ilustración 8 Señalización del PM

11.2 Supervisión por parte del consorcio

En obra se realiza de manera diaria la supervisión por parte del consorcio en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.



Ilustración 9 Supervisión por parte del área de sst

11.3 Charlas de seguridad a trabajadores

Diariamente se realizan charlas de seguridad a todo el personal trabajador de la obra con el fin de concientizar a los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial.

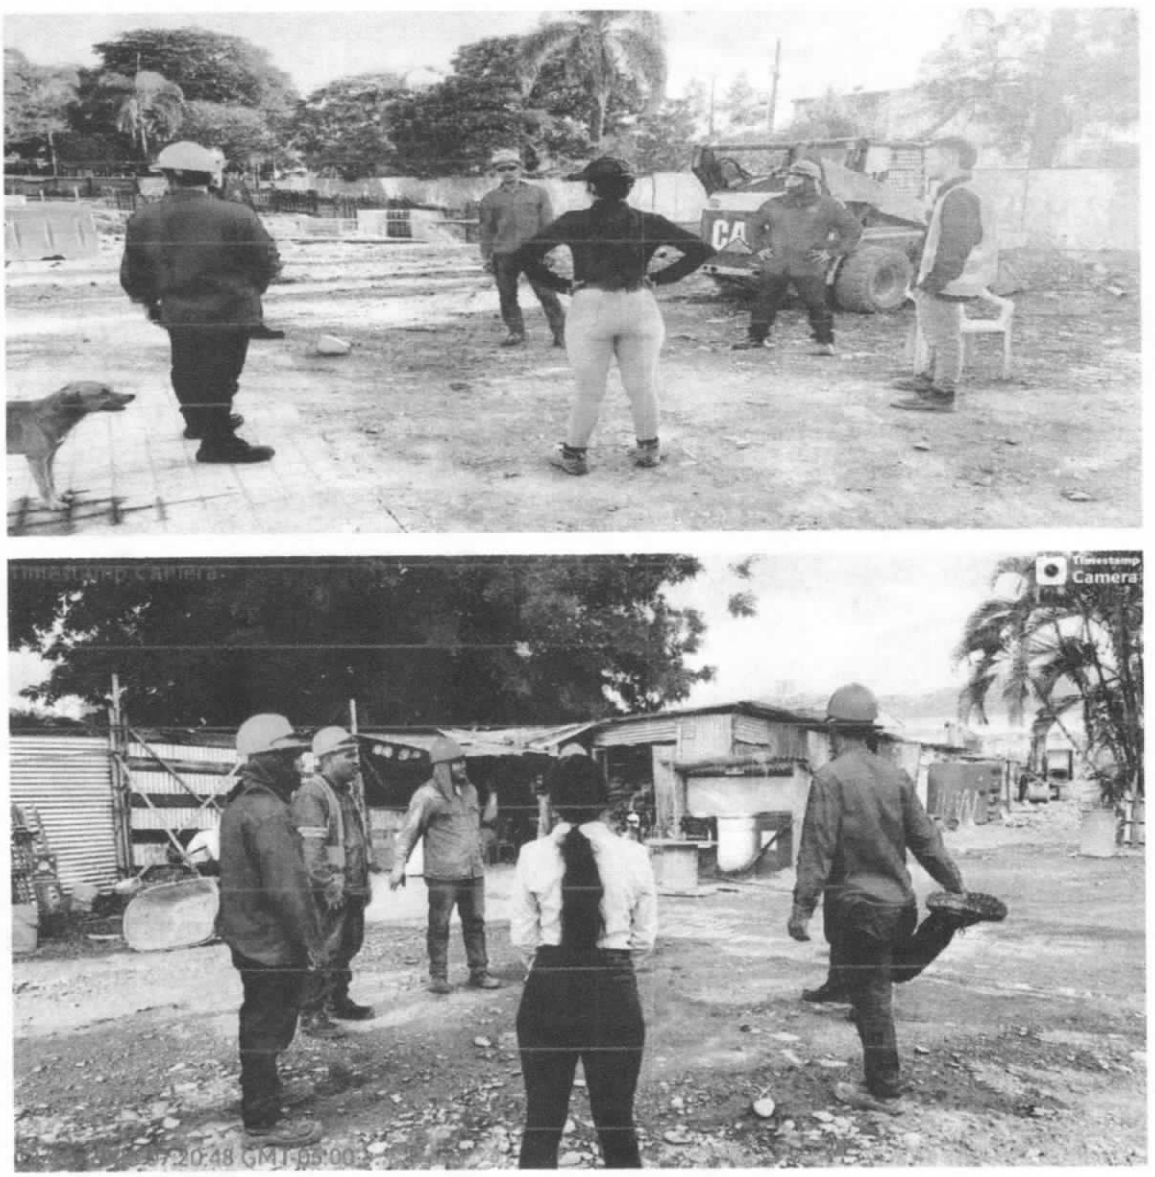


Ilustración 10 Charlas de seguridad

11.4 Mantenimiento de señalización en obra

Se verifica que la lona instalada en el cerramiento de la obra esté en buenascondiciones y así garantizar el paso a solo personal de la obra.

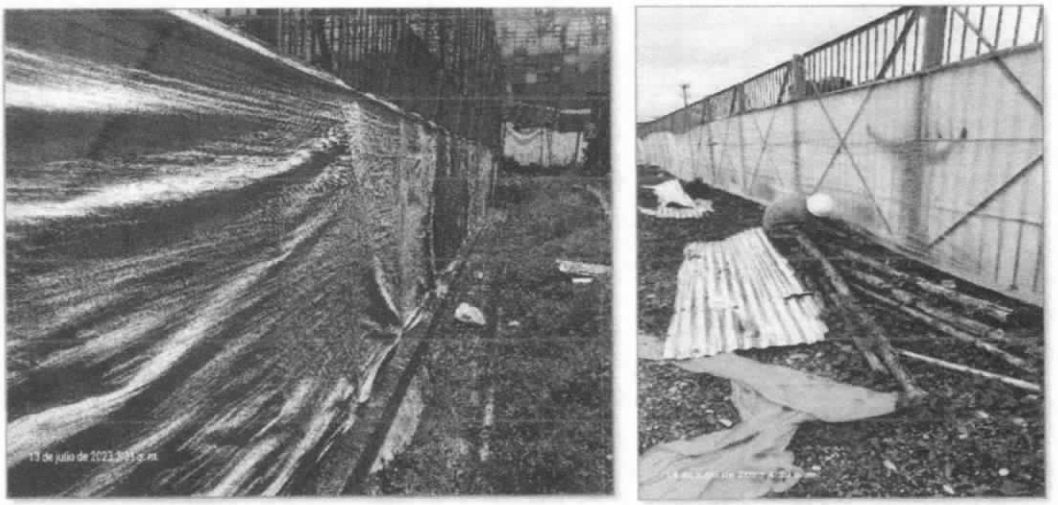


Ilustración 11 Mantenimiento de la señalización

11.5 Puntos de emergencia y ecológicos en obra

En la obra se cuenta con 3 puntos de emergencia y puntos ecológicos ubicados en zonas donde se están ejecutando actividades en caso de un accidente, así mismo el consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023, tiene conformada por 4 personas, una brigada integral de emergencia, en caso de alguna eventualidad que se llegue a presentar en la obra.

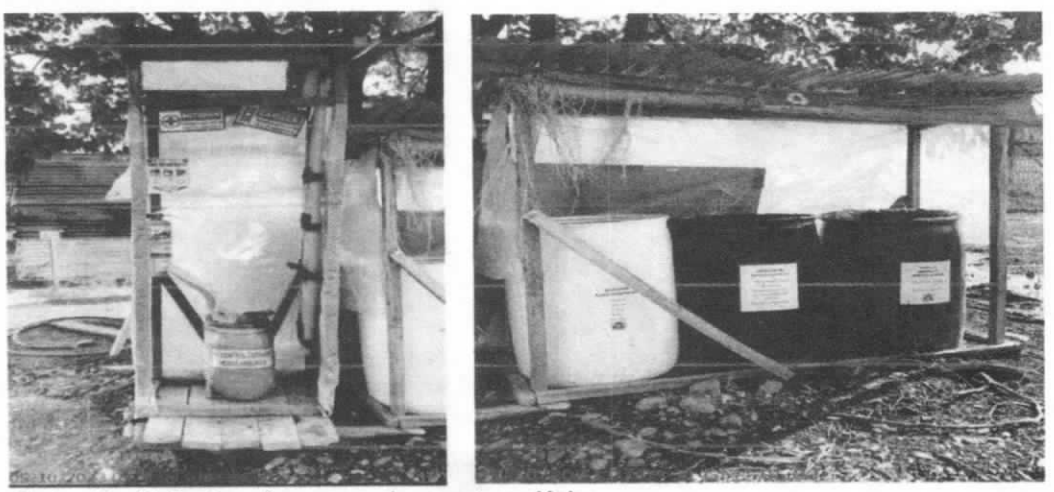



Ilustración 12 Equipos de emergencia y punto ecológico


12. DISPONIBILIDAD E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA EL PMT

Se cuenta con la señalización reglamentaria para el ingreso y salida de los vehículos, se instala señalización en puntos estratégicos fuera de la obra en torno a lo autorizado en el PMT, así mismo se cuenta con el personal idóneo para la ejecución de la labor.

12.1 Características de la señalización.

La señalización implementada garantiza que la información sea clara a los usuarios de la vía y los conductores en la zona interna de la obra.

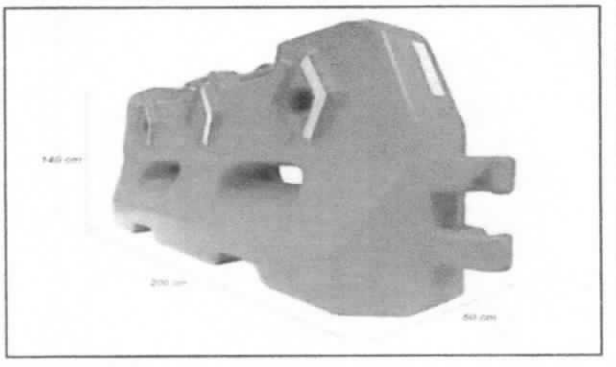

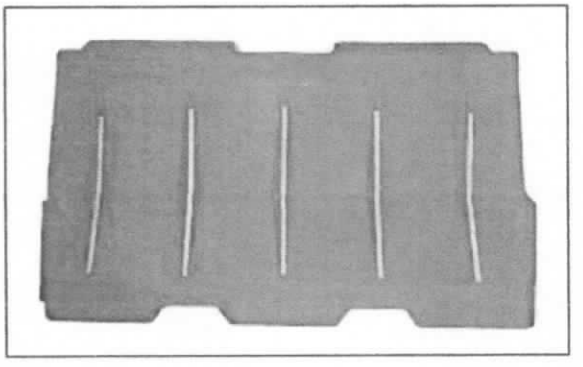

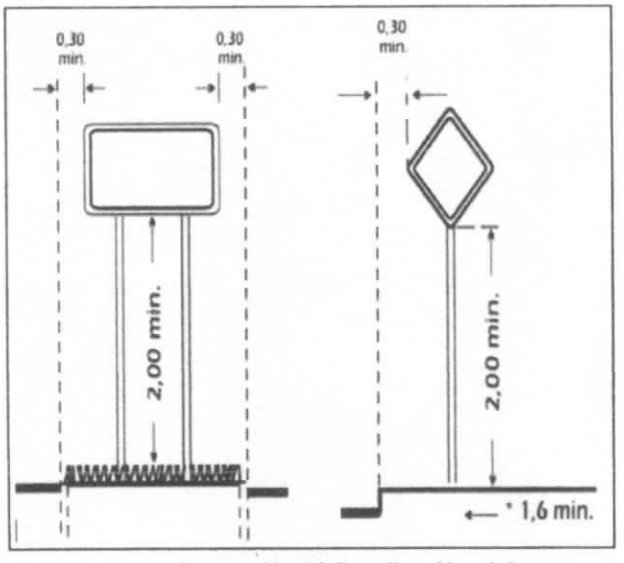




Ilustración 13 Señalización vial

12.2 Equipo y maquinaria

La maquinaria para la correcta ejecución de la obra, consta principalmente de:

- Volquetas.
- Minicargador
- Grua Ph.
- Retroexcavadora.
- Herramientas Básicas y equipos de construcción.

Esporádicamente ingresan a obra vehículos de carga pesada, tractomulas y camiones por parte de los contratistas.



Ilustración 14 Maquinaria en obra

12.3 Señalización informativa de obra.


Corresponde a señales informativas de entrada y salida de volquetas, fin de obra y paletero, que se ubicarán cada 50 metros de distancia desde el punto donde se ubica la última señal, en ambos costados, informando sobre la precaución de paso vehicular existente, en forma general para la ejecución de la labor.



Ilustración 15 Señalización instalada en obra

13. COORDINACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL PLAN (PMT).

La obra de **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta,** cuenta con persona de seguridad y salud en el trabajo, quien es la encargada de la supervisión de las actividades realizadas en la obra, así mismo se cuenta con una persona certificada en seguridad vial a quien se le designa roles para las actividades del manejo de tránsito en la obra al momento de la circulación de peatones y vehículos.

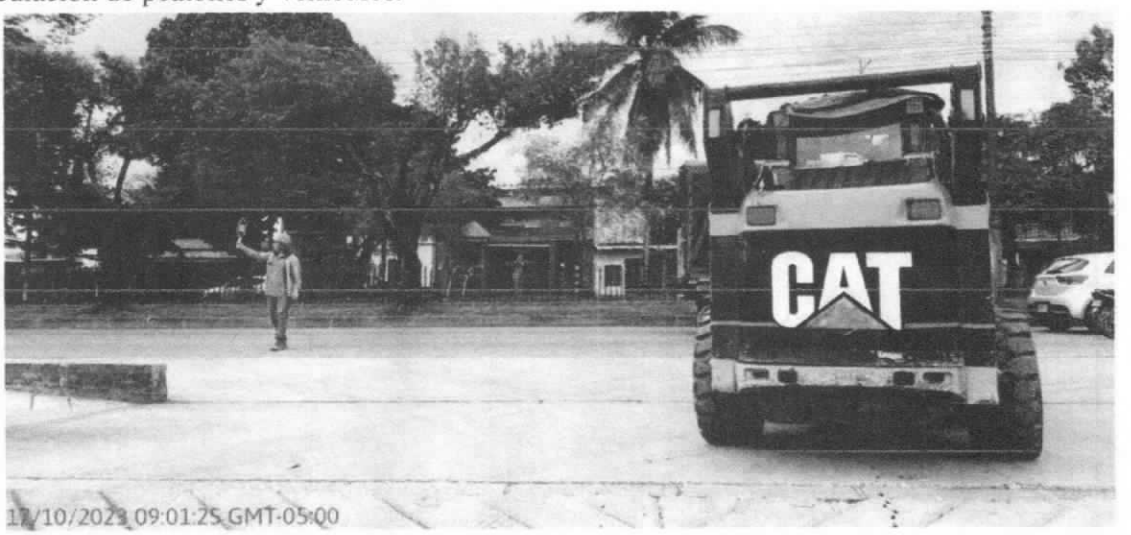



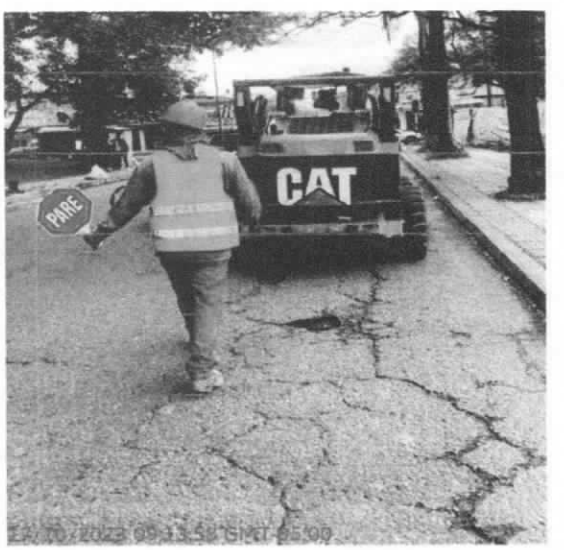


Ilustración 16 personal de apoyo vial

14. SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.

El plan de manejo de tránsito es supervisado por el director de obra, Ing. Yeison Esneider Gómez Guerrero, quien es el encargado de la supervisión y ejecución de las actividades que se realizan a diario, así mismo es supervisado por el ingeniero residente y a su vez por la persona encargada del área de seguridad y salud en el trabajo del consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023.



Ilustración 17 Supervisión en obra

Elaboro: Ing. Yeison Esneider Gómez Guerrero
Director de Obra

15. CONCLUSIONES

- No se presentaron accidentes o incidentes en la obra en este periodo del mes de octubre del 2023
- La implantación del PMT es supervisado por el director de obra quien es el encargado de dirigir la obra, así mismo es supervisado por la interventoría quien está muy pendiente de todo lo relacionado con vehículos y maquinaria pesada que entra a obra.
- En el mes de octubre se contó un ingreso moderado de vehículos y maquinaria, ya que la obra se encuentra en una etapa de extracción de material sobrantes.
- Se cuenta con la bitácora diaria correspondientes al mes de octubre del 2023.
- Se encuentran rotuladas con la aprobación del PMT, todas las volquetas que prestan el servicio de cargue y descargue de material en obra.
- Se realiza limpieza del sobrante de material en las vías de manera diaria.

16. ANEXOS

- 1703-F-Mov-11-V1 Formato Registro Bitácora PMT octubre 2023
- 1703-F-Mov-11-V1 Formato de Evaluación Plan de Manejo de Transito Señalización y Desvíos octubre 2023 (1-07AL31-07)

10.474


Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

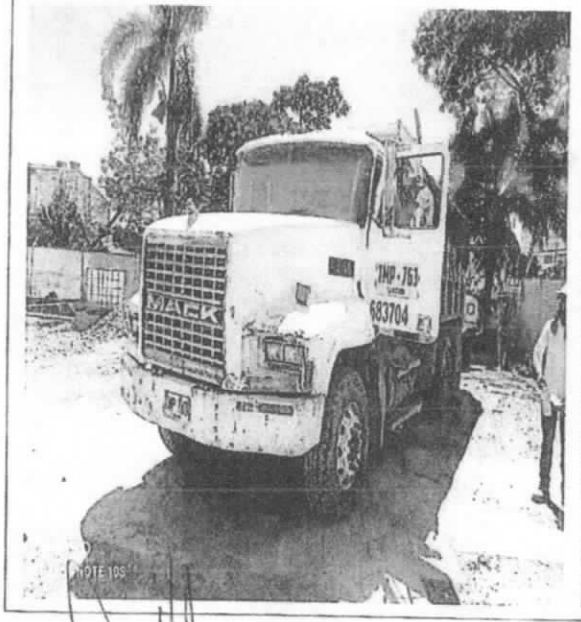



FIRMA RESIDENTE

LAURA BLANCO
FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

10.480

Municipio de Villavicencio


Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



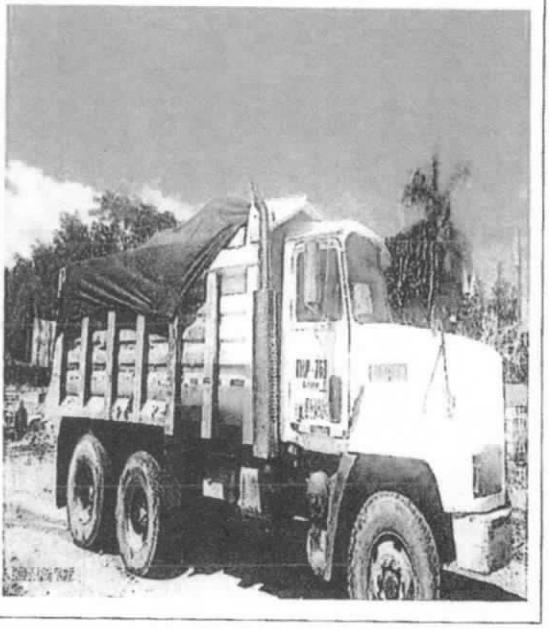

FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ


Municipio de Villavicencio


Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

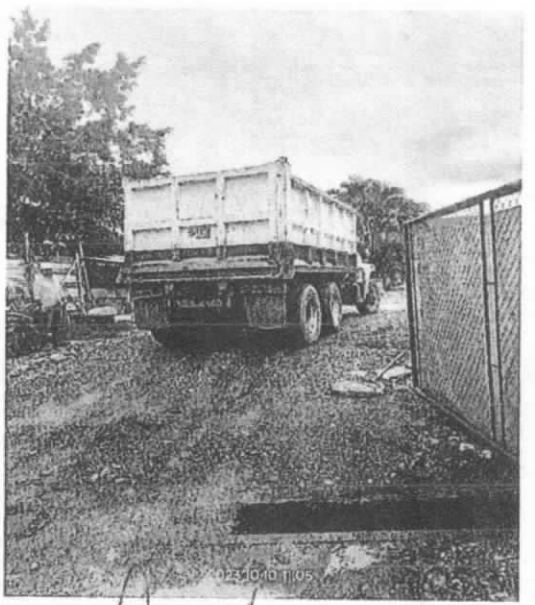

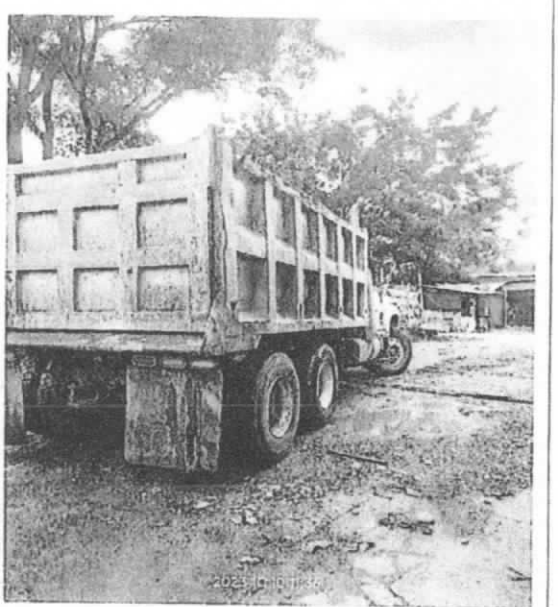

FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio


Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



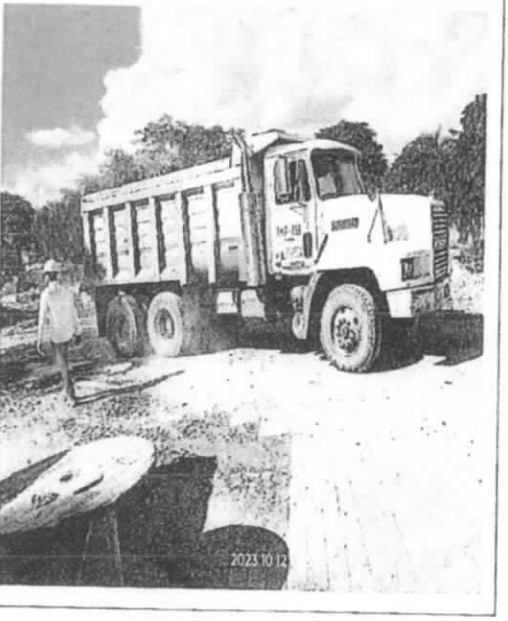

FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

10.481

Municipio de Villavicencio


Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



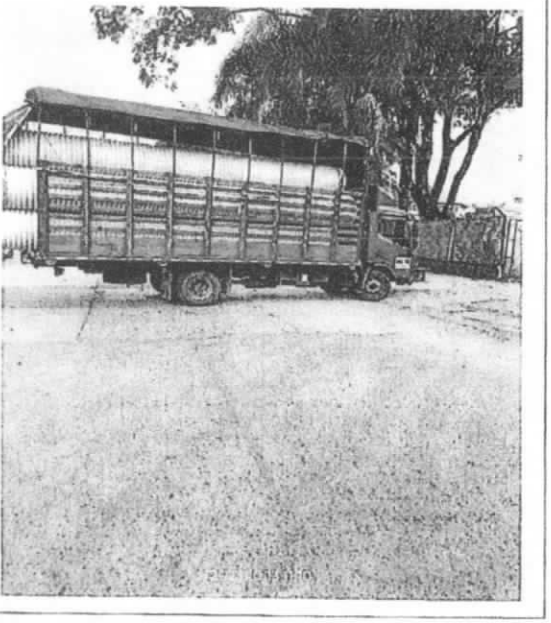

FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio


Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



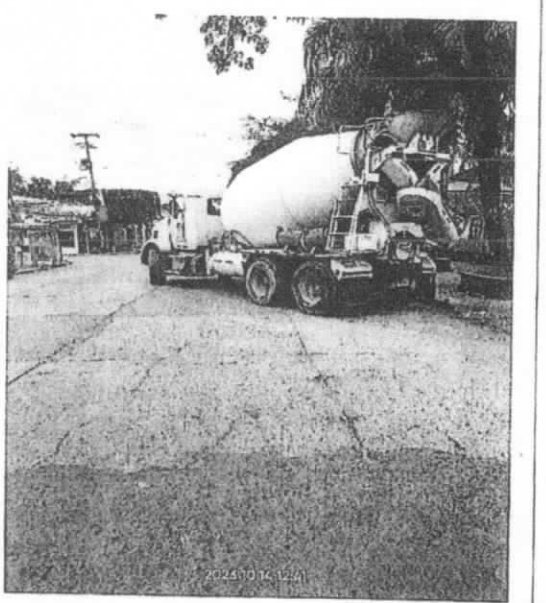

FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

10.486

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 17 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE

Laura Bravo
FIRMA HSEQ

10.487

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 20 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

10.490

Municipio de Villavicencio


Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



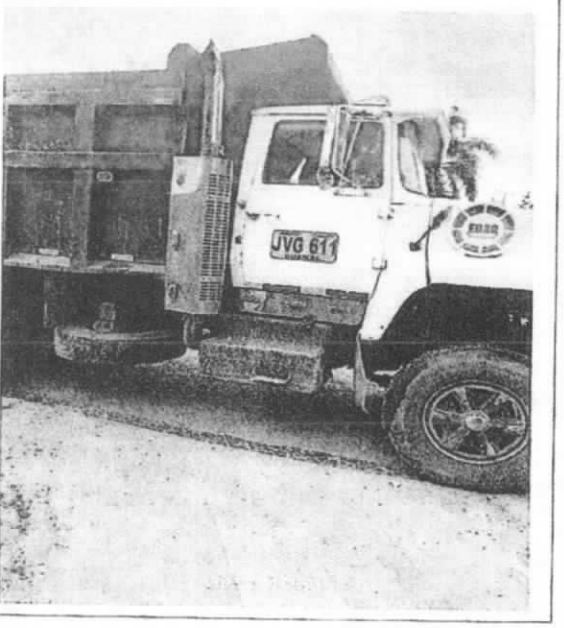

FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

10.491

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE

Laura Bravo
FIRMA HSEQ

10.493

Municipio de Villavicencio


Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 25 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



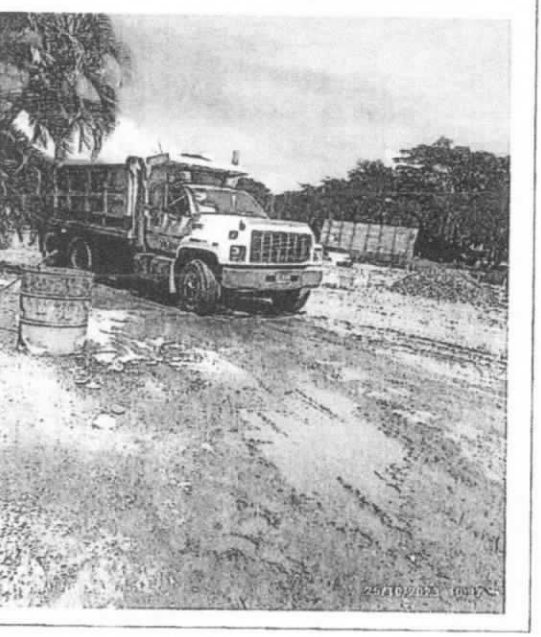

FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ


Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

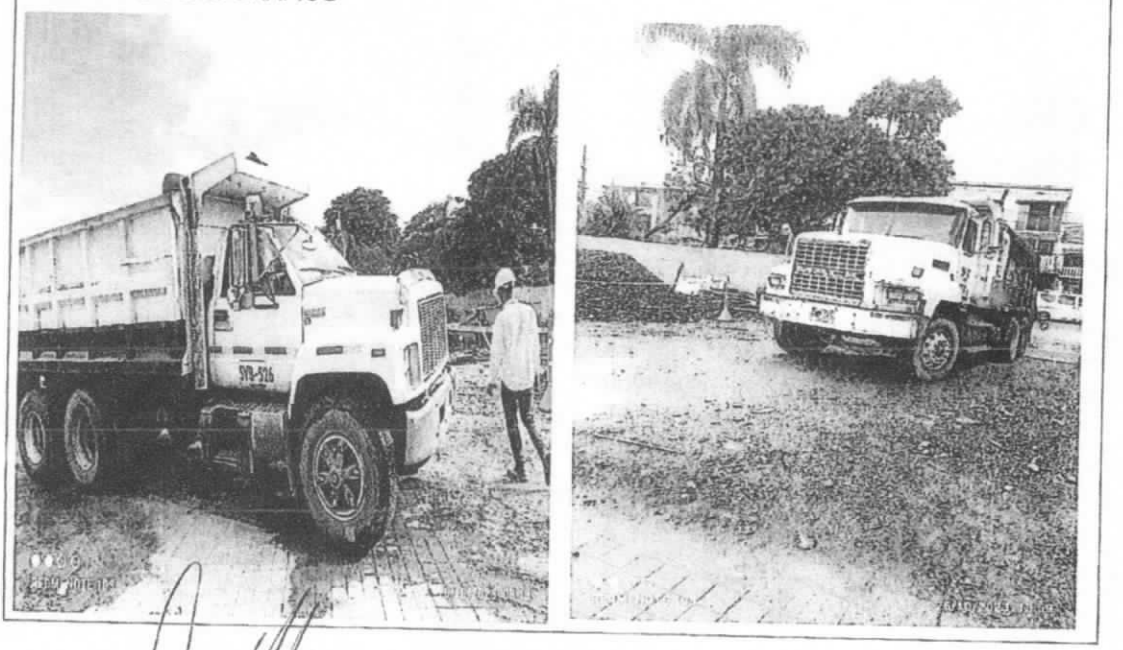

FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua el ingreso de relleno y extracción del material proveniente de la pista de patinaje y escenarios.	

FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE

LAURA BRAVO
FIRMA HSEQ

10.496

CALIFICACIÓN MENSUAL DE TRÁNSITO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/10/2023 AL 31/10/2023

ITEM	PARÁMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	100%	90%	50%	0%	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	**Señalización Vertical y Dispositivos**						
	Pasacalles					X	
	Señales Reglamentarias	100%					
	Señales Preventivas	100%					
	Señales Informativas	100%					SEÑALIZACION CARRERA 18
	Señalización luminosa					X	
	Canalizaciones (Cintas, delineadores tubulares, maletines, etc.)	100%					SE INSTALO CINTA REFLECTIVA DENTRO DE LA OBRA
	Barricadas					X	NO HAY INTERVENCIÓN EN LA VIA
	Señalización Horizontal						
	Separación de Carriles					X	
	Paraderos					X	
	Pasos peatonales y lineas de pare					X	
	Vias de desvio					X	
2	**Manejo Peatonal**						
	Señales Informativas	100%					SEÑALIZACION CARRERA 18 NUEVA
	Canalización de Senderos					X	ZONA PEATONAL HABILITADA
	Adecuación de rampas					X	
	Adecuación superficie zonas peatonales	100%					
	Adecuación Paraderos					X	
	Adecuación superficie Paraderos					X	
	Iluminación					X	
3	**Estado de las vías**						
	Corredor a Intervenir					X	EL PROYECTO NO INTERVIENE NINGUN CORREDOR
	Vias de desvio					X	EL PROYECTO NO INTERVIENE NINGUNA VIA
4	**Manejo de Intersecciones o intercambiadores**						
	Tiempo de ejecución (duración)	100%					12 MESES
	Implementación del PMT correspondiente	100%					
5	**Cumplimiento de Parámetros de Tránsito**						
	Velocidad					X	
	Accidentalidad					X	
6	**Cumplimiento de compromisos**						
	Cumplimientos de compromisos	100%					
7	**Tiempos de vigencia de los PMT**						
	Tiempos de vigencia de los PMT	100%					6 MESES
8	**Personal asignado al PMT**						
	Personal profesional	100%					
	Auxiliares de Tránsito	100%					VIALISTAS APOYO ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS Y VOLQUETAS
	Brigada de Mantenimiento	100%					
	Asistencia y participación en los Comités de Tránsito					X	
9	**Informes Mensuales de Tránsito**						
	Entrega puntual	100%					
10	**Inconformidades al PMT**						
	Número de Soluciones dadas / Quejas recibidas	100%					
	CALIFICACIÓN MENSUAL	90%	0%	0%	0%		

PERIODO EVALUADO: 1 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

ING LEONEL ROA RUIZ
INTERVENTORÍA

ING YEISON ESNEIDER GOMEZ
CONTRATISTA

10.497

1. Señalización: Para efectos de la evaluación del cumplimiento del Contratista en cuanto a la señalización que debe disponer de acuerdo con lo señalado en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, se entenderá que una señal (sea esta vertical u horizontal) es considerada para efectos de este numeral como efectivamente ejecutada, cuando cumple con las características físicas señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos y cuando se encuentra dispuesta durante el tiempo allí señalado.

Esta evaluación se debe aplicar a cada nivel de señalización y demarcación en forma independiente.
La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:

- Si el Contratista ejecuta el 100% de las actividades señaladas en el Plan de manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 100%.

- Si el Contratista ejecuta menos del 100%, pero más del 90% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 90%.

- Si el Contratista ejecuta menos del 90%, pero más del 70% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 50%.

- Si el Contratista ejecuta el 70% o menos de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 0%.

2. Manejo Peatonal: Para efectos de la evaluación del cumplimiento en cuanto al manejo peatonal, que debe realizar y mantener el contratista, se entenderá que el manejo peatonal ha sido efectivamente ejecutado cuando los senderos peatonales han sido debidamente implementados conforme al Plan de Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos.

La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:
- Si el Contratista ejecuta el 100% de las actividades de manejo peatonal señaladas en el Plan de manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 100%.

- Si el Contratista ejecuta menos del 100%, pero más del 90% de las actividades de manejo peatonal señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 90%.

- Si el Contratista ejecuta menos del 90%, pero más del 70% de las actividades de manejo peatonal señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 50%.

- Si el Contratista ejecuta el 70% o menos de las actividades de manejo peatonal señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 0%.

3. Estado de las vías:
Para efectos de la evaluación del Contratista en cuanto al estado de condición de las vías, sobre el corredor y las vías utilizadas como desvío, se efectuará la siguiente evaluación:

- Si, durante el mes correspondiente, todo el corredor y todas las vías utilizadas como desvíos se encuentran en buen estado, la calificación del Contratista será del 100%.

- Si, durante el mes correspondiente, menos del 100% pero más del 90% del corredor y las vías utilizadas como desvíos se encuentran en buen estado, la calificación del Contratista será del 90%

- Si, durante el mes correspondiente, menos del 90% pero más del 70% del corredor y las vías utilizadas como desvíos se encuentran en buen estado, la calificación del Contratista será del 50%.

- Si, durante el mes correspondiente, el 70% o menos del corredor y las vías utilizadas como desvíos se encuentran en buen estado, la calificación del Contratista será del 0%.

4. Manejo de Intersecciones e Intercambiadores:
Se evalúa el cumplimiento del Contratista en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos para las intersecciones e intercambiadores en las cuales se ejecutaron Obras de Construcción durante el mes correspondiente con las condiciones de tiempo, horario, forma, indicadas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos.

La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:

- Si el Contratista ejecuta el 100% de las actividades señaladas en el Plan de manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 100%.

- Si el Contratista ejecuta menos del 100%, pero más del 90% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 90%.

- Si el Contratista ejecuta menos del 90%, pero más del 70% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 50%.

- Si el Contratista ejecuta el 70% o menos de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 0%.

10498

5. Cumplimiento de los parámetros de control de Tránsito:
El cumplimiento de los parámetros de control de Tránsito se calificará si o no, es decir que en caso de no alcanzar los valores acordados se dará por no cumplido y la calificación será 0%, en caso contrario sera 100%.

El cumplimiento de los parámetros del tránsito se dará teniendo en cuenta los indicadores fijados en la construcción de la línea base.

6. Cumplimiento de Compromisos: Como resultado de los comités semanales de seguimiento del PMT, se acordarán acciones concretas a seguir por el Contratista, dichas actividades se consignarán en las actas precisando los alcances y tiempos para su ejecución. Estos compromisos serán evaluados si se cumplieron o no, con 100% para el cumplimiento y 0% para el caso contrario.

7. Tiempos de vigencia de los PMT: Los PMT se aprueban con una vigencia establecida por el contratista, por lo tanto, se tendrá en cuneta su cumplimiento. Estos compromisos serán evaluados si se cumplieron o no, con 100% para el cumplimiento y 0% para el caso contrario.

8. Personal asignado al Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos:
Del personal profesional y de apoyo con que debe contar el contratista, se evalúa su efectiva disponibilidad, la asistencia a los comités de Tránsito (de acuerdo a la periodicidad establecida con la SMV mediante acta), su presencia en la vía y su dotación.

- Si el personal del Contratista cumple el 100% en asistencia, disponibilidad, cumplimiento y dotación, el Contratista recibirá una calificación del 100%.

- Si el personal del Contratista cumple en menos del 100%, pero más del 90% en asistencia, disponibilidad, cumplimiento y dotación, el Contratista recibirá una calificación del 90%.

- Si el personal del Contratista cumple en menos del 90%, pero más del 70% en asistencia, disponibilidad, cumplimiento y dotación, el Contratista recibirá una calificación del 50%.

- Si el personal del Contratista cumple el 70% o menos en asistencia, disponiblilidad, cumplimiento y dotación, el Contratista recibirá una calificación del 0%.

9. Informes mensuales de Tránsito

Se evalúa la entrega y contenido de los informes de seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, lo cual debe realizarse dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes y debe contener los diferentes aspectos planeados.

- 100% si el informe ha sido entregado a tiempo y su contenido cumple con el 100% de lo solicitado.

- 50% si el informe ha sido entregado entre los 11 y 15 días del mes o su contenido cumple entre el 70% y el 100% de lo solicitado.

- 0% si el informe ha sido entregado después del día 15 o si, aún entregado a tiempo, su contenido no cumple con, por lo menos el 70% de lo solicitado

10. Inconformidades al PMT

Se entenderán como inconformidades al PMT, las manifestaciones que en tal sentido formulen las comunidades y/o usuarios o en forma directa a la SMV . En igual sentido se considerarán favorablemente las soluciones que el Contratista tome en forma directa para atender las inconformidades recibidas. Para la parametrización de la calificación se tomarán en consideración, en porcentaje, el número de soluciones dadas sobre el número de quejas presentadas, teniendo en cuenta la siguiente fórmula

(Soluciones dadas/quejas recibidas) x 100
- Si el procentaje del producto de esta fórmula está entre el 100% y el 91% tendrá una calificación de 100%.
- Si se encuentra entre el 90% y el 71% tendrá una calificación de 90%.
- Si se encuentra entre el 70% y el 49% tendrá una calificación del 50%
- Si es inferior al 49% tendrá una calificación de 0%.

CAUSALES DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS DEL CONTRATISTA.
La SMV podrá imponer las multas señaladas en la Cláusula de la minuta del Contrato MULTAS y por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el PMT, cuando el Contratista, entre otras:
1. No alcance la calificación de por lo menos el 80% en las listas de chequeo según la evaluación presentada por la Interventoría en el informe mensual.
2. Incumpla en tres (3) o más periodos mensuales consecutivos uno o varios ítems de las listas de chequeo.
3. Incumpla los requerimientos oficiados por la Interventoría o la SMV, en tres (3) o más ocasiones.

CONTRATO DE OBRA N° 106 DE 2023

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROSPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

INFORME N° 6

PERIODO: 1 al 31 de Octubre

THERLY CONTRERAS PEÑA

INGENIERA AMBIENTAL

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMIPICA 2023

VILLAVIENCENCIO, META

CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN 3
2.OBJETIVO GENERAL 3
2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 3
3.LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
4.SEGUIMIENTO AMBIENTAL 5
4.1. Medio abiótico 5
4.1.1. Programa de manejo y disposición de material sobrante de demolición, excavación y construcción. 5
4.1.2. Programa de manejo adecuado de los materiales de construcción 7
4.1.3 Programa de manejo eficiente del agua y vertimientos 10
4.1.4 Programa de manejo de residuos líquidos domésticos 13
4.1.5 Programa de manejo de residuos sólidos y especiales 13
4.2. Medio Biótico 18
4.2.1. Programa de manejo de remoción de cobertura vegetal, descapote y aprovechamiento forestal 18
4.2.2. Programa de manejo de flora 18
4.2.3. Programa de manejo de fauna 18
4.2.4. Programa de manejo de calidad de aire y ruido 22
4.2.5. Programa de manejo de sustancias químicas 26
4.2.6. Programa de manejo de señalización de la obra 28
4.2.7. Programa de manejo de educación ambiental 31
5.ANEXOS 33

1.INTRODUCCIÓN

La ejecución del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROSPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META",** surge como necesidad, debido a que las condiciones de los escenarios deportivos ya no cuentan con los espacios aptos para el desarrollo de las actividades de las disciplinas deportivas que se practican (Voleibol, gimnasia, taekwondo, lucha, boxeo y levantamiento de pesas); siendo así, se plantean las mejoras para su ejecución.

Siendo así, el Consorcio Escenarios Deportivos villa olímpica 2023 realiza el seguimiento del plan de manejo ambiental (PMA) establecido según las responsabilidades en cada manejo, reportar los inconvenientes y eventualidades que se presenten en el transcurso de la obra; de igual manera, prevenir la generación de impactos ambientales negativos, cumpliendo con lo propuesto en el plan de manejo ambiental.

El presente documento contiene el informe mensual N° 06 del contratista de obra en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre del año 2023.

2.OBJETIVO GENERAL

Hacer seguimiento al plan de manejo ambiental del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROSPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"**, y dar cumplimiento la normatividad ambiental vigente.

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar monitoreos para control de calidad de aire y ruido.
- Instalar puntos ecológicos en el área de influencia del proyecto y mantener la adecuada separación en la fuente de residuos sólidos.
- Tramitar los permisos pertinentes para las actividades ambientales que lo requieran.

3.LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Complejo Deportivo Villa Olímpica se encuentra localizado en la Comuna Número 5 de la ciudad de Villavicencio, la cual está compuesta por los barrios Popular, Dos Mil, Olímpico, Villa Ortiz, Camelias, Cataluña, Bello Horizonte, Nueva Floresta, Estero, Bochica, Macunaima, Ariguani, Vizcaya, Hacaritama, Villa Mélida, Ciudadela San Antonio, Aguas Claras, Danubio, Doña Luz, Remanso, Menegua y Buenos Aires.

El Complejo Deportivo se encuentra en un polígono delimitado de Sur a Norte por la Avenida los Maracos o Carrera 18 y la Calle 25 y de Oriente a Occidente por la Carrera 16 y la Avenida Carrera 19, respectivamente. En la actualidad hay accesibilidad a las instalaciones del Complejo Deportivo por la Calle 25 y la Carrera 16.

La zona donde se está ejecutando la obra del presente seguimiento al PMA, se encuentra ubicada en un polígono delimitado de Sur a Norte por la Avenida los Maracos o Carrera 18 y la Calle 25 y de Oriente a Occidente por la Carrera 16 y la Avenida Carrera 19, respectivamente. En la actualidad hay accesibilidad a las instalaciones del Complejo Deportivo por la Calle 25 y la Carrera 16.

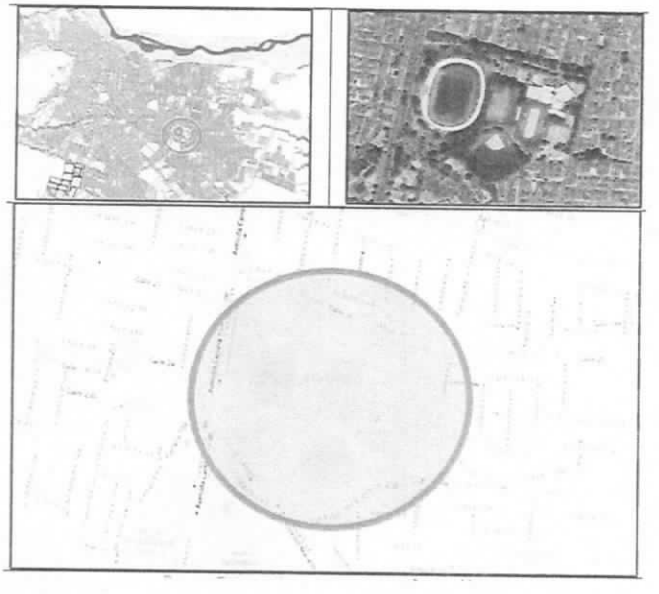


Ilustración 1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

4.SEGUIMIENTO AMBIENTAL

4.1. Medio abiótico

A continuación, se presentan los programas que forman parte del componente abiótico del Plan de Manejo Ambiental en las etapas de construcción y todas las actividades a desarrollar con respecto a lo aplicable de cada ficha de manejo ambiental en el periodo comprendido al presente informe.

Estas actividades se ejecutan con el equipo de Gestión Ambiental, y se presentan con una breve descripción de las operaciones realizados en cada programa de manejo ambiental, donde se relaciona el período evaluado, su respectivo avance o condición actual, y a su vez, se incluye si aplica, el registro fotográfico o anexo documental asociado.

4.1.1. Programa de manejo y disposición de material sobrante de demolición, excavación y construcción.

En el mes de octubre continuamos con la disposición de material sobrante de excavación, se dispone el 100% de excavación debido a que el material no cumple con los componentes físicos para ser reutilizado, el material se dispone en el lugar autorizado para la ejecución de la actividad (ZODME Guatiquia). Las volquetas que efectúan el movimiento cubren el material del volco para reducir las emisiones de material particulado en el trayecto de la obra al sitio de disposición final.

A continuación, se discrimina el tipo de material y la cantidad dispuesta en el sito autorizado:

Mes	Tipo de material	Volumen dispuesto (m3) en sitio autorizado
OCTUBRE	Excavación	1584

Tabla 1: Consolidado de material dispuesto

4.1.1.1. Registro fotográfico





Observaciones: Cargue de material de excavación a vehículo que transporta.





Observaciones: Transporte de material excavación a sitio de disposición.
