11838

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 03 de Enero del 2024 **OF-C249 -2023-213**

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META" 1

ASUNTO: Entrega informe mensual interventoría a obra mes de Noviembre -7 Carpetas
Entrega de informe mensual de obra mes de Noviembre – 5 Carpetas

Por medio de la presente me permito realizar la entrega del informe mensual de interventoría a obra correspondiente al mes de Noviembtrr se complementa la documentación y los anexos, acorde a los estipulado en el formato GES-FO-35 para informes mensuales dado por la entidad.

De igual manera se anexa el informe de obra entregado por el contratista para el cual se implementa formato GES-FO-126 se complementan anexos y se entregan informes de seguimiento para lo cual se anexan:

Informe de obra formato GES-FO-126
Informe de gestión SST
Informe de seguimiento plan de manejo ambiental
Informe de seguimiento plan de manejo de transito
Informe de seguimiento plan de salud ocupacional

R. Loisa M. 04/01/2024. 3:25 PM.

IDERMETA NIT 0 9 ENE 2024 0006 11:31 Firma

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Cabe anotar que aun queda pendiente la entrega del informe de seguimiento al plan de gerencia, el cual no se ha corregido ni entregado a la interventoría.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

11840

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

CONTRATO N°	106 de 2023	PROYECTO N°	2022005500024 2022005500094 2022005500022

INFORME MENSUAL No 7 INTERVENTORIA A OBRA NOVIEMBRE



CONTRATO DE INTERVENTORIA 249 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALPARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATO DE OBRA 106 DE 2023

CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

NOVIEMBRE DE 2023

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

Periodo informado	Desde	01/11/2023	Hasta	30/11/2023

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE OBRA	
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	$50.871.940.842
OBJETO PROYECTO 1: 2022005500024	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.
VALOR DEL PROYECTO:	$ 31.845.658.891,00
OBJETO PROYECTO 2: 2022005500094	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.
VALOR DEL PROYECTO:	$ 10.220.557.418,00
OBJETO PROYECTO 3: 2022005500022	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.
VALOR DEL PROYECTO:	$ 8.805.724.533,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
CORREO ELECTRÓNICO:	escenariosdeportivos2023@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	10/05/2023
PRORROGA:	N.A.
SUSPENSIÓN:	N.A.
TIEMPO:	N.A.
REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	09/05/2024

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 20223
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO 1: 2022005500024	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITOS EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.
OBJETO PROYECTO 2: 2022005500094	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.
OBJETO PROYECTO 3: 2022005500022	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.
CORREO ELECTRÓNICO:	INTERESCENARIOSC@GMAIL.COM

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	BIBIANA PAN MERCHAN
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	811-2022 062-2023 381-2023 206-2023
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	FLOOWER EMILIO PEÑA FABIAN ALBERTO SAAVEDRA RIOS LUZ ADRIANA LESMES ESCOBAR BERTULFO ROJAS QUIMBAYO

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO ESCENARIOS MULTIPROPOSITO			
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	VEREDA:	
CORREGIMIENTO:		BARRIO:	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°8'24"N 73°37´06W´´		

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO PISTA DE ATLETISMO			
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	VEREDA:	
CORREGIMIENTO:		BARRIO:	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°08'24"N 73°37'13"W		

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTOPISTA DE PATINAJE			
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	VEREDA:	
CORREGIMIENTO:		BARRIO:	OLIMPICO
COMUNA:	05		
COORDENADAS:	4°8'21"N 73°37'07"W		

Los proyectos se localizan dentro de la villa Olimpia de Villavicencio localizada en el barrio olímpico comuna 05 de la ciudad de Villavicencio, meta.



1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

AVANCE FÍSICO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.

GRAFICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO TOTAL:



CUADRO RESUMEN AVANCE POR PERIODO:

ESCENARIOS MULTIPROPOSITO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO
10-may-23	0,00%	0,00%
31-may-23	0,06%	0,07%
30-Jun-23	0,28%	0,71%
31-Jul-23	1.38%	0.63%
31-Ago-23	0.94%	1,71%
30-Sept-23	1.1%	1.27%
30-Oct-23	2.52%	2.17%
30-nov-2023	11.59%	0.97%
ACUMULADO	17.87%	7.54%

OBSERVACIONES CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA:

Durante el mes de noviembre, se logró un avance mensual del 0.97%. Sin embargo, el acumulado total hasta la fecha es del 7.53%. En comparación, el avance acumulado programado era del 17.87%, lo que revela un rezago en la programación del 10.33%. Este rezago se debe a la falta de inicio de las actividades proyectadas, impactando negativamente en el avance acumulado para este periodo

CUADRO DE RESUMEN POR CAPITULO:

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	%	$	%	$	%	$	%	$
LOCALIZACION. TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.	8.52	2.980.779,14	57.34	$ 20.072.402,68	11.25	$ 3.938.743,40	75.88	$ 26.560.823,40
DESMONTE Y DEMOLICIONES			100	796.139.513,08			100	796.139.513,08
EXCAVACIONES Y RELLENOS	29.97	165.679.535,37	93.44	$ 519.734.761,05	10.97	$ 61.033.325,24	80.86	$ 449.753.677,24
CIMENTACIÓN	19.53	293.694.964,94	65.44	$ 984.034.445,00	8.97	$ 134.825.497,86	46.93	$ 705.625.421,83
ESTRUCTURAS EN ACERO	20.84	$3.113.162.028,55	20.84	$3.113.162.028,55	0.70	$ 104.927.196,00	0.70	$ 104.927.196,00
MAMPOSTERÍA Y PAÑETES	14.89	$ 77.215.208,81	14.89	$ 77.215.208,81				
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	1.11	$ 1.337.635,19	1.11	$ 1.337.635,19				
INSTALACIONES SANITARIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	1.11	$ 2.043.519,00	45.23	$ 82.945.053,85
INSTALACIONES ELÉCTRICA	1.45	$ 11.922.383,30	1.45	$ 11.922.383,30				

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	%	$	%	$	%	$	%	$
S INTERNAS								
CERTIFICACIONES-PMT Y/O PMA, OTROS. ESCENARIOS DEPORTIVOS .	7.68	$ 24.867.198,81	51.68	$ 167.454.347,97	1.18	$ 3.836.345,70	67.09	$ 217.364.197,42
		TOTAL, PROGRAMADO	17.87	5.691.073.303		TOTAL, ACUMULADO	7.54	2.401.711.964

AVANCE FÍSICO CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

GRAFICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO TOTAL:



CUADRO RESUMEN AVANCE POR PERIODO:

	PROGRAMADO	EJECUTADO
10-may-23	0,00%	0,00%
31-may-23	0,19%	0,40%
30-jun-23	1,32%	1,83%
31-jul-23	2.29%	0,76%
31-Ago-23	5.04%	1.39%
30-Sept-23	5.49%	2.70%
30-Oct-23	9.58%	1.08%
30-nov-2023	9.63%	0.30%
ACUMULADO	33.54%	8.46%

OBSERVACIONES CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA:

En el transcurso del mes de septiembre, se logró un avance ejecutado del 0.30%, acumulando un total ejecutado del 8.46% en comparación con el avance total programado, que asciende al 33.54%. Es crucial destacar que el proyecto presenta un progreso más lento debido a la necesidad de realizar ajustes en el diseño. Durante la implementación, se evidenció la necesidad de modificar la geometría de la pista, ya que el paramento interfirió con el cerramiento y las graderías de la cancha auxiliar. Por lo tanto, se actualizó la geometría de acuerdo con la realidad del terreno y las edificaciones existentes. Cabe mencionar que el nuevo trazado de la pista fue aprobado y avalado por la Fedepatin hasta el día 09 de noviembre.

CUADRO DE RESUMEN POR CAPITULO:

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	%	$	%	$	%	$	%	$
DEMOLICIONES	0.00	0.00	100	331.566.326,00			99.9	331.345.502,04
PRELIMINARES	18.08	67.00	30.84	$ 538.003.113,05	2.28	$ 18.319.930,83	36.15	$ 290.277.110,83
CONCRETOS	13.96	$ 88.413.306,97	91.96	582.263.111,20	0.65	$ 4.104.147,20	0.65	$ 4.104.147,20
CIMENTACIÓN								
PISTA DE VELOCIDAD	9.49	184.124.674,51	9.49	184.124.674,51				
OBRAS EXTERIORES								

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	%	$	%	$	%	$	%	$
RED AGUAS LLUVIAS			100	626.971.499,00				
REDES ELECTRICAS	39.81	414.960.326,13	56.16	585.344.187,00				
CERTIFICACIONES-PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE PATINAJE.	7.65	15.648.083,17	51.51	105.373.330,68	2.04	$3.836.345,70	63.65	$ 119.357.475,42
		TOTAL, PROGRAMADO	33.54	2.953.646.241		TOTAL, EJECUTADO	8.46	745.084.235

AVANCE FÍSICO CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

GRAFICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO TOTAL:



CUADRO RESUMEN AVANCE POR PERIODO:

PISTA DE ATLETISMO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO
10-may-23	0,00%	0,00%
31-may-23	0,03%	0,03%
30-jun-23	0,27%	0,18%
31-jul-23	0,95%	0,17%
31-ago-23	5,07%	0,05%
30-sep-23	2,82%	0,54%
30-Oct-23	0.83%	0.31%
30-nov-2023	2.10%	0.29%
ACUMULADO	12.07%	1.57%

OBSERVACIONES CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA:

El avance acumulado del proyecto a la fecha corresponde a 1.57% sin embargo, el avance acumulado programado correspondiente a 12.07 %, reflejando un rezago en la programación para la ejecución de este proyecto equivalente al 10.5% debido a los inconvenientes que se han presentado en la ejecución con el ajuste del diseño y la programación de las fechas en las que se utiliza el estadio para eventos.

CUADRO DE RESUMEN POR CAPITULO

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	%	$	%	$	%	$	%	$
PRELIMINARES	6.64	$ 3.628.772,64	67.49	36.905.646,21			95.06	51.980.047,10
EXCAVACION Y RELLENOS			100	28.979.315,00			99.62	28.870.420,00
OBRAS EXTERIORES			100	439.500.859,00				
FILTROS			100	411.368.644,00	3.96	16.295.910,00	3.96	16.295.910,00
SUPERFICIE	2.27	194.130.807,58	2.57	219.128.769,67				
ACCESORIOS								

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	%	$	%	$	%	$	%	$
PLACA EN CONCRETO								
GRAMA SINTETICA								
CERTIFICACIONES-PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE ATLETISMO.	7.38	17.286.902,69	41.58	97.377.598,63	5.71	13.374.155,70	26.69	63.128.974,01
		TOTAL, PROGRAMADO	12.07	1.233.260.833		TOTAL, EJECUTADO	1.57	160.275.351

GRAFICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO TOTAL CONTRATO DE OBRA 106:



CUADRO RESUMEN AVANCE POR PERIODO:

RESUMEN CONTRATO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO
10-may-23	0,00%	0,00%
31-may-23	0,08%	0,12%
30-jun-23	0,46%	0,79%
31-jul-23	1.44%	0.57%
31-Ago-23	2.48%	1.32%
30-sep-23	2.21%	1.37%
30-Oct-23	3.40%	1.61%
30-nov-2023	9.35%	0.72%
ACUMULADO	19.42%	6.50%

CUADRO GENERAL PROGRAMACION / EJECUCION

PROYECTO	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE EJECUTADO			
	PROGRAMADO MES		PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO MES		EJECUTADO ACUMULADO	
Prog. Escenarios Deportivos	3.690.859.734	11,59%	5.691.073.303	17,87%	310.604.627	0,98%	2.401.711.964	7,54%
Prog. Pista de Patinaje	848.323.258	9,63%	2.953.646.241	33,54%	26.260.424	0,30%	745.084.235	8,46%
Prog. Pista de Atletismo	215.046.483	2,10%	1.233.260.833	12,07%	29.670.066	0,29%	160.275.351	1,57%
TOTAL	**4.754.229.475**	**9,35%**	**9.877.980.377**	**19,42%**	**366.535.117**	**0,72%**	**3.307.071.551**	**6,50%**

OBSERVACIONES CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA:

Se ha calculado el avance total del contrato de obra durante este periodo. El avance ejecutado en el mes de noviembre corresponde al 0.72%, lo que acumula un total del 6.50%. En comparación, el avance acumulado programado estaba planeado para ser del 19.42%. Esto indica un retraso en la ejecución de los tres proyectos combinados, equivalente al 12.92% del total programado.

En vista de esta situación, la interventoría ha solicitado al contratista mejorar los rendimientos mediante el oficio OF-C249-2023-105, con el asunto "Avance de obra

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

A continuación, se relaciona la correspondencia tramitada durante el periodo de este informe concerniente a oficios y correos electrónicos canales estipulados para la comunicación:

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
07/11/2023	OF-C249-2023-178	Remisión comprobante de pago de rendimientos del anticipo de octubre	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
09/11/2023	OF-C249-2023-179	Solicitud de definición de alcance y requerimientos iluminación pista atletismo	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
07/11/2023	OF-C249-2023-180	Aprobación y pago de orden de giro No. 8 anticipo. Fiduciaria alianza – Fideicomiso No. 113392	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
09/11/2023	OF-C249-2023-181	Aprobación y pago de orden	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		de giro No. 10 anticipo. Fiduciaria alianza – Fideicomiso No. 113392		Deportivos Villa Olímpica 2023
10/11/2023	OF-C249-2023-182	Traslado oficio Federación Colombiana de Patinaje FPC 01 20231107000001	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
10/11/2023	OF-C249-2023-183	Aprobación y pago de orden de giro No. 09 anticipo. Fiduciaria alianza – Fideicomiso No. 113392	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
10/11/2023	OF-C249-2023-184	Solicitud de trámite de modificación, adición y prorroga de los contratos de obra e interventoría celebrados para la ejecución del proyecto identificado con los BPIN 2022005500094 Total 8 carpretas	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
14/11/2023	OF-C249-2023-186	Solicitud de creación y registro de ajustes al proyecto de inversión "construcción de la pista de atletismo en la Villa Olimpica del mnunicipio de Villavicencio, Meta" con código BPIN 2022005500094	Consorcio Interescenarios	IDERMETA – Secretaria de Planeación Departamental

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		aprobado bajo numeral 3 del artículo 4.5.1.2.2. acuerdo único de comisión rectora		
14/11/2023	OF-C249-2023-184	Aprobación y pago de orden de giro No. 11 anticipo. Fiduciaria alianza – Fideicomiso No. 113392	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
14/11/2023	OF-C249-2023-185	Aprobación reprogramación plan de inversión del Anticipo	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023 C.C. IDERMETA
15/11/2023	OF-C249-2023-186	Solicitud de trámite de modificación, adición y prorroga de los contratos de obra e interventoría celebrados para la ejecución del proyecto identificado con los BPIN 2022005500022 – Proyecto: Construcción pista de patinaje en la Villa Olimpica del municipio de Villavicencio, Meta.	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
17/11/2023	OF-C249-2023-187	Aprobación y pago de orden de giro No. 12 anticipo. Fiduciaria alianza – Fideicomiso No. 113392	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
23/11/2023	OF-C249-2023-188	Traslado de problemática informada por medio de correo electrónico de fecha lunes 20 noviembre, 9:33 am	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
24/11/2023	OF-C249-2023-189	Respuesta correo electrónico de fecha lunes 20 de Noviembre, 9:33 am	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
24/11/2023	OF-C249-2023-190	Reiteración del informe de gerencia de proyectos	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
24/11/2023	OF-C249-2023-191	Solicitud del seguimiento del programa de seguridad industrial y salud ocupacional	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
28/11/2023	OF-C249-2023-192	Solicitud de suspensión de actividades de entrenamiento de todas las disciplinas de atletismo.	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
30/11/2023	OF-C249-2023-193	Traslado oficio CEDVO-141-2023 intervención en la zona verde de la cancha de futbol	Consorcio Interescenarios	IDERMETA
30/11/2023	OF-C249-2023-194	Reiteración solicitud del seguimiento del programa de seguridad industrial y salud ocupacional	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023 C.C. IDERMETA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
30/11/2023	OF-C249-2023-195	Reiteracion del informe de gerencia de proyectos	Consorcio Interescenarios	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023 C.C. IDERMETA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
01/11/2023	CEDVO-120-2023	Entrega de informe de PMT de octubre de 2023	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
02/11/2023	CEDVO-123-2023	Entrega de planos de montaje de anclajes actualizado	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
02/11/2023	CEDVO-124-2023	Entrega de ajuste estructural a fachada y cubierta	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
03/11/2023	CEDVO-122-2023	Remisión orden de giro No. 08 anticipo	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
07/11/2023	CEDVO-126-2023	Remisión orden de giro No. 10 Anticipo	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
07/11/2023	CEDVO-125-2023	Remisión orden de giro No. 09 Anticipo	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
07/11/2023	CEDVO-127-2023	Reprogramación plan de inversión del anticipo	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
08/11/2023	CEDVO-129-2023	Entrega correcciones modificación No.	Consorcio Escenarios	Consorcio Interescenarios

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		01 Pista de atletismo	Deportivos Villa Olimpica 2023	
10/11/2023	CEDVO-129-2023	Remisión orden de giro No. 11 Anticipo	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
10/11/2023	CEDVO-130-2023	Entrega de solicitud de modificación No. 01 y adición No. 01 pista de patinaje	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
15/11/2023	CEDVO-131-2023	Remisión orden de giro No. 12 Anticipo	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
21/11/2023	CEDVO-135-2023	Entrega de informe plan de inversión anticipo de obra mes de octubre	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
28/11/2023	CEDVO-137-2023	Entrega de ajuste estructural a pedestal A-8 escenario 1	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
28/11/2023	CEDVO-132-2023	Entrega de ajuste estructural a muros de contención de pista de ruta	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
28/11/2023	CEDVO-140-2023	Entrega de corrección planos de montaje de anclajes	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios
30/11/2023	CEDVO-141-2023	Intervención en la zona verde de la cancha de futbol	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023	Consorcio Interescenarios

ACTAS DE REUNION Y COMITES DE OBRA

A continuación, se relacionan los distintos comités de obra actas de reunión generadas durante este periodo:

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

ESCENARIOS MULTIPROPOSITO

Durante este periodo de tiempo, la interventoría y el contratista continúan trabajando en la elaboración del acta de modificación y adición, en concordancia con los ajustes y eventualidades surgidos durante el desarrollo del contrato. Se están realizando análisis de precios unitarios para las nuevas actividades, ajustes en las cantidades reales basados en las mediciones efectuadas en el sitio y la actualización del presupuesto conforme a los diseños finales para la construcción del proyecto.

No obstante, el proyecto enfrenta un retraso en la programación, equivalente al 12.92% del valor total de ejecución. Este contratiempo se origina en la necesidad de realizar ajustes en los diseños iniciales, los cuales han sido implementados por el contratista con el respaldo y la revisión de los especialistas de la interventoría. A pesar de estos esfuerzos, hasta la fecha se evidencia la existencia de actividades programadas que aún no se han llevado a cabo, generando un impacto significativo en el avance general del proyecto.

PISTA DE PATINAJE

Durante este periodo se gestiona la aprobación de la actualización de la geometría ajustada de la pista de ruta y de acuerdo con las disposiciones establecidas por la FEDEPATIN en el manual actualizado que se utiliza para ajustar el diseño inicial. Esto se realiza considerando el levantamiento real del terreno en el cual se implantará el proyecto. En este contexto, se han iniciado actividades de excavación para la conformación de zarpas destinadas al muro de contención perimetral de la pista de ruta. Al mismo tiempo, se han puesto en marcha actividades de construcción de los solados en las excavaciones realizadas.

Sin embargo, debido a las eventualidades surgidas en el desarrollo del proyecto, especialmente en lo que respecta a la aprobación del diseño final, la obra presenta un rezago en la programación, correspondiente al 25.08%. Por este motivo, se ha solicitado a la contratista mejorar los rendimientos de obra e implementar una mayor cantidad de cuadrillas para optimizar el avance del proyecto.

Durante este periodo de tiempo, la interventoría ha llevado a cabo la entrega del acta de modificación y la solicitud de adición. Se ha completado la entrega de toda la documentación

requerida, conforme a la lista de chequeo y los formatos proporcionados por la entidad para este propósito.

PISTA DE ATLETISMO

Tras la aprobación de los ajustes en los diseños por parte de la interventoría, se dio inicio a las actividades de excavación y rellenos para la conformación de la estructura de la pista. Sin embargo, hasta la fecha, se observa un rezago del 10.5% en comparación con las actividades programadas, especialmente en cárcamos, filtros, bordillos y el inicio de la conformación de la superficie de la pista.

Dadas las circunstancias actuales del proyecto y las eventualidades surgidas, es esencial que el contratista implemente un plan de contingencia. El objetivo es actualizar el porcentaje de ejecución de acuerdo con lo proyectado y asegurar el desarrollo adecuado del proyecto.

Dado que estos ajustes y cambios son esenciales para asegurar la certificación técnica del proyecto, tanto el contratista de obra como la interventoría presentan a la entidad las cantidades actualizadas y la inclusión de nuevas actividades derivadas de las modificaciones de diseño.

Durante este periodo de tiempo, se ha presentado oficialmente ante la entidad la modificación al presupuesto y la solicitud de adición. La documentación correspondiente se ha entregado de acuerdo con los requisitos establecidos por la entidad para llevar a cabo esta gestión.

CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA

En concordancia con los ajustes efectuados en los diseños de cada proyecto y teniendo en cuenta las particularidades identificadas durante la ejecución, tanto la interventoría como el contratista han procedido a entregar a la entidad la documentación pertinente para la solicitud de modificación y adición de los siguientes proyectos.

OBJETO PROYECTO 2: 2022005500094	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.
OBJETO PROYECTO 3: 2022005500022	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

Considerando el cronograma de programación de obra establecido para cada proyecto y tomando en cuenta el plazo transcurrido, así como las actividades pendientes por ejecutar, se proyecta una prórroga de 4 meses adicionales sobre el plazo inicial para concluir las actividades de construcción de cada proyecto.

4. GESTIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	El director de Interventoría dirige la ejecución del contrato de interventoría en los aspectos técnicos, legales, administrativos, financieros y ambientales. Para este periodo se realiza respuesta de oficios a solicitudes del contratista, la elaboración de informes de interventoría revisión de ajustes a los diseños
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Realiza la cuantificación de las cantidades ejecutadas, para este periodo lo concerniente a actividades de construcción de cimentación de escenario 2 se realiza revisión de cantidades y actividades que no se presupuestaron inicialmente para proyección de acta de modificación, adicionalmente se realiza supervisión de los procedimientos de cada actividad acorde al cumplimiento de las especificaciones técnicas, de igual forma verifica la correcta ejecución de los distintos planes de seguridad en el trabajo y plan de manejo ambiental, verifica y realiza control de calidad a los elementos y materiales utilizados en los diferentes procesos constructivos
INGENIERO ELECTRICISTA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Para este periodo de tiempo el especialista eléctrico se ha encargado de realizar la revisión a los ajustes de los diseños eléctricos verificando presupuesto y cantidades de obra
ASESOR O ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Para este periodo de tiempo se ha venido realizando la revisión de las observaciones encontradas en la estructura para cimentación y estructura metálica, se realiza revisión de los pesos y especificaciones entregadas en la planimetría de taller entregada por el contratista, adicionalmente ha venido

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
	realizando visitas periódicas a obra para revisión de aceros y de elementos fundidos
ASESOR O ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	El especialista hidráulico realiza revisión y trabaja conjuntamente con el contratista de obra para verificar los ajustes que se deben realizar a las redes hidrosanitarias que se cruzan con la cimentación del proyecto, así mismo se trabaja en los ajustes que se deben realizar a la red de suministro y la red del sistema contraincendios
ASESOR O ESPECIALISTA AMBIENTAL	Para este periodo de tiempo se realiza seguimiento a las fichas y se realiza informe de seguimiento ambiental, de igual forma se realiza visita a obra con el fin de velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental. Y el manejo del plan ambiental presentado
ASESOR O PROFESIONAL Y/O EN SALUD OCUPACIONAL	Para este periodo de tiempo se realiza seguimiento al plan de salud ocupacional, velando por el cumplimiento de la normativa se verifican documentaciones para el correcto ingreso del personal en obra, se verifican preoperacionales, permisos de trabajo, se lleva control de los equipos, se verifican pagos de planillas de seguridad social entregadas por el contratista.

4. 1. GESTIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	El director de Interventoría, dirige la ejecución del contrato de interventoría en los aspectos técnicos, legales, administrativos, financieros y ambientales. Revisa los ajustes realizados a los diseños acorde a la normativa dada por FEDEPATIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Realiza la cuantificación de las cantidades ejecutadas para los rellenos de conformación de la pista verifica los procedimientos de cada actividad se verifica la correcta ejecución de los distintos planes de seguridad en el trabajo

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
	y plan de manejo ambiental para cada proyecto, verifica y realiza control de calidad a los elementos y materiales utilizados en los diferentes procesos constructivos
INGENIERO ELECTRICISTA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se realiza verificación de las observaciones realizadas por el contratista para el diseño de la iluminación de la pista de igual forma se revisan las alternativas y ajustes de diseños que se deben realizar a las acometidas y a los puntos que deben implementarse en la pista verificando presupuesto y cantidades de obra proyectadas para verificar el alcance real de este capítulo del presupuesto.
ASESOR O ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Para este periodo se trabaja conjuntamente con el contratista de obra en el ajuste que debe realizarse a la red de aguas lluvias y drenaje de la grama sintética que no fueron contemplados en el diseño inicial.
ASESOR O ESPECIALISTA AMBIENTAL	Para este periodo de tiempo se realiza informe de seguimiento, de igual forma se realiza visita a obra con el fin de velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental
ASESOR O PROFESIONAL Y/O EN SALUD OCUPACIONAL	Realiza seguimiento al plan de salud ocupacional, velando por el cumplimiento de la normativa acorde a todos los procedimientos realizados en la construcción del proyecto, supervisa la aplicación de la ley respecto a las afiliaciones y seguridad en el trabajo de todos los trabajadores de la obra.

4.2. GESTIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Para este periodo se realiza respuesta de oficios a solicitudes del contratista, la elaboración de informes de interventoría dirige la ejecución del proyecto en los aspectos técnicos, legales, administrativos, financieros y ambientales. Se verifica ajustes la geometría

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
	y acabado final de la pista acorde a normativa dada por la Word Athletics
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Para este periodo se ha venido trabajando en la verificación de niveles y de la implantación real de la pista, se verifica ejecución de cantidades y avance, de igual forma supervisa, los procedimientos de cada actividad, verifica la correcta ejecución de los distintos planes de seguridad en el trabajo y plan de manejo ambiental para cada proyecto, verifica y realiza control de calidad a los elementos y materiales utilizados en los diferentes procesos constructivos
INGENIERO ELECTRICISTA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Para este periodo de tiempo el especialista eléctrico se ha encargado de realizar la revisión de los diseños eléctricos entregados por la entidad verificando presupuesto y cantidades de obra proyectadas para la ejecución
ASESOR O ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Para este periodo se ha venido verificando el ajuste realizado a los diseños del sistema de redes hidráulicas y sanitarias dentro de la pista para el sistema de drenaje, sistema de riego y sistema de red de incendios.
ASESOR O ESPECIALISTA AMBIENTAL	Para este periodo de tiempo se realiza seguimiento a las fichas y se realiza informe de seguimiento, de igual forma se realiza visita a obra con el fin de velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental
ASESOR O PROFESIONAL Y/O EN SALUD OCUPACIONAL	Realiza seguimiento al plan de salud ocupacional, velando por el cumplimiento de la normativa acorde a todos los procedimientos realizados en la construcción del proyecto, supervisa la aplicación de la ley respecto a las afiliaciones y seguridad en el trabajo de todos los trabajadores de la obra.

5. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia.

ESTADO	N° DE DÍAS
NUBLADO	0
TORMENTA	1
LLUVIOSO	14
SOLEADO	11

OBSERVACIONES
Se anexan a esta acta cuadro de control del tiempo en el cual se lleva el registro a diario del estado del tiempo para este periodo

A. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. NORMAS TÉCNICAS CITADAS EN EL PROCESO

NORMA	APLICACIÓN	RESULTADO
MANUAL ESCENARIOS DEPORTIVOS	VERIFICACION DE DISEÑOS Y ESPECIFICAIONES	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES PARA CADA ESCENARIO
NORMATIVA ESCENARIOS DE PATINAJE 2016 (FCP).	VERIFICACION DE DISEÑOS Y ESPECIFICAIONES	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES DIMENSION Y PERLATES
NORMA INSTALACION PISTA DE ATLETISMO IAAF	VERIFICACION DE DISEÑOS Y ESPECIFICAIONES	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Durante este periodo se realiza seguimiento de la disposición de los escombros resultantes de las demoliciones, se realiza informe de seguimiento PMA por parte de Ingeniero Ambiental.

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: Durante este periodo se realiza respecto al seguimiento y la implementación del PMT acorde a lo estipulado en el documento aprobado por la secretaria de movilidad, de tal forma se realiza entrega de bitácora e informe a la interventoría posteriormente se radica ante la secretaria de movilidad.

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GERENCIA DE PROYECTOS: mediante oficio OF-C249-2023-146 La interventoría reitera al contratista la necesidad de entregar la documentación requerida para la radicación del plan de gerencia. Este documento debe ser presentado como anexo al informe de obra. Hasta la fecha, no se ha recibido el informe de seguimiento. La interventoría mantiene un registro de las solicitudes realizadas y señala el incumplimiento repetido por parte del contratista de obra

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.

1,1 LOCALIZACION. TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.

La actividad de "localización y replanteo convencional de obra arquitectónica" implica seguir los procedimientos tradicionales de posicionamiento de elementos de construcción según lo indicado en los planos del proyecto. Esto incluye la realización de una comisión topográfica. En este proceso, se lleva a cabo la toma de niveles de referencia en 0.0 y la ubicación de puntos georreferenciados para determinar la posición de las cimentaciones y paramentos de cada componente del proyecto arquitectónico.

Para llevar a cabo esta tarea, se utiliza una estación topográfica y un equipo de topógrafos, así como un cadenero para asegurar que la implantación de los elementos de construcción sea precisa y de acuerdo con los planos de diseño. Este proceso garantiza que los elementos se ubiquen de manera adecuada y se ajusten a las especificaciones del proyecto arquitectónico

3,00 EXCAVACIONES Y RELLENOS

3,1 EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE

El término "conglomerado" se refiere a materiales con características que requieren, para su extracción, el uso no solo de picas y garlanchas, sino también de otras herramientas manuales como palancas, cuñas o equipos mecánicos. Durante este periodo, se lleva a cabo la excavación para la demolición de cimientos enterrados, así como la excavación para la creación de zapatas y contrapesos para el escenario multipropósito 2. Este proceso implica el uso de herramientas manuales especializadas y, posiblemente, equipos mecánicos para garantizar una excavación eficiente y segura.

4,00 CIMENTACIÓN

4,1 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)

Durante este período de tiempo, se ejecutan las labores correspondientes a la construcción de solados para la formación de las zapatas y contrapesos del escenario multipropósito 2. Estas actividades inician con un replanteo preciso de los elementos, garantizando su correcta ubicación. Posteriormente, se lleva a cabo la fundición del concreto, compuesto por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados fino y grueso, y aditivos en casos específicos.

El diseño de las mezclas de concreto se basa en la relación agua-cemento necesaria para lograr una mezcla plástica y manejable, ajustada a las condiciones específicas de colocación. El objetivo es obtener un concreto con durabilidad, impermeabilidad y resistencia conforme a los requisitos establecidos para las diversas estructuras, de acuerdo con los planos y especificaciones.

En este proceso, se garantiza que la resistencia del concreto alcance los 2000 psi, conforme a la dosificación indicada en el diseño de la mezcla. El espesor del solado se mantiene en 5 cm, de acuerdo con las especificaciones del diseño estructural.

4,2 PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

Durante este periodo, se llevan a cabo las labores de construcción de pedestales destinados a la zona del escenario multipropósito 2. Para llevar a cabo esta actividad, se realiza un minucioso replanteo de los elementos, verificando los aceros de refuerzo, las dimensiones, los niveles y la correcta colocación de tornillos y platinas de anclaje con cuadrilla de topografía y nivel de precisión. Seguidamente, se procede a verificar la plomada de las formaletas y, una vez asegurada la exactitud de los parámetros, se procede a la fundición en concreto.

4,3 ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

Consiste en los trabajos necesarios para suministro y construcción de zapatas en concreto de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría

El concreto estará construido por una mezcla de cemento portland, agua, agregados fino y grueso, y aditivos en algunos casos, el diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación agua–cemento necesarias para obtener una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de colocación de tal manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras, según los planos y especificaciones

Durante este período de tiempo, se llevan a cabo las actividades de construcción de las zapatas del escenario multipropósito 2. Para llevar a cabo esta actividad, se realiza un replanteo de los elementos que garantiza su correcta ubicación. Luego, se procede a la fundición de concreto, premezclado con las dimensiones específicas para cada elemento según la planimetría entregada.

4,4 VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

Durante este periodo, se lleva a cabo la construcción de vigas para el escenario multipropósito 2, siguiendo las especificaciones detalladas en los planos estructurales actualizados. La ejecución de la actividad se realiza conforme a las dimensiones proporcionadas para cada elemento, y se inicia con la verificación de la localización de ejes mediante el uso de equipo topográfico.

Adicionalmente, se realiza una revisión y confirmación de los refuerzos de acero necesarios. La etapa de construcción prosigue con el encofrado utilizando formaletas metálicas, seguido por la fundición del concreto premezclado. Durante este proceso, se toman muestras de cilindro de concreto para verificar la resistencia, asegurando que cumpla con los estándares especificados.

4,5 PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA

En el marco de esta actividad, se lleva a cabo la formación de concretos ciclópeos destinados a la construcción de los contrapesos del escenario multipropósito 2. Este proceso implica la ubicación precisa de los contrapesos mediante el uso de equipo topográfico, garantizando su alineación de acuerdo con los detalles indicados en los planos.

Se verifica meticulosamente la dosificación de la proporción de concreto y piedra para asegurar la calidad adecuada de los concretos ciclópeos. Además, se realiza una revisión minuciosa del armado de los refuerzos de acero y del encofrado, con el propósito de verificar las dimensiones de cada elemento y garantizar la conformidad con las especificaciones del diseño.

4,6 ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.

La actividad comprende el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto

En esta etapa se realiza el figurado y armado de las parrillas que serán utilizadas en la conformación de las zapatas, pedestales y contrapesos de los dos escenarios. Durante el desarrollo de esta actividad, se ensamblan los elementos de acuerdo con las especificaciones detalladas en los planos estructurales del proyecto. Se verifica que se cumplan las cuantías, longitudes y cantidades de cada elemento armado, asegurando que la estructura esté construida de acuerdo con las especificaciones y los requisitos de diseño.

6,00 ESTRUCTURAS EN ACERO

6,1 ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

En este periodo de tiempo se realizan actividades de conformación de tornillos y platinas en pedestales de concreto para el desarrollo de esta actividad se realiza verificación de especificaciones, calibres, dimensiones de cada elemento para la localización de la tornillería se utiliza cuadrilla de topografía se localizan según plano

14 INSTALACIONES SANITARIAS

14,22 CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.

Se refiere esta actividad se refiere cilindro para conformación de (pozo) de inspección en concreto de 4000 psi, d=1.50 m E=0.20 m. los muros de la la cámara de inspección, está conformada por un muro de concreto 0,20 m de espesor, cumpliendo con las normas técnicas.

14,23 LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS

Se refiere esta actividad se refiere losa inferior base para cámara (pozo) de inspección en concreto de 4000 psi, d=1.80 m E=0.20 m. incluye cañuelas. La base de la cámara de inspección, está conformada por una losa circular de concreto 0,20 m de espesor, con diámetro mayor que el externo del cilindro cumpliendo con las normas técnicas.

19 CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESCENARIOS DEPORTIVOS

20,0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Durante este pedido de tiempo se realiza verificación de la ejecución del presupuesto correspondiente al PMA de igual manera se realiza seguimiento de las actividades ejecutadas de las cuales se anexa informe de seguimiento.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

2,00 PRELIMINARES

2,2 EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE

Se considera un "conglomerado" a los materiales que presentan características que requieren la utilización de herramientas adicionales a las picas y garlanchas, como palancas, cuñas o incluso equipos mecánicos, para su extracción. Durante este período de tiempo, se lleva a cabo la excavación del muro perimetral para permitir el inicio de las actividades de demolición de este elemento. Se realiza actividad debido a la naturaleza del material y la ubicación del muro, se ejecuta para facilitar la posterior demolición de manera eficiente.

3,00 CONCRETOS

3,1 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)

Durante este período de tiempo, se ejecutan las labores correspondientes a la construcción de solados para la formación de pista de ruta . Estas actividades inician con un replanteo preciso de los elementos, garantizando su correcta ubicación. Posteriormente, se lleva a cabo la fundición del concreto, compuesto por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados fino y grueso, y aditivos en casos específicos.

El diseño de las mezclas de concreto se basa en la relación agua-cemento necesaria para lograr una mezcla plástica y manejable, ajustada a las condiciones específicas de colocación. El objetivo es obtener un concreto con durabilidad, impermeabilidad y resistencia conforme a los requisitos establecidos para las diversas estructuras, de acuerdo con los planos y especificaciones.

En este proceso, se garantiza que la resistencia del concreto alcance los 2000 psi, conforme a la dosificación indicada en el diseño de la mezcla. El espesor del solado se mantiene en 5 cm, de acuerdo con las especificaciones del diseño estructural.

9 CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE PATINAJE.

Durante este pedido de tiempo se realiza verificación de la ejecución del presupuesto correspondiente al PMA de igual manera se realiza seguimiento de las actividades ejecutadas de las cuales se anexa informe de seguimiento.

ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No 1 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

4,00 FILTROS

4,1 GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Se realiza instalación de geotextil sobre relleno en conformación de la estructura de la pista de atletismo para el desarrollo de esta actividad se verifican especificaciones del material utilizado se verifica que se instale sobre toda la superficie de manera uniforme y continua.

9 CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE ATLETISMO.

9,2 PMA

Durante este pedido de tiempo se realiza verificación de la ejecución del presupuesto correspondiente al PMA de igual manera se realiza seguimiento de las actividades ejecutadas de las cuales se anexa informe de seguimiento.

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

Escenarios multipropósito

- Durante este período, se continúan actividades de localización y replanteo para los escenarios multipropósito 1 y 2. Estas actividades incluyen la determinación del nivel 0.00, que servirá como referencia para el acabado del piso y la definición de la cota de cimentación para las zapatas de estos escenarios.

- En esta etapa, se están realizando las actividades de conformación de rellenos de acuerdo con los diseños para mejorar la capacidad del terreno en las zapatas del escenario 2. Para llevar a cabo esta actividad, se está instalando material de río de 2 pulgadas de tamaño, el cual se compacta mecánicamente cada 15 centímetros. La compactación es un proceso importante que asegura que el material se asiente de manera adecuada y que el terreno alcance la capacidad de carga requerida para soportar las zapatas y la estructura del escenario 2 de manera segura y estable.

- Se llevan a cabo actividades relacionadas con la conformación de aceros de refuerzo destinados a los elementos constituyentes de la cimentación. La labor de la interventoría incluye la revisión minuciosa de zapatas, el armado de refuerzos en vigas de cimentación y pedestales, así como la verificación de dimensiones, calibres y longitudes de los refuerzos, conforme a las especificaciones detalladas en el plano estructural.

- Se llevan a cabo diversas actividades en la construcción de la cimentación de los escenarios 1 y 2. Se procede con la fundición de concreto en zapatas, vigas de cimentación y pedestales, siguiendo las especificaciones de resistencia detalladas en los planos estructurales. La interventoría se encarga de verificar la prueba de cono de Abrams, además de realizar la toma de cilindros de concreto para llevar a cabo pruebas de compresión.

- Se realizan actividades de instalaciones platinas y tornillería en pedestales para anclaje de la estructura metálica, para el desarrollo de la actividad se realiza localización y nivelación de los elementos con cuadrilla topográfica

- Durante este periodo, se están llevando a cabo actividades de construcción de la red sanitaria en la zona de los escenarios multipropósito 2. Se incluyen acciones como la conexión e instalación de tuberías. Además, se está llevando a cabo la construcción de placas de piso y la creación de cilindros para la formación de pozos

- Durante este período de tiempo, se continúan actividades de construcción de solados de concreto con el fin de conformar la cimentación en el escenario 2. Y cimentación de escenario 1 Posteriormente, se procede a la instalación de aceros de refuerzo de acuerdo con lo especificado en los detalles del diseño estructural.

Pista de patinaje

- Durante este periodo, se realizan actividades de excavaciones para la construcción de muro de contención perimetral de la pista de ruta, la actividad se ejecuta conforme a los diseños actualizados aprobados por la FEDEPATIN.

- Se realizan actividades de conformación de solados para construcción de zarpa de muro de contención perimetral de la pista de ruta

Pista de atletismo

- Además, se ejecutan tareas de excavación para la formación del cajeo necesario para la estructura del pavimento. Este proceso implica el uso de maquinaria retroexcavadora y la posterior remoción del material excavado.

- Se están llevando a cabo actividades para la conformación del material de relleno destinado a la estructura de la pista de atletismo y las zonas de competencia. Simultáneamente, se realiza la instalación de geotextil con el objetivo de separar capas de suelo con características diferentes, evitando su mezcla. Este geotextil se coloca para

facilitar el paso del agua a través del suelo, al mismo tiempo que impide el desplazamiento de partículas finas. Este enfoque contribuye a prevenir la obstrucción de drenajes y a mantener un flujo de agua controlado.

4. VERIFICACIÓN MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	17/11/2023	INV-E-410-13, NTC 673-10

- Se toman muestras de cilindros a los concretos fundidos en la construcción de zapatas, vigas y contrapesos
- Se anexan las pruebas de los resultados de los ensayos relacionados en este informe

toma de prueba cono de abrams revisión de asentamiento del concreto



Prueba toma de muestras cilindros de concreto



5. VERIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • *IMPLEMENTACIÓN DE INSPECIÓN DE ARNES DE SEGURIDAD. • *IMPLEMENTACIÓN DE FORMATO PLAN DE IZAJE. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. • * LIQUIDACION DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. * ACOMPAÑAMIENTO FUNDIDA. • * VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ROTULACIÓN.	Se verifico en documentación entregada
02/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES. • * ORDEN Y ASEO ESCENARIOS. • * ACOMPAÑAMIENTO VISITA INTERVENTORIA EN ATLETISMO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS.	-Se verifico en documentación entregada

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
03/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL Y CONTRATISTAS • * VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES. • *MOVIMIENTO DE MAQUINARIA DE ESCENARIO A PISTA DE ATLETISMO. • * ORDEN Y ASEO EN PORTERIA ESCENARIOS. • * MOVIMIENTO DE PUNTO DE EMERGENCIA EN ESCENARIOS.	Se verifico en documentación entregada
04/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • *ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN CALIENTE, CONTRATISTA WILSON CARDENAS	Se verifico en documentación entregada
06/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	Se verifico en documentación entregada
07/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • ACOMPAÑAMIENTO EN FUNDIDA. • SEÑALIZACIÓN ENTRADA DE ESTADIO - PISTA ATLETICA. • VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN A MAQUINA 135. • * ORDEN Y ASEO ENTRADA PRINCIPAL ESTADIO.	Se verifico en documentación entregada
08/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	Se verifico en documentación entregada
09/11/2023	• *CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN BRIGADAS DE EMERGENCIAS. • *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO.	Se verifico en documentación entregada

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
10/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL.	Se verifico en documentación entregada
11/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * ARREGLO DE SEÑALIZACIÓN ENTRADA PRINCIPAL ESTADIOS - PISTA ATLETICA.	Se verifico en documentación entregada
13/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * ORDEN Y ASEO PERSONAL CONSORCIO.	Se verifico en documentación entregada
14/11/2023	• *CHARLA PRACTIVA SOBRE MANEJO DE EXTINTORES. • ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO.	Se verifico en documentación entregada
15/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES ATLETISMO. • *INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y PREVENTIVA EN OBRA. • * INSPECCIÓN DE BOTIQUIN EN TODOS LOS ESCENARIOS.	Se verifico en documentación entregada
16/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * INSPECCIÓN DE EXTINTORES EN TODOS LOS ESCENARIOS. • * INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO. • * RECORRIDO CON INTERVENTORIA EN ESCENARIOS Y PISTA ATLETICA.	Se verifico en documentación entregada

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
17/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO FUNDIDA FCC - PEDESTALES. • * INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO. • * SEÑALIZACIÓN DE EXCAVACIONES EN ESCENARIOS. • * ORDEN Y ASEO ALMACEN.	Se verifico en documentación entregada
18/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE CABLEADO.	Se verifico en documentación entregada
20/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS FCC. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * ORDEN Y ASEO ATLETISTMO Y ALMACEN. • * ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN. • * REUNIÓN COPASST. • * VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ROTULACIÓN. • * SUSPENDIÓN DE ACTIVIDADES EN PISTA ATLETICA POR EVENTO. • * SEÑALIZACIÓN EN ESCENARIOS.	Se verifico en documentación entregada
21/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * ORDEN Y ASEO TERMINADA LA JORDANA CONTRATISTA FCC. • * ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDAD DE FUNDIDA.	Se verifico en documentación entregada
22/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * INSPECCIÓN INDUSTRIAL EN ESCENARIOS. • * MOVIMIENTO DE MAQUINARIA ENTRE PISTA ATLETICA Y ESCENARIOS.	Se verifico en documentación entregada

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
	• * SOCIALIZACIÓN CON EL PERSONAL EN GENERAL DE OBRA.	
23/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL. • * INSPECCIÓN DE CAMILLAS EN TODOS LOS ESCENARIOS. • * MOVIMIENTO DE MAQUINARIA ENTRE ESCENARIOS Y PISTA ATLETICA.	Se verifico en documentación entregada
24/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS.	Se verifico en documentación entregada
25/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE ATLETISMO. • * ACTIVIDAD DE BIENESTAR LABORAL - PERSONAL CONSORCIO.	Se verifico en documentación entregada
27/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. • * ORDEN Y ASEO ESCENARIOS Y PATINAJE CON CONTRATISTA WILSON CARDENAS. • * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA. • * ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE FUNDIDA. • * MOVIMIENTO DE MAQUINARIA ENTRE ESCENARIOS A PISTA ATLETICA. • * INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO.	Se verifico en documentación entregada
28/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. • * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA.	Se verifico en documentación entregada

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
	• * MOVIMIENTO DE MAQUINARIA DE ESCENARIOS A PISTA DE ATLETISMO. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE FUNDIDA DE SOLADOS EN PISTA ATLETICA.	
29/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. • * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA EN PISTA ATLETICA. • * ORDEN Y ASEO ESCENARIOS Y PATINAJE. • * PAUSAS ACTIVAS. • * ELABORACIÓN DE PREOPERACIONAL DE TRNZADORA. • * INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO.	Se verifico en documentación entregada
30/11/2023	• *CHARLA PREOPERACIONAL. • * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. • *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. • * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. • * ACOMPAÑAMIENTO EN FUNDIDA, ESCENARIOS Y PISTA ATLETICA. • * ARREGLO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL.	Se verifico en documentación entregada

Dentro de la gestión de la implementación de las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizaron en los 3 proyectos, (escenarios deportivos, pista de patinaje y atletismo) se evidencia el cumplimiento del contratista al cumplir con la normativa, aplicación de procedimientos a los cuales se le realizaron sus respectivas observaciones y recomendaciones en puntos donde se evidenciaba falta de información y corrección. Dentro de las actividades realizadas se mencionan las siguientes:

- Se realizo la verificación de la seguridad social de los contratistas y consorcio, los cuales cumplieron los aportes establecidos a todos los subsistemas de seguridad social.
- Se realizo la verificación de la asistencia a charlas y capacitaciones realizadas al personal que se encuentra en los 3 proyectos
- La entrega de elementos de protección personal al personal
- La supervisión en las actividades diarias en obra
- El diligenciamiento de los permisos de trabajo en alturas
- Verificación de documentación de maquinaria, volquetas y operarios
- Revisión y observaciones a procedimientos de actividades

Anexo:
Registro "ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA"
SE ADJUNTA INFORME SST

6. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Empleos directos generados	19
Empleos indirectos generados	22
Total empleos generados	41

ACTORES POR ÁMBITO CONTEXTUAL – LOCAL

EMPLEO	CANTIDAD
Población Urbana y/o Rural	28
Agrícola	
Ganadero	
Escolar	
Comercial	13
Hoteles	
TOTAL	41

7. VERIFICACIÓN MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
ESCENARIOS DEPORTIVOS	Las actividades realizadas en el mes con respecto al área ambiental se describen en los siguientes numerales: 1. Jornada de orden y aseo en el área de trabajo y entradas a la obra (entrada de volquetas y entrada personal). 2. Señalización en la obra con cinta peligro en excavaciones y agregados pétreos acopiados temporalmente y ser extendidos.	Se verifico en documentación entregada

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
	3. Se cambian las bolsas plásticas del punto ecológico, los residuos ordinarios y orgánicos se sacan 3 veces por semana a la entrada de las volquetas para que Bioagricola los retire y realice disposición final en el relleno sanitario del municipio. 4. Para el presente mes fue necesario el cambio de lugar de las baterías sanitarias dado que en donde se instalaron inicialmente se debían realizar excavaciones para la instalación de nueva tubería, Se realiza limpieza de las unidades sanitarias dos veces por semana y se le pone los elementos necesarios para su uso (papel higiénico y papelera). 5. Disposición de material de excavaciones, este material no es reutilizado porque no tiene las condiciones necesarias para ser reutilizado en las actividades de obra civil. Se dispone en el ZODME Guatiquia. 6. Se realizan monitoreos ambientales (Sonometro y Anemometro) para la actividad de nivelación de terreno en escenario 1.	
PISTA DE PATINAJE	• Se realizan monitoreos ambientales de emisiones con equipos (Sonometro y Anemometro) en la actividad de excavación de material para la cimentación del muro de contención de la pista; al punto ecológico instalado se le cambian las bolsas de las canecas para ser sacadas a la puerta principal y retiradas por el camión recolector de Bioagricola.	Se verifico en documentación entregada
PISTA DE ATLETISMO	1. Se realiza actividad de disposición de material de excavación en (ZODME Guajitquia).	Se verifico en documentación entregada

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
	2. Se dejan acopios temporales de agregados pétreos los cuales son señalizados y cubiertos con plástico negro. 3. Se instala el acopio de sustancias químicas para que sea almacenado el combustible de los equipos que operan en el área. 4. Se realiza jornada de orden y aseo en el área de influencia del proyecto, cabe resaltar que como en el periodo comprendido al informe, no hay mucho personal el cual genere gran cantidad de residuos sólidos, por tal razón solo se cambian las bolsas 1 vez por semana. Los residuos son sacados a la puerta del complejo deportivo para que la empresa prestadora del servicio de recolección los disponga en el relleno sanitario del municipio. 5. Se realizan monitoreos ambientales (Sonometro y Anemometro) en actividades de mezcla de concreto y excavación de material.	

Cabe mencionar que en la ejecución de estas actividades se ven relacionados los 3 proyectos que se encuentran en ejecución, (escenarios deportivos, pista de patinaje y atletismo). Dentro de las actividades propuestas para el manejo ambiental mencionadas que se realizaron en conjunto se realizaron de forma integral teniendo en cuenta que los 3 proyectos se realizan en un solo contrato. Sin embrago se realiza entrega de informe de seguimiento de cada proyecto por separado

Anexo: Registro "ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL"
INFORME SEGUIMIENTO PMA

B. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE OBRA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DÍAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Durante este periodo de tiempo no se generó ningún acto prorroga, suspensión.

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Durante este periodo de tiempo no se generó ningún acto adiciona o modificación al contrato de obra

2. GARANTÍAS:

A continuación, se realiza descripción de las pólizas generadas para el contrato de obra publica

POLIZA DE ACTUALIZACION SERIEDAD DE OFERTA ACORDE A MINUTA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-81241317-2
ANEXO N°	0
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-81327904-1
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	10-04-2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/02/2023	23/06/2024	$ 10.174.388.168,40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	23/02/2023	23/06/2024	$ 15.261.582.252,60
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINZACIONES	23/02/2023	23/02/2027	$ 2.543.597.042,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	23/02/2024	23/02/2029	$ 15.261.582.252,60
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/02/2023	23/02/2024	$ 2.543.597.042,10
DAÑO MORAL	23/02/2023	23/02/2024	$ 2.543.597.042,10
LUCRO CESANTE	23/02/2023	23/02/2024	$ 2.543.597.042,10

POLIZA ACTUALIZADA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-81241317-2
ANEXO N°	1
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-81327904-1
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	17-05-2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/05/2023	09/09/2024	$ 10.174.388.168,40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	10/05/2023	09/09/2024	$ 15.261.582.252,60
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINZACIONES	10/05/2023	09/05/2027	$ 2.543.597.042,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	10/05/2023	09/05/2029	$ 15.261.582.252,60
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/02/2023	09/05/2024	$ 2.543.597.042,10
DAÑO MORAL	23/02/2023	23/02/2024	$ 2.543.597.042,10
LUCRO CESANTE	23/02/2023	23/02/2024	$ 2.543.597.042,10

C. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

Durante este periodo de tiempo no se ha realizado ningún pago parcial de obra.

Se ha realizado el pago anticipo realizado por 30% del total del presupuesto= $15.261.582.252,60

A continuación, se relacionan los giros sobre el anticipo aprobados

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR PAGO
ORDEN DE GIRO 1	07-JUL-23	Anticipo Contrato No.01- Organización Terracanto SAS	$ 3.206.552.830,72

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR PAGO
ORDEN DE GIRO 2	31-JUL-23	Corte parcial 1 Contrato No.01- Organización Terracanto SAS	$ 289.205.761,34
ORDEN DE GIRO 3	16-AGOS-23	Anticipo Contrato No.04- Industrias del Hierro SAS	$ 3.598.852.877,00
ORDEN DE GIRO 4	14-AGOS-23	Anticipo Contrato No.06- Organización Terracanto SAS	$ 1.053.857.052,24
ORDEN DE GIRO 5	20-SEPT-23	Anticipo Contrato No.02- Grupo Viarq Ltda	$ 907.601.278,00
ORDEN DE GIRO 6	03-OCT-23	Corte 2 Contrato No.01- Organización Terracanto SAS	$ 132.265.723,00
ORDEN DE GIRO 7	03-OCT-23	Anticipo Contrato No.10- Organización Terracanto SAS	$ 2.007.157.131,00
ORDEN DE GIRO 8	8-NOV-23	Corte parcial 3 Contrato No.01- Organización Terracanto SAS	$ 86,126,323,00
ORDEN DE GIRO 9	14-NOV-23	Consorcio escenarios deportivos Reembolso por concepto de alquiler de maquinaria	$ 144,985,030,60
ORDEN DE GIRO 10	14-NOV-23	Consorcio escenarios deportivos Reembolso por concepto de mano de obra	$ 200,790,003,00
ORDEN DE GIRO 11	15-NOV-23	Consorcio escenarios deportivos Reembolso por concepto de mano de obra	$ 36,132,107,00
ORDEN DE GIRO 12	17-NOV-23	Civideportes SAS Anticipo contrato No 9	$ 241,751,169,00
		TOTAL	**$ 11.905.277.286**

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 01/11/2023 ***AL*** 30/11/2023

A la fecha no se ha generado ningún tipo acta parcial de pago al contrato de obra

D. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
		EJECUTADO	%
1.1	LOCALIZACION. TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.	724,30 m2	11.30%
			
OBSERVACIONES			
DURANTE SE REALIZA ACTIVIDADES DE LOSCALIZACION Y REPLANTEO PARA CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE ESCENARIO 1 y 2 SE IMPLANTA ESCENARIO Y SE REPLANTEAN EJES DE CIMENTACION PARA ZAPATAS Y CONTRAPESOS			

3 EXCAVACIONES Y RELLENOS

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS	EJECUTADO	%
	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	1585.24	33.60%



OBSERVACIONES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION PARA ZAPATAS Y CONTRAPESOS DEL ESCENARIO MULTIPROPOSITO No 2, SE REALZAN EXCAVACIONES PARA ADECUACION DE LA RED DE SUMINISTRO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, IGUALMENTE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION DE ZAPATAS Y CONTRAPESOS DEL ESCENARIO 1

4 CIMENTACIÓN

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4.1	CIMENTACION	EJECUTADO	%
	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	2.61 m3	5.60%



OBSERVACIONES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE SOLADOS DE LIMPIEZA PARA CONFORMACION DE ZAPATAS Y CONTRAPESOS DE LA ESTRUCCTURA DE ESCENARIO No 1 Y ESCENARIO No 2

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4.2	CIMENTACION	EJECUTADO	%
	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	27.60 m3	32.40%
			

OBSERVACIONES

SE REALIZANA ACTIVIDADES DE FUNDIDA DE PEDESTALES EN CNCRETO PARA ESCENARIO 2 ACORDE A DISEÑOS Y ESPECICIFICACIONES EN PLANOS

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4.3	CIMENTACION	EJECUTADO	%
	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	1.69 m3	0.90%



OBSERVACIONES


SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE LA ESTRUCTURA DE ESCENARIO No 1 Y ESCENARIO No 2 SE FUNDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 P.S.I. ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES EN DISEÑO Y PLANIMETRIA ACTUALIZADA

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4.4	CIMENTACION	EJECUTADO	%
	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	37.75 m3	30.20 %



OBSERVACIONES

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VIGAS PARA LA CONFORMACION DE LA CIMENTACION DE ESCENARIO No 2 SE FUNDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 P.S.I. ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES EN DISEÑO Y PLANIMETRIA ACTUALIZADA

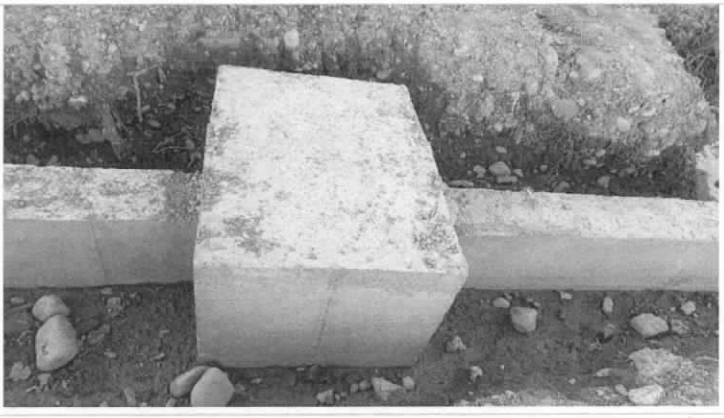ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4.5	CIMENTACION	EJECUTADO	%
	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	14.63	13.50%
			

OBSERVACIONES

SE INICAN ACTIVIDADES DE FUNDIDA DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE CONTRAPESOS PARA EL ESCENARIO No 1 Y 2 SE REALIZAN TOMA DE CILINDROS PARA CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO RESISTENCIA 3000 PSI SEGÚN ESPECIFICACIONES EN PLANOS.

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4.6	CIMENTACION	EJECUTADO	%
	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	4876.38	9.50%



OBSERVACIONES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ARMADO DE PARRILLAS PARA ZAPATAS CONFORMACION DE PEDESTALES, VIGAS Y CONTRAPESOS, SE VERIFICAN CALIBRES DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ACEROS ACORDE A LOS PLLANOS DE DISEÑO ACTUALIZADOS

6,00 ESTRUCTURAS EN ACERO

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	ESTRUCTURAS EN ACERO	EJECUTADO	%
6.1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	4.066.00	0.70



OBSERVACIONES
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE INSTALACION Y MONTAJE DE TORNILLERIA Y PLATINAS QUE CONFORMAN EL ANCLAJE DE LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA METALICA

14,00 INSTALACIONES SANITARIAS

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	INSTALACIONES SANITARIAS	EJECUTADO	%
14.22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	3 UND	100%
			

OBSERVACIONES
SE REALIZA CONSTRUCCION DE CILINDRO EN CONCRETO CON ESPESOR 20 CM SEGÚN ESPECIFICACION Y DISEÑO EN PLANOS HIDROSANITARIOS

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
14.23	INSTALACIONES SANITARIAS	EJECUTADO	%
	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	1 UND	100%
			
OBSERVACIONES			
SE REALIZA CONSTRUCCION DE PLACA PARA CONFORMACION DE PISO DEL POZO DE INSPECCION SE FUNDE EN CONCRETO CON ESPESRO DE 20 CM SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA EN PLANOS			

CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

2 PRELIMINARES

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.2	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	475.83 m3	30.40%



OBSERVACIONES

SE REALIZA EXCAVACION PARA CONFORMACION DE MURO DE CONTENCION PERIMETRAL DE LA PISTA DE RUTA

3,1 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CONCRETOS	EJECUTADO	%
	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	6.40 m2	12.80%
2.1			
	OBSERVACIONES		

SE ADELANTAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE SOLADOS SOBRE LAS EXCAVACIONES PARA CONFORMACION DE ZARPA DE MURO DE CONTENCION

CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO META.

4,00 FILTROS

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	FILTROS	EJECUTADO	%
4.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1.100 M3	12.50%
			
	OBSERVACIONES		
	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MECANICA PARA CONFORMACION DE CAJEO ESTRUCTURA DE LA PISTA ATLETICA		

E. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Durante este período, se presenta el acta que incorpora las modificaciones, adiciones y prórrogas, considerando los ajustes de diseño de la pista y las zonas de competencia de acuerdo con la normativa necesaria para la certificación. La documentación, previamente revisada y aprobada por la interventoría, se entrega a la entidad para llevar a cabo la gestión correspondiente de los recursos.

- Durante este período, se presenta el acta que abarca las modificaciones, adiciones y prórrogas, originadas por los ajustes efectuados en el diseño, específicamente en la geometría de la pista de ruta y en la configuración de la pista de velocidad. La documentación, debidamente revisada y aprobada por la interventoría, se entrega a la entidad para llevar a cabo la gestión correspondiente de los recursos y validar las prorrogas necesarias para actualizar el plazo del contrato.

- Durante este periodo, se continúa trabajando en la proyección de modificaciones y adiciones para el proyecto de escenarios multipropósito. Se está llevando a cabo la actualización de las memorias de cálculo para ajustar las cantidades de obra de acuerdo con las modificaciones realizadas en los diseños. Además, se está trabajando en la incorporación de ítems no previstos, lo que implica la presentación de un análisis de precios para estos elementos. Asimismo, se está proyectando la programación del cronograma de trabajo para establecer el plazo en el cual deben ejecutarse las obras planificadas.

- En este periodo, se prosiguen las actividades de construcción de la cimentación del escenario 1 y 2, llevando a cabo la fundición de zapatas, vigas y contrapesos conforme a las especificaciones detalladas en la planimetría y los diseños actualizados. Debido a que la resistencia del concreto difiere de la indicada en el diseño, es necesario realizar ajustes en el presupuesto para reflejar esta variación

- En relación con la ejecución de la obra, es imperativo que el contratista tome medidas para implementar cuadrillas con el objetivo de mejorar los rendimientos en los proyectos de la pista de patinaje y el escenario de la pista de atletismo. Esto se vuelve fundamental para optimizar el desempeño y poner al día la programación de la obra, que actualmente se encuentra rezagada.

Durante el periodo correspondiente a este informe, el contrato de obra No. 106 de 2023, ha presentado el siguiente avance según la programación de obra ajustada con el acta de inicio:

avance físico mensual	0.72%
total, ejecutado acumulado	6.50%
acumulado programado actualizado	19.42%

De acuerdo con las cantidades ejecutadas, las cuales fueron verificadas por esta interventoría, se obtiene un avance acumulado por capítulo, como se expone a continuación:

- **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.**

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS CORTE NOVIEMBRE			
CONDICIONES CONTRACTUALES		ACUMULADO NOVIEMBRE	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.			
1,1	LOCALIZACION. TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.		
	SUBTOTAL	26.560.823,40	75,880%
2,00	DESMONTE Y DEMOLICIONES		
	SUBTOTAL	796.139.513,08	100,000%
3,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
	SUBTOTAL	449.753.677,24	80,861%
4,00	CIMENTACIÓN		
	SUBTOTAL	705.625.421,83	46,925%
6,00	ESTRUCTURAS EN ACERO		
	SUBTOTAL	104.927.196,00	0,702%
13,00	INSTALACIONES HIDRÁULICAS		
	SUBTOTAL	18.396.081,13	15,313%
14,00	INSTALACIONES SANITARIAS		

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS CORTE NOVIEMBRE			
CONDICIONES CONTRACTUALES		ACUMULADO NOVIEMBRE	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
	SUBTOTAL	82.945.053,84	45,233%
19,00	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESCENARIOS DEPORTIVOS.		
	SUBTOTAL	217.364.197,42	67,090%
	TOTAL, CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO	**2.401.711.963,94**	**7,54%**

- **CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.**

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS CORTE NOVIEMBRE			
CONDICIONES CONTRACTUALES		ACUMULADO NOVIEMBRE	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
B	**CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.**		
1.0	DEMOLICIONES		
	SUBTOTAL	331.345.502,04	99,933%
2,00	PRELIMINARES		
	SUBTOTAL	290.277.110,83	36,151%
3,00	CONCRETOS		
	SUBTOTAL	4.104.147,20	0,648%
9	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE PATINAJE.		
	SUBTOTAL	119.357.475,42	58.35%

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS CORTE NOVIEMBRE			
CONDICIONES CONTRACTUALES		ACUMULADO NOVIEMBRE	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
	TOTAL, CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE	745.084.235	8,46%

- **CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META**

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS CORTE NOVIEMBRE			
CONDICIONES CONTRACTUALES		ACUMULADO NOVIEMBRE	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
C	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
1.0	PRELIMINARES		
	SUBTOTAL	51.980.047,10	95,057%
2,00	EXCAVACION Y RELLENOS		
	SUBTOTAL	28.870.420,00	99,624%
4,00	FILTROS		
	SUBTOTAL	16.295.910,00	3,961%
C	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE ATLETISMO.		
	SUBTOTAL	63.128.974,01	26.96%
	TOTAL, CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO	$ 160.275.351,11	1,570%

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

F. ANEXOS

- Cuadro de resumen cantidades ejecutadas.
- Copia de la bitácora de la obra o de las actividades desarrolladas.
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Control de Seguridad Industrial.
- Control de equipos.
- Estado del tiempo.
- Actas de comité técnico.
- Copia afiliaciones del personal y pagos de seguridad social.
- Copia de los ensayos de laboratorio, certificados de calidad de los materiales, y demás documentos que soporten el control de calidad
- Informe manejo del anticipo
- Informe PMT
- Informe seguimiento PMA
- Manejo Ambiental.
- Informe SST
- Informe de seguimiento plan de salud ocupacional

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 30 días del mes Noviembre del 2023

Firma
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:
2520279953 CND

Firma
Nombre: ANDRÉS HERNANDEZ BOLAÑOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:
A251082008-80038630

Firma
Nombre: JORGUE A. RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:
2520268176 CND

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE/23			ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	∑ mes	% MES	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.						
1,1	LOCALIZACION. TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.	M2	724,30	11,30%	$ 3.938.743,40	4.884,30	$ 26.560.823,40
2,00	DESMONTE Y DEMOLICIONES						
2,1	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	-		$ -	52,00	$ 1.587.248,00
2,2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	-		$ -	75,00	$ 2.861.625,00
2,3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	-		$ -	4.700,80	$ 86.922.492,80
2,4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	KG	-		$ -	25.854,30	$ 141.965.961,30
2,5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	-		$ -	58,00	$ 4.757.914,00
2,6	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	-		$ -	3.250,79	$ 58.582.486,59
2,7	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	-		$ -	3.984,00	$ 54.819.840,00
2,8	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	-		$ -	11,00	$ 167.882,00
2,9	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	-		$ -	487,53	$ 181.853.077,77
2,10	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	-		$ -	3.070,50	$ 44.973.613,50
2,11	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	-		$ -	332,05	$ 143.320.749,20
2,12	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	-		$ -	189,77	$ 72.808.296,82
2,13	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	-		$ -	45,90	$ 1.518.326,10
3,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS						
3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1.585,24	33,60%	$ 61.033.325,24	4.337,24	$ 166.988.077,24
3,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	-		$ -	4.446,00	$ 282.765.600,00
3,3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	-		$ -	-	$ -
4,00	CIMENTACIÓN						
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2,61	5,60%	$ 1.673.722,53	27,00	$ 17.314.371,00
4,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	27,60	32,40%	$ 39.867.979,20	43,40	$ 62.690.952,80
4,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,69	0,90%	$ 1.695.266,04	121,76	$ 122.139.404,16
4,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	37,75	30,20%	$ 40.584.987,25	56,27	$ 60.495.820,73
4,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	14,63	13,50%	$ 9.490.919,90	112,90	$ 73.241.617,00
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	4.876,38	9,50%	$ 41.512.622,94	43.432,78	$ 369.743.256,14
4,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-		$ -	-	$ -
5,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	-		$ -	-	$ -

CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE/23			ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	Σ mes	% MES	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5,2	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-		$ -	-	$ -
5,3	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. GRADERÍAS	M3	-		$ -	-	$ -
6,00	**ESTRUCTURAS EN ACERO**						
6,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4.066,00	0,70%	$ 104.927.196,00	4.066,00	$ 104.927.196,00
6,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	-		$ -	-	$ -
7,00	**CUBIERTA Y FACHADA**						
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2''	M2	-		$ -	-	$ -
7,2	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte y remates de cubierta)	M2	-		$ -	-	$ -
8,00	**MAMPOSTERÍA Y PAÑETES**						
8,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	-		$ -	-	$ -
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-		$ -	-	$ -
8,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-		$ -	-	$ -
8,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-		$ -	-	$ -
8,5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-		$ -	-	$ -
8,6	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-		$ -	-	$ -
8,7	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	-		$ -	-	$ -
8,8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	-		$ -	-	$ -
8,9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M3	-		$ -	-	$ -
8,10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	-		$ -	-	$ -
9,00	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
9,1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	-		$ -	-	$ -
9,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	-		$ -	-	$ -
9,3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	-		$ -	-	$ -
9,4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	-		$ -	-	$ -
9,5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	-		$ -	-	$ -
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	-		$ -	-	$ -
9,7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	-		$ -	-	$ -
9,8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	-		$ -	-	$ -
9,9	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UND	-		$ -	-	$ -
10,00	**CARPINTERÍA METÁLICA**						
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UND	-		$ -	-	$ -
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	-		$ -	-	$ -
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMINIO	M2	-		$ -	-	$ -

11.904

CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE/23			ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	∑ mes	% MES	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	-		$ -	-	$ -
10,5	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	M2	-		$ -	-	$ -
11,00	**OBRAS EXTERIORES**						
11,1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	-		$ -	-	$ -
11,2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	-		$ -	-	$ -
11,3	SISTEMA MODULAR SPORT PARA CANCHAS DEPORTIVAS (FLEXIBLES, ALTOS ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA CUALQUIER ESCENARIO DEPORTIVO DE COMPETITIVIDAD)	M2	-		$ -	-	$ -
11,4	SISTEMA MODULAR ESPECIALIZADO PARA PESAS EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO, MEDIDAS DE 30 CMS X 30 CMS Y ESPESOR DE 1.2 CMS	M2	-		$ -	-	$ -
11,5	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	-		$ -	-	$ -
11,6	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	-		$ -	-	$ -
11,7	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	-		$ -	-	$ -
12,00	**PISOS Y ENCHAPES**						
12,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	-		$ -	-	$ -
12,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	-		$ -	-	$ -
12,3	ESTUCO PLASTICO	M2	-		$ -	-	$ -
13,00	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**						
13,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	-		$ -	76,96	$ 424.973,12
13,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	-		$ -	46,18	$ 3.171.321,50
13,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	-		$ -	10,00	$ 2.479.040,00
13,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	-		$ -	13,85	$ 1.659.939,47
13,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	-		$ -	32,32	$ 2.055.755,52
13,6	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	76,96	$ 8.605.051,52
13,7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
13,8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
13,9	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
13,10	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
13,11	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
13,12	TUBERÍA PVCP RDE 9 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
13,13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
13,14	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
13,15	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
13,16	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
13,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	-		$ -	-	$ -
13,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø4" UM	UN	-		$ -	-	$ -
13,19	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
13,20	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
13,21	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
13,22	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -

CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE/23			ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	Σ mes	% MES	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13,23	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
13,24	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	-		$ -	-	$ -
14,00	**INSTALACIONES SANITARIAS**						
14,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	-		$ -	131,82	$ 727.910,04
14,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	-		$ -	395,46	$ 27.159.797,34
14,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	-		$ -	85,00	$ 21.071.840,00
14,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	-		$ -	48,51	$ 5.812.779,01
14,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	-		$ -	342,73	$ 21.797.755,20
14,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	-		$ -	32,93	$ 3.326.753,25
14,7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
14,8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
14,9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
14,10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
14,11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
14,12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
14,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
14,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
14,15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
14,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	-		$ -	-	$ -
14,17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	-		$ -	-	$ -
14,18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
14,19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
14,20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
14,21	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UN	-		$ -	-	$ -
14,22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	UN	3,00	100%	$ 1.541.169,00	3,00	$ 1.541.169,00
14,23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	1,00	100%	$ 502.350,00	3,00	$ 1.507.050,00
15,00	**RED AGUAS LLUVIAS**						
15,1	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
15,2	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
15,3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	-		$ -	-	$ -
15,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
16,00	**RED CONTRA INCENDIOS**						
16,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	-		$ -	-	$ -

CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE/23			ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	Σ mes	% MES	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	-		$ -	-	$ -
16,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	-		$ -	-	$ -
16,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	-		$ -	-	$ -
16,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	-		$ -	-	$ -
16,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	-		$ -	-	$ -
16,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	-		$ -	-	$ -
16,8	TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
16,9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
16,10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
16,11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
16,12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
16,13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
16,14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
17,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS**						
17,1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	-		$ -	-	$ -
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4-0 - JUEGO X 3 UNIDADES - TFT151EXT	UN	-		$ -	-	$ -
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE 225 KVA, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UN	-		$ -	-	$ -
17,4	PLATINA DE COBRE 1000A PARA EXTENSIÓN DE BARRAJES DE TRANSFORMADOR DE 300KVA	UN	-		$ -	-	$ -
17,5	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	-		$ -	-	$ -
17,6	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	-		$ -	-	$ -
17,7	GENERADOR DIÉSEL DE 225KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	-		$ -	-	$ -
17,8	TABLERO DE DISTRIBUCION ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 125A; BARRAJE PRINCIPAL DE 300A, PROTECCION PARA 2 CIRCUITOS TRIFASICOS DE 63A, EN COFRE METALICO DE 80X40X35 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	-		$ -	-	$ -
17,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO DE SALIDA LED, COLOR VERDE, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 110V-130V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, CUADRADA 18X290X4.5. AUTONOMIA 90MINUTOS. DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	-		$ -	-	$ -
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA <3.2W, TEMPERATURA DEL COLOR 6000-6500K, VIDA ÚTIL 35000 HORAS, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V-277V, FACTOR DE POTENCIA >0,9. AUTONOMÍA 90 MINUTOS. IP20. RECTANGULAR 30X13X6 CM, DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	-		$ -	-	$ -
17,11	Suministro e instalación de acometida 2x(3x250+250+2T)	ML	-		$ -	-	$ -
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0+2/0+6T	ML	-		$ -	-	$ -
17,13	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	-		$ -	-	$ -

CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE/23			ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	Σ mes	% MES	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
17,14	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-		$ -	-	$ -
17,15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
17,16	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	-		$ -	-	$ -
17,17	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN CON VARILLA ROSCADA Y RIEL OMEGA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS. LA SALIDA INCLUYE LA INCIDENCIA DE LOS ML DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO RAMAL	UN	-		$ -	-	$ -
17,18	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1''	ML	-		$ -	-	$ -
17,19	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
17,20	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
17,21	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
17,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL METÁLICO DE 10M , GALVANIZADO CON DOS BRAZOS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO), TOT TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE D E 40 X 40 EN 1/2",	UN	-		$ -	-	$ -
17,23	CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA POSTES METÁLICOS SEGÚN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MÁSTIL METÁLICO	UN	-		$ -	-	$ -
17,24	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	-		$ -	-	$ -
17,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X8+8T AWG - THHN	ML	-		$ -	-	$ -
17,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO ≥110,9W - IP65 - IK08 - 4.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	-		$ -	-	$ -
17,27	Suministro e instalación LUMINARIA Panel LED <20W, angulo de apertura 120º, 1799 lumenes, eficiencia 72 lm/W, temperatura del color 3000-6000K, vida util 35000 horas, tension de operación 100V-240V, factor de potencia >0,9, IP20. Redonda diametro 30 cm. Debe terner certificado RETILAP	UN	-		$ -	-	$ -
17,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA <40W, 3400 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP65. RECTANGULAR 120X11X7 CM, DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	-		$ -	-	$ -
17,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL <24W, 2880-4000 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP20. CUADRADA 60X60 CM, DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	-		$ -	-	$ -
17,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 7W	UN	-		$ -	-	$ -
17,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 6W	UN	-		$ -	-	$ -
17,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HIGHBAY ≤200W	UN	-		$ -	-	$ -
17,33	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE	UN	-		$ -	-	$ -
17,34	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	-		$ -	-	$ -
17,35	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,4X0,4M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8")	ML	-		$ -	-	$ -
17,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	-		$ -	-	$ -

CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE/23			ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	Σ mes	% MES	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
17,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNAFS	UN	-		$ -	-	$ -
17,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 3/4"	ML	-		$ -	-	$ -
17,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	-		$ -	-	$ -
18,00	SEÑALETICA						
18,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION EN LAMINA DE POLIESTILENO CALIBRE DE 40 DE 1 MM DE ESPESOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SOBRE VINILO GRADO DE INGENERIA CON CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	M2	-		$ -	-	$ -

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.					
B	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.						
1,0	DEMOLICIONES						
1,1	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	ML	-		$ -	658,80	$ 10.231.164,00
1,2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	-		$ -	529,36	$ 197.456.044,24
1,3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	-		$ -	133,00	$ 38.753.008,00
1,4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	-		$ -	221,30	$ 84.905.285,80
2,00	PRELIMINARES						
2,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA,CARTERA Y PLANOS.	M2	-		$ -	6.000,00	$ 32.628.000,00
2,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	475,83	30,40%	$ 18.319.930,83	855,83	$ 32.950.310,83
2,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	-		$ -	3.533,00	$ 224.698.800,00
3,00	CONCRETOS						
3,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	6,40	12,80%	$ 4.104.147,20	6,40	$ 4.104.147,20
3,2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO YCONSTRUCCIÓN	M3	-		$ -	-	$ -
3,3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	-		$ -	-	$ -
3,4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	-		$ -	-	$ -
3,5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-		$ -	-	$ -
3,6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	-		$ -	-	$ -
4,00	CIMENTACIÓN						
4,1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	-		$ -	-	$ -
4,2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	-		$ -	-	$ -
4,3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	-		$ -	-	$ -
4,4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	-		$ -	-	$ -

CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE/23			ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	Σ mes	% MES	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4,5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS	M2	-		$ -	-	$ -
4,6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 6O MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2 CAPAS	M2	-		$ -	-	$ -
4,7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50%.3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada para los deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMUSLSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%.	M2	-		$ -	-	$ -
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1 1/2" BARANDA 5/8"	ML	-		$ -	-	$ -
5,00	PISTA DE VELOCIDAD						
5,1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	-		$ -	-	$ -
5,2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	-		$ -	-	$ -
5,3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	-		$ -	-	$ -
5,4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	-		$ -	-	$ -
5,5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS	M2	-		$ -	-	$ -
5,6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 6O MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2 CAPAS	M2	-		$ -	-	$ -
5,7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50%.3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada paralos deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMUSLSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%.	M2	-		$ -	-	$ -
5,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA PISTA DE PATINAJE.	ML	-		$ -	-	$ -
5,9	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 45 CM DE LARGO Y 5 CM DE ANCHO CADA 40 CMS EN LINEA RECTA Y CADA 10 CM EN CURVA, CON UN ESPESOR DE 5 MM, HECHOS EN SINTETICO ACRILICO CARGADO CON CUARZO.	UN	-		$ -	-	$ -
6,00	OBRAS EXTERIORES						
6,1	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	-		$ -	-	$ -
6,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	-		$ -	-	$ -

 11.910

CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE/23			ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	Σ mes	% MES	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6,3	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	-		$ -	-	$ -
6,4	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	-		$ -	-	$ -
7,00	RED AGUAS LLUVIAS						
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	-		$ -	-	$ -
7,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	-		$ -	-	$ -
7,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	-		$ -	-	$ -
7,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	-		$ -	-	$ -
7,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	-		$ -	-	$ -
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	-		$ -	-	$ -
7,7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
7,8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
7,9	CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,48 A=0,50 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	-		$ -	-	$ -
7,10	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD. PARA PISTA DE PATINAJE	ML	-		$ -	-	$ -
8,00	REDES ELECTRICAS						
8,1	MASTIL METALICO TRONCO CONICO OCTOGONAL DE 16-18M FABRICADO EN SECCIONES EMBONADAS, BASE REDONDA 600MM EN 3/4 DE ESPESOR, CANASTILLA DE ANCLAJE CON 8 PERNOS DE 7/8" X 1500MM, CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA ALOJAR DE 1 A 8 REFLECTORES, PELDAÑOS DE ASCENSO Y LINEA DE VIDA A PARTIR DE LOS 4M,GALVANIZADO EN CALIENTE	UN	-		$ -	-	$ -
8,2	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-		$ -	-	$ -
8,3	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	-		$ -	-	$ -
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	-		$ -	-	$ -
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2+2+8T AWG THHN	ML	-		$ -	-	$ -
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4+4+8T AWG THHN	ML	-		$ -	-	$ -
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+8T AWG THHN	ML	-		$ -	-	$ -
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8+8+8T AWG THHN	ML	-		$ -	-	$ -
8,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 2"	ML	-		$ -	-	$ -
8,10	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	-		$ -	-	$ -
8,11	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	-		$ -	-	$ -

CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE/23			ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	Σ mes	% MES	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 800W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	-		$ -	-	$ -
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 600W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	-		$ -	-	$ -
8,14	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA ILUMINACION PATINAJE QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 300A; BARRAJE PRINCIPAL DE 400A, 7 ARRANCADORES DIRECTOR CON PROTECCION DE 50A Y CONTACTOR TRIPOLAR DE 50A EN AC3; ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION, EN COFRE METALICO DE 100X60X40 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	-		$ -	-	$ -
8,15	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	-		$ -	-	$ -
8,16	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	-		$ -	-	$ -
8,17	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	-		$ -	-	$ -
8,18	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-		$ -	-	$ -
8,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	-		$ -	-	$ -
8,20	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	-		$ -	-	$ -
8,21	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-		$ -	-	$ -
8,22	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	-		$ -	-	$ -
8,23	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	-		$ -	-	$ -
8,24	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	-		$ -	-	$ -
8,25	CANALIZACIÓN 18 DUCTOS DE 2" PVC	ML	-		$ -	-	$ -
8,26	CANALIZACIÓN 12 DUCTOS DE 2" PVC	ML	-		$ -	-	$ -
8,27	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 2" PVC	ML	-		$ -	-	$ -
8,28	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 2" PVC	ML	-		$ -	-	$ -
8,29	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 2" PVC	ML	-		$ -	-	$ -
8,30	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	-		$ -	-	$ -
8,31	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	-		$ -	-	$ -
8,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	-		$ -	-	$ -
8,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	-		$ -	-	$ -
8,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	-		$ -	-	$ -
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.					
C	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META						
1,0	PRELIMINARES						
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	-		$ -	9.645,00	$ 41.946.105,00
1,2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	-		$ -	26,90	$ 10.033.942,10
2,00	EXCAVACION Y RELLENOS						
2,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	-		$ -	42,00	$ 1.617.042,00
2,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	-		$ -	238,00	$ 16.345.602,00
2,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	-		$ -	44,00	$ 10.907.776,00
3,00	OBRAS EXTERIORES						
3,1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	-		$ -	-	$ -

CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE/23			ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	Σ mes	% MES	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3,2	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,40 A=0,50. DESARROLLO 1,13 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	-		$ -	-	$ -
3,3	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD.	ML	-		$ -	-	$ -
4,00	**FILTROS**						
4,1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1.110,00	12,50%	$ 16.295.910,00	1.110,00	$ 16.295.910,00
4,2	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	-		$ -	-	$ -
5,00	**SUPERFICIE**						
5,1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	-		$ -	-	$ -
5,2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	-		$ -	-	$ -
5,3	PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA EN SITIO CERTIFICADA IAAF: SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 Y DIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPA ELÁSTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPA POROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM 1 A 4 MM DE COLOR ROJO.	M2	-		$ -	-	$ -
5,4	DEMARCACION PISTA	ML	-		$ -	-	$ -
6,00	**ACCESORIOS**						
6,1	BORDILLO ALUMINIO DESMONTABLE CERTIFICADO IAAF	ML	-		$ -	-	$ -
6,2	OBSTACULO CARRERA CERTIFICADO IAAF	UN	-		$ -	-	$ -
6,3	TACOS DE SALIDA	UN	-		$ -	-	$ -
7,00	**PLACA EN CONCRETO**						
7,1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-		$ -	-	$ -
7,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	-		$ -	-	$ -
7,3	SISTEMA MODULAR DEPORTIVO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TEJIDO EN REJILLA, TABLETAS DE 25 CM X 25 CMS X 12.5 MM	M2	-		$ -	-	$ -
8,00	**GRAMA SINTETICA**						
8,1	RELLENO CON GRAVILLA	M3	-		$ -	-	$ -
8,2	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	-		$ -	-	$ -
19,00	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS.**						
19,1	CERTFICACION RETIE REDES DE MEDIA		-		$ -	-	$ -
19,2	CERTFICACION E INSPCCION DE TRANSFORMADOR		-		$ -	-	$ -
19,3	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION		-		$ -	-	$ -
19,4	RETIE USO FINAL		-		$ -	-	$ -
19,5	CERTIFICACION RETILAP		-		$ -	-	$ -
19,6	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA		-		$ -	-	$ -
20,0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		0,0129		$ 3.836.345,70	0,7307	$ 217.364.197,42
9,00	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE**						
9,1	RETIE USO FINAL		-		$ -	-	$ -
9,2	CERTIFICACION RETILAP		-		$ -	-	$ -
9,3	PMA		0,0204		$ 3.836.345,70	0,6356	$ 119.357.475,42
9,00	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE**		-				

CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE/23			ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	Σ mes	% MES	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9,1	Diagnostico pista de Atletismo IAAF -Identificación de las materias primas IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Inspección visual IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Espesor de la pista EN 1969 -Absorción de impactos y Deformación vertical (12 puntos) EN 14808 y EN 14809 -Deslizamiento (6 puntos) EN 13036-4 -Planimetría de la superficie IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Drenaje IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications		-		$ -	-	$ -
9,2	PMA		0,0712		$ 13.374.155,70	0,3362	$ 63.128.974,01
	VALOR TOTAL				$ 366.535.117	0,72%	$ 3.307.071.551

11914

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

COPIA DE LA BITACORA DE OBRA

11 715

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	1	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 9:00 AM HASTA LAS 12:00 PM Y DE 3:30 PM A 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	4.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	19	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	9	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.2	M3	PEDESTAL EN CONCRETO 5000 PSI	3.94	SI	SI
A4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 4000 PSI	5.39	SI	SI
A6.1	KG	ACERO ESTRUCTURAL	580.86	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11916

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	2	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			LLUVIAS DESDE LAS 9:00 AM A 9:30 AM Y DE 1:00 PM A 2:30 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	2 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	19	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	9	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A4.6	KG	ACERO DE REFUERZO	812.73	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088003863O	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.917

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	3	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 7:00 AM HASTA LAS 9:00 AM Y DE 12:30 A 2:00 PM
TORMENTA				
LLUMOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	3.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	18	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A14.23	UND	LOSA INFERIOR BASE PARA POZO	1.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.918

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	4	11	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	16	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	11	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11919

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	6	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	0	X				
AYUDANTES	13	X				
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	0	X				
CADENERO	0	X				
OTRO	0	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.920

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	7	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	1	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	22	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A4.2	M3	PEDESTAL EN CONCRETO 5000 PSI	3.94	SI	SI
A4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 4000 PSI	5.39	SI	SI
A6.1	KG	ACERO ESTRUCTURAL	580.86	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11921

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	8	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 7:00 AM HASTA LAS 12:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	1	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	22	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A4.1	M3	SOLADO CONCRETO 2000 PSI	0.44	SI	SI
A4.6	KG	ACERO DE REFUERZO	812.73	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11922

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	9	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 4:00 PM HASTA LAS 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias	1 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	23	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TECNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.6	KG	ACERO DE REFUERZO	812.73	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11923

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	24	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.6	KG	ACERO DE REFUERZO	812.73	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820080038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.924

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	11	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 9:00 AM HASTA LAS 10:00 AM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	1 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	23	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30,18	SI	SI
A4.1	M3	SOLADO CONCRETO 2000 PSI	0.44	SI	SI
C4.1	M2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS	185,00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.925

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		LLUVIAS DESDE LAS 7:00 AM HASTA LAS 9:00 AM Y DE 3:30 A 5:00 PM
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	3.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	1	X				
OPERARIO	0	X				
AYUDANTES	6	X				
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	0	X				
CADENERO	0	X				
OTRO	0	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11926

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	23	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.2	M3	PEDESTAL EN CONCRETO 5000 PSI	3.94	SI	SI
A4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 4000 PSI	5.39	SI	SI
A4.5	M3	CICLOPEO EN CONCRETO 3000 PSI	7.32	SI	SI
A6.1	KG	ACERO ESTRUCTURAL	580.86	SI	SI
A14.22	UND	CILINDRO CONCRETO 4000PSI	1.00	SI	SI
C4.1	M2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS	185.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.927

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 7:00 AM HASTA LAS 8:00 AM Y DE 2:00 PM A 3:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	2 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	24	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	3	X		ESTACION	3	
CADENERO	3	X		NIVEL	3	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A4.1	M3	SOLADO CONCRETO 2000 PSI	0.44	SI	SI
A4.6	KG	ACERO DE REFUERZO	612.73	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11928

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			LLUVIAS DESDE LAS 9:00 AM HASTA LAS 9:30 AM Y DE 4:00 PM A 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	1.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	2	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	22	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	7	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.66	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11929

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	17	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 3:00 PM HASTA LAS 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias	2 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	1	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	23	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	7	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.2	M3	PEDESTAL EN CONCRETO 5000 PSI	3.94	SI	SI
A4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 4000 PSI	5.39	SI	SI
A4.5	M3	CICLOPEO EN CONCRETO 3000 PSI	7.32	SI	SI
A6.1	KG	ACERO ESTRUCTURAL	580.86	SI	SI
C4.1	M2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS	185.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820088038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.930

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	11	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	0	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	21	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	7	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	20	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	26	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	11	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.932

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 1:30 PM HASTA LAS 5:00 PM
TORMENTA		X		
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias	3.5 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	26	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	11	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TECNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACIÓN MECANICA	105.68	SI	SI
A4.2	M3	PEDESTAL EN CONCRETO 5000 PSI	3.94	SI	SI
A4.3	M3	ZAPATA EN CONCRETO 4000 PSI	1.69	SI	SI
A4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 4000 PSI	5.39	SI	SI
A6.1	KG	ACERO ESTRUCTURAL	580.86	SI	SI
A14.22	UND	CILINDRO CONCRETO 4000PSI	1.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.933

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	3	X		MINICARGADOR	1	
AYUDANTES	26	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	11	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.66	SI	SI
A4.1	M3	SOLADO CONCRETO 2000 PSI	0.44	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.934

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 8:30 AM HASTA LAS 9:30 AM Y DE 4:00 A 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias	2 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	2	
AYUDANTES	27	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A4.1	M3	SOLADO CONCRETO 2000 PSI	0.44	SI	SI
C4.1	M2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS	165.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.935

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	24	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 7:00 AM HASTA LAS 8:00 AM Y DE 11:00 AM A 12:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
Tiempo de espera por lluvias	2 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	2	
AYUDANTES	27	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30,18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105,68	SI	SI
B2.2	M3	EXCAVACION MECANICA	95,17	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.936

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	25	11	2023	7:00am	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	2	
AYUDANTES	27	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.6	KG	ACERO DE REFUERZO	812.73	SI	SI
B2.2	M3	EXCAVACION MECANICA	95.17	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.937

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	27	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE LAS 3:00 PM HASTA LAS 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias	2 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	2	
AYUDANTES	32	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	11	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.2	M3	PEDESTAL EN CONCRETO 5000 PSI	3.94	SI	SI
A4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 4000 PSI	5.39	SI	SI
A6.1	KG	ACERO ESTRUCTURAL	580.86	SI	SI
A14.22	UND	CILINDRO CONCRETO 4000PSI	1.00	SI	SI
C4.1	M2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS	185.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A2510820080038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones.

11.938

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	28	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	2	
AYUDANTES	32	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	10	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A4.1	M3	SOLADO CONCRETO 2000 PSI	0.44	SI	SI
B2.2	M3	EXCAVACION MECANICA	95.17	SI	SI
C4.1	M2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS	185.00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11739

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	29	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE 9:00 AM A 10:00 AM Y 3:00 PM HASTA LAS 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de espera por lluvias	4 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	2	
AYUDANTES	30	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION	2	
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	11	X	RESIDENTES Y HS			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS					
ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
B2.2	M3	EXCAVACION MECANICA	95.17	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.940

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-40
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	BITACORA DE OBRA	Versión: 02

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	11	2023	7:00am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500094
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	BPIN 2022005500022
CONTRATO OBRA N°	106 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		LLUVIAS DESDE LAS 1:30 AM HASTA LAS 3:30 PM
SOLEADO	X			
Tiempo de espera por lluvias	2 HR			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ALMACENISTA	1	X				
OFICIAL	2	X				
OPERARIO	4	X		MINICARGADOR	2	
AYUDANTES	31	X		EXCAVADORA	2	
CELADOR	2	X				
TOPÓGRAFO	2	X		ESTACION		
CADENERO	2	X		NIVEL	2	
OTRO	11	X	RESIDENTES Y HS		2	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
A1.1	M2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	30.18	SI	SI
A3.1	M3	EXCAVACION MECANICA	105.68	SI	SI
A4.2	M3	PEDESTAL EN CONCRETO 5000 PSI	3.94	SI	SI
A4.4	M3	VIGA EN CONCRETO 4000 PSI	5.39	SI	SI
A6.1	KG	ACERO ESTRUCTURAL	580.86	SI	SI
B2.2	M3	EXCAVACION MECANICA	95.17	SI	SI
B3.1	M3	SOLADO LIMPIEZA 2000 PSI	6.40	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bitácora bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día
30 de noviembre de 2023

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-132229 CND	
Nombre: ANDRES HERNANDEZ BOLAÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: A25108200880038630	
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-090820 CND	
Nombre: LEONEL ROA RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-79953 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

11.941

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

CORRESPONDENCIA GENERADA (ENVIADA)

11.942

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 03 de noviembre del 2023 **OF-C249 -2023-178**

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 N°24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: REMISIÓN COMPROBANTE DE PAGO DE RENDIMIENTOS DEL ANTICIPO DE OCTUBRE.

Respetados señores

Me permito remitir certificado de transferencia de los rendimientos generados en la cuenta bancaria del Consorcio Interescenarios por el anticipo recibido de acuerdo al contrato de interventoría N°249/2023, por el mes de octubre, así:

- Rendimientos de octubre: $48.044

Sin otro particular,

07 NOV 2023
11:50 3589

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Banco de Bogotá

11.943

HECTOR ARMANDO
GOMEZ JAIMES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/02 16:09

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO6630
No. Producto	*****6630
Fecha	2023/10/31
Transacción	Intereses ganados
Oficina	2027

Desc. Oficina	2027-GERENCIA BANCA PYME 122
No. Documento	0000000000
Débitos	$0.00
Créditos	$48,044.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00

11944

AHO6630	2023/11/02	$48,044.00	Banco Davivienda	INSTITUTO DE DEPORTES Y R	379400003073	Exitosa

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**Referencia / Nro. Factura**	N/A
Nombre Producto	AHO6630	**Información Adicional**	rendimientos octubre
Nro. Producto	*****6630	**Estado**	Exitosa
Fecha Transferencia	2023/11/02	**Nro. Autorización**	158807
Nombre Destinatario	INSTITUTO DE DEPORTES Y R	**Fecha de Emisión**	2023/11/02
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Exonerar Transacción de GMF**	N/A
Nro. Identificación	00822002510	**Usuario Crea**	HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Valor Transferencia	$48,044.00	**Usuario Aprueba/Rechaza**	HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Entidad Financiera	Banco Davivienda	**Código de Error**	N/A
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Descripción de Código de Error**	N/A
Nro. Producto Destino	379400003073		

CONSORCIO INTERESCENARIOS

11945

OF-C249 -2023-179

Villavicencio, 03 de noviembre del 2023

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Dra. Martha Bibiana Pan Merchán, Jefe Oficina Asesora de Planeación
Supervisora contrato de interventoría N° 249 de 2023
planeacion@idermeta.gov.co
Carrera 16 Nº24-03 Barrio Olímpico
Villavicencio-Meta-Colombia.

09 NOV 2023
4203 3701

REFERENCIA: Contrato de obra Nº106 de 2023[1]

ASUNTO: solicitud de definición de alcance y requerimientos iluminación pista atletismo

Respetados señores

En atención al contrato de la referencia y teniendo en cuenta lo establecido en la documentación entregada por la entidad contratante producto de la consultoría realizada por AIM, se estableció que en la planimetría entregada NO existe diseño de redes eléctricas, al igual que NO se contempla dentro del presupuesto un capítulo para iluminación de la pista de atletismo. 1

Por lo anterior se procede a determinar el ajuste requerido en este capítulo del proyecto en cumplimiento de las necesidades y normativa vigente tomando como parámetro la de la siguiente documentación:

1. **INFORME DIAGNOSTICO Y REVISION DOCUMENTACION PRE Y CONTRACTUAL**

Tal como se manifestó en informe diagnóstico de fecha 22 mayo de 2023, la pista de atletismo contratada se debe construir acorde a la norma IAAF y al MED (manual de escenarios deportivos del ministerio del deporte), y la misma se encuentra ubicada dentro del estadio macal, escenario de futbol que se encuentra bajo pólizas de estabilidad y calidad, por tanto, se debe mantener los cuidados necesarios para no afectar sus garantías.

Adicionalmente en la revisión se puede observar que la iluminación de la pista de atletismo posiblemente se contempló para ser asumida con las torres de alumbrado de la cancha de fútbol del estadio macal, lo cual bajo el punto de vista de la presente interventoría genera un gasto oneroso, innecesario e inadecuado ya que la misma no está diseñada bajo los parámetros requeridos para le realización de atletismo sino de futbol.

2. LA METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA –MGA

..." Descripción de la situación existente con respecto al problema
han propuesto aportar a la infraestructura existente mediante obras de adecuación, mantenimiento y remodelación, esencialmente para la atención de los semilleros deportivos, por lo que se promueven

[1] El objeto del contrato es la construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del Meta".

principalmente las actividades recreativas..." (el subrayado es nuestro)

..." Magnitud actual del problema indicadores de referencia
Actualmente, el Municipio de Villavicencio NO cuenta con un escenario deportivo adecuado para la práctica del atletismo a nivel competitivo y de alto rendimiento, con miras a generar y formar deportistas profesionales. La entidad territorial no cuenta con infraestructura para atender las necesidades en deporte de alto rendimiento (Atletismo) ..." (el subrayado es nuestro)

..." Identificación y análisis de participantes..."

Participante
Actor: Otro
Entidad: LIGA DE ATLETISMO
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Escenarios deportivos adecuados para las practicas
Actor: Otro
Entidad: POBLACION
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Contar con un espacio adecuado para la práctica profesional de atletismo

..." 02 - Análisis de los participantes
Se realizará una cooperación entre Departamento, el Instituto de Deporte y Recreación del Meta, ligas de atletismo existentes y población en general, para aportar con el presente proyecto un área completa para la formación y eventuales competencias, torneos o demás actividades de tipo profesional o alto rendimiento. ..." (el subrayado es nuestro)

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	AUMENTAR LOS NIVELES DE PRACTICA EN ATLETISMO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, META	Pistas de atletismo construidas y dotadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de Supervisión	La pista construida es usada diariamente

Así las cosas, debemos concluir que la MGA, aprobada por el Departamento Nacional de Planeación para el proyecto con código BIPIN 2022005500094, establece como problema e indicador de referencia la necesidad de semilleros deportivos e infraestructura para atender las necesidades en deporte de **alto rendimiento** (Atletismo), mediante la entrega de **espacios adecuados, para la práctica profesional del atletismo.**

No se evidencia dentro de la cadena de valor o meta proyecto la inclusión de ningún capitulo Eléctrico para este proyecto.

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

3. MANUAL DE ESCENARIOS DEPORTIVO – MINDEPORTE

..." Módulo 1

Escenarios de formación y competencia
Edificaciones creadas para desarrollo de habilidades, perfeccionamiento y práctica deportiva; así como para la realización de competencias a nivel regional y local, permitiendo un uso más alto y con mayor nivel de frecuencia.
Estos escenarios deben cumplir con las medidas y características mínimas exigidas por la norma en las zonas de competencia y las auxiliares y deben de mantener graderías para público y otros espacios y características técnicas que permitan su adecuado funcionamiento. ..." (el subrayado es nuestro)

En este punto cabe resaltar la definición del Ministerio de deporte para un escenario de formación y competencia, lo que se cumple parcialmente al estar inmerso dentro del estadio exceptuando en lo relacionado a la iluminación de la pista, **aclarando que la misma solo es necesaria si y solo si se plantea la realización de actividades nocturnas.**

..." Módulo 5

Sistema de iluminación
Niveles de iluminancia competencias 600 luxes a 800 luxes.
Para garantizar una iluminación adecuada, se debe tomar el escenario principal (pista atlética) y teniendo en cuenta sus dimensiones se hará el correspondiente cálculo para la altura de las torres de iluminación, teniendo en cuenta además toda la información presentada en las generalidades.
Para alcanzar el nivel de iluminancia de competencia nacional se debe estimar aproximadamente 35 equipos de iluminación por cada torre. Se debe reforzar el nivel de iluminancia en la línea de llegada para el photo finish buscando así un nivel final de 100 luxes.
Esta línea de meta se refuerza con aproximadamente cuatro luminarias tipo LED ubicadas sobre la estructura en U invertida y se deben orientar directamente al suelo. La ubicación de las torres de iluminación depende en gran medida del tamaño de las graderías, con el fin de no afectar la visual de los espectadores, también depende del espacio que tenga el lote del proyecto y la zona donde es posible fundir las zapatas de las torres las torres de iluminación deben especificarse con escalera y canasta en la parte superior.

Los tableros de los conjuntos eléctricos proyectados para las torres de iluminación deben ser tipo intemperie (IP65). Se contemplan salidas de tomacorrientes dobles para la energización de dispositivos en las mesas de los jueces como: consolas, estadísticas, anotadores entre otros.

Las salidas eléctricas deben ser reguladas (alimentadas desde UPS) se contempla salida de datos, de audio, de video, para la transmisión de información de sonido y de gráficos. Se ubican en las mesas de los jueces. ..." (el subrayado es nuestro)

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

En este módulo determinan las características de cálculo y de ubicación y especificaciones a tener encuentra para el diseño eléctrico y de iluminación, acorde a la normativa vigente, lo que generaría un costo y unos parámetros a definir por la entidad que nos permitimos relacionar a continuación para su evaluación, valoración y directrices ya que de estos depende el ajuste a realizar para el proyecto de la referencia.

PARÁMETROS A DEFINIR POR EL EJECUTOR (conocedor de la necesidad)

1- ¿Dentro del uso de la pista de atletismo en la actualidad o en su proyección es relevante y necesario la practica nocturna?
2- ¿Se tiene a la fecha algún tipo de programación para competencias de esta especialidad que requieran la iluminación?

   De ser afirmativo lo anterior es necesario que la entidad contratante tenga presente que no es viable por normativa y costo de operación el uso de la iluminación del estadio, la cual, además está prevista no para su encendido permanente sino para su uso en condiciones de competencia u ocasional.

3- De ser necesaria la iluminación para practica nocturna deberá realizarse un diseño que para practicidad y disminución de costos sería necesario la utilización de las sub estaciones eléctricas construidas en la fase 1, la cual se encuentra aún bajo pólizas de garantía y estabilidad.

4- Esto puede generar la necesidad de desmontar algún tramo, implemento, accesorio o componente de las redes realizadas bajo el contrato de la fase 1, el cual aún se encuentra sin liquidar y con garantías vigentes.

4

5- De NO realizar la alimentación de esta red bajo las obras de la fase 1, se pueden presentar mayores cantidades de obra porque requería la alimentación desde otro punto o generar una pertinencia de una nueva subestación o similar para este alumbrado.

Así las cosas y tratando de suplir las necesidades, requerimientos y usos que realmente tiene el ente deportivo a nivel Departamental IDERMETA para este deporte. **Nos permitimos solicitar de carácter perentorio se establezca de manera urgente el alcance que debe dársele a este escenario teniendo en cuenta los parámetros antes enumerados.**

La urgencia en la respuesta solicitada radica, en que atendiendo la descripción de la necesidad presentada en la MGA y expresada en el pliego de condiciones presentado por IDERMETA, pero con la limitante de la existencia de obras sin acta de recibo a satisfacción y sin liquidar ejecutadas en marco del contrato que realizó el reforzamiento estructural, ampliación, camerinos y fachada del Estadio Macal, el Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023, ha presentado una propuesta de iluminación que se aproxima al nivel II (recreativo y de entrenamiento) contemplado en la cartilla del Ministerio del Deporte, para su ejecución toca dos de las subestaciones ya existentes y los aparatos en ellas instalados para realizar la redistribución de las cargas eléctricas sin alterar las fachadas, muros estructura ni la estética del Estadio, no obstante, solo la respuesta de IDERMETA puede servir como guía para aprobación del diseño y la ejecución de las obras.

Sin otro particular,

Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. Consorcio Interescenarios

11.949

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 7 de Noviembre del 2023 **OF-C249 -2023-180**

Recibido sin aceptación
07 Noviembre 2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación y pago de Orden de Giro No. 8 anticipo. Fiduciaria Alianza – Fideicomiso No. 113392.

1

Cordial saludo,

Una vez revisados y evaluados los soportes que se adjuntan en el Giro No. 8 Anticipo radicado el día 3 de Noviembre del 2023, se autoriza el REEMBOLSO de OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 86.126.323,00), los cuales se encuentran discriminados en el siguiente ítem:

- MATERIALES Y SUBCONTRATOS PARA PISTA DE ATLETISMO Y PISTA DE PATINAJE: OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 86.126.323,00), reembolso a ORGANIZACIÓN TERRACANTO S.A.S.

Destinados única y exclusivamente a la ejecución del contrato de obra No. 106 de 2023.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

11950

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 9 de Noviembre del 2023

OF-C249 -2023-181

Recibido sin aceptación
09 Noviembre 2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación y pago de Orden de Giro No. 10 anticipo. Fiduciaria Alianza – Fideicomiso No. 113392.

1

Cordial saludo,

Una vez revisados y evaluados los soportes que se adjuntan en el Giro No. 10 Anticipo radicado el día 7 de Noviembre del 2023, se autoriza el REEMBOLSO de DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 200.790.003,00), los cuales se encuentran discriminados en el siguiente ítem:

- MANO DE OBRA PARA PISTA DE ATLETISMO, PISTA DE PATINAJE Y ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITOS: DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 200.790.003,00), reembolso a CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023.

Destinados única y exclusivamente a la ejecución del contrato de obra No. 106 de 2023.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

11.951

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 10 de Noviembre del 2023

OF-C249 -2023-182

Recibido sin aceptacion
10 Noviembre 2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Traslado oficio Federación Colombiana de Patinaje FPC 01 20231107000001

1

Cordial saludo,

Me permito realizar traslado de oficio FPC 01 20231107000001 entregado por la Federación Colombiana de Patinaje, en la cual se da asesoría técnica para el diseño y construcción escenario de patinaje de alto rendimiento.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

11952

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
PATINAJE
Haciendo historia desde 1.954

NIT.: 860.077.223-7 / Cra. 74 # 25F - 10
Barrio Modelia - Bogotá, Colombia
PBX: 263 2225 - 295 0867 / Cel.: 316 834 8916
E - mail: fedepatin@gmail.com - info@fedepatin.org.co
www.fedepatin.org.co

OFICIO SOLICITUD NORMATIVA ESCENARIOS DE PATINAJE -2023

VERSION8– NOVIEMBRE 2023

Bogotá, 07 de noviembre de 2023

FPC 01 20231107000001

ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PARA HOMOLOGACIÓN ESCENARIO DE PATINAJE PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

ASESORÍA TÉCNICA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DE PATINAJE DE ALTO RENDIMIENTO

Para: **Señor**
FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO
Director General
Instituto de Deporte y Recreación del Meta - IDERMETA
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META
Carrera 16 #24 – 03 Barrio Olimpico – Popular
6701469 – 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

De: **JORGE IVÁN ROLDAN PÉREZ**
Dependencia: AREA TÉCNICA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE

Asunto: Respuesta al oficio N° DG-100-412 del 11 de octubre de 2023 - SOLICITUD REVISIÓN CAMBIO DE GEOMETRIA PISTA DE RUTA.
En referencia al CONTRATO DE OBRA N°106 DE 2023 – "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

REVISIÓN BAJO NORMATIVA 2023 PARA AVAL DE PROYECTO EN SU ETAPA DE PLANIFICACION E INICIO DE EJECUCION DE OBRA PARA POSTERIOR **HOMOLOGACIÓN** DEL ESCENARIO – TEMA PUNTUAL NUEVA GEOMETRIA

Fecha ASESORÍA			*OBSERVACIONES*
DD	*/ MM /*	*AAAA*	
25	*10*	*2023*	*REVISIÓN SEGÚN OFICIO FECHADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (IDERMETA) EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2023 Y SE DARESPUESTA AL OFICIO SIN VISITA TECNICA Y SOBRE VALORACION EN PLANOS.*

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE
Haciendo historia desde 1.954

NIT.: 860.077.223-7 / Cra. 74 # 25F - 10
Barrio Modelia - Bogotá, Colombia
PBX: 263 2225 - 295 0867 / Cel.: 316 834 8916
E - mail: fedepatin@gmail.com - info@fedepatin.org.co
www.fedepatin.org.co

DATOS GENERALES		
NORMATIVA 2023 APLICABLE A:	01. PISTA DE CARRERAS Y ZONA CENTRAL	AN
	02. PISTA DE RUTA	X
	03. ZONA DE SERVICIOS	NA
CIUDAD	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META	
UBICACIÓN PUNTUAL	COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL CALLE LOMBANA – VILLA OLIMPICA	
ENTIDAD NORMATIVA	FEDEPATIN, WORLD SKATE AMERICA Y WORLD SKATE	
ETAPA DE PLANIFICACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA ESCENARIO NUEVO	ETAPA DE PLANIFICACIÓN - EJECUCIÓN DE ESCENARIOPARA COMPETENCIAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMACIÓN DEFINICION DE GEOMETRIA PISTA DE RUTA	

La Federación es un organismo deportivo de derecho privado, constituida como una asociación, sin ánimo de lucro, dotado de personería jurídica, que impulsa programas de interés público y social y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y tendrán a su cargo el manejo técnico y administrativo de su deporte y la representación internacional del mismo

El objeto de **La Federación Colombiana de Patinaje - FEDEPATIN** es fomentar, patrocinar y organizar lapráctica del deporte de Patinaje sobre ruedas y en hielo en sus diferentes modalidades deportivas, en las diferentes ramas y categorías, dentro del ámbito nacional, teniendo a su cargo el manejo técnico y administrativo y cumplir con las demás actividades reglamentadas en el presente estatuto y en las disposiciones legales e impulsar programas de interés público y social.

Al reglamentar la práctica del patinaje, La Federación en su campo técnico se ajustará a las normas internacionales que lo rigenpor parte de Las Federaciones Deportivas (World Skate WS, World Skate America WSA)

Dado lo anterior propender que las prácticas de estas actividades se hagan en escenarios que cumplan con la reglamentación y/o normativa vigente según su tipo, es aquí donde **FEDEPATIN** presta su asesoría técnica básica y recomienda los diferentes parámetros a tener en cuenta según sea su disciplina deportiva enfocada a la práctica del patinaje cuando esta requiere ser reglamentaria.

En la actualidad deportiva muchas ciudades y poblaciones son sedes de Campeonatos del mundo, Campeonatos Continentales y campeonatos Nacionales que tienen que ver con disciplinas deportivas de Patinaje, por lo que es importante la oportunidad de dejarle a la comunidad escenarios para prácticas de alto rendimiento y escuela que conlleve a tener nuevos deportistas y así aumente el número potencial de usuarios y aficionados a este gran deporte.

SOBRE EL DISEÑO DE ESCENARIOS DE PATINAJE

Después de evaluar en nuestro país los diferentes escenarios de patinaje, y la preocupación generada en su mayoría por el **NO** cumplimiento de la reglamentación oficial, **FEDEPATIN** a través de sus asesores técnicos externos, ha encontrado la necesidad sentida de establecer parámetros que materialicen el cumplimiento de la normalización de las pistas de carreras y ruta, y defina las necesidades que den soluciones óptimas para el servicio, confort y seguridad de los usuarios, sean estos deportistas o espectadores.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE
Haciendo historia desde 1.954

NIT.: 860.077.223-7 / Cra. 74 # 25F - 10
Barrio Modelia - Bogotá, Colombia
PBX: 263 2225 - 295 0867 / Cel.: 316 834 8916
E - mail: fedepatin@gmail.com - info@fedepatin.org.co
www.fedepatin.org.co

Una vez revisada la solicitud realizada por usted vía email con oficio adjunto fechado el 11 de octubre de 2023 y realizada la revisión planimétrica por el arquitecto Alexander Salas asesor técnico externo autorizado por FEDEPATIN, el día 25 de octubre de 2023 y dado su interés en **LA ASESORÍA TÉCNICA** en la etapa de planificación de obra que permita a futuro **HOMOLOGAR** el escenario deportivo para competencias de orden nacional y continental, le informamos lo siguiente:

La presente consulta se centra en la **GEOMETRIA** de la pista de ruta según actualización planimetrica, para lo cual nos referiremos a la normativa vigente (2023) para este tema y la cual se enuncia a continuación:

PISTA DE RUTA (THE ROAD) DE 400 METROS

Recorrido de competición que se encuentra en una instalación al aire libre o en una instalación cubierta y presenta un circuito cerrado asimétrico donde los patinadores han de cubrirlo una o más veces de acuerdo a la distancia del evento

Circuito cerrado se acogen las disposiciones dictadas en la **General Regulations Edition 2018 - 2023** donde se enuncia que este tipo de pistas no podrán tener una longitud menor a 250 pero se recomienda tener una longitud de 400 metros o mayor, hasta 600 metros y que su ancho de pista no podrá ser inferior a 6metros, pero se recomienda que este ancho sea de ocho (8) metros, además se evaluaran por parte de **FEDEPATIN.** Parámetros de cumplimiento de geometría en curvas, pasamanos de protección, acabado y recubrimiento, solo se HOMOLOGARÁN aquellas pistas que cumplan con los parámetros de geometría establecidos por WORLD SKATE, WORLD SKATE AMERICA Y FEDEPATIN y cumplan con lo establecido en las fichas de HOMOLOGACIÓN. (ART 110.1 Y 111 COMISIÓN TÉCNICA DE PATINAJE DE VELOCIDAD - REGLAMENTO 2023)

Su medición se realizará según la normativa establecida por el WORLD SKATE Y WORLD SKATE AMERICA Y FEDEPATIN en la mitad del circuito cuando sólo una parte del ancho de la ruta pueda ser usado, el radio de curva mínimo no podrá ser inferior a los 18,00m. En rectas se conserva una pendiente del 1% en curvas el 1.5% hacia el interior de curva.

Se recomienda que en uno de sus costados pueda tener una recta de unos 110 metros como mínimo y que cumpla con los parámetros de peraltes mínimos, específico para la Carrera de 100 m sprint.

- Se demarcan tres (3) carriles de dos metros sesenta (2.60) m con líneas de cinco (5) cm. Las condiciones de carrera deben ser idénticas en cada uno de los carriles, en caso de no ser así, en los recorridos de menos de ocho (8) m de ancho, pueden demarcarse sólo dos (2) carriles.
- El patinador debe patinar en su carril. El patinador que toque la línea blanca se considera fuera de su carril (falta técnica) y será descalificado DSQ-TF.

En lo posible Los rectilíneos deben representar el 60 % del total del circuito, los desniveles nunca podrán exceder del 5%. Las excepciones a esta regla nunca deberán superar el 25% de toda la carrera.

Las curvas de todos los recorridos de competencia deben tener una delimitación natural o ser delimitadas con señales móviles que sean muy visibles. Estas señales no deben ser colocadas sobre el recorrido de lacompetencia, para evitar que constituyan un peligro para los patinadores.

Durante las carreras sólo los jueces y los patinadores estarán autorizados a estar en la carrera. Sólo los delegados y el equipo médico podrán entrar en la carrera cuando hayan sido autorizados por el Juez Árbitro. (Art.78.6 - COMISIÓN TÉCNICA DE PATINAJE DE VELOCIDAD - REGLAMENTO 2023)

NIT.: 860.077.223-7 / Cra. 74 # 25F - 10
Barrio Modelia - Bogotá, Colombia
PBX: 263 2225 - 295 0867 / Cel.: 316 834 8916
E - mail: fedepatin@gmail.com - info@fedepatin.org.co
www.fedepatin.org.co

11955


La línea de meta debe estar marcada con una línea blanca de cinco (5) centímetros de ancho, debiendo noestar en una curva. La referencia para la llegada es el borde interior de esta línea. La foto-finish se colocaráen este borde interior de la línea de meta

La superficie de la ruta debe ser uniforme y suficientemente lisa, sin fallas ni fisuras. La curvatura transversal del recorrido no debe superar el 5% de su amplitud desde el punto interior del circuito hasta el exterior.

Se recomienda colocar pasamanos de protección en todo el perímetro exterior y en las zonas donde haya cambio de curvas o establecidas o que requieran protección especial. (Se evaluarán los puntos críticos y deser necesario se solicitara la instalación de esta protección donde sea necesario).

Se recomienda instalación de recubrimiento según especificaciones de FEDEPATIN.

PLANO DE JUSTIFICACION

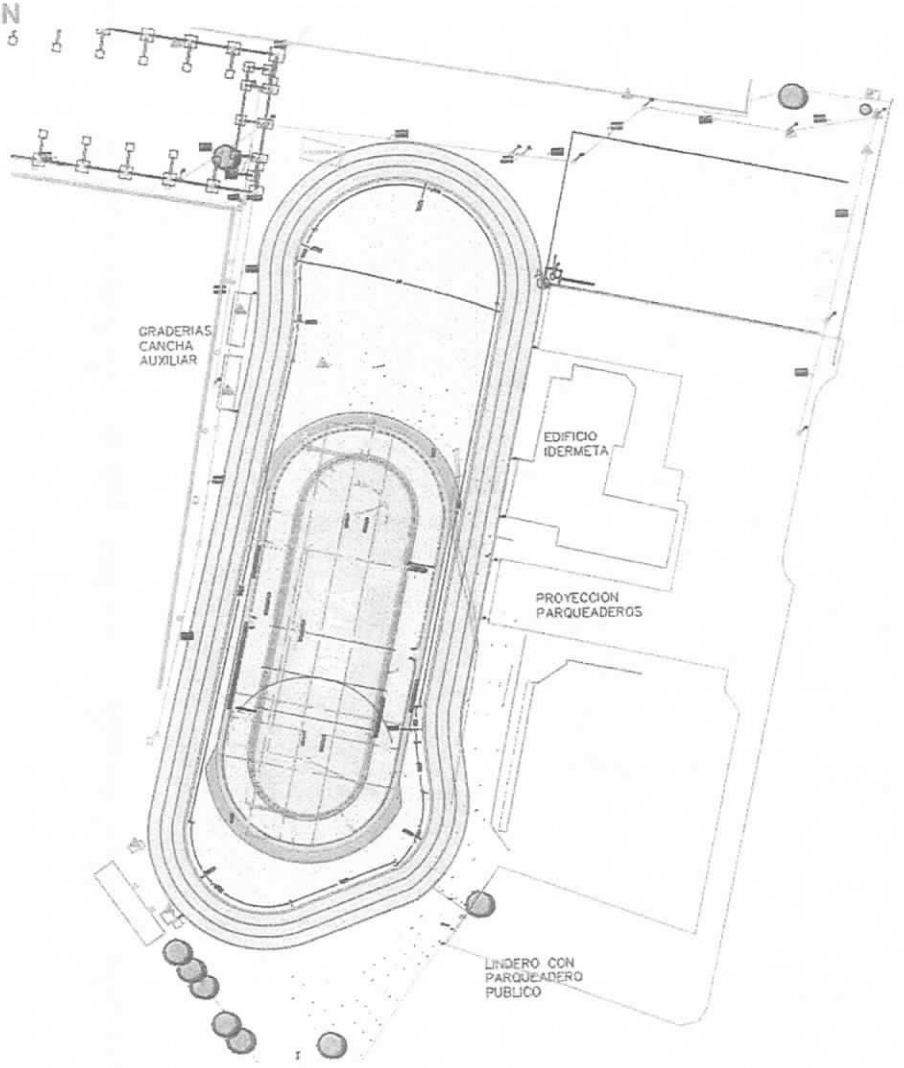

NIT.: 860.077.223-7 / Cra. 74 # 25F - 10
Barrio Modelia - Bogotá, Colombia
PBX: 263 2225 - 295 0867 / Cel.: 316 834 8916
E - mail: fedepatin@gmail.com - info@fedepatin.org.co
www.fedepatin.org.co

11.956


GEOMETRIA DE LA PISTA RUTA

TIPO DE PISTA	ANCHO	Numero de curvas	RADIO (interior) DE CURVA mínima	Longitud de medida entre
VERSION 2023	No menor a 6 metros, se recomienda 8 metros	variable	Superior a 18,00m.	No debe ser menor a 250 metros, se recomienda entre 400 a 600 metros

INTERIOR DE PISTAS en la superficie que queda al interior de la pista de ruta para la versión 2023 se recomienda que estas sean destinadas para actividades acordes al patinaje, sin que esto incida en la homologación del escenario. (Se revisarán parámetros técnicos) Dichas actividades deberán permitir la visual al interior de toda la pista sin crear obstáculos, no se permitirán elementos construidos al interior conotras actividades deportivas ajenas al patinaje y que se conviertan en barrera visual, si esto se diera será causal para NO HOMOLOGAR el escenario.

CONCLUSIONES ANALISIS DE PISTA DE RUTA

Revisando los ajustes realizados a la geometría al proyecto inicial, lo anterior debido a intervenciones físicas realizadas en el complejo deportivo, encontramos los siguiente en el nuevo trazado presentado:

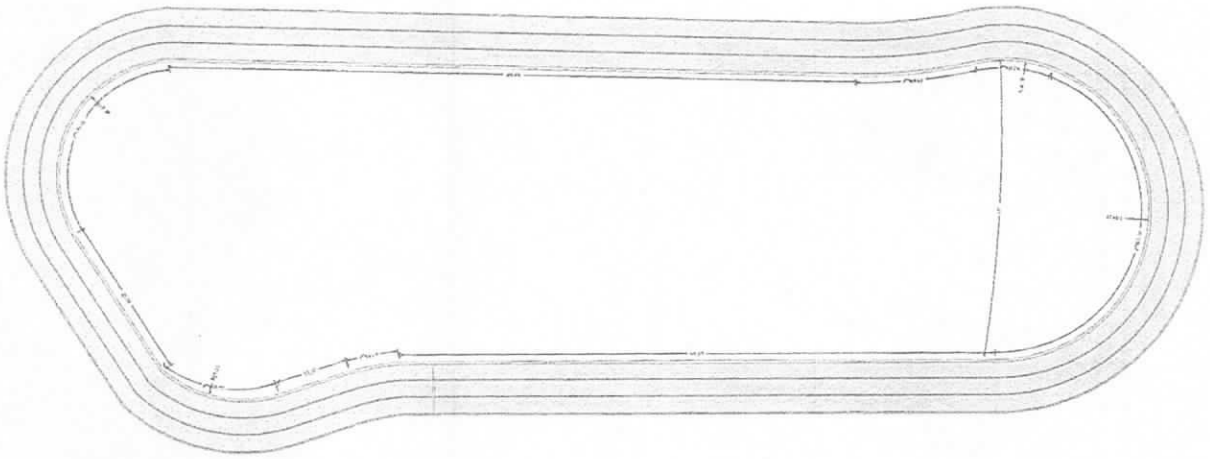

Como se aprecia en la imagen (Plano de proyecto actualizado por IDERMETA, encontramos una PISTA DE RUTA, cuyo trazado y geometría es analizado bajo normativa 2023, estableciendo que esta presenta una longitud de 406.10 metros medidos a línea de borde y de 431.24 metros a centro de pista, CUMPLIENDO ASI con normativa lo cual permite estar en rango entre 250 y 600 metros, así mismo cumple en su ancho de 8 metros.


En cuanto a curvas tenemos cinco (5), tres (3) cerradas y dos (2) contracurvas las cuales una vez analizadas cumplen con normativa al tener radios superiores a 18 metros.

NIT.: 860.077.223-7 / Cra. 74 # 25F - 10
Barrio Modelia - Bogotá, Colombia
PBX: 263 2225 - 295 0867 / Cel.: 316 834 8916
E - mail: fedepatin@gmail.com - info@fedepatin.org.co
www.fedepatin.org.co

11957

Siendo este un escenario nuevo **LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE** informa

FEDEPATIN luego de analizadas las condicionantes planteadas por el municipio, y los cambios presentados a la geometría de pista de Ruta, se **APRUEBA** el trazado en los planos presentados, los cuales pueden ser utilizados para el trazado de la pista formal y serán la referencia geométrica para su correcta construcción.

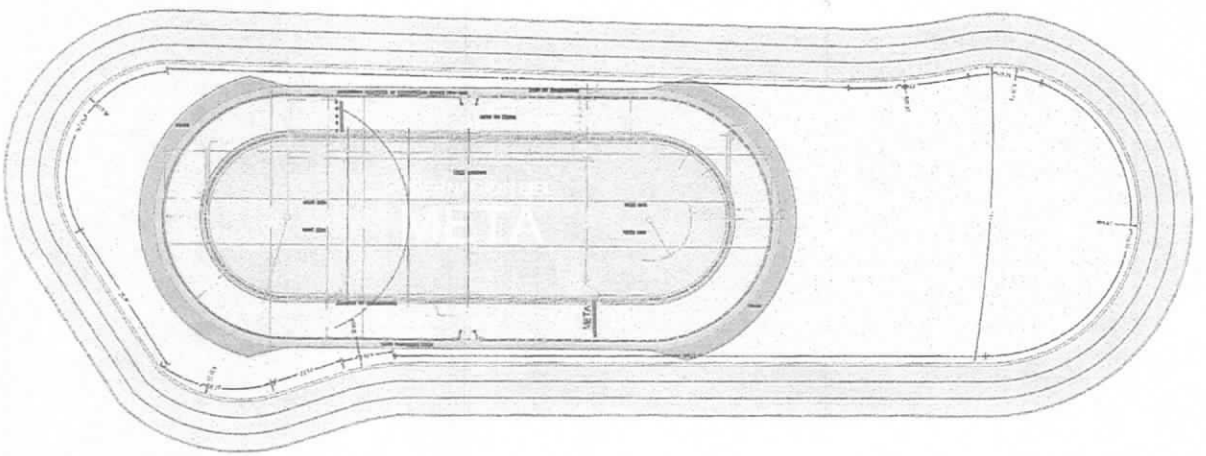

Cabe anotar que, para **HOMOLOGAR** el escenario, no solo se revisa su geometría, también deberá cumplir con aspectos técnicos como peraltes mínimos, evacuación de aguas y aspectos de seguridad (Pasamanos y recubrimientos en pista entre otros) planteados en la normativa 2023 y que no fueron revisados por no contar con la información completa.

Desde lo urbano se recomienda a futuro destinar el lote adjunto por el costado occidental para que el escenario pueda contar con una zona de servicios básicos (graderías, camerinos, w.c. públicos, zonas de ventas, etc), lo cual debido a la calidad en sus pistas de alto rendimiento y escuela, hace que en la actualidad estas no puedan ser aprovechadas al máximo para eventos masivos.

ASESORIA TECNICA PARA SEGUIMIENTO EN LA ETAPA DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO A OBRA PARA LA HOMOLOGACION

Es en este punto donde es importante la recomendación de tener el acompañamiento constante por parte de un técnico conocedor y con experiencia en este tipo de escenarios, durante la etapa de planificación y en su etapa de ejecución, aspecto que deriva a tener las pistas (carreras, central y Ruta) y zonas de servicio, avaladas para iniciar de requerirse el trámite de HOMOLOGACION ante la FEDEPATIN para Colombia, Esto facilitara detectar posibles errores a tiempo y dará agilidad en procesos constructivos que eviten reprocesos que pueden afectar la programación de obra y los tiempos de entrega.
(Los costos de asesoría técnica, visitas técnicas serán determinados a criterio de las partes y el costo de homologación será determinado por FEDEPATIN según tarifa anual)

Para FEDEPATIN es muy importante que los escenarios cumplan con las especificaciones y reglamentación para su construcción y que permitan ser homologados bajo los parámetros de calidad y

NIT.: 860.077.223-7 / Cra. 74 # 25F - 10
Barrio Modelia - Bogotá, Colombia
PBX: 263 2225 - 295 0867 / Cel.: 316 834 8916
E - mail: fedepatin@gmail.com - info@fedepatin.org.co
www.fedepatin.org.co

11.958

confort, tanto para el deportista como para el usuario espectador, por lo que es de estricto control y seguimiento los componentes de geometría, seguridad y velocidad que definen que un escenario de este tipo sea apto para competencias de alto rendimiento de tipo Mundial, nacional y escuela.

El concepto en el presente oficio está enfocado solo en aspectos de **GEOMETRIA DE LA PISTA DE RUTA** del escenario de patinaje y su concepto positivo de viabilidad se da como respuesta al email presentado por la administración municipal con su adjunto PDF N° DG-100-412 del 11 de octubre de 2023

Este escenario de requerirse podrá ser **HOMOLOGADO**, Una vez cumpla con aspectos técnicos y de especificaciones lo cual quedará formalizado mediante documento escrito firmado por el presidente ejecutivo, basado en las fichas y cumplimiento de las normas establecidas.

JORGE IVÁN ROLDAN PÉREZ
AREA TECNICA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE
gerenciadeportiva@fedepatin.org.co

ASESORÍA TÉCNICA EXTERNA RECOMENDADA POR FEDEPATIN
Arquitecto JOHN ALEXANDER SALAS MORALES
Celular y WhatsApp (+57) 3168338314 o 3177552088 Medellín
E-mail: alexpatin16@yahoo.com

INFORMACION BASADA EN LA SPEED TECHNICAL COMMISSION RULEBOOK 2023

FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE

11959

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 10 de Noviembre del 2023

OF-C249 -2023-183

Recibido sin aceptacion
10 Noviembre 2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación y pago de Orden de Giro No. 09 anticipo. Fiduciaria Alianza – Fideicomiso No. 113392.

Cordial saludo,

1

Una vez revisados y evaluados los soportes que se adjuntan en el Giro No. 9 Anticipo radicado el día 7 de Noviembre del 2023, se autoriza el REEMBOLSO de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 144.985.031,40), los cuales se encuentran discriminados en el siguiente ítem:

- ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PISTA DE ATLETISMO, PISTA DE PATINAJE Y ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITOS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 144.985.031,40), reembolso a COMERCIALIZADORA LEON P SAS.

Destinados única y exclusivamente a la ejecución del contrato de obra No. 106 de 2023.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

11.960

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 11 de Noviembre del 2023 **OF-C249 -2023-184**

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META – IDERMETA
Fabian Hernán Gonzalo Torres Carrillo
Director
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Solicitud de trámite de modificación, adición y prórroga de los contratos de obra e interventoría celebrados para la ejecución del proyecto identificado con los BPIN 2022005500094. Total 8 Carpetas.

1

Cordial saludo,

En calidad de interventor del contrato de obra N. 106 de 2023 por medio del cual se materializa la ejecución del proyecto citado en referencia, presento al Instituto de deporte y recreación del Meta en calidad de ejecutor de los proyectos y de entidad contratante solicitud de modificación adición y prórroga de los contratos de obra e interventoría.

La solicitud que se allega ha sido revisada y avalada por esta interventora, y responde a diferentes causas constructivas, técnicas, deportivas, legales y principalmente a las necesidades de los usuarios finales de los diferentes escenarios, contempla plazos prudenciales de ejecución y es financieramente viable en términos contractuales. Dado el alcance de la propuesta se requiere el aval del Instituto y su gestión para el ajuste en Planeación.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

10 NOV 2023
3774
4:34

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

Villavicencio, 10 de noviembre de 2023 **OF-C249 -2023-186**

Señores:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
Ciudad

Asunto: Solicitud de creación y registro de ajustes al proyecto de inversión "construcción de la pista de atletismo en la Villa Olímpica del municipio de Villavicencio, Meta" con código BPIN 2022005500094 aprobado bajo numeral 3 del Artículo 4.5.1.2.2. Acuerdo Único de Comisión Rectora.

En calidad de representante legal de la interventoría contratada por la entidad designada como ejecutora del proyecto de inversión denominado "construcción de la pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio, Meta", con código BPIN 2022005500094, manifiesto que la interventoría ha realizado un análisis de situación del proyecto viabilizado, generándose la necesidad de realizar la modificación de las variables definidas a través del artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, *para los ajustes a los proyectos de inversión aprobados que versen sobre modificación del valor total del proyecto, fuentes de financiación o cambio de ejecutor,* como a continuación se describen:

VARIABLE(S) OBJETO DE AJUSTE

VARIABLES SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN	VARIABLE	IDENTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN
a) Actividades y costos	Aumento o disminución de los costos de las actividades existentes	*
	Inclusión de actividades nuevas	
	Cambios definidos en el horizonte de ejecución del proyecto	*
b) Valor total del proyecto de inversión	Incremento del valor total inicial hasta el 50%	*
	Disminución de los montos aprobados	
c) Indicadores de producto	Indicadores de producto secundarios	
d) Fuentes de financiación	Sustitución de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas	
	Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas	
	Modificación de las fuentes ya existentes	
e) Ejecutor	Cambio de la entidad ejecutora designada	
f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría	Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría	

De conformidad con el literal a del numeral 1 del artículo 4.5.1.2.5. del Acuerdo Único de Comisión Rectora que las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la necesidad y pertinencia del ajuste de la cadena de valor de la alternativa sobre las variables mencionadas, se detallan a continuación, vale la pena aclarar se genera por causas no imputables, ni al contratista de obra, ni a la interventoría y consiste

principalmente en actividades no previstas y mayores cantidades de obra, necesarias para cumplir con el alcance, garantizar la funcionabilidad, estabilidad y seguridad del proyecto y satisfacer la necesidad identificada por la entidad en los estudios previos, como algunas de estas actividades son nuevas o no previstas requerirán de un tiempo adicional o plazo para su ejecución, seguimiento y supervisión el cual se ha cuantificado en **cuatro (4) meses** contados a partir de la actual fecha de terminación para los contratos de obra y **cinco (5) meses** contados a partir de la actual fecha de terminación para los contratos de interventoría y supervisión que hacen parte del proyecto.

1. RAZONES TÉCNICAS

Se conservan las condiciones inicialmente aprobadas en el proyecto, BPIN 2022005500094- construcción de la pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio Meta. Lo que indica que no se incurre en ninguna variación de las especificaciones técnicas, lugar o meta producto. Cabe anotar que el contrato de obra fue pactado a precios unitarios, así las cosas, las partes establecieron el costo por unidad de cada uno de los conceptos que integran la obra a ejecutar o ítems de obra y el valor real es el que corresponde a la multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra. Las cantidades de obra faltantes hacen parte del objeto inicial y deben ser incluidas a través de un trámite interno para generar la compensación entre el valor y el de supresión o menor cantidad y determinar el valor adicional faltante para el componente de obra que es de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($4.552.066.550) y un plazo adicional de cuatro (4) meses para obra y cinco (5) interventoría soportados en la necesidad que la geometría de esta pista cumpla con las medidas reglamentarias mínimas y las regulaciones proporcionadas por World Athletics en sus manuales para la construcción de pistas de atletismo como son el recorrido de la pista de 400 m con una tolerancia de 4 centímetros y demás ajustes que se detallan a continuación:

1.1. CANTIDADES MENORES DE OBRA

Estas actividades se ajustan de acuerdo con las modificaciones en las especificaciones, siguiendo estrictamente las regulaciones proporcionadas por World Athletics en sus manuales para la construcción de pistas de atletismo. Además, algunas de estas actividades se adaptan en función de las mediciones realizadas y cuantificadas en el sitio.

3,1 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

De acuerdo con las regulaciones establecidas en el manual de World Athletics, el bordillo que debe ser instalado en las zonas de competencia debe cumplir con las especificaciones correspondientes al bordillo prefabricado A-81 dimensiones 80*35*15 cm

3,2 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,40 A=0,50. DESARROLLO 1,13 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS

Debido a las modificaciones realizadas en el diseño de la pista, se ha reducido la longitud de los cárcamos, teniendo en cuenta el desarrollo de una pista de 400 metros

3,3 REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD.

Debido a las modificaciones realizadas en el diseño de la pista (400 metros), disminuye la longitud de los cárcamos.

4,2 BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR
La cantidad se ajusta por las modificaciones realizadas en el diseño del pavimento en el espesor de capa de 10 cm, lo que da disminución del volumen total

5,1 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1
De acuerdo con el ajuste en el área de las zonas de competencia disminuye el área donde se debe aplicar la imprimación

5,2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.
Las actualizaciones realizadas en el diseño y la geometría de la pista y en el diseño de pavimento ajustan las áreas o volúmenes requeridos.

5,3 PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA EN SITIO CERTIFICADA IAAF: SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 Y DIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPA ELÁSTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPA POROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM 1 A 4 MM DE COLOR ROJO.
Para el acabado final de la pista en las diferentes zonas de competencia, a raíz de las solicitudes efectuadas por la entidad IDERMETA y la Liga de Atletismo, las cantidades se ajustan para el acabado en las zonas de saltos y lanzamiento, lo que implica una disminución del área contratada inicialmente

6,2 OBSTACULO CARRERA CERTIFICADO IAAF
De acuerdo a la normativa establecida por World Athletics, es necesario incluir una barrera específica para carreras de obstáculos, que cumpla con las especificaciones requeridas para esta disciplina.

6,3 TACOS DE SALIDA
Estas especificaciones no se encuentran contempladas en los estudios y diseños originales. Por lo tanto, se procederá a eliminar esta actividad y se creará un nuevo ítem que esté acorde con las especificaciones dadas en los manuales y que este certificado por la world atheltics

7,1 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
Debido al uso previsto del escenario, se proyecta en las zonas perimetrales un tráfico vehicular ambulancias, bomberos o camiones de logística para eventos. Por lo tanto, es necesario incluir un ítem de concreto y disminuir este ítem.

8,1 RELLENO CON GRAVILLA
Debido a las variaciones en las áreas de instalación de césped sintético, que se adaptan al diseño actualizado se afecta la cantidad de este material de filtración para el césped

8,2 GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
Se ajusta la cantidad teniendo en cuenta el diseño para terminado de piso en las diferentes zonas de la pista.

1.2. CANTIDADES MAYORES DE OBRA

Estas actividades corresponden a la actualización realizada en respuesta a los ajustes efectuados en el diseño de la pista en su aspecto geométrico, tomando en cuenta la normativa proporcionada por los manuales de World Athletics, así como las modificaciones efectuadas en el diseño de pavimentos, el cual se adecuó según el diseño de suelos específico de la pista. A continuación, se describen estas actualizaciones y se especifica la particularidad respecto a la cantidad en cada uno de los ítems modificados.

1,1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA – CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS
De acuerdo a las actualizaciones efectuadas en el diseño, con el propósito de cumplir con la normativa establecida por World Athletics, lo que conlleva un cambio en la geometría final de la pista y en el diseño de las zonas de competencia sus dimensiones finales han experimentado variaciones a este item

1,2 DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.
Las dimensiones reales tomadas en el sitio que incluyen los bordillos perimetrales de la cancha de futbol y los que bordean la pista de atletismo existente aumenta este ítem.

2,1 EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE
El diseño de pavimentos ajustado para la estructura de soporte de la pista, genera una actualización de los volúmenes de excavación para las estructuras de concreto, pozos de salto y ría.

2,2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE
Es necesario tener en cuenta las tuberías para las redes hidrosanitarias y eléctricas, así como los bordillos requeridos para las diferentes áreas de competencia.

2,3 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
Esta actividad se adapta según los volúmenes necesarios para demoler elementos de concreto y retirar materiales como el césped sintético existente.

4,1 GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
La cantidad de geotextil aumenta conforme al diseño actualizado de pavimentos para mejorar la capacidad de carga de la subrasante y se consideran las áreas donde se debe construir una placa de concreto en el perímetro de la pista.

5,4 DEMARCACION PISTA
Se realiza un ajuste en la cantidad teniendo en cuenta la actualización del diseño de la pista y la demarcación de las diferentes zonas de competencia para saltos y lanzamiento

7,2 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN
Es fundamental considerar los ajustes en la geometría del diseño inicial, ya que cambian las áreas donde se requiere la construcción de la placa de concreto.

7,3 SISTEMA MODULAR DEPORTIVO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TEJIDO EN REJILLA, TABLETAS DE 25 CM X 25 CMS X 12.5 MM

Se ajusta en conformidad con la actualización de los diseños de acuerdo a las regulaciones establecidas por World Athletics que implican acabados de las superficies de las zonas de competencia, lo que conlleva a un aumento en la cantidad de esta actividad.

1.3. ITEM NO PREVISTOS

Las actividades que se describen a continuación están incluidas en el presupuesto inicial del proyecto por dos razones: primero, debido a ajustes en las especificaciones, y segundo, porque no se habían incluido originalmente en el capítulo correspondiente. Estas actividades se han presupuestado siguiendo las regulaciones establecidas por la máxima autoridad competente en competiciones de atletismo. Además, se realizan ajustes en el diseño original para actualizar las diferentes zonas de competencia, siguiendo las normas establecidas por World Athletics, las solicitudes realizadas por la entidad contratante, en cuanto a diseño arquitectónico, especificaciones técnicas y el acabado final de la pista.

NP 1.3 DESMONTE DE GRAMA SINTETICA, INC SHOCKPAQ Y CARGUE
La actividad de desmonte de la grama existente es esencial, ya que las áreas que cuentan con césped sintético, como el perímetro de la pista y la zona de salto largo, deben cumplir con las especificaciones y normativas necesarias para garantizar un acabado apropiado de acuerdo a las disciplinas correspondientes.

NP2.4 RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.
De acuerdo con el diseño de pavimentos y el estudio del suelo, esta actividad debe llevarse a cabo considerando la totalidad del área a intervenir, lo cual incluye las zonas de competencia para saltos y lanzamiento, así como las áreas con acabados diversos

NP 3.4 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
El terreno de la cancha de fútbol se encuentra a un nivel más alto que la pista existente. Por lo tanto, se requiere un proceso de nivelación y la construcción de muros de contención que permitan conformar el terreno de las diferentes zonas de competencia.

NP 3.5 ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE
Se requiere la construcción de diversos elementos, como el muro perimetral y los componentes de concreto reforzado relacionados con las distintas disciplinas del atletismo.

NP 3.6 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)
Para las zonas donde se funden los muros de contención y para los elementos de concreto, como la ria y los pozos de salto en las zonas de competencia del escenario.

NP 3.7 BASE PARA ANCLAJE DE BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO SEGÚN DISEÑO
Base para la formación de los bordillos de concreto siguiendo las recomendaciones de World Athletics en su manual de instalaciones para pistas de atletismo.

NP 3.8 CONSTRUCCION DE RIA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000PSI SEGÚN DISEÑO. INC ACERO DE REFUERZO
Para que este elemento cumpla con las certificaciones necesarias, es esencial construirlo siguiendo las especificaciones detalladas en los manuales de World Athletics de acuerdo a los detalles y especificaciones proporcionados en la planimetría actualizada.

NP 3.9 TUBERIA PVCS 2". SUMINISTRO E INSTALACION

Los ajustes realizados en las redes de aguas pluviales de la pista y las zonas de competencia, hacen necesario incorporar tubería de 2" sanitaria con el propósito de drenar los diversos cajetines y fosos en las áreas de salto.

NP3.10 CAJA DE INSPECCION DE 0.50x0.50X0.50 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI

El ajuste de los diseños hidrosanitarios, determina que es necesario incluir este ítem para la construcción de la red de desagüe de aguas pluviales desde los cárcamos perimetrales de la pista y el drenaje de los fosos en las áreas de salto de las distintas zonas de competencia.

NP3.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA FOSOS DE SALTOS

La incorporación de las redes que formarán parte de la ejecución del proyecto, tales como las redes hidráulicas para el ajuste del sistema de riego de la cancha y las áreas de competencia, las redes eléctricas para la instalación de la iluminación de la pista y las redes de drenaje de aguas pluviales

NP3.12 FILTRO EN GRAVA. INC GEOTEXTIL Y TUBERIA DE DRENAJE 4"

Debido a la necesidad de drenar el agua pluvial de los distintos fosos de salto, con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de World Athletics y las especificaciones proporcionadas en los planos actualizados.

NP3.13 TUBERIA PVCS 4". SUMINISTRO E INSTALACION

Debido a los ajustes realizados en las redes de aguas pluviales de la pista y las zonas de competencia, es necesario incorporar tubería de 4" sanitaria con el propósito de drenar las aguas lluvias de la ría.

NP3.14 ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

Como resultado de los ajustes realizados en el diseño de las diferentes zonas de competencia, ya que es necesario construir elementos de concreto para la jaula de lanzamiento y los componentes de las áreas de salto.

NP3.15 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-81 80X35X15 CM.

El manual de World Athletics y las especificaciones técnicas establecidas por el proveedor encargado del acabado final de la pista, se requiere que el bordillo cumpla con dimensiones específicas de ancho y alto. Por lo tanto, se ha decidido incluir el bordillo prefabricado A81.

NP3.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200 MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE

Consideración de las modificaciones realizadas en los diseños hidrosanitarios para la conexión de los desagües de los cárcamos a las cajas de aguas pluviales existentes.

NP3.17RETIRO DE TUBERIA PVC 2" Y 4" SISTEMA DE RIEGO DE CANCHA FUTBOL.

Para ajustar las redes existentes según el diseño actualizado, se hace necesario reubicar la red perimetral de riego de la cancha en concordancia con la geometría de la cancha de fútbol.

NP3.18 CAMA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.

Con el fin de cumplir con la normativa, se debe incluir la cama de arena para la instalación de las redes hidrosanitarias y la red eléctrica.

NP3.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160 MM Ø6 TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE
Con el propósito de proporcionar drenaje a los filtros de los fosos de salto largo, en conformidad con los diseños actualizados de las redes de aguas pluviales.

NP3.20 TUBERIA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACION
Esta actividad se incluye en la conformación del sistema de riego de la cancha de fútbol, de acuerdo con los ajustes que deben realizarse según el diseño hidrosanitario

NP3.21 TUBERIA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION
Se incluye en la conformación del sistema de riego de la cancha de fútbol, de acuerdo con los ajustes que deben realizarse según el diseño hidrosanitario

NP3.22 ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACION
La red del sistema de riego accesorios de unión, codos y semi codos acorde a los ajustes realizados según el diseño hidrosanitario

NP3.23 ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACION
Se incluye en la conformación de la red del sistema de riego accesorios de unión, codos y semi codos acorde a los ajustes realizados según el diseño hidrosanitario.

NP3.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE
Se requiere instalación de tubería de 10" para conexión de cárcamos con pozos de la red de aguas lluvias en las zonas de competencia de la pista.

NP3.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE
Se requiere para conformación de la red de aguas lluvias, se incluye teniendo en cuenta ajuste de diseño de redes sanitarias.

NP3.26 FILTRO EN GEODREN PLANAR H=0.50M (INC.TUBO PVC 4" PERFORADO Y GRAVA 1").
Con el propósito de controlar el agua subterránea, reducir la presión del agua en el suelo y mejorar la estabilidad de terreno, en la zona norte y sur de la cancha de futbol evitando la saturación de las zonas de competencia

NP 4.3 SUB BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR
De acuerdo al diseño de pavimentos ajustado en base al estudio de suelos realizado, se hace necesaria la inclusión de esta actividad, ya que en dicho diseño se especifica la necesidad de una capa de 20 cm de subbase para la conformación de la estructura del pavimento de la pista.

NP 5.5 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1
De acuerdo al diseño de pavimentos ajustado en base al estudio de suelos realizado, se hace necesaria la inclusión de esta actividad, para dar una base de unión entre los dos pavimentos a instalar.

NP 5.6 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.

Considerando el diseño de pavimentos actualizado, que establece la necesidad de instalar una carpeta para rodadura en la conformación del acabado final de la pista, siguiendo las especificaciones detalladas en los manuales de World Athletics

NP 5.7 PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA PREFABRICADA CERTIFICADA IAAF, ESPESOR 13 MM, COLOR SEGÚN DISEÑO

Teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por la Liga de Atletismo y avaladas por la entidad contratante, en beneficio del usuario final de la pista solicitó que el acabado final se realice utilizando un sistema prefabricado recomendado por la LIGA DE ATLETISMO cuyo proveedor es la empresa MONDO ya que cumple con las especificaciones necesarias para la certificación del escenario.

NP 6.4 CAJETIN EN ACERO INOXIDABLE PARA SALTO CON PERTIGA HQ-INCLUYE TAPA DE ACERO CAJETIN -CERTIFICADO WA

Se debe instalar un cajetín que este certificado (Certificado WA: E-12-0682) y avalado por la Word Athletics para la disciplina de salto con pértiga, el cual se suministra acorde a las especificaciones técnicas y normativa para certificación del componente.

NP 6.5 KIT TABLA DE BATIDA DE ACERO INOXIDABLE WS-ATK02-CERTIFICADO WA

Conforme a las directrices de diseño y las especificaciones detalladas en el manual de la Asociación Mundial de Atletismo (World Athletics), para la disciplina de salto largo y triple, es fundamental realizar la instalación de este elemento según las dimensiones y especificaciones técnicas del elemento a fin de obtener la certificación correspondiente (Certificado WA E-12-0683)

NP 6.6 OBSTACULO DE RIA -AC021-CERTIFICADO WA

Desempeña un papel fundamental en las competencias de carreras y se requiere para obtener una certificación de conformidad con las normativas establecidas por World Athletics, que se encuentra detallada en el certificado WA E-04-0385.

N P 6.7 CIRCULO DE ALUMINIO PARA LANZAMIENTO DISCO-AL085-CERTIFICADO WA

Dado que todos los componentes y accesorios son sujetos a certificación, es crucial incluir esta actividad en las disciplinas de lanzamiento. El elemento debe contar con la certificación correspondiente (Certificado WA: E-13-0730), la cual debe estar homologada por World Athletic

NP 6.8 REDUCTOR DE ALUMINIO PARA CIRCULO CONCENTRICO DISCO/MARTILLO-AL095-CERTIFICADO WA

Dado que la zona de lanzamiento está conformada por varios componentes, es necesario incluir este elemento. Para cumplir con las normativas de World Athletics, este componente debe contar con la homologación correspondiente y el certificado (Certificado WA: E-12-0686), asegurando que cumpla con las dimensiones y especificaciones estipuladas en el manual.

NP 6.9 CIRCULO DE ALUMINIO PARA LANZAMIENTO PESO Y MARTILLO -AL055-CERTIFICADO WA

Esta actividad se debe incluir teniendo en cuenta la conformación de la zona de competencia para lanzamiento de disco y martillo. El elemento debe ser homologado y certificado por World Athletics, conforme a la normativa estipulada en los manuales correspondientes. Debe contar con el certificado (WA: E-12-0684) para este componente.

NP 6.10 CONTENEDOR DE PESO EN ACERO INOXIDABLE -AL065-CERTIFICADO

Este elemento es fundamental para asegurar la seguridad y el cumplimiento de las reglas en las disciplinas de lanzamiento, como el lanzamiento de disco, martillo y peso. Por lo tanto, debe ser incluido en el

presupuesto, teniendo en cuenta que este componente debe estar homologado y certificado por la World Athletics, y contar con el certificado WA: E-12-0686.

NP 6.11 ANCLAJE PARA JAULA DE MARTILLO Y DISCO-AL008-CERTIFICADO WA
El anclaje asegura que la jaula de lanzamiento de martillo y disco permanezca firmemente en su lugar, evitando desplazamientos o volcamientos durante los lanzamientos. Esta actividad se debe incluir teniendo en cuenta que el elemento debe estar homologado por World Athletics.

NP6.12 BASELAST UNDERLAYMENT 7MM ROLLS-CERTIFICADO WA
Este tipo de acabado de piso se requiere en las zonas de salto, ya que, según las normativas, estas áreas deben contar con un acabado de piso específico. Dichas zonas se ubican generalmente en las áreas de llegada o finales de carrera. El grosor de la superficie debe determinarse para cumplir con los requisitos de reducción de fuerza y deformación vertical. El producto debe contar con la certificación de World Athletics.

NP6.13 BASELAST UNDERLAYMENT 12MM ROLLS-CERTIFICADO WA
Este tipo de acabado de piso se requiere en las zonas de salto, ya que, según las normativas, estas áreas deben contar con un acabado de piso específico. Dichas zonas se ubican generalmente en las áreas de llegada o finales de carrera. El grosor de la superficie debe determinarse para cumplir con los requisitos de reducción de fuerza y deformación vertical. El producto debe contar con la certificación de World Athletics.

NP 6.14 BLOQUE DE INICIO CERTIFICADO POR LA IAAF-CERTIFICADO WA
Esta actividad se incluye debido a que es necesario utilizar un elemento que cuente con la certificación proporcionada por la Federación Internacional de Atletismo, conocida como World Athletics. Se debe instalar un elemento certificado en cada carril, siguiendo las especificaciones técnicas y dimensiones requeridas para garantizar su adecuación para competencias de alto nivel.

NP 6.15 BARRERA DE CARRERA DE OBSTACULOS-CERTIFICADO IAAF-CERTIFICADO WA
Se requiere incluir el elemento según la normativa para carreras de obstáculos, que debe contar con el certificado WA E-12-0674/AC044 y WA E-12-0675, de acuerdo a las reglas establecidas por la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics). Estas especificaciones son fundamentales para asegurar que las carreras de obstáculos se desarrollen de manera segura por lo cual se incluye esta actividad dentro del presupuesto.

NP 7.4 PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42KG/CM2 O 4.2 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.
Teniendo en cuenta el uso previsto para las zonas norte y sur, a fin de permitir el tráfico de vehículos, incluyendo ambulancias, camiones de bomberos y vehículos para la logística de eventos. Se incluye concreto para construcción de placas hidráulico MR 42kg/cm2

NP10.1GRUPO DE MEDIDA EN COLLD ROLLED CALIBRE 16 A 220V GABINETE DE 180X60X30, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 18, TERMINADO EN RECUBRIMIENTO ELECTROSTATICO RAL 7032, BREAKER 80 AMP FIJO, TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 100/5, BORNERA DE CONEXIÓN Y PRUEBAS, MEDIDOR ELECTRONICO DE MEDIDA INDIRECTA, CONEXION INTERNA
Considerando que se encuentra dentro del ámbito de la iluminación de la pista y que dicha actividad debe ser independiente de la iluminación actual de la cancha de fútbol, es imperativo incluir, en conformidad con el diseño eléctrico actualizado aprobado, la actividad para generar un consumo independiente de energía cuando sea necesario utilizar la pista en horario nocturno.

NP10.2 "TABLERO DE DISTRIBUCION SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA SUBESTACIÓN NORTE

Esta actividad se incluye porque, según el diseño eléctrico, es necesario que la iluminación de la pista se maneje en un tablero independiente con acometidas independientes de las existentes.

NP10.3 "TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA 80 AMP, EN CONTACTORES, COFRE METALICO EN COLLD ROLLED, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 18 TERMINADO EN RECUBRIMEINTO ELECTROSTATICO RAL 7032, CONTACTOTRES DE 80 AMP, MODULO DIGITAL, SISTEMA MANUAL AUTOMATICO "
Dado que es importante contar con un respaldo en caso de cortes de energía, se requiere incluir una transferencia que se conecte a la planta instalada y mantenga el flujo eléctrico en el circuito de iluminación.

NP10.4 GRUPO DE MEDIDA EN COLLD ROLLED CALIBRE 16 A 220V GABINETE DE 180X60X30, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 18, TERMINADO EN RECUBRIMIENTO ELECTROSTATICO RAL 7032, BREAKER 60 AMP FIJO, TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 100/5, BORNERA DE CONEXIÓN Y PRUEBAS, MEDIDOR ELECTRONICO DE MEDIDA INDIRECTA, CONEXION INTERNA
Considerando que se encuentra dentro del ámbito de la iluminación de la pista y que dicha actividad debe ser independiente de la iluminación actual de la cancha de fútbol, es imperativo incluir, en conformidad con el diseño eléctrico actualizado aprobado, la actividad para generar un consumo independiente de energía cuando sea necesario utilizar la pista en horario nocturno.

NP10.5 TABLERO DE DISTRIBUCION SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA SUBESTACIÓN SUR
Debido al diseño eléctrico, que requiere que la gestión de la iluminación de la pista se realice mediante un tablero independiente con conexiones separadas de las existentes. Este tablero estará ubicado en la subestación sur del estadio

NP10.6 TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA 60 AMP, EN CONTACTORES, COFRE METALICO EN COLLD ROLLED, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 18 TERMINADO, EN RECUBRIMIENTO ELECTROSTATICO RAL 7032, CONTACTORES DE 60 AMP, MODULO DIGITAL, SISTEMA MANUAL AUTOMATICO
Dado que es importante contar con un respaldo en caso de cortes de energía, se requiere incluir una transferencia que se conecte a la planta instalada y mantenga el flujo eléctrico en el circuito de iluminación.

NP10.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3x250+250+4/0T AL
Esta actividad se refiere a la conexión que se extiende desde el transformador norte y el transformador sur hasta el tablero general de distribución. La inclusión de esta tarea se basa en la consideración de los diseños eléctricos más recientes, específicamente para la iluminación de la pista

NP10.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2x1/0+1/0 AL
Se incluye teniendo en cuenta el cuadro de cargas y el diseño actualizado de iluminación, esta actividad se refiere a la acometida para alimentar los reflectores del circuito de la zona oriental del estadio.

NP10.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2x2+2 AL
Con el fin de suministrar energía a los reflectores de las zonas norte y sur, de acuerdo con el diseño eléctrico y los cuadros de cargas correspondientes

NP10.10SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2X2/0+2/0 AL
El cuadro de cargas y el diseño actualizado de iluminación, esta actividad se refiere a la acometida para alimentar los reflectores del circuito de la zona occidental del estadio.

NP10.11 SALIDA DE ILUMINACION 220 V INCLUYE TOMA BIFASICA CABLE LIBRE DE HALÓGENO Y ACCESORIOS

Esta actividad implica cuantificar la salida de cada reflector hasta el circuito y la acometida, de acuerdo con el diseño eléctrico establecido

NP10.12 PROYECTOR 640W SPORT LED. ALTA POTENCIA. 100.000 HORAS VIDA ÚTIL. IP66. IK08, FACTOR POTENCIA 0.98, PROTECCIÓN TRASCIENTES 10KV. PASOS MCADAMS 5 SDCM (10 AÑOS DE GARANTIA)

De acuerdo con el estudio fotométrico y el diseño de iluminación, se define el tipo de reflector a instalar, siguiendo las normativas específicas para las competencias. Este tipo de reflector será utilizado especialmente en la zona de fotofinish.

NP10.13 PROYECTOR 350W SPORT LED. ALTA POTENCIA. 100.000 HORAS VIDA ÚTIL. IP66. IK08, FACTOR POTENCIA 0.98, PROTECCIÓN TRASCIENTES 10KV. PASOS MCADAMS 5 SDCM (10 AÑOS DE GARANTIA)

De acuerdo con el diseño fotométrico y el plano de iluminación, se determina la cantidad de reflectores necesarios, especificando tanto el tipo como las especificaciones correspondientes

NP10.14 CAJA DE PASO DEXSON 22x17x9 PARA DERIVACION

Esta caja de paso se incorpora de acuerdo con el diseño eléctrico, siendo necesaria para cada reflector instalado y en las zonas de acometidas correspondientes

NP10.15 SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA EMT 2"

Según el diseño eléctrico que especifica el diámetro y las características de la tubería de conducción, se requiere la instalación de esta actividad para la zona de iluminación en la zona norte.

NP10.16 SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA EMT 4"

Esta actividad es necesaria para la alimentación principal de las subestaciones norte y sur se calculan ductos se dejan reservas según normativa y cuadro de cargas actualizado.

NP10.17 SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA IMC 2"

se incluye actividad para conducción de las acometidas de los circuitos de los reflectores desde subestación, acorde a los diseños y especificaciones técnicas en planimetría.

NP10.18 SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA IMC 4"

se incluye actividad para alimentación desde subestación norte y sur a la red principal.

NP10.19 ACCESORIOS DE INSTALACION DE REFLECTOR

Debido a que los reflectores deben suspenderse de la estructura de la cubierta, es esencial incluir los accesorios de anclaje necesarios para cada punto

NP10.20 DESMONTE DE EQUIPOS ESCENARIO CANCHA AUXILIAR (CELDA DE MEDIDA, TABLERO Y TRANSFERENCIA)

Es necesario llevar a cabo el traslado de equipos desde la cancha auxiliar al cuarto eléctrico del escenario de softbol para que dicho espacio funcione como cuarto eléctrico destinado a la iluminación de la pista.

NP10.21 DESMONTE DE ACOMETIDA PRINCIPAL 3X2+2+8T ESCENARIO CANCHA AUXILIAR

Considerando el traslado de los equipos desde la cancha auxiliar al cuarto eléctrico de softbol, también es necesario llevar a cabo el desmonte de la acometida eléctrica, que va desde el transformador hasta el medidor, la transferencia y el tablero de la cancha.

NP10.22 DESMONTE DE ACOMETIDA PARCIAL 3X4+4+8T A CADA MASTIL ESCENARIO CANCHA AUXILIAR
Es necesario llevar a cabo el desmonte de la acometida a los mástiles de iluminación de la cancha auxiliar, ya que se procederá a su posterior reubicación debido al cambio de cuarto eléctrico

NP10.23 INSTALACION DE EQUIPOS ESCENARIO CANCHA AUXILIAR (CELDA DE MEDIDA, TABLERO Y TRANSFERENCIA)
En concordancia con el traslado de los equipos desde la cancha auxiliar a la subestación de softbol, se incluye la reinstalación del transformador, medidor y sistema de transferencia.

NP10.24 INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL 3X2+2+8T ESCENARIO CANCHA AUXILIAR
Según el traslado planificado de los equipos desde la cancha auxiliar a la subestación, se contempla el traslado de las acometidas, que fueron desmontadas de los mástiles, hacia el cuarto principal

NP10.25 INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL 3X4+4+8T A CADA MASTIL ESCENARIO CANCHA AUXILIAR
Acorde al traslado que debe realizar de los equipos de cancha auxiliar a subestación se contempla traslado de las acometidas desmontadas desde los mástiles a cuarto principal.

NP10.26 DESMONTE DE EQUIPOS ESCENARIO CANCHA TEJO (CELDA DE MEDIDA Y TRANSFERENCIA)
Es necesario llevar a cabo el desmonte de los equipos de los tableros de la cancha de tejo con el fin de proceder a su reubicación dentro de la subestación.

NP10.27 DESMONTE DE ACOMETIDA PRINCIPAL 3X2+2+8T ESCENARIO CANCHA TEJO
Es necesario realizar el desmonte de las acometidas de la cancha de tejo para proceder a su reubicación.

NP10.28 INSTALACION DE EQUIPOS ESCENARIO CANCHA TEJO (CELDA DE MEDIDA Y TRANSFERENCIA)
En línea con el traslado planificado de los equipos de tejo, es necesario llevar a cabo la reinstalación de la celda de medida y la transferencia automática.

NP10.29 INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL 3X2+2+8T ESCENARIO CANCHA TEJO
Según el traslado planificado de los equipos de tejo, es necesario reinstalar la acometida para asegurar su correcto funcionamiento en la nueva ubicación.

NP10.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 2KVA-AUTONOMIA DE 7-30MINUTOS
se incluye instalación de UPS 2 KVA para instalación en el PMU del estadio segundo piso.

NP10.31 TABLERO MOVIL DE TOMA CORRIENTE REGULADA JUECES-(INCLUYE 03 TOMAS REGULADAS)
Esta actividad se incorpora considerando las normativas establecidas por World Athletics y es esencial para la zona técnica de jueces.

NP10.32 CABLE ENCAUCHETADO 3X10 CU ALIMENTACION PARA TABLERO MOVIL REGULADO
Esta actividad se incluye teniendo en cuenta la normativa establecida por World Athletics y es necesaria para la alimentación desde la PMU hasta la zona técnica de jueces

NP9.3 RETIE USO FINAL

Debe incluirse, ya que, conforme a la normativa vigente, es necesario obtener la certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas para Colombia). Este reglamento establece todos los requisitos que deben cumplir los productos y las instalaciones eléctricas, garantizando su conformidad con las normas de seguridad y estándares establecidos

NP9.4 CERTIFICACION RETILAP

Dado que el proyecto debe cumplir con todas las normativas aplicables, es esencial incluir la certificación RETILAB, especialmente considerando la incorporación de un sistema de iluminación en el proyecto. Esta certificación asegurará que la instalación cumple con los estándares y requisitos establecidos por RETILAB, garantizando la seguridad y eficiencia del sistema de iluminación en conformidad con las normativas correspondientes.

NP9.5 INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA

Esta actividad debe incluirse, ya que para poder energizar el proyecto se requiere la certificación por parte de la entidad prestadora del servicio público EMSA. Esta certificación avalará las obras ejecutadas en el proyecto y garantizará que la instalación cumple con los requisitos y estándares necesarios para la conexión segura y efectiva al servicio eléctrico proporcionado por EMSA.

NP9.6 CERTIFICACION TRACK-WA CLASS 2

Esta certificación debe incluirse, ya que para que la pista pueda ser utilizada en competiciones de alto rendimiento, debe cumplir con los requisitos especificados en dicha certificación. Esta certificación, que homologa la geometría, las zonas de competencia, los accesorios y la pista en sí, asegura que cumple con los estándares para ser catalogada como una pista estándar de 400 metros. Su inclusión es fundamental para garantizar que la instalación cumpla con las normativas necesarias para competiciones de alto nivel.

2. RAZONES FINANCIERAS

2.1. JUSTIFICACIÓN ADICIONAL CONTRATO DE OBRA

En el desarrollo de elaboración del presupuesto del proyecto de inversión denominado "construcción de la pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio, Meta", con código BPIN 2022005500094, se tuvo en cuenta el estudio de mercado realizado por la consultoría, dicho estudio se realizó en la vigencia 2022, datos que finalmente se tuvieron en cuenta para la definición de los precios unitarios en cada uno de los elementos que hacen parte del proyecto.

El valor de la adición solicitada corresponde al presupuesto necesario para la ejecución de las obras no previstas en el contrato inicial, en condiciones necesarias para garantizar que las prestaciones a ejecutar por el contratista de obra guarden proporcionalidad con los precios y condiciones de mercado, así como las necesarias para mantener el equilibrio del contrato existente.

De acuerdo al artículo 40 de la ley 80 de 1993 establece que el contrato solo puede adicionarse en el 50% y sumadas las adiciones solicitadas para cada uno de los proyectos no exceden el 50% por esta razón, en relación con el contrato, esta adición es viable financiera y jurídicamente y adicionalmente el acuerdo 7 de la comisión general de regalías establece que los proyectos de financiación con fondos de regalías no puede adicionarse en sí mismos al 50%, dicha financiación se entiende expresada en SMMLV y se encuentra que las adiciones solicitadas no exceden el monto mencionado, por esta razón, tanto los proyectos como el

contrato son susceptibles de la adición porque no se superan los topes establecidos por la ley, por dicha razón, la interventoría aprueba la adición.

2.2. JUSTIFICACIÓN ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El valor adicional solicitado ha sido calculado de conformidad con el numeral 4.3 del estudio previo que sustentó el proceso que desembocó en el presente contrato, donde se encuentra el análisis que soporta el valor estimado del contrato, mismo que se encuentra soportado en los anexos financieros realizados por la Agencia de Infraestructura del Meta en la etapa de formulación del proyecto, donde fueron determinados el staff mínimo de profesionales a vincular por proyecto, así mismo, se toma en cuenta el factor multiplicador presentado por el Consorcio Interescenarios, el cual revela la distribución de los costos necesarios para la ejecución del contrato en la forma requerida por la entidad, propuesta por el Consorcio y establecida en el contrato, para el proyecto BPIN 2022005500094 - construcción de la pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio - Meta.

Así mismo toma en cuenta que el contrato de Interventoría tuvo inicio veinte días antes que el contrato de obra en razón a que el contrato de interventoría contempla la obligación de realizar una revisión de diseños y estudios previo a la viabilización y suscripción del contrato de obra, tal como lo determina Colombia Compra Eficiente, por ello es necesario que el contrato de interventoría sea extendido en esta misma proporción en tiempo y recursos para vigilar la ejecución de las obras durante la totalidad del plazo de ejecución de dicho contrato.

Adicionalmente, la adición financiera contempla diez (10) días más de plazo, que se considera prudencial para la preparación de los informes de cierre y entrega de las obras a entera satisfacción; es decir, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra que son inherentes al objeto del mismo y que solo pueden ejecutarse una vez haya terminado.

Los planteamientos financieros presentados obedecen a que los contratos de obra e interventoría son independientes uno de otro, no obstante se encuentran coligados en la medida en que el contrato de interventoría debe subsistir en tanto subsista el de obra, así mismo, a que el presupuesto desarrollado por el formulador del proyecto (AIM), el presentado por la Entidad dentro del proceso de selección, el presentado con la propuesta económica inicial y el incluido en el contrato, se han elaborado por tasación mensual de gastos indirectos y pago a profesionales, por lo cual claramente se realiza la solicitud de adición de recursos respetando la misma línea conceptual y legal adoptada por Idermeta con arreglo a lo prescrito por la Ley 1474 de 2011, que en su artículo 85, en relación con los contratos de interventoría, establece la excepción de la aplicación de la restricción en su valor, de manera que podrán adicionarse sin importar su monto[1].

3. RAZONES JURIDICAS:

3.1. JUSTIFICACIÓN ADICIONAL CONTRATO DE OBRA

La ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Si bien, durante la etapa de planeación, la Agencia para la infraestructura del Meta y el Instituto de deporte y

[1] «Artículo 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993».

recreación del Meta estimaron y determinaron las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad de interés colectivo que pretende satisfacer, durante la ejecución del contrato, se identifican las siguientes situaciones: i) la necesidad de mayores cantidades de bienes o actividades inicialmente previstos, y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, pero que consideramos pertinentes y necesarias para garantizar el objeto del contrato y la satisfacción de los deportistas.

Conforme a la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y Colombia compra Eficiente, es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse que la causa de la modificación es real y cierta y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador.

En este caso, las actividades no previstas propuestas en esta modificación buscan ajustar la pista al cumplimiento de los requisitos exigidos para cada disciplina que compone el Atletismo, lo que conlleva la adquisición de productos con mejores especificaciones técnicas y la adecuación de diseños a las necesidades del terreno y del deporte en sí mismos, así como las propuestas necesarias para incluir las peticiones realizadas por la liga de Atletismo. En este sentido, cada una de las actividades propuestas han tomado los referentes del contrato, los precios de mercado vigentes y la consideración del tiempo adicional necesario para la ejecución de estas obras una vez estén contratadas y formalizadas, por lo cual considera las proyecciones de incremento del salario mínimo el IPC y la inflación, así como la reducción de la jornada laboral que impacta directamente la dedicación del personal el avance en la ejecución del proyecto.[2]

3.2. JUSTIFICACIÓN ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, las Entidades Estatales están en la obligación de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y de proteger los derechos de la Entidad Pública, de los contratistas y de terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

En particular, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011[3] dispone que, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

En ese orden de ideas, la supervisión de un contrato estatal consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos

[2] La inflación proyectada para diciembre de 2023 por el Banco de la República es del orden del 9.8%; el salario mínimo para el año 2024 en Colombia se proyecta en 1,276,000 pesos colombianos sin tener en cuenta el auxilio de transporte. El Gobierno Nacional prevé un aumento del 10% para el próximo año, siendo estos criterios de gran importancia para la valuación de la adición solicitada.

[3] "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"

Por otro lado, la interventoría consiste en el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en este caso, porque la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos tal como en los contratos de obra. Ahora bien, la Entidad Estatal en el estudio previo determinó que la interventoría que requiere debe cubrir no solo acciones de carácter técnico sino también administrativo, financiero y Contable.

El Consejo de Estado, en Sentencia 25000-23-26-000-2005-02611-01 (38098) recuerda la finalidad de la interventoría en los contratos estatales, reiterando que ésta comprende todas aquellas actividades que, en representación de la entidad contratante, realiza una persona, natural o jurídica, con el fin de vigilar o inspeccionar, controlar, verificar y colaborar en la ejecución de los contratos o convenios, para lo cual debe prestar asesoría y apoyo tanto a la entidad como al contratista. Se trata así, de una exigencia establecida en el ordenamiento jurídico, que tiene el propósito de asegurar el cumplimiento del objeto de los contratos estatales, en defensa de los fines de la contratación pública, para la satisfacción de los intereses generales y de las necesidades básicas de la colectividad.

El interventor debe velar porque se cumplan las especificaciones técnicas del objeto del contrato al que deba hacerse la interventoría, al igual que las actividades o acciones administrativas, legales, financieras y presupuestales a cargo del contratista llamado a cumplir con dicho objeto e, igualmente, debe realizar un acompañamiento directo al contratista para asegurar la adecuada y total ejecución del contrato.

En este sentido, la solicitud de adición del contrato de interventoría contempla la remuneración del consorcio contratista, durante el término de prórroga de la obra contando con el equipo profesional determinado por la entidad contratante e incluyendo un profesional en electricidad para la interventoría de este capítulo en el proyecto de atletismo; así mismo, la propuesta de adición abarca el término necesario para que la extensión de la interventoría llegue al mismo término del plazo de ejecución de la obra más un plazo de diez (10) días que se considera prudencial para la preparación de los informes de cierre y entrega de las obras a entera satisfacción; es decir, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra que son inherentes al objeto del mismo y que solo pueden ejecutarse una vez haya terminado.

Cordialmente,

Ing. **HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES**
Representante legal Consorcio Interescenarios

Villavicencio, 10 de noviembre de 2023 **OF-C249 -2023-186**

Señores:
SECRETÁRÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
Ciudad

14 NOV 2023
3735
3:30

Asunto: Solicitud de creación y registro de ajustes al proyecto de inversión "construcción de la pista de atletismo en la Villa Olímpica del municipio de Villavicencio, Meta" con código BPIN 2022005500094 aprobado bajo numeral 3 del Artículo 4.5.1.2.2. Acuerdo Único de Comisión Rectora.

En calidad de representante legal de la interventoría contratada por la entidad designada como ejecutora del proyecto de inversión denominado "construcción de la pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio, Meta", con código BPIN 2022005500094, manifiesto que la interventoría ha realizado un análisis de situación del proyecto viabilizado, generándose la necesidad de realizar la modificación de las variables definidas a través del artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, *para los ajustes a los proyectos de inversión aprobados que versen sobre modificación del valor total del proyecto, fuentes de financiación o cambio de ejecutor,* como a continuación se describen:

VARIABLE(S) OBJETO DE AJUSTE

VARIABLES SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN	VARIABLE	IDENTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN
a) Actividades y costos	Aumento o disminución de los costos de las actividades existentes	*
	Inclusión de actividades nuevas	
	Cambios definidos en el horizonte de ejecución del proyecto	*
b) Valor total del proyecto de inversión	Incremento del valor total inicial hasta el 50%	*
	Disminución de los montos aprobados	
c) Indicadores de producto	Indicadores de producto secundarios	
d) Fuentes de financiación	Sustitución de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas	
	Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas	
	Modificación de las fuentes ya existentes	
e) Ejecutor	Cambio de la entidad ejecutora designada	
f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría	Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría	

De conformidad con el literal a del numeral 1 del artículo 4.5.1.2.5. del Acuerdo Único de Comisión Rectora que las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la necesidad y pertinencia del ajuste de la cadena de valor de la alternativa sobre las variables mencionadas, se detallan a continuación, vale la pena aclarar se genera por causas no imputables, ni al contratista de obra, ni a la interventoría y consiste

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

11978

Villavicencio, 14 de Noviembre del 2023 **OF-C249 -2023-184**

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación y pago de Orden de Giro No. 11 anticipo. Fiduciaria Alianza – Fideicomiso No. 113392.

1

Cordial saludo,

Una vez revisados y evaluados los soportes que se adjuntan en el Giro No. 11 Anticipo radicado el día 10 de Noviembre del 2023, se autoriza el REEMBOLSO de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 36.132.107,00), los cuales se encuentran discriminados en el siguiente ítem:

- MANO DE OBRA PARA PISTA DE ATLETISMO, PISTA DE PATINAJE Y ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITOS: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 36.132.107,00), reembolso a ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS.

Destinados única y exclusivamente a la ejecución del contrato de obra No. 106 de 2023.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Recibido
14/11/23

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

11979

Villavicencio, 14 de Noviembre del 2023

OF-C249 -2023-185

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación reprogramación Plan de Inversión del Anticipo

Cordial saludo,

1

De manera respetuosa me permito aprobar la reprogramación del plan de inversión del anticipo radicada el día 07 de Noviembre del 2023.

Se anexa formato GES-FO-145 Plan de Inversión y autorización pago anticipo obra firmado por Contratista de Obra e Interventoría.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

14 NOV 2023
3:30 3734

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Recibí
14/11/23

C.C. INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

11980

Villavicencio, 15 de Noviembre del 2023 **OF-C249 -2023-186**

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META – IDERMETA
Fabian Hernán Gonzalo Torres Carrillo
Director
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Solicitud de trámite de modificación, adición y prórroga de los contratos de obra e interventoría celebrados para la ejecución del proyecto identificado con los BPIN 2022005500022 – Proyecto: Construcción Pista de Patinaje en la Villa Olimpica del Municipio de Villavicencio, Meta. En 5 carpetas

1

Cordial saludo,

En calidad de interventor del contrato de obra N. 106 de 2023 por medio del cual se materializa la ejecución del proyecto citado en referencia, presento al Instituto de Deporte y Recreación del Meta en calidad de ejecutor de los proyectos y de entidad contratante solicitud de modificación adición y prórroga de los contratos de obra e interventoría.

La solicitud que se allega ha sido revisada y avalada por esta interventoria, y responde a diferentes causas constructivas, técnicas, deportivas, legales y principalmente a las necesidades de los usuarios finales de los diferentes escenarios, contempla plazos prudenciales de ejecución y es financieramente viable en términos contractuales. Dado el alcance de la propuesta se requiere el aval del Instituto y su gestión para el ajuste en Planeación.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

15 NOV 2023
3769
9:20

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

11.981

Villavicencio, 17 de Noviembre del 2023

OF-C249 -2023-187

Recibido sin aceptación
17 noviembre 2023

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz Garcia
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Aprobación y pago de Orden de Giro No. 12 anticipo. Fiduciaria Alianza – Fideicomiso No. 113392.

1

Cordial saludo,

Una vez revisados y evaluados los soportes que se adjuntan en el Giro No. 12 Anticipo radicado el día 15 de Noviembre del 2023, se autoriza el REEMBOLSO de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 241.751.169,00), los cuales se encuentran discriminados en el siguiente ítem:

- MANO DE OBRA PARA PISTA DE ATLETISMO Y PISTA DE PATINAJE: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 241.751.169,00) reembolso a CIVIDEPORTES SAS.

Destinados única y exclusivamente a la ejecución del contrato de obra No. 106 de 2023.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: armconsulting@gmail.com

11982

CONSORCIO INTERESCENARIOS

OF - C249 – 2023 - 188

Villavicencio, 21 de noviembre de 2023

23 NOV 2023
3870
11:38

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Dra. Martha Bibiana Pan Merchán, Jefe Oficina Asesora de Planeación
planeacion@idermeta.gov.co
Carrera 16 Nº24-03 Barrio Olímpico
Villavicencio – Meta - Colombia.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023. "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de los escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio, departamento del Meta"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023. "Construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio, departamento del Meta".

ASUNTO: Traslado de problemática informada por medio de correo electrónico de fecha lunes 20 noviembre, 09:33 am

Cordial saludo,

Por este medio nos permitimos hacer traslado de una problemática informada vía correo electrónico la mañana de ayer 20 de noviembre de 2023, por el **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023,** donde manifiesta que la entidad contratante realizo actividades de fútbol infantil dentro del área de trabajo, las cuales NO fueron informadas al consorcio, ni a la interventoría.


Por lo anterior, el contratista de obra previendo el riesgo tomo como medida de contingencia la suspensión de todas las actividades de obra que se vienen adelantando en el punto donde se cuenta con 13 personas y maquinaria como excavadora, mini cargador, 2 doble troques y mezcladora de concreto la cual quedo en stand by.

Así las cosas, la presente interventoría solicitó al contratista realizar un informe y valoración detallada de los imprevistos con el fin de evaluar los daños reales que ellos exponen y poder realizar una reunión entre las partes y estimar lo sucedido.

Cabe anotar que se debe tener presente por todos los actores que interviene en la ejecución del contrato que la responsabilidad y la tenencia temporal está en manos del contratista de obra y será de cuenta de este indemnizar todos los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras o dentro de ellas, por tanto, la entidad contratante debe contar con el visto bueno y la anuencia del CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023, para la programación de los eventos que involucren el uso de las zonas en intervención máxime cuando existe un Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual cargada a su pecunio asegurado los daños materiales o

personales de un tercero en el desarrollo de las actividades del contrato y que las actividades propias de una obra civil se encuentran categorizadas con el nivel de riesgo V, en consecuencia el ingreso de menores de edad sin suspensión de actividades, y sin acordonamiento y protección de las áreas y maquinarias peligrosas es un riesgo del que debió informarse previamente al contratista de obra y a la interventoría.



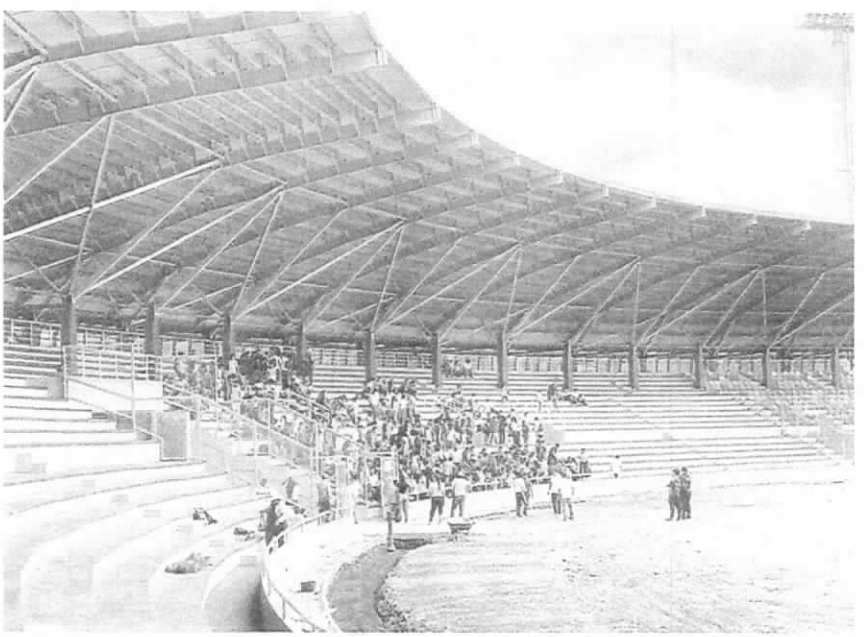

11984

CONSORCIO INTERESCENARIOS

OF - C249 – 2023 - 188



Lo anterior para su conocimiento, análisis y fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. Consorcio Interescenarios

CONSORCIO INTERESCENARIOS

11.985

OF-C249 -2023-189

Villavicencio, 21 de noviembre del 2023

Recibio Jessy Parra
24 Noviembre 2023
Hora 2:47 pm

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. JHON HENRY ORTIZ GARCÍA, Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023. "interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de los escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio, departamento del Meta"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023. "construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio, departamento del Meta"

ASUNTO: RESPUESTA CORREO ELECTRONICO DE FECHA LUNES 20 DE NOVIEMBRE, 09:33 AM

Respetados señores,

1

La presente es con el fin de dar respuesta al correo del asunto en el cual ponen en conocimiento la problemática vivida el día de ayer 2023, por unas actividades realizadas por IDERMETA de fútbol infantil dentro del área de trabajo, las cuales no fueron informadas previamente al CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023.

Por lo tanto y aclarando que lo anterior tampoco fue socializado con la presente interventoría y que entendemos los percances a nivel de programación y responsabilidad extracontractual por posible daño a terceros que ocasionan este tipo de imprevistos.

Solicitamos se sirvan realizar y entregar un reporte detallado donde se valoren sus posibles pérdidas económicas y evidencien los riesgos y responsabilidades que afectaron a su juicio el desarrollo del presente contrato.

Sin otro particular y a esperas de su pronta respuesta.

Atentamente:

Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. Consorcio Interescenarios

11986

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 23 de noviembre del 2023

OF-C249 -2023-190

Recibio Jenny Pena
24 Noviembre 2023
Hora: 2:46 Pm

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: REITERACION DEL INFORME DE GERENCIA DE PROYECTOS

Cordial saludo,

1

Me permito reiterar la solicitud pendiente con respecto al Informe de Gerencia de Proyectos correspondiente al contrato que, hasta la fecha, no hemos recibido por parte de su equipo.

En relación con la propuesta presentada por el CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023 durante el proceso de licitación para el contrato de obra, se recuerda el compromiso explicitado a través del formato **7A-Gerencia de Proyectos**. En dicho documento, el contratista afirmó, bajo juramento, su responsabilidad de implementar, por cuenta propia y asumiendo los riesgos inherentes, un programa integral de Gerencia de Proyectos.

Este compromiso se estableció con el propósito expreso de garantizar la efectiva y eficiente ejecución del alcance y objetivos contemplados en el contrato. Como parte fundamental de esta disposición, se estipuló que el contratista debería contar con un profesional especializado en áreas de ingeniería o arquitectura, cuyas competencias se ajusten a los requerimientos y estándares establecidos por nuestra entidad.

Hasta la presente fecha, no hemos recibido el Informe de Gerencia de Proyectos comprometido en su propuesta. Este documento es de vital importancia para el seguimiento y control del progreso del proyecto, así como para asegurar la alineación con los plazos y la efectividad en la gestión previamente convenida.

Por tanto, le instamos a tomar las medidas pertinentes para la pronta presentación de este informe.

En concordancia con los requerimientos anteriores, se reitera la solicitud al Contratista de Obra

para la presentación mensual del informe de Gerencia de Proyectos. Hasta la fecha, dicho informe correspondiente al mes **No. 1** no ha sido recibido, Aun cuando fue solicitado por la interventoría en múltiples ocasiones.

Los oficios emitidos con los números **OF-C249 -2023-039** del **26 de mayo** del 2023, **OF-C249 -2023-061** del **13 de junio** del 2023, **OF-C249 -2023-085** del **06 de Julio** del 2023, **OF-C249 -2023-132** del **31 de agosto** del 2023 y **OF-C249 -2023-146** radicado el **14 de septiembre** del 2023 han sido las instancias en las cuales se ha requerido la entrega de este informe mensual, se anexan dichos oficios mencionados.

Cabe resaltar que el no cumplimiento de un compromiso ofertado en el proceso licitatorio resulta en un incumplimiento contractual por parte del contratista.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

2

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

11988

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 23 de noviembre del 2023

OF-C249 -2023-191

Recibio Jenssy Para
24 noviembre 2023
Hora: 2:44 pm.

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: SOLICITUD DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

1

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el suministro regular de los seguimientos mensuales concernientes al programa de seguridad industrial y salud ocupacional, tal y como fue acordado y establecido en nuestras reuniones anteriores. Es fundamental recordar que se acordó específicamente la entrega de estos informes de manera mensual, iniciando desde el mes de mayo y prosiguiendo a lo largo del período de ejecución del contrato.

Destacamos la importancia de este seguimiento continuo, por lo que agradecemos su compromiso en proporcionar estos informes de forma regular y oportuna.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta y entrega de los informes requeridos. Agradecemos de antemano su pronta atención y disposición para cumplir con esta solicitud.

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional o aclaración que puedan requerir.

Atentamente,

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: interescenariosc@gmail.com

11989

CONSORCIO INTERESCENARIOS

OF-C459 -2022-192

Villavicencio, 27 de noviembre del 2023

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Dra. **Martha Bibiana Pan Merchán**, jefe Oficina Asesora de planeación
planeacion@idermeta.gov.co
Carrera 16 Nº24-03 Barrio Olímpico
Villavicencio-Meta-Colombia.

28 NOV 2023
3980
11:10

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023 "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de los escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio, departamento del Meta"
CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023 "Construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio, departamento del Meta"

ASUNTO solicitud de suspensión de actividades de entrenamiento de todas las disciplinas de atletismo.

1

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el acta de entrega de la pista de atletismo realizada por el IDERMETA firmada el 05 de julio del año 2023 por obra, interventoría y la identidad, por medio del cual entregan el escenario para iniciar actividades de obras dentro del estadio se establece que la identidad no podrá llevar a cabo actividades deportivas ni entrenamientos, ni permitir el acceso a civiles que carezcan de sus elementos de protección personal o seguridad social, sin haber gestionado previamente y obtenido la autorización correspondiente por parte de la interventoría; toda vez que en la actualidad la responsabilidad sobre el escenario se encuentra en cabeza del contratista de obra.

En este sentido, informo a cerca de un incidente de seguridad que tuvo lugar hoy, 27 de noviembre de 2023, durante una supervisión de la interventoría en las zonas de actividades laborales de la pista de atletismo, aproximadamente a las 10:25 de la mañana, mientras el Arquitecto residente y la Auxiliar de Seguridad y Salud en el trabajo de la interventoría se encontraban en el área realizando la inspección de rutina, notamos la presencia de varios grupos de deportistas entrenando en la obra de la pista de atletismo, actividad para la cual no se solicitó permiso o notificación previa a la interventoría.

Entre las actividades realizadas, se incluyeron prácticas de lanzamiento de disco y bala una deportista lanzó una bala al aire, la cual estuvo a punto de impactar cerca de los profesionales que estaban supervisando la obra. Esta situación representa un grave riesgo y constituye un

acto inseguro. Es importante tener en cuenta que la obra está clasificada con niveles de riesgo 5 y 6, lo cual prohíbe la presencia de civiles en el área. Además de estar prohibido el acceso a personal no autorizado por interventoría, la entrenadora que acompañaba a los deportistas no supervisaba las acciones de estos. Cuando se le preguntó si tenían permiso para estar en esa zona de trabajo de alto riesgo, ella afirmó tener el permiso otorgado por IDERMETA.

El área donde se llevan a cabo estos entrenamientos deportivos no autorizados está obstruyendo la zona destinada al tránsito de maquinaria pesada, como volquetas, grúas y minicargadores. Además, como se puede apreciar en las **evidencias fotográficas**, se están llevando a cabo excavaciones para la construcción del muro de contención, representando un peligro evidente tanto para los deportistas como para los colaboradores que trabajan en la zona.

Es preocupante que se lancen discos y balas al aire sin precaución alguna, lo que puede resultar en un incidente similar en el futuro si no se toman medidas inmediatas para evitarlo. Esta situación implica un riesgo significativo tanto para los colaboradores de la obra como para cualquier civil presente en las instalaciones.

Por lo tanto, solicitamos de manera urgente al Instituto de Recreación y Deporte de Meta (IDERMETA) la suspensión inmediata de este tipo de actividades deportivas mientras se llevan a cabo las ejecuciones en la obra. Esta medida es esencial para garantizar la seguridad y evitar cualquier incidente adicional. Se anexa evidencia fotográfica.




Entrenamiento de actividades deportivas no autorizada

11.991

CONSORCIO INTERESCENARIOS

OF-C459 -2022-192

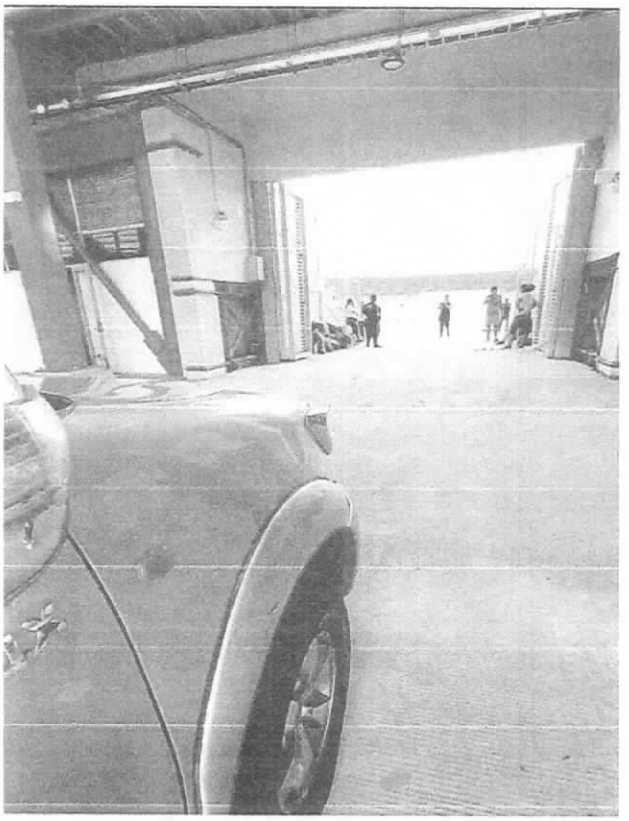

Estos entrenamientos no autorizados están bloqueando el acceso y la salida designada para la maquinaria pesada, impidiendo su correcto tránsito

3

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. Consorcio Interescenarios

11.992

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 30 de Noviembre del 2023

OF-C249 -2023-193

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
planeacion@idermeta.gov.co
CARRERA 16 Nº24-03 BARRIO OLIMPICO
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: TRASLADO OFICIO CEDVO-141-2023 – Intervención en la zona verde de la cancha de futbol 1

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito realizar el traslado del oficio en el cual informa el contratista de obra que se hará la construcción del carcamo perimetral e instalación de tuberías de Aguas Lluvias en la zona interna de la pista de atletismo, por lo que se hace necesario intervenir una zona de la cancha de futbol.

Dichos cambios se realizan de acuerdo al ajuste de diseños realizados a la pista en la zonas de competición y cancha, según la normativa dada por la World Athletics.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

30 NOV 2023
9:55 4068

11.993

CONSORCIO INTERESCENARIOS

Villavicencio, 30 de noviembre del 2023 **OF-C249 -2023-194**

30 Noviembre 2023
Hora 4:27pm

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: REITERACION SOLICITUD DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

Cordial saludo,

1

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el suministro regular de los seguimientos mensuales concernientes al programa de seguridad industrial y salud ocupacional, tal y como fue acordado y establecido en nuestras reuniones anteriores. Es fundamental recordar que se acordó específicamente la entrega de estos informes de manera mensual, iniciando desde el mes de mayo y prosiguiendo a lo largo del período de ejecución del contrato.

Destacamos la importancia de este seguimiento continuo, por lo que agradecemos su compromiso en proporcionar estos informes de forma regular y oportuna.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta y entrega de los informes requeridos.

Agradecemos de antemano su pronta atención y disposición para cumplir con esta solicitud.

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional o aclaración que puedan requerir.

Atentamente,

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

30 NOV 2023
4:55 4069

C.C. **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA**
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

11994

Villavicencio, 30 de noviembre del 2023

OF-C249 -2023-195

30-Noviembre 2023
Hora: 4:26 pm

Señores
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023
Att. Jhon Henry Ortiz García
Representante legal
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 249 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No 106 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: REITERACION DEL INFORME DE GERENCIA DE PROYECTOS

30 NOV 2023
4:55 4070

Cordial saludo,

Me permito reiterar la solicitud pendiente con respecto al Informe de Gerencia de Proyectos correspondiente al contrato que, hasta la fecha, no hemos recibido por parte de su equipo.

En relación con la propuesta presentada por el CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023 durante el proceso de licitación para el contrato de obra, se recuerda el compromiso explicitado a través del formato **7A-Gerencia de Proyectos**. En dicho documento, el contratista afirmó, bajo juramento, su responsabilidad de implementar, por cuenta propia y asumiendo los riesgos inherentes, un programa integral de Gerencia de Proyectos.

Este compromiso se estableció con el propósito expreso de garantizar la efectiva y eficiente ejecución del alcance y objetivos contemplados en el contrato. Como parte fundamental de esta disposición, se estipuló que el contratista debería contar con un profesional especializado en áreas de ingeniería o arquitectura, cuyas competencias se ajusten a los requerimientos y estándares establecidos por nuestra entidad.

Hasta la presente fecha, no hemos recibido el Informe de Gerencia de Proyectos comprometido en su propuesta. Este documento es de vital importancia para el seguimiento y control del progreso del proyecto, así como para asegurar la alineación con los plazos y la efectividad en la gestión previamente convenida.

Por tanto, le instamos a tomar las medidas pertinentes para la pronta presentación de este informe.

CONSORCIO INTERESCENARIOS

CONSORCIO INTERESCENARIOS

11995

En concordancia con los requerimientos anteriores, se reitera la solicitud al Contratista de Obra para la presentación mensual del informe de Gerencia de Proyectos. Hasta la fecha, dicho informe correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre no han sido recibidos.

Los oficios emitidos con los números **OF-C249 -2023-039** del **26 de mayo** del 2023, **OF-C249 -2023-061** del **13 de junio** del 2023, **OF-C249 -2023-085** del **06 de Julio** del 2023, **OF-C249 -2023-132** del **31 de agosto** del 2023, **OF-C249 -2023-146** radicado el **14 de septiembre** del 2023 y **OF-C249 -2023-190** radicado el **24 de Noviembre** del 2023, han sido las instancias en las cuales se ha requerido la entrega de este informe mensual, se anexan dichos oficios mencionados.

Cabe resaltar que el no cumplimiento de un compromiso ofertado en el proceso licitatorio resulta en un incumplimiento contractual por parte del contratista.

Agradeciendo su atención y gestión en lo anteriormente expuesto.

Atentamente:

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
RL. CONSORCIO INTERESCENARIOS

C.C. **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META- IDERMETA**
Atn: DRA. MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: interescenariosc@gmail.com

11996.

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-35
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 02

CORRESPONDENCIA GENERADA (RECIBIDA)

11997

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 1 de noviembre del 2023

CEDVO-120-2023

RECIBIDO 01 NOV 2023
4:34 PM
Tatiana20 S.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE INFORME PMT DE OCTUBRE DE 2023

Cordial saludo

De manera atenta me permito realizar entrega del informe PMT del mes de octubre, del proyecto de la referencia según aprobación N° 1703-19. 18/0680 del 17 de mayo de 2023, con el cual se realiza el control y registro de las actividades realizadas.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 60 folios,

11998

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01
		FORMATO 02 08/03/2023
		Página 1 de 1
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	

Villavicencio, 02 de noviembre de 2023

CEDVO-0123-2023

RECIBIDO 02 NOV 2023
11:30 a.m.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de planos de montaje de anclajes actualizado

De manera atenta me permito remitir planos de montaje de anclajes de pernos actualizados para la estructura de los Escenarios 1 y 2. Se realiza ajuste de posición de pernos en los ejes A y E.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 2 planos, CD

11999

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 02 de noviembre del 2023

CEDVO-124-2023

RECIBIDO 02 NOV 2023
11:28 am
Tatiana Pardo S.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de ajuste estructural a fachada y cubierta

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los ajustes realizados en la distribución de correas en fachadas y cubierta para los escenarios multipropósito de acuerdo a la arquitectura de los estudios y diseños.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: CD con archivo dwg, oficio modificaciones, tabla de peso

12.000

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 02 de noviembre de 2023

CEDVO-0122-2023

RECIBIDO 03 NOV 2023
9:57 am
Tatiana Paz S.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No 08 ANTICIPO

Cordialmente remitimos los documentos soporte de la orden de giro No 08 con cargo al Fideicomiso Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023.

ITEM DEL ANTICIPO	VALOR	DOCUMENTOS SOPORTE
2	$ 86.126.323,00	Copia del corte de obra No 3, factura electrónica N°14, RUT, certificación existencia y representación legal y certificado bancario, por concepto de pago de materiales y subcontrato de obra.

N°	BPIN	NOMBRE DE PROYECTO	AFECTACION
1	2022005500094	Pista de atletismo	$ 3.392.016,00
2	2022005500022	Pista de Patinaje	$ 82.734.307,00
		VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO N° 8 POR PROYECTO	$ 86.126.323,00

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

12.001

	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	
	AUTORIZACIÓN PAGO ORDEN DE GIRO	FID. 113392

CONTRATO N°	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

OBJETO CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL DEL	$ 50.871.940.842
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
NIT:	901.682.871-2
CORREO ELECTRÓNICO:	escenariosdeportivos2023@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS.
CORREO ELECTRÓNICO:	interescenariosc@gmail.com

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	ANTICIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR ORDEN DE GIRO 8	VALOR ACTUAL
1	2022005500094	$ 2.912.858.864	$ 2.314.654.428	$ 3.392.016	$ 2.311.262.413
2	2022005500022	$ 2.509.631.492	$ 534.555.419	$ 82.734.307	$ 451.821.111
3	2022005500024	$ 9.076.012.784	$ 453.800.639		$ 453.800.639
TOTAL		$ 14.498.503.139,60	$ 3.303.010.486,30	$ 86.126.323,00	$ 3.216.884.163,30

PLAN DE INVERSIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR SOLICITADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 579.940.126	$ 579.940.126		$ 579.940.126
2	Materiales y subcontratos de	$ 12.323.727.669	$ 2.035.836.293	$ 86.126.323,00	$ 1.949.709.970
3	Transporte	$ 1.449.850.314	$ 542.249.036		$ 542.249.036
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.030,60	$ 144.985.031		$ 144.985.031
TOTAL		$ 14.498.503.139,60	$ 3.303.010.486,30	$ 86.126.323,00	$ 3.216.884.163,30

VALOR A PAGAR: OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE

Los valores de la presente acta de autorización pago de orden de giro son aprobados el día 03 de noviembre de 2023.

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

12002

ORGANIZACION TERRACANTO SAS

ORGANIZACION
TERRACANTO
NIT 901.093.535-5
CALLE 14 SUR 48 B 61
Tel: 3153308256
Villavicencio - Colombia
terracantosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 14

				Fecha y hora Factura	
Señores	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023			Generación	02/11/2023, 11:49
NIT	901.682.871-2	Teléfono	(000) 3213512138 - Ext. 000	Expedición	02/11/2023, 11:49
Dirección	CL 24 B 11 119	Ciudad	Villavicencio - Colombia	Vencimiento	02/11/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Código	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	1.00	CORTE 3 CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y REDES ELECTRICAS PARA LOS ESCENARIOS MULTIPROPOSITOS, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO.EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	41350501	0 %	2 %	171,940,029.00	3,438,800.58	171,940,029.00
2	1.00	CORTE 3 CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y REDES ELECTRICAS PARA LOS ESCENARIOS MULTIPROPOSITOS, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. Utilidad 5% (gravada)	41350504	19 %	2 %	7,815,456.00	156,309.12	7,815,456.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento setenta y siete millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos once pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-02 por $ 177,645,311.94

Total Bruto	179,755,485.00
IVA 19%	1,484,936.64
Retefuente 2%	3,595,109.70
Total a Pagar	177,645,311.94

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764052161834 aprobado en 20230721 prefijo FE desde el número 9 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5X1000
CUFE: 46df236c84295446317db9b3c9145d0263440e783b4320564e5c511922de822fcc02195b1f26209df1f47a304724e09c

12005

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Código: F003

Versión: 1

Fecha: 30/6/2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATO No.	01 DE 2023				
OBJETO:	CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y REDES ELECTRICAS PARA LOS ESCENARIOS MULTIPROPOSITOS, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META				
CONTRATISTA:	TERRACANTO SAS Nit. 901.093.535-5				
VALOR:	$ 6.413.105.661,43	PERIODO:	24-septiembre-23 al 31-Octubre-23	FECHA DE INICIO:	10-may-23
PLAZO:	DIEZ (10) MESES CALENDARIO			FECHA DE TERMINACION:	9-mar-24
				FECHA PRESENTE CORTE:	31-oct-23

		CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				ACTAS ANTERIORES		PRESENTE CORTE		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.										
2,00	DESMONTE Y DEMOLICIONES										
2,1	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	30,00	$ 20.096	$ 602.880	30,00	$ 602.880	-	-	30,00	602.880,00
2,2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	55,00	$ 25.119	$ 1.381.545	55,00	$ 1.381.545	-	-	55,00	1.381.545,00
2,3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4.319,02	$ 12.174	$ 52.579.749	4.319,02	$ 52.579.749	-	-	4.319,02	52.579.749,48
2,4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	KG	25.854,30	$ 3.615	$ 93.463.295	25.854,30	$ 93.463.295	-	-	25.854,30	93.463.294,50
2,5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	58,00	$ 54.007	$ 3.132.406	58,00	$ 3.132.406	-	-	58,00	3.132.406,00
2,6	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	3.250,79	$ 11.864	$ 38.567.373	3.250,79	$ 38.567.373	-	-	3.250,79	38.567.372,56
2,7	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4.319,02	$ 9.059	$ 39.126.002	4.319,02	$ 39.126.002	-	-	4.319,02	39.126.002,18
2,8	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	11,00	$ 10.048	$ 110.528	11,00	$ 110.528	-	-	11,00	110.528,00
2,9	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	487,53	$ 245.571	$ 119.723.230	487,53	$ 119.723.230	-	-	487,53	119.723.229,63
2,10	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	3.335,73	$ 9.643	$ 32.166.444	-	$ -	-	-	-	-
2,11	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	332,05	$ 284.160	$ 94.355.328	332,05	$ 94.354.688	-	-	332,05	94.354.687,50
2,12	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	189,77	$ 252.587	$ 47.933.435	189,77	$ 47.933.435	-	-	189,77	47.933.434,99
2,13	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	45,90	$ 21.778	$ 999.610	45,90	$ 999.610	-	-	45,90	999.610,20
3,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS				$ 524.141.825		$ 491.974.740		$ -		$ 491.974.740
3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	4.718,84	$ 25.347	$ 119.608.437	2.381,90	$ 60.374.019	-	-	2.381,90	60.374.019,30
3,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	5.396,66	$ 41.871	$ 225.963.551	177,60	$ 7.436.290	-	-	177,60	7.436.289,60
3,3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	989,88	$ 20.814	$ 20.603.362	-	$ -	-	-	-	-
4,00	CIMENTACIÓN				$ 366.175.350		$ 67.810.309		$ -		$ 67.810.309
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	46,78	$ 422.183	$ 19.749.721	-	$ -	-	-	-	-
4,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	85,21	$ 950.984	$ 81.033.347	-	$ -	-	-	-	-
4,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	189,95	$ 660.403	$ 125.443.550	-	$ -	-	-	-	-

12004

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONALES DEL CONTRATO				ACTAS ANTERIORES		PRESENTE CORTE		EJECUTADO ACUMULADO	
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
4,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124,96	$ 707.793	$ 88.445.813	-	$ -	-	-	-	-
4,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	108,08	$ 427.092	$ 46.160.103	-	$ -	-	-	-	-
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	51209,86	$ 5.605	$ 287.031.265	9.750,66	$ 54.652.449	-	-	9.750,66	54.652.449,30
4,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	632,48	$ 540.945	$ 342.136.894	-	$ -	-	-	-	-
17,00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS				$ 990.000.693		$ 54.652.449		$ -		$ 54.652.449
17,1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	310,00	$ 118.994	$ 36.888.140	-	$ -	-	-	-	-
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4-0 - JUEGO X 3 UNIDADES - TFT151EXT	UN	2,00	$ 322.046	$ 644.092	-	$ -	-	-	-	-
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE 225 KVA, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UN	1,00	$ 62.875.029	$ 62.875.029	-	$ -	-	-	-	-
17,4	PLATINA DE COBRE 1000A PARA EXTENSIÓN DE BARRAJES DE TRANSFORMADOR DE 300KVA	UN	1,00	$ 908.897	$ 908.897	-	$ -	-	-	-	-
17,5	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT'S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1,00	$ 7.476.254	$ 7.476.254	-	$ -	-	-	-	-
17,6	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1,00	$ 11.020.061	$ 11.020.061	-	$ -	-	-	-	-
17,7	GENERADOR DIÉSEL DE 225KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1,00	$ 120.869.536	$ 120.869.536	-	$ -	-	-	-	-
17,8	TABLERO DE DISTRIBUCION ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 125A; BARRAJE PRINCIPAL DE 300A, PROTECCION PARA 2 CIRCUITOS TRIFASICOS DE 63A, EN COFRE METALICO DE 80X40X35 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1,00	$ 8.226.358	$ 8.226.358	-	$ -	-	-	-	-
17,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO DE SALIDA LED, COLOR VERDE, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 110V-130V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, CUADRADA 18X290X4.5. AUTONOMIA 90MINUTOS. DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	44,00	$ 83.112	$ 3.656.928	-	$ -	-	-	-	-
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA <3,2W, TEMPERATURA DEL COLOR 6000 6500K, VIDA ÚTIL 35000 HORAS, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V-277V, FACTOR DE POTENCIA >0,9. AUTONOMÍA 90 MINUTOS. IP20. RECTANGULAR 30X13X6 CM. DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	44,00	$ 77.087	$ 3.391.828	-	$ -	-	-	-	-
17,11	Suministro e instalación de acometida 2x(3x250+250+2T)	ML	36,00	$ 792.513	$ 28.530.468	-	$ -	-	-	-	-
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0+2/0+6T	ML	2,00	$ 162.003	$ 324.006	-	$ -	-	-	-	-
17,13	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	125,00	$ 40.405	$ 5.050.625	-	$ -	-	-	-	-
17,14	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	420,00	$ 90.096	$ 37.840.320	-	$ -	-	-	-	-
17,15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 692.348	$ 1.384.696	-	$ -	-	-	-	-
17,16	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	12,00	$ 397.908	$ 4.774.896	-	$ -	-	-	-	-

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES DEL CONTRATO CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACTAS ANTERIORES CANTIDAD	ACTAS ANTERIORES VR. TOTAL	PRESENTE CORTE CANTIDAD	PRESENTE CORTE VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO CANTIDAD	EJECUTADO ACUMULADO VR. TOTAL
17,17	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN CON VARILLA ROSCADA Y RIEL OMEGA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS. LA SALIDA INCLUYE LA INCIDENCIA DE LOS ML DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO RAMAL	UN	80,00	$ 262.907	$ 21.032.560	-	$ -	-	-	-	-
17,18	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1"	ML	240,00	$ 22.522	$ 5.405.280	-	$ -	-	-	-	-
17,19	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	256,00	$ 83.081	$ 21.268.736	-	$ -	-	-	-	-
17,20	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	56,00	$ 76.551	$ 4.286.856	-	$ -	-	-	-	-
17,21	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 124.459	$ 497.836	-	$ -	-	-	-	-
17,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL METÁLICO DE 10M , GALVANIZADO CON DOS BRAZOS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO), TOT TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4". FLANGE D E 40 X 40 EN 1/2".	UN	2,00	$ 2.181.610	$ 4.363.220	-	$ -	-	-	-	-
17,23	CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA POSTES METÁLICOS SEGÚN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MÁSTIL METÁLICO	UN	2,00	$ 145.835	$ 291.670	-	$ -	-	-	-	-
17,24	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	9,00	$ 48.851	$ 439.659	-	$ -	-	-	-	-
17,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X8+8T AWG - THHN	ML	127,00	$ 25.957	$ 3.296.539	-	$ -	-	-	-	-
17,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO ≥110,9W - IP65 - IK08 - 4.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	4,00	$ 1.330.360	$ 5.321.440	-	$ -	-	-	-	-
17,27	Suministro e instalación LUMINARIA Panel LED <20W, angulo de apertura 120°, 1799 lumenes, eficiencia 72 lm/W, temperatura del color 3000-6000K, vida util 35000 horas, tension de operación 100V-240V, factor de potencia >0,9, IP20. Redonda diametro 30 cm. Debe terner certificado RETILAP	UN	48,00	$ 117.227	$ 5.626.896	-	$ -	-	-	-	-
17,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA <40W, 3400 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP65. RECTANGULAR 120X11X7 CM, DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	16,00	$ 254.724	$ 4.075.584	-	$ -	-	-	-	-
17,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL <24W, 2880-4000 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP20. CUADRADA 60X60 CM, DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	24,00	$ 102.195	$ 2.452.680	-	$ -	-	-	-	-
17,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 7W	UN	16,00	$ 100.682	$ 1.610.912	-	$ -	-	-	-	-
17,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 6W	UN	56,00	$ 89.201	$ 4.995.256	-	$ -	-	-	-	-
17,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HIGHBAY ≤200W	UN	80,00	$ 703.784	$ 56.302.720	-	$ -	-	-	-	-
17,33	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE	UN	4,00	$ 476.404	$ 1.905.616	-	$ -	-	-	-	-
17,34	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	2,00	$ 6.129.863	$ 12.259.726	-	$ -	-	-	-	-

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				ACTAS ANTERIORES		PRESENTE CORTE		EJECUTADO ACUMULADO	
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
17,35	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,4X0,4M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8")	ML	15,00	$ 292.104	$ 4.381.560	-	$ -	-	-	-	-
17,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRON ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	476,00	$ 48.084	$ 22.887.984	-	$ -	-	-	-	-
17,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0.60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4,00	$ 288.078	$ 1.152.312	-	$ -	-	-	-	-
17,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 3/4"	ML	12,00	$ 30.785	$ 369.420	-	$ -	-	-	-	-
17,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	607,00	$ 39.249	$ 23.824.143	-	$ -	-	-	-	-
	SUB TOTAL A. ESCENARIOS DEPORTIVOS				$ 541.910.739		$ -		$ -		$ -
	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META				$ 2.422.228.607		$ 614.437.498		$ -		$ 614.437.498
1.0	DEMOLICIONES										
1,1	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	ML	628,26	$ 10.224	$ 6.423.330	628,26	$ 6.423.330	-	-	628,26	6.423.330,24
1,2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	335,36	$ 245.571	$ 82.354.691	335,36	$ 82.354.691	-	-	335,36	82.354.690,56
1,3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	187,28	$ 191.828	$ 35.925.548	133,00	$ 25.513.124	-	-	133,00	25.513.124,00
1,4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	370,50	$ 252.587	$ 93.583.484	83,90	$ 21.192.049	8,80	2.222.765,60	92,70	23.414.814,90
2,00	PRELIMINARES				$ 218.287.053		$ 135.483.194		$ 2.222.766		$ 137.705.960
2,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1.563,67	$ 25.347	$ 39.634.343	221,72	$ 5.619.937	-	-	221,72	5.619.936,84
2,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	10.442,12	$ 41.871	$ 437.222.007	-	$ -	3.533,00	147.930.243,00	3.533,00	147.930.243,00
3.00	CONCRETOS				$ 476.856.350		$ 5.619.937		$ 147.930.243		$ 153.550.180
3,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	49,87	$ 422.183	$ 21.054.266	-	$ -	-	-	-	-
3,2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO YCONSTRUCCIÓN	M3	234,60	$ 806.057	$ 189.100.972	-	$ -	-	-	-	-
3,3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	20875,47	$ 5.605	$ 117.007.009	-	$ -	-	-	-	-
3,4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	859,76	$ 86.305	$ 74.201.587	-	$ -	-	-	-	-
3,5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18,82	$ 638.348	$ 12.013.709	-	$ -	-	-	-	-
3,6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	532,01	$ 6.554	$ 3.486.794	-	$ -	-	-	-	-
4.00	CIMENTACIÓN				$ 416.864.337		$ -		$ -		$ -
4,1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	681,64	$ 84.833	$ 57.825.566	-	$ -	-	-	-	-
4,2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	408,98	$ 83.109	$ 33.989.919	-	$ -	-	-	-	-
4,3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	102,25	$ 967.538	$ 98.930.761	-	$ -	-	-	-	-
4,4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	170,41	$ 592.541	$ 100.974.912	-	$ -	-	-	-	-
5.00	PISTA DE VELOCIDAD				$ 291.721.158		$ -		$ -		$ -

12.007

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO / ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACTAS ANTERIORES CANTIDAD	ACTAS ANTERIORES VR. TOTAL	PRESENTE CORTE CANTIDAD	PRESENTE CORTE VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO CANTIDAD	EJECUTADO ACUMULADO VR. TOTAL
5,1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	666,42	$ 84.833	$ 56.534.408	-	$ -	-	-	-	
5,2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2", SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	399,85	$ 83.109	$ 33.231.134	-	$ -	-	-	-	
5,3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	99,96	$ 967.538	$ 96.715.098	-	$ -	-	-	-	
5,4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	166,60	$ 592.541	$ 98.717.331	-	$ -	-	-	-	
8,00	REDES ELECTRICAS				$ 285.197.971		$ -		$ -		$ -
8,1	MASTIL METALICO TRONCO CONICO OCTOGONAL DE 16-18M FABRICADO EN SECCIONES EMBONADAS, BASE REDONDA 600MM EN 3/4 DE ESPESOR, CANASTILLA DE ANCLAJE CON 8 PERNOS DE 7/8" X 1500MM, CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA ALOJAR DE 1 A 8 REFLECTORES, PELDAÑOS DE ASCENSO Y LINEA DE VIDA A PARTIR DE LOS 4M,GALVANIZADO EN CALIENTE	UN	7,00	$ 12.859.460	$ 90.016.220	-	$ -	-	-	-	
8,2	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7,00	$ 315.071	$ 2.205.497	-	$ -	-	-	-	
8,3	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGUN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1,00	$ 7.476.315	$ 7.476.315	-	$ -	-	-	-	
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	37,00	$ 172.216	$ 6.371.992	-	$ -	-	-	-	
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2+2+8T AWG THHN	ML	433,00	$ 73.065	$ 31.637.145	-	$ -	-	-	-	
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4+4+8T AWG THHN	ML	307,00	$ 62.694	$ 19.247.058	-	$ -	-	-	-	
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+8T AWG THHN	ML	96,00	$ 49.697	$ 4.770.912	-	$ -	-	-	-	
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8+8+8T AWG THHN	ML	165,00	$ 52.038	$ 8.586.270	-	$ -	-	-	-	
8,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 2"	ML	140,00	$ 76.103	$ 10.654.420	-	$ -	-	-	-	
8,10	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1,00	$ 11.020.061	$ 11.020.061	-	$ -	-	-	-	
8,11	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	7,00	$ 2.264.150	$ 15.849.050	-	$ -	-	-	-	
8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 800W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	76,00	$ 3.740.116	$ 284.248.816	-	$ -	-	-	-	
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 600W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	16,00	$ 2.718.044	$ 43.488.704	-	$ -	-	-	-	
8,14	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA ILUMINACION PATINAJE QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 300A; BARRAJE PRINCIPAL DE 400A, 7 ARRANCADORES DIRECTOR CON PROTECCION DE 50A Y CONTACTOR TRIPOLAR DE 50A EN AC3; ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION, EN COFRE METALICO DE 100X60X40 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1,00	$ 15.457.152	$ 15.457.152	-	$ -	-	-	-	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONALES DEL CONTRATO CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACTAS ANTERIORES CANTIDAD	ACTAS ANTERIORES VR. TOTAL	PRESENTE CORTE CANTIDAD	PRESENTE CORTE VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO CANTIDAD	EJECUTADO ACUMULADO VR. TOTAL
8,15	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	251,54	$ 25.347	$ 6.375.784	-	$ -	-	-	-	-
8,16	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	157,04	$ 126.469	$ 19.860.692	-	$ -	-	-	-	-
8,17	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2,02	$ 422.183	$ 852.810	-	$ -	-	-	-	-
8,18	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,91	$ 906.653	$ 5.358.319	-	$ -	-	-	-	-
8,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	275,63	$ 35.155	$ 9.689.773	-	$ -	-	-	-	-
8,20	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	2.770,04	$ 5.605	$ 15.526.074	-	$ -	-	-	-	-
8,21	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20,16	$ 616.491	$ 12.428.459	-	$ -	-	-	-	-
8,22	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	10,00	$ 397.908	$ 3.979.080	-	$ -	-	-	-	-
8,23	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	4,00	$ 758.575	$ 3.034.300	-	$ -	-	-	-	-
8,24	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	2,00	$ 1.269.029	$ 2.538.058	-	$ -	-	-	-	-
8,25	CANALIZACIÓN 18 DUCTOS DE 2" PVC	ML	5,00	$ 267.141	$ 1.335.705	-	$ -	-	-	-	-
8,26	CANALIZACIÓN 12 DUCTOS DE 2" PVC	ML	33,42	$ 227.548	$ 7.604.654	-	$ -	-	-	-	-
8,27	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 2" PVC	ML	135,11	$ 118.058	$ 15.950.816	-	$ -	-	-	-	-
8,28	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 2" PVC	ML	70,44	$ 104.861	$ 7.386.409	-	$ -	-	-	-	-
8,29	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 2" PVC	ML	77,30	$ 98.262	$ 7.595.653	-	$ -	-	-	-	-
8,30	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	85,78	$ 40.405	$ 3.465.941	-	$ -	-	-	-	-
8,31	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	54,59	$ 22.595	$ 1.233.461	-	$ -	-	-	-	-
8,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	154,00	$ 48.084	$ 7.404.936	-	$ -	-	-	-	-
8,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	7,00	$ 288.078	$ 2.016.546	-	$ -	-	-	-	-
8,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	39,00	$ 39.249	$ 1.530.711	-	$ -	-	-	-	-
	SUB TOTAL 8. PISTA DE PATINAJE				$ 686.197.793		$ -		$ -		$ -
					$ 2.375.124.662		$ 141:103.131		$ 150.153.009		$ 291.256.140
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VEREDA CHIMBE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META										
1.0	PRELIMINARES										
1,2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	33,43	$ 245.571,00	$ 8.209.439	26,90	$ 6.605.860	-	-	26,90	6.605.859,90
2,00	EXCAVACION Y RELLENOS				$ 8.209.439		$ 6.605.860		$ -		$ 6.605.860
2,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	42,05	$ 25.347,00	$ 1.065.841	-	$ -	42,05	1.065.841,35	42,05	1.065.841,35
2,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	238,98	$ 45.215,00	$ 10.805.481	-	$ -	15,12	683.650,80	15,12	683.650,80
2,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	44,16	$ 163.208,00	$ 7.207.265	17,00	$ 2.774.536	27,00	4.406.616,00	44,00	7.181.152,00
4,00	FILTROS				$ 19.078.587		$ 2.774.536		$ 6.156.108		$ 8.930.644
4,1	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8866,15	$ 9.665,00	$ 85.691.340	-	$ -	-	-	-	-
4,2	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1956,86	$ 94.606,00	$ 185.130.697	-	$ -	-	-	-	-
5,00	SUPERFICIE				$ 270.822.037		$ -		$ -		$ -
5,1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	8866,15	$ 2.893,00	$ 25.649.772	-	$ -	-	-	-	-
5,2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	545,95	$ 592.541,00	$ 323.497.759	-	$ -	-	-	-	-
7,00	PLACA EN CONCRETO				$ 349.147.531		$ -		$ -		$ -

12.009

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACTAS ANTERIORES CANTIDAD	ACTAS ANTERIORES VR. TOTAL	PRESENTE CORTE CANTIDAD	PRESENTE CORTE VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO CANTIDAD	EJECUTADO ACUMULADO VR. TOTAL
7,1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	95,25	$ 638.348,00	$ 60.802.647	-	$ -	-	-	-	-
7,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3892,26	$ 6.554,00	$ 25.509.872	-	$ -	-	-	-	-
	SUB TOTAL C. PISTA DE ATLETISMO				$ 86.312.519		$ -		$ -		$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 733.570.113		$ 9.380.396		$ 6.156.108		$ 15.536.504
	ADMINISTRACION			9,00%	5.530.923.382,09		764.921.025		156.309.117		921.230.141,83
	IMPREVISTOS			1,0%	497.783.104,38		68.842.892		14.067.821		82.910.713
	UTILIDAD			5,0%	55.309.233,82		7.649.210		1.563.091		9.212.301
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,0%	276.546.169,10		38.246.051		7.815.456		46.061.507
	VALOR TOTAL				52.543.772,13		7.266.750		1.484.937		8.751.686
					6.413.105.361,43		886.925.929		181.240.421		1.068.166.349

VALOR PRESENTE ACTA:	181.240.421
(-) Amortizacion del Anticipo :	90.620.210
VALOR NETO A PAGAR:	90.620.210

CONTROL DE ANTICIPO	
Valor Anticipo:	3.206.552.831
(-) Amortizacion actas anteriores:	443.462.964
(-) Amortizacion presente acta:	90.620.210
Valor pendiente por amortizar:	2.672.469.658

El pago de las cantidades relacionadas en la presente acta no exoneran al contratista por la calidad de los trabajos realizados.

Se firma por los que en ella intervinieron, a los 31 dias del mes de octubre de 2023

HON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante legal
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Vo.Bo. ING. YEISON E. GOMEZ GUERRERO
Director de Obra
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

JUAN CARLOS LOZANO
Representante legal
TERRACANTO SAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

12010

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14927339235

(415)7707212489984(8020) 000001492733923 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 0 9 3 5 3 5 | 6. DV 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico 2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: RGANIZACIÓN TERRACANTO SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: LOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Meta 5 0

40. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 14 SUR 48 B 61

42. Correo electrónico: terracantosas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 5 3 3 0 8 2 5 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 7 0 6 3 0	4 3 1 1	2 0 1 7 0 6 3 0	4 3 1 2	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 1 6 4 8 5 2 5 5

- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- Retención en la fuente a título de rent
- 14- Informante de exogena
- 16- Obligación facturar por ingresos bienes
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023 - 07 - 18 / 11 : 33: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: LOZANO LEON JUAN CARLOS

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

12-011

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14927339235

(415)7707212489984(8020) 000001492733923 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 9 3 5 3 5	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 7 0 6 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 6 3 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 8 3 5 5 7 7	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 0 6 3 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

12012

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14927339235

(415)7707212489984(8020) 000001492733923 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 9 3 5 3 5	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 0 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 3 4 9 7 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOZANO	LEON	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

12.013

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14927339235

(415)7707212489984(8020) 000001492733923 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 9 3 5 3 5	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 1 7 2 3 8		1 8 5 7 1 1

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GARZON	AMAYA	LADY	ANGELICA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 2 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ORGANIZACION TERRACANTO S.A.S

Fecha expedición: 2023/11/02 - 16:18:40 **** Recibo No. S001769496 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20231102-0207

CODIGO DE VERIFICACIÓN MTUeXRBrJn

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: ORGANIZACION TERRACANTO S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 901093535-5
ADMINISTRACIÓN DIAN : VILLAVICENCIO
DOMICILIO : VILLAVICENCIO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 342566
FECHA DE MATRÍCULA : NOVIEMBRE 26 DE 2018
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 29 DE 2023
ACTIVO TOTAL : 6,956,229,889.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 14 SUR NRO. 48B - 61
BARRIO : SERRAMONTE
MUNICIPIO / DOMICILIO: 50001 - VILLAVICENCIO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3153308256
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : terracantosas@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 14 SUR NRO. 48B - 61
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
BARRIO : SERRAMONTE
TELÉFONO 1 : 3153308256
CORREO ELECTRÓNICO : terracantosas@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : terracantosas@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4311 - DEMOLICIÓN
OTRAS ACTIVIDADES : F4312 - PREPARACION DEL TERRENO
OTRAS ACTIVIDADES : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JUNIO DE 2017 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 71259 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ORGANIZACION TERRACANTO S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ACTA NÚMERO 004 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS , REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 71259 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : POR ACTA 004 _2018, DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2018, ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CONSTA CAMBIO DE DOMICILIO DE BOGOTA A VILLAVICENCIO (INSCRIPCION REALIZADA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA).

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-004	20181012	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS BOGOTA	RM09-71259	20181126

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE CARGA

NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA GERENCIA DE PROYECTOS PROMOCIÓN, VENTAS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA EN TODAS LAS RAMAS EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. LA SOCIEDAD PODRÁ TENER ESTABLECIMIENTOS COMO FERRETERÍA EN GENERAL, COMPRA Y VENTA, FABRICACIÓN DE PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA LA INDUSTRIA DE CUALQUIER ÍNDOLE. PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PODRÁ IMPORTAR MAQUINARIA, HERRAMIENTA, REPUESTOS, VEHÍCULOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL LOGRO SOCIAL. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PODRÁ CONTRATAR CON OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO, BIENES MUEBLES Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES &MIDDOT;E INMUEBLES, RECIBIR Y DAR DINERO EN PRÉSTAMO CON O SIN INTERESES DAR EN GARANTÍA SUS BIENES CONSTITUYENDO PRENDAS O HIPOTECAS, GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, CANCELAR Y PAGAR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, PAGARES, BONOS, FACTURAS, CARTAS DE CRÉDITO O CUALQUIER OTRA CLASE DE TÍTULO VALOR, REPRESENTAR COMERCIALMENTE OTRAS FIRMAS NACIONALES E INTERNACIONALES, HACER PARTE DE OTRAS SOCIEDADES DE CUALQUIER OBJETO SOCIAL, DE CUALQUIER MANERA GENERAL EFECTUAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN DE ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES CIVILES, COMERCIALES Y FINANCIERAS NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL. ADQUIRIR ,ENAJENAR Y EXPLOTAR TODA CLASE DE BIENES CORPORALES ,COMPRAR Y VENDER GANADO, CRÍA DE GANADO PARA PRODUCCIÓN DE CARNE O COMO GANADO REPRODUCTOR, CRÍA DE EQUINOS Y EN GENERAL TODAS LAS ACTIVIDADES CONEXAS A LA GANADERÍA. TAL Y CONFORME SE HA DEJADO EXPRESAR ANTERIORMENTE. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	50.000.000,00	1.000,00	50.000,00
CAPITAL SUSCRITO	50.000.000,00	1.000,00	50.000,00
CAPITAL PAGADO	50.000.000,00	1.000,00	50.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2019 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75984 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE OCTUBRE DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	LOZANO LEON JUAN CARLOS	CC 17,349,727

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTES, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO INDEFINIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.*****FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL YA LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 29 DE ENERO DE 2021 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 83941 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE ABRIL DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	GARZON AMAYA LADY ANGELICA	CC 1,121,817,238	185711T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $18,584,048,099
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

QUE EN EL REGISTRO MERCANTIL QUE SE LLEVA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, ESTUVO MATRICULADO BAJO EL NÚMERO DE MATRÍCULA 2835577 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DENOMINADA ORGANIZACION TERRACANTO S.A.S. CONSTITUIDA POR DOCUMENTO PRIVADO BAJO DEL 30 DE JUNIO 2017, REGISTRADO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ BAJO EL NUMERO 02238825 DEL LIBRO IX

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

12.017

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ORGANIZACION TERRACANTO S.A.S
Fecha expedición: 2023/11/02 - 16:18:40 **** **Recibo No.** S001769496 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20231102-0207

CODIGO DE VERIFICACIÓN MTUeXRBrJn

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $7,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación MTUeXRBrJn

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Débora Murillo R

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

12 018.

Bancolombia

Villavicencio, 6 de julio de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ORGANIZACION TERRACANTO SAS,** identificado(a) con **NIT. 901093535** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre producto	Numero Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	844-000007-30	2020/09/03	Activa

* **Importante** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números:
Direccion oficina Primavera: Cra 15 4ª 70 Centro Comercial Primavera Urbana Local 247
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país:
01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Villavicencio - Of. 844 Primavera

Asesor de servicios Nº 151
Cédula Nº

Edwin Jair Camelo Garcia

Coordinador HE

Sucursal 844 Primavera

12019

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 03 de noviembre de 2023

CEDVO-0126-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

07-11-23
Tatiana Rojas S.
8:41 am

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No 10 ANTICIPO

Cordialmente remitimos los documentos soporte de la orden de giro No 10 con cargo al Fideicomiso Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023.

ITEM DEL ANTICIPO	VALOR	DOCUMENTOS SOPORTE
1	$ 200.790.003,00	Relación reembolso, planillas de pago de seguridad social y aportes a parafiscales, copia de consignaciones y/o transferencias bancarias, documentos soporte de pago de nómina electrónica, resumen individual de nómina electrónica, por concepto de pago de mano de obra.

N°	BPIN	NOMBRE DE PROYECTO	AFECTACION
1	2022005500094	Pista de atletismo	$ 40.338.711,60
2	2022005500022	Pista de Patinaje	$ 34.756.749,52
3	2022005500024	Escenarios deportivos multipropósitos	$ 125.694.541,88
		VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO N° 10 POR PROYECTO	**$ 200.790.003,00**

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

12.020

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 03 de noviembre de 2023

CEDVO-0125-2023

RECIBIDO 07 NOV 2023
8:41 am
Tatiana S

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No 09 ANTICIPO

Cordialmente remitimos los documentos soporte de la orden de giro No 09 con cargo al Fideicomiso Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023.

ITEM DEL ANTICIPO	VALOR	DOCUMENTOS SOPORTE
4	$ 144.985.031,40	Relación reembolso de facturas, facturas electrónicas, RUT, certificación existencia y representación legal de cada uno de los proveedores y certificado bancario del consorcio, por concepto de pago alquiler de maquinaria y equipos.

N°	BPIN	NOMBRE DE PROYECTO	AFECTACION
1	2022005500094	Pista de atletismo	$ 29.128.588,64
2	2022005500022	Pista de Patinaje	$ 25.096.314,92
3	2022005500024	Escenarios deportivos multipropósitos	$ 90.760.127,83
VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO N° 9 POR PROYECTO			$ 144.985.031,40

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

12.021

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01
		FORMATO 02 08/03/2023
		Página 1 de 1
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	

Villavicencio, 04 de noviembre de 2023

CEDVO-0127-2023

RECIBIDO 07 NOV 2023
8:41 am
Tatiana S

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REPROGRAMACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

De acuerdo con el plan de inversión del anticipo y su ejecución en los diferentes rubros, así como las necesidades reales de inversión, actualmente se requiere una mayor destinación para el rubro de materiales y subcontratos de obra.

La ejecución actual se resume en el siguiente balance,

PLAN DE INVERSIÓN				
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	EJECUTADO	SALDO
1	Mano de obra	$ 579.940.125,58		$ 579.940.125,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 12.323.727.668,66	10.287.891.375,04	$ 2.035.836.293,62
3	Transporte	$ 1.449.850.313,96	907.601.278,00	$ 542.249.035,96
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.031,40		$ 144.985.031,40
TOTAL		**$ 14.498.503.139,60**	**11.195.492.653,04**	**$ 3.303.010.486,56**

PLAN DE INVERSIÓN POR PROYECTO 2022005500094 ATLETISMO				
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	EJECUTADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 116.514.354,58	$ -	$ 116.514.354,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 2.475.930.034,75	$ 598.204.436,05	$ 1.877.725.598,70
3	Transporte	$ 291.285.886,44	$ -	$ 291.285.886,44
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 29.128.588,64		$ 29.128.588,64
TOTAL		**$ 2.912.858.864,41**	**$ 598.204.436,05**	**$ 2.314.654.428,36**

PLAN DE INVERSIÓN POR PROYECTO 2022005500022 PATINAJE				
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	EJECUTADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 100.385.259,68		$ 100.385.259,68
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 2.133.186.768,11	$ 1.975.076.073,18	$ 158.110.694,93
3	Transporte	$ 250.963.149,19	$ -	$ 250.963.149,19
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 25.096.314,92		$ 25.096.314,92
TOTAL		**$ 2.509.631.491,90**	**$ 1.975.076.073,18**	**$ 534.555.418,71**

12.022

PLAN DE INVERSIÓN POR PROYECTO 2022005500024 MULTIPROPOSITO				
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	EJECUTADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 363.040.511,33		$ 363.040.511,33
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 7.714.610.865,80	$ 7.714.610.865,80	$ -
3	Transporte	$ 907.601.278,33	$ 907.601.278,00	$ 0,33
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 90.760.127,83		$ 90.760.127,83
TOTAL		**$ 9.076.012.783,30**	**$ 8.622.212.143,81**	**$ 453.800.639,49**

5.62

Como se observa en la tabla anterior, el ítem número tres (3) TRANSPORTE, tiene un remanente que tal y como se dijo anteriormente por la ejecución del contrato no es necesario ejecutarla y se requiere para ser invertido en el ítem numero dos (2) MATERIALES Y SUBCONTRATOS DE OBRA. Con este cambio el balance en el plan de inversión del anticipo quedaría de la siguiente forma;

PLAN DE INVERSIÓN						
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	MODIFICACION	REPROGRAMACION	EJECUTADO	SALDO
1	Mano de obra	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$12.323.727.668,66	$ 542.249.035,63	$ 12.865.976.704,29	$ 10.287.891.375,04	$ 2.578.085.329,25
3	Transporte	$ 1.449.850.313,96	-$ 542.249.035,63	$ 907.601.278,33	$ 907.601.278,00	$ 0,33
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40
TOTAL		**$ 4.498.503.139,60**	**$ -**	**$ 14.498.503.139,60**	**$ 11.195.492.653,04**	**$ 3.303.010.486,56**

PLAN DE INVERSIÓN POR PROYECTO 2022005500094 ATLETISMO						
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	MODIFICACION	REPROGRAMACION	EJECUTADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 116.514.354,58	$ -	$ 116.514.354,58	$ -	$ 116.514.354,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 2.475.930.034,75	$ 291.285.886,44	$ 2.767.215.921,19	$ 598.204.436,05	$ 2.169.011.485,14
3	Transporte	$ 291.285.886,44	-$ 291.285.886,44	$ -	$ -	$ -
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 29.128.588,64	$ -	$ 29.128.588,64	$ -	$ 29.128.588,64
TOTAL		**$ 2.912.858.864,41**	**$ -**	**$ 2.912.858.864,41**	**$ 598.204.436,05**	**$ 2.314.654.428,36**

PLAN DE INVERSIÓN POR PROYECTO 2022005500022 PATINAJE						
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	MODIFICACION	REPROGRAMACION	EJECUTADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 100.385.259,68	$ -	$ 100.385.259,68	$ -	$ 100.385.259,68
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 2.133.186.768,11	$ 250.963.149,19	$ 2.384.149.917,30	$ 1.975.076.073,18	$ 409.073.844,12
3	Transporte	$ 250.963.149,19	-$ 250.963.149,19	$ -	$ -	$ -
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 25.096.314,92	$ -	$ 25.096.314,92	$ -	$ 25.096.314,92
TOTAL		**$ 2.509.631.491,90**	**$ -**	**$ 2.509.631.491,90**	**$ 1.975.076.073,18**	**$ 534.555.418,71**

12023

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

PLAN DE INVERSIÓN POR PROYECTO 2022005500024 MULTIPROPOSITO						
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	MODIFICACION	REPROGRAMACION	EJECUTADO	SALDO ACTUAL
1	Mano de obra	$ 363.040.511,33	$ -	$ 363.040.511,33	$ -	$ 363.040.511,33
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 7.714.610.865,80	$ -	$ 7.714.610.865,80	$ 7.714.610.865,80	$ -
3	Transporte	$ 907.601.278,33	$ -	$ 907.601.278,33	$ 907.601.278,00	$ 0,33
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 90.760.127,83	$ -	$ 90.760.127,83	$ -	$ 90.760.127,83
TOTAL		**$ 9.076.012.783,30**	**$ -**	**$ 9.076.012.783,30**	**$ 8.622.212.143,81**	**$ 453.800.639,49**

Por lo anterior, solicitamos la respectiva aprobación de la reprogramación en el plan de inversión del anticipo justificada según lo descrito anteriormente; dicha información se soporta en el anexo GES-FO-145 PLAN DE INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN PAGO ANTICIPO OBRA.

Quedamos atentos a respuesta.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

12.024

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 8 de noviembre del 2023

CEDVO-129-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

RECIBIDO 08 NOV 2023

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA CORRECCIONES MODIFICACIÓN No.01 PISTA DE ATLETISMO

Cordial saludo

De manera atenta me permito entregar las correcciones de la modificación del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META", el cual forma parte del contrato de la referencia.

La presenta tiene como fin hacer entrega de las observaciones realizadas por ustedes de la modificación en mayores y menores de cantidades de obra e ítems no previstos para llevar a feliz término la terminación del proyecto

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

RECIBIDO 08 NOV 2023
4:13 Pm

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo:____folios, ___ planos

12.025

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023 Página 1 de 1
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	

Villavicencio, 10 de noviembre de 2023

CEDVO-0129-2023

10-11-23
Tatiana Soto S
9:45 AM

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No 11 ANTICIPO

Cordialmente remitimos los documentos soporte de la orden de giro No 11 con cargo al Fideicomiso Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023.

ITEM DEL ANTICIPO	VALOR	DOCUMENTOS SOPORTE
1	$ 36.132.107,00	Relación reembolso, comprobantes de egreso, soportes de pago, cuentas de cobro, RUT´s y certificación bancaria del consorcio, por concepto de pago de mano de obra.

N°	BPIN	NOMBRE DE PROYECTO	AFECTACION
1	2022005500094	Pista de atletismo	$ 10.123.000,00
2	2022005500022	Pista de Patinaje	$ 6.119.640,00
3	2022005500024	Escenarios deportivos multipropósitos	$ 19.889.467,00
		VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO N° 11 POR PROYECTO	**$ 36.132.107,00**

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

12.026

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 10 de noviembre del 2023

CEDVO-130-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Recibido
10/11/2023

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No.01 Y ADICION No 1 PISTA DE PATINAJE

Cordial saludo

De manera atenta me permito entregar solicitud de modificación del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.", el cual forma parte del contrato de la referencia.

La presenta solicitud contempla modificación en mayores y menores de cantidades de obra e ítems no previstos para llevar a feliz término la terminación del proyecto. Para ello se requiere realizar modificación con adición en valor y tiempo así:

CUADRO RESUMEN

VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	**$8.805.724.533**
MODIFICACIONES (+)	$6.593.796.936
MODIFICACIONES (-)	$2.513.645.052
VALOR ADICIONAL	**$4.080.151.884**
VALOR TOTAL	**$12.885.876.417**

12027

En cuanto al tiempo de ejecución final, el proyecto tiene una duración actual de 12 meses y se requiere 4 meses más para para la terminación de las mayores cantidades e ítems no previstos en el presente informe, una vez sea aprobado por la entidad.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo:____folios, ___ planos

12.028

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION O1 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 10 de noviembre del 2023

CEDVO-130-2023

Recibido
10/11/23
Tahofazo S.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No.01 PISTA DE PATINAJE

Cordial saludo

De manera atenta me permito entregar solicitud de modificación del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.", el cual forma parte del contrato de la referencia.

La presenta solicitud contempla modificación en mayores y menores de cantidades de obra e ítems no previstos para llevar a feliz término la terminación del proyecto. Para ello se requiere realizar modificación con adición en valor y tiempo así:

CUADRO RESUMEN	
CONTRATO:	**$8.805.724.533**
MODIFICACIONES (+)	$6.603.849.916
MODIFICACIONES (-)	$2.513.645.052
VALOR ADICIONAL	**$4.090.204.864**
VALOR TOTAL	**$12.895.929.397**

En cuanto al tiempo de ejecución final, el proyecto tiene una duración actual de 12 meses y se requiere 4 meses más para para la terminación de las mayores cantidades e ítems no previstos en el presente informe, una vez sea aprobado por la entidad.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo:____folios, ___ planos

12030

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 16 de noviembre de 2023

CEDVO-0131-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: REMISION ORDEN DE GIRO No 12 ANTICIPO

Cordialmente remitimos los documentos soporte de la orden de giro No 12 con cargo al Fideicomiso Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023.

ITEM DEL ANTICIPO	VALOR	DOCUMENTOS SOPORTE
1	$ 241.751.169,00	Cuenta de cobro, copia de contrato N°9, RUT, certificado existencia y representación legal, copia de cedula del representante legal, certificación bancaria, por concepto de pago de materiales y sub contratos de obra.

N°	BPIN	NOMBRE DE PROYECTO	AFECTACION
1	2022005500094	Pista de atletismo	$ 46.808.582,17
2	2022005500022	Pista de Patinaje	$ 194.942.586,83
		VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO N° 12 POR PROYECTO	**$ 241.751.169,00**

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

RECIBIDO 15 NOV 2023
Carolina B.
5:15 p.m.

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

12031

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 21 de noviembre del 2023

CEDVO-135-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Tatiana Diaz S.
21-11-23

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO DE OBRA MES DE OCTUBRE.

Cordial saludo

La presente tiene como fin, realiza la entrega del informe de plan de inversión de anticipo de obra correspondiente a los desembolsos del mes de octubre con sus respectivas ordenes de giro.

Agradecemos la atención prestada.

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

12.632

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 21 de noviembre del 2023

CEDVO-135-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

RECIBIDO 21 NOV 2023
Tatiana Paz S
3:11 PM

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: ENTREGA DE INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO DE OBRA MES DE OCTUBRE.

Cordial saludo

La presente tiene como fin, realiza la entrega del informe de plan de inversión de anticipo de obra correspondiente a los desembolsos del mes de octubre con sus respectivas ordenes de giro.

Agradecemos la atención prestada.

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

12033

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

CONTRATO N°	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

INFORME N°	4	PERIODO INFORME:	1 de octubre de 2023	a	31 de octubre de 2023

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
NIT:	901682871-2
CORREO ELECTRONICO:	Contabilidadedeportivos@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
CORREO ELECTRONICO:	interescenariosc@gmail.com
SUPERVISOR:	BIBIANA PAN MERCHAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	FLOWER EMILIO PEÑA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	

VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Días	0
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de mayo de 2023				
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VIGENCIA ACTUAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Días	0
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VALOR DEL PROYECTO					
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL		VALOR ($) ACTUAL
1	2022005500094	10.220.557.418,00	0,00	$	10.220.557.418,00
2	2022005500022	8.805.724.533,00	0,00	$	8.805.724.533,00
3	2022005500024	31.845.658.891,00	0,00	$	31.845.658.891,00
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$	50.871.940.842,00

INFORMACIÓN DE ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO 1:	$ 14.498.503.139,60		
FECHA PAGO ANTICIPO	29 de junio de 2023	No. COMPROBANTE:	01976-01975-01974-01973-01972
FIDUCIA (SI APLICA):	ALIANZA FIDUCIARIA		
BANCO :	BANCOLOMBIA - FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS		
CUENTA DE AHORROS :	4000006842		

INFORME DE INVERSIÓN

ITEM	CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO		VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
1	ORDEN DE GIRO 7 - 442375	4 de octubre de 2023	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS	$	2.007.157.131,00	2	ANTICIPO 40% CONTRATO No 10
2	ORDEN DE GIRO 6 - 441746	2 de octubre de 2023	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS	$	132.265.723,00	2	CORTE 2 DE OBRA CONTRATO 01
TOTAL						$	2.139.422.854,00

Anexar: Respectivos Soportes y Extracto Cuenta Bancaria Registrada.

12.034

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANTICIPO INICIAL	ANTICIPO ADICIONAL	TOTAL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO ANTICIPO
1	Mano de obra	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 12.323.727.668,66	$ -	$ 12.323.727.668,66	$ 2.139.422.854,00	$ 2.035.836.293,36
3	Transporte	$ 1.449.850.313,96	$ -	$ 1.449.850.313,96	$ -	$ 542.249.035,96
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40
5	FONSET 5%	$ 763.079.113,00		$ 763.079.113,00		$ -
TOTALES		$ 15.261.582.252,60	$ -	$ 15.261.582.252,60	$ 2.139.422.854,00	$ 3.303.010.486,30

Nota: Se anexa copia de Tarjeta Profesional y vigencia de la Tarjeta Profesional de los contadores que intervienen en el presente informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, 21 de noviembre de 2023

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 278207-T

Firma
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 175215-T

12.035

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

CONTRATO N°	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

INFORME N°	4	PERIODO INFORME:	1 de octubre de 2023	a	31 de octubre de 2023

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
NIT:	901682871-2
CORREO ELECTRONICO:	Contabilidadedeportivos@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
CORREO ELECTRONICO:	interescenariosc@gmail.com
SUPERVISOR:	BIBIANA PAN MERCHAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	FLOWER EMILIO PEÑA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	

VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Días	0
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de mayo de 2023				
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VIGENCIA ACTUAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Días	0
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	2022005500094	10.220.557.418,00	0,00	$ 10.220.557.418,00
2	2022005500022	8.805.724.533,00	0,00	$ 8.805.724.533,00
3	2022005500024	31.845.658.891,00	0,00	$ 31.845.658.891,00
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$ 50.871.940.842,00

INFORMACIÓN DE ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO 1:	$ 14.498.503.139,60		
FECHA PAGO ANTICIPO	29 de junio de 2023	No. COMPROBANTE:	**01976-01975-01974-01973-01972**
FIDUCIA (SI APLICA):	**ALIANZA FIDUCIARIA**		
BANCO :	**BANCOLOMBIA - FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS**		
CUENTA DE AHORROS :	**4000006842**		

INFORME DE INVERSIÓN

ITEM	CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
1	ORDEN DE GIRO 7 - 442375	4 de octubre de 2023	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS	$ 2.007.157.131,00	2	ANTICIPO 40% CONTRATO No 10
2	ORDEN DE GIRO 6 - 441746	2 de octubre de 2023	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS	$ 132.265.723,00	2	CORTE 2 DE OBRA CONTRATO 01
TOTAL						$ 2.139.422.854,00

Anexar: Respectivos Soportes y Extracto Cuenta Bancaria Registrada.

12.036

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANTICIPO INICIAL	ANTICIPO ADICIONAL	TOTAL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO ANTICIPO
1	Mano de obra	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 12.323.727.668,66	$ -	$ 12.323.727.668,66	$ 2.139.422.854,00	$ 2.035.836.293,36
3	Transporte	$ 1.449.850.313,96	$ -	$ 1.449.850.313,96	$ -	$ 542.249.035,96
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40
5	FONSET 5%	$ 763.079.113,00		$ 763.079.113,00		$ -
TOTALES		$ 15.261.582.252,60	$ -	$ 15.261.582.252,60	$ 2.139.422.854,00	$ 3.303.010.486,30

Nota: Se anexa copia de Tarjeta Profesional y vigencia de la Tarjeta Profesional de los contadores que intervienen en el presente informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, 21 de noviembre de 2023

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 278207-T

Firma
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 175215-T

Alianza
Fiduciaria

t: (601) 644 7700 12037
Carrera 15 # 82 - 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE OCTUBRE DEL 2023

FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023 CODIGO SIFI 113392

Respetados Señores:OCTUBREOCTUBRE128OCTUBRE1015734

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 4/17/2023 rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

12038

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000006842

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTI

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	5,447,197,969.05	*SALDO PROMEDIO*	$	3,506,638,590
TOTAL ABONOS	$	2,225,226.40	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	2,139,444,596.62	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,225,226.40
SALDO ACTUAL	$	3,309,978,598.83	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			111,481.01	5,447,309,450.06
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43.31	5,447,309,406.75
2/10	TRASL ENTRE FONDOS DE VALORES	C.SERV.EMP BOGOTA		-132,265,723.00	5,315,043,683.75
2/10	VALOR IVA			-1,729.00	5,315,041,954.75
2/10	COMIS TRASLADO EN SUCURSAL			-9,099.00	5,315,032,855.75
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			217,554.52	5,315,250,410.27
4/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43.31	5,315,250,366.96
4/10	TRASL ENTRE FONDOS DE VALORES	OSE CUCUTA		-2,007,157,131.00	3,308,093,235.96
4/10	VALOR IVA			-1,729.00	3,308,091,506.96
4/10	COMIS TRASLADO EN SUCURSAL			-9,099.00	3,308,082,407.96
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,896,190.87	3,309,978,598.83
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

12.039

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 23 de noviembre del 2023

CEDVO-137-2023

Recibido
28/11/23
4:40 PM
Tatiana S.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de ajuste estructural a pedestal A-8 escenario 1

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega del ajuste estructural del pedestal A-8 en el escenario 1, el cual obedece al cruce obligado de la tubería de Aguas Lluvias existente que interfiere con la zapata y pedestal en mención.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 21 folios

12040

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA / CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 23 de noviembre del 2023

CEDVO-132-2023

Recibido
28/11/23
4:40 PM
Tatiana S.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de ajuste estructural a muros de contención de pista de ruta

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de las memorias de cálculo y plano estructural de los muros perimetrales de la pista de patinaje de ruta, de acuerdo a las diferentes alturas libres del urbanismo.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 37 folios y 1 plano

12041

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023	VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA | CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 28 de noviembre del 2023

CEDVO-140-2023

Recibido
28/11/23
4:40 PM
Tatiana S.

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Entrega de corrección planos de montaje de anclajes

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la corrección de los planos de montaje de anclajes de pernos en los escenarios multipropósito.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCÍA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.
Anexo: 2 planos

12042

NIT: 901.682.871 – 2	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023		VERSION 01 FORMATO 02 08/03/2023
	CONTRATO 106 DE 2023- IDERMETA	CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1

Villavicencio, 29 de noviembre del 2023

CEDVO-141-2023

Señores
CONSORCIO INTERESCENARIOS
Attn. Ing Hector Armando Gómez Jaimes
Representante legal
Carrera 2A# 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio-Meta

RECIBIDO 30 NOV 2023
10:34 AM
Tatiana Ozo S.

Referencia: Contrato 106 de 2023 - "CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Intervención en la zona verde de la cancha de futbol.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito informar que, según programación de obra el 04 de diciembre daremos inicio con la construcción del cárcamo perimetral en la zona interna de la pista atlética, para ello es necesario intervenir la zona verde de la cancha de futbol. Como se aprecia en las siguientes imágenes:

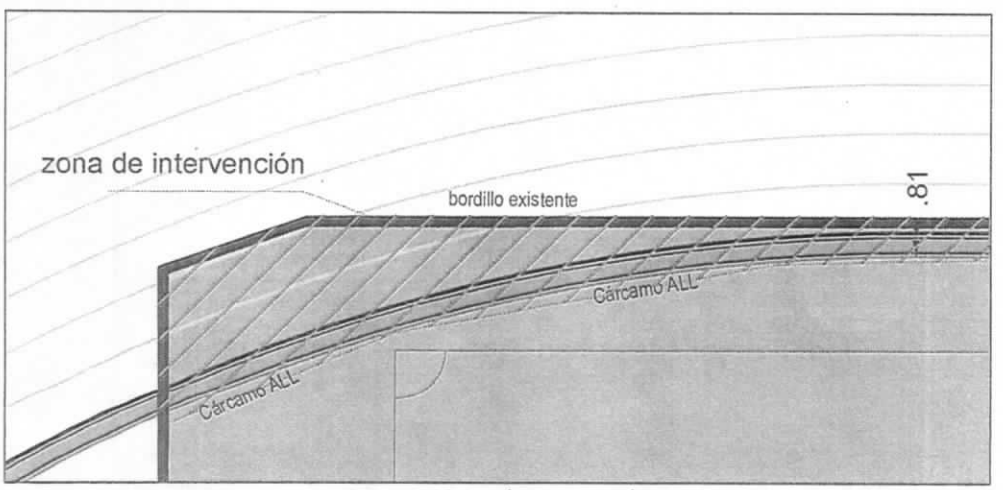


Imagen 1 Zona de intervención

12043

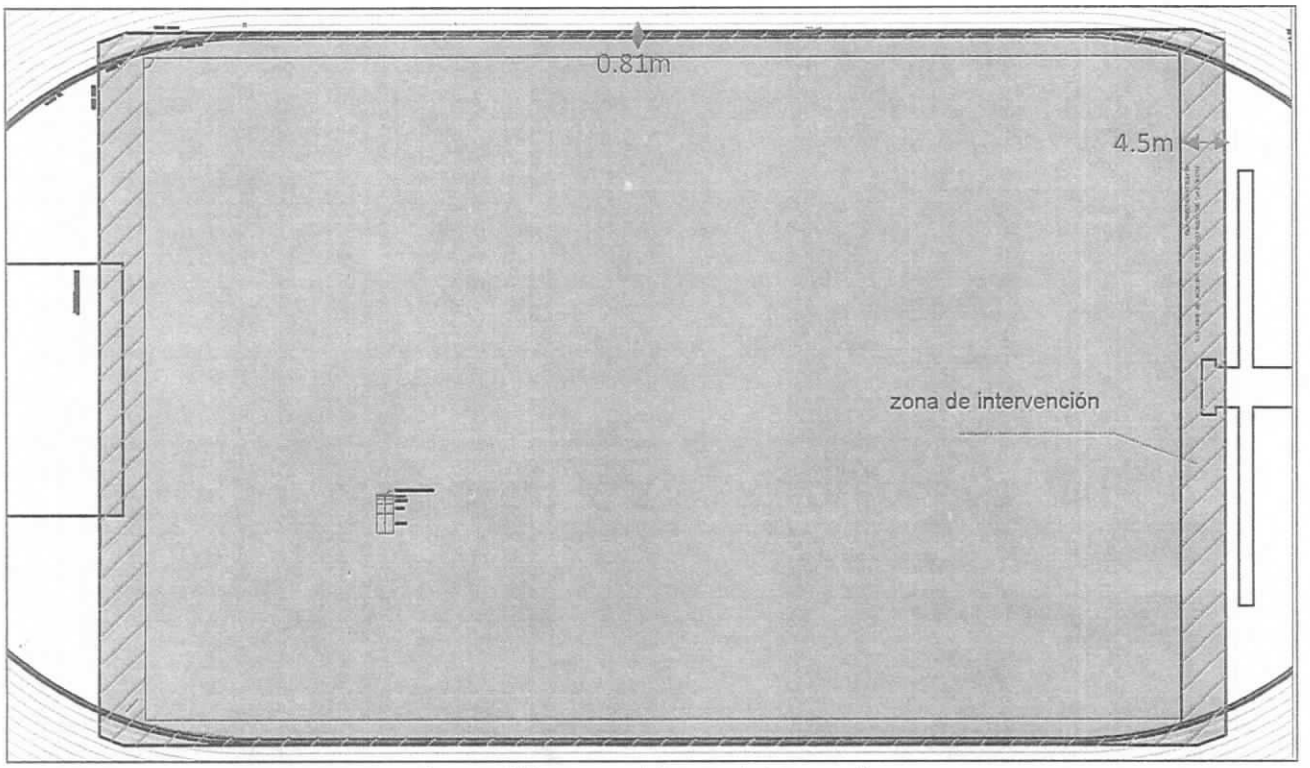


Imagen 2 Vista general de zona de intervención

La intervención que se realizará es para instalación de tuberías y cárcamo ALL.

Se solicita, dejar de usar el campo de futbol para evitar contratiempos.

Cordialmente,

JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023.

12044

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

NOTIFICACIÓN TRABAJO EN CANCHA SINTÉTICA AUXILIAR VILLA OLIMPICA VILLAVICENCIO

1 mensaje

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 2 de noviembre de 2023, 4:37 p.m.
Para: CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>, consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>
CC: Administracion Escenarios <escenarios@idermeta.gov.co>

PL-120-531
Villavicencio, 28 de junio de 2023

Al contestar, citar en el asunto:
Respuesta al oficio No PL-120-531

Señores:
CORSORCIO INTERESCENARIOS
R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Contrato De Interventoría N° 249 DE 2023
interescenariosc@gmail.com
Ciudad

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
R/L JHON HENRY ORTIZ GARCIA
Escenariosdeportivos2023@gmail.com
Carrera 16 # 24-03 Villa Olímpica
Ciudad

ASUNTO: NOTIFICACIÓN TRABAJO EN CANCHA SINTÉTICA AUXILIAR VILLA OLIMPICA VILLAVICENCIO

Respetados señores

Por medio de la presente comunicación me permito notificarles que la cancha sintética auxiliar del escenario deportivo Villa Olímpica de Villavicencio, va a ser intervenida por el contratista de obra Consorcio Villa Olímpica **del 02 de noviembre de 2023 al 10 de noviembre de 2023 en los horarios de 9:00 pm a 12:00 pm**; con el fin de verificar los mástiles para la iluminación del escenario.

Lo anterior se notifica con el fin de que no hayan actividades que se crucen durante estos días y estos horarios en la cancha, para no interrumpir el mantenimiento

Agradezco su colaboración y pronta respuesta.

Atentamente:

BIBIANA PAN MERCHÁN
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos

Elaboró: ADRIANA LESMES
Cargo: Profesional - CPS

--
Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta
Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

12.045

Gmail

CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>

URGENTE!!! SOLICITUD INFORMACIÓN - REQUERIMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

1 mensaje

Planeacion Idermeta <planeacion@idermeta.gov.co> 7 de noviembre de 2023, 11:51 a.m.
Para: CONSORCIO INTERESCENARIOS <interescenariosc@gmail.com>, consorcioescenariosdeportivos villaolimpica2023 <escenariosdeportivos2023@gmail.com>

PL-120-538
Villavicencio, 07 de noviembre de 2023

Al contestar, citar en el asunto:
Respuesta al oficio No PL-120-538 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

Señores:
CORSORCIO INTERESCENARIOS
R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Contrato De Interventoría N° 249 DE 2023
interescenariosc@gmail.com
Ciudad

Asunto: URGENTE!!! SOLICITUD INFORMACIÓN - REQUERIMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

En atención a requerimiento con número de radicado 2023EE0192446 del 03 de noviembre de 2023 por la contraloría general de la república, nos permitimos solicitar de forma perentoria siguiente información con el fin de dar trámite al requerimiento del ente de control relacionada con el proyecto CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO en atención a que el requerimiento compone los 3 proyectos del contrato de obra N° 106 de 2023, solicitamos que la información relacionada sea clara de acuerdo con cada punto del requerimiento.:

- Certificación emitida por la interventoría que de cuenta del ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.
- Cronograma de ejecución
- Avance de ejecución física
- Avance de ejecución financiera
- Datos de contacto del contratista e interventoría, que incluya correo electrónico, dirección física y números telefónicos.

Reiteramos la importancia del requerimiento, motivo por el cual es indispensable que sea remitida de forma inmediata esta información.

Cordialmente,

BIBIANA PAN MERCHÁN
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos

Adjunto (2) folios - requerimiento rad n°2023EE0192446

Elaboró: Adriana Lesmes
Cargo: Profesional - CPS

–
Martha Bibiana Pan Merchán
Jefe Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
Instituto de Deporte y Recreación del Meta
Sede Administrativa Villa Olímpica
3138081957

En virtud de la ley 527 de 1999 y la ley 962 de 2005, y las facultades conferidas por las mismas, tanto los documentos como toda información que contenga el presente email, se entenderá notificado a quien sea enviado.

Antes de imprimir este mensaje, determine si es conveniente hacerlo.

2023EE0192446.pdf
494K

12046

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE
Haciendo historia desde 1.954

NIT.: 860.077.223-7 / Cra. 74 # 25F - 10
Barrio Modelia - Bogotá, Colombia
PBX: 263 2225 - 295 0867 / Cel.: 316 834 8916
E - mail: fedepatin@gmail.com - info@fedepatin.org.co
www.fedepatin.org.co

OFICIO SOLICITUD NORMATIVA ESCENARIOS DE PATINAJE -2023

VERSION8– NOVIEMBRE 2023

Bogotá, 07 de noviembre de 2023

FPC 01 20231107000001

ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PARA HOMOLOGACIÓN ESCENARIO DE PATINAJE PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

ASESORÍA TÉCNICA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DE PATINAJE DE ALTO RENDIMIENTO

Para: **Señor**
FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO
Director General
Instituto de Deporte y Recreación del Meta - IDERMETA
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META
Carrera 16 #24 – 03 Barrio Olimpico – Popular
6701469 – 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

De: **JORGE IVÁN ROLDAN PÉREZ**
Dependencia: AREA TÉCNICA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE

Asunto: Respuesta al oficio N° DG-100-412 del 11 de octubre de 2023 - SOLICITUD REVISIÓN CAMBIO DE GEOMETRIA PISTA DE RUTA.
En referencia al CONTRATO DE OBRA N°106 DE 2023 – "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

REVISIÓN BAJO NORMATIVA 2023 PARA AVAL DE PROYECTO EN SU ETAPA DE PLANIFICACION E INICIO DE EJECUCION DE OBRA PARA POSTERIOR **HOMOLOGACIÓN** DEL ESCENARIO – TEMA PUNTUAL NUEVA GEOMETRIA

Fecha ASESORÍA			*OBSERVACIONES*
DD	*/ MM*	*/ AAAA*	
25	*10*	*2023*	*REVISIÓN SEGÚN OFICIO FECHADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (IDERMETA) EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2023 Y SE DARESPUESTA AL OFICIO SIN VISITA TECNICA Y SOBRE VALORACION EN PLANOS.*

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE
Haciendo historia desde 1.954

NIT.: 860.077.223-7 / Cra. 74 # 25F - 10
Barrio Modelia - Bogotá, Colombia
PBX: 263 2225 - 295 0867 / Cel.: 316 834 8916
E - mail: fedepatin@gmail.com - info@fedepatin.org.co
www.fedepatin.org.co

DATOS GENERALES		
NORMATIVA 2023 APLICABLE A:	01. PISTA DE CARRERAS Y ZONA CENTRAL	AN
	02. PISTA DE RUTA	X
	03. ZONA DE SERVICIOS	NA
CIUDAD	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META	
UBICACIÓN PUNTUAL	COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL CALLE LOMBANA – VILLA OLIMPICA	
ENTIDAD NORMATIVA	FEDEPATIN, WORLD SKATE AMERICA Y WORLD SKATE	
ETAPA DE PLANIFICACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA ESCENARIO NUEVO	ETAPA DE PLANIFICACIÓN - EJECUCIÓN DE ESCENARIOPARA COMPETENCIAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMACIÓN DEFINICION DE GEOMETRIA PISTA DE RUTA	

La Federación es un organismo deportivo de derecho privado, constituida como una asociación, sin ánimo de lucro, dotado de personería jurídica, que impulsa programas de interés público y social y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y tendrán a su cargo el manejo técnico y administrativo de su deporte y la representación internacional del mismo

El objeto de **La Federación Colombiana de Patinaje - FEDEPATIN** es fomentar, patrocinar y organizar lapráctica del deporte de Patinaje sobre ruedas y en hielo en sus diferentes modalidades deportivas, en las diferentes ramas y categorías, dentro del ámbito nacional, teniendo a su cargo el manejo técnico y administrativo y cumplir con las demás actividades reglamentadas en el presente estatuto y en las disposiciones legales e impulsar programas de interés público y social.

Al reglamentar la práctica del patinaje, La Federación en su campo técnico se ajustará a las normas internacionales que lo rigenpor parte de Las Federaciones Deportivas (World Skate WS, World Skate America WSA)

Dado lo anterior propender que las prácticas de estas actividades se hagan en escenarios que cumplan con la reglamentación y/o normativa vigente según su tipo, es aquí donde **FEDEPATIN** presta su asesoría técnica básica y recomienda los diferentes parámetros a tener en cuenta según sea su disciplina deportiva enfocada a la práctica del patinaje cuando esta requiere ser reglamentaria.

En la actualidad deportiva muchas ciudades y poblaciones son sedes de Campeonatos del mundo, Campeonatos Continentales y campeonatos Nacionales que tienen que ver con disciplinas deportivas de Patinaje, por lo que es importante la oportunidad de dejarle a la comunidad escenarios para prácticas de alto rendimiento y escuela que conlleve a tener nuevos deportistas y así aumente el número potencial de usuarios y aficionados a este gran deporte.

SOBRE EL DISEÑO DE ESCENARIOS DE PATINAJE

Después de evaluar en nuestro país los diferentes escenarios de patinaje, y la preocupación generada en su mayoría por el **NO** cumplimiento de la reglamentación oficial, **FEDEPATIN** a través de sus asesores técnicos externos, ha encontrado la necesidad sentida de establecer parámetros que materialicen el cumplimiento de la normalización de las pistas de carreras y ruta, y defina las necesidades que den soluciones óptimas para el servicio, confort y seguridad de los usuarios, sean estos deportistas o espectadores.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE
Haciendo historia desde 1.954

NIT.: 860.077.223-7 / Cra. 74 # 25F - 10
Barrio Modelia - Bogotá, Colombia
PBX: 263 2225 - 295 0867 / Cel.: 316 834 8916
E - mail: fedepatin@gmail.com - info@fedepatin.org.co
www.fedepatin.org.co

Una vez revisada la solicitud realizada por usted vía email con oficio adjunto fechado el 11 de octubre de 2023 y realizada la revisión planimétrica por el arquitecto Alexander Salas asesor técnico externo autorizado por FEDEPATIN, el día 25 de octubre de 2023 y dado su interés en **LA ASESORÍA TÉCNICA** en la etapa de planificación de obra que permita a futuro **HOMOLOGAR** el escenario deportivo para competencias de orden nacional y continental, le informamos lo siguiente:

La presente consulta se centra en la **GEOMETRIA** de la pista de ruta según actualización planimetrica, para lo cual nos referiremos a la normativa vigente (2023) para este tema y la cual se enuncia a continuación:

PISTA DE RUTA (THE ROAD) DE 400 METROS

Recorrido de competición que se encuentra en una instalación al aire libre o en una instalación cubierta y presenta un circuito cerrado asimétrico donde los patinadores han de cubrirlo una o más veces de acuerdo a la distancia del evento

Circuito cerrado se acogen las disposiciones dictadas en la **General Regulations Edition 2018 - 2023** donde se enuncia que este tipo de pistas no podrán tener una longitud menor a 250 pero se recomienda tener una longitud de 400 metros o mayor, hasta 600 metros y que su ancho de pista no podrá ser inferior a 6metros, pero se recomienda que este ancho sea de ocho (8) metros, además se evaluaran por parte de **FEDEPATIN.** Parámetros de cumplimiento de geometría en curvas, pasamanos de protección, acabado y recubrimiento, solo se HOMOLOGARÁN aquellas pistas que cumplan con los parámetros de geometría establecidos por WORLD SKATE, WORLD SKATE AMERICA Y FEDEPATIN y cumplan con lo establecido en las fichas de HOMOLOGACIÓN. (ART 110.1 Y 111 COMISIÓN TÉCNICA DE PATINAJE DE VELOCIDAD - REGLAMENTO 2023)

Su medición se realizará según la normativa establecida por el WORLD SKATE Y WORLD SKATE AMERICA Y FEDEPATIN en la mitad del circuito cuando sólo una parte del ancho de la ruta pueda ser usado, el radio de curva mínimo no podrá ser inferior a los 18,00m. En rectas se conserva una pendiente del 1% en curvas el 1.5% hacia el interior de curva.

Se recomienda que en uno de sus costados pueda tener una recta de unos 110 metros como mínimo y que cumpla con los parámetros de peraltes mínimos, específico para la Carrera de 100 m sprint.

- Se demarcan tres (3) carriles de dos metros sesenta (2.60) m con líneas de cinco (5) cm. Las condiciones de carrera deben ser idénticas en cada uno de los carriles, en caso de no ser así, en los recorridos de menos de ocho (8) m de ancho, pueden demarcarse sólo dos (2) carriles.
- El patinador debe patinar en su carril. El patinador que toque la línea blanca se considera fuera de su carril (falta técnica) y será descalificado DSQ-TF.

En lo posible Los rectilíneos deben representar el 60 % del total del circuito, los desniveles nunca podrán exceder del 5%. Las excepciones a esta regla nunca deberán superar el 25% de toda la carrera.

Las curvas de todos los recorridos de competencia deben tener una delimitación natural o ser delimitadas con señales móviles que sean muy visibles. Estas señales no deben ser colocadas sobre el recorrido de lacompetencia, para evitar que constituyan un peligro para los patinadores.

Durante las carreras sólo los jueces y los patinadores estarán autorizados a estar en la carrera. Sólo los delegados y el equipo médico podrán entrar en la carrera cuando hayan sido autorizados por el Juez Árbitro. (Art.78.6 - COMISIÓN TÉCNICA DE PATINAJE DE VELOCIDAD - REGLAMENTO 2023)

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE
Haciendo historia desde 1.954

NIT.: 860.077.223-7 / Cra. 74 # 25F - 10
Barrio Modelia - Bogotá, Colombia
PBX: 263 2225 - 295 0867 / Cel.: 316 834 8916
E - mail: fedepatin@gmail.com - info@fedepatin.org.co
www.fedepatin.org.co


La línea de meta debe estar marcada con una línea blanca de cinco (5) centímetros de ancho, debiendo noestar en una curva. La referencia para la llegada es el borde interior de esta línea. La foto-finish se colocaráen este borde interior de la línea de meta

La superficie de la ruta debe ser uniforme y suficientemente lisa, sin fallas ni fisuras. La curvatura transversal del recorrido no debe superar el 5% de su amplitud desde el punto interior del circuito hasta el exterior.

Se recomienda colocar pasamanos de protección en todo el perímetro exterior y en las zonas donde haya cambio de curvas o establecidas o que requieran protección especial. (Se evaluarán los puntos críticos y deser necesario se solicitara la instalación de esta protección donde sea necesario).

Se recomienda instalación de recubrimiento según especificaciones de FEDEPATIN.

PLANO DE JUSTIFICACION

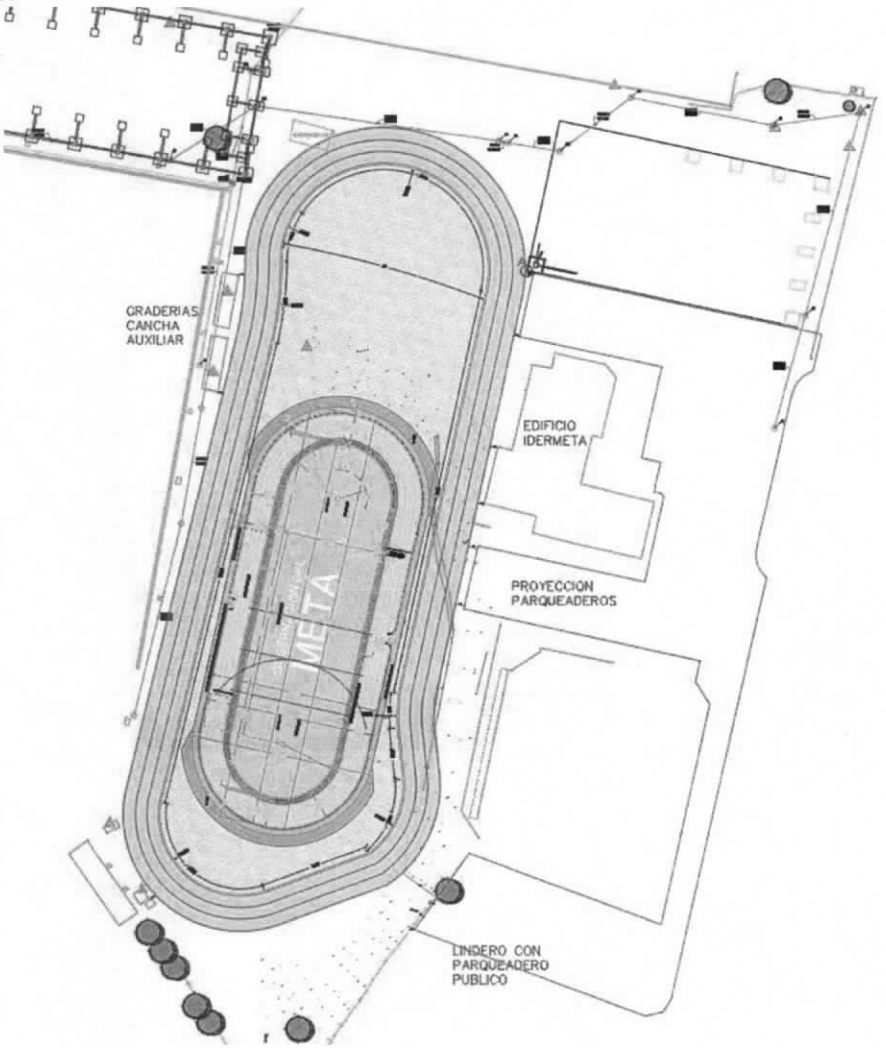

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE
Haciendo historia desde 1.954

NIT.: 860.077.223-7 / Cra. 74 # 25F - 10
Barrio Modelia - Bogotá, Colombia
PBX: 263 2225 - 295 0867 / Cel.: 316 834 8916
E - mail: fedepatin@gmail.com - info@fedepatin.org.co
www.fedepatin.org.co


GEOMETRIA DE LA PISTA RUTA

TIPO DE PISTA	ANCHO	Numero de curvas	RADIO (interior) DE CURVA mínima	Longitud de medida entre
VERSION 2023	No menor a 6 metros, se recomienda 8 metros	variable	Superior a 18,00m.	No debe ser menor a 250 metros, se recomienda entre 400 a 600 metros

INTERIOR DE PISTAS en la superficie que queda al interior de la pista de ruta para la versión 2023 se recomienda que estas sean destinadas para actividades acordes al patinaje, sin que esto incida en la homologación del escenario. (Se revisarán parámetros técnicos) Dichas actividades deberán permitir la visual al interior de toda la pista sin crear obstáculos, no se permitirán elementos construidos al interior conotras actividades deportivas ajenas al patinaje y que se conviertan en barrera visual, si esto se diera será causal para NO HOMOLOGAR el escenario.

CONCLUSIONES ANALISIS DE PISTA DE RUTA

Revisando los ajustes realizados a la geometría al proyecto inicial, lo anterior debido a intervenciones físicas realizadas en el complejo deportivo, encontramos los siguiente en el nuevo trazado presentado:

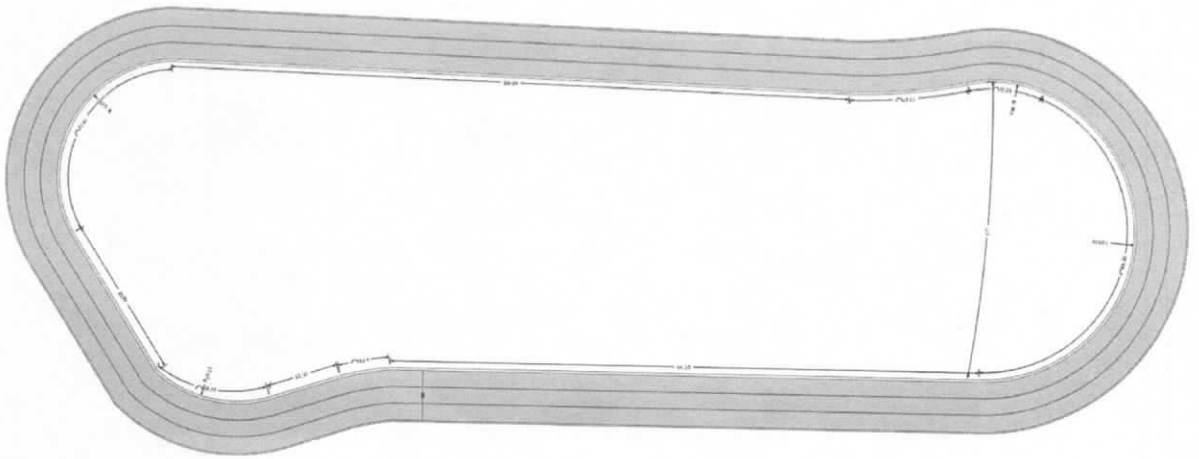

Como se aprecia en la imagen (Plano de proyecto actualizado por IDERMETA, encontramos una PISTA DE RUTA, cuyo trazado y geometría es analizado bajo normativa 2023, estableciendo que esta presenta una longitud de 406.10 metros medidos a línea de borde y de 431.24 metros a centro de pista, CUMPLIENDO ASI con normativa lo cual permite estar en rango entre 250 y 600 metros, así mismo cumple en su ancho de 8 metros.


En cuanto a curvas tenemos cinco (5), tres (3) cerradas y dos (2) contracurvas las cuales una vez analizadas cumplen con normativa al tener radios superiores a 18 metros.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE
Haciendo historia desde 1.954

NIT.: 860.077.223-7 / Cra. 74 # 25F - 10
Barrio Modelia - Bogotá, Colombia
PBX: 263 2225 - 295 0867 / Cel.: 316 834 8916
E - mail: fedepatin@gmail.com - info@fedepatin.org.co
www.fedepatin.org.co

Siendo este un escenario nuevo **LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE** informa

FEDEPATIN luego de analizadas las condicionantes planteadas por el municipio, y los cambios presentados a la geometría de pista de Ruta, se **APRUEBA** el trazado en los planos presentados, los cuales pueden ser utilizados para el trazado de la pista formal y serán la referencia geométrica para su correcta construcción.

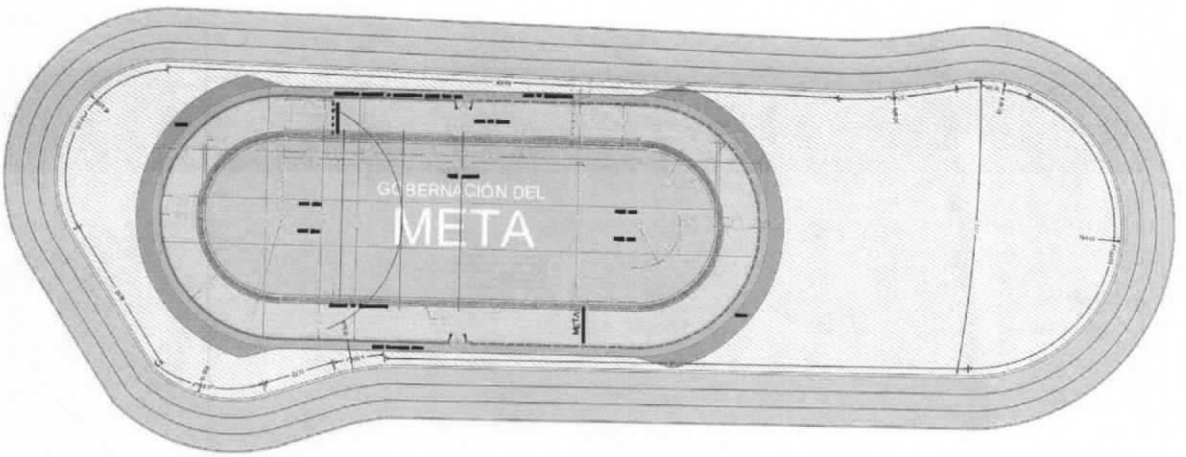

Cabe anotar que, para **HOMOLOGAR** el escenario, no solo se revisa su geometría, también deberá cumplir con aspectos técnicos como peraltes mínimos, evacuación de aguas y aspectos de seguridad (Pasamanos y recubrimientos en pista entre otros) planteados en la normativa 2023 y que no fueron revisados por no contar con la información completa.

Desde lo urbano se recomienda a futuro destinar el lote adjunto por el costado occidental para que el escenario pueda contar con una zona de servicios básicos (graderías, camerinos, w.c. públicos, zonas de ventas, etc), lo cual debido a la calidad en sus pistas de alto rendimiento y escuela, hace que en la actualidad estas no puedan ser aprovechadas al máximo para eventos masivos.

ASESORIA TECNICA PARA SEGUIMIENTO EN LA ETAPA DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO A OBRA PARA LA HOMOLOGACION

Es en este punto donde es importante la recomendación de tener el acompañamiento constante por parte de un técnico conocedor y con experiencia en este tipo de escenarios, durante la etapa de planificación y en su etapa de ejecución, aspecto que deriva a tener las pistas (carreras, central y Ruta) y zonas de servicio, avaladas para iniciar de requerirse el trámite de HOMOLOGACION ante la FEDEPATIN para Colombia, Esto facilitara detectar posibles errores a tiempo y dará agilidad en procesos constructivos que eviten reprocesos que pueden afectar la programación de obra y los tiempos de entrega.
(Los costos de asesoría técnica, visitas técnicas serán determinados a criterio de las partes y el costo de homologación será determinado por FEDEPATIN según tarifa anual)

Para FEDEPATIN es muy importante que los escenarios cumplan con las especificaciones y reglamentación para su construcción y que permitan ser homologados bajo los parámetros de calidad y
