EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	PRE-ACTA DE RECIBO DE ACTIVIDADES	Código:	IP-FM-35
		VERSION:	01
		FECHA:	7/09/2021

OBJETO DEL PROYECTO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. ETAPA III. (MODULO VII)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ		
POSTULANTE:	ESPIDIA ISABEL GARCIA SIERRA		
DIRECCIÓN:	C 13 13A 45	BARRIO:	LA CHINITA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)		
FECHA:			

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	PRESUPUESTO DE OBRA		CANTIDADES EJECUTADAS	
				CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**						
282	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UN	$ 42.131,38	1,00	$ 42.131,38	1,00	$ 42.131,38
293	PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	UN	$ 114.252,77	0,00	$ -	0,00	$ -
288	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UN	$ 77.933,74	1,00	$ 77.933,74	1,00	$ 77.933,74
318	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 2"	ML	$ 49.553,27	0,00	$ -	0,00	$ -
274	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 4"	ML	$ 63.381,53	0,00	$ -	0,00	$ -
272	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	ML	$ 24.192,52	0,00	$ -	0,00	$ -
8892	REGISTRO DE 0,50X0,50X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	$ 263.243,79	1,00	$ 263.243,79	1,00	$ 263.243,79
8893	EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	ML	$ 19.860,78	0,00	$ -	0,00	$ -
1683	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3	$ 84.134,84	0,00	$ -	0,00	$ -
2	**PISO BAÑO Y VIVIENDA**						
263	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	$ 17.190,13	37,60	$ 646.348,89	37,60	$ 646.348,89
901	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	M2	$ 34.850,32	45,08	$ 1.571.052,43	45,08	$ 1.571.052,43
8748	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM SEPARACIÓN DE 0.15 MTS	M2	$ 41.548,26	0,00	$ -	0,00	$ -
8895	PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2	$ 79.435,17	8,05	$ 639.453,12	8,05	$ 639.453,12
8897	ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2	$ 79.435,17	47,71	$ 3.789.851,96	47,71	$ 3.789.851,96
1448	ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0.10 X 0.20 METROS	ML	$ 11.353,97	46,90	$ 532.501,19	46,90	$ 532.501,19
3	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**						
129	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12 Y RETIRO DE MATERAL	M2	$ 23.156,20	0,00	$ -	0,00	$ -
419	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	$ 11.800,24	9,60	$ 113.282,30	9,60	$ 113.282,30
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	$ 27.045,64	46,27	$ 1.251.401,76	46,27	$ 1.251.401,76
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	$ 49.249,81	0,00	$ -	0,00	$ -
262	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERIA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	$ 22.412,42	3,44	$ 77.098,72	3,44	$ 77.098,72
3,1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2	$ 79.435,17	0,00	$ -	0,00	$ -
264	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	UN	$ 34.680,74	0,00	$ -	0,00	$ -
313	DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	UN	$ 21.402,87	0,00	$ -	0,00	$ -
349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UN	$ 306.491,83	0,00	$ -	0,00	$ -
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA. INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UN	$ 244.690,07	0,00	$ -	0,00	$ -
797	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	UN	$ 48.087,53	0,00	$ -	0,00	$ -
317	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	UN	$ 23.942,61	1,00	$ 23.942,61	1,00	$ 23.942,61
3,2	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	UND	$ 28.929,87	0,00	$ -	0,00	$ -
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	UND	$ 59.715,22	0,00	$ -	0,00	$ -
3,4	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	ML	$ 13.977,02	0,00	$ -	0,00	$ -
3,5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML	$ 12.466,66	0,00	$ -	0,00	$ -
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	$ 8.273,75	0,00	$ -	0,00	$ -
4	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**						
417	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	M2	$ 8.476,06	12,43	$ 105.357,43	12,43	$ 105.357,43
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	$ 13.772,73	82,82	$ 1.140.657,50	82,82	$ 1.140.657,50
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	$ 11.878,58	82,82	$ 983.784,00	82,82	$ 983.784,00
3,1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2	$ 79.435,17	12,45	$ 988.967,87	12,45	$ 988.967,87
934	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	ML	$ 30.596,92	0,00	$ -	0,00	$ -
4,1	DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	UND	$ 25.337,94	0,00	$ -	0,00	$ -
1161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONOMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UN	$ 241.651,51	0,00	$ -	0,00	$ -
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	$ 49.249,81	0,00	$ -	0,00	$ -
4,2	FILOS O CARTERA	ML	$ 19.070,39	0,00	$ -	0,00	$ -
4,3	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	ML	$ 170.586,28	0,00	$ -	0,00	$ -
3,5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML	$ 12.466,66	0,00	$ -	0,00	$ -
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	$ 8.273,75	0,00	$ -	0,00	$ -
191	VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0.15 MTS	ML	$ 76.714,94	0,00	$ -	0,00	$ -
1847	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	ML	$ 78.259,01	0,00	$ -	0,00	$ -
4647	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).	M3	$ 1.128.745,01	0,00	$ -	0,00	$ -
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	$ 7.828,48	0,00	$ -	0,00	$ -

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	PRE-ACTA DE RECIBO DE ACTIVIDADES	Código:	IP-FM-35
		VERSION:	01
		FECHA:	7/09/2021

OBJETO DEL PROYECTO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. ETAPA III. (MODULO VII)									
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA									
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ									
POSTULANTE:	ESPIDIA ISABEL GARCIA SIERRA									
DIRECCIÓN:	C 13 13A 45						**BARRIO:**		LA CHINITA	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)									
FECHA:										

5	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**									
929	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	M2	$	333.110,05	1,00	$	333.110,05	1,00	$	333.110,05
5,1	DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	UND	$	48.771,81	1,00	$	48.771,81	1,00	$	48.771,81
671	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	UN	$	283.964,37	1,00	$	283.964,37	1,00	$	283.964,37
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	UND	$	67.730,13	1,00	$	67.730,13	1,00	$	67.730,13
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	ML	$	8.909,43	4,30	$	38.310,55	4,30	$	38.310,55
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	UND	$	342.136,50	1,00	$	342.136,50	1,00	$	342.136,50
6	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**									
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 3 BREAKERS DE 20Amp	UND	$	173.159,75	1,00	$	173.159,75	1,00	$	173.159,75
6,2	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	UND	$	135.876,78	3,00	$	407.630,34	3,00	$	407.630,34
6,3	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	UND	$	174.515,40	2,00	$	349.030,80	2,00	$	349.030,80
6,4	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO	UND	$	224.394,93	5,00	$	1.121.974,65	5,00	$	1.121.974,65
6,5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND	$	470.398,02	1,00	$	470.398,02	1,00	$	470.398,02
6,6	DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	GL	$	128.997,36	1,00	$	128.997,36	1,00	$	128.997,36
6,7	CERTIFICACIÓN RETIE	UND	$	255.596,79	1,00	$	255.596,79	1,00	$	255.596,79
7	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**									
7,1	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	UND	$	43.799,42	1,00	$	43.799,42	1,00	$	43.799,42
7,2	SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GL	$	51.116,18	1,00	$	51.116,18	1,00	$	51.116,18
7,3	LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	UND	$	198.340,00	1,00	$	198.340,00	1,00	$	198.340,00
7,4	ASEO GENERAL	M2	$	5.259,98	32,76	$	172.323,42	32,76	$	172.323,42
	COSTO DIRECTO					$	16.733.399		$	16.733.399
	COSTO INDIRECTO (AIU 30%)					$	5.020.020		$	5.020.020
	VALOR TOTAL					$	21.753.418,46		$	21.753.418,46

OBSERVACIONES:

Firma:	**Firma:**
Nombre: Javier Sarabria	**Nombre:** Carlos Felipe Cruz
CONTRATISTA	**INTERVENTORÍA**

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)

CONTRATISTA: CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	LA CHINITA	**POSTULANTE**	ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA - C.C:39002383
DIRECCIÓN	C 13 13A 45		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
PATIO				1,00	UNIDAD	1,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM: 293 — PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

ITEM: 288 — PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
PATIO				1,00	UNIDAD	1,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM: 318 — SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

ITEM: 274 — SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 4"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

ITEM: 272 — SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

ITEM: 8892 — REGISTRO DE 0,50X0,50X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
GENERAL				1,00	UNIDAD	1,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM: 8893 — EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

ITEM: 1683 — RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

CAPITULO 2 - PISO BAÑO Y VIVIENDA

ITEM: 263 — DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
ALCOBA 1	2,94	2,38		1,00	M2	7,00
SALA	4,46	3,50		1,00	M2	15,61
COCINA	0,75	2,32		1,00	M2	1,74
COCINA	1,47	2,14		1,00	M2	3,15
HALL	1,40	7,22		1,00	M2	10,11
					TOTAL PRESENTE ACTA:	37,60

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)

CONTRATISTA: CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	LA CHINITA			**POSTULANTE**	ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA - C.C:39002383
DIRECCIÓN	C 13 13A 45				
ITEM:	**901**			PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
PATIO	5,75	1,30		1,00	M2	7,48
ALCOBA 1	2,94	2,38		1,00	M2	7,00
SALA	4,46	3,50		1,00	M2	15,61
COCINA	0,75	2,32		1,00	M2	1,74
COCINA	1,47	2,14		1,00	M2	3,15
HALL	1,40	7,22		1,00	M2	10,11
					TOTAL PRESENTE ACTA:	45,08
ITEM:	**8748**			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM SEPARACIÓN DE 0.15 MTS		
LOÇALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00
ITEM:	**8895**			PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
PATIO	5,75	1,4		1,00	M2	8,05
					TOTAL PRESENTE ACTA:	8,05
ITEM:	**8897**			ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
ALCOBA 2	3,44	2,94		1,00	M2	10,11
ALCOBA 1	2,94	2,38		1,00	M2	7,00
SALA	4,46	3,50		1,00	M2	15,61
COCINA	0,75	2,32		1,00	M2	1,74
COCINA	1,47	2,14		1,00	M2	3,15
HALL	1,40	7,22		1,00	M2	10,11
					TOTAL PRESENTE ACTA:	47,71
ITEM:	**1448**			ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0.10 X 0.20 METROS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
ALCOBA 2	12,3			1,00	ML	12,3
SALA	10,7			1,00	ML	10,7
COCINA	1,35			1,00	ML	1,35
ALCOBA 1	9,92			1,00	ML	9,92
HALL	12,63			1,00	ML	12,63
					TOTAL PRESENTE ACTA:	46,90

CAPITULO 3 - ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

ITEM:	**129**			DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12 Y RETIRO DE MATERAL	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00
ITEM:	**419**			DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
PATIO	4,80		2,00	1,00	M2	9,60
					TOTAL PRESENTE ACTA:	9,60
ITEM:	**435**			PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
PATIO	12,45		2,00	1,00	M2	24,90
SALA	3,50		2,50	1,00	M2	8,75
ALCOBA 2 MURO DEBAJO VENTANA	3,44		0,90	1,00	M2	3,10
DETRÁS DE ALCOBA 2	5,00		2,00	1,00	M2	10,00
VENTANA ALCOBA	0,80		0,60	-1,00	M2	-0,48
					TOTAL PRESENTE ACTA:	46,27

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)

CONTRATISTA: CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	LA CHINITA				**POSTULANTE**	ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA - C.C:39002383	
DIRECCIÓN	C 13 13A 45						
ITEM:	**133**				LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**262**				DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
ALCOBA 2	3,44		1,00	1,00	M2	3,44	
					TOTAL PRESENTE ACTA:	3,44	
ITEM:	**3,1**				ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**264**				DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**313**				DESMONTE DE LAVAMANOS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**349**				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**351**				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**797**				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**317**				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
PATIO				1,0	UND	1,0	
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00	
ITEM:	**3,2**				TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**3,3**				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)

CONTRATISTA: CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	LA CHINITA	**POSTULANTE**	ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA - C.C:39002383
DIRECCIÓN	C 13 13A 45		

ITEM: 3,4 — REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

ITEM: 3,5 — SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

ITEM: 3,6 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

CAPITULO 4 - ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES

ITEM: 417 — ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
SALA- COMEDOR (PARED FONDO)	3,5		2,50	1,00	M2	8,75
COCINA/PASILLO	1,47		2,50	1,00	M2	3,675
					TOTAL PRESENTE ACTA:	12,43

ITEM: 152 — PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
SALA	5,70		2,50	1,00	M2	14,25
SALA	0,96		0,48	1,00	M2	0,46
SALA	1,30		1,15	1,00	M2	1,50
COCINA/PASILLO	1,47		2,50	1,00	M2	3,68
HALL	7,72		2,70	1,00	M2	20,84
HALL	3,01		2,30	1,00	M2	6,92
HALL	1,79		2,60	1,00	M2	4,65
HALL	0,71		0,48	1,00	M2	0,34
HALL	0,90		0,35	1,00	M2	0,32
HALL	0,68		0,35	1,00	M2	0,24
ALCOBA 2	12,76		2,50	1,00	M2	31,90
PUERTA ALCOBA 2	0,90		2,00	-1,00	M2	-1,80
VENTANA ALCOBA 2	0,80		0,60	-1,00	M2	-0,48
					TOTAL PRESENTE ACTA:	82,82

ITEM: 432 — ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
SALA	5,70		2,50	1,00	M2	14,25
SALA	0,96		0,48	1,00	M2	0,46
SALA	1,30		1,15	1,00	M2	1,50
COCINA/PASILLO	1,47		2,50	1,00	M2	3,68
HALL	7,72		2,70	1,00	M2	20,84
HALL	3,01		2,30	1,00	M2	6,92
HALL	1,79		2,60	1,00	M2	4,65
HALL	0,71		0,48	1,00	M2	0,34
HALL	0,90		0,35	1,00	M2	0,32
HALL	0,68		0,35	1,00	M2	0,24
ALCOBA 2	12,76		2,50	1,00	M2	31,90
PUERTA ALCOBA 2	0,90		2,00	-1,00	M2	-1,80
VENTANA ALCOBA 2	0,80		0,60	-1,00	M2	-0,48
					TOTAL PRESENTE ACTA:	82,82

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)

CONTRATISTA: CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	LA CHINITA				**POSTULANTE**	ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA - C.C:39002383	
DIRECCIÓN	C 13 13A 45						
ITEM:	**3,1**			ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M			
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
PATIO	12,45		1,00	1,00		12,45	
					TOTAL PRESENTE ACTA:	12,45	
ITEM:	**934**			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL			
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**4,1**			DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE			
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**1161**			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA			
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**133**			LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS			
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**4,2**			FILOS O CARTERA			
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**4,3**			SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE			
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**3,5**			SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS			
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**3,6**			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN			
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**191**			VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS			
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	
ITEM:	**1847**			VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS			
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00	

EDUBAR

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)

CONTRATISTA: CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	LA CHINITA	**POSTULANTE**	ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA - C.C:39002383
DIRECCIÓN	C 13 13A 45		

ITEM:	**4647**	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES: LONG (M) / ANCHO (M) / ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
			TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

ITEM:	**78**	ACERO DE REFUERZO FIGURADO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES: LONG (M) / ANCHO (M) / ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
			TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

CAPITULO 5 - PUERTAS, VENTANAS Y OTROS

ITEM:	**929**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES: LONG (M) / ANCHO (M) / ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
HABITACION 2		1,00	UNIDAD	1,00
			TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM:	**5,1**	DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES: LONG (M) / ANCHO (M) / ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO		1,00	UNIDAD	1,00
			TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM:	**671**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES: LONG (M) / ANCHO (M) / ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO		1,00	UNIDAD	1,00
			TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM:	**5,2**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES: LONG (M) / ANCHO (M) / ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO		1,00	UNIDAD	1,00
			TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM:	**5,3**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES: LONG (M) / ANCHO (M) / ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	4,3	1,00	ML	4,30
			TOTAL PRESENTE ACTA:	4,30

ITEM:	**5,4**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES: LONG (M) / ANCHO (M) / ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
PATIO		1,00	UNIDAD	1,00
			TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

CAPITULO 6 - ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM:	**6,1**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 3 BREAKERS DE 20Amp CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES: LONG (M) / ANCHO (M) / ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
SALA		1,00	UNIDAD	1,00
			TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM:	**6,2**	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES: LONG (M) / ANCHO (M) / ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
SALA		3,00	UNIDAD	3,00

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)

CONTRATISTA: CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	LA CHINITA	**POSTULANTE**	ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA - C.C:39002383
DIRECCIÓN	C 13 13A 45		

TOTAL PRESENTE ACTA:	3,00

ITEM:	**6,3**			SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
COCINA				1,00	UNIDAD	1,00
BAÑO				1,00	UNIDAD	1,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	2,00

ITEM:	**6,4**			SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
SALA				1,00	UNIDAD	1,00
COCINA				1,00	UNIDAD	1,00
ALCBOBA 1				1,00	UNIDAD	1,00
ALCBOBA 2				1,00	UNIDAD	1,00
BAÑO				1,00	UNIDAD	1,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	5,00

ITEM:	**6,5**			SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
TERRAZA				1,00	UNIDAD	1,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM:	**6,6**			DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
GENERAL				1,00	UNIDAD	1,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00


CAPITULO 7 - SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDAS

ITEM:	**7,4**			ASEO GENERAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
VIVIENDA				32,76		32,76
					TOTAL PRESENTE ACTA:	32,76

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A	LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE VIVIENDA	CÓDIGO:	IP-FM-38
		VERSION:	01
		FECHA:	7/09/2021

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ		
POSTULANTE:	ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA	No. DE IDENTIFICACIÓN:	39002383
DIRECCIÓN:	C 13 13A 45	BARRIO:	LA CHINITA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)		

1. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA VIVIENDA

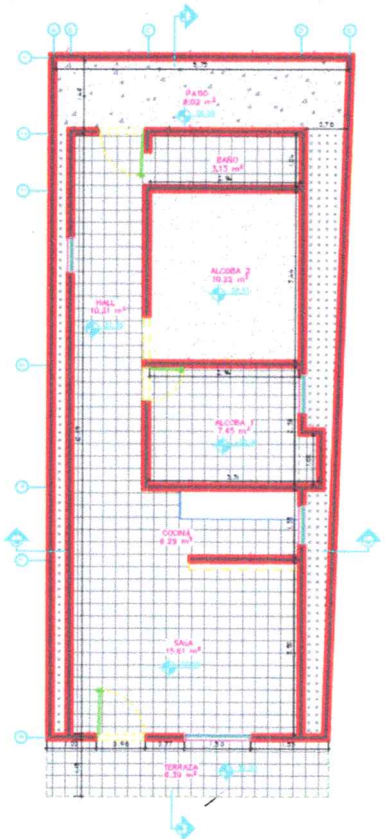

PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE PRIMER NIVEL

2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

EN LA VIVIENDA SE REALIZARAN ACT. COMO DEMOLICIÓN DE PISO, PLANTILLA Y CERAMICA SEMIBRILLANTE CON GUARDAESCOBA EN AREAS COMO SALA, COCINA Y ALCOBA 1 Y 2, Y PATIO (ANTIDESLIZANTE). ADEMÁS SE INTERVIENE EL PATIO EN SU TOTALIDAD, DONDE SE PAÑETA A UNA ALT DE 2.3, ENCHAPE A 1 METRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO Y SUS RESPECTIVOS PUNTOS MAS REJILLA DE DESAGÜE POR ULTIMO SE INTERVIENE LA SALA CON ESTUCO Y PINTURA, COMO TAMBIEN UNA DE LAS CARAS SE DEMUELE PAÑETE Y SE VUELVE A PAÑETAR POR HUMEDAD.

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE CONTRATISTA

Nombre: Javier Sanabria
Carrgo: Residente de obra
Matricula Profesional: 54202 – 339485


FIRMA DEL POSTULANTE EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN

Nombre: Espidia Isabel garcia Sierra.
No. de Identificación: 39002383


FECHA: 23-05-2024

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	LOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS A INTERVENIR			CÓDIGO:	IP-FM-37
				VERSION:	01
				FECHA:	7/09/2021
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)				
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA				
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ				
POSTULANTE:	ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA	**No. DE IDENTIFICACIÓN:**	39002383		
DIRECCIÓN:	C 13 13A 45				
BARRIO:	LA CHINITA				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)				


1. LOCALIZACION DE LA VIVIENDA A INTERVENIR

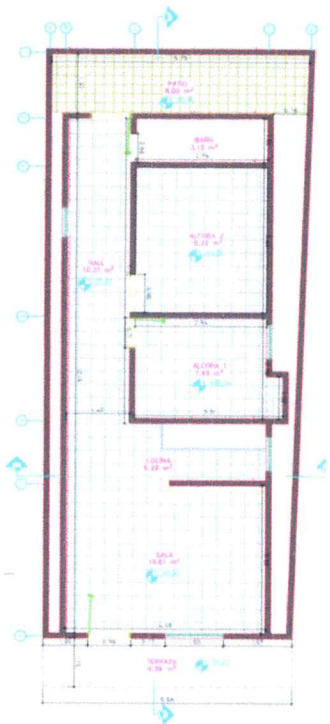

PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE PRIMER NIVEL
ESC: 1:100

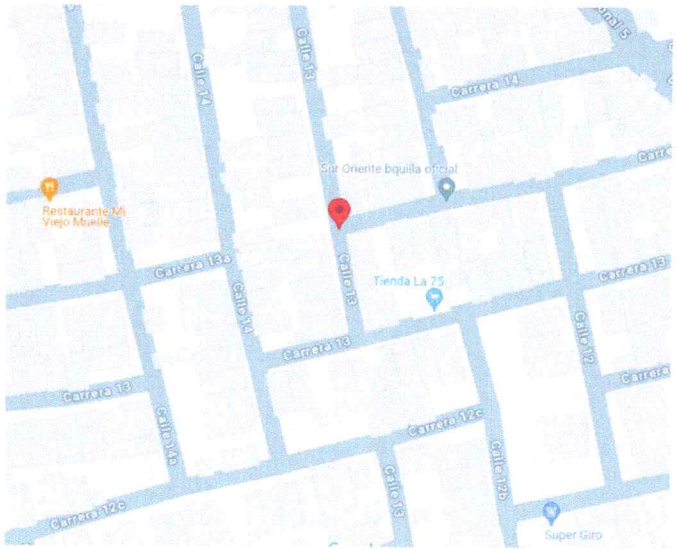


2. CORTES DE LA PROPUESTA

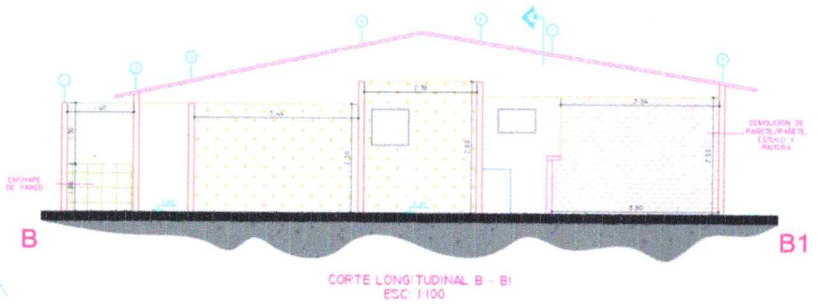

CORTE LONGITUDINAL B - B1
ESC: 1:100

PATIO - INTERVENCIÓN

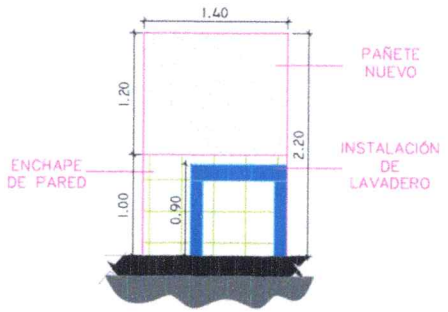

EDUBAR	RECIBO DE VIVIENDA	CÓDIGO:	IP-FM-36
		VERSION:	01
		FECHA:	7/09/2021

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ		
POSTULANTE:	ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA		
DIRECCIÓN:	C 13 13A 45	BARRIO:	LA CHINITA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)		

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA




ACTIVIDAD FINALIZADA







ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA





ACTIVIDAD FINALIZADA



RECIBE A SATISFACCIÓN

Firma:	Espidia Garcia	Firma:		Firma:	
Nombre:	ESPIDIA ISABELGARCIA SIERRA	Nombre:	Javier Santabria	Nombre:	Carlos Felipe Cuervo
	POSTULANTE		CONTRATISTA		INTERVENTORIA
C.C.	39.002.383				

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	SA-EDU-019-2024	PROYECTO	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII).
11	CONTRATO INTERVENTORIA	SA-EDU-012-2024		

Apertura	Cierre
24 05 24	11 06 24

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Espidia Garcia Sierra

Tenencia: Propietario __x Arrendatario _____ Poseedor ____ Otro Cual?_____

Nombre del Propietario ESPIDIA ISABEL GARCIA SIERRA

Dirección CL 13 13A 45 Teléfono 3126044658

Long. del frente (mts) 5,56 MT Matrícula inmobiliaria No. _____

Cédula catastral _____ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	x		area a intervenir
2. Alcantarillado	x		Sala
3. Energía	x		cocina
4. Teléfonos			alcoba 1 y 2.
5. Gas	x		Patio
6, Televisión cable			
7, Otros			Cuál?

Tipo de predio

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	x	Cuál?	

Uso actual

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

Accesos vehiculares

Garaje SI ____ NO X

Cuantos _____

El garaje se usa como comercio SI ____ NO ____

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque Cemento	N.P	asbesto Cemento	Madera	Pintura	N.P.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras				x				
Humedades	X	X				X		
Hundimientos								
Desplazamientos								
Otros					X		X	

Espidia Garcia — Espidia Garcia — 39602387

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

CONSORCIO 1B CEV BARRANQUILLA	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	**PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN**(Diligenciarlo para el cierre del acta)
SALA: ***PISO*** EN CERAMICA SEMIBRILLANTE EN ESTADO REGULAR, AL TENER ALGUNAS PIEZAS FISURADAS. ***PARED:*** ALGUNAS AREAS ESTAN AFECTADAS POR HUMEDAD Y DESPRENDIMIENTO DE PINTURA. ***CUBIERTA:*** SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR, DEBIDO A QUE HAY ALGUNA PARTE DE LALAMINA DE FIBROCEMENTO HAY FISURAS MAL RESANADAS, CAUSANDO FILTRACIONES DE AGUA.	Se realiza cierre de acta de vecindad a satisfacción, se ejecutaron actividades propuestas en la vivienda inigualmente las cuales dada la particularidad de las obras de mejoramiento fueron sujetas a algunos cambios necesarios durante la ejecucion, dejando las áreas intervenidas en condiciones de habitabilidad y salubridad con la calidad esperada en las obras, se contemplaron teniendo en cuenta el alcance general del proyecto intervención de espacios como cocina, baños, salas habitaciones, patios y/o lavaderos, intervencion de acabados de muros, redes electricas segun las recendaciones endecuadas, sin causar afectaciones a los espacios no intervenidos y dejando completamente ejecutadas las actividades presupuestadas las cuales fueron verificadas, probadas y plasmadas en el cierre y en la pre acta y su detalle en el reporte de pre acta. se cierra el acta sin novedades de mayor trascendencia y se firma acta de recibo a satisfacion.
COCINA: ***PISO*** EN CERAMICA SEMIBRILLANTE EN ESTADO REGULAR, ADEMÁS CONSTRACTA DE MANERA NEGATIVA CON LA CERAMICA DE LA SALA AL SER DOS TIPOS DE CERAMICA DIFERENTES. ***MESÓN:*** ESTRUCTURA EN CONCRETO EN BUEN ESTADO, SIN EMBARGO ESTA A UNA ALTURA NO ADECUADA DE 1,00 MT. ***PARED:*** ENCHAPE EN BUEN ESTADO H: 2,5M	
PATIO: ***PISO*** EN PLANTILLA DE CONCRETO POBRE EN MAL ESTADO POR GRIETAS Y AGUJEROS EN LA MISMA. ***PARED:*** SE ENCUENTRAN SIN PAÑETE. ***LAVADERO:*** ESTA CONSTRUIDO EN GRANITO EN UN ESTADO REGULAR. SUS INSTALACIONES NO ESTAN COCNECTADAS DE MANERA CORRECTA A LA TUBERIA EXISTENTE DE LA VIVIENDA.	
BAÑO: ESTE ESPACIO ESTA EN BUEN ESTADO, DEBIDO A SER INTERVENIDO RECIENTEMENTE. ***PISO Y PARED*** CON ENCHAPE Y APARATOS SANITARIOS TIENEN UN BUEN FUNCIONAMIENTO. NO CUENTA CON PUERTA.(UN MARCO DE MADERA EN MAL ESTADO POR DESPRENDIMIENTO)	
ALCOBA 1 Y 2: ***PISO*** ESMALTADO EN MAL ESTADO POR GRIETAS. ***PARED:*** ESTAN EN MAL ESTADO DEBIDO AL DETERIORO DE PAÑETE POR HUMEDAD, POR LO TANTO ESTUCO Y PINTURA ESTAN AFECTADOS POR DESPRENDIEMIENTO, ADEMAS DE ENCONTRARSE SUCIAS Y RAYADAS.	
Erydicia Goria	39002383
Firma responsable unidad social	Nombre / C.C o Nit

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021


4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
	*Patio: Piso en ceramica antideslizante, enchape pared alt: 1:00m Lavadero nuevo, aplicacion pañete paredes a H=2.00m puntos hidro sanitarios.
	*Baño: Punto, alumbrado, toma corriente GFCI, Puerta, no se intervienen paredes, no intervencion en piso
	*Pasillo: Piso en ceramica Semibrillante Con su respectivo zocalo, aplicacion de estuco y pintura H=2,50m, punto alumbrado.
	*Alcoba 2: Piso en Ceramica Semibrillante, con su respectivo zocalo aplicacion de estuco y pintura H=2,50m, punto de alumbrado Suministro de Ventana.
	*Alcoba 1: Piso en ceramica Semibrillante Con su respectivo zocalo, no se intervienen paredes, punto de alumbrado.
	*Cocina: Piso en Ceramica Semibrillante Con su respectivo zocalo, aplicacion de estuco y pintura, no se interviene área mesón, toma corriente GFCI y punto alumbrado.
	*Sala-Comedor: Piso en ceramica Semibrillante, Con su respectivo zocalo aplicación de estuco y pintura a H=2,50 toma corriente, punto alumbrado, tablero 4 circuitos Sistema puesta a tierra.
	*Terraza: No se realizan intervenciones en esta área.

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO

PISOS

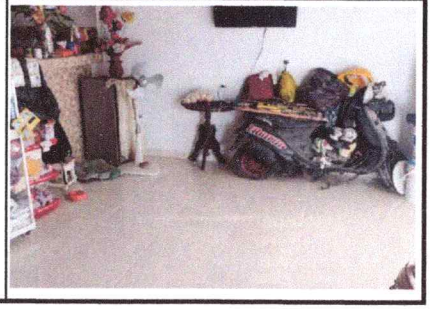Antes	Después
	

CUBIERTA

Antes	Después
	



PAREDES

Antes	Después
	

COCINA

Antes	Después
	

BANO

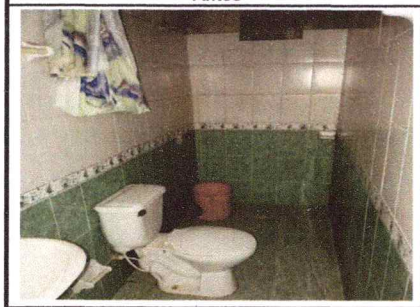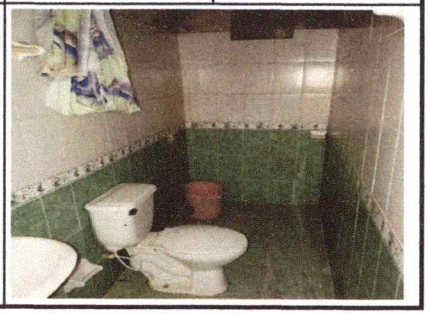Antes	Después
	

PATIO

Antes	Después
	

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Espidia Garcia

Firma responsable unidad social

Nombre Espidia Garcia

C.C o Nit 39022383.

Representante del contratista

Nombre Javier Sanabria

Representante de la interventoría

Nombre Carlos Felizola Cuevo

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo Espidia Isabel Garcia identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 39022383 obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura Cl 13 13A 45 de la ciudad de Barranquilla, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por Consorcio C&V B/quilla, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista Consorcio C&V Barranquilla; Interventoría, Consorcio Intervuiendas BQ. y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día 11 de junio de 2024

Espidia Garcia

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre Javier Sanabria

Testigo

Nombre

C.C o Nit

Representante de la Interventoría

Nombre Carlos Felizola C.

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. MODULO VII.

LUGAR La Chinita **FECHA** 23-05-2024 **HORA INICIO Y FIN** _____

TIPO DE REUNION		TEMA	
Socializacion	X	Alcance de presupuesto	
Comité de veedores			
Mesa de trabajo			
Informativa			
Reunión interventoría			
Otra	Cual?		

OBJETIVO DE LA REUNION	Informar el alcance del presupuesto aprobado

ORDEN DEL DÍA	º Visitar a los beneficiarios de la vivienda para socialización de presupuesto aprobado.
	º Aceptación y aprobación de presupuesto y especificaciones de zonas a intervenir.
	º Firma de acta de vecindad
	º Socialización de compromisos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

EL dia de hoy el equipo tecnico y social por parte del contratista C&V Barranquilla,en compañia de Edubar y la interventoría interviviendas BQ, visitan las viviendas de cada beneficiario para socializar el presupuesto aprobado y el alcance del proyecto de manera individual en cada una de las viviendas. Se indica los compromisos que deberán adquirir el propietario y familiares. Se da aprobación y aceptación del beneficiario y firma a conformidad la propuesta de intervención. Se continua con la firma de acta vecindad. Se les recuerda a ocupantes de la vivienda que los espacios a intervenir no deberan ser usados hasta tanto no entregue el contratista. Lo beneficiarios serán responsables del cuidado de los materiales de trabajo que ingresarán a la vivienda por lo que deberán asumir la responsabilidad ante cualquier eventualidad.

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

A la beneficiaria se le realiza una primera visita donde se socializa el alcance de la vivienda en presencia de funcionarios de Edubar, interventoría, contratista e hijos de beneficiarias; los cuales se muestran inconformes con la propuesta realizada, por lo que se indica que se hará una nueva visita donde se informe del ajuste.

En una segunda visita se presenta el equipo técnico social del contratista, la interventora y los funcionarios de Edubar, y la alcaldía para socializar el alcance de la vivienda, se explican actividades a ejecutar y las áreas de intervención.

la beneficiaria manifiesta estar de acuerdo con lo propuesto y acepta.

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

COMPROMISOS PACTADOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Permanencia de un adulto responsable en pleno uso de facultades mentales, con la capacidad para estar al pendiente y al cuidado de la vivienda durante la ejecución de la obra; ya que el contratista no se hace responsable de elementos personales	Erpidia Garcia	23-05-2024
Las zonas de intervención deberán estar libres de niños o personas ajenas a la obra, el contratista no asume responsabilidad ante eventualidades		
se dispondrá del material necesario y requerido para la culminación de las actividades, el contratista llevará control de elementos y cantidades ingresados en la vivienda		
Los materiales que ingresen a la vivienda estarán bajo la responsabilidad del beneficiario y familiares, quienes se comprometen con el cuidado y almacenamiento de los mismos.		
Existirá un trato respetuoso, digno y asertivo por parte de los residentes de la casa hacia los maestros, ayudantes y demás profesionales que le brinden un servicio en su vivienda		
Los materiales sobrantes son propiedad del contratista, por lo que, una vez terminada la ejecución de la obra, serán retirados de la vivienda.		
En caso de quejas, inquietudes, inconformidad o sugerencias, dirigirse únicamente a los profesionales técnicos o sociales del contratista		

FIRMAS

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
David De Vega A	Psocial	Alcaldía	
María Palomino	P. social	Consorcio C y V	María Palomino
Javier Sanabria	Residente de obra	consorcio C y V	
Maura Escorcia H.	Profesional Social	Interviviendas Bq	
Carlos Pelzola Cantero	Inspector Interventor	Interviviendas Bq.	

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC17020:2012
17-OIN-033

electricert sas
NIT. 901057816-7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Lugar y fecha de expedición	Medellín, 2024-07-02	**Dictamen No.**	011056EL-24
Nombre Organismo de Inspección:	ELECTRICERT S.A.S	Resolución de Acreditación:	17-OIN-033
Nit. Organismo de Inspección:	901057816-7		
Dirección domicilio:	Medellín, CRA 98 N ° 37B - 18 INT-201	Teléfono:	3043621312-5575085

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localización	Muicipio	LA CHINITA-BARRANQUILLA	Dirección	CALLE 13 #13A- 45					Barrio o sector	URBANO	
Tipo de Servicio	Público		Residencial	X	Comercial		Industrial			Especial-Tipo	N/A
Cap.Instalada [kVA ó kW]	0.810		Tensión[kV]	0.110	Fases	1	2	3		Año de terminación	2024

C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN

Diseñador	Ludwing Del Carmen Roiano Mercado	Mat. Prof. No	AT205-147890
Interventor (si lo hay)	N/A	Mat. Prof. No	N/A
Responsable construcción	Ludwing Del Carmen Roiano Mercado	Mat. Prof. No	AT205-147890

D. ASPECTOS EVALUADOS

ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Diseño Eléctrico	Planos, Diagramas y Esquemas*	SI	SI	
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	SI	SI	
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*	SI	SI	
4		Matriculas Profesionales de personas calificadas	SI	SI	
5	Campos	Valores de campo electromagnéticos	NO		
6	Distancias	Distancias de seguridad	SI	SI	
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP	NO		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	SI	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	SI	
10		Selección de conductores*	SI	SI	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI	SI	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	NO		
13	Protección contra rayos	Evaluación nivel de riesgo*	SI	SI	
14		Implementación de la protección	SI	SI	
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	SI	
16		Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	NO		
17		Resistencia de puesta a tierra*	NO		
18	Señalización	Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	SI	
19		Identificación de canalizaciones*	SI	SI	
20		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	SI	SI	
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	SI	SI	
22	Documentación final	Memoria del Proyecto	SI	SI	
23		Plano(s) de lo construido	SI	SI	
24		Certificaciones de productos*	SI	SI	
25	Otros	Bomba contra incendios	NO		
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	SI	SI	
27		Ejecución de las conexiones*	SI	SI	
28		Ensayos funcionales*	SI	SI	
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI	SI	
30		Protección contra arcos internos	SI	SI	
31		Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	SI	
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI	SI	
33		Resistencia de aislamiento*	SI	SI	
34		Sistemas de emergencia	NO		
35		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	SI	SI	
36		Ventilación de equipos	NO		

Nota: * Items a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

SOLICITUD DE SERVICIO N°: 002159 **NOMBRE DEL PROPIETARIO:** ESPEDIA GRACIA **C.C/Nit:** 39002383

ALCANCE: ESTA INSPECCIÓN COMPRENDIO LA REVISIÓN DE UNA CASA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN INTERNO DE LA CASA CON LAS PROTECCIONES PARA LOS CIRCUITOS RAMALES HASTA LAS SALIDAS ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA.

Medición de resistencia de puesta a tierra (Ω): 7.16
Menor valor medición de aislamiento (MΩ): 67.4
Medición de corrientes en el sistema de puesta a tierra (mA): N/A
Menor valor medición de iluminación (Lx): N/A
Medición de campo electromagnetico (μT ó kV/m): N/A
Versión del RETIE que le aplica a la instalación: Resolución 9 0708 de agosto 30 de 2013
El dictamen corresponde a una construcción, RETIE 34.3.H: CONSTRUCIÓN
Este dictamen es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones tal como se encontraron el día de la inspección: FECHAS DE INSPECCIÓN
2024-06-17
Las modificaciones realizadas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y debe ejecutarse de acuerdo al RETIE.

F. RELACIÓN DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: **Aprobada** X **No aprobada**

Nombredirector técnico de Organismo de Inspección	KARINA GUERRA SANCHEZ	Mat. Prof.	AT205-59731	Firma y sello	KARINA ISABEL GUERRA SANCHEZ Firmado digitalmente por KARINA ISABEL GUERRA SANCHEZ Fecha: 2024.07.02 15:16:20 -05'00'
Nombre y Apellidos del Inspector:	JHON JAIRO CAÑAS REALES	Mat. Prof.	NS205-132694	Firma	JOHN JAIRO CAÑAS REALES Firmado digitalmente por JOHN JAIRO CAÑAS REALES Fecha: 2024.07.02 11:02:45 -05'00'
