821

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

MUNICIPIO DE TAURAMENA
RECIBIDO
FECHA 06 AGO 2024
HORA 4:49 pm
FIRMA Daniela M

Tauramena Casanare, 06 de Agosto de 2024

SEÑORES:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Calle 5 No. 14-34, piso 2 Centro Administrativo Municipal de Tauramena

Ref: Entrega Informe de Ejecución.

Cordial saludo,

Por medio de la presente hago entrega del Informe No. 4 de Ejecución del CONVENIO SOLIDARIO No. 007 DE 2024 que tiene por objeto para "EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA", se radica;

a) INFORME DE EJECUCIÓN No.4 MES DE JULIO DE 2024.

Agradezco de antemano su atención,

Cordialmente,

HENRY PAUL ALFONSO
Representante legal ASOJUNTAS
NIT. No. 900.002.220-8

KATTIA JULIETH VIASUS C.
Ing. Residente
C.S. 007/2024

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

INFORME DE EJECUCIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 007 DE 2024,

"PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA"



CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"

R/L: HENRY PAUL ALFONSO

TAURAMENA - CASANARE

JULIO 2024

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999

NIT: 900.002.220-8

PRESENTACIÓN

El presente informe refleja las actuaciones de la Contratación directa No. CDMT-SI-018-2024 que tiene por objeto "PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA", durante el período de ejecución del contrato y la supervisión, seguimiento, control y acompañamiento del mismo.

ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y VIABILIZACIÓN.

De acuerdo a lo expuesto, el presente proceso contractual se realizó de acuerdo al cumplimiento de los estatutos de "la ASOJUNTAS" *en el capítulo cuarto numeral 18, según naturaleza de los convenios, ítem 3, "Asamblea General: desde (60) salarios mínimo legales mensuales vigentes, más de un peso ($1,00)..."* se le solicita autorización a la asamblea, para que el presidente HENRY PAUL ALFONSO celebre el convenio RED VIAL "PLAN DE VERANO" 2024 HASTA LA MENOR CUANTIA ($364.000.000) CON EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL "PLAN VERANO" 2024 MUNICIPIO DE TAURAMENA, elaborado y aprobado para tal fin, con un concepto favorable de las siguientes características:

ALCANCE.

Teniendo en cuenta que el municipio de Tauramena cuenta con diferentes vías de acceso que comunican la zona urbana y la zona rural entre sí. Actualmente, dichas vías de acceso conducen a varios sectores de gran importancia y son la garantía de movilidad para la comunidad de las veredas, cuya actividad económica principal es la ganadería y la agricultura, hoy se encuentran en mal estado, dificultando el paso normal de los usuarios, lo que conlleva a que el uso de la vía pueda comprometer la seguridad y el bienestar de estos, generando la ocurrencia de accidentes, el desgaste excesivo de los vehículos de transporte y el aumento del costo de los fletes dadas las deplorables condiciones del carreteable.

La comunidad requiere que se mejore y realice mantenimiento a la malla vial rural, teniendo en cuenta que por la condición de "vías a nivel de afirmado" y en algunos sectores a "nivel de subrasante", se deterioran aceleradamente con el uso y con el efecto de las condiciones de intemperismo. Las vías rurales que presentan gran deterioro, dificultan en gran manera el desarrollo de los proyectos agrícolas y pecuarios. Es muy difícil el acceso a las fincas, el transporte de insumos para cultivos y ganadería, y en general se está viendo perjudicada la población rural al ver frustradas sus aspiraciones de desarrollo por no contar con vías en buen estado que facilite su actividad diaria y el acceso a los servicios.

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

La Asociación, deberá ejecutar dentro del proyecto las siguientes actividades:

Mejoramiento vial: Conformación subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación).

BENEFICIARIOS. Habitantes de la zona rural de Tauramena.

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: CINCO (05) MESES

PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL A LA FECHA: 19,19%.

PLAN FINANCIERO: el proyecto corresponde a $ 331.055.656.00 (Aporte del Municipio: $300.055.656.00 y Aporte de la asociación $ 31.000.000)

CÓDIGO	PROYECTO	VALOR A EJECUTAR	Registro Presupuestal No.	ORIGEN RECURSOS
2.3.24.2402.0600.2020854100036	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS, TERCIARIAS, CAMINOS, PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES, EN EL MUNICIPO DE TAURAMENA.	$150.000.000	273 14/03/2024	1.2.1.0.00 I.C.L.D
		$150.055.656		1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MIUNICIPIOS CATEGORIAS 4,5 Y 6
VALOR TOTAL		**$300.055.656**		

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONVENIO SOLIDARIO N.º	007 DE 13 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA"
CONTRATISTA	ASOJUNTAS TAURAMENA
REPRESENTANTE LEGAL	HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	ING. LINO RODRIGUEZ OCHOA
TIEMPO DE EJECUCIÒN	CINCO (05) MESES
ACTA DE INICIO	22 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE AGOSTO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILONES CERO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 331.055.656.00)
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	TRESCIENTOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($300.055.656.00)
VALOR APORTE DE LA ASOCIACIÓN	TREINTA Y UN MILLON DE PESOS M/CTE ($ 31.000.000)
ANTICIPO	SE INFORMÓ POR PARTE DE ASOJUNTAS TAURAMENA LA RENUNCIA DEL ANTICIPO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
MODIFICATORIO No. 1	GIRO DE LOS RECURSOS- CLAUSULA 7 Y MANEJO DE LOS RECURSOS CLAUSULA 8 (06 DE MAYO DE 2024)

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONVENIO SOLIDARIO

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	%	ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
BYC 10004086 (Anexo 1)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	MUNDIAL DE SEGUROS	$ 66.211131,20	13/03/2024	23/12/2024
	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO	100%	MUNDIAL DE SEGUROS	$60.011.131,00	13/03/2024	23/12/2024
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	MUNDIAL DE SEGUROS	$ 16.552.782,80	13/03/2024	23/08/2027
BYC 100005628 (Anexo 1)	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	200S MLV	MUNDIAL DE SEGUROS	$ 260.000.000	13/03/2024	23/08/2024

ESTADIO FINANCIERO ACTUAL DEL PROYECTO

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	VALOR
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	22-03-2024	$ 330.055.656,00
APORTE DE LA ASOCIACIÓN		$31.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 331.055.656,00**

ACTIVIDADES ADELANTADAS.

- ✓ Se realizó visita de control y seguimiento con el coordinador de maquinaria para evaluar las condiciones de las vías terciarias a intervenir, en las veredas El Palmar.
- ✓ El día 09 de Julio de 2024 la Volqueta de placas OSE966, se envió para la Ciudad de Duitama Boyacá, a la sede de NAVITRANS, con el fin de realizarle el mantenimiento por garantía.
- ✓ El día 30 de Julio de 2024 se recibió visita por parte de PARTEQUIPOS, para realizar mantenimiento de garantía a la maquinaria Amarilla, (Motoniveladora y Vibrocompactador)
- ✓ Se realizó visita técnica de supervisión en compañía del Ing. Kevin Santiago López Silva, Ingeniera Residente de Obra y el coordinador de maquinaria para hacer el recorrido de los kms intervenidos y terminados.

- ✓ Se realizó la compra de repuestos, lubricantes y neumáticos para la sustitución y mantenimiento de la maquinaria amarilla (motoniveladora, vibrocompactador y la retroexcavadora); debido al desgaste que presentaban a causa del desarrollo de las actividades del presente contrato, con esto se busca prolongar la longevidad de la maquinaria y la eficacia en sus labores diarias.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Se ejecutaron los siguientes ítems contractuales dando óptimo cumplimiento al Convenio Solidario con el fin de satisfacer las necesidades de las vías terciarias.

APORTE DEL MUNICIPIO:

ITEM 1. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE MEJORADA (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación), las maquinas son del Municipio de Tauramena, No incluye costo equipo).

Se adelantaron actividades de disgregación de la superficie del terreno por medio de la motoniveladora y la retroexcavadora así mismo se llevó a cabo limpieza, formación, reconstrucción y perfilado de cunetas para cumplir la función de protección de la calzada, especialmente de la acción erosiva del agua, pues favorecen la conducción del agua de escorrentía hacia los drenajes, posterior a esto se realiza la compactación con el cilindro compactador para eliminar los espacios vacíos, aumentar su densidad, la capacidad de soporte y estabilidad de la vía, no fue necesario el riego al terreno debido a las lluvias que se habían presentado ya que esto favoreció en la humedad necesaria para su intervención.

APORTE DE ASOCIACIÓN DE ASOJUNTAS DE TAURAMENA "ASOJUNTAS":

ITEM 2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA, representada en 4 ayudantes.

Se apoyó en la ejecución de la actividad de conformación de subrasante mejorada por medio de los cuatro (4) ayudantes que aportó la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tauramena " ASOJUNTAS".

A continuación, se anexa avance de ejecución del Convenio Solidario;

De esta manera se intervinieron 24,95 kms de vías terciarias del Municipio de Tauramena, localizados en Las Veredas La Urama y El Palmar;

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8

DESDE EL 05 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

DÍAS	KM INTERVENIDO		DIA	TRAMOS INTERVENIDOS VEREDA	KILOMETRAJE TOTAL
1	1,5	km	5/07/2024	LA URAMA	17
2	1,3	km	6/07/2024		
3	3,1	km	8/07/2024		
4	1	km	9/07/2024		
5	1,5	km	10/07/2024		
6	1,4	km	11/07/2024		
7	0,9	km	12/07/2024		
8	0,49	km	13/07/2024		
9	1	km	15/07/2024		
10	0,89	km	16/07/2024		
11	0,92	km	17/07/2024		
12	1,6	km	18/07/2024		
13	1,4	km	19/07/2024		
14	0,95	km	22/07/2024	EL PALMAR	7,95
15	0,91	km	23/07/2024		
16	0,5	km	24/07/2024		
17	0,7	km	25/07/2024		
18	0,5	km	26/07/2024		
19	1	km	27/07/2024		
20	1,7	km	29/07/2024		
21	0,78	km	30/07/2024		
22	0,91	km	31/07/2024		
TOTAL	**24,95**	**km**			

Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntastauramena@gmail.com
"Por la Unidad del Desarrollo Integral y Comunitario"

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8

DESDE EL 05 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

VEREDA INTERVENIDA	TRAMO INTERVENIDO		
VEREDA LA URAMA	Tramo Bohorquez - Finca Las Palmeras Don Miguel	5	km
	Casa Amarilla - Palmera San Rafael - Maria Bermudez	3	km
	Barrio Chino - Manchai	2,5	km
	Entrada de la Escuela - Pedro Gutierrez	2,5	km
	Geovanni Amador - Finca Carimagua	4	km
VEREDA EL PALMAR	Ramal cruce corral – Mata de Loro	4	km
	Vía Alterna – Escuela El Palmar	3,95	km
Total km Intervenido		**24,95**	**km**

KATTIA JULIETH VIASUS CACERES
Ing. Residente
C.S. 007/2024

BERNABE VIVAS BAUTISTA
Coordinador de Maquinaria
C.S. 007/2024

A continuación, se realiza la localización Geográfica y registros fotográficos de un antes, durante y después de la ejecución de las actividades del Convenio correspondientes en las Vereda La Urama y El Palmar, en donde se obtuvo un total de vía terciaria intervenida de **24,95 kms.**

Fig. 1 Localización Geografica del segmento intervenido del sector Barrio Chino – Manchai 2,5 km, localizado en la Vereda La Urama.



Fuente: Google Earth

Fig. 2 Localización Geografica del segmento intervenido del sector Finca Bohórquez – Finca Las Palmeras Don Miguel 5 km, localizado en la Vereda La Urama.



Fuente: Google Earth

831

Fig. 3 Localización Geografica del segmento intervenido del sector Casa Amarilla - Palmera San Rafael – María Bermúdez 3 km, localizado en la Vereda La Urama.



Fuente: Google Earth

Fig. 4 Localización Geografica del segmento intervenido del sector Entrada de la Escuela - Pedro Gutiérrez 2,5 km, localizado en la Vereda La Urama.




Fuente: Google Earth

Fig. 5 Localización Geografica del segmento intervenido del sector Geovanni Amador - Finca Carimagua 4 km, localizado en la Vereda La Urama.



Fuente: Google Earth

Fig. 6 Localización Geografica del segmento intervenido del sector 1: 1,13 km, localizado en la Vereda El Palmar.

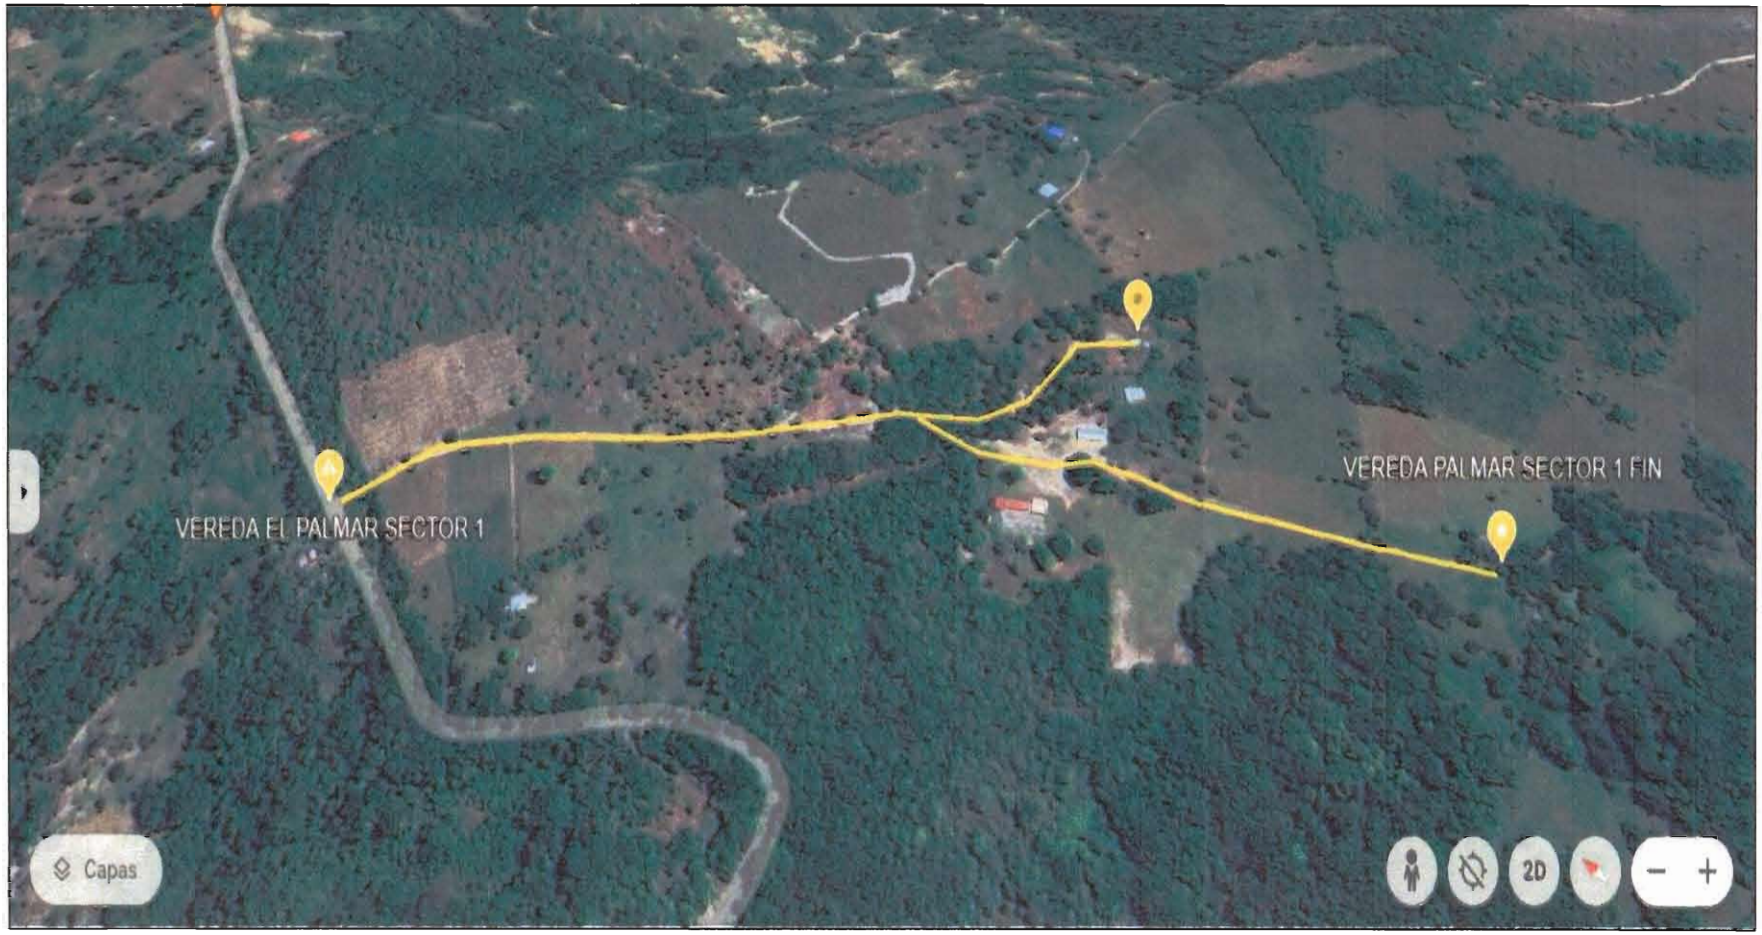

Fuente: Google Earth

85

Fig. 7 Localización Geografica del segmento intervenido del sector 2: 2.95 km, localizado en la Vereda El Palmar.



Fuente: Google Earth

Fig. 8 Localización Geografica del segmento intervenido del sector 3: 0.26 km, localizado en la Vereda El Palmar.



Fuente: Google Earth

Fig. 9 Localización Geografica del segmento intervenido del sector 4: 2.7 km, localizado en la Vereda El Palmar.



Fuente: Google Earth.

Fig. 10 Localización Geografica del segmento intervenido del sector 5: 0,9 km, localizado en la Vereda El Palmar.




Fuente: Google Earth


ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999


NIT: 900.002.220-8

INTERVENCIÓN VEREDAS LA URAMA Y EL PALMAR

ANTES

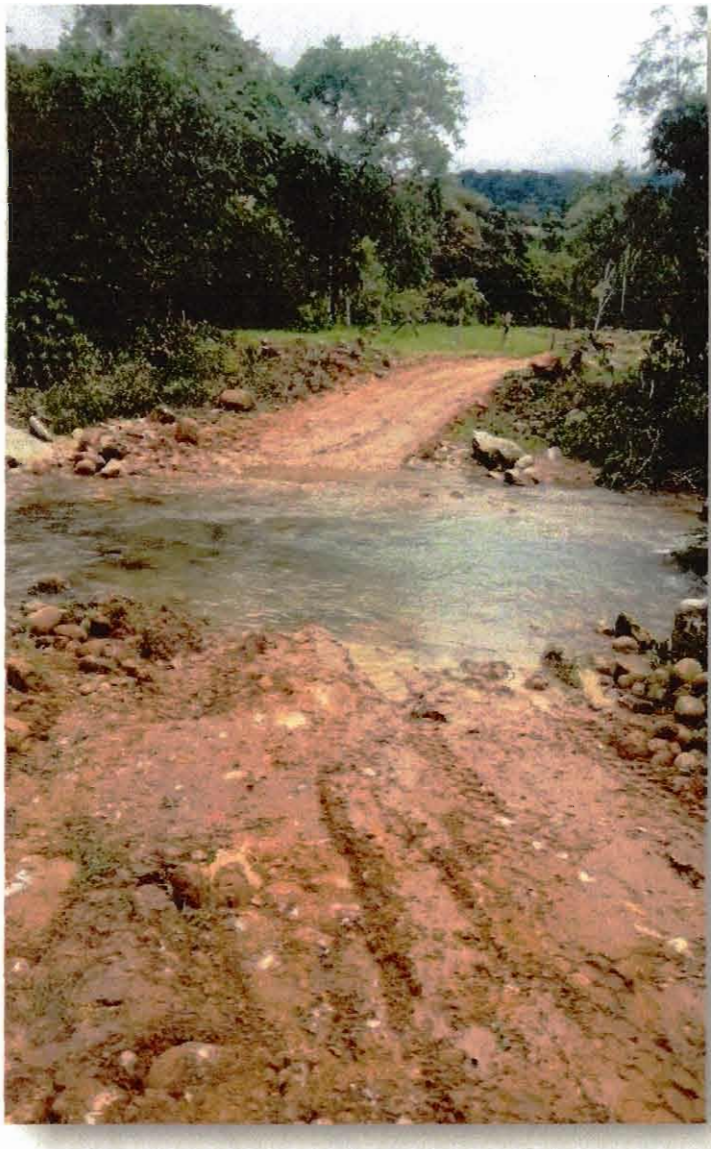

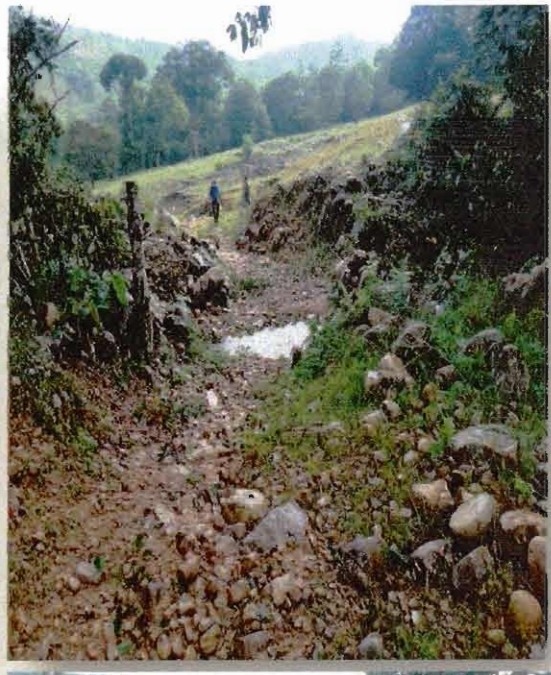


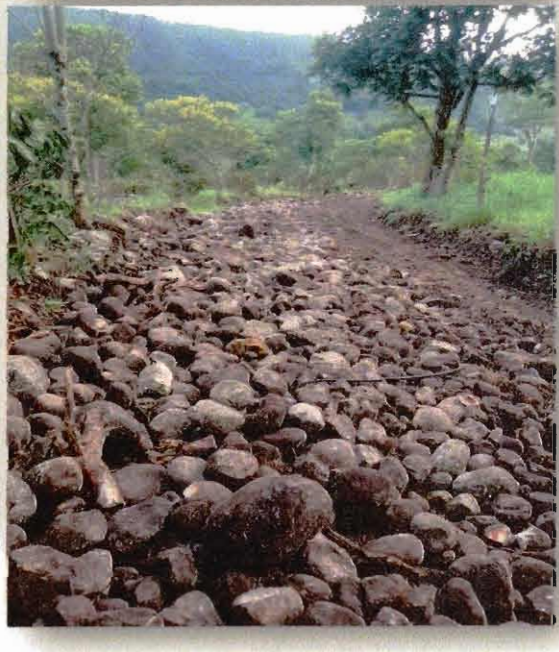


Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntastauramena@gmail.com
"Por la Unidad del Desarrollo Integral y Comunitario"


ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999

NIT: 900.002.220-8

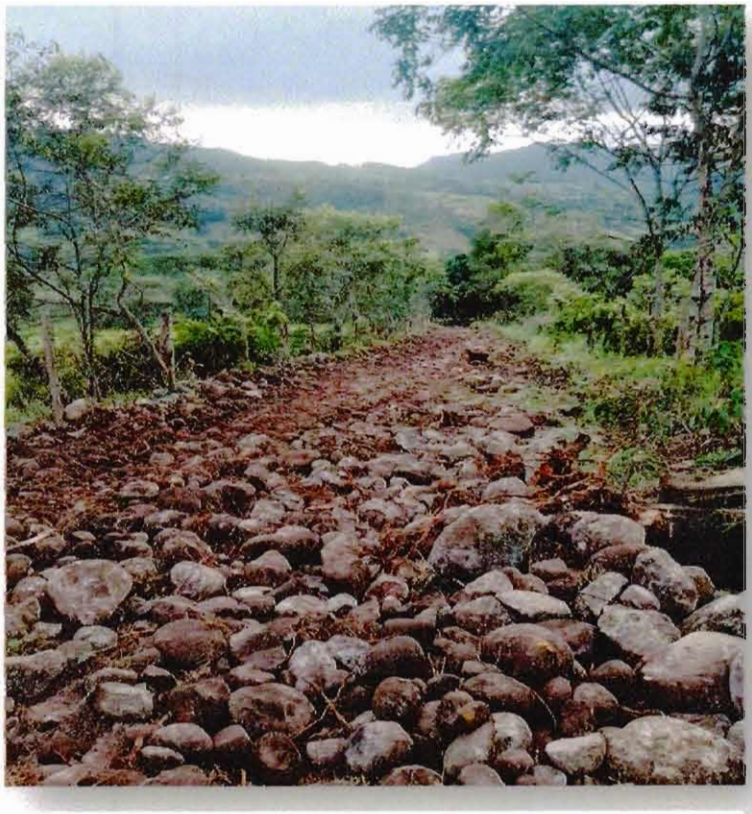

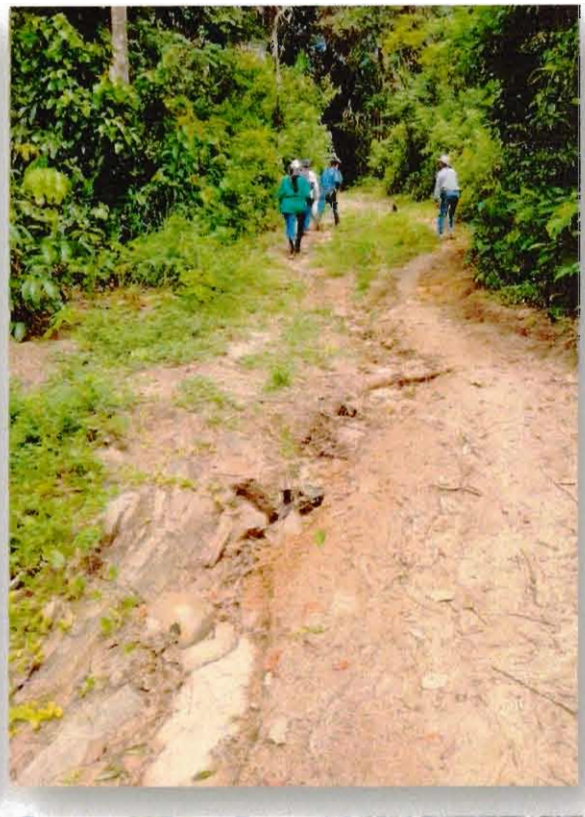



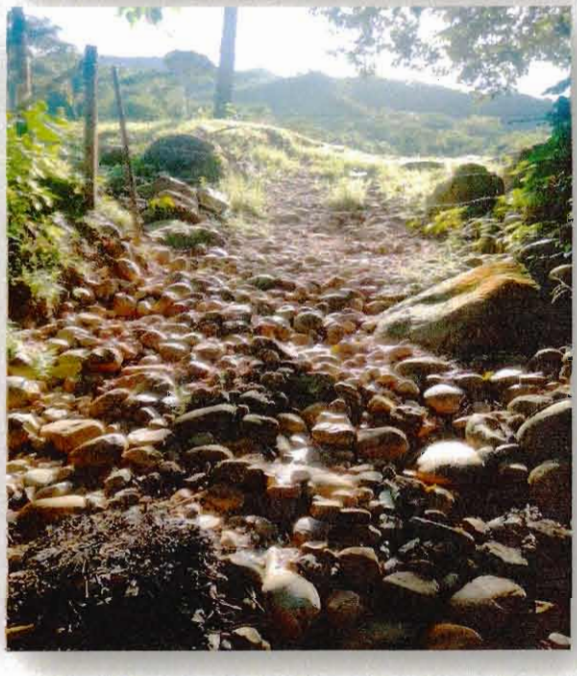

Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntastauramena@gmail.com
"Por la Unidad del Desarrollo Integral y Comunitario"


ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999

NIT: 900.002.220-8

DURANTE





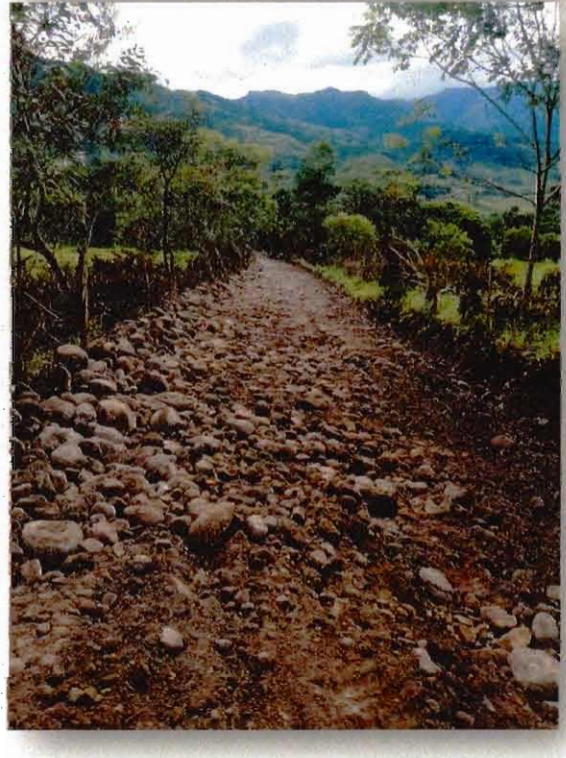





ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999

NIT: 900.002.220-8





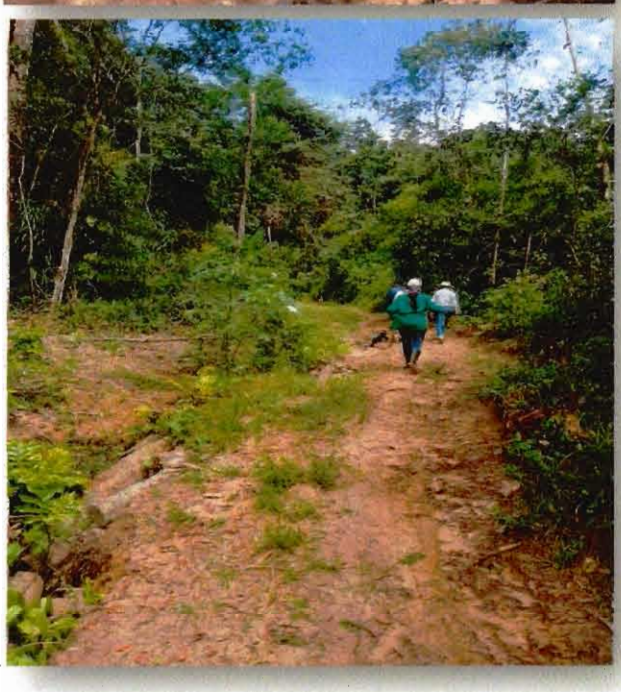

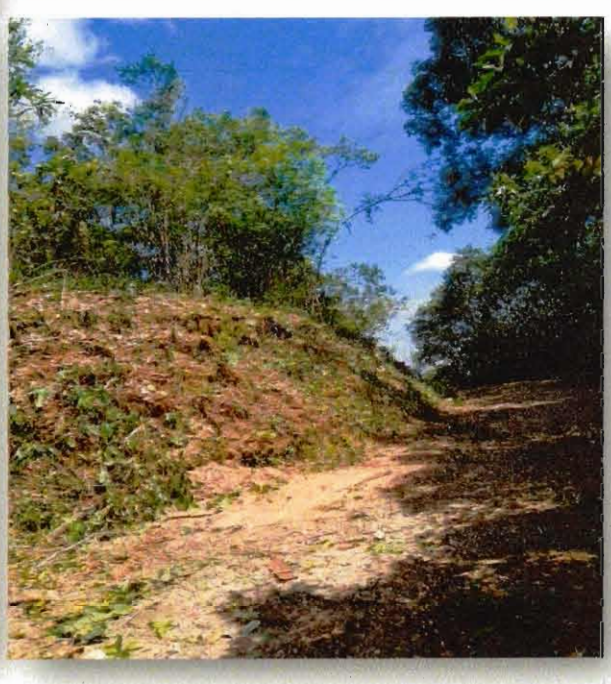


Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntastauramena@gmail.com

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999

NIT: 900.002.220-8

DESPUES

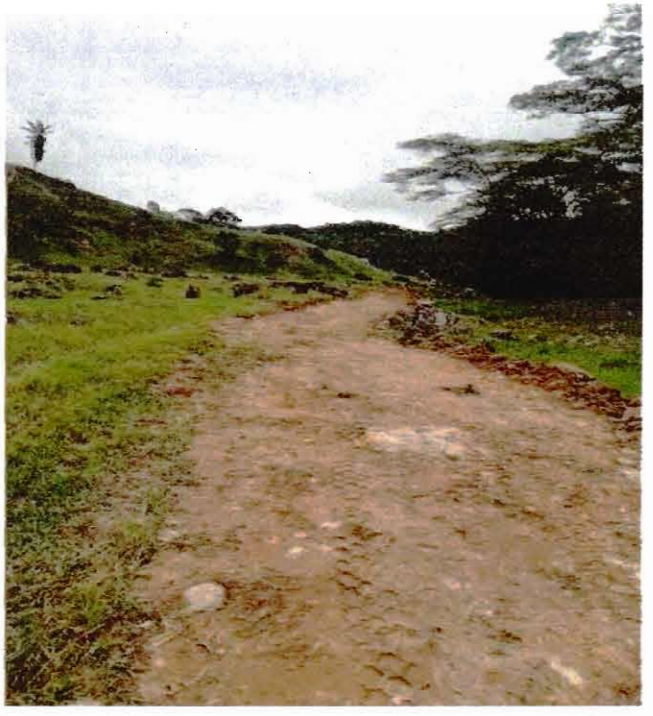








ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999

NIT: 900.002.220-8





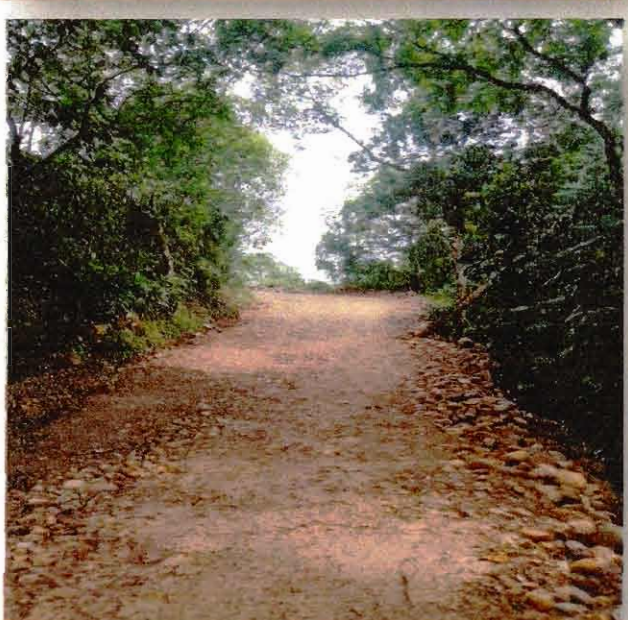



Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntastauramena@gmail.com
"Por la Unidad del Desarrollo Integral y Comunitario"

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8







Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntastauramena@gmail.com

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

- Todo el personal del presente convenio solidario, se encuentran afiliados al sistema de Seguridad Social integral (Salud, pensiones y riesgos laborales y la caja de compensación Comfacasanare (se anexan planillas de pago).

- Se realizaron pausas activas durante el desarrollo de las actividades en el día.

- Se recibió reporte emitido por parte de NAVITRANS de acuerdo al mantenimiento por garantía que se le realizó a la Volqueta de placas OSE966 en la Ciudad de Duitama en las instalaciones de NAVITRANS. (se anexa reporte de NAVITRANS)

- Se realizó visita técnica por parte de Partequipos para la revisión de la maquinaria amarilla de acuerdo a las fallas que presentaba.

INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

Durante la ejecución del presente Convenio Solidario, se presentaron diferentes inconvenientes de los cuales afectaron en mínima medida el avance del desarrollo de las actividades de este;

- El día 30 de Julio de 2024, llegaron los técnicos por parte de Partequipos para realizar los mantenimientos de garantía programados a la maquinaria amarilla (Motoniveladora y vibrocompactador).

- Durante el desarrollo de las actividades del Convenio Solidario, la maquinaria amarilla ha presentado inconvenientes por las condiciones del terreno; debido a las lluvias presentadas en las zonas de intervención.


ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.


El presente Convenio Solidario No. 007 del 13 de Marzo de 2024, presenta un avance de ejecución para el mes de Julio del 19,19% y 24,95 kms intervenidos, y un avance total a la fecha del 87,93% representado en 129 días calendario y 114,31 kms intervenidos, de los cuales corresponde a la malla vial terciaria propuesta por el Municipio de Tauramena;

VEREDA JAGUITO, BENDICIONES Y PIÑALITO BAJO	Jaguito- Guafal Ramal Jaguito – Bendiciones Quebrada la Quiquia- Visinaca – parte alta (Israel Moreno) Ramal Escuela Visinaca – Rio Sunce Ramal Escuela Piñalito – Caño Piñalito – caño Piñalito – Crieet
VEREDA LA URAMA	Anillo escuela Urama Ramal Fincas Urama (Hacia los lobos) Escuela Urama – Don Guillermo Guirripa - Las Brisas Ramal a Puerto Miriam Tramo Bohórquez - Finca Las Palmeras Don Miguel Casa Amarilla - Palmera San Rafael - María Bermúdez Barrio Chino – Manchai Entrada de la Escuela - Pedro Gutiérrez Geovanni Amador - Finca Carimagua
VEREDA VIGIA, EL RAIZAL, DELICIAS	Ramal Escuela La Vigía Colegio Raizal-cruce los Cedros (Finca la Victoria) Raizal (cruce vía Raizal-los Cedros)-Alto Sicigua Los Cedros-Raizal (Finca la Victoria) Ramal Marginal (caño Guira)-Delicias
VEREDA EL PALMAR	Ramal cruce corral – Mata de Loro Vía Alterna – Escuela El Palmar

AVANCE DE EJECUCIÓN MES JULIO

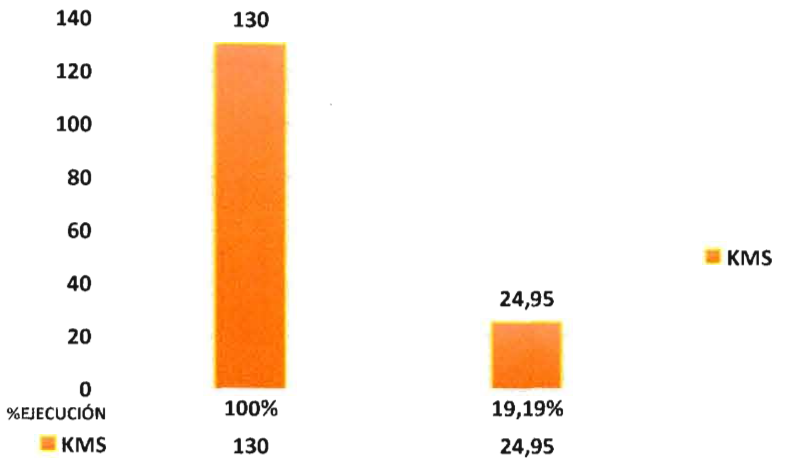

AVANCE DE EJECUCIÓN TOTAL

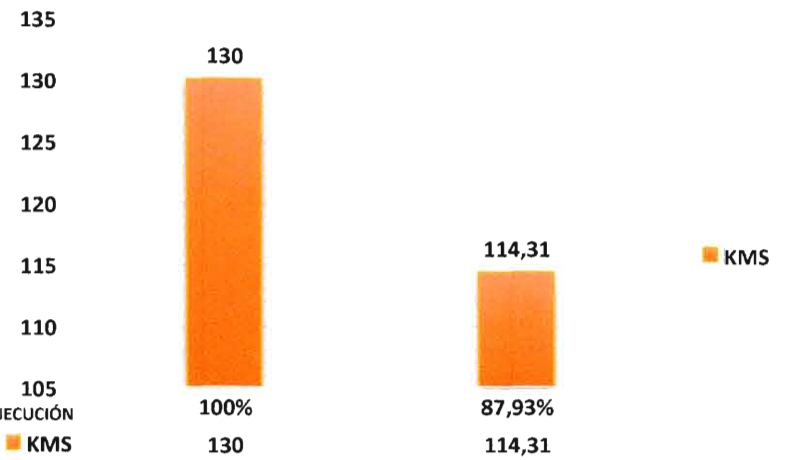

HENRY PAUL ALFONSO
Representante legal ASOJUNTAS
NIT. No. 900.002.220-8

KATTIA JULIETH VIASUS CACERES
Ing. Residente
C.S. 007/2024
