INFORME DE SUPERVISION No. 4

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA PRESENTE INFORME	12 de agosto de 2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula Décima del Convenio en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

ACTIVIDAD DESARROLLADA	% contratado	% ejecutado
APORTE MUNICIPIO		
Conformación, subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)	100,0%	87,93%
APORTE ASOJUNTAS		
Mano de obra no calificada representada en 4 ayudantes	100,0%	82,0%

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	**4**		**PORCENTAJE AVANCE EJECUCIÓN TOTAL DEL**	**87,38%**

2. INDICADORES

INDICADOR DE PRODUCTO			
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA	% EJECUTADO
Vias mejoradas	No. Km	130	87,93%

INDICADOR DE RESULTADO				
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SITUACION ACTUAL	POBLACIÓN ATENDIDA	
			UNIDAD DE	CANTIDAD
Incrementar el 10% de la red vial municipal en el cuatrienio	%	50%	HAB	25.410

3. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

¿Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

No se materializó ninguno de los riesgos previstos inicialmente.

INFORME DE SUPERVISION No. 4

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA PRESENTE INFORME	12 de agosto de 2024

4. OBSERVACIONES

Ninguna observación.

5. ANEXOS

1. Anexo 1. Informe del Acta Parcial #4 del convenio en ejecución.
2. Anexo 2. Soporte de los pagos de seguridad social mes de julio de 2024.

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura

KEVIN SANTIAGO LOPEZ SILVA
Prof de Apoyo a ala Supervisión

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TAURAMENA

FECHA: 12 AGOSTO DE 2024

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME DE SUPERVISION **FECHA: 12 AGOSTO DE 2024**

EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA KEVIN SANTIAGO LÓPEZ SILVA - Prof Apoyo Sec Infraestructura
CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO No.007 DEL 13 DE MARZO DE 2024

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

2. CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

4. INFORME FOTOGRAFICO

5. GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)

6. ANEXOS

   a. Pago de seguridad Social de los meses correspondientes

CONTROL ADMINISTRATIVO

1. INFORMACION INICIAL

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE				
CONVENIO SOLIDARIO No	007		**FECHA DE CONVENIO**	13 de marzo de 2024	
VALOR CONVENIO	$ 331.055.656,00		**APORTE MUNICIPIO**	$ 300.055.656	
APORTE JAC	$ 31.000.000,00		**VALOR ANTICIPO (0 %)**	$ 0	
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA		**NIT.**	900.002.220-8	
R/L	HENRY PAUL ALFONSO		**C.C.**	74.861.785 de Yopal	
PLAZO CONTRACTUAL	CINCO (5) MESES		**No Y FECHA DE RESOLUCION DE APERTURA**	N.A.	
PLAZO (DIAS)			**PUBLICACION OFICIAL**	N.A.	
No Y FECHA DE DISPONIBILIDAD	255 del 01 de marzo de 2024		**No Y FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION**		
No Y FECHA DE DESIGNACION DE INTERVENTORÍA	N.A		**INTERVENTOR**	N.A.	
ACTA DE INICIO	22 de marzo de 2024		**FECHA DE TERMINACION**	21 de agosto de 2024	

GARANTIAS FINALES

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	**FECHA DE APROBACION**	**VEGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
POLIZAS No	**AMPARO**		**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	
BY-10004086 (anexo 1)	DE CUMPLIMIENTO	20-mar.-24	13-mar.-24	23-dic.-24	$ 66.211.131,20
	BUEN MANEJO ANTICIPO		13-mar.-24	23-dic.-24	$ 0,00
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		13-mar.-24	23-ago.-27	$ 16.552.782,80
BY-100005628 (anexo 1)	Responsabilidad civil extracontractual		13-mar.-24	23-ago.-24	$ 260.000.000,00

CONTROL ADMINISTRATIVO

2. INFORMACION DURANTE LA EJECUCION

FECHAS DE ACTAS Y/O MODIFICATORIOS			
ACTA DE INICIO	22 de marzo de 2024	VALOR DEL ANTICIPO	$ 0,00
ACTA DE SUSPENSIÓN	N.A.	ACTA DE REINICIO	N.A.
PRORROGA #1	N.A.	PLAZO CONTRACTUAL	CINCO (5) MESES
ACTA PARCIAL #1	14 de mayo de 2024	VALOR ACTA PARCIAL #1	$ 69.243.613,00
ACTA PARCIAL #2	18 de junio de 2024	VALOR ACTA PARCIAL #2	$ 69.382.100,00
ACTA PARCIAL #3	26 de julio de 2024	VALOR ACTA PARCIAL #3	$ 67.627.929,00
ACTA PARCIAL #4	12 de agosto de 2024	VALOR ACTA PARCIAL #4	$ 57.587.605,00
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA Y ACTA FINAL DE EJECUCION	N.A.	VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	N.A.
ACTA DE LIQUIDACION	N.A.	VALOR TOTAL EJECUTADO CONVENIO SOLIDARIO	$ 289.261.246,00

CONDICIONES FINAL DEL CONVENIO

VALOR APORTE MUNICIPIO	$ 300.055.656,00
PLAZO TOTAL DEL CONVENIO	CINCO (5) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO APORTE MUNICIPIO	$ 263.841.247,00
SALDO POR EJECUTAR APORTE MUNICIPIO	$ 36.214.409,00

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	% CONTRATADO	% EJECUTADO TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUT APORTE MPIO
A	**APORTE MUNICIPIO**									
1	Conformación, subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)	km	130,00	24,95	114,31	100,0%	87,93%	$ 2.308.120,43	$ 300.055.656,00	**$ 263.841.246,00**
B	**APORTE ASOJUNTAS**									
2	Mano de obra no calificada representada en 4 ayudantes	UND	1,00	0,18	0,82	100,0%	82,00%	$ 31.000.000,00	$ 31.000.000,00	$ 25.420.000,00
	VALOR CONVENIO SOLIDARIO				**VALORES TOTALES**				**$ 331.055.656,00**	**$ 289.261.246,00**
					VALOR APORTE MUNICPIO					**$ 263.841.246,00**
					SALDO POR EJECUTAR APORTE MUNICPIO					**$ 36.214.410,00**

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL


TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
MARZO 2024	1					
	2					
	3			Acta de Inicio	Revisión	
	4				Seguimiento	
ABRIL 2024	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
MAYO 2024	1				Seguimiento	
	2			Acta Parcial #1	Revisión	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
JUNIO 2024	1				Seguimiento	
	2			Acta Parcial #2	Revisión	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
JULIO 2024	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4			Acta Parcial #3	Revisón	
AGOSTO 2024	1				Seguimiento	
	2			Acta Parcial #4	Revisión	
	3					
	4					

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)

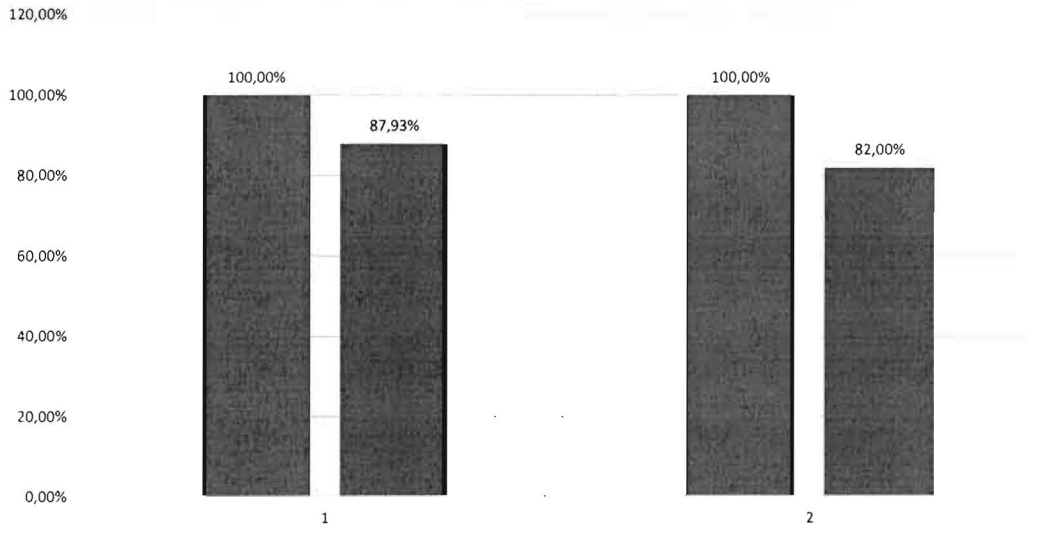

CANTIDADES CONTRATADAS VS CANTIDADES EJECUTADAS

A APORTE MUNICIPIO
1 Conformación, subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)

B APORTE ASOJUNTAS
2 Mano de obra no calificada representada en 4 ayudantes

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, R/L HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	LINO OCHOA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME FOTOGRAFICO

PROCEDIMIENTO/ESTADO FINAL







