
# REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

| Id | ITEM | ACTIVIDAD | Comienzo | Fin | Costo | URACIÓ (DIAS) | UNIDAD | CANTIDA | % completado | Holgura | Predecesoras | Sucesoras | Ruta crítica | % físico completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | **"REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS"** | **mar 30/04/24** | **dom 30/06/24** | **$ 323.342.962,40** | **62 días?** | | | **50%** | **0 días?** | | | **Si** | **0%** |
| 1 | INICI | **INICIO DEL PROYECTO** | **mar 30/04/24** | **mar 30/04/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **2;3** | **No** | **0%** |
| 2 | ED | **ETAPA DE DIAGNOSTICO** | **mar 30/04/24** | **mié 1/05/24** | **$ 0,00** | **2 días** | | | **100%** | **0 días** | 1 | | **No** | **0%** |
| 3 | 3617 | EVALUACION SUPERFICIAL, DE CADA UNO DE LOS SALONES COMUNALES, IDENTIFICANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS SALONES COMUNALES CONTRATADOS Y COMPLEMENTARLAS CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS. | mar 30/04/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 2 días | GL | 1 | 100% | 0 días | 1 | 11CC+2 días;17;125;232CC+2 días;238;340CC+2 días;346 | No | 0% |
| 4 | EO | **ACTIVIDADES DE ETAPA DE OBRA - MANTENIMIENTO SALONES COMUNALES** | **mar 30/04/24** | **dom 30/06/24** | **$ 323.342.962,40** | **62 días?** | | | **50%** | **0 días?** | | | **Si** | **0%** |
| 5 | 3.1 | **LA LIBERTAD** | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | **$ 100.693.596,85** | **54 días?** | | | **60%** | **0 días?** | | **113CC+2 días;119CC+2 días** | **No** | **0%** |
| 6 | 1 | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **jue 2/05/24** | **vie 10/05/24** | **$ 5.566.886,00** | **9 días** | | | **100%** | **0 días** | | **31CC+5 días;26;20;36** | **No** | **0%** |
| 7 | 1,1 | DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 11 | | No | 0% |
| 8 | 1,2 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 379.502,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 11 | | No | 0% |
| 9 | 1,3 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | mié 8/05/24 | vie 10/05/24 | $ 1.272.544,00 | 3 días | M2 | 79,04 | 100% | 0 días | 10 | | No | 0% |
| 10 | 1,4 | DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | lun 6/05/24 | mar 7/05/24 | $ 119.600,00 | 2 días | ML | 8 | 100% | 0 días | 12 | 9 | No | 0% |
| 11 | 1,5 | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | jue 2/05/24 | vie 3/05/24 | $ 0,00 | 2 días | M2 | 8 | 100% | 0 días | 3CC+2 días | 15;7;8;12;14CC | No | 0% |
| 12 | 1,6 | DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS | sáb 4/05/24 | dom 5/05/24 | $ 127.200,00 | 2 días | UN | 8 | 100% | 0 días | 11 | 10 | No | 0% |
| 13 | 1,7 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., ( | sáb 4/05/24 | sáb 4/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 14 | | No | 0% |
| 14 | 1,8 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | jue 2/05/24 | sáb 4/05/24 | $ 3.554.280,00 | 3 días | M2 | 60,9 | 100% | 0 días | 11CC | 13 | No | 0% |
| 15 | 1,9 | DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 113.760,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 11 | | No | 0% |
| 16 | 2 | **MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mié 1/05/24** | **dom 26/05/24** | **$ 0,00** | **25 días** | | | **100%** | **0 días** | | | **No** | **0%** |
| 17 | 2,1 | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLIUYE CAMBIO DE TEJAS | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 3 | 18 | No | 0% |
| 18 | 2,2 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS. | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 17 | | No | 0% |
| 19 | 2,3 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS. SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS | dom 19/05/24 | dom 26/05/24 | $ 0,00 | 8 días | M2 | 42,45 | 100% | 0 días | 27 | 55 | No | 0% |
| 20 | 2,4 | Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS) | sáb 11/05/24 | sáb 18/05/24 | $ 0,00 | 8 días | M2 | 166 | 100% | 0 días | 6 | 27;28FF;21CC+1 día | No | 0% |
| 21 | 2,5 | Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT | dom 12/05/24 | lun 13/05/24 | $ 0,00 | 2 días | UN | 2 | 100% | 0 días | 20CC+1 día | 23CC+5 días | No | 0% |
| 22 | 3 | **VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN** | **jue 16/05/24** | **jue 16/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 23 | 3,1 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | jue 16/05/24 | jue 16/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 21CC+5 días | | No | 0% |
| 24 | 4 | **MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **vie 10/05/24** | **sáb 18/05/24** | **$ 0,00** | **8 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 25 | 4,1 | MURO EN BLOQUE HUECO No.4, tabique a pañetar | vie 10/05/24 | vie 10/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 26CC | | No | 0% |
| 26 | 4,2 | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE | vie 10/05/24 | vie 10/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 6 | 25CC;66 | No | 0% |
| 27 | 4,3 | LAVADO DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO AGUA A PRES | sáb 18/05/24 | sáb 18/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 20;28 | 19 | No | 0% |
| 28 | 4,4 | TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS. DEJANDO UNA SUPERFFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYEPRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPE | sáb 18/05/24 | sáb 18/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 20FF | 27 | No | 0% |
| 29 | 5 | **REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 6/05/24** | **lun 6/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 30 | 5,1 | PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 31CC | 32CC | No | 0% |
| 31 | 5,2 | RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA). | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 6CC+5 días | 30CC;35 | No | 0% |
| 32 | 5,3 | MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084 | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | KG | 0 | 100% | 0 días | 30CC | | No | 0% |

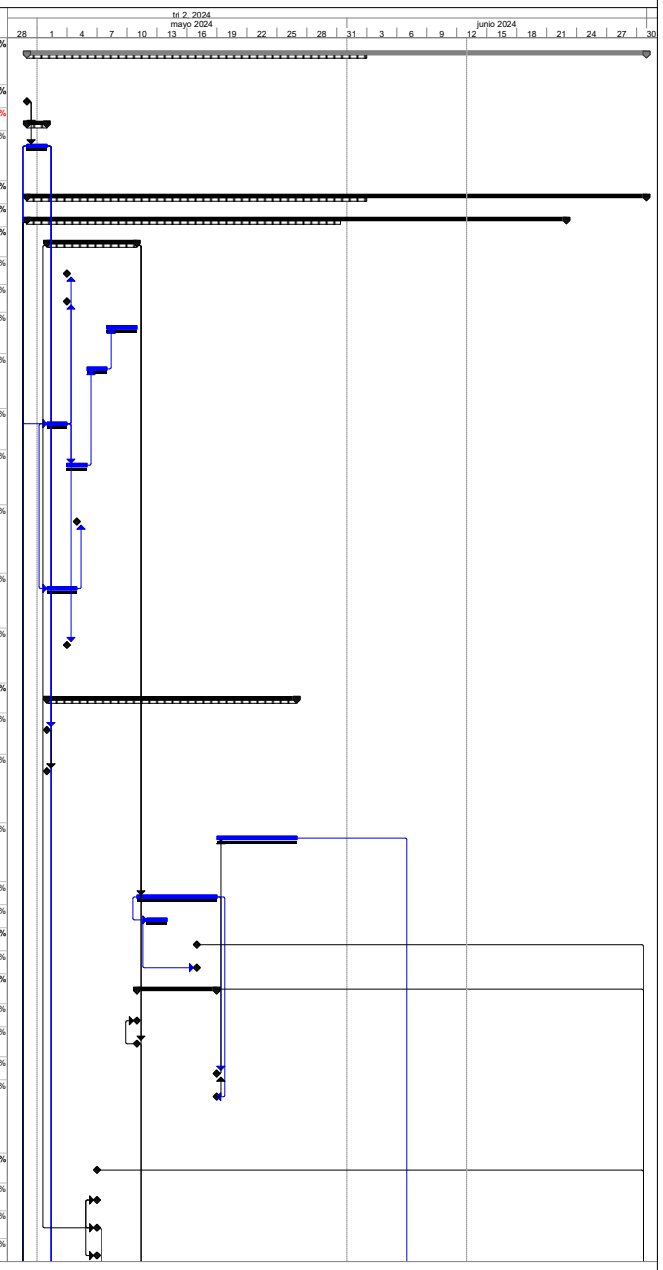


BRASCO INGENIERÍA SAS


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

# REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

| Id | ITEM | ACTIVIDAD | Comienzo | Fin | Costo | URACIÓ (DIAS) | UNIDAD | CANTIDA | % completado | Holgura | Predecesoras | Sucesoras | Ruta crítica | % físico completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | **6** | **PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 6/05/24** | **jue 16/05/24** | **$ 6.808.950,00** | **10 días** | | 0 | **100%** | **0 días** | | **71** | **No** | **0%** |
| 34 | 6,1 | ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4 | sáb 11/05/24 | sáb 11/05/24 | $ 3.905.980,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 36CF | | No | 0% |
| 35 | 6,2 | ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3 | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 31 | 40 | No | 0% |
| 36 | 6,3 | ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm | sáb 11/05/24 | jue 16/05/24 | $ 2.902.970,00 | 6 días | M2 | 79,10 | 100% | 0 días | 6 | 34CF;105 | No | 0% |
| 37 | **7** | **ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 6/05/24** | **lun 6/05/24** | **$ 331.470,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 38 | 7,1 | Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido (PISOS) | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 39FF | | No | 0% |
| 39 | 7,2 | DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33X33 | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 40FF | 38FF;44CF | No | 0% |
| 40 | 7,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA, FILOS Y DILATACIONES Y PIRLAN EN BRONCE | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 35 | 39FF;41;45;46 | No | 0% |
| 41 | 7,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE. | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 40 | 42 | No | 0% |
| 42 | 7,5 | WIN DE ALUMINIO | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 41 | 43FF | No | 0% |
| 43 | 7,6 | GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 42FF | | No | 0% |
| 44 | 7,7 | RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM. | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 331.470,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 39CF | | No | 0% |
| 45 | 7,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 40 | | No | 0% |
| 46 | 7,9 | ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 40 | 48CC+1 día | No | 0% |
| 47 | **8** | **MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **dom 19/05/24** | **jue 23/05/24** | **$ 6.743.305,00** | **5 días** | | | **100%** | **0 días** | **83** | **71** | **No** | **0%** |
| 48 | 8,1 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX) | dom 19/05/24 | jue 23/05/24 | $ 6.659.993,00 | 5 días | M2 | 72,47 | 100% | 0 días | 46CC+1 día | 49FF;58 | No | 0% |
| 49 | 8,2 | SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO | mié 22/05/24 | jue 23/05/24 | $ 83.312,00 | 2 días | ML | 10,16 | 100% | 0 días | 48FF | | No | 0% |
| 50 | **9** | **CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 30/04/24** | **mar 30/04/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **54FF;441** | **No** | **0%** |
| 51 | 9,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 52CC | 98 | No | 0% |
| 52 | 9,2 | PASAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1/2" EN PINTURA ESMALTE COLOR GRIS GRAFITO. | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | | 51CC | No | 0% |
| 53 | **10** | **CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 30/04/24** | **mar 30/04/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 54 | 10,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO) | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 50FF | | No | 0% |
| 55 | **11** | **CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **vie 7/06/24** | **dom 9/06/24** | **$ 0,00** | **3 días** | | | **100%** | **0 días** | **19** | | **No** | **0%** |
| 56 | 11,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDA | vie 7/06/24 | dom 9/06/24 | $ 0,00 | 3 días | M2 | 8 | 100% | 0 días | 76FF | 79 | No | 0% |
| 57 | **12** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **vie 24/05/24** | **mar 28/05/24** | **$ 3.711.200,00** | **5 días** | | | **100%** | **0 días** | | **64** | **No** | **0%** |
| 58 | 12,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE) | vie 24/05/24 | sáb 25/05/24 | $ 1.069.600,00 | 2 días | UN | 2 | 100% | 0 días | 48 | 59 | No | 0% |
| 59 | 12,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) | dom 26/05/24 | lun 27/05/24 | $ 1.530.000,00 | 2 días | UN | 3 | 100% | 0 días | 58 | 60 | No | 0% |
| 60 | 12,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | mar 28/05/24 | mar 28/05/24 | $ 1.111.600,00 | 1 día | UN | 2 | 100% | 0 días | 59 | 61 | No | 0% |
| 61 | 12,4 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | mar 28/05/24 | mar 28/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 60 | 62 | No | 0% |
| 62 | 12,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | mar 28/05/24 | mar 28/05/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 100% | 0 días | 61 | | No | 0% |
| 63 | **13** | **APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN** | **mié 29/05/24** | **vie 31/05/24** | **$ 8.019.900,00** | **3 días** | | | **100%** | **0 días** | | **89** | **No** | **0%** |
| 64 | 13,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS | mié 29/05/24 | vie 31/05/24 | $ 8.019.900,00 | 3 días | M2 | 7,00 | 100% | 0 días | 57 | | No | 0% |
| 65 | **14** | **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **vie 10/05/24** | **vie 10/05/24** | **$ 547.580,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 66 | 14,1 | Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m ** | vie 10/05/24 | vie 10/05/24 | $ 547.580,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 26 | 67CC;68 | No | 0% |
| 67 | 14,2 | Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m** | vie 10/05/24 | vie 10/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 66CC | | No | 0% |
| 68 | 14,3 | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | vie 10/05/24 | vie 10/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 66 | 69;83 | No | 0% |
| 69 | 14,4 | ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO | vie 10/05/24 | vie 10/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 68 | | No | 0% |
| 70 | **15** | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **vie 24/05/24** | **jue 6/06/24** | **$ 21.090.262,00** | **14 días** | | | **100%** | **0 días** | | | **No** | **0%** |
| 71 | 15,1 | VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | vie 24/05/24 | jue 30/05/24 | $ 4.493.143,00 | 7 días | M2 | 233,41 | 100% | 0 días | 33;47 | 72FF;73FF;74 | No | 0% |

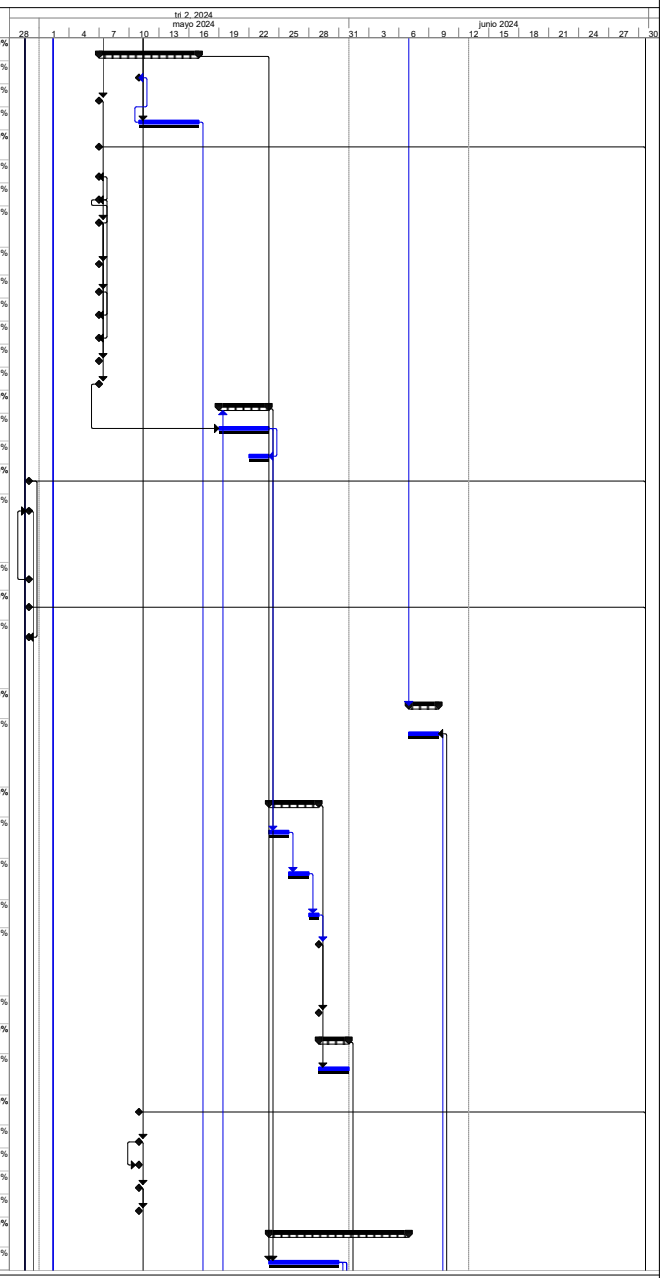


BRASCO INGENIERÍA SAS


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

**LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.**

**VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024**

# REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

| Id | ITEM | ACTIVIDAD | Comienzo | Fin | Costo | URACIÓ (DIAS) | UNIDAD | CANTIDA | % completado | Holgura | Predecesoras | Sucesoras | Ruta crítica | % físico completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15,2 | PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS | mié 29/05/24 | jue 30/05/24 | $ 127.125,00 | 2 días | ML | 10,17 | 100% | 0 días | 71FF | | No | 0% |
| 73 | 15,3 | PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | jue 30/05/24 | jue 30/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 71FF | | No | 0% |
| 74 | 15,4 | Pintura acrílica Koraza 10 sobre losa / pañete | vie 31/05/24 | mar 4/06/24 | $ 15.200.894,00 | 5 días | M2 | 371,66 | 100% | 0 días | 71 | 75 | No | 0% |
| 75 | 15,5 | PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 | $ 1.269.100,00 | 2 días | M2 | 37 | 100% | 0 días | 74 | 77 | No | 0% |
| 76 | **16** | **PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **vie 7/06/24** | **dom 9/06/24** | **$ 0,00** | **3 días** | | | **100%** | **0 días** | | **56FF** | **No** | **0%** |
| 77 | 16,1 | PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES. | vie 7/06/24 | dom 9/06/24 | $ 0,00 | 3 días | M2 | 74,1 | 100% | 0 días | 75 | 79 | No | 0% |
| 78 | **17** | **PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 10/06/24** | **mar 18/06/24** | **$ 2.685.740,00** | **9 días** | | | **0%** | **8 días** | | **100** | **No** | **0%** |
| 79 | 17,1 | ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS | lun 10/06/24 | mié 12/06/24 | $ 1.224.600,00 | 3 días | M2 | 52 | 0% | 8 días | 77;56 | 80 | No | 0% |
| 80 | 17,2 | ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA | jue 13/06/24 | vie 14/06/24 | $ 773.640,00 | 2 días | M2 | 22,3 | 0% | 8 días | 79 | 81 | No | 0% |
| 81 | 17,3 | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICATOS) | sáb 15/06/24 | mar 18/06/24 | $ 687.500,00 | 4 días | ML | 25 | 0% | 8 días | 80 | | No | 0% |
| 82 | **18** | **CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 30/04/24** | **sáb 18/05/24** | **$ 13.489.590,00** | **19 días** | | | **100%** | **0 días** | | | **No** | **0%** |
| 83 | 18,1 | CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | sáb 11/05/24 | sáb 18/05/24 | $ 13.489.590,00 | 8 días | M2 | 176,4 | 100% | 0 días | 68 | 47 | No | 0% |
| 84 | 18,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE DRY WALL DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | | 85FF+2 días | No | 0% |
| 85 | 18,3 | CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS) | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 84FF+2 días | 86FF | No | 0% |
| 86 | 18,4 | CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO REPISA(0.05X0.10M) | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 85FF | | No | 0% |
| 87 | **19** | **VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 30/04/24** | **sáb 1/06/24** | **$ 0,00** | **33 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 88 | 19,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | | | No | 0% |
| 89 | 19,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO | sáb 1/06/24 | sáb 1/06/24 | $ 0,00 | 1 día | M2 | 2,5 | 100% | 0 días | 63 | 90 | No | 0% |
| 90 | 19,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS | sáb 1/06/24 | sáb 1/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 89 | | No | 0% |
| 91 | **20** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 30/04/24** | **mar 30/04/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 92 | 20,1 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 93 | | No | 0% |
| 93 | 20,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 97 | 92;94CC;95CC;96 | No | 0% |
| 94 | 20,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 93CC | | No | 0% |
| 95 | 20,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 93CC | | No | 0% |
| 96 | 20,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 93 | | No | 0% |
| 97 | 20,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO. | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 98CC | 93 | No | 0% |
| 98 | 20,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 51 | 97CC | No | 0% |
| 99 | **21** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | **sáb 8/06/24** | **sáb 22/06/24** | **$ 3.896.350,00** | **15 días** | | | **11%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 100 | 21,1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | mié 19/06/24 | sáb 22/06/24 | $ 1.946.350,00 | 4 días | M2 | 180 | 0% | 8 días | 78 | 101FF;102FF | No | 0% |
| 101 | 21,2 | DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO | sáb 22/06/24 | sáb 22/06/24 | $ 0,00 | 0 días | KG | 0 | 0% | 8 días | 100FF | | No | 0% |
| 102 | 21,3 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC) | sáb 8/06/24 | sáb 22/06/24 | $ 1.950.000,00 | 15 días | KG | 1000 | 13% | 0 días | 100FF | | No | 0% |
| 103 | 22 | **ITEMS NO PREVISTOS** | **mar 30/04/24** | **dom 26/05/24** | **$ 25.122.457,00** | **27 días?** | | | **100%** | **0 días?** | | | **No** | **0%** |
| 104 | ~~22.4~~ | ~~SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR. DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13~~ | ~~mar 30/04/24~~ | ~~mar 30/04/24~~ | ~~$ 399.133,00~~ | ~~1 día?~~ | | | ~~0%~~ | ~~81 días?~~ | | | ~~No~~ | ~~0%~~ |
| 105 | 22.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO SPC (4 mm de espesor) | vie 17/05/24 | dom 26/05/24 | $ 23.943.365,00 | 10 días | M2 | 106,47 | 100% | 0 días | 36 | | No | 0% |
| 106 | 22.14 | PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 1.179.092,00 | 1 día? | un | | 100% | 0 días? | | | No | 0% |
| 107 | 23 | DIAGNÓSTICO | mar 30/04/24 | mié 1/05/24 | $ 1.323.875,00 | 2 días? | | | 100% | 0 días? | | | No | 0% |
| 108 | **3.1.2** | **COMPONENTES** | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | **$ 1.356.031,85** | **54 días?** | | | **50%** | **0 días?** | | | **No** | **0%** |
| 109 | 3.1.2 | COMPONENTE SOCIAL | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | $ 817.110,00 | 54 días? | | | 50% | 0 días? | | | No | 0% |
| 110 | 3.1.2 | COMPONENTE AMBIENTAL | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | $ 11.000,00 | 54 días? | | | 50% | 0 días? | | | No | 0% |
| 111 | 3.1.2 | COMPONENTE SST | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | $ 361.720,25 | 54 días? | | | 50% | 0 días? | | | No | 0% |
| 112 | 24 | COMPONENTE PMT | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | $ 166.201,60 | 54 días? | | | 50% | 0 días? | | | No | 0% |
| 113 | **3.2** | **SANTA SOFIA** | **mié 1/05/24** | **sáb 29/06/24** | **$ 80.847.981,85** | **59 días?** | | | **52%** | **0 días?** | **5CC+2 días** | **230CC+30 días** | **No** | **0%** |

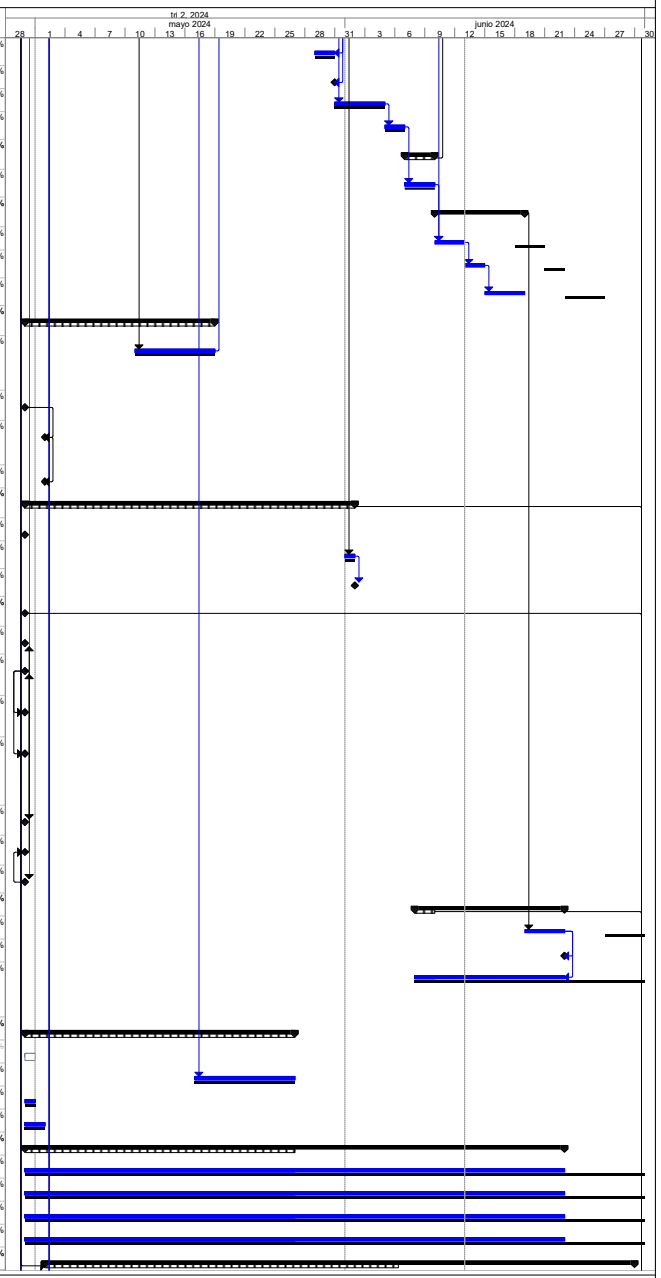


BRASCO INGENIERÍA SAS


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

# REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

| Id | ITEM | ACTIVIDAD | Comienzo | Fin | Costo | URACIÓ (DIAS) | UNIDAD | CANTIDA | % completado | Holgura | Predecesoras | Sucesoras | Ruta crítica | % físico completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | **1** | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **jue 2/05/24** | **vie 3/05/24** | **$ 1.167.332,00** | **2 días** | | | **100%** | **0 días** | | **139CC+5 días;129;134;212FF** | **No** | **0%** |
| 115 | 1,1 | DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 119 | | No | 0% |
| 116 | 1,2 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 119 | | No | 0% |
| 117 | 1,3 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 118 | | No | 0% |
| 118 | 1,4 | DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 120 | 117 | No | 0% |
| 119 | 1,5 | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | jue 2/05/24 | vie 3/05/24 | $ 1.167.332,00 | 2 días | M2 | 29,97 | 100% | 0 días | 5CC+2 días | 115;116;123;120;122CC; | No | 0% |
| 120 | 1,6 | DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 100% | 0 días | 119 | 118 | No | 0% |
| 121 | 1,7 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., ( | jue 2/05/24 | jue 2/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 122 | | No | 0% |
| 122 | 1,8 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | jue 2/05/24 | jue 2/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 119CC | 121 | No | 0% |
| 123 | 1,9 | DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 119 | | No | 0% |
| 124 | **2** | **MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mié 1/05/24** | **dom 9/06/24** | **$ 1.766.545,00** | **39 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 125 | 2,1 | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLIUYE CAMBIO DE TEJAS | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 3 | 126 | No | 0% |
| 126 | 2,2 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS. | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 125 | | No | 0% |
| 127 | 2,3 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS | vie 31/05/24 | dom 9/06/24 | $ 1.766.545,00 | 10 días | M2 | 99,09 | 100% | 0 días | 215 | | No | 0% |
| 128 | 2,4 | Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS) | jue 9/05/24 | jue 9/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 131 | 135 | No | 0% |
| 129 | 2,5 | Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | 0 | 100% | 0 días | 114 | | No | 0% |
| 130 | **3** | **VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN** | **sáb 4/05/24** | **jue 9/05/24** | **$ 222.500,00** | **6 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441;205** | **No** | **0%** |
| 131 | 3,1 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | sáb 4/05/24 | jue 9/05/24 | $ 222.500,00 | 6 días | ML | 50 | 100% | 0 días | 119 | 128;136 | No | 0% |
| 132 | **4** | **MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **vie 3/05/24** | **dom 19/05/24** | **$ 2.100.095,00** | **16 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441;179;192** | **No** | **0%** |
| 133 | 4,1 | MURO EN BLOQUE HUECO No.4, tabique a pañetar | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 134CC | | No | 0% |
| 134 | 4,2 | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 114 | 133CC;174 | No | 0% |
| 135 | 4,3 | LAVADO DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO AGUA A PRES | dom 19/05/24 | dom 19/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 128;136 | | No | 0% |
| 136 | 4,4 | TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYEPRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPE | vie 10/05/24 | dom 19/05/24 | $ 2.100.095,00 | 10 días | M2 | 79,695 | 100% | 0 días | 131 | 135 | No | 0% |
| 137 | **5** | **REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 6/05/24** | **lun 6/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 138 | 5,1 | PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 139CC | 140CC | No | 0% |
| 139 | 5,2 | RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA). | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 114CC+5 días | 138CC;143 | No | 0% |
| 140 | 5,3 | MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084 | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | KG | 0 | 100% | 0 días | 138CC | | No | 0% |
| 141 | **6** | **PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 6/05/24** | **lun 6/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 142 | 6,1 | ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4 | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 144CF | | No | 0% |
| 143 | 6,2 | ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3 | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 139 | 144CF;148 | No | 0% |
| 144 | 6,3 | ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 143CF | 142CF | No | 0% |
| 145 | **7** | **ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 6/05/24** | **lun 6/05/24** | **$ 233.460,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 146 | 7,1 | Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido (PISOS) | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 147FF | | No | 0% |
| 147 | 7,2 | DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33X33 | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 148FF | 146FF;152CF | No | 0% |
| 148 | 7,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA, FILOS Y DILATACIONES Y PIRLAN EN BRONCE | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 143 | 147FF;149;153;154 | No | 0% |

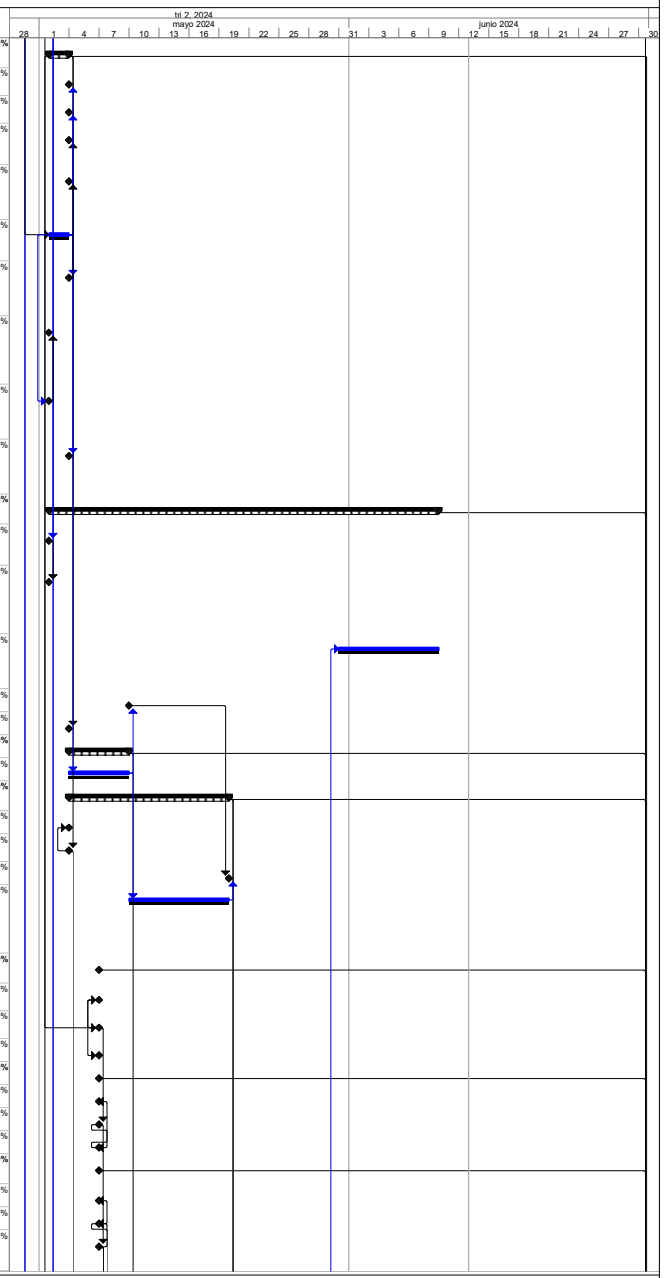


BRASCO INGENIERÍA SAS


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

# REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

| Id | ITEM | ACTIVIDAD | Comienzo | Fin | Costo | DURACIÓN (DIAS) | UNIDAD | CANTIDAD | % completado | Holgura | Predecesoras | Sucesoras | Ruta crítica | % físico completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 7,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE. | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 148 | 150 | No | 0% |
| 150 | 7,5 | WIN DE ALUMINIO | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 149 | 151FF | No | 0% |
| 151 | 7,6 | GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 150FF | | No | 0% |
| 152 | 7,7 | RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM. | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 233.460,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 147CF | | No | 0% |
| 153 | 7,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 148 | | No | 0% |
| 154 | 7,9 | ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 148 | 156CC+1 día | No | 0% |
| 155 | **8** | **MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 7/05/24** | **mar 7/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | **0** | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 156 | 8,1 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX) | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 154CC+1 día | 157;166 | No | 0% |
| 157 | 8,2 | SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 156 | | No | 0% |
| 158 | **9** | **CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 7/05/24** | **mar 7/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | **0** | **100%** | **0 días** | | **162FF;441** | **No** | **0%** |
| 159 | 9,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 160CC | 206 | No | 0% |
| 160 | 9,2 | PASAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1/2" EN PINTURA ESMALTE COLOR GRIS GRAFITO. | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 163FF | 159CC | No | 0% |
| 161 | **10** | **CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 7/05/24** | **mar 7/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 162 | 10,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO) | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 158FF | | No | 0% |
| 163 | **11** | **CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 7/05/24** | **mar 7/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **160FF;441** | **No** | **0%** |
| 164 | 11,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLL/ESD CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDA | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 171 | | No | 0% |
| 165 | **12** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 7/05/24** | **mar 7/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441;172** | **No** | **0%** |
| 166 | 12,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE) | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 100% | 0 días | 156 | 167 | No | 0% |
| 167 | 12,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 100% | 0 días | 166 | 168 | No | 0% |
| 168 | 12,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 100% | 0 días | 167 | 169 | No | 0% |
| 169 | 12,4 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 168 | 170 | No | 0% |
| 170 | 12,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 100% | 0 días | 169 | | No | 0% |
| 171 | **13** | **APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN** | **mar 7/05/24** | **mar 7/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **164;441;196** | **No** | **0%** |
| 172 | 13,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 165 | | No | 0% |
| 173 | **14** | **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **vie 3/05/24** | **vie 3/05/24** | **$ 2.168.584,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 174 | 14,1 | Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m ** | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 2.168.584,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 134 | 175CC;176 | No | 0% |
| 175 | 14,2 | Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m** | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 174CC | | No | 0% |
| 176 | 14,3 | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 174 | 177;191CC | No | 0% |
| 177 | 14,4 | ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 176 | | No | 0% |
| 178 | **15** | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 20/05/24** | **mié 5/06/24** | **$ 13.792.275,00** | **17 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441;188** | **No** | **0%** |
| 179 | 15,1 | VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | lun 20/05/24 | lun 3/06/24 | $ 13.569.325,00 | 15 días | M2 | 704,90 | 100% | 0 días | 132 | 180FF;181FF;182;183 | No | 0% |
| 180 | 15,2 | PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS | lun 3/06/24 | lun 3/06/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 179FF | | No | 0% |
| 181 | 15,3 | PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | lun 3/06/24 | lun 3/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 179FF | | No | 0% |
| 182 | 15,4 | Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete | lun 3/06/24 | lun 3/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 179 | | No | 0% |
| 183 | 15,5 | PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | mar 4/06/24 | mié 5/06/24 | $ 222.950,00 | 2 días | M2 | 6,50 | 100% | 0 días | 179 | 185 | No | 0% |
| 184 | **16** | **PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mié 5/06/24** | **mié 5/06/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 185 | 16,1 | PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES | mié 5/06/24 | mié 5/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 183 | 187 | No | 0% |
| 186 | **17** | **PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mié 5/06/24** | **lun 10/06/24** | **$ 2.692.410,00** | **5 días** | | | **80%** | **0 días** | | **441;208FF** | **No** | **0%** |
| 187 | 17,1 | ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS | mié 5/06/24 | mié 5/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 185 | | No | 0% |

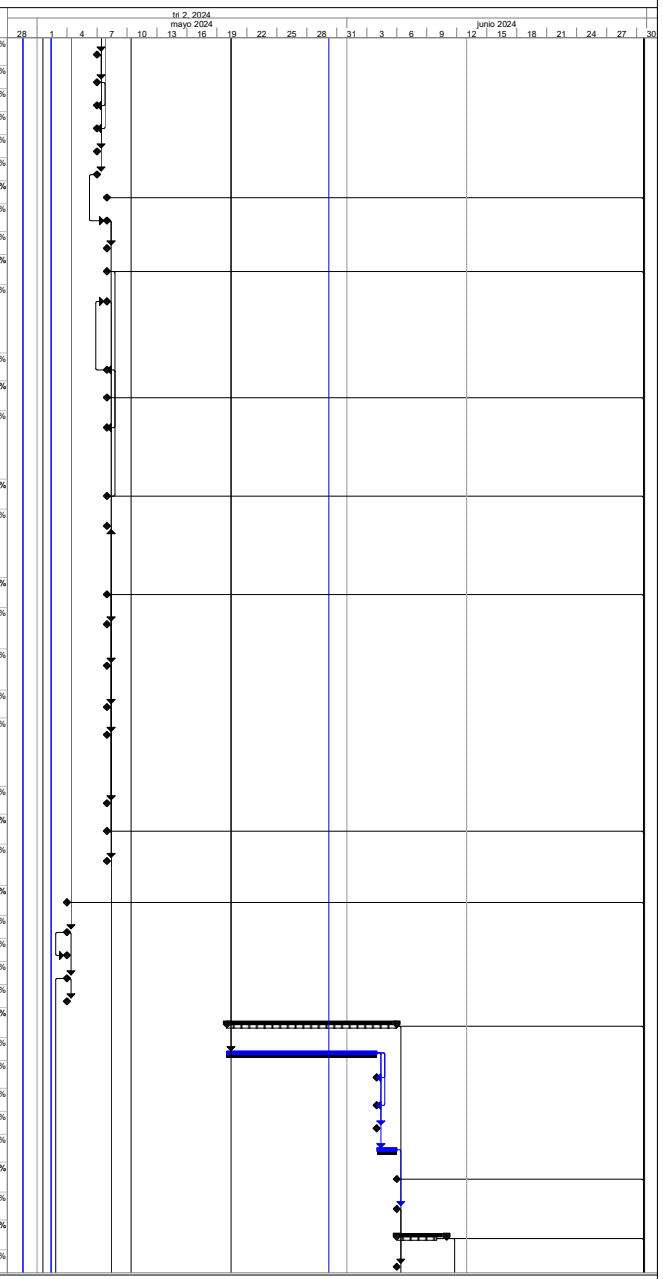


BRASCO INGENIERÍA SAS


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

# REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

| Id | ITEM | ACTIVIDAD | Comienzo | Fin | Costo | URACIÓ (DIAS) | UNIDAD | CANTIDA | % completado | Holgura | Predecesoras | Sucesoras | Ruta crítica | % físico completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 17.2 | ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA | jue 6/06/24 | lun 10/06/24 | $ 2.692.410,00 | 5 días | M2 | 75,18 | 80% | 0 días | 178 | 189 | No | 0% |
| 189 | 17.3 | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | lun 10/06/24 | lun 10/06/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 0% | 20 días | 188 | | No | 0% |
| 190 | **18** | **CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **vie 3/05/24** | **mié 29/05/24** | **$ 19.899.320,00** | **26 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441;214** | **No** | **0%** |
| 191 | 18.1 | CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | vie 3/05/24 | vie 3/05/24 | $ 19.519.320,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 176CC | | No | 0% |
| 192 | 18.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE DRY WALL DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | lun 20/05/24 | lun 27/05/24 | $ 0,00 | 8 días | M2 | 164,715 | 100% | 0 días | 132 | 193;215;213 | No | 0% |
| 193 | 18.3 | CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS) | mar 28/05/24 | mié 29/05/24 | $ 380.000,00 | 2 días | ML | 5 | 100% | 0 días | 192 | 194FF | No | 0% |
| 194 | 18.4 | CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO REPISA(0.05X0.10M) | mié 29/05/24 | mié 29/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 193FF | | No | 0% |
| 195 | **19** | **VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 7/05/24** | **mar 7/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 196 | 19.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 171 | 197 | No | 0% |
| 197 | 19.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 196 | 198 | No | 0% |
| 198 | 19.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 197 | | No | 0% |
| 199 | **20** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 7/05/24** | **dom 12/05/24** | **$ 3.455.711,00** | **5 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 200 | 20.1 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | dom 12/05/24 | dom 12/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 201 | | No | 0% |
| 201 | 20.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | dom 12/05/24 | dom 12/05/24 | $ 1.620.949,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 205 | 200;202CC;203CC;204 | No | 0% |
| 202 | 20.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | dom 12/05/24 | dom 12/05/24 | $ 399.762,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 201CC | | No | 0% |
| 203 | 20.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | dom 12/05/24 | dom 12/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 201CC | | No | 0% |
| 204 | 20.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1.07 Y 1.13 | dom 12/05/24 | dom 12/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 201 | | No | 0% |
| 205 | 20.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO. | vie 10/05/24 | dom 12/05/24 | $ 1.435.000,00 | 3 días | M2 | 25 | 100% | 0 días | 130 | 201 | No | 0% |
| 206 | 20.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 159 | | No | 0% |
| 207 | **21** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | **lun 27/05/24** | **lun 10/06/24** | **$ 4.303.000,00** | **15 días** | | | **89%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 208 | 21.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | vie 7/06/24 | lun 10/06/24 | $ 2.158.000,00 | 4 días | M2 | 260 | 75% | 0 días | 186FF | 209FF;210FF | No | 0% |
| 209 | 21.2 | DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO | lun 10/06/24 | lun 10/06/24 | $ 0,00 | 0 días | KG | | 0% | 20 días | 208FF | | No | 0% |
| 210 | 21.3 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC) | lun 27/05/24 | lun 10/06/24 | $ 2.145.000,00 | 15 días | KG | 1100 | 93% | 0 días | 208FF | | No | 0% |
| 211 | 22 | **ITEMS NO PREVISTOS** | **lun 27/05/24** | **sáb 29/06/24** | **$ 26.366.843,00** | **34 días?** | | | **42%** | **0 días?** | | | **No** | **0%** |
| 212 | NP | DESMONTE DE LAMPARAS Y REINSTALACIION DE LAMPARAS EXISTENTE TIPO LED 60 X 60 | lun 27/05/24 | sáb 29/06/24 | $ 216.000,00 | 34 días | UN | 12 | 41% | 0 días | 114FF | | No | 0% |
| 213 | NP | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE 60 X 60 TIPO LED | lun 27/05/24 | sáb 29/06/24 | $ 399.122,00 | 34 días | UN | 2 | 41% | 0 días | 192 | | No | 0% |
| 214 | NP | PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS PARA TECHOS | lun 27/05/24 | sáb 29/06/24 | $ 285.008,00 | 34 días | M2 | 177,03 | 41% | 0 días | 190 | | No | 0% |
| 215 | NP | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON BATIENTES O CORREDERAS, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 6 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO) | lun 27/05/24 | sáb 29/06/24 | $ 17.505.606,00 | 34 días | M2 | 29,97 | 41% | 0 días | 192 | 219FF;127 | No | 0% |
| 216 | 3.2.2.2 | DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, ANTICORROSIVO Y PINTURA , SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y | lun 27/05/24 | sáb 29/06/24 | $ 7.412.777,00 | 34 días? | | | 41% | 0 días? | | | No | 0% |
| 217 | 3.2.2.3 | CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS) | lun 27/05/24 | sáb 29/06/24 | $ 355.500,00 | 34 días? | | | 41% | 0 días? | | | No | 0% |
| 218 | 3.2.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINILO SPC | lun 27/05/24 | sáb 29/06/24 | $ 192.830,00 | 34 días? | | | 41% | 0 días? | | | No | 0% |
| 219 | NP | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO SPC NATURAL OAK | lun 27/05/24 | jue 30/05/24 | $ 0,00 | 4 días | M2 | 29,89 | 100% | 0 días | 215FF | | No | 0% |
| 220 | 23 | DIAGNÓSTICO | jue 2/05/24 | vie 3/05/24 | $ 1.323.875,00 | 2 días? | | | 100% | 0 días? | | | No | 0% |
| 221 | **3.2.2** | **COMPONENTES** | **jue 2/05/24** | **lun 24/06/24** | **$ 1.356.031,85** | **54 días?** | | | **46%** | **0 días?** | | | **No** | **0%** |
| 222 | 3.2.2.1 | COMPONENTE SOCIAL | jue 2/05/24 | lun 24/06/24 | $ 817.110,00 | 54 días? | | | 46% | 0 días? | | | No | 0% |
| 223 | 3.2.2.2 | COMPONENTE AMBIENTAL | jue 2/05/24 | lun 24/06/24 | $ 11.000,00 | 54 días? | | | 46% | 0 días? | | | No | 0% |
| 224 | 3.2.2.3 | COMPONENTE SST | jue 2/05/24 | lun 24/06/24 | $ 361.720,25 | 54 días? | | | 46% | 0 días? | | | No | 0% |
| 225 | 24 | COMPONENTE PMT | jue 2/05/24 | lun 24/06/24 | $ 166.201,60 | 54 días? | | | 46% | 0 días? | | | No | 0% |
| 226 | 3.3 | BEJAMIN HERRERA | mar 30/04/24 | dom 30/06/24 | $ 49.254.584,85 | 62 días? | | | 38% | 0 días? | | 339CC+10 días | Si | 0% |
| 227 | 1 | DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | mié 1/05/24 | jue 6/06/24 | $ 2.668.602,00 | 36 días | | | 100% | 0 días | | 252CC+5 días;242;247;244;257 | No | 0% |

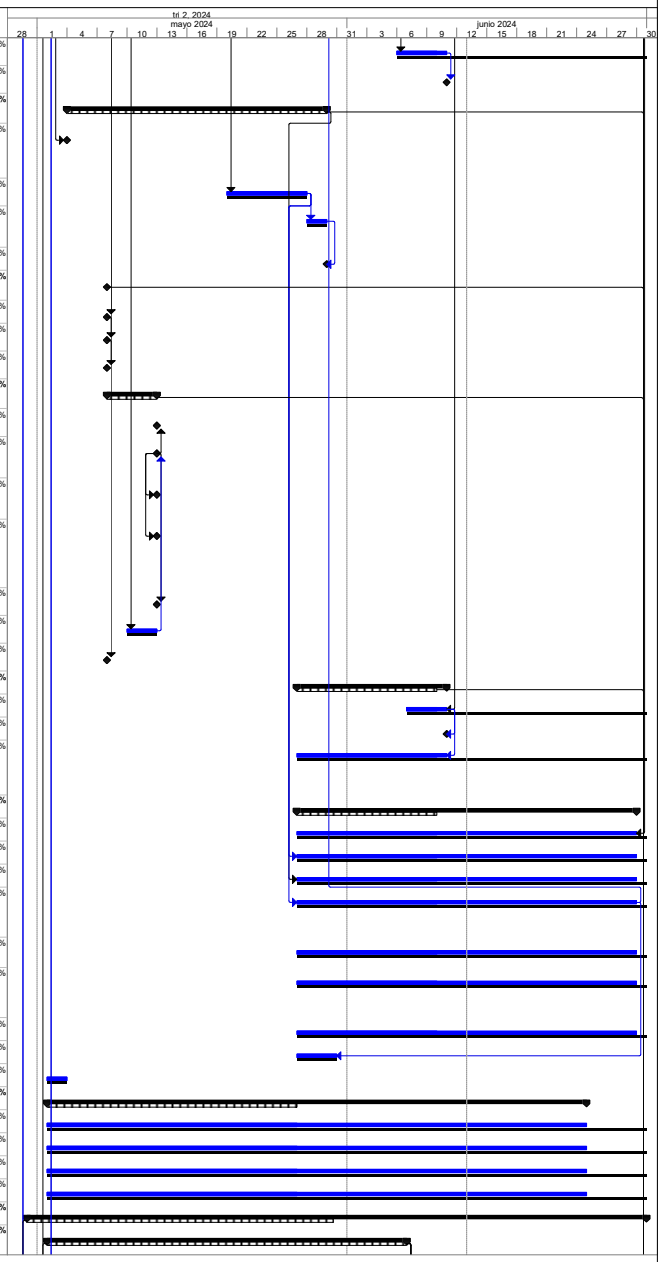


BRASCO INGENIERÍA SAS


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

# REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

| Id | ITEM | ACTIVIDAD | Comienzo | Fin | Costo | URACIÓ (DIAS) | UNIDAD | CANTIDA | % completado | Holgura | Predecesoras | Sucesoras | Ruta crítica | % físico completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 1,1 | DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 232 | | No | 0% |
| 229 | 1,2 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 232 | | No | 0% |
| 230 | 1,3 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | sáb 1/06/24 | mar 4/06/24 | $ 730.296,00 | 4 días | M2 | 45,36 | 100% | 0 días | 113CC+30 días | 234CC+1 día | No | 0% |
| 231 | 1,4 | DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 233 | | No | 0% |
| 232 | 1,5 | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 3CC+2 días | 228;229;236;233;235CC | No | 0% |
| 233 | 1,6 | DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 100% | 0 días | 232 | 231 | No | 0% |
| 234 | 1,7 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., ( | dom 2/06/24 | jue 6/06/24 | $ 1.938.306,00 | 5 días | M2 | 62,83 | 100% | 0 días | 230CC+1 día | | No | 0% |
| 235 | 1,8 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 232CC | | No | 0% |
| 236 | 1,9 | DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 232 | | No | 0% |
| 237 | **2** | **MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mié 1/05/24** | **mié 19/06/24** | **$ 1.462.945,00** | **49 días** | | | **0%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 238 | 2,1 | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLIUYE CAMBIO DE TEJAS | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 3 | 239 | No | 0% |
| 239 | 2,2 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS. | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 238 | | No | 0% |
| 240 | 2,3 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS | lun 10/06/24 | mié 19/06/24 | $ 1.462.945,00 | 10 días | M2 | 19,85 | 0% | 11 días | 244 | 273FF | No | 0% |
| 241 | 2,4 | Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS) | dom 9/06/24 | dom 9/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 244 | 248;249FF | No | 0% |
| 242 | 2,5 | Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 100% | 0 días | 227 | | No | 0% |
| 243 | **3** | **VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN** | **vie 7/06/24** | **dom 9/06/24** | **$ 48.060,00** | **3 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441;325** | **No** | **0%** |
| 244 | 3,1 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | vie 7/06/24 | dom 9/06/24 | $ 48.060,00 | 3 días | ML | 10,8 | 100% | 0 días | 227 | 241;240;319 | No | 0% |
| 245 | **4** | **MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **jue 6/06/24** | **dom 9/06/24** | **$ 110.000,00** | **3 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 246 | 4,1 | MURO EN BLOQUE HUECO No.4, tabique a pañetar | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 247CC | | No | 0% |
| 247 | 4,2 | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | $ 110.000,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 227 | 246CC;287 | No | 0% |
| 248 | 4,3 | LAVADO DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO AGUA A PRES | dom 9/06/24 | dom 9/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 241;249 | | No | 0% |
| 249 | 4,4 | TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYEPRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPE | dom 9/06/24 | dom 9/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 241FF | 248 | No | 0% |
| 250 | **5** | **REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 6/05/24** | **lun 6/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 251 | 5,1 | PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 252CC | 253CC | No | 0% |
| 252 | 5,2 | RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA). | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 227CC+5 días | 251CC;256 | No | 0% |
| 253 | 5,3 | MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084 | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | KG | | 100% | 0 días | 251CC | | No | 0% |
| 254 | **6** | **PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 6/05/24** | **mié 12/06/24** | **$ 2.116.489,00** | **37 días** | | | **50%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 255 | 6,1 | ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4 | vie 7/06/24 | vie 7/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 257CF | | No | 0% |
| 256 | 6,2 | ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3 | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 252 | 261 | No | 0% |
| 257 | 6,3 | ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm | vie 7/06/24 | mié 12/06/24 | $ 2.116.489,00 | 6 días | M2 | 57,672 | 50% | 0 días | 227 | 255CF;269 | No | 0% |
| 258 | **7** | **ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 6/05/24** | **lun 6/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 259 | 7,1 | Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido (PISOS) | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 260FF | | No | 0% |
| 260 | 7,2 | DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33X33 | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 261FF | 259FF;265CF | No | 0% |
| 261 | 7,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA, FILOS Y DILATACIONES Y PIRLAN EN BRONCE | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 256 | 260FF;262;266;267 | No | 0% |
| 262 | 7,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE. | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 261 | 263 | No | 0% |

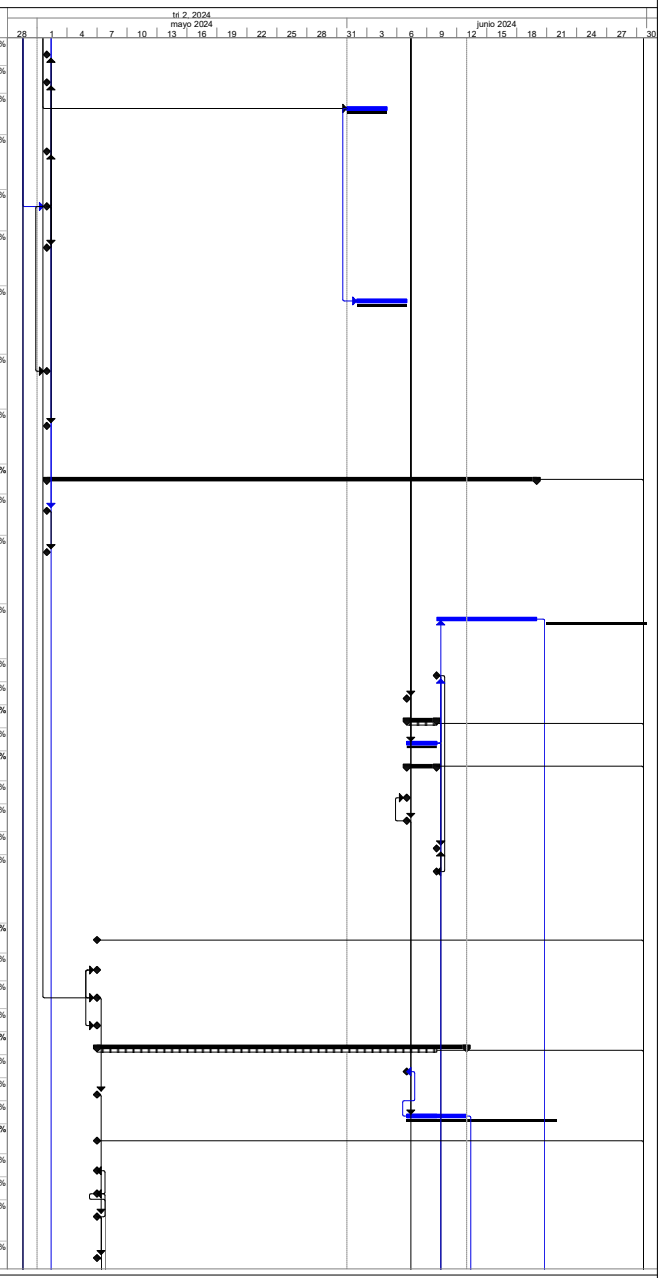


BRASCO INGENIERÍA SAS


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

# REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

| Id | ITEM | ACTIVIDAD | Comienzo | Fin | Costo | URACIÓ (DIAS) | UNIDAD | CANTIDA | % completado | Holgura | Predecesoras | Sucesoras | Ruta crítica | % físico completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 7,5 | WIN DE ALUMINIO | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | 0 | 100% | 0 días | 262 | 264FF | No | 0% |
| 264 | 7,6 | GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 263FF | | No | 0% |
| 265 | 7,7 | RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM. | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 260CF | | No | 0% |
| 266 | 7,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 261 | | No | 0% |
| 267 | 7,9 | ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 261 | | No | 0% |
| 268 | **8** | **MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **jue 13/06/24** | **mar 18/06/24** | **$ 4.419.837,00** | **6 días** | | | **0%** | **9 días** | | **441;292CC** | **No** | **0%** |
| 269 | 8,1 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX) | jue 13/06/24 | lun 17/06/24 | $ 4.377.197,00 | 5 días | M2 | 47,63 | 0% | 9 días | 257 | 270;279 | No | 0% |
| 270 | 8,2 | SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO | mar 18/06/24 | mar 18/06/24 | $ 42.640,00 | 1 día | ML | 5,2 | 0% | 12 días | 269 | | No | 0% |
| 271 | **9** | **CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 18/06/24** | **mié 19/06/24** | **$ 0,00** | **2 días** | | | **0%** | **11 días** | | **275FF;441** | **No** | **0%** |
| 272 | 9,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | mar 18/06/24 | mar 18/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 13 días | 273CC | | No | 0% |
| 273 | 9,2 | PASAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1/2" EN PINTURA ESMALTE COLOR GRIS GRAFITO. | mar 18/06/24 | mié 19/06/24 | $ 0,00 | 2 días | ML | 38,3 | 0% | 11 días | 240FF | 272CC | No | 0% |
| 274 | **10** | **CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mié 19/06/24** | **mié 19/06/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **0%** | **11 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 275 | 10,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO) | mié 19/06/24 | mié 19/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 11 días | 271FF | | No | 0% |
| 276 | **11** | **CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **vie 21/06/24** | **vie 21/06/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **0%** | **9 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 277 | 11,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDA | vie 21/06/24 | vie 21/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 9 días | 284 | | No | 0% |
| 278 | **12** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 18/06/24** | **vie 21/06/24** | **$ 1.044.800,00** | **4 días** | | | **0%** | **9 días** | | **441;285** | **No** | **0%** |
| 279 | 12,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE) | mar 18/06/24 | mié 19/06/24 | $ 534.800,00 | 2 días | UN | 1 | 0% | 9 días | 269 | 280 | No | 0% |
| 280 | 12,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) | jue 20/06/24 | vie 21/06/24 | $ 510.000,00 | 2 días | UN | 1 | 0% | 9 días | 279 | 281 | No | 0% |
| 281 | 12,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | vie 21/06/24 | vie 21/06/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 0% | 9 días | 280 | 282 | No | 0% |
| 282 | 12,4 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | vie 21/06/24 | vie 21/06/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 0% | 9 días | 281 | 283 | No | 0% |
| 283 | 12,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | vie 21/06/24 | vie 21/06/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 0% | 9 días | 282 | | No | 0% |
| 284 | **13** | **APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN** | **vie 21/06/24** | **vie 21/06/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **0%** | **9 días** | | **277;441;309** | **No** | **0%** |
| 285 | 13,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS | vie 21/06/24 | vie 21/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 9 días | 278 | | No | 0% |
| 286 | **14** | **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **jue 6/06/24** | **jue 6/06/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 287 | 14,1 | Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m ** | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 247 | 288CC;289 | No | 0% |
| 288 | 14,2 | Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m** | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 287CC | | No | 0% |
| 289 | 14,3 | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 287 | 290 | No | 0% |
| 290 | 14,4 | ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 289 | | No | 0% |
| 291 | **15** | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **jue 13/06/24** | **mié 19/06/24** | **$ 3.549.205,00** | **7 días** | | | **0%** | **2 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 292 | 15,1 | VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | jue 13/06/24 | mié 19/06/24 | $ 2.361.205,00 | 7 días | M2 | 113,751 | 0% | 2 días | 268CC | 293FF;294FF;295 | No | 0% |
| 293 | 15,2 | PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS | mar 18/06/24 | mié 19/06/24 | $ 1.188.000,00 | 2 días | ML | 71,28 | 0% | 11 días | 292FF | | No | 0% |
| 294 | 15,3 | PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | mié 19/06/24 | mié 19/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 11 días | 292FF | | No | 0% |
| 295 | 15,4 | Pintura acrílica Koraza 10 sobre losa / pañete | mié 19/06/24 | mié 19/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 2 días | 292 | 296 | No | 0% |
| 296 | 15,5 | PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | mié 19/06/24 | mié 19/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 2 días | 295 | 298 | No | 0% |
| 297 | **16** | **PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mié 19/06/24** | **mié 19/06/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **0%** | **2 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 298 | 16,1 | PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES | mié 19/06/24 | mié 19/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 2 días | 296 | 300 | No | 0% |
| 299 | **17** | **PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **jue 20/06/24** | **vie 28/06/24** | **$ 1.804.529,00** | **9 días** | | | **0%** | **2 días** | | **441;321FF** | **No** | **0%** |
| 300 | 17,1 | ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS | jue 20/06/24 | sáb 22/06/24 | $ 338.649,00 | 3 días | M2 | 14,38 | 0% | 2 días | 298 | 301 | No | 0% |
| 301 | 17,2 | ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA | dom 23/06/24 | lun 24/06/24 | $ 530.880,00 | 2 días | M2 | 25,28 | 0% | 2 días | 300 | 302 | No | 0% |

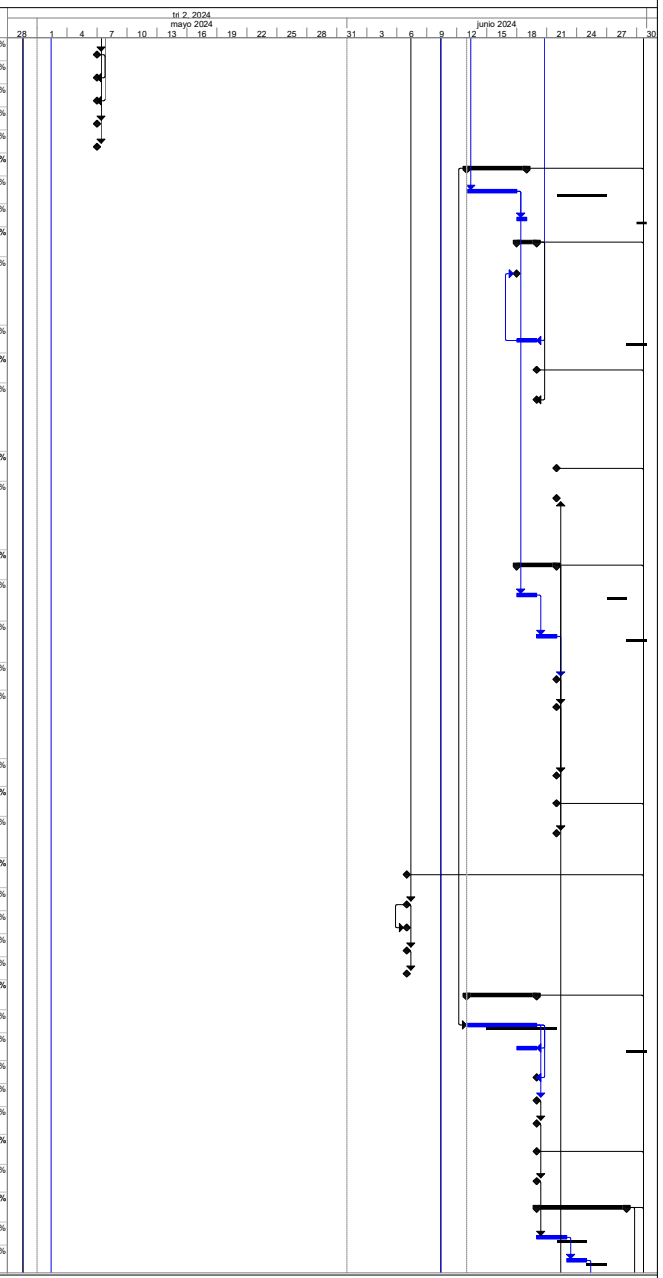


BRASCO INGENIERÍA SAS


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

# REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

| Id | ITEM | ACTIVIDAD | Comienzo | Fin | Costo | URACIÓ (DIAS) | UNIDAD | CANTIDA | % completado | Holgura | Predecesoras | Sucesoras | Ruta crítica | % físico completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 17,3 | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | mar 25/06/24 | vie 28/06/24 | $ 935.000,00 | 4 días | ML | 34 | 0% | 2 días | 301 | | No | 0% |
| 303 | **18** | **CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **dom 16/06/24** | **dom 30/06/24** | **$ 5.545.800,00** | **15 días** | | | **0%** | **0 días** | | **441** | **Si** | **0%** |
| 304 | 18,1 | CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | dom 16/06/24 | jue 27/06/24 | $ 5.545.800,00 | 12 días | M2 | 46,8 | 0% | 0 días | 312 | 305CC+3 días;306 | Si | 0% |
| 305 | 18,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE DRY WALL DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | mar 18/06/24 | mar 18/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 12 días | 304CC+3 días | | No | 0% |
| 306 | 18,3 | CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS) | vie 28/06/24 | dom 30/06/24 | $ 0,00 | 3 días | ML | 46,8 | 0% | 0 días | 304 | 307FF | Si | 0% |
| 307 | 18,4 | CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO REPISA(0.05X0.10M) | dom 30/06/24 | dom 30/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 0 días | 306FF | | Si | 0% |
| 308 | **19** | **VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **vie 21/06/24** | **vie 21/06/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **0%** | **9 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 309 | 19,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM | vie 21/06/24 | vie 21/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 0% | 9 días | 284 | 310 | No | 0% |
| 310 | 19,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO | vie 21/06/24 | vie 21/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 9 días | 309 | 311 | No | 0% |
| 311 | 19,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS | vie 21/06/24 | vie 21/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 0% | 9 días | 310 | | No | 0% |
| 312 | **20** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 10/06/24** | **sáb 15/06/24** | **$ 16.427.300,00** | **6 días** | | | **0%** | **0 días** | | **441;304** | **Si** | **0%** |
| 313 | 20,1 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | sáb 15/06/24 | sáb 15/06/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 0% | 0 días | 314 | | Si | 0% |
| 314 | 20,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | sáb 15/06/24 | sáb 15/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0,00 | 0% | 0 días | 318 | 313;315CC;317 | Si | 0% |
| 315 | 20,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | sáb 15/06/24 | sáb 15/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 0 días | 314CC | | Si | 0% |
| 316 | 20,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | sáb 15/06/24 | sáb 15/06/24 | $ 12.332.730,00 | 0 días | M2 | 57,67 | 0% | 0 días | 318 | | Si | 0% |
| 317 | 20,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1.07 Y 1.13 | sáb 15/06/24 | sáb 15/06/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 0% | 0 días | 314 | | Si | 0% |
| 318 | 20,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO. | jue 13/06/24 | sáb 15/06/24 | $ 3.310.258,00 | 3 días | M2 | 57,67 | 0% | 0 días | 319 | 314;316 | Si | 0% |
| 319 | 20,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR | lun 10/06/24 | mié 12/06/24 | $ 784.312,00 | 3 días | M2 | 57,67 | 0% | 0 días | 244 | 318 | Si | 0% |
| 320 | **21** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | **vie 14/06/24** | **vie 28/06/24** | **$ 3.780.149,00** | **15 días** | | | **0%** | **2 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 321 | 21,1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | mar 25/06/24 | vie 28/06/24 | $ 855.149,00 | 4 días | M2 | 103,03 | 0% | 2 días | 299FF | 322FF | No | 0% |
| 322 | 21,2 | DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO | vie 14/06/24 | vie 28/06/24 | $ 1.170.000,00 | 15 días | KG | 600 | 0% | 2 días | 321FF;325FF | 323FF | No | 0% |
| 323 | 21,3 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC) | vie 14/06/24 | vie 28/06/24 | $ 1.755.000,00 | 15 días | KG | 1000 | 0% | 2 días | 322FF | | No | 0% |
| 324 | **22** | **ITEMS NO PREVISTOS** | **mar 30/04/24** | **mar 11/06/24** | **$ 3.596.962,00** | **43 días?** | | | **33%** | **0 días?** | | **441** | **No** | **0%** |
| 325 | NP- | LAVADO Y DESINFEECION DE TANQUE 500 LTS | lun 10/06/24 | mar 11/06/24 | $ 269.482,00 | 2 días | UN | 1 | 0% | 19 días | 243 | 322FF | No | 0% |
| 326 | 3.3.2 | CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS) | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 3.327.480,00 | 1 día? | | | 100% | 0 días? | | | No | 0% |
| 327 | 23 | DIAGNÓSTICO | mar 30/04/24 | mié 1/05/24 | $ 1.323.875,00 | 2 días? | | | 100% | 0 días? | | | No | 0% |
| 328 | **3.3.2** | **COMPONENTES** | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | **$ 1.356.031,85** | **54 días?** | | | **50%** | **0 días?** | | | **No** | **0%** |
| 329 | 3.3.2 | COMPONENTE SOCIAL | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | $ 817.110,00 | 54 días? | | | 50% | 0 días? | | | No | 0% |
| 330 | 3.3.2 | COMPONENTE AMBIENTAL | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | $ 11.000,00 | 54 días? | | | 50% | 0 días? | | | No | 0% |
| 331 | 3.3.2 | COMPONENTE SST | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | $ 361.720,25 | 54 días? | | | 50% | 0 días? | | | No | 0% |
| 332 | 24 | COMPONENTE PMT | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | $ 166.201,60 | 54 días? | | | 50% | 0 días? | | | No | 0% |
| 333 | 3.3.2 | <Tarea nueva> | mar 30/04/24 | mar 30/04/24 | $ 0,00 | 1 día? | | | 100% | 0 días? | | | No | 0% |
| 334 | **3.4** | **LA AURORA NORTE** | **mar 30/04/24** | **sáb 29/06/24** | **$ 92.546.798,85** | **61 días?** | | | **50%** | **0 días?** | | | **No** | **0%** |
| 335 | **1** | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mié 1/05/24** | **sáb 18/05/24** | **$ 8.884.800,00** | **17 días** | | | **100%** | **0 días** | | **360CC+5 días;350;355;352** | **No** | **0%** |
| 336 | 1,1 | DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 340 | | No | 0% |
| 337 | 1,2 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 340 | | No | 0% |
| 338 | 1,3 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | lun 13/05/24 | lun 13/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 339 | | No | 0% |
| 339 | 1,4 | DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | dom 12/05/24 | lun 13/05/24 | $ 0,00 | 2 días | ML | 2 | 100% | 0 días | 226CC+10 días | 338;342CC | No | 0% |
| 340 | 1,5 | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 3CC+2 días | 336;337;344;341;343CC | No | 0% |

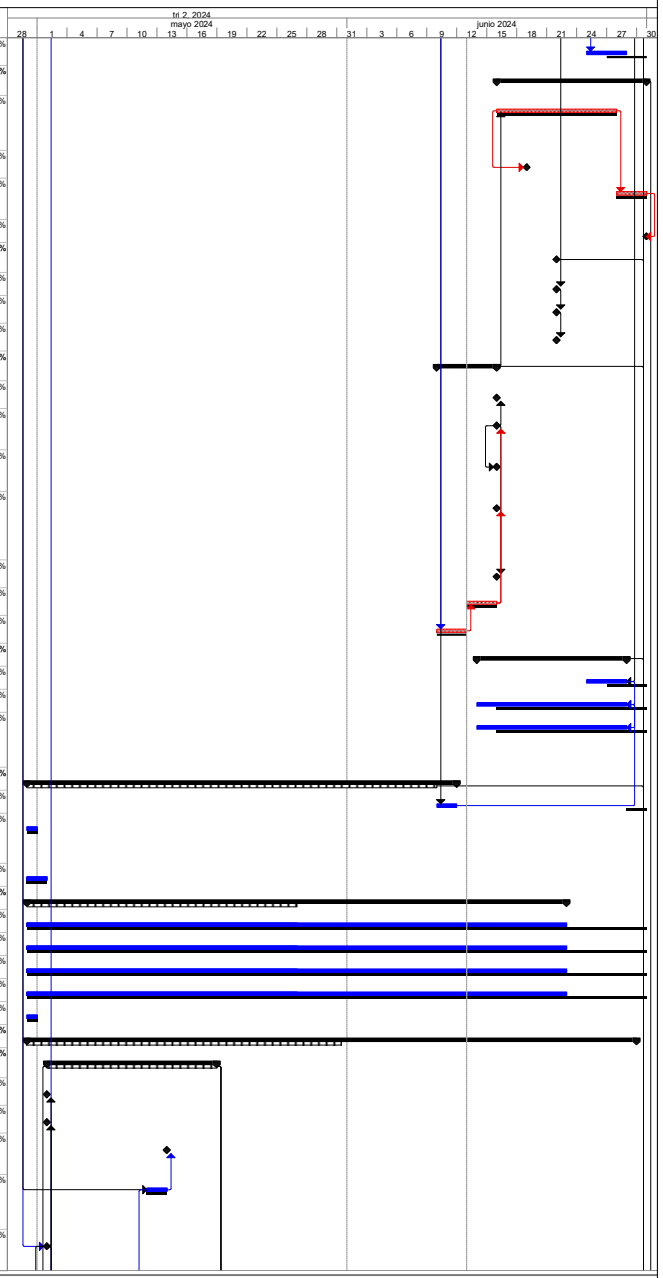


BRASCO INGENIERÍA SAS


Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea
División · Progreso de tarea · Línea de base · División de la línea de base
Hito de línea de base · Hito · Progreso del resumen · Resumen
Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual
Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo
Sólo fin · Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

# REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

| Id | ITEM | ACTIVIDAD | Comienzo | Fin | Costo | URACIÓ (DIAS) | UNIDAD | CANTIDA | % completado | Holgura | Predecesoras | Sucesoras | Ruta crítica | % físico completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1,6 | DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 100% | 0 días | 340 | | No | 0% |
| 342 | 1,7 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., ( | dom 12/05/24 | sáb 18/05/24 | $ 8.884.800,00 | 7 días | M2 | 288 | 100% | 0 días | 339CC | | No | 0% |
| 343 | 1,8 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 340CC | | No | 0% |
| 344 | 1,9 | DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 340 | | No | 0% |
| 345 | **2** | **MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mié 1/05/24** | **vie 24/05/24** | **$ 0,00** | **23 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 346 | 2,1 | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLIUYE CAMBIO DE TEJAS | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 3 | 347 | No | 0% |
| 347 | 2,2 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACION DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS. | mié 1/05/24 | mié 1/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 346 | | No | 0% |
| 348 | 2,3 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS | vie 24/05/24 | vie 24/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 356 | | No | 0% |
| 349 | 2,4 | Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS) | vie 24/05/24 | vie 24/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 352 | 356;357FF | No | 0% |
| 350 | 2,5 | Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT | sáb 18/05/24 | sáb 18/05/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 100% | 0 días | 335 | | No | 0% |
| 351 | **3** | **VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN** | **dom 19/05/24** | **vie 24/05/24** | **$ 115.700,00** | **6 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441;424** | **No** | **0%** |
| 352 | 3,1 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | dom 19/05/24 | vie 24/05/24 | $ 115.700,00 | 6 días | ML | 26 | 100% | 0 días | 335 | 349;434 | No | 0% |
| 353 | **4** | **MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **sáb 18/05/24** | **vie 24/05/24** | **$ 0,00** | **6 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 354 | 4,1 | MURO EN BLOQUE HUECO No.4, tabique a pañetar | sáb 18/05/24 | sáb 18/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 355CC | | No | 0% |
| 355 | 4,2 | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE | sáb 18/05/24 | sáb 18/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 335 | 354CC | No | 0% |
| 356 | 4,3 | LAVADO DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO AGUA A PRES | vie 24/05/24 | vie 24/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 349;357 | 348 | No | 0% |
| 357 | 4,4 | TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYEPRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPE | vie 24/05/24 | vie 24/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 349FF | 356 | No | 0% |
| 358 | **5** | **REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 6/05/24** | **lun 6/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 359 | 5,1 | PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 360CC | 361CC | No | 0% |
| 360 | 5,2 | RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA). | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 335CC+5 días | 359CC;364 | No | 0% |
| 361 | 5,3 | MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084 | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | KG | | 100% | 0 días | 359CC | | No | 0% |
| 362 | **6** | **PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 6/05/24** | **lun 6/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 363 | 6,1 | ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4 | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 365CF | | No | 0% |
| 364 | 6,2 | ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3 | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 360 | 365CF;369 | No | 0% |
| 365 | 6,3 | ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 364CF | 363CF | No | 0% |
| 366 | **7** | **ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 6/05/24** | **lun 6/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 367 | 7,1 | Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido (PISOS) | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 368FF | | No | 0% |
| 368 | 7,2 | DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33X33 | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 369FF | 367FF;373CF | No | 0% |
| 369 | 7,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA, FILOS Y DILATACIONES Y PIRLAN EN BRONCE | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 364 | 368FF;370;374;375 | No | 0% |
| 370 | 7,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE. | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 369 | 371 | No | 0% |
| 371 | 7,5 | WIN DE ALUMINIO | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 370 | 372FF | No | 0% |
| 372 | 7,6 | GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 371FF | | No | 0% |
| 373 | 7,7 | RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM. | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 368CF | | No | 0% |
| 374 | 7,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 369 | | No | 0% |
| 375 | 7,9 | ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona | lun 6/05/24 | lun 6/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 369 | 377CC+1 día | No | 0% |
| 376 | **8** | **MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 7/05/24** | **mar 7/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 377 | 8,1 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX) | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 375CC+1 día | 378;387 | No | 0% |
| 378 | 8,2 | SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 377 | | No | 0% |

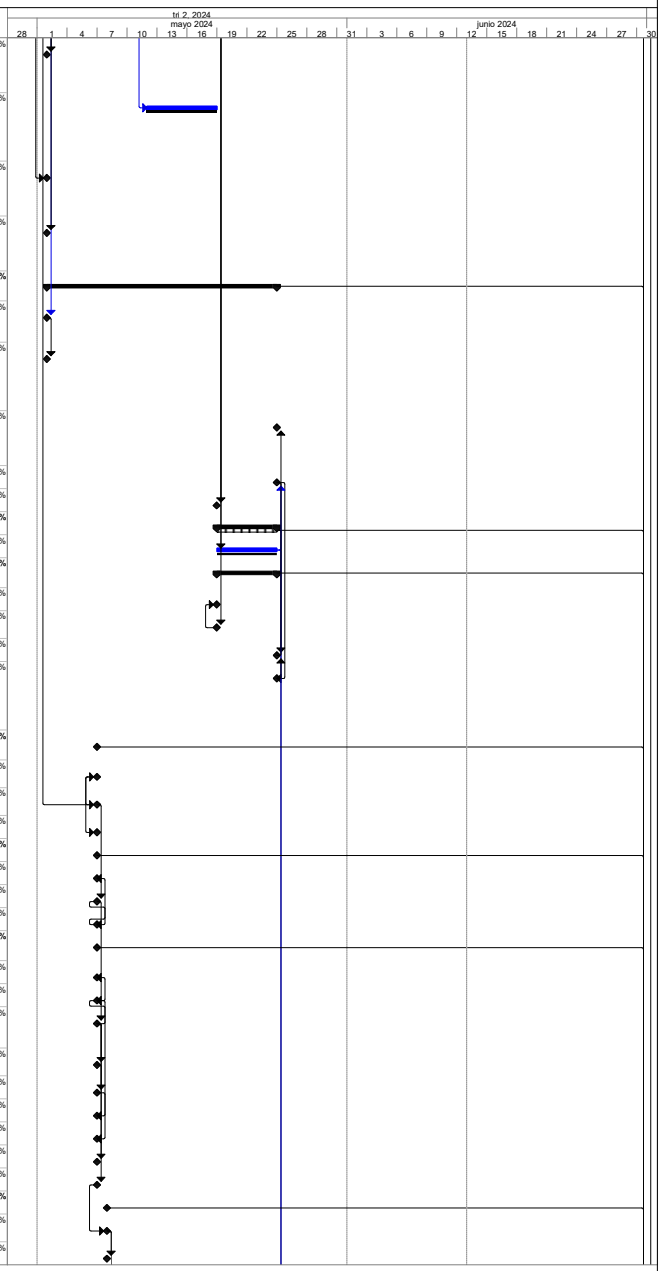


BRASCO INGENIERÍA SAS


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

# REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

| Id | ITEM | ACTIVIDAD | Comienzo | Fin | Costo | URACIÓ (DIAS) | UNIDAD | CANTIDA | % completado | Holgura | Predecesoras | Sucesoras | Ruta crítica | % físico completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | **9** | **CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 7/05/24** | **mar 7/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **383FF;441** | **No** | **0%** |
| 380 | 9,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 381CC | 427 | No | 0% |
| 381 | 9,2 | PASAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1/2" EN PINTURA ESMALTE COLOR GRIS GRAFITO. | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 384FF | 380CC | No | 0% |
| 382 | **10** | **CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 7/05/24** | **mar 7/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 383 | 10,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO) | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 379FF | | No | 0% |
| 384 | **11** | **CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 7/05/24** | **mar 7/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **381FF;441** | **No** | **0%** |
| 385 | 11,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDA | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 392 | | No | 0% |
| 386 | **12** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 7/05/24** | **mar 7/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441;393** | **No** | **0%** |
| 387 | 12,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE) | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 100% | 0 días | 377 | 388 | No | 0% |
| 388 | 12,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 100% | 0 días | 387 | 389 | No | 0% |
| 389 | 12,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 100% | 0 días | 388 | 390 | No | 0% |
| 390 | 12,4 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 389 | 391 | No | 0% |
| 391 | 12,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | UN | | 100% | 0 días | 390 | | No | 0% |
| 392 | **13** | **APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN** | **mar 7/05/24** | **mar 7/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **385;441;417** | **No** | **0%** |
| 393 | 13,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 386 | | No | 0% |
| 394 | **14** | **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 4/06/24** | **vie 7/06/24** | **$ 1.036.640,00** | **4 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 395 | 14,1 | Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m ** | mar 4/06/24 | vie 7/06/24 | $ 1.036.640,00 | 4 días | M2 | 24,8 | 100% | 0 días | 424 | 396CC;397;400 | No | 0% |
| 396 | 14,2 | Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m** | mar 4/06/24 | mar 4/06/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 395CC | | No | 0% |
| 397 | 14,3 | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | vie 7/06/24 | vie 7/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 395 | 398;412CC | No | 0% |
| 398 | 14,4 | ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO | vie 7/06/24 | vie 7/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 397 | | No | 0% |
| 399 | **15** | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **sáb 8/06/24** | **jue 20/06/24** | **$ 0,00** | **13 días** | | | **15%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 400 | 15,1 | VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | sáb 8/06/24 | lun 17/06/24 | $ 0,00 | 10 días | M2 | 425,5 | 20% | 0 días | 395 | 401;402FF;403 | No | 0% |
| 401 | 15,2 | PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS | mar 18/06/24 | jue 20/06/24 | $ 0,00 | 3 días | ML | 87 | 0% | 10 días | 400 | | No | 0% |
| 402 | 15,3 | PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | lun 17/06/24 | lun 17/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 13 días | 400FF | | No | 0% |
| 403 | 15,4 | Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete | lun 17/06/24 | lun 17/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 13 días | 400 | 404 | No | 0% |
| 404 | 15,5 | PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | lun 17/06/24 | lun 17/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 13 días | 403 | 406 | No | 0% |
| 405 | **16** | **PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 17/06/24** | **lun 17/06/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **0%** | **13 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 406 | 16,1 | PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES. | lun 17/06/24 | lun 17/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 13 días | 404 | 408 | No | 0% |
| 407 | **17** | **PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **lun 17/06/24** | **lun 17/06/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **0%** | **13 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 408 | 17,1 | ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS | lun 17/06/24 | lun 17/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 13 días | 406 | 409 | No | 0% |
| 409 | 17,2 | ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA | lun 17/06/24 | lun 17/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 13 días | 408 | 410 | No | 0% |
| 410 | 17,3 | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | lun 17/06/24 | lun 17/06/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 0% | 13 días | 409 | | No | 0% |
| 411 | **18** | **CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **vie 7/06/24** | **mar 25/06/24** | **$ 0,00** | **18 días** | | | **0%** | **0 días** | | **441;429** | **No** | **0%** |
| 412 | 18,1 | CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | vie 7/06/24 | vie 7/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 397CC | | No | 0% |
| 413 | 18,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE DRY WALL DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | mar 11/06/24 | sáb 22/06/24 | $ 0,00 | 12 días | M2 | 248,9 | 0% | 1 día | 433 | 414 | No | 0% |
| 414 | 18,3 | CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS) | dom 23/06/24 | mar 25/06/24 | $ 0,00 | 3 días | ML | 23,5 | 0% | 1 día | 413 | 415FF | No | 0% |

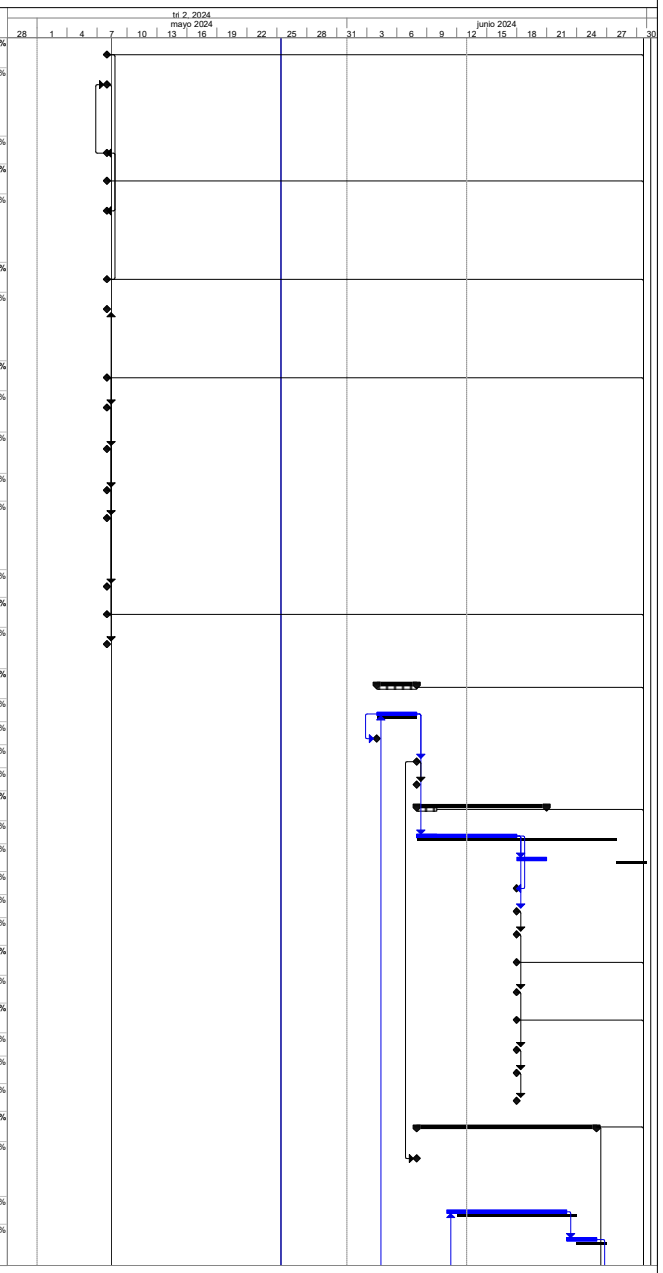


BRASCO INGENIERÍA SAS


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

# REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

| Id | ITEM | ACTIVIDAD | Comienzo | Fin | Costo | URACIÓ (DIAS) | UNIDAD | CANTIDA | % completado | Holgura | Predecesoras | Sucesoras | Ruta crítica | % físico completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 18,4 | CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO REPISA(0.05X0.10M) | mar 25/06/24 | mar 25/06/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 0% | 1 día | 414FF | | No | 0% |
| 416 | **19** | **VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 7/05/24** | **mar 7/05/24** | **$ 0,00** | **0 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 417 | 19,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 392 | 418 | No | 0% |
| 418 | 19,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 417 | 419 | No | 0% |
| 419 | 19,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 418 | | No | 0% |
| 420 | **20** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **mar 7/05/24** | **mié 5/06/24** | **$ 66.944.700,00** | **29 días** | | | **100%** | **0 días** | | **441** | **No** | **0%** |
| 421 | 20,1 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | ML | | 100% | 0 días | 422 | | No | 0% |
| 422 | 20,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 426 | 421;423CC | No | 0% |
| 423 | 20,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 422CC | | No | 0% |
| 424 | 20,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | sáb 25/05/24 | lun 3/06/24 | $ 65.438.100,00 | 10 días | M2 | 306 | 100% | 0 días | 351 | 425;433;395 | No | 0% |
| 425 | 20,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1.07 Y 1.13 | mar 4/06/24 | mié 5/06/24 | $ 1.506.600,00 | 2 días | ML | 18 | 100% | 0 días | 424 | | No | 0% |
| 426 | 20,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO. | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | 0 | 100% | 0 días | 427CC | 422 | No | 0% |
| 427 | 20,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR | mar 7/05/24 | mar 7/05/24 | $ 0,00 | 0 días | M2 | | 100% | 0 días | 380 | 426CC | No | 0% |
| 428 | **21** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | **sáb 15/06/24** | **sáb 29/06/24** | **$ 10.671.168,00** | **15 días** | | | **0%** | **1 día** | | **441** | **No** | **0%** |
| 429 | 21,1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | mié 26/06/24 | sáb 29/06/24 | $ 2.830.300,00 | 4 días | M2 | 260 | 0% | 1 día | 411 | 430FF | No | 0% |
| 430 | 21,2 | DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO | sáb 29/06/24 | sáb 29/06/24 | $ 0,00 | 0 días | KG | | 0% | 1 día | 429FF;433FF | 431FF | No | 0% |
| 431 | 21,3 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC) | sáb 15/06/24 | sáb 29/06/24 | $ 7.840.868,00 | 15 días | KG | 4000 | 0% | 1 día | 430FF | | No | 0% |
| 432 | **22** | **ITEMS NO PREVISTOS** | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | **$ 4.893.790,85** | **54 días?** | | | **52%** | **0 días?** | | **441** | **No** | **0%** |
| 433 | NP-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DEPOLICARBONATO | mar 4/06/24 | lun 10/06/24 | $ 2.213.884,00 | 7 días | M2 | 24 | 86% | 0 días | 424 | 430FF;413 | No | 0% |
| 434 | NP | LAVADO Y DESINFEECION DE TANQUE 500 LTS | sáb 25/05/24 | dom 26/05/24 | $ 0,00 | 2 días | UN | 1 | 100% | 0 días | 352 | | No | 0% |
| 435 | 23 | DIAGNÓSTICO | mar 30/04/24 | mié 1/05/24 | $ 1.323.875,00 | 2 días? | | | 100% | 0 días? | | | No | 0% |
| 436 | **3.4.2** | **COMPONENTES** | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | **$ 1.356.031,85** | **54 días?** | | | **50%** | **0 días?** | | | **No** | **0%** |
| 437 | 3.4.2 | COMPONENTE SOCIAL | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | $ 817.110,00 | 54 días? | | | 50% | 0 días? | | | No | 0% |
| 438 | 3.4.2 | COMPONENTE AMBIENTAL | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | $ 11.000,00 | 54 días? | | | 50% | 0 días? | | | No | 0% |
| 439 | 3.4.2 | COMPONENTE SST | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | $ 361.720,25 | 54 días? | | | 50% | 0 días? | | | No | 0% |
| 440 | 24 | COMPONENTE PMT | **mar 30/04/24** | **sáb 22/06/24** | $ 166.201,60 | 54 días? | | | 50% | 0 días? | | | No | 0% |
| 441 | FIN | **FIN DEL PROYECTO.** | dom 30/06/24 | dom 30/06/24 | $ 0,00 | 0 días | | | 0% | 0 días | 22;24;29;37;50;53;65;8 | | Sí | 0% |

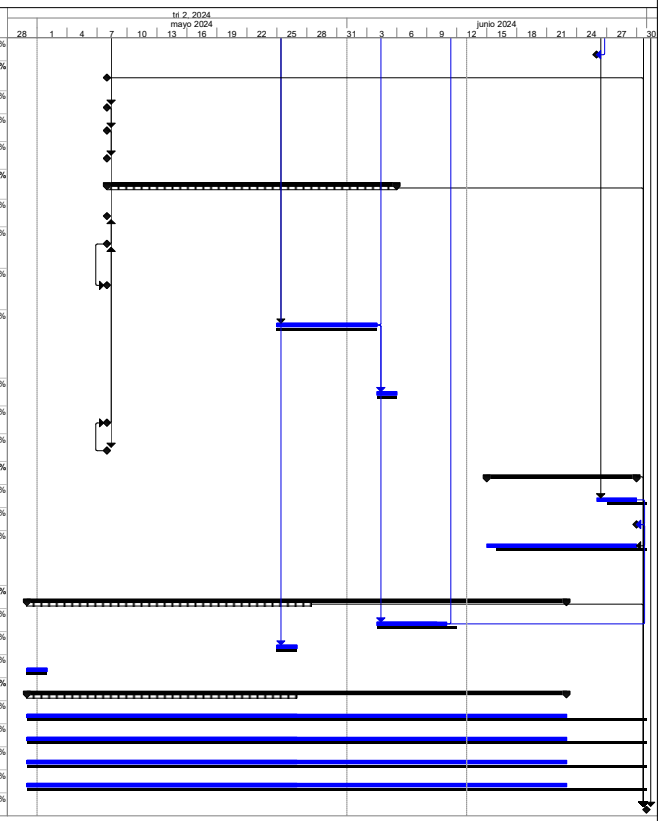



BRASCO INGENIERÍA SAS

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

**REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.**

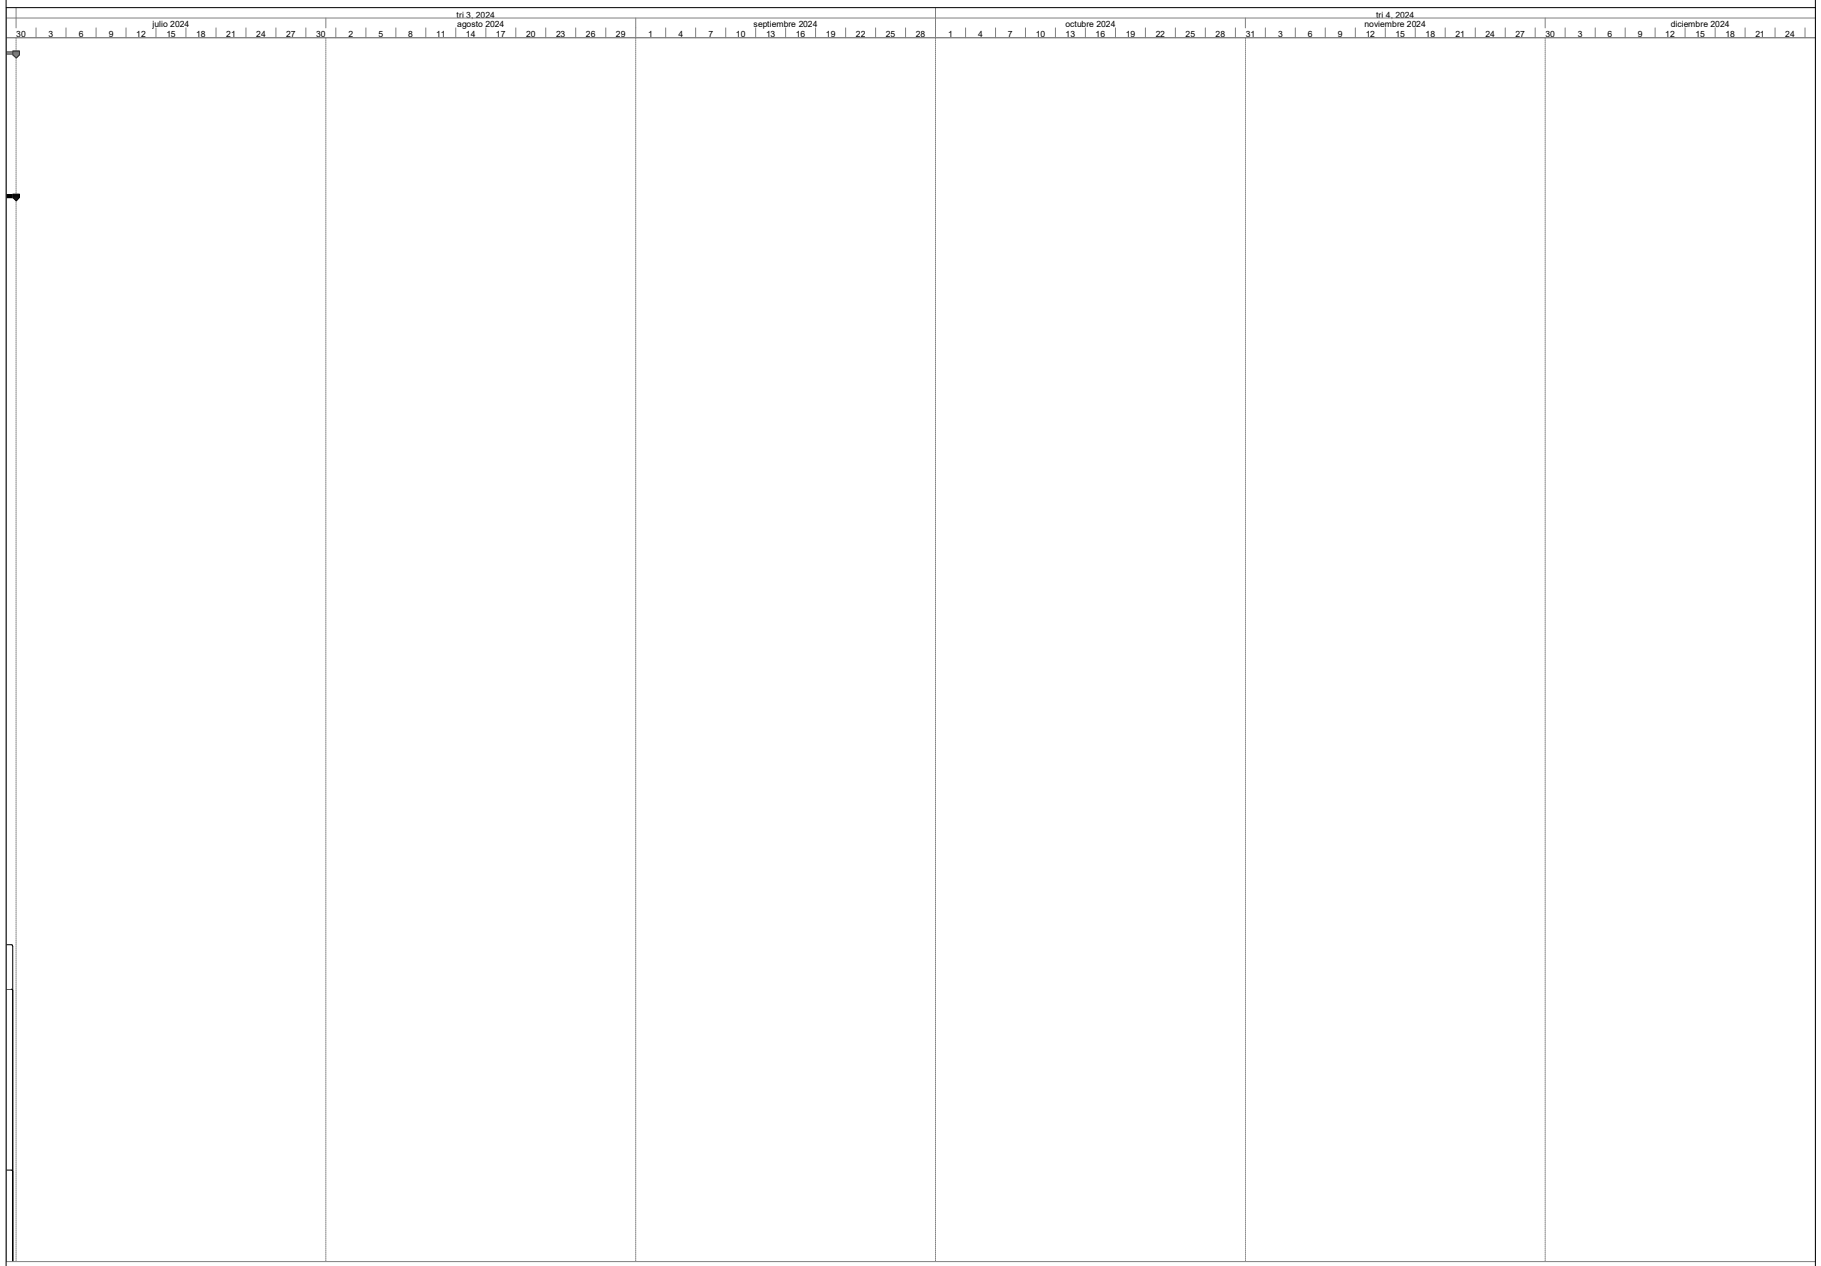



BRASCO INGENIERÍA SAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | División | Hito de línea de base | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Sólo duración | Sólo fin | | | |
| División crítica | Progreso de tarea | Hito | Tareas externas | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Fecha límite | | | |
| Progreso de tarea crítica | Línea de base | Progreso del resumen | Hito externo | Resumen inactivo | Resumen manual | | | | |
| Tarea | División de la línea de base | Resumen | PLAZOS TARDÍOS | Tarea manual | Sólo el comienzo | | | | |

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

**REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.**

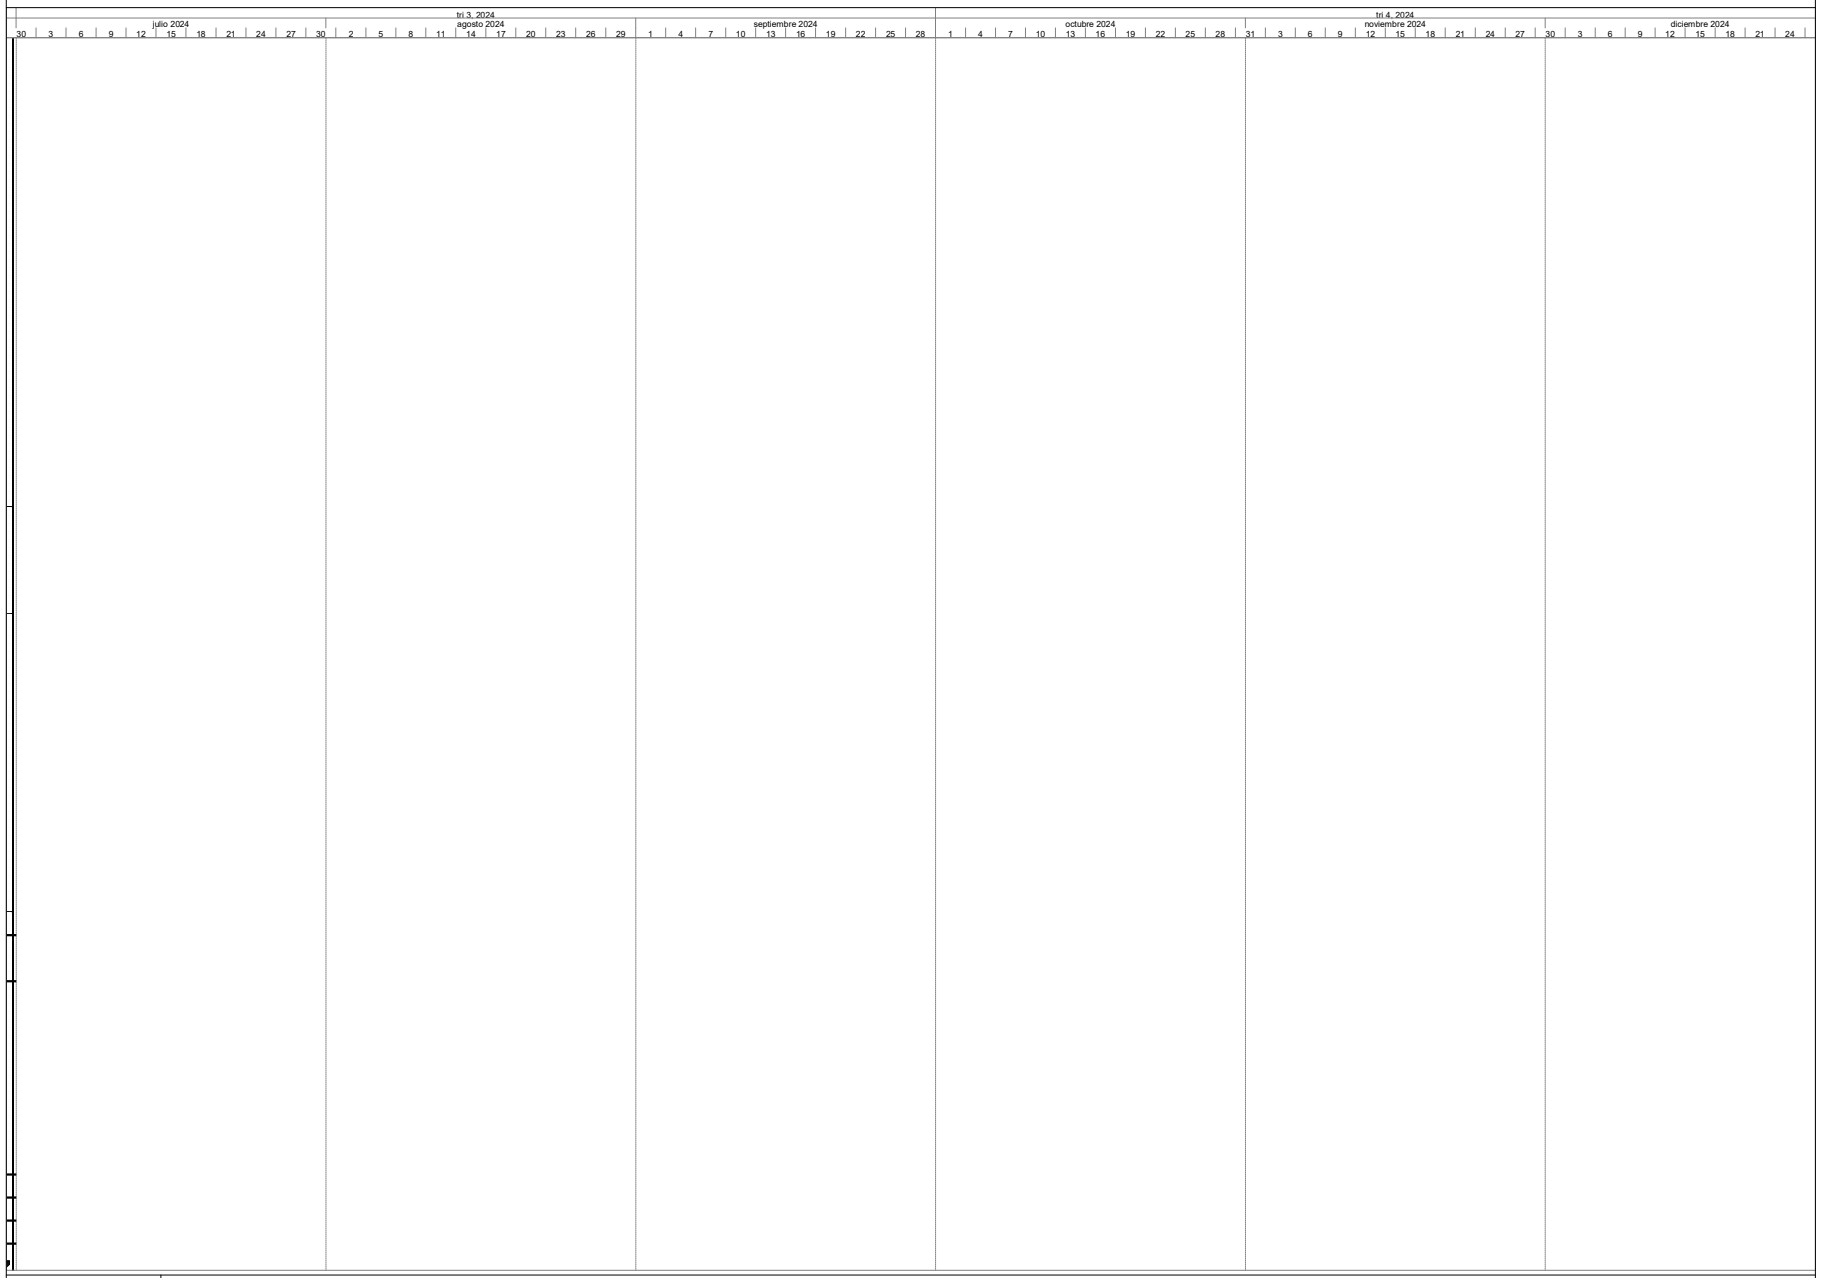



BRASCO INGENIERÍA SAS

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

**REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.**

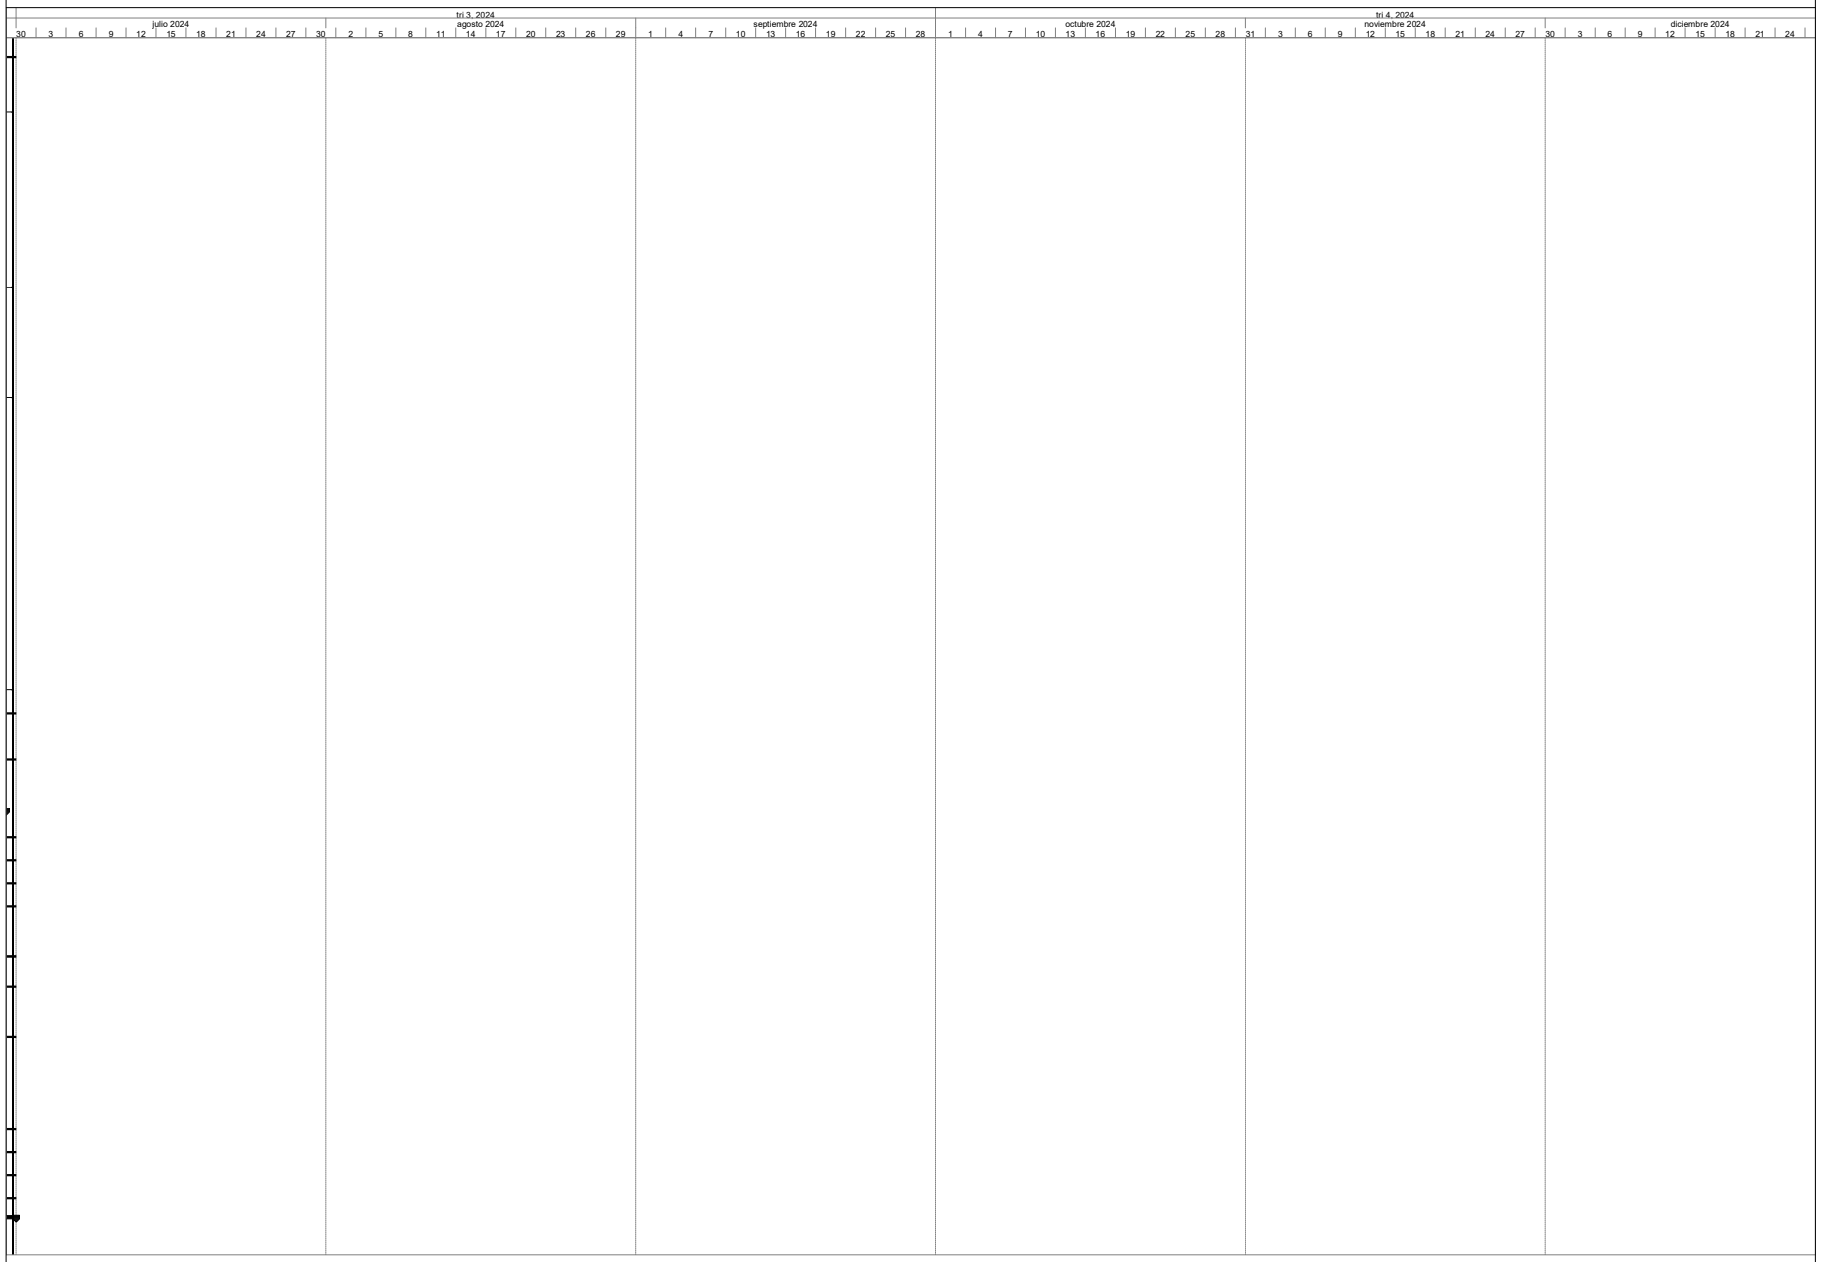



BRASCO INGENIERÍA SAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | División | Hito de línea de base | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Sólo duración | Sólo fin | | | |
| División crítica | Progreso de tarea | Hito | Tareas externas | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Fecha límite | | | |
| Progreso de tarea crítica | Línea de base | Progreso del resumen | Hito externo | Resumen inactivo | Resumen manual | | | | |
| Tarea | División de la línea de base | Resumen | PLAZOS TARDÍOS | Tarea manual | Sólo el comienzo | | | | |

**LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.**

**VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024**

**REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.**

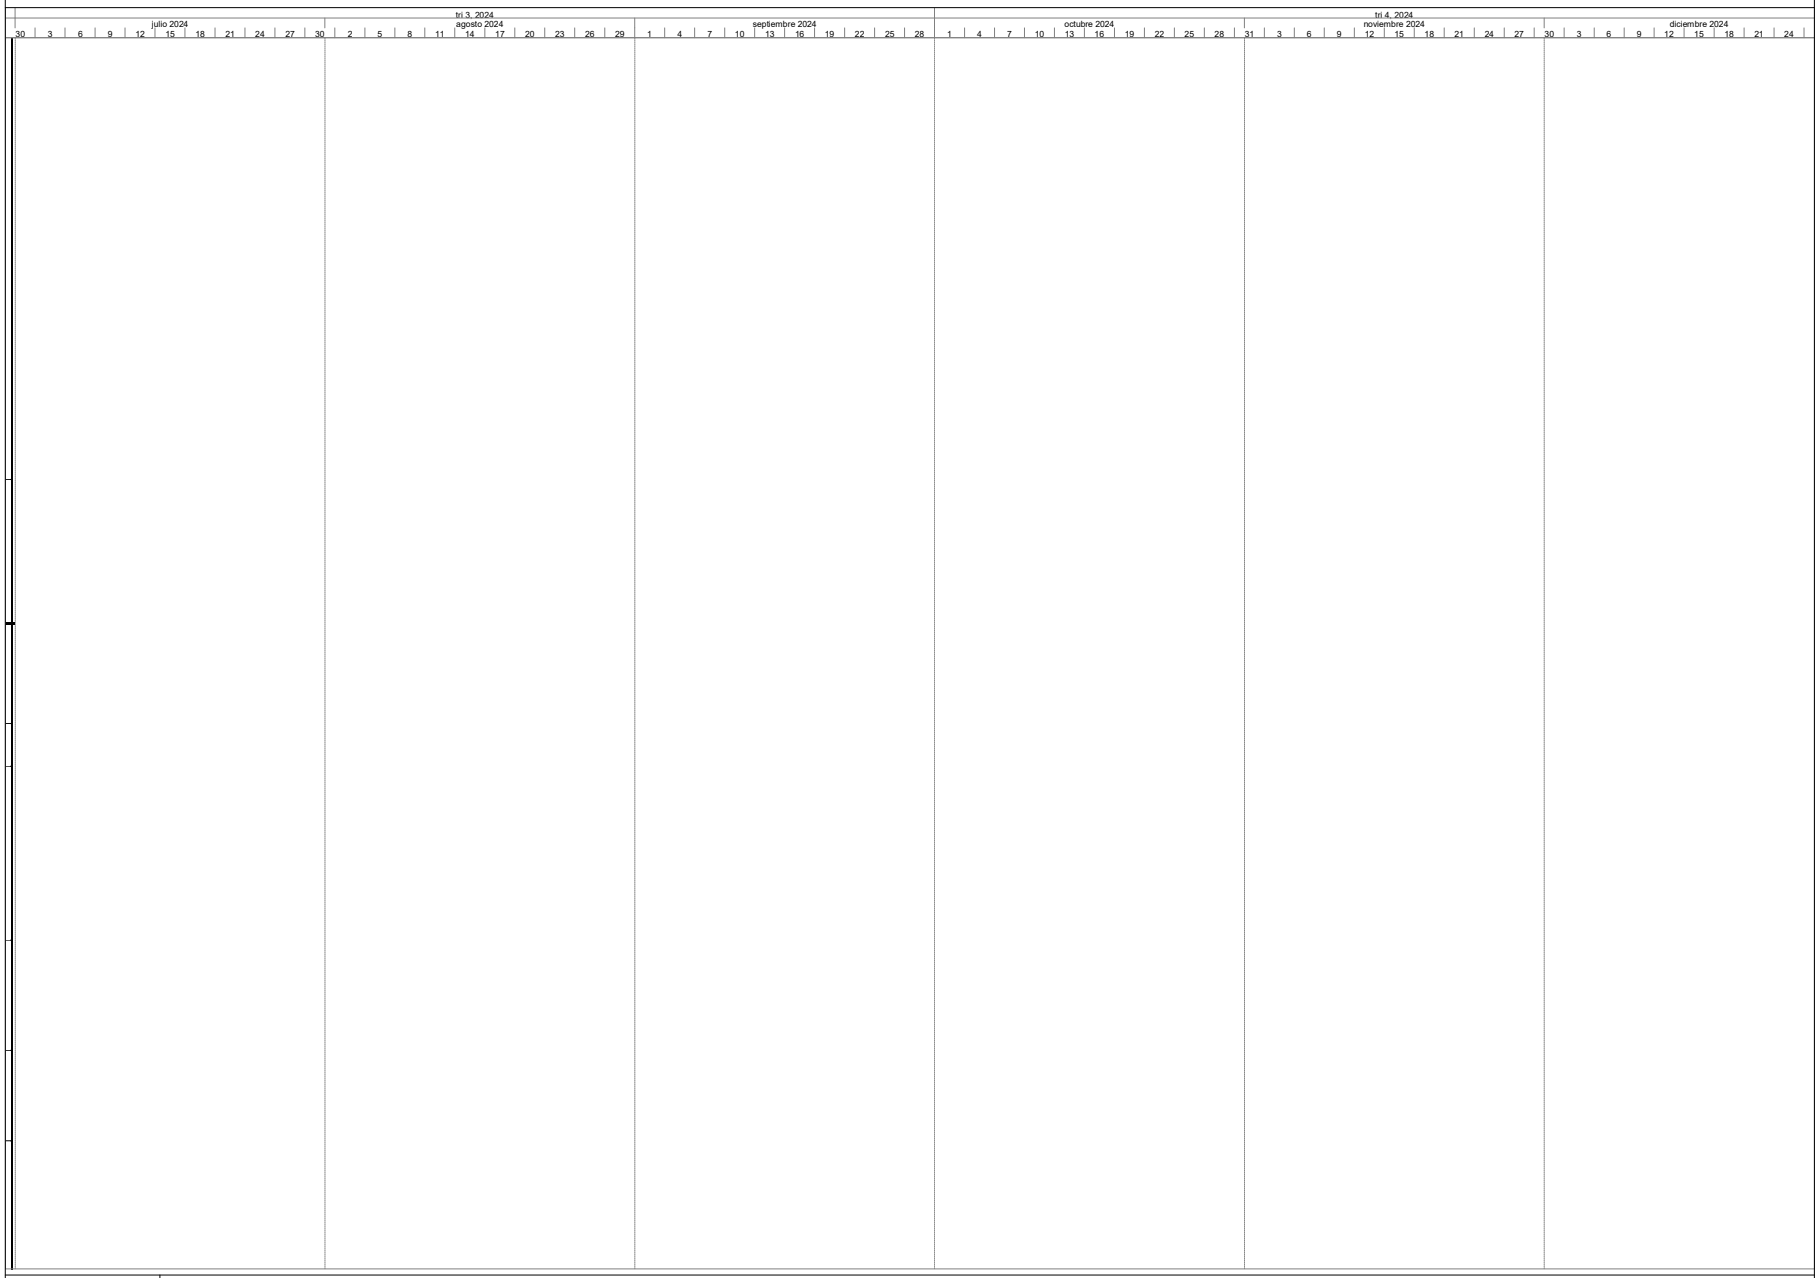



BRASCO INGENIERÍA SAS

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

**REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.**

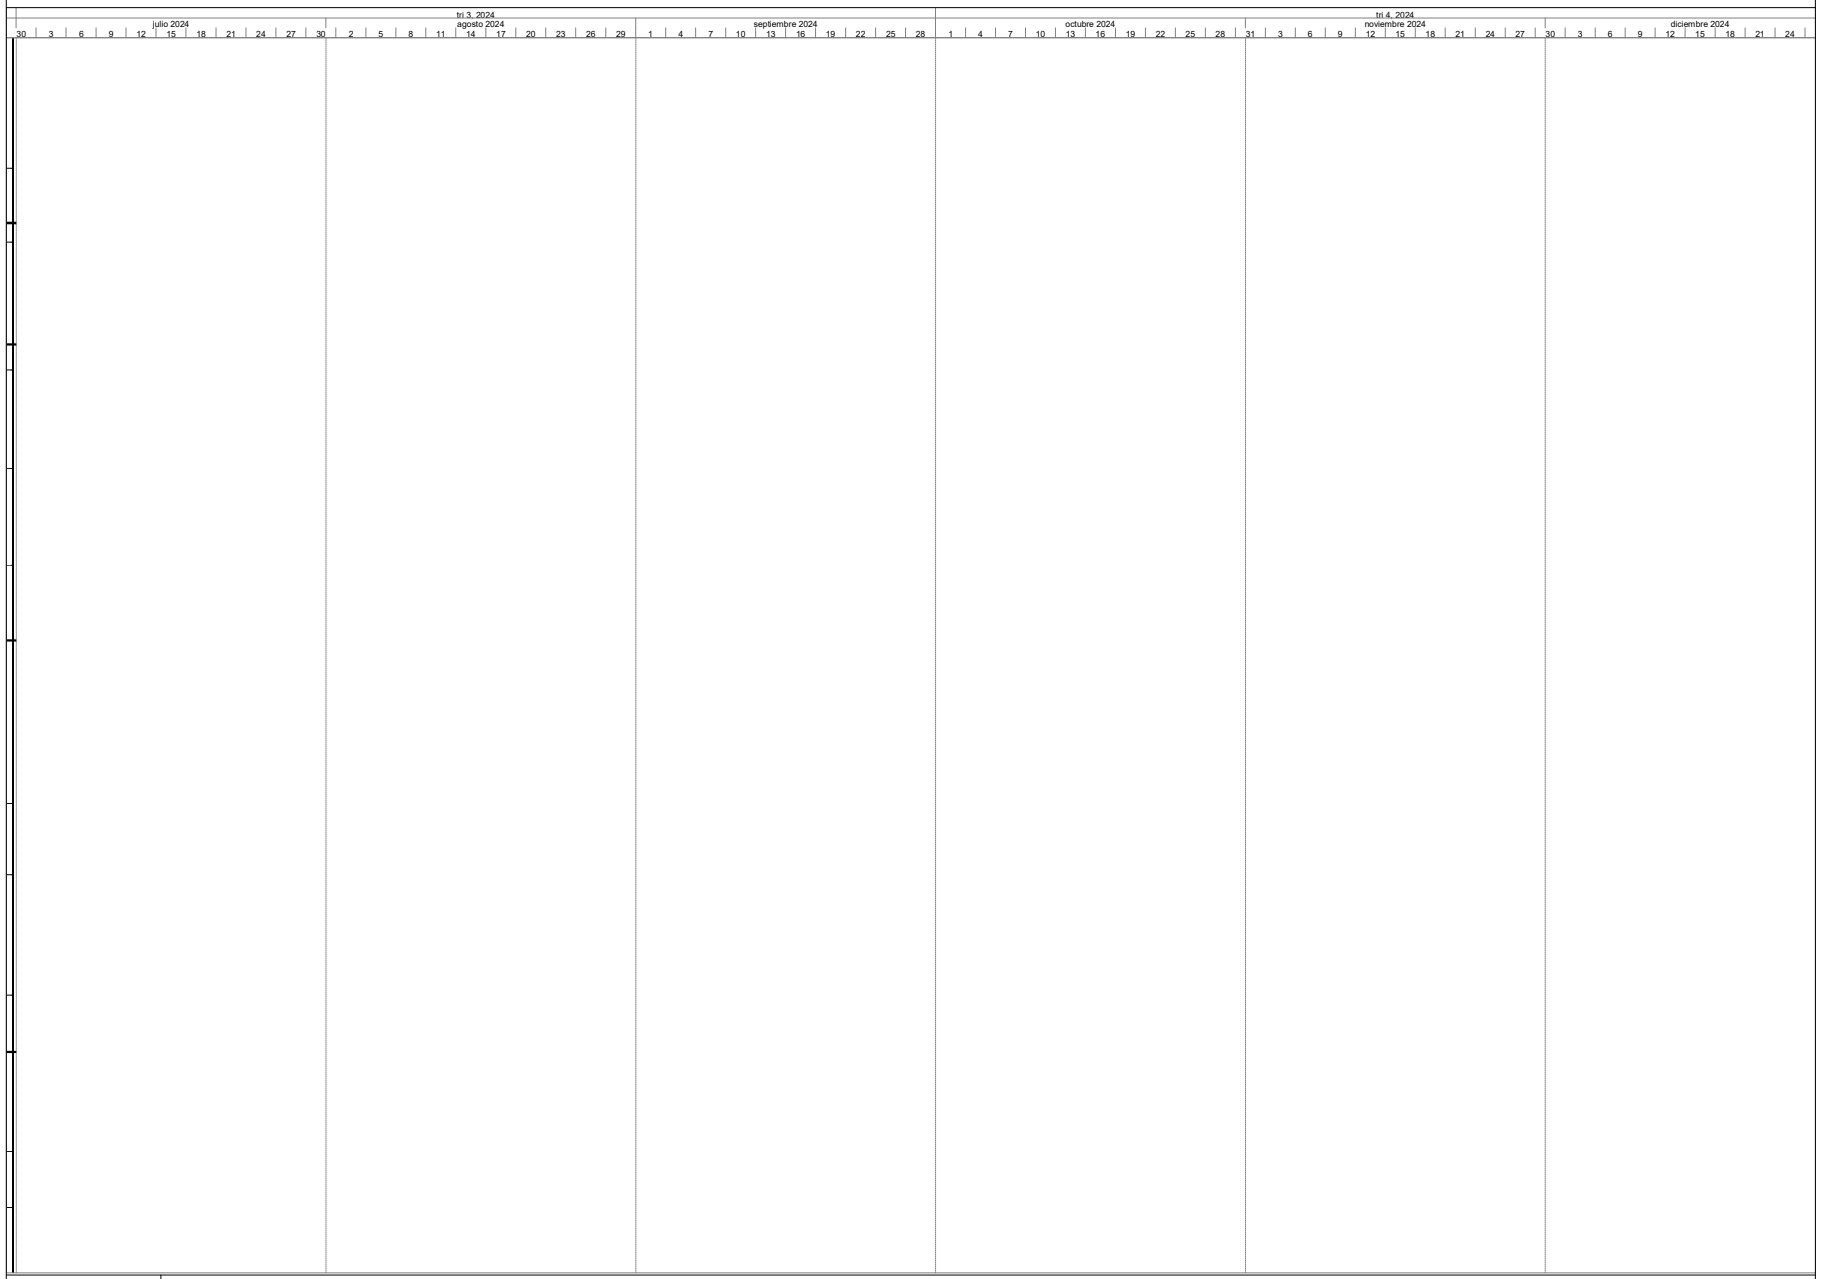



BRASCO INGENIERÍA SAS

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

**REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.**

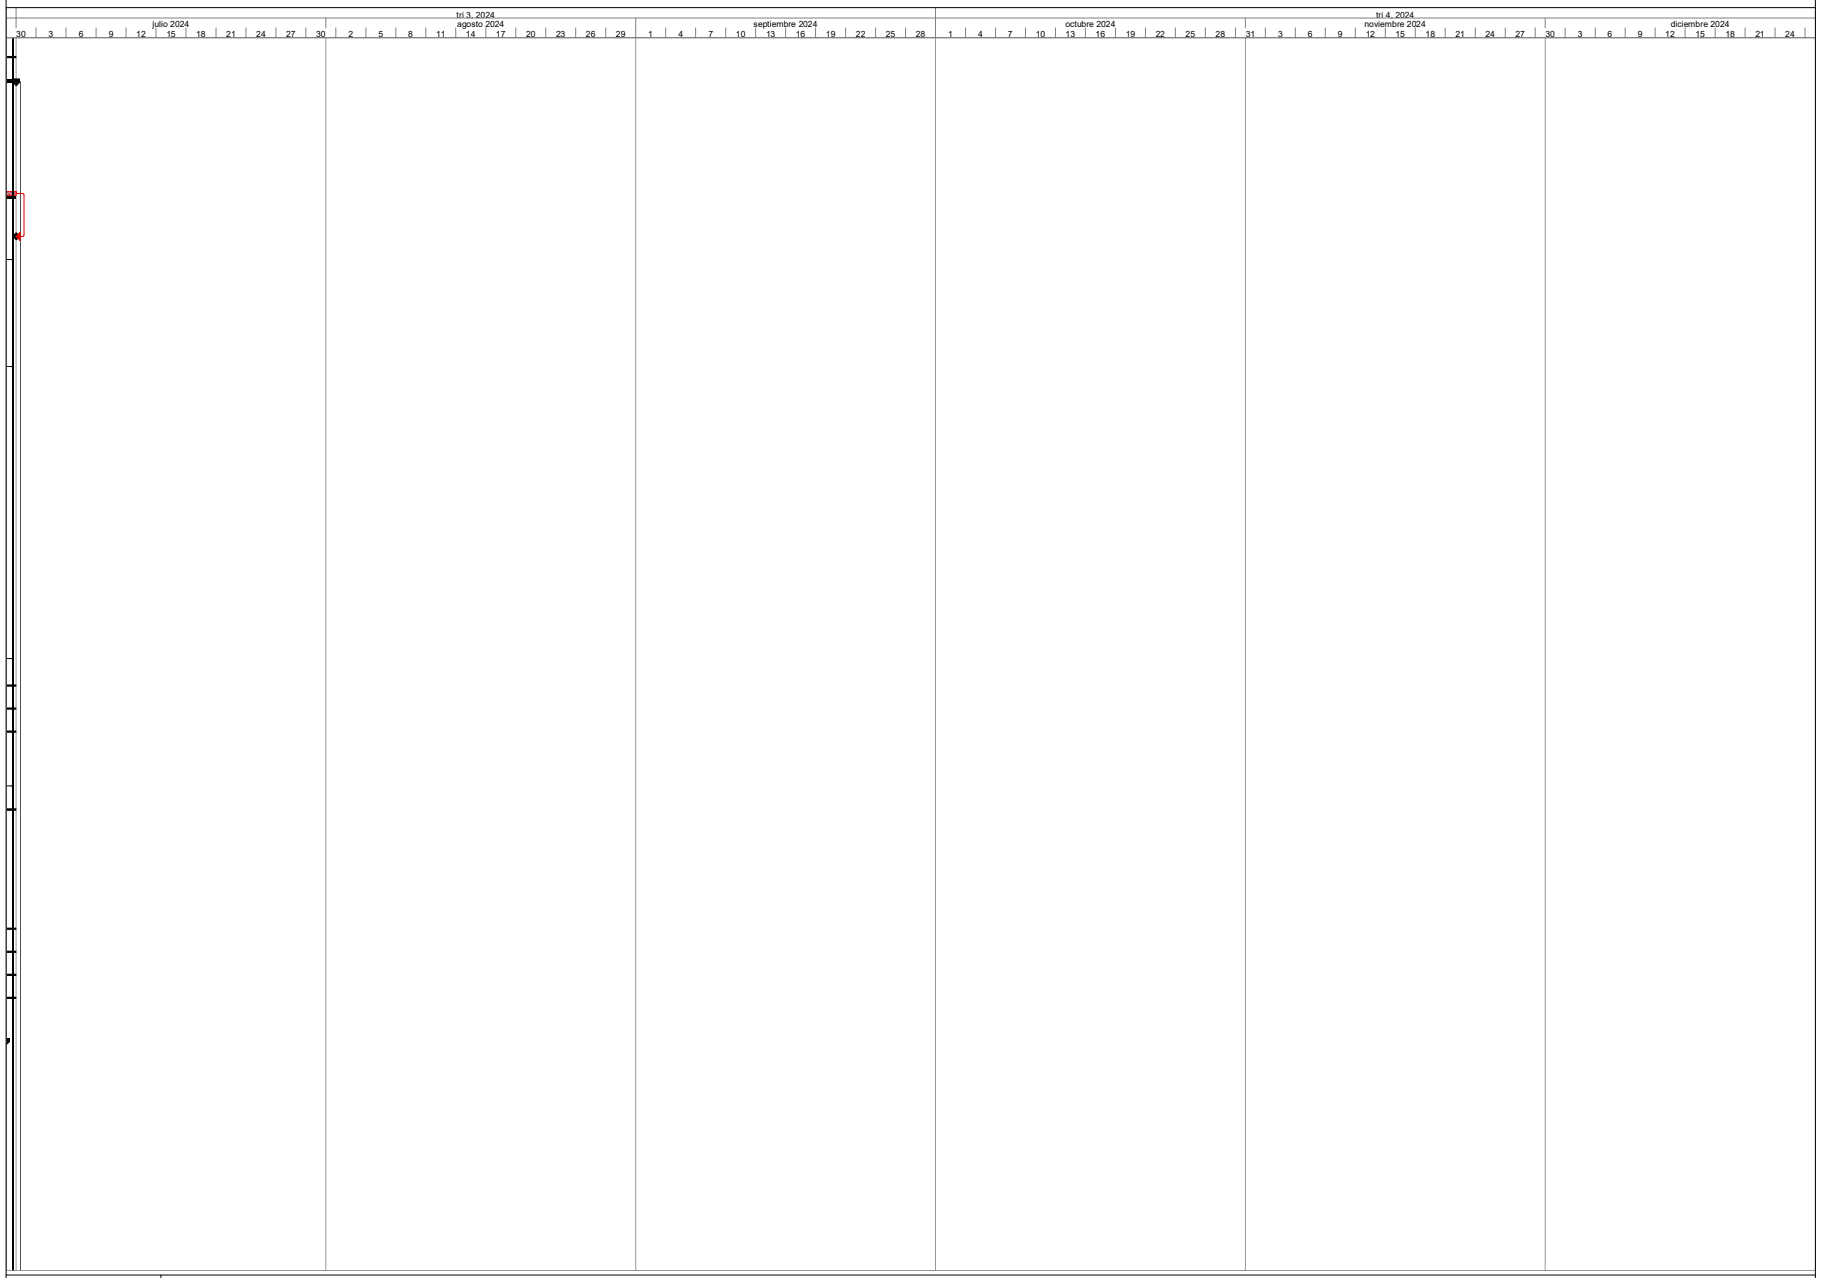


BRASCO INGENIERÍA SAS

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base
Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

**REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.**





BRASCO INGENIERÍA SAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | División | Hito de línea de base | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Sólo duración | Sólo fin | | | |
| División crítica | Progreso de tarea | Hito | Tareas externas | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Fecha límite | | | |
| Progreso de tarea crítica | Línea de base | Progreso del resumen | Hito externo | Resumen inactivo | Resumen manual | | | | |
| Tarea | División de la línea de base | Resumen | PLAZOS TARDÍOS | Tarea manual | Sólo el comienzo | | | | |

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

**REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.**

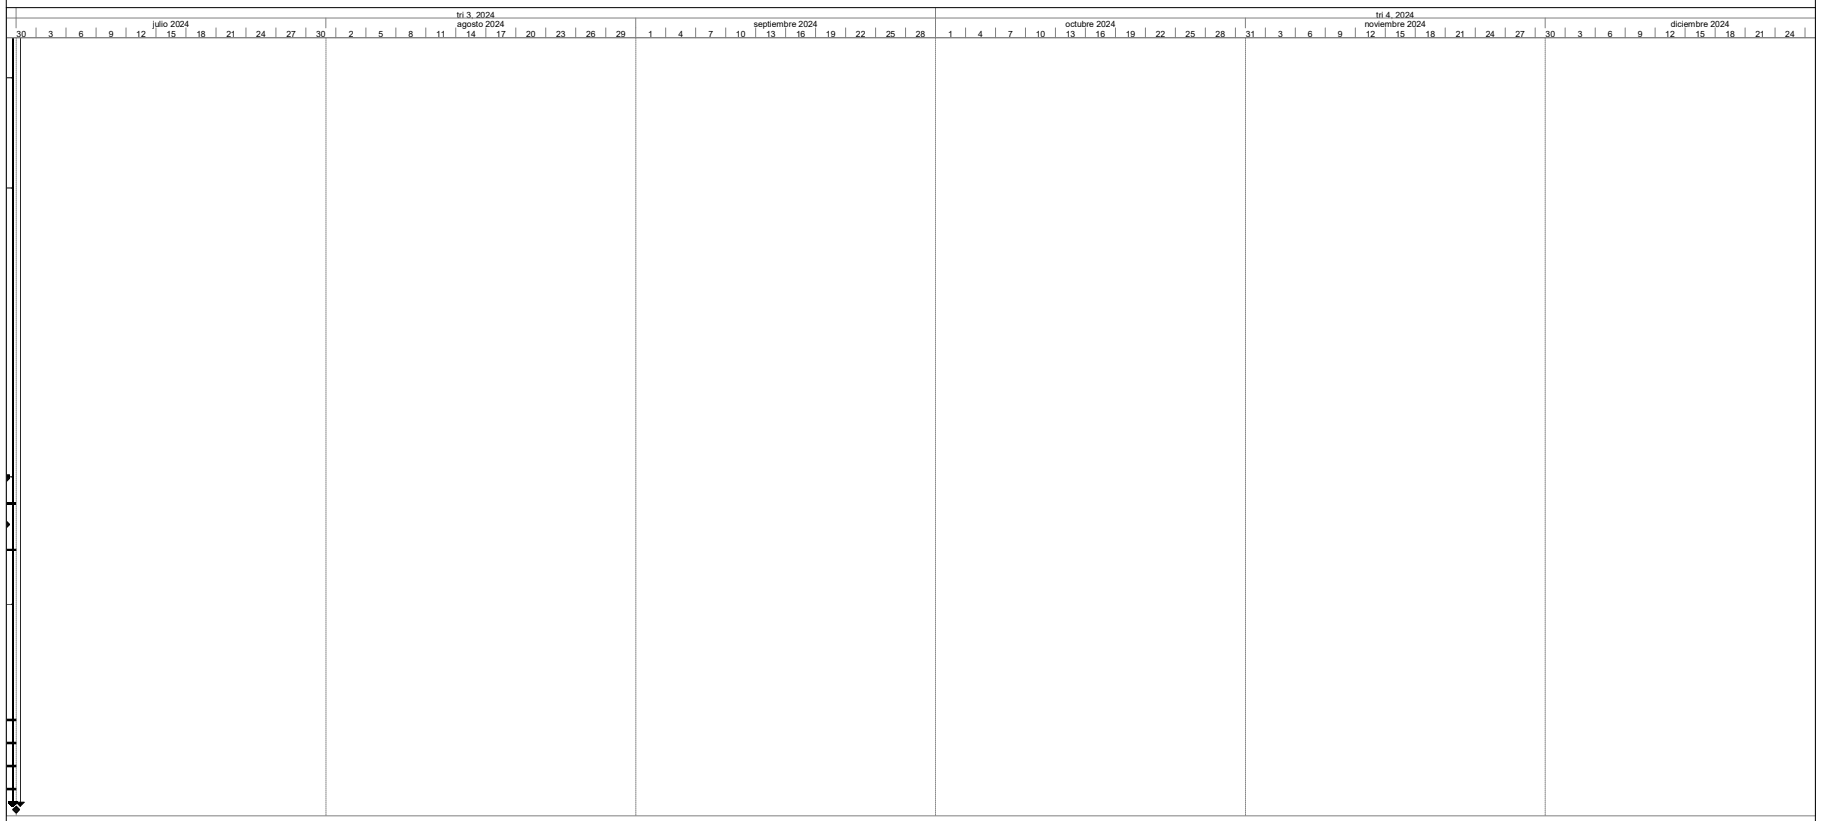


BRASCO INGENIERÍA SAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas críticas | División | Hito de línea de base | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Sólo duración | Sólo fin | | | |
| División crítica | Progreso de tarea | Hito | Tareas externas | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Fecha límite | | | |
| Progreso de tarea crítica | Línea de base | Progreso del resumen | Hito externo | Resumen inactivo | Resumen manual | | | | |
| Tarea | División de la línea de base | Resumen | PLAZOS TARDÍOS | Tarea manual | Sólo el comienzo | | | | |

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024
