PROYECTO

REHABILITACION DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGA – CABO CORRIENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 156 DE 2023

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y TECNICA AL PROYECTO "REHABILITACION DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGA – CABO CORRIENTES

CONVENIO No. 03 DE 2023

SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO-CODECHOCO Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO-CORPOINTERSA

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 017

QUIBDÓ - CHOCÓ
FECHA: 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2024

agropacificosas@hotmail.com
Clle 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

I. INTRODUCCIÓN

Con base en lo establecido en los terminos de referencia del contrato de interventoría No. 156 DE 2023 suscrito entre CODECHOCO y Agroambientales del Pacifico S.A.S, se fundamenta en el Manual de Supervisión e Interventoría de MINAMBIENTE, donde establece los lineamientos técnicos, administrativos, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimiento especializado.

La interventoría consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Bajo esta dirección la interventoría estará orientada al cumplimiento del Convenio No. 03 DE 2023, suscrito entre, **LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO-CODECHOCO Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO-CORPOINTERSA**, con el objetivo de reducir la degradación de las áreas de manglar afectadas por actividades antrópicas ubicadas en el DRMI Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes, proceso que este articulado al Capítulo IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo del PND 2018 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad.”, al Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas y a los diferentes instrumentos de planificación regional y local en el departamento del Chocó.

La recuperación de las áreas de manglar degradadas por actividades antrópicas, representa en el municipio de Nuquí, una respuesta a los conflictos de uso del suelo; El proyecto aprobado se ejecutará en un plazo de veintiún (21) meses a través de un proceso inicial de capacitación comunitaria en restauración y conservación de manglar

2.400 miembros de la comunidad, el establecimiento y mantenimiento de manera participativa de 480 hectáreas de manglar y 1.200.000 árboles; finalmente se establecerán 16 parcelas para el seguimiento y monitoreo de las áreas restauradas.

agropacificosas@hotmail.com
Clle 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION GENERAL

En el marco de la convocatoria No.2021-SGRCAAE-0135 realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y el Sistema General de Regalías – SGR para la conservación de áreas ambientales estratégicas de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías para el Bienio 2021-2022, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO presento el proyecto "REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGÁ – CABO CORRIENTES CHOCÓ", por valor de $3.999.109.207; el cual se priorizó y aprobó mediante Resolución No. 0772 del 22 de julio del 2022, en esta también se designan a CODECHOCO como entidad pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría.

El proyecto busca reducir la degradación de las áreas de manglar afectadas por actividades antrópicas ubicadas en el DRMI Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes, proceso que este articulado al Capítulo IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo del PND 2018 – 2022 "Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad.", al Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas y a los diferentes instrumentos de planificación regional y local en el departamento del Chocó.

El proyecto aprobado se ejecutará en un plazo de veintiún (21) meses, a través de un proceso inicial de capacitación comunitaria en restauración y conservación de manglar a 2.400 miembros de la comunidad, el establecimiento y mantenimiento de manera participativa de 480 hectáreas de manglar y 1.200.000 árboles; finalmente se establecerán 16 parcelas para el seguimiento y monitoreo de las áreas restauradas y se contratara la interventoría del proyecto.

2.2. LOCALIZACION

El proyecto se ejecutará en el municipio de Nuquí departamento del Chocó, en áreas del Consejo Comunitario General de los Riscales, en las comunidades de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí (Cabecera municipal).

agropacificosas@hotmail.com
Clle 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

2.3. ALCANCE

Descripción		Actividad
Objetivos Específicos	Capacitar a miembros de la comunidad en restauración ecológica	Cuatro (4) informes de socialización del proyecto.
		Dos (2) Documento diseñado talleres de capacitación.
		Ochenta (80) talleres de capacitación en cultura y participación para la gestión ambiental y territorial
	Rehabilitar y mantener áreas degradadas de Manglar	Un millón trecientas veinte mil (1.320.000) propágulos.
		Veinte (20) informes de visitas a predios identificados para acuerdos de restauración.
		Cuatrocientas ochenta (480) hectáreas establecidas.
		Establecimiento de dieciséis (16) parcelas de monitoreo.

III. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

3.1. INFORMACION BÁSICA

CONVENIO No.	03 de 2023
OBJETO.	Anuar esfuerzos humanos, técnicos y económicos para el acompañamiento en la Rehabilitación de Ecosistemas de Manglar en el Distrito Regional de Manejo Integrado Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes
CONTRATISTA	Corporación Integral para el Desarrollo Comunitario-CORPOINTERSA
NIT	901057134-2
REPRESENTANTE LEGAL	HAROL ALEISON PALACIOS VALENCIA
CONTRATANTE	Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ
NIT	899999238-5
REPRESENTANTE LEGAL	ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LOPEZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/05/2023
FECHA DE INICIO	02/06/2023
FECHA DE TERMINACION	31/12/2023
DURACIÓN DEL CONVENIO	21 meses
FECHA ACTA DE INICIO	06/02/2023
APORTE CODECHOCÓ	TRES MIL SETECIENTOS UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($3.701.804.400) en efectivo.
APORTE CORPOINTERSA	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($298.998.819) en especie.
VALOR TOTAL CONVENIO	CUATRO MIL MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($4.000.803.219) M/CTE
LUGAR DE EJECICIÒN	Municipio Nuquí – Chocó

IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. INFORMACIÓN FINANCIERA

Descripción				Fecha (día, mes ano)
Suscripción del Contrato (Convenio)				
Concepto	Número	Fecha	Rubro presupuestal	Valor
CDP	180	01/03/2023	Aunar Esfuerzos Humanos, Técnicos y Económicos para la rehabilitación de ecosistemas de manglar en el distrito regional de manejo integrado del Tribugá cabo corriente choco	$3.737.48.5240
RP	687	29/05/2023	Aunar Esfuerzos Humanos, Técnicos y Económicos para la rehabilitación de ecosistemas de manglar en el distrito regional de manejo integrado del Tribugá cabo corriente choco	$3.701.804.400

4.2. GARANTÍAS DE CONVENIO

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Póliza No		
Constitución de la Pólizas	Valor	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
Cumplimiento	$800.160.643,08	26/05/2023	30/06/2025
Salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$800.160.643,08	26/05/2023	31/12/2027
Calidad	$200.040.160,95	26/05/2023	31/12/2025

4.3. SUPERVISIÓN

Designación Interventor	Contrato de Interventoría No 01 de 2023
Aprobación de la Póliza	01/06/2023
Paz y salvo del contratista Sistema General de Seguridad Social.	Se presenta paz y salvo
Presentación Plan Operativo	Se Presenta plan operativo
Cronograma de Actividades	Se presenta cronograma

agropacificosas@hotmail.com
Clle 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

V. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO

Actividad programada	Observaciones/recomendaciones	Cumple	
		Si	No
Producción de material vegetal	Se verifico mediante visitas realizadas en campo, la producción de 165.000 propágulos de mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle salado (Laguncularia racemosa), mangle blanco (Rhizophora harrisonni), mangle nato (Mora oleífera), mangle feliz (Avicennia germinans) y mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae) producidas en los viveros localizados en las comunidades rurales del Municipio de Nuqui – Choco. El cumplimiento de esta labor se evidencio mediante las visitas realizada a los viveros, el cual comprendió la toma de registros fotográficos y revisión de fichas de registros de producción.	X	
Establecimiento y mantenimiento	Se establecieron 165.000 propágulos de manglar que cubre un área total de 60 hectáreas en el área urbana del municipio de Nuquí, con una distribución de 2.500 plantas por hectárea. El cumplimiento de esta labor se evidencio mediante el acompañamiento en el proceso de establecimiento y manejo, los registros fotográficos y el levantamiento del mapa de Áreas establecidas en el mes de noviembre de 2023.	X	
Asistencia Técnica	Se evidencio el desarrollo de dos eventos de asistencia tecnica realizadas por los profesionales contratados por la empresa contratista "***Corporación Integral para el Desarrollo Comunitario-CORPOINTERSA"*** para el desarrollo de esta labor en las actividades de establecimiento y manejo de las plantaciones establecidas; orientando los procesos de transporte del material vegetal, trazado, ahoyado y siembra; de igual manera en el control de plagas y enfermedades. Esta labor de verifico atraves de ficha de registro, listados asistencia y Registro fotográfico.	X	
Seguimiento y monitoreo	Se establecieron cuatro parcelas de monitoreo, acorde a lo establecido en el documento guía "Lineamientos nacionales para el monitoreo del manglar en Colombia" elaborado por el MADS. Se pudo evidencia el proceso de Seguimiento y monitoreo en las parcelas establecidas para dicho fin mediante el mapa de Localización parcela de monitoreo y los Registros fotográfico.	X	

agropacificosas@hotmail.com
Clle 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

VI. RESUMEN GENERAL RELACIONADO CON LOS INDICADORES Y METAS

Actividad	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Total	Cantidad	Vr. Ejecutado	
	Objetivo específico 1 Capacitar a miembros de la comunidad en restauración ecológica							
	Producto 1. Personas capacitadas				**$ 428.400.000**		**$ 47.600.000**	
1	Cuatro (4) informes de socialización del proyecto.	Numero	4	$ 2.975.000,00	$ 11.900.000	0	$ 0	0,00%
2	Dos (2) Documento diseñado talleres de capacitación.	Numero	2	$ 17.850.000	$ 35.700.000	0	$ 0	0,00%
3	Ochenta (80) talleres de capacitación en cultura y participación para la gestión ambiental y territorial	Numero	80	$ 4.760.000	$ 380.800.000	10	$ 47.600.000	12,50%
	Objetivo específico 2 Rehabilitar y mantener áreas degradadas de Manglar							
	Producto 2. Ecosistemas marico costeros en proceso de restauración.				**$ 3.273.404.400**		**$ 343.130.550**	
4	Un millón trecientas veinte mil (1.320.000) propágulos.	Numero	1320000	$ 382	$ 504.226.800	165000	$ 63.028.350	12,50%
5	Veinte (20) informes de visitas a predios identificados para acuerdos de restauración.	Numero	20	$ 89.250.000	$ 1.785.000.000	2	$ 178.500.000	10,00%
6	Cuatrocientas ochenta (480) hectáreas establecidas.	Héctarea	480	$ 1.693.370	$ 812.817.600	60	$ 101.602.200	12,50%
7	Establecimiento de dieciséis (16) parcelas de monitoreo.	Parcelas	16	$ 10.710.000	$ 171.360.000	0	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 3.701.804.400**		**$ 390.730.550**	**10,56%**

VII. CONCLUSIONES

En los temas de formación se evidencio la participación masiva de los beneficiarios directos de las comunidades de los consejos locales de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí, de igual manera se denota la necesidad del desarrollo permanente de los ejercicios de formación para una mayor comprensión y apropiación de la dimensión ambiental en los ecosistemas de manglar fundamentado en la protección, conservación y uso racionales de los recursos naturales en el área de influencia del proyecto.

Este ejercicio de capacitación, en el mes de febrero, registro un avance del 10,56% equivalente a diez talleres de capacitación desarrollados en las comunidades de los consejos locales de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí.

El proceso de asistencia tecnica y establecimiento genero una dinámica de reconocimiento y de apropiación del territorio fundamentado en la conservacion y aprovechamiento del material vegetal (propágulos de mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle salado (Laguncularia racemosa), mangle blanco (Rhizophora harrisonni), mangle nato (Mora oleífera), mangle feliz (Avicennia germinans) y mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae) disponible en la zona de intervención; esto es debido a la demanda que posibilito el proyecto de "REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGÁ – CABO CORRIENTES CHOCÓ" la consolidación de puestos trabajos en las comunidades rurales de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí.

Bajo esta misma dirección se comprobó que para el mes de febrero, se establecieron un total de 165.000 propágulos de mangle, equivalente a 60 hectareas establecidas orientadas mediante el desarrollo de dos visitas de asistencia técnica al igual que el seguimiento y evaluación de las parcelas.

agropacificosas@hotmail.com
Cll 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861


VIII. CONCEPTO

El Interventor designado para la ejecución de este convenio, certifica que el contratista cumplió a cabalidad y satisfacción con la entrega de los productos y obligaciones pactadas correspondientes al INFORME DE AVANCE de acuerdo con la cláusula 5ª del Convenio de Asociación No 03 de 2023.

WILSON VALOYES QUEJADA
Director Interventoría.


agropacificosas@hotmail.com
Clle 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

ANEXO AREAS ESTABLECIDAS MES DE FEBRERO

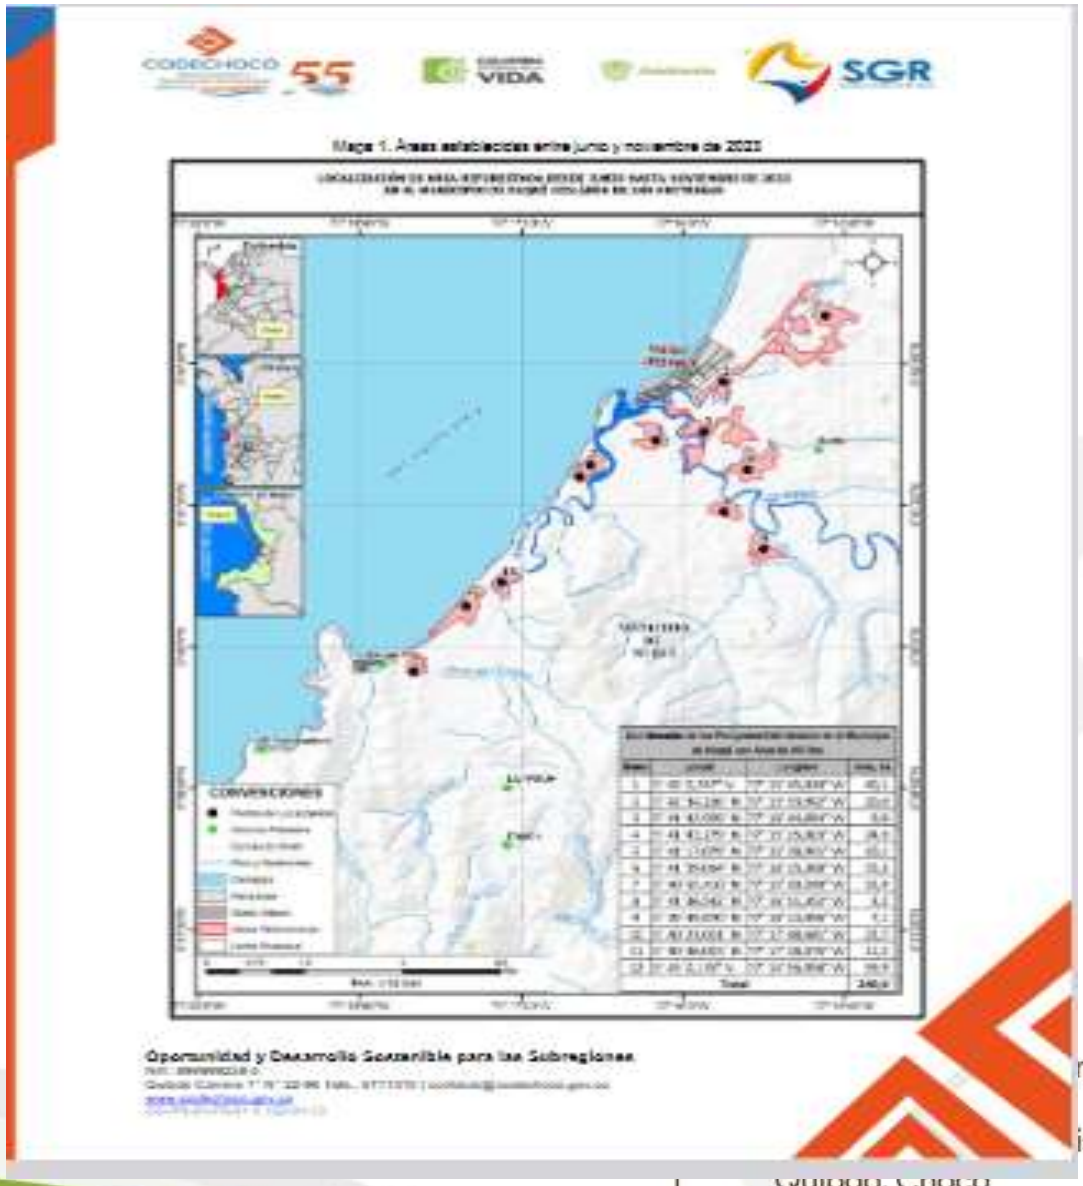

mail.com
istorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

Mapa 2. Localización parcelas de monitoreo entre junio de 2023 y enero de 2024

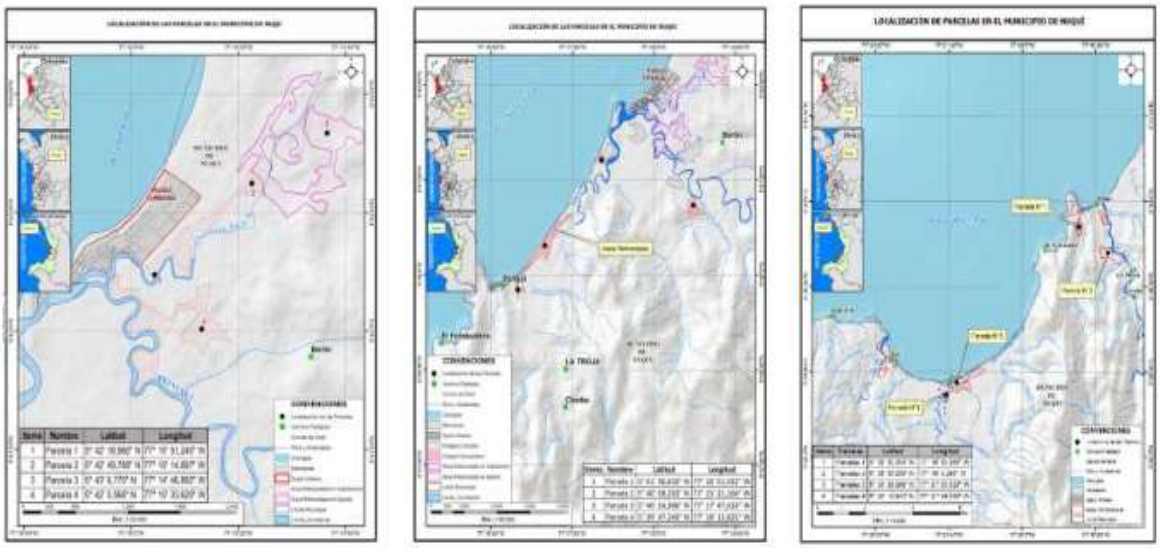

agro
ambientales
DEL PACIFICO

agropacificosas@hotmail.com
Clle 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

PROYECTO

REHABILITACION DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGA – CABO CORRIENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 156 DE 2023

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y TECNICA AL PROYECTO "REHABILITACION DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGA – CABO CORRIENTES

CONVENIO No. 03 DE 2023

SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO-CODECHOCO Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO-CORPOINTERSA

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 018

QUIBDÓ - CHOCÓ
FECHA: 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2024

agropacificosas@hotmail.com
Clle 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

I. INTRODUCCIÓN

Con base en lo establecido en los terminos de referencia del contrato de interventoría No. 156 DE 2023 suscrito entre CODECHOCO y Agroambientales del Pacifico S.A.S, se fundamenta en el Manual de Supervisión e Interventoría de MINAMBIENTE, donde establece los lineamientos técnicos, administrativos, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimiento especializado.

La interventoría consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Bajo esta dirección la interventoría estará orientada al cumplimiento del Convenio No. 03 DE 2023, suscrito entre, **LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO-CODECHOCO Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO-CORPOINTERSA**, con el objetivo de reducir la degradación de las áreas de manglar afectadas por actividades antrópicas ubicadas en el DRMI Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes, proceso que este articulado al Capítulo IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo del PND 2018 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad.”, al Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas y a los diferentes instrumentos de planificación regional y local en el departamento del Chocó.

La recuperación de las áreas de manglar degradadas por actividades antrópicas, representa en el municipio de Nuquí, una respuesta a los conflictos de uso del suelo; El proyecto aprobado se ejecutará en un plazo de veintiún (21) meses a través de un proceso inicial de capacitación comunitaria en restauración y conservación de manglar

2.400 miembros de la comunidad, el establecimiento y mantenimiento de manera participativa de 480 hectáreas de manglar y 1.200.000 árboles; finalmente se establecerán 16 parcelas para el seguimiento y monitoreo de las áreas restauradas.

agropacificosas@hotmail.com
Clle 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION GENERAL

En el marco de la convocatoria No.2021-SGRCAAE-0135 realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y el Sistema General de Regalías – SGR para la conservación de áreas ambientales estratégicas de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías para el Bienio 2021-2022, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO presento el proyecto "REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGÁ – CABO CORRIENTES CHOCÓ", por valor de $3.999.109.207; el cual se priorizó y aprobó mediante Resolución No. 0772 del 22 de julio del 2022, en esta también se designan a CODECHOCO como entidad pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría.

El proyecto busca reducir la degradación de las áreas de manglar afectadas por actividades antrópicas ubicadas en el DRMI Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes, proceso que este articulado al Capítulo IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo del PND 2018 – 2022 "Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad.", al Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas y a los diferentes instrumentos de planificación regional y local en el departamento del Chocó.

El proyecto aprobado se ejecutará en un plazo de veintiún (21) meses, a través de un proceso inicial de capacitación comunitaria en restauración y conservación de manglar a 2.400 miembros de la comunidad, el establecimiento y mantenimiento de manera participativa de 480 hectáreas de manglar y 1.200.000 árboles; finalmente se establecerán 16 parcelas para el seguimiento y monitoreo de las áreas restauradas y se contratara la interventoría del proyecto.

2.2. LOCALIZACION

El proyecto se ejecutará en el municipio de Nuquí departamento del Chocó, en áreas del Consejo Comunitario General de los Riscales, en las comunidades de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí (Cabecera municipal).

agropacificosas@hotmail.com
Clle 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

2.3. ALCANCE

Descripción		Actividad
Objetivos Específicos	Capacitar a miembros de la comunidad en restauración ecológica	Cuatro (4) informes de socialización del proyecto.
		Dos (2) Documento diseñado talleres de capacitación.
		Ochenta (80) talleres de capacitación en cultura y participación para la gestión ambiental y territorial
	Rehabilitar y mantener áreas degradadas de Manglar	Un millón trecientas veinte mil (1.320.000) propágulos.
		Veinte (20) informes de visitas a predios identificados para acuerdos de restauración.
		Cuatrocientas ochenta (480) hectáreas establecidas.
		Establecimiento de dieciséis (16) parcelas de monitoreo.

III. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

3.1. INFORMACION BÁSICA

CONVENIO No.	03 de 2023
OBJETO.	Anuar esfuerzos humanos, técnicos y económicos para el acompañamiento en la Rehabilitación de Ecosistemas de Manglar en el Distrito Regional de Manejo Integrado Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes
CONTRATISTA	Corporación Integral para el Desarrollo Comunitario-CORPOINTERSA
NIT	901057134-2
REPRESENTANTE LEGAL	HAROL ALEISON PALACIOS VALENCIA
CONTRATANTE	Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ
NIT	899999238-5
REPRESENTANTE LEGAL	ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LOPEZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/05/2023
FECHA DE INICIO	02/06/2023
FECHA DE TERMINACION	31/12/2023
DURACIÓN DEL CONVENIO	21 meses
FECHA ACTA DE INICIO	06/02/2023
APORTE CODECHOCÓ	TRES MIL SETECIENTOS UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($3.701.804.400) en efectivo.
APORTE CORPOINTERSA	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($298.998.819) en especie.
VALOR TOTAL CONVENIO	CUATRO MIL MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($4.000.803.219) M/CTE
LUGAR DE EJECICIÒN	Municipio Nuquí – Chocó

agropacificosas@hotmail.com
Clle 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. INFORMACIÓN FINANCIERA

Descripción				Fecha (día, mes ano)
Suscripción del Contrato (Convenio)				
Concepto	Número	Fecha	Rubro presupuestal	Valor
CDP	180	01/03/2023	Aunar Esfuerzos Humanos, Técnicos y Económicos para la rehabilitación de ecosistemas de manglar en el distrito regional de manejo integrado del Tribugá cabo corriente choco	$3.737.48.5240
RP	687	29/05/2023	Aunar Esfuerzos Humanos, Técnicos y Económicos para la rehabilitación de ecosistemas de manglar en el distrito regional de manejo integrado del Tribugá cabo corriente choco	$3.701.804.400

4.2. GARANTÍAS DE CONVENIO

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**Póliza No**		
Constitución de la Pólizas	**Valor**	**VIGENCIA**	
		Desde (día, mes, año)	**Hasta** (día, mes, año)
Cumplimiento	$800.160.643,08	26/05/2023	30/06/2025
Salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$800.160.643,08	26/05/2023	31/12/2027
Calidad	$200.040.160,95	26/05/2023	31/12/2025

4.3. SUPERVISIÓN

Designación Interventor	Contrato de Interventoría No 01 de 2023
Aprobación de la Póliza	01/06/2023
Paz y salvo del contratista Sistema General de Seguridad Social.	Se presenta paz y salvo
Presentación Plan Operativo	Se Presenta plan operativo
Cronograma de Actividades	Se presenta cronograma

agropacificosas@hotmail.com
Clle 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

V. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO

<table>
<tr><th rowspan="2">Actividad programada</th><th rowspan="2">Observaciones/recomendaciones</th><th colspan="2">Cumple</th></tr>
<tr><th>Si</th><th>No</th></tr>
<tr><td>Talleres de capacitación</td><td>Se realizaron Diez (10) talleres de Negocios verdes y Sostenibilidad, en las comunidades de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí. Se conto con la participación de 205 personas, 104 hombres (59%) y 101 mujeres (41%), como se discrimina a continuación:
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Comunidad</th><th colspan="3">Personas</th></tr>
<tr><th>Hombres</th><th>Mujeres</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Arusí</td><td>20</td><td>13</td><td>33</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Partadó</td><td>15</td><td>13</td><td>28</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Termales</td><td>12</td><td>18</td><td>30</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Coquí</td><td>12</td><td>13</td><td>25</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Joví</td><td>14</td><td>13</td><td>27</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Panguí</td><td>11</td><td>20</td><td>31</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Nuquí</td><td>20</td><td>11</td><td>31</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>104</td><td>101</td><td>205</td></tr>
</table>
Se verifico el cumplimiento mediate la presentación del informe con visitas de inspección den campo, toma de registro fotográficos y listados de asistencia, en las siguientes fechas comprendidas.</td><td>X</td><td></td></tr>
</table>

VI. RESUMEN GENERAL RELACIONADO CON LOS INDICADORES Y METAS

Actividad	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Total	Cantidad	Vr. Ejecutado	
	Objetivo específico 1 Capacitar a miembros de la comunidad en restauración ecológica							
	Producto 1. Personas capacitadas				**$ 428.400.000**		**$ 47.600.000**	
1	Cuatro (4) informes de socialización del proyecto.	Numero	4	$ 2.975.000,00	$ 11.900.000	0	$ 0	0,00%
2	Dos (2) Documento diseñado talleres de capacitación.	Numero	2	$ 17.850.000	$ 35.700.000	0	$ 0	0,00%
3	Ochenta (80) talleres de capacitación en cultura y participación para la gestión ambiental y territorial	Numero	80	$ 4.760.000	$ 380.800.000	10	$ 47.600.000	12,50%
	Objetivo específico 2 Rehabilitar y mantener áreas degradadas de Manglar							
	Producto 2. Ecosistemas marico costeros en proceso de restauración.				**$ 3.273.404.400**		**$ 343.130.550**	
4	Un millón trecientas veinte mil (1.320.000) propágulos.	Numero	1320000	$ 382	$ 504.226.800	165000	$ 63.028.350	12,50%
5	Veinte (20) informes de visitas a predios identificados para acuerdos de restauración.	Numero	20	$ 89.250.000	$ 1.785.000.000	2	$ 178.500.000	10,00%
6	Cuatrocientas ochenta (480) hectáreas establecidas.	Héctarea	480	$ 1.693.370	$ 812.817.600	60	$ 101.602.200	12,50%
7	Establecimiento de dieciséis (16) parcelas de monitoreo.	Parcelas	16	$ 10.710.000	$ 171.360.000	0	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 3.701.804.400**		**$ 390.730.550**	**10,56%**

agropacificasas@hotmail.com
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

VII. CONCLUSIONES

En los temas de formación se evidencio la participación masiva de los beneficiarios directos de las comunidades de los consejos locales de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí, de igual manera se denota la necesidad del desarrollo permanente de los ejercicios de formación para una mayor comprensión y apropiación de la dimensión ambiental en los ecosistemas de manglar fundamentado en la protección, conservación y uso racionales de los recursos naturales en el área de influencia del proyecto.

Este ejercicio de capacitación, en el mes de febrero, registro un avance del 10,56% equivalente a diez talleres de capacitación desarrollados en las comunidades de los consejos locales de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí.

El proceso de asistencia tecnica y establecimiento genero una dinámica de reconocimiento y de apropiación del territorio fundamentado en la conservacion y aprovechamiento del material vegetal (propágulos de mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle salado (Laguncularia racemosa), mangle blanco (Rhizophora harrisonni), mangle nato (Mora oleífera), mangle feliz (Avicennia germinans) y mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae) disponible en la zona de intervención; esto es debido a la demanda que posibilito el proyecto de "REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGÁ – CABO CORRIENTES CHOCÓ" la consolidación de puestos trabajos en las comunidades rurales de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí.

Bajo esta misma dirección se comprobó que para el mes de febrero, se establecieron un total de 165.000 propágulos de mangle, equivalente a 60 hectareas establecidas orientadas mediante el desarrollo de dos visitas de asistencia técnica al igual que el seguimiento y evaluación de las parcelas.

VIII. CONCEPTO

El Interventor designado para la ejecución de este convenio, certifica que el contratista cumplió a cabalidad y satisfacción con la entrega de los productos y obligaciones pactadas correspondientes al INFORME DE AVANCE de acuerdo con la cláusula 5ª del Convenio de Asociación No 03 de 2023.

WILSON VALOYES QUEJADA
Director Interventoría.

agropacificosas@hotmail.com
Clle 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861

ANEXOS REGISTROS FOTOGRAFICOS

Registros fotográficos Proceso de Capacitación	
 Capacitación Arusí	 Capacitación Partadó
 Capacitación Termales	 Capacitación Joví
Registros fotográficos Proceso de Capacitación	
 Capacitación Coquí	 Capacitación Panguí

otmail.com
Clle 30 N 2 - 47 B/ Cristorey
Quibdó, Chocó
310 595 8314 - 310 531 8861
