ANEXO No.1

PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARÍA GENERAL

No Radicado. 1-2019-18675

Fecha: 23/07/2019 15:25:29
Destino: DIR. ADMIN Y FINANC
Anexos: 29 FOLIOS
Copia: N/A

www.secretariageneral.gov.co

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-018

Bogotá. D.C., 23 de Julio de 2019

Señores:
SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
LUZ ÁNGELA GÓMEZ GÓMEZ
Dirección Administrativa y Financiera
Atn. CARLOS AUGUSTO PINZÓN SÁNCHEZ
Apoyo Administrativo
Carrera 8 No. 10 - 65
BOGOTÁ D. C.
Ciudad.

Referencia: CONTRATO No. 4233000-730-2019. OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA - CONTABLE, ECONOMICA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C."

ASUNTO: ALCANCE AL OFICIO CON RADICADO No 1-2019-17964 DEL 16 DE JULIO DE 2019APROBACIÓN Y TRASLADO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA GENERAL Y POR FRENTE DE OBRA ***(MANZANA LIÉVANO, CENTRO DE MEMORIA Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL)***

Respetados Señores:


En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y una vez subsanado por parte del contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, las programación de obra por frente de obra y la general correspondiente al contrato de obra No 731 de 2019, observaciones estas que surgieron de las reuniones que de manera interna se sostuvieron con los profesionales técnicos de las residencias de obra y de interventoría, y asi mismo en respuesta a las observaciones hechas por el supervisor tecnico **ING. CARLOS AUGUSTO PINZÓN SÁNCHEZ** trasladamos a ustedes las programaciones firmadas por el director de la Interventoría y director de obra, programaciones estas que ya se encuentras avaladas por la Interventoría.

Cordialmente,

ING. PAULA FERNANDA MORALES SÁNCHEZ
Cedula de Ciudadanía No. 52.959.013 De Bogotá D.C
Apoyo a la dirección de Interventoría y residencia administrativa
ARQUITECTURA URBANA LTDA
Nit: 830.098.495-4

Elaboró: ING. PAULA FERNANDA MORALES - Coordinadora de Interventoría.
VoBo: ING. PAULA FERNANDA MORALES - Coordinadora de Interventoría
Copia: CONSECUTIVO DEL CONTRATO.
Anexos: 29 FOLIOS

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

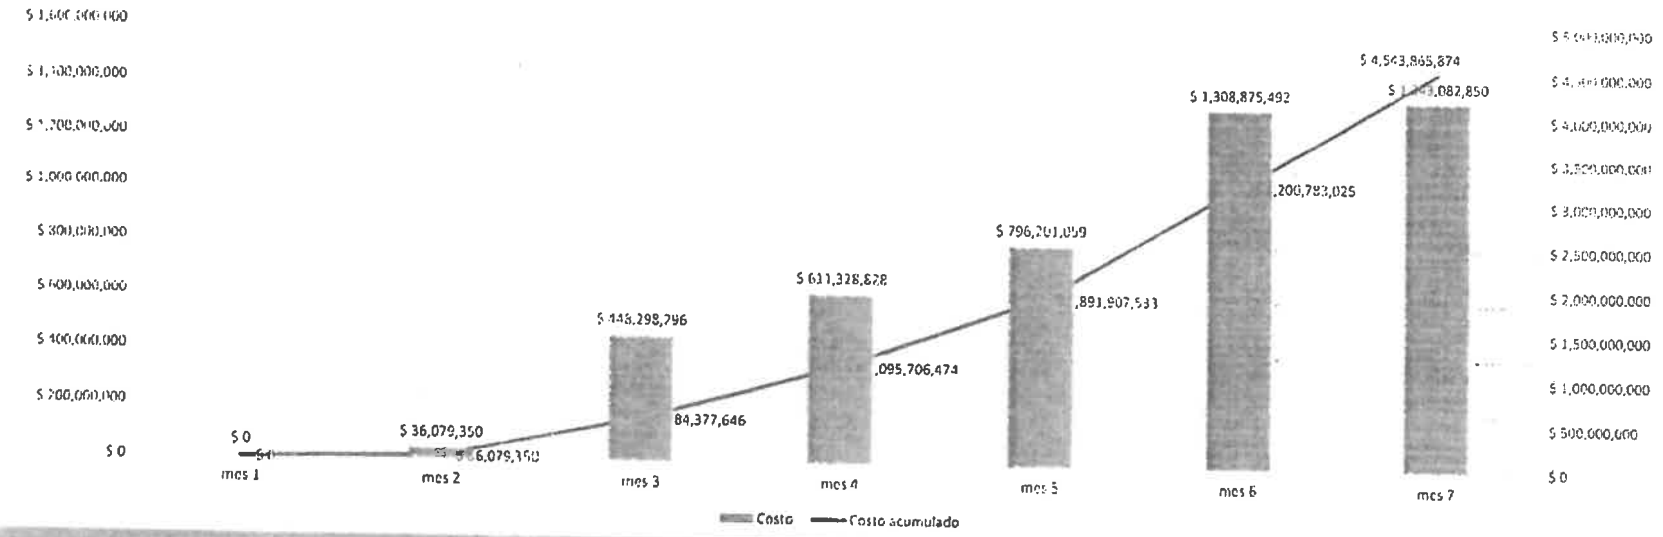

Nombre	Costo restante	Costo real	Costo	% completado	Estado
CONSOLIDADO SEDES	$ 4,521,339,828	$ 22,526,046	$ 4,543,865,874	1%	Retrasada
A. CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	$ 884,461,537	$ 0	$ 884,461,537	0%	Según lo programado
acta de inicio	$ 0	$ 0	$ 0	100%	Completada
Etapa de subcontratacion y logistica para inicio de actividades.	$ 0	$ 0	$ 0	100%	Completada
B. IMPRENTA DISTRITAL	$ 2,718,359,801	$ 22,526,046	$ 2,740,885,847	2%	Retrasada
acta de inicio	$ 0	$ 0	$ 0	100%	Completada
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 870,418,706	$ 22,526,046	$ 892,944,752	7%	Retrasada
INICIO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 0	$ 0	$ 0	100%	Completada
PRELIMINARES	$ 26,812,251	$ 22,526,046	$ 49,338,297	46%	Retrasada
Campamento de obra	$ 0	$ 16,694,735	$ 16,694,735	100%	Completada
Localización y replanteo	$ 8,207,973	$ 341,999	$ 8,549,972	4%	Retrasada

	Baño móvil	$ 0	$ 4,913,922	$ 4,913,922	100%	Completada
	Aseo general	$ 18,604,278	$ 575,390	$ 19,179,668	3%	Retrasada
C. MANZANA LIÉVANO		$ 918,518,490	$ 0	$ 918,518,490	0%	Según lo programado
	Acta de inicio	$ 0	$ 0	$ 0	100%	Completada
	Etapa de logistica, compras y proveedores para inicio de actividades	$ 0	$ 0	$ 0	100%	Completada

Pablo Morales
Apoyo D. y Residencia Inte. Adm.
