-Interventoria nuevamente solicita al Contratista hacer entrega de Actas de Vecindad de espacios intervenidos como se consignan el dia 27 de Septiembre de 2019 en este libro de Obra.

Interventoria.

30/09/2019.

INTERVENTORIA NO HA TENIDO DISPONIBILIDAD PARA RECIBO Y REVISION DE ACTAS DE VECINDAD DESDE EL DIA VIERNES SEGUN LO ACORDADO.

SE INGRESA RETROEXCAVADORA KOMATSU PARA EXCAVACION FILTRO.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE POLIUREA (REPARACION SUPERFICIE).

SE REALIZA LA DESVIACION DE LA TUBERIA PVC 1" PREVIA COORDINACION DE ACTIVIDAD CON LA ENTIDAD PARA LA SUSPENCION DEL AGUA APARTIR DE 2 PM PARA LA RECONECCION DE LA TUBERIA DESVIADA A LA RED.

LOS INFORMES DE SISTEMA VENTILACION MECANICA, PLANTA ELECTRICA, CAMARAS Y DOMOS, UPS SERAN ENTREGADOS ENTRE EL 4 Y 8 DE OCTUBRE DE ACUERDO A COMPROMISO CONSIGNADO EN ACTA 30 DE SEPTIEMBRE N°.

LISTADO DE LUMINARIAS SE ENTREGARA EL DIA 2 OCT/19 DE ACUERDO A COMPROMISO CONSIGNADO EN ACTA N° DEL 30 DE SEPT/19

(1/10/19) 1/10/2019.

- INICIO RETIRO REJILLAS METALICAS FILTRO PERIMETRAL.
INICIO RETIRO PLACAS CONCRETO Y EXCAVACION MECANICA.
CONTINUA REPARACION DE SUPERFICIE PARA IMPERMEABILIZACION.
- INTERVENTORIA RECIBE ACTAS DE VECINDAD PARA REVISION EN HORAS DE LA MAÑANA.

IMPRENTA DISTRITAL

la pagina 041 fue tachada y rayada por el consultor de P&D el ingeniero Juan Gabriel Carreño Silva, sin autorizacion de la inter dado que él mismo había hecho anotaciones para dar claridad a l dudas expuestas por el contratista de obra y de interventoría, comprometiendose a revisar en oficina y dar pronunciamiento lo ante posible.

* Este día se continúa con actividades de excavación de zapata 1 Eje A. Se continuó con excavación para redes hidrosanitarias en el Sector Sur y redes Eléctricas, el dia viernes se realizó la instalación de la Tubería PVC 2x3" x 2x2". (Eléctrica). Alejandra Flores

Martes, 03 de Septiembre 2014

El dia de hoy se continua con excavación de red Eléctrica, y se encuentra a un nivel de -90 mts. con Piedra de gran tamaño que impide continuar con la excavación para la caja Eléctrica que va a Planta generadora. Se solicita a la interventoría aprobar verificar si es posible cambiar la ubicación de la caja y desplazarla 3 mts.

Se continua con excavación de red Sanitaria en costado Sur, Se continua con excavación en zapata 1 Eje 5'-4 (A), la actividad de anclajes Epóxicos en cimentación de columnas continua Suspendida porque no se tiene respuesta y claridad por parte del consultor. Alejandra F.

9 Septiembre 2014 Profesional Ambiental

Se realiza recorrido diario a zona de trabajo primer piso excava evidenciando al personal con sus respectivos elementos de protección personal, y la zona señalizada.

Se verificó el acopio de material pétreo con su respectivo cubrim Sin embargo se solicita sea encerado con la señalización re tivo.

El punto de acopio temporal de RCD, se encuentra sin su resp cierre (señalización), el cual deberá realizarse por parte de Contratista, con el fin de cumplir con lo establecido en el PMA y P Respecto al punto ecológico, se solicita nuevamente al contra

COPIA

realice de manera inmediata una capacitación al personal en el cual se concientice sobre la implementación de las medidas ambientales, y la importancia de la adecuada segregación de los residuos sólidos, teniendo en cuenta que acorde al seguimiento se esta incumpliendo con esta medida.
Diana C. Morales V.

* Con base a las observaciones por parte de interventoria en lo concerniente al respectivo cubrimiento del material petreo Arena se cumplira con lo estipulado en el PMA, y aún más con una recomendación por parte del area tecnica de interventoria que este material debe cubrirse con polietileno.
Se informa a la interventoria con respecto al cierre del punto de Acopio provisional de RCD, este se realiza al finalizar la jornada laboral debido a que en el transcurso del dia su demarcación en sitio no se verifica por el debido trasiego que estan realizando desde los puntos los cuales se estan realizando actividades pertinentes de obra, a su vez segun el volumen de RCD que se evidencia se llama a la empresa para que envie una volqueta hacer el respectivo traslado hacia la escombrera dispuesta y mencionada en el PGRCD. Willian Fonseca Vargas

Jueves 05 de septiembre de 2019

Personal contratista	Personal interventoria
Residente de obra = 1	Residente de interventoria = 1
Residente SST = 1	Inspector de interventoria = 1
Maestro General = 2	
oficiales electrico = 1	
auxiliares = 1	
oficiales civiles: 6	
auxiliares civiles: 10	
Residentes	

Estado del tiempo: Soleado
El día de hoy se realizaron actividades tales como:
fijaciada de acero de refuerzo para zapata tipo 2-2, se realizaron
anclajes con epóxico sika - anchor fix-3001 en las vigas de c
donde va ubicada la zapata 2, continuación de la excavación pa
canalización de red baja de la planta electrica y tablero Gener
se realizó el replanteo y demolición de la placa de contrapiso
dar inicio con la excavación de las cajas de inspección en
descargues de unidades sanitarias planta primer piso. Demolición de
viga de cimentación ubicada en el eje 4' entre ejes A y B para re
cimentación del muro M2 Jessica Lopez


La interventoria revisa y verifico las condiciones de la excavacion para la caja electrica ubicada inmediatamente al frente del edificio 3, evidenciando que efectivamente se encuentra un grupo de piedras de gran tamaño y se revisa la propuesta del contratista para mover la ubicacion de la caja, viendola totalmente viable y aprobandose este ajuste al trazado de la ubicacion de la caja.
Este dia se realiza comite de obra en las horas de la mañana
Clima seco Jessica Lopez

6 de septiembre del 2019. Profesional sisoma.
Se realiza recorrido diario de obra, en conjunto con el contratista residente técnico, residente de interventoria, inspector sst de interventoría, y profesional sisoma de interventoría, con el fin de verificar campo acorde a lo establecido en los planos hidraulicos el trazo de la tubería, teniendo en cuenta este item, se evidencio que en el tramo que se encuentra obstaculizado por los individuos arboreos, razón por la cual la interventoría informa:
1) El contratista no podrá realizar actividades que afecten individuo arbóreo, ya que se desconoce el inventario forestal de la imprenta bustatal, así como esta área es de interés para
2) Si en el replanteo de la tubería, se encuentran ra el contratista deberá garantizar el tratamiento silvic forestal del individuo por profesional experto (forestal)

COPIA PLAC.

La interventoria revisa y verifica el proceso de fundida de concreto ciclopeo en el area de la zapata 1 en el edificio administrativo encontrando que: El carro de la mixer tiene el concreto que fue despachado desde planta, corroborando el sello que trae con la remision. Se realiza prueba de slump dando 4" de asentamiento, Se verifica que el concreto antiguo se encuentra limpio y rugoso al momento de adherir y vaciar el nuevo concreto. el procedimiento para fundir el ciclopeo es una capa de concreto 3.000psi de fabricar marca ANDINO con una capa de piedra media zonga no superior a 25 cm de ancho. Ver dibujo inferior. Jessica lopera

- La interventoría y el contratista de obra asisten a reunion con el SST de la imprenta distrital la cual queda consignado en acta y de la cual se genera el compromiso de hacer un plan SST para la zona de producción con la matriz de riesgos por microzona y subsanando las observaciones que la interventoría envió via correo electronico el dia. , esto debe entregarse a la interventoría para ser elevado a la entidad el dia martes 10 sept/19 adicional, el contratista debera presentar una programación en diagrama de gant donde se evidencie que ejecucion de obra se tiene si los trabajadores en el area de produccion no estan laborando al mismo tiempo que los trabajadores de obra civil Jessica lopera

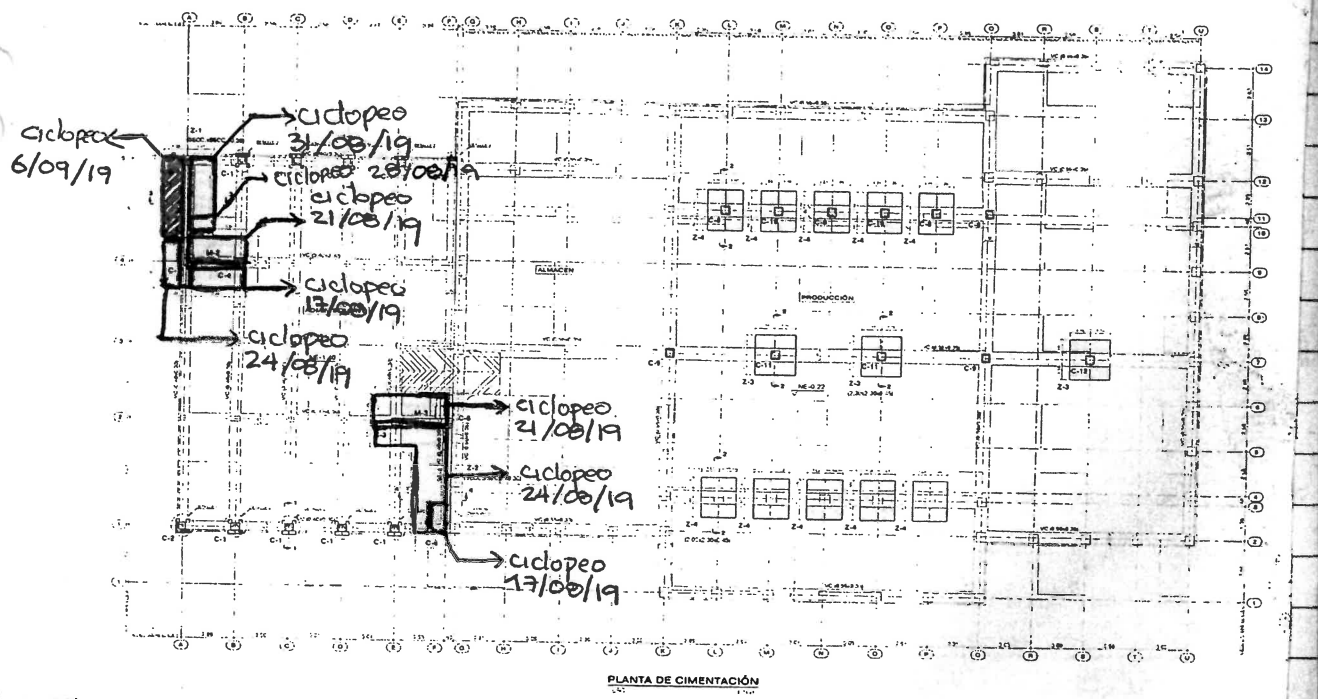

PLANTA DE CIMENTACIÓN

Una vez realizado el recorrido de las redes exteriores del componente hidrosanitario, la interventoria le solicita al contratista revisar y proponer junto con su asesor hidrosanitario un ajuste al trazado de red hidrosanitario que ya se evidencio pasa por encima de individuos arboreos y se entregue a la interventoria para revision por parte de sus especialistas y posteriormente dar a conocer a la consultoría.

Se le aclara a la interventoria que en reunión SST, nosotros como contratistas no nos hemos comprometido a realizar un diagrama de gant, se dejó claro a todos los asistentes que así se labore sin personal operativo de Imprenta en el área de producción, los tiempos programados para la ejecución de las actividades no cambian sin contar con Imprevistos, dado que el proceso constructivo es el mismo de abajo hacia arriba. para realizar el reforzamiento de la estructura. Se reitera el riesgo inminente que se presenta trabajar con personal operativo de Imprenta y realizar las actividades de Obra civil.

Alejandra BP.

— 11 —

A la fecha se continúa suspendida la actividad de anclajes epóxicos en cimentación de columnas por falta de definición y/o aclaración en diseños. De igual manera no se tiene detalle constructivo de la viga de cimentación que fue demolida en el eje F.

El área de archivo no se ha podido intervenir por falta de detalles constructivos en los muros en tolette de la (subestación) planta eléctrica, estos muros no tienen cimentación y no es claro como se deben anclar a lo existente. Desde el 24 agosto se solicitó a través de correo electrónico la aclaración y definición de estos detalles.

Alejandra BP

Lunes

Sabado, 09 Sep 2019

2872

El dia de hoy se continua con actividades correspondientes a excavación para redes eléctricas desde Planta eléctrica hasta Subestación.

Se continúa con figurado y armado de hierro para Zapata 2. Se evidencia de los traslapos para varilla de 5/8" quedan de 80 cm siguiendo con las medidas y detalles de los planos estructurales.

Se continua con demolición de viga de cimentación del eje A entre 4'-5'. Alejandra B.

,,

• El dia sabado 7 de septiembre de 2019, la interventoria revisó la actividad demolicion de viga de cimentación en el eje A de la zapata 1. Para esta actividad, el contratista de obra realizó el retiro del apuntalamiento de la placa y los aceros de refuerzo están vinculados a las columnas.

• El día de hoy la interventoria revisa y verifica en obra el siguiente personal: 8:24am 3 personas amarrando acero de refuerzo para viga de cimentacion existente ubicada en el muro M1 en ejes A-(5-4). 3 oficiales amarrando acero de refuerzo para zapata tipo Z-2 ubicada en el eje 2. 2 personas cortando y figuriando acero de refuerzo. 3 personas realizando excavacion manual y trasiego de excavaciones para red de desagues hidrosanitario. 2 personas cargando material a volqueton para su retiro. En total 13 obreros.

→ Se evidencia que el contratista ha bajado el personal en obra. Pues hace un par de semanas había llegado a un pico de 23 personas y segun lo anteriormencionado hoy solo cuenta con 13. Esto se debe en parte a que el consultor no ha definido el diseño para cimentacion de columnas y vigas pero se debe tambien a que el contratista no tiene un plan de contingencia y no aumenta personal en otras actividades.

• El contratista de obra nuevamente saltandose los protocolos de calidad figura y amarra el acero de refuerzo SIN CERTIFICADO DE CALIDAD entregado y realiza anclaje en los elementos estructurales. Se le recuerda al contratista que el día 27 de agosto de 2019 (pagina 036) la interventoria fue clara en que no podia ser utilizado hasta tanto la interventoria verificara

COPYPAC

el certificado de los materiales.

• Se le aclara al contratista que esta interventoría le solicita de manera expresa realizar un digrama de gantt para el area de produccion si las personas que trabajan como operarios de imprenta no estovieran interfiriendo en sus labores de obra, cómo se vería reflejado en programa y por favor radicar como oficio para atender la solicitud realizada por nuestro cliente SECRETARIA GENERAL, el día de la reunión SST 6 septiembre 2019

Se le solicita a la interventoria de manera atenta no realizar tachones a las anotaciones realizadas por el Contratista, sin antes pedir aclaración si algo no concuerda o no esta de acuerdo. (ver pag. 47)
De igual manera se le informa a la residente de interventoria que ya fue radicado oficio PS04-073-19 y/o enviado por correo electrónico, respondiendo a las observaciones de plan de Contingencia para el proyecto, donde se aclara y reitera las razones de porque no se ha podido avanzar en las actividades que generan atraso y que no son imputables al contratista.

Se le aclara a la Interventora que como contratistas no nos hemos saltado los protocolos de calidad. respecto a el acero de refuerzo que se encuentra en obra, dado que el acero que se ha utilizado para anclajes epóxicos, armado de Zapatas es de 5/8" y los certificados de Calidad de este acero fueron radicados por oficio PS04-073-19 para su verificación y respectivo trámite.
Para el acero de refuerzo que fue ingresado el dia 27 de Agosto. y fue a la fecha no se ha utilizado para ninguna actividad, los certificados de calidad seran entregados el dia de mañana.
Señores interventoria se les recuerda que nosotros como contratistas presentamos una programación por zonas en el área de producción, resultado del trabajo en

COPYPAC

equipo de las tres partes, donde se atendieron todas las solicitudes y/o observaciones, para el desarrollo de... las actividades que se van a ejecutar en esta área.
Cronograma enviado por correo electrónico el día 23-Agosto/2019. y que posteriormente fue enviado el 27-Agosto/2019. con los ajustes solicitados por el apoyo a la Supervisión Arq. Mauricio Polido. y que fue socializado en reunión el día 30-Agosto-2019, con personal de la Entidad Imprenta Distrital, Interventoria y Contratista.
Este cronograma de intención representa el diagrama de Gantt donde se exponen las actividades y tiempo de ejecución previsto para acometer esta área, aclarando que no se estan teniendo en cuenta Imprevistos. — Alejandra B.

10-08-2019

(1) En recorrido de obra sobre las redes sanitarias se propone modificar el trazado de estas redes sobre el costado de la calle 11 sur por cruces con material vegetal existente. Para las modificaciones se hace sobre el plano #1 anexo. Se solicita verificar niveles con este trazado para poder confirmar su ejecución. Es importante tener en cuenta que el planteamiento no modifica las dimensiones propuestas por el diseñador

(2) El retiro se propone realizar con el trazado de la red de aguas lluvias sobre el costado occidental edificio 1 para evitar el cruce con la vegetación existente. Es importante tener en cuenta que no se modifican los diametros de la red. La modificación consta en ubicar el colector sobre el cordon existente y la red sanitaria se mantiene sobre el bordillo. Se anexa Plano #2 de la propuesta



Asesor Hidrosanitario

Martes 10 septiembre 2019.

- La interventoría junto con el Arq. Mauricio, Ing. Edna y el dr. Mario apoyos al proyecto de parte de la Imprenta Distrital asisten a reunion donde el Contratista expone los riesgos que se podrian presentar en el area de Produccion, quedando como compromiso de parte del contratista de obra entregar a la interventoria toda esta documentacion preventiva junto con las conclusiones, observaciones y recomendaciones para ser trasladada a la entidad.

COPYA PLAC.

- La interventoría junto con el contratista de obra y el arquitecto Mauricio Pulido sierra asisten à la reunion en las instalaciones de PSD citada por correo electronico a todas las partes desde el 5 de septiembre de 2019, allí se aclararon todas las dudas de índole estructural, quedando pendiente el pronunciamiento de la consultoría frente a todas las dudas y observaciones del componente hidrosanitario y 2 dudas del componente electrico.
- Se le solicita al contratista de obra tener cuidado al nombrar las fechas de la bitacora de obra ya que esto puede generar confusión en la trazabilidad de lo aquí presentado.
- Señor contratista el oficio con tema plan de contingencia será respondido vía oficio por parte de la interventoría.
- Teniendo en cuenta que el contratista de obra esta ingresando material a obra del cual el certificado de calidad no es presentado a la interventoría aun pasados más de 10 días, desde el día de hoy se toma el instrumento de control de no dejar ingresar a la obra ningún material sin previa revisión de la interventoría. Ya la portería y el arquitecto Mauricio Pulido apoyo a la supervisión tienen conocimiento y apoyaron esta decisión.

Jessica lopera A.

Miercoles 11 septiembre 2019

- El día de hoy lo interventoría reviso que el contratista se encuentra realizando labores de excavacion del componente hidrosanitario y electrico, sin embargo no es posible verificar que estas actividades atiendan a una planeación detallada por zonas ya que desde el día 21 de agosto se ha venido solicitando.

Se reitera y aclara nuevamente a la interventoria que dentro de nuestras obligaciones Contractuales no existe realizar o entregar programaciones especificas de los Componentes, para eso existe una programación general entregada al inicio del contrato y aprobada para hacerle seguimiento y control al proyecto. Por lo tanto no se entregaran las programaciones solicitadas.

Alejandra B.

El día de hoy se continúo realizando diferentes actividades correspondientes a:

PAC

Excavación para cajas eléctricas y tendido de tubería que va desde la planta eléctrica a subestación.
Se continúó con el replanteo y localización de la red hidrosanitaria por el sector norte, se recomienda hacer un ajuste al trazado, replantear una caja de inspección porque no estan dando los niveles.
Se continúa con la demolición de vigas de cimentación en la Zapata 1 eje B. (MZ)
Se realizó el desmonte de 3 ventanas en el eje 1'. se continúa con el figurado de hierro para zapatas.

Jueves 12 septiembre 2019

Se celebra reunion de comité tecnico en las instalaciones de la Imprenta Distrital, en donde participan Director de obra y de Interventoría, residentes administrativos de obra y de interventoría, residente tecnica de obra y de interventoría de la sede imprenta Distrital apoyos a la supervision de las 3 sedes y la abogada Natalia Cortes Mateus. Lo mencionado en la reunión quedará plasmada en acta de comité.
•En respuesta a la propuesta planteada por el asesor hidrosanitario del contratista de obra consorcio PRUNI SEDES 04, en las paginas 49 y 50 de la presente bitácora, se les indica que estamos de acuerdo con el nuevo recorrido planteado siempre y cuando como dice la nota en el libro de bitacora, se conserven los diámetros y las pendientes. En el evento en que tengan que plantear diametros y pendientes diferentes, la propuesta se debe justificar con una memoria de calculo.

Jessica Lopera A.

13 de Septiembre del 2019. Profesional SST.
Se realiza recorrido diario en obra, con 3 trabajadores realizando actividad de demolición y excavación en el primer piso, con sus elementos de protección personal para la actividad. En campamento se encuentra (1) residente y un (1) visitante. Se evidencia el adecuado manejo de residuos sólidos ordinarios en el punto de acopio (punto ecológico), en el punto de acopio de RCD se evidencia señalización con cinta y conos, en las zonas de trabajo se evidencian charlas (señalización) de emergencia (ruta de evacuación),

los acopios de material pétreo se encuentra con su respectivo cerramiento en cinta y cubierto con plástico se recomienda realizar el traslado de RCD en lonas en las zonas de trabajo, para tener mejor transito y espacio con el fin de poder realizar el retiro de RCD.

Diana C. Morales V.

Viernes, 13 septiembre de 2019.

La interventoría evidencia que siendo las 12:24pm del día presente, sólo se encuentran 3 trabajadores en obra, se le solicita al contratista de inicio inmediato a las labores de reforzamiento que ha venido adelantando en la semana correspondiente a figurado y amarre de acero de refuerzo, perforaciones y anclajes, demolición de viga de cimentación. Jessica Lopera

Se le recuerda al contratista hacer la prueba (~~la prueba~~) de tensión que tiene la varilla con el epoxico en las vigas de cimentación, esto es importante ya que se requiere verificar el funcionamiento del epóxico utilizado y de igual forma descartar que el concreto preexistente el cual se ve poroso y de fácil demolición soporte estas fuerzas requeridas en los planos de diseño. Jessica Lopera

Siendo las 5:00pm se tiene trabajadores laborando en total hoy 3 del componente electrico.

Sabado 14 Septiembre del 2019

Con base a las observaciones del dia 4 de septiembre por parte de Interventoria, el dia 5 de septiembre se envia material fotografico evidenciando y subsanando el tema en campo; el dia 10 de septiembre se realiza la capacitación en el manejo de Residuos solidos, se hacen partícipes 22 colaboradores en lo cual se puede evidenciar con la capacitación de este dia.

William Javier Vargas

El día viernes 13 de Septiembre se realizaron las respectivas pruebas de tensión a los anclajes epóxicos ubicados en zapata 1 y 2. de 5/8" para zapata y 7/8" para columna

PAC

Lunes 16 septiembre 2019.

La interventoría revisa que el contratista de obra tiene el siguiente personal en obra: 3 personas realizando trasiego de material producto de excavaciones de la red electrica, 2 personas realizan la excavacion manual para cajas de inspecion red de desague. 4 personas realizan amarre de acero de refuerzo para zapata y muro 1, 3 personas realizan desmonte de ventanas, para un total de 12 personas el día de hoy.

- La interventoría en compañía del contratista de obra y el apoyo a la supervisora de la sede IMPRENTA DISTRITAL, asisten a reunión con la consultoría para tratar y aclarar los temas de red hidrosanitaria y red contra incendio. Dicha acta queda plasmada en el acta de comite N. 50
- La interventoría revisa y verifico el ingreso a obra del hierro figurado de 3/8 y 5/8 proveniente de Sidenal con su respectivo certificado de calidad.
- Tiempo seco.
- El contratista de obra hace llegar a la interventoría en las horas de la tarde, via correo electronico, el informe del ensayo de resistencia a traccion de los anclajes epoxicos de varilla N° 7 y N°5 para revisión.

Jessica lopera

Martes 17 septiembre 2019.

- La interventoría revisa en obra el siguiente personal. 3 personas realizan amarre de acero zapata 2 y muro M4. 4 personas realizando perforaciones en columnas ubicadas en el eje 1 entre A y F para su posterior anclaje y eje 5 entre ejes A y F 3 personas realizan amarre de acero en zapata 1, 3 personas realizan desmonte de ventanas, 3 personas realizan trasiego de material de excavacion. para un total de 16 personas.
- Teniendo en cuenta que el día 13 de septiembre, se encuentra nuevamento piedras de gran tamaño en la excavacion de la cap electrica costado oriente edificio 1. Se le recomienda como interventoría tratar de romper la piedra con taladro y en su defecto si no es posible, proponer una caja de menor tamaño justificando con fotografías el porque, para revision y aprobación.

Jessica lopera

* Miercoles 18 de septiembre del 2019

Profesional Ambiental y SST: se realiza recorrido diario en el frente de obra el personal cuenta con los respectivos elementos de protección personal, encuentran realizando actividades de excavación y armado de acero. Se verificó el estado de los baños portátiles y los acopios temporales de residuos de construcción y demolición.

COPIA PAC


Se le solicita al contratista que deberá realizar la disposición de residuos de construcción y demolición, ya que no se ha realizado la disposición desde el 13 de septiembre del 2019, y se extiende el tiempo de máximo acopio de los mismos.
Así como se le solicita al contratista realizar la disposición de residuos especiales o llevarlos al punto de acopio del contratista.
Diana C. Morales V.

- Teniendo en cuenta que hasta el dia lunes 16 septiembre de 2019 se tiene resultados al ensayo a tracción de los anclajes, no alcanzando la resistencia que indica el plano RE-01, se le recomienda al contratista no continuar con esta actividad hasta tener la solución y concepto de parte de la interventoría, de igual manera se solicita saber cual es la solucion constructiva y concepto que tiene el asesor estructural del contratista. Jessica lopera.
- Se le recomienda al contratista realizar la instalacion de tuberia de desague Ø4" ubicada en el costado sur entre ejes G y J, igualmente hacer las cajas de inspeccion con ladrillo tolete ubicadas en el mismo sector, debido a que ya se realizó la excavación y por motivos de lluvia puede desestabilizar el terreno.
- Se le recomienda al contratista realizar la instalacion de diámetro 4" para desagues paralelo al eje U, ya que la excavacion ya esta culminada en esta area.
- El dia de hoy 18 de septiembre de 2019 no se evidencia personal operativo para actividades hidrosanitarias.
- Se le recuerda al contratista que para dar inicio a cualquier actividad de obra se debe realizar se debe realizar el replanteo respectivo y posteriormente notificar a la interventoría y así de esta manera ser verificado para dar inicio al prizes constructivo.
- Se recuerda al contratista que toda entrega de resultado de laboratorio, certificados de material y equipo deben hacerse de manera oficial con la respectiva firma del residente de obra y en efecto del laboratorista quién realiza el ensayo.

Jueves 19 septiembre 2019. Jessica lopera

- la interventoría revisa que el contratista de obra tiene el siguiente personal en obra: 4 personas en excavación manual para red electrica y acopio de material de excavación, 3 personas realizan corte y figurado de acero para refuerzo de las columnas, 3 personas realizan aseo en la obra, 3 personas realizan perforaciones en las columnas para un total de 13 personas operativas

- El dia de hoy se realizaron perforaciones y anclaje a la columna (1'E) del area administrativa, la interventoría revisó y verificó la profundidad de la perforacion y limpieza previa antes de realizar anclaje con el epoxico SIKA 3001. aprobado por la interventoría.
- La interventoria revisa el proceso de demolicion de vigas de cimentacion en el eje 1 (E-F), esta actividad se realiza tomando en cuenta la solucion de la Ing Ruby Prieto Mejica de la consultoría P&D frente a los resultados obtenidos en el ensayo a traccion de los anclajes al concreto, donde se evidenció que fallaba el concreto.
- La interventoria reporta lluvias el dia de ayer de 2:00pm a 4:00pm El dia de hoy se presento de igual manera lluvias fuertes 10:00am a 12:00pm. y de 3:30pm a 4:30pm
- Se le solicita al contratista realizar retiro del material de escombros y de excavación ya que el punto de acopio se encuentra saturado.
- Se le solicita al contratista presentar al interventoria la ficha tecnica del adhesivo epoxico para adherir concreto nuevo y concreto viejo o preexistente a utilizar proximamente, para aprobación. Ya que es importante controlar tiempo que funciona el producto despues de ser aplicado.
- Se le recomiendo al contratista programarse tecnicamente y en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo para las actividades en caliente proximas a ejecutarse, presentando ante la interventoria los certificados de la soldadura a utilizar en la unión de los estribos de las columnas, personal competente para trabajo con soldadura, adecuacion del lugar donde se hara la soldadura y la respectiva protección de los elementos aledaños.
- Se le solicita al contratista informar al inicio de cada semana la programacion de ingreso de material y vaciados de concreto a realizar, para proceder con los protocolos de calidad correspondientes y realizacion de formatos de liberacion previos al menos con 1 día de solicitar el concreto.
- Se le solicita al contratista que las vigas que se estan demoliendo parcialmente y que tienen continuidad, deberan quedar demolidas a 45° grados



• En el proceso de demolición del lineal de muro aledaño a columnas A5 y B5 en el cual queda suelto de los elementos estructurales, se produce colapso de muro siendo las 4:30pm, en el primer piso del area administrativa.
Se recomienda al contratista realizar la demolicion de estos elementos completamente y de forma controlada en primer y segundo piso para evitar un accidente en obra.
Jessica Lopera

Viernes 20 Septiembre 2019

El día de hoy se registran lluvias fuertes en horas de la mañana desde 8:00 am a 1:00 pm.
Se continúa con actividades de excavación para redes eléctricas en fachada sur.
Se continua con la demolición de vigas de cimentación en Zapata 2. instalación de anclajes epóxicos en cimentación de columnas. eje 1', se realizaron las perforaciones para los anclajes en columnas. en eje 5'.
Se terminó el armado del acero de refuerzo de la Zapata 2, se verificó el armado del elemento. que esta listo para realizar el vaciado del concreto de Zapata 2.
Alejandra

el dia 20 de septiembre a las 3 de la tarde se realizo la liberacion de concreto de la zapata 2 ubicada entre ejes 2 y 2 y ESE EyF en compañia del contratista donde se verifico dimenciones, cantidad, diametro y espacios del acero de refuerzo segun planos de diseño y especificaciones Tecnicas.
Jessica Lopera

se le recomienda al contratista realizar apuntalamiento al contratista.
Jessica Lopera

Al finalizar el día se realizó la liberación del elemento Zapata 2. para realizar Vaciado de concreto. el dia de mañana como se tiene programado.

De igual manera se realizó el respectivo apuntalamiento a la placa de 2do Piso Admi. ETE A.

Alejandra B

Sábado, 21 de Septiembre 2019

-Se realizo el vaciado en concreto de 4000 psi para la zapata tipo Z-2 con su respectivo proceso constructivo como lo exige las especificaciones tecnicas del proyecto.
se le recomienda al contratista realizar el debido proceso de curado del concreto vaciado para la zapata tipo Z-2.
-Se realizo el ensayo de asentamiento cono de ~~Slump~~ abrahám para el concreto suministrado por la concretera Holcim.con andino al contratista consorcio pdni sedes ou, lo cual se evidenció en remisión que salio de planta con un asentamiento de 4" mas o menos 1, y en obra dio un resultado de 3", adicionalmente contratista tomo 8 cilindros de ensayo para compresión y la interventoria tomo 4 muestras para el mismo ensayo.
el dia sabado 21 de septiembre de 2019 se realizó el apique en zona de produción para ubicar cimentación y proceder a ser los anclajes respectivos para realizar el ensayo de tración en esta zona, pero se evidencia que el piso se encuentra con sobrecapa de contrapiso, lo cual el apique se realizó a una profundidad de 60 cm y no se encontro la cimentación de esa zapata y viga de cimentación lo cual para proceder a excavar a una mayor profundidad es necesario ampliar las dimensiones de la excavación para proseguir con esta actividad, pero por espacio y trabajo que realizan el personal de la imprenta distrital no se puede proceder hasta que esta zona no este despejada.
se le recomienda al contratista realizar el curado del concreto vaciado el dia de hoy aplicandole agua de dos a tres veces al dia para garantizar un fraguado óptimo y adecuado.

COPYPAC

El día domingo 22 de Septiembre, se realizó el curado del concreto Zapata 2, se le apliró agua para garantizar el fraguado. 2884

Alejandra B.

Lunes 23 de septiembre de 2019

-> se realizó la liberación de concreto de la zapata 1 donde se verificó dimensiones, diametros y distanciamiento de barras de acero, cumpliendo con lo propuesto en planos y especificaciones, se aprueba el vaciado del concreto.

-> se le recomienda al contratista que cualquier actividad que se realice o se de inicio se debe realizar su respectivo replanteo y verificación de dimensiones y ser informado a la interventoria para su respectiva aprobación.

el dia de hoy el contratista dio inicio a la actividad de reforzamiento de cerchas en la cubierta en la zona administrativa segundo nivel. donde no fue evidenciado el replanteo ni presentado a la interventoria.

se le recuerda al contratista que las actividades que se den inicio sin ser presentado ningun replanteo a la interventoria corre a cuenta y riesgo del contratista

se le recomienda al contratista realizar los ensayos establecidos en las especificaciones tecnicas y planos de diseño de manera preventiva, para el reforzamiento de cerchas y demas actividades

se le recomienda al contratista realizar retiro de material proveniente de excavaciones de canalización de red electrica y desagues para mantener esa área despejada.

todo anclaje que se vaya a realizar previamente tiene que ser informado a la interventoria para verificar ubicación, profundidad de perforaciones y limpieza del mismo.

el contratista realizó la subsanación del oficio AV-interv-ucu 4733000-730-2019-OF096 con asunto solicitud del proceso realizado y sello de Fisuras Viga Zapata 1

Jessica Lopez

COPIA PLAC

El dia de hoy se continúo con el curado del concreto de la zapata 2, se le aplicó agua en el transcurso del dia.
Se continúo con el armado de acero de refuerzo de la Zapata 1, se verificó y liberó por parte de la Interventoria ~~para~~ este elemento para poder realizar el vaciado del concreto.
Se aplicó el Sikagrout-212 para rellenar fisura en sobre viga de cimentación según recomendación del Ing. asesor estructural Juan Jacobo Pinilla Consorcio Phoni Sedes 04. y aprobado y autorizado por la Interventoria.
Se dió inicio a el reforzamiento de cubierta. ~~de~~ estructura metálica en correas. sobre el EJE 5' y 4', se le informó a la Interventoria por donde se iban a iniciar las actividades y que los elementos a reforzar están en el plano de detalle, Se están utilizando las medidas de precaución para: proteger tejas de cubierta y piso.
Se continúa con el retiro de material proveniente de excavación en redes eléctricas, trasiego a punto de acopio

Martes 24 septiembre 2019

- la interventoría revisa que el contratista tiene el siguiente personal de obra. 3 personas realizan andaje para columnas en el eje 1 entre ejes A y F. 1 soldador, 2 personas realizan corte y figuracion de acero de refuerzo, 4 personas realizan excavacion manual para canalizacion de red electrica, 2 personas realizan demolicion de vigas de cimentación. para un total de 12 personas operativas.
- No hay personal hidrosanitario trabajando.
- No se evidencia aumento del personal como contingencia a los atrasos de la obra. No se tiene plan de contingencia, se solicita entregarlo de inmediato y ponerlo en marcha.
- No se ha retirado el material acopiado producto de demolicion y excavacion desde la semana pasada, se solicita al contratista gestionar esta actividad de caracter inmediato

2886

- Se tiene agregado expuesto sin cubrir repartido sobre el anden del eje 4. por lo que esta interventoría solicita que se cubra teniendo en cuenta que no lo estan trabajando y que las lluvias de los ultimos dias podrian transportar este material particulado a las cañerías de la Imprenta y taponarlas.
- Se requiere que el contratista de obra utilice proteccion para los pisos preexistentes en el momento de realizar actividades como vaciados de concreto y trabajos en caliente con soldadura. De igual manera una vez terminados los vaciados se debera realizar limpieza al piso.
Se requiere mayor proteccion de piso preexistente ya que estan descargando material metálico y escombros sobre este deteriorandolo.
- Se realiza prueba de tinta sobre los puntos de soldadura en la correa del segundo piso area administrativa entre eje 5'-1' y eje A-B-C. El resultado de esta prueba arroja que la soldadura presenta disconformidades fisuras y porosidad por lo que se requiere al contratista de obra mejorar la soldadura para posteriormente realizar una segunda prueba.
- Se recomienda al contratista de obra utilizar el termo para soldadura y guardar en este los electrodos para mantener la temperatura ideal para soldar.
- Se le recomienda al contratista de obra realizar el desmonte de la teja para realizar el trabajo de soldadura en correas y en las cerchas de cubierta toda vez que se evidencia algunos elementos afectados por esta labor.
- Se le recomienda al contratista de obra evaluar la pertinencia de retirar la estructura en aluminio del cielo falso para realizar el reforzamiento de las cerchas de cubierta, como mecanismo para aumentar el rendimiento y evitar que se dañe con el proceso de soldadura.
- Se solicita al contratista de obra mejorar el aseo general.

Jessica Lopera

El día de hoy se realizó el vaciado del concreto de zapata 1. concreto de 4000 psi premezclado de Concretera Hormigón Andino. 8 m^3 para zapata 1 y 1 m^3 para cimentación (Dados) de columnas.
Se realizo el respectivo asentamiento 5 ½", se tomaron 8 muestras de cilindros para ensayos a compresión. Se aplicó el Sikadur-32 para unir concreto antiguo con nuevo en los puntos donde se

COPYPLAC

requiere.
Una vez realizada la prueba de tintas a la soldadura de la estructura metálica de cubierta, se procede a mejorar el cordón de soldadura, y se hace necesario desmontar la estructura del cielo raso existente para realizar de manera óptima esta actividad.
Se continua con actividades de trasiego de material proveniente de excavación a punto de Acopio y perfilado para cajas eléctricas.

*26 de septiembre de 2019
Tiempo seco
Personal en obra 16 personas
se solicita al contratista de manera inmediata que organice y mej el aseo en el area donde se esta realizando la excavación para l electricas — o — o — o — o — o — o — o — o —
se le solicita al contratista organizar la polisombra en la par exteriores donde se estan realizando las excavaciones electrica ya que con las aberturas que tiene puede ingresar personal de imprenta y presentarse un accidente. — o — o — o — o —
se le solicita al contratista de manera inmediata que inic la construccion de la caja electrica aledaña al edificio de archi toda vez que por las lluvias se esta desestabilizando.
Jessica lopera
El dia 26 de septiembre se informa a la Interventoría que el dia 25 de septiembre se vetiran dos viajes de escombro cada viaje de 7m³, para un total de 14m³; se envia material fotografico subsanando las observaciones de interventoría con la limpieza de los cargamos, la señalización y demarcación del area Archivo.
Con respecto al material que se va a utilizar en las cajas de inspección electricas, no se puede trasladar al punto de Acopio provisional debido a que se va a reutilizar en SITU.
Con respecto a la protección de piso, el contratista acata la observación y se hara [illegible] con respecto a lo que se

estipula tanto para los vaciados y para la aplicación de soldadura

Leidy Fonseca Vaya

Teniendo en cuenta que se iniciará en el area de produccion el día 1 de octubre, se requiere que la interventoría conozca el plan de trabajo o programacion para esta area. esto teniendo en cuenta que la entidad no va a tener personal en esta área. operarios de labores de impresión. por tal motivo el dia de mañana 27 de septiembre de 2019 se realizará reunion entre el equipo de interventoría y contratista para que presente la programación y surtir las debidas revisiones. Jessica Lopera.

Se solicita al contratista de obra apuntalar cada columna (~~cortesón~~) y placa antes de iniciar demolición de vigas de cimentacion. Jessica Lopera

* Se inicia con la instalación de la Tubería eléctrica en fachada sur, Ducto DB 3" x 6m PVC. Ducto DB 2" x 3m PVC. pavco. y Ducto TOP 4" x 6m Pavco.

Se continúa con el armado del hierro de Columnas. Instalación de platos y aplicación de cordón de soldadura sobre la parte superior.
Se realiza Limpieza y aseo en todos los sectores de la Obra, se adecua la polisombra en la parte posterior, siguiendo la recomendación de La Interventoria.
Se registra ingreso de Grauilla para iniciar con la instalación de la Tubería Sanitaria red exterior.

Se continúo con el mejoramiento de la soldadura en estructura metálica de cubierto. en 2do Piso Administ.

27 septiembre 2019 Viernes.

* La interventoria evidencia que el desconfinamiento en las paredes de la excavacion de las cajas electricas en el costado sur exterior del edificio 1 se hace mas pronunciado.
Toda la excavacion exterior presenta grietas con proximos desconfinamientos las excavaciones no estan siendo cubiertas en la tarde, por lo que las

Lluvias nocturnas estan inundando las excavaciones.

- El contratista de obra no ha iniciado el proceso de construccion de estas cajas.
- El terreno se puede estar viendo afectado por la absorcion de humedad situacion que puede ser contraproducente y verse las consecuencias de hundimiento en el adoquín una vez concluida la obra a consecuencia de la saturacion de agua en el suelo.
- Nuevamente se le solicita al contratista actuar diligentemente y de manera inmediata en la construcción de las cajas electricas e hidraulicas que se excavaron hace mas de 15 días, iniciando por la caja que ya presenta desconfinamiento y que esta exponiendo la cimentacion del edificio 3 archivo.
- Se evidencia que el contratista de obra esta afectando los individuos arboreos en la zona exterior suroriental, toda vez que el material producto de excavación en esta area está distribuido por todos lados sin ningun control, se le requiere al contratista de manera inmediata recoger este material de la zona verde y cerrar con polisombra para proteger el producto de excavacion cubriendolo.
- La interventoria evidencia que el personal de obra esta saltando los cerramientos con polisombra, deteriorandolos y faltando a los protocolos de seguridad y salud en el trabajo.
- Se realiza reunión entre interventoría, contratista de obra y el apoyo a la supervision para revision del cronograma del area de produccion teniendo en cuenta que no va a haber personal propio de imprenta. Esta reunion queda en el acta de reunión Nº 61.
- Al dia de hoy no se tiene cangeo, polisombra o malla como proteccion al material particulado proveniente de construccion para evitar taponamiento en la red de desagues de aguas lluvias.
- Al dia de hoy el contratista no ha atendido la solicitud de demoler los muros no estructurales los cuales desconfinó de las columnas en el segundo piso. Se evidencia que uno de estos muros ya presenta desplome y representa un riesgo alto de accidente en obra. Se requiere que de manera inmediata sea atendida la solicitud de demolición controlada de estos muros.

Jessica Lopera

COPIA FIEL

El arquitecto Mauricio Rolido Sierra apoyo a la supervision informa que el dia miercoles a las 7:00 am vienen a Imprenta Distrital los proveedores de las maquinas alzadora y barnizadora, para presencia de los residentes y prever embalaje este mismo día en presencia de los proveedores
27- Sept. - 2019.
Se realizo visita al predio de la imprenta distrital y se verifico en terreno el trazado de las tuberias que se repondran, para la obra, en especial los tramos que van a intervenir dentro de las áreas directas del sistema radicular de algunos árboles.
Se informa que la actividad de manejo y poda radicular se puede adelantar tomando las medidas necesarias para garantizar la sobrevivencia del árbol, entre ellas la menor afectación al volumen radicular, su debido corte y cicatrización y la colocación de barreras entre las raices a permanecer y la tuberia.

Mauricio Suaiz U.
Ing. Forestal
Cel. 3118228699.

27-09-2019
Se realiza la inspeccion de obra por parte del supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de Interventoria donde solicitad la demolicion de los muros del segundo piso costado sur-occidental la cual fue realizada, se solicita demarcar el area y el vaciado de borde de placa. Juan Carlos Bocanegra Interventoria

Sabado, 28 septiembre de 2019.
Profesional Ambiental. Se realizó recorrido diario en obra donde se vinculo el siguiente personal: 3 electricos, 2 hidraulicos, 10 oficiales, quienes contaban con sus elementos de protección personal y su dotación.
Se verifica que la zona de acopio de residuos de construcción

PAC

y demolición, se encuentra con menor cantidad de ma
acopiado, el acopio de residuos peligrosos se encuen
acopiados hace más de 1 mes, donde se solicita al c
fisto realizar la gestión final de los mismos teniend
en cuenta los residuos acopiados de las demás sedes.
Frente al acopio de material de excavación, se encuen
afectando los individuos arbóreos, razón por la cual se
licita de manera inmediata frente al cerramiento de
individuos y el orden y aseo de la zona.

Lunes 30 septiembre 2019.

Tema electrico: Se realiza recorrido de obra se
evidencia excavación para las cajas electricas,
excavacion e instalacion de tuberia DT de
6 pulg y de 3 pulg, entre la planta electrica y
la subestacion, y entre la subestacion y
el cuarto technico de la red contra incendio
En la excavacion de la tuberia se evidencia las
capas de arena y la instalacion de la cinta de
señalizacion. En la parte documental se revisa
las actividades ejecutadas y a ejecutar contra
los planos y se identifica su ubicación y
cantidad

Ing electricista
Interventoria

El día de hoy la interventoría revisa las áreas de trabajo y se encuentra
que las excavaciones para cajas electricas e hidrosanitarias amanecen l
de agua por las lluvias del fin de semana, no se ha iniciado labores
construcción de cajas, el contratista realiza extracion del agua en la
mañana con bomba eyectora, la interventoria solicita iniciar los a
de construcción de cajas de inmediato para evitar que se siga afecta
el terreno.

El contratista de obra no ha realizado la instalacion de polisombra so
cárcamo, sobre este están evacuando las aguas provenientes de entr
de las cajas electricas.

La interventoría revisa y verifica el personal en obra teniendo 2 pe
hidrosanitaria realizando instalacion de tuberia de desagüe en e
costado sur. El inspector de interventoría revisa la instalacion y

COPYPLAC

2892

3 personas realizan relleno e instalacion de tuberia electrica.
5 personas realizan amarre de acero en M1 y M2.
1 soldador con un auxiliar realizan soldadura en reforzamiento de estructuc metalica de cubierta, area administrativa, segundo nivel.
Total de 15. personas.
Martes 1 octubre 2019.

Jessica Lopera # Interventoría.

Segun reunión interna entre contratista obra, interventoría y entidad suscitada el dia viernes 29 de septiembre en las instalaciones de imprenta Distrital, el inicio de actividades ~~de~~ en esta area (zona producción) debe iniciar el dia de hoy. Sin embargo no se da inicio ya que aun esta area esta con personal, papel y maquinas.
Profesional Ambiental. se realiza recorrido diario de obra, identificando que el personal cuenta con los elementos de proteccion personal, dotacion y carnet de identificacion. Personal en obra siendo 5 oficiales civiles y 2 auxiliares civiles, 2 oficiales electricos y 5 ayudantes electricos, 1 oficial hidraulico, 1 ayudante hidraulico, 1 residente de obra, 2 encargados, 1 inspector interventoría, 1 residente interventoria 1 profesional SST interventoria.
Se lleva a cabo socialización con el personal de obra sobre simulacro distrital que se llevará a cabo el día 2 de octubre, con asesoria de la profesional PIGA Edna Bayona, tiempo seco.
Se revisó y verifico el orden y aseo en obra, se solicita al contratista realizar la recolección de material resultante de la demolición de muro, zona administrativa, así como realice el trasiego al punto de acopio temporal.
Se solicita nuevamente al contratista realice la disposición final de los residuos peligrosos que se encuentran acopiados.
se solicita que se realice la señalización y cambio de identificación del punto de acopio, por mal estado, de manera inmediata. Diana Corrales V.
Miércoles 2 octubre 2019.
Profesional Ambiental.
Se realiza por parte de la entidad, contratista de obra e interventoría el simulacro de evacuación a las 9:00 am,

PAC

MANZANA LIEVANO

zona de acuerdo alo programado esta zona IGU almarte se termina hoy. Igualmente se inicia la actualizacion de gabinetes en el palacio municipal, pendiente de instalar Vidnes y Martillo. se realiza la actualizacion de tres gabinetes. Oscar Ribero
Residente de obra.

31/08/2019. Profesional Ambiental.
Se realiza recorrido diario de obra, donde el personal se encuentra laborando en el sótano 1 (área rampa), cumpliendo con el uso de epp, andamios y permisos de trabajo.
Frente a la atividad programada de retiro de residuos peligrosos y especiales, se cancela debido a que el vehículo no cumple con la capacidad de carga teniendo en cuenta que es tubería de 6m de largo y de 4" y 6", así como no contaban con el personal para hacer el trasiego desde sotano 2 hasta sotano 1 (entrada vehicular); razón por la cual no se da cumplimiento al compromiso adquirido. por falta de logistica. Firmo Diana C Morales Y.

31 de Agosto de 2019. Interventoría realiza revisión de actividades de obra por parte del Consorcio Pruni Sedes 04 encontrando lo siguiente: actividades de instalación de tubería de 8" y de 6" en sótano 2, actualización de gabinetes y cambio de valvulas, manguera en Edificio Llévano. En obra se encuentran Residente de obra, residente S.soma de obra, 1 encargado hidraulico, 6 oficiales hidraulicas, 3 ayudantes hidraulicas, 2 oficiales de obra civil, residente Sisoma de Interventoria y 1 residente de Interventoría. 2 oficiales de ornamentación que realizan reforzamiento en escaleras para la posterior perforación e instalación del stand pipe en edificio Bicentenario 1

Ing Carlos Wilches
Residente de Interventoría

2 de septiembre de 2019. Se realiza reunión entre los representantes de la secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. contratista de obra Consorcio Pruni Sedes 04 e Interventoría para hacer entrega del Balance N1 del contrato para tener en cuenta las mayores y menores

cantidades de obra los conclusiones de las reuniones por frente de obra quedan consignadas en actas de reunión. En obra se encuentran durante el dia 1 Residente de obra, 1 auxiliar SST de obra, 3 oficiales hidraulicos, 2 oficiales de obra civil, 1 auxiliar de servicios generales. Ingeniera de apoyo de interventoría 1 Residente de interventoría. Se realizan cambios de valvulas en gabinetes contra incendio, cambio de mangueras en sótanos. Remates a las observaciones presentadas por la Interventoria en edificio Bicentenario 2 tercer piso y en Bicentenario 1 en primer piso, remates de pintura ajuste de escudos en dry wall, limpieza general. En horas de la noche se realiza instalación de tubería de 8" y 6" en sotano 2 zona de rampa y empates de tubería. Se realiza el retiro de la tubería desinstalada de 4" y 6"

03-09-2019.

(1) Se solicita despejar tema de la capacidad electrica del edificio respecto a la potencia de la bomba. Concepto enviado a la dirección de proyecto por correo electronico el 28 de agosto de 2019.

(2) En recorrido se evidencio que es necesario romper muro en mampostería del piso 4 para ajuste valvula de 2 1/2" en gabinete porque se seccionó el niple de 2 1/2 que conecta la valvula con la columna de incendio.

(3) No se ha recibido concepto respecto a la prueba sísmica de la red contra incendio del ~~de~~ sotano 2.

Residente Hidrosanitario.
Prui cedula 04

3 de septiembre de 2019 Se encuentra el siguiente personal en obra Residente de obra, coordinadora de obra, residente de interventoría, ingeniera de apoyo interventoría, 3 oficiales hidraulicos, 1 oficial de obra civil, auxiliar de aseo. En la noche se encontraron 4 oficiales hidraulicos, 1 encargado hidraulico

COPIA

2 ayudantes hidraulicos. En el día se realizan adecuaciones e instalación de valvulas y mangueras en edificio Bicentenario 1 En piso 4 se revisó y evidencio que no se podo retirar una valvula porque se rodo el miple de conexión, se debe revisar si se puede romper el muro por la parte interna de un archivo para hacer el cambio de miple y hacer la instalación de la nueva valvula, se realizo aseo general en las areas yo intervenidas al igual que remates a observaciones presentadas por Interventoría Interventoría Solicita coordinar el personal que debe realizar las perforaciones en los descansos para la tubería stad pipe del edificio Bicentenario 1, esta actividad se encuentra retrasada porque estaba programada a partir del 30 de agosto y a la fecha no se han realizado generando retrasos en esta actividad. Consorcio Pruni Sedes 04 esta incumpliendo la programación pactada el dia 28 de agosto con Interventoría y la secretaría General de la alcaldia mayor de Bogotá D.C.


Residente Interventoria

Interventoria Arquitectura Urbana


SE DEJA CONSTANCIA EN BITACORA QUE LAS ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA CONTRACTUAL SE VEREAN AFECTADOS PARA ESTAS TUBERÍAS POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONSORCIO PRUNI SEDES 04 SUS ACTIVIDADES ESTAN PROGRAMADAS CON FECHA DE INICIO EL 22 DE JULIO DE 2019 PARA FINALIZACIÓN EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLO HASTA EL 12 DE AGOSTO SE REDEFINIO POR LA CONSULTORIA COMO QUE SE INSTALABA EL EQUIPO DE 1250 GPM (BOMBA) GENERANDO: AL CONSORCIO PRUNI SEDES 04 21 DIAS DE ATRASO MAS 15 DIAS POR SUMINISTRO, PARA UN TOTAL DE 36 DIAS DE ATRASO NO ATRIBUIBLES AL CONSORCIO PRUNI SEDES 04.

LAS ACTIVIDADES DE PERFORACIONES A LA FECHA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION E INTERVENTORIA

realiza presentación de tubo de 4" y de 2" de drenaje y alimentación de tubería de red contraincendio en escalera de edificio licuano y se acordo lo siguiente, entre Supervisión, interventoria y contratista



pasar el tubo de 4" y de 2½ sin cortar el pasa manos existente y lo mas pegado posible al perfil existente de 10cm

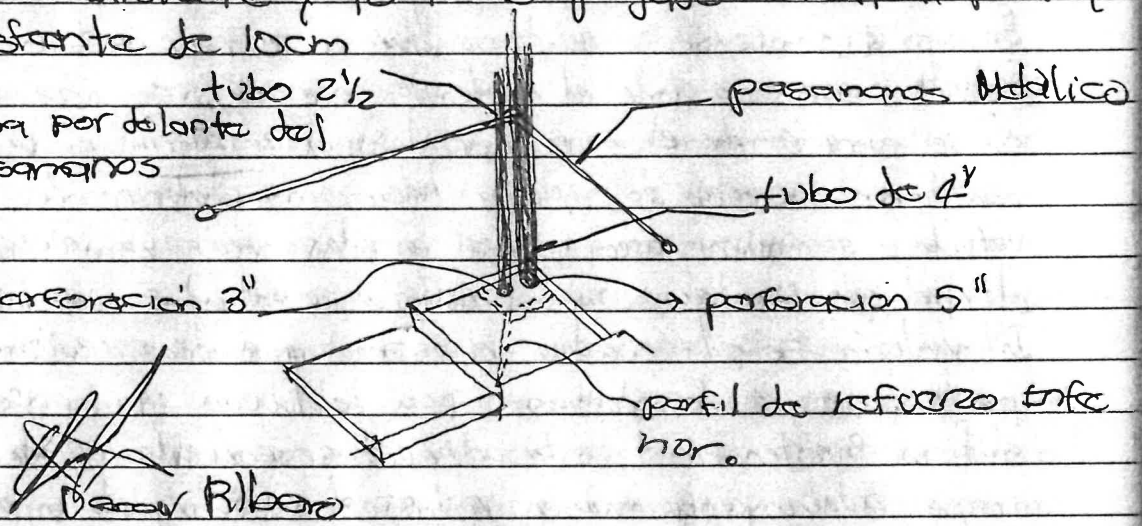

Oscar Ribero

04/09/2019 Se hace recorrido SSTA y se evidencia que otros contratistas ó usuarios del Acopio de residuos de la entidad, están ubicandolos en el sitio asignado a consorcio peum en el sotano 1, Recubriendo Dry Wall con residuos de metal, escombro (cemento y mezcla en bolsas), alfombra, madera. El dia de hoy se retiran los residuos especiales y se informa la novedad a la interventoria.

Se revisó y se encuentra por parte de interventoria el siguiente personal, residente de obra, residente SISOMA, auxiliar SST obra 6 oficiales hidraulicos 2 ayudantes hidraulicos, auxiliar de servicios generales, residente de interventoría. En revisión y verificación de actividades en obra se encontro que el dia 4 de septiembre de 2019 se realizaron las perforaciones en obra de stad pipe de Bicentenario I, el día de hoy se comienza instalación de tubería vertical, se realizan actividades de señalización y aseo general


Residente Interventoría
Ing Carlos Wilches

05 de Septiembre de 2019 Interventoria realiza revisión de personal en obra encontrando: Residente de obra, residente sisoma, auxiliar SST Obra, 6 oficiales hidraulicos, 3 ayudantes hidraulicos, auxiliar de servicios generales y residente de interventoria interventoria hace revisión de la instalacion de tubería stad pipe desde sotano 1 hasta cuarto piso en Bicentenario I

COPIA PAC

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. informa mediante la Arq. Monica Álvarez que la secretaría de Gobierno solicito una semana más de plazo para ingresar a instalar la red contra incendio en sus oficinas, por lo tanto no se comienza el dia 9 de septiembre de 2019, la fecha de inicio es el 16 de septiembre de 2019. Como plan de contingencia la Arq. Monica Álvarez se compromete a realizar entrega de las oficinas del edificio Bicentenario I piso 3 en su totalidad las cuales se pueden iniciar el día 6 de septiembre despues de las 5 pm hasta el dia 15 de septiembre de 2019. solicita a la Interventoría notificar al consorcio PRUNI SEPES 04 para que realice toda la logistica para iniciar con los cerramientos y retiro de cielo raso de la nueva zona asignada

Piso 3 Bicentenario I

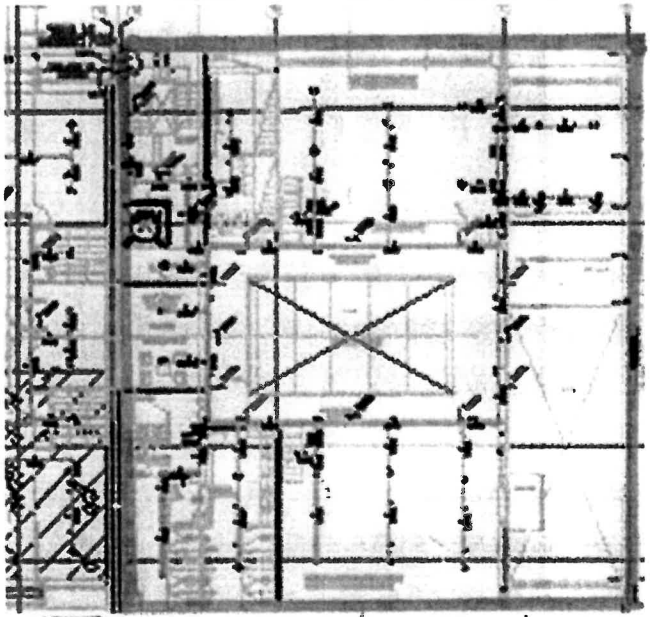

Area asignada todo el piso

Ing Carlos W. Lobo
Residente Interventoría

6 de Septiembre de 2019. Interventoría realiza revisión de personal en obra y se encuentran. Residente de obra, auxiliar SST, 1 encargado hidraulico, 6 oficiales hidráulicos, 2 ayudantes hidráulicos, 1 auxiliar de servicios generales, Residente SISOMA interventoría, residente SST interventoría residente de interventoría. Se realizan trabajos de acoples de tubería en cuarto de bombas. La secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante la Arq. Monica Álvarez ratifican la entrega de piso 3 del edificio Bicentenario I informando que queda libre

el 100% del piso y se puede iniciar actividades a partir de las 5:00 pm, realizan el retiro de los elementos de oficina quedando solo los muebles. Consorcio Pruni Sedes 04, Director de obra Ing. Fredi Gomez y residente de obra Arq. Oscar Ribero junto con la interventoría Arquitectura Urbana Ing Carlos Wilches hacen recibo del area a las 5 pm, totalmente libre de funcionarios y elementos de oficina. Interventoría realiza revisión del inicio de actividades y verifica que el personal hidraulico se retira de obra a las 3:40 p.m, no se encuentran oficiales para la protección y señalización del area, se encuentra que llega personal para realizar perforaciones en muros con saca nucleos. Interventoría deja consignado en esta bitácora que si el consorcio Pruni Sedes 04 no inicia de la manera adecuada se comienzan a presentar retrasos y se recuerda que las actividades programadas van desde el 6 de septiembre de 2019 a partir de las 5:00pm hasta la fecha de entrega 15 de septiembre de 2019 a las 11:59 pm y el compromiso del consorcio es trabajar todos los dias incluyendo domingos. Interventoría hace revisión y verificación en cantidades de tubería existentes en obra para comprobar que si tiene las cantidades necesarias de acuerdo a los planos de diseño.

Residente Interventoría
Ing Carlos Wilches

7 de septiembre de 2019. Residente de interventoría Ing. Carlos Wilches realiza revisión de personal en obra encontrando: Director de Obra Ing. Fredi Gomez, Residente SISOMA Sara Serrato, 1 auxiliar de servicios generales, 1 encargado hidraulico, 6 oficiales hidraulicos, 3 ayudantes hidraulicos, Residente SST de interventoría, Ingeniera de apoyo interventoría, Residente de interventoría. Interventoría verifica el estado del area de trabajo y solicita al contratista realizar el adecuado cerramiento en las puertas de Secretaría Juridica y puerta de edificio Municipal. El personal hidraulico realiza ingreso de tubería necesaria en piso 3, ingreso de equipos y herramientas. Director de Obra informa que no se va a trabajar el día domingo 9 de septiembre

Residente Interventoría
Ing Carlos Wilches

COPIA

9 SEPTIEMBRE DE 2019

SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA APROBACION PARA DESMONTE DE MUEBLES EN AREA DE OFICINAS INTERNAS PYU 3 , SOBRE LOS CUALES SE REQUIERE HACER 2 PERFORACIONES EN DIAMETRO DE 2" C/U LO ANTERIOR DADO QUE EL EQUIPO PARA PERFORACIONES TIENE UN PESO APROX. DE 70 LBS. POR LO QUE SE REQUIERE GARANTIZAR LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTA Y LOS MUEBLES NO PERMITEN QUE LA ACTIVIDAD SE EJECUTE EN CONDICIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS.

9 de septiembre de 2019. interventoría haciendo revisión a las 7:00 AM en el piso 3 Edificio Bicentenario I encuentro que el consorcio Pruni Sedes 04 no realiza desde el dia sabado 7 de septiembre el adecuado cerramiento y señalización de las puertas. No se realiza la totalidad de la protección del mobiliario y de la alfombra. Interventoría Arquitectura Urbana Ltda solicita la inmediata intervención a las observaciones presentadas se deja la anotacion en esta bitacora. Realizando revisión de personal se encuentra lo siguiente: Auxiliar SST de obra, encargado hidráulico, 6 oficiales y 3 ayudantes hidraulicos, auxiliar servicios generales. Se inicia la actividad de instalación de red contra incendio, se retira cielo raso modular. A media mañana llega a Manzana Llevano la coordinadora de obra Ing Sandra Parra y director de obra Ing. Fredi Gomez.

Residente Interventoría
Ing Carlos Wilches

10 de septiembre de 2019. Interventoría realiza revisión de personal en obra y se encuentran a primera hora 7:20 AM 1 encargado, 6 oficiales y 3 ayudantes hidraulicos, auxiliar SST de obra y Residente interventoría. Interventoría realiza revisión en instalación de tubería de red contra incendios de pisos tres edificio Bicentenario Se solicita aseo general por verificar que al momento de realizar nucleos para paso de tubería no se tuvo el cuidado necesario

Residente Interventoría
Ing Carlos Wilches

COPIA PAC

11 de Septiembre de 2019. Interventoría realiza revisión de personal en obra y se encuentran: 1 encargado hidráulico, 6 oficiales hidráulicos, 3 ayudantes hidráulicos, 2 oficiales de obra civil, 1 auxiliar SST, 1 auxiliar de servicios y enseres, Director de Obra y Residente de Interventoría. Se realiza instalación de red contra incendio de acuerdo a diseño en edificio Bicentenario 1 piso tres interventoría revisa y verifica ubicación de puntos de rociadores. Se realiza recorrido con profesionales y especialistas de la consultoría COINSI, Director de Obra, Supervición de apoyo e Interventoría entregando las siguientes observaciones: se ratifica y avala que la tubería de descarga del stand pipe sea de 2", se avala que la valvula de control del stand pipe se ubique cerca a la puerta de emergencia de las escaleras, se recomienda por COINSI que la descarga del stand pipe se haga entrega al tanque de reserva en cuarto de bombas, Se verifica por COINSI que la bomba jockey la capacidad y se recomienda realizar mantenimiento para no realizar compra de una nueva, se recomienda verificar con proveedor el estado de los tableros de bombas la compatibilidad de la nueva bomba y los mismos para no realizar compra de tableros nuevas, las valvulas del cabezal de prueba pueden ser reutilizadas. Consorcio Pruni Sedes 04 trabaja con su equipo de hidráulicos en la instalación de tubería en Bicentenario 1 piso tres zona de baños y pasillo.

Residente Interventoría
Ing Carlos Wilches

12 de Septiembre de 2019. Interventoría en recorrido diario verifica el siguiente personal en obra. Director de obra, apoyo a dirección de obra, auxiliar SST, 1 encargado, 6 oficiales y 3 ayudantes electricos, auxiliar de servicios generales, un oficial de obra, ingeniero apoyo de interventoría, residente de interventoría. Interventoría hace revisión a las actividades de obra en piso 3 edificio Bicentenario 1 de instalación de tubería y rociadores en cuarto tecnico

COPY PAC.

cierre de anillo principal de red contra incendio, inicio de prueba de presión a toda la zona. Se realiza reunión entre personas responsables de secretaría de Gobierno, secretaría General, consorcio Pruni sedes 04, interventoría Arquitectura Urbana, se hace presentación de la forma de trabajo para la implementación e instalación de la red contra incendio que se iniciara a partir del día 16 de septiembre de 2019, información que quedo consignado en acta de reunion. Posteriormente se realiza acompañamiento de Arq Miguel Agudelo de Secretaría de Gobierno, junto con el Arq de apoyo Dario Franco de Consorcio Pruni Sedes 04 y el Ing. Carlos Wilches de interventoría Arquitectura Urbana Ltda realizan recorrido y fotografías para acta de veracidad.

Residente Interventoría
Ing Carlos Wilches.

13 sept 2019 Prof. SST.

Se realizo recorrido de obra, donde se revisa y verificacion de personal en zona de escalera Bicentenario 1, PVO 3 de Bicentenario 1, el personal contó con sus epp y las zonas con su cerramiento y señalizacion.

Se realiza socializacion PVO 1,2,3 Bicentenario 2 drea o Secretaria de Gobierno, dado a la entrega e intervencion de zona cafeteria - baños - escalera de emergencia., en conjunto con el prof. SST William Fonseca (contratista), Arq Guiomar Olivares, Arq: Monica Alvarez y el inspector Juan Carlos Bnceño (interventoria). Y Ing Diana Morales (interventoria)

Ivma Diana Morales

13 de Septiembre de 2019

Se realiza verificación de personal en edificio Bicentenario 1 encontrado Director de Obra, apoyo a la direccion, auxiliar SST, auxiliar servicios generales, encargado de personal hidráulico 6 oficiales hidraulicos, 3 ayudantes hidraulicos, 2 oficiales de obra, Ing auxiliar de interventoría y residente Interventoría. Se realiza prueba de presión a red contra incendio de piso 3 Bicentenario 1 siendo positiva y aceptado por la Interventoría. Se realiza presentacion de valvulas de control y se acuerda la posición de las mismas

Residente Interventoría
Ing Carlos Wilches

14 de Septiembre de 2019
Interventoría revisa el personal de obra encontrando 7 oficiales, 3 ayudantes y un encargado hidraulicos, 2 auxiliares de servicios generales, 2 oficiales de obra civil, Director de obra, apoyo a dirección de obra, SST de Interventoría, Ing auxiliar de Interventoría, residente de Interventoría. Se realizan actividades de cerramiento en edificio Bicentenario I piso 4 y protección de mobiliario. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. informo que a partir del 19 de septiembre de 2019 se intervera en la red contra incendio en el pasillo y la scala estrategica del piso cuarto. Interventoria revisa la instalación de válvulas control incendio en piso tres y en sótano. Interventoria solicita al consorcio Pruni Sedes 04 que se trabaje todo el fin de semana como lo anuncio el Director de Obra Ing Fredi Gomez. se debe desmontar el cielo raso de madera de los tres pisos, realizar ventanas en dry wall. realizar los adecuados cerramientos, dejar materiales y herramientas en las zonas asignadas, proteger el piso y el mobiliario realizar la señalización. Se requiere concepto especialista de Obra perforación muro.

Residente Interventoría
Ing Carlos Welches

15 de Septiembre de 2019.
Interventoría realiza revisión y verificación de las zonas de trabajo, se encontro que no se presentaron personal del consorcio PRUNI SEDES 04, Se encontro cerramientos en piso 4 de Bicentenario 1, dejaron tubería en pasillo, No se realizo la limpieza de cielo raso
EL DOMINGO 15 SEPT. DE 2019 SE PRESENTARON A OBRA 3 OPERARIOS DE R.C.L. QUIENES SUBIERON MATERIAL A PISO 4 BICENTENARIO 1.
NO SE LEVANTAN ACTIVIDADES EN EDIFICIO BICENTENARIO 2 (GOBIERNO) DADO QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE NO HIZO ENTREGA DEL AREA COORDINADO EN REUNION DEL JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE (PISO 1 AREA DE OFICINAS SECRETARIA DE GOBIERNO ALA SUR OCCIDENTAL).

COPIA PAC
DIL OBRA CONSORCIO PRUNI SEDES 04

16 SEPTIEMBRE DE 2019

ando
2 auxiliares
Director
toría, Ing
Se
icentenario I
General
que a
en la
ca del
c
no.
04
anuncio

SOLO HASTA 8:30 A.M. SE PERMITE POR PARTE DE SEGURIDAD BICENTENARIO 2 PARA ACTIVIDADES DE PUNTO FIJO (ESCALERAS S-2 — P3) Y CAFETERIA Y BAÑO P1 - P3.

EN HORAS DE LA TARDE A LAS 5:00 P.M SE SUSPENDEN ACTIVIDADES EN P-4 BICENTENARIO 1 POR 1½ HORAS DEBIDO A REUNION EN SALA ESTRATEGICO POR PARTE DE LA ENTIDAD.

SE CONTINUAN ACTIVIDADES EN EDIFICIO BICENTENARIO 1 PISO 4 ZONA 1 (OFICINA DE PLANEACION Y TALENTO HUMANO) SOBRECIMIENTO, INICIO INSTALACION TUBERIA R.C.I, INSTALACION 3 ESTACIONES DE CONTROL Y DETECTOR.

SE REALIZO DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA PISO 1 EDIFICIO BICENTENARIO 2 ZONA DE CAFETERÍA, SE INICIA INSTALACION TUBERIA R.C.I. EN ESTA MISMA AREA.

DIRECTOR OBRA
CONSTRUCTORA PRUM
SEDE 04.

pisos,
cuados
l zonas
alizar
con muro.

17 SEPTIEMBRE DE 2019

INGRESO PERSONAL DE ORNAMENTACION PARA ACTIVIDADES ESCALERAS (REFORZAMIENTO PARA PERFORACIONES)

SE PRESENTAN INCONVENIENTES DE CARGA EN EL AREA DE ACTIVIDADES POR LO QUE SE REALIZO SOLICITUD A LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA CONEXION A 220V. LA CUAL FUE TOMADA DESDE LA SUBESTACIÓN, SE REQUIERE Y ACUERDO ENTRE CM QUE EL CONTRATISTA PRUM PONGA EN TABLERO EL DÍA DE MAÑANA UN TABLERO Y EXTENSION SUFICIENTE PARA LA CONEXION REQUERIDA, EN CONSECUENCIA SE ATRASA EN 1 DIA LA ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO ESCALERAS.

las zonas
personal
amientos
allo,

SIENDO LAS 4:15 P.M. SE ACUERDA ENTRE OBRA E INTERVENTORIA HACER RECIBO DE PISO Y CORTADO SUR ZONA 3 EDIFICIO BICENTENARIO 1. POR LO TANTO SE INICIARAN ACTIVIDADES EN ESTA AREA (PRELIMINARES) EL DIA DE MAÑANA MIERCOLES 18 SEPT/19. (FECHA DE INICIO REAL POR ENTREGA EFECTIVA).

ures de
tablero) dado
rpimado
ecinos

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE INSTALACION R.C.I. PISO 4 ZONA 1 BICENTENARIO 1, PERFORACIONES ESCALERA, REFORZAMIENTO ESCALERA (ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR TEMA DE ENERGÍA ELECTRICA), DESMONTE CIELO RASO PISOS 2 Y 3 (EDIFICIO BICENTENARIO 2)

Interventoria por parte de residente SISOMA abre bitacora para realizar observaciones del día 16 de septiembre del 2019.

- Se realiza reunión en la Sec. de Gobierno con profesional SST de la entidad, profesional SST del contratista, prof SST de la sec. General y profesional SST contratista, para definir actividades del simulacro distrital que se llevara a cabo el día 2 de octubre del 2019.
- Se realiza recorrido diario de obra donde se manifiesta las actividades por mejorar:
- En Bicentenario 1 - Piso 4: se debera mejorar la señalización de conos de acceso.
- en Bicentenario 2 -- Piso Sotano 1 a piso 3: mejorar la señalización informativa usando señales preventivas e informativas.
- En sotano 1 cuarto de acopio: se solicita al contratista realizar el retiro de la sede de los residuos, a su bodega con el fin de realizar la disposición final de los residuos teniendo en cuenta que ya cuentan con una cantidad para gestionar con su gestor externo. Diana Catherine Morales V [redacted].

9 de septiembre de 2019.

Se realizo recorrido diario de obra, y acompañamiento en las actividades de instalación de tubería en el edificio Bicentenario 1 - piso 4 y Bicentenario 2 - Secretaria de Gobierno, así como verificación de ingreso de materiales.

Diana Catherine Morales V [redacted].

10 de septiembre de 2019.

Se reporta el siguiente personal en el frente de obra: 1 encargado 8 oficiales, 3 ayudantes hidrosiluos, 1 auxiliar serv Generales, 1 auxiliar SST, 1 auxiliar de dirección obra, 1 residente interventoria, 1 residente SISOMA, 20 oficiales obra civil. Se realizan actividades de instalación de tubería red contra incendio en piso cuatro edificio Bicentenario 1 costado sur, se tiene pendiente una perforación para paso de red en muro que el contratista no ha realizado, interventoria solicita aseo, repinte de tuberias instaladas, protección en muebles

COPIA FIEL

remates en muros de dry wall y de techo, porque la tubería queda a la vista. Interventoría revisa y encuentra instalación de tubería red contra incendio en pisos 1, 2 y 3 edificio Bicentenario II en zona de cafetería, pasillos y baños, retiro de cielo raso de madera. Interventoría solicita marcar y realizar perforaciones en descansos de escaleras. La Arq. Monica Álvarez informa que se perdio señal de una camara en cafeteria, Interventoría informa al Director de Obra Ing Fredi Gomez para que entregue solucion al tema, compromiso de revisión el dia 19 de septiembre de 2019. Interventoría Ing. Carlos Wilches solicita realizar perforaciones en láminas de cielo raso de piso tres de Bicentenario I oficinas de secretaría Jurídica y limpieza en laminas de piso uno del mismo edificio, se realiza compromiso por parte del contratista para el 19 de septiembre de 2019. Interventoría bajo documento entregado por la Arq Monica Álvarez mediante correo electronico de las zonas de trabajo entre el 13 y 27 de Septiembre que implica instalación en edificios Bicentenario I y II recomienda y solicita incrementar el personal de obra hidraulica a por lo menos 6 cuadrillas de 4 personas y 6 cuadrillas de dos personas en personal de remates generales y aseo de lo contrario con los rendimientos que se tiene conocimiento por parte de esta Interventoría el contratista no alcanzaría a cumplir con las fechas de entrega presentadas por la Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. Secretaría General realiza citación de urgencia con Directores de Obra e Interventoría para establecer compromisos de entrega.

Residente Interventoría
Ing. Carlos Wilches

19 de septiembre de 2019

Interventoría verifica y revisa el personal en obra encontrando la siguiente relacion de trabajadores: un encargado, seis oficiales, tres ayudantes hidraulicos, cuatro personas de remates y servicios generales. Interventoría revisa e informa que solo se esta trabajando en edificio Bicentenario II, zona de cafeterias, baños y pasillos pisos 1, 2 y 3 el contratista manifiesta que de acuerdo al compromiso para la entrega de areas con secretaría de Gobierno y al no contar con mayor numero de personal debe cancelar

en las areas mencionadas. Interventoría Arquitectura Urbana Ltda recuerda que para la instalación de tubería red contra incendio se establecieron los siguientes compromisos: Bicentenario I piso 4 para el 24 de septiembre de 2019 Bicentenario I sala estrategica inicia 19 septiembre hasta el 3 de octubre 2019 Bicentenario II Cafeteria, baños, pasillos de piso 1,2 y 3 de secretaría de Gobierno para el 22 de septiembre de 2019. Escaleras Bicentenario II stand pipe para el 22 de septiembre de 2019. Interventoría Ing Carlos Wilches recuerda al contratista que se debe incrementar a mas del doble el personal hidraulico y de remates de lo contrario puede presentarse un incumplimiento de entregas. La Arq. Monica Alvarez informa a residentes de obra e interventoría que se realizará entrega el 20 de septiembre de 2019 de segundo piso Bicentenario II Secretaría de Gobierno, se infoma tambien que no será el area completa y quedaran unos puestos de trabajo en la zona norte, por lo tanto se debe realizar un cerramiento temporal pero no puede ser con polisombra ni con policarbono. Debe ser un cerramiento duro tipo dry wall y en la parte alta complementarlo con policarbono para que no pase ningun elemento como polvo. Interventoría informa que despues de revisión de documentación del Arquitecto Dario Alberto Franco Figueredo, por parte de Interventoría queda aprobado, de este resultado es el nuevo residente de obra. Ing. Carlos Wilches revisa y verifica el cargue de tubería para cafeteria, baños y pasillo de piso uno Bicentenario II, iniciando en 200 PSI manometro instalado en cuarto de aseo finalizando en 185 psi, no se recibe prueba y se solicita descargar el sistema y realizar nuevamente.

Residente Interventoría

Ing Carlos Wilches

20 de Septiembre de 2019. Interventoría realiza revisión de personal en obra por parte del contratista encontrando la siguiente relación de personal Residente de Obra, auxiliar SST de obra, 1 encargado, 6 oficiales, 3 ayudantes hidraulicos, 2 oficiales de obra civil, 3 auxiliares de aseo general, auxiliar SST de interventoría. Interventoría revisa las actividades

COPIA PLAC.

Urbana
red
promisos:
2019
ic 2019
lario de
centenario II)
toría
debe
y de
miento de
de 25
20 2
II Secretaría
completo
por lo
puede
amiento
n pol.etileno
ientoría
Arquitecto
oría queda
obra.
ubana
rio II,
de aseo
olicita

revisión
ncontrando
a, auxiliar
oulicos,
1, auxiliar
ctividades

de obra y encuentra que a pesar de que se realizo entrega de la sala estrategica no se a comenzado a intervenir. La secretaría de Gobierno hace entrego de area de piso 2 Bicentenario 2, aclara que personal de recurso humano no desocupara por lo tanto se debe realizar un cerramiento en dry wall. Interventoría revisa las actividades en cafeterias, baños y pasillos en Bicentenario 2 pisos 1, 2 y 3 donde se realizan actividades de instalación de tubería, Interventoría solicita hacer aseo a las areas. Se realiza prueba de presión para piso 1 iniciando con 200PSI a las 7:39 am y finalizando con 200 PSI a las 9:52 am, interventoría realiza verificación de manometro y da por aceptada la prueba. Interventoría Arquitectura Urbana Ltda recomienda al consorcio Pruni sedes 04 incrementar el personal ya que se tiene buena area de trabajo, se recuerda y se deja consignado en esta bitacora que las fechas de compromisos de entrega quedaron cbas en reunión del 18 de septiembre de 2019, donde se realizaron compromiso por parte de Directores de Obra e interventoría

Residente Interventoria
Ing Carlos Wilches

21 de Septiembre de 2019. En revisión de personal diario la interventoría encuentra lo siguiente: un residente de Obra, residente SST de Obra, un encargado, ocho oficiales, once ayudantes de hidraulicos, dos oficiales de obra civil, dos ayudantes de obra civil, dos personas de aseo general, residente SST de interventoría y residente de interventoría. Arquitectura Urbana Ltda mediante Ing Carlos Wilches revisa y verifica cada area de trabajo asignada al Consorcio Pruni Sedes 04 encontrando que solo se realizan trabajos de instalación de tubería red contra incendio en escalera edificio Bicentenario 2 en punto fijo escalera de sotano a tercer piso e instalación de tubería en cafeteria, baños y pasillo de piso 2 edificio Bicentenario 2 de Secretaria de Gobierno. Interventoría realiza revisión durante el día y evidencia que No se realiza intervención en piso 4 de Secretaría General Bicentenario I

No se realiza intervención en sala estrategica, solo se abrio una ventana en techo dry wall para inspecionar el area encontrando que en el pasillo a sala estrategica existen vigas ipe. Interventoría queda a la espera de la propuesta del especialista estructural del contratista para poder pasar la tubería de red contra incendio. En edificio Bicentenario II piso 2 secretaría de Gobierno solo se trabajo en protección de alfombra e instalacion de división en dry wall. Interventoria realiza revisión de aseo y solicita realizarlo permanente, personal de aseo se retira a medio día, Interventoría Ing Carlos Wilches realiza revisión de tubería de piso 3 Bicentenario II zona de cafetería baños y pasillo, se autoriza realizar prueba de presión iniciando con 200 PSI a las 8:29 am y termina a las 10:40 am manteniendo la presión de 200 PSI, se da por aceptada la prueba y se libera el area para continuar con los remates y reinstalación de cielo raso en madera y dry wall. Consorcio Proni sedes 04 informa que termino de realizar la instalación de tubería en piso 2 cafeterias, baños y pasillo de Secretaría de Gobierno, se realiza revisión de diseño e instalación y se autoriza el inicio de prueba de presion iniciando con 200 PSI a las 11:15 am y termina a la 1:23 pm manteniendo la presión inicial, se libera el area y se autoriza cierre de cielo raso.

Residente Interventoría
Ing Carlos Wilches

22 de Septiembre de 2019. Interventoría Ing Carlos Wilches realiza recorrido y verifica estado de las actividades de edificio Bicentenario II zona de cafeterias, baños y pasillos encontrando que hay seis personas realizando instalación de cielo raso en madera piso 3 y piso 2, se realiza aseo general en baños limpieza de muros, en escaleras se encuentran un encargado y 5 oficiales realizando instalacion de tubería stand pipe en escaleras de Secretaría de Gobierno. El personal no cuenta con acompañamiento de residente de obra del consorcio Proni, no se encuentra residente sisoma. Los pisos 4 de Bicentenario I no tienen le suficiente

PLAC

protección de muebles, no se ha realizado cerramiento y no hay trabajos en el area. En piso 2 de Secretaría de gobierno no se tiene protección en muebles, solo hay protección de piso falta señalización, no se esta trabajando en el area. Interventoría solicita contar con el personal de forma permanente

Residente Interventoría Carlos Wilk

23 Septiembre de 2019.

1. Se solicita notificar por escrito al instalador sobre las anulaciones de los instalaciones descritos en los planos. Esto con el fin de tener claro las obras no ejecutadas y soportadas por el diseñador
2. Se solicita detalle del soporte tipo pedestal descrito en los planos de piso (4) de diametro 4".
3. Se solicita aclarar con urgencia con el diseñador el sistema de rociadores del piso 2 del edificio Bicentenario 2 entre los ejes [C-F] con ejes [11-15] ya que en los planos entregados al instalador de 30 de Enero de 2019 no se describen rociadores a instalar en esta zona, Pero en correo recibido 21 septiembre de 2019 se anexa plano DI-PCI-LC0079-ML-PL46 si describe rociadores a instalar en esta zona.

Asesor Fiduoccidente Piii

23 de Septiembre de 2019 Interventoría en recorrido de primera hora encuentra el siguiente personal en obra. Residente de Obra, auxilior SST de obra, auxiliar en residencia de obra, encargado hidraulico, 10 oficiales hidraulicos, 8 ayudantes hidraulicos, 4 oficiales y personal de aseo obra, residente de interventoría. Interventoría hace revisión y verificacion de actividades en edificio Bicentenario I piso 4 encontrando que se encuentra instalada la totalidad de la red contra incendio, pero se presentan las siguientes observaciones, repinte general de la tubería red contra incendio, remates en muros donde pasa tubería, remates generales de pintura en dry wall y en techo,

COPIA FIAC

aseo general. Interventoría solicita realizar cerramiento en pasillo que conduce a sola estrategica y organizar materiales y equipos de red contra incendio. En pisos 1, 2 y 3 de edificio bicentenario II Secretaría General se encontro lo siguiente por parte de la revisión de Interventoría, remates y pintura de cielo raso en dry wall de todos los baños, limpieza de enchapes, divisiones de acero inoxidable, mesones, piso y puertas de todos los baños, escapes sin instalar, cielo raso de madera en ventanas de inspección sin instalar, black teather suelto y mal instalado en todos los pisos. Por las anteriores razones Interventoría Ing. Carlos Wilches de Arquitectura Urbana ltda no da por aceptada y no son recibidas las áreas de oficinas de Bicentenario I. Y no son recibidas las areas de cafeterias, baños y pasillos de edificio Bicentenario II Secretaría Gobierno. Consorcio Pruni Sedes 04, realiza el compromiso de realizar la instalación de tubería red contra incendio en piso 4 Bicentenario I oficinas de talento humano entrego para el dia 24 de septiembre de 2019 a las 8:00 am. Se compromete el consorcio Pruni Sedes 04 a trabajar durante la noche. Consorcio Pruni Sedes 04 solicita poder realizar las actividades de Bicentenario II zona de cafeterias, baños y pasillos de piso 1, 2 y 3 remates y aseo general. Interventoría Ing Carlos Wilches realizo revisión a las 4:30 pm del personal de obra y se encontro que el personal quedaria sin vigilancia porque no se encontraban el residente y el residente sisoma. Se solicita al consorcio Pruni Sedes 04 contar con las personas responsables de obra para la supervisión del personal que ejecuta las actividades.

Residente Interventoría
Ing Carlos Wilches

24 de septiembre de 2019. Interventoría en revisión de interventoría se encuentra el siguiente personal en obra. 1 Residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 encargado hidráulico, 11 Oficiales hidraulicos, 8 ayudantes hidraulicos, 4 oficiales de obra civil, 3 auxiliares de servicios generales y Residente de Interventoría, Ing Carlos Wilches de Arquitectura Urbana ltda realiza recorrido de revisión a las observaciones presentadas el día 23 de septiembre

COPIA PLAC

encontrando que en cafeterías, baños y pasillos de Bicentenario II falta aseo general en baños, enchapes, meson de cocineta, arreglo de cielo raso black tester. En piso 4 Bicentenario I oficinas de talento humano se termino la instalacion de la red contra incendio se realizo la prueba de presion comensando 200 PSI a las 8pm del 23 de septiembre y se realizo verificacion de 200 PSI a las 6:30 am del 24 de septiembre de 2019 Interventoría lo da por aceptada y se libera el area. Interventoría solicita a residente de obra realizar cerramiento en pasillo de sola estrategica con polietileno, se inician trabajos de instalación del ramal principal. Encontrando que existen vigas Ipe que obstruyen el diseño.

24/09/2019 → El pasado 23 de Septiembre no se dejo ingresar 10 operarios de hidro alfa encargados de instalar la red de tubería contra incendio; ingresaron despues de medio dia del mismo dia, porque la interventoría no radico oportunamente el formato de ingreso a nosotros Pero ya habiamos radicado a ellos.

24/09/2019 → Se solicito por parte de la interventoría detener actividades en el edificio Bicentenario 2 piso 2, area Dirección administrativo por motivo de una reunion en el edificio, el tiempo solicitado esta compundido entre las 9:30 am a 11:30 am. Igualmente en esta misma area se solicita suspender toda actividad a las 4:00 pm hasta las 6:00 pm debido a un evento con el señor alcalde de Bogotá

Interventoría es notificada por Director de Obra Ing Fredi Gomez que se trabajará el sabado 28 y domingo 29 de septiembre de 2019 para cumplir con los compromisos de entrega en oficinas de Direccion Administrativas de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C.

Residente de Interventoría
Ing Carlos Wilches

25 de Septiembre de 2019. Interventoría realiza revisión de personal en obra encontrando lo siguiente: Residente de Obra, auxiliar SST, encargado hidráulico, 11 oficiales hidráulicos, 9 ayudantes hidraulicos, 4 oficiales de obra civil, 3 personas de servicios generales, auxiliar SST de Interventoría y Residente de Interventoría. Se realiza instalación de tubería red contra incendio en sala Estrategica de edificio Bicentenario 1 en piso 4, e instalación de tubería en edificio Bicentenario 2 en piso 2 en Dirección Administrativa de Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Interventoría solicita a residente de obra Arq. Dario Franco realizar aseo en zonas de trabajo y orden de los elementos para la instalación de tubería. Interventoría evidencia que se realizan correcciones a las observaciones de las zonas de cafeterías baños y pasillos de edificio Bicentenario 2 en pisos 1, 2 y 3 realizando limpieza de enchapes, retoques de pintura en muros y cielo raso, correcion de escapes de reciadores, instalacion de madera en ventanas de inspeccion. Todas las actividades se realizan despues que salen los funcionarios de la Alcaldía y en horas de la noche.

Residente Interventoría
Ing. Carlos Wilches

26 de Septiembre de 2019. En recorrido de la mañana Residente de Interventoría Ing Carlos Wilches se realiza verificación de personal en obra encontrando lo siguiente: Residente de obra Arq. Dario Franco, auxiliar SST de obra, auxiliar de residente de Obra, técnico hidraulico encargado, 11 oficiales de obra hidraulica, 8 ayudantes hidraulicos, 4 oficiales de obra civil, 3 auxiliares de servicios generales, auxiliar SST de Interventoría, Residente de Interventoría Ing Carlos Wilches. Interventoría informa que se continua realizando actividades de instalación de tubería de red contra incendio en edificio Bicentenario 1 en piso 4 en Sala Estrategica. Interventoría Arquitectura Urbana Ltda mediante residente

COPIA PAC

de recuerda que la fecha de entrega para esta zona es el día 3 de Octubre de 2019, se revisa y verifica que las actividades se encuentran retrasados. Interventoría recuerda a residente de Obra que a pesar de ser entregada el area el día 19 de septiembre no se intervino durante cinco días. Tiempo que perdio el consorcio PRUNI SEDES 04 para la instalación de la tubería. Se recuerda por parte de la Interventoría que bajo el diseño y las decisiones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en los cuartos técnicos no se instalará tubería y rociadores, por lo tanto en Sala Estrategica se suspendera el último ramal en el costado occidental de la área mencionada. En edificio Bicentenario 2 se realizan actividades de instalación de tubería red contra incendio en piso 2 de dirección Administrativa de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Interventoría recuerda y solicita el cumplimiento de entrega para el día 29 de septiembre de 2019.

Residente Interventoría
Ing Carlos Wilches

27 de Septiembre de 2019. A primera hora Residente de Interventoría realiza revisión y verificación de personal de obra encontrando lo siguiente. No se encuentra el profesional Residente de Obra Arq. Dario Franco, se encuentra la auxiliar SST, auxiliar de residente de Obra, técnico hidraulico encargado, 11 oficiales y 8 ayudantes hidraulicos, 4 Oficiales de obra civil, 3 personas de servicios generales, residente SISOMA interventoría y residente de Interventoria. Actividades en edificio Bicentenario 1 piso 4 Sala Estrategica instalación de tubería red contra incendio. Edificio Bicentenario 11 en piso 2 instalación de tubería red contra incendio. Residente de obra se presenta en obra a la una de la tarde. En recorrido con la Arq. Monica Álvarez y Arq. Dario Franco con Interventoría Ing. Carlos Wilches en piso 4 de Bicentenario 1 se establecen diferentes [redacted] alternativas para el recorrido de la tubería, por lo tanto residente de obra realizará presentación de propuestas para ser revisadas por Interventoría.

COPIA PAC

000

2915

Viernes 27 de septiembre del 2019.

Profesional SISOMA:

- Se realiza recorrido diario de obra, evidenciando que el personal cuenta con los elementos de protección personal, dotación y carnet. Se encuentra en el segundo piso - Porcentenario 2 (Sec. General)
- Por parte de la interventoría, se hace entrega de manera física el formato de ingreso de personal para fin de semana (28 y 29 sep 19) y entre semana (30 sep 19 al 4 oct 19), a las 2:00 pm, teniendo en cuenta los formatos entregados por el contratista.

Acorde a lo informado por el ing. Carlos Pinzón y la arq. Monica alvarez el día de hoy, la profesional Diana Morales informa de manera verbal al profesional SST del consorcio Pruni, que de acuerdo a los formatos presentados del personal de obra los cuales quedaron para jornada de 24 horas, por el área específica de Secretaria de Gobierno, el contratista asumirá los costos del personal de vigilancia que se contrate, si no se cumple a cabalidad el trabajo en este tiempo establecido para los fines de semana (24 h diurno y nocturno), teniendo en cuenta que es personal contratado únicamente por la entidad para el control de seguridad.

Recibí: William Fonseca Vargas
Residente SST

Diana C. Morales V.
Residente SISOMA.

Interventoría Ing. Carlos Wilches solicita al Consorcio Pruni Sedes 04 informar los horarios de trabajo para el día y el fin de semana. Residente de obra informa que se trabajara en hora de la noche el día 27 de septiembre de 2019 y todo el fin de semana sabado y domingo, 28 y 29 de septiembre de 2019. Interventoría recuerdo a residente de obra que la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. realiza solicitud de vigilancia para acompañamiento a personal de obra y que si no se realizan trabajos por parte del personal del consorcio Pruni Sedes 04 el consorcio debera asumir los costos de la vigilancia. Interventoría evidencia que no se trabaja en horas de la noche, el personal sale a las 5pm

Residente Interventoría
Ing Carlos Wilches

COPIA

28/09 Se informa a la interventoría q' no se requiere vigilancia para el día 29 de Septiembre/19 en el edificio Bicentenario 2, piso 2, oficinas Secretaría de gobierno Dirección administrativo, el motivo de la cancelación de este servicio se debe a que las pruebas realizadas a la red de tubería contra incendio fueron positivas, la cual genero q' las actividades q' se desarrollaban en estos espacios fueran culminadas antes de lo programado. Siendo las 12:00 pm.
Solicitamos tambien cancelar el vigilante para el día 28 de Septiembre en horas de la noche es decir después de las 7:00 pm por las mismos razones anteriormente.

Interventoría en revisión diaria de personal en obra encuentra lo siguiente: Residente de Obra, auxiliar SST de Obra, 1 técnico, 11 Oficiales y 8 ayudantes hidraulicos, 2 oficiales de obra, 3 ayudantes de servicios generales, auxiliar SST de Interventoría Residente SISOMA interventoría. Residente de Interventoría. Ing. Carlos Wilcher realiza revisión y seguimiento a prueba de presión de red contra incendio iniciando a las 8:18 am con 200 PSI y Finalizando a las 10:32 am con 200 PSI por lo tanto la red instalada en las oficinas de Dirección Administrativa en piso 2 del edificio Bicentenario se da como aceptada y liberada, se solicita a Residente de obra cerrar el cielo raso, realizar el levantamiento del carton y plastico de protección y realizar la adecuada limpieza de toda la oficina. Interventoría recuerda a residente de obra que de no hacer entrega de esta oficina de secretaría de Gobierno con plena satisfacción de Interventoría y Secretaría General el día 29 de septiembre de 2019. No se asignaron nuevas areas de trabajo. A la una de la tarde se realiza recorrido Arq. Dario Franco del consorcio Proni sedes 04, Ing Carlos Wilcher de interventoría

Arquitectura Urbana y la Arq. Monica Alvarez de la Secretaría General, quedando las siguientes observaciones: 1- Limpieza general de las láminas de cielo raso. 2- Arreglo de cielo raso en archivos (Drywall). 3- Retoques con pintura en muros de oficina y de sala de reuniones. 4. Arreglo de mesa en formica que se encontro rayada.
interventoría realiza revisión en instalación de

2917

COPIA PLAC

ANEXO No.12

CONTROL Y SEGUIMIENTO A PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA /CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 /

OC 365 2919

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PERSONAL ANTIGUO Y VIGENTE

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019

EMPRESA	CENTRO DE TRABAJO	TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHA DE AFILIACION ARL	EPS	AFP	EXAMEN MEDICO INGRESO	PLANILLA AGOSTO
ANCER CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	GUTIERREZ CESAR STIVEEN	1.019.066.733	SUPERVISOR ANSER	SURA	PLANILLA	SALUD TOTAL	PROTECCION	14/08/2019	8496805273
ANCER CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	MONTEALEGRE GRANADOS JAIR ALIRIO	7.723.231	AUXILIAR	SURA	PLANILLA	COOMEVA	PORVENIR	28/05/2019	8496805273
ANCER CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	TRUJILLO TOVAR OSCAR HERNAN	1.075.213.473	AUXILIAR	SURA	PLANILLA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	15/08/2019	8496805273

OC 366 220

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901206646	1	ANCER CONSTRURTOR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAMARIA 2DO SECTOR	Calle 136a # 111a - 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7573874	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	494521744	8496805273	E	2019/09/11	2019/09/13	BANCO CAJA SOCIAL	2	$1,920,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUBTOTAL TOTAL APORTES PAGO SUBTOTAL (14 Afiliados)																							$6,183,270	$989,700			$6,183,270	$248,300			$6,183,270	$248,300			$6,183,270	$431,100		$0	$0		$1,917,400
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (14 Afiliados)																							$6,183,270	$989,700			$6,183,270	$248,300			$6,183,270	$248,300			$6,183,270	$431,100		$0	$0		$1,917,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)																							$6,183,270	$989,700			$6,183,270	$248,300			$6,183,270	$248,300			$6,183,270	$431,100		$0	$0		$1,917,400
1	CC	1151471731	BALDIRIS JEAN	X	X																230301	10	$276,039	$44,200	EPS037	10	$276,039	$11,100	CCF24	10	$276,039	$11,100	14-11	10	$276,039	$19,300	10	$0	$0	Si	$85,700
2	CC	1046275114	FIGUEROA HAROL	X	X																230301	9	$248,435	$39,800	EPS002	9	$248,435	$10,000	CCF24	9	$248,435	$10,000	14-11	9	$248,435	$17,300	9	$0	$0	Si	$77,100
3	CC	1030670406	GARCIA ANDRES																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
4	CC	1019066733	GUTIERREZ CESAR																		230201	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
5	CC	1012346128	JIMENEZ CARLOS	X																	25-14	11	$303,643	$48,600	EPS005	11	$303,643	$12,200	CCF24	11	$303,643	$12,200	14-11	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0	Si	$94,200
6	CC	78020225	JIMENEZ EDINSON	X	X																230201	10	$276,039	$44,200	ESSC07	10	$276,039	$11,100	CCF24	10	$276,039	$11,100	14-11	10	$276,039	$19,300	10	$0	$0	Si	$85,700
7	CC	1065008677	JIMENEZ FIDEL	X																	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
8	CC	1072658043	MAHECHA DYLAN		X																230201	3	$82,812	$13,300	EPS017	3	$82,812	$3,400	CCF24	3	$82,812	$3,400	14-11	3	$82,812	$5,800	3	$0	$0	Si	$25,900
9	CC	7723231	MONTEALEGRE JAIR																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
10	CC	1026580529	RATIVA EDISON		X																25-14	3	$82,812	$13,300	EPS005	3	$82,812	$3,400	CCF24	3	$82,812	$3,400	14-11	3	$82,812	$5,800	3	$0	$0	Si	$25,900
11	CC	1061428955	REINOSA JUAN		X																230201	20	$552,078	$88,400	EPS017	20	$552,078	$22,100	CCF24	20	$552,078	$22,100	14-11	20	$552,078	$38,500	20	$0	$0	Si	$171,100
12	CC	1075213473	TRUJILLO OSCAR																		231001	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	Si	$256,600
13	CC	1063287695	VARGAS EDUIN	X	X																230301	4	$110,416	$17,700	CCFC53	4	$110,416	$4,500	CCF24	4	$110,416	$4,500	14-11	4	$110,416	$7,700	4	$0	$0	Si	$34,400
14	CC	78305060	VARGAS LUIS	X	X																230201	4	$110,416	$17,700	EPS017	4	$110,416	$4,500	CCF24	4	$110,416	$4,500	14-11	4	$110,416	$7,700	4	$0	$0	Si	$34,400
Total			**Afiliados(14)**																				$6,183,270	$989,700			$6,183,270	$248,300			$6,183,270	$248,300			$6,183,270	$431,100		$0	$0		$1,917,400

Oi 367 2921

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901206646	1	ANCER CONSTRURTOR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAMARIA 2DO SECTOR	Calle 136a # 111a - 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7573874	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	494521744	8496805273	E	2019/09/11	2019/09/13	BANCO CAJA SOCIAL	2	$1,920,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$989,700	$1,600	$0	$991,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$132,500	$200	$0	$132,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$61,900	$100	$0	$62,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$499,200	$800	$0	$500,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$296,100	$500	$0	$296,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$431,100	$700	$0	$431,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$431,100	$700	$0	$431,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$248,300	$400	$0	$248,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	$248,300	$400	$0	$248,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$248,300	$800	$0	$249,100
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	$4,500	$100	$0	$4,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$63,200	$100	$0	$63,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$11,100	$100	$0	$11,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$11,100	$100	$0	$11,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$142,800	$300	$0	$143,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$15,600	$100	$0	$15,700
TOTAL				14	$1,917,400	$3,500	$0	$1,920,900

2019/09/16 12:09 PM

f. 368 292

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019

EMPRESA	CENTRO DE TRABAJO	TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHA DE AFILIACION ARL	EPS	AFP	EXAMEN MEDICO INGRESO	PLANILLA AGOSTO
CONSORCIO PRUNI	TRANSVERSAL	LEIDY NATALIA JHON VENAVIDEZ	1.110.570.029	AUX ADMINISTRATIVA	SURA	PLANILLA	FAMISANAR	PORVENIR	22-ago-19	37060678
CONSORCIO PRUNI	TRANSVERSAL	MARILUZ CARBACAS GOMEZ	45.530.754	RESIDENTE ADMINISTRATIVA	SURA	22/07/2019	ALIANSALUD	COLPENSIONES	13-jul-19	37060678
CONSORCIO PRUNI	TRANSVERSAL	ZORAYA RUIZ OLAYA	52.084.547	RESIDENTE TECNICA	SURA	26/07/2019	COMPENSAR	COLPENSIONES	23-jul-19	37060678
CONSORCIO PRUNI	TRANSVERSAL	SANDRA LUCIA PARRA JIMENEZ	52.261.860	RESIDENTE ADMINISTRATIVA	SURA	9/07/2019	SURA	COLPENSIONES	13-jul-19	37060678
CONSORCIO PRUNI	TRANSVERSAL	INGRID ALEJANDRA BOLAÑO CRUZ	55.131.681	RESIDENTE DE OBRA	SURA	29/06/2019	NUEVA EPS	COLFONDOS	17/01/2019	37060678
CONSORCIO PRUNI	TRANSVERSAL	WILLIAM FONSECA VARGAS	74.381.366	RESIDENTE SST	SURA	18/07/2019	MEDIMAS	PORVENIR	12-dic-19	37060678
CONSORCIO PRUNI	TRANSVERSAL	FREDI GOMEZ GARCES	79.416.146	DIRECTOR DE OBRA	SURA	29/06/2019	SURA	COLPENSIONES	25-jul-19	37060678

Fl 369 2923

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901294259-1	[redacted]		CL 98 70 91 OF! 812	7441529	asistente@prismauniversal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTA D C	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			2019/09/30		EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-08	E	30/09/2019	37060078	$8.440.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC53	EPS-S Comfacundi	860045904-7	33.200	0		0		0	17	500	0	33.700	1
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	120.000	0		0		0	17	1.600	0	121.600	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	33.200	0		0		0	17	500	0	33.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	17	1.600	0	121.600	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	200.000	0		0		0	17	2.600	0	202.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	232.000	0		0		0	17	3.000	0	235.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	180.000	0		0		0	17	2.300	0	182.300	2
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	114.400	0		0		0	17	1.500	0	115.900	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	33.200	0		0		0	17	500	0	33.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	132.500	0	0	0	0	17	1.700	0	134.200	1
230301	Porvenir	800224816-8	448.000	0	0	0	0	17	5.700	0	453.700	2
231001	Colfondos	800227910-6	1.657.300	0	0	17.500	17.500	17	20.800	600	1.713.700	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.025.000	0	0	25.000	25.000	17	25.400	800	2.101.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.854.600				1.854.600	17	23.300	1.877.900			18.546	1.877.900	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.066.000	17	13.400	1.079.400	12

0370 2924

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901294259-1	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		CL 98 70 91 OFI 812	7441529	asistente@prismauniversal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTA D C	BOGOTA, D.C		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				12	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	30/09/2019	37060678	$8.440.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.066.000	1.080.100
Pensión	4	4.347.800	4.402.800
Riesgos Laborales	1	1.854.600	1.877.900
CCF	1	1.066.000	1.079.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	8.334.400	8.440.200

OC 37[illegible] 2925

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901294259-1	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		CL 98 70 91 OFI 812	7441529	asistente@prismauniversal.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	30/09/2019	37060678	$8.440.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificacion	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	SNO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCI	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotizacion	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024527597	SALCEDO QUINTERO MAYCOLL	1	0			S	X																230201	828.116	132.500	0	0	0	0	CCFC53	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF21	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1026301207	OSORIO QUINTERO BRAYAN STIVEN	1	0			S	X																25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF21	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	1033808431	GARZON OSPINA OSCAR ORLANDO	1	0			S	X																25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSC34	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF21	828.116	33.200	0	0	0	0	0
4	CC	1083866332	SANTOFIMIO TRUJILLO ALEXANDER	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	111057002[illegible]	JOHN VENAVIDEZ LEIDY NATALIA	1	0			S	X																230301	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS017	300.000	12.000	14-11	300.000	5	20.900	CCF21	300.000	12.000	0	0	0	0	0
6	CC	24049493	SERRANO HERNANDEZ SARA ESPERANZA	1	0			S																	231001	2.858.000	457.300	0	0	0	0	EPS044	2.858.000	114.400	14-11	2.858.000	5	199.000	CCF21	2.858.000	114.400	0	0	0	0	0
7	CC	[illegible]	CABASCAS CC[illegible]AMBUZ	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS001	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
8	CC	[illegible]	RUIZ OLAYA ZORAYA	1	0			S																	231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
9	CC	[illegible]	[illegible] JIMENEZ SANDRA LUCIA	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
10	CC	[illegible]	BOLAÑOS CRUZ INGRID ALEJANDRA	1	0			S																	231001	3.500.000	560.000	0	0	17.500	17.500	EPS037	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF21	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
11	CC	[illegible]	[illegible]ONSECA MARCELO[illegible]	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF21	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
12	CC	79416146	GOMEZ GANCES FREDI	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS010	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0

372 2726

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019

EMPRESA	CENTRO DE TRABAJO	TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHA DE AFILIACION ARL	EPS	AFP	EXAMEN MEDICO INGRESO	PLANILLA AGOSTO
HIDROALFA	LIEVANO	FAJARDO ANZOLA PEDRO JULIO	79.246.381	OFICIAL	BOLIVAR	PLANILLA	ALIANSALUD	PROTECCION	23-jul-19	8337487204
HIDROALFA	LIEVANO	MENDEZ DUCUARA GULLERMO ALFONSO	1.007.787.546	ENCARGADO CUADRILLA	BOLIVAR	PLANILLA	SURA	PORVENIR	30-jul-19	8337486596
HIDROALFA	LIEVANO	ASCENCIO VERGARA LUIS ALBERTO	1.100.395.224	AYUDANTE	BOLIVAR	PLANILLA	NUEVA EPS	PROTECCION	6-ago-19	8337486596
HIDROALFA	LIEVANO	TABARES LOPEZ MARINO	16.680.215	OFICIAL	BOLIVAR	PLANILLA	SANITAS	PORVENIR	30-jul-19	8337486396
HIDROALFA	LIEVANO	PALECHOR ITAZ ALVARO	4.698.485	AYUDANTE	BOLIVAR	PLANILLA	NUEVA EPS	PROTECCION	6-ago-18	8337486396
HIDROALFA	LIEVANO	ALFONSO TORRES LUIS GABRIEL	79.913.617	OFICIAL	BOLIVAR	PLANILLA	SALUD TOTAL	PORVENIR	6-ago-19	8337495512
HIDROALFA	LIEVANO	DIMATE DOMINGUEZ LUIS ORLANDO	79.414.421	AYUDANTE	BOLIVAR	PLANILLA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	21-jul-19	8337486450
HIDROALFA	LIEVANO	ASCENCIO VERGARA JAIRO ANDRES	92.098.927	AYUDANTE	BOLIVAR	PLANILLA	SALUD TOTAL	PORVENIR	1-ago-19	8337486450
HIDROALFA	LIEVANO	MEDINA UL JAIRO	4.786.363	OFICIAL	BOLIVAR	PLANILLA	FAMISANAR	PROTECCION	30-sep-19	140720429

Of. 373 2923

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800230346-1	HIDROALFA S A S	CARRERA 46 N 152-46 LOCAL1-86	7006307	seguridadst@hidroalfasas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	Adicional	05	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	18/09/2019	8337487204	$419.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	53.900	0		0		0	7	300	0	54.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	215.400	0	0	0	0	7	1.200	0	216.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S A	860002503-2	93.700				93.700	7	500	94.200			937	94.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	53.900	7	300	54.200	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	53.900	54.200
Pensión	1	215.400	216.600
Riesgos Laborales	1	93.700	94.200
CCF	1	53.900	54.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	416.900	419.200

compensar · miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800230346-1	HIDROALFA S A S	CARRERA 46 N 152-46 LOCAL1-86	7006307	seguridadst@hidroalfasas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	Adicional	05	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	18/09/2019	8337487204	$419.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79246381	FAJARDO ANZOLA PEDRO JULIO	1	0			S																	230201	1.345.787	215.400	0	0	0	0	EPS001	1.345.787	53.900	14-7	1.345.787	5	93.700	CCF24	1.345.787	53.900	1.345.787	0	0	0	0

375

2929

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800230346-1	HIDROALFA S A S	CARRERA 46 N 152-46 LOCAL1-86	7006307	seguridadst@hidroalfasas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	LIEVANO R5	78	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	18/09/2019	8337486596	$909.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	63.000	0		0		0	7	400	0	63.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	53.900	0		0		0	7	300	0	54.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	467.300	0	0	0	0	7	2.500	0	469.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	203.300				203.300	7	1.100	204.400			2.033	204.400	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	116.900	7	700	117.600	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	116.900	117.600
Pensión	1	467.300	469.800
Riesgos Laborales	1	203.300	204.400
CCF	1	116.900	117.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	904.400	909.400

376

2930

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800230346-1	HIDROALFA S.A.S	CARRERA 46 N 152-46 LOCAL1-86	7006307	seguridadst@hidroalfasas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	LIEVANO R5	78	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	18/09/2019	8337486596	$909.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. residente	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007787546	MENDEZ DUCUARA GUILLERMO ALFONSO	1	0			S																	230301	1.345.887	215.400	0	0	0	0	EPS010	1.345.887	53.900	14-7	1.345.887	5	93.700	CCF24	1.345.887	53.900	0	0	0	0	0
2	CC	1100395224	ASCENCIO VERGARA LUIS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.573.787	251.900	0	0	0	0	EPS002	1.573.787	63.000	14-7	1.573.787	5	109.600	CCF24	1.573.787	63.000	0	0	0	0	0

377

2931

378 2932

Señor(es): HIDROALFA S.A.S
Nit: NI 800230346
Dirección: CARRERA 46 N 152-46 LOCAL1-86
Teléfono: 7006307 **Fax:** 6150519
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar miplanilla.com

	HIDROALFA S.A.S
	800230346
	8337486396
	9/18/2019
	1000000340
	1001
	$0

	2
	Septiembre 2019
	Agosto 2019
	Agosto 2019
	6
	$736.400
	$3.900

14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$165.600	2
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	$149.900	1
230301	Porvenir	$230.500	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	$95.200	2
EPS005	Sanitas EPS	$57.700	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	$37.500	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR BC							LIQUIDACION DE APORTES					
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	DIAS COTIZADOS	EXONERADO	TIPO COTIZANTE	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	[redacted]	[redacted]	EPS002	230701	CCF24																			1 432 787	1 432 787	1 432 787	1 432 787	8			299 550	0	0	57 456	0
2	CC	[redacted]	[redacted]	EPS037	230701	CCF24																			931 787	931 787	931 787	931 787	8			149 100	0	0	37 300	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

380 2934

Señor(es): HIDROALFA S.A.S
Nit: NI 800230346
Dirección: CARRERA 46 N 152-46 LOCAL1-86
Teléfono: 7006307 **Fax:** 6150519
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

	HIDROALFA S A S
	800230346
	8337495512
	9/18/2019
	1000000337
	1001
	$0

	1
	Septiembre 2019
	Agosto 2019
	Agosto 2019
	4
	$154.100
	$1.100

14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$34.600	1
230301	Porvenir	$79.500	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	$20.000	1
EPS002	Salud Total EPS	$20.000	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES														VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
No	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC R.ESGOS	Dias Cotizados	Salario Integral	Tarifa de aportes	COTZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	[illegible]	[illegible]	EPS002	230301	CCF24	X																		493.456	493.456	493.456	493.456	0			79.630	0	0	79.630	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

382 2936

Señor(es): HIDROALFA S.A.S
Nit: NI 800230346
Dirección: CARRERA 46 N 152-46 LOCAL1-86
Teléfono: 7006307 **Fax:** 6150519
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

	HIDROALFA S.A.S
	800230346
	8337486450
	9/18/2019
	1000000342
	1001
	$0

	2
	Septiembre 2019
	Agosto 2019
	Agosto 2019
	5
	$936.400
	$5.000

14-7	Cia de Seguros Bolivar S.A.	$210.500	2
230301	Porvenir	$253.200	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$230.500	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	$121.100	2
EPS002	Salud Total EPS	$121.100	2

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

~~383~~ 2937

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES														VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
No	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIF	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	DIAS COTIZADOS	SUSPENSION	INCAPACIDAD	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	[redacted]	[redacted]	EPS002	25-14	CCF24																		1 432 787	1 432 787	1 432 787	1 432 781	0			229 200	0	0	57 408	0
2	CC	[redacted]	[redacted]	EPS002	230301	CCF24																		1 573 781	1 573 781	1 573 781	1 573 781	0			251 900	0	0	63 000	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2938

384

Señor(es): HIDROALFA S.A.S
Nit: NI 800230346
Dirección: CARRERA 46 N 152-46 LOCAL1-86
Teléfono: 7006307 **Fax:** 6150519
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	HIDROALFA S.A.S
Tipo y número de identificación	800230346
Número de radicación planilla	8337552760
Fecha de pago	10/1/2019
Número de autorización de pago	140720429
Banco	1019
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Septiembre 2019
Periodo cotización pensión	Agosto 2019
Periodo cotización caja	Agosto 2019
Número de administradoras	4
Total Pagado	$423.100
Total interes mora	$6.200

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$95.100	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	$218.600	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	$54.700	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	$54.700	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES														VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ISP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	DIAS COTIZADOS	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	4786363	MEDINA UL JAIRO	EPS017	230201	CCF24																			1.345.787	1.345.787	1.345.787	1.345.787	0			215.400	0	0	53.900	0

885

2939

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019

EMPRESA	CENTRO DE TRABAJO	TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHA DE AFILIACION ARL	EPS	AFP	EXAMEN MEDICO INGRESO	PLANILLA AGOSTO
OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	CAMILO ANDRES PALACIOS AVILA	1.023.933.472	AYUDANTE	AXA COLPATRIA	PLANILLA	FAMISANAR	PORVENIR	29/07/2019	41435011
OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	LUIS ANGEL CASSIANI CUETO	1.033.120.481	AYUDANTE	AXA COLPATRIA	PLANILLA	FAMISANAR	PORVENIR	29/07/2019	41435011
OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	YEISON DIAZ JULIO	1.050.955.439	AYUDANTE	AXA COLPATRIA	PLANILLA	ASOCIACION MUTUAL	PROTECCION	29/07/2019	41435011
OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	DIEGO LEANDRO HILLON VILLAMIL	1.053.584.773	COORDINADOR OLMO	AXA COLPATRIA	PLANILLA	NUEVA EPS	PORVENIR	29/07/2019	41435011
OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	SEBASTIAN ANDRES HERNANDEZ VARGAS	1.077.086.615	AYUDANTE	AXA COLPATRIA	PLANILLA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	25/07/2019	41435011
OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	OMAR JESID ALVARADO RUIDIAZ	1.126.119.523	AYUDANTE	AXA COLPATRIA	PLANILLA	FAMISANAR	PORVENIR	25/07/2019	41435011
OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	VICTOR JOSE CAICEDO REY	1.127.661.722	AYUDANTE	AXA COLPATRIA	PLANILLA	FAMISANAR	PORVENIR	25/07/2019	41435011
OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	RAUL ANTONIO VILLALBA GOMEZ	1.143.118.844	AYUDANTE	AXA COLPATRIA	PLANILLA	SALUD TOTAL	PORVENIR	25/07/2019	41435011
OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	JEAN CARLOS BEJARANO OROZCO	1.232.588.330	AYUDANTE	AXA COLPATRIA	PLANILLA	SALUD TOTAL	PORVENIR	25/07/2019	41435011
OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	EUCLIDES RODRIGUEZ GALVAN	13.853.521	AYUDANTE	AXA COLPATRIA	PLANILLA	SALUD TOTAL	PORVENIR	25/07/2019	41435011
OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	JOBER ANTONIO AMARIS PALOMINO	771.320.992	AYUDANTE	AXA COLPATRIA	PLANILLA	FAMISANAR	PORVENIR	25/07/2019	41435011
OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	JOSE GUILLERMO JUNCO CHOCONTA	79.757.550	MAESTRO	AXA COLPATRIA	PLANILLA	SALUD TOTAL	PORVENIR	26/07/2019	41435011
OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	JOSE ALEXANDER ORTIZ MORENO	79.971.621	AYUDANTE	AXA COLPATRIA	PLANILLA	MEDIMAS	PORVENIR	26/07/2019	41435011
OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRANSVERSAL	VICTOR HUGO GRANJA PALACIOS	80.871.279	AYUDANTE	AXA COLPATRIA	PLANILLA	SALUD TOTAL	PROTECCION	29/07/2019	41435011

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-09-17, 06:56:28 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 41435011

Periodo Cotización: agosto de 2019 **Periodo Servicio:** septiembre de 2019

PAGADO 17/09/2019 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	**Nombre Sucursal**	CENTRO MEMORIAL	**Código Sucursal**	02
Documento	NI901300853	**Dirección**	CR 100 NORTE #135 - 04 CASA 2		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2807155		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	HILLON VILLAMIL DIEGO LEANDRO	**Identificación**	CC 1053584773		
Total Afiliados	30	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002497406	CARLOS JULIO HERNANDEZ ZABALA	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 55.208	$ 8.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 55.208	$ 2.300	6,960	$ 55.208	$ 3.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 55.208	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.4
CC 1002497728	MAURICIO ENRIQUE UPARELA SIMANCA	01	00	X																0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 717.701	$ 114.900	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 717.701	$ 28.800	6,960	$ 717.701	$ 50.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 717.701	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.5
CC 1007614754	JOSE GIOVANY MATIZ TORRES	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 800.513	$ 128.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 800.513	$ 32.100	6,960	$ 800.513	$ 55.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 800.513	$ 32.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.1
CC 1023933472	CAMILO ANDRES PALACIOS AVILA	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 276.039	$ 44.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 276.039	$ 11.100	6,960	$ 276.039	$ 19.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 276.039	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.7
CC 1024535251	EDISON JAVIER CORTES OTALVARO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 27.604	$ 4.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 27.604	$ 1.200	6,960	$ 27.604	$ 2.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.9
CC 1033120481	LUIS ANGEL CASSIANI CUETO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 828.116	$ 33.200	6,960	$ 828.116	$ 57.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.6
CC 1050955436	YEISON DIAZ JULIO	01	00	X																0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 800.513	$ 128.100	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 800.513	$ 32.100	6,960	$ 800.513	$ 55.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 800.513	$ 32.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.1
CC 1052972888	ODIMAR ROBLES MENDEZ	01	00	X																0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 717.701	$ 114.900	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 717.701	$ 28.800	6,960	$ 717.701	$ 50.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 717.701	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.5
CC 1053584773	DIEGO LEANDRO HILLON VILLAMIL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 828.116	$ 33.200	6,960	$ 828.116	$ 57.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.6
CC 1053585802	MARIA CAMILA HILLON VILLAMIL	01	00	X																0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 303.643	$ 48.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 303.643	$ 12.200	6,960	$ 303.643	$ 21.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 303.643	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.2
CC 1070019427	JESSYCA PAOLA BELTRAN RODRIGUEZ	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 55.208	$ 8.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 55.208	$ 2.300	6,960	$ 55.208	$ 3.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 55.208	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.4
CC 1073383474	JOSE MIGUEL MARTINEZ GALVIS	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 27.604	$ 4.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 27.604	$ 1.200	6,960	$ 27.604	$ 2.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.9
CC 1077086615	SEBASTIAN ANDRES HERNANDEZ VARGAS	01	00	X																0	20	20	20	20	(231001) COLFONDOS	$ 552.078	$ 88.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 552.078	$ 22.100	6,960	$ 552.078	$ 38.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 552.078	$ 22.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.1
CC 1121417829	JHON JAIRO CAMARGO QUIÑONEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 828.116	$ 33.200	6,960	$ 828.116	$ 57.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.6
CC 1126119523	OMAR JESID ALVARADO RONDAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 828.116	$ 33.200	6,960	$ 828.116	$ 57.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.6
CC 1127661722	VICTOR JOSE CAICEDO REY	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 800.513	$ 128.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 800.513	$ 32.100	6,960	$ 800.513	$ 55.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 800.513	$ 32.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.1
CC 1143158844	RAUL ANTONIO VILLALBA GOMEZ	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 717.701	$ 114.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 717.701	$ 28.800	6,960	$ 717.701	$ 50.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 717.701	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.5
CC 11806550	FERMIN PALACIOS PALACIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 828.116	$ 33.200	6,960	$ 828.116	$ 57.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.6
CC 1193387009	NEIDER MACHADO VEGA	01	00		X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 27.604	$ 4.500	(EPS010) EPS SURA	$ 27.604	$ 1.200	6,960	$ 27.604	$ 2.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.9

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 17/09/2019 | Empresa NI901300853 OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCION | Planilla Nro: 41435011 | Periodo Cotización: agosto de 2019 | Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1232588330	JEAN CARLOS BEJARANO OROZCO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 828.116	$ 33.200	6,960	$ 828.116	$ 57.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.6
CC 13853521	EUCLIDES RODRIGUEZ GALVAN	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 828.116	$ 33.200	6,960	$ 828.116	$ 57.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.6
CC 52205591	ERIKA EMILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	00	X	X														0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 83.334	$ 13.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 83.334	$ 3.400	6,960	$ 83.334	$ 5.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.1
CC 77132092	JOBER ANTONIO AMARIS PALOMINO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 828.116	$ 33.200	6,960	$ 828.116	$ 57.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.6
CC 79046323	JOSE ISIDRO ALARCON PEÑA	01	00	X	X														0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 110.416	$ 17.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 110.416	$ 4.500	6,960	$ 110.416	$ 7.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 110.416	$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.4
CC 79492996	JAVIER RODRIGUEZ RINCON	01	00	X															0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 276.039	$ 44.200	(EPS010) EPS SURA	$ 276.039	$ 11.100	6,960	$ 276.039	$ 19.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 276.039	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.7
CC 79651446	JAVIER HUMBERTO GUATIVA CASTILLO	01	00		X														0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 27.604	$ 4.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 27.604	$ 1.200	6,960	$ 27.604	$ 2.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.9
CC 79757550	JOSE GUILLERMO JUNCO CHOCONTA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 828.116	$ 33.200	6,960	$ 828.116	$ 57.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.6
CC 79971621	JOSE ALEXANDER ORTIZ MORENO	01	00	X															0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 800.513	$ 128.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 800.513	$ 32.100	6,960	$ 800.513	$ 55.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 800.513	$ 32.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.1
CC 80871279	VICTOR HUGO GRANJA PALACIOS	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 828.116	$ 132.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 828.116	$ 33.200	6,960	$ 828.116	$ 57.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.6
CC 98652087	JAMER ANTONIO PEREZ PIANETA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 27.604	$ 4.500	(ESSC02) EMP MUTUAL PARA EL DESAR ENDISALUD ESS	$ 27.604	$ 1.200	6,960	$ 27.604	$ 2.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.9

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.486.300	$ 15.486.300	$ 15.486.300	$ 15.486.300	$ 2.478.900	$ 621.800	$ 1.079.900	$ 621.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.802.400	$ 22.000	$ 4.824.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

388

2942

389
2943

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-09-17, 06:53:27 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2019
Empresa	OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT	NI 901300853
Código Sucursal (Nombre)	02 (CENTRO MEMORIAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	41435011
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	496451255
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 4.824.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	COLFONDOS	5	$ 327.200	$ 1.500
N800224808	230301	PORVENIR	20	$ 1.793.800	$ 8.000
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	5	$ 357.900	$ 1.600
I900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	$ 46.600	$ 300
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 12.300	$ 100
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	4	$ 68.800	$ 400
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	3	$ 89.700	$ 400
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$ 5.700	$ 100
N811004055	ESSC02	EMP MUTUAL PARA EL DESAR ENDISALUD ESS	1	$ 1.200	$ 100
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	7	$ 208.100	$ 1.000
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	8	$ 189.400	$ 900
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.079.900	$ 4.800
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	30	$ 621.800	$ 2.800
		SubTotales:		$ 4.802.400	$ 22.000
		Total a Pagar:			$ 4.824.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pago PSE

Código único CUS
496451255

Destino de pago
ENLACE OPERATIVO S.A.

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
17/09/2019

Número de aprobación
00451255

Dirección IP
186.154.33.194

Valor transacción
$ 4.824.400,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.0.19.58	NI	901300853

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019

EMPRESA	CENTRO DE TRABAJO	TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHA DE AFILIACION ARL	EPS	AFP	EXAMEN MEDICO INGRESO	PLANILLA AGOSTO
SERVISEGURIDAD SAS	TRANSVERSAL	GUERRERO CORREDOR HANNER	80.125.709	AUXILIAR ELECTRICO	EQUIDAD	PLANILLA	SALUD TOTAL	PORVENIR	12/06/2019	1023843365
SERVISEGURIDAD SAS	TRANSVERSAL	GARZON MARTINEZ CARLOS AUGUSTO	5.893.456	AUXILIAR ELECTRICO	EQUIDAD	PLANILLA	SANITAS	PORVENIR	12/06/2019	1023843365
SERVISEGURIDAD SAS	TRANSVERSAL	SIBATO RODRIGUEZ ALFONSO ARTURO	1.023.943.373	AUXILIAR ELECTRICO	EQUIDAD	PLANILLA	SALUD TOTAL	PORVENIR	25/07/2019	1023843365
SERVISEGURIDAD SAS	TRANSVERSAL	RUBIO VEGA MAICOL ESTEBAN	1.023.933.050	AUXILIAR ELECTRICO	EQUIDAD	PLANILLA	SANITAS	PORVENIR	25/07/2019	1023843365
SERVISEGURIDAD SAS	TRANSVERSAL	VELASQUEZ BOCANEGRA ELVER ARLEY	1.012.442.683	AUXILIAR ELECTRICO	EQUIDAD	PLANILLA	COMPENSAR	PORVENIR	25/07/2019	1023843365
SERVISEGURIDAD SAS	TRANSVERSAL	PERALTA CASTELLANOS DORANCE	3.019.591	SUPERVISOR SERVISEGURIDAD	EQUIDAD	PLANILLA	COMPENSAR	PORVENIR	25/07/2019	1023843365
SERVISEGURIDAD SAS	TRANSVERSAL	MOLINA TIBABISCO LUIS ALBERTO	79.705.989	AUXILIAR ELECTRICO	EQUIDAD	PLANILLA	SANITAS	PROTECCION	25/07/2019	1023843365
SERVISEGURIDAD SAS	TRANSVERSAL	MOLINA PALACIOS ANDREY DAVID	1.001.280.164	AUXILIAR ELECTRICO	EQUIDAD	PLANILLA	MEDIMAS	PORVENIR	25/07/2019	1023843365
SERVISEGURIDAD SAS	TRANSVERSAL	SANCHEZ GUTIERREZ CRISTIAN DAVID	1.053.844.276	AUXILIAR ELECTRICO	EQUIDAD	PLANILLA	SALUD TOTAL	PORVENIR	25/07/2019	1023843365

Electrico.

Simple

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-09-12, 08:30:02 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1023843365

Periodo Cotización: agosto de 2019 Periodo Servicio: septiembre de 2019

PAGADO 12/09/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVISEGUIND SAS	**Nombre Sucursal**	UNO **Código Sucursal** 01
Documento	NI900735574	**Dirección**	CRA 77A 64C 31
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5475389
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL
Ciudad	BOGOTA	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SUAREZ YAMILE XIMENA	**Identificación**	NI 900735574
Total Afiliados	9	**ARP**	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud				Riesgos			Cajas			Parafiscales				Tot
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Tot
CC 80125709	GUERRERO CORREDOR HANNER	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 829.000	$ 132.700	(EPS002) SALUDTOTAL EPS	$ 829.000	$ 33.200	6,960	$ 829.000	$ 57.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 829.000	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25
CC 5893456	GARZON MARTINEZ CARLOS AUGUSTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 829.000	$ 132.700	(EPS005) SANITAS EPS	$ 829.000	$ 33.200	6,960	$ 829.000	$ 57.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 829.000	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25
CC 1023943373	SABATO RODRIGUEZ ALFONSO ARTURO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 829.000	$ 132.700	(EPS002) SALUDTOTAL EPS	$ 829.000	$ 33.200	6,960	$ 829.000	$ 57.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 829.000	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25
CC 1023933050	RUBIO VEGA MAICOL ESTEBAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 829.000	$ 132.700	(EPS005) SANITAS EPS	$ 829.000	$ 33.200	6,960	$ 829.000	$ 57.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 829.000	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25
CC 1012442683	VELASQUEZ BOCANEGRA ELVER ARLEY	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 829.000	$ 132.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 829.000	$ 33.200	6,960	$ 829.000	$ 57.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 829.000	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25
CC 3019591	PERALTA CASTELLANOS DORANCE	01	00																	0	30	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 829.000	$ 33.200	6,960	$ 829.000	$ 57.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 829.000	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
CC 79705989	MOLINA TISABISCO LUIS ALBERTO	01	00	X																0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION	$ 690.834	$ 110.600	(EPS005) SANITAS EPS	$ 690.834	$ 27.700	6,960	$ 690.834	$ 48.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 690.834	$ 27.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2
CC 1001280164	MOLINA PALACIOS ANDREY DAVID	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 690.834	$ 110.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 690.834	$ 27.700	6,960	$ 690.834	$ 48.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 690.834	$ 27.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2
CC 1053844276	SANCHEZ GUTIERREZ CRISTIAN DAVID	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 138.167	$ 22.200	(EPS002) SALUDTOTAL EPS	$ 138.167	$ 5.600	6,960	$ 138.167	$ 9.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 138.167	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.664.835	$ 6.493.835	$ 6.493.835	$ 6.493.835	$ 906.900	$ 260.200	$ 452.100	$ 260.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.879.400	$ 0	$ 1.879.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

392 2016

CONSOLIDADO PERSONAL ANTIGUO EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019

EMPRESA	CENTRO DE TRABAJO	TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ARL	FECHA DE AFILIACION ARL	EPS	AFP	EXAMEN MEDICO INGRESO	PLANILLA AGOSTO
TRANSPORTES ANGIE ROMERO	TRANSVERSAL	JHON FREDY LOZANO MATEUS	1.018.418.642	VOLQUETAS	POSITIVA	PLANILLA	COMPENSAR	COLPENSIONES	25/06/2019	8496805625
TRANSPORTES ANGIE ROMERO	TRANSVERSAL	PEDRO ELKIN ROMERO DUQUINO	80.133.031	VOLQUETAS	POSITIVA	PLANILLA	SALUD TOTAL	PORVENIR	25/06/2019	8496805625
TRANSPORTES ANGIE ROMERO	TRANSVERSAL	WILMARK ALEJANDRO ROMERO DUQUINO	79.939.510	VOLQUETAS	POSITIVA	PLANILLA	COMPENSAR	PORVENIR	12/06/2019	8496805625

393
247

portes
línea

Resu eneral de Pago

Volquetas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901149648	1	TRANSPORTES ANGIE ROMERO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	TRV 5C No 127A-40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8013721	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	493791616	8496805625	E	2019/09/11	2019/09/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,045,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1018418642	LOZANO MATEUS JOHN FREDY	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS008	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
2	CC	1020801053	ROMERO DUQUINO ANGIE KATHERINE	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0
3	CC	80133031	ROMERO DUQUINO PEDRO ELKIN	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
4	CC	79939510	ROMERO DUQUINO WILMAR ALEJANDRO	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS008	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$3,684,348	$589,500			$3,684,348	$147,600			$3,684,348	$147,600			$3,684,348	$160,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$589,500	$0	$0	$589,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$265,000	$0	$0	$265,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$324,500	$0	$0	$324,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$160,500	$0	$0	$160,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$160,500	$0	$0	$160,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$147,600	$0	$0	$147,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$147,600	$0	$0	$147,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$147,600	$0	$0	$147,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$66,400	$0	$0	$66,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$33,200	$0	$0	$33,200
TOTAL				4	$1,045,200	$0	$0	$1,045,200

2019/09/11 05:34 PM

394 748

395
2949

CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR UNIVERSAL SEC S.A.S.	CONSORCIO PRUNI SEDES 04

PERSONAL NUEVO, CONSORCIO PRUNI SEDES 04, Y PROVEEDORES

CONSOLIDADO PERSONAL NUEVO EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019

EMPRESA	CENTRO DE TRABAJO	TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	NOTIFICACION DE RIESGOS	ARL	FECHA DE AFILIACION ARL	EPS	AFP	EXAMEN MEDICO INGRESO	INGRESO / NO INGRESO
CONSORCIO PRUNI	TRANSVERSAL	DANIEL FELIPE GOMEZ ALDANA	1.018.480.030	AUXILIAR TECNICO	16/09/2019	SURA	16/09/2019	FAMISANAR	PORVENIR	14-sep-19	SI
CONSORCIO PRUNI	TRANSVERSAL	DARIO ALBERTO FRANCO FIGUEREDO	86.060.271	RESIDENTE TECNICO	13/09/2019	SURA	9/09/2019	COMPENSAR	PORVENIR	9/09/2019	SI
CONSORCIO PRUNI	TRANSVERSAL	JUAN JOSE LEAL VARGAS	1.032.470.073	AUXILIAR TECNICO	13/09/2019	SURA	11/09/2019	SURA	PORVENIR	11-sep-19	SI

397
2951

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.480.030
GOMEZ ALDANA
APELLIDOS
DANIEL FELIPE
NOMBRES



Daniel Gomez
FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO 23-OCT-1995
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA | O+ G.S RH | M SEXO

24-OCT-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150-00618445-M-1018480030-20131125 0035903951A 1 40172103

ARL | sura 398 2482

Medellín, 13 de septiembre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PRUNI SEDES 04 que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 OBRAS		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
C101848003 0	GOMEZ ALDANA DANIEL FELIPE	16/09/2019		251181U1	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 13/09/2019 15:15:10 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.57.129.162, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

399
2983

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **DANIEL FELIPE GOMEZ ALDANA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **1,018,480,030**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Septiembre de 2019.

Gerente de Clientes

9006093566 16 09 2019 400

2134

X X X X X X

GOMEZ ALDANA DANIEL FELIPE

CC 1018480030 X 23 10 1995

0 0 SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA PORVENIR S.A.

$1.000.000 CRA 41 4 01 NT 3002011660

BOGOTA X DISTRITO CAPITAL

CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1

CONSORCIO PRUNI NT 901294259

CL 98 70 91 OFC 812 7441529 BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NINGUNA 16 09 2019

X

X

X

X

X

Preventsalud

CONCEPTO MÉDICO DE APTITUD LABORAL

Cll 15 Sur No. 16 - 46 Tel: 757

40
2988

icencia IPS Resolución No 10519 de 24/08/2017
Nit: 9005-40214-0

EXAMEN DE: INGRESO ENFASIS ALTURAS

C rol: 0 Bogotà, Septiembre 14 de 2019 **Hora:** 8,08



DATOS GENERALES

No Identificación: 1018480030 **Paciente:** GOMEZ ALDANA DANIEL FELIPE

Fecha Nacimiento: Octubre 23 de 1995 **Lugar:** BOGOTA **Edad:** 23

Estado Civil: SOLTERO (A) **No Hijos:** 0 **Sexo:** Masculino

Escolaridad: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DATOS LABORALES

Empresa: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Empresa Misión:** NO APLICA

EPS: FAMISANAR **Act.Económica:**

ARL: SURA **AFP:** PORVENIR

Cargo a Ocupar: AUXILIAR DE INGENIERIA

EXAMENES PARACLINICOS

Audiometría: NORMAL

V etría: NORMAL

Psicometrico: NO APLICA

spirometría: NORMAL

Optometría: NO SE REALIZA

Otros: PERFIL LIPIDICO (NORMAL) GLICEMIA BASAL (NORMAL)

CONCEPTO MEDICO: APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

R TRICCIONES
NA

RECOMENDACIONES
UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PROPIOS DEL CARGO

RECOMENDACIONES
Uso elementos protección personal indicados para la actividad
Pausas Activas para MMSS
: postural y de columna

OBSERVACIONES
NINGUNO

EXAMEN MEDICO CON ENFASIS EN ALTURAS

Declaración del trabajador. Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen médico están completas, son verídicasy permitieron la elaboración del presente certificado médico; otorgué mi consentimiento libre e informado para la realización de las evaluaciones médicas y pruebas complementarias por solicitud de la empresa empleadora arriba mencionada y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional.

Dr. Carlos A. Cuenca S.
R.M. 4516
Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia: Resolución 753
18 de Enero del 2019

CARLOS SANCHEZ

OMBRE, FIRMA Y SELLO DEL MEDICO

EGISTRO MÉDICO: 4516

CENCIA S.O: RESOLUCION 753


Daniel Gomez

FIRMA DEL PACIENTE

NOMBRE: GOMEZ ALDANA DANIEL FELIPE

CEDULA 1018480030

402
2986

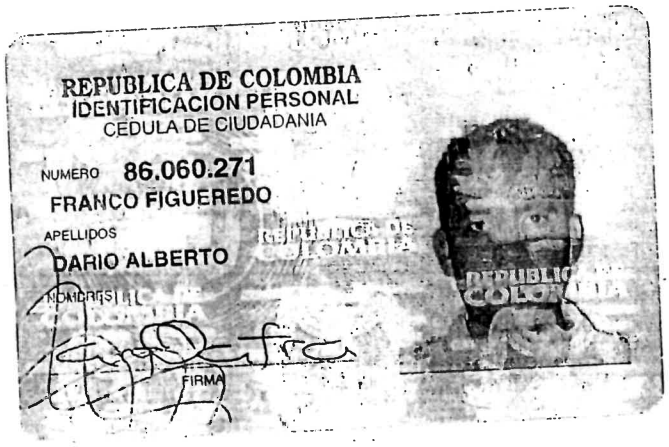

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.060.271
FRANCO FIGUEREDO
APELLIDOS
DARIO ALBERTO
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-MAY-1979
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
05-JUN-1997 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00122081-M-0086060271-20081104 0005281290A 1 6750006352

ARL | sura

Medellín, 06 de septiembre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PRUNI SEDES 04 que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0600000001 OBRAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	0,116 %	
C8006027 I	FRANCO FIGUEREDO DARIO ALBERTO	09/09/2019	14/12/917		DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Esta certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/09/2019 10:39:15 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de pago.

Dirección IP: 181.57.129.162, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

~~404~~
2488

compensar | eps
salud

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

No de Radicación: 10/09/2019

A. DATOS DEL TRAMITE

1. Tipo de Usuario: A. Usuario
2. Tipo de Afiliado: A. Cotizante
3. Régimen: A. Contributivo
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante
5. Cabeza de Familia
6. Condición
7. Tipo de cotizante: A. Dependiente
8. Independiente
9. Pensionado
10. Ingreso: 01
11. Traslado de EPS

B. AFILIACIÓN B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

12. Apellidos y nombres: Franco Figueredo — Dario Alberto
13. Tipo de documento de identidad: CC
14. Número de documento de identidad: 80606471
15. Sexo: M
16. Fecha de nacimiento: 26/05/1978
17. Zona Residencial: U
18. Dirección: Cra 98 # 70-91
19. Teléfono: 7491529
20. Departamento: Bogotá D.C.
21. Municipio: Bogotá D.C.
22. Correo electrónico: asistente@finanmarinvasal.com
23. Estado civil: U
24. Nivel educativo: 6
25. Ocupación: 3
26. Salario Básico de cotización: $ 1.200.000

C. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

27. Administradora de Pensiones (AFP): Colpensiones
28. Administradora de Riesgos Laborales (ARL): Sura
29. Pertenencia étnica: 6
30. Grupo de población especial: 1
31. Pueblo SISBEN: 1
32. Discapacidad: No
33. Cuidador: No

D. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante)

34. Apellidos y nombres
35. Tipo de documento de identidad
36. Número de documento de identidad
37. Sexo
38. Fecha de nacimiento
39. Parentesco
40. Discapacidad
41. Cotiza
42. Dirección de residencia
43. Teléfono fijo con código
44. Valor de la UPC adicional asignado por la EPS

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	34. Apellidos y nombres	35. Tipo de documento de identidad	36. Número de documento de identidad	37. Sexo	38. Fecha de nacimiento	39. Parentesco	40. Discapacidad	41. Cotiza	42. Dirección de residencia	43. Teléfono fijo con código	44. Valor de la UPC adicional asignado por la EPS
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

E. Selección de la IPS Primaria

45. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS
46. Código de la IPS (asignado por la EPS)
A:
B:
C:

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

47. Nombre o Razón Social: Empresa Ruta Seca SAS
48. Tipo de documento de identificación: NIT
49. Número del documento de identificación: 901.274.259-1
50. Tipo de aportante o pagador pensional a registrar en la EPS: Jurídico
51. Dirección: Cll 98 - #70-91
52. Teléfono: 7491529
53. Correo electrónico: asistente@finanmarinvasal.com
54. Municipio: Bogotá
55. Departamento: Bogotá D.C.

G. REPORTE DE NOVEDADES

56. Tipo de Novedad
1. Modificación datos básicos de identificación
2. Corrección datos básicos de identificación
3. Actualización documento de identidad
4. Actualización y corrección de datos complementarios
5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código:
6. Reactivación en la EPS
7. Inclusión de beneficiario(s) y de afiliado adicionales
8. Exclusión de beneficiario(s) o de afiliado adicionales
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

57. Ingreso: 1
58. Traslado: 1
59. Régimen: A. Régimen Contributivo — B. Régimen Subsidiado
60. Traslado: A. Mismo Régimen — B. Diferente Régimen
61. Periodo por Vacaciones
62. Reporte del informe de producción del usuario
63. Reporte de la calidad de Empadronamiento
64. Reporte de la calidad de Pensionados

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

65. Tipo y Número de Identificación — Tipo de documento de identidad: CC — Número de documento de identidad: Franco Figueredo Dario Alberto
66. EPS Anterior
67. Sexo: M
68. Fecha de nacimiento: 26/05/1978
69. Fecha de Novedad: 09/09/2019
70. Código de la Novedad
71. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones: Compensar

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

45. Declaración de pensiones y aportes de los beneficiarios y afiliados adicionales
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
48. Declaración de veracidad de registros de fuentes propias o para todos los que impacta la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
50. Autorización para que la EPS solicite y consulte datos y copia de la historia clínica del cotizante, cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
51. Autorización para que la EPS reporte la información a que se refiere el artículo 244 respecto de novedades a la base de datos de afiliados activos y a las entidades públicas que por ley requieran la información
52. Autorización para que la EPS realice la validación periódica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al teléfono celular registrado en la base.

VIII. FIRMAS

Dario Alberto Franco — Samuel Camilo B

IX. ANEXOS

54. Anexo copia del documento de identidad: CC Card — RC Card — TI Card — CC Card — CE Card — PA Card — PE Card — CD Card
55. Copia de la orden judicial de custodia y cuidado personal
56. Copia del documento de inscripción permanente emitido por la autoridad competente
57. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
58. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital
59. Copia del certificado de adopción o acta de entrega definitiva
60. Copia del documento de identidad del cónyuge o compañero(a) permanente
61. Copia de la tarjeta de identidad del beneficiario o afiliado adicional
62. Documento en el que conste la designación del beneficiario o afiliado adicional por parte de los padres o de quien ejerza la patria potestad, o del representante legal de la institución que tenga bajo su cuidado al menor de edad
63. Copia de la resolución de adopción, para el caso del Subsistema Contributivo
64. Certificación de supervivencia una vez cumplida la mayoría de edad, para el caso de los hijos en condición de discapacidad
65. Copia del acta de conciliación o providencia de la autoridad competente en la que conste la calidad de beneficiario o afiliado adicional

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial — Código del departamento — Código del municipio
67. Datos del SISBEN — Número de la ficha — Puntaje — Nivel
68. Fecha de validación
69. Datos del funcionario que realiza la validación — Tipo de documento de identidad — Número de documento de identidad: Angie Oct
70. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Vigilado Supersalud

405
259

porvenir

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **DARIO ALBERTO FRANCO FIGUEREDO**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **86,060,271**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Septiembre de 2019.

Gerente de Clientes

408
296C

Preventsalud

CONCEPTO MÉDICO DE APTITUD LABORAL

CR 35 Sur No. 16 - 46 Tel. 927 53 25

Licencia IPS Resolución No 1059 de 24 04 2013
Nit 900540714-1



EXAMEN DE INGRESO ENFASIS ALTURAS

Contrato: 0

Bogotá, Septiembre 09 de 2015 Hora: 9:34

DATOS GENERALES

No Identificación: 80606231 Paciente: FRANCO PERALTA DARIO ALBERTO

Fecha Nacimiento: Mayo 26 de 1979 Lugar: . VILLAVICENCIO Edad: 36

Estado Civil: UNION LIBRE No Hijos: 0 Sexo: Masculino

Escolaridad: ESPECIALIZACION Y/O POSTGRADO

DATOS LABORALES

Empresa: CONSORCIO PETROMILLENIA Empresa Misión: CONSORCIO

EPS: COMPENSAR Act.Económica:

ARL: No AFILIADO ATP: POBLACION

Cargo u Ocupación: RESIDENTE OBRA

EXAMENES PARACLINICOS

Audiometría: NORMAL

Visiometría: NORMAL

Psicosensométrico: COMPLETO

Espirometría: NORMAL

Optometría: NO SE REALIZA

Otros: OTRA: ELECTROCARDIOGRAMA DENTRO DE LOS PARAMETROS

CONCEPTO MEDICO: APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

PATOLOGICOS:
NINGUNA

RECOMENDACIONES:
CAMBIOS DE HABITOS ALIMENTARIOS DE MANERA PERMANENTE
UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PROPIOS DEL CARGO

RECOMENDACIONES:
Diligenciamiento profesional independiente para la afiliación
Pagos Autoliquidados MENSUALES
Higiene postural y de columna

OBSERVACIONES
NINGUNO

EXAMEN MEDICO CON ENFASIS EN ALTURAS

Declaración del trabajador: Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen medico están completas y son verdaderas y permanecen hasta la fecha en el presente certificado médico, otorgué mi consentimiento libre e informado para la realización de los exámenes médicos y pruebas complementarias por solicitud de la empresa empleadora antes mencionada y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional

Dr. Carlos A. Cuevas
Especialista en Salud Ocupacional
Licencia 2009-2013

CARLOS ALBERTO CUEVAS SANCHEZ
MEDICO OCUPACIONAL

REGISTRO: 4810

FECHA: RESOLUCION 1891

DARIO ALBERTO FRANCO PERALTA

CEDULA: 80606231

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.032.470.073**

LEAL VARGAS

APELLIDOS

JUAN JOSE

NOMBRES

Juan José Leal V.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **16-MAR-1995**

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **B+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-MAR-2013 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00436200-M-1032470073-20130520 **0033**073787A 1 38497598

408

2962

Medellín, 10 de septiembre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PRUNI SEDES 04 que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 OBRAS		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
C103247007 3	LEAL VARGAS JUAN JOSE	11/09/2019		210G1721	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/09/2019 15:51:46 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.57.129.162, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2964

410

porvenir

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **JUAN JOSE LEAL VARGAS,** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **1,032,470,073**, se encuentra afiliado(a) **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 12 días del mes de Septiembre de 2019.

Gerente de Clientes

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
NIT. 800.088.702-2

EPS | SURA

No. U16442562

Fecha de Radicación (a registrar por la EPS) 13/01/2019

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite (a registrar por la EPS): A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual [ ] Cotizante o Cabeza de Familia [X] Beneficiario o afiliado adicional [ ] D. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Código Tipo de Cotizante (Ver tabla de códigos que se encuentra en instructivo de diligenciamiento): Código Tipo de Pensionado:

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	7. Tipo de doc
Leal	Vargas	Juan	José	C.C

8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento	Estado civil	EPS anterior
1032490093	Femenino [ ] Masculino [X]	16/03/1995	Soltero	

III. DATOS COMPLEMENTARIOS Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización -IBC
Sura	Porvenir	1'600.000

18. Residencia Dirección	Teléfono fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico
Carrera 26 a No 16-51	7441579	3123897870	juanjleal@hotmail.com

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
Bogotá	Urbana [X] Rural [ ]	Santa Isabel	Bogotá D.C.	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	20. Tipo de doc

21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento	Dirección

Municipio/Distrito	Zona: Urbana [ ] Rural [ ]	Departamento	Código IPS (a registrar por la EPS)	Teléfono fijo	Teléfono Celular

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de doc	26. Número de documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento	Correo electrónico
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

	Datos complementarios	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	33. Valor de la UPC (a registrar por la EPS)
B1				Tipo [F] [I] [M] Condición [T] [P]	
B2				Tipo [F] [I] [M] Condición [T] [P]	
B3				Tipo [F] [I] [M] Condición [T] [P]	
B4				Tipo [F] [I] [M] Condición [T] [P]	
B5				Tipo [F] [I] [M] Condición [T] [P]	

	32. Datos de residencia Dirección	Zona	Municipio / Distrito	Departamento	Teléfono fijo	Celular
B1		U R				
B2		U R				
B3		U R				
B4		U R				
B5		U R				

	34. Selección de la IPS Primaria	Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de doc	37. Número de documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)
Consorcio Prum Sedes 09	NIT	901.294.254-1	dependiente

39. Ubicación	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
Cll 98 # 70-91	Bogotá	7441579	asistente@prum universal.com	Bogotá	Bogotá D.C.

VIGILADO Supersalud

apotama

2966
412

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
NIT. 890.903.702-2

EPS | SURA

No. U16442562

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1 Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4 Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5 Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código [ ]
- [ ] 6 Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8 Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9 Inicio de relación laboral o adquisición de las condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11 Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18 Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Real	Vargas	Juan	José

Tipo de doc	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
C.C	1032470073	Femenino [ ] Masculino [X]	16 01 1991	10 12 2019

43. EPS anterior

44. Motivo de traslado
Código [ ]

45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46 Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47 Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de no intención del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51 Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades o la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Actuando en nombre propio y de mis beneficiarios, bajo su encargo, autorizo a Suramericana S.A, filiales y subsidiarias a contactarnos para el ofrecimiento de productos y servicios y las demás finalidades contenidas en su política de privacidad, que puede ser consultada en www.epssura.com e igualmente para adelantar los procesos de relacionamiento con el cliente (soportados o no en tecnología), para un abordaje integral con todos los productos y soluciones por nosotros contratadas dentro del grupo de compañías pertenecientes a Suramericana S.A.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante o cabeza de familia

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o deOficio

Código Asesor

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Total [ ]

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58 Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial

Código del Municipio	Código del departamento

67. Datos del SISBÉN

Número de ficha	Puntaje	Nivel

68. Fecha de radicación

69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | 71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

Preventsalud

CONCEPTO MÉDICO DE APTITUD LABORAL

CII 15 Sur No. 16 - 46 Tel: 413

Licencia IPS Resolución No 10519 de 24/08/2017
Nit: 900540214-0



EXAMEN DE: INGRESO ENFASIS ALTURAS

ntrol: 0 Bogotà, Septiembre 11 de 2019 Hora: 9,46

DATOS GENERALES

No Identificación: 1032470073 **Paciente:** LEAL VARGAS JUAN JOSE
Fecha Nacimiento: Marzo 16 de 1995 **Lugar:** MANIZALEZ **Edad:** 24
Estado Civil: SOLTERO (A) **No Hijos:** 0 **Sexo:** Masculino
Escolaridad: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DATOS LABORALES

Empresa: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 **Empresa Misión:** NO APLICA
EPS: SURA **Act.Económica:**
ARL: SURA **AFP:** PORVENIR
Cargo a Ocupar: AUXILIAR DE RESIDENCIA

EXAMENES PARACLINICOS

Audiometría: NORMAL

Visiometría: NORMAL

ı ıetrico: NO APLICA

.pirometría: NORMAL

Optometría: NO SE REALIZA

Otros:
PERFIL LIPIDICO (NORMAL) GLICEMIA BASAL (NORMAL)

CONCEPTO MEDICO: APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

RESTRICCIONES
UNA

RECOMENDACIONES
UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PROPIOS DEL CARGO

RECOMENDACIONES
Uso elementos protección personal indicados para la actividad
Pausas Activas para MMSS
Higiene postural y de columna

OBSERVACIONES

NINGUNO

EXAMEN MEDICO CON ENFASIS EN ALTURAS

Declaración del trabajador. Certifico que las respuestas dadas por mí en el examen médico están completas, son veridicasy permitieron la elaboración del presente certificado médico; otorgué mi consentimiento libre e informado para la realización de las evaluaciones médicas y pruebas complementarias por solicitud de la empresa empleadora arriba mencionada y me comprometo a seguir las recomendaciones dadas por el profesional.

Dr. Carlos A. Cuenca S.
R.M. 4516
Especialista en Gerencia en Servicios de Salud
Licencia: Resolución 753
18 de Enero del 2019

CARLOS MARIO CUENCA SANCHEZ
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO

REGISTRO MÉDICO: 4516

LICENCIA S.O: RESOLUCION 753

FIRMA DEL PACIENTE

NOMBRE: LEAL VARGAS JUAN JOSE

CEDULA 1032470073

2968
Fl: 414

Central Group

2DME S.A.S - CENTRAL GROUP.

CENTRO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PARA TRABAJO EN ALTURAS.

En cumplimiento a las resoluciones 1409 de 2012 y 1178 de 2017
expedidas por el ministerio de trabajo para orientar formación en
trabajo en alturas
Numero de aprobación del Ministerio de Trabajo
08SE2018220000000011969 del 12 de abril de 2018

Certificado de capacitación y entrenamiento para:

JUAN JOSE LEAL VARGAS

Identificado con Cédula de Ciudadanía

1032470073

Cursó y aprobó la formación en Trabajo Seguro en Alturas:

Nivel TSA - AVANZADO

Con una intensidad de:

40 Horas

En testimonio de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C.,
el día viernes 12 de abril de 2019

Código de verificación:

22525

ILBERTH MAURICIO MONTEALEGRE ANTOLINES
C.C. 7714873
Representante Legal 2DME S.A.S.
Central Group

NUBIA MARIA PARDO CAMACHO
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas
Licencia de Salud Ocupacional
No. 5756 de 23/07/2009
C.C. 52645529

Para verificar la autenticidad de este certificado, ingrese a la página
www.centralgrouptsa.com.co o escanee el código QR que aparece en este documento
Certificación Bureau Veritas NTC 6072 CO18.01020

CONSOLIDADO PERSONAL NUEVO EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019

EMPRESA	CENTRO DE TRABAJO	TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	NOTIFICACION DE RIESGOS	ARL	FECHA DE AFILIACION ARL	EPS	AFP	EXAMEN MEDICO INGRESO	INGRESO / NO INGRESO
HIDROALFA	LIEVANO	CRISHIAN CAMILO CONTRERAS GARCIA	1.013.647.686	AYUDANTE	21/09/2019	BOLIVAR	20/09/2019	FAMISANAR	PORVENIR	19-sep-19	SI
HIDROALFA	LIEVANO	ALDAIR YARA ROA	1.022.991.883	OFICIAL	21/09/2019	BOLIVAR	9/02/2017	SANITAS	PORVENIR	20-sep-19	SI
HIDROALFA	LIEVANO	ALEXIS GARCIA MEDRANO	1.104.422.168	OFICIAL	21/09/2019	BOLIVAR	18/09/2019	CRUZ BLANCA	PORVENIR	18-sep-19	SI
HIDROALFA	LIEVANO	AVELINO AGUILAR JAIMES	1.090.437.286	OFICIAL	21/09/2019	BOLIVAR	21/09/2019	SANITAS	PROTECCION	20-sep-19	SI
HIDROALFA	LIEVANO	DEIVIS GARCIA HOSTIA	12.603.129	AYUDANTE	21/09/2019	BOLIVAR	18/09/2019	SANITAS	PORVENIR	17-sep-19	SI
HIDROALFA	LIEVANO	HORACIO LONDERO GARCIA MEDRANO	1.010.007.270	AYUDANTE	21/09/2019	BOLIVAR	18/09/2019	SANITAS	PORVENIR	18-sep-19	SI
HIDROALFA	LIEVANO	JEFFERSON ARLEY HERNANDEZ ARAGON	1.024.595.596	AYUDANTE	21/09/2019	BOLIVAR	20/09/2019	MEDIMAS	PORVENIR	19-sep-19	SI
HIDROALFA	LIEVANO	JOSE GABRIEL GONZALEZ GARZON	80.068.070	AYUDANTE	21/09/2019	BOLIVAR	20/09/2019	SANITAS	PROTECCION	19-sep-19	SI
HIDROALFA	LIEVANO	LUIS EDUARDO PEREZ GIRALDO	1.040.745.530	AYUDANTE	21/09/2019	BOLIVAR	7/09/2019	MEDIMAS	PORVENIR	8-sep-19	SI
HIDROALFA	LIEVANO	RUBEN ALBERTO GARCIA RAMIREZ	94.074.715	OFICIAL	21/09/2019	SURA	20/09/2019	SANITAS	PORVENIR	19-sep-19	SI
HIDROALFA	LIEVANO	JUAN DAVID SEBASTIAN OSORIO SANCHEZ	1.032.480.463	RESIDENTE TECNICO	23/09/2019	BOLIVAR	17/09/2019	COMPENSAR	PORVENIR	18-sep-19	SI
HIDROALFA	TRANSVERSAL	GUILLERMO OSWALDO ROMERO PEDRAZA	80.410.588	OFICIAL	25/09/2019	BOLIVAR	20/09/2019	COMPENSAR	COLPENSIONES	20-sep-19	SI

CC 415

2940

416

NUMERO 1.013.647 630

CONTRERAS GARCIA

APELLIDO

CRISTHIAN CAMILO

NOMBRES

Cristian Contreras

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1994

MAICAO
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA


O+
G.S. RH

M
SEXO

07-MAR-2012 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO



A-1500150-00944500 M 1013647686 20171009 00579 02774A 1 0150171 [illegible]

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
HIDROALFA S A S
Identificada con NT No. 800230346

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 2802508465210, a partir del 01 de Septiembre del año 2010.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

CC	1013647686	CRISTIAN CAMILO CONTRERAS GARCIA	OPERATIVA	5	6.96%	20/09/2019		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 19 de Septiembre del año 2019.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

porvenir

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **CRISTHIAN CAMILO CONTRERAS GARCIA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **1,013,647,686**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes de Septiembre de 2019.

Gerente de Clientes
