	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 12/04/2019

FECHA	Julio	INFORME No.	1	DEL	21/05/2024	AL	21/06/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSULTORIA TECNICA PARA LAS OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO 20240120 EL 2024 Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETO 20240124 DE 2024 DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Diferentes puntos de intervención: Muro de Contención Adelaida Correa, Talud Loma los Henao, Talud San José, Quebradas (La Sabanetica, La Doctora, La Escuela y La Cien Pesos), Parque Erato, Rieles La Bonita, Alcantarillado Las Lomitas, Derrumbes, Demoliciones.

CONTRATO DE CONSULTORIA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CONTRATO No.:				CONTRATO No.:			
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:			
FECHA DE INICIACIÓN:	21 de mayo de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de noviembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:			
PLAZO ACTUALIZADO:	6			PLAZO ACTUALIZADO:			
PLAZO TRANSCURRIDO:	1,0	EQUIVALE AL	16,67%	PLAZO TRANSCURRIDO		EQUIVALE AL	
VALOR INICIAL :	$ 592.977.000,00			VALOR INICIAL :			
VALOR ACTUALIZADO:	$ 592.977.000,00			VALOR ACTUALIZADO:			
VALOR PAGADO:		EQUIVALE AL		VALOR PAGADO:		EQUIVALE AL	
VALOR POR PAGAR:		EQUIVALE AL		VALOR POR PAGAR:		EQUIVALE AL	
COORDINADOR:	Ana Milena Molina Osorio			INTERVENTOR:			

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

contrato de OBRA		ACTA 1	
	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		
contrato de INTERVENTORIA		ACTA 1	
	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 12/04/2019

FECHA	Julio	INFORME No.	1	DEL	21/05/2024	AL	21/06/2024

Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos

1.1 AVANCE

El contratista en virtud del presente contrato realizará la asesoria técnica , económica y acompañamiento de estudios y diseños en puntos críticos que se van a intervenir bajo el decreto de calamidad del Municipio de Sabaneta

- Inicia con Topografia
- Inicia con estudios de Suelos
- Inicia con estudios Hidraulicas e Hidrologicos

Entrega informes de la visita realizada en los diferentes puntos a intervenir
Realiza visitas periodicas a solicitud del Municipio para revisar las situaciones presentadas
Participa en comites y reuniones para revisar el avance de los estudios y diseños
Entrega bosquejos de diseños para iniciar actividades

1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS

• RPC EN TRAMITE

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 12/04/2019

FECHA	Julio	INFORME No.	1	DEL	21/05/2024	AL	21/06/2024

1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES

TECNICOS:

- Se da inicio en los diferentes frentes de obra, segun indicaciones entregadas por el ingeniero consultor Carlos Vasquez.
- Se realizan reuniones para revisar situaciones presentadas y revisar el avance de los diseños y estudios

ADMINISTRATIVOS:

- Se presentan las medidas de mitigacion para iniciar con las obras en Talud los Henaos, Via Adelaida Correa, Talud via San Jose, Vía Pan de azucar Sector la bonita, Fondo Canal Quebrada la Escuela y Cien pesos
- Se le solicita al contratista organizar toda la información necesaria para la legalizacion del contrato.

AMBIENTALES:

- N/A

SOCIALES:

- Se programa reunion con padres de famila y personal del Colegio Adelaida para el dia 8 de julio

LEGALES:

- Se inician tramites para la legalizacion el contrato de consultoria
- Se da autorizacion de inicio de actividades a partir del 21 de mayo

3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES


4. INDICADORES

No.	Programa	Subprogramas	Indicadores de Producto y/o Gestión	Unidad	Linea Base	Meta Plan Desarrollo	Meta en el Proyecto


	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01
		Fecha: 12/04/2019

FECHA	Julio	INFORME No.	1	DEL	21/05/2024	AL	21/06/2024


5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO

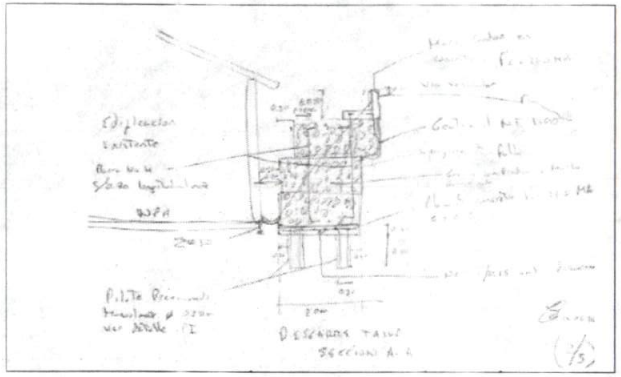


Punto crítico Desgarre de talud vía San José

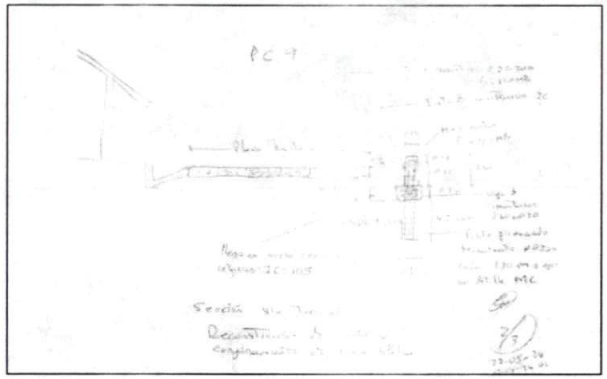


Punto crítico cuneta vía pan de azúcar

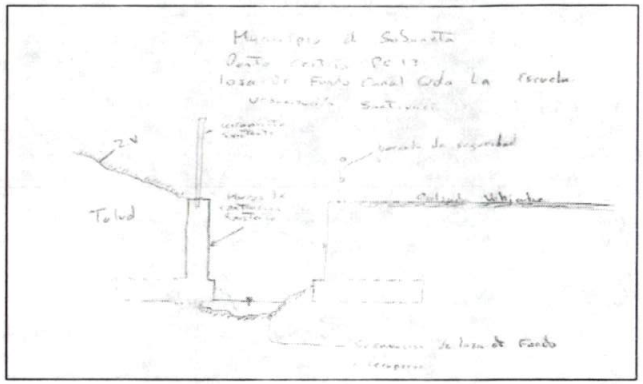


Punto crítico losa de fondo canal quebrada la escuela

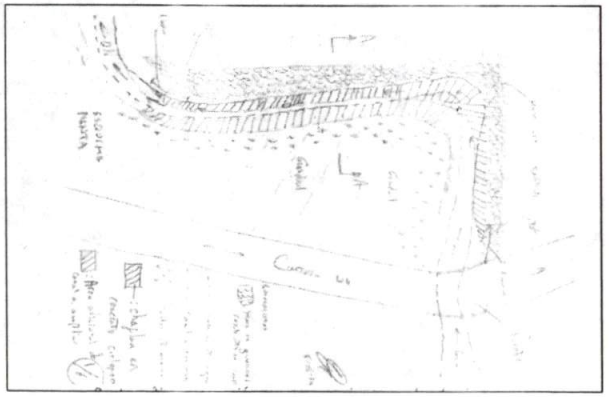

Punto crítico socavación muro en gaviones quebrada cien pesos

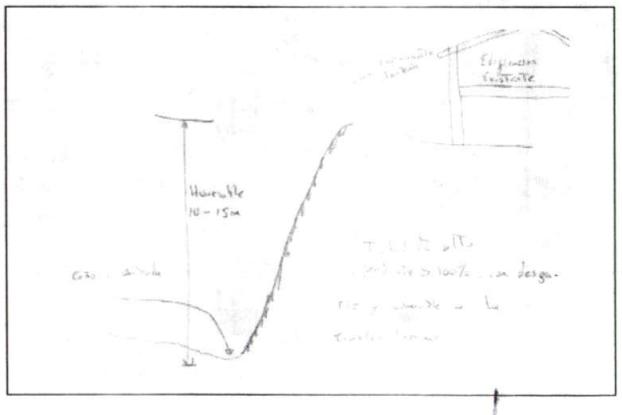

Punto crítico Talud los Henao

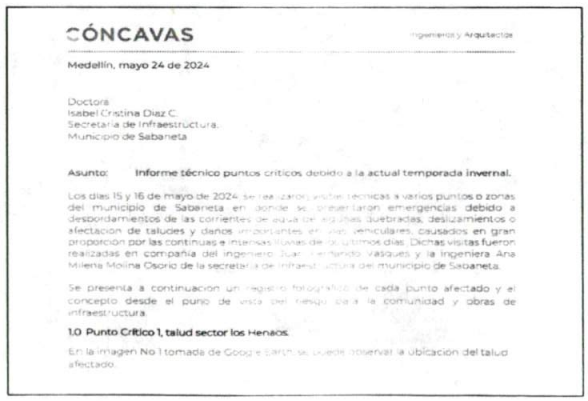

CÓNCAVAS

Ingenieros y Arquitectos

Medellín, mayo 24 de 2024

Doctora
Isabel Cristina Diaz C.
Secretaria de Infraestructura.
Municipio de Sabaneta

Asunto: **Informe técnico puntos críticos debido a la actual temporada invernal.**

Los días 15 y 16 de mayo de 2024 se realizaron visitas técnicas a varios puntos o zonas del municipio de Sabaneta en donde se presentaron emergencias debido a desbordamientos de las corrientes de agua de algunas quebradas, deslizamientos o afectación de taludes y daños ocasionados en vías vehiculares, causados en gran proporción por las continuas e intensas lluvias de los últimos días. Dichas visitas fueron realizadas en compañía del ingeniero Juan Fernando Vasquez y la ingeniera Ana Milena Molina Osorio de la secretaría de infraestructura del municipio de Sabaneta.

Se presenta a continuación un registro fotográfico de cada punto afectado y el concepto desde el punto de vista del riesgo para la comunidad y obras de infraestructura.

1.0 Punto Crítico 1, talud sector los Henaos.

En la imagen No 1 tomada de Google Earth se puede observar la ubicación del talud afectado.

Informe tecnico

FIRMA: PROFESIONAL ENCARGADO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

NOMBRE: Ana Milena Molina Osorio

Vo.Bo SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

NOMBRE: Isabel Cristina Diaz Correa
