
|CONTRATO No CO1.PCCNTR.4316864 DE 2023

OBJETO: "LOTE No 2. CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN - ONZAGA."

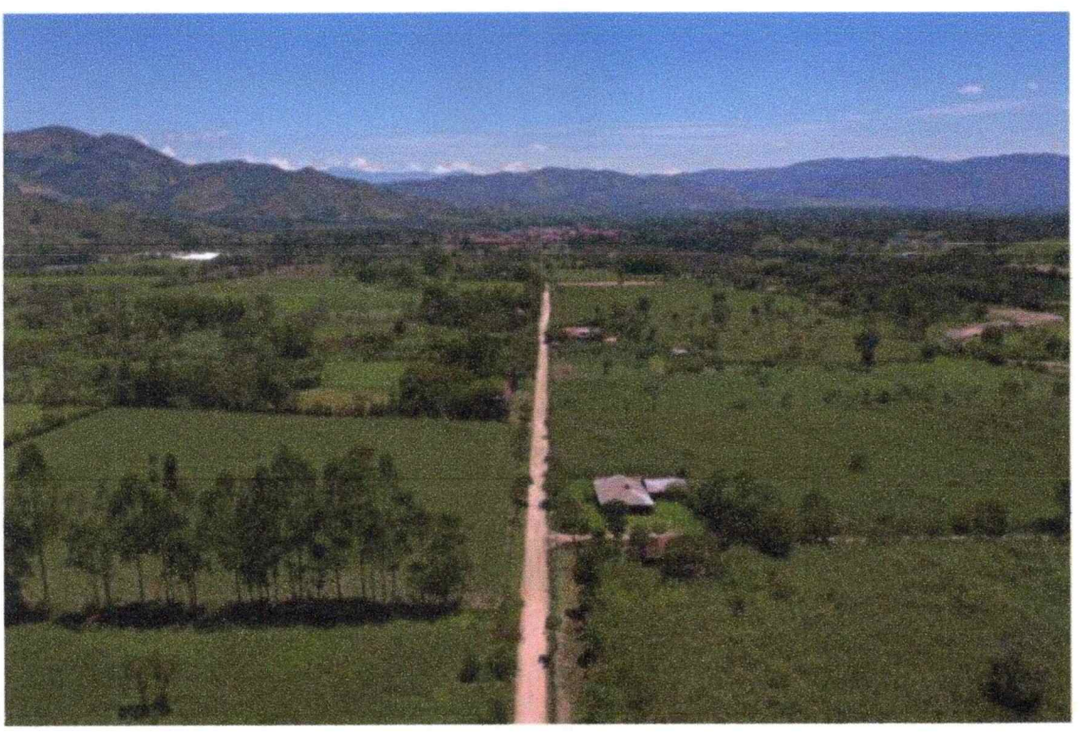

INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA No. 015.
PARA TRAMITE DE ACTA DE COBRO No.011.

Periodo: 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER
901.669.825-1

INTERVENTORÍA: CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC

Firma_____
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA
RESIDENTE DE OBRA
T.P 68202-333916 STD

INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA No. 014.

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.4316864 (NI 763 DE 2023)	DE 08 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATISTA:	Consorcio Conexiones Viales Santander	
Nit o C.C. No.	901.669.825-1	
OBJETO:	LOTE No 2 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN - ONZAGA	

VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($88.323.779.414,00 COP)	
VALOR ADICIONAL:	No aplica	
VALOR TOTAL:	No aplica	
ANTICIPO INICIAL:	No aplica	
ANTICIPO ADICIONAL:	No aplica	
ANTICIPO TOTAL:	No aplica	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	No aplica	No aplica
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	No aplica	No aplica
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	17.13%	
PORCENTAJE DE AVANCE PERIODO	0.92%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	15,96%	
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	No aplica	
PLAZO TOTAL:	No aplica	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CONTRATO INVIAS 1057 DE 2022	CONTRATO INVIAS 1057 DE 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC R/L CARLOS ALBERTO RAMIREZ QUINTERO	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	**NIT 901.577.958-5**	
SUPERVISOR:	PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SUÁREZ **FABIO RIOS FRANCO**	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	08 de Febrero de 2023 01 marzo de 2024 **09 mayo de 2024**	

FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2023

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	No aplica	Fecha:	No aplica
No.	No aplica	Fecha:	No aplica

ACTAS DE REINICIO			
No.	No aplica	Fecha:	No aplica
No.	No aplica	Fecha:	No aplica

FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2028

OFICINA GESTORA:	**Secretaria de Infraestructura**

TRÁMITE DE ACTA DE PAGO:	**SI**	**X**	**NO**	

VALOR A PAGAR:	**$**	**790,092,693.02**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**01/05/2024**	**Hasta:**	**31/05/2024**

Tabla 1: Información del contrato de obra

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	LOTE No 2 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN -ONZAGA
No. SSEPI	**20220680000060**
No. BPIN	**2022004680068**
Valor total del Proyecto	$ 88.323.779.414,00
Alcance	SE PLANTEA LA PAVIMENTACIÓN DE 31 KM DE LA VÍA QUE VA A BENEFICIAR A LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES, ONZAGA Y SAN JOAQUÍN

Tabla 2: Información general del proyecto

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.4316864 DE 08 DE FEBRERO DE 2023

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.4316864	DE 08 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATISTA:	Consorcio Conexiones Viales Santander	
Nit o C.C. No.	901.669.825-1	
OBJETO:	LOTE No 2 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN - ONZAGA	

VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($88.323.779.414,00 COP)	
VALOR ADICIONAL:	No aplica	
VALOR TOTAL:	$ 88.323.779.414,00	
ANTICIPO INICIAL:	No aplica	
ANTICIPO ADICIONAL:	No aplica	
ANTICIPO TOTAL:	No aplica	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA: No aplica	ACUMULADO: No aplica
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA: No aplica	ACUMULADO No aplica
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	17.13%	
PORCENTAJE DE AVANCE PERIODO	0.92%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	15,96%	
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	No aplica	
PLAZO TOTAL:	No aplica	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CONTRATO INVIAS 1057 DE 2022	CONTRATO INVIAS 1057 DE 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC R/L CARLOS ALBERTO RAMIREZ QUINTERO	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	**NIT 901.577.958-5**	
SUPERVISOR:	PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SUÁREZ **FABIO RIOS FRANCO**	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	08 de Febrero de 2023 01 marzo de 2024 **09 mayo de 2024**	

FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2023

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	No aplica	Fecha:	No aplica
No.	No aplica	Fecha:	No aplica

ACTAS DE REINICIO			
No.	No aplica	Fecha:	No aplica
No.	No aplica	Fecha:	No aplica

FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2028

Tabla 3: Información general del contrato de obra

OFICINA GESTORA:	**Secretaria de Infraestructura**	

2.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	27/02/2023	Se da inicio a las actividades de obra e interventoría.
APROBACIÓN DE POLIZAS	24/02/2023	Se firma el acta de aprobación de pólizas
ACTA PARCIAL No 1	21/09/2023	Se firma el acta parcial No 1
ACTA PARCIAL No 2	28/09/2023	Se firma el acta parcial No 2
ACTA PARCIAL No 3	29/09/2023	Se firma el acta parcial No 3
ACTA PARCIAL No 4	11/10/2023	Se firma el acta parcial No 4

ACTA PARCIAL No 5	21/11/2023	Se firma el acta parcial No 5
ACTA PARCIAL No 6	14/12/2023	Se firma el acta parcial No 6
ACTA PARCIAL No 7	18/12/2023	Se firma el acta parcial No 7
ACTA PARCIAL No 8	12/02/2024	Se firma el acta parcial No 8
ACTA PARCIAL No 9	29/02/2024	Se firma el acta parcial No 9
ACTA PARCIAL No 10	08/05/2024	Se firma el acta parcial No 10
ACTA PARCIAL No. 11	EN TRAMITE	

Tabla 4: Relación de actos administrativos

2.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Relación en orden cronológico de las actas de modificación de cantidades y precios no previstos y/o adicionales.

ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA
ACTA DE MAYORES Y MENORES No 1	29 de septiembre de 2023
ACTA DE MAYORES Y MENORES No 2	25 de enero de 2024

Tabla 5: Relación de cambios técnicos y/o modificaciones del contrato


2.4 ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

2.4.1. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:


ITEM	NORMA ESP TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
PAVIMENTOS					**42,829,628.92**		**$ 1,982,058,131.19**
320.1	320-13	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (incluye suministro, transporte e instalación)	M3	57.23	$ 12,660,077.22	4,024.99	$ 890,384,137.86
330.1	330-13	BASE GRANULAR CLASE A (incluye suministro, transporte e instalacion)	M3	121.70	$ 30,169,551.70	4,007.13	$ 993,371,534.13
ALCANTARILLAS					**44,622,718.06**		**$ 2,170,036,262.80**
630.3.7	630-13	CONCRETO CLASE C 280kg/cm2=400PSI=28MPa		15.99	$ 14,843,900.76	19.96	$ 18,529,347.04
640.1	640-13	Acero de refuerzo de Fy=420MPa (incluye suministro, transporte e instalacion)	KG	1,843.00	$ 15,444,340.00	10,846.93	$ 90,897,273.40
600.1.1.A	600-13	Excavaciones sin clasificar a Maquina	M3	228.02	$ 14,334,477.30	29,437.84	$ 1,850,609,811.60
CUNETAS Y FILTROS					**7,784,480.6**		**$ 1,926,709,986.47**
671.1	671-13	Cuneta en concreto vaciado insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo. CONCRETO CLASE C 280kg/cm2=4000psi=14 Mpa	M3	10.86	$ 7,784,480.58	34.19	$ 24,507,494.57
ITEMS NO PREVISTOS					**433,100,135.4**		**$ 6,006,936,377.20**
NP-02		Caisson Diámetro D=1,50 m F´c 28 Mpa No incluye acero de refuerzo	M	36.00	$ 181,993,680.00	81.00	$ 409,485,780.00
NP-03		REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	132.06	$ 2,312,238.54	734.06	$ 12,852,656.54
NP-06		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) - TRANSPORTE CON VOLQUETA DE 15m3	M3-KM	272.30	$ 542,693.90	6,215.02	$ 12,386,534.86
NP-07		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	5,592.00	$ 11,340,576.00	123,648.00	$ 250,758,144.00
NP-08		CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	1,216.55	$ 236,910,947.00	9,918.81	$ 1,931,589,059.40

320.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A (Incluye suministro, transporte e instalación): El presente ítem corresponde a la subbase granular para estructura de pavimento de 20 cms de espesor en los siguientes PR:

PR35+063	PR35+130
PR34+500	PR34+540
PR36+460	PR36+470
PR36+470	PR36+480
PR36+480	PR36+490

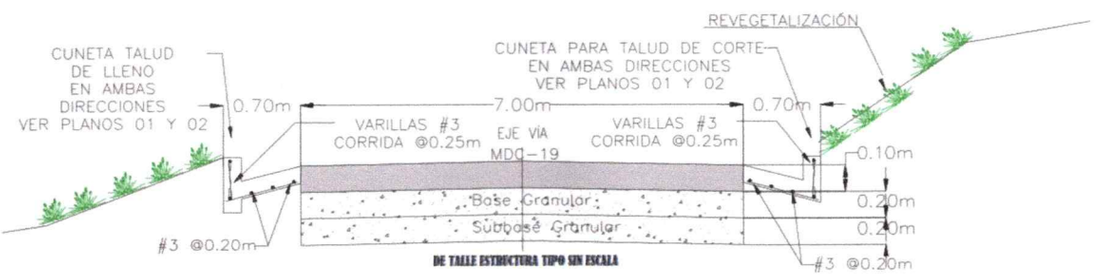

Así como subbase granular para la conformación de cunetas en los PR 33+788 al 34+354 y 33+788 al 34+354 margen derecho, así como PR 33+910 AL 34+072, 34+210 AL 34+350, 35+247 AL 35+642 Y 35+840 al 36+138 margen izquierdo.

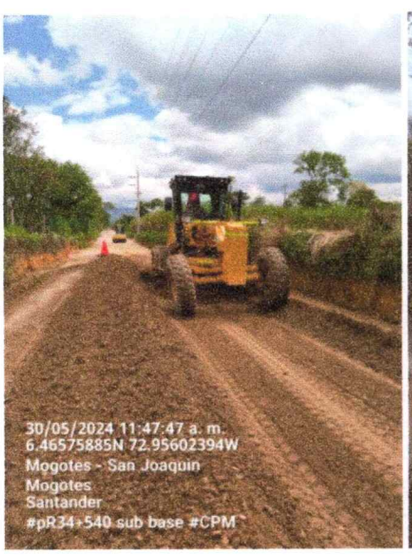



330.1 BASE GRANULAR CLASE A (incluye suministro, transporte e instalación): El presente ítem corresponde a la base granular para estructura de pavimento de 20 cms de espesor en los siguientes PR:


PR34+500	PR35+130
PR34+380	PR34+500
PR35+227	PR35+641
PR36+320	PR36+330
PR36+330	PR36+340
PR36+340	PR36+350
PR36+350	PR36+360
PR36+360	PR36+370
PR36+370	PR36+380
PR36+380	PR36+390
PR36+390	PR36+400
PR36+400	PR36+410
PR36+410	PR36+420

PR36+420	PR36+430
PR36+430	PR36+440
PR36+440	PR36+450
PR36+450	PR36+460
PR36+460	PR36+470
PR36+470	PR36+480
PR36+480	PR36+490



Así como subbase granular para la conformación de cunetas en los PR 33+788 al 34+354 y 35+227 al 35+641 margen derecho, así como PR 33+910 AL 34+072, 34+210 AL 34+350, 35+247 AL 35+642 Y 35+840 al 36+138 margen izquierdo.



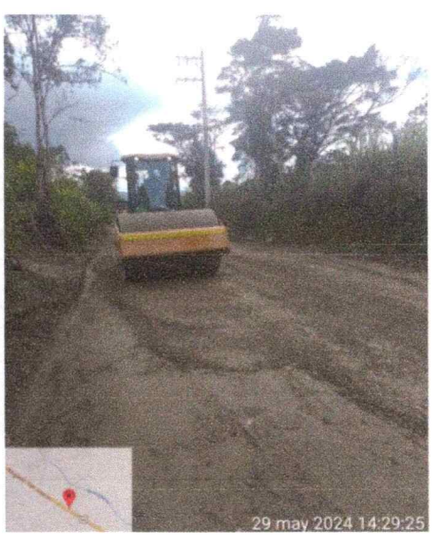

630.3.7 CONCRETO CLASE C 280kg/cm2=400PSI=28MPa: Hace referencia a los realces de cabezotes en las alcantarillas de los PR 35+640 Y 35+227 además del concreto para las cajas colectoras No 8-7-6 y 4 en el margen derecho.



640.1 Acero de refuerzo de Fy=420MPa (incluye suministro, transporte e instalación): Hace referencia al acero de refuerzo para los realces de cabezotes en las alcantarillas de los PR 35+640 Y 35+227 además del concreto para las cajas colectoras No 8-7-6 y 4 en el margen derecho



600.1.1.A EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR A MAQUINA: El presente ítem corresponde a las excavaciones para la instalación crudo para el mejoramiento de la capacidad portante de la subrasante y las cajas colectoras No 8-7-6 y 4 margen derecho, así mismo se descuentan los tramos de alcantarillas del mejoramiento de la capacidad portante.





671.1 Cuneta en concreto vaciado insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. CONCRETO CLASE C 280kg/cm2=4000psi=14 Mpa: El presente ítem corresponde al concreto de 4000 psi para cunetas en la vía San Gil- Mogotes PR 6+940 al PR7+129.





NP-02 'Caisson Diámetro D=1,50 m F´c 28 Mpa No incluye acero de refuerzo: Corresponde a 3 caisson fundidos durante el mes de mayo en el sector del PR 26 como cimentación del muro proyectado en el sector como se ilustra a continuación.

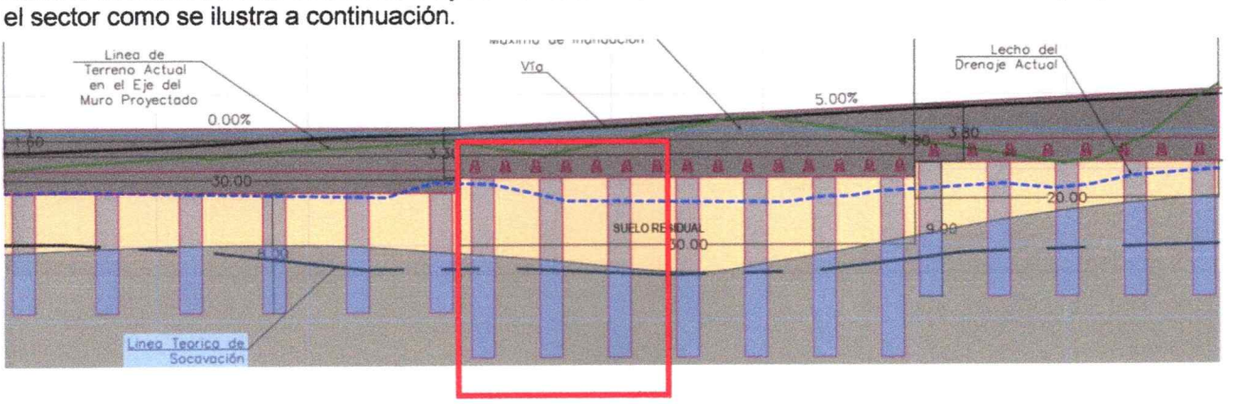

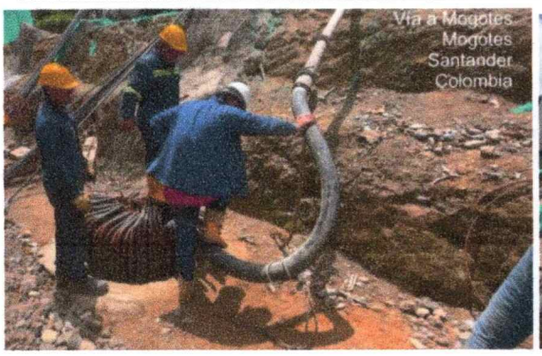





NP-03 REMOCIÓN DE DERRUMBES: Corresponde a la remoción de material depositado sobre la vía San Joaquín – Onzaga en el sector de la quebrada la leona que presenta una avalancha de manera constante e impide la transitabilidad, se solicitó a la interventoría el reconocimiento de la actividad a través de costos operacionales ya que el material a remover es insuficiente para cubrir los costos de operación (Maquinaria, personal, movimiento de maquinaria, etc.), por medio de la medida indicada en el NP -03 "Remoción de derrumbes" a continuación se presenta el análisis realizado para el mes de mayo corrigiendo los valores del mes de abril.

Costos operacionales mayo					
Item	Descripción	Unidad	Tarifa (incluye AIU)	cantidad	Valor total
1	Retrocargador	hora	$ 159,868.40	10.1	$ 1,614,670.88
2	Inspector de obra	hora	$ 20,521.13	10.1	$ 207,263.37
TOTAL					$ 1,821,934.25


Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Horas
11/05/2024	5890.6	5893	2.4
17/05/2024	5937.5	5938.5	1
18/05/2024	5948.6	5950.3	1.7
19/05/2024	5950.3	5951.6	5
TOTAL			10.1

CONVERSIÓN ITEM CONTRACTUAL (REMOCIÓN DE DERRUMBES)			
Item	valor unitario	conversión	unidad
Remoción de derrumbes	$ 17,509.00	104.06	m3

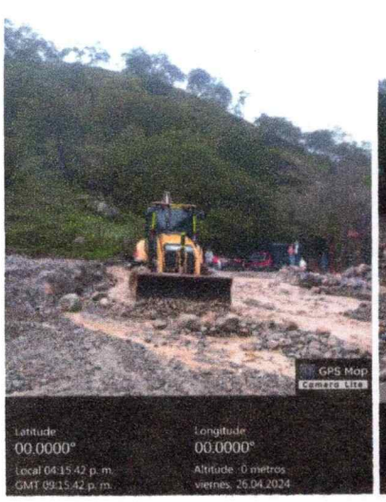

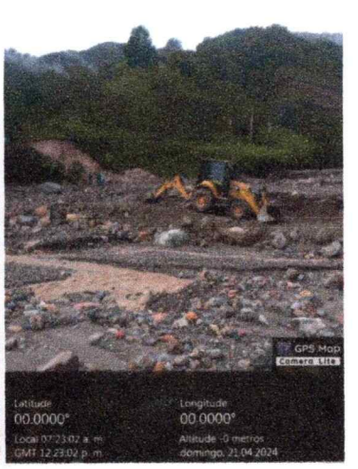

NP-07 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Corresponde a la conformación de calzada existente entre los PR 62+300 al PR 63+000 vía Mogotes – Onzaga como parte del mantenimiento vial del corredor.

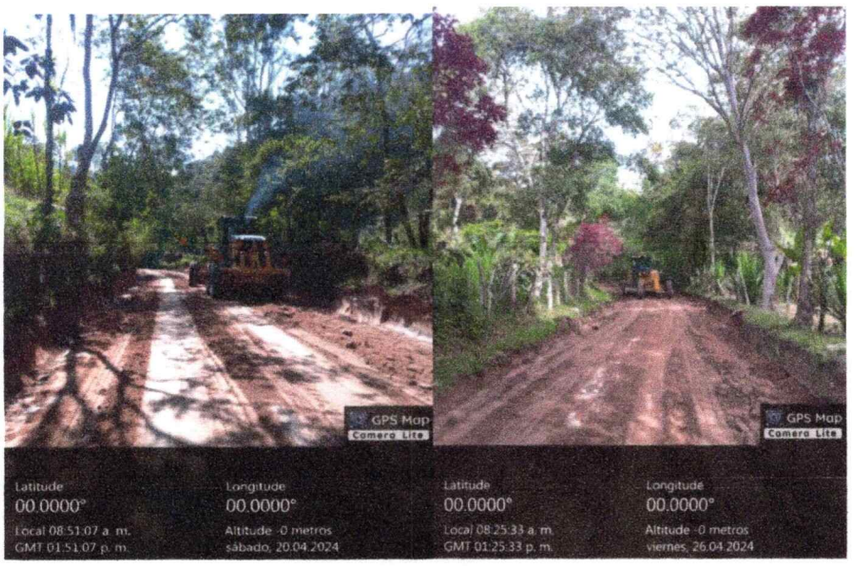

NP-08 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO: Corresponde a la la instalación de material seleccionado para el mejoramiento de la transitabilidad entre los PR 55+160 al PR 59+300 vía Mogotes – Onzaga como parte del mantenimiento vial del corredor, así como la nivelación de la subrasante en los PR 36+340 al 36+490




Tabla 6: Resumen de actividades ejecutadas

2.4.2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

Se muestra la reprogramación de la obra presentada en la modificatoria No 2 del contrato, esta programación se encuentra en el anexo No 8 del presente informe.

CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.2875421 V.00 (1)

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1	**CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.2875421**	**1304 días**	**lun 1/01/24**	**mar 29/02/2**	**$ 67,423,133,533.52**
2	**VIGENCIA 2024**	**314 días**	**lun 1/01/24**	**mar 31/12/2**	**$ 17,166,800,940.31**
3	**VIA**	**0 días**	**lun 1/01/24**	**lun 1/01/24**	**$ 0.00**
4	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
5	TERRAPLENES	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
6	**PAVIMENTOS**	**313 días**	**lun 1/01/24**	**mar 31/12/2**	**$ 2,651,691,960.00**
7	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES DE CORTE	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
8	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (incluye suministro, transporte e instalacion)	260 días	lun 1/01/24	mar 29/10/2	$ 1,195,440,456.00
9	BASE GRANULAR CLASE A (incluye suministro, transporte e instalacion)	260 días	jue 1/02/24	lun 2/12/24	$ 1,339,657,004.00
10	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-O	285 días	jue 1/02/24	mar 31/12/2	$ 116,594,500.00
11	Mezcla densa en caliente MDC-25 (incluye Suministro, Transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
12	**SEÑALIZACIÓN**	**314 días**	**lun 1/01/24**	**mar 31/12/2**	**$ 120,360,130.67**
13	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (90x90) cm.	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
14	Señal vertical de transito Informativa (SI-05 y/o SI 06) con lamina retrorreflectiva tipo IV	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
15	señal de transito tipo preventiva DCH SP - REFLECTIVO TIIPO IV (75x60) cm	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
16	Señal vertical de transito tipo SI - 04(poste de referencia) Reflectivo tipo IV(1,25x0,45) m	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
17	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA	26 días	lun 2/12/24	mar 31/12/2	$ 103,159,880.25
18	Tacha reflectiva - adhesivo bituminoso y/o termoplastico	26 días	lun 2/12/24	mar 31/12/2	$ 10,013,864.04
19	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (20cm x 20 cm)	26 días	lun 2/12/24	mar 31/12/2	$ 7,186,386.38
20	DEFENSA METALICA DOBLE ONDA	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
21	SECCION FINAL	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
22	**ALCANTARILLAS**	**155 días**	**lun 1/01/24**	**vie 28/06/24**	**$ 453,998,435.90**
23	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	24 días	jue 1/02/24	jue 29/02/24	$ 9,651,552.00
24	CONCRETO CLASE D 210 KG/cm2=3000 psi=21 Mpa Concreto de Estructuras.	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
25	CONCRETO CLASE C 280kg/cm2=4000PSI=28MPa	51 días	mié 1/05/24	vie 28/06/24	$ 40,660,581.20
26	Acero de refuerzo de Fy=420MPa (incluye suministro, transporte e instalacion)	51 días	mié 1/05/24	vie 28/06/24	$ 111,498,330.20
27	Tuberia de concreto reforzado 21 Mpa de 900 MM de Diametro interior (Tipo II)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
28	Tuberia de concreto reforzado 21 Mpa de 1000 MM de Diametro interior (Tipo II)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
29	Tuberia de concreto reforzado 21 Mpa de 1200 mm de diametro interior (tipo II)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
30	Tuberia de concreto reforzado 21 Mpa de 1300 mm de Diametro interior (tipo II)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
31	Tuberia de concreto reforzado 21MPa de 1400 mm de diametro interior (tipo II)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
32	Tuberia de concreto reforzado 21 Mpa de 1500 mm de diametro interior (tipo II)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
33	Tuberia de concreto reforzado 21 Mpa de 1700 mm de diametro interior (tipo II)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
34	Tuberia de concreto reforzado 21 Mpa de 1800 mm de diametro interior (tipo II)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
35	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (incluye suministro, transporte e instalacion)	51 días	mié 1/05/24	vie 28/06/24	$ 9,954,630.00
36	Excavaciones sin clasificar a Maquina	51 días	mié 1/05/24	vie 28/06/24	$ 261,436,675.50
37	Material granular filtrante (incluye suministro, transporte e instalacion)	51 días	mié 1/05/24	vie 28/06/24	$ 13,776,105.00
38	Geotextil Tipo NT-2000 o similar no tejido (incluye suministro, transporte e instalacion)	51 días	mié 1/05/24	vie 28/06/24	$ 4,538,422.00
39	Tuberia Perforada 4"(incluye suministro, transporte e instalacion)	51 días	mié 1/05/24	vie 28/06/24	$ 2,482,130.00
40	**CANALES DE DESCARGA**	**51 días**	**mié 1/05/24**	**vie 28/06/24**	**$ 15,881,352.00**
41	CONCRETO CLASE D 210 KG/cm2=3000 psi=21 Mpa Concreto de Estructuras	51 días	mié 1/05/24	vie 28/06/24	$ 11,431,572.00
42	Acero de refuerzo de Fy=420MPa (incluye suministro, transporte e instalacion)	51 días	mié 1/05/24	vie 28/06/24	$ 4,449,780.00
43	**CUNETAS Y FILTROS**	**314 días**	**lun 1/01/24**	**mar 31/12/2**	**$ 2,101,200,951.50**
44	Cuneta en concreto vaciado insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo. CONCRETO CLASE C 280kg/cm2=4000psi=14 Mpa	130 días	jue 1/08/24	mar 31/12/24	$ 954,064,793.00
45	Material granular filtrante (incluye suministro, transporte e instalacion)	104 días	lun 2/09/24	mar 31/12/2	$ 849,985,678.50
46	Geotextil Tipo NT-2000 o similar no tejido (incluye suministro, transporte e instalacion)	104 días	lun 2/09/24	mar 31/12/2	$ 297,150,480.00
47	Tuberia perforada de 8" (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
48	**ZODME MOGOTES**	**0 días**	**lun 1/01/24**	**lun 1/01/24**	**$ 0.00**
52	**ZODME SAN JOAQUIN**	**0 días**	**lun 1/01/24**	**lun 1/01/24**	**$ 0.00**
58	**OBRAS AMBIENTALES**	**78 días**	**mié 2/10/24**	**mar 31/12/2**	**$ 18,844,084.00**
59	PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUE DE CESPED	78 días	mié 2/10/24	mar 31/12/2	$ 18,844,084.00
60	**CAMARA DE IMPACTO**	**0 días**	**lun 1/01/24**	**lun 1/01/24**	**$ 0.00**
61	CONCRETO CLASE D 210 KG/cm2=3000 psi=21 Mpa Concreto de Estructuras	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
62	Acero de refuerzo de Fy=420MPa (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
63	CONCRETO CLASE F 140 kg/cm2=2000PSI=14MPa concreto de limpieza	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
64	TUBERIA DOBLE PARED (TIPO ALCANTARILLADO)450 mm DE DIAMETRO (NTC3722-3) (incluye suministro, transporte e instalacion	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
65	Acero de refuerzo de Fy=420MPa (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00
66	Excavacion varias sin clasificar a mano	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00

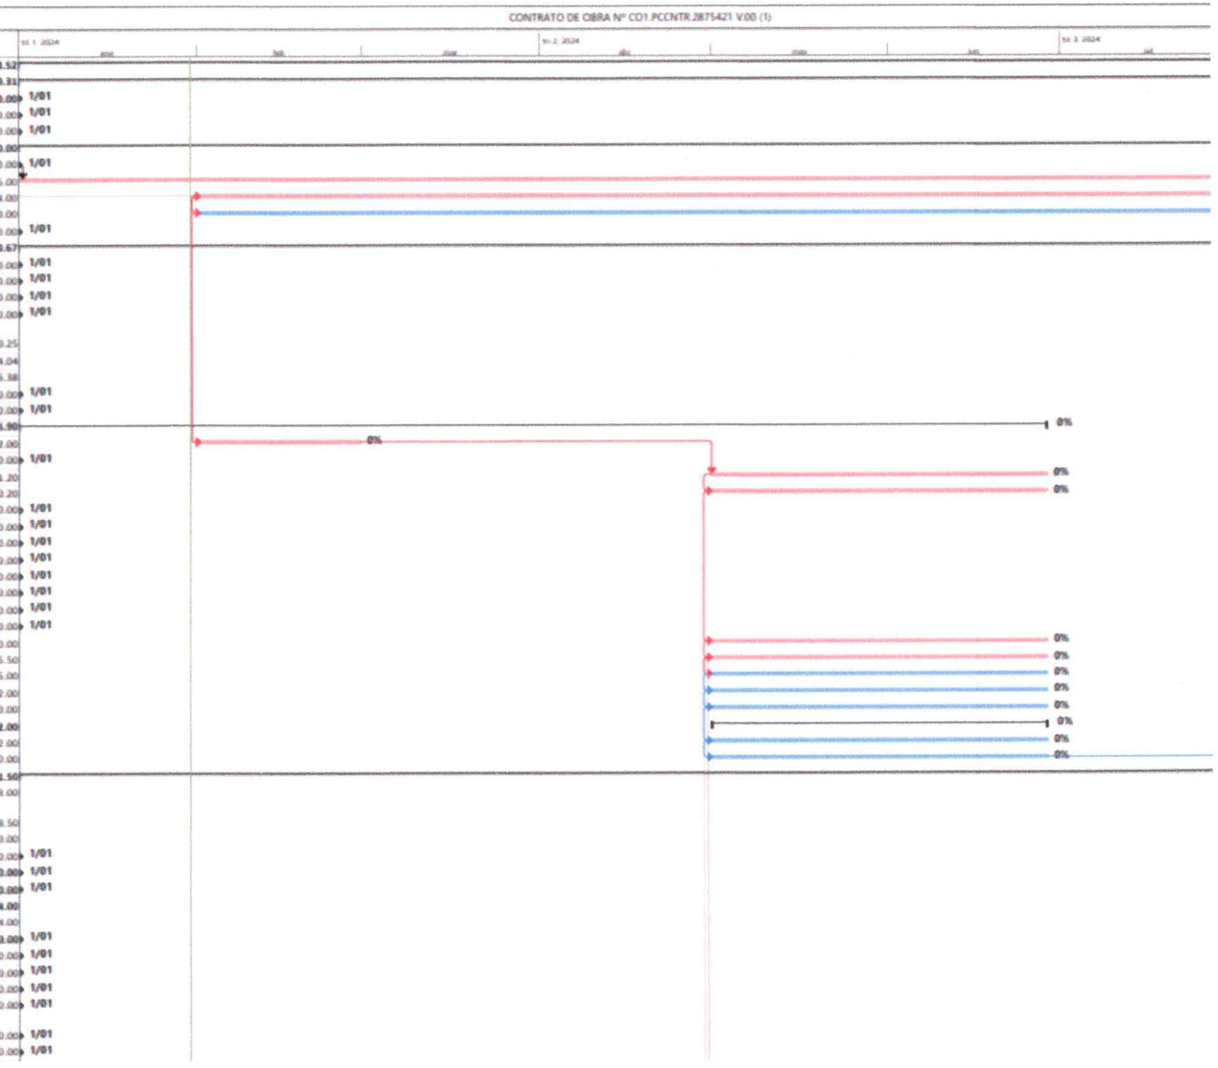

67	**ZANJAS DE CORONACION**	**24 días**	**vie 1/11/24**	**vie 29/11/24**	**$ 16,692,310.38**		
68	Cuneta en concreto vaciado insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo. CONCRETO CLASE F 140kg/cm2=2000psi=14 Mpa	24 días	vie 1/11/24	vie 29/11/24	$ 12,828,543.78		
69	Acero de refuerzo de Fy=420MPa (incluye suministro, transporte e instalacion)	24 días	vie 1/11/24	vie 29/11/24	$ 3,863,766.60		
70	**MUROS K33-57**	**313 días**	**lun 1/01/24**	**mar 31/12/2**	**$ 741,196,242.70**		
71	CONCRETO CLASE C 280kg/cm2=400PSI=28MPa	50 días	vie 1/11/24	mar 31/12/2	$ 239,507,592.00		
72	Acero de refuerzo de Fy=420MPa (incluye suministro, transporte e instalacion)	50 días	vie 1/11/24	mar 31/12/2	$ 154,895,920.00		
73	CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa G (CICLOPEO)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
74	Tuberia Perforada 4"(incluye suministro, transporte e instalacion)	50 días	vie 1/11/24	mar 31/12/2	$ 4,148,703.00		
75	Geotextil Tipo NT- 1600 o similar tejido (incluye suministro, transporte e instalacion)	50 días	vie 1/11/24	mar 31/12/2	$ 47,458,927.20		
76	Material granular filtrante (incluye suministro, transporte e instalacion)	50 días	vie 1/11/24	mar 31/12/2	$ 23,025,775.50		
77	ANCLAJE ACTIVO 6.6 Tn	50 días	vie 1/11/24	mar 31/12/2	$ 272,159,325.00		
78	ANCLAJE ACTIVO 16 Tn	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
79	**TRATAMIENTOS DE TALUDES**	**313 días**	**lun 1/01/24**	**mar 31/12/2**	**$ 338,289,600.00**		
80	ANCLAJE ACTIVO 30Tn	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
81	Tratamiento con concreto Fc=21MPa lanzado e=10 cm y malla electrosoldada D=4mm 15*15	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
82	Concreto lanzado f´c=21MPa	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
83	PROTECCION DE TALUDES CON MALLA Y MANTO M2 ORGANICO	50 días	vie 1/11/24	mar 31/12/2	$ 338,289,600.00		
84	**INFRAESTRUCTURA**	**0 días**	**lun 1/01/24**	**lun 1/01/24**	**$ 0.00**	1/01	
85	Caisson Diametro D=1,25 m F´c 28 Mpa- No incluye acero de refuerzo	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
86	Acero de refuerzo de Fy=420MPa (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
87	CONCRETO CLASE C 280kg/cm2=400PSI=28MPa concretos estribos y aletas estribos	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
88	**VARIOS**	**314 días**	**lun 1/01/24**	**mar 31/12/2**	**$ 234,029,400.00**		
89	CONCRETO CLASE F 140 kg/cm2=2000PSI=14MPa concreto de limpieza	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
90	Tuberia Perforada 4"(incluye suministro, transporte e instalacion)	104 días	lun 2/09/24	mar 31/12/2	$ 234,029,400.00		
91	Tuberia perforada de 6" (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
92	JUNTA ELOSTOMERICA JEENE (J8097)(incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
93	BARANDA METALICA PEATONAL (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
94	Geotextil Tipo NT- 1600 o similar tejido (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
95	Material granular filtrante (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
96	**INFRAESTRUCTURA**	**0 días**	**lun 1/01/24**	**lun 1/01/24**	**$ 0.00**	1/01	
97	Caisson Diametro D=1,25 m F´c 28 Mpa- No incluye acero de refuerzo	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
98	Acero de refuerzo de Fy=420MPa (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
99	CONCRETO CLASE C 280kg/cm2=400PSI=28MPa concretos estribos y aletas estribos	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
100	Apoyo neopreno 35x35x6-dureza 60-reforzado(incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
101	**VARIOS**	**0 días**	**lun 1/01/24**	**lun 1/01/24**	**$ 0.00**	1/01	
102	CONCRETO CLASE F 140 kg/cm2=2000PSI=14MPa concreto de limpieza	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
103	Tuberia Perforada 4"(incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
104	Tuberia perforada de 6" (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
105	JUNTA ELOSTOMERICA JEENE (J8097)(incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
106	BARANDA METALICA PEATONAL (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
107	Geotextil Tipo NT- 1600 o similar tejido (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
108	Material granular filtrante (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
109	BARRERA EN CONCRETO CLASE C 210kg/cm2=3000PSI=21MPa- TIPO NEW JERSEY	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
110	**INFRAESTRUCTURA**	**0 días**	**lun 1/01/24**	**lun 1/01/24**	**$ 0.00**	1/01	
111	Caisson Diametro D=1,25 m F´c 28 Mpa- No incluye acero de refuerzo	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
112	Acero de refuerzo de Fy=420MPa (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
113	CONCRETO CLASE C 280kg/cm2=400PSI=28MPa concretos estribos y aletas estribos	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
114	Apoyo neopreno 35x35x6-dureza 60-reforzado(incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
115	**VARIOS**	**0 días**	**lun 1/01/24**	**lun 1/01/24**	**$ 0.00**	1/01	
116	CONCRETO CLASE F 140 kg/cm2=2000PSI=14MPa concreto de limpieza	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
117	Tuberia Perforada 4"(incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
118	Tuberia perforada de 6" (incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	
119	JUNTA ELOSTOMERICA JEENE (J8097)(incluye suministro, transporte e instalacion)	0 días	lun 1/01/24	lun 1/01/24	$ 0.00	1/01	

En el presente periodo la ejecución programada es de 25.31% de acuerdo al programa de inversiones vigente, la obra presenta un avance mensual de 0.92% y un avance físico acumulado de 17.13%

2.5 INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Se anexa el reporte diario de estado general del tiempo:

FECHA	DIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1/05/2024	MIERCOLES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la tarde
2/05/2024	JUEVES	LLUVIAS INTENSAS	Lluvias durante todo el día
3/05/2024	VIERNES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la tarde
4/05/2024	SABADO	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la tarde
5/05/2024	DOMINGO	LLUVIAS INTENSAS	Lluvias durante todo el día
6/05/2024	LUNES	LLUVIAS INTENSAS	Lluvias en horas de la tarde
7/05/2024	MARTES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la tarde
8/05/2024	MIERCOLES	LLUVIAS INTENSAS	Lluvias en horas de la tarde
9/05/2024	JUEVES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias durante todo el día
10/05/2024	VIERNES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la tarde
11/05/2024	SABADO	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la tarde
12/05/2024	DOMINGO	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la noche
13/05/2024	LUNES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la noche
14/05/2024	MARTES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la tarde
15/05/2024	MIERCOLES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la tarde
16/05/2024	JUEVES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la tarde
17/05/2024	VIERNES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la tarde
18/05/2024	SABADO	SOLEADO	
19/05/2024	DOMINGO	SOLEADO	
20/05/2024	LUNES	LLUVIAS INTENSAS	Lluvias en horas de la tarde
21/05/2024	MARTES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias durante todo el día
22/05/2024	MIERCOLES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la tarde
23/05/2024	JUEVES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la tarde
24/05/2024	VIERNES	LLUVIAS INTENSAS	Lluvias en horas de la tarde
25/05/2024	SABADO	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la tarde
26/05/2024	DOMINGO	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la tarde

27/05/2024	LUNES	LLUVIAS INTENSAS	Lluvias en horas de la tarde
28/05/2024	MARTES	LLUVIAS INTENSAS	Lluvias en horas de la tarde
29/05/2024	MIERCOLES	LLUVIAS INTENSAS	Lluvias en horas de la tarde
30/05/2024	JUEVES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias en horas de la noche
31/05/2024	VIERNES	LLUVIAS MODERADAS	Lluvias durante todo el día

Tabla 7: Estado del tiempo

2.5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Entrega de informes SST y ambientales del proyecto	Ver Anexos en el informe
realización de la inducción y reinducción a los trabajadores en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo a los trabajadores dependientes, cooperadores, en misión y contratistas.	Ver Anexos en el informe.
Seguimiento a la programación	Ver Anexos en el informe.
Trámite de permisos	Ver Anexos en el informe.
Comunicación permanente con la administración municipal, la veeduría y la comunidad	Ver Anexos en el informe.
Afiliación del personal al sistema de seguridad social.	Ver Anexos en el informe.
Se gestiona la disposición del material de excavación del proyecto, para él un punto autorizado y certificado.	Ver Anexos en el informe.
Pago de planillas de seguridad social del periodo.	Ver Anexos en el informe.

Tabla 8:Actividades ejecutadas por el contratista

2.5.1 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero director de obra	1
Ingeniero Residente de obra	1
Ingeniero auxiliar residente	1
Especialista en vías	1
Especialista en estructuras	1
Especialista hidráulico	1
Especialista en geotecnia	1
Especialista ambiental	1
Asesor legal	1
Secretaria	1
Contadora	1
Topógrafo	1
Cadenero 1	1
Cadenero 2	1
Auxiliar SST	1
Despachadora-recibidora	1
Profesional social	1
Auxiliar ambiental	1
Practicante universitaria	1
Inspectores	1
Operadores de maquinaria amarilla	9
Ayudante de topografía	1
ayudantes	15
conductores	3
Oficiales	3
Controladores viales	13
Conductores volquetas	3

Servicios generales	1
Técnico de laboratorio	1
Almacenista	1
Auxiliar de despacho	1
Auxiliar de suministro	1
TOTAL	**72**

Tabla 9: Relación del personal de obra

2.5.2 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de obra. A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

OMBRE Y PELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	SALARIO	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DESVINCULACION	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	IBC(SEGÚN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
ONZALEZ PELAEZ AYINSON JAVIER	17975755	Especialista en estructuras	Independiente	2,300,000	70%	1/10/2023	N/A	30	Mayo	2,300,000	7927452884	2,300,000	287,500	368,000	12,100	667,600
ERRANO ATA EFRAIN ANDRES	91541593	Especialista en vias	Independiente	2,400,000	60%	1/01/2024	N/A	30	Mayo	2,400,000	77491526	2,400,000	300,000	384,000	12,600	696,600
UTIERREZ OVAR ANYI ATHERINE	1095796908	Especialista en Geotecnia	Independiente	1,600,000	60%	1/01/2024	N/A	30	Mayo	1,600,000	9468284110	1,600,000	200,000	256,000	39,000	495,000
TORRES ORTIZ HECTOR	13930230	Especialista hidraulico e hidrologia	Independiente	2,000,000	60%	1/01/2024	N/A	30	Mayo	2,000,000	9468375661	2,000,000	250,000	320,000	20,900	590,900
EPULVEDA LORGIA	63528873	Profesional ambiental	Independiente	1,300,000	50%	1/09/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9467931243	1,300,000	162,500	208,000	90,500	461,000
NCIARTE JESUS	1122810440	Asesor legal	Independiente	1,300,000	100%	18/03/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9468554330	1,300,000	162,500	208,000	90,500	461,000
AFRICANO SAIDA	63555076	Contadora	Empleado	2,262,665	100%	1/01/2024	N/A	30	Mayo	2,262,665	9466966011	$2,262,665	90,600	362,100	157,500	610,200
AGUILAR JULIAN	1098693111	Residente de obra	Empleado	4,000,000	100%	18/03/2024	N/A	30	Mayo	4,000,000	9466966011	$4,000,000	160,000	640,000	278,400	1,078,400
APARICIO STIVEN	1100220081	Ayudante de obra	Empleado	1,300,000	100%	13/05/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,317,287	52,700	210,800	91,700	355,200
ARGUELLO DORIS	1005411432	Auxiliar administrativo	Empleado	1,300,000	100%	21/04/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,344,947	53,800	215,200	93,700	362,700
VELLANEDA CECILIA	1100221916	Controladora vial	Empleado	1,300,000	100%	1/09/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,306,915	52,300	209,200	91,000	352,500

AVELLANEDA CECILIA	1100221916	Controladora vial	Empleado	1,300,000	100%	1/09/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,306,915	52,300	209,200	91,000	352,500
AYALA ARIEL	1100221885	Operador	Empleado	1,800,000	100%	1/02/2024	N/A	30	Mayo	1,800,000	9466966011	$1,700,000	68,000	272,000	118,400	458,400
BARCENAS JOSE	1098260165	Operador	Empleado	1,800,000	100%	22/01/2024	N/A	30	Mayo	1,800,000	9466966011	2,200,213	88,100	352,100	$136,500	440,200
BARRERA MARIA	1098822491	Residente de obra	Empleado	2,500,000	100%	12/09/2023	N/A	30	Mayo	2,500,000	9466966011	$2,500,000	100,000	400,000	174,000	674,000
BARRERA NANCY	1005464536	Controladora vial	Empleado	1,300,000	100%	17/10/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,300,000	52,000	208,000	90,500	350,500
BARRIOS WILLIAM	6794875	Operador Maq. Amarilla	Empleado	1,800,000	100%	4/05/2023	N/A	30	Mayo	1,800,000	9466966011	$1,300,000	52,000	208,000	0	260,000
BUENO NATHALIA	1102382204	Controladora vial	Empleado	1,300,000	100%	8/05/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	1,302,979	47,000	208,500	81,700	337,200
CAMACHO ANGEL	1098828768	Ayudante de obra	Empleado	1,300,000	100%	16/01/2024	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,300,000	52,000	208,000	0	260,000
CASTILLO HOLMER	1098609925	Operador Motonivelado ra	Empleado	2,200,000	100%	30/05/2023	N/A	30	Mayo	2,200,000	9466966011	$2,200,000	88,000	352,000	153,200	593,200
CASTRO LUIS	5690083	Ayudante de Obra	Empleado	1,300,000	100%	21/03/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	1,300,000	50,300	208,100	87,500	345,900
CORDERO MARIA	63494528	Servicios Generales	Empleado	1,300,000	100%	14/06/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	1,300,000	52,100	208,100	69,400	329,600
CORZO DIANA	1100223169	Despachador a - Recibidora	Empleado	1,300,000	100%	20/06/2023	N/A	4	Mayo	1,300,000	9466966011	$173,334	$7,000	$27,800	$12,100	46,900
ESTUPIÑAN CESAR	1104184490	Ayudante de obra	Empleado	1,300,000	100%	30/07/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,300,000	$52,000	$208,000	$90,500	350,500
FIGUEROA LIZETH	1019142348	Controladora Vial	Empleado	1,300,000	100%	20/06/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	1,310,373	$50,700	209,800	$88,200	348,700

FRANCO JEIMY	1005237355	Controladora vial	Empleado	1,300,000	100%	8/08/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,300,000	$52,000	$208,000	$90,500	350,500
GALLO JUAN	1098733730	Oficial de obra	Empleado	1,600,000	100%	22/08/2023	N/A	30	Mayo	1,600,000	9466966011	$1,600,000	$64,000	$256,000	$111,400	431,400
GARCIA DAGO	1095925597	Operador	Empleado	1,800,000	100%	16/01/2024	N/A	30	Mayo	1,800,000	9466966011	1,800,000	72,000	288,000	121,200	481,200
GOMEZ JORGE	1099363935	Ayudante de obra	Empleado	1,300,000	100%	1/09/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,305,585	$52,300	$208,900	$90,900	352,100
GOMEZ LILIANA	1101260449	Controladora vial	Empleado	1,300,000	100%	17/10/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,300,000	$52,000	$208,000	$90,500	350,500
GOMEZ LUIS	1057546458	Tecnico de laboratorio	Empleado	1,600,000	100%	21/03/2024	N/A	10	Mayo	1,600,000	9466966011	$1,676,596	$67,100	$268,300	$116,700	452,100
GOMEZ SALOMON	91111061	Operador Maq. Amarilla	Empleado	1,600,000	100%	13/06/2023	N/A	30	Mayo	1,600,000	9466966011	$1,708,936	$68,400	$273,500	$119,000	460,900
GOMEZ WILMER	1102349140	Conductor volqueta	Empleado	1,300,000	100%	28/09/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$2,075,574	$83,100	$332,100	$144,500	559,700
GUARIN JEFFERSON	1102364612	Operador Minicargador	Empleado	1,600,000	100%	1/11/2023	N/A	30	Mayo	1,600,000	9466966011	$1,651,064	$66,100	$264,200	$115,000	445,300
GUTIERREZ CAROLINA	37840965	Profesional social	Empleado	3,000,000	100%	7/11/2023	N/A	30	Mayo	3,000,000	9466966011	$3,000,000	$120,000	$480,000	$208,800	808,800
GUTIERREZ JOSE	1005411525	Conductor	Empleado	1,300,000	100%	20/06/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,450,330	$58,100	$232,100	$101,000	391,200
GUTIERREZ JUAN	1081824381	Ayudante de obra	Empleado	1,300,000	100%	17/10/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,324,202	$53,000	$211,900	$92,200	357,100
HERNANDEZ DIANA	1005411398	Controladora vial	Empleado	1,300,000	100%	16/01/2024	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,300,000	$52,000	$208,000	$90,500	350,500
HERRERA JOHAN	1005419982	Ayudante de obra	Empleado	1,300,000	100%	16/01/2024	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,306,915	$52,300	$209,200	$91,000	352,500

LOPEZ PEDRO	1100220821	Ayudante de obra	Empleado	1,300,000	100%	13/05/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,313,830	$52,600	$210,300	$91,500	354,400
MANRIQUE WILMER	1098689435	Topografo	Empleado	2,800,000	100%	28/11/2023	N/A	30	Mayo	2,800,000	9466966011	$2,800,000	$112,000	$448,000	$194,900	754,900
MARTINEZ JOHAN	1095958243	Ayudante de obra	Empleado	1,300,000	100%	22/08/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,320,745	$52,900	$211,400	$92,000	356,300
MEJIA OSCAR	1100893597	Conductor volqueta	Empleado	1,300,000	100%	28/09/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	2,036,575	81,600	326,000	$138,800	546,400
MENDEZ GERSON	91077216	Operador Retrocargador	Empleado	1,700,000	100%	25/05/2023	N/A	30	Mayo	1,700,000	9466966011	1,700,000	65,800	272,100	114,400	452,300
MENESES DAILY	1064841712	Auxiliar SST	Empleado	1,800,000	100%	26/06/2023	N/A	30	Mayo	1,800,000	9466966011	$1,823,936	$73,000	$291,900	$127,000	491,900
MUÑOZ JUAN	1102349735	Cadenero 2	Empleado	1,300,000	100%	5/12/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,608,511	$64,400	$257,400	$112,000	433,800
OLARTE WENDY	1007448133	Almacenista	Empleado	1,300,000	100%	18/08/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,327,660	$53,200	$212,500	$92,500	358,200
PAREDES LUZ	1095806041	Auxiliar de Suministro	Empleado	1,300,000	100%	4/05/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,300,000	$52,000	$208,000	$90,500	350,500
PEDRAZA EFRAIN	1007336574	Ayudante de obra	Empleado	1,300,000	100%	16/01/2024	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,320,745	$52,900	$211,400	$92,000	356,300
PEREZ KAREN	1100813317	Controladora vial	Empleado	1,300,000	100%	16/01/2024	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,313,830	$52,600	$210,300	$91,500	354,400
PINTO ANDRES	1100221610	Ayudante Topografia	Empleado	1,300,000	100%	22/08/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,300,000	$52,000	$208,000	$90,500	350,500
RAVELO EDINSON	1104130837	Operador de cargador	Empleado	1,800,000	100%	17/10/2023	N/A	30	Mayo	1,800,000	9466966011	$1,800,000	$72,000	$288,000	$125,300	485,300
REMOLINA FREDI	1007644765	Ayudante de obra	Empleado	1,300,000	100%	16/01/2024	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,320,745	$52,900	$211,400	$92,000	356,300

REYES JERLEY	1100969540	Controladora vial	Empleado	1,300,000	100%	16/01/2024	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,300,000	$52,000	$208,000	$90,500	350,500
RINCON JHOANNY	91481282	Ayudante de obra	Empleado	1,300,000	100%	1/09/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	1,300,000	$50,300	208,100	$87,500	345,900
ROJAS ESLENDY	1006594201	Controladora vial	Empleado	1,300,000	100%	16/01/2024	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,317,287	$52,700	$210,800	$91,700	355,200
ROJAS LAURA	1100222760	Controladora vial	Empleado	1,300,000	100%	16/01/2024	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,313,830	$52,600	$210,300	$91,500	354,400
RUEDA GERMAN	1098685506	Director obra	Empleado	4,500,000	100%	1/11/2023	N/A	30	Mayo	4,500,000	9466966011	$4,500,000	$180,000	$720,000	$313,200	1,213,200
RUGELES WILSON	91227789	Inspector de obra	Empleado	2,500,000	100%	3/11/2023	N/A	30	Mayo	2,500,000	9466966011	2,500,000	$96,700	400,100	$168,300	665,100
SALAZAR MILSIADES	5690267	Conductor	Empleado	1,300,000	100%	13/04/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	2,023,576	81,100	324,000	134,900	540,000
SERRANO RUTH	63476716	Controladora vial	Empleado	1,300,000	100%	21/04/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	1,313,832	52,700	210,400	85,500	348,600
SIERRA FIDEL	13716539	Cadenero 1	Empleado	1,300,000	100%	5/12/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$2,000,000	$80,000	$320,000	$139,200	539,200
TAVERA HELIBERTO	5690311	Conductor	Empleado	1,300,000	100%	3/06/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$2,075,574	$83,100	$332,100	$144,500	559,700
TIQUE LUIS	1143147015	Ayudante de obra	Empleado	1,300,000	100%	19/01/2024	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,313,830	$52,600	$210,300	$91,500	354,400
TORRES CRISTHIAN	1100221889	Ayudante de obra	Empleado	1,300,000	100%	8/05/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,468,032	$58,800	$234,900	$102,200	395,900
TORRES DIEGO	1100222600	Conductor volqueta	Empleado	1,300,000	100%	9/09/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,365,000	$54,600	$218,400	$95,100	368,100
VALDERRAMA NESTOR	1104184204	Ayudante de obra	Empleado	1,300,000	100%	17/10/2023	N/A	1	Mayo	1,300,000	9466966011	$43,334	1,800	$7,000	$3,100	11,900

VILLAMIZAR DORIS	1100222503	Controladora vial	Empleado	1,300,000	100%	30/06/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	1,324,203	51,300	212,000	$89,200	352,500
ZAMBRANO GIOVANNY	1100221024	Oficial de obra	Empleado	1,600,000	100%	11/05/2023	N/A	30	Mayo	1,600,000	9466966011	1,612,767	62,400	258,200	108,600	429,200
ZAMBRANO PAULA	1005419890	Auxiliar de despacho	Empleado	1,300,000	100%	17/10/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,300,000	$52,000	$208,000	$90,500	350,500
ZAMBRANO RUTH	1100220020	Auxiliar ambiental	Empleado	1,300,000	100%	17/10/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466966011	$1,300,000	$52,000	$208,000	$90,500	350,500
ZUÑIGA ADOLFO	1100812112	Oficial de obra	Empleado	1,600,000	100%	1/09/2023	N/A	30	Mayo	1,600,000	9466966011	$1,612,766	$64,600	$258,100	$112,300	435,000
VILLAMIZAR LIZETH	1099734490	Practicante universitaria	Empleado	1,300,000	100%	22/5/2023	N/A	30	Mayo	1,300,000	9466885247	1,300,000	0	0	90,500	90,500

Tabla 10: Relación de pagos de parafiscales

2.5.3. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

N° DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
400046559	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/02/2023	26/08/2026
400046559	PAGO DE SALARIOS	27/02/2023	26/02/2031
400046559	ESTABILIDAD	26/02/2028	26/02/2033
400046558	RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRUCTURAL	27/02/2023	26/02/2028

Tabla 11: Control de polizas del contratista

2.5.4. MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

A continuación, se relacionan los municipios donde se ejecutaron las actividades contractuales y el valor a partir del valor básico del acta de: $ 779,069,577.02 (Valor sin IVA)

MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TARIFA	VALOR
SAN GIL (0.89%)	RETEICA	0.60%	$ 9,141,912.76
MOGOTES (48.57%)	RETEICA	0.40%	$ 401,154,366.40
SAN JOQUIN (45.51%)	RETEICA	0.90%	$ 357,582,061.75
ONZAGA (5.02%)	RETEICA	1.00%	$ 11,191,236.11

Tabla 12: Municipios donde se realizaron las actividades

2.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

2.7

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Trámite de acta de recibo 011	Anexo No, 001 Relacione la Evidencia

Tabla 13:Actividades financieras realizadas por el contratista

2.7.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL:	$88.323.779.414,00
VALOR ADICIONAL:	No aplica
VALOR TOTAL:	$88.323.779.414,00
EJECUCIÓN FINANCIERA:	15,96%

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
23000804	14/02/2023	$9.500.000.000,00	23001949	15/02/2023	$7.823.779.414,00	7.359.787.720,58	463.991.693,42
23000805	14/02/2023	$7.500.000.000,00	23001950	15/02/2023	$7.500.000.000,00	6.736.394.445,94	763.605.554,06

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	No aplica	No aplica	No aplica
PARCIAL No 1	21/09/2023	$ 444.606.614,00	$00.000.00

PARCIAL No 2	28/09/2023	$ 417.326.967,78	$00.000.00
PARCIAL No 3	29/09/2023	$1,490,086,947.98	$00.000.00
PARCIAL No 4	11/10/2023	$1.654.742.254,90	$00.000.00
PARCIAL No 5	21/11/2023	$1,217,423,292.95	$00.000.00
PARCIAL No 6	14/12/2023	$1,228,972,438.34	$00.000.00
PARCIAL No 7	18/12/2023	$3,349,892,200.95	$00.000.00
PARCIAL No 8	12/02/2023	$ 2,315,704,263.59	$00.000.00
PARCIAL No 9	29/02/2023	$ 906,629,201.63	$00.000.00
PRESENTE ACTA	**ABRIL-MAYO 2024**	**$ 1,033,305,611.26**	$00.000.00
TOTAL		**$15,129,487,774.78**	P+FEsIsIpIIlwqñ

ANTICIPO INICIAL:	No aplica
ANTICIPO ADICIONAL:	No aplica
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	No aplica
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	No aplica
REINTEGROS:	No aplica
FIDUCIARIA:	No aplica
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	No aplica
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	No aplica

Tabla 14: Información financiera del contrato

2.8 ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
➢ Ajuste del PAGA de conformidad a las recomendaciones solicitadas por la interventoría. ➢ Revisión y ajuste del marco legal y metodología. ➢ Revisión de las fichas de manejo ambiental y sus indicadores. ➢ Elaboración de informe de cumplimiento ambiental. ➢ Capacitaciones al personal de obra ➢ Cumplimiento de requerimientos legales ➢ Manejo integral de materiales de construcción y residuos ➢ Manejo de aguas superficiales	Anexos adjuntos al informe.

Tabla 15: Actividades ambientales

2.9 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

PLAN DE CALIDAD	EVIDENCIAS

Se verifica que todos los materiales tengan el certificado de calidad (anexo se presenta).	Anexos adjuntos al informe
Se realiza la toma de muestras de materiales granulares en diversas canteras autorizadas en la región, para posteriormente realizarse los ensayos correspondientes.	Anexos adjuntos al informe
Se realiza la toma de muestra de los concretos utilizados para el desarrollo de la obra.	Anexos adjuntos al informe
Se realiza la toma de densidades para la estructura del pavimento según sus requerimientos	Anexos adjuntos al informe
Se realiza la toma de ensayos necesarios para la aplicación de carpeta asfaltica	Anexos adjuntos al informe
Se hace la revisión e inspección de los equipos, con el fin de cumplir con los buenos usos de los mismos, de que su estado sea el adecuado.	Anexos adjuntos al informe

Tabla 16:Actividades de aseguramiento de la calidad

2.9.1 PRUEBAS Y ENSAYOS

Para verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas se realizaron los siguientes ensayos en el laboratorio cuyos resultados se anexan al presente informe:

* Densidades de campo para subbase granular, mejoramiento con material seleccionado y base granular

2.8.2 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

MAQUINARIA/VEHICULO	PLACA	MARCA	MODELO	LINEA
RETROEXCAVADORA	R11D	DOOSAN	2023	DX225LCA-7M
RETROEXCAVADORA		CATERPILLAR	2022	313GC
RETROCARCADOR	RC01JC	JCB	2022	3CX
RETROCARGADOR		XCMG	2023	XC870K
MOTONIVELADORA	MN02C	CATERPILLAR	2022	120GC
MOTONIVELADORA		CATERPILLAR	2019	120M
VIBROCOMPACTADOR	VC02C	CATERPILLAR	2022	CS10GC
VIBROCOMPACTADOR		BITELLI	1995	BORA C80
VIBROCOMPACTADOR		INGERSOLL RAND	2002	
MINICARGADOR		CATERPILLAR	2022	236D3
MINICARGADOR		CATERPILLAR	2007	2268
CARGADOR		VOLVO	2010	L70F
VOLQUETA	SSY 983	INTERNATIONAL	2012	7600 SBA
VOLQUETA	SSY 963	INTERNATIONAL	2012	7600 SBA
VOLQUETA	LLQ 030	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4
VOLQUETA	LLQ 029	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4
VOLQUETA	LLQ 028	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4
CAMIONETA	HVZ-111	MAZDA	2014	
CAMIONETA	SON -239	CHEVROLET	2006	

CAMION TURBO	SBL-385	CHEVROLET	2008	
CARROTANQUE	SYP 000	FOTON	2013	
CARROTANQUE	XKF 731	FORD	1954	

Tabla 17:Relación de equipos

2.9. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el presente periodo se enviaron las siguientes comunicaciones:

2/5/2024	OFI-CONEX-808	Solicitud actualización al Programa de inversiones Versión 2 del 25 de enero de 2024	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
3/5/2024	OFI-CONEX-809	Notificación renuncia Especialista Ambiental y documentación nuevo especialista ambiental, Consultoría de los estudios y diseños quebrada santa clara pr61+820 al pr61+860 en el sector de la leona san Joaquín - Santander.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
7/5/2024	OFI-CONEX-809-A	Ingreso de trituradora y excavadora	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
7/5/2024	OFI-CONEX-810	Atención a comunicación INV-VIAS CONEXIÓN AC-1144-2024 de asunto Respuesta a comunicado OFI-CONEX-763 del 20 de marzo de 2024. Informe de cumplimiento ambiental No 12 – febrero 2024 V0	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
7/5/2024	OFI-CONEX-811	Ingreso de personal	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
7/5/2024	OFI-CONEX-812	Respuesta oficio AC-1164-2024 observaciones plan de contingencia 2024	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
7/5/2024	OFI-CONEX-813	Atención de observaciones al informe de cumplimiento ambiental No.11 de enero de 2024 V1	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
8/5/2024	OFI-CONEX-814	Respuesta oficio AC-1166-2024 solicitud entrega parcial de obra No 11 e informe mensual de obra correspondiente al mes de abril 2024	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
9/5/2024	OFI-CONEX-815	Solicitud reconocimiento de costos de remoción de material proveniente de la quebrada la Leona	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
9/5/2024	OFI-CONEX-816	Ingreso de personal Carlos Jose Roa	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
9/5/2024	OFI-CONEX-817	Alcance comunicado INV-VIAS-CONEXIÓN-AC-751-2023, Aprobación condicionada diseño hidráulico PR76+040 – obras estabilización – sector San Joaquín – Onzaga	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
9/5/2024	OFI-CONEX-818	Entrega prolongación muro de contención PR26+215	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
9/5/2024	OFI-CONEX-819	Respuesta comunicado INV-VIAS-CONEXIÓN AC-1125-2024 – Metodologías de diseño para el VOLUMEN III -IV-V: Estudio de Geología, Estudio de suelos y estudios de Estabilidad de taludes en el sitio – Pr61+800 (La Leona)	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC

10/5/2024	OFI-CONEX-820	Respuesta a Solicitud de Revisión de Peralte alto ubicado en el municipio de San Gil sector conocido como las ventanas, ventana número 3	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
10/5/2024	OFI-CONEX-821	Respuesta comunicado INV-VIAS-CONEXIÓN AC-1124-2024 – Metodologías de diseño para el VOLUMEN Estudio de Hidrología y socavación para realizar los diseños para fase I y III en el sitio – Pr61+800 (La Leona).	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
10/5/2024	OFI-CONEX-822	Respuesta comunicado INV-VIAS-CONEXIÓN AC-1125-2024 – Metodologías de diseño para el VOLUMEN II – IV – V: Estudio de Geología, Estudio de suelos y estudio de Estabilidad de taludes en el sitio – Pr61+800 (La Leona)	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
10/5/2024	OFI-CONEX-823	Informe de cumplimiento ambiental No 13 – marzo 2024 V0	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
10/5/2024	OFI-CONEX-824	Alcance comunicado OFI-CONEX-812 Entrega plan de contingencia vigencia 2024	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
14/5/20224	OFI-CONEX-825	Atención a la comunicación INV-VIAS CONEXIÓN AC-1064-2024 de asunto: Respuesta a comunicados OFI-CONEX-700 y OFI-CONEX-754. Acompañamiento para visita técnica a sitios de donación de materiales RCD y Zona de Nivelación PR 34+380.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
14/5/20224	OFI-CONEX-826	Consulta sobre restricción del certificado de uso del suelo para las intervenciones en el PR 29 – Zona de Disposición final de Material Estéril - ZODME	Leidy Johana Almeida Balcarcel	Alcaldia Municipal Mogotes
14/5/20224	OFI-CONEX-827	Invitación socialización plan de contingencia 2024 Consorcio Conexiones Viales Santander	Leidy Johana Almeida Balcarcel	Alcaldia Municipal Mogotes
14/5/20224	OFI-CONEX-828	Invitación socialización plan de contingencia 2024 Consorcio Conexiones Viales Santander	Emilton Darío Pérez Prada	Alcaldia Municipal San Joaquin
14/5/20224	OFI-CONEX-829	Invitación socialización plan de contingencia 2024 Consorcio Conexiones Viales Santander	Juan Fernando Cáceres	Alcaldia Municipal Onzaga
14/5/20224	OFI-CONEX-830	- Alcance a comunicación OFI-CONEX-825 de asunto Atención a la comunicación INV VIAS CONEXIÓN AC-1064-2024 de asunto: Respuesta a comunicados OFI-CONEX 700 y OFI-CONEX-754. Acompañamiento para visita técnica a sitios de donación de materiales RCD y Zona de Nivelación PR 34+380. - Atención a comunicación INV-VIAS CONEXIÓN AC-992-2024 y asunto Observaciones y requerimientos respecto al manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
14/5/20224	OFI-CONEX-831	Volante invitación Socialización Plan de contingencia vigencia 2024	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
17/5/20224	OFI-CONEX-832	Respuesta comunicado INV-VIAS-CONEXIÓN AC-1161-2024- "Respuesta al comunicado OFI-CONEX-778-Subsanacion de las observaciones de la mitología de Diseño Volumen XI: Estudio Gestión Predial, derivadas del comunicado (INV-VIAS CONEX AC 1057 1120-2024)- Sitio critico Pr61+800 (La Leona)	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
21/5/20224	OFI-CONEX-833	Informe de cumplimiento ambiental No 14 – abril 2024 V0	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC

21/5/20224	OFI-CONEX-834	Ingreso de personal	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
21/5/20224	OFI-CONEX-835	Respuesta comunicado INV-VIAS-CONEXIÓN AC-1121-2024- "Respuesta comunicado OFI-CONEX-771- Metodologías de diseño para el VOLUMEN VI: DISEÑO GEOMETRICO – Pr 61+800 (La Leona)	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
21/5/20224	OFI-CONEX-836	Solicitud viabilidad paso restringido nocturnos Sector PR61+820 Quebrada Santa Clara "La Leona.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
22/5/2024	OFI-CONEX-837	Atención al cumplimiento de requerimientos establecidos en la Res. 1007 del 29 de diciembre de 2023 – "Por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce permanente, y se dictan otras disposiciones "– Artículo Tercero.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA OFERTA RNR	Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
23/5/20224	OFI-CONEX-838	Estado actual estructuras sobre vía nacional 6304 Mogotes – San Joaquín - Onzaga		
23/5/20224	OFI-CONEX-839	Situación ejecución de obra días 20, 21, 22 y 23 de mayo de 2024	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
23/5/20224	OFI-CONEX-840	Respuesta Comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-1180-2024 (10 de Mayo de 2024)	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
23/5/20224	OFI-CONEX-841	Respuesta Comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-1205-2024 Incumplimiento ejecución actividades del plan de contingencia	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
23/5/20224	OFI-CONEX-842	Respuesta Comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-1213-2024 Solicitud cierre preventivo – condiciones inseguras Obras de contención Pr 26	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
23/5/20224	OFI-CONEX-843	Respuesta Comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-1219-2024 Solicitud inmediata, Planeación – trabajos de excavación CAISSONS No 1 y 2 del Modulo 1	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
27/5/20224	OFI-CONEX-844	Solicitud de capacitación sobre la vía nacional. En proceso de construcción y mantenimiento vía Mogotes San Gil, PR 26, vía Mogotes Onzaga, Pr 33+100	Melissa Duarte Romero.	Estación de Policia
24/5/20224	OFI-CONEX-845	Recorrido especialista geotécnico	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
24/5/20224	OFI-CONEX-846	Respuesta a comunicado INV-VIAS CONEXION AC-1140-2024 – Entrega de documentación ambiental	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
27/5/20224	OFI-CONEX-847	Consulta Restricciones transporte de maquinaria pesada	Leidy Johana Almeida Balcarcel	Alcaldia Municipal Mogotes
24/5/20224	OFI-CONEX-848	Atención a la comunicación INV-VIAS CONEXIÓN AC-1148-2024 de asunto: Respuesta a su comunicado OFI-CONEX-767 - Solicitud entrega de Acta de reunión Técnico Ambiental No. 1 de fecha 31 de enero de 2024	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
29/5/20224	OFI-CONEX-849	Consulta Restricciones transporte de maquinaria pesada	Emilton Dario Perez	Alcaldia Municipal San Joaquin

29/5/20224	OFI-CONEX-850	Consulta Restricciones transporte de maquinaria pesada	Juan Fernando Cáceres	Alcaldia Municipal Onzaga
29/5/20224	OFI-CONEX-851	Respuesta A oficio AC-1133-2024 Observaciones al diseño geométrico PR38+320 PR39+393	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
29/5/20224	OFI-CONEX-852	Atención a la comunicación INV-VIAS CONEXIÓN AC-1053-2024 de asunto: Respuesta a comunicado OFI-CONEX-731. Atención a comunicación INV-VIAS CONEXIÓN AC-946-2024 respecto al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución DGL No. 001007 del 29 de diciembre de 2023. Permiso de Ocupación de Cauce PR 26+0215 a PR 26+0500 en el municipio de Mogotes	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
29/5/20224	OFI-CONEX-853	Atención a la comunicación INV-VIAS CONEXIÓN AC-1054-2024 de asunto: Respuesta a comunicado OFI-CONEX-730. Cumplimiento obligaciones Resolución DGL No. 000843 del 14-11 2023. Permiso de Aprovechamiento Forestal de Árboles aislados PR 33+345 al PR 39+860 del corredor vial Mogotes – San Joaquín	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
29/5/20224	OFI-CONEX-854	Atención a la comunicación INV-VIAS CONEXIÓN AC-1032-2024 de asunto: Respuesta a su comunicado OFI-CONEX-729 de asunto: Apremio por incumplimiento: Resolución DGL No. 001010 del 29-12-2023. Licencia Ambiental para la explotación de materiales de construcción en la Autorización Temporal 507820 concedida por la ANM	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
29/5/20224	OFI-CONEX-855	Respuesta comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-1221-2024 ATENCION Y CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL Gremio de Volqueteros de los municipio del AID	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
29/5/20224	OFI-CONEX-856	Acopios materiales de obra sobre el corredor	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
31/5/20224	OFI-CONEX-857	Respuesta comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC 1147-2024 OBSERVACIONES ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MODIFICATORIA No 3	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC

Durante el presente periodo se recibieron las siguientes comunicaciones:

2/5/2024	1057-AC-1163	ATENCIÓN POR POSIBLE AFECTACIÓN EN EXCAVACIONES POR AUMENTO DE CAUDAL DEL RÍO MOGOTICOS EN LA CIMENTACIÓN MURO PR26 Y OTRAS OBSERVACIONES	Consorcio Vias Conexión AC
2/5/2024	1057-AC-1164	Respuesta comunicado OFI-CONEX-807 (30/04/2024). Plan de Contingencia	Consorcio Vias Conexión AC
3/5/2024	CR-030-2024	Respuesta solicitud bajo radicado 20241294	Secretaria de planeacion - Mogotes
4/5/2024	1057-AC-1165	Respuesta a comunicado OFI-CONEX-792: Observaciones diseño Hidráulico de las obras de drenaje K37+114.73 - K37+367.45 - K37+697.77	Consorcio Vias Conexión AC
4/5/2024	1057-AC-1166	Solicitud entrega de Acta Parcial de Obra No. 11 e Informe mensual de obra, correspondiente al mes de abril de 2024.	Consorcio Vias Conexión AC

4/5/2024	1057-AC-1167	Ejecución de actividades – con materiales de fuentes NO aprobados	Consorcio Vias Conexión AC
4/5/2024	1057-AC-1168	Respuesta al comunicado OFI-CONEX-803 Observaciones levantamiento topográfico del PR 51 al PR 58	Consorcio Vias Conexión AC
4/5/2024	1057-AC-1169	Remisión de Análisis de Precios unitarios contractuales	Consorcio Vias Conexión AC
6/5/2024	1057-AC-1170	Trazabilidad de la gestión ambiental realizada para definición de tipo de trámite y/o permiso que se debe obtener para las intervenciones del corredor vial San Gil- Mogotes- San Joaquín -Onzaga que discurre dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado - DMRI Guantiva La Rusia	Consorcio Vias Conexión AC
6/5/2024	1057-AC-1171	Incumplimiento de Compromisos – Gestion Ambiental-Corredor ONSAMO	Consorcio Vias Conexión AC
10/5/2024	1057-AC-1180	Apremio por el reiterativo Incumplimiento de los Compromisos pactados en Comité de Obra (Comité No. 40).	Consorcio Vias Conexión AC
8/5/2024	1057-AC-1181	Afectación estructura de pavimento subsectores corredor vial San Gil – Mogotes	Consorcio Vias Conexión AC
8/5/2024	1057-AC-1182	Aprobación Hoja de vida de profesional para el Cargo de Especialista Ambiental	Consorcio Vias Conexión AC
9/5/2024	CR-031-2024	Radicado 20241299 R fechado el 24 de abril de 2024	Alcaldia Municipal de mogotes
11/5/2024	1057-AC-1190	Respuesta a comunicados OFI- CONEX-811 INGRESO PERSONAL - OFI-CONEX-809 INGRESO MAQUINARIA	Consorcio Vias Conexión AC
11/5/2024	1057-AC-1191	Respuesta Plan de Contingencia V2, OFI-CONEX-806-807-808-812-824. Aprobación	Consorcio Vias Conexión AC
14/5/2024	1057-AC-1192	Respuesta a comunicados OFI-CONEX-750 y OFI-CONEX-813. Aprobación al Informe de cumplimiento ambiental No 11 – enero 2024 Versión 2	Consorcio Vias Conexión AC
14/5/2024	1057-AC-1193	Respuesta a comunicado OFI-CONEX-810. Aprobación al Informe de cumplimiento ambiental No 12 – febrero 2024 Versión 1	Consorcio Vias Conexión AC
14/5/2024	1057-AC-1194	Validación o corrección abscisado corredor vial dentro DRMI de los páramos de Guantiva y la Rusia	Consorcio Vias Conexión AC
15/5/2024	1057-AC-1197	Respuesta comunicado OFI- CONEX-816. (ingreso de Personal)	Consorcio Vias Conexión AC
15/5/2024	1057-AC-1198	Respuesta comunicado OFI-CONEX-819 Aprobación metodología del volumen III de Geología Estudios y Diseños Fase III, Pr 61+800 (Quebrada La Leona)	Consorcio Vias Conexión AC
15/5/2024	1057-AC-1199	Respuesta comunicado OFI-CONEX-818 Aprobación condicionada Prolongación Pr 26+215	Consorcio Vias Conexión AC

15/5/2024	1057-AC-1200	Respuesta comunicado OFI-CONEX-822 Aprobación metodología del Volumen IV Estudio de suelos y metodología Volumen V, Estudio de estabilidad de taludes Pr 61+800 (Quebrada La Leona)	Consorcio Vias Conexión AC
15/5/2024	1057-AC-1201	Alcance comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-1199-2024 Aprobación condicionada Prolongación Pr 26+215	Consorcio Vias Conexión AC
15/5/2024	1057-AC-1202	Respuesta comunicado OFI-CONEX-818. Observaciones Diseño Estructural Prolongación Muro de contención Pr 26+215	Consorcio Vias Conexión AC
15/5/2024	1057-AC-1203	Respuesta OFI-CONEX-821 - Metodologías de diseño para el VOLUMEN Estudio de Hidrología y socavación para realizar los diseños para fase I y III en el sitio – Pr61+800 (La Leona)	Consorcio Vias Conexión AC
15/5/2024	1057-AC-1204	Respuesta OFI-CONEX-818 – Análisis hidráulico Prolongación Muro de contención Pr 26+215 – (no aprobación)	Consorcio Vias Conexión AC
15/5/2024	SAO.335.2024.	Respuesta radicado CAS 80.30.5329.2024. de fecha del 5 de abril de 2024	Corporación Autónoma Regional de Santander
16/5/2024	1057-AC-1205	Incumplimiento ejecución actividades del plan de Contingencia	Consorcio Vias Conexión AC
21/5/2024	1057-AC-1211	Respuesta a comunicado OFI-CONEX-808. Actualización Programa de Inversiones	Consorcio Vias Conexión AC
21/5/2024	1057-AC-1213	Solicitud cierre preventivo – Condiciones inseguras Obras de contención Pr 26	Consorcio Vias Conexión AC
21/5/2024	1057-AC-1214	Identificación de escenarios de riesgo	Consorcio Vias Conexión AC
21/5/2024	1057-AC-1215	Solicitud – ajuste definitivo de los Estudios y Diseños – Presupuesto Total de Obra	Consorcio Vias Conexión AC
22/5/2024	1057-AC-1219	Solicitud inmediata, Planeación - trabajos de excavación CAISSONS No. 1 y 2 del Módulo 1	Consorcio Vias Conexión AC
22/5/2024	1057-AC-1220	Avance en actividades para ejecución de las Obras con Participación Comunitaria (OPC) y Realización del Primer Taller Pedagógico con Instituciones educativas	Consorcio Vias Conexión AC
22/5/2024	1057-AC-1221	Atención y Cumplimiento a compromisos adquiridos con el Gremio de Volquetero de los municipios del AID	Consorcio Vias Conexión AC
23/5/2024	1057-AC-1223	INCUMPLIMIENTO SEGUNDA SEMANA DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES DEL PLAN DE CONTINGENCIA	Consorcio Vias Conexión AC
24/5/2024	1057-AC-1224	SOLICITUD REMISION (APU NO PREVISTOS) DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL PR 76	Consorcio Vias Conexión AC
24/5/2024	1057-AC-1225	Volante Invitación Socialización Plan de Contingencia Vigencia 2024	Consorcio Vias Conexión AC

24/5/2024	1057-AC-1228	CUENTAS POR PAGAR DE PROVEEDORES. Contrato CO1.PCCNTR.4316864-Mogotes	Consorcio Vias Conexión AC
24/5/2024	1057-AC-1231	Respuesta comunicado OFI-CONEX-832. Aprobación VOLUMEN XI ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL. (Pr 61+800 La LEONA). CO1.PCCNTR.4316864	Consorcio Vias Conexión AC
24/5/2024	1057-AC-1232	Respuesta a comunicado OFI-CONEX-840, OFI-CONEX-841, OFI-CONEX-842. CO1.PCCNTR.4316864 – Observaciones Plan de contingencia	Consorcio Vias Conexión AC
29/5/2024	1057-AC-1234	INCUMPLIMIENTO TERCERA SEMANA EN LA EJECUCIÓN ACTIVIDADES DEL PLAN DE CONTINGENCIA	Consorcio Vias Conexión AC
29/5/2024	1057-AC-1238	Solicitud remisión Acta Parcial de Obra No. 12 e Informe mensual de obra, correspondiente al mes de mayo de 2024	Consorcio Vias Conexión AC
29/5/2024	1057-AC-1239	Solicitud retiro material seleccionado NO APTO para mejoramiento de la subrasante PR 34+700 al PR 34+900	Consorcio Vias Conexión AC
30/5/2024	1057-AC-1240	Orden de suspensión de la Autorización Temporal minera 507820	Consorcio Vias Conexión AC
31/5/2024	1057-AC-1246	SOLICITUD ENTREGA APU NO PREVISTO PARA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL PR 26+215	Consorcio Vias Conexión AC
31/5/2024	1057-AC-1247	SOLICITUD ENTREGA ANÁLISIS ESTRUCTURAL PARA LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	Consorcio Vias Conexión AC
31/5/2024	1057-AC-1248	Respuesta al Comunicado OFI-CONEX-835 Segunda entrega de la Metodología del Volumen Geométrico. (Pr 61+800-Quebrada La Leona)	Consorcio Vias Conexión AC
31/5/2024	24004077	REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2004077	Registro Presupuestal

Tabla 18: Comunicaciones del contratista

3. ANEXOS

1. Registro fotográfico.
2. Topografía
3. Parafiscales
4. Actas de reunión y/o comités
5. Resultados de laboratorio
6. Flujo de fondos
7. Programa de inversiones
8. Cronograma
9. Bitácora de obra

10. Certificados de calidad
11. Certificación Bancaria
12. Factura
13. Informe ambiental
14. Informe HSEQ
15. Informe Social
16. Polizas
