

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1	**1**	**CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ**	**jue 2/12/21**	**mié 3/12/25**	**990,5 d**	**$ 53.028.510.083**	**$ 27,76%**	**27,76%**	**$ 14.722.995.728**
2	**1.1**	**ETAPA PRELIMINARES**	**jue 2/12/21**	**sáb 1/07/23**	**270,75 d**	**$ 1.339.935.484**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 1.339.935.484**
3	*1.1.1*	*Acta de Inicio*	*jue 2/12/21*	*jue 2/12/21*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
4	*1.1.2*	*Suspension 1*	*mié 23/02/22*	*mié 23/02/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
5	*1.1.3*	*Reinicio suspension 1*	*jue 1/09/22*	*jue 1/09/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
6	*1.1.4*	*Suspension 2*	*mar 6/09/22*	*mar 6/09/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
7	*1.1.5*	*Reinicio suspension 2*	*mar 27/09/22*	*mar 27/09/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
8	*1.1.6*	*Prorroga Etapa preliminar 1*	*jue 29/09/22*	*jue 29/09/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
9	*1.1.7*	*Suspensión 3*	*dom 26/03/23*	*dom 26/03/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
10	*1.1.8*	*Reinicio suspension 3*	*mar 2/05/23*	*mar 2/05/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
11	*1.1.9*	*Prorroga Etapa preliminar 2*	*jue 4/05/23*	*jue 4/05/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
12	**1.1.10**	**FASE DE PRELIMINARES (INCLUYE ENSAYOS DE LABORATORIO, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) (I)**	**jue 2/12/21**	**sáb 1/07/23**	**270,75 d**	**$ 335.378.863**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 335.378.863**
13	*1.1.10.1*	*Adquirir información del contrato*	*jue 2/12/21*	*jue 2/12/21*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
14	1.1.10.2	Revisión de Diseños	jue 2/12/21	vie 23/12/22	143 d	$ 161.047.636	100,00%	100,00%	$ 161.047.636
15	**1.1.10.3**	**DESGLOSE DEL AIU OFERTADO**	**jue 6/01/22**	**vie 7/10/22**	**53 d**	**$ 4.661.563**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 4.661.563**
16	1.1.10.3.1	Elaboracion y entrega a la interventoria de desgl	jue 6/01/22	mar 11/01/22	3 d	$ 932.313	100,00%	100,00%	$ 932.313
17	1.1.10.3.2	Revision desglose por parte de la interventoria y	mar 11/01/22	jue 13/01/22	2 d	$ 621.542	100,00%	100,00%	$ 621.542
18	1.1.10.3.3	Atencion a obsercaciones y entrega de documen	lun 5/09/22	mar 27/09/22	1 d	$ 621.542	100,00%	100,00%	$ 621.542
19	1.1.10.3.4	Revision por parte de la interventoria y aprobaci	mar 27/09/22	vie 7/10/22	9 d	$ 2.486.167	100,00%	100,00%	$ 2.486.167
20	*1.1.10.4*	*fin de desglose del AIU ofertado*	*vie 7/10/22*	*vie 7/10/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
21	**1.1.10.5**	**ANTICIPO**	**jue 2/12/21**	**jue 9/12/21**	**5 d**	**$ 3.962.329**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 3.962.329**
22	1.1.10.5.1	Plan detallado de inversion del anticipo	jue 2/12/21	jue 9/12/21	5 d	$ 1.981.164	100,00%	100,00%	$ 1.981.164
23	1.1.10.5.2	Suscribir contrato de fiducia para el manejo de lo	jue 2/12/21	jue 9/12/21	5 d	$ 1.981.164	100,00%	100,00%	$ 1.981.164
24	*1.1.10.6*	*fin actividades Anticipo*	*jue 9/12/21*	*jue 9/12/21*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
25	**1.1.10.7**	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU CONTRACTUALES**	**vie 31/12/21**	**vie 11/11/22**	**85,75 d**	**$ 37.898.507**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 37.898.507**
26	1.1.10.7.1	Elaboracion y entrega a la interventoria de preci	vie 31/12/21	mar 1/02/22	25 d	$ 11.703.951	100,00%	100,00%	$ 11.703.951
27	1.1.10.7.2	Revision de precios unitarios por parte de la inte	mié 2/02/22	jue 1/09/22	18 d	$ 8.917.296	100,00%	100,00%	$ 8.917.296
28	1.1.10.7.3	Atencion a observaciones y entrega de documen	mié 28/09/22	jue 20/10/22	19 d	$ 8.917.296	100,00%	100,00%	$ 8.917.296
29	1.1.10.7.4	Revision por parte de la interventoria y aprobaci	vie 21/10/22	vie 11/11/22	18 d	$ 8.359.965	100,00%	100,00%	$ 8.359.965
30	*1.1.10.8*	*fin analisis de precios unitarios APU contractuales*	*vie 11/11/22*	*vie 11/11/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
31	**1.1.10.9**	**ELABORACION Y APROBACION PLAN DE CALIDAD - PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS**	**jue 2/12/21**	**mar 1/11/22**	**100 d**	**$ 8.390.813**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 8.390.813**
32	1.1.10.9.1	Elaboracion y entrega a la interventoria plan de	jue 2/12/21	vie 14/01/22	33 d	$ 3.401.681	100,00%	100,00%	$ 3.401.681
33	1.1.10.9.2	Revision del informe por parte de la interventor	sáb 15/01/22	mar 4/10/22	43 d	$ 2.834.734	100,00%	100,00%	$ 2.834.734
34	1.1.10.9.3	Atencion a observaciones y entrega de documer	mié 5/10/22	mié 19/10/22	11 d	$ 1.133.894	100,00%	100,00%	$ 1.133.894
35	1.1.10.9.4	Revision por parte de la interventoria y aprobac	jue 20/10/22	mar 1/11/22	10 d	$ 1.020.504	100,00%	100,00%	$ 1.020.504
36	*1.1.10.9.5*	*Aprobacion del idu del plan de inspeccion y ensay*	*mar 1/11/22*	*mar 1/11/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
37	*1.1.10.10*	*fin elaboracion y aprobacion plan de calidad - plan*	*mar 1/11/22*	*mar 1/11/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
38	**1.1.10.11**	**Tramite ante Empresas de Servicios Públicos**	**jue 2/12/21**	**mié 28/06/23**	**267,75 d**	**$ 92.857.161**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 92.857.161**
39	1.1.10.11.1	Revisión de Interferencias	jue 2/12/21	jue 17/02/22	62 d	$ 15.831.723	100,00%	100,00%	$ 15.831.723
40	1.1.10.11.2	Inventario e Inspección de redes existentes	jue 2/12/21	mar 22/02/22	66 d	$ 16.711.263	100,00%	100,00%	$ 16.711.263
41	1.1.10.11.3	Verificación de otros Proyectos Dentro del Área d	jue 2/12/21	mié 28/09/22	72 d	$ 18.177.164	100,00%	100,00%	$ 18.177.164
42	*1.1.10.11.4*	*Solicitud por parte de la interventoria al IDU del i*	*jue 2/12/21*	*jue 2/12/21*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
43	*1.1.10.11.5*	*Informar a las ESP el inicio de las actividades de*	*mar 13/12/22*	*mar 13/12/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
44	1.1.10.11.6	Apoyar gestion del IDU para obtencion de las aut	jue 2/12/21	mié 28/12/22	147 d	$ 36.061.147	100,00%	100,00%	$ 36.061.147
45	1.1.10.11.7	Ajuste de actas de competencia (Primera parte)	lun 28/11/22	mar 20/12/22	18 d	$ 4.127.975	100,00%	100,00%	$ 4.127.975
46	1.1.10.11.8	Ajuste de actas de competencia (Segunda parte)	jue 1/06/23	jue 8/06/23	7 d	$ 644.996	100,00%	100,00%	$ 644.996
47	1.1.10.11.9	Revision de actas de actas de competencia por p	vie 9/06/23	jue 15/06/23	5 d	$ 464.397	100,00%	100,00%	$ 464.397
48	1.1.10.11.10	Atencion de observaciones emitidas por interver	vie 16/06/23	jue 22/06/23	5 d	$ 580.497	100,00%	100,00%	$ 580.497
49	1.1.10.11.11	Revision por parte del IDU a las actas de competi	jue 22/06/23	mar 27/06/23	5 d	$ 193.499	100,00%	100,00%	$ 193.499
50	1.1.10.11.12	Atencion de las observaciones emitidas por el ID	mar 27/06/23	mié 28/06/23	2 d	$ 64.500	100,00%	100,00%	$ 64.500
51	*1.1.10.12*	*Fin del tramite ante Empresas de Servicios Publicos*	*mié 28/06/23*	*mié 28/06/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
52	**1.1.10.13**	**ELABORACION Y APROBACION DE PRESUPUESTO DE OBRA**	**mar 29/11/22**	**sáb 1/07/23**	**148 d**	**$ 11.653.907**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 11.653.907**
53	1.1.10.13.1	Elaboracion y entrega a la interventoria de presu	mar 29/11/22	mar 27/12/22	24 d	$ 582.695	100,00%	100,00%	$ 582.695
54	1.1.10.13.2	Elaboracion y entrega a la interventoria de presu	jue 8/06/23	sáb 17/06/23	8 d	$ 4.215.973	100,00%	100,00%	$ 4.215.973
55	1.1.10.13.3	Revision del presupuesto por parte de la interve	mar 20/06/23	vie 23/06/23	4 d	$ 2.742.096	100,00%	100,00%	$ 2.742.096
56	1.1.10.13.4	Atencion a observaciones y entrega de documer	sáb 24/06/23	mié 28/06/23	4 d	$ 2.742.096	100,00%	100,00%	$ 2.742.096
57	1.1.10.13.5	Revision por parte de la interventoria y aprobac	jue 29/06/23	sáb 1/07/23	3 d	$ 1.371.048	100,00%	100,00%	$ 1.371.048
58	*1.1.10.14*	*Fin Elabotacion y Aprobacion de presupuesto de obi*	*sáb 1/07/23*	*sáb 1/07/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*

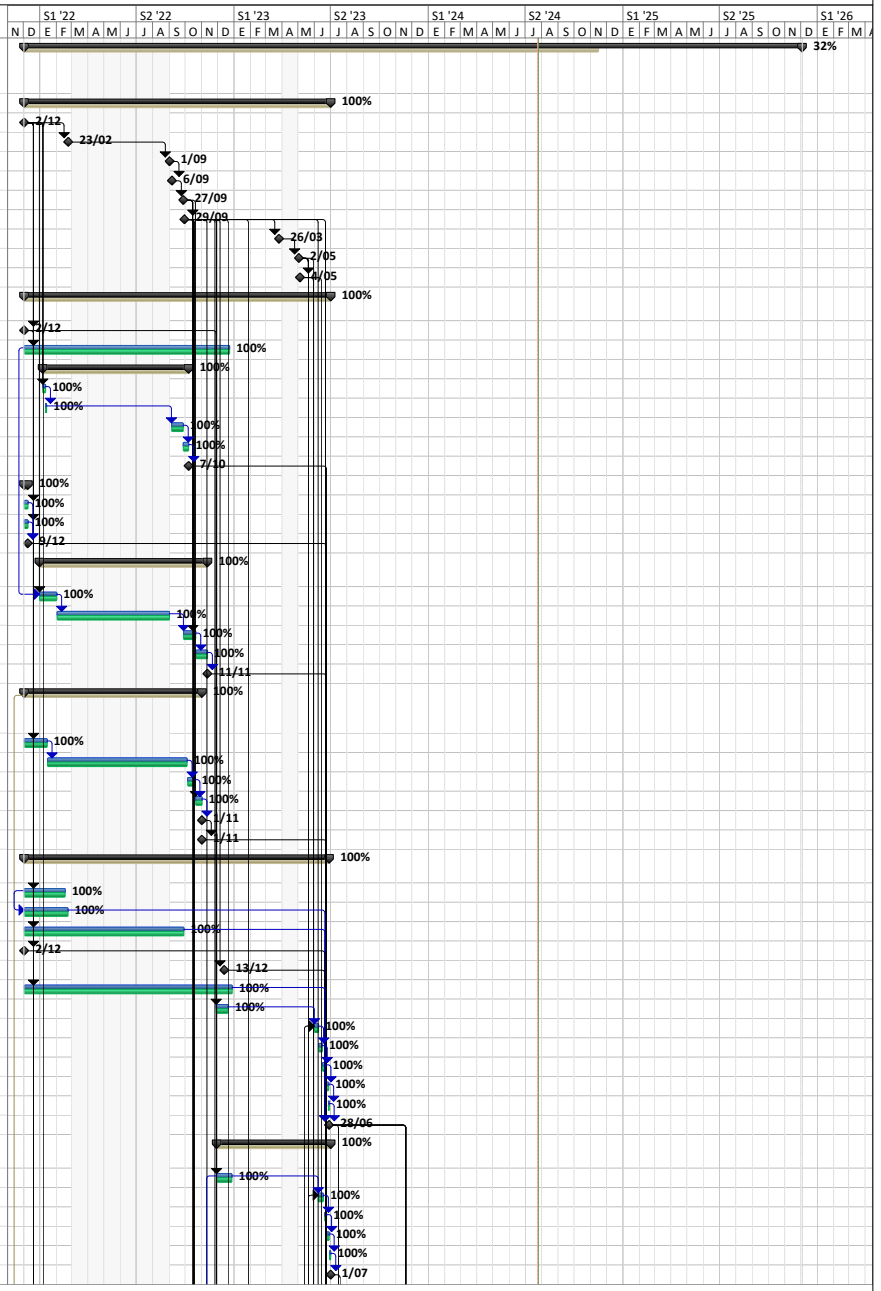

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños	Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
	División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
	Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
	Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
59	**1.1.10.15**	**ELABORACION Y APROBACION PDT DETALLADO ACTIVIDADES DE OBRA**	**jue 8/06/23**	**sáb 1/07/23**	**19 d**	**$ 8.349.682**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 8.349.682**
60	1.1.10.15.1	elaboracion y entrega a la interventoria pdt deta	jue 8/06/23	mié 14/06/23	5 d	$ 2.879.201	100,00%	100,00%	$ 2.879.201
61	1.1.10.15.2	revision del pdt por parte de la interventoria y g	jue 15/06/23	mié 21/06/23	5 d	$ 2.303.361	100,00%	100,00%	$ 2.303.361
62	1.1.10.15.3	atencion a observaciones y entrega de documer	jue 22/06/23	mar 27/06/23	5 d	$ 2.303.361	100,00%	100,00%	$ 2.303.361
63	1.1.10.15.4	revision por parte de la interventoria y aprobaci	mié 28/06/23	sáb 1/07/23	4 d	$ 863.760	100,00%	100,00%	$ 863.760
64	*1.1.10.16*	*fin Elaboracion y Aprobacion PDT detallado Activid*	*sáb 1/07/23*	*sáb 1/07/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
65	**1.1.10.17**	**ELABORACION Y APROBACION PAC DE ETAPA DE OBRA**	**mar 29/11/22**	**sáb 1/07/23**	**148 d**	**$ 4.226.484**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 4.226.484**
66	1.1.10.17.1	Elaboracion y entrega a la interventoria pac vers	mar 29/11/22	jue 29/12/22	26 d	$ 4.008.944	100,00%	100,00%	$ 4.008.944
67	1.1.10.17.2	Elaboracion y entrega a la interventoria pac vers	jue 22/06/23	lun 26/06/23	4 d	$ 145.026	100,00%	100,00%	$ 145.026
68	1.1.10.17.3	revision del pac por parte de la interventoria y g	mar 27/06/23	sáb 1/07/23	5 d	$ 72.513	100,00%	100,00%	$ 72.513
69	*1.1.10.18*	*Fin Elaboracion y aprobacion PAC de etapa de obra*	*sáb 1/07/23*	*sáb 1/07/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
70	1.1.10.19	RELACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO.	mar 29/11/22	jue 29/12/22	26 d	$ 2.330.782	100,00%	100,00%	$ 2.330.782
71	**1.1.11**	**COMPONENTES**	**jue 2/12/21**	**sáb 1/07/23**	**270,75 d**	**$ 411.302.525**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 411.302.525**
72	1.1.11.1	ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B)	jue 2/12/21	vie 3/12/21	1 d	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0
73	**1.1.11.2**	**SST, AMBIENTAL Y FORESTAL**	**jue 2/12/21**	**jue 29/12/22**	**148,75 d**	**$ 132.956.795**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 132.956.795**
74	**1.1.11.2.1**	**SST**	**jue 2/12/21**	**jue 29/12/22**	**148,75 d**	**$ 52.442.945**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 52.442.945**
75	1.1.11.2.1.1	Sistema de gestión y seguridad en el Trabajo /	jue 2/12/21	mié 9/11/22	106 d	$ 7.630.075	100,00%	100,00%	$ 7.630.075
76	1.1.11.2.1.2	Visita al Área de Intervención	vie 7/01/22	jue 29/09/22	45 d	$ 12.080.952	100,00%	100,00%	$ 12.080.952
77	1.1.11.2.1.3	Aprobación de Hojas de Vida-Etapa Preliminar	vie 30/09/22	mié 12/10/22	11 d	$ 2.861.278	100,00%	100,00%	$ 2.861.278
78	1.1.11.2.1.4	Presentación documentos de vinculación pers	vie 30/09/22	mar 11/10/22	10 d	$ 2.861.278	100,00%	100,00%	$ 2.861.278
79	1.1.11.2.1.5	Aprobación de Hojas de Vida-Etapa de Constr	mar 29/11/22	vie 16/12/22	15 d	$ 4.132.957	100,00%	100,00%	$ 4.132.957
80	1.1.11.2.1.6	Seguimiento para actividades de obra etapa p	mar 29/11/22	jue 29/12/22	26 d	$ 22.876.404	100,00%	100,00%	$ 22.876.404
81	*1.1.11.2.2*	*fin de Actividades SST*	*jue 29/12/22*	*jue 29/12/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
82	**1.1.11.2.3**	**AMBIENTAL**	**jue 2/12/21**	**jue 29/12/22**	**148,75 d**	**$ 48.550.442**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 48.550.442**
83	1.1.11.2.3.1	Cronograma detallado de actividades A&SST (	mié 5/10/22	sáb 5/11/22	27 d	$ 1.127.538	100,00%	100,00%	$ 1.127.538
84	1.1.11.2.3.2	Manejo Ambiental de Obra MAO (Actividades	vie 17/12/21	mié 28/12/22	135 d	$ 14.156.861	100,00%	100,00%	$ 14.156.861
85	1.1.11.2.3.3	Plan de gestión de RCD (Actividades desde su	vie 30/09/22	mar 25/10/22	21 d	$ 2.129.793	100,00%	100,00%	$ 2.129.793
86	1.1.11.2.3.4	Publicidad Exterior visual (revisión de registro	jue 2/12/21	mar 25/10/22	94 d	$ 10.022.556	100,00%	100,00%	$ 10.022.556
87	1.1.11.2.3.5	Elaboración documentos técnicos para el trán	vie 30/09/22	mar 25/10/22	21 d	$ 2.129.793	100,00%	100,00%	$ 2.129.793
88	1.1.11.2.3.6	Seguimiento para actividades de obra etapa p	mar 29/11/22	jue 29/12/22	26 d	$ 18.983.901	100,00%	100,00%	$ 18.983.901
89	*1.1.11.2.4*	*fin de Actividades Ambientales*	*jue 29/12/22*	*jue 29/12/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
90	**1.1.11.2.5**	**FORESTAL**	**jue 2/12/21**	**jue 29/12/22**	**148,75 d**	**$ 31.963.407**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 31.963.407**
91	1.1.11.2.5.1	Inventario forestal	jue 2/12/21	vie 14/10/22	86 d	$ 12.794.878	100,00%	100,00%	$ 12.794.878
92	1.1.11.2.5.2	Inventario y balance de zonas verdes	jue 2/12/21	vie 14/10/22	86 d	$ 12.794.878	100,00%	100,00%	$ 12.794.878
93	1.1.11.2.5.3	Actividades silviculturales frentes iniciales	sáb 26/11/22	jue 29/12/22	28 d	$ 3.976.786	100,00%	100,00%	$ 3.976.786
94	1.1.11.2.5.4	Seguimiento para actividades de obra etapa p	mar 29/11/22	jue 29/12/22	26 d	$ 2.396.866	100,00%	100,00%	$ 2.396.866
95	*1.1.11.2.6*	*fin de Actividades Forestales*	*jue 29/12/22*	*jue 29/12/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
96	*1.1.11.3*	*Fin actividades Ambientales y SST*	*jue 29/12/22*	*jue 29/12/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
97	**1.1.11.4**	**DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (C)**	**jue 2/12/21**	**jue 23/02/23**	**195,75 d**	**$ 191.820.410**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 191.820.410**
98	1.1.11.4.1	Directorio de Actores	jue 2/12/21	mié 2/02/22	49 d	$ 20.518.104	100,00%	100,00%	$ 20.518.104
99	1.1.11.4.2	Inventario de Predios, metodología y Cronogram	jue 2/12/21	vie 14/10/22	86 d	$ 20.518.104	100,00%	100,00%	$ 20.518.104
100	1.1.11.4.3	Recorrido con el Área Técnica	jue 2/12/21	mié 28/09/22	72 d	$ 29.584.242	100,00%	100,00%	$ 29.584.242
101	1.1.11.4.4	Inventario de Rampas y Accesos a Garajes	jue 2/12/21	mié 28/09/22	72 d	$ 29.584.242	100,00%	100,00%	$ 29.584.242
102	1.1.11.4.5	Inventario de Vías a Utilizar	jue 2/12/21	mar 25/10/22	94 d	$ 38.173.216	100,00%	100,00%	$ 38.173.216
103	1.1.11.4.6	Estado Actual de Vías a Utilizar Según PMT	jue 2/12/21	mar 25/10/22	94 d	$ 38.173.216	100,00%	100,00%	$ 38.173.216
104	1.1.11.4.7	Elaboracion Actas de Vecindad	mié 21/12/22	lun 30/01/23	34 d	$ 8.456.428	100,00%	100,00%	$ 8.456.428
105	1.1.11.4.8	Revision por parte de interventoria a las actas de	mar 31/01/23	jue 9/02/23	9 d	$ 2.041.207	100,00%	100,00%	$ 2.041.207
106	1.1.11.4.9	Informe de antecedentes (incluye revision docur	vie 11/11/22	sáb 10/12/22	25 d	$ 2.385.826	100,00%	100,00%	$ 2.385.826
107	1.1.11.4.10	Inicio Informe de Preliminares - Diálogo Ciudada	vie 10/02/23	jue 23/02/23	12 d	$ 2.385.826	100,00%	100,00%	$ 2.385.826
108	*1.1.11.5*	*Fin de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégi*	*jue 23/02/23*	*jue 23/02/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
109	**1.1.11.6**	**Plan de Manejo de Trafico PMT (D)**	**jue 2/12/21**	**sáb 1/07/23**	**270,75 d**	**$ 86.525.320**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 86.525.320**
110	**1.1.11.6.1**	**ETAPA 1**	**jue 2/12/21**	**jue 27/10/22**	**96,75 d**	**$ 48.436.029**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 48.436.029**
111	1.1.11.6.1.1	Presentación de Plan de Manejo de Trafico (F	jue 2/12/21	mar 25/01/22	42 d	$ 25.428.915	100,00%	100,00%	$ 25.428.915
112	1.1.11.6.1.2	Validación de Documento (Etapa 1) por Parte	mié 2/02/22	vie 4/02/22	2 d	$ 1.816.351	100,00%	100,00%	$ 1.816.351
113	1.1.11.6.1.3	Revisión y Ajustes Necesarios por Observacior	sáb 5/02/22	vie 11/02/22	5 d	$ 3.027.252	100,00%	100,00%	$ 3.027.252
114	1.1.11.6.1.4	Presentacion y Revisión de documento (Etapa	vie 11/02/22	lun 21/02/22	8 d	$ 3.632.702	100,00%	100,00%	$ 3.632.702
115	1.1.11.6.1.5	Revisión y Ajustes Necesarios por Observacior	lun 21/02/22	mié 28/09/22	7 d	$ 3.632.702	100,00%	100,00%	$ 3.632.702
116	*1.1.11.6.1.6*	*Aprobación de PMT (Etapa 1) por SDM*	*mié 28/09/22*	*mié 28/09/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
117	1.1.11.6.1.7	Presentación actualización de Plan de Manejo	sáb 1/10/22	mar 11/10/22	9 d	$ 4.238.153	100,00%	100,00%	$ 4.238.153
118	1.1.11.6.1.8	Validación de actualización Documento (PDA)	mié 12/10/22	mié 12/10/22	1 d	$ 605.450	100,00%	100,00%	$ 605.450
119	1.1.11.6.1.9	Revisión y Ajustes Necesarios por Observacior	jue 13/10/22	sáb 15/10/22	3 d	$ 1.816.351	100,00%	100,00%	$ 1.816.351
120	1.1.11.6.1.1(	Presentacion y Revisión de documento (Etapa	mar 18/10/22	sáb 22/10/22	5 d	$ 2.421.802	100,00%	100,00%	$ 2.421.802
121	1.1.11.6.1.1:	Revisión y Ajustes Necesarios por Observacior	lun 24/10/22	jue 27/10/22	4 d	$ 1.816.351	100,00%	100,00%	$ 1.816.351

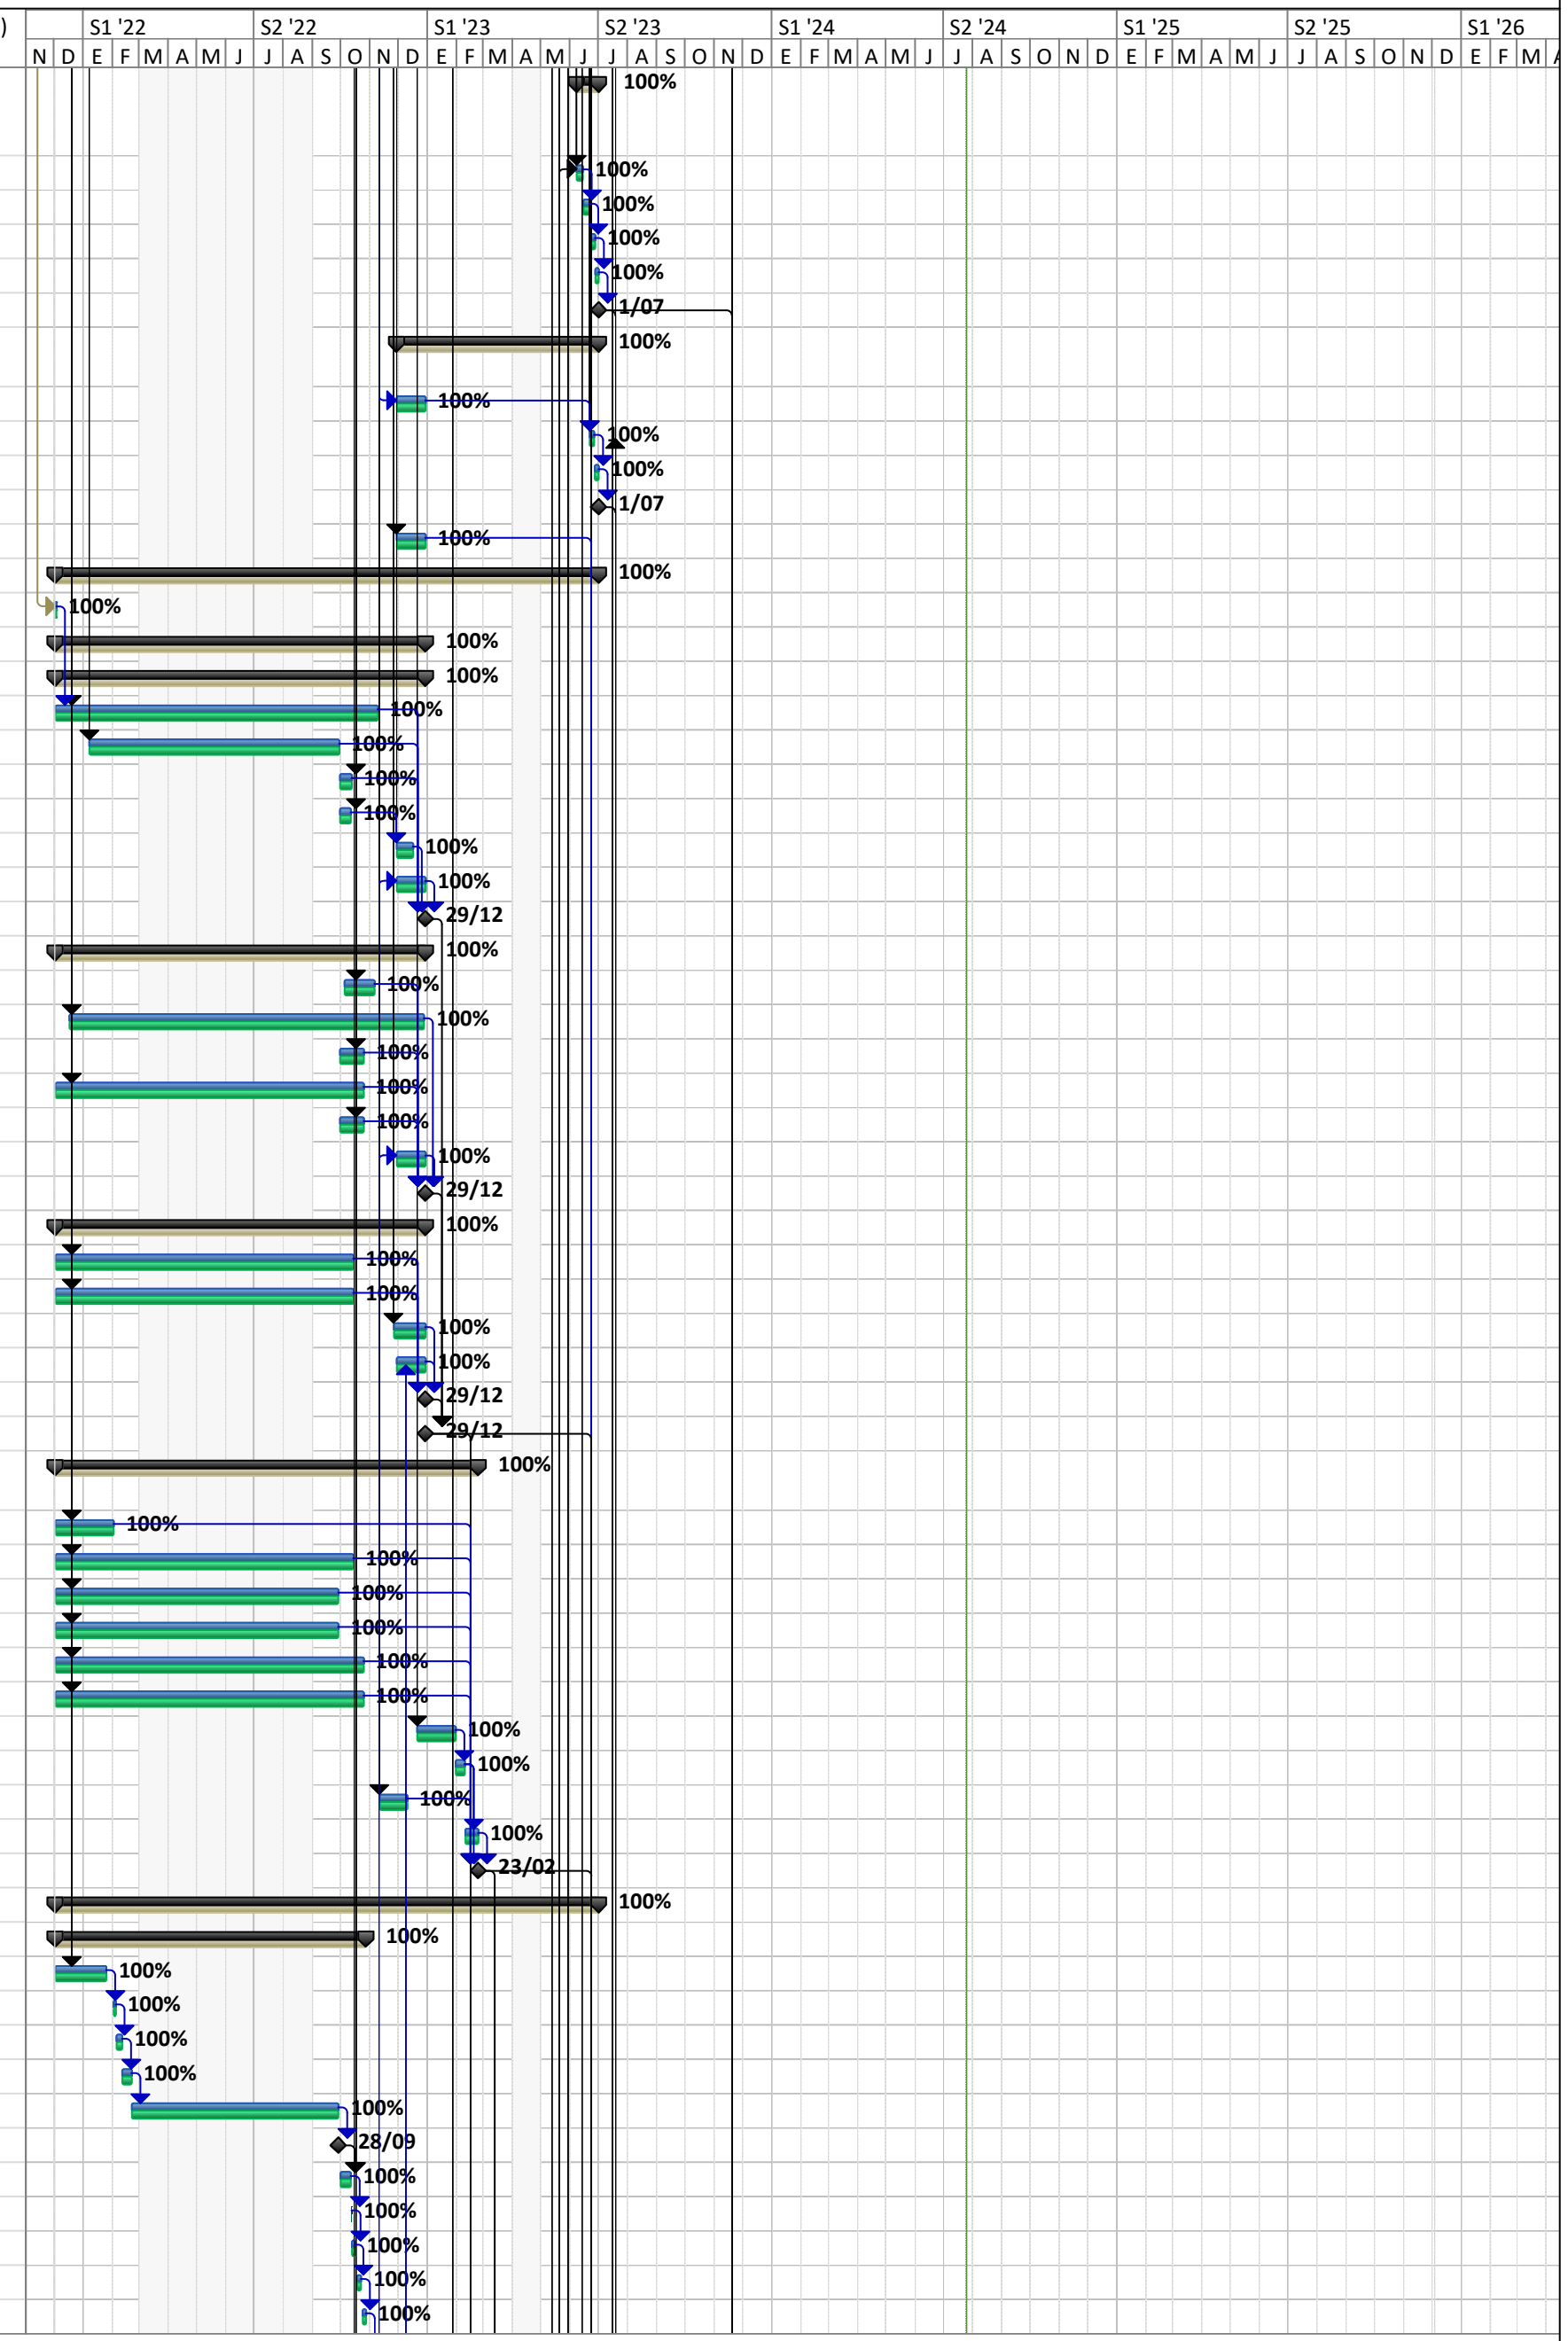


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
122	*1.1.11.6.1.12*	*Aprobación de actualizacion de PMT (PDA) po*	*jue 27/10/22*	*jue 27/10/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
123	*1.1.11.6.2*	*Fin de PMT Etapa 1*	*jue 27/10/22*	*jue 27/10/22*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
124	**1.1.11.6.3**	**PMT Autopista Norte**	**mié 28/09/22**	**sáb 1/07/23**	**199 d**	**$ 26.320.382**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 26.320.382**
125	1.1.11.6.3.1	Presentación a la interventoria de propuesta d	mié 28/09/22	vie 7/10/22	9 d	$ 4.843.603	100,00%	100,00%	$ 4.843.603
126	1.1.11.6.3.2	Validación de Propuesta (Autopista Norte) por	sáb 8/10/22	mar 11/10/22	3 d	$ 1.210.901	100,00%	100,00%	$ 1.210.901
127	1.1.11.6.3.3	Revisión y Ajustes Necesarios por Observacior	mié 12/10/22	sáb 15/10/22	4 d	$ 2.421.802	100,00%	100,00%	$ 2.421.802
128	1.1.11.6.3.4	Presentacion y Revisión de propuesta (Autopis	mar 18/10/22	mié 19/10/22	2 d	$ 605.450	100,00%	100,00%	$ 605.450
129	1.1.11.6.3.5	Radicacion y aprobacion de la SDM a la metoc	mié 28/12/22	jue 19/01/23	19 d	$ 4.621.087	100,00%	100,00%	$ 4.621.087
130	1.1.11.6.3.6	Toma de informacion y presentacion de la line	vie 20/01/23	jue 23/02/23	30 d	$ 3.648.227	100,00%	100,00%	$ 3.648.227
131	1.1.11.6.3.7	Toma de informacion y presentacion de la line	mié 3/05/23	sáb 3/06/23	27 d	$ 3.648.227	100,00%	100,00%	$ 3.648.227
132	1.1.11.6.3.8	Revision interventoria a linea base	lun 5/06/23	mié 7/06/23	3 d	$ 1.216.076	100,00%	100,00%	$ 1.216.076
133	1.1.11.6.3.9	Atencion observaciones interventoria a linea b	jue 8/06/23	sáb 10/06/23	3 d	$ 1.216.076	100,00%	100,00%	$ 1.216.076
134	1.1.11.6.3.10	Presentacion de linea base ante (SDM)	mar 13/06/23	mar 13/06/23	1 d	$ 1.216.076	100,00%	100,00%	$ 1.216.076
135	1.1.11.6.3.11	Atención de observaciones de la SDM a line ba	mié 14/06/23	vie 23/06/23	8 d	$ 500.000	100,00%	100,00%	$ 500.000
136	1.1.11.6.3.12	Aprobación de la linea base por la SDM	sáb 24/06/23	sáb 24/06/23	1 d	$ 200.000	100,00%	100,00%	$ 200.000
137	1.1.11.6.3.13	Elaboracion de Plan de Manejo de Trafico (Au	lun 26/06/23	sáb 1/07/23	6 d	$ 972.860	100,00%	100,00%	$ 972.860
138	*1.1.11.6.4*	*Fin de Linea Base PMT Autopista Norte*	*sáb 1/07/23*	*sáb 1/07/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
139	1.1.11.6.5	Seguimiento para actividades de obra etapa prel	mar 29/11/22	jue 29/12/22	26 d	$ 11.768.908	100,00%	100,00%	$ 11.768.908
140	*1.1.11.7*	*Fin de Plan de Manejo de Tráfico PMT's Preliminare*	*sáb 1/07/23*	*sáb 1/07/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
141	*1.1.11.8*	*Fin de Componentes*	*jue 23/02/23*	*jue 23/02/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
142	**1.1.12**	**PDA**	**jue 29/09/22**	**mar 7/03/23**	**133 d**	**$ 407.988.906**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 407.988.906**
143	**1.1.12.1**	**NP's y Presupuesto para PDA**	**jue 29/09/22**	**mar 29/11/22**	**51 d**	**$ 49.086.258**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 49.086.258**
144	1.1.12.1.1	Presentacion de propuesta PDA (metodologia, ca	jue 29/09/22	mié 5/10/22	6 d	$ 8.463.148	100,00%	100,00%	$ 8.463.148
145	1.1.12.1.2	Revision de interventoria a la propuesta PDA (me	jue 6/10/22	mar 11/10/22	5 d	$ 6.770.518	100,00%	100,00%	$ 6.770.518
146	1.1.12.1.3	Presentación de documentación para inicio de ac	mié 5/10/22	vie 7/10/22	3 d	$ 5.077.889	100,00%	100,00%	$ 5.077.889
147	1.1.12.1.4	Revision por parte de la interventoría a la Presen	sáb 8/10/22	vie 14/10/22	6 d	$ 8.463.148	100,00%	100,00%	$ 8.463.148
148	1.1.12.1.5	Atencion de observaciones emitidas por la interv	sáb 15/10/22	sáb 15/10/22	1 d	$ 1.692.630	100,00%	100,00%	$ 1.692.630
149	1.1.12.1.6	Revision por parte del IDU a la Presentación de d	mar 18/10/22	mar 25/10/22	7 d	$ 8.463.148	100,00%	100,00%	$ 8.463.148
150	1.1.12.1.7	Atencion de observaciones emitidas por el IDU a	mié 26/10/22	mié 26/10/22	1 d	$ 1.692.630	100,00%	100,00%	$ 1.692.630
151	1.1.12.1.8	Modificacion contractual (NP's)	jue 27/10/22	mar 29/11/22	28 d	$ 8.463.148	100,00%	100,00%	$ 8.463.148
152	**1.1.12.2**	**Pilotaje**	**mar 29/11/22**	**mar 29/11/22**	**1 d**	**$ 284.949.139**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 284.949.139**
153	1.1.12.2.1	Armado de Acero	mar 29/11/22	mar 29/11/22	1 d	$ 23.886.413	100,00%	100,00%	$ 23.886.413
154	1.1.12.2.2	Excavación, plataforma de pilotaje y fundida de l	mar 29/11/22	mar 29/11/22	1 d	$ 261.062.726	100,00%	100,00%	$ 261.062.726
155	**1.1.12.3**	**Alistamiento para PDA**	**mié 30/11/22**	**sáb 10/12/22**	**9 d**	**$ 7.539.566**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 7.539.566**
156	1.1.12.3.1	Descabece de Pilotes	mié 30/11/22	jue 1/12/22	2 d	$ 120.866	100,00%	100,00%	$ 120.866
157	1.1.12.3.2	Armado de Acero Recrecido	vie 2/12/22	sáb 3/12/22	2 d	$ 1.218.525	100,00%	100,00%	$ 1.218.525
158	1.1.12.3.3	Realce de Pilotes (Vaciado de Concreto)	mar 6/12/22	mié 7/12/22	1 d	$ 5.200.175	100,00%	100,00%	$ 5.200.175
159	1.1.12.3.4	Resistencia del realce concreto de 5000 PSI	mar 6/12/22	sáb 10/12/22	4 d	$ 1.000.000	100,00%	100,00%	$ 1.000.000
160	**1.1.12.4**	**Prueba PDA**	**mar 29/11/22**	**mar 7/03/23**	**83 d**	**$ 66.413.943**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 66.413.943**
161	1.1.12.4.1	Disipacion de Poros	mar 29/11/22	mar 13/12/22	12 d	$ 1.500.000	100,00%	100,00%	$ 1.500.000
162	1.1.12.4.2	PDA	mar 13/12/22	sáb 17/12/22	5 d	$ 53.472.860	100,00%	100,00%	$ 53.472.860
163	1.1.12.4.3	Procesamiento de Información PDA por laborato	lun 19/12/22	jue 29/12/22	10 d	$ 11.441.083	100,00%	100,00%	$ 11.441.083
164	1.1.12.4.4	Revision de los resultados de la PDA por parte de	vie 20/01/23	sáb 4/03/23	38 d	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0
165	1.1.12.4.5	Entrega al IDU de los resultados de la PDA	lun 6/03/23	mar 7/03/23	2 d	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0
166	*1.1.13*	*fin Actividades de la PDA*	*mar 7/03/23*	*mar 7/03/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
167	**1.1.14**	**CORRECCION YERROS TECNICOS**	**mié 3/05/23**	**sáb 1/07/23**	**49 d**	**$ 182.303.321**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 182.303.321**
168	1.1.14.1	Configuración Yerro Tecnico por parte del IDU	mié 3/05/23	mié 3/05/23	1 d	$ 2.071.629	100,00%	100,00%	$ 2.071.629
169	**1.1.14.2**	**Geotecnia**	**jue 4/05/23**	**mié 21/06/23**	**39 d**	**$ 80.793.531**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 80.793.531**
170	1.1.14.2.1	Entrega producto geotecnico	jue 4/05/23	vie 2/06/23	25 d	$ 51.790.725	100,00%	100,00%	$ 51.790.725
171	1.1.14.2.2	Revisión parte de interventoria del producto geo	sáb 3/06/23	jue 8/06/23	5 d	$ 10.358.145	100,00%	100,00%	$ 10.358.145
172	1.1.14.2.3	Atención de observaciones del producto geotecn	vie 9/06/23	vie 16/06/23	6 d	$ 12.429.774	100,00%	100,00%	$ 12.429.774
173	1.1.14.2.4	Aprobacion por parte de interventoria del produ	sáb 17/06/23	mié 21/06/23	3 d	$ 6.214.887	100,00%	100,00%	$ 6.214.887
174	*1.1.14.3*	*Fin producto geotecnico*	*mié 21/06/23*	*mié 21/06/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
175	**1.1.14.4**	**Estructuras**	**jue 4/05/23**	**sáb 1/07/23**	**48 d**	**$ 99.438.161**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 99.438.161**
176	**1.1.14.4.1**	**Cimentación**	**jue 4/05/23**	**sáb 1/07/23**	**48 d**	**$ 99.438.161**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 99.438.161**
177	1.1.14.4.1.1	Primer avance	jue 4/05/23	vie 23/06/23	41 d	$ 84.936.789	100,00%	100,00%	$ 84.936.789
178	1.1.14.4.1.2	Revisión parte de interventoria del producto e	sáb 24/06/23	mar 27/06/23	3 d	$ 6.214.887	100,00%	100,00%	$ 6.214.887
179	1.1.14.4.1.3	Atención de observaciones del producto estru	mié 28/06/23	jue 29/06/23	2 d	$ 4.143.258	100,00%	100,00%	$ 4.143.258
180	1.1.14.4.1.4	Aprobacion por parte de interventoria del pro	vie 30/06/23	sáb 1/07/23	2 d	$ 4.143.227	100,00%	100,00%	$ 4.143.227
181	*1.1.14.4.2*	*Fin Cimentación*	*sáb 1/07/23*	*sáb 1/07/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
182	*1.1.14.5*	*Fin producto estructural*	*sáb 1/07/23*	*sáb 1/07/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
183	*1.1.15*	*Finalización corrección yerro tecnico*	*sáb 1/07/23*	*sáb 1/07/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
184	*1.1.16*	*Fin de Fase de Preliminares con traslapo*	*sáb 1/07/23*	*sáb 1/07/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
185	1.1.17	Inicio Informe de Preliminares	lun 19/12/22	lun 2/01/23	12 d	$ 2.961.870	100,00%	100,00%	$ 2.961.870
186	***1.2***	***fin de Preliminares***	***jue 29/12/22***	***jue 29/12/22***	***0 d***	***$ 0***	***0,00%***	***0,00%***	***$ 0***
187	**1.3**	**FASE DE EJECUCIÓN**	**vie 30/12/22**	**mié 3/12/25**	**841,75 d**	**$ 51.688.574,5...**	**25,89%**	**25,89%**	**$ 13.383.060.244**

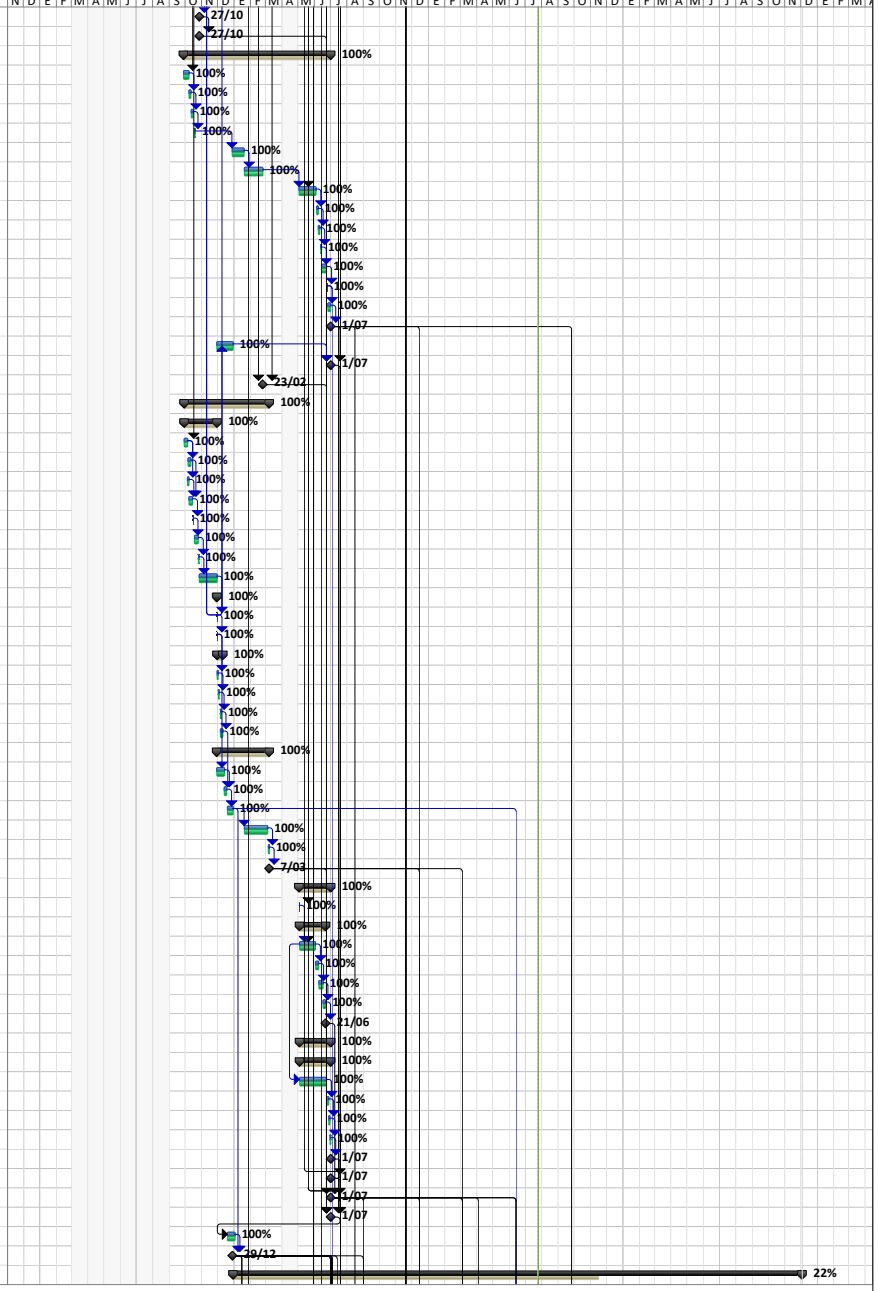

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
188	**1.3.1**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**	**lun 26/06/23**	**mié 13/12/23**	**139 d**	**$ 45.944.259**	**100,00%**	**99,90%**	**$ 45.944.259**
189	**1.3.1.1**	**ACTAS DE COMPETENCIAS**	**lun 20/11/23**	**mié 13/12/23**	**20 d**	**$ 374.098**	**100,00%**	**87,50%**	**$ 374.098**
190	1.3.1.1.1	Ajuste de actas de competencia ENEL (Modificaciones avaladas por las ESP)	lun 20/11/23	jue 30/11/23	10 d	$ 46.762	100,00%	100,00%	$ 46.762
191	1.3.1.1.2	Revision de actas de actas de competencia por parte de interventoria ENEL (Modificaciones avaladas por las ESP)	vie 1/12/23	mié 6/12/23	5 d	$ 23.381	100,00%	100,00%	$ 23.381
192	1.3.1.1.3	Atencion de observaciones emitidas por interventoria a las actas de competencias ENEL	jue 7/12/23	mié 13/12/23	5 d	$ 23.381	100,00%	100,00%	$ 23.381
193	*1.3.1.1.4*	*Revisión, aval y firma IDU y ENEL*	*mié 13/12/23*	*mié 13/12/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
194	1.3.1.1.5	Ajuste de actas de competencia ETB (Modificaciones avaladas por las ESP)	lun 20/11/23	jue 30/11/23	10 d	$ 46.762	100,00%	100,00%	$ 46.762
195	1.3.1.1.6	Revision de actas de actas de competencia por parte de interventoria ETB (Modificaciones avaladas por las ESP)	vie 1/12/23	mié 6/12/23	5 d	$ 23.381	100,00%	100,00%	$ 23.381
196	1.3.1.1.7	Atencion de observaciones emitidas por interventoria a las actas de competencias ETB	jue 7/12/23	mié 13/12/23	5 d	$ 23.381	100,00%	100,00%	$ 23.381
197	*1.3.1.1.8*	*Revisión, aval y firma IDU y ETB*	*mié 13/12/23*	*mié 13/12/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
198	1.3.1.1.9	Ajuste de actas de competencia VANTI (Modificaciones avaladas por las ESP)	lun 20/11/23	jue 30/11/23	10 d	$ 46.762	100,00%	100,00%	$ 46.762
199	1.3.1.1.10	Revision de actas de actas de competencia por parte de interventoria VANTI (Modificaciones avaladas por las ESP)	vie 1/12/23	mié 6/12/23	5 d	$ 23.381	100,00%	100,00%	$ 23.381
200	1.3.1.1.11	Atencion de observaciones emitidas por interventoria a las actas de competencias VANTI	jue 7/12/23	mié 13/12/23	5 d	$ 23.381	100,00%	100,00%	$ 23.381
201	*1.3.1.1.12*	*Revisión, aval y firma IDU y VANTI*	*mié 13/12/23*	*mié 13/12/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
202	1.3.1.1.13	Ajuste de actas de competencia EAAB (Modificaciones avaladas por las ESP)	lun 20/11/23	jue 30/11/23	10 d	$ 46.762	100,00%	100,00%	$ 46.762
203	1.3.1.1.14	Revision de actas de actas de competencia por parte de interventoria EAAB (Modificaciones avaladas por las ESP)	vie 1/12/23	mié 6/12/23	5 d	$ 23.381	100,00%	0,00%	$ 23.381
204	1.3.1.1.15	Atencion de observaciones emitidas por interventoria a las actas de competencias EAAB	jue 7/12/23	mié 13/12/23	5 d	$ 23.381	100,00%	0,00%	$ 23.381
205	*1.3.1.1.16*	*Revisión, aval y firma IDU y EAAB*	*mié 13/12/23*	*mié 13/12/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
206	*1.3.1.2*	*Fin actas de competencias*	*mié 13/12/23*	*mié 13/12/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
207	**1.3.1.3**	**PDT V8**	**lun 20/11/23**	**mar 28/11/23**	**8 d**	**$ 1.439.600**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 1.439.600**
208	1.3.1.3.1	Atencion a observaciones y entrega de documento a la interventoria V8	lun 20/11/23	vie 24/11/23	5 d	$ 899.750	100,00%	100,00%	$ 899.750
209	1.3.1.3.2	Revision por parte de la interventoria y aprobacion del pdt final	sáb 25/11/23	mar 28/11/23	3 d	$ 539.850	100,00%	100,00%	$ 539.850
210	*1.3.1.4*	*Fin PDT V8*	*mar 28/11/23*	*mar 28/11/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
211	**1.3.1.5**	**PAC PDT V8**	**mié 29/11/23**	**lun 11/12/23**	**10 d**	**$ 435.079**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 435.079**
212	1.3.1.5.1	Elaboracion y entrega a la interventoria pac	mié 29/11/23	sáb 2/12/23	4 d	$ 174.032	100,00%	100,00%	$ 174.032
213	1.3.1.5.2	revision del pac por parte de la interventoria y generacion de observaciones y comentarios	lun 4/12/23	mar 5/12/23	2 d	$ 87.016	100,00%	100,00%	$ 87.016
214	1.3.1.5.3	atencion a observaciones y entrega de documento a la interventoria	mié 6/12/23	jue 7/12/23	2 d	$ 87.016	100,00%	100,00%	$ 87.016
215	1.3.1.5.4	revision por parte de la interventoria y aprobacion del pac	sáb 9/12/23	lun 11/12/23	2 d	$ 87.016	100,00%	100,00%	$ 87.016
216	*1.3.1.6*	*Fin PAC PDT V8*	*lun 11/12/23*	*lun 11/12/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
217	**1.3.1.7**	**PMT Autopista Norte**	**lun 26/06/23**	**mié 16/08/23**	**41,13 d**	**$ 11.217.540**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 11.217.540**
218	1.3.1.7.1	Elaboracion de Plan de Manejo de Trafico (Autopista Norte)	lun 26/06/23	jue 13/07/23	15 d	$ 3.891.442	100,00%	100,00%	$ 3.891.442
219	1.3.1.7.2	Validación del Plan de Manejo de Trafico (Autopista Norte) por Parte de la Interventoria	vie 14/07/23	mié 19/07/23	5 d	$ 1.202.506	100,00%	100,00%	$ 1.202.506
220	1.3.1.7.3	Revisión y Ajustes Necesarios por Observaciones al documento de parte de Interventoría (Autopista Norte)	vie 21/07/23	vie 28/07/23	7 d	$ 1.502.506	100,00%	100,00%	$ 1.502.506
221	1.3.1.7.4	Presentacion y Revisión de documento (Autopista Norte) a Secretaria de Movilidad	sáb 29/07/23	jue 3/08/23	5 d	$ 1.702.506	100,00%	100,00%	$ 1.702.506
222	1.3.1.7.5	Revisión y Ajustes Necesarios por Observaciones de parte de Secretaría de Movilidad (SDM) (Autopista Norte)	vie 4/08/23	sáb 12/08/23	7 d	$ 2.432.151	100,00%	100,00%	$ 2.432.151
223	1.3.1.7.6	Aprobación de PMT (Autopista Norte) por SDM	mar 15/08/23	mié 16/08/23	1 d	$ 486.430	100,00%	100,00%	$ 486.430
224	*1.3.1.8*	*Fin PMT Autopista Norte*	*mié 16/08/23*	*mié 16/08/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
225	**1.3.1.9**	**PANTALLA DE PROTECCIÓN RED MATRIZ**	**mar 4/07/23**	**mar 22/08/23**	**40 d**	**$ 32.477.941**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 32.477.941**
226	1.3.1.9.1	Ajuste de la pantalla de proteccion a la red matriz	mar 4/07/23	sáb 29/07/23	22 d	$ 9.552.336	100,00%	100,00%	$ 9.552.336
227	1.3.1.9.2	Revision por parte de interventoria al ajuste de la pantalla de proteccion a la red matriz	lun 31/07/23	vie 4/08/23	5 d	$ 2.388.084	100,00%	100,00%	$ 2.388.084
228	1.3.1.9.3	Atencion de observaciones emitidas por la interventoria al ajuste de la pantalla de proteccion a la red matriz	sáb 5/08/23	mar 8/08/23	2 d	$ 6.209.018	100,00%	100,00%	$ 6.209.018

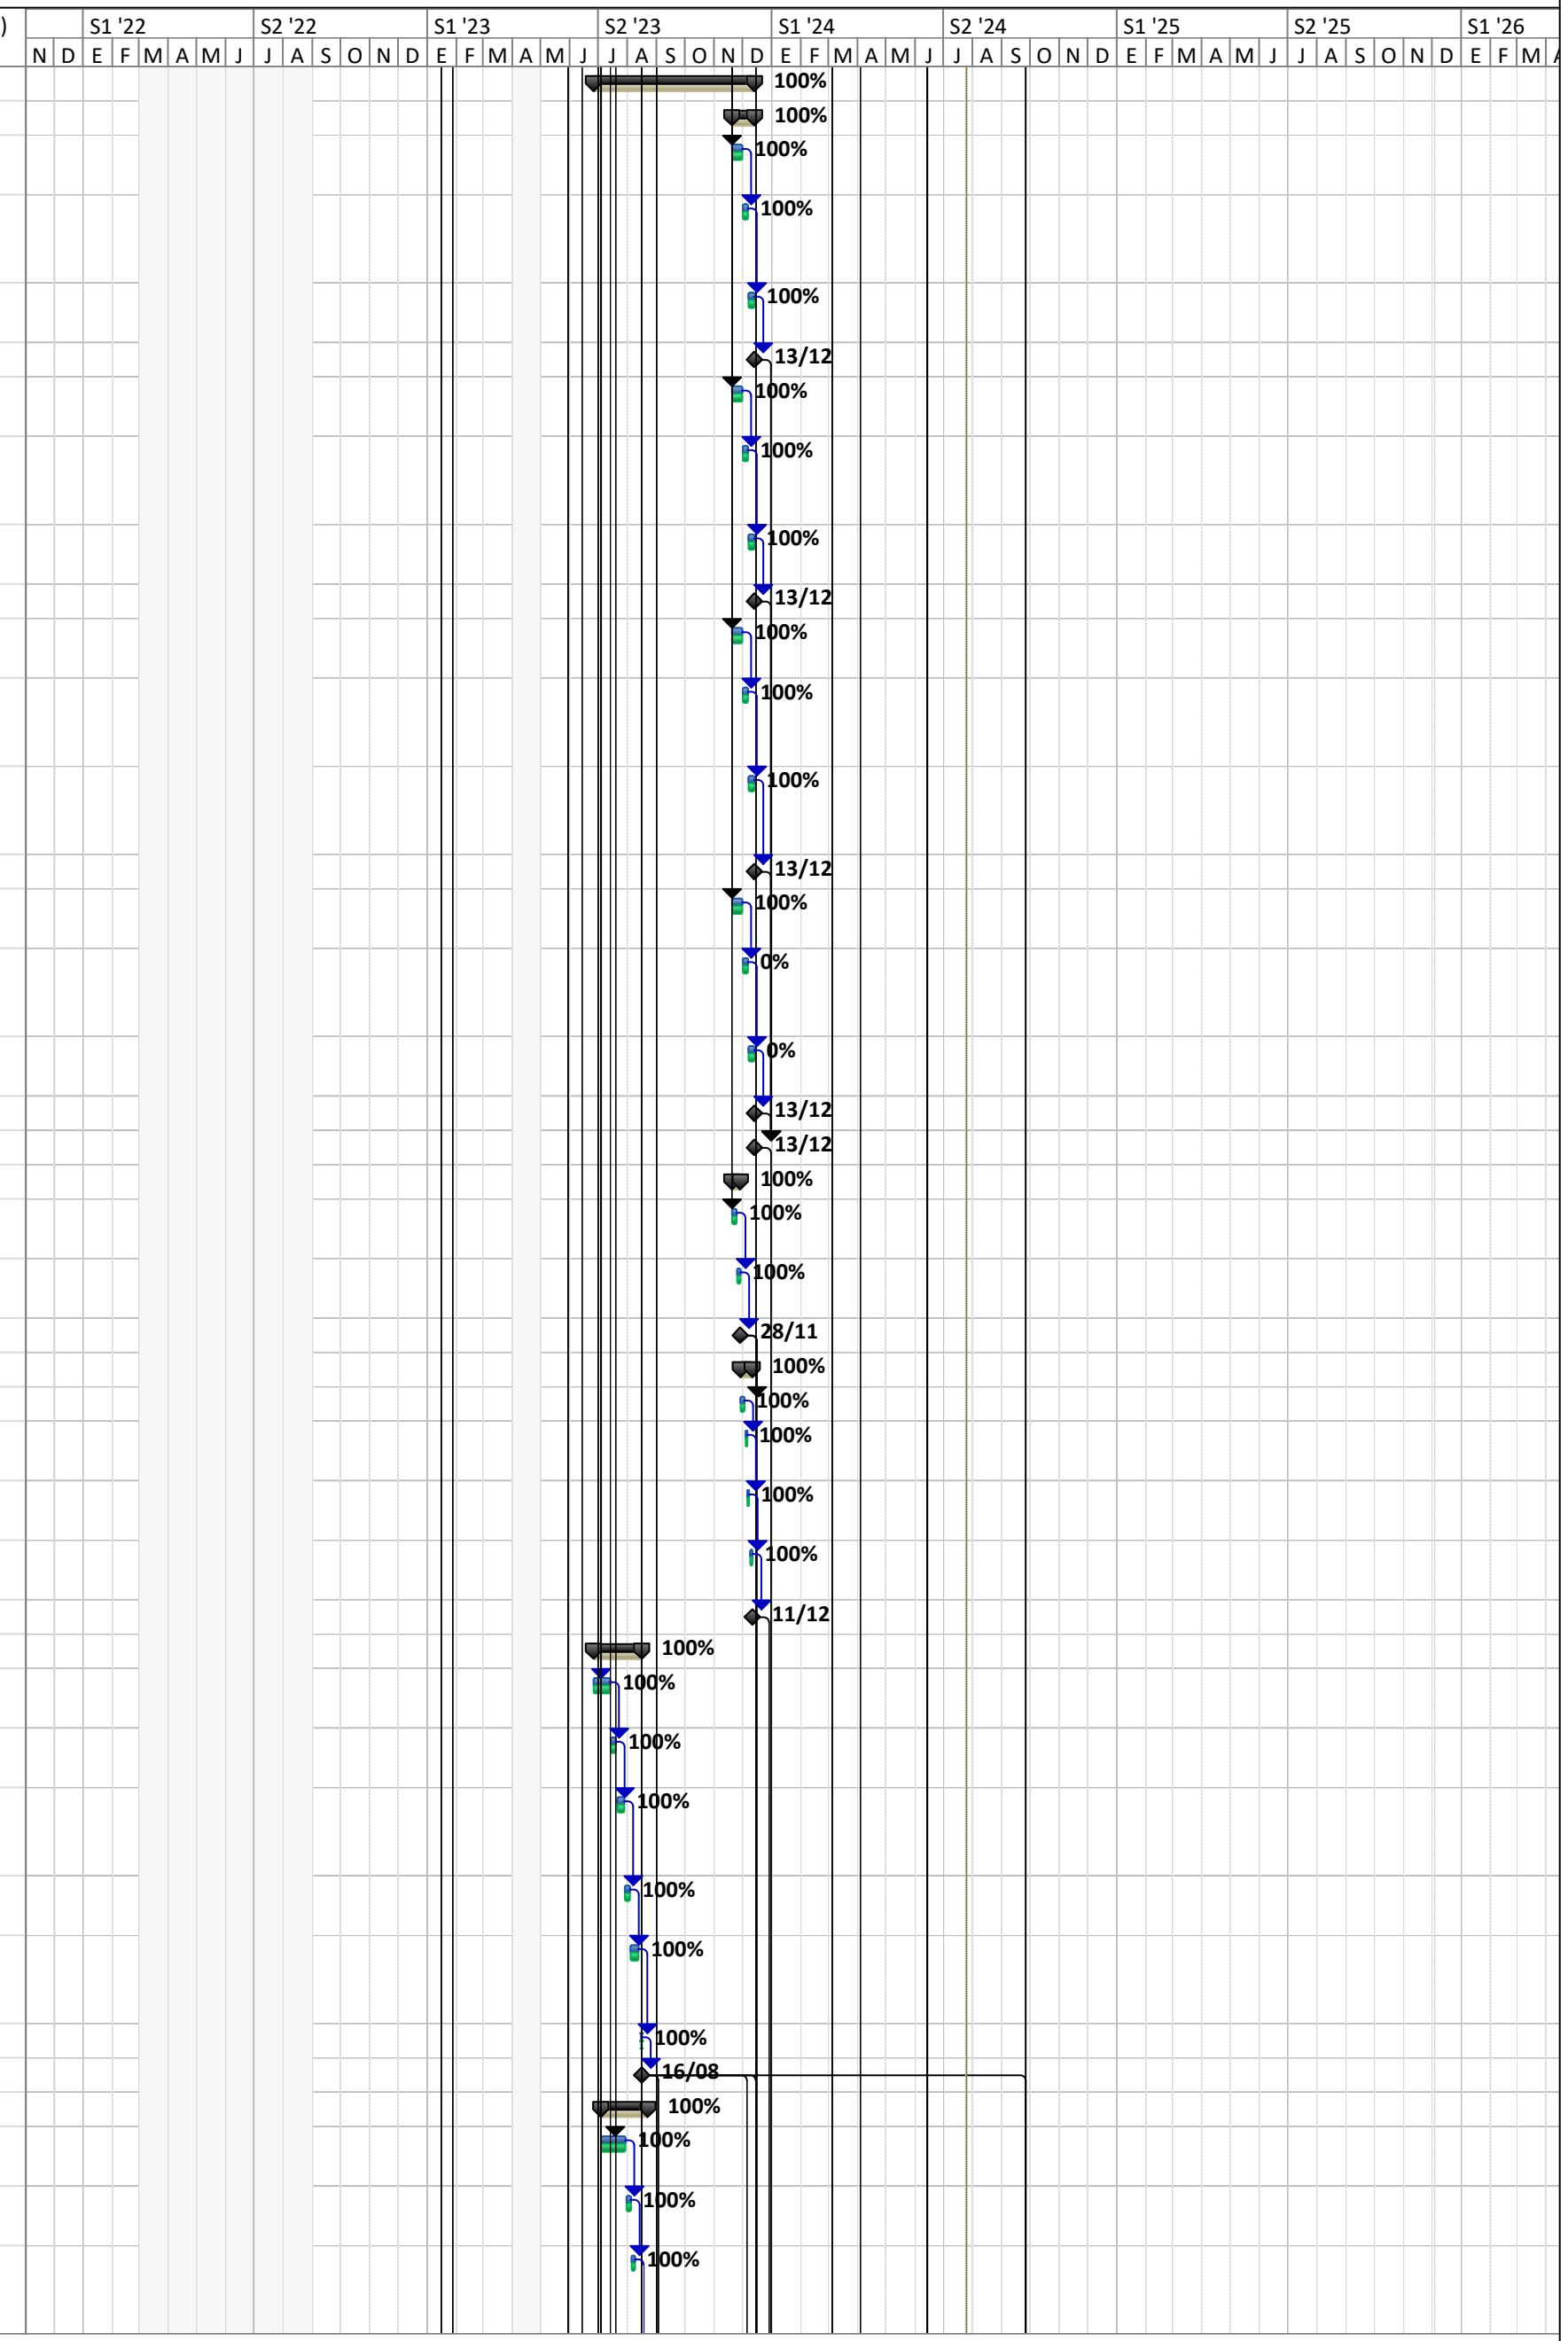

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
229	1.3.1.9.4	No objeción EAAB del ajuste de la pantalla de proteccion a la red matriz	mié 9/08/23	mar 22/08/23	11 d	$ 14.328.503	100,00%	100,00%	$ 14.328.503
230	*1.3.1.10*	*Fin ajuste a la pantalla de protección red matriz*	*mar 22/08/23*	*mar 22/08/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
231	*1.3.1.11*	*Fin actividades complementarias*	*mié 13/12/23*	*mié 13/12/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
232	1.3.2	Avales a terceros	vie 14/06/24	sáb 15/06/24	2 d	$ 43.562.560	100,00%	100,00%	$ 43.562.560
233	1.3.3	Avales a terceros 2	mié 31/07/24	sáb 15/02/25	156 d	$ 440.026	0,00%	0,00%	$ 0
234	**1.3.4**	**ACTIVIDADES DE OBRA (A) Y ACTIVIDADES DE ACERO (F)**	**vie 30/12/22**	**mié 3/12/25**	**841,75 d**	**$ 46.493.875.697**	**25,63%**	**25,63%**	**$ 11.914.987.424**
235	1.3.4.1	Replanteo General	vie 30/12/22	vie 27/01/23	24 d	$ 20.043.999	100,00%	100,00%	$ 20.043.999
236	1.3.4.2	Intervención Silvicultural Etapa Inicial	vie 30/12/22	vie 27/01/23	24 d	$ 3.445.261	100,00%	100,00%	$ 3.445.261
237	1.3.4.3	Intervención Silvicultural Etapa Inicial (Reinicio)	mar 30/05/23	jue 29/06/23	25 d	$ 2.818.850	100,00%	100,00%	$ 2.818.850
238	1.3.4.4	Intervención Silvicultural Segunda Etapa	mié 16/08/23	vie 15/09/23	25 d	$ 9.135.163	100,00%	100,00%	$ 9.135.163
239	**1.3.4.5**	**COSTADO ORIENTAL**	**mar 21/02/23**	**mié 24/09/25**	**739,25 d**	**$ 10.562.881.8…**	**6,55%**	**6,54%**	**$ 691.443.662**
240	**1.3.4.5.1**	**APROCHE ORIENTAL**	**mar 21/02/23**	**mié 19/03/25**	**586,5 d**	**$ 2.865.504.249**	**8,15%**	**8,11%**	**$ 233.653.186**
241	1.3.4.5.1.1	Demolición	vie 15/03/24	mié 20/03/24	5 d	$ 1.135.018	100,00%	0,00%	$ 1.135.018
242	**1.3.4.5.1.2**	**EJE 1-2**	**mar 12/03/24**	**vie 27/12/24**	**234,25 d**	**$ 225.892.935**	**14,45%**	**14,45%**	**$ 32.648.372**
243	1.3.4.5.1.2.1	Excavación	mar 12/03/24	jue 14/03/24	3 d	$ 1.648.372	100,00%	100,00%	$ 1.648.372
244	1.3.4.5.1.2.2	Pilotes FDP	jue 16/05/24	vie 17/05/24	2 d	$ 31.000.000	100,00%	100,00%	$ 31.000.000
245	1.3.4.5.1.2.3	Mejoramiento con Rajón	jue 10/10/24	mié 16/10/24	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
246	**1.3.4.5.1.2.4**	**Estructura**	**lun 21/10/24**	**jue 12/12/24**	**43,5 d**	**$ 36.392.040**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
247	**1.3.4.5.1.2.4**	**Zapatas**	**lun 21/10/24**	**mar 29/10/24**	**7 d**	**$ 14.154.985**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
248	1.3.4.5.1.2.4	Solado	lun 21/10/24	mié 23/10/24	2 d	$ 24.985	0,00%	0,00%	$ 0
249	1.3.4.5.1.2.4	Acero	mié 23/10/24	vie 25/10/24	2 d	$ 7.800.000	0,00%	0,00%	$ 0
250	1.3.4.5.1.2.4	Concreto	vie 25/10/24	mar 29/10/24	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
251	**1.3.4.5.1.2.4**	**Vigas de Cimentación**	**mié 23/10/24**	**vie 1/11/24**	**8 d**	**$ 4.536.645**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
252	1.3.4.5.1.2.4	Acero	mié 23/10/24	sáb 26/10/24	3 d	$ 2.004.645	0,00%	0,00%	$ 0
253	1.3.4.5.1.2.4	Concreto	sáb 26/10/24	vie 1/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
254	**1.3.4.5.1.2.4**	**Columnas**	**mié 23/10/24**	**vie 8/11/24**	**13 d**	**$ 6.016.710**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
255	1.3.4.5.1.2.4	Acero	mié 23/10/24	sáb 26/10/24	3 d	$ 3.484.710	0,00%	0,00%	$ 0
256	1.3.4.5.1.2.4	Concreto	vie 1/11/24	vie 8/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
257	**1.3.4.5.1.2.4**	**Vigas Longitudinales**	**mar 3/12/24**	**jue 12/12/24**	**8 d**	**$ 5.204.860**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
258	1.3.4.5.1.2.4	Acero	mar 3/12/24	vie 6/12/24	3 d	$ 2.672.860	0,00%	0,00%	$ 0
259	1.3.4.5.1.2.4	Concreto	vie 6/12/24	jue 12/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
260	**1.3.4.5.1.2.4**	**Vigas Transversales**	**mar 3/12/24**	**jue 12/12/24**	**8 d**	**$ 6.478.840**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
261	1.3.4.5.1.2.4	Acero	mar 3/12/24	vie 6/12/24	3 d	$ 3.946.840	0,00%	0,00%	$ 0
262	1.3.4.5.1.2.4	Concreto	vie 6/12/24	jue 12/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
263	**1.3.4.5.1.2.5**	**Tierra Armada**	**sáb 23/11/24**	**sáb 14/12/24**	**18 d**	**$ 107.325.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
264	1.3.4.5.1.2.5	Geomalla de Refuerzo	sáb 23/11/24	mié 11/12/24	15 d	$ 26.831.250	0,00%	0,00%	$ 0
265	1.3.4.5.1.2.5	Sacos Llenos Con Material Granular	lun 25/11/24	jue 12/12/24	15 d	$ 26.831.250	0,00%	0,00%	$ 0
266	1.3.4.5.1.2.5	Geotextil Fortex	sáb 30/11/24	jue 12/12/24	10 d	$ 25.758.000	0,00%	0,00%	$ 0
267	1.3.4.5.1.2.5	Relleno con Ceniza	mié 27/11/24	sáb 14/12/24	15 d	$ 27.904.500	0,00%	0,00%	$ 0
268	**1.3.4.5.1.2.6**	**Fachada en Mampostería**	**jue 5/12/24**	**vie 27/12/24**	**17 d**	**$ 49.118.523**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
269	**1.3.4.5.1.2.6**	**Dobelas**	**jue 5/12/24**	**vie 6/12/24**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
270	1.3.4.5.1.2.6	Acero	jue 5/12/24	vie 6/12/24	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
271	**1.3.4.5.1.2.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**lun 16/12/24**	**mar 17/12/24**	**2 d**	**$ 13.368.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
272	1.3.4.5.1.2.6	Concreto	mar 17/12/24	mar 17/12/24	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
273	1.3.4.5.1.2.6	Bloque en Concreto	lun 16/12/24	mar 17/12/24	2 d	$ 10.829.876	0,00%	0,00%	$ 0
274	**1.3.4.5.1.2.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 23/12/24**	**vie 27/12/24**	**3 d**	**$ 639.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
275	1.3.4.5.1.2.6	Concreto	mar 24/12/24	vie 27/12/24	2 d	$ 6.245	0,00%	0,00%	$ 0
276	1.3.4.5.1.2.6	Bloque en Concreto	lun 23/12/24	vie 27/12/24	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
277	**1.3.4.5.1.2.6**	**Viga de Amarre**	**mié 18/12/24**	**lun 23/12/24**	**4 d**	**$ 732.920**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
278	1.3.4.5.1.2.6	Acero	mié 18/12/24	jue 19/12/24	2 d	$ 99.920	0,00%	0,00%	$ 0
279	1.3.4.5.1.2.6	Concreto	jue 19/12/24	lun 23/12/24	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
280	1.3.4.5.1.2.6	Losa de aproximación	jue 12/12/24	jue 19/12/24	6 d	$ 32.648.372	0,00%	0,00%	$ 0
281	*1.3.4.5.1.3*	*Fin de Eje 1-2*	*vie 27/12/24*	*vie 27/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
282	**1.3.4.5.1.4**	**EJE 2-3**	**mar 7/03/23**	**vie 27/12/24**	**484,25 d**	**$ 193.487.733**	**16,87%**	**16,87%**	**$ 32.648.372**
283	1.3.4.5.1.4.1	Excavación N: -1.2 m	mar 7/03/23	jue 9/03/23	3 d	$ 461.544	100,00%	100,00%	$ 461.544
284	1.3.4.5.1.4.2	Excavación N:-4.5 m	mar 12/03/24	jue 14/03/24	3 d	$ 1.186.828	100,00%	100,00%	$ 1.186.828
285	1.3.4.5.1.4.3	Pilotes FDP	lun 20/05/24	mar 21/05/24	2 d	$ 31.000.000	100,00%	100,00%	$ 31.000.000
286	1.3.4.5.1.4.4	Mejoramiento con Rajón	jue 10/10/24	mié 16/10/24	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
287	**1.3.4.5.1.4.5**	**Estructura**	**mié 23/10/24**	**sáb 14/12/24**	**41,75 d**	**$ 36.616.860**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
288	**1.3.4.5.1.4.5**	**Zapatas**	**mié 23/10/24**	**jue 31/10/24**	**7 d**	**$ 14.154.985**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
289	1.3.4.5.1.4.5	Solado	mié 23/10/24	vie 25/10/24	2 d	$ 24.985	0,00%	0,00%	$ 0
290	1.3.4.5.1.4.5	Acero	vie 25/10/24	lun 28/10/24	2 d	$ 7.800.000	0,00%	0,00%	$ 0
291	1.3.4.5.1.4.5	Concreto	lun 28/10/24	jue 31/10/24	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
292	**1.3.4.5.1.4.5**	**Vigas de Cimentación**	**vie 25/10/24**	**mar 5/11/24**	**8 d**	**$ 4.499.175**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**



Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños


Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Sólo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite





IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
293	1.3.4.5.1.4.5	Acero	vie 25/10/24	mar 29/10/24	3 d	$ 1.967.175	0,00%	0,00%	$ 0
294	1.3.4.5.1.4.5	Concreto	mar 29/10/24	mar 5/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
295	**1.3.4.5.1.4.5**	**Columnas**	**vie 25/10/24**	**mar 12/11/24**	**13 d**	**$ 5.972.995**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
296	1.3.4.5.1.4.5	Acero	vie 25/10/24	mar 29/10/24	3 d	$ 3.440.995	0,00%	0,00%	$ 0
297	1.3.4.5.1.4.5	Concreto	mar 5/11/24	mar 12/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
298	**1.3.4.5.1.4.5**	**Vigas Longitudinales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 5.286.045**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
299	1.3.4.5.1.4.5	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 2.754.045	0,00%	0,00%	$ 0
300	1.3.4.5.1.4.5	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
301	**1.3.4.5.1.4.5**	**Vigas Transversales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 6.703.660**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
302	1.3.4.5.1.4.5	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 4.171.660	0,00%	0,00%	$ 0
303	1.3.4.5.1.4.5	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
304	**1.3.4.5.1.4.6**	**Tierra Armada**	**sáb 23/11/24**	**sáb 14/12/24**	**18 d**	**$ 107.325.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
305	1.3.4.5.1.4.6	Geomalla de Refuerzo	sáb 23/11/24	mié 11/12/24	15 d	$ 26.831.250	0,00%	0,00%	$ 0
306	1.3.4.5.1.4.6	Sacos Llenos Con Material Granular	lun 25/11/24	jue 12/12/24	15 d	$ 26.831.250	0,00%	0,00%	$ 0
307	1.3.4.5.1.4.6	Geotextil Fortex	sáb 30/11/24	jue 12/12/24	10 d	$ 25.837.500	0,00%	0,00%	$ 0
308	1.3.4.5.1.4.6	Relleno con Ceniza	mié 27/11/24	sáb 14/12/24	15 d	$ 27.825.000	0,00%	0,00%	$ 0
309	**1.3.4.5.1.4.7**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 7/12/24**	**vie 27/12/24**	**15 d**	**$ 16.488.501**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
310	**1.3.4.5.1.4.7**	**Dobelas**	**sáb 7/12/24**	**lun 9/12/24**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
311	1.3.4.5.1.4.7	Acero	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
312	**1.3.4.5.1.4.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**lun 16/12/24**	**mar 17/12/24**	**2 d**	**$ 13.199.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
313	1.3.4.5.1.4.7	Concreto	mar 17/12/24	mar 17/12/24	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
314	1.3.4.5.1.4.7	Bloque en Concreto	lun 16/12/24	mar 17/12/24	2 d	$ 10.660.876	0,00%	0,00%	$ 0
315	**1.3.4.5.1.4.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 23/12/24**	**vie 27/12/24**	**3 d**	**$ 807.860**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
316	1.3.4.5.1.4.7	Concreto	mar 24/12/24	vie 27/12/24	2 d	$ 174.860	0,00%	0,00%	$ 0
317	1.3.4.5.1.4.7	Bloque en Concreto	lun 23/12/24	vie 27/12/24	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
318	**1.3.4.5.1.4.7**	**Viga de Amarre**	**mié 18/12/24**	**lun 23/12/24**	**4 d**	**$ 751.655**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
319	1.3.4.5.1.4.7	Acero	mié 18/12/24	jue 19/12/24	2 d	$ 118.655	0,00%	0,00%	$ 0
320	1.3.4.5.1.4.7	Concreto	jue 19/12/24	lun 23/12/24	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
321	*1.3.4.5.1.5*	*Fin de Eje 2-3*	*vie 27/12/24*	*vie 27/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
322	**1.3.4.5.1.6**	**EJE 3-4**	**vie 3/03/23**	**mar 31/12/24**	**490 d**	**$ 193.221.963**	**16,90%**	**16,90%**	**$ 32.648.372**
323	1.3.4.5.1.6.1	Excavación N: -1.2 m	vie 3/03/23	lun 6/03/23	3 d	$ 478.028	100,00%	100,00%	$ 478.028
324	1.3.4.5.1.6.2	Excavación N:-4.5 m	vie 8/03/24	lun 11/03/24	3 d	$ 1.170.344	100,00%	100,00%	$ 1.170.344
325	1.3.4.5.1.6.3	Pilotes FDP	lun 27/05/24	mar 28/05/24	2 d	$ 31.000.000	100,00%	100,00%	$ 31.000.000
326	1.3.4.5.1.6.4	Mejoramiento con Rajón	jue 10/10/24	sáb 12/10/24	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
327	**1.3.4.5.1.6.5**	**Estructura**	**mié 23/10/24**	**jue 26/12/24**	**49,75 d**	**$ 36.997.805**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
328	**1.3.4.5.1.6.5**	**Zapatas**	**mié 23/10/24**	**jue 31/10/24**	**7 d**	**$ 14.154.985**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
329	1.3.4.5.1.6.5	Solado	mié 23/10/24	vie 25/10/24	2 d	$ 24.985	0,00%	0,00%	$ 0
330	1.3.4.5.1.6.5	Acero	vie 25/10/24	lun 28/10/24	2 d	$ 7.800.000	0,00%	0,00%	$ 0
331	1.3.4.5.1.6.5	Concreto	lun 28/10/24	jue 31/10/24	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
332	**1.3.4.5.1.6.5**	**Vigas de Cimentación**	**vie 25/10/24**	**mar 5/11/24**	**8 d**	**$ 4.761.465**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
333	1.3.4.5.1.6.5	Acero	vie 25/10/24	mar 29/10/24	3 d	$ 2.229.465	0,00%	0,00%	$ 0
334	1.3.4.5.1.6.5	Concreto	mar 29/10/24	mar 5/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
335	**1.3.4.5.1.6.5**	**Columnas**	**vie 25/10/24**	**mar 12/11/24**	**13 d**	**$ 6.010.465**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
336	1.3.4.5.1.6.5	Acero	vie 25/10/24	mar 29/10/24	3 d	$ 3.478.465	0,00%	0,00%	$ 0
337	1.3.4.5.1.6.5	Concreto	mar 5/11/24	mar 12/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
338	**1.3.4.5.1.6.5**	**Vigas Longitudinales**	**lun 16/12/24**	**jue 26/12/24**	**8 d**	**$ 5.642.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
339	1.3.4.5.1.6.5	Acero	lun 16/12/24	mié 18/12/24	3 d	$ 3.110.010	0,00%	0,00%	$ 0
340	1.3.4.5.1.6.5	Concreto	jue 19/12/24	jue 26/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
341	**1.3.4.5.1.6.5**	**Vigas Transversales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 6.428.880**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
342	1.3.4.5.1.6.5	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 3.896.880	0,00%	0,00%	$ 0
343	1.3.4.5.1.6.5	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
344	**1.3.4.5.1.6.6**	**Tierra Armada**	**sáb 23/11/24**	**sáb 14/12/24**	**18 d**	**$ 107.060.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
345	1.3.4.5.1.6.6	Geomalla de Refuerzo	sáb 23/11/24	mié 11/12/24	15 d	$ 26.764.999	0,00%	0,00%	$ 0
346	1.3.4.5.1.6.6	Sacos Llenos Con Material Granular	lun 25/11/24	jue 12/12/24	15 d	$ 26.764.999	0,00%	0,00%	$ 0
347	1.3.4.5.1.6.6	Geotextil Fortex	sáb 30/11/24	jue 12/12/24	10 d	$ 25.842.069	0,00%	0,00%	$ 0
348	1.3.4.5.1.6.6	Relleno con Ceniza	mié 27/11/24	sáb 14/12/24	15 d	$ 27.687.933	0,00%	0,00%	$ 0
349	**1.3.4.5.1.6.7**	**Fachada en Mampostería**	**mié 18/12/24**	**mar 31/12/24**	**10 d**	**$ 16.106.786**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
350	**1.3.4.5.1.6.7**	**Dobelas**	**mié 18/12/24**	**mié 18/12/24**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
351	1.3.4.5.1.6.7	Acero	mié 18/12/24	mié 18/12/24	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
352	**1.3.4.5.1.6.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**jue 19/12/24**	**vie 20/12/24**	**2 d**	**$ 12.861.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
353	1.3.4.5.1.6.7	Concreto	vie 20/12/24	vie 20/12/24	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
354	1.3.4.5.1.6.7	Bloque en Concreto	jue 19/12/24	vie 20/12/24	2 d	$ 10.322.876	0,00%	0,00%	$ 0
355	**1.3.4.5.1.6.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**vie 27/12/24**	**mar 31/12/24**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
356	1.3.4.5.1.6.7	Concreto	sáb 28/12/24	mar 31/12/24	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
357	1.3.4.5.1.6.7	Bloque en Concreto	vie 27/12/24	mar 31/12/24	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
358	**1.3.4.5.1.6.7**	**Viga de Amarre**	**sáb 21/12/24**	**vie 27/12/24**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**

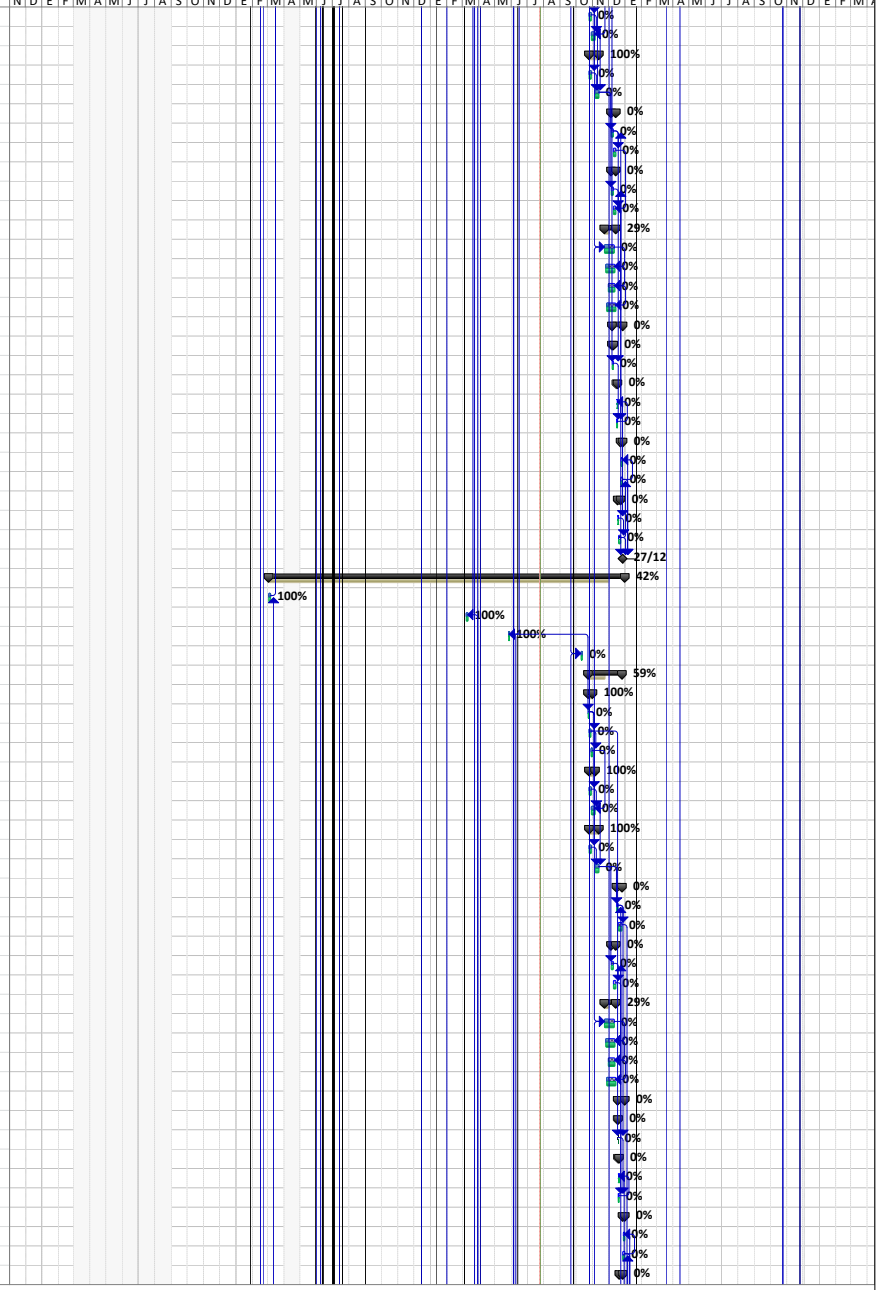

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
359	1.3.4.5.1.6.7	Acero	sáb 21/12/24	mar 24/12/24	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
360	1.3.4.5.1.6.7	Concreto	mar 24/12/24	vie 27/12/24	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
361	*1.3.4.5.1.7*	*Fin de Eje 3-4*	*mar 31/12/24*	*mar 31/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
362	**1.3.4.5.1.8**	**EJE 4-5**	**mar 28/02/23**	**sáb 28/12/24**	**491 d**	**$ 192.797.303**	**16,93%**	**16,93%**	**$ 32.648.372**
363	1.3.4.5.1.8.1	Excavación N: -1.2 m	mar 28/02/23	jue 2/03/23	3 d	$ 560.447	100,00%	100,00%	$ 560.447
364	1.3.4.5.1.8.2	Excavación N:-4.5 m	vie 8/03/24	lun 11/03/24	3 d	$ 1.087.926	100,00%	100,00%	$ 1.087.926
365	1.3.4.5.1.8.3	Pilotes FDP	lun 10/06/24	mié 12/06/24	2 d	$ 31.000.000	100,00%	100,00%	$ 31.000.000
366	1.3.4.5.1.8.4	Mejoramiento con Rajón	jue 10/10/24	mié 23/10/24	10,75 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
367	**1.3.4.5.1.8.5**	**Estructura**	**vie 25/10/24**	**sáb 14/12/24**	**40 d**	**$ 36.573.145**	0,00%	0,00%	**$ 0**
368	**1.3.4.5.1.8.5**	**Zapatas**	**vie 25/10/24**	**sáb 2/11/24**	**7 d**	**$ 14.154.985**	0,00%	0,00%	**$ 0**
369	1.3.4.5.1.8.5	Solado	vie 25/10/24	lun 28/10/24	2 d	$ 24.985	0,00%	0,00%	$ 0
370	1.3.4.5.1.8.5	Acero	lun 28/10/24	mié 30/10/24	2 d	$ 7.800.000	0,00%	0,00%	$ 0
371	1.3.4.5.1.8.5	Concreto	mié 30/10/24	sáb 2/11/24	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
372	**1.3.4.5.1.8.5**	**Vigas de Cimentación**	**lun 28/10/24**	**jue 7/11/24**	**8 d**	**$ 4.624.075**	0,00%	0,00%	**$ 0**
373	1.3.4.5.1.8.5	Acero	lun 28/10/24	jue 31/10/24	3 d	$ 2.092.075	0,00%	0,00%	$ 0
374	1.3.4.5.1.8.5	Concreto	jue 31/10/24	jue 7/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
375	**1.3.4.5.1.8.5**	**Columnas**	**lun 28/10/24**	**jue 14/11/24**	**13 d**	**$ 6.004.220**	0,00%	0,00%	**$ 0**
376	1.3.4.5.1.8.5	Acero	lun 28/10/24	jue 31/10/24	3 d	$ 3.472.220	0,00%	0,00%	$ 0
377	1.3.4.5.1.8.5	Concreto	jue 7/11/24	jue 14/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
378	**1.3.4.5.1.8.5**	**Vigas Longitudinales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 5.229.840**	0,00%	0,00%	**$ 0**
379	1.3.4.5.1.8.5	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 2.697.840	0,00%	0,00%	$ 0
380	1.3.4.5.1.8.5	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
381	**1.3.4.5.1.8.5**	**Vigas Transversales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 6.560.025**	0,00%	0,00%	**$ 0**
382	1.3.4.5.1.8.5	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 4.028.025	0,00%	0,00%	$ 0
383	1.3.4.5.1.8.5	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
384	**1.3.4.5.1.8.6**	**Tierra Armada**	**sáb 23/11/24**	**sáb 14/12/24**	**18 d**	**$ 107.060.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
385	1.3.4.5.1.8.6	Geomalla de Refuerzo	sáb 23/11/24	mié 11/12/24	15 d	$ 26.764.997	0,00%	0,00%	$ 0
386	1.3.4.5.1.8.6	Sacos Llenos Con Material Granular	lun 25/11/24	jue 12/12/24	15 d	$ 26.764.997	0,00%	0,00%	$ 0
387	1.3.4.5.1.8.6	Geotextil Fortex	sáb 30/11/24	jue 12/12/24	10 d	$ 25.901.616	0,00%	0,00%	$ 0
388	1.3.4.5.1.8.6	Relleno con Ceniza	mié 27/11/24	sáb 14/12/24	15 d	$ 27.628.390	0,00%	0,00%	$ 0
389	**1.3.4.5.1.8.7**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 7/12/24**	**sáb 28/12/24**	**16 d**	**$ 16.106.786**	0,00%	0,00%	**$ 0**
390	**1.3.4.5.1.8.7**	**Dobelas**	**sáb 7/12/24**	**lun 9/12/24**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
391	1.3.4.5.1.8.7	Acero	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
392	**1.3.4.5.1.8.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**lun 16/12/24**	**mié 18/12/24**	**3 d**	**$ 12.861.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
393	1.3.4.5.1.8.7	Concreto	mié 18/12/24	mié 18/12/24	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
394	1.3.4.5.1.8.7	Bloque en Concreto	lun 16/12/24	mar 17/12/24	2 d	$ 10.322.876	0,00%	0,00%	$ 0
395	**1.3.4.5.1.8.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mar 24/12/24**	**sáb 28/12/24**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
396	1.3.4.5.1.8.7	Concreto	jue 26/12/24	sáb 28/12/24	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
397	1.3.4.5.1.8.7	Bloque en Concreto	mar 24/12/24	sáb 28/12/24	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
398	**1.3.4.5.1.8.7**	**Viga de Amarre**	**jue 19/12/24**	**mar 24/12/24**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
399	1.3.4.5.1.8.7	Acero	jue 19/12/24	vie 20/12/24	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
400	1.3.4.5.1.8.7	Concreto	vie 20/12/24	mar 24/12/24	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
401	*1.3.4.5.1.9*	*Fin de Eje 4-5*	*sáb 28/12/24*	*sáb 28/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
402	**1.3.4.5.1.10**	**EJE 5-6**	**vie 24/02/23**	**vie 27/12/24**	**492,75 d**	**$ 227.382.474**	**30,19%**	**30,19%**	**$ 68.648.372**
403	1.3.4.5.1.10.	Excavación N: -1.2 m	vie 24/02/23	lun 27/02/23	3 d	$ 626.381	100,00%	100,00%	$ 626.381
404	1.3.4.5.1.10.	Excavación N:-4.5 m	mar 5/03/24	jue 7/03/24	3 d	$ 1.021.991	100,00%	100,00%	$ 1.021.991
405	1.3.4.5.1.10.	Pilotes FDP	lun 27/05/24	mar 28/05/24	2 d	$ 67.000.000	100,00%	100,00%	$ 67.000.000
406	1.3.4.5.1.10.	Mejoramiento con Rajón	jue 10/10/24	sáb 12/10/24	3 d	$ 855.712	0,00%	0,00%	$ 0
407	**1.3.4.5.1.10.**	**Estructura**	**vie 25/10/24**	**sáb 14/12/24**	**40 d**	**$ 37.091.480**	0,00%	0,00%	**$ 0**
408	**1.3.4.5.1.10.**	**Zapatas**	**vie 25/10/24**	**sáb 2/11/24**	**7 d**	**$ 14.154.985**	0,00%	0,00%	**$ 0**
409	1.3.4.5.1.10.	Solado	vie 25/10/24	lun 28/10/24	2 d	$ 24.985	0,00%	0,00%	$ 0
410	1.3.4.5.1.10.	Acero	lun 28/10/24	mié 30/10/24	2 d	$ 7.800.000	0,00%	0,00%	$ 0
411	1.3.4.5.1.10.	Concreto	mié 30/10/24	sáb 2/11/24	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
412	**1.3.4.5.1.10.**	**Vigas de Cimentación**	**lun 28/10/24**	**jue 7/11/24**	**8 d**	**$ 4.836.405**	0,00%	0,00%	**$ 0**
413	1.3.4.5.1.10.	Acero	lun 28/10/24	jue 31/10/24	3 d	$ 2.304.405	0,00%	0,00%	$ 0
414	1.3.4.5.1.10.	Concreto	jue 31/10/24	jue 7/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
415	**1.3.4.5.1.10.**	**Columnas**	**lun 28/10/24**	**jue 14/11/24**	**13 d**	**$ 6.022.955**	0,00%	0,00%	**$ 0**
416	1.3.4.5.1.10.	Acero	lun 28/10/24	jue 31/10/24	3 d	$ 3.490.955	0,00%	0,00%	$ 0
417	1.3.4.5.1.10.	Concreto	jue 7/11/24	jue 14/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
418	**1.3.4.5.1.10.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 5.642.010**	0,00%	0,00%	**$ 0**
419	1.3.4.5.1.10.	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 3.110.010	0,00%	0,00%	$ 0
420	1.3.4.5.1.10.	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
421	**1.3.4.5.1.10.**	**Vigas Transversales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 6.435.125**	0,00%	0,00%	**$ 0**
422	1.3.4.5.1.10.	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 3.903.125	0,00%	0,00%	$ 0
423	1.3.4.5.1.10.	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
424	**1.3.4.5.1.10.**	**Tierra Armada**	**sáb 23/11/24**	**sáb 14/12/24**	**18 d**	**$ 107.060.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**

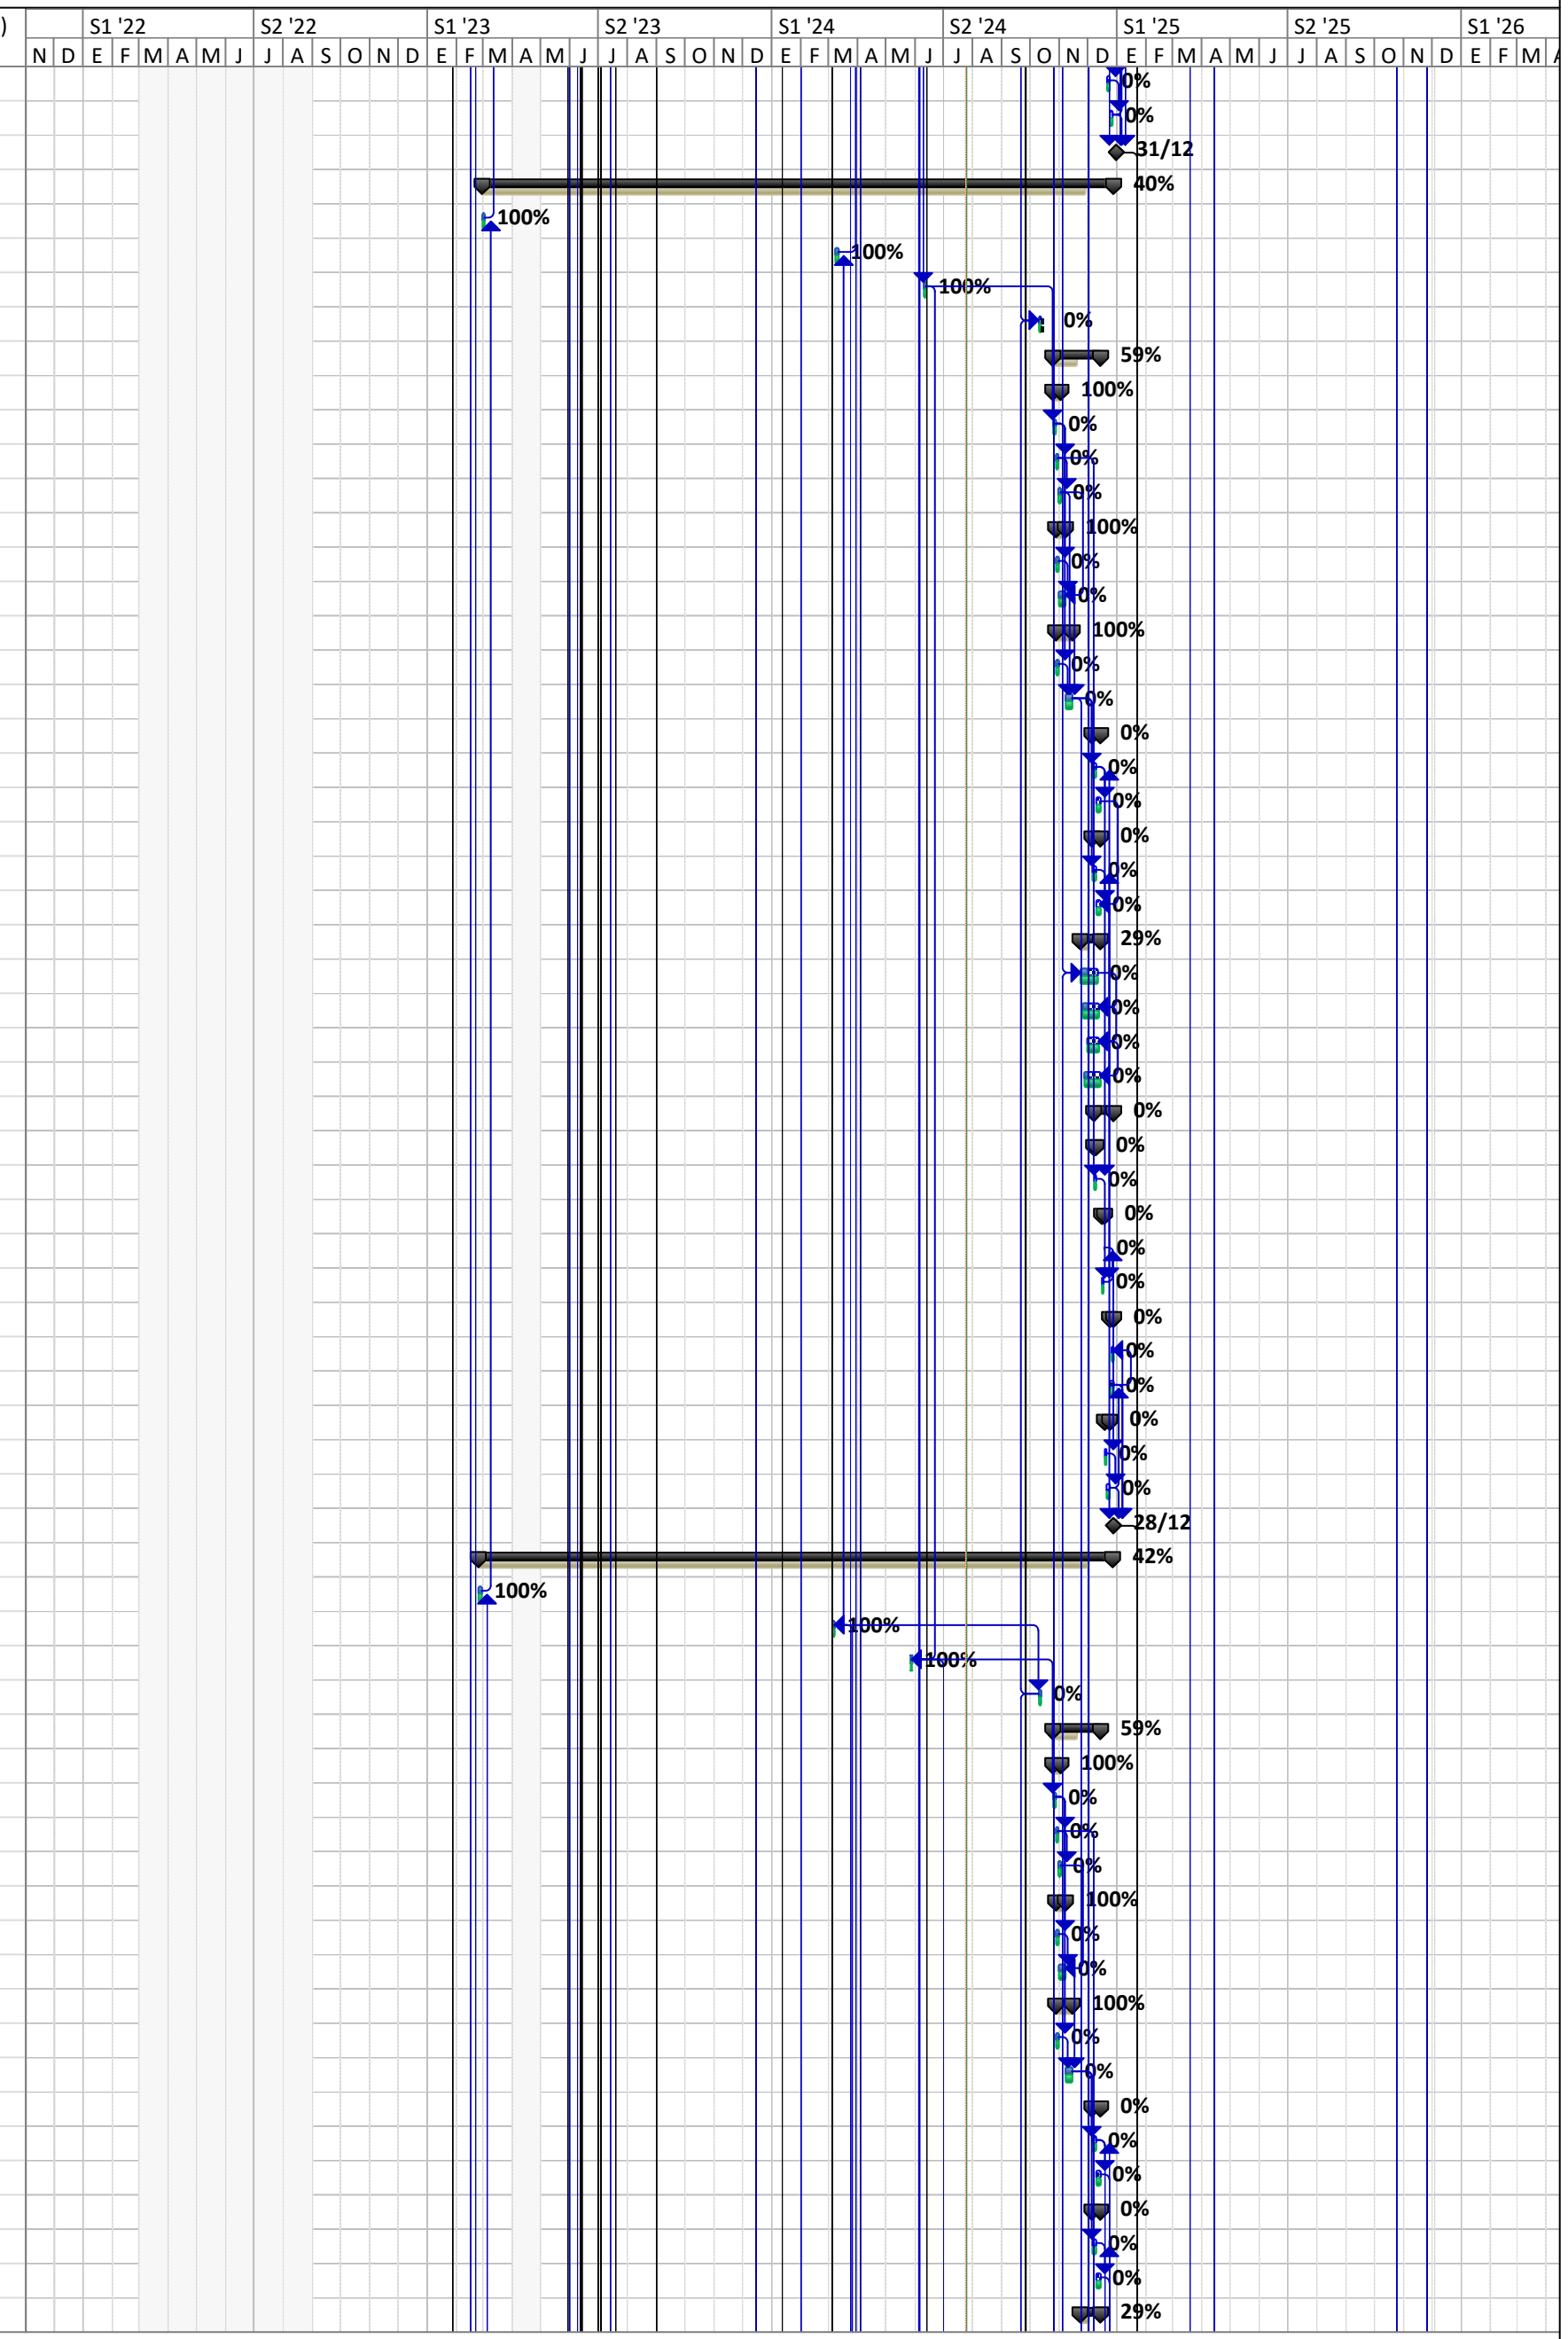

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas · División · Sólo fin · Hito de línea base · Resumen manual · Tarea inactiva
División crítica · Progreso de tarea · Sólo duración · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo
Progreso de tarea crítica · Tarea manual · Línea base · Progreso del resumen · Tareas externas · Resumen inactivo
Tarea · Sólo el comienzo · División de la línea base · Resumen · Hito externo · Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
425	1.3.4.5.1.10.	Geomalla de Refuerzo	sáb 23/11/24	mié 11/12/24	15 d	$ 26.765.013	0,00%	0,00%	$ 0
426	1.3.4.5.1.10.	Sacos Llenos Con Material Granular	lun 25/11/24	jue 12/12/24	15 d	$ 26.765.013	0,00%	0,00%	$ 0
427	1.3.4.5.1.10.	Geotextil Fortex	sáb 30/11/24	jue 12/12/24	10 d	$ 25.953.900	0,00%	0,00%	$ 0
428	1.3.4.5.1.10.	Relleno con Ceniza	mié 27/11/24	sáb 14/12/24	15 d	$ 27.576.074	0,00%	0,00%	$ 0
429	**1.3.4.5.1.10.**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 7/12/24**	**vie 27/12/24**	**15 d**	**$ 13.726.910**	0,00%	0,00%	**$ 0**
430	**1.3.4.5.1.10.**	**Dobelas**	**sáb 7/12/24**	**lun 9/12/24**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
431	1.3.4.5.1.10.	Acero	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
432	**1.3.4.5.1.10.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**lun 16/12/24**	**mar 17/12/24**	**2 d**	**$ 10.481.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
433	1.3.4.5.1.10.	Concreto	mar 17/12/24	mar 17/12/24	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
434	1.3.4.5.1.10.	Bloque en Concreto	lun 16/12/24	mar 17/12/24	2 d	$ 7.943.000	0,00%	0,00%	$ 0
435	**1.3.4.5.1.10.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 23/12/24**	**vie 27/12/24**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
436	1.3.4.5.1.10.	Concreto	mar 24/12/24	vie 27/12/24	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
437	1.3.4.5.1.10.	Bloque en Concreto	lun 23/12/24	vie 27/12/24	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
438	**1.3.4.5.1.10.**	**Viga de Amarre**	**mié 18/12/24**	**lun 23/12/24**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
439	1.3.4.5.1.10.	Acero	mié 18/12/24	jue 19/12/24	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
440	1.3.4.5.1.10.	Concreto	jue 19/12/24	lun 23/12/24	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
441	*1.3.4.5.1.11*	*Fin de Eje 5-6*	*vie 27/12/24*	*vie 27/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
442	**1.3.4.5.1.12**	**EJE 6-7**	**mar 21/02/23**	**vie 27/12/24**	**495,75 d**	**$ 191.567.187**	**17,04%**	**17,04%**	**$ 32.640.596**
443	1.3.4.5.1.12.	Excavación N: -1.2 m	mar 21/02/23	jue 23/02/23	3 d	$ 672.644	100,00%	100,00%	$ 672.644
444	1.3.4.5.1.12.	Excavación N:-4.5 m	mar 5/03/24	jue 7/03/24	3 d	$ 967.952	100,00%	100,00%	$ 967.952
445	1.3.4.5.1.12.	Pilotes FDP	lun 1/07/24	mié 3/07/24	2 d	$ 31.000.000	100,00%	100,00%	$ 31.000.000
446	1.3.4.5.1.12.	Mejoramiento con Rajón	jue 10/10/24	sáb 12/10/24	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
447	**1.3.4.5.1.12.**	**Estructura**	**lun 28/10/24**	**sáb 14/12/24**	**38 d**	**$ 36.364.805**	0,00%	0,00%	**$ 0**
448	**1.3.4.5.1.12.**	**Zapatas**	**lun 28/10/24**	**mié 6/11/24**	**7 d**	**$ 13.521.985**	0,00%	0,00%	**$ 0**
449	1.3.4.5.1.12.	Solado	lun 28/10/24	mié 30/10/24	2 d	$ 24.985	0,00%	0,00%	$ 0
450	1.3.4.5.1.12.	Acero	mié 30/10/24	vie 1/11/24	2 d	$ 7.800.000	0,00%	0,00%	$ 0
451	1.3.4.5.1.12.	Concreto	vie 1/11/24	mié 6/11/24	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
452	**1.3.4.5.1.12.**	**Vigas de Cimentación**	**mié 30/10/24**	**sáb 9/11/24**	**8 d**	**$ 4.836.405**	0,00%	0,00%	**$ 0**
453	1.3.4.5.1.12.	Acero	mié 30/10/24	sáb 2/11/24	3 d	$ 2.304.405	0,00%	0,00%	$ 0
454	1.3.4.5.1.12.	Concreto	sáb 2/11/24	sáb 9/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
455	**1.3.4.5.1.12.**	**Columnas**	**mié 30/10/24**	**sáb 16/11/24**	**13 d**	**$ 6.010.465**	0,00%	0,00%	**$ 0**
456	1.3.4.5.1.12.	Acero	mié 30/10/24	sáb 2/11/24	3 d	$ 3.478.465	0,00%	0,00%	$ 0
457	1.3.4.5.1.12.	Concreto	sáb 9/11/24	sáb 16/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
458	**1.3.4.5.1.12.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 5.567.070**	0,00%	0,00%	**$ 0**
459	1.3.4.5.1.12.	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 3.035.070	0,00%	0,00%	$ 0
460	1.3.4.5.1.12.	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
461	**1.3.4.5.1.12.**	**Vigas Transversales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 6.428.880**	0,00%	0,00%	**$ 0**
462	1.3.4.5.1.12.	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 3.896.880	0,00%	0,00%	$ 0
463	1.3.4.5.1.12.	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
464	**1.3.4.5.1.12.**	**Tierra Armada**	**sáb 23/11/24**	**sáb 14/12/24**	**18 d**	**$ 107.060.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
465	1.3.4.5.1.12.	Geomalla de Refuerzo	sáb 23/11/24	mié 11/12/24	15 d	$ 26.764.990	0,00%	0,00%	$ 0
466	1.3.4.5.1.12.	Sacos Llenos Con Material Granular	lun 25/11/24	jue 12/12/24	15 d	$ 26.764.990	0,00%	0,00%	$ 0
467	1.3.4.5.1.12.	Geotextil Fortex	sáb 30/11/24	jue 12/12/24	10 d	$ 26.000.300	0,00%	0,00%	$ 0
468	1.3.4.5.1.12.	Relleno con Ceniza	mié 27/11/24	sáb 14/12/24	15 d	$ 27.529.720	0,00%	0,00%	$ 0
469	**1.3.4.5.1.12.**	**Fachada en Mampostería**	**jue 31/10/24**	**vie 27/12/24**	**44 d**	**$ 15.092.786**	0,00%	0,00%	**$ 0**
470	**1.3.4.5.1.12.**	**Dobelas**	**jue 31/10/24**	**vie 1/11/24**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
471	1.3.4.5.1.12.	Acero	jue 31/10/24	vie 1/11/24	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
472	**1.3.4.5.1.12.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**lun 16/12/24**	**mar 17/12/24**	**2 d**	**$ 11.847.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
473	1.3.4.5.1.12.	Concreto	mar 17/12/24	mar 17/12/24	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
474	1.3.4.5.1.12.	Bloque en Concreto	lun 16/12/24	mar 17/12/24	2 d	$ 9.308.876	0,00%	0,00%	$ 0
475	**1.3.4.5.1.12.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 23/12/24**	**vie 27/12/24**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
476	1.3.4.5.1.12.	Concreto	mar 24/12/24	vie 27/12/24	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
477	1.3.4.5.1.12.	Bloque en Concreto	lun 23/12/24	vie 27/12/24	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
478	**1.3.4.5.1.12.**	**Viga de Amarre**	**mié 18/12/24**	**lun 23/12/24**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
479	1.3.4.5.1.12.	Acero	mié 18/12/24	jue 19/12/24	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
480	1.3.4.5.1.12.	Concreto	jue 19/12/24	lun 23/12/24	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
481	*1.3.4.5.1.13*	*Fin de Eje 6-7*	*vie 27/12/24*	*vie 27/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
482	**1.3.4.5.1.14**	**EJE 7-8**	**jue 21/03/24**	**jue 19/12/24**	**211,5 d**	**$ 190.520.837**	**0,33%**	**0,33%**	**$ 635.712**
483	1.3.4.5.1.14.	Excavación	jue 21/03/24	jue 21/03/24	1 d	$ 635.712	100,00%	100,00%	$ 635.712
484	1.3.4.5.1.14.	Excavación 2	mar 20/08/24	mié 21/08/24	2 d	$ 953.568	0,00%	0,00%	$ 0
485	1.3.4.5.1.14.	Pilotes FDP	mar 8/10/24	mié 9/10/24	2 d	$ 31.000.000	0,00%	0,00%	$ 0
486	1.3.4.5.1.14.	Mejoramiento con Rajón	jue 17/10/24	lun 21/10/24	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
487	**1.3.4.5.1.14.**	**Estructura**	**sáb 9/11/24**	**sáb 14/12/24**	**28,5 d**	**$ 36.133.740**	0,00%	0,00%	**$ 0**
488	**1.3.4.5.1.14.**	**Zapatas**	**sáb 9/11/24**	**mar 19/11/24**	**7 d**	**$ 13.521.985**	0,00%	0,00%	**$ 0**
489	1.3.4.5.1.14.	Solado	sáb 9/11/24	mié 13/11/24	2 d	$ 24.985	0,00%	0,00%	$ 0
490	1.3.4.5.1.14.	Acero	mié 13/11/24	vie 15/11/24	2 d	$ 7.800.000	0,00%	0,00%	$ 0

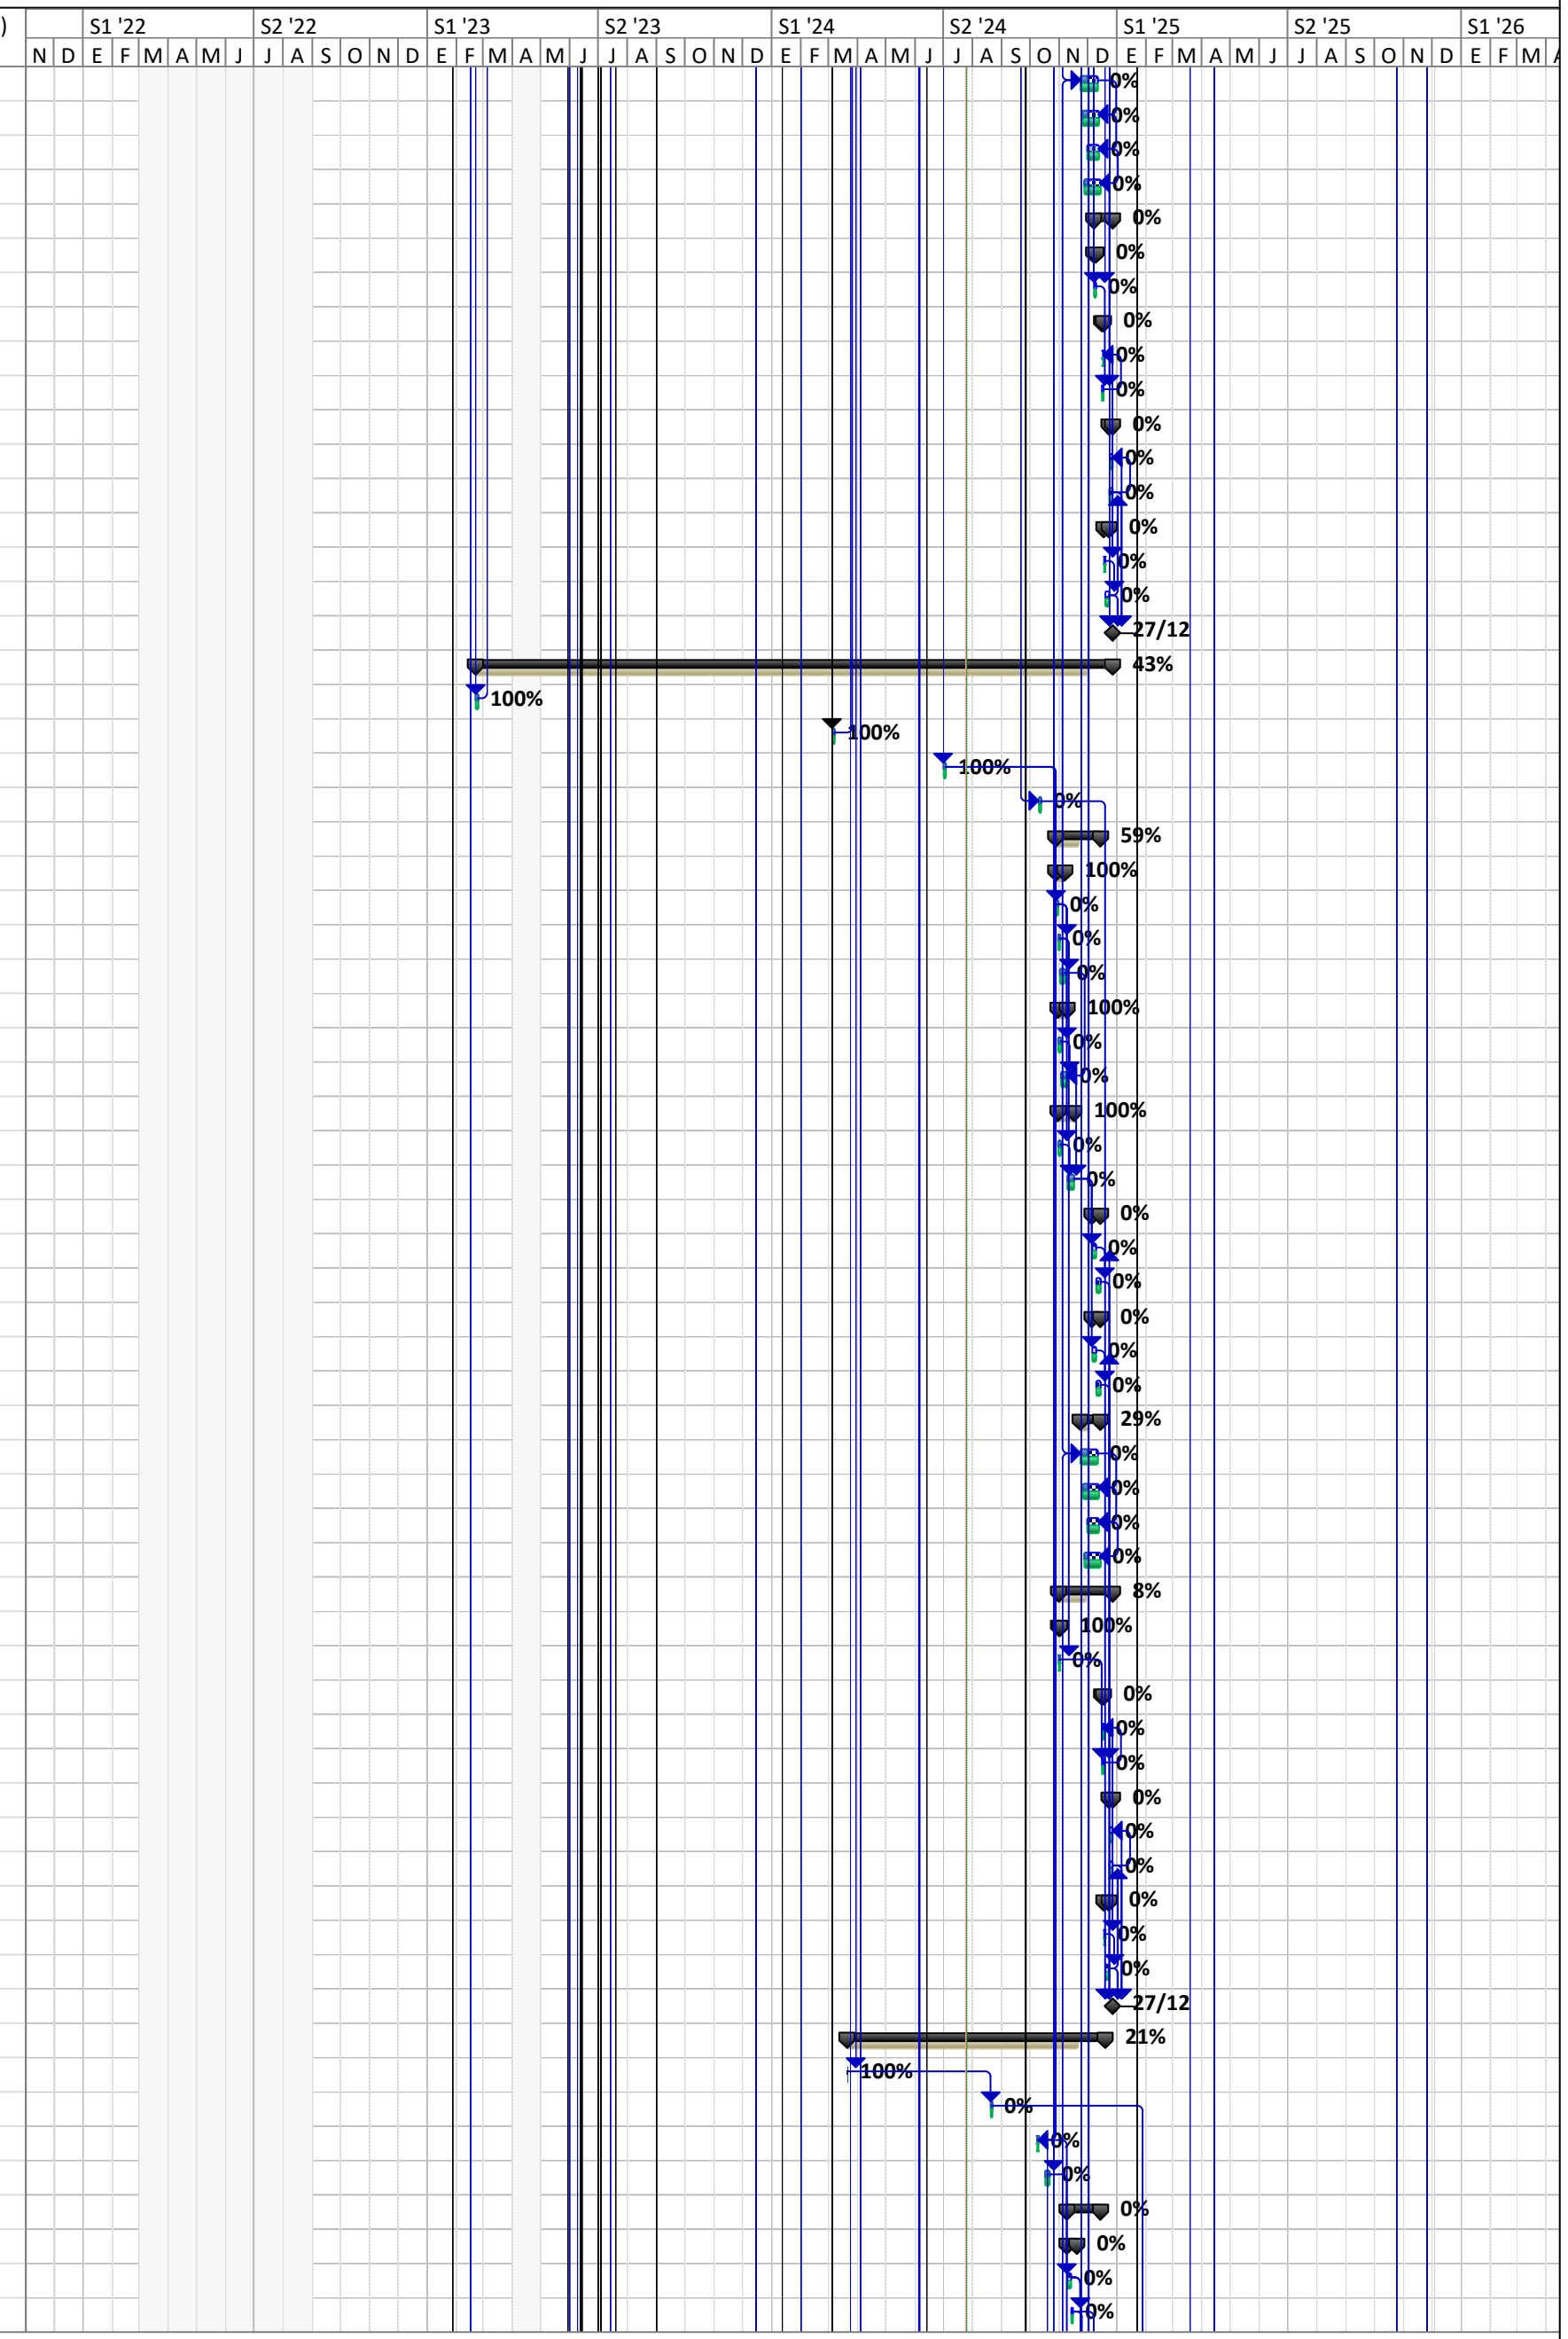

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas · División · Sólo fin · Hito de línea base · Resumen manual · Tarea inactiva
División crítica · Progreso de tarea · Sólo duración · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo
Progreso de tarea crítica · Tarea manual · Línea base · Progreso del resumen · Tareas externas · Resumen inactivo
Tarea · Sólo el comienzo · División de la línea base · Resumen · Hito externo · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
491	1.3.4.5.1.14.	Concreto	vie 15/11/24	mar 19/11/24	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
492	**1.3.4.5.1.14.**	**Vigas de Cimentación**	**mié 13/11/24**	**vie 22/11/24**	**8 d**	**$ 4.761.465**	0,00%	0,00%	**$ 0**
493	1.3.4.5.1.14.	Acero	mié 13/11/24	sáb 16/11/24	3 d	$ 2.229.465	0,00%	0,00%	$ 0
494	1.3.4.5.1.14.	Concreto	sáb 16/11/24	vie 22/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
495	**1.3.4.5.1.14.**	**Columnas**	**mié 13/11/24**	**jue 28/11/24**	**13 d**	**$ 6.022.955**	0,00%	0,00%	**$ 0**
496	1.3.4.5.1.14.	Acero	mié 13/11/24	sáb 16/11/24	3 d	$ 3.490.955	0,00%	0,00%	$ 0
497	1.3.4.5.1.14.	Concreto	vie 22/11/24	jue 28/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
498	**1.3.4.5.1.14.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 5.398.455**	0,00%	0,00%	**$ 0**
499	1.3.4.5.1.14.	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 2.866.455	0,00%	0,00%	$ 0
500	1.3.4.5.1.14.	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
501	**1.3.4.5.1.14.**	**Vigas Transversales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 6.428.880**	0,00%	0,00%	**$ 0**
502	1.3.4.5.1.14.	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 3.896.880	0,00%	0,00%	$ 0
503	1.3.4.5.1.14.	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
504	**1.3.4.5.1.14.**	**Tierra Armada**	**sáb 23/11/24**	**sáb 14/12/24**	**18 d**	**$ 107.060.000**	0,00%	0,00%	**$ 0**
505	1.3.4.5.1.14.	Geomalla de Refuerzo	sáb 23/11/24	mié 11/12/24	15 d	$ 26.764.986	0,00%	0,00%	$ 0
506	1.3.4.5.1.14.	Sacos Llenos Con Material Granular	lun 25/11/24	jue 12/12/24	15 d	$ 26.764.986	0,00%	0,00%	$ 0
507	1.3.4.5.1.14.	Geotextil Fortex	sáb 30/11/24	jue 12/12/24	10 d	$ 26.041.668	0,00%	0,00%	$ 0
508	1.3.4.5.1.14.	Relleno con Ceniza	mié 27/11/24	sáb 14/12/24	15 d	$ 27.488.360	0,00%	0,00%	$ 0
509	**1.3.4.5.1.14.**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 7/12/24**	**jue 19/12/24**	**10 d**	**$ 14.328.817**	0,00%	0,00%	**$ 0**
510	**1.3.4.5.1.14.**	**Dobelas**	**sáb 7/12/24**	**lun 9/12/24**	**1 d**	**$ 1.729.865**	0,00%	0,00%	**$ 0**
511	1.3.4.5.1.14.	Acero	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
512	**1.3.4.5.1.14.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**lun 9/12/24**	**mié 11/12/24**	**2 d**	**$ 11.083.152**	0,00%	0,00%	**$ 0**
513	1.3.4.5.1.14.	Concreto	mar 10/12/24	mié 11/12/24	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
514	1.3.4.5.1.14.	Bloque en Concreto	lun 9/12/24	mié 11/12/24	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
515	**1.3.4.5.1.14.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 16/12/24**	**jue 19/12/24**	**3 d**	**$ 789.125**	0,00%	0,00%	**$ 0**
516	1.3.4.5.1.14.	Concreto	mié 18/12/24	jue 19/12/24	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
517	1.3.4.5.1.14.	Bloque en Concreto	lun 16/12/24	jue 19/12/24	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
518	**1.3.4.5.1.14.**	**Viga de Amarre**	**mié 11/12/24**	**lun 16/12/24**	**4 d**	**$ 726.675**	0,00%	0,00%	**$ 0**
519	1.3.4.5.1.14.	Acero	mié 11/12/24	vie 13/12/24	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
520	1.3.4.5.1.14.	Concreto	vie 13/12/24	lun 16/12/24	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
521	*1.3.4.5.1.15*	*Fin de Eje 7-8*	*jue 19/12/24*	*jue 19/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
522	**1.3.4.5.1.16**	**EJE 8-9**	**mar 8/10/24**	**jue 9/01/25**	**71,75 d**	**$ 190.383.447**	0,00%	0,00%	**$ 0**
523	1.3.4.5.1.16.	Excavación	vie 29/11/24	jue 9/01/25	30,75 d	$ 1.589.280	0,00%	0,00%	$ 0
524	1.3.4.5.1.16.	Pilotes FDP	mar 8/10/24	mié 9/10/24	2 d	$ 31.000.000	0,00%	0,00%	$ 0
525	1.3.4.5.1.16.	Mejoramiento con Rajón	jue 17/10/24	lun 21/10/24	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
526	**1.3.4.5.1.16.**	**Estructura**	**sáb 9/11/24**	**sáb 14/12/24**	**28,5 d**	**$ 35.996.350**	0,00%	0,00%	**$ 0**
527	**1.3.4.5.1.16.**	**Zapatas**	**sáb 9/11/24**	**mar 19/11/24**	**7 d**	**$ 13.521.985**	0,00%	0,00%	**$ 0**
528	1.3.4.5.1.16.	Solado	sáb 9/11/24	mié 13/11/24	2 d	$ 24.985	0,00%	0,00%	$ 0
529	1.3.4.5.1.16.	Acero	mié 13/11/24	vie 15/11/24	2 d	$ 7.800.000	0,00%	0,00%	$ 0
530	1.3.4.5.1.16.	Concreto	vie 15/11/24	mar 19/11/24	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
531	**1.3.4.5.1.16.**	**Vigas de Cimentación**	**mié 13/11/24**	**vie 22/11/24**	**8 d**	**$ 4.630.320**	0,00%	0,00%	**$ 0**
532	1.3.4.5.1.16.	Acero	mié 13/11/24	sáb 16/11/24	3 d	$ 2.098.320	0,00%	0,00%	$ 0
533	1.3.4.5.1.16.	Concreto	sáb 16/11/24	vie 22/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
534	**1.3.4.5.1.16.**	**Columnas**	**mié 13/11/24**	**jue 28/11/24**	**13 d**	**$ 6.022.955**	0,00%	0,00%	**$ 0**
535	1.3.4.5.1.16.	Acero	mié 13/11/24	sáb 16/11/24	3 d	$ 3.490.955	0,00%	0,00%	$ 0
536	1.3.4.5.1.16.	Concreto	vie 22/11/24	jue 28/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
537	**1.3.4.5.1.16.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 5.385.965**	0,00%	0,00%	**$ 0**
538	1.3.4.5.1.16.	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 2.853.965	0,00%	0,00%	$ 0
539	1.3.4.5.1.16.	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
540	**1.3.4.5.1.16.**	**Vigas Transversales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 6.435.125**	0,00%	0,00%	**$ 0**
541	1.3.4.5.1.16.	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 3.903.125	0,00%	0,00%	$ 0
542	1.3.4.5.1.16.	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
543	**1.3.4.5.1.16.**	**Tierra Armada**	**sáb 23/11/24**	**sáb 14/12/24**	**18 d**	**$ 107.060.000**	0,00%	0,00%	**$ 0**
544	1.3.4.5.1.16.	Geomalla de Refuerzo	sáb 23/11/24	mié 11/12/24	15 d	$ 27.289.821	0,00%	0,00%	$ 0
545	1.3.4.5.1.16.	Sacos Llenos Con Material Granular	lun 25/11/24	jue 12/12/24	15 d	$ 27.289.821	0,00%	0,00%	$ 0
546	1.3.4.5.1.16.	Geotextil Fortex	sáb 30/11/24	jue 12/12/24	10 d	$ 26.590.017	0,00%	0,00%	$ 0
547	1.3.4.5.1.16.	Relleno con Ceniza	mié 27/11/24	sáb 14/12/24	15 d	$ 25.890.341	0,00%	0,00%	$ 0
548	**1.3.4.5.1.16.**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 7/12/24**	**vie 27/12/24**	**15 d**	**$ 14.328.817**	0,00%	0,00%	**$ 0**
549	**1.3.4.5.1.16.**	**Dobelas**	**sáb 7/12/24**	**lun 9/12/24**	**1 d**	**$ 1.729.865**	0,00%	0,00%	**$ 0**
550	1.3.4.5.1.16.	Acero	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
551	**1.3.4.5.1.16.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**lun 16/12/24**	**mar 17/12/24**	**2 d**	**$ 11.083.152**	0,00%	0,00%	**$ 0**
552	1.3.4.5.1.16.	Concreto	mar 17/12/24	mar 17/12/24	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
553	1.3.4.5.1.16.	Bloque en Concreto	lun 16/12/24	mar 17/12/24	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
554	**1.3.4.5.1.16.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 23/12/24**	**vie 27/12/24**	**3 d**	**$ 789.125**	0,00%	0,00%	**$ 0**
555	1.3.4.5.1.16.	Concreto	mar 24/12/24	vie 27/12/24	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
556	1.3.4.5.1.16.	Bloque en Concreto	lun 23/12/24	vie 27/12/24	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0

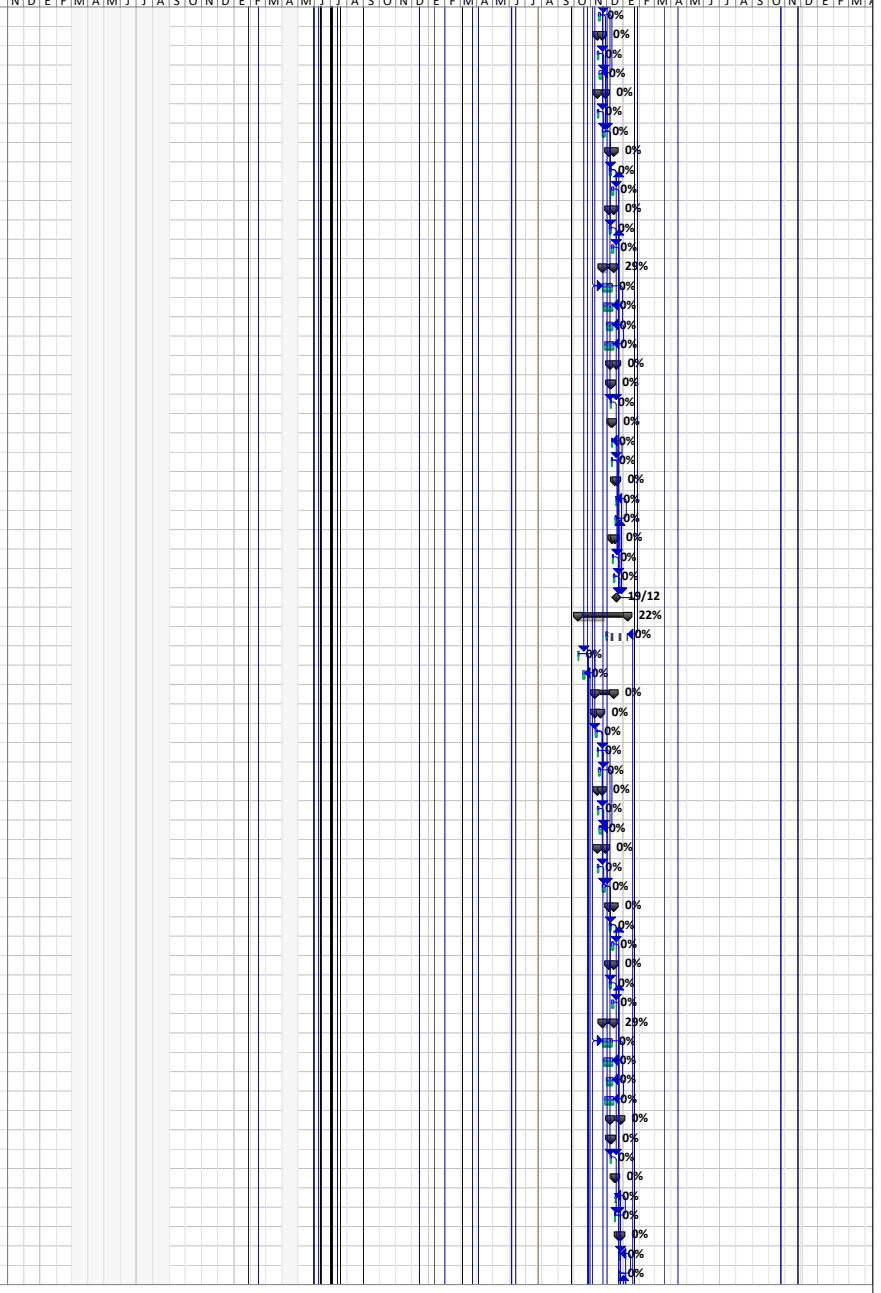


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
557	**1.3.4.5.1.16.**	**Viga de Amarre**	**mié 18/12/24**	**lun 23/12/24**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
558	1.3.4.5.1.16.	Acero	mié 18/12/24	jue 19/12/24	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
559	1.3.4.5.1.16.	Concreto	jue 19/12/24	lun 23/12/24	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
560	*1.3.4.5.1.17*	*Fin de Eje 8-9*	*vie 27/12/24*	*vie 27/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
561	**1.3.4.5.1.18**	**EJE 9-10**	**mar 8/10/24**	**mar 14/01/25**	**74,75 d**	**$ 189.917.627**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
562	1.3.4.5.1.18.	Excavación	vie 10/01/25	mar 14/01/25	3 d	$ 1.589.280	0,00%	0,00%	$ 0
563	1.3.4.5.1.18.	Pilotes FDP	mar 8/10/24	mié 9/10/24	2 d	$ 31.000.000	0,00%	0,00%	$ 0
564	1.3.4.5.1.18.	Mejoramiento con Rajón	lun 21/10/24	jue 24/10/24	3 d	$ 168.000	0,00%	0,00%	$ 0
565	**1.3.4.5.1.18.**	**Estructura**	**sáb 9/11/24**	**jue 26/12/24**	**36,5 d**	**$ 35.771.530**	0,00%	0,00%	**$ 0**
566	**1.3.4.5.1.18.**	**Zapatas**	**sáb 9/11/24**	**mar 19/11/24**	**7 d**	**$ 13.521.985**	0,00%	0,00%	**$ 0**
567	1.3.4.5.1.18.	Solado	sáb 9/11/24	mié 13/11/24	2 d	$ 24.985	0,00%	0,00%	$ 0
568	1.3.4.5.1.18.	Acero	mié 13/11/24	vie 15/11/24	2 d	$ 7.800.000	0,00%	0,00%	$ 0
569	1.3.4.5.1.18.	Concreto	vie 15/11/24	mar 19/11/24	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
570	**1.3.4.5.1.18.**	**Vigas de Cimentación**	**mié 13/11/24**	**vie 22/11/24**	**8 d**	**$ 4.561.625**	0,00%	0,00%	**$ 0**
571	1.3.4.5.1.18.	Acero	mié 13/11/24	sáb 16/11/24	3 d	$ 2.029.625	0,00%	0,00%	$ 0
572	1.3.4.5.1.18.	Concreto	sáb 16/11/24	vie 22/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
573	**1.3.4.5.1.18.**	**Columnas**	**mié 13/11/24**	**jue 28/11/24**	**13 d**	**$ 6.010.465**	0,00%	0,00%	**$ 0**
574	1.3.4.5.1.18.	Acero	mié 13/11/24	sáb 16/11/24	3 d	$ 3.478.465	0,00%	0,00%	$ 0
575	1.3.4.5.1.18.	Concreto	vie 22/11/24	jue 28/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
576	**1.3.4.5.1.18.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 5.248.575**	0,00%	0,00%	**$ 0**
577	1.3.4.5.1.18.	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 2.716.575	0,00%	0,00%	$ 0
578	1.3.4.5.1.18.	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
579	**1.3.4.5.1.18.**	**Vigas Transversales**	**lun 16/12/24**	**jue 26/12/24**	**8 d**	**$ 6.428.880**	0,00%	0,00%	**$ 0**
580	1.3.4.5.1.18.	Acero	lun 16/12/24	mié 18/12/24	3 d	$ 3.896.880	0,00%	0,00%	$ 0
581	1.3.4.5.1.18.	Concreto	jue 19/12/24	jue 26/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
582	**1.3.4.5.1.18.**	**Tierra Armada**	**sáb 23/11/24**	**sáb 14/12/24**	**18 d**	**$ 107.060.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
583	1.3.4.5.1.18.	Geomalla de Refuerzo	sáb 23/11/24	mié 11/12/24	15 d	$ 26.765.005	0,00%	0,00%	$ 0
584	1.3.4.5.1.18.	Sacos Llenos Con Material Granular	lun 25/11/24	jue 12/12/24	15 d	$ 26.765.005	0,00%	0,00%	$ 0
585	1.3.4.5.1.18.	Geotextil Fortex	sáb 30/11/24	jue 12/12/24	10 d	$ 26.112.180	0,00%	0,00%	$ 0
586	1.3.4.5.1.18.	Relleno con Ceniza	mié 27/11/24	sáb 14/12/24	15 d	$ 27.417.810	0,00%	0,00%	$ 0
587	**1.3.4.5.1.18.**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 7/12/24**	**vie 27/12/24**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
588	**1.3.4.5.1.18.**	**Dobelas**	**sáb 7/12/24**	**lun 9/12/24**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
589	1.3.4.5.1.18.	Acero	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
590	**1.3.4.5.1.18.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**lun 16/12/24**	**mar 17/12/24**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
591	1.3.4.5.1.18.	Concreto	mar 17/12/24	mar 17/12/24	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
592	1.3.4.5.1.18.	Bloque en Concreto	lun 16/12/24	mar 17/12/24	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
593	**1.3.4.5.1.18.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 23/12/24**	**vie 27/12/24**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
594	1.3.4.5.1.18.	Concreto	mar 24/12/24	vie 27/12/24	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
595	1.3.4.5.1.18.	Bloque en Concreto	lun 23/12/24	vie 27/12/24	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
596	**1.3.4.5.1.18.**	**Viga de Amarre**	**mié 18/12/24**	**lun 23/12/24**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
597	1.3.4.5.1.18.	Acero	mié 18/12/24	jue 19/12/24	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
598	1.3.4.5.1.18.	Concreto	jue 19/12/24	lun 23/12/24	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
599	*1.3.4.5.1.19*	*Fin de Eje 9-10*	*vie 27/12/24*	*vie 27/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
600	**1.3.4.5.1.20**	**EJE 10-11**	**vie 11/10/24**	**mar 14/01/25**	**71,75 d**	**$ 190.655.662**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
601	1.3.4.5.1.20.	Excavación	vie 10/01/25	mar 14/01/25	3 d	$ 1.589.280	0,00%	0,00%	$ 0
602	1.3.4.5.1.20.	Pilotes FDP	vie 11/10/24	mar 15/10/24	2 d	$ 30.604.000	0,00%	0,00%	$ 0
603	1.3.4.5.1.20.	Mejoramiento con Rajón	lun 21/10/24	jue 24/10/24	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
604	**1.3.4.5.1.20.**	**Estructura**	**jue 14/11/24**	**sáb 14/12/24**	**25,5 d**	**$ 36.664.565**	0,00%	0,00%	**$ 0**
605	**1.3.4.5.1.20.**	**Zapatas**	**jue 14/11/24**	**vie 22/11/24**	**7 d**	**$ 13.803.010**	0,00%	0,00%	**$ 0**
606	1.3.4.5.1.20.	Solado	jue 14/11/24	sáb 16/11/24	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
607	1.3.4.5.1.20.	Acero	sáb 16/11/24	mar 19/11/24	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
608	1.3.4.5.1.20.	Concreto	mar 19/11/24	vie 22/11/24	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
609	**1.3.4.5.1.20.**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 16/11/24**	**mar 26/11/24**	**8 d**	**$ 5.017.510**	0,00%	0,00%	**$ 0**
610	1.3.4.5.1.20.	Acero	sáb 16/11/24	mié 20/11/24	3 d	$ 2.485.510	0,00%	0,00%	$ 0
611	1.3.4.5.1.20.	Concreto	mié 20/11/24	mar 26/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
612	**1.3.4.5.1.20.**	**Columnas**	**sáb 16/11/24**	**lun 2/12/24**	**13 d**	**$ 6.022.955**	0,00%	0,00%	**$ 0**
613	1.3.4.5.1.20.	Acero	sáb 16/11/24	mié 20/11/24	3 d	$ 3.490.955	0,00%	0,00%	$ 0
614	1.3.4.5.1.20.	Concreto	mar 26/11/24	lun 2/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
615	**1.3.4.5.1.20.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 5.392.210**	0,00%	0,00%	**$ 0**
616	1.3.4.5.1.20.	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 2.860.210	0,00%	0,00%	$ 0
617	1.3.4.5.1.20.	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
618	**1.3.4.5.1.20.**	**Vigas Transversales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 6.428.880**	0,00%	0,00%	**$ 0**
619	1.3.4.5.1.20.	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 3.896.880	0,00%	0,00%	$ 0
620	1.3.4.5.1.20.	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
621	**1.3.4.5.1.20.**	**Tierra Armada**	**sáb 23/11/24**	**sáb 14/12/24**	**18 d**	**$ 107.060.000**	0,00%	0,00%	**$ 0**
622	1.3.4.5.1.20.	Geomalla de Refuerzo	sáb 23/11/24	mié 11/12/24	15 d	$ 26.765.006	0,00%	0,00%	$ 0

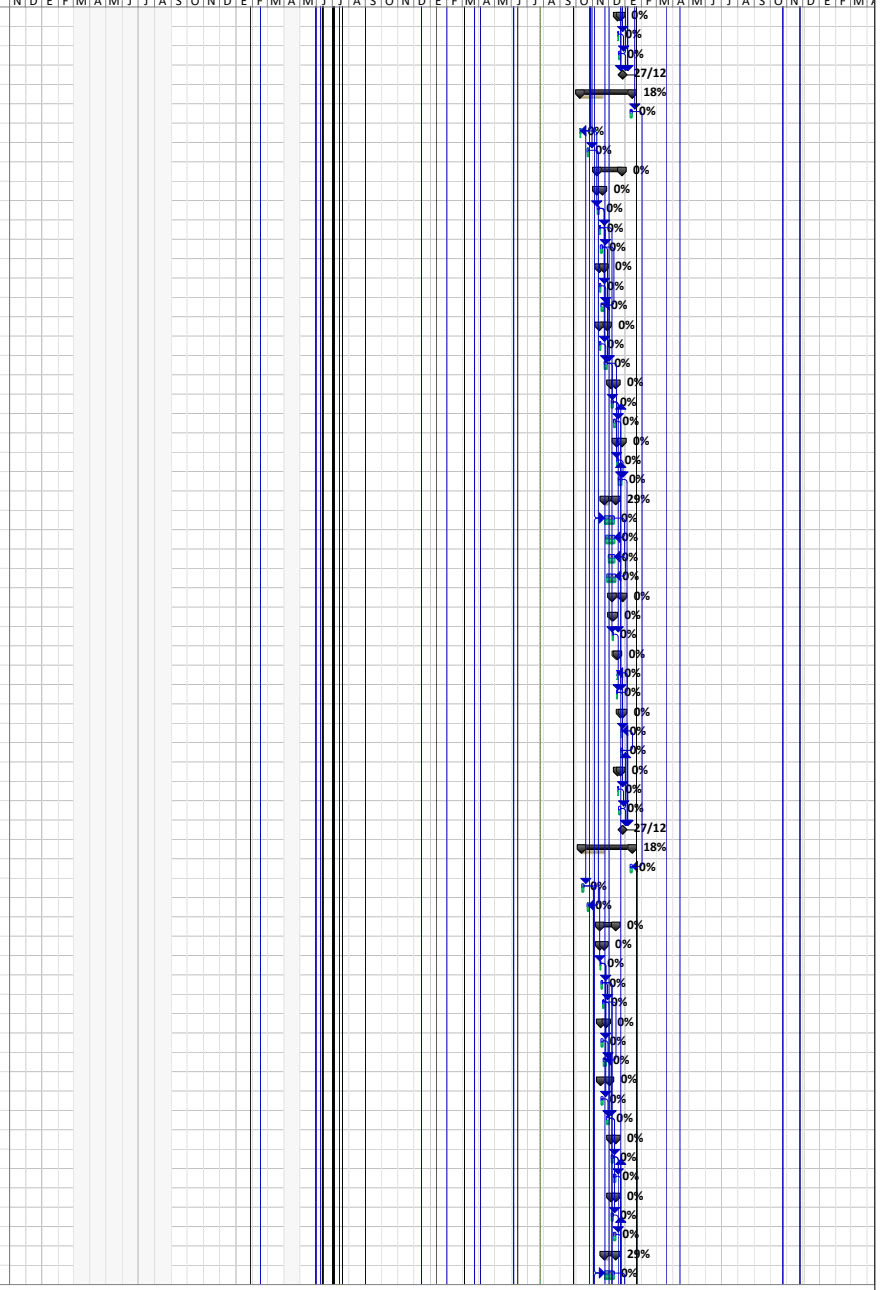

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
623	1.3.4.5.1.20.	Sacos Llenos Con Material Granular	lun 25/11/24	jue 12/12/24	15 d	$ 26.765.006	0,00%	0,00%	$ 0
624	1.3.4.5.1.20.	Geotextil Fortex	sáb 30/11/24	jue 12/12/24	10 d	$ 26.142.540	0,00%	0,00%	$ 0
625	1.3.4.5.1.20.	Relleno con Ceniza	mié 27/11/24	sáb 14/12/24	15 d	$ 27.387.448	0,00%	0,00%	$ 0
626	**1.3.4.5.1.20.**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 7/12/24**	**vie 27/12/24**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
627	**1.3.4.5.1.20.**	**Dobelas**	**sáb 7/12/24**	**lun 9/12/24**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
628	1.3.4.5.1.20.	Acero	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
629	**1.3.4.5.1.20.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**lun 16/12/24**	**mar 17/12/24**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
630	1.3.4.5.1.20.	Concreto	mar 17/12/24	mar 17/12/24	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
631	1.3.4.5.1.20.	Bloque en Concreto	lun 16/12/24	mar 17/12/24	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
632	**1.3.4.5.1.20.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 23/12/24**	**vie 27/12/24**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
633	1.3.4.5.1.20.	Concreto	mar 24/12/24	vie 27/12/24	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
634	1.3.4.5.1.20.	Bloque en Concreto	lun 23/12/24	vie 27/12/24	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
635	**1.3.4.5.1.20.**	**Viga de Amarre**	**mié 18/12/24**	**lun 23/12/24**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
636	1.3.4.5.1.20.	Acero	mié 18/12/24	jue 19/12/24	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
637	1.3.4.5.1.20.	Concreto	jue 19/12/24	lun 23/12/24	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
638	*1.3.4.5.1.21*	*Fin de Eje 10-11*	*vie 27/12/24*	*vie 27/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
639	**1.3.4.5.1.22**	**EJE 11-12**	**vie 11/10/24**	**mié 15/01/25**	**72,75 d**	**$ 190.199.777**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
640	1.3.4.5.1.22.	Excavación	mar 14/01/25	mié 15/01/25	1 d	$ 1.589.280	0,00%	0,00%	$ 0
641	1.3.4.5.1.22.	Pilotes FDP	vie 11/10/24	mar 15/10/24	2 d	$ 30.604.000	0,00%	0,00%	$ 0
642	1.3.4.5.1.22.	Mejoramiento con Rajón	jue 24/10/24	lun 28/10/24	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
643	**1.3.4.5.1.22.**	**Estructura**	**jue 14/11/24**	**sáb 14/12/24**	**25,5 d**	**$ 36.208.680**	0,00%	0,00%	**$ 0**
644	**1.3.4.5.1.22.**	**Zapatas**	**jue 14/11/24**	**vie 22/11/24**	**7 d**	**$ 13.803.010**	0,00%	0,00%	**$ 0**
645	1.3.4.5.1.22.	Solado	jue 14/11/24	sáb 16/11/24	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
646	1.3.4.5.1.22.	Acero	sáb 16/11/24	mar 19/11/24	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
647	1.3.4.5.1.22.	Concreto	mar 19/11/24	vie 22/11/24	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
648	**1.3.4.5.1.22.**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 16/11/24**	**mar 26/11/24**	**8 d**	**$ 4.742.730**	0,00%	0,00%	**$ 0**
649	1.3.4.5.1.22.	Acero	sáb 16/11/24	mié 20/11/24	3 d	$ 2.210.730	0,00%	0,00%	$ 0
650	1.3.4.5.1.22.	Concreto	mié 20/11/24	mar 26/11/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
651	**1.3.4.5.1.22.**	**Columnas**	**sáb 16/11/24**	**lun 2/12/24**	**13 d**	**$ 6.022.955**	0,00%	0,00%	**$ 0**
652	1.3.4.5.1.22.	Acero	sáb 16/11/24	mié 20/11/24	3 d	$ 3.490.955	0,00%	0,00%	$ 0
653	1.3.4.5.1.22.	Concreto	mar 26/11/24	lun 2/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
654	**1.3.4.5.1.22.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 4.767.710**	0,00%	0,00%	**$ 0**
655	1.3.4.5.1.22.	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 2.235.710	0,00%	0,00%	$ 0
656	1.3.4.5.1.22.	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
657	**1.3.4.5.1.22.**	**Vigas Transversales**	**jue 5/12/24**	**sáb 14/12/24**	**8 d**	**$ 6.872.275**	0,00%	0,00%	**$ 0**
658	1.3.4.5.1.22.	Acero	jue 5/12/24	lun 9/12/24	3 d	$ 4.340.275	0,00%	0,00%	$ 0
659	1.3.4.5.1.22.	Concreto	lun 9/12/24	sáb 14/12/24	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
660	**1.3.4.5.1.22.**	**Tierra armada**	**sáb 23/11/24**	**sáb 14/12/24**	**18 d**	**$ 107.060.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
661	1.3.4.5.1.22.	Geomalla de Refuerzo	sáb 23/11/24	mié 11/12/24	15 d	$ 26.765.010	0,00%	0,00%	$ 0
662	1.3.4.5.1.22.	Sacos Llenos Con Material Granular	lun 25/11/24	jue 12/12/24	15 d	$ 26.765.010	0,00%	0,00%	$ 0
663	1.3.4.5.1.22.	Geotextil Fortex	sáb 30/11/24	jue 12/12/24	10 d	$ 26.170.232	0,00%	0,00%	$ 0
664	1.3.4.5.1.22.	Relleno con Ceniza	mié 27/11/24	sáb 14/12/24	15 d	$ 27.359.748	0,00%	0,00%	$ 0
665	**1.3.4.5.1.22.**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 7/12/24**	**vie 27/12/24**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
666	**1.3.4.5.1.22.**	**Dobelas**	**sáb 7/12/24**	**lun 9/12/24**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
667	1.3.4.5.1.22.	Acero	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
668	**1.3.4.5.1.22.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**lun 16/12/24**	**mar 17/12/24**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
669	1.3.4.5.1.22.	Concreto	mar 17/12/24	mar 17/12/24	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
670	1.3.4.5.1.22.	Bloque en Concreto	lun 16/12/24	mar 17/12/24	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
671	**1.3.4.5.1.22.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 23/12/24**	**vie 27/12/24**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
672	1.3.4.5.1.22.	Concreto	mar 24/12/24	vie 27/12/24	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
673	1.3.4.5.1.22.	Bloque en Concreto	lun 23/12/24	vie 27/12/24	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
674	**1.3.4.5.1.22.**	**Viga de Amarre**	**mié 18/12/24**	**lun 23/12/24**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
675	1.3.4.5.1.22.	Acero	mié 18/12/24	jue 19/12/24	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
676	1.3.4.5.1.22.	Concreto	jue 19/12/24	lun 23/12/24	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
677	*1.3.4.5.1.23*	*Fin de Eje 11-12*	*vie 27/12/24*	*vie 27/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
678	**1.3.4.5.1.24**	**PAVIMENTO**	**mié 22/01/25**	**mar 25/02/25**	**28 d**	**$ 349.717.706**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
679	1.3.4.5.1.24.	Subbase	mié 22/01/25	jue 6/02/25	13 d	$ 101.866.925	0,00%	0,00%	$ 0
680	1.3.4.5.1.24.	Base	vie 7/02/25	sáb 22/02/25	13 d	$ 104.982.171	0,00%	0,00%	$ 0
681	1.3.4.5.1.24.	Mezcla Asfaltica - GCR	sáb 22/02/25	lun 24/02/25	1 d	$ 107.465.110	0,00%	0,00%	$ 0
682	1.3.4.5.1.24.	Mezcla Asfaltica - MD12	lun 24/02/25	mar 25/02/25	1 d	$ 35.403.500	0,00%	0,00%	$ 0
683	1.3.4.5.1.25	Baranda Vehicular	sáb 22/02/25	mié 19/03/25	20 d	$ 338.624.580	0,00%	0,00%	$ 0
684	*1.3.4.5.2*	*Fin de Aproche Oriental*	*mié 19/03/25*	*mié 19/03/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
685	**1.3.4.5.3**	**OREJA ORIENTAL**	**mié 19/03/25**	**mié 24/09/25**	**146 d**	**$ 2.019.056.601**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
686	1.3.4.5.3.1	Demolición	mié 19/03/25	mar 1/04/25	10 d	$ 4.129.834	0,00%	0,00%	$ 0
687	**1.3.4.5.3.2**	**EJE 1-2**	**mié 2/04/25**	**sáb 5/07/25**	**72 d**	**$ 55.374.193**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
688	1.3.4.5.3.2.1	Excavación	mié 11/06/25	vie 13/06/25	2 d	$ 1.455.544	0,00%	0,00%	$ 0

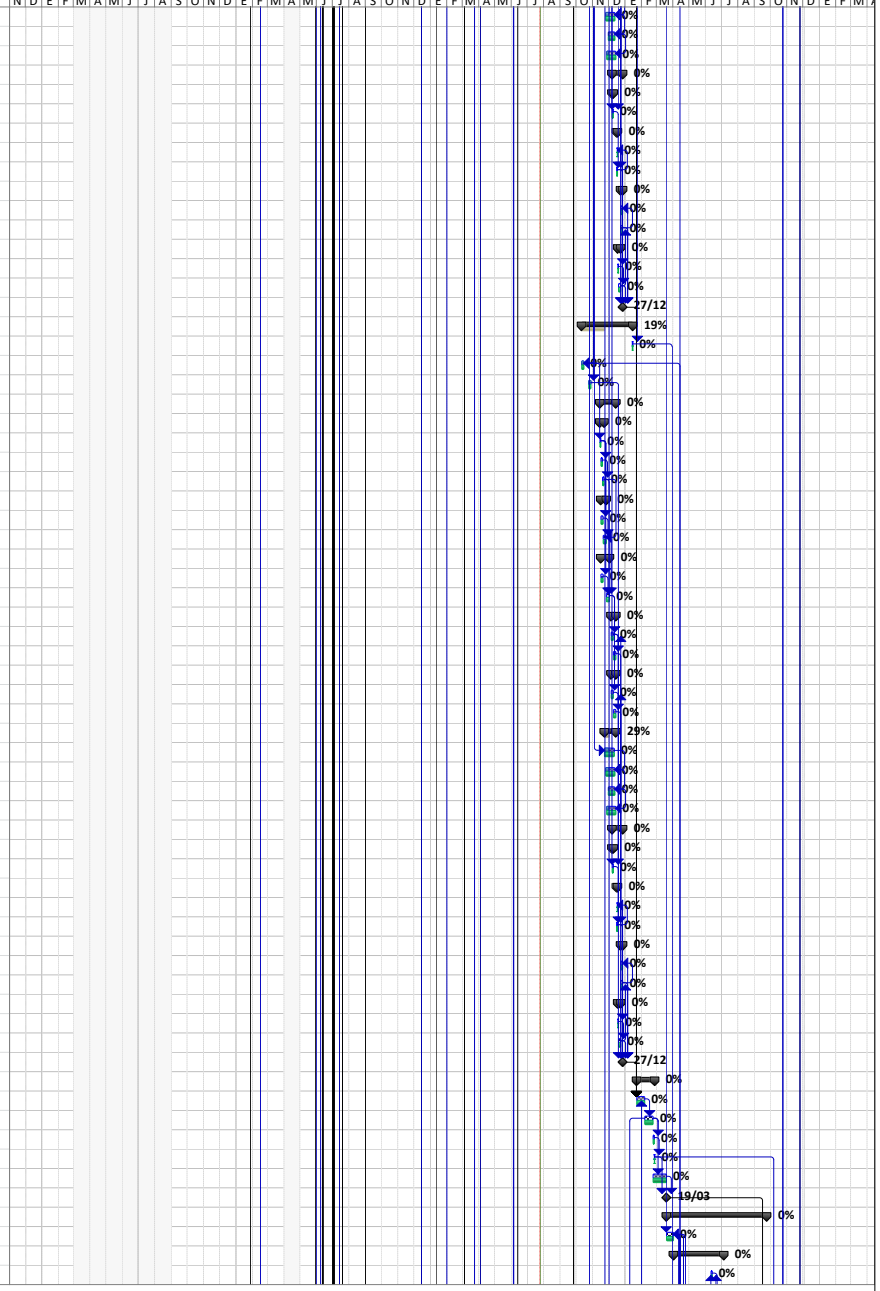

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
689	1.3.4.5.3.2.2	Mejoramiento de Subrasante	mié 2/04/25	lun 7/04/25	4 d	$ 255.544	0,00%	0,00%	$ 0
690	**1.3.4.5.3.2.3**	**Estructura**	**jue 10/04/25**	**sáb 5/07/25**	**65 d**	**$ 53.663.105**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
691	**1.3.4.5.3.2.3**	**Zapatas**	**jue 10/04/25**	**lun 21/04/25**	**7 d**	**$ 16.335.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
692	1.3.4.5.3.2.3	Solado	jue 10/04/25	sáb 12/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
693	1.3.4.5.3.2.3	Acero	sáb 12/04/25	mar 15/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
694	1.3.4.5.3.2.3	Concreto	mar 15/04/25	lun 21/04/25	3 d	$ 8.229.000	0,00%	0,00%	$ 0
695	**1.3.4.5.3.2.3**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 12/04/25**	**jue 24/04/25**	**8 d**	**$ 6.735.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
696	1.3.4.5.3.2.3	Acero	sáb 12/04/25	mié 16/04/25	3 d	$ 2.304.405	0,00%	0,00%	$ 0
697	1.3.4.5.3.2.3	Concreto	mié 16/04/25	jue 24/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
698	**1.3.4.5.3.2.3**	**Columnas**	**sáb 12/04/25**	**mié 30/04/25**	**13 d**	**$ 7.909.465**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
699	1.3.4.5.3.2.3	Acero	sáb 12/04/25	mié 16/04/25	3 d	$ 3.478.465	0,00%	0,00%	$ 0
700	1.3.4.5.3.2.3	Concreto	jue 24/04/25	mié 30/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
701	**1.3.4.5.3.2.3**	**Vigas Longitudinales**	**vie 23/05/25**	**mié 4/06/25**	**8 d**	**$ 7.522.275**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
702	1.3.4.5.3.2.3	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 3.091.275	0,00%	0,00%	$ 0
703	1.3.4.5.3.2.3	Concreto	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
704	**1.3.4.5.3.2.3**	**Vigas Transversales**	**vie 23/05/25**	**mié 4/06/25**	**8 d**	**$ 8.327.880**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
705	1.3.4.5.3.2.3	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 3.896.880	0,00%	0,00%	$ 0
706	1.3.4.5.3.2.3	Concreto	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
707	**1.3.4.5.3.2.3**	**Placa de Concreto**	**mar 27/05/25**	**sáb 5/07/25**	**30 d**	**$ 6.833.070**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
708	1.3.4.5.3.2.3	Acero	mar 27/05/25	sáb 14/06/25	15 d	$ 3.035.070	0,00%	0,00%	$ 0
709	1.3.4.5.3.2.3	Concreto	sáb 14/06/25	sáb 5/07/25	15 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
710	*1.3.4.5.3.3*	*Fin de Eje 1-2*	*sáb 5/07/25*	*sáb 5/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
711	**1.3.4.5.3.4**	**EJE 2-3**	**mar 1/04/25**	**vie 20/06/25**	**63 d**	**$ 164.884.551**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
712	1.3.4.5.3.4.1	Excavación	mié 16/04/25	sáb 10/05/25	17 d	$ 1.455.544	0,00%	0,00%	$ 0
713	1.3.4.5.3.4.2	Pilotes FDP	sáb 10/05/25	lun 12/05/25	1 d	$ 42.830.000	0,00%	0,00%	$ 0
714	1.3.4.5.3.4.3	Mejoramiento con Rajón	mar 1/04/25	mar 1/04/25	1 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
715	**1.3.4.5.3.4.4**	**Estructura**	**jue 15/05/25**	**lun 16/06/25**	**25 d**	**$ 42.526.190**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
716	**1.3.4.5.3.4.4**	**Zapatas**	**jue 15/05/25**	**vie 23/05/25**	**7 d**	**$ 15.069.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
717	1.3.4.5.3.4.4	Solado	jue 15/05/25	sáb 17/05/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
718	1.3.4.5.3.4.4	Acero	sáb 17/05/25	mié 21/05/25	3 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
719	1.3.4.5.3.4.4	Concreto	mié 21/05/25	vie 23/05/25	2 d	$ 6.963.000	0,00%	0,00%	$ 0
720	**1.3.4.5.3.4.4**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 17/05/25**	**sáb 24/05/25**	**6 d**	**$ 6.027.465**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
721	1.3.4.5.3.4.4	Acero	sáb 17/05/25	jue 22/05/25	4 d	$ 2.229.465	0,00%	0,00%	$ 0
722	1.3.4.5.3.4.4	Concreto	jue 22/05/25	sáb 24/05/25	2 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
723	**1.3.4.5.3.4.4**	**Columnas**	**sáb 17/05/25**	**vie 6/06/25**	**15 d**	**$ 7.282.710**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
724	1.3.4.5.3.4.4	Acero	sáb 17/05/25	mar 27/05/25	8 d	$ 3.484.710	0,00%	0,00%	$ 0
725	1.3.4.5.3.4.4	Concreto	mié 28/05/25	vie 6/06/25	7 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
726	**1.3.4.5.3.4.4**	**Vigas Longitudinales**	**vie 6/06/25**	**lun 16/06/25**	**8 d**	**$ 6.452.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
727	1.3.4.5.3.4.4	Acero	vie 6/06/25	mar 10/06/25	3 d	$ 2.654.125	0,00%	0,00%	$ 0
728	1.3.4.5.3.4.4	Concreto	mar 10/06/25	lun 16/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
729	**1.3.4.5.3.4.4**	**Vigas Transversales**	**vie 6/06/25**	**lun 16/06/25**	**8 d**	**$ 7.694.880**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
730	1.3.4.5.3.4.4	Acero	vie 6/06/25	mar 10/06/25	3 d	$ 3.896.880	0,00%	0,00%	$ 0
731	1.3.4.5.3.4.4	Concreto	mar 10/06/25	lun 16/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
732	**1.3.4.5.3.4.5**	**Tierra armada**	**jue 24/04/25**	**mié 4/06/25**	**31 d**	**$ 63.335.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
733	1.3.4.5.3.4.5	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 15.833.739	0,00%	0,00%	$ 0
734	1.3.4.5.3.4.5	Sacos Llenos Con Material Granular	jue 24/04/25	vie 30/05/25	29 d	$ 15.833.739	0,00%	0,00%	$ 0
735	1.3.4.5.3.4.5	Geotextil Fortex	vie 25/04/25	vie 30/05/25	28 d	$ 15.287.792	0,00%	0,00%	$ 0
736	1.3.4.5.3.4.5	Relleno con Ceniza	vie 25/04/25	mié 4/06/25	30 d	$ 16.379.730	0,00%	0,00%	$ 0
737	**1.3.4.5.3.4.6**	**Fachada en Mampostería**	**lun 9/06/25**	**vie 20/06/25**	**10 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
738	**1.3.4.5.3.4.6**	**Dobelas**	**lun 9/06/25**	**mar 10/06/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
739	1.3.4.5.3.4.6	Acero	lun 9/06/25	mar 10/06/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
740	**1.3.4.5.3.4.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mar 10/06/25**	**jue 12/06/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
741	1.3.4.5.3.4.6	Concreto	mié 11/06/25	jue 12/06/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
742	1.3.4.5.3.4.6	Bloque en Concreto	mar 10/06/25	jue 12/06/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
743	**1.3.4.5.3.4.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mar 17/06/25**	**vie 20/06/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
744	1.3.4.5.3.4.6	Concreto	mié 18/06/25	vie 20/06/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
745	1.3.4.5.3.4.6	Bloque en Concreto	mar 17/06/25	vie 20/06/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
746	**1.3.4.5.3.4.6**	**Viga de Amarre**	**jue 12/06/25**	**mar 17/06/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
747	1.3.4.5.3.4.6	Acero	jue 12/06/25	sáb 14/06/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
748	1.3.4.5.3.4.6	Concreto	sáb 14/06/25	mar 17/06/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
749	*1.3.4.5.3.5*	*Fin de Eje 2-3*	*vie 20/06/25*	*vie 20/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
750	**1.3.4.5.3.6**	**EJE 3-4**	**vie 4/04/25**	**sáb 14/06/25**	**55 d**	**$ 165.293.031**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
751	1.3.4.5.3.6.1	Excavación	lun 14/04/25	mié 16/04/25	2 d	$ 1.455.544	0,00%	0,00%	$ 0
752	1.3.4.5.3.6.2	Pilotes FDP	vie 2/05/25	lun 5/05/25	2 d	$ 42.589.000	0,00%	0,00%	$ 0
753	1.3.4.5.3.6.3	Mejoramiento con Rajón	vie 4/04/25	mié 9/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
754	**1.3.4.5.3.6.4**	**Estructura**	**jue 8/05/25**	**vie 6/06/25**	**23 d**	**$ 43.175.670**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**

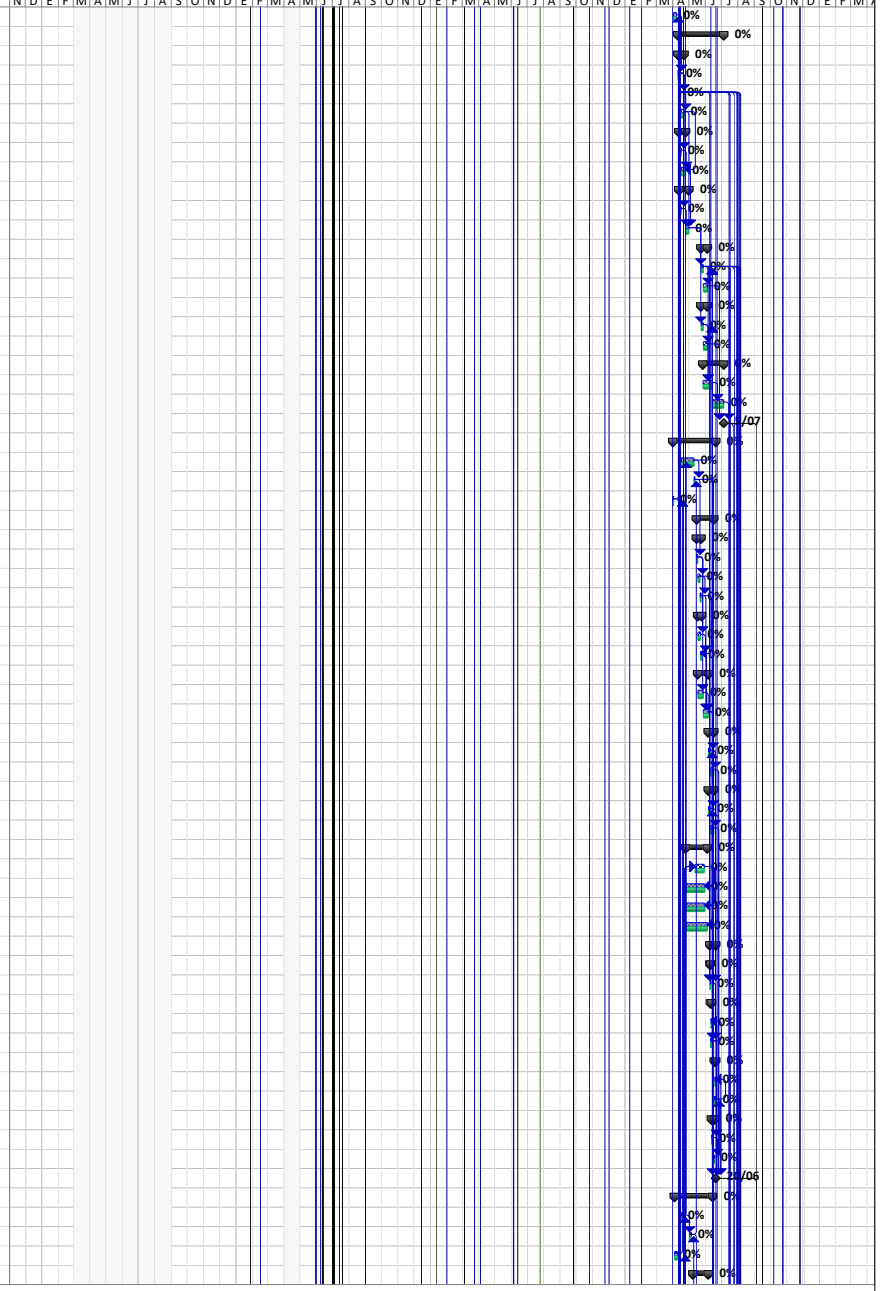

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
755	**1.3.4.5.3.6.4**	**Zapatas**	**jue 8/05/25**	**vie 16/05/25**	**7 d**	**$ 15.069.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
756	1.3.4.5.3.6.4	Solado	jue 8/05/25	sáb 10/05/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
757	1.3.4.5.3.6.4	Acero	sáb 10/05/25	mar 13/05/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
758	1.3.4.5.3.6.4	Concreto	mar 13/05/25	vie 16/05/25	3 d	$ 6.963.000	0,00%	0,00%	$ 0
759	**1.3.4.5.3.6.4**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 10/05/25**	**mar 20/05/25**	**8 d**	**$ 5.971.260**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
760	1.3.4.5.3.6.4	Acero	sáb 10/05/25	mié 14/05/25	3 d	$ 2.173.260	0,00%	0,00%	$ 0
761	1.3.4.5.3.6.4	Concreto	mié 14/05/25	mar 20/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
762	**1.3.4.5.3.6.4**	**Columnas**	**sáb 10/05/25**	**lun 26/05/25**	**13 d**	**$ 7.276.465**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
763	1.3.4.5.3.6.4	Acero	sáb 10/05/25	mié 14/05/25	3 d	$ 3.478.465	0,00%	0,00%	$ 0
764	1.3.4.5.3.6.4	Concreto	mar 20/05/25	lun 26/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
765	**1.3.4.5.3.6.4**	**Vigas Longitudinales**	**mar 27/05/25**	**vie 6/06/25**	**8 d**	**$ 6.701.925**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
766	1.3.4.5.3.6.4	Acero	mar 27/05/25	jue 29/05/25	3 d	$ 2.903.925	0,00%	0,00%	$ 0
767	1.3.4.5.3.6.4	Concreto	vie 30/05/25	vie 6/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
768	**1.3.4.5.3.6.4**	**Vigas Transversales**	**mar 27/05/25**	**vie 6/06/25**	**8 d**	**$ 8.157.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
769	1.3.4.5.3.6.4	Acero	mar 27/05/25	jue 29/05/25	3 d	$ 4.359.010	0,00%	0,00%	$ 0
770	1.3.4.5.3.6.4	Concreto	vie 30/05/25	vie 6/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
771	**1.3.4.5.3.6.5**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 63.335.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
772	1.3.4.5.3.6.5	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 15.833.746	0,00%	0,00%	$ 0
773	1.3.4.5.3.6.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 15.833.746	0,00%	0,00%	$ 0
774	1.3.4.5.3.6.5	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 15.322.980	0,00%	0,00%	$ 0
775	1.3.4.5.3.6.5	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 16.344.528	0,00%	0,00%	$ 0
776	**1.3.4.5.3.6.6**	**Fachada en Mampostería**	**jue 29/05/25**	**sáb 14/06/25**	**13 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
777	**1.3.4.5.3.6.6**	**Dobelas**	**jue 29/05/25**	**jue 29/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
778	1.3.4.5.3.6.6	Acero	jue 29/05/25	jue 29/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
779	**1.3.4.5.3.6.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mié 4/06/25**	**vie 6/06/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
780	1.3.4.5.3.6.6	Concreto	jue 5/06/25	vie 6/06/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
781	1.3.4.5.3.6.6	Bloque en Concreto	mié 4/06/25	vie 6/06/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
782	**1.3.4.5.3.6.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mié 11/06/25**	**sáb 14/06/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
783	1.3.4.5.3.6.6	Concreto	jue 12/06/25	sáb 14/06/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
784	1.3.4.5.3.6.6	Bloque en Concreto	mié 11/06/25	sáb 14/06/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
785	**1.3.4.5.3.6.6**	**Viga de Amarre**	**vie 6/06/25**	**mié 11/06/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
786	1.3.4.5.3.6.6	Acero	vie 6/06/25	lun 9/06/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
787	1.3.4.5.3.6.6	Concreto	lun 9/06/25	mié 11/06/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
788	*1.3.4.5.3.7*	*Fin de Eje 3-4*	*sáb 14/06/25*	*sáb 14/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
789	**1.3.4.5.3.8**	**EJE 4-5**	**mié 9/04/25**	**sáb 14/06/25**	**51 d**	**$ 164.780.941**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
790	1.3.4.5.3.8.1	Excavación	vie 11/04/25	lun 14/04/25	2 d	$ 1.455.544	0,00%	0,00%	$ 0
791	1.3.4.5.3.8.2	Pilotes FDP	mar 29/04/25	mié 30/04/25	2 d	$ 42.589.000	0,00%	0,00%	$ 0
792	1.3.4.5.3.8.3	Mejoramiento con Rajón	mié 9/04/25	lun 14/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
793	**1.3.4.5.3.8.4**	**Estructura**	**mar 6/05/25**	**mié 4/06/25**	**23 d**	**$ 42.663.580**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
794	**1.3.4.5.3.8.4**	**Zapatas**	**mar 6/05/25**	**mié 14/05/25**	**7 d**	**$ 15.069.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
795	1.3.4.5.3.8.4	Solado	mar 6/05/25	jue 8/05/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
796	1.3.4.5.3.8.4	Acero	jue 8/05/25	sáb 10/05/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
797	1.3.4.5.3.8.4	Concreto	sáb 10/05/25	mié 14/05/25	3 d	$ 6.963.000	0,00%	0,00%	$ 0
798	**1.3.4.5.3.8.4**	**Vigas de Cimentación**	**jue 8/05/25**	**sáb 17/05/25**	**8 d**	**$ 6.077.425**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
799	1.3.4.5.3.8.4	Acero	jue 8/05/25	lun 12/05/25	3 d	$ 2.279.425	0,00%	0,00%	$ 0
800	1.3.4.5.3.8.4	Concreto	lun 12/05/25	sáb 17/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
801	**1.3.4.5.3.8.4**	**Columnas**	**jue 8/05/25**	**vie 23/05/25**	**13 d**	**$ 7.282.710**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
802	1.3.4.5.3.8.4	Acero	jue 8/05/25	lun 12/05/25	3 d	$ 3.484.710	0,00%	0,00%	$ 0
803	1.3.4.5.3.8.4	Concreto	sáb 17/05/25	vie 23/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
804	**1.3.4.5.3.8.4**	**Vigas Longitudinales**	**vie 23/05/25**	**mié 4/06/25**	**8 d**	**$ 6.539.555**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
805	1.3.4.5.3.8.4	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 2.741.555	0,00%	0,00%	$ 0
806	1.3.4.5.3.8.4	Concreto	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
807	**1.3.4.5.3.8.4**	**Vigas Transversales**	**vie 23/05/25**	**mié 4/06/25**	**8 d**	**$ 7.694.880**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
808	1.3.4.5.3.8.4	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 3.896.880	0,00%	0,00%	$ 0
809	1.3.4.5.3.8.4	Concreto	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
810	**1.3.4.5.3.8.5**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 63.335.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
811	1.3.4.5.3.8.5	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 15.833.763	0,00%	0,00%	$ 0
812	1.3.4.5.3.8.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 15.833.763	0,00%	0,00%	$ 0
813	1.3.4.5.3.8.5	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 15.353.900	0,00%	0,00%	$ 0
814	1.3.4.5.3.8.5	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 16.313.574	0,00%	0,00%	$ 0
815	**1.3.4.5.3.8.6**	**Fachada en Mampostería**	**mar 27/05/25**	**sáb 14/06/25**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
816	**1.3.4.5.3.8.6**	**Dobelas**	**mar 27/05/25**	**mar 27/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
817	1.3.4.5.3.8.6	Acero	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
818	**1.3.4.5.3.8.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mié 4/06/25**	**vie 6/06/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
819	1.3.4.5.3.8.6	Concreto	jue 5/06/25	vie 6/06/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
820	1.3.4.5.3.8.6	Bloque en Concreto	mié 4/06/25	vie 6/06/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0

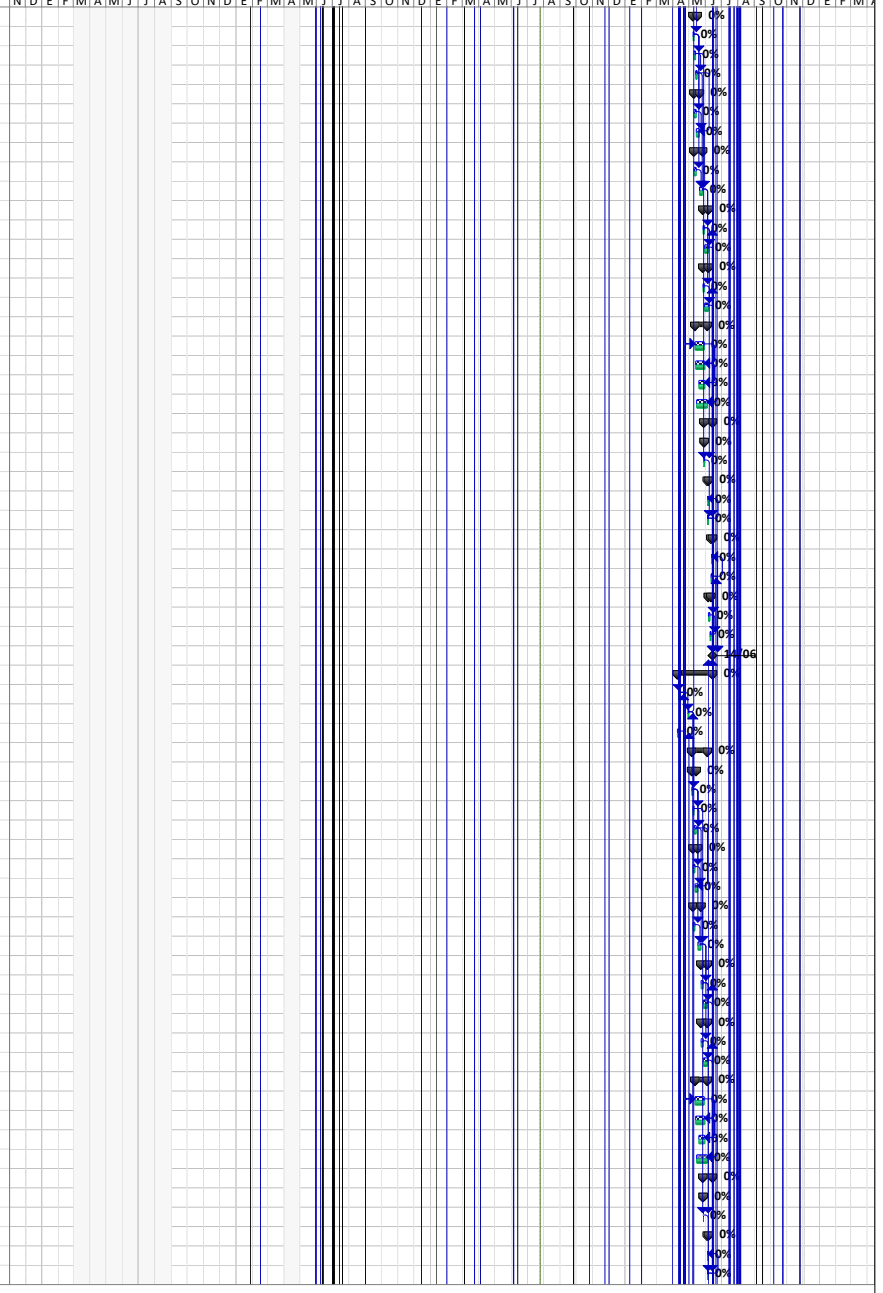

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
821	**1.3.4.5.3.8.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mié 11/06/25**	**sáb 14/06/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
822	1.3.4.5.3.8.6	Concreto	jue 12/06/25	sáb 14/06/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
823	1.3.4.5.3.8.6	Bloque en Concreto	mié 11/06/25	sáb 14/06/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
824	**1.3.4.5.3.8.6**	**Viga de Amarre**	**vie 6/06/25**	**mié 11/06/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
825	1.3.4.5.3.8.6	Acero	vie 6/06/25	lun 9/06/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
826	1.3.4.5.3.8.6	Concreto	lun 9/06/25	mié 11/06/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
827	*1.3.4.5.3.9*	*Fin de Eje 4-5*	*sáb 14/06/25*	*sáb 14/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
828	**1.3.4.5.3.10**	**EJE 5-6**	**mié 9/04/25**	**sáb 14/06/25**	**51 d**	**$ 201.656.792**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
829	1.3.4.5.3.10.	Excavación	mié 9/04/25	vie 11/04/25	2 d	$ 1.447.768	0,00%	0,00%	$ 0
830	1.3.4.5.3.10.	Pilotes FDP	vie 25/04/25	lun 28/04/25	2 d	$ 79.035.712	0,00%	0,00%	$ 0
831	1.3.4.5.3.10.	Mejoramiento con Rajón	lun 14/04/25	lun 21/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
832	**1.3.4.5.3.10.**	**Estructura**	**sáb 3/05/25**	**mié 4/06/25**	**25 d**	**$ 43.100.495**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
833	**1.3.4.5.3.10.**	**Zapatas**	**sáb 3/05/25**	**lun 12/05/25**	**7 d**	**$ 15.075.020**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
834	1.3.4.5.3.10.	Solado	sáb 3/05/25	mar 6/05/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
835	1.3.4.5.3.10.	Acero	mar 6/05/25	jue 8/05/25	2 d	$ 8.106.010	0,00%	0,00%	$ 0
836	1.3.4.5.3.10.	Concreto	jue 8/05/25	lun 12/05/25	3 d	$ 6.963.000	0,00%	0,00%	$ 0
837	**1.3.4.5.3.10.**	**Vigas de Cimentación**	**mar 6/05/25**	**jue 15/05/25**	**8 d**	**$ 6.102.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
838	1.3.4.5.3.10.	Acero	mar 6/05/25	vie 9/05/25	3 d	$ 2.304.405	0,00%	0,00%	$ 0
839	1.3.4.5.3.10.	Concreto	vie 9/05/25	jue 15/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
840	**1.3.4.5.3.10.**	**Columnas**	**mar 6/05/25**	**mié 21/05/25**	**13 d**	**$ 7.288.955**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
841	1.3.4.5.3.10.	Acero	mar 6/05/25	vie 9/05/25	3 d	$ 3.490.955	0,00%	0,00%	$ 0
842	1.3.4.5.3.10.	Concreto	jue 15/05/25	mié 21/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
843	**1.3.4.5.3.10.**	**Vigas Longitudinales**	**vie 23/05/25**	**mié 4/06/25**	**8 d**	**$ 6.726.905**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
844	1.3.4.5.3.10.	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 2.928.905	0,00%	0,00%	$ 0
845	1.3.4.5.3.10.	Concreto	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
846	**1.3.4.5.3.10.**	**Vigas Transversales**	**vie 23/05/25**	**mié 4/06/25**	**8 d**	**$ 7.907.210**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
847	1.3.4.5.3.10.	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 4.109.210	0,00%	0,00%	$ 0
848	1.3.4.5.3.10.	Concreto	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
849	**1.3.4.5.3.10.**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 63.335.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
850	1.3.4.5.3.10.	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 15.833.755	0,00%	0,00%	$ 0
851	1.3.4.5.3.10.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 15.833.755	0,00%	0,00%	$ 0
852	1.3.4.5.3.10.	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 15.381.342	0,00%	0,00%	$ 0
853	1.3.4.5.3.10.	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 16.286.148	0,00%	0,00%	$ 0
854	**1.3.4.5.3.10.**	**Fachada en Mampostería**	**mar 27/05/25**	**sáb 14/06/25**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
855	**1.3.4.5.3.10.**	**Dobelas**	**mar 27/05/25**	**mar 27/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
856	1.3.4.5.3.10.	Acero	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
857	**1.3.4.5.3.10.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mié 4/06/25**	**vie 6/06/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
858	1.3.4.5.3.10.	Concreto	jue 5/06/25	vie 6/06/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
859	1.3.4.5.3.10.	Bloque en Concreto	mié 4/06/25	vie 6/06/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
860	**1.3.4.5.3.10.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mié 11/06/25**	**sáb 14/06/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
861	1.3.4.5.3.10.	Concreto	jue 12/06/25	sáb 14/06/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
862	1.3.4.5.3.10.	Bloque en Concreto	mié 11/06/25	sáb 14/06/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
863	**1.3.4.5.3.10.**	**Viga de Amarre**	**vie 6/06/25**	**mié 11/06/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
864	1.3.4.5.3.10.	Acero	vie 6/06/25	lun 9/06/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
865	1.3.4.5.3.10.	Concreto	lun 9/06/25	mié 11/06/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
866	*1.3.4.5.3.11*	*Fin de Eje 5-6*	*sáb 14/06/25*	*sáb 14/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
867	**1.3.4.5.3.12**	**EJE 6-7**	**lun 7/04/25**	**sáb 14/06/25**	**53 d**	**$ 164.743.065**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
868	1.3.4.5.3.12.	Excavación	lun 7/04/25	mié 9/04/25	2 d	$ 1.447.768	0,00%	0,00%	$ 0
869	1.3.4.5.3.12.	Pilotes FDP	mié 23/04/25	vie 25/04/25	2 d	$ 42.434.000	0,00%	0,00%	$ 0
870	1.3.4.5.3.12.	Mejoramiento con Rajón	mar 22/04/25	sáb 26/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
871	**1.3.4.5.3.12.**	**Estructura**	**mié 30/04/25**	**mié 4/06/25**	**27 d**	**$ 42.788.480**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
872	**1.3.4.5.3.12.**	**Zapatas**	**mié 30/04/25**	**vie 9/05/25**	**7 d**	**$ 15.069.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
873	1.3.4.5.3.12.	Solado	mié 30/04/25	vie 2/05/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
874	1.3.4.5.3.12.	Acero	sáb 3/05/25	mar 6/05/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
875	1.3.4.5.3.12.	Concreto	mar 6/05/25	vie 9/05/25	3 d	$ 6.963.000	0,00%	0,00%	$ 0
876	**1.3.4.5.3.12.**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 3/05/25**	**mar 13/05/25**	**8 d**	**$ 6.202.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
877	1.3.4.5.3.12.	Acero	sáb 3/05/25	mié 7/05/25	3 d	$ 2.404.325	0,00%	0,00%	$ 0
878	1.3.4.5.3.12.	Concreto	mié 7/05/25	mar 13/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
879	**1.3.4.5.3.12.**	**Columnas**	**sáb 3/05/25**	**lun 19/05/25**	**13 d**	**$ 7.257.730**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
880	1.3.4.5.3.12.	Acero	sáb 3/05/25	mié 7/05/25	3 d	$ 3.459.730	0,00%	0,00%	$ 0
881	1.3.4.5.3.12.	Concreto	mar 13/05/25	lun 19/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
882	**1.3.4.5.3.12.**	**Vigas Longitudinales**	**vie 23/05/25**	**mié 4/06/25**	**8 d**	**$ 6.539.555**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
883	1.3.4.5.3.12.	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 2.741.555	0,00%	0,00%	$ 0
884	1.3.4.5.3.12.	Concreto	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
885	**1.3.4.5.3.12.**	**Vigas Transversales**	**vie 23/05/25**	**mié 4/06/25**	**8 d**	**$ 7.719.860**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
886	1.3.4.5.3.12.	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 3.921.860	0,00%	0,00%	$ 0

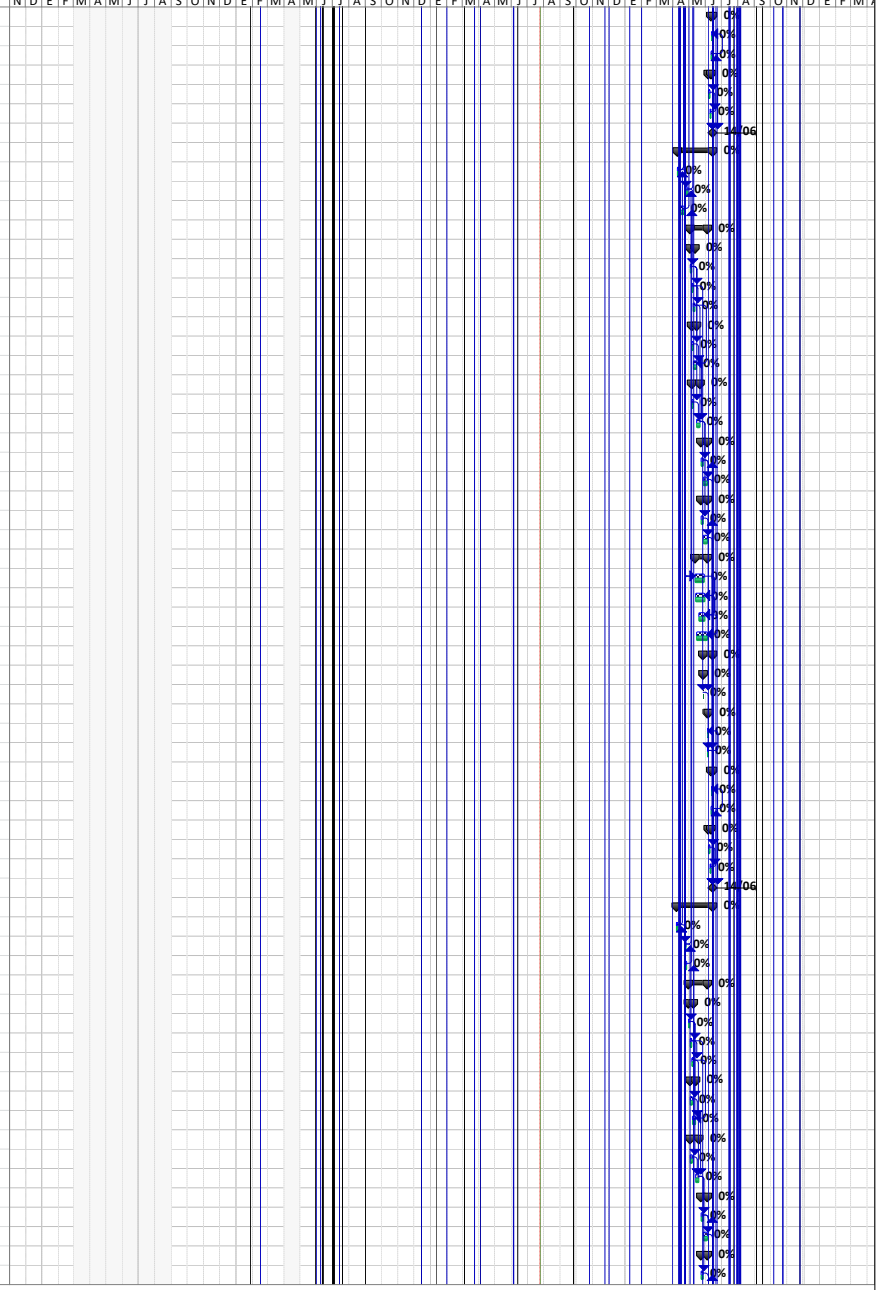

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
887	1.3.4.5.3.12.	Concreto	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
888	**1.3.4.5.3.12.**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 63.335.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
889	1.3.4.5.3.12.	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 15.833.743	0,00%	0,00%	$ 0
890	1.3.4.5.3.12.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 15.833.743	0,00%	0,00%	$ 0
891	1.3.4.5.3.12.	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 15.405.832	0,00%	0,00%	$ 0
892	1.3.4.5.3.12.	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 16.261.682	0,00%	0,00%	$ 0
893	**1.3.4.5.3.12.**	**Fachada en Mampostería**	**mar 27/05/25**	**sáb 14/06/25**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
894	**1.3.4.5.3.12.**	**Dobelas**	**mar 27/05/25**	**mar 27/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
895	1.3.4.5.3.12.	Acero	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
896	**1.3.4.5.3.12.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mié 4/06/25**	**vie 6/06/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
897	1.3.4.5.3.12.	Concreto	jue 5/06/25	vie 6/06/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
898	1.3.4.5.3.12.	Bloque en Concreto	mié 4/06/25	vie 6/06/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
899	**1.3.4.5.3.12.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mié 11/06/25**	**sáb 14/06/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
900	1.3.4.5.3.12.	Concreto	jue 12/06/25	sáb 14/06/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
901	1.3.4.5.3.12.	Bloque en Concreto	mié 11/06/25	sáb 14/06/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
902	**1.3.4.5.3.12.**	**Viga de Amarre**	**vie 6/06/25**	**mié 11/06/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
903	1.3.4.5.3.12.	Acero	vie 6/06/25	lun 9/06/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
904	1.3.4.5.3.12.	Concreto	lun 9/06/25	mié 11/06/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
905	*1.3.4.5.3.1:*	*Fin de Eje 6-7*	*sáb 14/06/25*	*sáb 14/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
906	**1.3.4.5.3.14**	**EJE 7-8**	**vie 4/04/25**	**sáb 14/06/25**	**55 d**	**$ 198.813.054**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
907	1.3.4.5.3.14.	Excavación	vie 4/04/25	lun 7/04/25	2 d	$ 1.396.452	0,00%	0,00%	$ 0
908	1.3.4.5.3.14.	Pilotes FDP	lun 21/04/25	mié 23/04/25	2 d	$ 42.434.000	0,00%	0,00%	$ 0
909	1.3.4.5.3.14.	Mejoramiento con Rajón	vie 25/04/25	mié 30/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
910	**1.3.4.5.3.14.**	**Estructura**	**lun 28/04/25**	**mié 4/06/25**	**29 d**	**$ 76.909.785**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
911	**1.3.4.5.3.14.**	**Zapatas**	**lun 28/04/25**	**mié 7/05/25**	**7 d**	**$ 15.069.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
912	1.3.4.5.3.14.	Solado	lun 28/04/25	mar 29/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
913	1.3.4.5.3.14.	Acero	mié 30/04/25	vie 2/05/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
914	1.3.4.5.3.14.	Concreto	sáb 3/05/25	mié 7/05/25	3 d	$ 6.963.000	0,00%	0,00%	$ 0
915	**1.3.4.5.3.14.**	**Vigas de Cimentación**	**mié 30/04/25**	**sáb 10/05/25**	**8 d**	**$ 6.008.730**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
916	1.3.4.5.3.14.	Acero	mié 30/04/25	lun 5/05/25	3 d	$ 2.210.730	0,00%	0,00%	$ 0
917	1.3.4.5.3.14.	Concreto	lun 5/05/25	sáb 10/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
918	**1.3.4.5.3.14.**	**Columnas**	**mié 30/04/25**	**vie 16/05/25**	**13 d**	**$ 41.541.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
919	1.3.4.5.3.14.	Acero	mié 30/04/25	lun 5/05/25	3 d	$ 3.553.405	0,00%	0,00%	$ 0
920	1.3.4.5.3.14.	Concreto	sáb 10/05/25	vie 16/05/25	5 d	$ 37.988.000	0,00%	0,00%	$ 0
921	**1.3.4.5.3.14.**	**Vigas Longitudinales**	**vie 23/05/25**	**mié 4/06/25**	**8 d**	**$ 6.458.370**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
922	1.3.4.5.3.14.	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 2.660.370	0,00%	0,00%	$ 0
923	1.3.4.5.3.14.	Concreto	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
924	**1.3.4.5.3.14.**	**Vigas Transversales**	**vie 23/05/25**	**mié 4/06/25**	**8 d**	**$ 7.832.270**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
925	1.3.4.5.3.14.	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 4.034.270	0,00%	0,00%	$ 0
926	1.3.4.5.3.14.	Concreto	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
927	**1.3.4.5.3.14.**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 63.335.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
928	1.3.4.5.3.14.	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 16.144.206	0,00%	0,00%	$ 0
929	1.3.4.5.3.14.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 16.144.206	0,00%	0,00%	$ 0
930	1.3.4.5.3.14.	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 15.730.290	0,00%	0,00%	$ 0
931	1.3.4.5.3.14.	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 15.316.298	0,00%	0,00%	$ 0
932	**1.3.4.5.3.14.**	**Fachada en Mampostería**	**mar 27/05/25**	**sáb 14/06/25**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
933	**1.3.4.5.3.14.**	**Dobelas**	**mar 27/05/25**	**mar 27/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
934	1.3.4.5.3.14.	Acero	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
935	**1.3.4.5.3.14.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mié 4/06/25**	**vie 6/06/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
936	1.3.4.5.3.14.	Concreto	jue 5/06/25	vie 6/06/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
937	1.3.4.5.3.14.	Bloque en Concreto	mié 4/06/25	vie 6/06/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
938	**1.3.4.5.3.14.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mié 11/06/25**	**sáb 14/06/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
939	1.3.4.5.3.14.	Concreto	jue 12/06/25	sáb 14/06/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
940	1.3.4.5.3.14.	Bloque en Concreto	mié 11/06/25	sáb 14/06/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
941	**1.3.4.5.3.14.**	**Viga de Amarre**	**vie 6/06/25**	**mié 11/06/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
942	1.3.4.5.3.14.	Acero	vie 6/06/25	lun 9/06/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
943	1.3.4.5.3.14.	Concreto	lun 9/06/25	mié 11/06/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
944	*1.3.4.5.3.1:*	*Fin de Eje 7-8*	*sáb 14/06/25*	*sáb 14/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
945	**1.3.4.5.3.16**	**EJE 8-9**	**mié 2/04/25**	**sáb 14/06/25**	**57 d**	**$ 165.203.839**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
946	1.3.4.5.3.16.	Excavación	mié 2/04/25	jue 3/04/25	2 d	$ 1.396.452	0,00%	0,00%	$ 0
947	1.3.4.5.3.16.	Pilotes FDP	mié 16/04/25	lun 21/04/25	2 d	$ 42.434.000	0,00%	0,00%	$ 0
948	1.3.4.5.3.16.	Mejoramiento con Rajón	lun 21/04/25	vie 25/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
949	**1.3.4.5.3.16.**	**Estructura**	**jue 24/04/25**	**mié 4/06/25**	**31 d**	**$ 43.300.570**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
950	**1.3.4.5.3.16.**	**Zapatas**	**jue 24/04/25**	**lun 5/05/25**	**7 d**	**$ 15.069.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
951	1.3.4.5.3.16.	Solado	jue 24/04/25	sáb 26/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
952	1.3.4.5.3.16.	Acero	lun 28/04/25	mar 29/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0

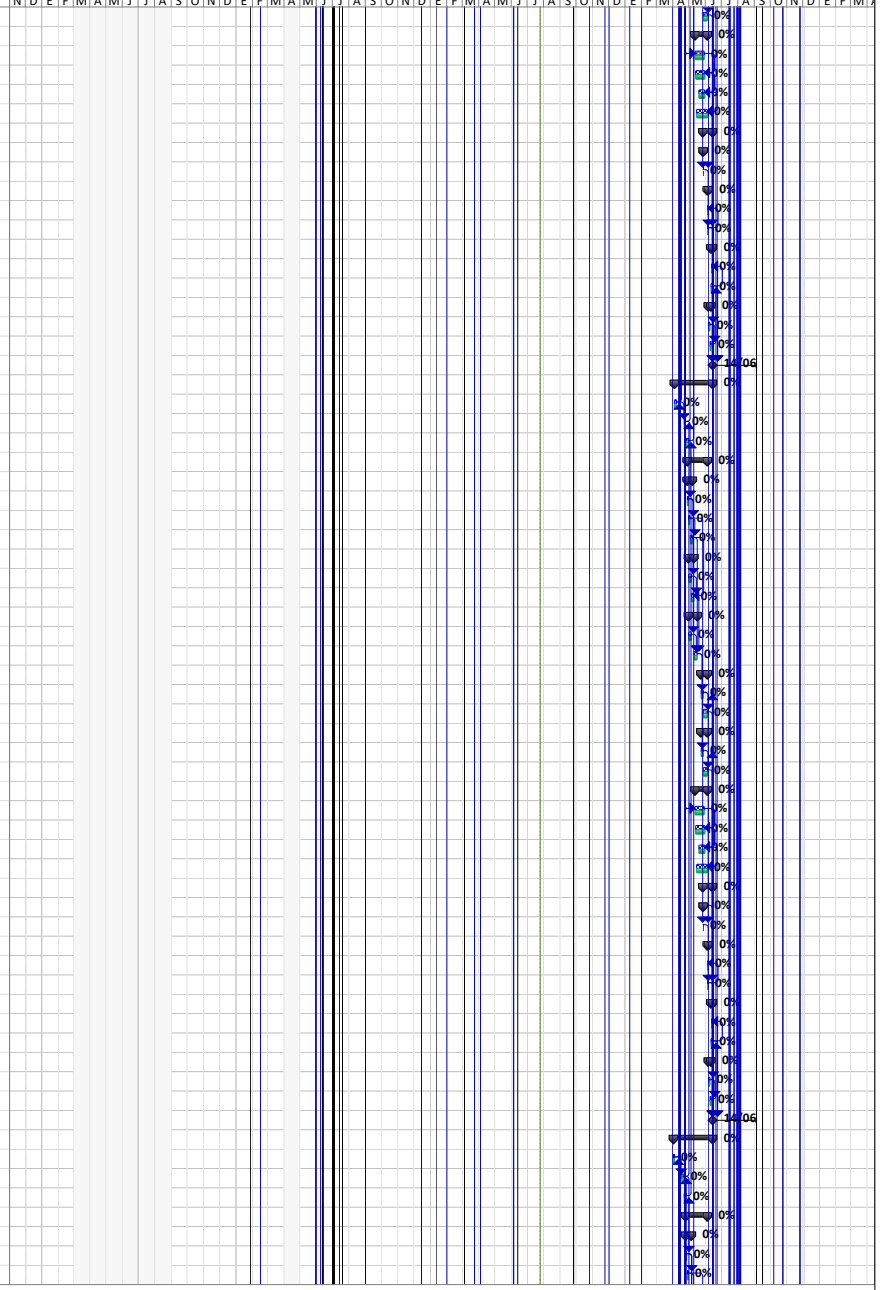


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
953	1.3.4.5.3.16.	Concreto	mié 30/04/25	lun 5/05/25	3 d	$ 6.963.000	0,00%	0,00%	$ 0
954	**1.3.4.5.3.16.**	**Vigas de Cimentación**	**lun 28/04/25**	**jue 8/05/25**	**8 d**	**$ 6.271.020**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
955	1.3.4.5.3.16.	Acero	lun 28/04/25	mié 30/04/25	3 d	$ 2.473.020	0,00%	0,00%	$ 0
956	1.3.4.5.3.16.	Concreto	vie 2/05/25	jue 8/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
957	**1.3.4.5.3.16.**	**Columnas**	**lun 28/04/25**	**mié 14/05/25**	**13 d**	**$ 7.345.160**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
958	1.3.4.5.3.16.	Acero	lun 28/04/25	mié 30/04/25	3 d	$ 3.547.160	0,00%	0,00%	$ 0
959	1.3.4.5.3.16.	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
960	**1.3.4.5.3.16.**	**Vigas Longitudinales**	**vie 23/05/25**	**mié 4/06/25**	**8 d**	**$ 6.514.575**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
961	1.3.4.5.3.16.	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 2.716.575	0,00%	0,00%	$ 0
962	1.3.4.5.3.16.	Concreto	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
963	**1.3.4.5.3.16.**	**Vigas Transversales**	**vie 23/05/25**	**mié 4/06/25**	**8 d**	**$ 8.100.805**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
964	1.3.4.5.3.16.	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 4.302.805	0,00%	0,00%	$ 0
965	1.3.4.5.3.16.	Concreto	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
966	**1.3.4.5.3.16.**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 63.335.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
967	1.3.4.5.3.16.	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 15.833.749	0,00%	0,00%	$ 0
968	1.3.4.5.3.16.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 15.833.749	0,00%	0,00%	$ 0
969	1.3.4.5.3.16.	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 15.447.564	0,00%	0,00%	$ 0
970	1.3.4.5.3.16.	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 16.219.938	0,00%	0,00%	$ 0
971	**1.3.4.5.3.16.**	**Fachada en Mampostería**	**mar 27/05/25**	**sáb 14/06/25**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
972	**1.3.4.5.3.16.**	**Dobelas**	**mar 27/05/25**	**mar 27/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
973	1.3.4.5.3.16.	Acero	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
974	**1.3.4.5.3.16.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mié 4/06/25**	**vie 6/06/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
975	1.3.4.5.3.16.	Concreto	jue 5/06/25	vie 6/06/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
976	1.3.4.5.3.16.	Bloque en Concreto	mié 4/06/25	vie 6/06/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
977	**1.3.4.5.3.16.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mié 11/06/25**	**sáb 14/06/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
978	1.3.4.5.3.16.	Concreto	jue 12/06/25	sáb 14/06/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
979	1.3.4.5.3.16.	Bloque en Concreto	mié 11/06/25	sáb 14/06/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
980	**1.3.4.5.3.16.**	**Viga de Amarre**	**vie 6/06/25**	**mié 11/06/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
981	1.3.4.5.3.16.	Acero	vie 6/06/25	lun 9/06/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
982	1.3.4.5.3.16.	Concreto	lun 9/06/25	mié 11/06/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
983	*1.3.4.5.3.1?*	*Fin de Eje 8-9*	*sáb 14/06/25*	*sáb 14/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
984	**1.3.4.5.3.18**	**EJE 9-10**	**lun 31/03/25**	**sáb 14/06/25**	**59 d**	**$ 165.203.839**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
985	1.3.4.5.3.18.	Excavación	lun 31/03/25	mar 1/04/25	2 d	$ 1.396.452	0,00%	0,00%	$ 0
986	1.3.4.5.3.18.	Pilotes FDP	lun 14/04/25	mié 16/04/25	2 d	$ 42.434.000	0,00%	0,00%	$ 0
987	1.3.4.5.3.18.	Mejoramiento con Rajón	lun 14/04/25	lun 21/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
988	**1.3.4.5.3.18.**	**Estructura**	**mar 22/04/25**	**mié 4/06/25**	**33 d**	**$ 43.300.570**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
989	**1.3.4.5.3.18.**	**Zapatas**	**mar 22/04/25**	**mié 30/04/25**	**7 d**	**$ 15.069.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
990	1.3.4.5.3.18.	Solado	mar 22/04/25	jue 24/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
991	1.3.4.5.3.18.	Acero	jue 24/04/25	sáb 26/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
992	1.3.4.5.3.18.	Concreto	lun 28/04/25	mié 30/04/25	3 d	$ 6.963.000	0,00%	0,00%	$ 0
993	**1.3.4.5.3.18.**	**Vigas de Cimentación**	**jue 24/04/25**	**mar 6/05/25**	**8 d**	**$ 6.271.020**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
994	1.3.4.5.3.18.	Acero	jue 24/04/25	lun 28/04/25	3 d	$ 2.473.020	0,00%	0,00%	$ 0
995	1.3.4.5.3.18.	Concreto	mar 29/04/25	mar 6/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
996	**1.3.4.5.3.18.**	**Columnas**	**jue 24/04/25**	**lun 12/05/25**	**13 d**	**$ 7.345.160**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
997	1.3.4.5.3.18.	Acero	jue 24/04/25	lun 28/04/25	3 d	$ 3.547.160	0,00%	0,00%	$ 0
998	1.3.4.5.3.18.	Concreto	mar 6/05/25	lun 12/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
999	**1.3.4.5.3.18.**	**Vigas Longitudinales**	**vie 23/05/25**	**mié 4/06/25**	**8 d**	**$ 6.514.575**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1000	1.3.4.5.3.18.	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 2.716.575	0,00%	0,00%	$ 0
1001	1.3.4.5.3.18.	Concreto	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
1002	**1.3.4.5.3.18.**	**Vigas Transversales**	**vie 23/05/25**	**mié 4/06/25**	**8 d**	**$ 8.100.805**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1003	1.3.4.5.3.18.	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 4.302.805	0,00%	0,00%	$ 0
1004	1.3.4.5.3.18.	Concreto	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
1005	**1.3.4.5.3.18.**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 63.335.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1006	1.3.4.5.3.18.	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 15.833.761	0,00%	0,00%	$ 0
1007	1.3.4.5.3.18.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 15.833.761	0,00%	0,00%	$ 0
1008	1.3.4.5.3.18.	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 15.465.534	0,00%	0,00%	$ 0
1009	1.3.4.5.3.18.	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 16.201.944	0,00%	0,00%	$ 0
1010	**1.3.4.5.3.18.**	**Fachada en Mampostería**	**mar 27/05/25**	**sáb 14/06/25**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1011	**1.3.4.5.3.18.**	**Dobelas**	**mar 27/05/25**	**mar 27/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1012	1.3.4.5.3.18.	Acero	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1013	**1.3.4.5.3.18.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mié 4/06/25**	**vie 6/06/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1014	1.3.4.5.3.18.	Concreto	jue 5/06/25	vie 6/06/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1015	1.3.4.5.3.18.	Bloque en Concreto	mié 4/06/25	vie 6/06/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
1016	**1.3.4.5.3.18.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mié 11/06/25**	**sáb 14/06/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1017	1.3.4.5.3.18.	Concreto	jue 12/06/25	sáb 14/06/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
1018	1.3.4.5.3.18.	Bloque en Concreto	mié 11/06/25	sáb 14/06/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0

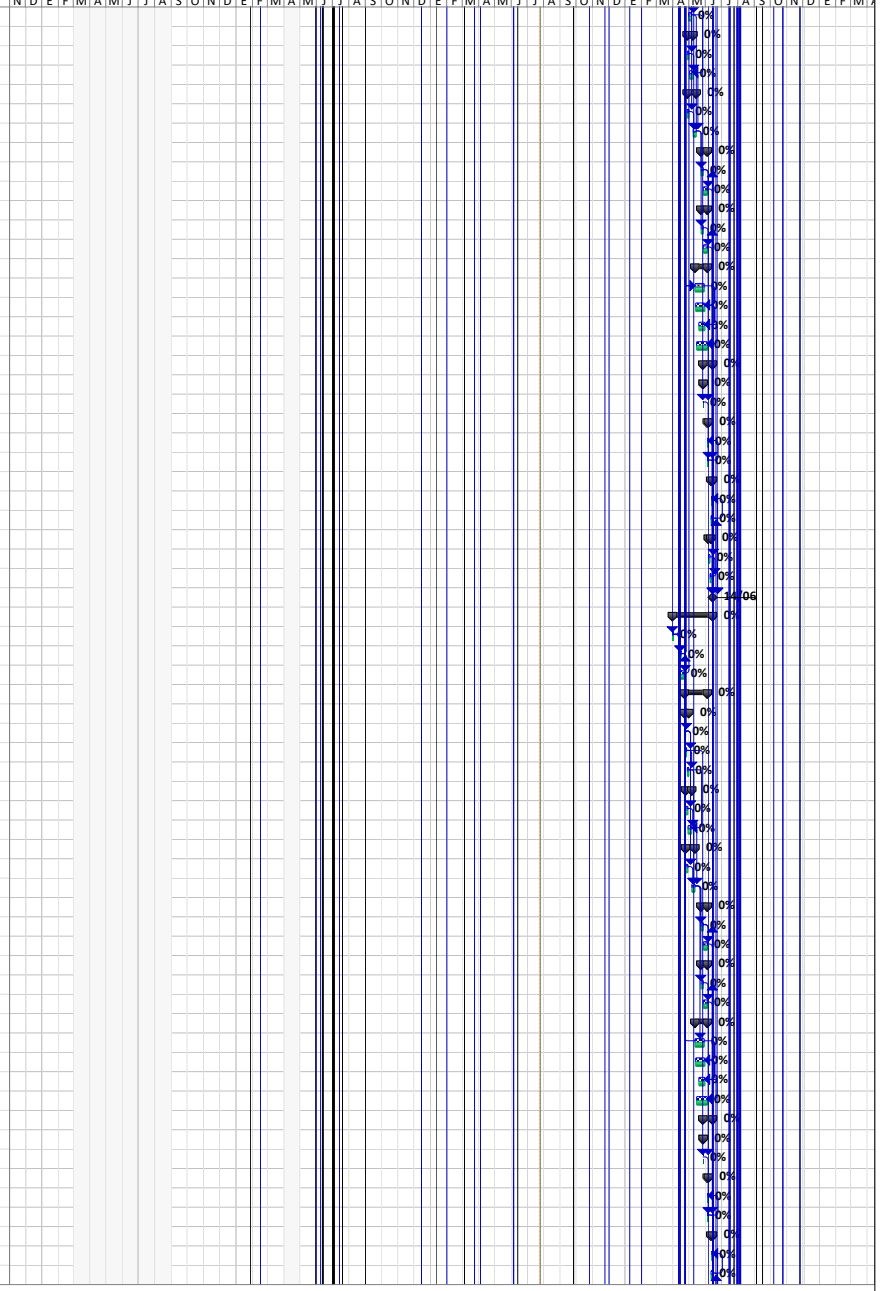


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1019	**1.3.4.5.3.18.**	**Viga de Amarre**	**vie 6/06/25**	**mié 11/06/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1020	1.3.4.5.3.18.	Acero	vie 6/06/25	lun 9/06/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
1021	1.3.4.5.3.18.	Concreto	lun 9/06/25	mié 11/06/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1022	*1.3.4.5.3.19*	*Fin de Eje 9-10*	*sáb 14/06/25*	*sáb 14/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1023	**1.3.4.5.3.20**	**PAVIMENTO**	**jue 4/09/25**	**mié 24/09/25**	**16 d**	**$ 194.719.816**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1024	1.3.4.5.3.20.	Subbase	jue 4/09/25	vie 19/09/25	13 d	$ 3.259.200	0,00%	0,00%	$ 0
1025	1.3.4.5.3.20.	Base	vie 5/09/25	lun 22/09/25	13 d	$ 74.379.725	0,00%	0,00%	$ 0
1026	1.3.4.5.3.20.	Mezcla Asfaltica - GCR	lun 22/09/25	mar 23/09/25	1 d	$ 88.564.541	0,00%	0,00%	$ 0
1027	1.3.4.5.3.20.	Mezcla Asfaltica - MD12	mar 23/09/25	mié 24/09/25	1 d	$ 28.516.350	0,00%	0,00%	$ 0
1028	1.3.4.5.3.21	Baranda Vehicular	mar 16/09/25	lun 22/09/25	5 d	$ 335.399.584	0,00%	0,00%	$ 0
1029	1.3.4.5.3.22	Baranda Peatonal	mar 16/09/25	lun 22/09/25	5 d	$ 38.854.062	0,00%	0,00%	$ 0
1030	*1.3.4.5.4*	*Fin de Oreja Oriental*	*mié 24/09/25*	*mié 24/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1031	**1.3.4.5.5**	**FINAL DE OREJA ORIENTAL**	**mié 2/04/25**	**lun 22/09/25**	**134 d**	**$ 1.893.398.973**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1032	1.3.4.5.5.1	Demolición	lun 14/04/25	lun 28/04/25	10 d	$ 4.233.082	0,00%	0,00%	$ 0
1033	**1.3.4.5.5.2**	**EJE 1"-2"**	**mié 16/04/25**	**jue 14/08/25**	**92 d**	**$ 127.754.492**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1034	1.3.4.5.5.2.1	Excavación	vie 20/06/25	mar 24/06/25	2 d	$ 817.968	0,00%	0,00%	$ 0
1035	1.3.4.5.5.2.2	Pilotes FDP	mar 1/07/25	jue 3/07/25	2 d	$ 46.429.000	0,00%	0,00%	$ 0
1036	1.3.4.5.5.2.3	Mejoramiento con Rajón	mié 16/04/25	mié 23/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1037	**1.3.4.5.5.2.4**	**Estructura**	**vie 11/07/25**	**sáb 9/08/25**	**23 d**	**$ 36.354.707**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1038	**1.3.4.5.5.2.4**	**Zapatas**	**vie 11/07/25**	**sáb 19/07/25**	**7 d**	**$ 13.187.147**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1039	1.3.4.5.5.2.4	Solado	vie 11/07/25	lun 14/07/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1040	1.3.4.5.5.2.4	Acero	lun 14/07/25	mié 16/07/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1041	1.3.4.5.5.2.4	Concreto	mié 16/07/25	sáb 19/07/25	3 d	$ 5.081.137	0,00%	0,00%	$ 0
1042	**1.3.4.5.5.2.4**	**Vigas de Cimentación**	**lun 14/07/25**	**mié 23/07/25**	**8 d**	**$ 5.005.020**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1043	1.3.4.5.5.2.4	Acero	lun 14/07/25	jue 17/07/25	3 d	$ 2.473.020	0,00%	0,00%	$ 0
1044	1.3.4.5.5.2.4	Concreto	jue 17/07/25	mié 23/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1045	**1.3.4.5.5.2.4**	**Columnas**	**lun 14/07/25**	**mié 30/07/25**	**13 d**	**$ 6.079.160**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1046	1.3.4.5.5.2.4	Acero	lun 14/07/25	jue 17/07/25	3 d	$ 3.547.160	0,00%	0,00%	$ 0
1047	1.3.4.5.5.2.4	Concreto	jue 24/07/25	mié 30/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1048	**1.3.4.5.5.2.4**	**Vigas Longitudinales**	**mié 30/07/25**	**sáb 9/08/25**	**8 d**	**$ 5.248.575**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1049	1.3.4.5.5.2.4	Acero	mié 30/07/25	sáb 2/08/25	3 d	$ 2.716.575	0,00%	0,00%	$ 0
1050	1.3.4.5.5.2.4	Concreto	sáb 2/08/25	sáb 9/08/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1051	**1.3.4.5.5.2.4**	**Vigas transversales**	**mié 30/07/25**	**sáb 9/08/25**	**8 d**	**$ 6.834.805**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1052	1.3.4.5.5.2.4	Acero	mié 30/07/25	sáb 2/08/25	3 d	$ 4.302.805	0,00%	0,00%	$ 0
1053	1.3.4.5.5.2.4	Concreto	sáb 2/08/25	sáb 9/08/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1054	**1.3.4.5.5.2.5**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 29.415.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1055	1.3.4.5.5.2.5	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 7.353.759	0,00%	0,00%	$ 0
1056	1.3.4.5.5.2.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 7.353.759	0,00%	0,00%	$ 0
1057	1.3.4.5.5.2.5	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 7.003.580	0,00%	0,00%	$ 0
1058	1.3.4.5.5.2.5	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 7.703.902	0,00%	0,00%	$ 0
1059	**1.3.4.5.5.2.6**	**Fachada en Mampostería**	**vie 1/08/25**	**jue 14/08/25**	**10 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1060	**1.3.4.5.5.2.6**	**Dobelas**	**vie 1/08/25**	**sáb 2/08/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1061	1.3.4.5.5.2.6	Acero	vie 1/08/25	sáb 2/08/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1062	**1.3.4.5.5.2.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**sáb 2/08/25**	**mar 5/08/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1063	1.3.4.5.5.2.6	Concreto	lun 4/08/25	mar 5/08/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1064	1.3.4.5.5.2.6	Bloque en Concreto	sáb 2/08/25	mar 5/08/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
1065	**1.3.4.5.5.2.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 11/08/25**	**jue 14/08/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1066	1.3.4.5.5.2.6	Concreto	mar 12/08/25	jue 14/08/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
1067	1.3.4.5.5.2.6	Bloque en Concreto	lun 11/08/25	jue 14/08/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1068	**1.3.4.5.5.2.6**	**Viga de Amarre**	**mar 5/08/25**	**lun 11/08/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1069	1.3.4.5.5.2.6	Acero	mar 5/08/25	vie 8/08/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
1070	1.3.4.5.5.2.6	Concreto	vie 8/08/25	lun 11/08/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1071	*1.3.4.5.5.3*	*Fin de Eje 1"-2"*	*jue 14/08/25*	*jue 14/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1072	**1.3.4.5.5.4**	**EJE 2"-3"**	**vie 11/04/25**	**mié 6/08/25**	**90 d**	**$ 127.740.890**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1073	1.3.4.5.5.4.1	Excavación	mié 18/06/25	vie 20/06/25	2 d	$ 817.968	0,00%	0,00%	$ 0
1074	1.3.4.5.5.4.2	Pilotes FDP	vie 27/06/25	mar 1/07/25	2 d	$ 46.429.000	0,00%	0,00%	$ 0
1075	1.3.4.5.5.4.3	Mejoramiento con Rajón	vie 11/04/25	mié 16/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1076	**1.3.4.5.5.4.4**	**Estructura**	**vie 4/07/25**	**vie 1/08/25**	**23 d**	**$ 36.606.105**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1077	**1.3.4.5.5.4.4**	**Zapatas**	**vie 4/07/25**	**sáb 12/07/25**	**7 d**	**$ 13.170.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1078	1.3.4.5.5.4.4	Solado	vie 4/07/25	lun 7/07/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1079	1.3.4.5.5.4.4	Acero	lun 7/07/25	mié 9/07/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1080	1.3.4.5.5.4.4	Concreto	mié 9/07/25	sáb 12/07/25	3 d	$ 5.064.000	0,00%	0,00%	$ 0
1081	**1.3.4.5.5.4.4**	**Vigas de Cimentación**	**lun 7/07/25**	**mié 16/07/25**	**8 d**	**$ 5.273.555**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1082	1.3.4.5.5.4.4	Acero	lun 7/07/25	jue 10/07/25	3 d	$ 2.741.555	0,00%	0,00%	$ 0
1083	1.3.4.5.5.4.4	Concreto	jue 10/07/25	mié 16/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1084	**1.3.4.5.5.4.4**	**Columnas**	**lun 7/07/25**	**mar 22/07/25**	**13 d**	**$ 6.079.160**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**

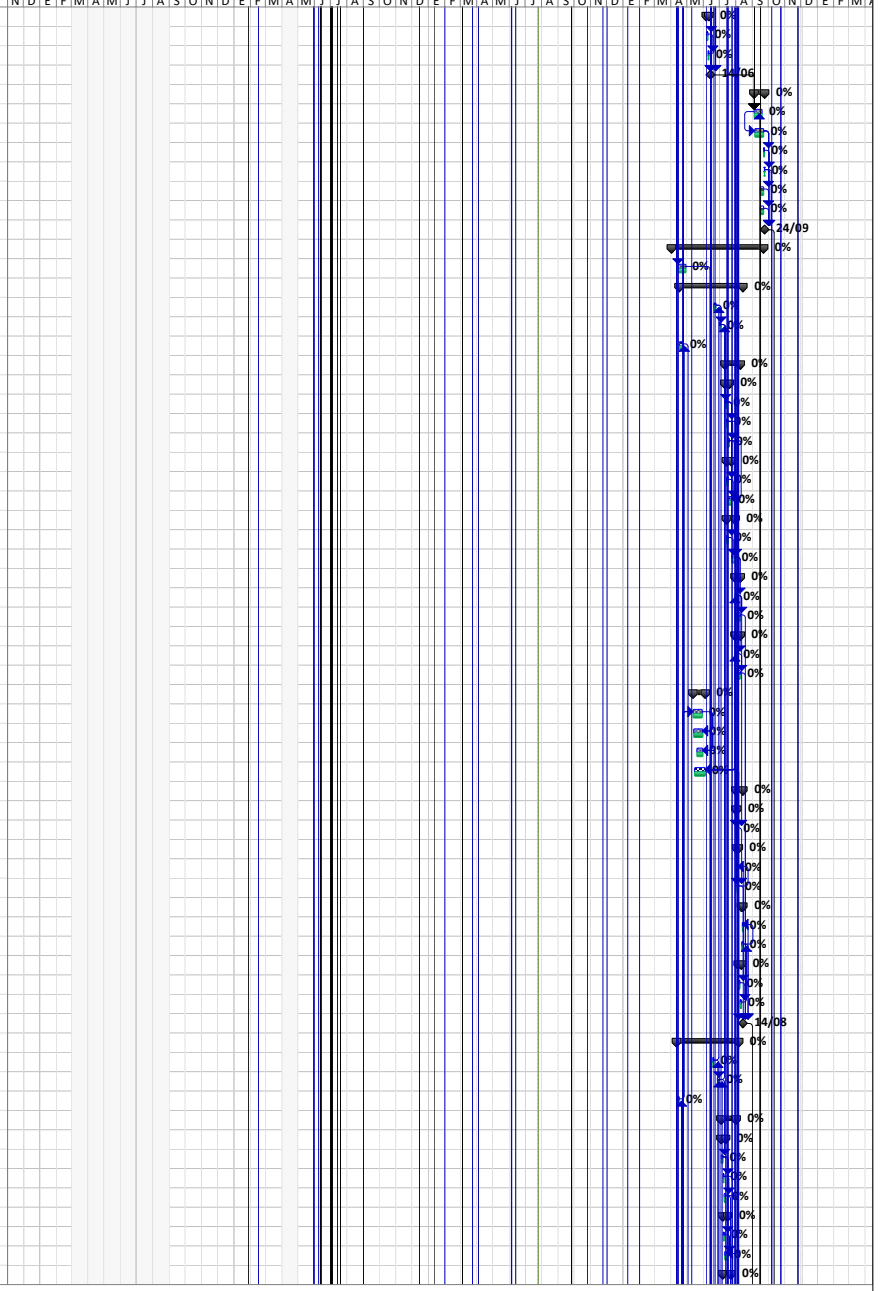

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1085	1.3.4.5.5.4.4	Acero	lun 7/07/25	jue 10/07/25	3 d	$ 3.547.160	0,00%	0,00%	$ 0
1086	1.3.4.5.5.4.4	Concreto	mié 16/07/25	mar 22/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1087	**1.3.4.5.5.4.4**	**Vigas Longitudinales**	**mié 23/07/25**	**vie 1/08/25**	**8 d**	**$ 5.248.575**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1088	1.3.4.5.5.4.4	Acero	mié 23/07/25	vie 25/07/25	3 d	$ 2.716.575	0,00%	0,00%	$ 0
1089	1.3.4.5.5.4.4	Concreto	sáb 26/07/25	vie 1/08/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1090	**1.3.4.5.5.4.4**	**Vigas Transversales**	**mié 23/07/25**	**vie 1/08/25**	**8 d**	**$ 6.834.805**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1091	1.3.4.5.5.4.4	Acero	mié 23/07/25	vie 25/07/25	3 d	$ 4.302.805	0,00%	0,00%	$ 0
1092	1.3.4.5.5.4.4	Concreto	sáb 26/07/25	vie 1/08/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1093	**1.3.4.5.5.4.5**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 29.150.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1094	1.3.4.5.5.4.5	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 7.287.504	0,00%	0,00%	$ 0
1095	1.3.4.5.5.4.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 7.287.504	0,00%	0,00%	$ 0
1096	1.3.4.5.5.4.5	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 6.970.640	0,00%	0,00%	$ 0
1097	1.3.4.5.5.4.5	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 7.604.352	0,00%	0,00%	$ 0
1098	**1.3.4.5.5.4.6**	**Fachada en Mampostería**	**vie 25/07/25**	**mié 6/08/25**	**10 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1099	**1.3.4.5.5.4.6**	**Dobelas**	**vie 25/07/25**	**vie 25/07/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1100	1.3.4.5.5.4.6	Acero	vie 25/07/25	vie 25/07/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1101	**1.3.4.5.5.4.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**sáb 26/07/25**	**mar 29/07/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1102	1.3.4.5.5.4.6	Concreto	lun 28/07/25	mar 29/07/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1103	1.3.4.5.5.4.6	Bloque en Concreto	sáb 26/07/25	mar 29/07/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
1104	**1.3.4.5.5.4.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**sáb 2/08/25**	**mié 6/08/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1105	1.3.4.5.5.4.6	Concreto	lun 4/08/25	mié 6/08/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
1106	1.3.4.5.5.4.6	Bloque en Concreto	sáb 2/08/25	mié 6/08/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1107	**1.3.4.5.5.4.6**	**Viga de Amarre**	**mar 29/07/25**	**sáb 2/08/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1108	1.3.4.5.5.4.6	Acero	mar 29/07/25	jue 31/07/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
1109	1.3.4.5.5.4.6	Concreto	jue 31/07/25	sáb 2/08/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1110	*1.3.4.5.5.5*	*Fin de Eje 2"-3"*	*mié 6/08/25*	*mié 6/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1111	**1.3.4.5.5.6**	**EJE 3"-4"**	**lun 7/04/25**	**mié 30/07/25**	**88 d**	**$ 129.739.290**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1112	1.3.4.5.5.6.1	Excavación	lun 16/06/25	mié 18/06/25	2 d	$ 817.968	0,00%	0,00%	$ 0
1113	1.3.4.5.5.6.2	Pilotes FDP	mié 18/06/25	vie 20/06/25	2 d	$ 46.429.000	0,00%	0,00%	$ 0
1114	1.3.4.5.5.6.3	Mejoramiento con Rajón	lun 7/04/25	vie 11/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1115	**1.3.4.5.5.6.4**	**Estructura**	**jue 26/06/25**	**jue 24/07/25**	**23 d**	**$ 38.604.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1116	**1.3.4.5.5.6.4**	**Zapatas**	**jue 26/06/25**	**sáb 5/07/25**	**7 d**	**$ 13.170.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1117	1.3.4.5.5.6.4	Solado	jue 26/06/25	vie 27/06/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1118	1.3.4.5.5.6.4	Acero	sáb 28/06/25	mié 2/07/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1119	1.3.4.5.5.6.4	Concreto	mié 2/07/25	sáb 5/07/25	3 d	$ 5.064.000	0,00%	0,00%	$ 0
1120	**1.3.4.5.5.6.4**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 28/06/25**	**mié 9/07/25**	**8 d**	**$ 5.560.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1121	1.3.4.5.5.6.4	Acero	sáb 28/06/25	jue 3/07/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1122	1.3.4.5.5.6.4	Concreto	jue 3/07/25	mié 9/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1123	**1.3.4.5.5.6.4**	**Columnas**	**sáb 28/06/25**	**mar 15/07/25**	**13 d**	**$ 6.628.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1124	1.3.4.5.5.6.4	Acero	sáb 28/06/25	jue 3/07/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1125	1.3.4.5.5.6.4	Concreto	mié 9/07/25	mar 15/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1126	**1.3.4.5.5.6.4**	**Vigas longitudinales**	**mar 15/07/25**	**jue 24/07/25**	**8 d**	**$ 5.810.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1127	1.3.4.5.5.6.4	Acero	mar 15/07/25	vie 18/07/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1128	1.3.4.5.5.6.4	Concreto	vie 18/07/25	jue 24/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1129	**1.3.4.5.5.6.4**	**Vigas Transversales**	**mar 15/07/25**	**jue 24/07/25**	**8 d**	**$ 7.434.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1130	1.3.4.5.5.6.4	Acero	mar 15/07/25	vie 18/07/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
1131	1.3.4.5.5.6.4	Concreto	vie 18/07/25	jue 24/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1132	**1.3.4.5.5.6.5**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 29.150.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1133	1.3.4.5.5.6.5	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 7.287.500	0,00%	0,00%	$ 0
1134	1.3.4.5.5.6.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 7.287.500	0,00%	0,00%	$ 0
1135	1.3.4.5.5.6.5	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 6.996.000	0,00%	0,00%	$ 0
1136	1.3.4.5.5.6.5	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 7.579.000	0,00%	0,00%	$ 0
1137	**1.3.4.5.5.6.6**	**Fachada en Mampostería**	**jue 17/07/25**	**mié 30/07/25**	**10 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1138	**1.3.4.5.5.6.6**	**Dobelas**	**jue 17/07/25**	**vie 18/07/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1139	1.3.4.5.5.6.6	Acero	jue 17/07/25	vie 18/07/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1140	**1.3.4.5.5.6.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**vie 18/07/25**	**lun 21/07/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1141	1.3.4.5.5.6.6	Concreto	lun 21/07/25	lun 21/07/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1142	1.3.4.5.5.6.6	Bloque en Concreto	vie 18/07/25	lun 21/07/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
1143	**1.3.4.5.5.6.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**sáb 26/07/25**	**mié 30/07/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1144	1.3.4.5.5.6.6	Concreto	lun 28/07/25	mié 30/07/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
1145	1.3.4.5.5.6.6	Bloque en Concreto	sáb 26/07/25	mié 30/07/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1146	**1.3.4.5.5.6.6**	**Viga de Amarre**	**mar 22/07/25**	**vie 25/07/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1147	1.3.4.5.5.6.6	Acero	mar 22/07/25	mié 23/07/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
1148	1.3.4.5.5.6.6	Concreto	jue 24/07/25	vie 25/07/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1149	*1.3.4.5.5.7*	*Fin de Eje 3"-4"*	*mié 30/07/25*	*mié 30/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1150	**1.3.4.5.5.8**	**EJE 4"-5"**	**mié 2/04/25**	**lun 28/07/25**	**90 d**	**$ 165.979.686**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**

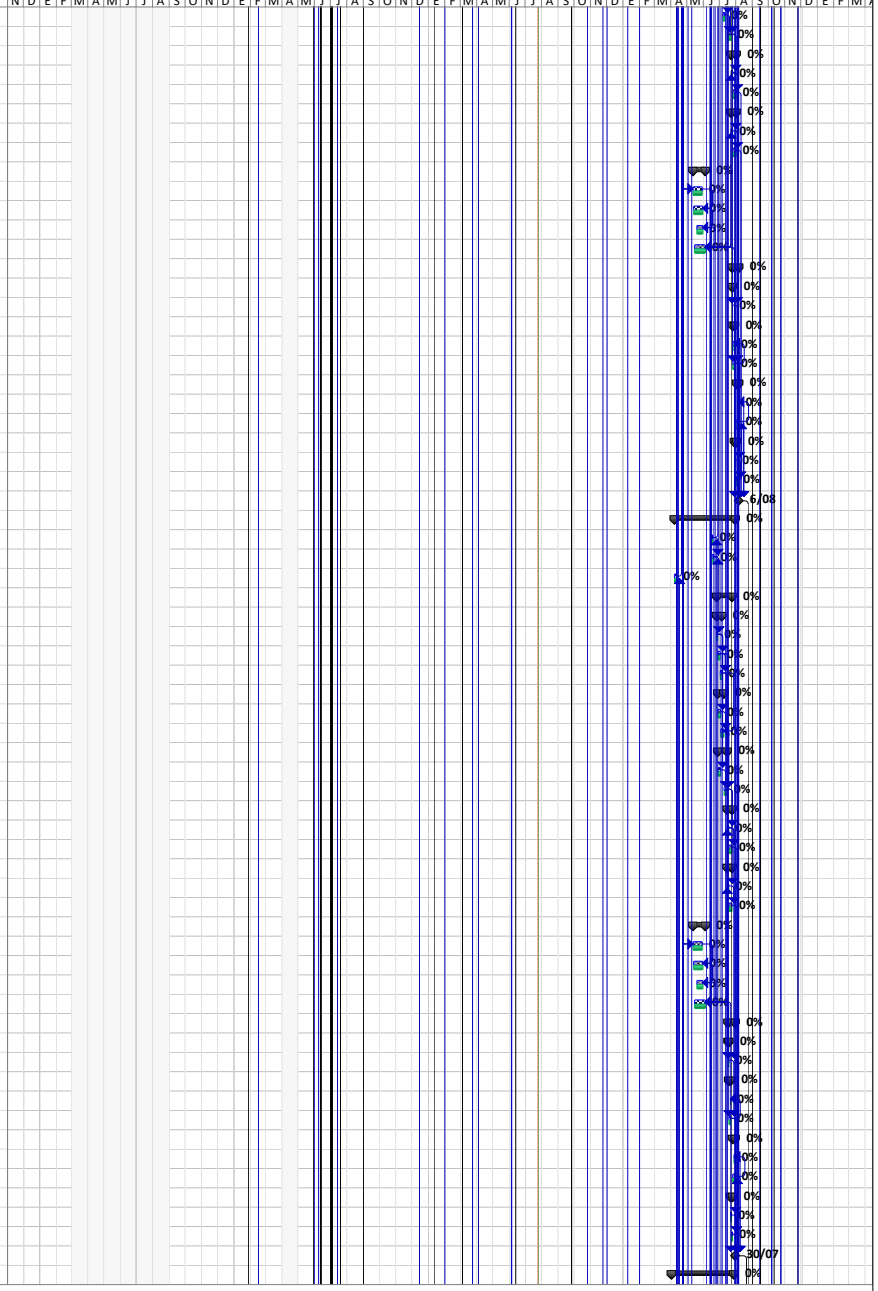

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1151	1.3.4.5.5.8.1	Excavación	vie 13/06/25	lun 16/06/25	2 d	$ 766.652	0,00%	0,00%	$ 0
1152	1.3.4.5.5.8.2	Pilotes FDP	lun 16/06/25	mié 18/06/25	2 d	$ 82.720.712	0,00%	0,00%	$ 0
1153	1.3.4.5.5.8.3	Mejoramiento con Rajón	mié 2/04/25	lun 7/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1154	**1.3.4.5.5.8.4**	**Estructura**	**mar 24/06/25**	**mar 22/07/25**	**23 d**	**$ 38.604.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1155	**1.3.4.5.5.8.4**	**Zapatas**	**mar 24/06/25**	**jue 3/07/25**	**7 d**	**$ 13.170.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1156	1.3.4.5.5.8.4	Solado	mar 24/06/25	mié 25/06/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1157	1.3.4.5.5.8.4	Acero	jue 26/06/25	vie 27/06/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1158	1.3.4.5.5.8.4	Concreto	sáb 28/06/25	jue 3/07/25	3 d	$ 5.064.000	0,00%	0,00%	$ 0
1159	**1.3.4.5.5.8.4**	**Vigas de Cimentación**	**jue 26/06/25**	**lun 7/07/25**	**8 d**	**$ 5.560.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1160	1.3.4.5.5.8.4	Acero	jue 26/06/25	mar 1/07/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1161	1.3.4.5.5.8.4	Concreto	mar 1/07/25	lun 7/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1162	**1.3.4.5.5.8.4**	**Columnas**	**jue 26/06/25**	**sáb 12/07/25**	**13 d**	**$ 6.628.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1163	1.3.4.5.5.8.4	Acero	jue 26/06/25	mar 1/07/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1164	1.3.4.5.5.8.4	Concreto	lun 7/07/25	sáb 12/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1165	**1.3.4.5.5.8.4**	**Vigas Longitudinales**	**sáb 12/07/25**	**mar 22/07/25**	**8 d**	**$ 5.810.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1166	1.3.4.5.5.8.4	Acero	sáb 12/07/25	mié 16/07/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1167	1.3.4.5.5.8.4	Concreto	mié 16/07/25	mar 22/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1168	**1.3.4.5.5.8.4**	**Vigas Transversales**	**sáb 12/07/25**	**mar 22/07/25**	**8 d**	**$ 7.434.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1169	1.3.4.5.5.8.4	Acero	sáb 12/07/25	mié 16/07/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
1170	1.3.4.5.5.8.4	Concreto	mié 16/07/25	mar 22/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1171	**1.3.4.5.5.8.5**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 29.150.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1172	1.3.4.5.5.8.5	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 7.287.489	0,00%	0,00%	$ 0
1173	1.3.4.5.5.8.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 7.287.489	0,00%	0,00%	$ 0
1174	1.3.4.5.5.8.5	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 7.017.582	0,00%	0,00%	$ 0
1175	1.3.4.5.5.8.5	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 7.557.440	0,00%	0,00%	$ 0
1176	**1.3.4.5.5.8.6**	**Fachada en Mampostería**	**mar 15/07/25**	**lun 28/07/25**	**10 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1177	**1.3.4.5.5.8.6**	**Dobelas**	**mar 15/07/25**	**mié 16/07/25**	**1 d**	**$ 2.538.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1178	1.3.4.5.5.8.6	Acero	mar 15/07/25	mié 16/07/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1179	**1.3.4.5.5.8.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mié 16/07/25**	**vie 18/07/25**	**2 d**	**$ 10.274.772**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1180	1.3.4.5.5.8.6	Concreto	jue 17/07/25	vie 18/07/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1181	1.3.4.5.5.8.6	Bloque en Concreto	mié 16/07/25	vie 18/07/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
1182	**1.3.4.5.5.8.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**jue 24/07/25**	**lun 28/07/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1183	1.3.4.5.5.8.6	Concreto	vie 25/07/25	lun 28/07/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
1184	1.3.4.5.5.8.6	Bloque en Concreto	jue 24/07/25	lun 28/07/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1185	**1.3.4.5.5.8.6**	**Viga de Amarre**	**vie 18/07/25**	**mié 23/07/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1186	1.3.4.5.5.8.6	Acero	vie 18/07/25	lun 21/07/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
1187	1.3.4.5.5.8.6	Concreto	mar 22/07/25	mié 23/07/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1188	*1.3.4.5.5.9*	*Fin de Eje 4"-5"*	*lun 28/07/25*	*lun 28/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1189	**1.3.4.5.5.10**	**EJE 1'-2'**	**vie 9/05/25**	**mié 20/08/25**	**80 d**	**$ 129.525.198**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1190	1.3.4.5.5.10.	Excavación	jue 3/07/25	sáb 5/07/25	2 d	$ 758.876	0,00%	0,00%	$ 0
1191	1.3.4.5.5.10.	Pilotes FDP	jue 10/07/25	sáb 12/07/25	2 d	$ 46.274.000	0,00%	0,00%	$ 0
1192	1.3.4.5.5.10.	Mejoramiento con Rajón	vie 9/05/25	mié 14/05/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1193	**1.3.4.5.5.10.**	**Estructura**	**mié 16/07/25**	**jue 14/08/25**	**23 d**	**$ 38.604.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1194	**1.3.4.5.5.10.**	**Zapatas**	**mié 16/07/25**	**jue 24/07/25**	**7 d**	**$ 13.170.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1195	1.3.4.5.5.10.	Solado	mié 16/07/25	vie 18/07/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1196	1.3.4.5.5.10.	Acero	vie 18/07/25	lun 21/07/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1197	1.3.4.5.5.10.	Concreto	mar 22/07/25	jue 24/07/25	3 d	$ 5.064.000	0,00%	0,00%	$ 0
1198	**1.3.4.5.5.10.**	**Vigas de Cimentación**	**vie 18/07/25**	**mar 29/07/25**	**8 d**	**$ 5.560.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1199	1.3.4.5.5.10.	Acero	vie 18/07/25	mar 22/07/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1200	1.3.4.5.5.10.	Concreto	mié 23/07/25	mar 29/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1201	**1.3.4.5.5.10.**	**Columnas**	**vie 18/07/25**	**lun 4/08/25**	**13 d**	**$ 6.628.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1202	1.3.4.5.5.10.	Acero	vie 18/07/25	mar 22/07/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1203	1.3.4.5.5.10.	Concreto	mar 29/07/25	lun 4/08/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1204	**1.3.4.5.5.10.**	**Vigas Longitudinales**	**lun 4/08/25**	**jue 14/08/25**	**8 d**	**$ 5.810.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1205	1.3.4.5.5.10.	Acero	lun 4/08/25	vie 8/08/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1206	1.3.4.5.5.10.	Concreto	vie 8/08/25	jue 14/08/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1207	**1.3.4.5.5.10.**	**Vigas Transversales**	**lun 4/08/25**	**jue 14/08/25**	**8 d**	**$ 7.434.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1208	1.3.4.5.5.10.	Acero	lun 4/08/25	vie 8/08/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
1209	1.3.4.5.5.10.	Concreto	vie 8/08/25	jue 14/08/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1210	**1.3.4.5.5.10.**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 29.150.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1211	1.3.4.5.5.10.	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 7.287.501	0,00%	0,00%	$ 0
1212	1.3.4.5.5.10.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 7.287.501	0,00%	0,00%	$ 0
1213	1.3.4.5.5.10.	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 6.726.920	0,00%	0,00%	$ 0
1214	1.3.4.5.5.10.	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 7.848.078	0,00%	0,00%	$ 0
1215	**1.3.4.5.5.10.**	**Fachada en Mampostería**	**mié 6/08/25**	**mié 20/08/25**	**10 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1216	**1.3.4.5.5.10.**	**Dobelas**	**mié 6/08/25**	**vie 8/08/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**

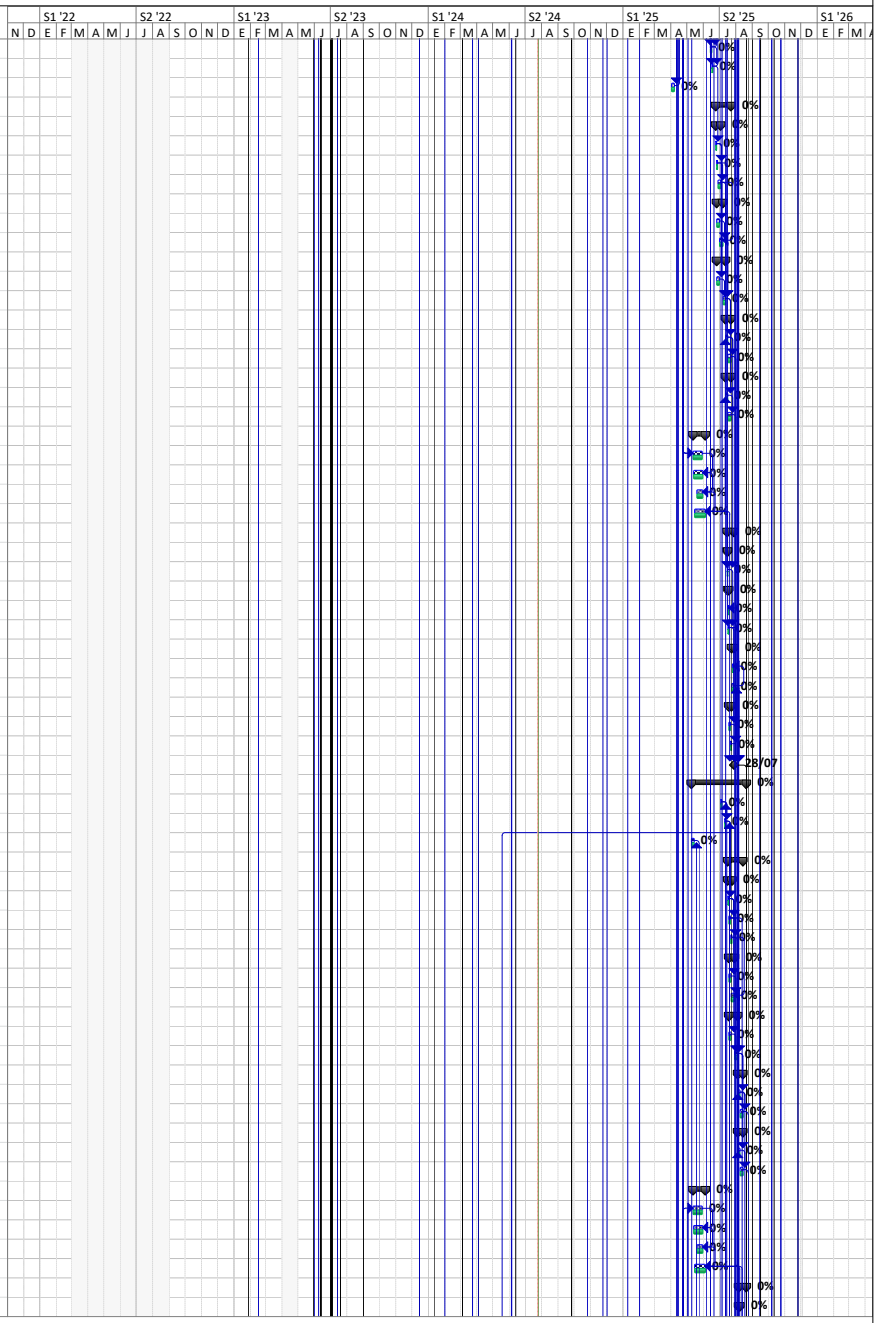

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1217	1.3.4.5.5.10.	Acero	mié 6/08/25	vie 8/08/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1218	**1.3.4.5.5.10.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**vie 8/08/25**	**lun 11/08/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1219	1.3.4.5.5.10.	Concreto	sáb 9/08/25	lun 11/08/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1220	1.3.4.5.5.10.	Bloque en Concreto	vie 8/08/25	lun 11/08/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
1221	**1.3.4.5.5.10.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**vie 15/08/25**	**mié 20/08/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1222	1.3.4.5.5.10.	Concreto	mar 19/08/25	mié 20/08/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
1223	1.3.4.5.5.10.	Bloque en Concreto	vie 15/08/25	mié 20/08/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1224	**1.3.4.5.5.10.**	**Viga de Amarre**	**lun 11/08/25**	**vie 15/08/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1225	1.3.4.5.5.10.	Acero	lun 11/08/25	mié 13/08/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
1226	1.3.4.5.5.10.	Concreto	mié 13/08/25	vie 15/08/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1227	*1.3.4.5.5.1:*	*Fin de Eje 1'-2'*	*mié 20/08/25*	*mié 20/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1228	**1.3.4.5.5.12**	**EJE 2'-3'**	**lun 5/05/25**	**vie 15/08/25**	**81 d**	**$ 129.693.198**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1229	1.3.4.5.5.12.	Excavación	mar 1/07/25	jue 3/07/25	2 d	$ 758.876	0,00%	0,00%	$ 0
1230	1.3.4.5.5.12.	Pilotes FDP	mar 8/07/25	jue 10/07/25	2 d	$ 46.442.000	0,00%	0,00%	$ 0
1231	1.3.4.5.5.12.	Mejoramiento con Rajón	lun 5/05/25	vie 9/05/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1232	**1.3.4.5.5.12.**	**Estructura**	**lun 14/07/25**	**mar 12/08/25**	**23 d**	**$ 38.604.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1233	**1.3.4.5.5.12.**	**Zapatas**	**lun 14/07/25**	**mar 22/07/25**	**7 d**	**$ 13.170.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1234	1.3.4.5.5.12.	Solado	lun 14/07/25	mié 16/07/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1235	1.3.4.5.5.12.	Acero	mié 16/07/25	vie 18/07/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1236	1.3.4.5.5.12.	Concreto	vie 18/07/25	mar 22/07/25	3 d	$ 5.064.000	0,00%	0,00%	$ 0
1237	**1.3.4.5.5.12.**	**Vigas de Cimentación**	**mié 16/07/25**	**vie 25/07/25**	**8 d**	**$ 5.560.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1238	1.3.4.5.5.12.	Acero	mié 16/07/25	sáb 19/07/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1239	1.3.4.5.5.12.	Concreto	lun 21/07/25	vie 25/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1240	**1.3.4.5.5.12.**	**Columnas**	**mié 16/07/25**	**vie 1/08/25**	**13 d**	**$ 6.628.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1241	1.3.4.5.5.12.	Acero	mié 16/07/25	sáb 19/07/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1242	1.3.4.5.5.12.	Concreto	sáb 26/07/25	vie 1/08/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1243	**1.3.4.5.5.12.**	**Vigas Longitudinales**	**vie 1/08/25**	**mar 12/08/25**	**8 d**	**$ 5.810.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1244	1.3.4.5.5.12.	Acero	vie 1/08/25	mar 5/08/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1245	1.3.4.5.5.12.	Concreto	mar 5/08/25	mar 12/08/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1246	**1.3.4.5.5.12.**	**Vigas Transversales**	**vie 1/08/25**	**mar 12/08/25**	**8 d**	**$ 7.434.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1247	1.3.4.5.5.12.	Acero	vie 1/08/25	mar 5/08/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
1248	1.3.4.5.5.12.	Concreto	mar 5/08/25	mar 12/08/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1249	**1.3.4.5.5.12.**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 29.150.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1250	1.3.4.5.5.12.	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 7.287.495	0,00%	0,00%	$ 0
1251	1.3.4.5.5.12.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 7.287.495	0,00%	0,00%	$ 0
1252	1.3.4.5.5.12.	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 6.801.682	0,00%	0,00%	$ 0
1253	1.3.4.5.5.12.	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 7.773.328	0,00%	0,00%	$ 0
1254	**1.3.4.5.5.12.**	**Fachada en Mampostería**	**lun 4/08/25**	**vie 15/08/25**	**9 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1255	**1.3.4.5.5.12.**	**Dobelas**	**lun 4/08/25**	**mar 5/08/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1256	1.3.4.5.5.12.	Acero	lun 4/08/25	mar 5/08/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1257	**1.3.4.5.5.12.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mar 5/08/25**	**vie 8/08/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1258	1.3.4.5.5.12.	Concreto	mié 6/08/25	vie 8/08/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1259	1.3.4.5.5.12.	Bloque en Concreto	mar 5/08/25	vie 8/08/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
1260	**1.3.4.5.5.12.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mié 13/08/25**	**vie 15/08/25**	**2 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1261	1.3.4.5.5.12.	Concreto	mié 13/08/25	vie 15/08/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
1262	1.3.4.5.5.12.	Bloque en Concreto	mié 13/08/25	vie 15/08/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1263	**1.3.4.5.5.12.**	**Viga de Amarre**	**vie 8/08/25**	**mié 13/08/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1264	1.3.4.5.5.12.	Acero	vie 8/08/25	lun 11/08/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
1265	1.3.4.5.5.12.	Concreto	lun 11/08/25	mié 13/08/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1266	*1.3.4.5.5.1:*	*Fin de Eje 2'-3'*	*vie 15/08/25*	*vie 15/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1267	**1.3.4.5.5.14**	**EJE 3'-4'**	**mar 29/04/25**	**jue 14/08/25**	**84 d**	**$ 129.284.198**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1268	1.3.4.5.5.14.	Excavación	vie 27/06/25	mar 1/07/25	2 d	$ 758.876	0,00%	0,00%	$ 0
1269	1.3.4.5.5.14.	Pilotes FDP	sáb 5/07/25	mar 8/07/25	2 d	$ 46.033.000	0,00%	0,00%	$ 0
1270	1.3.4.5.5.14.	Mejoramiento con Rajón	mar 29/04/25	lun 5/05/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1271	**1.3.4.5.5.14.**	**Estructura**	**vie 11/07/25**	**sáb 9/08/25**	**23 d**	**$ 38.604.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1272	**1.3.4.5.5.14.**	**Zapatas**	**vie 11/07/25**	**sáb 19/07/25**	**7 d**	**$ 13.170.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1273	1.3.4.5.5.14.	Solado	vie 11/07/25	lun 14/07/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1274	1.3.4.5.5.14.	Acero	lun 14/07/25	mié 16/07/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1275	1.3.4.5.5.14.	Concreto	mié 16/07/25	sáb 19/07/25	3 d	$ 5.064.000	0,00%	0,00%	$ 0
1276	**1.3.4.5.5.14.**	**Vigas de Cimentación**	**lun 14/07/25**	**mié 23/07/25**	**8 d**	**$ 5.560.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1277	1.3.4.5.5.14.	Acero	lun 14/07/25	jue 17/07/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1278	1.3.4.5.5.14.	Concreto	jue 17/07/25	mié 23/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1279	**1.3.4.5.5.14.**	**Columnas**	**lun 14/07/25**	**mié 30/07/25**	**13 d**	**$ 6.628.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1280	1.3.4.5.5.14.	Acero	lun 14/07/25	jue 17/07/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1281	1.3.4.5.5.14.	Concreto	jue 24/07/25	mié 30/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1282	**1.3.4.5.5.14.**	**Vigas Longitudinales**	**mié 30/07/25**	**sáb 9/08/25**	**8 d**	**$ 5.810.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**

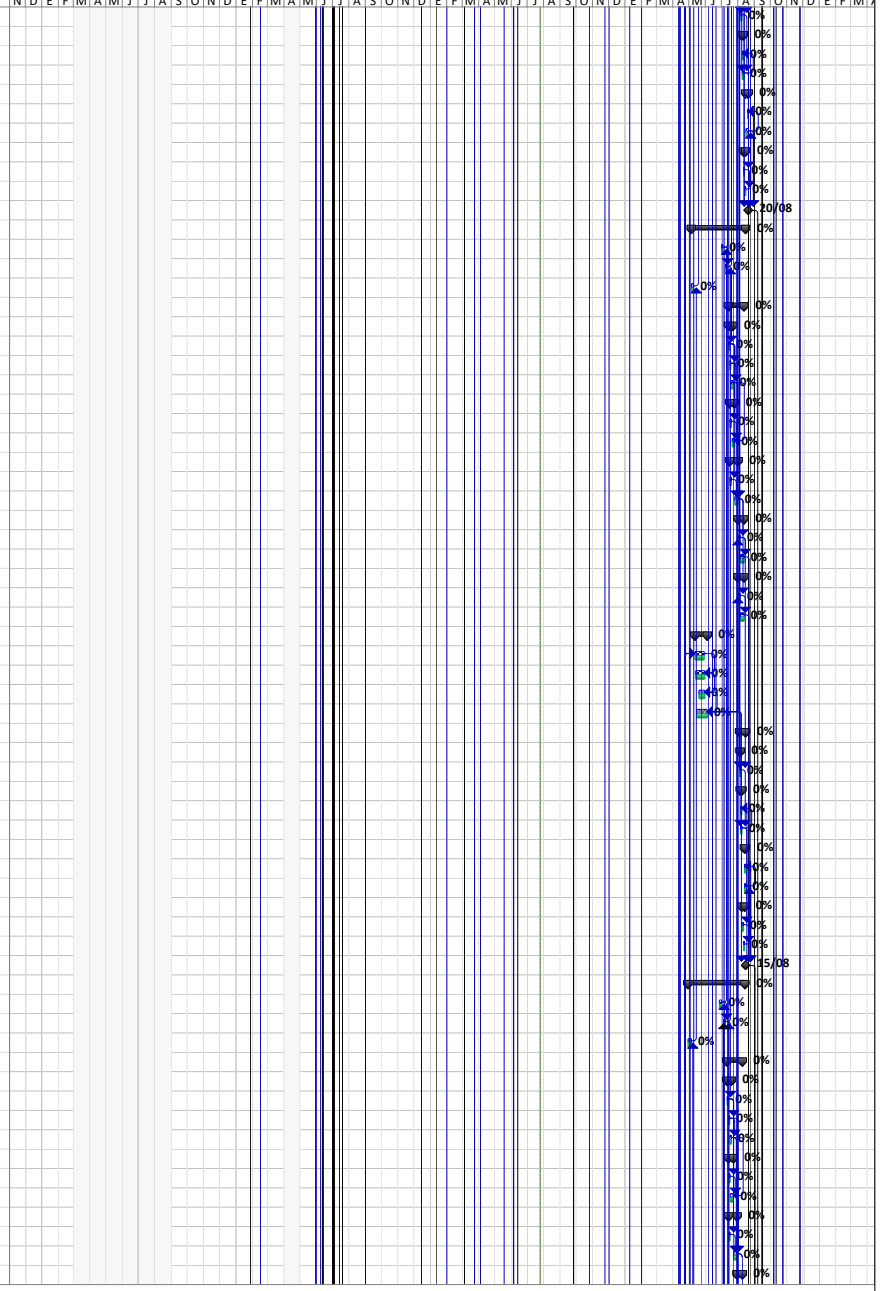


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1283	1.3.4.5.5.14.	Acero	mié 30/07/25	sáb 2/08/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1284	1.3.4.5.5.14.	Concreto	sáb 2/08/25	sáb 9/08/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1285	**1.3.4.5.5.14.**	**Vigas Transversales**	**mié 30/07/25**	**sáb 9/08/25**	**8 d**	**$ 7.434.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1286	1.3.4.5.5.14.	Acero	mié 30/07/25	sáb 2/08/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
1287	1.3.4.5.5.14.	Concreto	sáb 2/08/25	sáb 9/08/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1288	**1.3.4.5.5.14.**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 29.150.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1289	1.3.4.5.5.14.	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 7.287.492	0,00%	0,00%	$ 0
1290	1.3.4.5.5.14.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 7.287.492	0,00%	0,00%	$ 0
1291	1.3.4.5.5.14.	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 6.858.848	0,00%	0,00%	$ 0
1292	1.3.4.5.5.14.	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 7.716.168	0,00%	0,00%	$ 0
1293	**1.3.4.5.5.14.**	**Fachada en Mampostería**	**vie 1/08/25**	**jue 14/08/25**	**10 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1294	**1.3.4.5.5.14.**	**Dobelas**	**vie 1/08/25**	**sáb 2/08/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1295	1.3.4.5.5.14.	Acero	vie 1/08/25	sáb 2/08/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1296	**1.3.4.5.5.14.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**sáb 2/08/25**	**mar 5/08/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1297	1.3.4.5.5.14.	Concreto	lun 4/08/25	mar 5/08/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1298	1.3.4.5.5.14.	Bloque en Concreto	sáb 2/08/25	mar 5/08/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
1299	**1.3.4.5.5.14.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 11/08/25**	**jue 14/08/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1300	1.3.4.5.5.14.	Concreto	mar 12/08/25	jue 14/08/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
1301	1.3.4.5.5.14.	Bloque en Concreto	lun 11/08/25	jue 14/08/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1302	**1.3.4.5.5.14.**	**Viga de Amarre**	**mar 5/08/25**	**lun 11/08/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1303	1.3.4.5.5.14.	Acero	mar 5/08/25	vie 8/08/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
1304	1.3.4.5.5.14.	Concreto	vie 8/08/25	lun 11/08/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1305	*1.3.4.5.5.1*	*Fin de Eje 3'-4'*	*jue 14/08/25*	*jue 14/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1306	**1.3.4.5.5.16**	**EJE 4'-5'**	**mié 23/04/25**	**mar 12/08/25**	**86 d**	**$ 149.596.944**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1307	1.3.4.5.5.16.	Excavación	mié 25/06/25	jue 26/06/25	2 d	$ 758.876	0,00%	0,00%	$ 0
1308	1.3.4.5.5.16.	Pilotes FDP	jue 3/07/25	sáb 5/07/25	2 d	$ 46.033.000	0,00%	0,00%	$ 0
1309	1.3.4.5.5.16.	Mejoramiento con Rajón	mié 23/04/25	lun 28/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1310	**1.3.4.5.5.16.**	**Estructura**	**mié 4/06/25**	**mié 6/08/25**	**50 d**	**$ 58.917.251**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1311	**1.3.4.5.5.16.**	**Zapatas**	**mié 9/07/25**	**jue 17/07/25**	**7 d**	**$ 13.170.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1312	1.3.4.5.5.16.	Solado	mié 9/07/25	vie 11/07/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1313	1.3.4.5.5.16.	Acero	vie 11/07/25	lun 14/07/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1314	1.3.4.5.5.16.	Concreto	lun 14/07/25	jue 17/07/25	3 d	$ 5.064.000	0,00%	0,00%	$ 0
1315	**1.3.4.5.5.16.**	**Vigas de Cimentación**	**vie 11/07/25**	**lun 21/07/25**	**8 d**	**$ 5.560.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1316	1.3.4.5.5.16.	Acero	vie 11/07/25	mar 15/07/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1317	1.3.4.5.5.16.	Concreto	mar 15/07/25	lun 21/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1318	**1.3.4.5.5.16.**	**Columnas**	**vie 11/07/25**	**lun 28/07/25**	**13 d**	**$ 6.628.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1319	1.3.4.5.5.16.	Acero	vie 11/07/25	mar 15/07/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1320	1.3.4.5.5.16.	Concreto	mar 22/07/25	lun 28/07/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1321	**1.3.4.5.5.16.**	**Vigas Longitudinales**	**lun 28/07/25**	**mié 6/08/25**	**8 d**	**$ 5.810.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1322	1.3.4.5.5.16.	Acero	lun 28/07/25	jue 31/07/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1323	1.3.4.5.5.16.	Concreto	jue 31/07/25	mié 6/08/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1324	**1.3.4.5.5.16.**	**Vigas Transversales**	**lun 28/07/25**	**mié 6/08/25**	**8 d**	**$ 7.434.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1325	1.3.4.5.5.16.	Acero	lun 28/07/25	jue 31/07/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
1326	1.3.4.5.5.16.	Concreto	jue 31/07/25	mié 6/08/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
1327	**1.3.4.5.5.16.**	**Losa Aproximación**	**mié 4/06/25**	**jue 3/07/25**	**22 d**	**$ 20.312.746**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1328	1.3.4.5.5.16.	Acero	mié 4/06/25	sáb 7/06/25	3 d	$ 13.744.840	0,00%	0,00%	$ 0
1329	1.3.4.5.5.16.	Concreto	vie 6/06/25	jue 3/07/25	20 d	$ 6.567.906	0,00%	0,00%	$ 0
1330	**1.3.4.5.5.16.**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 29.150.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1331	1.3.4.5.5.16.	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 7.287.507	0,00%	0,00%	$ 0
1332	1.3.4.5.5.16.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 7.287.507	0,00%	0,00%	$ 0
1333	1.3.4.5.5.16.	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 6.903.954	0,00%	0,00%	$ 0
1334	1.3.4.5.5.16.	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 7.671.032	0,00%	0,00%	$ 0
1335	**1.3.4.5.5.16.**	**Fachada en Mampostería**	**mié 30/07/25**	**mar 12/08/25**	**10 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1336	**1.3.4.5.5.16.**	**Dobelas**	**mié 30/07/25**	**jue 31/07/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1337	1.3.4.5.5.16.	Acero	mié 30/07/25	jue 31/07/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1338	**1.3.4.5.5.16.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**jue 31/07/25**	**sáb 2/08/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1339	1.3.4.5.5.16.	Concreto	vie 1/08/25	sáb 2/08/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1340	1.3.4.5.5.16.	Bloque en Concreto	jue 31/07/25	sáb 2/08/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
1341	**1.3.4.5.5.16.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**vie 8/08/25**	**mar 12/08/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1342	1.3.4.5.5.16.	Concreto	sáb 9/08/25	mar 12/08/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
1343	1.3.4.5.5.16.	Bloque en Concreto	vie 8/08/25	mar 12/08/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1344	**1.3.4.5.5.16.**	**Viga de Amarre**	**sáb 2/08/25**	**vie 8/08/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1345	1.3.4.5.5.16.	Acero	sáb 2/08/25	mar 5/08/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
1346	1.3.4.5.5.16.	Concreto	mar 5/08/25	vie 8/08/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1347	*1.3.4.5.5.1*	*Fin de Eje 4'-5'*	*mar 12/08/25*	*mar 12/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1348	**1.3.4.5.5.18**	**EJE 1-2**	**mar 17/06/25**	**mar 19/08/25**	**48 d**	**$ 68.901.611**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**

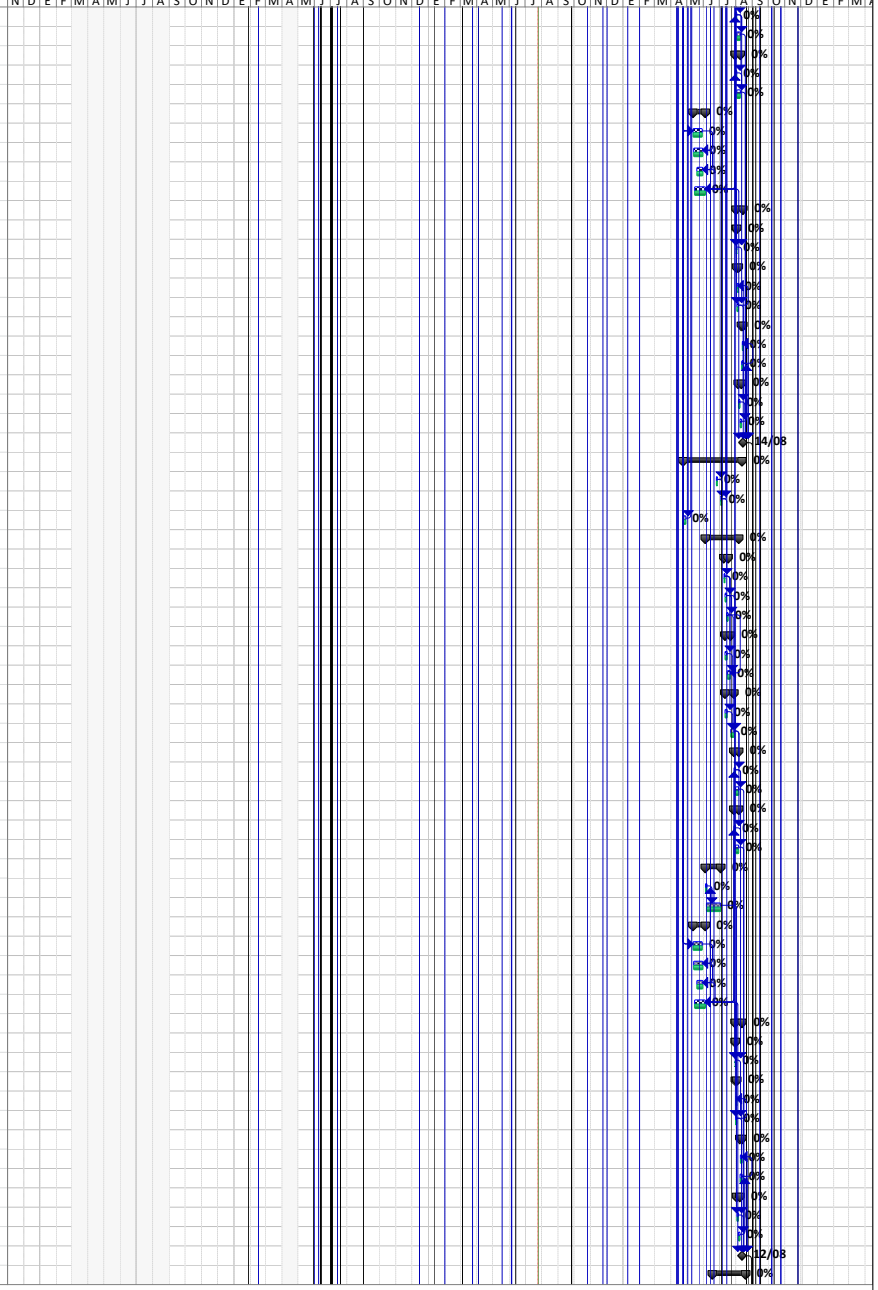


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1349	1.3.4.5.5.18.	Excavación	sáb 12/07/25	mar 15/07/25	2 d	$ 700.000	0,00%	0,00%	$ 0
1350	1.3.4.5.5.18.	Mejoramiento de Subrasante	mar 15/07/25	sáb 19/07/25	4 d	$ 58.876	0,00%	0,00%	$ 0
1351	**1.3.4.5.5.18.**	**Estructura**	**lun 21/07/25**	**mar 19/08/25**	**23 d**	**$ 38.992.735**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1352	**1.3.4.5.5.18.**	**Zapatas**	**lun 21/07/25**	**mar 29/07/25**	**7 d**	**$ 14.246.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1353	1.3.4.5.5.18.	Solado	lun 21/07/25	mar 22/07/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
1354	1.3.4.5.5.18.	Acero	mié 23/07/25	jue 24/07/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
1355	1.3.4.5.5.18.	Concreto	vie 25/07/25	mar 29/07/25	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
1356	**1.3.4.5.5.18.**	**Vigas de Cimentación**	**mié 23/07/25**	**vie 1/08/25**	**8 d**	**$ 7.262.240**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1357	1.3.4.5.5.18.	Acero	mié 23/07/25	vie 25/07/25	3 d	$ 2.198.240	0,00%	0,00%	$ 0
1358	1.3.4.5.5.18.	Concreto	sáb 26/07/25	vie 1/08/25	5 d	$ 5.064.000	0,00%	0,00%	$ 0
1359	**1.3.4.5.5.18.**	**Muros Laterales**	**vie 25/07/25**	**vie 8/08/25**	**11 d**	**$ 10.594.815**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1360	1.3.4.5.5.18.	Acero	vie 25/07/25	mar 29/07/25	3 d	$ 6.163.815	0,00%	0,00%	$ 0
1361	1.3.4.5.5.18.	Concreto	vie 1/08/25	vie 8/08/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
1362	**1.3.4.5.5.18.**	**Vigas Longitudinales**	**vie 8/08/25**	**mar 19/08/25**	**8 d**	**$ 6.889.275**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1363	1.3.4.5.5.18.	Acero	vie 8/08/25	mar 12/08/25	3 d	$ 3.091.275	0,00%	0,00%	$ 0
1364	1.3.4.5.5.18.	Concreto	mar 12/08/25	mar 19/08/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
1365	**1.3.4.5.5.18.**	**Tierra Armada**	**mar 17/06/25**	**vie 27/06/25**	**8 d**	**$ 29.150.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1366	1.3.4.5.5.18.	Geomalla de Refuerzo	mar 17/06/25	mar 24/06/25	5 d	$ 7.287.500	0,00%	0,00%	$ 0
1367	1.3.4.5.5.18.	Sacos Llenos Con Material Granular	mié 18/06/25	mié 25/06/25	5 d	$ 7.287.500	0,00%	0,00%	$ 0
1368	1.3.4.5.5.18.	Geotextil Fortex	jue 19/06/25	mié 25/06/25	4 d	$ 5.830.000	0,00%	0,00%	$ 0
1369	1.3.4.5.5.18.	Relleno con Ceniza	jue 19/06/25	vie 27/06/25	6 d	$ 8.745.000	0,00%	0,00%	$ 0
1370	*1.3.4.5.5.19*	*Fin de Eje 1-2*	*mar 19/08/25*	*mar 19/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1371	**1.3.4.5.5.20**	**EJE 2-3**	**vie 23/05/25**	**sáb 12/07/25**	**38 d**	**$ 69.534.611**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1372	1.3.4.5.5.20.	Excavación	jue 10/07/25	sáb 12/07/25	2 d	$ 700.000	0,00%	0,00%	$ 0
1373	1.3.4.5.5.20.	Mejoramiento de Subrasante	vie 23/05/25	mié 28/05/25	4 d	$ 58.876	0,00%	0,00%	$ 0
1374	**1.3.4.5.5.20.**	**Estructura**	**jue 29/05/25**	**vie 27/06/25**	**23 d**	**$ 39.625.735**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1375	**1.3.4.5.5.20.**	**Zapatas**	**jue 29/05/25**	**sáb 7/06/25**	**7 d**	**$ 14.879.405**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1376	1.3.4.5.5.20.	Solado	jue 29/05/25	vie 30/05/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
1377	1.3.4.5.5.20.	Acero	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
1378	1.3.4.5.5.20.	Concreto	mié 4/06/25	sáb 7/06/25	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
1379	**1.3.4.5.5.20.**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 31/05/25**	**mié 11/06/25**	**8 d**	**$ 6.629.240**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1380	1.3.4.5.5.20.	Acero	sáb 31/05/25	jue 5/06/25	3 d	$ 2.198.240	0,00%	0,00%	$ 0
1381	1.3.4.5.5.20.	Concreto	jue 5/06/25	mié 11/06/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
1382	**1.3.4.5.5.20.**	**Muros Laterales**	**mié 4/06/25**	**mar 17/06/25**	**11 d**	**$ 10.594.815**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1383	1.3.4.5.5.20.	Acero	mié 4/06/25	sáb 7/06/25	3 d	$ 6.163.815	0,00%	0,00%	$ 0
1384	1.3.4.5.5.20.	Concreto	mié 11/06/25	mar 17/06/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
1385	**1.3.4.5.5.20.**	**Vigas Longitudinales**	**mar 17/06/25**	**vie 27/06/25**	**8 d**	**$ 7.522.275**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1386	1.3.4.5.5.20.	Acero	mar 17/06/25	vie 20/06/25	3 d	$ 3.091.275	0,00%	0,00%	$ 0
1387	1.3.4.5.5.20.	Concreto	vie 20/06/25	vie 27/06/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
1388	**1.3.4.5.5.20.**	**Tierra Armada**	**mar 17/06/25**	**vie 27/06/25**	**8 d**	**$ 29.150.000**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1389	1.3.4.5.5.20.	Geomalla de Refuerzo	mar 17/06/25	mar 24/06/25	5 d	$ 7.287.497	0,00%	0,00%	$ 0
1390	1.3.4.5.5.20.	Sacos Llenos Con Material Granular	mié 18/06/25	mié 25/06/25	5 d	$ 7.287.497	0,00%	0,00%	$ 0
1391	1.3.4.5.5.20.	Geotextil Fortex	jue 19/06/25	mié 25/06/25	4 d	$ 6.246.438	0,00%	0,00%	$ 0
1392	1.3.4.5.5.20.	Relleno con Ceniza	jue 19/06/25	vie 27/06/25	6 d	$ 8.328.568	0,00%	0,00%	$ 0
1393	*1.3.4.5.5.21*	*Fin de Eje 2-3*	*vie 27/06/25*	*vie 27/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1394	**1.3.4.5.5.22**	**EJE 3-4**	**lun 19/05/25**	**jue 10/07/25**	**40 d**	**$ 69.534.611**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1395	1.3.4.5.5.22.	Excavación	mar 8/07/25	jue 10/07/25	2 d	$ 700.000	0,00%	0,00%	$ 0
1396	1.3.4.5.5.22.	Mejoramiento de Subrasante	lun 19/05/25	vie 23/05/25	4 d	$ 58.876	0,00%	0,00%	$ 0
1397	**1.3.4.5.5.22.**	**Estructura**	**vie 23/05/25**	**jue 26/06/25**	**26 d**	**$ 39.625.735**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1398	**1.3.4.5.5.22.**	**Zapatas**	**vie 23/05/25**	**mar 3/06/25**	**7 d**	**$ 14.879.405**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1399	1.3.4.5.5.22.	Solado	vie 23/05/25	lun 26/05/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
1400	1.3.4.5.5.22.	Acero	mar 27/05/25	mié 28/05/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
1401	1.3.4.5.5.22.	Concreto	jue 29/05/25	mar 3/06/25	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
1402	**1.3.4.5.5.22.**	**Vigas de Cimentación**	**mar 27/05/25**	**vie 6/06/25**	**8 d**	**$ 6.629.240**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1403	1.3.4.5.5.22.	Acero	mar 27/05/25	jue 29/05/25	3 d	$ 2.198.240	0,00%	0,00%	$ 0
1404	1.3.4.5.5.22.	Concreto	vie 30/05/25	vie 6/06/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
1405	**1.3.4.5.5.22.**	**Muros Laterales**	**vie 6/06/25**	**lun 16/06/25**	**8 d**	**$ 10.594.815**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1406	1.3.4.5.5.22.	Acero	vie 6/06/25	mar 10/06/25	3 d	$ 6.163.815	0,00%	0,00%	$ 0
1407	1.3.4.5.5.22.	Concreto	mar 10/06/25	lun 16/06/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
1408	**1.3.4.5.5.22.**	**Vigas Longitudinales**	**lun 16/06/25**	**jue 26/06/25**	**8 d**	**$ 7.522.275**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1409	1.3.4.5.5.22.	Acero	lun 16/06/25	jue 19/06/25	3 d	$ 3.091.275	0,00%	0,00%	$ 0
1410	1.3.4.5.5.22.	Concreto	jue 19/06/25	jue 26/06/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
1411	**1.3.4.5.5.22.**	**Tierra Armada**	**lun 16/06/25**	**jue 26/06/25**	**8 d**	**$ 29.150.000**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1412	1.3.4.5.5.22.	Geomalla de Refuerzo	lun 16/06/25	sáb 21/06/25	5 d	$ 7.287.498	0,00%	0,00%	$ 0
1413	1.3.4.5.5.22.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 17/06/25	mar 24/06/25	5 d	$ 7.287.498	0,00%	0,00%	$ 0
1414	1.3.4.5.5.22.	Geotextil Fortex	mié 18/06/25	mar 24/06/25	4 d	$ 6.477.776	0,00%	0,00%	$ 0

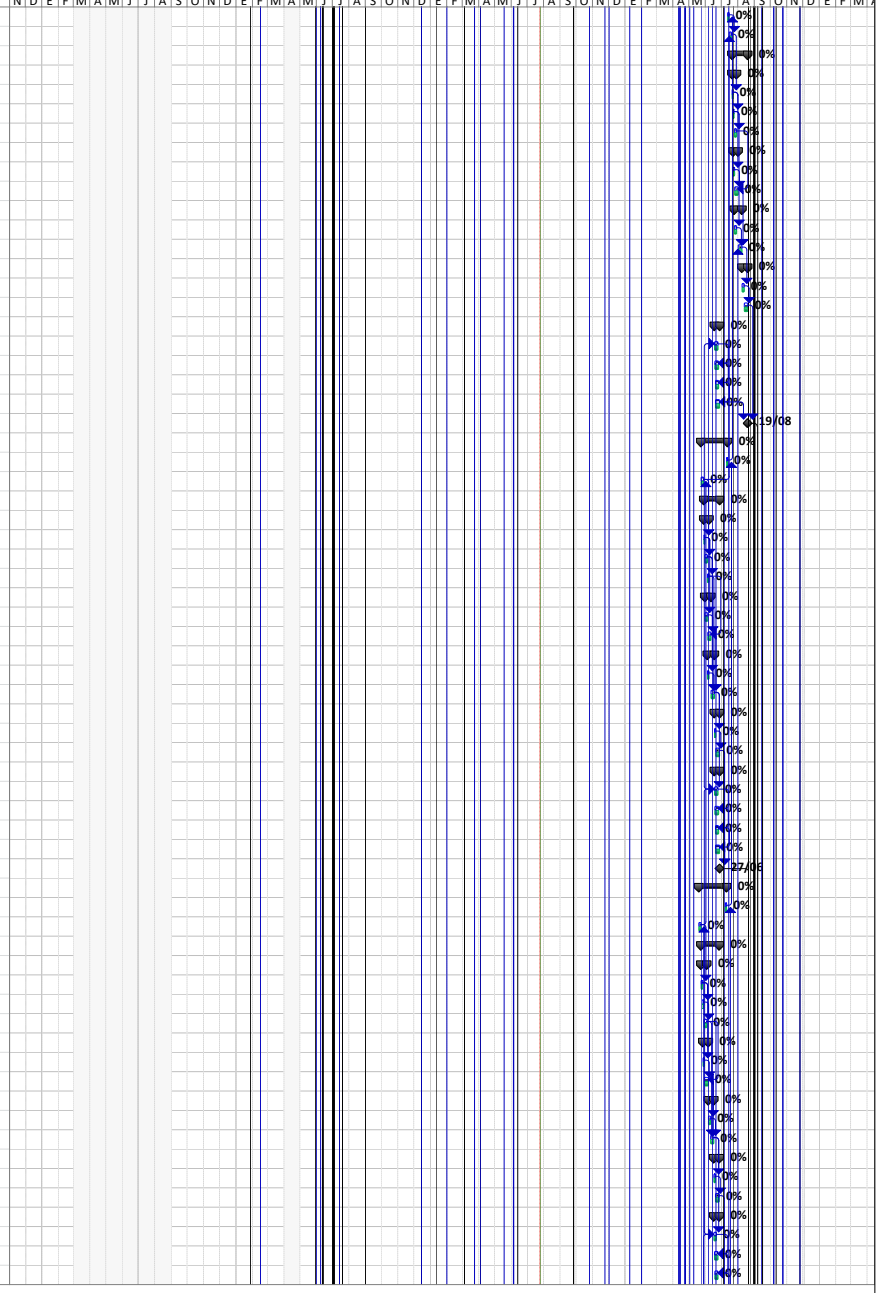

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1415	1.3.4.5.5.22.	Relleno con Ceniza	mié 18/06/25	jue 26/06/25	6 d	$ 8.097.228	0,00%	0,00%	$ 0
1416	*1.3.4.5.5.2*	*Fin de Eje 3-4*	*jue 26/06/25*	*jue 26/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1417	**1.3.4.5.5.24**	**EJE 4-5**	**mié 14/05/25**	**mar 8/07/25**	**42 d**	**$ 69.534.611**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1418	1.3.4.5.5.24.	Excavación	sáb 5/07/25	mar 8/07/25	2 d	$ 700.000	0,00%	0,00%	$ 0
1419	1.3.4.5.5.24.	Mejoramiento de Subrasante	mié 14/05/25	lun 19/05/25	4 d	$ 58.876	0,00%	0,00%	$ 0
1420	**1.3.4.5.5.24.**	**Estructura**	**lun 19/05/25**	**mar 17/06/25**	**23 d**	**$ 39.625.735**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1421	**1.3.4.5.5.24.**	**Zapatas**	**lun 19/05/25**	**mar 27/05/25**	**7 d**	**$ 14.879.405**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1422	1.3.4.5.5.24.	Solado	lun 19/05/25	mié 21/05/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
1423	1.3.4.5.5.24.	Acero	mié 21/05/25	vie 23/05/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
1424	1.3.4.5.5.24.	Concreto	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
1425	**1.3.4.5.5.24.**	**Vigas de Cimentación**	**mié 21/05/25**	**vie 30/05/25**	**8 d**	**$ 6.629.240**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1426	1.3.4.5.5.24.	Acero	mié 21/05/25	sáb 24/05/25	3 d	$ 2.198.240	0,00%	0,00%	$ 0
1427	1.3.4.5.5.24.	Concreto	lun 26/05/25	vie 30/05/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
1428	**1.3.4.5.5.24.**	**Muros Laterales**	**vie 23/05/25**	**sáb 7/06/25**	**11 d**	**$ 10.594.815**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1429	1.3.4.5.5.24.	Acero	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 6.163.815	0,00%	0,00%	$ 0
1430	1.3.4.5.5.24.	Concreto	sáb 31/05/25	sáb 7/06/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
1431	**1.3.4.5.5.24.**	**Vigas Longitudinales**	**sáb 7/06/25**	**mar 17/06/25**	**8 d**	**$ 7.522.275**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1432	1.3.4.5.5.24.	Acero	sáb 7/06/25	mié 11/06/25	3 d	$ 3.091.275	0,00%	0,00%	$ 0
1433	1.3.4.5.5.24.	Concreto	mié 11/06/25	mar 17/06/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
1434	**1.3.4.5.5.24.**	**Tierra Armada**	**sáb 7/06/25**	**mar 17/06/25**	**8 d**	**$ 29.150.000**	0,00%	0,00%	**$ 0**
1435	1.3.4.5.5.24.	Geomalla de Refuerzo	sáb 7/06/25	vie 13/06/25	5 d	$ 7.287.500	0,00%	0,00%	$ 0
1436	1.3.4.5.5.24.	Sacos Llenos Con Material Granular	lun 9/06/25	sáb 14/06/25	5 d	$ 7.287.500	0,00%	0,00%	$ 0
1437	1.3.4.5.5.24.	Geotextil Fortex	mar 10/06/25	sáb 14/06/25	4 d	$ 6.625.000	0,00%	0,00%	$ 0
1438	1.3.4.5.5.24.	Relleno con Ceniza	mar 10/06/25	mar 17/06/25	6 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
1439	*1.3.4.5.5.2*	*Fin de Eje 5-4*	*mar 17/06/25*	*mar 17/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1440	**1.3.4.5.5.26**	**PAVIMENTO**	**jue 21/08/25**	**jue 11/09/25**	**18 d**	**$ 184.917.482**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1441	1.3.4.5.5.26.	Subbase	jue 21/08/25	jue 4/09/25	12 d	$ 74.573.085	0,00%	0,00%	$ 0
1442	1.3.4.5.5.26.	Base	mar 26/08/25	mar 9/09/25	12 d	$ 20.000.000	0,00%	0,00%	$ 0
1443	1.3.4.5.5.26.	Mezcla Asfaltica - GCR	mar 9/09/25	mié 10/09/25	1 d	$ 68.151.947	0,00%	0,00%	$ 0
1444	1.3.4.5.5.26.	Mezcla Asfaltica - MD12	mié 10/09/25	jue 11/09/25	1 d	$ 22.192.450	0,00%	0,00%	$ 0
1445	1.3.4.5.5.27	Baranda Vehicular	mar 9/09/25	lun 22/09/25	10 d	$ 293.474.636	0,00%	0,00%	$ 0
1446	1.3.4.5.5.28	baranda Peatonal	mar 9/09/25	lun 22/09/25	10 d	$ 43.954.433	0,00%	0,00%	$ 0
1447	*1.3.4.5.6*	*Fin de Final de oreja Oriental*	*lun 22/09/25*	*lun 22/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1448	**1.3.4.5.7**	**FINAL DE APROCHE ORIENTAL**	**vie 15/03/24**	**lun 3/03/25**	**273,5 d**	**$ 1.091.521.700**	**19,93%**	**19,93%**	**$ 217.574.992**
1449	**1.3.4.5.7.1**	**EJE JC1-JC2**	**vie 15/03/24**	**vie 27/12/24**	**221,5 d**	**$ 125.010.988**	**29,06%**	**29,06%**	**$ 36.322.056**
1450	1.3.4.5.7.1.1	Excavación	vie 15/03/24	vie 15/03/24	1 d	$ 1.258.056	100,00%	100,00%	$ 1.258.056
1451	1.3.4.5.7.1.2	Pilotes FDP	lun 20/05/24	mar 21/05/24	2 d	$ 35.064.000	100,00%	100,00%	$ 35.064.000
1452	1.3.4.5.7.1.3	Mejoramiento con Rajón	jue 17/10/24	lun 21/10/24	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1453	**1.3.4.5.7.1.4**	**Estructura**	**jue 28/11/24**	**vie 27/12/24**	**23 d**	**$ 47.999.932**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1454	**1.3.4.5.7.1.4**	**Zapatas**	**jue 28/11/24**	**vie 6/12/24**	**7 d**	**$ 18.070.947**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1455	1.3.4.5.7.1.4	Solado	jue 28/11/24	sáb 30/11/24	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
1456	1.3.4.5.7.1.4	Acero	sáb 30/11/24	mar 3/12/24	2 d	$ 8.549.405	0,00%	0,00%	$ 0
1457	1.3.4.5.7.1.4	Concreto	mar 3/12/24	vie 6/12/24	3 d	$ 9.512.137	0,00%	0,00%	$ 0
1458	**1.3.4.5.7.1.4**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 30/11/24**	**mar 10/12/24**	**8 d**	**$ 9.242.425**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1459	1.3.4.5.7.1.4	Acero	sáb 30/11/24	mié 4/12/24	3 d	$ 2.279.425	0,00%	0,00%	$ 0
1460	1.3.4.5.7.1.4	Concreto	mié 4/12/24	mar 10/12/24	5 d	$ 6.963.000	0,00%	0,00%	$ 0
1461	**1.3.4.5.7.1.4**	**Muros Laterales**	**sáb 30/11/24**	**mar 17/12/24**	**13 d**	**$ 11.954.490**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1462	1.3.4.5.7.1.4	Acero	sáb 30/11/24	mié 4/12/24	3 d	$ 6.257.490	0,00%	0,00%	$ 0
1463	1.3.4.5.7.1.4	Concreto	mié 11/12/24	mar 17/12/24	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
1464	**1.3.4.5.7.1.4**	**Vigas Longitudinales**	**mar 17/12/24**	**vie 27/12/24**	**8 d**	**$ 8.732.070**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1465	1.3.4.5.7.1.4	Acero	mar 17/12/24	vie 20/12/24	3 d	$ 3.035.070	0,00%	0,00%	$ 0
1466	1.3.4.5.7.1.4	Concreto	vie 20/12/24	vie 27/12/24	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
1467	**1.3.4.5.7.1.5**	**Tierra Armada**	**jue 14/11/24**	**vie 22/11/24**	**7 d**	**$ 40.280.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1468	1.3.4.5.7.1.5	Geomalla de Refuerzo	jue 14/11/24	mié 20/11/24	5 d	$ 10.069.995	0,00%	0,00%	$ 0
1469	1.3.4.5.7.1.5	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 15/11/24	jue 21/11/24	5 d	$ 10.069.995	0,00%	0,00%	$ 0
1470	1.3.4.5.7.1.5	Geotextil Fortex	lun 18/11/24	jue 21/11/24	4 d	$ 9.295.400	0,00%	0,00%	$ 0
1471	1.3.4.5.7.1.5	Relleno con Ceniza	vie 15/11/24	vie 22/11/24	6 d	$ 10.844.610	0,00%	0,00%	$ 0
1472	*1.3.4.5.7.2*	*Fin de Eje JC1-JC2*	*vie 27/12/24*	*vie 27/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1473	1.3.4.5.7.3	Losa de aproximación	sáb 28/12/24	mar 7/01/25	6 d	$ 15.607.239	0,00%	0,00%	$ 0
1474	**1.3.4.5.7.4**	**EJE JC2-JC3**	**vie 15/03/24**	**mar 24/12/24**	**219,5 d**	**$ 124.940.731**	**29,07%**	**29,07%**	**$ 36.322.056**
1475	1.3.4.5.7.4.1	Excavación	vie 15/03/24	vie 15/03/24	1 d	$ 1.258.056	100,00%	100,00%	$ 1.258.056
1476	1.3.4.5.7.4.2	Pilotes FDP	lun 27/05/24	mar 28/05/24	2 d	$ 35.064.000	100,00%	100,00%	$ 35.064.000
1477	1.3.4.5.7.4.3	Mejoramiento con Rajón	lun 21/10/24	jue 24/10/24	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1478	**1.3.4.5.7.4.4**	**Estructura**	**mar 26/11/24**	**mar 24/12/24**	**23 d**	**$ 47.929.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1479	**1.3.4.5.7.4.4**	**Zapatas**	**mar 26/11/24**	**mié 4/12/24**	**7 d**	**$ 18.044.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1480	1.3.4.5.7.4.4	Solado	mar 26/11/24	jue 28/11/24	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0

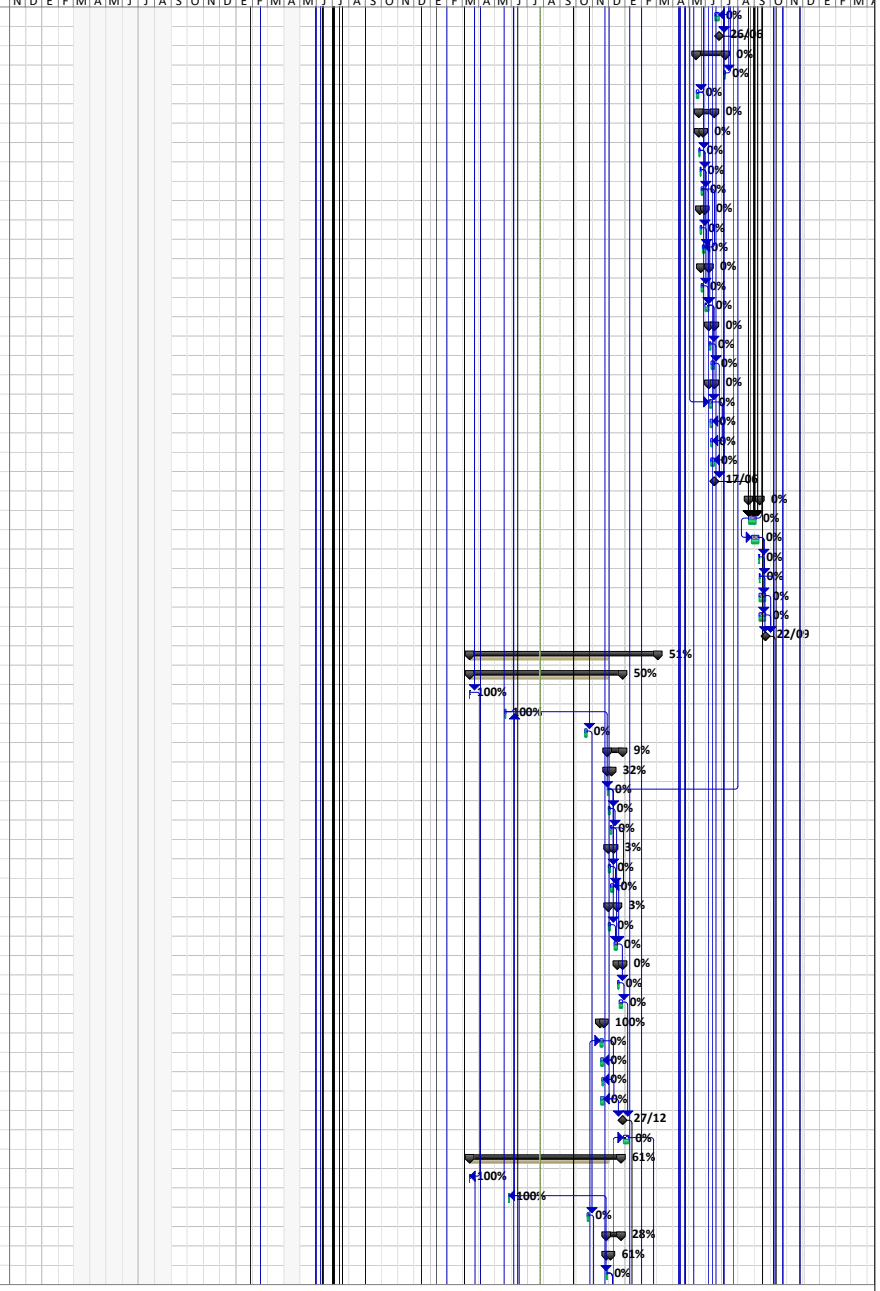


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1481	1.3.4.5.7.4.4	Acero	jue 28/11/24	sáb 30/11/24	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
1482	1.3.4.5.7.4.4	Concreto	sáb 30/11/24	mié 4/12/24	3 d	$ 9.495.000	0,00%	0,00%	$ 0
1483	**1.3.4.5.7.4.4**	**Vigas de Cimentación**	**jue 28/11/24**	**sáb 7/12/24**	**8 d**	**$ 9.186.220**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1484	1.3.4.5.7.4.4	Acero	jue 28/11/24	lun 2/12/24	3 d	$ 2.223.220	0,00%	0,00%	$ 0
1485	1.3.4.5.7.4.4	Concreto	lun 2/12/24	sáb 7/12/24	5 d	$ 6.963.000	0,00%	0,00%	$ 0
1486	**1.3.4.5.7.4.4**	**Muros Laterales**	**jue 28/11/24**	**vie 13/12/24**	**13 d**	**$ 11.973.225**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1487	1.3.4.5.7.4.4	Acero	jue 28/11/24	lun 2/12/24	3 d	$ 6.276.225	0,00%	0,00%	$ 0
1488	1.3.4.5.7.4.4	Concreto	lun 9/12/24	vie 13/12/24	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
1489	**1.3.4.5.7.4.4**	**Vigas Longitudinales**	**sáb 14/12/24**	**mar 24/12/24**	**8 d**	**$ 8.725.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1490	1.3.4.5.7.4.4	Acero	sáb 14/12/24	mié 18/12/24	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1491	1.3.4.5.7.4.4	Concreto	mié 18/12/24	mar 24/12/24	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
1492	**1.3.4.5.7.4.5**	**Tierra Armada**	**jue 14/11/24**	**vie 22/11/24**	**7 d**	**$ 40.280.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1493	1.3.4.5.7.4.5	Geomalla de Refuerzo	jue 14/11/24	mié 20/11/24	5 d	$ 10.070.005	0,00%	0,00%	$ 0
1494	1.3.4.5.7.4.5	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 15/11/24	jue 21/11/24	5 d	$ 10.070.005	0,00%	0,00%	$ 0
1495	1.3.4.5.7.4.5	Geotextil Fortex	lun 18/11/24	jue 21/11/24	4 d	$ 9.154.550	0,00%	0,00%	$ 0
1496	1.3.4.5.7.4.5	Relleno con Ceniza	vie 15/11/24	vie 22/11/24	6 d	$ 10.985.440	0,00%	0,00%	$ 0
1497	*1.3.4.5.7.5*	*Fin de Eje JC2-JC3*	*mar 24/12/24*	*mar 24/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1498	**1.3.4.5.7.6**	**EJE JC3-JC4**	**sáb 16/03/24**	**mar 24/12/24**	**218,5 d**	**$ 124.872.036**	**29,09%**	**29,09%**	**$ 36.322.056**
1499	1.3.4.5.7.6.1	Excavación	sáb 16/03/24	sáb 16/03/24	1 d	$ 1.258.056	100,00%	100,00%	$ 1.258.056
1500	1.3.4.5.7.6.2	Pilotes FDP	lun 3/06/24	mié 5/06/24	2 d	$ 35.064.000	100,00%	100,00%	$ 35.064.000
1501	1.3.4.5.7.6.3	Mejoramiento con Rajón	jue 24/10/24	lun 28/10/24	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1502	**1.3.4.5.7.6.4**	**Estructura**	**mar 26/11/24**	**mar 24/12/24**	**23 d**	**$ 47.860.980**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1503	**1.3.4.5.7.6.4**	**Zapatas**	**mar 26/11/24**	**mié 4/12/24**	**7 d**	**$ 18.044.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1504	1.3.4.5.7.6.4	Solado	mar 26/11/24	jue 28/11/24	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
1505	1.3.4.5.7.6.4	Acero	jue 28/11/24	sáb 30/11/24	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
1506	1.3.4.5.7.6.4	Concreto	sáb 30/11/24	mié 4/12/24	3 d	$ 9.495.000	0,00%	0,00%	$ 0
1507	**1.3.4.5.7.6.4**	**Vigas de Cimentación**	**jue 28/11/24**	**sáb 7/12/24**	**8 d**	**$ 8.867.725**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1508	1.3.4.5.7.6.4	Acero	jue 28/11/24	lun 2/12/24	3 d	$ 1.904.725	0,00%	0,00%	$ 0
1509	1.3.4.5.7.6.4	Concreto	lun 2/12/24	sáb 7/12/24	5 d	$ 6.963.000	0,00%	0,00%	$ 0
1510	**1.3.4.5.7.6.4**	**Muros Laterales**	**jue 28/11/24**	**vie 13/12/24**	**13 d**	**$ 12.347.925**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1511	1.3.4.5.7.6.4	Acero	jue 28/11/24	lun 2/12/24	3 d	$ 6.650.925	0,00%	0,00%	$ 0
1512	1.3.4.5.7.6.4	Concreto	lun 9/12/24	vie 13/12/24	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
1513	**1.3.4.5.7.6.4**	**Vigas Longitudinales**	**sáb 14/12/24**	**mar 24/12/24**	**8 d**	**$ 8.600.925**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1514	1.3.4.5.7.6.4	Acero	sáb 14/12/24	mié 18/12/24	3 d	$ 2.903.925	0,00%	0,00%	$ 0
1515	1.3.4.5.7.6.4	Concreto	mié 18/12/24	mar 24/12/24	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
1516	**1.3.4.5.7.6.5**	**Tierra Armada**	**jue 14/11/24**	**vie 22/11/24**	**7 d**	**$ 40.280.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1517	1.3.4.5.7.6.5	Geomalla de Refuerzo	jue 14/11/24	mié 20/11/24	5 d	$ 10.070.001	0,00%	0,00%	$ 0
1518	1.3.4.5.7.6.5	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 15/11/24	jue 21/11/24	5 d	$ 10.070.001	0,00%	0,00%	$ 0
1519	1.3.4.5.7.6.5	Geotextil Fortex	lun 18/11/24	jue 21/11/24	4 d	$ 8.951.112	0,00%	0,00%	$ 0
1520	1.3.4.5.7.6.5	Relleno con Ceniza	vie 15/11/24	vie 22/11/24	6 d	$ 11.188.886	0,00%	0,00%	$ 0
1521	*1.3.4.5.7.7*	*Fin de Eje JC3-JC4*	*mar 24/12/24*	*mar 24/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1522	**1.3.4.5.7.8**	**EJE JC4-JC5**	**sáb 16/03/24**	**sáb 21/12/24**	**216,75 d**	**$ 160.460.773**	**45,20%**	**45,20%**	**$ 72.527.768**
1523	1.3.4.5.7.8.1	Excavación	sáb 16/03/24	sáb 16/03/24	1 d	$ 1.258.056	100,00%	100,00%	$ 1.258.056
1524	1.3.4.5.7.8.2	Pilotes FDP	mié 5/06/24	jue 6/06/24	2 d	$ 71.269.712	100,00%	100,00%	$ 71.269.712
1525	1.3.4.5.7.8.3	Mejoramiento con Rajón	lun 28/10/24	jue 31/10/24	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1526	**1.3.4.5.7.8.4**	**Estructura**	**sáb 23/11/24**	**sáb 21/12/24**	**23 d**	**$ 47.509.005**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1527	**1.3.4.5.7.8.4**	**Zapatas**	**sáb 23/11/24**	**lun 2/12/24**	**7 d**	**$ 18.044.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1528	1.3.4.5.7.8.4	Solado	sáb 23/11/24	mar 26/11/24	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
1529	1.3.4.5.7.8.4	Acero	mar 26/11/24	jue 28/11/24	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
1530	1.3.4.5.7.8.4	Concreto	jue 28/11/24	lun 2/12/24	3 d	$ 9.495.000	0,00%	0,00%	$ 0
1531	**1.3.4.5.7.8.4**	**Vigas de Cimentación**	**mar 26/11/24**	**jue 5/12/24**	**8 d**	**$ 9.198.710**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1532	1.3.4.5.7.8.4	Acero	mar 26/11/24	vie 29/11/24	3 d	$ 2.235.710	0,00%	0,00%	$ 0
1533	1.3.4.5.7.8.4	Concreto	vie 29/11/24	jue 5/12/24	5 d	$ 6.963.000	0,00%	0,00%	$ 0
1534	**1.3.4.5.7.8.4**	**Muros Laterales**	**mar 26/11/24**	**jue 12/12/24**	**13 d**	**$ 12.166.820**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1535	1.3.4.5.7.8.4	Acero	mar 26/11/24	vie 29/11/24	3 d	$ 6.469.820	0,00%	0,00%	$ 0
1536	1.3.4.5.7.8.4	Concreto	vie 6/12/24	jue 12/12/24	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
1537	**1.3.4.5.7.8.4**	**Vigas Longitudinales**	**jue 12/12/24**	**sáb 21/12/24**	**8 d**	**$ 8.099.070**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1538	1.3.4.5.7.8.4	Acero	jue 12/12/24	lun 16/12/24	3 d	$ 3.035.070	0,00%	0,00%	$ 0
1539	1.3.4.5.7.8.4	Concreto	lun 16/12/24	sáb 21/12/24	5 d	$ 5.064.000	0,00%	0,00%	$ 0
1540	**1.3.4.5.7.8.5**	**Tierra Armada**	**jue 14/11/24**	**vie 22/11/24**	**7 d**	**$ 40.015.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1541	1.3.4.5.7.8.5	Geomalla de Refuerzo	jue 14/11/24	mié 20/11/24	5 d	$ 10.003.749	0,00%	0,00%	$ 0
1542	1.3.4.5.7.8.5	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 15/11/24	jue 21/11/24	5 d	$ 10.003.749	0,00%	0,00%	$ 0
1543	1.3.4.5.7.8.5	Geotextil Fortex	lun 18/11/24	jue 21/11/24	4 d	$ 8.574.646	0,00%	0,00%	$ 0
1544	1.3.4.5.7.8.5	Relleno con Ceniza	vie 15/11/24	vie 22/11/24	6 d	$ 11.432.856	0,00%	0,00%	$ 0
1545	*1.3.4.5.7.9*	*Fin de Eje JC4-JC5*	*sáb 21/12/24*	*sáb 21/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1546	**1.3.4.5.7.10**	**EJE JC5-JC6**	**sáb 16/03/24**	**sáb 21/12/24**	**216,75 d**	**$ 123.957.856**	**29,11%**	**29,11%**	**$ 36.081.056**

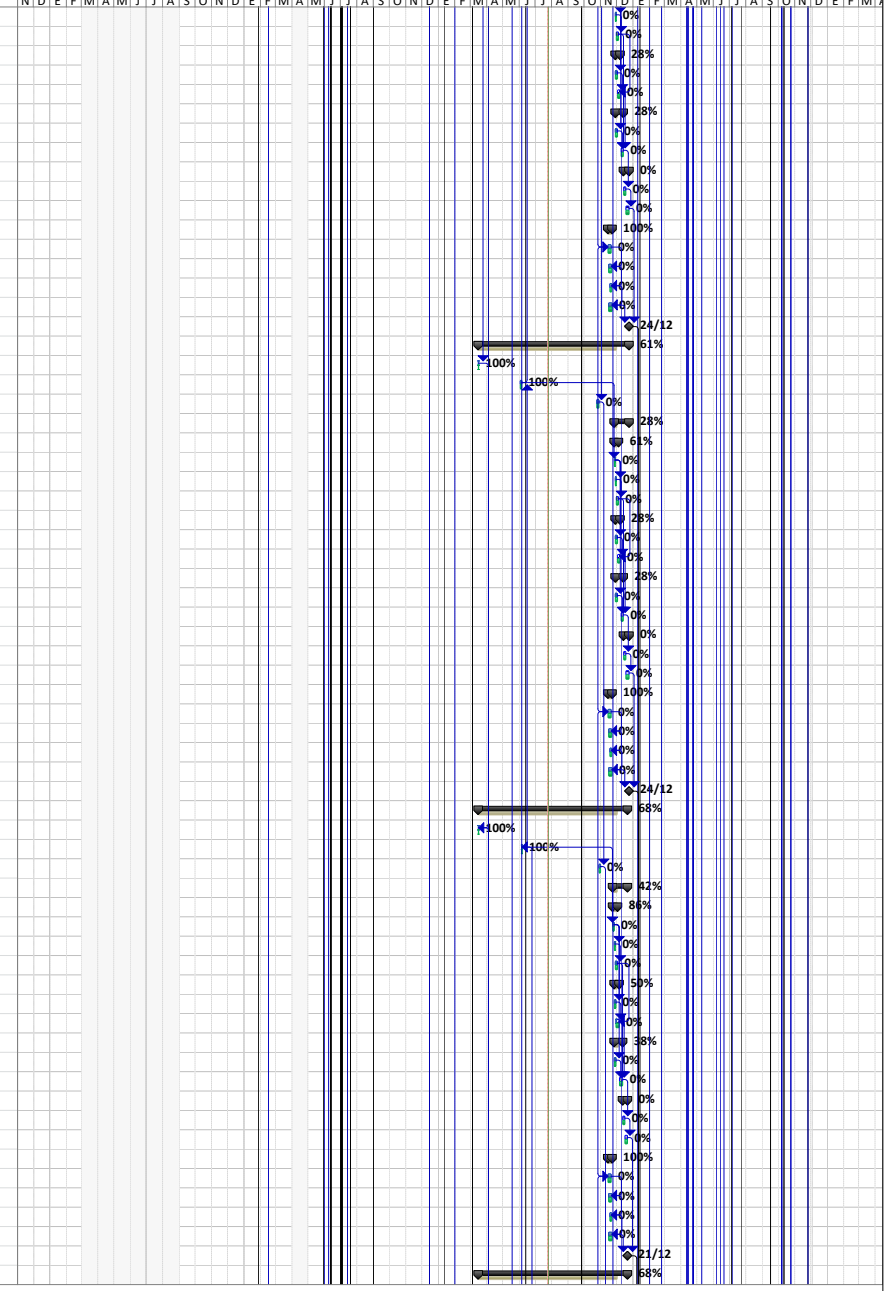

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1547	1.3.4.5.7.10.	Excavación	sáb 16/03/24	sáb 16/03/24	1 d	$ 1.258.056	100,00%	100,00%	$ 1.258.056
1548	1.3.4.5.7.10.	Pilotes FDP	lun 10/06/24	mié 12/06/24	2 d	$ 34.823.000	100,00%	100,00%	$ 34.823.000
1549	1.3.4.5.7.10.	Mejoramiento con Rajón	jue 31/10/24	mar 5/11/24	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1550	**1.3.4.5.7.10.**	**Estructura**	**sáb 23/11/24**	**sáb 21/12/24**	**23 d**	**$ 47.452.800**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1551	**1.3.4.5.7.10.**	**Zapatas**	**sáb 23/11/24**	**lun 2/12/24**	**7 d**	**$ 18.044.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1552	1.3.4.5.7.10.	Solado	sáb 23/11/24	mar 26/11/24	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
1553	1.3.4.5.7.10.	Acero	mar 26/11/24	jue 28/11/24	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
1554	1.3.4.5.7.10.	Concreto	jue 28/11/24	lun 2/12/24	3 d	$ 9.495.000	0,00%	0,00%	$ 0
1555	**1.3.4.5.7.10.**	**Vigas de Cimentación**	**mar 26/11/24**	**jue 5/12/24**	**8 d**	**$ 9.173.730**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1556	1.3.4.5.7.10.	Acero	mar 26/11/24	vie 29/11/24	3 d	$ 2.210.730	0,00%	0,00%	$ 0
1557	1.3.4.5.7.10.	Concreto	vie 29/11/24	jue 5/12/24	5 d	$ 6.963.000	0,00%	0,00%	$ 0
1558	**1.3.4.5.7.10.**	**Muros Laterales**	**mar 26/11/24**	**jue 12/12/24**	**13 d**	**$ 12.266.740**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1559	1.3.4.5.7.10.	Acero	mar 26/11/24	vie 29/11/24	3 d	$ 6.569.740	0,00%	0,00%	$ 0
1560	1.3.4.5.7.10.	Concreto	vie 6/12/24	jue 12/12/24	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
1561	**1.3.4.5.7.10.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 12/12/24**	**sáb 21/12/24**	**8 d**	**$ 7.967.925**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1562	1.3.4.5.7.10.	Acero	jue 12/12/24	lun 16/12/24	3 d	$ 2.903.925	0,00%	0,00%	$ 0
1563	1.3.4.5.7.10.	Concreto	lun 16/12/24	sáb 21/12/24	5 d	$ 5.064.000	0,00%	0,00%	$ 0
1564	**1.3.4.5.7.10.**	**Tierra Armada**	**jue 14/11/24**	**vie 22/11/24**	**7 d**	**$ 40.015.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1565	1.3.4.5.7.10.	Geomalla de Refuerzo	jue 14/11/24	mié 20/11/24	5 d	$ 10.003.750	0,00%	0,00%	$ 0
1566	1.3.4.5.7.10.	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 15/11/24	jue 21/11/24	5 d	$ 10.003.750	0,00%	0,00%	$ 0
1567	1.3.4.5.7.10.	Geotextil Fortex	lun 18/11/24	jue 21/11/24	4 d	$ 8.003.000	0,00%	0,00%	$ 0
1568	1.3.4.5.7.10.	Relleno con Ceniza	vie 15/11/24	vie 22/11/24	6 d	$ 12.004.500	0,00%	0,00%	$ 0
1569	*1.3.4.5.7.11*	*Fin de Eje JC5-JC6*	*sáb 21/12/24*	*sáb 21/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1570	**1.3.4.5.7.12**	**PAVIMENTO**	**vie 27/12/24**	**lun 10/02/25**	**34 d**	**$ 197.372.349**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1571	1.3.4.5.7.12.	Subbase	vie 27/12/24	mié 22/01/25	19 d	$ 23.771.607	0,00%	0,00%	$ 0
1572	1.3.4.5.7.12.	Base	mié 22/01/25	jue 6/02/25	13 d	$ 20.328.000	0,00%	0,00%	$ 0
1573	1.3.4.5.7.12.	Mezcla Asfaltica - GCR	vie 7/02/25	vie 7/02/25	1 d	$ 59.009.647	0,00%	0,00%	$ 0
1574	1.3.4.5.7.12.	Mezcla Asfaltica - MD12	sáb 8/02/25	lun 10/02/25	1 d	$ 94.263.095	0,00%	0,00%	$ 0
1575	1.3.4.5.7.13	Baranda Vehicular	vie 7/02/25	lun 3/03/25	20 d	$ 219.299.728	0,00%	0,00%	$ 0
1576	*1.3.4.5.8*	*Fin de Final de Aproche Oriental*	*lun 3/03/25*	*lun 3/03/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1577	**1.3.4.5.9**	**CALLE 153 NE**	**mié 14/06/23**	**mar 3/06/25**	**557,75 d**	**$ 743.097.799**	**31,60%**	**31,60%**	**$ 234.801.851**
1578	1.3.4.5.9.1	Demolición	mar 4/03/25	mar 4/03/25	1 d	$ 1.498.639	0,00%	0,00%	$ 0
1579	**1.3.4.5.9.2**	**Via**	**mié 14/06/23**	**vie 16/05/25**	**544,75 d**	**$ 665.381.539**	**35,29%**	**35,29%**	**$ 234.801.851**
1580	1.3.4.5.9.2.1	Excavación Via Nueva	mié 14/06/23	mié 21/06/23	6 d	$ 21.653.409	100,00%	100,00%	$ 21.653.409
1581	1.3.4.5.9.2.2	Mejoramiento con Rajón Via Nueva	jue 22/06/23	mié 28/06/23	6 d	$ 119.469.958	100,00%	100,00%	$ 119.469.958
1582	1.3.4.5.9.2.3	Subbase Granular Via Nueva	jue 29/06/23	mié 12/07/23	11 d	$ 57.306.484	100,00%	100,00%	$ 57.306.484
1583	1.3.4.5.9.2.4	Base Granular Via Nueva	lun 23/10/23	vie 3/11/23	11 d	$ 36.372.000	100,00%	100,00%	$ 36.372.000
1584	1.3.4.5.9.2.5	Mezcla Asfaltica - GCR Via Nueva	vie 15/11/24	vie 22/11/24	6 d	$ 73.844.769	0,00%	0,00%	$ 0
1585	1.3.4.5.9.2.6	Mezcla Asfaltica - MD12 Via Nueva	vie 22/11/24	vie 29/11/24	6 d	$ 24.044.150	0,00%	0,00%	$ 0
1586	1.3.4.5.9.2.7	Excavación Rehabilitación de via	mar 4/03/25	vie 21/03/25	15 d	$ 21.653.409	0,00%	0,00%	$ 0
1587	1.3.4.5.9.2.8	Mejoramiento con Rajón Rehabilitación de via	mié 2/04/25	mar 22/04/25	15 d	$ 119.469.958	0,00%	0,00%	$ 0
1588	1.3.4.5.9.2.9	Subbase Granular Rehabilitación de via	mié 23/04/25	lun 5/05/25	8 d	$ 57.306.484	0,00%	0,00%	$ 0
1589	1.3.4.5.9.2.1	Base Granular Rehabilitación de via	lun 5/05/25	mié 14/05/25	8 d	$ 36.372.000	0,00%	0,00%	$ 0
1590	1.3.4.5.9.2.1	Mezcla Asfaltica - GCR Rehabilitación de via	mié 14/05/25	jue 15/05/25	1 d	$ 73.844.769	0,00%	0,00%	$ 0
1591	1.3.4.5.9.2.1	Mezcla Asfaltica - MD12 Rehabilitación de via	jue 15/05/25	vie 16/05/25	1 d	$ 24.044.150	0,00%	0,00%	$ 0
1592	**1.3.4.5.9.3**	**Espacio Público**	**vie 21/03/25**	**mar 3/06/25**	**55 d**	**$ 76.217.621**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1593	1.3.4.5.9.3.1	Excavación	vie 21/03/25	vie 11/04/25	16 d	$ 8.538.031	0,00%	0,00%	$ 0
1594	1.3.4.5.9.3.2	Rellenos	lun 19/05/25	mar 3/06/25	11 d	$ 10.957.760	0,00%	0,00%	$ 0
1595	1.3.4.5.9.3.3	Acabados	vie 2/05/25	mar 3/06/25	25 d	$ 56.721.830	0,00%	0,00%	$ 0
1596	*1.3.4.5.10*	*Fin Calle 153 NE*	*mar 3/06/25*	*mar 3/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1597	**1.3.4.5.11**	**CONECTANTE NE**	**jue 20/03/25**	**mar 12/08/25**	**111 d**	**$ 1.194.309.036**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1598	1.3.4.5.11.1	Demolición	jue 20/03/25	vie 21/03/25	1 d	$ 4.285.178	0,00%	0,00%	$ 0
1599	**1.3.4.5.11.2**	**Via**	**vie 21/03/25**	**mié 23/07/25**	**95 d**	**$ 803.889.792**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1600	1.3.4.5.11.2.	Excavación	vie 21/03/25	jue 10/04/25	15 d	$ 134.022.313	0,00%	0,00%	$ 0
1601	1.3.4.5.11.2.	Subbase Granular	lun 19/05/25	sáb 7/06/25	15 d	$ 116.545.224	0,00%	0,00%	$ 0
1602	1.3.4.5.11.2.	Base Granular - Estabilizada con Asfalto	vie 13/06/25	vie 4/07/25	15 d	$ 224.168.725	0,00%	0,00%	$ 0
1603	1.3.4.5.11.2.	Mezcla Asfaltica - GCR	vie 11/07/25	jue 17/07/25	5 d	$ 200.288.030	0,00%	0,00%	$ 0
1604	1.3.4.5.11.2.	Mezcla Asfaltica - MD12	jue 17/07/25	mié 23/07/25	5 d	$ 128.865.500	0,00%	0,00%	$ 0
1605	**1.3.4.5.11.3**	**Espacio Público**	**jue 10/04/25**	**vie 25/07/25**	**82 d**	**$ 374.060.610**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1606	1.3.4.5.11.3.	Excavación	jue 10/04/25	sáb 26/04/25	12 d	$ 34.152.123	0,00%	0,00%	$ 0
1607	1.3.4.5.11.3.	Muros	lun 28/04/25	mié 16/07/25	62 d	$ 53.140.987	0,00%	0,00%	$ 0
1608	1.3.4.5.11.3.	Rellenos	jue 17/07/25	vie 25/07/25	7 d	$ 46.946.934	0,00%	0,00%	$ 0
1609	1.3.4.5.11.3.	Acabados	mié 25/06/25	vie 25/07/25	25 d	$ 239.820.566	0,00%	0,00%	$ 0
1610	1.3.4.5.11.4	Pompeyano	jue 24/07/25	mar 12/08/25	15 d	$ 12.073.456	0,00%	0,00%	$ 0

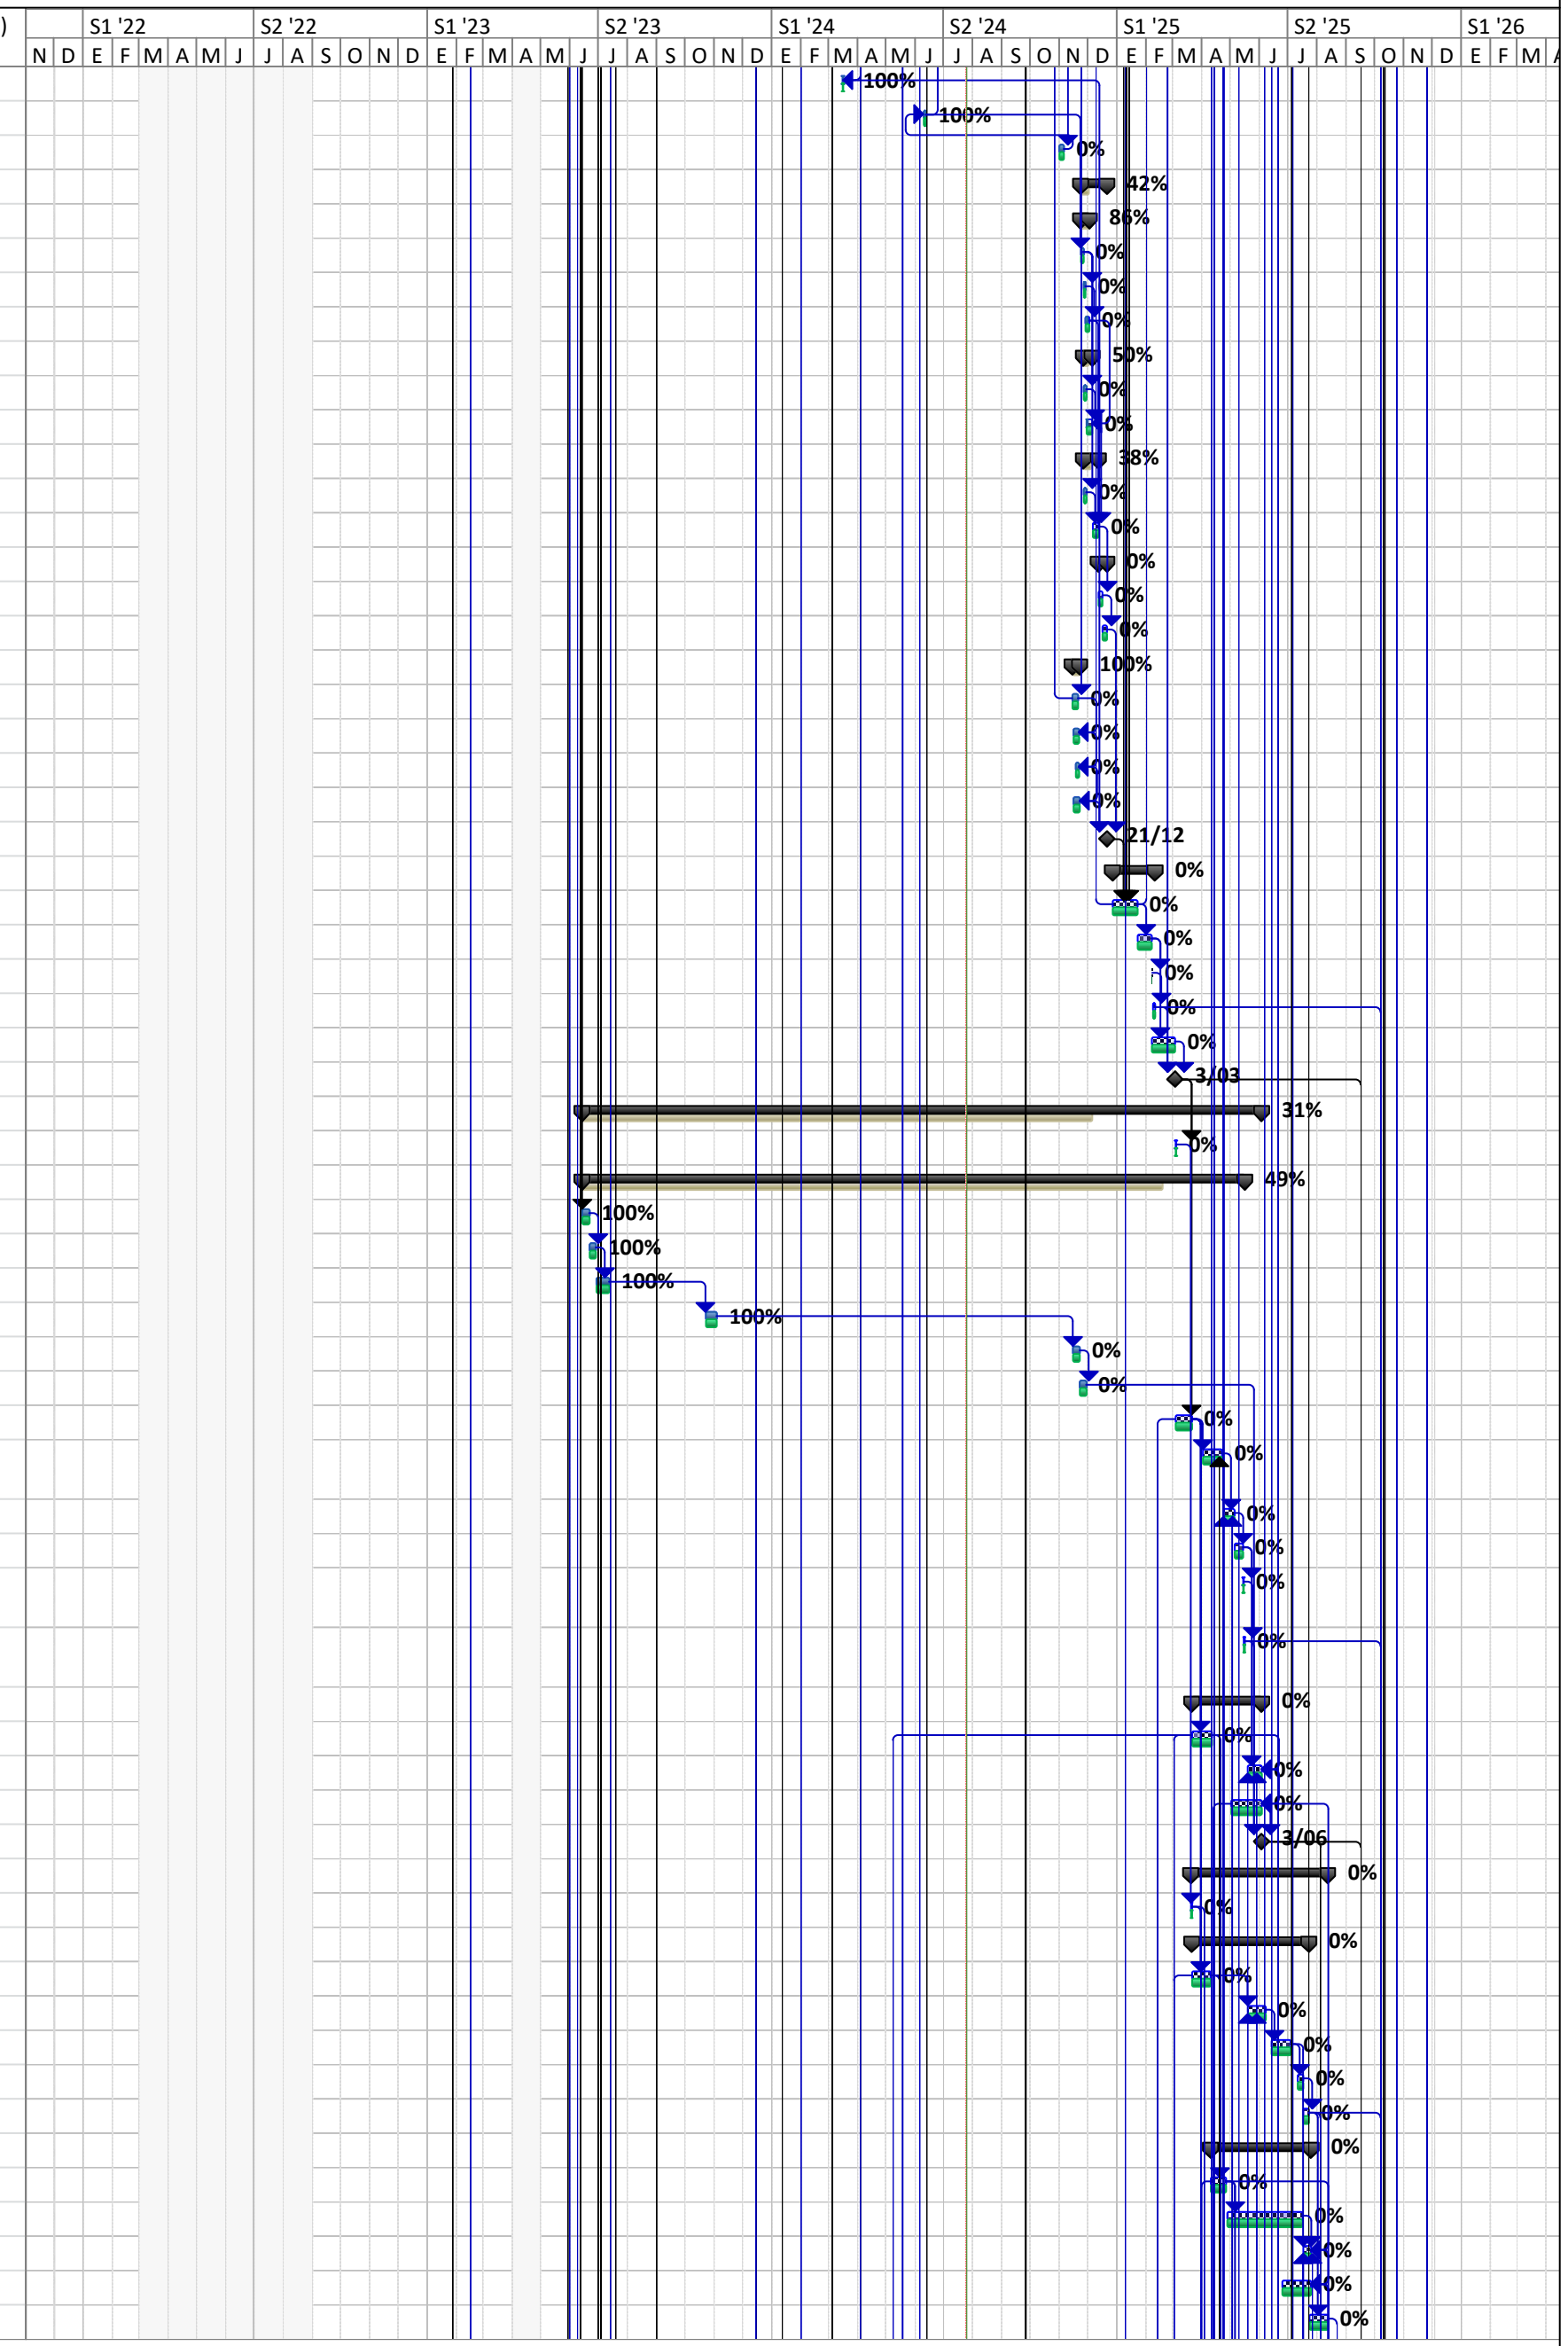

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas		División		Sólo fin		Hito de línea base		Resumen manual		Tarea inactiva	
División crítica		Progreso de tarea		Sólo duración		Hito		Resumen del proyecto		Hito inactivo	
Progreso de tarea crítica		Tarea manual		Línea base		Progreso del resumen		Tareas externas		Resumen inactivo	
Tarea		Sólo el comienzo		División de la línea base		Resumen		Hito externo		Fecha límite	


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1611	*1.3.4.5.12*	*Fin Conectante NE*	*mar 12/08/25*	*mar 12/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1612	**1.3.4.5.13**	**RAMAL TRANSICIÓN NE**	**vie 4/04/25**	**jue 8/05/25**	**25 d**	**$ 124.881.186**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1613	1.3.4.5.13.1	Demolición	vie 4/04/25	jue 10/04/25	5 d	$ 972.551	0,00%	0,00%	$ 0
1614	**1.3.4.5.13.2**	**Via**	**jue 10/04/25**	**jue 8/05/25**	**20 d**	**$ 123.908.635**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1615	1.3.4.5.13.2.	Excavación	jue 10/04/25	mar 22/04/25	8 d	$ 18.356.180	0,00%	0,00%	$ 0
1616	1.3.4.5.13.2.	Subbase Granular	mar 22/04/25	lun 28/04/25	5 d	$ 33.633.544	0,00%	0,00%	$ 0
1617	1.3.4.5.13.2.	Base Granular	mar 29/04/25	mar 6/05/25	5 d	$ 18.648.000	0,00%	0,00%	$ 0
1618	1.3.4.5.13.2.	Mezcla Asfaltica - GCR	mar 6/05/25	mié 7/05/25	1 d	$ 40.037.561	0,00%	0,00%	$ 0
1619	1.3.4.5.13.2.	Mezcla Asfaltica - MD12	mié 7/05/25	jue 8/05/25	1 d	$ 13.233.350	0,00%	0,00%	$ 0
1620	*1.3.4.5.14*	*Fin Ramal Transición NE*	*jue 8/05/25*	*jue 8/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1621	**1.3.4.5.15**	**CARRIL DESACELERACIÓN AUTONORTE NE**	**jue 10/04/25**	**mar 26/08/25**	**105 d**	**$ 491.546.855**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1622	1.3.4.5.15.1	Demolición	jue 10/04/25	lun 21/04/25	7 d	$ 13.147.854	0,00%	0,00%	$ 0
1623	**1.3.4.5.15.2**	**Via**	**mar 22/04/25**	**mar 26/08/25**	**97 d**	**$ 478.399.001**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1624	1.3.4.5.15.2.	Excavación	mar 22/04/25	lun 5/05/25	9 d	$ 37.436.222	0,00%	0,00%	$ 0
1625	1.3.4.5.15.2.	Subbase Granular	jue 31/07/25	sáb 9/08/25	7 d	$ 53.339.566	0,00%	0,00%	$ 0
1626	1.3.4.5.15.2.	Base Granular - Estabilizada con Asfalto	mié 13/08/25	vie 22/08/25	7 d	$ 196.758.000	0,00%	0,00%	$ 0
1627	1.3.4.5.15.2.	Mezcla Asfaltica - GCR	sáb 23/08/25	lun 25/08/25	1 d	$ 137.031.539	0,00%	0,00%	$ 0
1628	1.3.4.5.15.2.	Mezcla Asfaltica - MD12	lun 25/08/25	mar 26/08/25	1 d	$ 53.833.674	0,00%	0,00%	$ 0
1629	*1.3.4.5.16*	*Fin Carril Desaceleración NE*	*mar 26/08/25*	*mar 26/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1630	**1.3.4.5.17**	**ESPACIO PUBLICO BAJO PUENTE - ORIENTE**	**jue 4/01/24**	**lun 7/07/25**	**427 d**	**$ 120.260.286**	**4,50%**	**4,50%**	**$ 5.413.633**
1631	1.3.4.5.17.1	Demolición	sáb 5/07/25	lun 7/07/25	1 d	$ 1.884.946	0,00%	0,00%	$ 0
1632	1.3.4.5.17.2	Excavación	sáb 16/11/24	mar 17/12/24	25 d	$ 29.144.443	0,00%	0,00%	$ 0
1633	1.3.4.5.17.3	Relleno	jue 4/01/24	mié 10/01/24	4 d	$ 5.413.633	100,00%	100,00%	$ 5.413.633
1634	1.3.4.5.17.4	Rellenos 2	vie 14/02/25	vie 21/03/25	29 d	$ 21.654.530	0,00%	0,00%	$ 0
1635	1.3.4.5.17.5	Acabados	sáb 25/01/25	vie 21/03/25	45 d	$ 58.937.738	0,00%	0,00%	$ 0
1636	1.3.4.5.17.6	Baranda Vehicular	mar 25/02/25	vie 21/03/25	20 d	$ 3.224.996	0,00%	0,00%	$ 0
1637	*1.3.4.5.18*	*Fin de Espacio Público*	*mar 26/08/25*	*mar 26/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1638	1.3.4.5.19	Paisajismo	mar 24/06/25	vie 25/07/25	26 d	$ 19.305.172	0,00%	0,00%	$ 0
1639	*1.3.4.6*	*Fin Costado Oriental*	*mié 24/09/25*	*mié 24/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1640	**1.3.4.7**	**COSTADO OCCIDENTAL**	**mar 5/03/24**	**vie 3/10/25**	**449 d**	**$ 11.566.795.1...**	**4,81%**	**4,80%**	**$ 556.646.213**
1641	**1.3.4.7.1**	**APROCHE OCCIDENTAL**	**mar 5/03/24**	**vie 5/09/25**	**426 d**	**$ 2.636.307.156**	**13,84%**	**13,77%**	**$ 364.828.697**
1642	1.3.4.7.1.1	Demolición	jue 6/06/24	vie 14/06/24	7 d	$ 1.702.527	100,00%	0,00%	$ 1.702.527
1643	**1.3.4.7.1.2**	**EJE 1-2**	**mar 6/08/24**	**mar 25/02/25**	**159 d**	**$ 290.546.752**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1644	1.3.4.7.1.2.1	Excavación	lun 16/12/24	mié 18/12/24	3 d	$ 2.463.224	0,00%	0,00%	$ 0
1645	1.3.4.7.1.2.2	Pilotes FDP	mar 6/08/24	mar 6/08/24	1 d	$ 35.563.500	0,00%	0,00%	$ 0
1646	1.3.4.7.1.2.3	Mejoramiento con Rajón	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1647	**1.3.4.7.1.2.4**	**Estructura**	**jue 23/01/25**	**mié 19/02/25**	**23 d**	**$ 42.402.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1648	**1.3.4.7.1.2.4**	**Zapatas**	**jue 23/01/25**	**vie 31/01/25**	**7 d**	**$ 14.436.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1649	1.3.4.7.1.2.4	Solado	jue 23/01/25	vie 24/01/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1650	1.3.4.7.1.2.4	Acero	sáb 25/01/25	mar 28/01/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1651	1.3.4.7.1.2.4	Concreto	mar 28/01/25	vie 31/01/25	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
1652	**1.3.4.7.1.2.4**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 25/01/25**	**mar 4/02/25**	**8 d**	**$ 6.193.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1653	1.3.4.7.1.2.4	Acero	sáb 25/01/25	mié 29/01/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1654	1.3.4.7.1.2.4	Concreto	mié 29/01/25	mar 4/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1655	**1.3.4.7.1.2.4**	**Columnas**	**sáb 25/01/25**	**lun 10/02/25**	**13 d**	**$ 7.261.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1656	1.3.4.7.1.2.4	Acero	sáb 25/01/25	mié 29/01/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1657	1.3.4.7.1.2.4	Concreto	mar 4/02/25	lun 10/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1658	**1.3.4.7.1.2.4**	**Vigas Longitudinales**	**lun 10/02/25**	**mié 19/02/25**	**8 d**	**$ 6.443.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1659	1.3.4.7.1.2.4	Acero	lun 10/02/25	jue 13/02/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1660	1.3.4.7.1.2.4	Concreto	jue 13/02/25	mié 19/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1661	**1.3.4.7.1.2.4**	**Vigas Transversales**	**lun 10/02/25**	**mié 19/02/25**	**8 d**	**$ 8.067.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1662	1.3.4.7.1.2.4	Acero	lun 10/02/25	jue 13/02/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
1663	1.3.4.7.1.2.4	Concreto	jue 13/02/25	mié 19/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1664	**1.3.4.7.1.2.5**	**Tierra Armada**	**lun 20/01/25**	**mar 11/02/25**	**18 d**	**$ 160.590.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1665	1.3.4.7.1.2.5	Geomalla de Refuerzo	lun 20/01/25	vie 7/02/25	15 d	$ 40.147.488	0,00%	0,00%	$ 0
1666	1.3.4.7.1.2.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 21/01/25	sáb 8/02/25	15 d	$ 40.147.488	0,00%	0,00%	$ 0
1667	1.3.4.7.1.2.5	Geotextil Fortex	mar 28/01/25	sáb 8/02/25	10 d	$ 38.660.592	0,00%	0,00%	$ 0
1668	1.3.4.7.1.2.5	Relleno con Ceniza	jue 23/01/25	mar 11/02/25	15 d	$ 41.634.432	0,00%	0,00%	$ 0
1669	**1.3.4.7.1.2.6**	**Fachada en Mampostería**	**mar 11/02/25**	**mar 25/02/25**	**11 d**	**$ 49.118.523**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1670	**1.3.4.7.1.2.6**	**Dobelas**	**mié 12/02/25**	**jue 13/02/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1671	1.3.4.7.1.2.6	Acero	mié 12/02/25	jue 13/02/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1672	**1.3.4.7.1.2.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**jue 13/02/25**	**sáb 15/02/25**	**2 d**	**$ 13.368.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1673	1.3.4.7.1.2.6	Concreto	vie 14/02/25	sáb 15/02/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1674	1.3.4.7.1.2.6	Bloque en Concreto	jue 13/02/25	sáb 15/02/25	2 d	$ 10.829.876	0,00%	0,00%	$ 0
1675	**1.3.4.7.1.2.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**jue 20/02/25**	**mar 25/02/25**	**3 d**	**$ 639.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1676	1.3.4.7.1.2.6	Concreto	sáb 22/02/25	mar 25/02/25	2 d	$ 6.245	0,00%	0,00%	$ 0

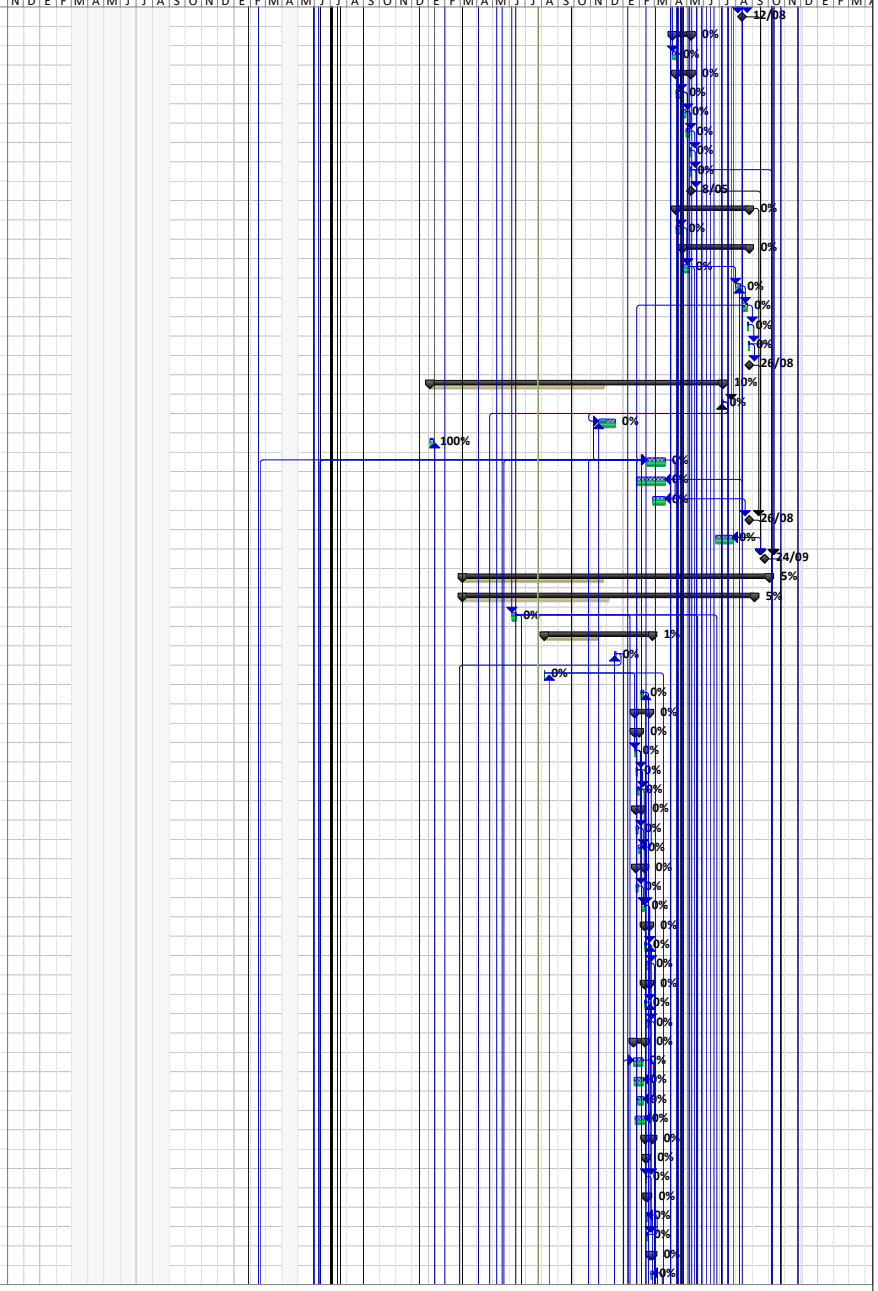

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1677	1.3.4.7.1.2.6	Bloque en Concreto	jue 20/02/25	mar 25/02/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1678	**1.3.4.7.1.2.6**	**Viga de Amarre**	**lun 17/02/25**	**jue 20/02/25**	**4 d**	**$ 732.920**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1679	1.3.4.7.1.2.6	Acero	lun 17/02/25	mar 18/02/25	2 d	$ 99.920	0,00%	0,00%	$ 0
1680	1.3.4.7.1.2.6	Concreto	mar 18/02/25	jue 20/02/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1681	1.3.4.7.1.2.6	Losa de aproximación	mar 11/02/25	mar 18/02/25	6 d	$ 32.648.372	0,00%	0,00%	$ 0
1682	*1.3.4.7.1.3*	*Fin de Eje 1-2*	*mar 25/02/25*	*mar 25/02/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1683	**1.3.4.7.1.4**	**EJE 2-3**	**mié 12/06/24**	**vie 21/02/25**	**200 d**	**$ 273.337.880**	**8,40%**	**8,40%**	**$ 22.970.424**
1684	1.3.4.7.1.4.1	Excavación	mié 12/06/24	vie 14/06/24	3 d	$ 2.463.224	100,00%	100,00%	$ 2.463.224
1685	1.3.4.7.1.4.2	Pilotes FDP	jue 13/06/24	vie 14/06/24	2 d	$ 20.507.200	100,00%	100,00%	$ 20.507.200
1686	1.3.4.7.1.4.3	Pilotes FDP 2	sáb 3/08/24	lun 5/08/24	2 d	$ 30.760.800	0,00%	0,00%	$ 0
1687	1.3.4.7.1.4.4	Mejoramiento con Rajón	mar 28/01/25	lun 3/02/25	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1688	**1.3.4.7.1.4.5**	**Estructura**	**vie 3/01/25**	**sáb 8/02/25**	**28,75 d**	**$ 42.402.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1689	**1.3.4.7.1.4.5**	**Zapatas**	**vie 3/01/25**	**sáb 11/01/25**	**6 d**	**$ 14.436.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1690	1.3.4.7.1.4.5	Solado	vie 3/01/25	sáb 4/01/25	1 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1691	1.3.4.7.1.4.5	Acero	sáb 4/01/25	mié 8/01/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1692	1.3.4.7.1.4.5	Concreto	mié 8/01/25	sáb 11/01/25	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
1693	**1.3.4.7.1.4.5**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 4/01/25**	**mié 15/01/25**	**8 d**	**$ 6.193.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1694	1.3.4.7.1.4.5	Acero	sáb 4/01/25	jue 9/01/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1695	1.3.4.7.1.4.5	Concreto	jue 9/01/25	mié 15/01/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1696	**1.3.4.7.1.4.5**	**Columnas**	**sáb 4/01/25**	**mar 21/01/25**	**13 d**	**$ 7.261.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1697	1.3.4.7.1.4.5	Acero	sáb 4/01/25	jue 9/01/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1698	1.3.4.7.1.4.5	Concreto	mié 15/01/25	mar 21/01/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1699	**1.3.4.7.1.4.5**	**Vigas Longitudinales**	**jue 30/01/25**	**sáb 8/02/25**	**8 d**	**$ 6.443.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1700	1.3.4.7.1.4.5	Acero	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1701	1.3.4.7.1.4.5	Concreto	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1702	**1.3.4.7.1.4.5**	**Vigas Transversales**	**jue 30/01/25**	**sáb 8/02/25**	**8 d**	**$ 8.067.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1703	1.3.4.7.1.4.5	Acero	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
1704	1.3.4.7.1.4.5	Concreto	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1705	**1.3.4.7.1.4.6**	**Tierra Armada**	**lun 20/01/25**	**mar 11/02/25**	**18 d**	**$ 160.325.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1706	1.3.4.7.1.4.6	Geomalla de Refuerzo	lun 20/01/25	vie 7/02/25	15 d	$ 40.081.250	0,00%	0,00%	$ 0
1707	1.3.4.7.1.4.6	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 21/01/25	sáb 8/02/25	15 d	$ 40.081.250	0,00%	0,00%	$ 0
1708	1.3.4.7.1.4.6	Geotextil Fortex	mar 28/01/25	sáb 8/02/25	10 d	$ 38.478.000	0,00%	0,00%	$ 0
1709	1.3.4.7.1.4.6	Relleno con Ceniza	jue 23/01/25	mar 11/02/25	15 d	$ 41.684.500	0,00%	0,00%	$ 0
1710	**1.3.4.7.1.4.7**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 1/02/25**	**vie 21/02/25**	**17 d**	**$ 16.470.151**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1711	**1.3.4.7.1.4.7**	**Dobelas**	**sáb 1/02/25**	**lun 3/02/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1712	1.3.4.7.1.4.7	Acero	sáb 1/02/25	lun 3/02/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1713	**1.3.4.7.1.4.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mar 11/02/25**	**jue 13/02/25**	**2 d**	**$ 13.368.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1714	1.3.4.7.1.4.7	Concreto	mié 12/02/25	jue 13/02/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1715	1.3.4.7.1.4.7	Bloque en Concreto	mar 11/02/25	jue 13/02/25	2 d	$ 10.829.876	0,00%	0,00%	$ 0
1716	**1.3.4.7.1.4.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mar 18/02/25**	**vie 21/02/25**	**3 d**	**$ 639.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1717	1.3.4.7.1.4.7	Concreto	mié 19/02/25	vie 21/02/25	2 d	$ 6.245	0,00%	0,00%	$ 0
1718	1.3.4.7.1.4.7	Bloque en Concreto	mar 18/02/25	vie 21/02/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1719	**1.3.4.7.1.4.7**	**Viga de Amarre**	**jue 13/02/25**	**mar 18/02/25**	**4 d**	**$ 732.920**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1720	1.3.4.7.1.4.7	Acero	jue 13/02/25	sáb 15/02/25	2 d	$ 99.920	0,00%	0,00%	$ 0
1721	1.3.4.7.1.4.7	Concreto	sáb 15/02/25	mar 18/02/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1722	*1.3.4.7.1.5*	*Fin de Eje 2-3*	*vie 21/02/25*	*vie 21/02/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1723	**1.3.4.7.1.6**	**EJE 3-4**	**mié 12/06/24**	**vie 21/02/25**	**200 d**	**$ 292.117.650**	**24,82%**	**24,82%**	**$ 72.510.994**
1724	1.3.4.7.1.6.1	Excavación	mié 12/06/24	vie 14/06/24	3 d	$ 2.463.224	100,00%	100,00%	$ 2.463.224
1725	1.3.4.7.1.6.2	Pilotes FDP	jue 13/06/24	vie 14/06/24	2 d	$ 70.047.770	100,00%	100,00%	$ 70.047.770
1726	1.3.4.7.1.6.3	Mejoramiento con Rajón	mié 22/01/25	mar 28/01/25	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1727	**1.3.4.7.1.6.4**	**Estructura**	**mar 31/12/24**	**sáb 8/02/25**	**31 d**	**$ 42.402.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1728	**1.3.4.7.1.6.4**	**Zapatas**	**mar 31/12/24**	**vie 10/01/25**	**7 d**	**$ 14.436.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1729	1.3.4.7.1.6.4	Solado	mar 31/12/24	jue 2/01/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1730	1.3.4.7.1.6.4	Acero	vie 3/01/25	mar 7/01/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1731	1.3.4.7.1.6.4	Concreto	mar 7/01/25	vie 10/01/25	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
1732	**1.3.4.7.1.6.4**	**Vigas de Cimentación**	**vie 3/01/25**	**mar 14/01/25**	**8 d**	**$ 6.193.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1733	1.3.4.7.1.6.4	Acero	vie 3/01/25	mié 8/01/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1734	1.3.4.7.1.6.4	Concreto	mié 8/01/25	mar 14/01/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1735	**1.3.4.7.1.6.4**	**Columnas**	**vie 3/01/25**	**lun 20/01/25**	**13 d**	**$ 7.261.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1736	1.3.4.7.1.6.4	Acero	vie 3/01/25	mié 8/01/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1737	1.3.4.7.1.6.4	Concreto	mar 14/01/25	lun 20/01/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1738	**1.3.4.7.1.6.4**	**Vigas Longitudinales**	**jue 30/01/25**	**sáb 8/02/25**	**8 d**	**$ 6.443.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1739	1.3.4.7.1.6.4	Acero	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1740	1.3.4.7.1.6.4	Concreto	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1741	**1.3.4.7.1.6.4**	**Vigas Transversales**	**jue 30/01/25**	**sáb 8/02/25**	**8 d**	**$ 8.067.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1742	1.3.4.7.1.6.4	Acero	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0

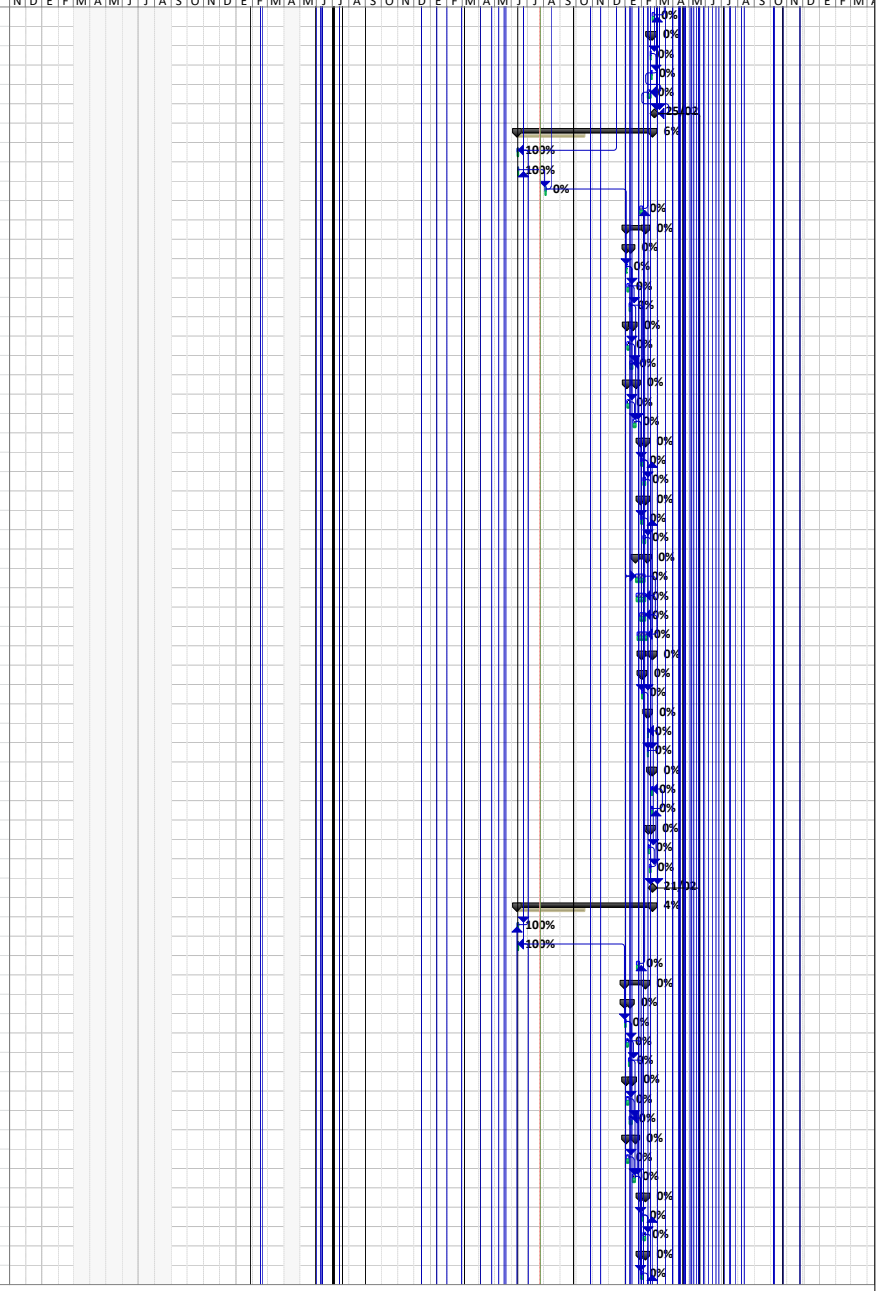

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1743	1.3.4.7.1.6.4	Concreto	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1744	**1.3.4.7.1.6.5**	**Tierra Armada**	**lun 20/01/25**	**mar 11/02/25**	**18 d**	**$ 160.325.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1745	1.3.4.7.1.6.5	Geomalla de Refuerzo	lun 20/01/25	vie 7/02/25	15 d	$ 40.081.249	0,00%	0,00%	$ 0
1746	1.3.4.7.1.6.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 21/01/25	sáb 8/02/25	15 d	$ 40.081.249	0,00%	0,00%	$ 0
1747	1.3.4.7.1.6.5	Geotextil Fortex	mar 28/01/25	sáb 8/02/25	10 d	$ 38.338.590	0,00%	0,00%	$ 0
1748	1.3.4.7.1.6.5	Relleno con Ceniza	jue 23/01/25	mar 11/02/25	15 d	$ 41.823.912	0,00%	0,00%	$ 0
1749	**1.3.4.7.1.6.6**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 1/02/25**	**vie 21/02/25**	**17 d**	**$ 16.470.151**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1750	**1.3.4.7.1.6.6**	**Dobelas**	**sáb 1/02/25**	**lun 3/02/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1751	1.3.4.7.1.6.6	Acero	sáb 1/02/25	lun 3/02/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1752	**1.3.4.7.1.6.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mar 11/02/25**	**jue 13/02/25**	**2 d**	**$ 13.368.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1753	1.3.4.7.1.6.6	Concreto	mié 12/02/25	jue 13/02/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1754	1.3.4.7.1.6.6	Bloque en Concreto	mar 11/02/25	jue 13/02/25	2 d	$ 10.829.876	0,00%	0,00%	$ 0
1755	**1.3.4.7.1.6.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mar 18/02/25**	**vie 21/02/25**	**3 d**	**$ 639.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1756	1.3.4.7.1.6.6	Concreto	mié 19/02/25	vie 21/02/25	2 d	$ 6.245	0,00%	0,00%	$ 0
1757	1.3.4.7.1.6.6	Bloque en Concreto	mar 18/02/25	vie 21/02/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1758	**1.3.4.7.1.6.6**	**Viga de Amarre**	**jue 13/02/25**	**mar 18/02/25**	**4 d**	**$ 732.920**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1759	1.3.4.7.1.6.6	Acero	jue 13/02/25	sáb 15/02/25	2 d	$ 99.920	0,00%	0,00%	$ 0
1760	1.3.4.7.1.6.6	Concreto	sáb 15/02/25	mar 18/02/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1761	*1.3.4.7.1.7*	*Fin de Eje 3-4*	*vie 21/02/25*	*vie 21/02/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1762	**1.3.4.7.1.8**	**EJE 4-5**	**mar 12/03/24**	**vie 21/02/25**	**268,75 d**	**$ 273.182.880**	**19,61%**	**19,61%**	**$ 53.576.224**
1763	1.3.4.7.1.8.1	Excavación	mar 12/03/24	jue 14/03/24	3 d	$ 2.463.224	100,00%	100,00%	$ 2.463.224
1764	1.3.4.7.1.8.2	Pilotes FDP	jue 13/06/24	vie 14/06/24	2 d	$ 51.113.000	100,00%	100,00%	$ 51.113.000
1765	1.3.4.7.1.8.3	Mejoramiento con Rajón	mié 15/01/25	mar 21/01/25	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1766	**1.3.4.7.1.8.4**	**Estructura**	**mar 31/12/24**	**sáb 8/02/25**	**31 d**	**$ 42.402.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1767	**1.3.4.7.1.8.4**	**Zapatas**	**mar 31/12/24**	**vie 10/01/25**	**7 d**	**$ 14.436.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1768	1.3.4.7.1.8.4	Solado	mar 31/12/24	jue 2/01/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1769	1.3.4.7.1.8.4	Acero	vie 3/01/25	mar 7/01/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1770	1.3.4.7.1.8.4	Concreto	mar 7/01/25	vie 10/01/25	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
1771	**1.3.4.7.1.8.4**	**Vigas de Cimentación**	**vie 3/01/25**	**mar 14/01/25**	**8 d**	**$ 6.193.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1772	1.3.4.7.1.8.4	Acero	vie 3/01/25	mié 8/01/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1773	1.3.4.7.1.8.4	Concreto	mié 8/01/25	mar 14/01/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1774	**1.3.4.7.1.8.4**	**Columnas**	**vie 3/01/25**	**lun 20/01/25**	**13 d**	**$ 7.261.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1775	1.3.4.7.1.8.4	Acero	vie 3/01/25	mié 8/01/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1776	1.3.4.7.1.8.4	Concreto	mar 14/01/25	lun 20/01/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1777	**1.3.4.7.1.8.4**	**Vigas Longitudinales**	**jue 30/01/25**	**sáb 8/02/25**	**8 d**	**$ 6.443.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1778	1.3.4.7.1.8.4	Acero	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1779	1.3.4.7.1.8.4	Concreto	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1780	**1.3.4.7.1.8.4**	**Vigas Transversales**	**jue 30/01/25**	**sáb 8/02/25**	**8 d**	**$ 8.067.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1781	1.3.4.7.1.8.4	Acero	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
1782	1.3.4.7.1.8.4	Concreto	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1783	**1.3.4.7.1.8.5**	**Tierra Armada**	**lun 20/01/25**	**mar 11/02/25**	**18 d**	**$ 160.325.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1784	1.3.4.7.1.8.5	Geomalla de Refuerzo	lun 20/01/25	vie 7/02/25	15 d	$ 40.081.251	0,00%	0,00%	$ 0
1785	1.3.4.7.1.8.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 21/01/25	sáb 8/02/25	15 d	$ 40.081.251	0,00%	0,00%	$ 0
1786	1.3.4.7.1.8.5	Geotextil Fortex	mar 28/01/25	sáb 8/02/25	10 d	$ 38.172.616	0,00%	0,00%	$ 0
1787	1.3.4.7.1.8.5	Relleno con Ceniza	jue 23/01/25	mar 11/02/25	15 d	$ 41.989.882	0,00%	0,00%	$ 0
1788	**1.3.4.7.1.8.6**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 1/02/25**	**vie 21/02/25**	**17 d**	**$ 16.470.151**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1789	**1.3.4.7.1.8.6**	**Dobelas**	**sáb 1/02/25**	**lun 3/02/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1790	1.3.4.7.1.8.6	Acero	sáb 1/02/25	lun 3/02/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1791	**1.3.4.7.1.8.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mar 11/02/25**	**jue 13/02/25**	**2 d**	**$ 13.368.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1792	1.3.4.7.1.8.6	Concreto	mié 12/02/25	jue 13/02/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1793	1.3.4.7.1.8.6	Bloque en Concreto	mar 11/02/25	jue 13/02/25	2 d	$ 10.829.876	0,00%	0,00%	$ 0
1794	**1.3.4.7.1.8.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mar 18/02/25**	**vie 21/02/25**	**3 d**	**$ 639.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1795	1.3.4.7.1.8.6	Concreto	mié 19/02/25	vie 21/02/25	2 d	$ 6.245	0,00%	0,00%	$ 0
1796	1.3.4.7.1.8.6	Bloque en Concreto	mar 18/02/25	vie 21/02/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1797	**1.3.4.7.1.8.6**	**Viga de Amarre**	**jue 13/02/25**	**mar 18/02/25**	**4 d**	**$ 732.920**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1798	1.3.4.7.1.8.6	Acero	jue 13/02/25	sáb 15/02/25	2 d	$ 99.920	0,00%	0,00%	$ 0
1799	1.3.4.7.1.8.6	Concreto	sáb 15/02/25	mar 18/02/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1800	*1.3.4.7.1.9*	*Fin de Eje 4-5*	*vie 21/02/25*	*vie 21/02/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1801	**1.3.4.7.1.10**	**EJE 5-6**	**vie 8/03/24**	**vie 21/02/25**	**271,5 d**	**$ 273.123.788**	**19,59%**	**19,59%**	**$ 53.517.132**
1802	1.3.4.7.1.10.	Excavación	vie 8/03/24	lun 11/03/24	3 d	$ 2.404.132	100,00%	100,00%	$ 2.404.132
1803	1.3.4.7.1.10.	Pilotes FDP	mar 11/06/24	mié 12/06/24	2 d	$ 51.113.000	100,00%	100,00%	$ 51.113.000
1804	1.3.4.7.1.10.	Mejoramiento con Rajón	jue 9/01/25	mié 15/01/25	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1805	**1.3.4.7.1.10.**	**Estructura**	**jue 9/01/25**	**sáb 8/02/25**	**25 d**	**$ 42.402.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1806	**1.3.4.7.1.10.**	**Zapatas**	**jue 9/01/25**	**vie 17/01/25**	**7 d**	**$ 14.436.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1807	1.3.4.7.1.10.	Solado	jue 9/01/25	sáb 11/01/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1808	1.3.4.7.1.10.	Acero	sáb 11/01/25	mar 14/01/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0

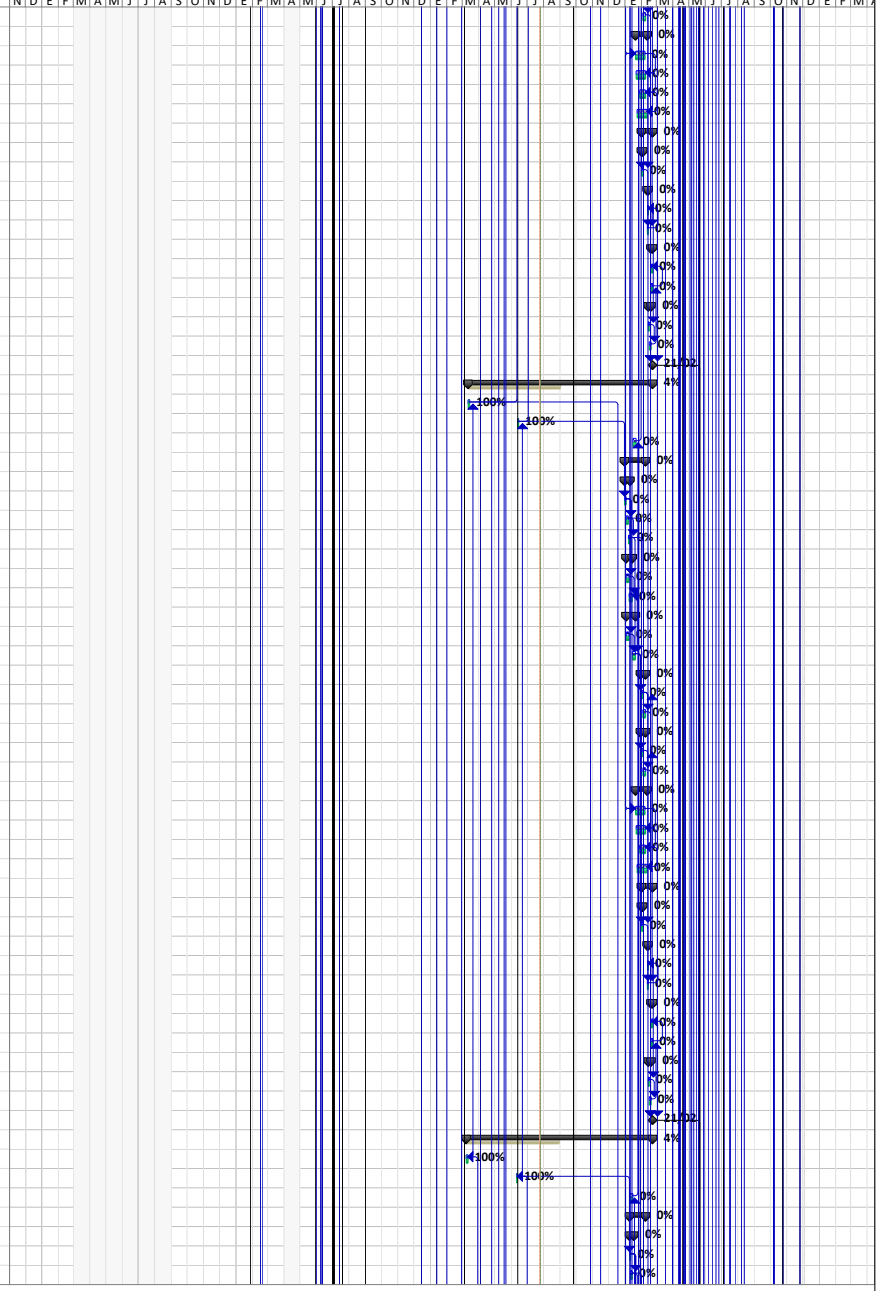

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1809	1.3.4.7.1.10.	Concreto	mar 14/01/25	vie 17/01/25	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
1810	**1.3.4.7.1.10.**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 11/01/25**	**mar 21/01/25**	**8 d**	**$ 6.193.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1811	1.3.4.7.1.10.	Acero	sáb 11/01/25	mié 15/01/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1812	1.3.4.7.1.10.	Concreto	mié 15/01/25	mar 21/01/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1813	**1.3.4.7.1.10.**	**Columnas**	**sáb 11/01/25**	**lun 27/01/25**	**13 d**	**$ 7.261.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1814	1.3.4.7.1.10.	Acero	sáb 11/01/25	mié 15/01/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1815	1.3.4.7.1.10.	Concreto	mar 21/01/25	lun 27/01/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1816	**1.3.4.7.1.10.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 30/01/25**	**sáb 8/02/25**	**8 d**	**$ 6.443.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1817	1.3.4.7.1.10.	Acero	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1818	1.3.4.7.1.10.	Concreto	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1819	**1.3.4.7.1.10.**	**Vigas Transversales**	**jue 30/01/25**	**sáb 8/02/25**	**8 d**	**$ 8.067.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1820	1.3.4.7.1.10.	Acero	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
1821	1.3.4.7.1.10.	Concreto	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1822	**1.3.4.7.1.10.**	**Tierra Armada**	**lun 20/01/25**	**mar 11/02/25**	**18 d**	**$ 160.325.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1823	1.3.4.7.1.10.	Geomalla de Refuerzo	lun 20/01/25	vie 7/02/25	15 d	$ 40.081.241	0,00%	0,00%	$ 0
1824	1.3.4.7.1.10.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 21/01/25	sáb 8/02/25	15 d	$ 40.081.241	0,00%	0,00%	$ 0
1825	1.3.4.7.1.10.	Geotextil Fortex	mar 28/01/25	sáb 8/02/25	10 d	$ 37.971.738	0,00%	0,00%	$ 0
1826	1.3.4.7.1.10.	Relleno con Ceniza	jue 23/01/25	mar 11/02/25	15 d	$ 42.190.780	0,00%	0,00%	$ 0
1827	**1.3.4.7.1.10.**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 1/02/25**	**vie 21/02/25**	**17 d**	**$ 16.470.151**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1828	**1.3.4.7.1.10.**	**Dobelas**	**sáb 1/02/25**	**lun 3/02/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1829	1.3.4.7.1.10.	Acero	sáb 1/02/25	lun 3/02/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1830	**1.3.4.7.1.10.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mar 11/02/25**	**jue 13/02/25**	**2 d**	**$ 13.368.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1831	1.3.4.7.1.10.	Concreto	mié 12/02/25	jue 13/02/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1832	1.3.4.7.1.10.	Bloque en Concreto	mar 11/02/25	jue 13/02/25	2 d	$ 10.829.876	0,00%	0,00%	$ 0
1833	**1.3.4.7.1.10.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mar 18/02/25**	**vie 21/02/25**	**3 d**	**$ 639.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1834	1.3.4.7.1.10.	Concreto	mié 19/02/25	vie 21/02/25	2 d	$ 6.245	0,00%	0,00%	$ 0
1835	1.3.4.7.1.10.	Bloque en Concreto	mar 18/02/25	vie 21/02/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1836	**1.3.4.7.1.10.**	**Viga de Amarre**	**jue 13/02/25**	**mar 18/02/25**	**4 d**	**$ 732.920**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1837	1.3.4.7.1.10.	Acero	jue 13/02/25	sáb 15/02/25	2 d	$ 99.920	0,00%	0,00%	$ 0
1838	1.3.4.7.1.10.	Concreto	sáb 15/02/25	mar 18/02/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1839	*1.3.4.7.1.11*	*Fin de Eje 5-6*	*vie 21/02/25*	*vie 21/02/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1840	**1.3.4.7.1.12**	**EJE 6-7**	**vie 8/03/24**	**vie 21/02/25**	**271,5 d**	**$ 273.123.788**	**19,59%**	**19,59%**	**$ 53.517.132**
1841	1.3.4.7.1.12.	Excavación	vie 8/03/24	lun 11/03/24	3 d	$ 2.404.132	100,00%	100,00%	$ 2.404.132
1842	1.3.4.7.1.12.	Pilotes FDP	mar 11/06/24	mié 12/06/24	2 d	$ 51.113.000	100,00%	100,00%	$ 51.113.000
1843	1.3.4.7.1.12.	Mejoramiento con Rajón	jue 2/01/25	jue 9/01/25	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1844	**1.3.4.7.1.12.**	**Estructura**	**jue 9/01/25**	**sáb 8/02/25**	**25 d**	**$ 42.402.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1845	**1.3.4.7.1.12.**	**Zapatas**	**jue 9/01/25**	**vie 17/01/25**	**7 d**	**$ 14.436.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1846	1.3.4.7.1.12.	Solado	jue 9/01/25	sáb 11/01/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1847	1.3.4.7.1.12.	Acero	sáb 11/01/25	mar 14/01/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1848	1.3.4.7.1.12.	Concreto	mar 14/01/25	vie 17/01/25	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
1849	**1.3.4.7.1.12.**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 11/01/25**	**mar 21/01/25**	**8 d**	**$ 6.193.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1850	1.3.4.7.1.12.	Acero	sáb 11/01/25	mié 15/01/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1851	1.3.4.7.1.12.	Concreto	mié 15/01/25	mar 21/01/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1852	**1.3.4.7.1.12.**	**Columnas**	**sáb 11/01/25**	**lun 27/01/25**	**13 d**	**$ 7.261.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1853	1.3.4.7.1.12.	Acero	sáb 11/01/25	mié 15/01/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1854	1.3.4.7.1.12.	Concreto	mar 21/01/25	lun 27/01/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1855	**1.3.4.7.1.12.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 30/01/25**	**sáb 8/02/25**	**8 d**	**$ 6.443.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1856	1.3.4.7.1.12.	Acero	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1857	1.3.4.7.1.12.	Concreto	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1858	**1.3.4.7.1.12.**	**Vigas Transversales**	**jue 30/01/25**	**sáb 8/02/25**	**8 d**	**$ 8.067.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1859	1.3.4.7.1.12.	Acero	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
1860	1.3.4.7.1.12.	Concreto	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1861	**1.3.4.7.1.12.**	**Tierra Armada**	**lun 20/01/25**	**mar 11/02/25**	**18 d**	**$ 160.325.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1862	1.3.4.7.1.12.	Geomalla de Refuerzo	lun 20/01/25	vie 7/02/25	15 d	$ 40.081.257	0,00%	0,00%	$ 0
1863	1.3.4.7.1.12.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 21/01/25	sáb 8/02/25	15 d	$ 40.081.257	0,00%	0,00%	$ 0
1864	1.3.4.7.1.12.	Geotextil Fortex	mar 28/01/25	sáb 8/02/25	10 d	$ 37.723.536	0,00%	0,00%	$ 0
1865	1.3.4.7.1.12.	Relleno con Ceniza	jue 23/01/25	mar 11/02/25	15 d	$ 42.438.950	0,00%	0,00%	$ 0
1866	**1.3.4.7.1.12.**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 1/02/25**	**vie 21/02/25**	**17 d**	**$ 16.470.151**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1867	**1.3.4.7.1.12.**	**Dobelas**	**sáb 1/02/25**	**lun 3/02/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1868	1.3.4.7.1.12.	Acero	sáb 1/02/25	lun 3/02/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1869	**1.3.4.7.1.12.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mar 11/02/25**	**jue 13/02/25**	**2 d**	**$ 13.368.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1870	1.3.4.7.1.12.	Concreto	mié 12/02/25	jue 13/02/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1871	1.3.4.7.1.12.	Bloque en Concreto	mar 11/02/25	jue 13/02/25	2 d	$ 10.829.876	0,00%	0,00%	$ 0
1872	**1.3.4.7.1.12.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mar 18/02/25**	**vie 21/02/25**	**3 d**	**$ 639.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1873	1.3.4.7.1.12.	Concreto	mié 19/02/25	vie 21/02/25	2 d	$ 6.245	0,00%	0,00%	$ 0
1874	1.3.4.7.1.12.	Bloque en Concreto	mar 18/02/25	vie 21/02/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0

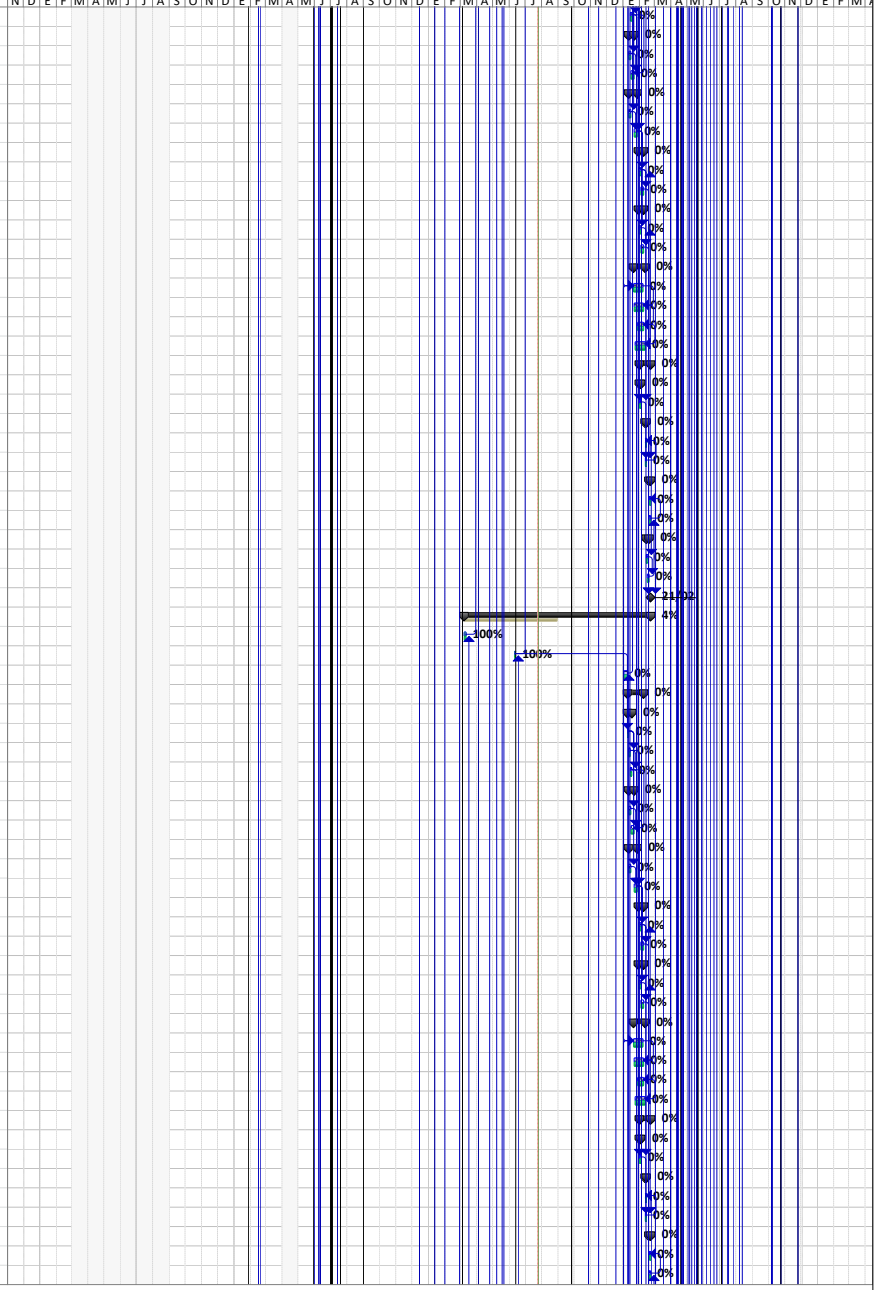


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1875	**1.3.4.7.1.12.**	**Viga de Amarre**	**jue 13/02/25**	**mar 18/02/25**	**4 d**	**$ 732.920**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1876	1.3.4.7.1.12.	Acero	jue 13/02/25	sáb 15/02/25	2 d	$ 99.920	0,00%	0,00%	$ 0
1877	1.3.4.7.1.12.	Concreto	sáb 15/02/25	mar 18/02/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1878	*1.3.4.7.1.13*	*Fin de Eje 6-7*	*vie 21/02/25*	*vie 21/02/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1879	**1.3.4.7.1.14**	**EJE 7-8**	**mar 5/03/24**	**vie 21/02/25**	**274,5 d**	**$ 273.123.788**	**19,59%**	**19,59%**	**$ 53.517.132**
1880	1.3.4.7.1.14.	Excavación	mar 5/03/24	jue 7/03/24	3 d	$ 2.404.132	100,00%	100,00%	$ 2.404.132
1881	1.3.4.7.1.14.	Pilotes FDP	jue 6/06/24	sáb 8/06/24	2 d	$ 51.113.000	100,00%	100,00%	$ 51.113.000
1882	1.3.4.7.1.14.	Mejoramiento con Rajón	jue 26/12/24	jue 2/01/25	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1883	**1.3.4.7.1.14.**	**Estructura**	**mar 7/01/25**	**sáb 8/02/25**	**27 d**	**$ 42.402.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1884	**1.3.4.7.1.14.**	**Zapatas**	**mar 7/01/25**	**mié 15/01/25**	**7 d**	**$ 14.436.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1885	1.3.4.7.1.14.	Solado	mar 7/01/25	jue 9/01/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1886	1.3.4.7.1.14.	Acero	jue 9/01/25	sáb 11/01/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1887	1.3.4.7.1.14.	Concreto	sáb 11/01/25	mié 15/01/25	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
1888	**1.3.4.7.1.14.**	**Vigas de Cimentación**	**jue 9/01/25**	**sáb 18/01/25**	**8 d**	**$ 6.193.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1889	1.3.4.7.1.14.	Acero	jue 9/01/25	lun 13/01/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1890	1.3.4.7.1.14.	Concreto	lun 13/01/25	sáb 18/01/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1891	**1.3.4.7.1.14.**	**Columnas**	**jue 9/01/25**	**vie 24/01/25**	**13 d**	**$ 7.261.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1892	1.3.4.7.1.14.	Acero	jue 9/01/25	lun 13/01/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1893	1.3.4.7.1.14.	Concreto	sáb 18/01/25	vie 24/01/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1894	**1.3.4.7.1.14.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 30/01/25**	**sáb 8/02/25**	**8 d**	**$ 6.443.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1895	1.3.4.7.1.14.	Acero	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1896	1.3.4.7.1.14.	Concreto	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1897	**1.3.4.7.1.14.**	**Vigas Transversales**	**jue 30/01/25**	**sáb 8/02/25**	**8 d**	**$ 8.067.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1898	1.3.4.7.1.14.	Acero	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
1899	1.3.4.7.1.14.	Concreto	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1900	**1.3.4.7.1.14.**	**Tierra Armada**	**lun 20/01/25**	**mar 11/02/25**	**18 d**	**$ 160.325.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1901	1.3.4.7.1.14.	Geomalla de Refuerzo	lun 20/01/25	vie 7/02/25	15 d	$ 40.081.245	0,00%	0,00%	$ 0
1902	1.3.4.7.1.14.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 21/01/25	sáb 8/02/25	15 d	$ 40.081.245	0,00%	0,00%	$ 0
1903	1.3.4.7.1.14.	Geotextil Fortex	mar 28/01/25	sáb 8/02/25	10 d	$ 37.409.182	0,00%	0,00%	$ 0
1904	1.3.4.7.1.14.	Relleno con Ceniza	jue 23/01/25	mar 11/02/25	15 d	$ 42.753.328	0,00%	0,00%	$ 0
1905	**1.3.4.7.1.14.**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 1/02/25**	**vie 21/02/25**	**17 d**	**$ 16.470.151**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1906	**1.3.4.7.1.14.**	**Dobelas**	**sáb 1/02/25**	**lun 3/02/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1907	1.3.4.7.1.14.	Acero	sáb 1/02/25	lun 3/02/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1908	**1.3.4.7.1.14.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mar 11/02/25**	**jue 13/02/25**	**2 d**	**$ 13.368.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1909	1.3.4.7.1.14.	Concreto	mié 12/02/25	jue 13/02/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1910	1.3.4.7.1.14.	Bloque en Concreto	mar 11/02/25	jue 13/02/25	2 d	$ 10.829.876	0,00%	0,00%	$ 0
1911	**1.3.4.7.1.14.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mar 18/02/25**	**vie 21/02/25**	**3 d**	**$ 639.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1912	1.3.4.7.1.14.	Concreto	mié 19/02/25	vie 21/02/25	2 d	$ 6.245	0,00%	0,00%	$ 0
1913	1.3.4.7.1.14.	Bloque en Concreto	mar 18/02/25	vie 21/02/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1914	**1.3.4.7.1.14.**	**Viga de Amarre**	**jue 13/02/25**	**mar 18/02/25**	**4 d**	**$ 732.920**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1915	1.3.4.7.1.14.	Acero	jue 13/02/25	sáb 15/02/25	2 d	$ 99.920	0,00%	0,00%	$ 0
1916	1.3.4.7.1.14.	Concreto	sáb 15/02/25	mar 18/02/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1917	*1.3.4.7.1.15*	*Fin de Eje 7-8*	*vie 21/02/25*	*vie 21/02/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1918	**1.3.4.7.1.16**	**EJE 8-9**	**mar 5/03/24**	**vie 21/02/25**	**274,5 d**	**$ 273.123.788**	**19,59%**	**19,59%**	**$ 53.517.132**
1919	1.3.4.7.1.16.	Excavación	mar 5/03/24	jue 7/03/24	3 d	$ 2.404.132	100,00%	100,00%	$ 2.404.132
1920	1.3.4.7.1.16.	Pilotes FDP	jue 6/06/24	sáb 8/06/24	2 d	$ 51.113.000	100,00%	100,00%	$ 51.113.000
1921	1.3.4.7.1.16.	Mejoramiento con Rajón	mié 18/12/24	mar 24/12/24	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1922	**1.3.4.7.1.16.**	**Estructura**	**mar 7/01/25**	**sáb 8/02/25**	**27 d**	**$ 42.402.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1923	**1.3.4.7.1.16.**	**Zapatas**	**mar 7/01/25**	**mié 15/01/25**	**7 d**	**$ 14.436.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1924	1.3.4.7.1.16.	Solado	mar 7/01/25	jue 9/01/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
1925	1.3.4.7.1.16.	Acero	jue 9/01/25	sáb 11/01/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1926	1.3.4.7.1.16.	Concreto	sáb 11/01/25	mié 15/01/25	3 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
1927	**1.3.4.7.1.16.**	**Vigas de Cimentación**	**jue 9/01/25**	**sáb 18/01/25**	**8 d**	**$ 6.193.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1928	1.3.4.7.1.16.	Acero	jue 9/01/25	lun 13/01/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1929	1.3.4.7.1.16.	Concreto	lun 13/01/25	sáb 18/01/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1930	**1.3.4.7.1.16.**	**Columnas**	**jue 9/01/25**	**vie 24/01/25**	**13 d**	**$ 7.261.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1931	1.3.4.7.1.16.	Acero	jue 9/01/25	lun 13/01/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1932	1.3.4.7.1.16.	Concreto	sáb 18/01/25	vie 24/01/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1933	**1.3.4.7.1.16.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 30/01/25**	**sáb 8/02/25**	**8 d**	**$ 6.443.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1934	1.3.4.7.1.16.	Acero	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1935	1.3.4.7.1.16.	Concreto	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1936	**1.3.4.7.1.16.**	**Vigas Transversales**	**jue 30/01/25**	**sáb 8/02/25**	**8 d**	**$ 8.067.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1937	1.3.4.7.1.16.	Acero	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
1938	1.3.4.7.1.16.	Concreto	lun 3/02/25	sáb 8/02/25	5 d	$ 3.165.000	0,00%	0,00%	$ 0
1939	**1.3.4.7.1.16.**	**Tierra Armada**	**lun 20/01/25**	**mar 11/02/25**	**18 d**	**$ 160.325.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1940	1.3.4.7.1.16.	Geomalla de Refuerzo	lun 20/01/25	vie 7/02/25	15 d	$ 40.081.249	0,00%	0,00%	$ 0

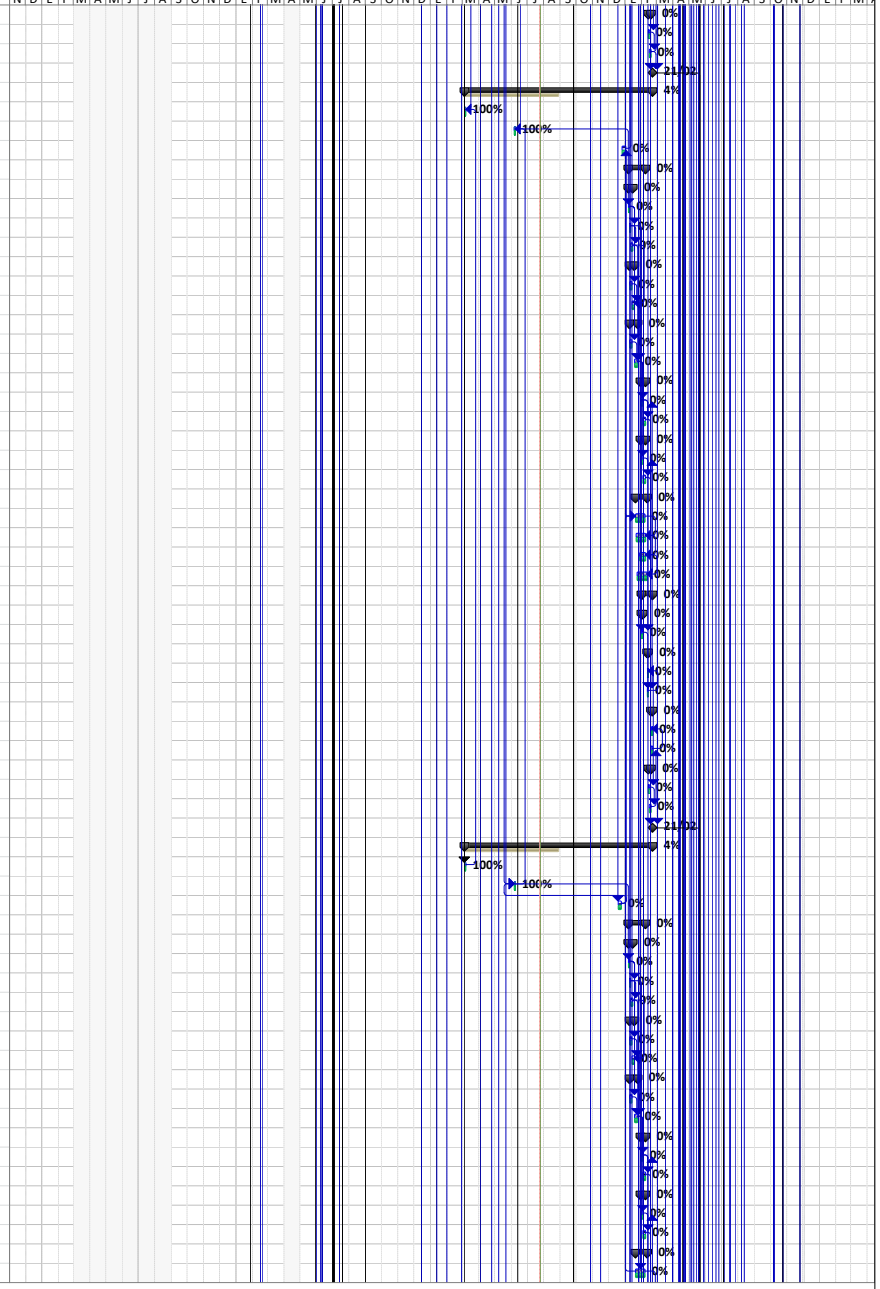


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
1941	1.3.4.7.1.16.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 21/01/25	sáb 8/02/25	15 d	$ 40.081.249	0,00%	0,00%	$ 0
1942	1.3.4.7.1.16.	Geotextil Fortex	mar 28/01/25	sáb 8/02/25	10 d	$ 36.998.080	0,00%	0,00%	$ 0
1943	1.3.4.7.1.16.	Relleno con Ceniza	jue 23/01/25	mar 11/02/25	15 d	$ 43.164.422	0,00%	0,00%	$ 0
1944	**1.3.4.7.1.16.**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 1/02/25**	**vie 21/02/25**	**17 d**	**$ 16.470.151**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1945	**1.3.4.7.1.16.**	**Dobelas**	**sáb 1/02/25**	**lun 3/02/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1946	1.3.4.7.1.16.	Acero	sáb 1/02/25	lun 3/02/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1947	**1.3.4.7.1.16.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mar 11/02/25**	**jue 13/02/25**	**2 d**	**$ 13.368.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1948	1.3.4.7.1.16.	Concreto	mié 12/02/25	jue 13/02/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1949	1.3.4.7.1.16.	Bloque en Concreto	mar 11/02/25	jue 13/02/25	2 d	$ 10.829.876	0,00%	0,00%	$ 0
1950	**1.3.4.7.1.16.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mar 18/02/25**	**vie 21/02/25**	**3 d**	**$ 639.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1951	1.3.4.7.1.16.	Concreto	mié 19/02/25	vie 21/02/25	2 d	$ 6.245	0,00%	0,00%	$ 0
1952	1.3.4.7.1.16.	Bloque en Concreto	mar 18/02/25	vie 21/02/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1953	**1.3.4.7.1.16.**	**Viga de Amarre**	**jue 13/02/25**	**mar 18/02/25**	**4 d**	**$ 732.920**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1954	1.3.4.7.1.16.	Acero	jue 13/02/25	sáb 15/02/25	2 d	$ 99.920	0,00%	0,00%	$ 0
1955	1.3.4.7.1.16.	Concreto	sáb 15/02/25	mar 18/02/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
1956	*1.3.4.7.1.17*	*Fin de Eje 8-9*	*vie 21/02/25*	*vie 21/02/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1957	**1.3.4.7.1.18**	**PAVIMENTO**	**mié 21/05/25**	**jue 28/08/25**	**77,25 d**	**$ 158.149.631**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1958	1.3.4.7.1.18.	Subbase	mié 21/05/25	mar 3/06/25	10 d	$ 33.995.200	0,00%	0,00%	$ 0
1959	1.3.4.7.1.18.	Base	lun 11/08/25	sáb 23/08/25	10 d	$ 32.088.000	0,00%	0,00%	$ 0
1960	1.3.4.7.1.18.	Mezcla Asfaltica - GCR	lun 25/08/25	mar 26/08/25	2 d	$ 68.987.081	0,00%	0,00%	$ 0
1961	1.3.4.7.1.18.	Mezcla Asfaltica - MD12	mié 27/08/25	jue 28/08/25	2 d	$ 23.079.350	0,00%	0,00%	$ 0
1962	1.3.4.7.1.19	Baranda Vehicular	lun 25/08/25	vie 5/09/25	10 d	$ 254.774.684	0,00%	0,00%	$ 0
1963	*1.3.4.7.2*	*Fin de Aproche Occidental*	*vie 5/09/25*	*vie 5/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
1964	**1.3.4.7.3**	**TRANSICION**	**jue 7/03/24**	**jue 3/07/25**	**373,25 d**	**$ 1.431.202.807**	**0,46%**	**0,46%**	**$ 6.605.959**
1965	1.3.4.7.3.1	Demolición	lun 23/12/24	jue 26/12/24	2 d	$ 7.489.537	0,00%	0,00%	$ 0
1966	**1.3.4.7.3.2**	**EJE 1-2**	**sáb 13/07/24**	**lun 5/05/25**	**230,25 d**	**$ 235.221.517**	**0,56%**	**0,56%**	**$ 1.326.791**
1967	1.3.4.7.3.2.1	Excavación-1	sáb 13/07/24	lun 15/07/24	1 d	$ 1.326.791	100,00%	100,00%	$ 1.326.791
1968	1.3.4.7.3.2.2	Excavación	vie 17/01/25	mar 21/01/25	3 d	$ 294.842	0,00%	0,00%	$ 0
1969	1.3.4.7.3.2.3	Pilotes FDP	sáb 22/03/25	mié 26/03/25	2 d	$ 35.064.000	0,00%	0,00%	$ 0
1970	1.3.4.7.3.2.4	Mejoramiento con Rajón	mié 5/03/25	mar 11/03/25	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
1971	**1.3.4.7.3.2.5**	**Estructura**	**sáb 29/03/25**	**mar 29/04/25**	**23 d**	**$ 52.601.733**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1972	**1.3.4.7.3.2.5**	**Zapatas**	**sáb 29/03/25**	**lun 7/04/25**	**7 d**	**$ 17.672.238**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1973	1.3.4.7.3.2.5	Solado	sáb 29/03/25	mar 1/04/25	2 d	$ 60.101	0,00%	0,00%	$ 0
1974	1.3.4.7.3.2.5	Acero	mar 1/04/25	jue 3/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
1975	1.3.4.7.3.2.5	Concreto	jue 3/04/25	lun 7/04/25	3 d	$ 9.512.137	0,00%	0,00%	$ 0
1976	**1.3.4.7.3.2.5**	**Vigas de Cimentación**	**mar 1/04/25**	**jue 10/04/25**	**8 d**	**$ 9.358.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1977	1.3.4.7.3.2.5	Acero	mar 1/04/25	vie 4/04/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
1978	1.3.4.7.3.2.5	Concreto	vie 4/04/25	jue 10/04/25	5 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
1979	**1.3.4.7.3.2.5**	**Columnas**	**mar 1/04/25**	**mié 16/04/25**	**13 d**	**$ 8.527.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1980	1.3.4.7.3.2.5	Acero	mar 1/04/25	vie 4/04/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
1981	1.3.4.7.3.2.5	Concreto	jue 10/04/25	mié 16/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
1982	**1.3.4.7.3.2.5**	**Vigas Longitudinales**	**sáb 19/04/25**	**mar 29/04/25**	**8 d**	**$ 7.709.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1983	1.3.4.7.3.2.5	Acero	sáb 19/04/25	mié 23/04/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
1984	1.3.4.7.3.2.5	Concreto	mié 23/04/25	mar 29/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
1985	**1.3.4.7.3.2.5**	**Vigas Transversales**	**sáb 19/04/25**	**mar 29/04/25**	**8 d**	**$ 9.333.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1986	1.3.4.7.3.2.5	Acero	sáb 19/04/25	mié 23/04/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
1987	1.3.4.7.3.2.5	Concreto	mié 23/04/25	mar 29/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
1988	**1.3.4.7.3.2.6**	**Tierra Armada**	**jue 30/01/25**	**jue 20/02/25**	**18 d**	**$ 129.055.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1989	1.3.4.7.3.2.6	Geomalla de Refuerzo	jue 30/01/25	lun 17/02/25	15 d	$ 32.263.741	0,00%	0,00%	$ 0
1990	1.3.4.7.3.2.6	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 31/01/25	mar 18/02/25	15 d	$ 32.263.741	0,00%	0,00%	$ 0
1991	1.3.4.7.3.2.6	Geotextil Fortex	jue 6/02/25	mar 18/02/25	10 d	$ 31.391.784	0,00%	0,00%	$ 0
1992	1.3.4.7.3.2.6	Relleno con Ceniza	lun 3/02/25	jue 20/02/25	15 d	$ 33.135.734	0,00%	0,00%	$ 0
1993	**1.3.4.7.3.2.7**	**Fachada en Mampostería**	**mar 22/04/25**	**lun 5/05/25**	**10 d**	**$ 16.470.151**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1994	**1.3.4.7.3.2.7**	**Dobelas**	**mar 22/04/25**	**mié 23/04/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1995	1.3.4.7.3.2.7	Acero	mar 22/04/25	mié 23/04/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
1996	**1.3.4.7.3.2.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mié 23/04/25**	**vie 25/04/25**	**2 d**	**$ 13.368.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
1997	1.3.4.7.3.2.7	Concreto	jue 24/04/25	vie 25/04/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
1998	1.3.4.7.3.2.7	Bloque en Concreto	mié 23/04/25	vie 25/04/25	2 d	$ 10.829.876	0,00%	0,00%	$ 0
1999	**1.3.4.7.3.2.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mié 30/04/25**	**lun 5/05/25**	**3 d**	**$ 639.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2000	1.3.4.7.3.2.7	Concreto	vie 2/05/25	lun 5/05/25	2 d	$ 6.245	0,00%	0,00%	$ 0
2001	1.3.4.7.3.2.7	Bloque en Concreto	mié 30/04/25	lun 5/05/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2002	**1.3.4.7.3.2.7**	**Viga de Amarre**	**vie 25/04/25**	**mié 30/04/25**	**4 d**	**$ 732.920**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2003	1.3.4.7.3.2.7	Acero	vie 25/04/25	lun 28/04/25	2 d	$ 99.920	0,00%	0,00%	$ 0
2004	1.3.4.7.3.2.7	Concreto	lun 28/04/25	mié 30/04/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2005	*1.3.4.7.3.3*	*Fin de Eje 1-2*	*lun 5/05/25*	*lun 5/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2006	**1.3.4.7.3.4**	**EJE 2-3**	**jue 18/07/24**	**vie 2/05/25**	**224,25 d**	**$ 234.885.289**	**0,56%**	**0,56%**	**$ 1.319.792**

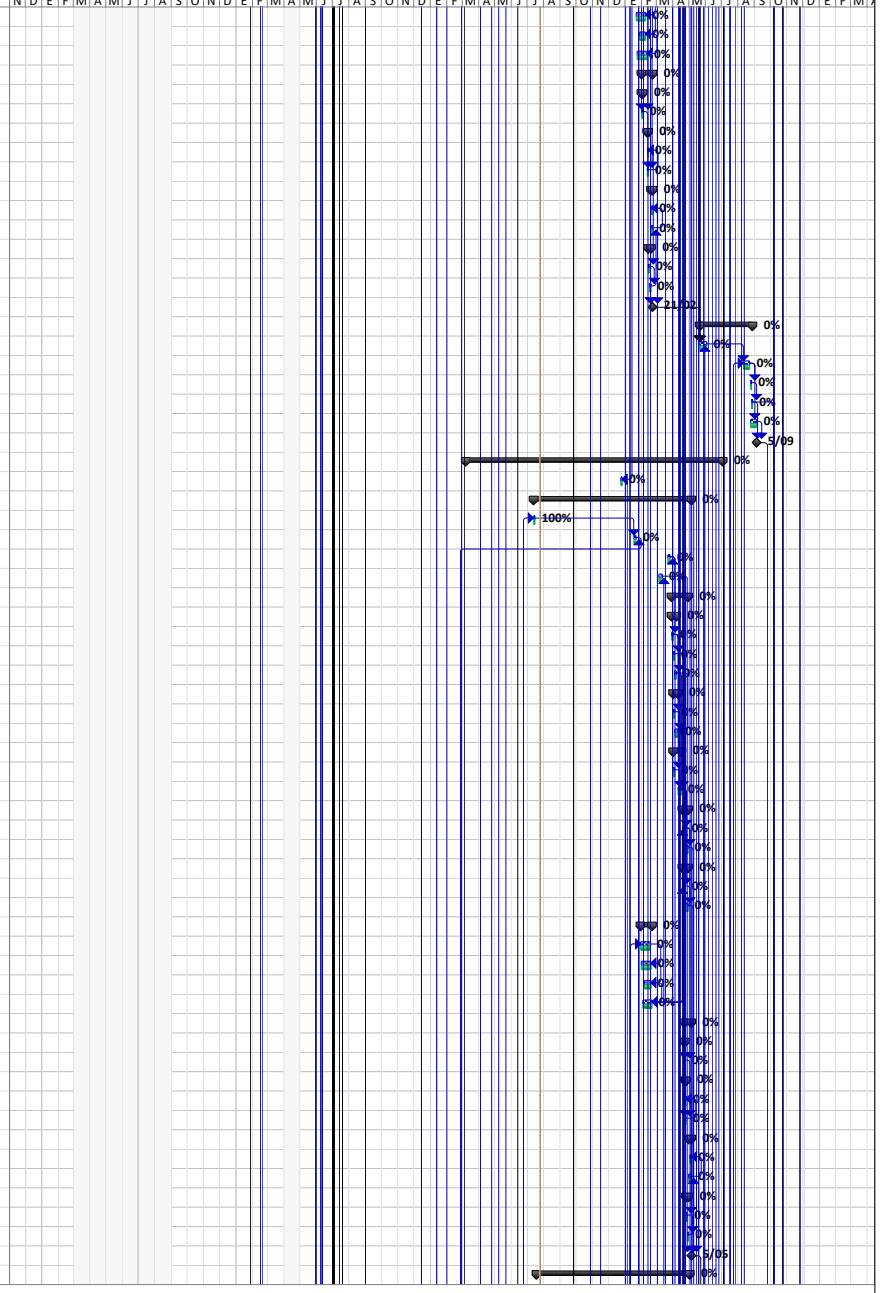

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2007	1.3.4.7.3.4.1	Excavación -1	jue 18/07/24	vie 19/07/24	1 d	$ 1.319.792	100,00%	100,00%	$ 1.319.792
2008	1.3.4.7.3.4.2	Excavación	mar 14/01/25	vie 17/01/25	3 d	$ 301.841	0,00%	0,00%	$ 0
2009	1.3.4.7.3.4.3	Pilotes FDP	jue 20/03/25	vie 21/03/25	2 d	$ 35.064.000	0,00%	0,00%	$ 0
2010	1.3.4.7.3.4.4	Mejoramiento con Rajón	jue 27/02/25	mié 5/03/25	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2011	**1.3.4.7.3.4.5**	**Estructura**	**jue 27/03/25**	**sáb 26/04/25**	**23 d**	**$ 52.530.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2012	**1.3.4.7.3.4.5**	**Zapatas**	**jue 27/03/25**	**vie 4/04/25**	**7 d**	**$ 17.601.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2013	1.3.4.7.3.4.5	Solado	jue 27/03/25	sáb 29/03/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2014	1.3.4.7.3.4.5	Acero	sáb 29/03/25	mar 1/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2015	1.3.4.7.3.4.5	Concreto	mar 1/04/25	vie 4/04/25	3 d	$ 9.495.000	0,00%	0,00%	$ 0
2016	**1.3.4.7.3.4.5**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 29/03/25**	**mar 8/04/25**	**8 d**	**$ 9.358.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2017	1.3.4.7.3.4.5	Acero	sáb 29/03/25	mié 2/04/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2018	1.3.4.7.3.4.5	Concreto	mié 2/04/25	mar 8/04/25	5 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
2019	**1.3.4.7.3.4.5**	**Columnas**	**sáb 29/03/25**	**lun 14/04/25**	**13 d**	**$ 8.527.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2020	1.3.4.7.3.4.5	Acero	sáb 29/03/25	mié 2/04/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2021	1.3.4.7.3.4.5	Concreto	mar 8/04/25	lun 14/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
2022	**1.3.4.7.3.4.5**	**Vigas Longitudinales**	**mar 15/04/25**	**sáb 26/04/25**	**8 d**	**$ 7.709.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2023	1.3.4.7.3.4.5	Acero	mar 15/04/25	lun 21/04/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2024	1.3.4.7.3.4.5	Concreto	lun 21/04/25	sáb 26/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
2025	**1.3.4.7.3.4.5**	**Vigas Transversales**	**mar 15/04/25**	**sáb 26/04/25**	**8 d**	**$ 9.333.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2026	1.3.4.7.3.4.5	Acero	mar 15/04/25	lun 21/04/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2027	1.3.4.7.3.4.5	Concreto	lun 21/04/25	sáb 26/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
2028	**1.3.4.7.3.4.6**	**Tierra Armada**	**jue 30/01/25**	**jue 20/02/25**	**18 d**	**$ 128.790.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2029	1.3.4.7.3.4.6	Geomalla de Refuerzo	jue 30/01/25	lun 17/02/25	15 d	$ 32.197.515	0,00%	0,00%	$ 0
2030	1.3.4.7.3.4.6	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 31/01/25	mar 18/02/25	15 d	$ 32.197.515	0,00%	0,00%	$ 0
2031	1.3.4.7.3.4.6	Geotextil Fortex	jue 6/02/25	mar 18/02/25	10 d	$ 31.277.526	0,00%	0,00%	$ 0
2032	1.3.4.7.3.4.6	Relleno con Ceniza	lun 3/02/25	jue 20/02/25	15 d	$ 33.117.444	0,00%	0,00%	$ 0
2033	**1.3.4.7.3.4.7**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 19/04/25**	**vie 2/05/25**	**10 d**	**$ 16.470.151**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2034	**1.3.4.7.3.4.7**	**Dobelas**	**sáb 19/04/25**	**lun 21/04/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2035	1.3.4.7.3.4.7	Acero	sáb 19/04/25	lun 21/04/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2036	**1.3.4.7.3.4.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**lun 21/04/25**	**mié 23/04/25**	**2 d**	**$ 13.368.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2037	1.3.4.7.3.4.7	Concreto	mar 22/04/25	mié 23/04/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2038	1.3.4.7.3.4.7	Bloque en Concreto	lun 21/04/25	mié 23/04/25	2 d	$ 10.829.876	0,00%	0,00%	$ 0
2039	**1.3.4.7.3.4.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 28/04/25**	**vie 2/05/25**	**3 d**	**$ 639.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2040	1.3.4.7.3.4.7	Concreto	mar 29/04/25	vie 2/05/25	2 d	$ 6.245	0,00%	0,00%	$ 0
2041	1.3.4.7.3.4.7	Bloque en Concreto	lun 28/04/25	vie 2/05/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2042	**1.3.4.7.3.4.7**	**Viga de Amarre**	**mié 23/04/25**	**lun 28/04/25**	**4 d**	**$ 732.920**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2043	1.3.4.7.3.4.7	Acero	mié 23/04/25	vie 25/04/25	2 d	$ 99.920	0,00%	0,00%	$ 0
2044	1.3.4.7.3.4.7	Concreto	vie 25/04/25	lun 28/04/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2045	*1.3.4.7.3.5*	*Fin de Eje 2-3*	*vie 2/05/25*	*vie 2/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2046	**1.3.4.7.3.6**	**EJE 3-4**	**mar 16/07/24**	**vie 2/05/25**	**226,25 d**	**$ 234.489.092**	**0,56%**	**0,56%**	**$ 1.319.792**
2047	1.3.4.7.3.6.1	Excavación -1	mar 16/07/24	mié 17/07/24	1 d	$ 1.319.792	100,00%	100,00%	$ 1.319.792
2048	1.3.4.7.3.6.2	Excavación	vie 10/01/25	mar 14/01/25	3 d	$ 146.644	0,00%	0,00%	$ 0
2049	1.3.4.7.3.6.3	Pilotes FDP	jue 20/03/25	vie 21/03/25	2 d	$ 34.823.000	0,00%	0,00%	$ 0
2050	1.3.4.7.3.6.4	Mejoramiento con Rajón	vie 21/02/25	jue 27/02/25	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2051	**1.3.4.7.3.6.5**	**Estructura**	**jue 27/03/25**	**sáb 26/04/25**	**23 d**	**$ 52.530.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2052	**1.3.4.7.3.6.5**	**Zapatas**	**jue 27/03/25**	**vie 4/04/25**	**7 d**	**$ 17.601.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2053	1.3.4.7.3.6.5	Solado	jue 27/03/25	sáb 29/03/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2054	1.3.4.7.3.6.5	Acero	sáb 29/03/25	mar 1/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2055	1.3.4.7.3.6.5	Concreto	mar 1/04/25	vie 4/04/25	3 d	$ 9.495.000	0,00%	0,00%	$ 0
2056	**1.3.4.7.3.6.5**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 29/03/25**	**mar 8/04/25**	**8 d**	**$ 9.358.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2057	1.3.4.7.3.6.5	Acero	sáb 29/03/25	mié 2/04/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2058	1.3.4.7.3.6.5	Concreto	mié 2/04/25	mar 8/04/25	5 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
2059	**1.3.4.7.3.6.5**	**Columnas**	**sáb 29/03/25**	**lun 14/04/25**	**13 d**	**$ 8.527.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2060	1.3.4.7.3.6.5	Acero	sáb 29/03/25	mié 2/04/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2061	1.3.4.7.3.6.5	Concreto	mar 8/04/25	lun 14/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
2062	**1.3.4.7.3.6.5**	**Vigas Longitudinales**	**mar 15/04/25**	**sáb 26/04/25**	**8 d**	**$ 7.709.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2063	1.3.4.7.3.6.5	Acero	mar 15/04/25	lun 21/04/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2064	1.3.4.7.3.6.5	Concreto	lun 21/04/25	sáb 26/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
2065	**1.3.4.7.3.6.5**	**Vigas Transversales**	**mar 15/04/25**	**sáb 26/04/25**	**8 d**	**$ 9.333.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2066	1.3.4.7.3.6.5	Acero	mar 15/04/25	lun 21/04/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2067	1.3.4.7.3.6.5	Concreto	lun 21/04/25	sáb 26/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
2068	**1.3.4.7.3.6.6**	**Tierra Armada**	**jue 30/01/25**	**jue 20/02/25**	**18 d**	**$ 128.790.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2069	1.3.4.7.3.6.6	Geomalla de Refuerzo	jue 30/01/25	lun 17/02/25	15 d	$ 32.197.506	0,00%	0,00%	$ 0
2070	1.3.4.7.3.6.6	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 31/01/25	mar 18/02/25	15 d	$ 32.197.506	0,00%	0,00%	$ 0
2071	1.3.4.7.3.6.6	Geotextil Fortex	jue 6/02/25	mar 18/02/25	10 d	$ 31.221.800	0,00%	0,00%	$ 0
2072	1.3.4.7.3.6.6	Relleno con Ceniza	lun 3/02/25	jue 20/02/25	15 d	$ 33.173.188	0,00%	0,00%	$ 0

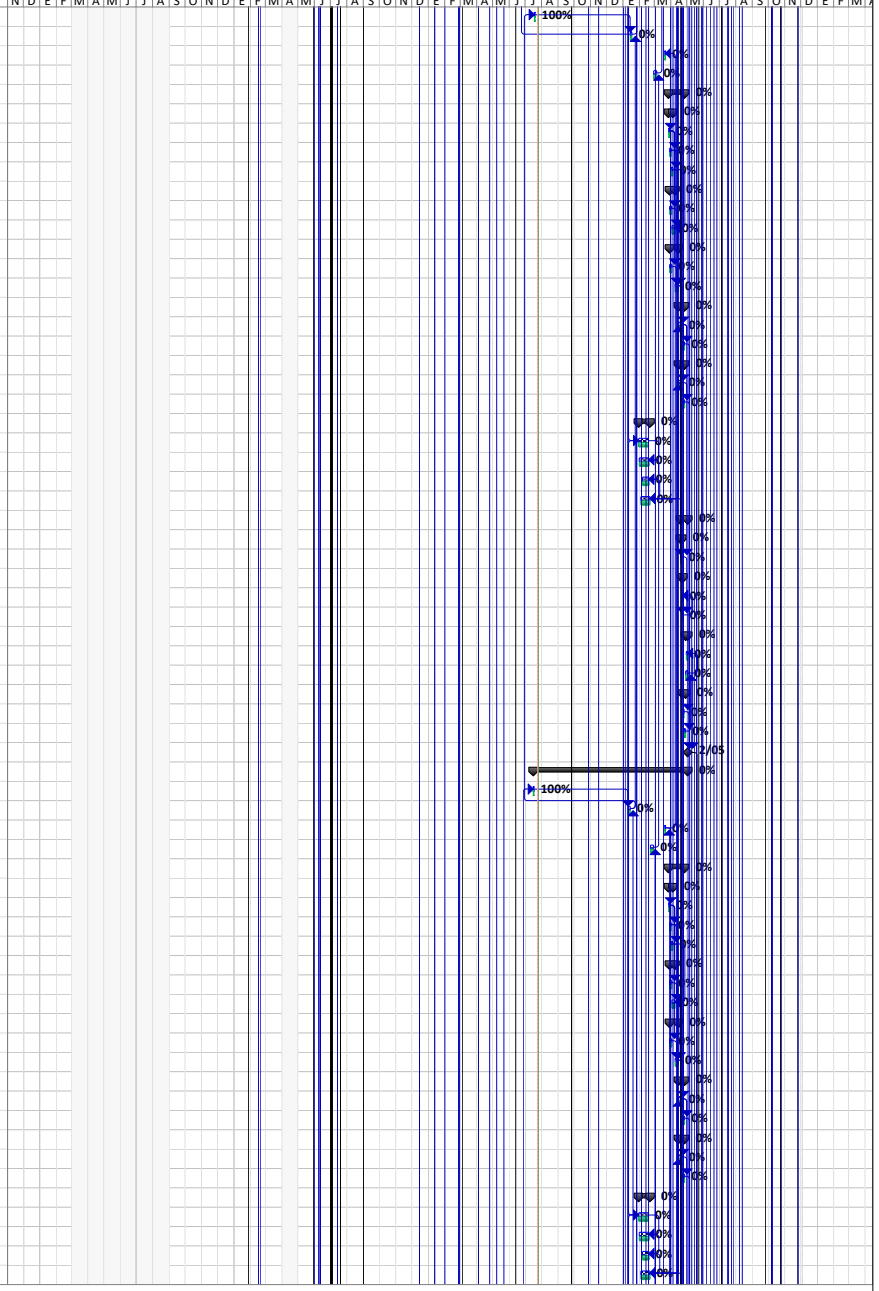


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2073	**1.3.4.7.3.6.7**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 19/04/25**	**vie 2/05/25**	**10 d**	**$ 16.470.151**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2074	**1.3.4.7.3.6.7**	**Dobelas**	**sáb 19/04/25**	**lun 21/04/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2075	1.3.4.7.3.6.7	Acero	sáb 19/04/25	lun 21/04/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2076	**1.3.4.7.3.6.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**lun 21/04/25**	**mié 23/04/25**	**2 d**	**$ 13.368.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2077	1.3.4.7.3.6.7	Concreto	mar 22/04/25	mié 23/04/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2078	1.3.4.7.3.6.7	Bloque en Concreto	lun 21/04/25	mié 23/04/25	2 d	$ 10.829.876	0,00%	0,00%	$ 0
2079	**1.3.4.7.3.6.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 28/04/25**	**vie 2/05/25**	**3 d**	**$ 639.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2080	1.3.4.7.3.6.7	Concreto	mar 29/04/25	vie 2/05/25	2 d	$ 6.245	0,00%	0,00%	$ 0
2081	1.3.4.7.3.6.7	Bloque en Concreto	lun 28/04/25	vie 2/05/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2082	**1.3.4.7.3.6.7**	**Viga de Amarre**	**mié 23/04/25**	**lun 28/04/25**	**4 d**	**$ 732.920**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2083	1.3.4.7.3.6.7	Acero	mié 23/04/25	vie 25/04/25	2 d	$ 99.920	0,00%	0,00%	$ 0
2084	1.3.4.7.3.6.7	Concreto	vie 25/04/25	lun 28/04/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2085	*1.3.4.7.3.7*	*Fin de Eje 3-4*	*vie 2/05/25*	*vie 2/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2086	**1.3.4.7.3.8**	**EJE 4-5**	**jue 7/03/24**	**mar 29/04/25**	**323,25 d**	**$ 270.935.804**	**0,49%**	**0,49%**	**$ 1.319.792**
2087	1.3.4.7.3.8.1	Excavación -1	jue 7/03/24	sáb 9/03/24	2 d	$ 1.319.792	100,00%	100,00%	$ 1.319.792
2088	1.3.4.7.3.8.2	Excavación	mar 7/01/25	vie 10/01/25	3 d	$ 146.644	0,00%	0,00%	$ 0
2089	1.3.4.7.3.8.3	Pilotes FDP	mar 18/03/25	mié 19/03/25	2 d	$ 71.269.712	0,00%	0,00%	$ 0
2090	1.3.4.7.3.8.4	Mejoramiento con Rajón	vie 14/02/25	jue 20/02/25	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2091	**1.3.4.7.3.8.5**	**Estructura**	**mar 25/03/25**	**jue 24/04/25**	**23 d**	**$ 52.530.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2092	**1.3.4.7.3.8.5**	**Zapatas**	**mar 25/03/25**	**mié 2/04/25**	**7 d**	**$ 17.601.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2093	1.3.4.7.3.8.5	Solado	mar 25/03/25	jue 27/03/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2094	1.3.4.7.3.8.5	Acero	jue 27/03/25	sáb 29/03/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2095	1.3.4.7.3.8.5	Concreto	sáb 29/03/25	mié 2/04/25	3 d	$ 9.495.000	0,00%	0,00%	$ 0
2096	**1.3.4.7.3.8.5**	**Vigas de Cimentación**	**jue 27/03/25**	**sáb 5/04/25**	**8 d**	**$ 9.358.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2097	1.3.4.7.3.8.5	Acero	jue 27/03/25	lun 31/03/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2098	1.3.4.7.3.8.5	Concreto	lun 31/03/25	sáb 5/04/25	5 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0
2099	**1.3.4.7.3.8.5**	**Columnas**	**jue 27/03/25**	**vie 11/04/25**	**13 d**	**$ 8.527.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2100	1.3.4.7.3.8.5	Acero	jue 27/03/25	lun 31/03/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2101	1.3.4.7.3.8.5	Concreto	sáb 5/04/25	vie 11/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
2102	**1.3.4.7.3.8.5**	**Vigas Longitudinales**	**vie 11/04/25**	**jue 24/04/25**	**8 d**	**$ 7.709.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2103	1.3.4.7.3.8.5	Acero	vie 11/04/25	mar 15/04/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2104	1.3.4.7.3.8.5	Concreto	mié 16/04/25	jue 24/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
2105	**1.3.4.7.3.8.5**	**Vigas Transversales**	**vie 11/04/25**	**jue 24/04/25**	**8 d**	**$ 9.333.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2106	1.3.4.7.3.8.5	Acero	vie 11/04/25	mar 15/04/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2107	1.3.4.7.3.8.5	Concreto	mié 16/04/25	jue 24/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
2108	**1.3.4.7.3.8.6**	**Tierra Armada**	**jue 30/01/25**	**jue 20/02/25**	**18 d**	**$ 128.790.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2109	1.3.4.7.3.8.6	Geomalla de Refuerzo	jue 30/01/25	lun 17/02/25	15 d	$ 32.197.499	0,00%	0,00%	$ 0
2110	1.3.4.7.3.8.6	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 31/01/25	mar 18/02/25	15 d	$ 32.197.499	0,00%	0,00%	$ 0
2111	1.3.4.7.3.8.6	Geotextil Fortex	jue 6/02/25	mar 18/02/25	10 d	$ 31.158.874	0,00%	0,00%	$ 0
2112	1.3.4.7.3.8.6	Relleno con Ceniza	lun 3/02/25	jue 20/02/25	15 d	$ 33.236.128	0,00%	0,00%	$ 0
2113	**1.3.4.7.3.8.7**	**Fachada en Mampostería**	**mar 15/04/25**	**mar 29/04/25**	**10 d**	**$ 16.470.151**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2114	**1.3.4.7.3.8.7**	**Dobelas**	**mar 15/04/25**	**mar 15/04/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2115	1.3.4.7.3.8.7	Acero	mar 15/04/25	mar 15/04/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2116	**1.3.4.7.3.8.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mié 16/04/25**	**lun 21/04/25**	**2 d**	**$ 13.368.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2117	1.3.4.7.3.8.7	Concreto	sáb 19/04/25	lun 21/04/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2118	1.3.4.7.3.8.7	Bloque en Concreto	mié 16/04/25	lun 21/04/25	2 d	$ 10.829.876	0,00%	0,00%	$ 0
2119	**1.3.4.7.3.8.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**vie 25/04/25**	**mar 29/04/25**	**3 d**	**$ 639.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2120	1.3.4.7.3.8.7	Concreto	sáb 26/04/25	mar 29/04/25	2 d	$ 6.245	0,00%	0,00%	$ 0
2121	1.3.4.7.3.8.7	Bloque en Concreto	vie 25/04/25	mar 29/04/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2122	**1.3.4.7.3.8.7**	**Viga de Amarre**	**lun 21/04/25**	**vie 25/04/25**	**4 d**	**$ 732.920**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2123	1.3.4.7.3.8.7	Acero	lun 21/04/25	mié 23/04/25	2 d	$ 99.920	0,00%	0,00%	$ 0
2124	1.3.4.7.3.8.7	Concreto	mié 23/04/25	vie 25/04/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2125	*1.3.4.7.3.9*	*Fin de Eje 4-5*	*mar 29/04/25*	*mar 29/04/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2126	**1.3.4.7.3.10**	**EJE 5-6**	**lun 18/03/24**	**mar 29/04/25**	**314,75 d**	**$ 234.489.092**	**0,56%**	**0,56%**	**$ 1.319.792**
2127	1.3.4.7.3.10.	Excavación -1	lun 18/03/24	mié 20/03/24	2 d	$ 1.319.792	100,00%	100,00%	$ 1.319.792
2128	1.3.4.7.3.10.	Excavación	jue 2/01/25	mar 7/01/25	3 d	$ 146.644	0,00%	0,00%	$ 0
2129	1.3.4.7.3.10.	Pilotes FDP	mar 18/03/25	mié 19/03/25	2 d	$ 34.823.000	0,00%	0,00%	$ 0
2130	1.3.4.7.3.10.	Mejoramiento con Rajón	sáb 8/02/25	vie 14/02/25	5 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2131	**1.3.4.7.3.10.**	**Estructura**	**mar 25/03/25**	**jue 24/04/25**	**23 d**	**$ 52.530.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2132	**1.3.4.7.3.10.**	**Zapatas**	**mar 25/03/25**	**mié 2/04/25**	**7 d**	**$ 17.601.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2133	1.3.4.7.3.10.	Solado	mar 25/03/25	jue 27/03/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2134	1.3.4.7.3.10.	Acero	jue 27/03/25	sáb 29/03/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2135	1.3.4.7.3.10.	Concreto	sáb 29/03/25	mié 2/04/25	3 d	$ 9.495.000	0,00%	0,00%	$ 0
2136	**1.3.4.7.3.10.**	**Vigas de Cimentación**	**jue 27/03/25**	**sáb 5/04/25**	**8 d**	**$ 9.358.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2137	1.3.4.7.3.10.	Acero	jue 27/03/25	lun 31/03/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2138	1.3.4.7.3.10.	Concreto	lun 31/03/25	sáb 5/04/25	5 d	$ 6.330.000	0,00%	0,00%	$ 0

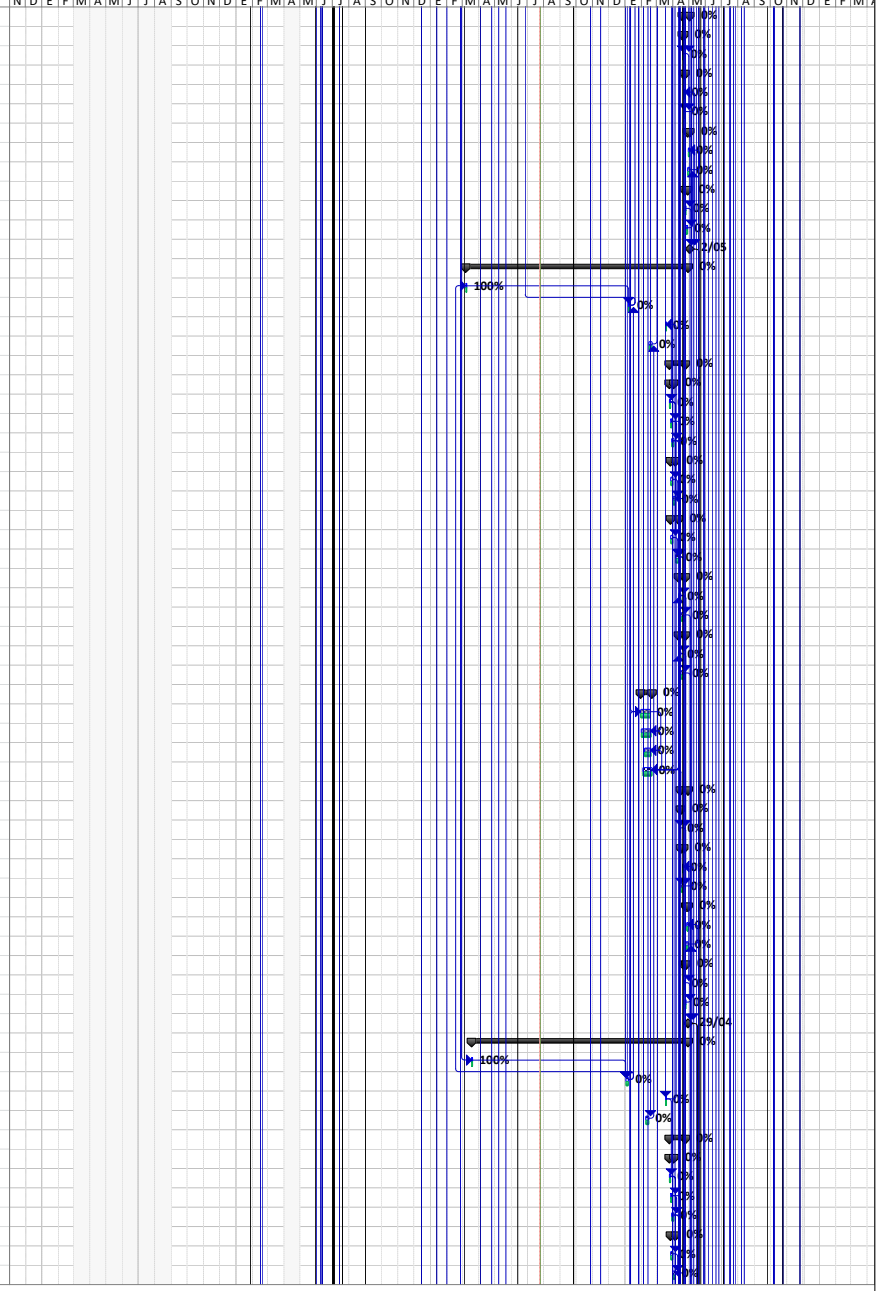


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2139	**1.3.4.7.3.10.**	**Columnas**	**jue 27/03/25**	**vie 11/04/25**	**13 d**	**$ 8.527.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2140	1.3.4.7.3.10.	Acero	jue 27/03/25	lun 31/03/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2141	1.3.4.7.3.10.	Concreto	sáb 5/04/25	vie 11/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
2142	**1.3.4.7.3.10.**	**Vigas Longitudinales**	**vie 11/04/25**	**jue 24/04/25**	**8 d**	**$ 7.709.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2143	1.3.4.7.3.10.	Acero	vie 11/04/25	mar 15/04/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2144	1.3.4.7.3.10.	Concreto	mié 16/04/25	jue 24/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
2145	**1.3.4.7.3.10.**	**Vigas Transversales**	**vie 11/04/25**	**jue 24/04/25**	**8 d**	**$ 9.333.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2146	1.3.4.7.3.10.	Acero	vie 11/04/25	mar 15/04/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2147	1.3.4.7.3.10.	Concreto	mié 16/04/25	jue 24/04/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
2148	**1.3.4.7.3.10.**	**Tierra Armada**	**jue 30/01/25**	**jue 20/02/25**	**18 d**	**$ 128.790.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2149	1.3.4.7.3.10.	Geomalla de Refuerzo	jue 30/01/25	lun 17/02/25	15 d	$ 35.235.000	0,00%	0,00%	$ 0
2150	1.3.4.7.3.10.	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 31/01/25	mar 18/02/25	15 d	$ 35.235.000	0,00%	0,00%	$ 0
2151	1.3.4.7.3.10.	Geotextil Fortex	jue 6/02/25	mar 18/02/25	10 d	$ 34.020.000	0,00%	0,00%	$ 0
2152	1.3.4.7.3.10.	Relleno con Ceniza	lun 3/02/25	jue 20/02/25	15 d	$ 24.300.000	0,00%	0,00%	$ 0
2153	**1.3.4.7.3.10.**	**Fachada en Mampostería**	**mar 15/04/25**	**mar 29/04/25**	**10 d**	**$ 16.470.151**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2154	**1.3.4.7.3.10.**	**Dobelas**	**mar 15/04/25**	**mar 15/04/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2155	1.3.4.7.3.10.	Acero	mar 15/04/25	mar 15/04/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2156	**1.3.4.7.3.10.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mié 16/04/25**	**lun 21/04/25**	**2 d**	**$ 13.368.121**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2157	1.3.4.7.3.10.	Concreto	sáb 19/04/25	lun 21/04/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2158	1.3.4.7.3.10.	Bloque en Concreto	mié 16/04/25	lun 21/04/25	2 d	$ 10.829.876	0,00%	0,00%	$ 0
2159	**1.3.4.7.3.10.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**vie 25/04/25**	**mar 29/04/25**	**3 d**	**$ 639.245**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2160	1.3.4.7.3.10.	Concreto	sáb 26/04/25	mar 29/04/25	2 d	$ 6.245	0,00%	0,00%	$ 0
2161	1.3.4.7.3.10.	Bloque en Concreto	vie 25/04/25	mar 29/04/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2162	**1.3.4.7.3.10.**	**Viga de Amarre**	**lun 21/04/25**	**vie 25/04/25**	**4 d**	**$ 732.920**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2163	1.3.4.7.3.10.	Acero	lun 21/04/25	mié 23/04/25	2 d	$ 99.920	0,00%	0,00%	$ 0
2164	1.3.4.7.3.10.	Concreto	mié 23/04/25	vie 25/04/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2165	*1.3.4.7.3.11*	*Fin de Eje 5-6*	*mar 29/04/25*	*mar 29/04/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2166	**1.3.4.7.3.12**	**PAVIMENTO**	**lun 5/05/25**	**lun 9/06/25**	**28 d**	**$ 66.225.950**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2167	1.3.4.7.3.12.	Subbase	lun 5/05/25	mié 21/05/25	13 d	$ 6.519.680	0,00%	0,00%	$ 0
2168	1.3.4.7.3.12.	Base	mié 21/05/25	vie 6/06/25	13 d	$ 8.400.000	0,00%	0,00%	$ 0
2169	1.3.4.7.3.12.	Mezcla Asfaltica - GCR	vie 6/06/25	sáb 7/06/25	1 d	$ 39.084.770	0,00%	0,00%	$ 0
2170	1.3.4.7.3.12.	Mezcla Asfaltica - MD12	lun 9/06/25	lun 9/06/25	1 d	$ 12.221.500	0,00%	0,00%	$ 0
2171	1.3.4.7.3.13	Baranda Vehicular	vie 6/06/25	jue 3/07/25	20 d	$ 136.282.413	0,00%	0,00%	$ 0
2172	1.3.4.7.3.14	Baranda Peatonal	vie 6/06/25	jue 3/07/25	20 d	$ 11.184.113	0,00%	0,00%	$ 0
2173	*1.3.4.7.4*	*Fin de Transición*	*jue 3/07/25*	*jue 3/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2174	**1.3.4.7.5**	**OREJA OCCIDENTAL**	**sáb 16/03/24**	**mié 3/09/25**	**414,5 d**	**$ 1.994.630.920**	**0,34%**	**0,34%**	**$ 6.807.150**
2175	1.3.4.7.5.1	Demolición	lun 27/01/25	mar 4/02/25	7 d	$ 6.763.637	0,00%	0,00%	$ 0
2176	**1.3.4.7.5.2**	**EJE 1-2**	**sáb 16/03/24**	**lun 26/05/25**	**336,5 d**	**$ 186.008.710**	**0,67%**	**0,67%**	**$ 1.239.388**
2177	1.3.4.7.5.2.1	Excavación	sáb 16/03/24	mar 19/03/24	2 d	$ 1.239.388	100,00%	100,00%	$ 1.239.388
2178	1.3.4.7.5.2.2	Pilotes FDP	mié 26/03/25	vie 28/03/25	2 d	$ 57.846.000	0,00%	0,00%	$ 0
2179	1.3.4.7.5.2.3	Mejoramiento con Rajón	mié 5/03/25	lun 10/03/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2180	**1.3.4.7.5.2.4**	**Estructura**	**mar 1/04/25**	**mié 14/05/25**	**33 d**	**$ 46.200.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2181	**1.3.4.7.5.2.4**	**Zapatas**	**mar 1/04/25**	**mié 9/04/25**	**7 d**	**$ 15.702.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2182	1.3.4.7.5.2.4	Solado	mar 1/04/25	jue 3/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2183	1.3.4.7.5.2.4	Acero	jue 3/04/25	sáb 5/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2184	1.3.4.7.5.2.4	Concreto	sáb 5/04/25	mié 9/04/25	3 d	$ 7.596.000	0,00%	0,00%	$ 0
2185	**1.3.4.7.5.2.4**	**Vigas de Cimentación**	**jue 3/04/25**	**sáb 12/04/25**	**8 d**	**$ 6.826.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2186	1.3.4.7.5.2.4	Acero	jue 3/04/25	lun 7/04/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2187	1.3.4.7.5.2.4	Concreto	lun 7/04/25	sáb 12/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2188	**1.3.4.7.5.2.4**	**Columnas**	**jue 3/04/25**	**mar 22/04/25**	**13 d**	**$ 7.894.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2189	1.3.4.7.5.2.4	Acero	jue 3/04/25	lun 7/04/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2190	1.3.4.7.5.2.4	Concreto	lun 14/04/25	mar 22/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2191	**1.3.4.7.5.2.4**	**Vigas Longitudinales**	**lun 5/05/25**	**mié 14/05/25**	**8 d**	**$ 7.076.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2192	1.3.4.7.5.2.4	Acero	lun 5/05/25	jue 8/05/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2193	1.3.4.7.5.2.4	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2194	**1.3.4.7.5.2.4**	**Vigas Transversales**	**lun 5/05/25**	**mié 14/05/25**	**8 d**	**$ 8.700.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2195	1.3.4.7.5.2.4	Acero	lun 5/05/25	jue 8/05/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2196	1.3.4.7.5.2.4	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2197	**1.3.4.7.5.2.5**	**Tierra armada**	**mar 22/04/25**	**mié 14/05/25**	**18 d**	**$ 65.985.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2198	1.3.4.7.5.2.5	Geomalla de Refuerzo	mar 22/04/25	sáb 10/05/25	15 d	$ 16.496.268	0,00%	0,00%	$ 0
2199	1.3.4.7.5.2.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mié 23/04/25	lun 12/05/25	15 d	$ 16.496.268	0,00%	0,00%	$ 0
2200	1.3.4.7.5.2.5	Geotextil Fortex	mar 29/04/25	lun 12/05/25	10 d	$ 16.093.848	0,00%	0,00%	$ 0
2201	1.3.4.7.5.2.5	Relleno con Ceniza	vie 25/04/25	mié 14/05/25	15 d	$ 16.898.616	0,00%	0,00%	$ 0
2202	**1.3.4.7.5.2.6**	**Fachada en Mampostería**	**mié 7/05/25**	**lun 26/05/25**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2203	**1.3.4.7.5.2.6**	**Dobelas**	**mié 7/05/25**	**jue 8/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2204	1.3.4.7.5.2.6	Acero	mié 7/05/25	jue 8/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0

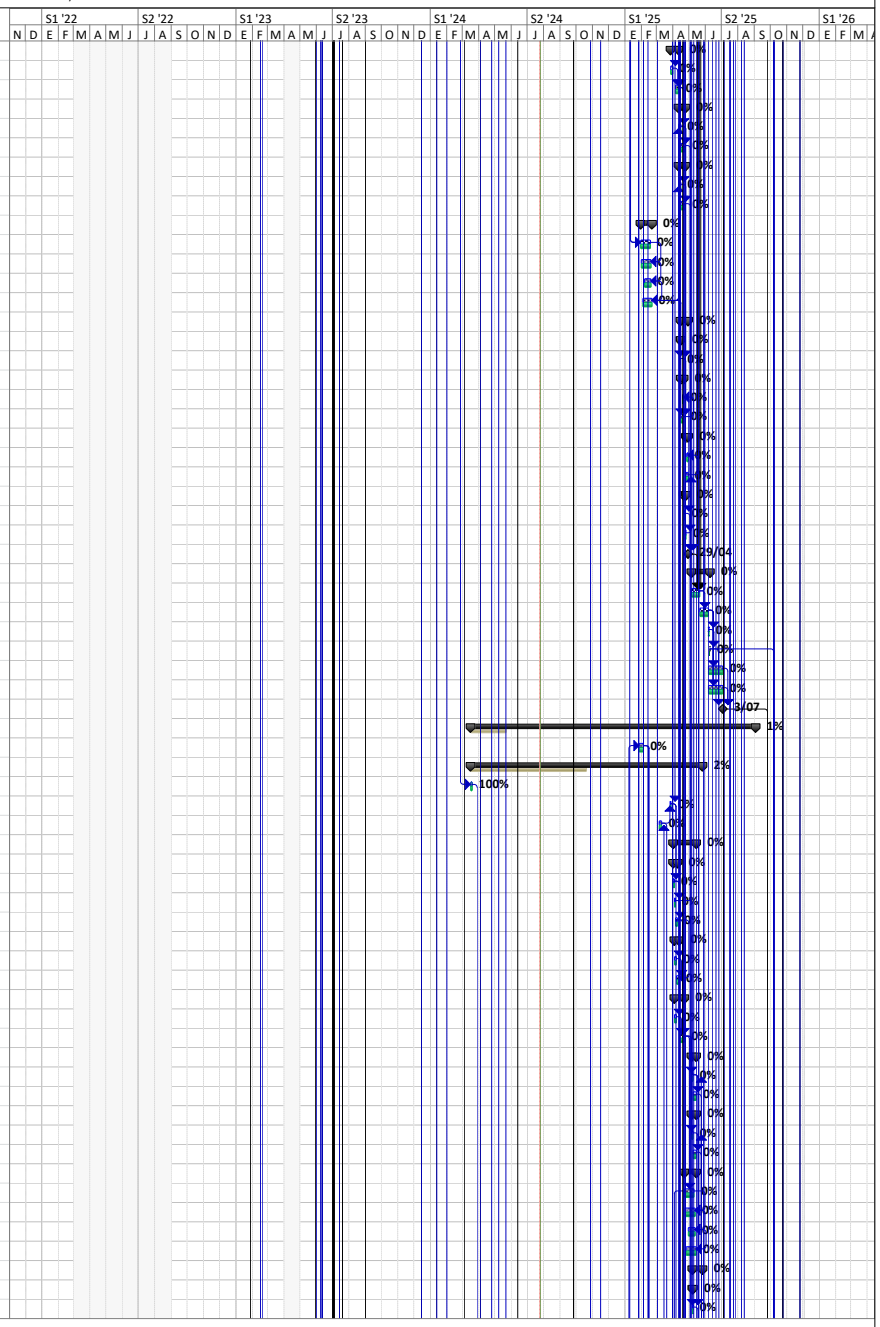


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2205	**1.3.4.7.5.2.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**jue 15/05/25**	**vie 16/05/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2206	1.3.4.7.5.2.6	Concreto	vie 16/05/25	vie 16/05/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2207	1.3.4.7.5.2.6	Bloque en Concreto	jue 15/05/25	vie 16/05/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
2208	**1.3.4.7.5.2.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**jue 22/05/25**	**lun 26/05/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2209	1.3.4.7.5.2.6	Concreto	vie 23/05/25	lun 26/05/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
2210	1.3.4.7.5.2.6	Bloque en Concreto	jue 22/05/25	lun 26/05/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2211	**1.3.4.7.5.2.6**	**Viga de Amarre**	**sáb 17/05/25**	**jue 22/05/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2212	1.3.4.7.5.2.6	Acero	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
2213	1.3.4.7.5.2.6	Concreto	mar 20/05/25	jue 22/05/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2214	*1.3.4.7.5.3*	*Fin de Eje 1-2*	*lun 26/05/25*	*lun 26/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2215	**1.3.4.7.5.4**	**EJE 2-3**	**mar 19/03/24**	**lun 26/05/25**	**334,75 d**	**$ 186.008.710**	**0,67%**	**0,67%**	**$ 1.239.388**
2216	1.3.4.7.5.4.1	Excavación	mar 19/03/24	jue 21/03/24	2 d	$ 1.239.388	100,00%	100,00%	$ 1.239.388
2217	1.3.4.7.5.4.2	Pilotes FDP	vie 28/03/25	lun 31/03/25	2 d	$ 57.846.000	0,00%	0,00%	$ 0
2218	1.3.4.7.5.4.3	Mejoramiento con Rajón	mar 11/03/25	vie 14/03/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2219	**1.3.4.7.5.4.4**	**Estructura**	**jue 3/04/25**	**mié 14/05/25**	**31 d**	**$ 46.200.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2220	**1.3.4.7.5.4.4**	**Zapatas**	**jue 3/04/25**	**vie 11/04/25**	**7 d**	**$ 15.702.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2221	1.3.4.7.5.4.4	Solado	jue 3/04/25	sáb 5/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2222	1.3.4.7.5.4.4	Acero	sáb 5/04/25	mar 8/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2223	1.3.4.7.5.4.4	Concreto	mar 8/04/25	vie 11/04/25	3 d	$ 7.596.000	0,00%	0,00%	$ 0
2224	**1.3.4.7.5.4.4**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 5/04/25**	**mar 15/04/25**	**8 d**	**$ 6.826.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2225	1.3.4.7.5.4.4	Acero	sáb 5/04/25	mié 9/04/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2226	1.3.4.7.5.4.4	Concreto	mié 9/04/25	mar 15/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2227	**1.3.4.7.5.4.4**	**Columnas**	**sáb 5/04/25**	**jue 24/04/25**	**13 d**	**$ 7.894.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2228	1.3.4.7.5.4.4	Acero	sáb 5/04/25	mié 9/04/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2229	1.3.4.7.5.4.4	Concreto	mié 16/04/25	jue 24/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2230	**1.3.4.7.5.4.4**	**Vigas Longitudinales**	**lun 5/05/25**	**mié 14/05/25**	**8 d**	**$ 7.076.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2231	1.3.4.7.5.4.4	Acero	lun 5/05/25	jue 8/05/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2232	1.3.4.7.5.4.4	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2233	**1.3.4.7.5.4.4**	**Vigas Transversales**	**lun 5/05/25**	**mié 14/05/25**	**8 d**	**$ 8.700.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2234	1.3.4.7.5.4.4	Acero	lun 5/05/25	jue 8/05/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2235	1.3.4.7.5.4.4	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2236	**1.3.4.7.5.4.5**	**Tierra armada**	**mar 22/04/25**	**mié 14/05/25**	**18 d**	**$ 65.985.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2237	1.3.4.7.5.4.5	Geomalla de Refuerzo	mar 22/04/25	sáb 10/05/25	15 d	$ 16.496.259	0,00%	0,00%	$ 0
2238	1.3.4.7.5.4.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mié 23/04/25	lun 12/05/25	15 d	$ 16.496.259	0,00%	0,00%	$ 0
2239	1.3.4.7.5.4.5	Geotextil Fortex	mar 29/04/25	lun 12/05/25	10 d	$ 16.073.242	0,00%	0,00%	$ 0
2240	1.3.4.7.5.4.5	Relleno con Ceniza	vie 25/04/25	mié 14/05/25	15 d	$ 16.919.240	0,00%	0,00%	$ 0
2241	**1.3.4.7.5.4.6**	**Fachada en Mampostería**	**mié 7/05/25**	**lun 26/05/25**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2242	**1.3.4.7.5.4.6**	**Dobelas**	**mié 7/05/25**	**jue 8/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2243	1.3.4.7.5.4.6	Acero	mié 7/05/25	jue 8/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2244	**1.3.4.7.5.4.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**jue 15/05/25**	**vie 16/05/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2245	1.3.4.7.5.4.6	Concreto	vie 16/05/25	vie 16/05/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2246	1.3.4.7.5.4.6	Bloque en Concreto	jue 15/05/25	vie 16/05/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
2247	**1.3.4.7.5.4.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**jue 22/05/25**	**lun 26/05/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2248	1.3.4.7.5.4.6	Concreto	vie 23/05/25	lun 26/05/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
2249	1.3.4.7.5.4.6	Bloque en Concreto	jue 22/05/25	lun 26/05/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2250	**1.3.4.7.5.4.6**	**Viga de Amarre**	**sáb 17/05/25**	**jue 22/05/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2251	1.3.4.7.5.4.6	Acero	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
2252	1.3.4.7.5.4.6	Concreto	mar 20/05/25	jue 22/05/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2253	*1.3.4.7.5.5*	*Fin de Eje 2-3*	*lun 26/05/25*	*lun 26/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2254	**1.3.4.7.5.6**	**EJE 3-4**	**jue 21/03/24**	**lun 26/05/25**	**332,75 d**	**$ 186.008.710**	**0,67%**	**0,67%**	**$ 1.239.388**
2255	1.3.4.7.5.6.1	Excavación	jue 21/03/24	sáb 23/03/24	2 d	$ 1.239.388	100,00%	100,00%	$ 1.239.388
2256	1.3.4.7.5.6.2	Pilotes FDP	lun 31/03/25	mié 2/04/25	2 d	$ 57.846.000	0,00%	0,00%	$ 0
2257	1.3.4.7.5.6.3	Mejoramiento con Rajón	sáb 15/03/25	jue 20/03/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2258	**1.3.4.7.5.6.4**	**Estructura**	**sáb 5/04/25**	**mié 14/05/25**	**29 d**	**$ 46.200.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2259	**1.3.4.7.5.6.4**	**Zapatas**	**sáb 5/04/25**	**lun 14/04/25**	**7 d**	**$ 15.702.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2260	1.3.4.7.5.6.4	Solado	sáb 5/04/25	mar 8/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2261	1.3.4.7.5.6.4	Acero	mar 8/04/25	jue 10/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2262	1.3.4.7.5.6.4	Concreto	jue 10/04/25	lun 14/04/25	3 d	$ 7.596.000	0,00%	0,00%	$ 0
2263	**1.3.4.7.5.6.4**	**Vigas de Cimentación**	**mar 8/04/25**	**lun 21/04/25**	**8 d**	**$ 6.826.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2264	1.3.4.7.5.6.4	Acero	mar 8/04/25	vie 11/04/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2265	1.3.4.7.5.6.4	Concreto	vie 11/04/25	lun 21/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2266	**1.3.4.7.5.6.4**	**Columnas**	**mar 8/04/25**	**sáb 26/04/25**	**13 d**	**$ 7.894.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2267	1.3.4.7.5.6.4	Acero	mar 8/04/25	vie 11/04/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2268	1.3.4.7.5.6.4	Concreto	lun 21/04/25	sáb 26/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2269	**1.3.4.7.5.6.4**	**Vigas Longitudinales**	**lun 5/05/25**	**mié 14/05/25**	**8 d**	**$ 7.076.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2270	1.3.4.7.5.6.4	Acero	lun 5/05/25	jue 8/05/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0

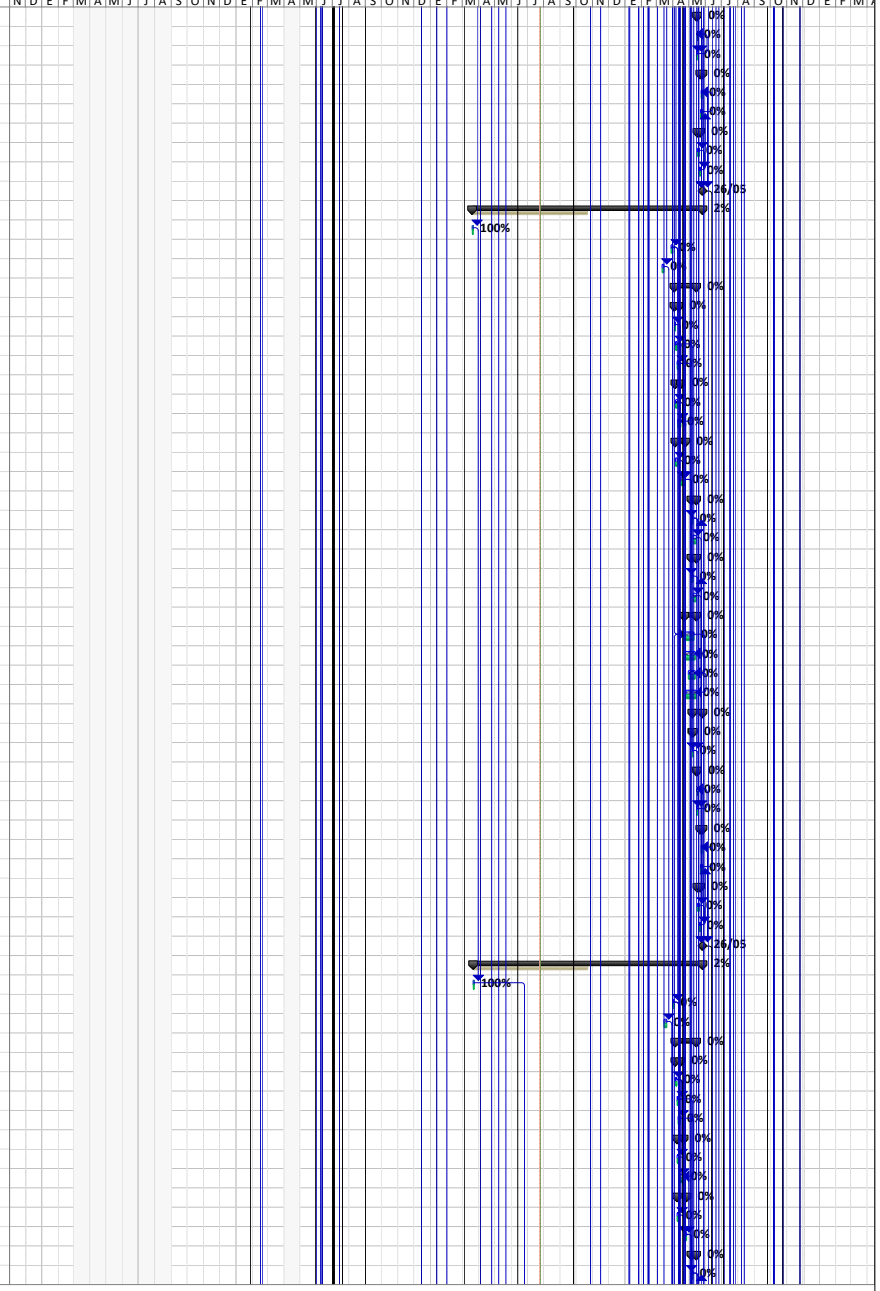


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2271	1.3.4.7.5.6.4	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2272	**1.3.4.7.5.6.4**	**Vigas Transversales**	**lun 5/05/25**	**mié 14/05/25**	**8 d**	**$ 8.700.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2273	1.3.4.7.5.6.4	Acero	lun 5/05/25	jue 8/05/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2274	1.3.4.7.5.6.4	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2275	**1.3.4.7.5.6.5**	**Tierra armada**	**mar 22/04/25**	**mié 14/05/25**	**18 d**	**$ 65.985.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2276	1.3.4.7.5.6.5	Geomalla de Refuerzo	mar 22/04/25	sáb 10/05/25	15 d	$ 16.496.265	0,00%	0,00%	$ 0
2277	1.3.4.7.5.6.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mié 23/04/25	lun 12/05/25	15 d	$ 16.496.265	0,00%	0,00%	$ 0
2278	1.3.4.7.5.6.5	Geotextil Fortex	mar 29/04/25	lun 12/05/25	10 d	$ 16.050.360	0,00%	0,00%	$ 0
2279	1.3.4.7.5.6.5	Relleno con Ceniza	vie 25/04/25	mié 14/05/25	15 d	$ 16.942.110	0,00%	0,00%	$ 0
2280	**1.3.4.7.5.6.6**	**Fachada en Mampostería**	**mié 7/05/25**	**lun 26/05/25**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2281	**1.3.4.7.5.6.6**	**Dobelas**	**mié 7/05/25**	**jue 8/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2282	1.3.4.7.5.6.6	Acero	mié 7/05/25	jue 8/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2283	**1.3.4.7.5.6.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**jue 15/05/25**	**vie 16/05/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2284	1.3.4.7.5.6.6	Concreto	vie 16/05/25	vie 16/05/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2285	1.3.4.7.5.6.6	Bloque en Concreto	jue 15/05/25	vie 16/05/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
2286	**1.3.4.7.5.6.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**jue 22/05/25**	**lun 26/05/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2287	1.3.4.7.5.6.6	Concreto	vie 23/05/25	lun 26/05/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
2288	1.3.4.7.5.6.6	Bloque en Concreto	jue 22/05/25	lun 26/05/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2289	**1.3.4.7.5.6.6**	**Viga de Amarre**	**sáb 17/05/25**	**jue 22/05/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2290	1.3.4.7.5.6.6	Acero	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
2291	1.3.4.7.5.6.6	Concreto	mar 20/05/25	jue 22/05/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2292	*1.3.4.7.5.7*	*Fin de Eje 3-4*	*lun 26/05/25*	*lun 26/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2293	**1.3.4.7.5.8**	**EJE 4-5**	**mié 26/06/24**	**lun 26/05/25**	**260,75 d**	**$ 222.404.106**	**0,53%**	**0,53%**	**$ 1.188.072**
2294	1.3.4.7.5.8.1	Excavación	mié 26/06/24	jue 27/06/24	2 d	$ 1.188.072	100,00%	100,00%	$ 1.188.072
2295	1.3.4.7.5.8.2	Pilotes FDP	mié 2/04/25	vie 4/04/25	2 d	$ 94.292.712	0,00%	0,00%	$ 0
2296	1.3.4.7.5.8.3	Mejoramiento con Rajón	vie 21/03/25	jue 27/03/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2297	**1.3.4.7.5.8.4**	**Estructura**	**mar 8/04/25**	**mié 14/05/25**	**27 d**	**$ 46.200.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2298	**1.3.4.7.5.8.4**	**Zapatas**	**mar 8/04/25**	**mié 16/04/25**	**7 d**	**$ 15.702.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2299	1.3.4.7.5.8.4	Solado	mar 8/04/25	jue 10/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2300	1.3.4.7.5.8.4	Acero	jue 10/04/25	sáb 12/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2301	1.3.4.7.5.8.4	Concreto	lun 14/04/25	mié 16/04/25	3 d	$ 7.596.000	0,00%	0,00%	$ 0
2302	**1.3.4.7.5.8.4**	**Vigas de Cimentación**	**jue 10/04/25**	**mié 23/04/25**	**8 d**	**$ 6.826.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2303	1.3.4.7.5.8.4	Acero	jue 10/04/25	lun 14/04/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2304	1.3.4.7.5.8.4	Concreto	mar 15/04/25	mié 23/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2305	**1.3.4.7.5.8.4**	**Columnas**	**jue 10/04/25**	**mar 29/04/25**	**13 d**	**$ 7.894.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2306	1.3.4.7.5.8.4	Acero	jue 10/04/25	lun 14/04/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2307	1.3.4.7.5.8.4	Concreto	mié 23/04/25	mar 29/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2308	**1.3.4.7.5.8.4**	**Vigas Longitudinales**	**lun 5/05/25**	**mié 14/05/25**	**8 d**	**$ 7.076.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2309	1.3.4.7.5.8.4	Acero	lun 5/05/25	jue 8/05/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2310	1.3.4.7.5.8.4	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2311	**1.3.4.7.5.8.4**	**Vigas Transversales**	**lun 5/05/25**	**mié 14/05/25**	**8 d**	**$ 8.700.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2312	1.3.4.7.5.8.4	Acero	lun 5/05/25	jue 8/05/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2313	1.3.4.7.5.8.4	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2314	**1.3.4.7.5.8.5**	**Tierra armada**	**mar 22/04/25**	**mié 14/05/25**	**18 d**	**$ 65.985.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2315	1.3.4.7.5.8.5	Geomalla de Refuerzo	mar 22/04/25	sáb 10/05/25	15 d	$ 16.496.235	0,00%	0,00%	$ 0
2316	1.3.4.7.5.8.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mié 23/04/25	lun 12/05/25	15 d	$ 16.496.235	0,00%	0,00%	$ 0
2317	1.3.4.7.5.8.5	Geotextil Fortex	mar 29/04/25	lun 12/05/25	10 d	$ 16.024.974	0,00%	0,00%	$ 0
2318	1.3.4.7.5.8.5	Relleno con Ceniza	vie 25/04/25	mié 14/05/25	15 d	$ 16.967.556	0,00%	0,00%	$ 0
2319	**1.3.4.7.5.8.6**	**Fachada en Mampostería**	**mié 7/05/25**	**lun 26/05/25**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2320	**1.3.4.7.5.8.6**	**Dobelas**	**mié 7/05/25**	**jue 8/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2321	1.3.4.7.5.8.6	Acero	mié 7/05/25	jue 8/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2322	**1.3.4.7.5.8.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**jue 15/05/25**	**vie 16/05/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2323	1.3.4.7.5.8.6	Concreto	vie 16/05/25	vie 16/05/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2324	1.3.4.7.5.8.6	Bloque en Concreto	jue 15/05/25	vie 16/05/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
2325	**1.3.4.7.5.8.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**jue 22/05/25**	**lun 26/05/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2326	1.3.4.7.5.8.6	Concreto	vie 23/05/25	lun 26/05/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
2327	1.3.4.7.5.8.6	Bloque en Concreto	jue 22/05/25	lun 26/05/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2328	**1.3.4.7.5.8.6**	**Viga de Amarre**	**sáb 17/05/25**	**jue 22/05/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2329	1.3.4.7.5.8.6	Acero	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
2330	1.3.4.7.5.8.6	Concreto	mar 20/05/25	jue 22/05/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2331	*1.3.4.7.5.9*	*Fin de Eje 4-5*	*lun 26/05/25*	*lun 26/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2332	**1.3.4.7.5.10**	**EJE 5-6**	**mié 26/06/24**	**lun 26/05/25**	**260,75 d**	**$ 185.957.394**	**0,51%**	**0,51%**	**$ 950.457**
2333	*1.3.4.7.5.10.*	*Excavacion -1*	*mié 26/06/24*	*mié 26/06/24*	*0 d*	*$ 950.457*	*100,00%*	*100,00%*	*$ 950.457*
2334	1.3.4.7.5.10.	Excavación	sáb 1/02/25	mar 4/02/25	2 d	$ 237.615	0,00%	0,00%	$ 0
2335	1.3.4.7.5.10.	Pilotes FDP	vie 4/04/25	lun 7/04/25	2 d	$ 57.846.000	0,00%	0,00%	$ 0
2336	1.3.4.7.5.10.	Mejoramiento con Rajón	jue 27/03/25	mar 1/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0

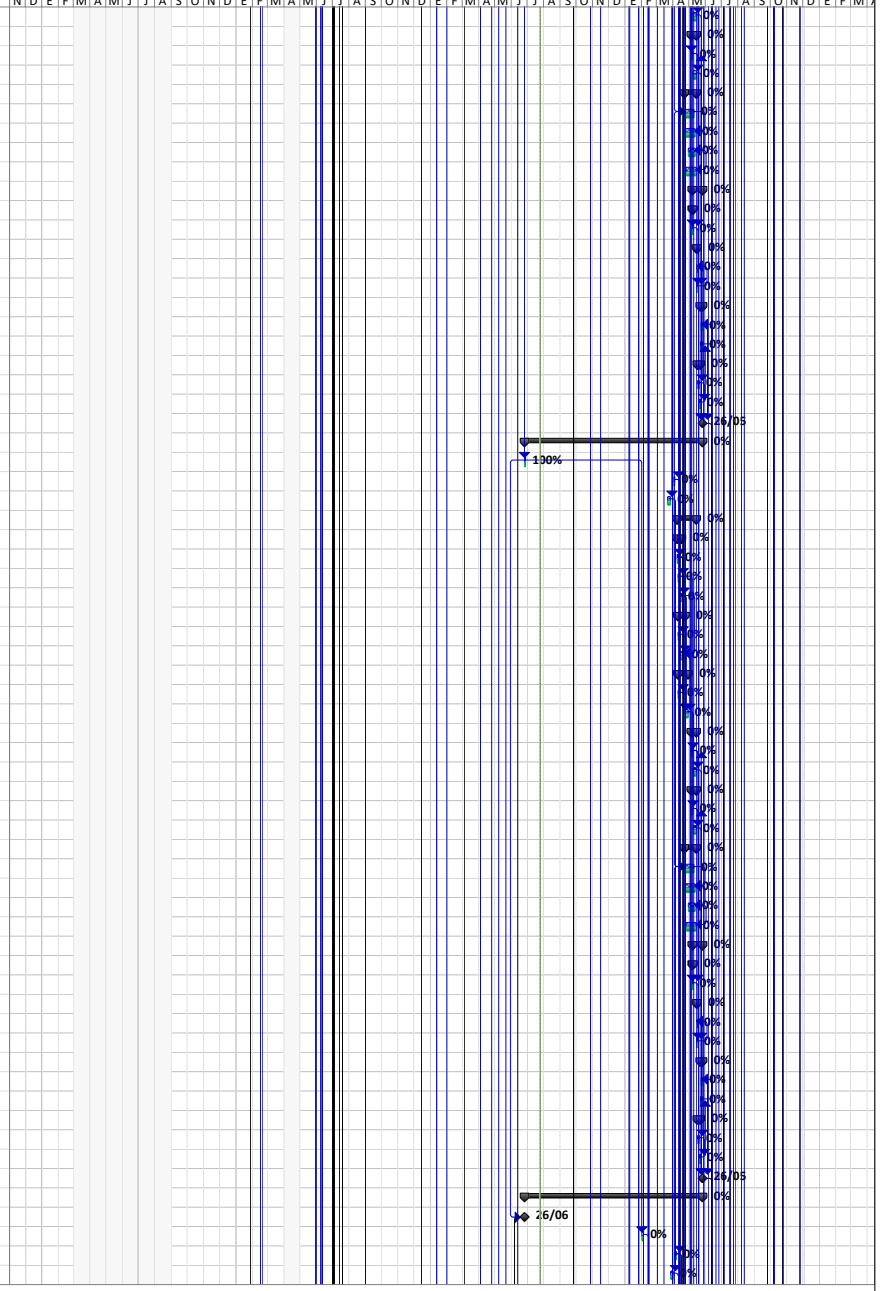

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2337	**1.3.4.7.5.10.**	**Estructura**	**jue 10/04/25**	**mié 14/05/25**	**25 d**	**$ 46.200.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2338	**1.3.4.7.5.10.**	**Zapatas**	**jue 10/04/25**	**mar 22/04/25**	**7 d**	**$ 15.702.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2339	1.3.4.7.5.10.	Solado	jue 10/04/25	sáb 12/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2340	1.3.4.7.5.10.	Acero	lun 14/04/25	mar 15/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2341	1.3.4.7.5.10.	Concreto	mié 16/04/25	mar 22/04/25	3 d	$ 7.596.000	0,00%	0,00%	$ 0
2342	**1.3.4.7.5.10.**	**Vigas de Cimentación**	**lun 14/04/25**	**vie 25/04/25**	**8 d**	**$ 6.826.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2343	1.3.4.7.5.10.	Acero	lun 14/04/25	mié 16/04/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2344	1.3.4.7.5.10.	Concreto	sáb 19/04/25	vie 25/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2345	**1.3.4.7.5.10.**	**Columnas**	**lun 14/04/25**	**vie 2/05/25**	**13 d**	**$ 7.894.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2346	1.3.4.7.5.10.	Acero	lun 14/04/25	mié 16/04/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2347	1.3.4.7.5.10.	Concreto	vie 25/04/25	vie 2/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2348	**1.3.4.7.5.10.**	**Vigas Longitudinales**	**lun 5/05/25**	**mié 14/05/25**	**8 d**	**$ 7.076.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2349	1.3.4.7.5.10.	Acero	lun 5/05/25	jue 8/05/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2350	1.3.4.7.5.10.	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2351	**1.3.4.7.5.10.**	**Vigas Transversales**	**lun 5/05/25**	**mié 14/05/25**	**8 d**	**$ 8.700.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2352	1.3.4.7.5.10.	Acero	lun 5/05/25	jue 8/05/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2353	1.3.4.7.5.10.	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2354	**1.3.4.7.5.10.**	**Tierra armada**	**mar 22/04/25**	**mié 14/05/25**	**18 d**	**$ 65.985.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2355	1.3.4.7.5.10.	Geomalla de Refuerzo	mar 22/04/25	sáb 10/05/25	15 d	$ 16.496.238	0,00%	0,00%	$ 0
2356	1.3.4.7.5.10.	Sacos Llenos Con Material Granular	mié 23/04/25	lun 12/05/25	15 d	$ 16.496.238	0,00%	0,00%	$ 0
2357	1.3.4.7.5.10.	Geotextil Fortex	mar 29/04/25	lun 12/05/25	10 d	$ 15.996.400	0,00%	0,00%	$ 0
2358	1.3.4.7.5.10.	Relleno con Ceniza	vie 25/04/25	mié 14/05/25	15 d	$ 16.996.124	0,00%	0,00%	$ 0
2359	**1.3.4.7.5.10.**	**Fachada en Mampostería**	**mié 7/05/25**	**lun 26/05/25**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2360	**1.3.4.7.5.10.**	**Dobelas**	**mié 7/05/25**	**jue 8/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2361	1.3.4.7.5.10.	Acero	mié 7/05/25	jue 8/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2362	**1.3.4.7.5.10.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**jue 15/05/25**	**vie 16/05/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2363	1.3.4.7.5.10.	Concreto	vie 16/05/25	vie 16/05/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2364	1.3.4.7.5.10.	Bloque en Concreto	jue 15/05/25	vie 16/05/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
2365	**1.3.4.7.5.10.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**jue 22/05/25**	**lun 26/05/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2366	1.3.4.7.5.10.	Concreto	vie 23/05/25	lun 26/05/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
2367	1.3.4.7.5.10.	Bloque en Concreto	jue 22/05/25	lun 26/05/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2368	**1.3.4.7.5.10.**	**Viga de Amarre**	**sáb 17/05/25**	**jue 22/05/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2369	1.3.4.7.5.10.	Acero	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
2370	1.3.4.7.5.10.	Concreto	mar 20/05/25	jue 22/05/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2371	*1.3.4.7.5.1:*	*Fin de Eje 5-6*	*lun 26/05/25*	*lun 26/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2372	**1.3.4.7.5.12**	**EJE 6-7**	**mié 26/06/24**	**lun 26/05/25**	**260,75 d**	**$ 219.984.394**	**0,43%**	**0,43%**	**$ 950.457**
2373	1.3.4.7.5.12.	Excavación -1	mié 26/06/24	jue 27/06/24	2 d	$ 950.457	100,00%	100,00%	$ 950.457
2374	1.3.4.7.5.12.	Excavación	mar 4/02/25	jue 6/02/25	2 d	$ 237.615	0,00%	0,00%	$ 0
2375	1.3.4.7.5.12.	Pilotes FDP	lun 7/04/25	mié 9/04/25	2 d	$ 57.691.000	0,00%	0,00%	$ 0
2376	1.3.4.7.5.12.	Mejoramiento con Rajón	mar 1/04/25	sáb 5/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2377	**1.3.4.7.5.12.**	**Estructura**	**lun 14/04/25**	**mié 14/05/25**	**23 d**	**$ 80.382.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2378	**1.3.4.7.5.12.**	**Zapatas**	**lun 14/04/25**	**jue 24/04/25**	**7 d**	**$ 15.702.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2379	1.3.4.7.5.12.	Solado	lun 14/04/25	mar 15/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2380	1.3.4.7.5.12.	Acero	mié 16/04/25	lun 21/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2381	1.3.4.7.5.12.	Concreto	lun 21/04/25	jue 24/04/25	3 d	$ 7.596.000	0,00%	0,00%	$ 0
2382	**1.3.4.7.5.12.**	**Vigas de Cimentación**	**mié 16/04/25**	**lun 28/04/25**	**8 d**	**$ 6.826.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2383	1.3.4.7.5.12.	Acero	mié 16/04/25	mar 22/04/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2384	1.3.4.7.5.12.	Concreto	mar 22/04/25	lun 28/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2385	**1.3.4.7.5.12.**	**Columnas**	**mié 16/04/25**	**lun 5/05/25**	**13 d**	**$ 7.894.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2386	1.3.4.7.5.12.	Acero	mié 16/04/25	mar 22/04/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2387	1.3.4.7.5.12.	Concreto	lun 28/04/25	lun 5/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2388	**1.3.4.7.5.12.**	**Vigas Longitudinales**	**lun 5/05/25**	**mié 14/05/25**	**8 d**	**$ 41.258.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2389	1.3.4.7.5.12.	Acero	lun 5/05/25	jue 8/05/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2390	1.3.4.7.5.12.	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 37.980.000	0,00%	0,00%	$ 0
2391	**1.3.4.7.5.12.**	**Vigas Transversales**	**lun 5/05/25**	**mié 14/05/25**	**8 d**	**$ 8.700.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2392	1.3.4.7.5.12.	Acero	lun 5/05/25	jue 8/05/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2393	1.3.4.7.5.12.	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2394	**1.3.4.7.5.12.**	**Tierra armada**	**mar 22/04/25**	**mié 14/05/25**	**18 d**	**$ 65.985.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2395	1.3.4.7.5.12.	Geomalla de Refuerzo	mar 22/04/25	sáb 10/05/25	15 d	$ 16.496.247	0,00%	0,00%	$ 0
2396	1.3.4.7.5.12.	Sacos Llenos Con Material Granular	mié 23/04/25	lun 12/05/25	15 d	$ 16.496.247	0,00%	0,00%	$ 0
2397	1.3.4.7.5.12.	Geotextil Fortex	mar 29/04/25	lun 12/05/25	10 d	$ 15.964.122	0,00%	0,00%	$ 0
2398	1.3.4.7.5.12.	Relleno con Ceniza	vie 25/04/25	mié 14/05/25	15 d	$ 17.028.384	0,00%	0,00%	$ 0
2399	**1.3.4.7.5.12.**	**Fachada en Mampostería**	**mié 7/05/25**	**lun 26/05/25**	**15 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2400	**1.3.4.7.5.12.**	**Dobelas**	**mié 7/05/25**	**jue 8/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2401	1.3.4.7.5.12.	Acero	mié 7/05/25	jue 8/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2402	**1.3.4.7.5.12.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**jue 15/05/25**	**vie 16/05/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**

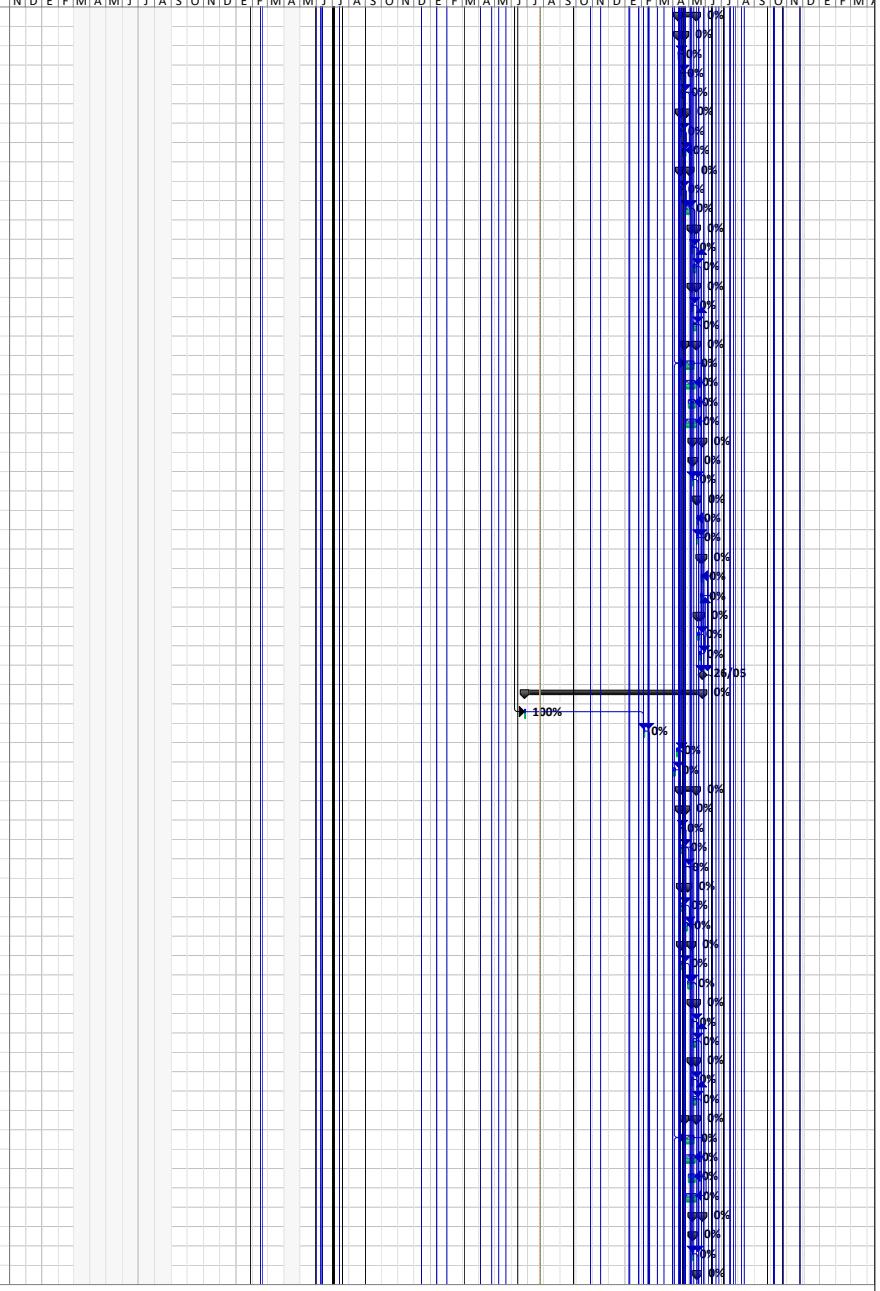

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2403	1.3.4.7.5.12.	Concreto	vie 16/05/25	vie 16/05/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2404	1.3.4.7.5.12.	Bloque en Concreto	jue 15/05/25	vie 16/05/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
2405	**1.3.4.7.5.12.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**jue 22/05/25**	**lun 26/05/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2406	1.3.4.7.5.12.	Concreto	vie 23/05/25	lun 26/05/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
2407	1.3.4.7.5.12.	Bloque en Concreto	jue 22/05/25	lun 26/05/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2408	**1.3.4.7.5.12.**	**Viga de Amarre**	**sáb 17/05/25**	**jue 22/05/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2409	1.3.4.7.5.12.	Acero	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
2410	1.3.4.7.5.12.	Concreto	mar 20/05/25	jue 22/05/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2411	*1.3.4.7.5.1:*	*Fin de Eje 6-7*	*lun 26/05/25*	*lun 26/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2412	**1.3.4.7.5.14**	**EJE 7-8**	**jue 6/02/25**	**lun 26/05/25**	**84,75 d**	**$ 185.802.394**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2413	1.3.4.7.5.14.	Excavación	jue 6/02/25	sáb 8/02/25	2 d	$ 1.188.072	0,00%	0,00%	$ 0
2414	1.3.4.7.5.14.	Pilotes FDP	mié 9/04/25	vie 11/04/25	2 d	$ 57.691.000	0,00%	0,00%	$ 0
2415	1.3.4.7.5.14.	Mejoramiento con Rajón	lun 7/04/25	jue 10/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2416	**1.3.4.7.5.14.**	**Estructura**	**mié 16/04/25**	**vie 16/05/25**	**23 d**	**$ 46.200.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2417	**1.3.4.7.5.14.**	**Zapatas**	**mié 16/04/25**	**sáb 26/04/25**	**7 d**	**$ 15.702.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2418	1.3.4.7.5.14.	Solado	mié 16/04/25	lun 21/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2419	1.3.4.7.5.14.	Acero	lun 21/04/25	mié 23/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2420	1.3.4.7.5.14.	Concreto	mié 23/04/25	sáb 26/04/25	3 d	$ 7.596.000	0,00%	0,00%	$ 0
2421	**1.3.4.7.5.14.**	**Vigas de Cimentación**	**lun 21/04/25**	**mié 30/04/25**	**8 d**	**$ 6.826.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2422	1.3.4.7.5.14.	Acero	lun 21/04/25	jue 24/04/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2423	1.3.4.7.5.14.	Concreto	jue 24/04/25	mié 30/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2424	**1.3.4.7.5.14.**	**Columnas**	**lun 21/04/25**	**mié 7/05/25**	**13 d**	**$ 7.894.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2425	1.3.4.7.5.14.	Acero	lun 21/04/25	jue 24/04/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2426	1.3.4.7.5.14.	Concreto	mié 30/04/25	mié 7/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2427	**1.3.4.7.5.14.**	**Vigas Longitudinales**	**mié 7/05/25**	**vie 16/05/25**	**8 d**	**$ 7.076.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2428	1.3.4.7.5.14.	Acero	mié 7/05/25	sáb 10/05/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2429	1.3.4.7.5.14.	Concreto	lun 12/05/25	vie 16/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2430	**1.3.4.7.5.14.**	**Vigas Transversales**	**mié 7/05/25**	**vie 16/05/25**	**8 d**	**$ 8.700.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2431	1.3.4.7.5.14.	Acero	mié 7/05/25	sáb 10/05/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2432	1.3.4.7.5.14.	Concreto	lun 12/05/25	vie 16/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2433	**1.3.4.7.5.14.**	**Tierra armada**	**mar 22/04/25**	**mié 14/05/25**	**18 d**	**$ 65.985.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2434	1.3.4.7.5.14.	Geomalla de Refuerzo	mar 22/04/25	sáb 10/05/25	15 d	$ 16.934.202	0,00%	0,00%	$ 0
2435	1.3.4.7.5.14.	Sacos Llenos Con Material Granular	mié 23/04/25	lun 12/05/25	15 d	$ 16.934.202	0,00%	0,00%	$ 0
2436	1.3.4.7.5.14.	Geotextil Fortex	mar 29/04/25	lun 12/05/25	10 d	$ 16.350.270	0,00%	0,00%	$ 0
2437	1.3.4.7.5.14.	Relleno con Ceniza	vie 25/04/25	mié 14/05/25	15 d	$ 15.766.326	0,00%	0,00%	$ 0
2438	**1.3.4.7.5.14.**	**Fachada en Mampostería**	**vie 9/05/25**	**lun 26/05/25**	**13 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2439	**1.3.4.7.5.14.**	**Dobelas**	**vie 9/05/25**	**sáb 10/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2440	1.3.4.7.5.14.	Acero	vie 9/05/25	sáb 10/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2441	**1.3.4.7.5.14.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**jue 15/05/25**	**vie 16/05/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2442	1.3.4.7.5.14.	Concreto	vie 16/05/25	vie 16/05/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2443	1.3.4.7.5.14.	Bloque en Concreto	jue 15/05/25	vie 16/05/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
2444	**1.3.4.7.5.14.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**jue 22/05/25**	**lun 26/05/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2445	1.3.4.7.5.14.	Concreto	vie 23/05/25	lun 26/05/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
2446	1.3.4.7.5.14.	Bloque en Concreto	jue 22/05/25	lun 26/05/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2447	**1.3.4.7.5.14.**	**Viga de Amarre**	**sáb 17/05/25**	**jue 22/05/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2448	1.3.4.7.5.14.	Acero	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
2449	1.3.4.7.5.14.	Concreto	mar 20/05/25	jue 22/05/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2450	*1.3.4.7.5.1!*	*Fin de Eje 7-8*	*lun 26/05/25*	*lun 26/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2451	**1.3.4.7.5.16**	**EJE 8-9**	**lun 10/02/25**	**lun 26/05/25**	**82,75 d**	**$ 185.794.618**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2452	1.3.4.7.5.16.	Excavación	lun 10/02/25	mar 11/02/25	2 d	$ 1.180.296	0,00%	0,00%	$ 0
2453	1.3.4.7.5.16.	Pilotes FDP	vie 11/04/25	lun 14/04/25	2 d	$ 57.691.000	0,00%	0,00%	$ 0
2454	1.3.4.7.5.16.	Mejoramiento con Rajón	vie 11/04/25	mié 16/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2455	**1.3.4.7.5.16.**	**Estructura**	**lun 21/04/25**	**mar 20/05/25**	**23 d**	**$ 46.200.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2456	**1.3.4.7.5.16.**	**Zapatas**	**lun 21/04/25**	**mar 29/04/25**	**7 d**	**$ 15.702.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2457	1.3.4.7.5.16.	Solado	lun 21/04/25	mié 23/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2458	1.3.4.7.5.16.	Acero	mié 23/04/25	vie 25/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2459	1.3.4.7.5.16.	Concreto	vie 25/04/25	mar 29/04/25	3 d	$ 7.596.000	0,00%	0,00%	$ 0
2460	**1.3.4.7.5.16.**	**Vigas de Cimentación**	**mié 23/04/25**	**sáb 3/05/25**	**8 d**	**$ 6.826.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2461	1.3.4.7.5.16.	Acero	mié 23/04/25	sáb 26/04/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2462	1.3.4.7.5.16.	Concreto	sáb 26/04/25	sáb 3/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2463	**1.3.4.7.5.16.**	**Columnas**	**mié 23/04/25**	**vie 9/05/25**	**13 d**	**$ 7.894.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2464	1.3.4.7.5.16.	Acero	mié 23/04/25	sáb 26/04/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2465	1.3.4.7.5.16.	Concreto	sáb 3/05/25	vie 9/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2466	**1.3.4.7.5.16.**	**Vigas Longitudinales**	**vie 9/05/25**	**mar 20/05/25**	**8 d**	**$ 7.076.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2467	1.3.4.7.5.16.	Acero	vie 9/05/25	mar 13/05/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2468	1.3.4.7.5.16.	Concreto	mié 14/05/25	mar 20/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0

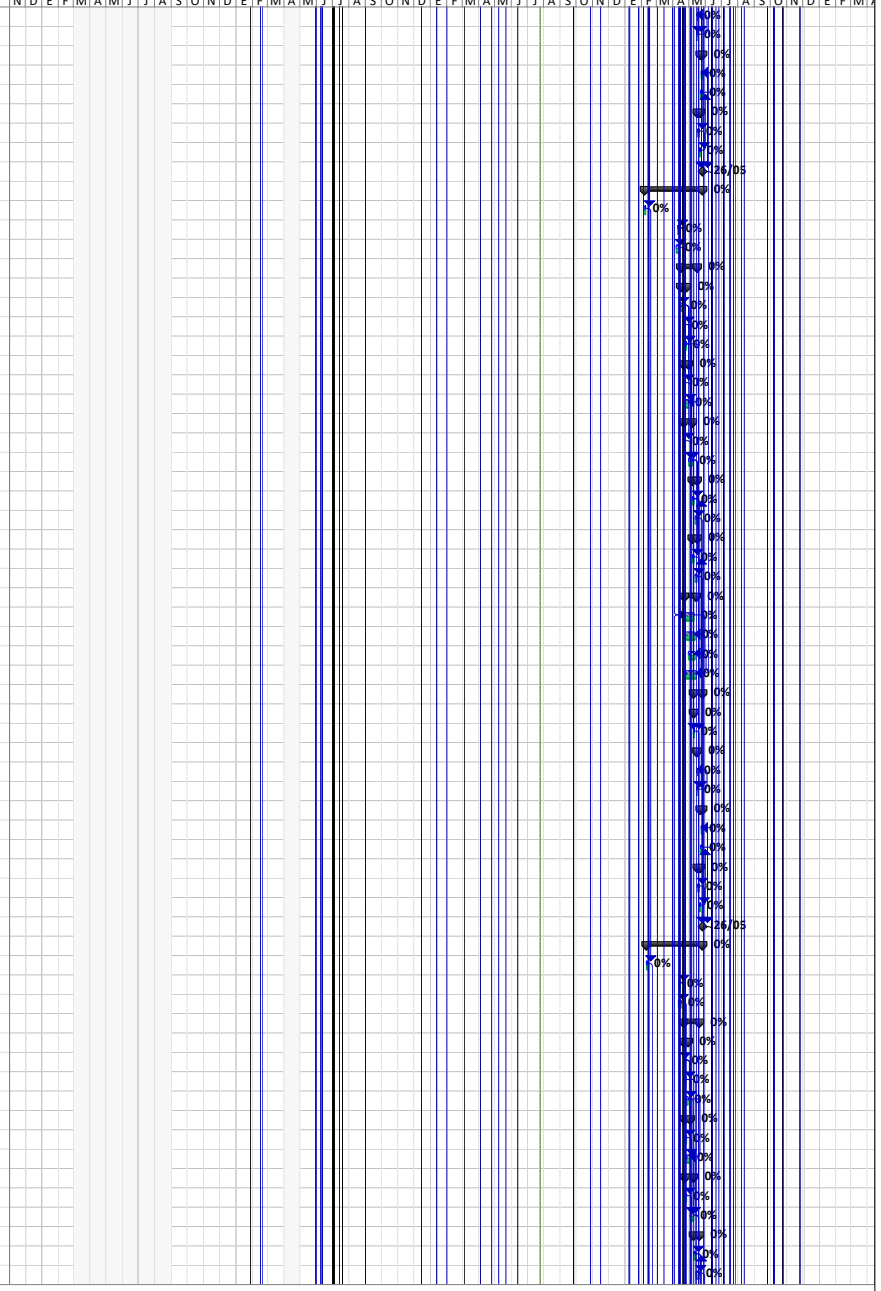

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2469	**1.3.4.7.5.16.**	**Vigas Transversales**	**vie 9/05/25**	**mar 20/05/25**	**8 d**	**$ 8.700.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2470	1.3.4.7.5.16.	Acero	vie 9/05/25	mar 13/05/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2471	1.3.4.7.5.16.	Concreto	mié 14/05/25	mar 20/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2472	**1.3.4.7.5.16.**	**Tierra armada**	**mar 22/04/25**	**mié 14/05/25**	**18 d**	**$ 65.985.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2473	1.3.4.7.5.16.	Geomalla de Refuerzo	mar 22/04/25	sáb 10/05/25	15 d	$ 16.496.244	0,00%	0,00%	$ 0
2474	1.3.4.7.5.16.	Sacos Llenos Con Material Granular	mié 23/04/25	lun 12/05/25	15 d	$ 16.496.244	0,00%	0,00%	$ 0
2475	1.3.4.7.5.16.	Geotextil Fortex	mar 29/04/25	lun 12/05/25	10 d	$ 15.885.272	0,00%	0,00%	$ 0
2476	1.3.4.7.5.16.	Relleno con Ceniza	vie 25/04/25	mié 14/05/25	15 d	$ 17.107.240	0,00%	0,00%	$ 0
2477	**1.3.4.7.5.16.**	**Fachada en Mampostería**	**mar 13/05/25**	**lun 26/05/25**	**11 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2478	**1.3.4.7.5.16.**	**Dobelas**	**mar 13/05/25**	**mar 13/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2479	1.3.4.7.5.16.	Acero	mar 13/05/25	mar 13/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2480	**1.3.4.7.5.16.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**jue 15/05/25**	**vie 16/05/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2481	1.3.4.7.5.16.	Concreto	vie 16/05/25	vie 16/05/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2482	1.3.4.7.5.16.	Bloque en Concreto	jue 15/05/25	vie 16/05/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
2483	**1.3.4.7.5.16.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**jue 22/05/25**	**lun 26/05/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2484	1.3.4.7.5.16.	Concreto	vie 23/05/25	lun 26/05/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
2485	1.3.4.7.5.16.	Bloque en Concreto	jue 22/05/25	lun 26/05/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2486	**1.3.4.7.5.16.**	**Viga de Amarre**	**sáb 17/05/25**	**jue 22/05/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2487	1.3.4.7.5.16.	Acero	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
2488	1.3.4.7.5.16.	Concreto	mar 20/05/25	jue 22/05/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2489	*1.3.4.7.5.17*	*Fin de Eje 8-9*	*lun 26/05/25*	*lun 26/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2490	**1.3.4.7.5.18**	**EJE 9-10**	**mié 12/02/25**	**vie 16/05/25**	**73 d**	**$ 59.144.471**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2491	1.3.4.7.5.18.	Excavación	mié 12/02/25	mié 12/02/25	1 d	$ 1.000.000	0,00%	0,00%	$ 0
2492	1.3.4.7.5.18.	Mejoramiento de Subrasante	jue 13/02/25	lun 17/02/25	3 d	$ 180.296	0,00%	0,00%	$ 0
2493	**1.3.4.7.5.18.**	**Estructura**	**lun 17/02/25**	**vie 16/05/25**	**69 d**	**$ 57.964.175**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2494	**1.3.4.7.5.18.**	**Zapatas**	**lun 17/02/25**	**mar 25/02/25**	**7 d**	**$ 15.702.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2495	1.3.4.7.5.18.	Solado	lun 17/02/25	mié 19/02/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2496	1.3.4.7.5.18.	Acero	mié 19/02/25	vie 21/02/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2497	1.3.4.7.5.18.	Concreto	vie 21/02/25	mar 25/02/25	3 d	$ 7.596.000	0,00%	0,00%	$ 0
2498	**1.3.4.7.5.18.**	**Vigas de Cimentación**	**mié 19/02/25**	**vie 28/02/25**	**8 d**	**$ 7.459.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2499	1.3.4.7.5.18.	Acero	mié 19/02/25	sáb 22/02/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2500	1.3.4.7.5.18.	Concreto	sáb 22/02/25	vie 28/02/25	5 d	$ 4.431.000	0,00%	0,00%	$ 0
2501	**1.3.4.7.5.18.**	**Columnas**	**vie 21/02/25**	**jue 6/03/25**	**11 d**	**$ 7.894.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2502	1.3.4.7.5.18.	Acero	vie 21/02/25	mar 25/02/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2503	1.3.4.7.5.18.	Concreto	vie 28/02/25	jue 6/03/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2504	**1.3.4.7.5.18.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 6/03/25**	**lun 17/03/25**	**8 d**	**$ 7.076.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2505	1.3.4.7.5.18.	Acero	jue 6/03/25	lun 10/03/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2506	1.3.4.7.5.18.	Concreto	mar 11/03/25	lun 17/03/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2507	**1.3.4.7.5.18.**	**Vigas Transversales**	**lun 17/03/25**	**jue 27/03/25**	**8 d**	**$ 8.700.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2508	1.3.4.7.5.18.	Acero	lun 17/03/25	jue 20/03/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2509	1.3.4.7.5.18.	Concreto	jue 20/03/25	jue 27/03/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2510	**1.3.4.7.5.18.**	**Placa de Concreto**	**jue 27/03/25**	**mar 6/05/25**	**30 d**	**$ 5.890.075**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2511	1.3.4.7.5.18.	Acero	jue 27/03/25	mar 15/04/25	15 d	$ 2.092.075	0,00%	0,00%	$ 0
2512	1.3.4.7.5.18.	Concreto	mar 15/04/25	mar 6/05/25	15 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2513	**1.3.4.7.5.18.**	**Bordillo Peatonal**	**mié 7/05/25**	**vie 16/05/25**	**8 d**	**$ 5.240.595**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2514	1.3.4.7.5.18.	Acero	mié 7/05/25	vie 9/05/25	3 d	$ 1.442.595	0,00%	0,00%	$ 0
2515	1.3.4.7.5.18.	Concreto	sáb 10/05/25	vie 16/05/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2516	*1.3.4.7.5.19*	*Fin de Eje 1-2*	*vie 16/05/25*	*vie 16/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2517	**1.3.4.7.5.20**	**PAVIMENTO**	**lun 26/05/25**	**sáb 5/07/25**	**31 d**	**$ 137.979.091**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2518	1.3.4.7.5.20.	Subbase	lun 26/05/25	mié 11/06/25	13 d	$ 3.259.200	0,00%	0,00%	$ 0
2519	1.3.4.7.5.20.	Base	jue 5/06/25	sáb 21/06/25	13 d	$ 30.000.000	0,00%	0,00%	$ 0
2520	1.3.4.7.5.20.	Mezcla Asfaltica - GCR	sáb 21/06/25	sáb 28/06/25	5 d	$ 79.191.541	0,00%	0,00%	$ 0
2521	1.3.4.7.5.20.	Mezcla Asfaltica - MD12	sáb 28/06/25	sáb 5/07/25	5 d	$ 25.528.350	0,00%	0,00%	$ 0
2522	1.3.4.7.5.21	Baranda Vehicular	mié 18/06/25	mié 3/09/25	60 d	$ 209.599.614	0,00%	0,00%	$ 0
2523	1.3.4.7.5.22	Baranda Peatonal	mié 18/06/25	mié 3/09/25	60 d	$ 23.175.071	0,00%	0,00%	$ 0
2524	*1.3.4.7.6*	*Fin de Oreja Occidental*	*mié 3/09/25*	*mié 3/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2525	**1.3.4.7.7**	**FINAL DE OREJA OCCIDENTAL**	**mar 4/02/25**	**sáb 30/08/25**	**161,75 d**	**$ 1.621.566.420**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2526	1.3.4.7.7.1	Demolición	mar 4/02/25	mié 12/02/25	7 d	$ 5.162.981	0,00%	0,00%	$ 0
2527	**1.3.4.7.7.2**	**EJE 1-2**	**jue 13/02/25**	**mar 27/05/25**	**80,75 d**	**$ 143.601.743**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2528	1.3.4.7.7.2.1	Excavación	jue 13/02/25	vie 14/02/25	2 d	$ 869.284	0,00%	0,00%	$ 0
2529	1.3.4.7.7.2.2	Pilotes FDP	mar 15/04/25	mié 16/04/25	2 d	$ 56.675.000	0,00%	0,00%	$ 0
2530	1.3.4.7.7.2.3	Mejoramiento con Rajón	mié 16/04/25	mié 23/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2531	**1.3.4.7.7.2.4**	**Estructura**	**mié 23/04/25**	**jue 22/05/25**	**23 d**	**$ 39.254.642**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2532	**1.3.4.7.7.2.4**	**Zapatas**	**mié 23/04/25**	**vie 2/05/25**	**7 d**	**$ 13.820.147**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2533	1.3.4.7.7.2.4	Solado	mié 23/04/25	vie 25/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2534	1.3.4.7.7.2.4	Acero	vie 25/04/25	lun 28/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0

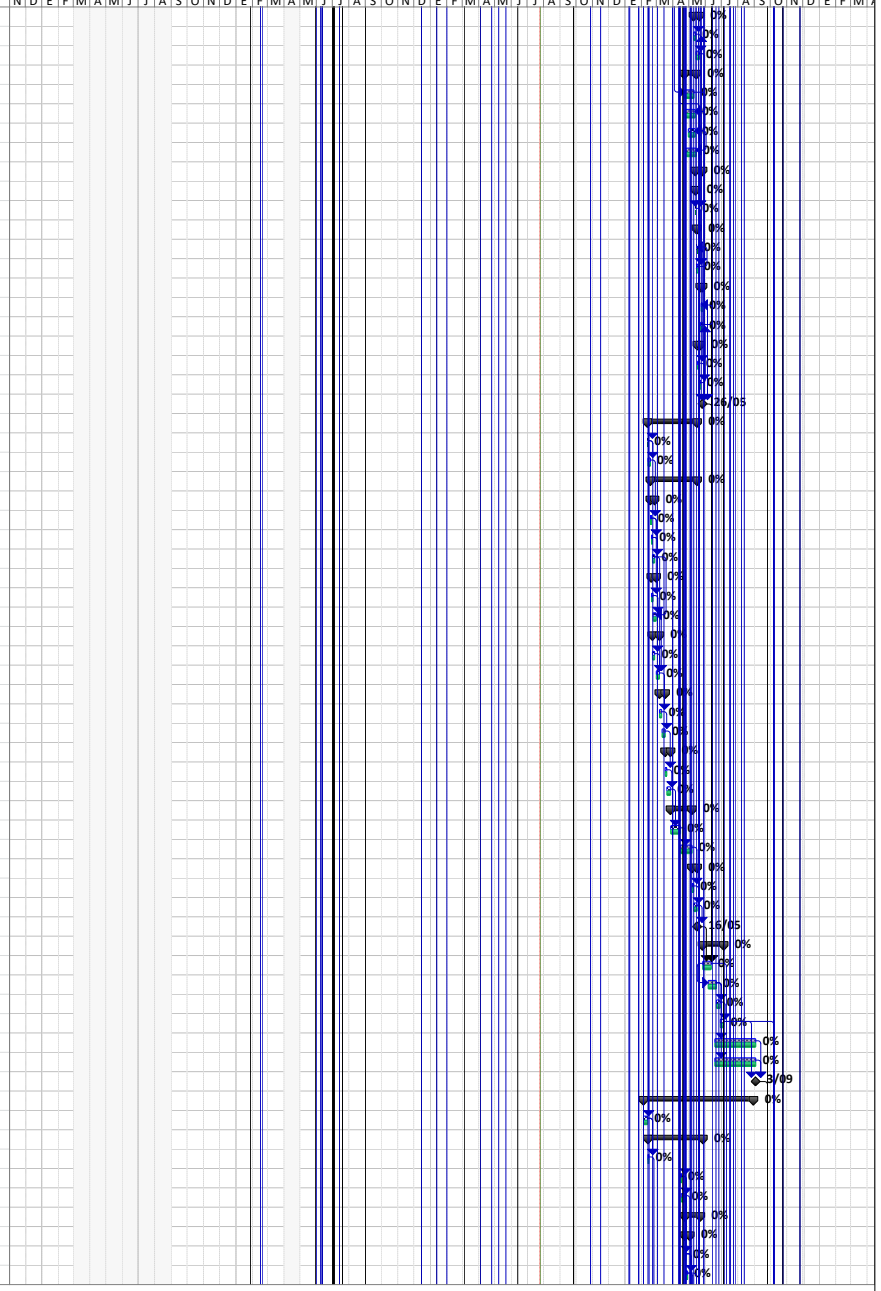

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2535	1.3.4.7.7.2.4	Concreto	lun 28/04/25	vie 2/05/25	3 d	$ 5.714.137	0,00%	0,00%	$ 0
2536	**1.3.4.7.7.2.4**	**Vigas de Cimentación**	**vie 25/04/25**	**mar 6/05/25**	**8 d**	**$ 5.560.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2537	1.3.4.7.7.2.4	Acero	vie 25/04/25	mar 29/04/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2538	1.3.4.7.7.2.4	Concreto	mar 29/04/25	mar 6/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2539	**1.3.4.7.7.2.4**	**Columnas**	**mié 30/04/25**	**lun 12/05/25**	**9 d**	**$ 6.628.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2540	1.3.4.7.7.2.4	Acero	mié 30/04/25	lun 5/05/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2541	1.3.4.7.7.2.4	Concreto	mar 6/05/25	lun 12/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2542	**1.3.4.7.7.2.4**	**Vigas Longitudinales**	**mar 13/05/25**	**jue 22/05/25**	**8 d**	**$ 5.810.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2543	1.3.4.7.7.2.4	Acero	mar 13/05/25	jue 15/05/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2544	1.3.4.7.7.2.4	Concreto	vie 16/05/25	jue 22/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2545	**1.3.4.7.7.2.4**	**Vigas Transversales**	**mar 13/05/25**	**jue 22/05/25**	**8 d**	**$ 7.434.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2546	1.3.4.7.7.2.4	Acero	mar 13/05/25	jue 15/05/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2547	1.3.4.7.7.2.4	Concreto	vie 16/05/25	jue 22/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2548	**1.3.4.7.7.2.5**	**Tierra armada**	**jue 10/04/25**	**mar 6/05/25**	**18 d**	**$ 32.065.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2549	1.3.4.7.7.2.5	Geomalla de Refuerzo	jue 10/04/25	vie 2/05/25	15 d	$ 8.016.250	0,00%	0,00%	$ 0
2550	1.3.4.7.7.2.5	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 11/04/25	sáb 3/05/25	15 d	$ 8.016.250	0,00%	0,00%	$ 0
2551	1.3.4.7.7.2.5	Geotextil Fortex	lun 21/04/25	sáb 3/05/25	10 d	$ 7.695.600	0,00%	0,00%	$ 0
2552	1.3.4.7.7.2.5	Relleno con Ceniza	mar 15/04/25	mar 6/05/25	15 d	$ 8.336.900	0,00%	0,00%	$ 0
2553	**1.3.4.7.7.2.6**	**Fachada en Mampostería**	**jue 15/05/25**	**mar 27/05/25**	**10 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2554	**1.3.4.7.7.2.6**	**Dobelas**	**jue 15/05/25**	**jue 15/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2555	1.3.4.7.7.2.6	Acero	jue 15/05/25	jue 15/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2556	**1.3.4.7.7.2.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**vie 16/05/25**	**lun 19/05/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2557	1.3.4.7.7.2.6	Concreto	sáb 17/05/25	lun 19/05/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2558	1.3.4.7.7.2.6	Bloque en Concreto	vie 16/05/25	lun 19/05/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
2559	**1.3.4.7.7.2.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**vie 23/05/25**	**mar 27/05/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2560	1.3.4.7.7.2.6	Concreto	sáb 24/05/25	mar 27/05/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
2561	1.3.4.7.7.2.6	Bloque en Concreto	vie 23/05/25	mar 27/05/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2562	**1.3.4.7.7.2.6**	**Viga de Amarre**	**lun 19/05/25**	**vie 23/05/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2563	1.3.4.7.7.2.6	Acero	lun 19/05/25	mié 21/05/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
2564	1.3.4.7.7.2.6	Concreto	mié 21/05/25	vie 23/05/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2565	*1.3.4.7.7.3*	*Fin de Eje 1-2*	*mar 27/05/25*	*mar 27/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2566	**1.3.4.7.7.4**	**EJE 2-3**	**sáb 15/02/25**	**jue 29/05/25**	**80,75 d**	**$ 143.319.606**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2567	1.3.4.7.7.4.1	Excavación	sáb 15/02/25	mar 18/02/25	2 d	$ 869.284	0,00%	0,00%	$ 0
2568	1.3.4.7.7.4.2	Pilotes FDP	sáb 19/04/25	mar 22/04/25	2 d	$ 56.675.000	0,00%	0,00%	$ 0
2569	1.3.4.7.7.4.3	Mejoramiento con Rajón	mié 23/04/25	lun 28/04/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2570	**1.3.4.7.7.4.4**	**Estructura**	**vie 25/04/25**	**sáb 24/05/25**	**23 d**	**$ 39.237.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2571	**1.3.4.7.7.4.4**	**Zapatas**	**vie 25/04/25**	**lun 5/05/25**	**7 d**	**$ 13.803.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2572	1.3.4.7.7.4.4	Solado	vie 25/04/25	lun 28/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2573	1.3.4.7.7.4.4	Acero	lun 28/04/25	mié 30/04/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2574	1.3.4.7.7.4.4	Concreto	mié 30/04/25	lun 5/05/25	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2575	**1.3.4.7.7.4.4**	**Vigas de Cimentación**	**lun 28/04/25**	**jue 8/05/25**	**8 d**	**$ 5.560.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2576	1.3.4.7.7.4.4	Acero	lun 28/04/25	vie 2/05/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2577	1.3.4.7.7.4.4	Concreto	vie 2/05/25	jue 8/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2578	**1.3.4.7.7.4.4**	**Columnas**	**lun 28/04/25**	**mié 14/05/25**	**13 d**	**$ 6.628.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2579	1.3.4.7.7.4.4	Acero	lun 28/04/25	vie 2/05/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2580	1.3.4.7.7.4.4	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2581	**1.3.4.7.7.4.4**	**Vigas Longitudinales**	**jue 15/05/25**	**sáb 24/05/25**	**8 d**	**$ 5.810.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2582	1.3.4.7.7.4.4	Acero	jue 15/05/25	lun 19/05/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2583	1.3.4.7.7.4.4	Concreto	lun 19/05/25	sáb 24/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2584	**1.3.4.7.7.4.4**	**Vigas Transversales**	**jue 15/05/25**	**sáb 24/05/25**	**8 d**	**$ 7.434.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2585	1.3.4.7.7.4.4	Acero	jue 15/05/25	lun 19/05/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2586	1.3.4.7.7.4.4	Concreto	lun 19/05/25	sáb 24/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2587	**1.3.4.7.7.4.5**	**Tierra armada**	**jue 10/04/25**	**mar 6/05/25**	**18 d**	**$ 31.800.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2588	1.3.4.7.7.4.5	Geomalla de Refuerzo	jue 10/04/25	vie 2/05/25	15 d	$ 7.949.996	0,00%	0,00%	$ 0
2589	1.3.4.7.7.4.5	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 11/04/25	sáb 3/05/25	15 d	$ 7.949.996	0,00%	0,00%	$ 0
2590	1.3.4.7.7.4.5	Geotextil Fortex	lun 21/04/25	sáb 3/05/25	10 d	$ 7.604.360	0,00%	0,00%	$ 0
2591	1.3.4.7.7.4.5	Relleno con Ceniza	mar 15/04/25	mar 6/05/25	15 d	$ 8.295.648	0,00%	0,00%	$ 0
2592	**1.3.4.7.7.4.6**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 17/05/25**	**jue 29/05/25**	**10 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2593	**1.3.4.7.7.4.6**	**Dobelas**	**sáb 17/05/25**	**lun 19/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2594	1.3.4.7.7.4.6	Acero	sáb 17/05/25	lun 19/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2595	**1.3.4.7.7.4.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**lun 19/05/25**	**mié 21/05/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2596	1.3.4.7.7.4.6	Concreto	mar 20/05/25	mié 21/05/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2597	1.3.4.7.7.4.6	Bloque en Concreto	lun 19/05/25	mié 21/05/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
2598	**1.3.4.7.7.4.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 26/05/25**	**jue 29/05/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2599	1.3.4.7.7.4.6	Concreto	mar 27/05/25	jue 29/05/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
2600	1.3.4.7.7.4.6	Bloque en Concreto	lun 26/05/25	jue 29/05/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0

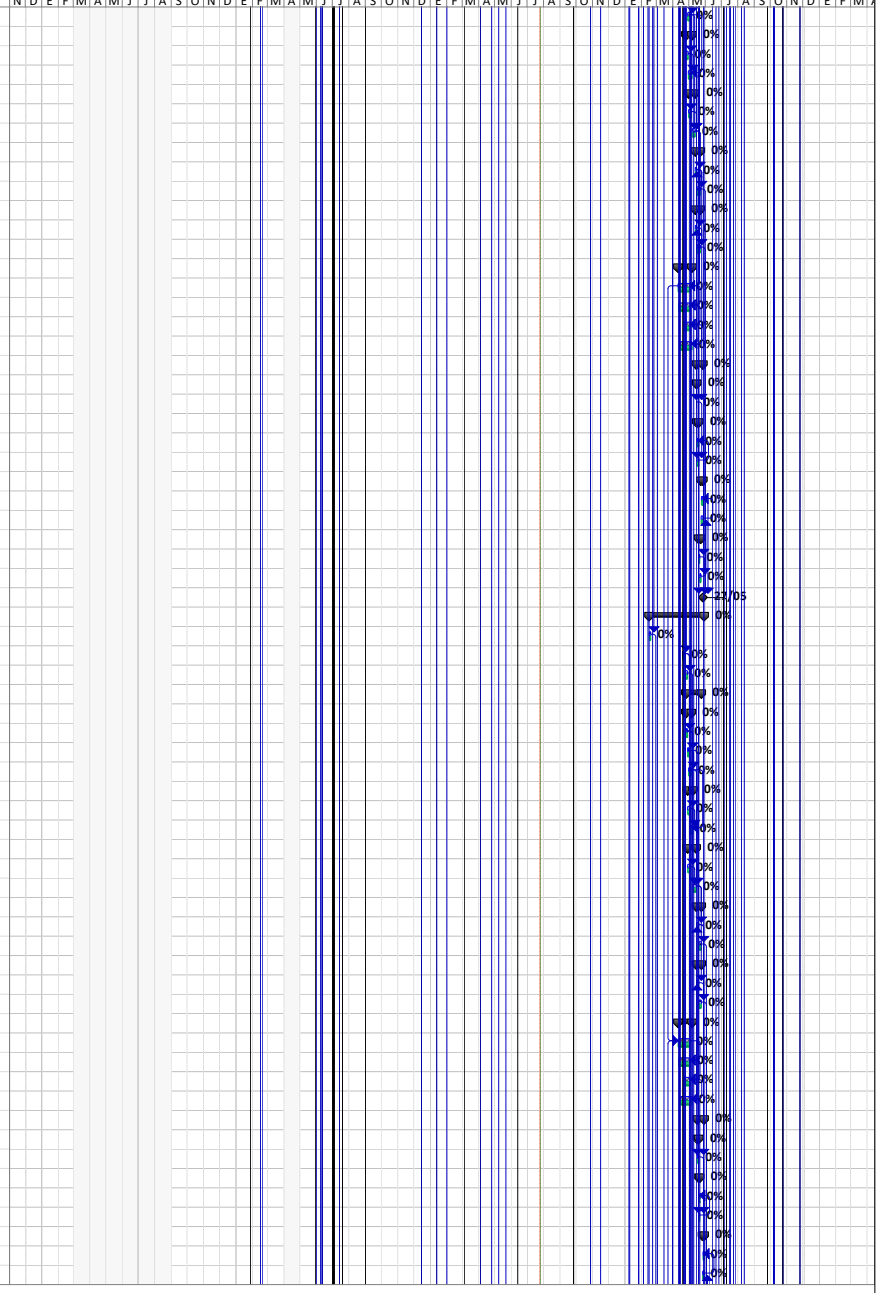

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2601	**1.3.4.7.7.4.6**	**Viga de Amarre**	**mié 21/05/25**	**lun 26/05/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2602	1.3.4.7.7.4.6	Acero	mié 21/05/25	vie 23/05/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
2603	1.3.4.7.7.4.6	Concreto	vie 23/05/25	lun 26/05/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2604	*1.3.4.7.7.5*	*Fin de Eje 2-3*	*jue 29/05/25*	*jue 29/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2605	**1.3.4.7.7.6**	**EJE 3-4**	**mar 18/02/25**	**sáb 31/05/25**	**80,75 d**	**$ 143.078.606**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2606	1.3.4.7.7.6.1	Excavación	mar 18/02/25	jue 20/02/25	2 d	$ 869.284	0,00%	0,00%	$ 0
2607	1.3.4.7.7.6.2	Pilotes FDP	mar 22/04/25	jue 24/04/25	2 d	$ 56.434.000	0,00%	0,00%	$ 0
2608	1.3.4.7.7.6.3	Mejoramiento con Rajón	lun 28/04/25	sáb 3/05/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2609	**1.3.4.7.7.6.4**	**Estructura**	**lun 28/04/25**	**mar 27/05/25**	**23 d**	**$ 39.237.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2610	**1.3.4.7.7.6.4**	**Zapatas**	**lun 28/04/25**	**mié 7/05/25**	**7 d**	**$ 13.803.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2611	1.3.4.7.7.6.4	Solado	lun 28/04/25	mié 30/04/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2612	1.3.4.7.7.6.4	Acero	mié 30/04/25	sáb 3/05/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2613	1.3.4.7.7.6.4	Concreto	sáb 3/05/25	mié 7/05/25	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2614	**1.3.4.7.7.6.4**	**Vigas de Cimentación**	**mié 30/04/25**	**sáb 10/05/25**	**8 d**	**$ 5.560.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2615	1.3.4.7.7.6.4	Acero	mié 30/04/25	lun 5/05/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2616	1.3.4.7.7.6.4	Concreto	lun 5/05/25	sáb 10/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2617	**1.3.4.7.7.6.4**	**Columnas**	**mié 30/04/25**	**vie 16/05/25**	**13 d**	**$ 6.628.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2618	1.3.4.7.7.6.4	Acero	mié 30/04/25	lun 5/05/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2619	1.3.4.7.7.6.4	Concreto	lun 12/05/25	vie 16/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2620	**1.3.4.7.7.6.4**	**Vigas Longitudinales**	**sáb 17/05/25**	**mar 27/05/25**	**8 d**	**$ 5.810.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2621	1.3.4.7.7.6.4	Acero	sáb 17/05/25	mié 21/05/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2622	1.3.4.7.7.6.4	Concreto	mié 21/05/25	mar 27/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2623	**1.3.4.7.7.6.4**	**Vigas Transversales**	**sáb 17/05/25**	**mar 27/05/25**	**8 d**	**$ 7.434.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2624	1.3.4.7.7.6.4	Acero	sáb 17/05/25	mié 21/05/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2625	1.3.4.7.7.6.4	Concreto	mié 21/05/25	mar 27/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2626	**1.3.4.7.7.6.5**	**Tierra armada**	**jue 10/04/25**	**mar 6/05/25**	**18 d**	**$ 31.800.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2627	1.3.4.7.7.6.5	Geomalla de Refuerzo	jue 10/04/25	vie 2/05/25	15 d	$ 7.949.991	0,00%	0,00%	$ 0
2628	1.3.4.7.7.6.5	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 11/04/25	sáb 3/05/25	15 d	$ 7.949.991	0,00%	0,00%	$ 0
2629	1.3.4.7.7.6.5	Geotextil Fortex	lun 21/04/25	sáb 3/05/25	10 d	$ 7.571.456	0,00%	0,00%	$ 0
2630	1.3.4.7.7.6.5	Relleno con Ceniza	mar 15/04/25	mar 6/05/25	15 d	$ 8.328.562	0,00%	0,00%	$ 0
2631	**1.3.4.7.7.6.6**	**Fachada en Mampostería**	**mar 20/05/25**	**sáb 31/05/25**	**10 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2632	**1.3.4.7.7.6.6**	**Dobelas**	**mar 20/05/25**	**mié 21/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2633	1.3.4.7.7.6.6	Acero	mar 20/05/25	mié 21/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2634	**1.3.4.7.7.6.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mié 21/05/25**	**vie 23/05/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2635	1.3.4.7.7.6.6	Concreto	jue 22/05/25	vie 23/05/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2636	1.3.4.7.7.6.6	Bloque en Concreto	mié 21/05/25	vie 23/05/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
2637	**1.3.4.7.7.6.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mié 28/05/25**	**sáb 31/05/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2638	1.3.4.7.7.6.6	Concreto	jue 29/05/25	sáb 31/05/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
2639	1.3.4.7.7.6.6	Bloque en Concreto	mié 28/05/25	sáb 31/05/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2640	**1.3.4.7.7.6.6**	**Viga de Amarre**	**vie 23/05/25**	**mié 28/05/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2641	1.3.4.7.7.6.6	Acero	vie 23/05/25	lun 26/05/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
2642	1.3.4.7.7.6.6	Concreto	lun 26/05/25	mié 28/05/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2643	*1.3.4.7.7.7*	*Fin de Eje 3-4*	*sáb 31/05/25*	*sáb 31/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2644	**1.3.4.7.7.8**	**EJE 4-5**	**jue 20/02/25**	**mié 4/06/25**	**80,75 d**	**$ 179.374.002**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2645	1.3.4.7.7.8.1	Excavación	jue 20/02/25	sáb 22/02/25	2 d	$ 817.968	0,00%	0,00%	$ 0
2646	1.3.4.7.7.8.2	Pilotes FDP	jue 24/04/25	sáb 26/04/25	2 d	$ 92.880.712	0,00%	0,00%	$ 0
2647	1.3.4.7.7.8.3	Mejoramiento con Rajón	lun 5/05/25	jue 8/05/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2648	**1.3.4.7.7.8.4**	**Estructura**	**mié 30/04/25**	**jue 29/05/25**	**23 d**	**$ 39.137.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2649	**1.3.4.7.7.8.4**	**Zapatas**	**mié 30/04/25**	**vie 9/05/25**	**7 d**	**$ 13.803.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2650	1.3.4.7.7.8.4	Solado	mié 30/04/25	sáb 3/05/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2651	1.3.4.7.7.8.4	Acero	sáb 3/05/25	mar 6/05/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2652	1.3.4.7.7.8.4	Concreto	mar 6/05/25	vie 9/05/25	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2653	**1.3.4.7.7.8.4**	**Vigas de Cimentación**	**sáb 3/05/25**	**mar 13/05/25**	**8 d**	**$ 5.560.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2654	1.3.4.7.7.8.4	Acero	sáb 3/05/25	mié 7/05/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2655	1.3.4.7.7.8.4	Concreto	mié 7/05/25	mar 13/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2656	**1.3.4.7.7.8.4**	**Columnas**	**sáb 3/05/25**	**mar 20/05/25**	**13 d**	**$ 6.628.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2657	1.3.4.7.7.8.4	Acero	sáb 3/05/25	mié 7/05/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2658	1.3.4.7.7.8.4	Concreto	mié 14/05/25	mar 20/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2659	**1.3.4.7.7.8.4**	**Vigas Longitudinales**	**mar 20/05/25**	**jue 29/05/25**	**8 d**	**$ 5.710.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2660	1.3.4.7.7.8.4	Acero	mar 20/05/25	vie 23/05/25	3 d	$ 3.178.625	0,00%	0,00%	$ 0
2661	1.3.4.7.7.8.4	Concreto	vie 23/05/25	jue 29/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2662	**1.3.4.7.7.8.4**	**Vigas Transversales**	**mar 20/05/25**	**jue 29/05/25**	**8 d**	**$ 7.434.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2663	1.3.4.7.7.8.4	Acero	mar 20/05/25	vie 23/05/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2664	1.3.4.7.7.8.4	Concreto	vie 23/05/25	jue 29/05/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2665	**1.3.4.7.7.8.5**	**Tierra armada**	**jue 10/04/25**	**mar 6/05/25**	**18 d**	**$ 31.800.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2666	1.3.4.7.7.8.5	Geomalla de Refuerzo	jue 10/04/25	vie 2/05/25	15 d	$ 7.949.999	0,00%	0,00%	$ 0

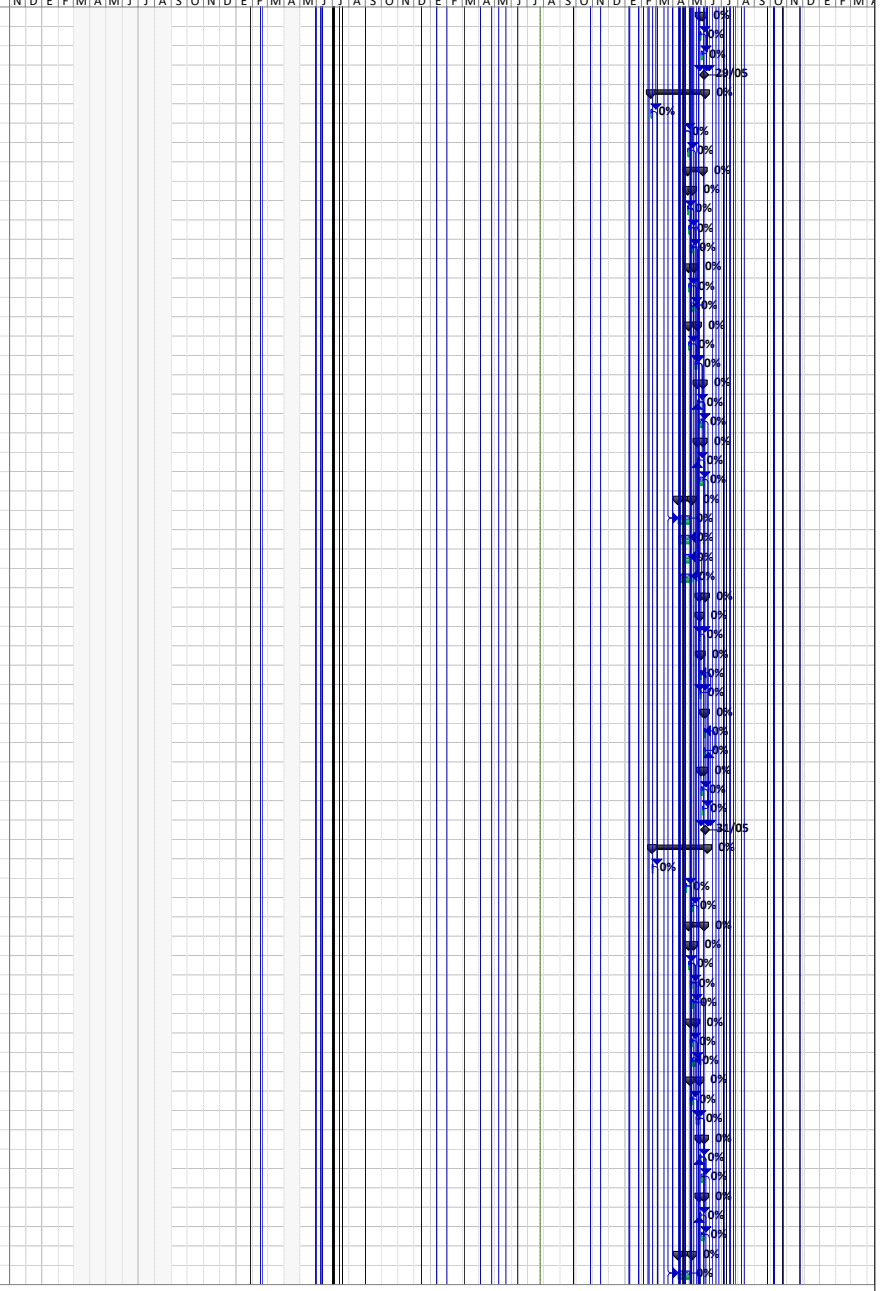

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2667	1.3.4.7.7.8.5	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 11/04/25	sáb 3/05/25	15 d	$ 7.949.999	0,00%	0,00%	$ 0
2668	1.3.4.7.7.8.5	Geotextil Fortex	lun 21/04/25	sáb 3/05/25	10 d	$ 7.531.578	0,00%	0,00%	$ 0
2669	1.3.4.7.7.8.5	Relleno con Ceniza	mar 15/04/25	mar 6/05/25	15 d	$ 8.368.424	0,00%	0,00%	$ 0
2670	**1.3.4.7.7.8.6**	**Fachada en Mampostería**	**jue 22/05/25**	**mié 4/06/25**	**10 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2671	**1.3.4.7.7.8.6**	**Dobelas**	**jue 22/05/25**	**vie 23/05/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2672	1.3.4.7.7.8.6	Acero	jue 22/05/25	vie 23/05/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2673	**1.3.4.7.7.8.6**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**vie 23/05/25**	**lun 26/05/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2674	1.3.4.7.7.8.6	Concreto	sáb 24/05/25	lun 26/05/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2675	1.3.4.7.7.8.6	Bloque en Concreto	vie 23/05/25	lun 26/05/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
2676	**1.3.4.7.7.8.6**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**vie 30/05/25**	**mié 4/06/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2677	1.3.4.7.7.8.6	Concreto	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
2678	1.3.4.7.7.8.6	Bloque en Concreto	vie 30/05/25	mié 4/06/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2679	**1.3.4.7.7.8.6**	**Viga de Amarre**	**lun 26/05/25**	**vie 30/05/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2680	1.3.4.7.7.8.6	Acero	lun 26/05/25	mié 28/05/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
2681	1.3.4.7.7.8.6	Concreto	mié 28/05/25	vie 30/05/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2682	*1.3.4.7.7.9*	*Fin de Eje 4-5*	*mié 4/06/25*	*mié 4/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2683	**1.3.4.7.7.10**	**EJE 5-6**	**sáb 22/02/25**	**vie 27/06/25**	**97,25 d**	**$ 143.027.290**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2684	1.3.4.7.7.10.	Excavación	sáb 22/02/25	mar 25/02/25	2 d	$ 817.968	0,00%	0,00%	$ 0
2685	1.3.4.7.7.10.	Pilotes FDP	vie 2/05/25	lun 5/05/25	2 d	$ 56.434.000	0,00%	0,00%	$ 0
2686	1.3.4.7.7.10.	Mejoramiento con Rajón	vie 9/05/25	mié 14/05/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2687	**1.3.4.7.7.10.**	**Estructura**	**jue 8/05/25**	**jue 19/06/25**	**34 d**	**$ 39.237.505**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2688	**1.3.4.7.7.10.**	**Zapatas**	**jue 8/05/25**	**mié 21/05/25**	**11 d**	**$ 13.803.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2689	1.3.4.7.7.10.	Solado	jue 8/05/25	vie 16/05/25	7 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2690	1.3.4.7.7.10.	Acero	vie 16/05/25	lun 19/05/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2691	1.3.4.7.7.10.	Concreto	lun 19/05/25	mié 21/05/25	2 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2692	**1.3.4.7.7.10.**	**Vigas de Cimentación**	**vie 16/05/25**	**jue 29/05/25**	**11 d**	**$ 5.560.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2693	1.3.4.7.7.10.	Acero	vie 16/05/25	lun 26/05/25	8 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2694	1.3.4.7.7.10.	Concreto	mar 27/05/25	jue 29/05/25	3 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2695	**1.3.4.7.7.10.**	**Columnas**	**vie 16/05/25**	**vie 6/06/25**	**16 d**	**$ 6.628.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2696	1.3.4.7.7.10.	Acero	vie 16/05/25	mar 3/06/25	13 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2697	1.3.4.7.7.10.	Concreto	mar 3/06/25	vie 6/06/25	3 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2698	**1.3.4.7.7.10.**	**Vigas Longitudinales**	**vie 6/06/25**	**jue 19/06/25**	**11 d**	**$ 5.810.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2699	1.3.4.7.7.10.	Acero	vie 6/06/25	lun 16/06/25	8 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2700	1.3.4.7.7.10.	Concreto	lun 16/06/25	jue 19/06/25	3 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2701	**1.3.4.7.7.10.**	**Vigas Transversales**	**vie 6/06/25**	**jue 19/06/25**	**11 d**	**$ 7.434.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2702	1.3.4.7.7.10.	Acero	vie 6/06/25	lun 16/06/25	8 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2703	1.3.4.7.7.10.	Concreto	lun 16/06/25	jue 19/06/25	3 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2704	**1.3.4.7.7.10.**	**Tierra armada**	**jue 10/04/25**	**mar 6/05/25**	**18 d**	**$ 31.800.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2705	1.3.4.7.7.10.	Geomalla de Refuerzo	jue 10/04/25	vie 2/05/25	15 d	$ 7.949.999	0,00%	0,00%	$ 0
2706	1.3.4.7.7.10.	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 11/04/25	sáb 3/05/25	15 d	$ 7.949.999	0,00%	0,00%	$ 0
2707	1.3.4.7.7.10.	Geotextil Fortex	vie 11/04/25	sáb 3/05/25	15 d	$ 7.482.356	0,00%	0,00%	$ 0
2708	1.3.4.7.7.10.	Relleno con Ceniza	mié 23/04/25	mar 6/05/25	10 d	$ 8.417.646	0,00%	0,00%	$ 0
2709	**1.3.4.7.7.10.**	**Fachada en Mampostería**	**sáb 14/06/25**	**vie 27/06/25**	**10 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2710	**1.3.4.7.7.10.**	**Dobelas**	**sáb 14/06/25**	**lun 16/06/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2711	1.3.4.7.7.10.	Acero	sáb 14/06/25	lun 16/06/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2712	**1.3.4.7.7.10.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**sáb 14/06/25**	**mar 17/06/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2713	1.3.4.7.7.10.	Concreto	sáb 14/06/25	mar 17/06/25	2 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2714	1.3.4.7.7.10.	Bloque en Concreto	lun 16/06/25	mar 17/06/25	1 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
2715	**1.3.4.7.7.10.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**mié 25/06/25**	**vie 27/06/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2716	1.3.4.7.7.10.	Concreto	mié 25/06/25	vie 27/06/25	3 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
2717	1.3.4.7.7.10.	Bloque en Concreto	jue 26/06/25	vie 27/06/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2718	**1.3.4.7.7.10.**	**Viga de Amarre**	**mar 17/06/25**	**mié 25/06/25**	**6 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2719	1.3.4.7.7.10.	Acero	mar 17/06/25	sáb 21/06/25	4 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
2720	1.3.4.7.7.10.	Concreto	mar 24/06/25	mié 25/06/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2721	*1.3.4.7.7.11*	*Fin de Eje 5-6*	*vie 27/06/25*	*vie 27/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2722	**1.3.4.7.7.12**	**EJE 6-7**	**mar 25/02/25**	**jue 10/07/25**	**104,25 d**	**$ 163.340.036**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2723	1.3.4.7.7.12.	Excavación	mar 25/02/25	jue 27/02/25	2 d	$ 817.968	0,00%	0,00%	$ 0
2724	1.3.4.7.7.12.	Pilotes FDP	lun 19/05/25	mié 21/05/25	2 d	$ 56.434.000	0,00%	0,00%	$ 0
2725	1.3.4.7.7.12.	Mejoramiento con Rajón	mié 14/05/25	lun 19/05/25	4 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2726	**1.3.4.7.7.12.**	**Estructura**	**sáb 24/05/25**	**vie 4/07/25**	**30,25 d**	**$ 59.550.251**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2727	**1.3.4.7.7.12.**	**Zapatas**	**sáb 24/05/25**	**mar 3/06/25**	**7 d**	**$ 13.803.010**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2728	1.3.4.7.7.12.	Solado	sáb 24/05/25	mar 27/05/25	2 d	$ 6.010	0,00%	0,00%	$ 0
2729	1.3.4.7.7.12.	Acero	mar 27/05/25	jue 29/05/25	2 d	$ 8.100.000	0,00%	0,00%	$ 0
2730	1.3.4.7.7.12.	Concreto	jue 29/05/25	mar 3/06/25	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2731	**1.3.4.7.7.12.**	**Vigas de Cimentación**	**mar 27/05/25**	**vie 6/06/25**	**8 d**	**$ 5.560.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2732	1.3.4.7.7.12.	Acero	mar 27/05/25	vie 30/05/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0

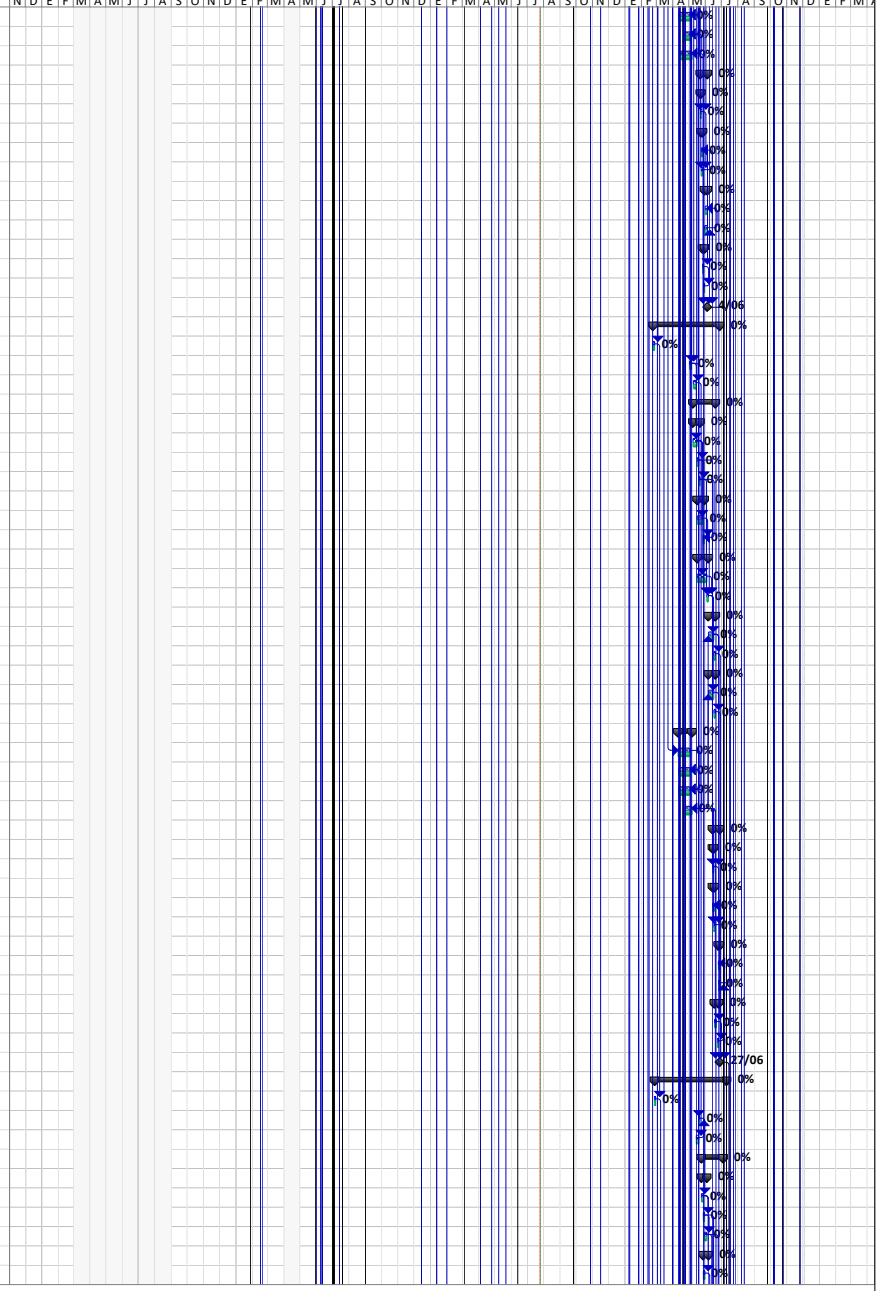

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2733	1.3.4.7.7.12.	Concreto	vie 30/05/25	vie 6/06/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2734	**1.3.4.7.7.12.**	**Columnas**	**mar 27/05/25**	**vie 13/06/25**	**13 d**	**$ 6.628.720**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2735	1.3.4.7.7.12.	Acero	mar 27/05/25	vie 30/05/25	3 d	$ 4.096.720	0,00%	0,00%	$ 0
2736	1.3.4.7.7.12.	Concreto	sáb 7/06/25	vie 13/06/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2737	**1.3.4.7.7.12.**	**Vigas Longitudinales**	**vie 13/06/25**	**mar 24/06/25**	**8 d**	**$ 5.810.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2738	1.3.4.7.7.12.	Acero	vie 13/06/25	mar 17/06/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2739	1.3.4.7.7.12.	Concreto	mar 17/06/25	mar 24/06/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2740	**1.3.4.7.7.12.**	**Vigas Transversales**	**vie 13/06/25**	**mar 24/06/25**	**8 d**	**$ 7.434.325**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2741	1.3.4.7.7.12.	Acero	vie 13/06/25	mar 17/06/25	3 d	$ 4.902.325	0,00%	0,00%	$ 0
2742	1.3.4.7.7.12.	Concreto	mar 17/06/25	mar 24/06/25	5 d	$ 2.532.000	0,00%	0,00%	$ 0
2743	**1.3.4.7.7.12.**	**Losa Aproximación**	**mié 4/06/25**	**vie 4/07/25**	**23 d**	**$ 20.312.746**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2744	1.3.4.7.7.12.	Acero	mié 4/06/25	sáb 7/06/25	3 d	$ 13.744.840	0,00%	0,00%	$ 0
2745	1.3.4.7.7.12.	Concreto	sáb 7/06/25	vie 4/07/25	20 d	$ 6.567.906	0,00%	0,00%	$ 0
2746	**1.3.4.7.7.12.**	**Tierra armada**	**lun 12/05/25**	**mié 4/06/25**	**18 d**	**$ 31.800.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2747	1.3.4.7.7.12.	Geomalla de Refuerzo	lun 12/05/25	jue 29/05/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2748	1.3.4.7.7.12.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 13/05/25	vie 30/05/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2749	1.3.4.7.7.12.	Geotextil Fortex	lun 19/05/25	vie 30/05/25	10 d	$ 7.420.000	0,00%	0,00%	$ 0
2750	1.3.4.7.7.12.	Relleno con Ceniza	jue 15/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 8.480.000	0,00%	0,00%	$ 0
2751	**1.3.4.7.7.12.**	**Fachada en Mampostería**	**lun 16/06/25**	**jue 10/07/25**	**18,25 d**	**$ 14.328.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2752	**1.3.4.7.7.12.**	**Dobelas**	**lun 16/06/25**	**mar 17/06/25**	**1 d**	**$ 1.729.865**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2753	1.3.4.7.7.12.	Acero	lun 16/06/25	mar 17/06/25	1 d	$ 1.729.865	0,00%	0,00%	$ 0
2754	**1.3.4.7.7.12.**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**mar 17/06/25**	**jue 19/06/25**	**2 d**	**$ 11.083.152**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2755	1.3.4.7.7.12.	Concreto	mié 18/06/25	jue 19/06/25	1 d	$ 2.538.245	0,00%	0,00%	$ 0
2756	1.3.4.7.7.12.	Bloque en Concreto	mar 17/06/25	jue 19/06/25	2 d	$ 8.544.907	0,00%	0,00%	$ 0
2757	**1.3.4.7.7.12.**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**lun 7/07/25**	**jue 10/07/25**	**3 d**	**$ 789.125**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2758	1.3.4.7.7.12.	Concreto	mar 8/07/25	jue 10/07/25	2 d	$ 156.125	0,00%	0,00%	$ 0
2759	1.3.4.7.7.12.	Bloque en Concreto	lun 7/07/25	jue 10/07/25	3 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2760	**1.3.4.7.7.12.**	**Viga de Amarre**	**mié 2/07/25**	**lun 7/07/25**	**4 d**	**$ 726.675**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2761	1.3.4.7.7.12.	Acero	mié 2/07/25	vie 4/07/25	2 d	$ 93.675	0,00%	0,00%	$ 0
2762	1.3.4.7.7.12.	Concreto	vie 4/07/25	lun 7/07/25	2 d	$ 633.000	0,00%	0,00%	$ 0
2763	*1.3.4.7.7.13*	*Fin de Eje 6-7*	*jue 10/07/25*	*jue 10/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2764	**1.3.4.7.7.14**	**Eje 1'-2'**	**jue 27/02/25**	**mar 15/04/25**	**37 d**	**$ 71.316.668**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2765	1.3.4.7.7.14.	Excavación	jue 27/02/25	vie 28/02/25	1 d	$ 800.000	0,00%	0,00%	$ 0
2766	1.3.4.7.7.14.	Mejoramiento de Subrasante	vie 28/02/25	mar 4/03/25	3 d	$ 17.968	0,00%	0,00%	$ 0
2767	**1.3.4.7.7.14.**	**Estructura**	**mar 4/03/25**	**mié 2/04/25**	**23 d**	**$ 38.698.700**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2768	**1.3.4.7.7.14.**	**Zapatas**	**mar 4/03/25**	**mié 12/03/25**	**7 d**	**$ 14.246.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2769	1.3.4.7.7.14.	Solado	mar 4/03/25	jue 6/03/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
2770	1.3.4.7.7.14.	Acero	jue 6/03/25	sáb 8/03/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
2771	1.3.4.7.7.14.	Concreto	lun 10/03/25	mié 12/03/25	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2772	**1.3.4.7.7.14.**	**Vigas de Cimentación**	**jue 6/03/25**	**lun 17/03/25**	**8 d**	**$ 6.826.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2773	1.3.4.7.7.14.	Acero	jue 6/03/25	lun 10/03/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2774	1.3.4.7.7.14.	Concreto	mar 11/03/25	lun 17/03/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2775	**1.3.4.7.7.14.**	**Muros Laterales**	**lun 10/03/25**	**sáb 22/03/25**	**11 d**	**$ 10.548.845**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2776	1.3.4.7.7.14.	Acero	lun 10/03/25	mié 12/03/25	3 d	$ 6.750.845	0,00%	0,00%	$ 0
2777	1.3.4.7.7.14.	Concreto	lun 17/03/25	sáb 22/03/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2778	**1.3.4.7.7.14.**	**Vigas Longitudinales**	**sáb 22/03/25**	**mié 2/04/25**	**8 d**	**$ 7.076.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2779	1.3.4.7.7.14.	Acero	sáb 22/03/25	jue 27/03/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2780	1.3.4.7.7.14.	Concreto	jue 27/03/25	mié 2/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2781	**1.3.4.7.7.14.**	**Tierra Armada**	**sáb 22/03/25**	**mar 15/04/25**	**18 d**	**$ 31.800.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2782	1.3.4.7.7.14.	Geomalla de Refuerzo	sáb 22/03/25	jue 10/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2783	1.3.4.7.7.14.	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 25/03/25	vie 11/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2784	1.3.4.7.7.14.	Geotextil Fortex	lun 31/03/25	vie 11/04/25	10 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2785	1.3.4.7.7.14.	Relleno con Ceniza	jue 27/03/25	mar 15/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2786	*1.3.4.7.7.15*	*Fin de Eje 1'-2'*	*mar 15/04/25*	*mar 15/04/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2787	**1.3.4.7.7.16**	**EJE 2'-3'**	**vie 28/02/25**	**mié 16/04/25**	**37 d**	**$ 71.316.668**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2788	1.3.4.7.7.16.	Excavación	vie 28/02/25	sáb 1/03/25	1 d	$ 800.000	0,00%	0,00%	$ 0
2789	1.3.4.7.7.16.	Mejoramiento de Subrasante	sáb 1/03/25	mié 5/03/25	3 d	$ 17.968	0,00%	0,00%	$ 0
2790	**1.3.4.7.7.16.**	**Estructura**	**mié 5/03/25**	**jue 3/04/25**	**23 d**	**$ 38.698.700**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2791	**1.3.4.7.7.16.**	**Zapatas**	**mié 5/03/25**	**jue 13/03/25**	**7 d**	**$ 14.246.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2792	1.3.4.7.7.16.	Solado	mié 5/03/25	vie 7/03/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
2793	1.3.4.7.7.16.	Acero	vie 7/03/25	lun 10/03/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
2794	1.3.4.7.7.16.	Concreto	mar 11/03/25	jue 13/03/25	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2795	**1.3.4.7.7.16.**	**Vigas de Cimentación**	**vie 7/03/25**	**mar 18/03/25**	**8 d**	**$ 6.826.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2796	1.3.4.7.7.16.	Acero	vie 7/03/25	mar 11/03/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2797	1.3.4.7.7.16.	Concreto	mié 12/03/25	mar 18/03/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2798	**1.3.4.7.7.16.**	**Muros Laterales**	**mar 11/03/25**	**mar 25/03/25**	**11 d**	**$ 10.548.845**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**

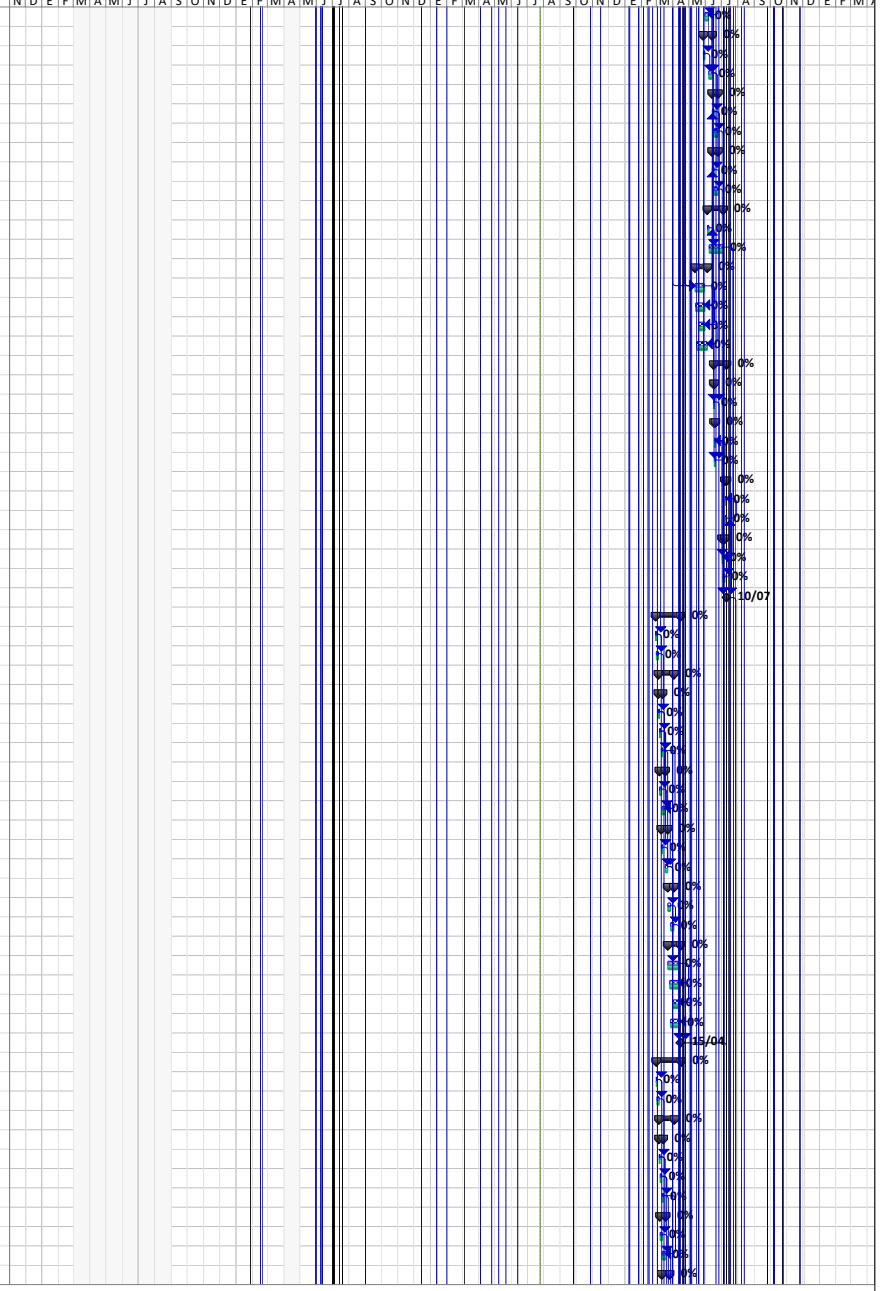

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños


Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2799	1.3.4.7.7.16.	Acero	mar 11/03/25	jue 13/03/25	3 d	$ 6.750.845	0,00%	0,00%	$ 0
2800	1.3.4.7.7.16.	Concreto	mar 18/03/25	mar 25/03/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2801	**1.3.4.7.7.16.**	**Vigas Longitudinales**	**mar 25/03/25**	**jue 3/04/25**	**8 d**	**$ 7.076.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2802	1.3.4.7.7.16.	Acero	mar 25/03/25	vie 28/03/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2803	1.3.4.7.7.16.	Concreto	vie 28/03/25	jue 3/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2804	**1.3.4.7.7.16.**	**Tierra Armada**	**mar 25/03/25**	**mié 16/04/25**	**18 d**	**$ 31.800.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2805	1.3.4.7.7.16.	Geomalla de Refuerzo	mar 25/03/25	vie 11/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2806	1.3.4.7.7.16.	Sacos Llenos Con Material Granular	mié 26/03/25	lun 14/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2807	1.3.4.7.7.16.	Geotextil Fortex	mar 1/04/25	lun 14/04/25	10 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2808	1.3.4.7.7.16.	Relleno con Ceniza	vie 28/03/25	mié 16/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2809	*1.3.4.7.7.1*	*Fin de Eje 2'-3'*	*mié 16/04/25*	*mié 16/04/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2810	**1.3.4.7.7.18**	**EJE 3'-4'**	**sáb 1/03/25**	**sáb 19/04/25**	**37 d**	**$ 71.316.668**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2811	1.3.4.7.7.18.	Excavación	sáb 1/03/25	lun 3/03/25	1 d	$ 800.000	0,00%	0,00%	$ 0
2812	1.3.4.7.7.18.	Mejoramiento de Subrasante	lun 3/03/25	jue 6/03/25	3 d	$ 17.968	0,00%	0,00%	$ 0
2813	**1.3.4.7.7.18.**	**Estructura**	**jue 6/03/25**	**vie 4/04/25**	**23 d**	**$ 38.698.700**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2814	**1.3.4.7.7.18.**	**Zapatas**	**jue 6/03/25**	**vie 14/03/25**	**7 d**	**$ 14.246.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2815	1.3.4.7.7.18.	Solado	jue 6/03/25	sáb 8/03/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
2816	1.3.4.7.7.18.	Acero	lun 10/03/25	mar 11/03/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
2817	1.3.4.7.7.18.	Concreto	mié 12/03/25	vie 14/03/25	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2818	**1.3.4.7.7.18.**	**Vigas de Cimentación**	**lun 10/03/25**	**mié 19/03/25**	**8 d**	**$ 6.826.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2819	1.3.4.7.7.18.	Acero	lun 10/03/25	mié 12/03/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2820	1.3.4.7.7.18.	Concreto	jue 13/03/25	mié 19/03/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2821	**1.3.4.7.7.18.**	**Muros Laterales**	**mié 12/03/25**	**mié 26/03/25**	**11 d**	**$ 10.548.845**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2822	1.3.4.7.7.18.	Acero	mié 12/03/25	vie 14/03/25	3 d	$ 6.750.845	0,00%	0,00%	$ 0
2823	1.3.4.7.7.18.	Concreto	mié 19/03/25	mié 26/03/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2824	**1.3.4.7.7.18.**	**Vigas Longitudinales**	**mié 26/03/25**	**vie 4/04/25**	**8 d**	**$ 7.076.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2825	1.3.4.7.7.18.	Acero	mié 26/03/25	sáb 29/03/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2826	1.3.4.7.7.18.	Concreto	sáb 29/03/25	vie 4/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2827	**1.3.4.7.7.18.**	**Tierra Armada**	**mié 26/03/25**	**sáb 19/04/25**	**18 d**	**$ 31.800.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2828	1.3.4.7.7.18.	Geomalla de Refuerzo	mié 26/03/25	lun 14/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2829	1.3.4.7.7.18.	Sacos Llenos Con Material Granular	jue 27/03/25	mar 15/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2830	1.3.4.7.7.18.	Geotextil Fortex	mié 2/04/25	mar 15/04/25	10 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2831	1.3.4.7.7.18.	Relleno con Ceniza	sáb 29/03/25	sáb 19/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2832	*1.3.4.7.7.1*	*Fin de Eje 3'-4'*	*sáb 19/04/25*	*sáb 19/04/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2833	**1.3.4.7.7.20**	**EJE 4'-5'**	**lun 3/03/25**	**lun 21/04/25**	**37 d**	**$ 71.316.668**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2834	1.3.4.7.7.20.	Excavación	lun 3/03/25	mar 4/03/25	1 d	$ 800.000	0,00%	0,00%	$ 0
2835	1.3.4.7.7.20.	Mejoramiento de Subrasante	mar 4/03/25	vie 7/03/25	3 d	$ 17.968	0,00%	0,00%	$ 0
2836	**1.3.4.7.7.20.**	**Estructura**	**vie 7/03/25**	**sáb 5/04/25**	**23 d**	**$ 38.698.700**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2837	**1.3.4.7.7.20.**	**Zapatas**	**vie 7/03/25**	**lun 17/03/25**	**7 d**	**$ 14.246.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2838	1.3.4.7.7.20.	Solado	vie 7/03/25	lun 10/03/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
2839	1.3.4.7.7.20.	Acero	mar 11/03/25	mié 12/03/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
2840	1.3.4.7.7.20.	Concreto	jue 13/03/25	lun 17/03/25	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2841	**1.3.4.7.7.20.**	**Vigas de Cimentación**	**mar 11/03/25**	**jue 20/03/25**	**8 d**	**$ 6.826.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2842	1.3.4.7.7.20.	Acero	mar 11/03/25	jue 13/03/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2843	1.3.4.7.7.20.	Concreto	vie 14/03/25	jue 20/03/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2844	**1.3.4.7.7.20.**	**Muros Laterales**	**jue 13/03/25**	**jue 27/03/25**	**11 d**	**$ 10.548.845**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2845	1.3.4.7.7.20.	Acero	jue 13/03/25	lun 17/03/25	3 d	$ 6.750.845	0,00%	0,00%	$ 0
2846	1.3.4.7.7.20.	Concreto	jue 20/03/25	jue 27/03/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2847	**1.3.4.7.7.20.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 27/03/25**	**sáb 5/04/25**	**8 d**	**$ 7.076.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2848	1.3.4.7.7.20.	Acero	jue 27/03/25	lun 31/03/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2849	1.3.4.7.7.20.	Concreto	lun 31/03/25	sáb 5/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2850	**1.3.4.7.7.20.**	**Tierra Armada**	**jue 27/03/25**	**lun 21/04/25**	**18 d**	**$ 31.800.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2851	1.3.4.7.7.20.	Geomalla de Refuerzo	jue 27/03/25	mar 15/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2852	1.3.4.7.7.20.	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 28/03/25	mié 16/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2853	1.3.4.7.7.20.	Geotextil Fortex	jue 3/04/25	mié 16/04/25	10 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2854	1.3.4.7.7.20.	Relleno con Ceniza	lun 31/03/25	lun 21/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2855	*1.3.4.7.7.2*	*Fin de Eje 4'-5'*	*lun 21/04/25*	*lun 21/04/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2856	**1.3.4.7.7.22**	**EJE 5'-6'**	**mar 4/03/25**	**mar 22/04/25**	**37 d**	**$ 71.316.668**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2857	1.3.4.7.7.22.	Excavación	mar 4/03/25	mié 5/03/25	1 d	$ 800.000	0,00%	0,00%	$ 0
2858	1.3.4.7.7.22.	Mejoramiento de Subrasante	mié 5/03/25	sáb 8/03/25	3 d	$ 17.968	0,00%	0,00%	$ 0
2859	**1.3.4.7.7.22.**	**Estructura**	**lun 10/03/25**	**lun 7/04/25**	**23 d**	**$ 38.698.700**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2860	**1.3.4.7.7.22.**	**Zapatas**	**lun 10/03/25**	**mar 18/03/25**	**7 d**	**$ 14.246.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2861	1.3.4.7.7.22.	Solado	lun 10/03/25	mar 11/03/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
2862	1.3.4.7.7.22.	Acero	mié 12/03/25	jue 13/03/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
2863	1.3.4.7.7.22.	Concreto	vie 14/03/25	mar 18/03/25	3 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2864	**1.3.4.7.7.22.**	**Vigas de Cimentación**	**mié 12/03/25**	**vie 21/03/25**	**8 d**	**$ 6.826.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2865	1.3.4.7.7.22.	Acero	mié 12/03/25	vie 14/03/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2866	1.3.4.7.7.22.	Concreto	sáb 15/03/25	vie 21/03/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2867	**1.3.4.7.7.22.**	**Muros Laterales**	**vie 14/03/25**	**vie 28/03/25**	**11 d**	**$ 10.548.845**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2868	1.3.4.7.7.22.	Acero	vie 14/03/25	mar 18/03/25	3 d	$ 6.750.845	0,00%	0,00%	$ 0
2869	1.3.4.7.7.22.	Concreto	vie 21/03/25	vie 28/03/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2870	**1.3.4.7.7.22.**	**Vigas Longitudinales**	**vie 28/03/25**	**lun 7/04/25**	**8 d**	**$ 7.076.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2871	1.3.4.7.7.22.	Acero	vie 28/03/25	mar 1/04/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2872	1.3.4.7.7.22.	Concreto	mar 1/04/25	lun 7/04/25	5 d	$ 3.798.000	0,00%	0,00%	$ 0
2873	**1.3.4.7.7.22.**	**Tierra Armada**	**vie 28/03/25**	**mar 22/04/25**	**18 d**	**$ 31.800.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2874	1.3.4.7.7.22.	Geomalla de Refuerzo	vie 28/03/25	mié 16/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2875	1.3.4.7.7.22.	Sacos Llenos Con Material Granular	sáb 29/03/25	sáb 19/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2876	1.3.4.7.7.22.	Geotextil Fortex	vie 4/04/25	sáb 19/04/25	10 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2877	1.3.4.7.7.22.	Relleno con Ceniza	mar 1/04/25	mar 22/04/25	15 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
2878	*1.3.4.7.7.2.*	*Fin de Eje 5'-6'*	*mar 22/04/25*	*mar 22/04/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2879	**1.3.4.7.7.24**	**PAVIMENTO**	**jue 10/07/25**	**mar 29/07/25**	**15 d**	**$ 110.226.887**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2880	1.3.4.7.7.24.	Subbase	jue 10/07/25	mar 29/07/25	15 d	$ 1.815.360	0,00%	0,00%	$ 0
2881	1.3.4.7.7.24.	Base	jue 10/07/25	mar 29/07/25	15 d	$ 30.000.000	0,00%	0,00%	$ 0
2882	1.3.4.7.7.24.	Mezcla Asfaltica - GCR	jue 10/07/25	sáb 12/07/25	2 d	$ 58.986.577	0,00%	0,00%	$ 0
2883	1.3.4.7.7.24.	Mezcla Asfaltica - MD12	jue 10/07/25	sáb 12/07/25	2 d	$ 19.424.950	0,00%	0,00%	$ 0
2884	1.3.4.7.7.25	Baranda Vehicular	vie 27/06/25	sáb 30/08/25	50 d	$ 177.112.106	0,00%	0,00%	$ 0
2885	1.3.4.7.7.26	baranda Peatonal	vie 27/06/25	sáb 30/08/25	50 d	$ 56.739.823	0,00%	0,00%	$ 0
2886	*1.3.4.7.8*	*Fin de Final de Oreja Occidental*	*sáb 30/08/25*	*sáb 30/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2887	**1.3.4.7.9**	**FINAL DE APROCHE OCCIDENTAL**	**mié 12/06/24**	**vie 3/10/25**	**374,25 d**	**$ 1.332.206.381**	**12,00%**	**12,00%**	**$ 159.865.662**
2888	1.3.4.7.9.1	Demolición	jue 26/06/25	sáb 5/07/25	7 d	$ 9.648.654	0,00%	0,00%	$ 0
2889	**1.3.4.7.9.2**	**EJE JC1-JC2**	**jue 13/06/24**	**mié 3/09/25**	**349 d**	**$ 109.832.185**	**18,39%**	**18,39%**	**$ 20.196.348**
2890	1.3.4.7.9.2.1	Excavación	jue 13/06/24	vie 14/06/24	1 d	$ 1.026.348	100,00%	100,00%	$ 1.026.348
2891	1.3.4.7.9.2.2	Pilotes FDP	jue 13/06/24	sáb 15/06/24	2 d	$ 19.170.000	100,00%	100,00%	$ 19.170.000
2892	1.3.4.7.9.2.3	Mejoramiento con Rajón	sáb 19/07/25	mié 23/07/25	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2893	**1.3.4.7.9.2.4**	**Estructura**	**mié 23/07/25**	**vie 22/08/25**	**23 d**	**$ 49.476.837**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2894	**1.3.4.7.9.2.4**	**Zapatas**	**mié 23/07/25**	**jue 31/07/25**	**7 d**	**$ 19.327.542**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2895	1.3.4.7.9.2.4	Solado	mié 23/07/25	vie 25/07/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
2896	1.3.4.7.9.2.4	Acero	vie 25/07/25	lun 28/07/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
2897	1.3.4.7.9.2.4	Concreto	lun 28/07/25	jue 31/07/25	3 d	$ 10.778.137	0,00%	0,00%	$ 0
2898	**1.3.4.7.9.2.4**	**Vigas de Cimentación**	**vie 25/07/25**	**lun 4/08/25**	**8 d**	**$ 8.725.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2899	1.3.4.7.9.2.4	Acero	vie 25/07/25	mar 29/07/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2900	1.3.4.7.9.2.4	Concreto	mar 29/07/25	lun 4/08/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2901	**1.3.4.7.9.2.4**	**Muros Laterales**	**lun 28/07/25**	**mar 12/08/25**	**11 d**	**$ 12.447.845**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2902	1.3.4.7.9.2.4	Acero	lun 28/07/25	jue 31/07/25	3 d	$ 6.750.845	0,00%	0,00%	$ 0
2903	1.3.4.7.9.2.4	Concreto	mar 5/08/25	mar 12/08/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2904	**1.3.4.7.9.2.4**	**Vigas Longitudinales**	**mar 12/08/25**	**vie 22/08/25**	**8 d**	**$ 8.975.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2905	1.3.4.7.9.2.4	Acero	mar 12/08/25	vie 15/08/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2906	1.3.4.7.9.2.4	Concreto	vie 15/08/25	vie 22/08/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2907	**1.3.4.7.9.2.5**	**Tierra Armada**	**mar 12/08/25**	**mié 3/09/25**	**18 d**	**$ 39.750.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2908	1.3.4.7.9.2.5	Geomalla de Refuerzo	mar 12/08/25	sáb 30/08/25	15 d	$ 9.937.503	0,00%	0,00%	$ 0
2909	1.3.4.7.9.2.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mié 13/08/25	lun 1/09/25	15 d	$ 9.937.503	0,00%	0,00%	$ 0
2910	1.3.4.7.9.2.5	Geotextil Fortex	mié 20/08/25	lun 1/09/25	10 d	$ 9.352.944	0,00%	0,00%	$ 0
2911	1.3.4.7.9.2.5	Relleno con Ceniza	vie 15/08/25	mié 3/09/25	15 d	$ 10.522.050	0,00%	0,00%	$ 0
2912	*1.3.4.7.9.3*	*Fin de Eje JC1-JC2*	*mié 3/09/25*	*mié 3/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2913	**1.3.4.7.9.4**	**EJE JC2-JC3**	**jue 13/06/24**	**mar 5/08/25**	**327 d**	**$ 109.807.272**	**18,39%**	**18,39%**	**$ 20.188.572**
2914	1.3.4.7.9.4.1	Excavación	jue 13/06/24	vie 14/06/24	1 d	$ 1.018.572	100,00%	100,00%	$ 1.018.572
2915	1.3.4.7.9.4.2	Pilotes FDP	jue 13/06/24	sáb 15/06/24	2 d	$ 19.170.000	100,00%	100,00%	$ 19.170.000
2916	1.3.4.7.9.4.3	Mejoramiento con Rajón	vie 20/06/25	mié 25/06/25	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2917	**1.3.4.7.9.4.4**	**Estructura**	**mié 25/06/25**	**jue 24/07/25**	**23 d**	**$ 49.459.700**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2918	**1.3.4.7.9.4.4**	**Zapatas**	**mié 25/06/25**	**vie 4/07/25**	**7 d**	**$ 19.310.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2919	1.3.4.7.9.4.4	Solado	mié 25/06/25	vie 27/06/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
2920	1.3.4.7.9.4.4	Acero	vie 27/06/25	mar 1/07/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
2921	1.3.4.7.9.4.4	Concreto	mar 1/07/25	vie 4/07/25	3 d	$ 10.761.000	0,00%	0,00%	$ 0
2922	**1.3.4.7.9.4.4**	**Vigas de Cimentación**	**vie 27/06/25**	**mar 8/07/25**	**8 d**	**$ 8.725.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2923	1.3.4.7.9.4.4	Acero	vie 27/06/25	mié 2/07/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2924	1.3.4.7.9.4.4	Concreto	mié 2/07/25	mar 8/07/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2925	**1.3.4.7.9.4.4**	**Muros Laterales**	**mar 1/07/25**	**mar 15/07/25**	**11 d**	**$ 12.447.845**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2926	1.3.4.7.9.4.4	Acero	mar 1/07/25	vie 4/07/25	3 d	$ 6.750.845	0,00%	0,00%	$ 0
2927	1.3.4.7.9.4.4	Concreto	mié 9/07/25	mar 15/07/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2928	**1.3.4.7.9.4.4**	**Vigas Longitudinales**	**mar 15/07/25**	**jue 24/07/25**	**8 d**	**$ 8.975.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2929	1.3.4.7.9.4.4	Acero	mar 15/07/25	vie 18/07/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2930	1.3.4.7.9.4.4	Concreto	vie 18/07/25	jue 24/07/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0

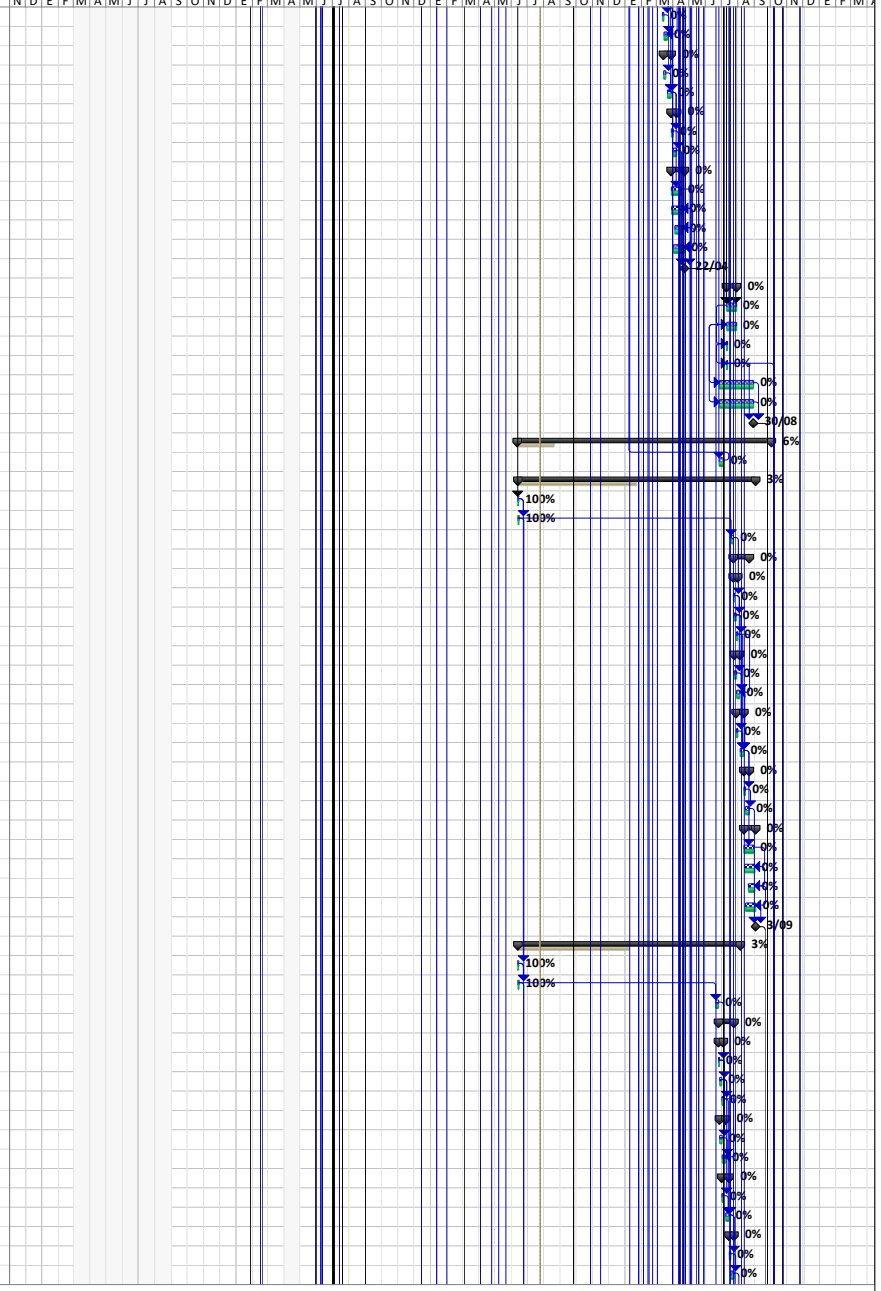

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2931	**1.3.4.7.9.4.5**	**Tierra Armada**	**mar 15/07/25**	**mar 5/08/25**	**18 d**	**$ 39.750.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2932	1.3.4.7.9.4.5	Geomalla de Refuerzo	mar 15/07/25	vie 1/08/25	15 d	$ 9.937.500	0,00%	0,00%	$ 0
2933	1.3.4.7.9.4.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mié 16/07/25	sáb 2/08/25	15 d	$ 9.937.500	0,00%	0,00%	$ 0
2934	1.3.4.7.9.4.5	Geotextil Fortex	mar 22/07/25	sáb 2/08/25	10 d	$ 9.275.000	0,00%	0,00%	$ 0
2935	1.3.4.7.9.4.5	Relleno con Ceniza	vie 18/07/25	mar 5/08/25	15 d	$ 10.600.000	0,00%	0,00%	$ 0
2936	*1.3.4.7.9.5*	*Fin de Eje JC2-JC3*	*mar 5/08/25*	*mar 5/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2937	**1.3.4.7.9.6**	**EJE JC3-JC4**	**jue 13/06/24**	**mar 9/09/25**	**353 d**	**$ 146.012.984**	**38,62%**	**38,62%**	**$ 56.394.284**
2938	1.3.4.7.9.6.1	Excavación	jue 13/06/24	vie 14/06/24	1 d	$ 1.018.572	100,00%	100,00%	$ 1.018.572
2939	1.3.4.7.9.6.2	Pilotes FDP	jue 13/06/24	sáb 15/06/24	2 d	$ 55.375.712	100,00%	100,00%	$ 55.375.712
2940	1.3.4.7.9.6.3	Mejoramiento con Rajón	jue 24/07/25	lun 28/07/25	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2941	**1.3.4.7.9.6.4**	**Estructura**	**lun 28/07/25**	**mié 27/08/25**	**23 d**	**$ 49.459.700**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2942	**1.3.4.7.9.6.4**	**Zapatas**	**lun 28/07/25**	**mar 5/08/25**	**7 d**	**$ 19.310.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2943	1.3.4.7.9.6.4	Solado	lun 28/07/25	mié 30/07/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
2944	1.3.4.7.9.6.4	Acero	mié 30/07/25	vie 1/08/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
2945	1.3.4.7.9.6.4	Concreto	vie 1/08/25	mar 5/08/25	3 d	$ 10.761.000	0,00%	0,00%	$ 0
2946	**1.3.4.7.9.6.4**	**Vigas de Cimentación**	**mié 30/07/25**	**lun 11/08/25**	**8 d**	**$ 8.725.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2947	1.3.4.7.9.6.4	Acero	mié 30/07/25	sáb 2/08/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2948	1.3.4.7.9.6.4	Concreto	lun 4/08/25	lun 11/08/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2949	**1.3.4.7.9.6.4**	**Muros Laterales**	**vie 1/08/25**	**sáb 16/08/25**	**11 d**	**$ 12.447.845**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2950	1.3.4.7.9.6.4	Acero	vie 1/08/25	mar 5/08/25	3 d	$ 6.750.845	0,00%	0,00%	$ 0
2951	1.3.4.7.9.6.4	Concreto	lun 11/08/25	sáb 16/08/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2952	**1.3.4.7.9.6.4**	**Vigas Longitudinales**	**sáb 16/08/25**	**mié 27/08/25**	**8 d**	**$ 8.975.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2953	1.3.4.7.9.6.4	Acero	sáb 16/08/25	jue 21/08/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2954	1.3.4.7.9.6.4	Concreto	jue 21/08/25	mié 27/08/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2955	**1.3.4.7.9.6.5**	**Tierra Armada**	**sáb 16/08/25**	**mar 9/09/25**	**18 d**	**$ 39.750.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2956	1.3.4.7.9.6.5	Geomalla de Refuerzo	sáb 16/08/25	jue 4/09/25	15 d	$ 9.937.499	0,00%	0,00%	$ 0
2957	1.3.4.7.9.6.5	Sacos Llenos Con Material Granular	mar 19/08/25	vie 5/09/25	15 d	$ 9.937.499	0,00%	0,00%	$ 0
2958	1.3.4.7.9.6.5	Geotextil Fortex	lun 25/08/25	vie 5/09/25	10 d	$ 9.173.080	0,00%	0,00%	$ 0
2959	1.3.4.7.9.6.5	Relleno con Ceniza	jue 21/08/25	mar 9/09/25	15 d	$ 10.701.922	0,00%	0,00%	$ 0
2960	*1.3.4.7.9.7*	*Fin de Eje JC3-JC4*	*mar 9/09/25*	*mar 9/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2961	**1.3.4.7.9.8**	**EJE JC4-JC5**	**vie 14/06/24**	**vie 6/06/25**	**279 d**	**$ 109.566.272**	**15,79%**	**15,79%**	**$ 17.297.512**
2962	1.3.4.7.9.8.1	Excavación	vie 14/06/24	sáb 15/06/24	1 d	$ 1.018.572	100,00%	100,00%	$ 1.018.572
2963	1.3.4.7.9.8.2	Pilotes FDP	sáb 15/06/24	lun 17/06/24	1 d	$ 16.278.940	100,00%	100,00%	$ 16.278.940
2964	1.3.4.7.9.8.3	Pilotes FDP 2	lun 29/07/24	mar 30/07/24	2 d	$ 2.650.060	0,00%	0,00%	$ 0
2965	1.3.4.7.9.8.4	Mejoramiento con Rajón	mar 6/08/24	sáb 10/08/24	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2966	**1.3.4.7.9.8.5**	**Estructura**	**sáb 10/08/24**	**mié 14/05/25**	**216,75 d**	**$ 49.459.700**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2967	**1.3.4.7.9.8.5**	**Zapatas**	**sáb 10/08/24**	**mar 20/08/24**	**7 d**	**$ 19.310.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2968	1.3.4.7.9.8.5	Solado	sáb 10/08/24	mar 13/08/24	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
2969	1.3.4.7.9.8.5	Acero	mar 13/08/24	jue 15/08/24	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
2970	1.3.4.7.9.8.5	Concreto	jue 15/08/24	mar 20/08/24	3 d	$ 10.761.000	0,00%	0,00%	$ 0
2971	**1.3.4.7.9.8.5**	**Vigas de Cimentación**	**mar 13/08/24**	**vie 23/08/24**	**8 d**	**$ 8.725.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2972	1.3.4.7.9.8.5	Acero	mar 13/08/24	vie 16/08/24	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2973	1.3.4.7.9.8.5	Concreto	vie 16/08/24	vie 23/08/24	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2974	**1.3.4.7.9.8.5**	**Muros Laterales**	**jue 24/04/25**	**lun 5/05/25**	**8 d**	**$ 12.447.845**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2975	1.3.4.7.9.8.5	Acero	jue 24/04/25	lun 28/04/25	3 d	$ 6.750.845	0,00%	0,00%	$ 0
2976	1.3.4.7.9.8.5	Concreto	lun 28/04/25	lun 5/05/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2977	**1.3.4.7.9.8.5**	**Vigas Longitudinales**	**lun 5/05/25**	**mié 14/05/25**	**8 d**	**$ 8.975.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2978	1.3.4.7.9.8.5	Acero	lun 5/05/25	jue 8/05/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
2979	1.3.4.7.9.8.5	Concreto	jue 8/05/25	mié 14/05/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2980	**1.3.4.7.9.8.6**	**Tierra Armada**	**jue 15/05/25**	**vie 6/06/25**	**18 d**	**$ 39.750.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2981	1.3.4.7.9.8.6	Geomalla de Refuerzo	jue 15/05/25	mar 3/06/25	15 d	$ 9.937.499	0,00%	0,00%	$ 0
2982	1.3.4.7.9.8.6	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 16/05/25	mié 4/06/25	15 d	$ 9.937.499	0,00%	0,00%	$ 0
2983	1.3.4.7.9.8.6	Geotextil Fortex	jue 22/05/25	mié 4/06/25	10 d	$ 9.034.094	0,00%	0,00%	$ 0
2984	1.3.4.7.9.8.6	Relleno con Ceniza	lun 19/05/25	vie 6/06/25	15 d	$ 10.840.908	0,00%	0,00%	$ 0
2985	*1.3.4.7.9.9*	*Fin de Eje JC4-JC5*	*vie 6/06/25*	*vie 6/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
2986	**1.3.4.7.9.10**	**EJE JC5-JC6**	**vie 14/06/24**	**mar 22/07/25**	**314,25 d**	**$ 109.566.272**	**13,89%**	**13,89%**	**$ 15.215.322**
2987	1.3.4.7.9.10.	Excavación	vie 14/06/24	sáb 15/06/24	1 d	$ 1.018.572	100,00%	100,00%	$ 1.018.572
2988	1.3.4.7.9.10.	Pilotes FDP	sáb 15/06/24	mar 18/06/24	2 d	$ 14.196.750	100,00%	100,00%	$ 14.196.750
2989	1.3.4.7.9.10.	Pilotes FDP 2	mié 31/07/24	jue 1/08/24	2 d	$ 4.732.250	0,00%	0,00%	$ 0
2990	1.3.4.7.9.10.	Mejoramiento con Rajón	vie 6/06/25	mar 10/06/25	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
2991	**1.3.4.7.9.10.**	**Estructura**	**mar 10/06/25**	**jue 10/07/25**	**23 d**	**$ 49.459.700**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2992	**1.3.4.7.9.10.**	**Zapatas**	**mar 10/06/25**	**mié 18/06/25**	**7 d**	**$ 19.310.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
2993	1.3.4.7.9.10.	Solado	mar 10/06/25	jue 12/06/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
2994	1.3.4.7.9.10.	Acero	jue 12/06/25	sáb 14/06/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
2995	1.3.4.7.9.10.	Concreto	sáb 14/06/25	mié 18/06/25	3 d	$ 10.761.000	0,00%	0,00%	$ 0
2996	**1.3.4.7.9.10.**	**Vigas de Cimentación**	**jue 12/06/25**	**sáb 21/06/25**	**8 d**	**$ 8.725.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**

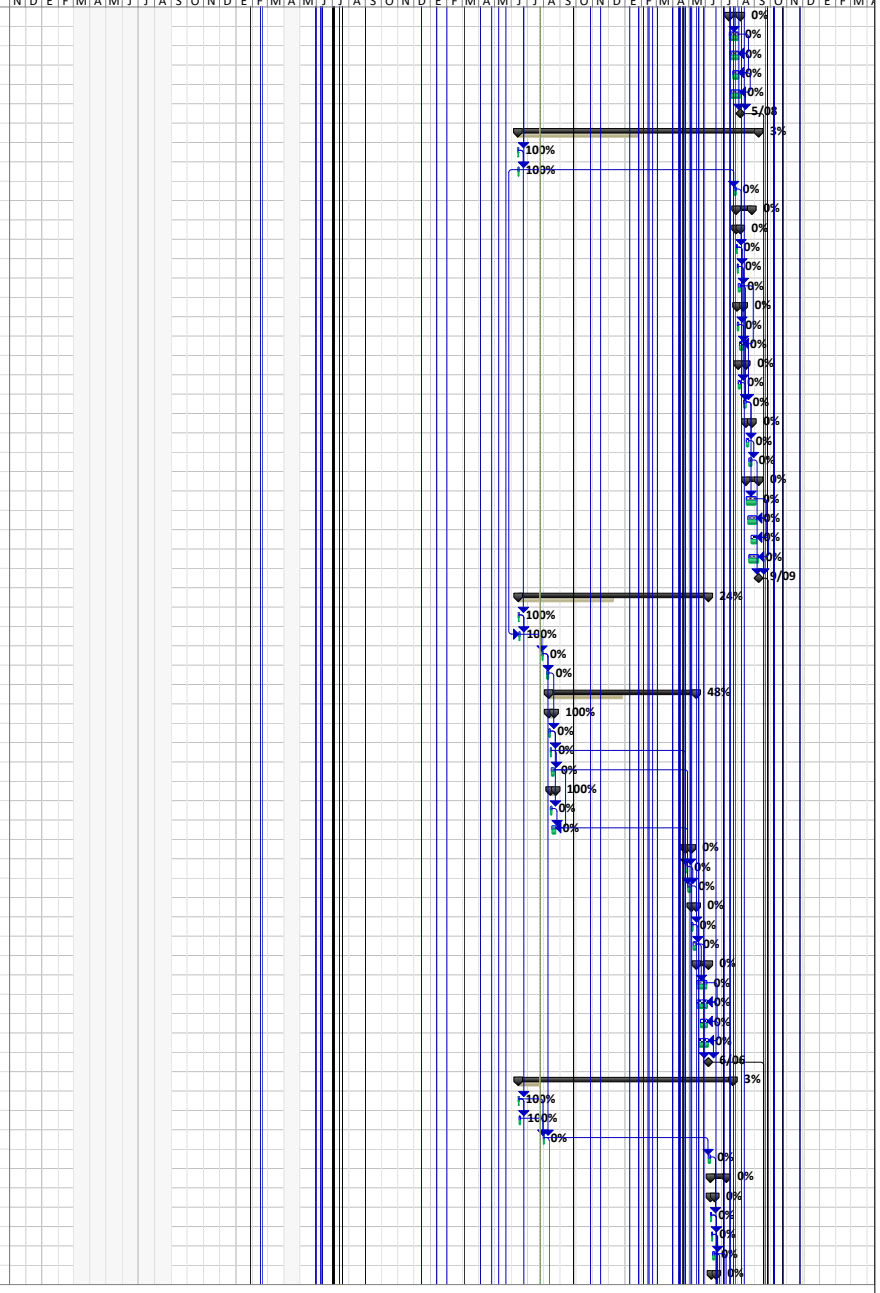

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
2997	1.3.4.7.9.10.	Acero	jue 12/06/25	lun 16/06/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
2998	1.3.4.7.9.10.	Concreto	lun 16/06/25	sáb 21/06/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
2999	**1.3.4.7.9.10.**	**Muros Laterales**	**sáb 14/06/25**	**sáb 28/06/25**	**11 d**	**$ 12.447.845**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3000	1.3.4.7.9.10.	Acero	sáb 14/06/25	mié 18/06/25	3 d	$ 6.750.845	0,00%	0,00%	$ 0
3001	1.3.4.7.9.10.	Concreto	sáb 21/06/25	sáb 28/06/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
3002	**1.3.4.7.9.10.**	**Vigas Longitudinales**	**mar 1/07/25**	**jue 10/07/25**	**8 d**	**$ 8.975.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3003	1.3.4.7.9.10.	Acero	mar 1/07/25	jue 3/07/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
3004	1.3.4.7.9.10.	Concreto	vie 4/07/25	jue 10/07/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
3005	**1.3.4.7.9.10.**	**Tierra Armada**	**mar 1/07/25**	**mar 22/07/25**	**18 d**	**$ 39.750.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3006	1.3.4.7.9.10.	Geomalla de Refuerzo	mar 1/07/25	vie 18/07/25	15 d	$ 9.937.503	0,00%	0,00%	$ 0
3007	1.3.4.7.9.10.	Sacos Llenos Con Material Granular	mié 2/07/25	sáb 19/07/25	15 d	$ 9.937.503	0,00%	0,00%	$ 0
3008	1.3.4.7.9.10.	Geotextil Fortex	mar 8/07/25	sáb 19/07/25	10 d	$ 8.833.324	0,00%	0,00%	$ 0
3009	1.3.4.7.9.10.	Relleno con Ceniza	vie 4/07/25	mar 22/07/25	15 d	$ 11.041.670	0,00%	0,00%	$ 0
3010	*1.3.4.7.9.1:*	*Fin de Eje JC5-JC6*	*mar 22/07/25*	*mar 22/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3011	**1.3.4.7.9.12**	**EJE JC6-JC7**	**vie 14/06/24**	**jue 18/09/25**	**360,25 d**	**$ 109.411.272**	**13,80%**	**13,80%**	**$ 15.099.072**
3012	1.3.4.7.9.12.	Excavación	vie 14/06/24	sáb 15/06/24	1 d	$ 1.018.572	100,00%	100,00%	$ 1.018.572
3013	1.3.4.7.9.12.	Pilotes FDP	sáb 15/06/24	mar 18/06/24	2 d	$ 14.080.500	100,00%	100,00%	$ 14.080.500
3014	1.3.4.7.9.12.	Pilotes FDP 2	vie 2/08/24	lun 5/08/24	2 d	$ 4.693.500	0,00%	0,00%	$ 0
3015	1.3.4.7.9.12.	Mejoramiento con Rajón	mar 12/08/25	vie 15/08/25	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
3016	**1.3.4.7.9.12.**	**Estructura**	**vie 15/08/25**	**sáb 13/09/25**	**23 d**	**$ 49.459.700**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3017	**1.3.4.7.9.12.**	**Zapatas**	**vie 15/08/25**	**lun 25/08/25**	**7 d**	**$ 19.310.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3018	1.3.4.7.9.12.	Solado	vie 15/08/25	mar 19/08/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
3019	1.3.4.7.9.12.	Acero	mar 19/08/25	jue 21/08/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
3020	1.3.4.7.9.12.	Concreto	jue 21/08/25	lun 25/08/25	3 d	$ 10.761.000	0,00%	0,00%	$ 0
3021	**1.3.4.7.9.12.**	**Vigas de Cimentación**	**mar 19/08/25**	**jue 28/08/25**	**8 d**	**$ 8.725.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3022	1.3.4.7.9.12.	Acero	mar 19/08/25	vie 22/08/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
3023	1.3.4.7.9.12.	Concreto	vie 22/08/25	jue 28/08/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
3024	**1.3.4.7.9.12.**	**Muros Laterales**	**jue 21/08/25**	**jue 4/09/25**	**11 d**	**$ 12.447.845**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3025	1.3.4.7.9.12.	Acero	jue 21/08/25	lun 25/08/25	3 d	$ 6.750.845	0,00%	0,00%	$ 0
3026	1.3.4.7.9.12.	Concreto	vie 29/08/25	jue 4/09/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
3027	**1.3.4.7.9.12.**	**Vigas Longitudinales**	**jue 4/09/25**	**sáb 13/09/25**	**8 d**	**$ 8.975.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3028	1.3.4.7.9.12.	Acero	jue 4/09/25	lun 8/09/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
3029	1.3.4.7.9.12.	Concreto	lun 8/09/25	sáb 13/09/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
3030	**1.3.4.7.9.12.**	**Tierra Armada**	**lun 1/09/25**	**jue 18/09/25**	**15 d**	**$ 39.750.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3031	1.3.4.7.9.12.	Geomalla de Refuerzo	jue 4/09/25	mar 16/09/25	10 d	$ 9.937.501	0,00%	0,00%	$ 0
3032	1.3.4.7.9.12.	Sacos Llenos Con Material Granular	vie 5/09/25	mié 17/09/25	10 d	$ 9.937.501	0,00%	0,00%	$ 0
3033	1.3.4.7.9.12.	Geotextil Fortex	vie 5/09/25	mié 17/09/25	10 d	$ 8.517.854	0,00%	0,00%	$ 0
3034	1.3.4.7.9.12.	Relleno con Ceniza	lun 1/09/25	jue 18/09/25	15 d	$ 11.357.144	0,00%	0,00%	$ 0
3035	*1.3.4.7.9.1:*	*Fin de Eje JC6-JC7*	*jue 18/09/25*	*jue 18/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3036	**1.3.4.7.9.14**	**EJE JC7-JC8**	**mié 12/06/24**	**lun 15/09/25**	**359 d**	**$ 109.411.272**	**14,14%**	**14,14%**	**$ 15.474.552**
3037	1.3.4.7.9.14.	Excavación	mié 12/06/24	jue 13/06/24	1 d	$ 1.018.572	100,00%	100,00%	$ 1.018.572
3038	1.3.4.7.9.14.	Pilotes FDP	jue 13/06/24	sáb 15/06/24	2 d	$ 14.455.980	100,00%	100,00%	$ 14.455.980
3039	1.3.4.7.9.14.	Pilotes FDP 2	mar 27/08/24	jue 29/08/24	2 d	$ 4.318.020	0,00%	0,00%	$ 0
3040	1.3.4.7.9.14.	Mejoramiento con Rajón	lun 4/08/25	mié 6/08/25	3 d	$ 409.000	0,00%	0,00%	$ 0
3041	**1.3.4.7.9.14.**	**Estructura**	**vie 8/08/25**	**vie 5/09/25**	**23 d**	**$ 49.459.700**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3042	**1.3.4.7.9.14.**	**Zapatas**	**vie 8/08/25**	**sáb 16/08/25**	**7 d**	**$ 19.310.405**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3043	1.3.4.7.9.14.	Solado	vie 8/08/25	lun 11/08/25	2 d	$ 9.405	0,00%	0,00%	$ 0
3044	1.3.4.7.9.14.	Acero	lun 11/08/25	mié 13/08/25	2 d	$ 8.540.000	0,00%	0,00%	$ 0
3045	1.3.4.7.9.14.	Concreto	mié 13/08/25	sáb 16/08/25	3 d	$ 10.761.000	0,00%	0,00%	$ 0
3046	**1.3.4.7.9.14.**	**Vigas de Cimentación**	**lun 11/08/25**	**jue 21/08/25**	**8 d**	**$ 8.725.825**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3047	1.3.4.7.9.14.	Acero	lun 11/08/25	jue 14/08/25	3 d	$ 3.028.825	0,00%	0,00%	$ 0
3048	1.3.4.7.9.14.	Concreto	jue 14/08/25	jue 21/08/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
3049	**1.3.4.7.9.14.**	**Muros Laterales**	**mié 13/08/25**	**mié 27/08/25**	**11 d**	**$ 12.447.845**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3050	1.3.4.7.9.14.	Acero	mié 13/08/25	sáb 16/08/25	3 d	$ 6.750.845	0,00%	0,00%	$ 0
3051	1.3.4.7.9.14.	Concreto	jue 21/08/25	mié 27/08/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
3052	**1.3.4.7.9.14.**	**Vigas Longitudinales**	**mié 27/08/25**	**vie 5/09/25**	**8 d**	**$ 8.975.625**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3053	1.3.4.7.9.14.	Acero	mié 27/08/25	sáb 30/08/25	3 d	$ 3.278.625	0,00%	0,00%	$ 0
3054	1.3.4.7.9.14.	Concreto	lun 1/09/25	vie 5/09/25	5 d	$ 5.697.000	0,00%	0,00%	$ 0
3055	**1.3.4.7.9.14.**	**Tierra Armada**	**sáb 23/08/25**	**lun 15/09/25**	**18 d**	**$ 39.750.000**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3056	1.3.4.7.9.14.	Geomalla de Refuerzo	sáb 23/08/25	jue 11/09/25	15 d	$ 9.937.500	0,00%	0,00%	$ 0
3057	1.3.4.7.9.14.	Sacos Llenos Con Material Granular	lun 25/08/25	vie 12/09/25	15 d	$ 9.937.500	0,00%	0,00%	$ 0
3058	1.3.4.7.9.14.	Geotextil Fortex	lun 1/09/25	vie 12/09/25	10 d	$ 7.950.000	0,00%	0,00%	$ 0
3059	1.3.4.7.9.14.	Relleno con Ceniza	mié 27/08/25	lun 15/09/25	15 d	$ 11.925.000	0,00%	0,00%	$ 0
3060	*1.3.4.7.9.1:*	*Fin de Eje JC7-JC8*	*lun 15/09/25*	*lun 15/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3061	**1.3.4.7.9.16**	**PAVIMENTO**	**jue 18/09/25**	**vie 3/10/25**	**12 d**	**$ 191.707.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3062	1.3.4.7.9.16.	Subbase	jue 18/09/25	mié 1/10/25	10 d	$ 28.847.600	0,00%	0,00%	$ 0

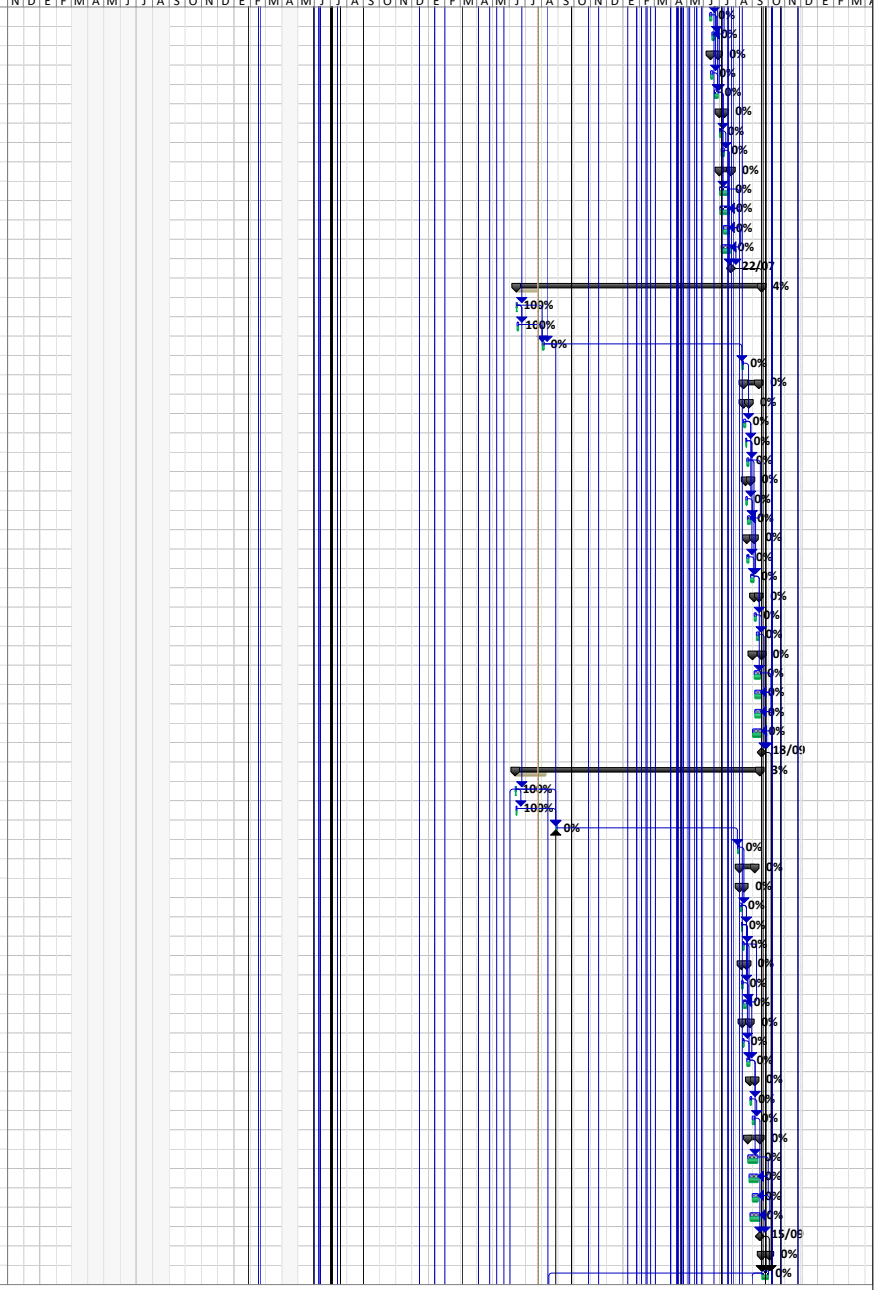


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
3063	1.3.4.7.9.16.	Base	vie 19/09/25	mié 1/10/25	9 d	$ 20.496.000	0,00%	0,00%	$ 0
3064	1.3.4.7.9.16.	Mezcla Asfaltica - GCR	mié 1/10/25	jue 2/10/25	1 d	$ 107.582.767	0,00%	0,00%	$ 0
3065	1.3.4.7.9.16.	Mezcla Asfaltica - MD12	jue 2/10/25	vie 3/10/25	1 d	$ 34.781.450	0,00%	0,00%	$ 0
3066	1.3.4.7.9.17	Baranda Vehicular	sáb 6/09/25	mié 1/10/25	20 d	$ 327.242.381	0,00%	0,00%	$ 0
3067	*1.3.4.7.10*	*Fin de Final de Aproche Occidental*	*vie 3/10/25*	*vie 3/10/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3068	**1.3.4.7.11**	**CALLE 153 NW**	**lun 2/09/24**	**lun 16/12/24**	**84 d**	**$ 641.613.261**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3069	1.3.4.7.11.1	Demolición	lun 2/09/24	mar 3/09/24	1 d	$ 4.745.901	0,00%	0,00%	$ 0
3070	**1.3.4.7.11.2**	**Via**	**lun 30/09/24**	**jue 31/10/24**	**25 d**	**$ 525.071.009**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3071	1.3.4.7.11.2.	Excavación	lun 30/09/24	mié 16/10/24	13 d	$ 130.181.003	0,00%	0,00%	$ 0
3072	1.3.4.7.11.2.	Mejoramiento con Rajón	sáb 5/10/24	jue 24/10/24	15 d	$ 12.650.782	0,00%	0,00%	$ 0
3073	1.3.4.7.11.2.	Subbase Granular	vie 11/10/24	mar 22/10/24	8 d	$ 147.872.712	0,00%	0,00%	$ 0
3074	1.3.4.7.11.2.	Base Granular	vie 18/10/24	mar 29/10/24	8 d	$ 85.176.000	0,00%	0,00%	$ 0
3075	1.3.4.7.11.2.	Mezcla Asfaltica - GCR	mar 29/10/24	mié 30/10/24	1 d	$ 110.893.312	0,00%	0,00%	$ 0
3076	1.3.4.7.11.2.	Mezcla Asfaltica - MD12	mié 30/10/24	jue 31/10/24	1 d	$ 38.297.200	0,00%	0,00%	$ 0
3077	**1.3.4.7.11.3**	**Espacio Público**	**lun 30/09/24**	**lun 16/12/24**	**61 d**	**$ 111.796.351**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3078	1.3.4.7.11.3.	Excavación	lun 30/09/24	vie 18/10/24	15 d	$ 6.440.069	0,00%	0,00%	$ 0
3079	1.3.4.7.11.3.	Rellenos	jue 28/11/24	lun 16/12/24	15 d	$ 81.015.570	0,00%	0,00%	$ 0
3080	1.3.4.7.11.3.	Acabados	vie 15/11/24	lun 16/12/24	25 d	$ 24.340.712	0,00%	0,00%	$ 0
3081	*1.3.4.7.12*	*Fin Calle 153 NE*	*lun 16/12/24*	*lun 16/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3082	**1.3.4.7.13**	**CONECTANTE NW**	**mar 21/05/24**	**mié 26/02/25**	**219 d**	**$ 1.155.933.018**	**1,22%**	**1,22%**	**$ 14.084.571**
3083	1.3.4.7.13.1	Demolición	lun 2/09/24	mié 11/09/24	8 d	$ 25.439.631	0,00%	0,00%	$ 0
3084	**1.3.4.7.13.2**	**Via**	**mar 21/05/24**	**vie 7/02/25**	**204 d**	**$ 670.287.230**	**2,10%**	**2,10%**	**$ 14.084.571**
3085	1.3.4.7.13.2.	Excavacion -2	mar 21/05/24	lun 27/05/24	5 d	$ 14.084.571	100,00%	100,00%	$ 14.084.571
3086	1.3.4.7.13.2.	Excavación	mié 30/10/24	mar 26/11/24	20 d	$ 114.019.998	0,00%	0,00%	$ 0
3087	1.3.4.7.13.2.	Subbase Granular	lun 25/11/24	mié 18/12/24	20 d	$ 103.356.792	0,00%	0,00%	$ 0
3088	1.3.4.7.13.2.	Base Granular - Estabilizada con Asfalto	mar 24/12/24	mar 21/01/25	20 d	$ 110.596.000	0,00%	0,00%	$ 0
3089	1.3.4.7.13.2.	Mezcla Asfaltica - GCR	lun 27/01/25	sáb 1/02/25	5 d	$ 201.518.815	0,00%	0,00%	$ 0
3090	1.3.4.7.13.2.	Mezcla Asfaltica - MD12	sáb 1/02/25	vie 7/02/25	5 d	$ 126.711.055	0,00%	0,00%	$ 0
3091	**1.3.4.7.13.3**	**Espacio Público**	**mié 30/10/24**	**mié 26/02/25**	**93 d**	**$ 460.206.157**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3092	1.3.4.7.13.3.	Excavación	mié 30/10/24	vie 15/11/24	12 d	$ 45.080.483	0,00%	0,00%	$ 0
3093	1.3.4.7.13.3.	Muros	vie 15/11/24	jue 2/01/25	37 d	$ 66.045.327	0,00%	0,00%	$ 0
3094	1.3.4.7.13.3.	Rellenos	jue 2/01/25	mar 14/01/25	9 d	$ 43.620.392	0,00%	0,00%	$ 0
3095	1.3.4.7.13.3.	Acabados	jue 12/12/24	mar 14/01/25	24 d	$ 293.386.499	0,00%	0,00%	$ 0
3096	1.3.4.7.13.3.	Pompeyano	vie 7/02/25	mié 26/02/25	15 d	$ 12.073.456	0,00%	0,00%	$ 0
3097	*1.3.4.7.14*	*Fin Conectante NE*	*vie 7/02/25*	*vie 7/02/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3098	**1.3.4.7.15**	**RAMAL TRANSICIÓN NW**	**mié 11/09/24**	**jue 24/10/24**	**35 d**	**$ 164.882.288**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3099	1.3.4.7.15.1	Demolición	mié 11/09/24	mar 17/09/24	5 d	$ 3.616.263	0,00%	0,00%	$ 0
3100	**1.3.4.7.15.2**	**Via**	**mar 17/09/24**	**jue 24/10/24**	**30 d**	**$ 161.266.025**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3101	1.3.4.7.15.2.	Excavación	mar 17/09/24	jue 26/09/24	8 d	$ 25.204.103	0,00%	0,00%	$ 0
3102	1.3.4.7.15.2.	Subbase Granular	jue 10/10/24	jue 17/10/24	5 d	$ 23.739.664	0,00%	0,00%	$ 0
3103	1.3.4.7.15.2.	Base Granular	jue 17/10/24	mié 23/10/24	5 d	$ 20.496.000	0,00%	0,00%	$ 0
3104	1.3.4.7.15.2.	Mezcla Asfaltica - GCR	jue 24/10/24	jue 24/10/24	1 d	$ 69.197.958	0,00%	0,00%	$ 0
3105	1.3.4.7.15.2.	Mezcla Asfaltica - MD12	jue 24/10/24	jue 24/10/24	1 d	$ 22.628.300	0,00%	0,00%	$ 0
3106	*1.3.4.7.16*	*Fin Ramal Transición NE*	*jue 24/10/24*	*jue 24/10/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3107	**1.3.4.7.17**	**CARRIL DESACELERACIÓN AUTONORTE NW**	**vie 30/05/25**	**jue 17/07/25**	**36 d**	**$ 335.470.759**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3108	1.3.4.7.17.1	Demolición	vie 30/05/25	vie 6/06/25	5 d	$ 12.854.861	0,00%	0,00%	$ 0
3109	**1.3.4.7.17.2**	**Via**	**sáb 7/06/25**	**jue 17/07/25**	**31 d**	**$ 322.615.898**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3110	1.3.4.7.17.2.	Excavación	sáb 7/06/25	mié 18/06/25	9 d	$ 107.180.643	0,00%	0,00%	$ 0
3111	1.3.4.7.17.2.	Subbase Granular	mar 24/06/25	jue 3/07/25	7 d	$ 53.599.111	0,00%	0,00%	$ 0
3112	1.3.4.7.17.2.	Base Granular - Estabilizada con Asfalto	vie 4/07/25	mié 16/07/25	10 d	$ 36.651.000	0,00%	0,00%	$ 0
3113	1.3.4.7.17.2.	Mezcla Asfaltica - GCR	mié 16/07/25	jue 17/07/25	1 d	$ 75.745.096	0,00%	0,00%	$ 0
3114	1.3.4.7.17.2.	Mezcla Asfaltica - MD12	mié 16/07/25	jue 17/07/25	1 d	$ 49.440.048	0,00%	0,00%	$ 0
3115	*1.3.4.7.18*	*Fin Carril Desaceleración NE*	*jue 17/07/25*	*jue 17/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3116	**1.3.4.7.19**	**ESPACIO PUBLICO BAJO PUENTE - OCCIDENTE**	**mar 12/03/24**	**lun 24/02/25**	**270 d**	**$ 232.690.922**	**1,91%**	**1,91%**	**$ 4.454.175**
3117	1.3.4.7.19.1	Demolición	lun 13/01/25	vie 24/01/25	10 d	$ 2.055.467	0,00%	0,00%	$ 0
3118	1.3.4.7.19.2	Excavación	vie 24/01/25	lun 24/02/25	25 d	$ 33.481.362	0,00%	0,00%	$ 0
3119	1.3.4.7.19.3	Relleno	mar 12/03/24	jue 14/03/24	2 d	$ 4.454.175	100,00%	100,00%	$ 4.454.175
3120	1.3.4.7.19.4	Rellenos 2	vie 29/11/24	mar 31/12/24	25 d	$ 25.240.323	0,00%	0,00%	$ 0
3121	1.3.4.7.19.5	Acabados	vie 29/11/24	mar 7/01/25	28 d	$ 164.234.599	0,00%	0,00%	$ 0
3122	1.3.4.7.19.6	Baranda Vehicular	mar 10/12/24	mar 7/01/25	20 d	$ 3.224.996	0,00%	0,00%	$ 0
3123	*1.3.4.7.20*	*Fin de Espacio Público*	*mar 7/01/25*	*mar 7/01/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3124	1.3.4.7.21	Paisajismo	jue 14/11/24	mar 14/01/25	47 d	$ 20.291.227	0,00%	0,00%	$ 0
3125	*1.3.4.8*	*Fin Costado Occidental*	*vie 3/10/25*	*vie 3/10/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3126	**1.3.4.9**	**PUENTE**	**sáb 1/07/23**	**sáb 1/11/25**	**664,25 d**	**$ 19.499.874.4...**	**50,84%**	**50,84%**	**$ 9.912.777.313**
3127	**1.3.4.9.1**	**SUBESTRUCTURA**	**sáb 1/07/23**	**sáb 12/07/25**	**575,25 d**	**$ 12.498.041.576**	**68,45%**	**68,45%**	**$ 8.555.108.457**
3128	1.3.4.9.1.1	Lecturas e informes de instrumentación	jue 18/01/24	lun 4/03/24	39 d	$ 29.382.858	100,00%	100,00%	$ 29.382.858

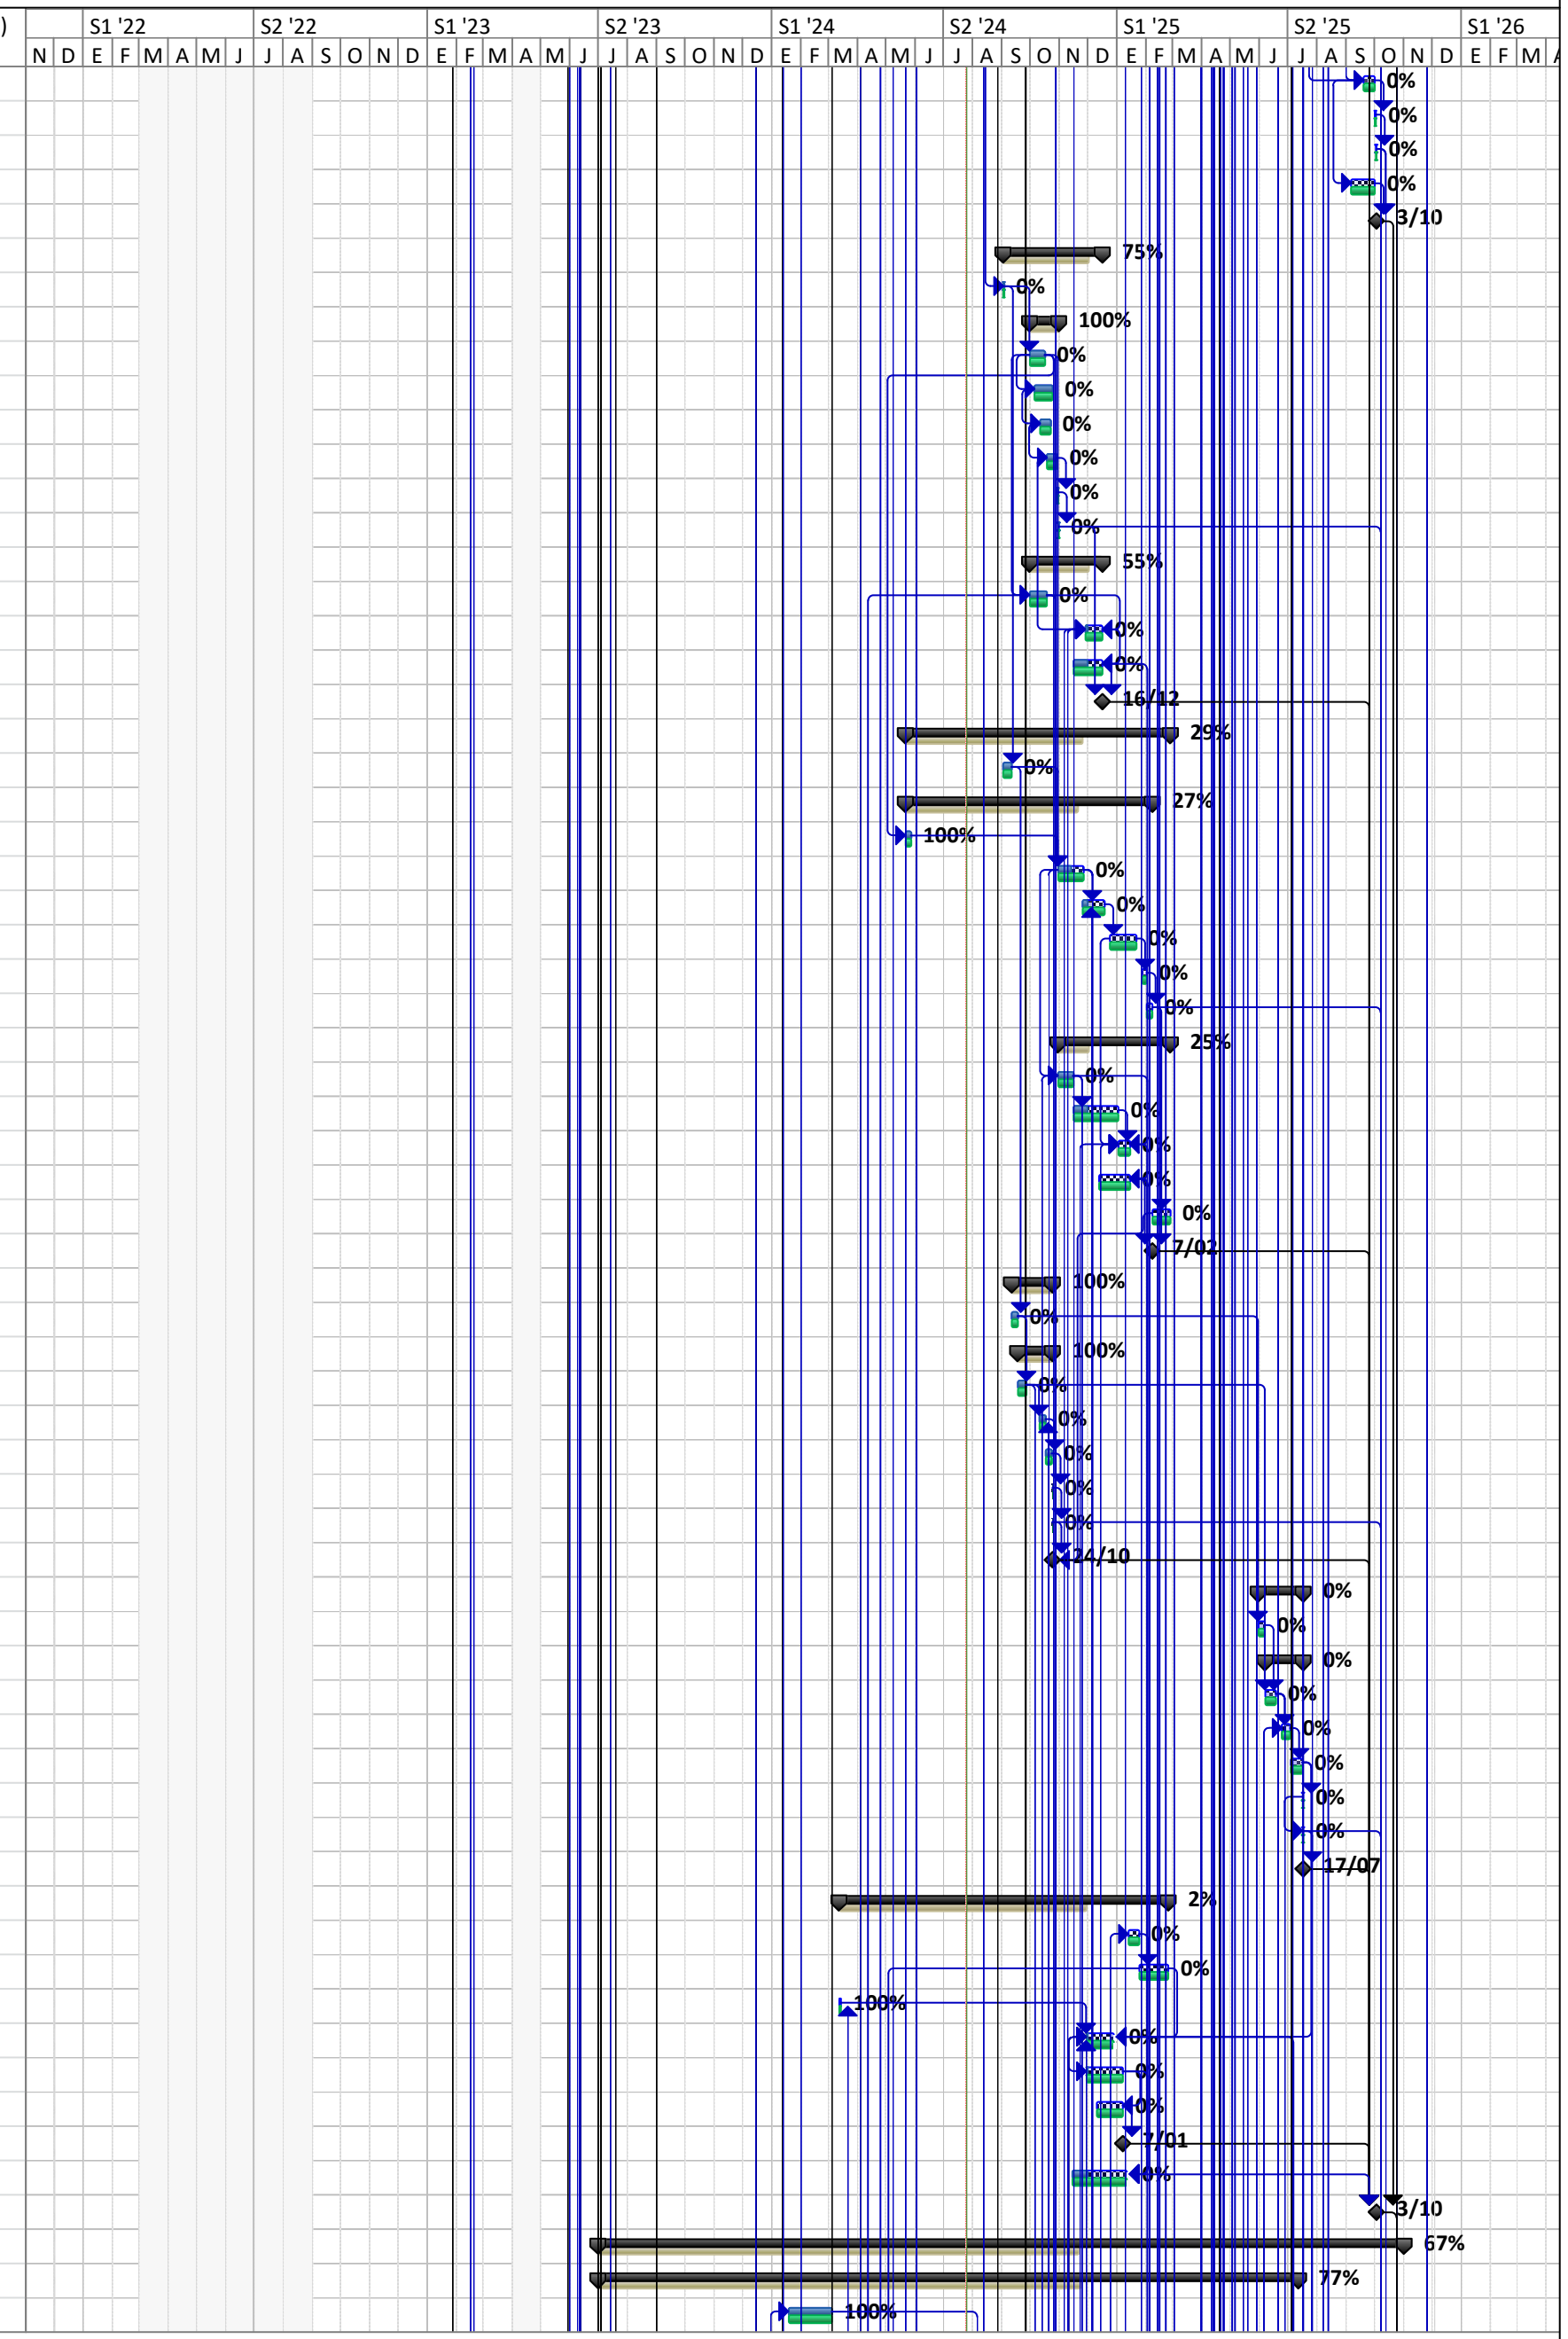

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas		División		Sólo fin		Hito de línea base		Resumen manual		Tarea inactiva	
División crítica		Progreso de tarea		Sólo duración		Hito		Resumen del proyecto		Hito inactivo	
Progreso de tarea crítica		Tarea manual		Línea base		Progreso del resumen		Tareas externas		Resumen inactivo	
Tarea		Sólo el comienzo		División de la línea base		Resumen		Hito externo		Fecha límite	

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
3129	1.3.4.9.1.2	Lecturas e informes de instrumentación 2	mar 6/08/24	lun 20/01/25	130 d	$ 125.263.762	0,00%	0,00%	$ 0
3130	1.3.4.9.1.3	Desvio Separador Central Autonorte para sistema BRT	vie 15/12/23	jue 1/02/24	39 d	$ 285.131.845	100,00%	100,00%	$ 285.131.845
3131	1.3.4.9.1.4	Desvio Separador Central Autonorte para sistema BRT 2	sáb 21/09/24	mié 15/01/25	89 d	$ 15.006.939	0,00%	0,00%	$ 0
3132	**1.3.4.9.1.5**	**EJE 1**	**lun 31/07/23**	**mar 22/10/24**	**349,25 d**	**$ 1.828.326.574**	**85,47%**	**85,47%**	**$ 1.562.731.915**
3133	**1.3.4.9.1.5.1**	**Pilotes**	**lun 31/07/23**	**jue 5/09/24**	**311,25 d**	**$ 1.326.679.661**	**94,01%**	**94,01%**	**$ 1.247.186.334**
3134	1.3.4.9.1.5.1	Acero	lun 31/07/23	sáb 19/08/23	17 d	$ 447.610.375	100,00%	100,00%	$ 447.610.375
3135	1.3.4.9.1.5.1	Acero pilote uno	mié 28/08/24	mar 3/09/24	5 d	$ 28.570.875	0,00%	0,00%	$ 0
3136	1.3.4.9.1.5.1	Excavación y Fundida	vie 8/09/23	lun 25/09/23	15 d	$ 782.080.000	100,00%	100,00%	$ 782.080.000
3137	1.3.4.9.1.5.1	Excavación y Fundida pilote uno	mar 3/09/24	mié 4/09/24	1 d	$ 49.920.000	0,00%	0,00%	$ 0
3138	1.3.4.9.1.5.1	Descabece (Pilotes 7, 8,9, 10)	mié 27/09/23	mar 10/10/23	11 d	$ 1.790.878	100,00%	100,00%	$ 1.790.878
3139	1.3.4.9.1.5.1	Descabece (Pilotes 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)	mar 31/10/23	jue 30/11/23	24 d	$ 15.705.081	100,00%	100,00%	$ 15.705.081
3140	1.3.4.9.1.5.1	Descabece 2 (Pilotes 1)	mié 4/09/24	jue 5/09/24	1 d	$ 1.002.452	0,00%	0,00%	$ 0
3141	**1.3.4.9.1.5.2**	**Zapatas**	**lun 9/10/23**	**jue 12/09/24**	**261,5 d**	**$ 232.991.078**	**77,04%**	**77,04%**	**$ 179.492.786**
3142	1.3.4.9.1.5.2	Excavación y Solado (Zapata 2)	lun 9/10/23	mié 11/10/23	2 d	$ 26.961.777	100,00%	100,00%	$ 26.961.777
3143	1.3.4.9.1.5.2	Excavación y Solado (Zapatas 3, 4)	mié 27/12/23	jue 18/01/24	17 d	$ 16.674.340	100,00%	100,00%	$ 16.674.340
3144	1.3.4.9.1.5.2	Excavación y Solado 2 (Zapatas 1)	jue 5/09/24	jue 12/09/24	6 d	$ 8.212.735	0,00%	0,00%	$ 0
3145	1.3.4.9.1.5.2	Acero	vie 19/01/24	vie 26/01/24	6 d	$ 75.642.932	100,00%	100,00%	$ 75.642.932
3146	1.3.4.9.1.5.2	Acero zapata uno	jue 5/09/24	lun 9/09/24	3 d	$ 25.214.311	0,00%	0,00%	$ 0
3147	1.3.4.9.1.5.2	Concreto	mar 30/01/24	jue 1/02/24	2 d	$ 60.213.737	100,00%	100,00%	$ 60.213.737
3148	1.3.4.9.1.5.2	Concreto zapata uno	lun 9/09/24	mar 10/09/24	1 d	$ 20.071.246	0,00%	0,00%	$ 0
3149	**1.3.4.9.1.5.3**	**Columnas**	**mar 30/01/24**	**sáb 14/09/24**	**177,5 d**	**$ 110.026.012**	**85,53%**	**85,53%**	**$ 94.104.299**
3150	1.3.4.9.1.5.3	Acero	mar 30/01/24	jue 15/02/24	14 d	$ 78.420.117	100,00%	100,00%	$ 78.420.117
3151	1.3.4.9.1.5.3	Acero 2	mar 10/09/24	jue 12/09/24	2 d	$ 10.693.652	0,00%	0,00%	$ 0
3152	1.3.4.9.1.5.3	Concreto	vie 16/02/24	mié 21/02/24	4 d	$ 15.684.182	100,00%	100,00%	$ 15.684.182
3153	1.3.4.9.1.5.3	Concreto 2	jue 12/09/24	sáb 14/09/24	2 d	$ 5.228.061	0,00%	0,00%	$ 0
3154	**1.3.4.9.1.5.4**	**Viga Cabezal**	**sáb 15/06/24**	**mar 22/10/24**	**101 d**	**$ 158.629.823**	**26,44%**	**26,44%**	**$ 41.948.496**
3155	1.3.4.9.1.5.4	Acero	sáb 15/06/24	mié 19/06/24	3 d	$ 41.948.496	100,00%	100,00%	$ 41.948.496
3156	1.3.4.9.1.5.4	Acero 2	vie 27/09/24	sáb 19/10/24	18 d	$ 41.948.496	0,00%	0,00%	$ 0
3157	1.3.4.9.1.5.4	Concreto	lun 21/10/24	mar 22/10/24	2 d	$ 74.732.831	0,00%	0,00%	$ 0
3158	*1.3.4.9.1.6*	*Fin de Eje 1*	*mar 22/10/24*	*mar 22/10/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3159	**1.3.4.9.1.7**	**EJE 2**	**vie 14/07/23**	**sáb 17/02/24**	**178 d**	**$ 1.619.321.886**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 1.619.321.886**
3160	**1.3.4.9.1.7.1**	**Pilotes**	**vie 14/07/23**	**jue 14/12/23**	**125 d**	**$ 1.233.982.751**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 1.233.982.751**
3161	1.3.4.9.1.7.1	Acero (Pilotes 20,19,23,28,31,35,21,22,25,29,34)	vie 14/07/23	sáb 29/07/23	13 d	$ 371.421.375	100,00%	100,00%	$ 371.421.375
3162	1.3.4.9.1.7.1	Acero (24,26,27,30,32,33,36)	mar 7/11/23	jue 16/11/23	8 d	$ 104.759.875	100,00%	100,00%	$ 104.759.875
3163	1.3.4.9.1.7.1	Excavación y Fundida (20,19,23,28,31,35,21,22,25,29,34)	vie 25/08/23	jue 7/09/23	12 d	$ 622.000.000	100,00%	100,00%	$ 622.000.000
3164	1.3.4.9.1.7.1	Excavación y Fundida (24,26,27,30,32,33,36)	mar 7/11/23	sáb 18/11/23	10 d	$ 134.010.623	100,00%	100,00%	$ 134.010.623
3165	1.3.4.9.1.7.1	Descabece	lun 27/11/23	jue 14/12/23	15 d	$ 1.790.878	100,00%	100,00%	$ 1.790.878
3166	**1.3.4.9.1.7.2**	**Zapatas**	**sáb 9/12/23**	**mié 3/01/24**	**20 d**	**$ 163.294.724**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 163.294.724**
3167	1.3.4.9.1.7.2	Excavación y Solado	sáb 9/12/23	mié 13/12/23	4 d	$ 25.203.259	100,00%	100,00%	$ 25.203.259
3168	1.3.4.9.1.7.2	Acero	mié 20/12/23	vie 29/12/23	8 d	$ 75.140.693	100,00%	100,00%	$ 75.140.693
3169	1.3.4.9.1.7.2	Concreto	sáb 30/12/23	mié 3/01/24	3 d	$ 62.950.772	100,00%	100,00%	$ 62.950.772
3170	**1.3.4.9.1.7.3**	**Columnas**	**sáb 30/12/23**	**jue 25/01/24**	**21 d**	**$ 91.318.437**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 91.318.437**
3171	1.3.4.9.1.7.3	Acero	sáb 30/12/23	jue 18/01/24	15 d	$ 71.561.573	100,00%	100,00%	$ 71.561.573
3172	1.3.4.9.1.7.3	Concreto	vie 19/01/24	jue 25/01/24	6 d	$ 19.756.864	100,00%	100,00%	$ 19.756.864
3173	**1.3.4.9.1.7.4**	**Viga Cabezal**	**vie 26/01/24**	**sáb 17/02/24**	**20 d**	**$ 130.725.974**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 130.725.974**
3174	1.3.4.9.1.7.4	Acero	vie 26/01/24	jue 15/02/24	18 d	$ 58.408.302	100,00%	100,00%	$ 58.408.302
3175	1.3.4.9.1.7.4	Concreto	vie 16/02/24	sáb 17/02/24	2 d	$ 72.317.672	100,00%	100,00%	$ 72.317.672
3176	*1.3.4.9.1.8*	*Fin de Eje 2*	*sáb 17/02/24*	*sáb 17/02/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3177	**1.3.4.9.1.9**	**EJE 3**	**sáb 1/07/23**	**mié 9/07/25**	**572,25 d**	**$ 2.000.051.347**	**15,44%**	**15,44%**	**$ 308.738.721**
3178	1.3.4.9.1.9.1	Instrumentación para Red Matriz	sáb 1/07/23	mar 8/08/23	30 d	$ 61.439.801	100,00%	100,00%	$ 61.439.801
3179	1.3.4.9.1.9.2	Protección de Red Matriz	mar 5/03/24	sáb 16/03/24	11 d	$ 247.298.920	100,00%	100,00%	$ 247.298.920
3180	1.3.4.9.1.9.3	Protección de Red Matriz 2	jue 24/10/24	jue 19/12/24	44 d	$ 86.888.810	0,00%	0,00%	$ 0
3181	**1.3.4.9.1.9.4**	**Pilotes**	**jue 19/12/24**	**mar 11/02/25**	**41 d**	**$ 1.233.982.751**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3182	1.3.4.9.1.9.4	Acero	jue 19/12/24	mar 7/01/25	13 d	$ 348.244.808	0,00%	0,00%	$ 0
3183	1.3.4.9.1.9.4	Excavación y Fundida	mié 8/01/25	vie 31/01/25	20 d	$ 883.947.065	0,00%	0,00%	$ 0
3184	1.3.4.9.1.9.4	Descabece	vie 31/01/25	mar 11/02/25	8 d	$ 1.790.878	0,00%	0,00%	$ 0
3185	**1.3.4.9.1.9.5**	**Zapatas**	**mar 29/04/25**	**sáb 17/05/25**	**15 d**	**$ 160.966.732**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3186	1.3.4.9.1.9.5	Excavación y Solado	mar 29/04/25	lun 5/05/25	4 d	$ 25.133.470	0,00%	0,00%	$ 0
3187	1.3.4.9.1.9.5	Acero	lun 5/05/25	mié 14/05/25	8 d	$ 75.140.693	0,00%	0,00%	$ 0
3188	1.3.4.9.1.9.5	Concreto	mié 14/05/25	sáb 17/05/25	3 d	$ 60.692.569	0,00%	0,00%	$ 0
3189	**1.3.4.9.1.9.6**	**Columnas**	**lun 26/05/25**	**mar 17/06/25**	**18 d**	**$ 92.977.382**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3190	1.3.4.9.1.9.6	Acero	lun 26/05/25	mar 10/06/25	12 d	$ 72.660.336	0,00%	0,00%	$ 0

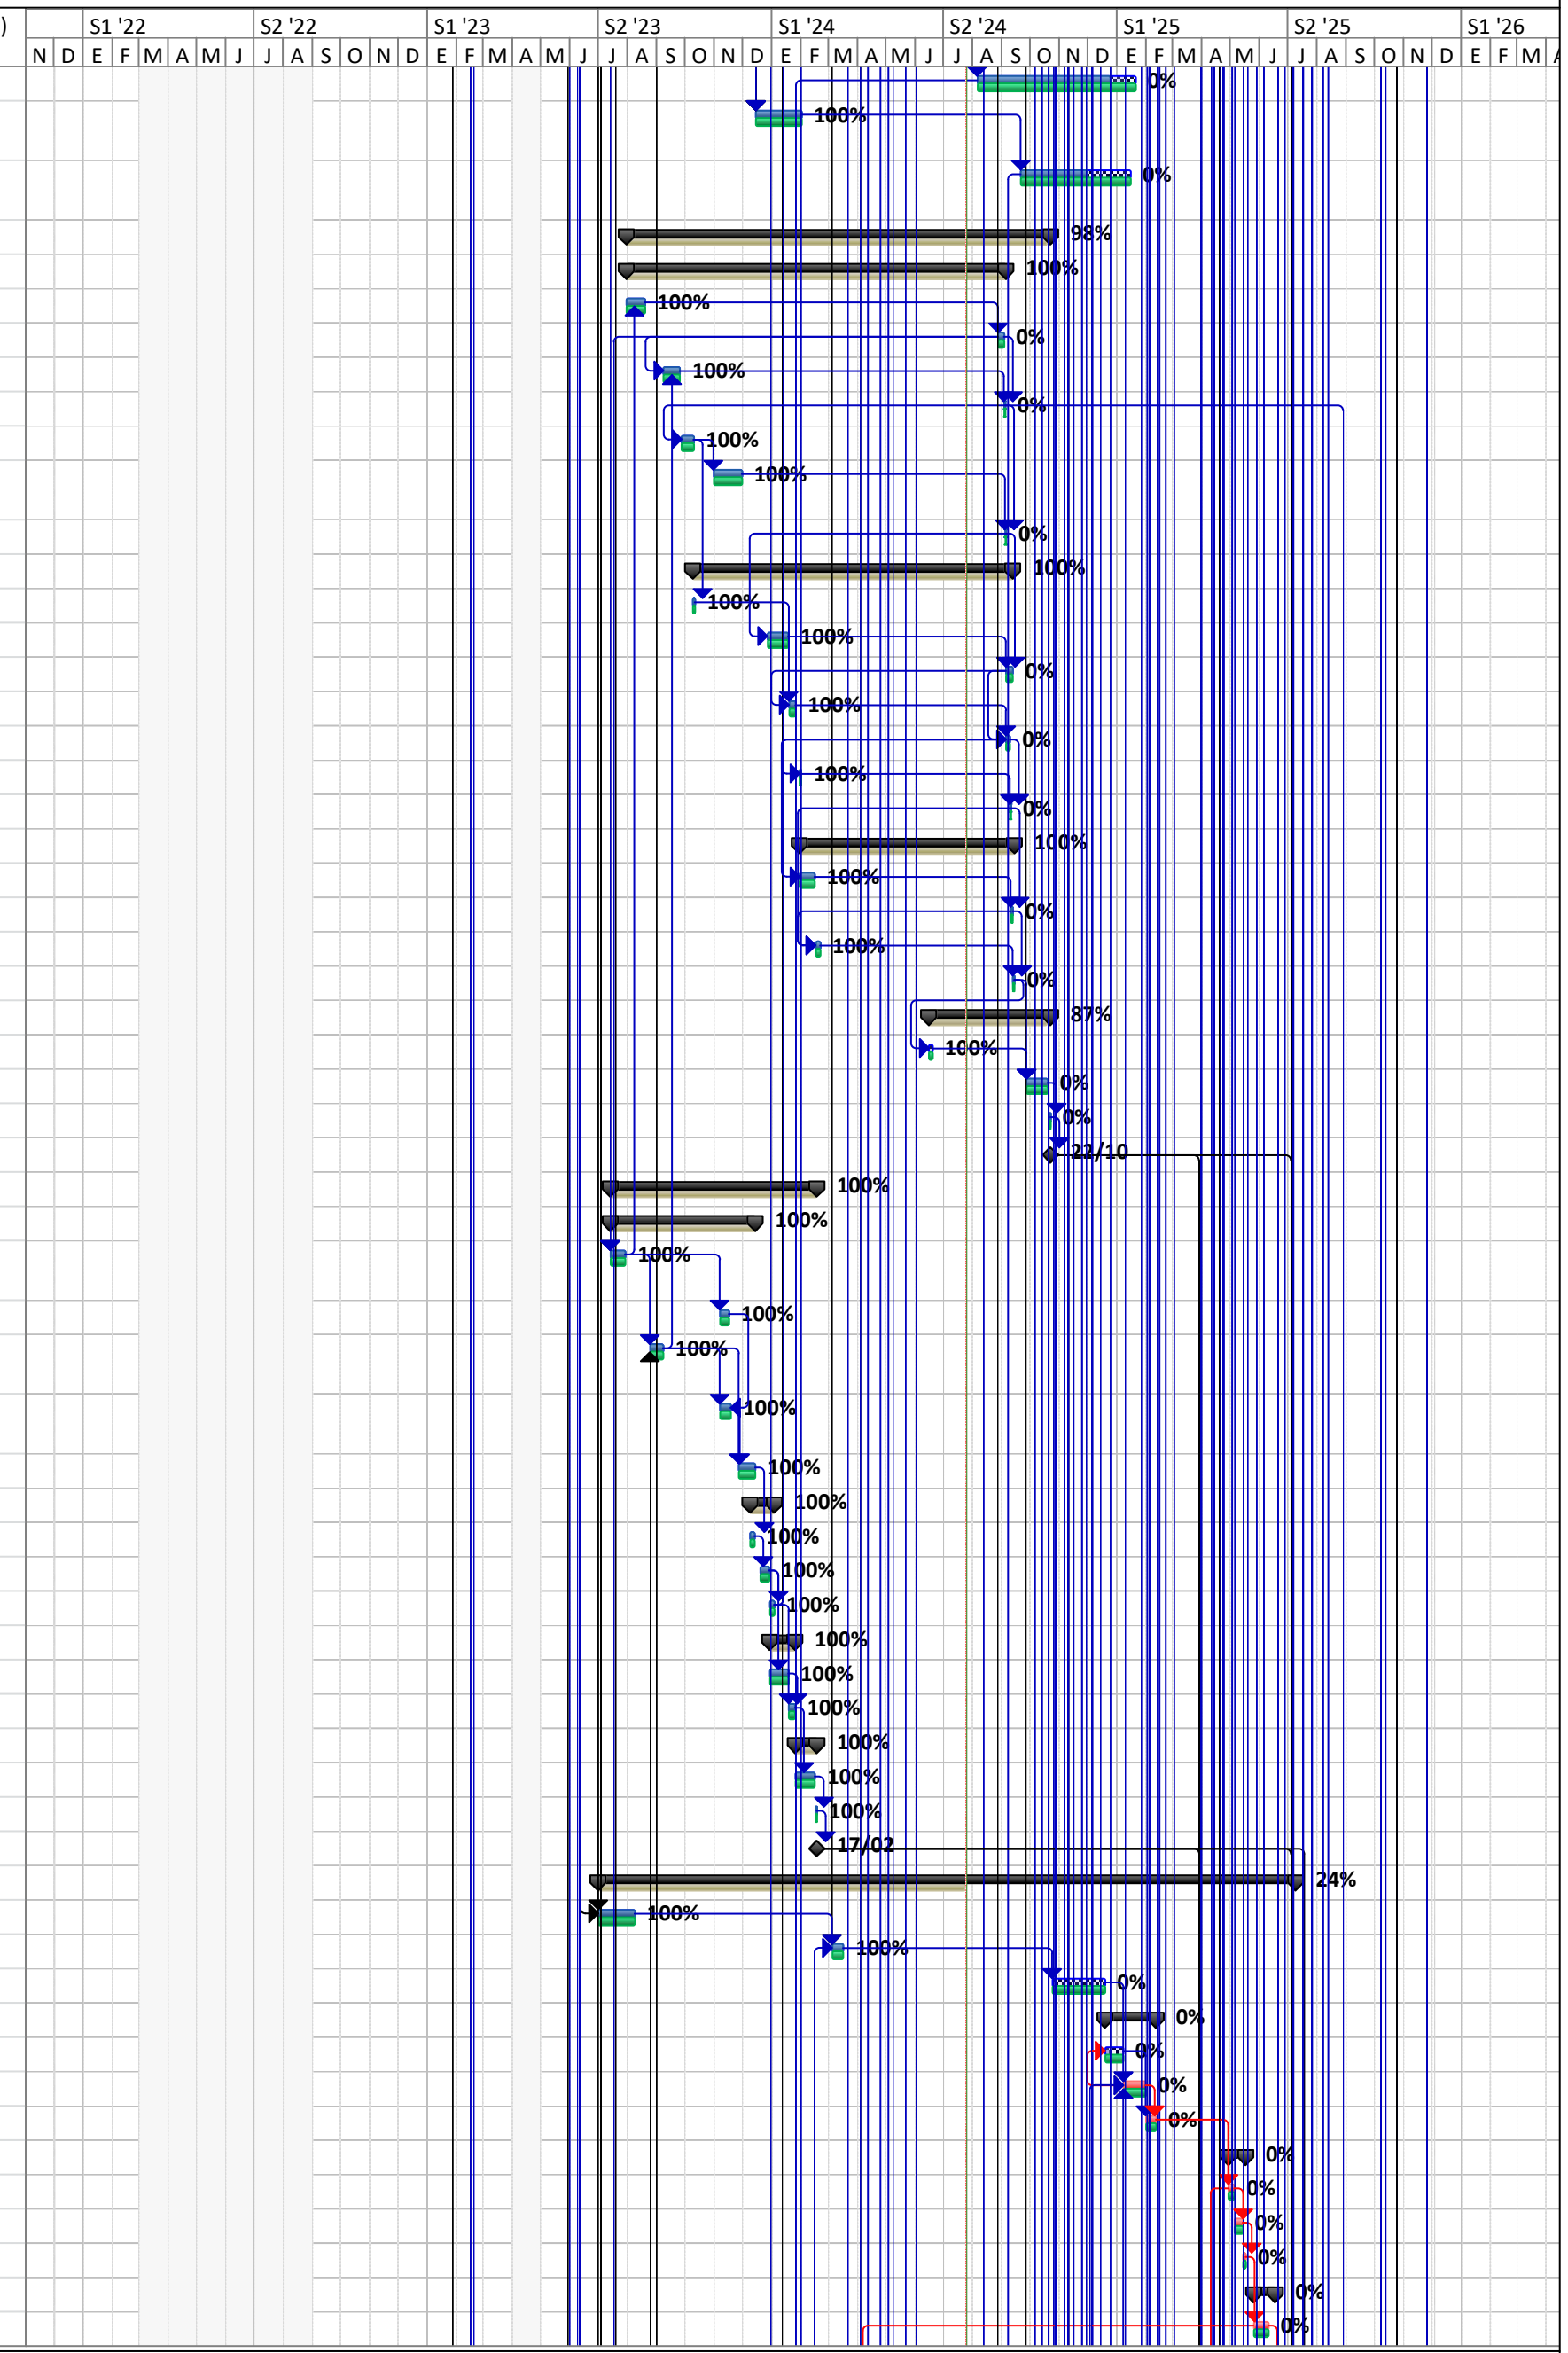


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
3191	1.3.4.9.1.9.6	Concreto	mar 10/06/25	mar 17/06/25	6 d	$ 20.317.046	0,00%	0,00%	$ 0
3192	**1.3.4.9.1.9.7**	**Viga Cabezal**	**vie 27/06/25**	**mié 9/07/25**	**9 d**	**$ 116.496.952**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3193	1.3.4.9.1.9.7	Acero	vie 27/06/25	lun 7/07/25	7 d	$ 55.028.397	0,00%	0,00%	$ 0
3194	1.3.4.9.1.9.7	Concreto	lun 7/07/25	mié 9/07/25	2 d	$ 61.468.555	0,00%	0,00%	$ 0
3195	*1.3.4.9.1.10*	*Fin de Eje 3*	*sáb 12/07/25*	*sáb 12/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3196	**1.3.4.9.1.11**	**EJE 4**	**mié 10/04/24**	**jue 29/05/25**	**322,5 d**	**$ 1.617.579.156**	**72,90%**	**72,90%**	**$ 1.179.155.049**
3197	**1.3.4.9.1.11.**	**Pilotes**	**mié 10/04/24**	**sáb 7/09/24**	**116,5 d**	**$ 1.233.982.751**	**95,56%**	**95,56%**	**$ 1.179.155.049**
3198	1.3.4.9.1.11.	Acero	mié 10/04/24	mié 24/04/24	12 d	$ 348.244.808	100,00%	100,00%	$ 348.244.808
3199	1.3.4.9.1.11.	Excavación y Fundida	jue 25/04/24	mar 14/05/24	14 d	$ 830.910.241	100,00%	100,00%	$ 830.910.241
3200	1.3.4.9.1.11.	Excavación y Fundida 2	mar 30/07/24	jue 29/08/24	23 d	$ 53.036.824	0,00%	0,00%	$ 0
3201	1.3.4.9.1.11.	Descabece	jue 29/08/24	sáb 7/09/24	8 d	$ 1.790.878	0,00%	0,00%	$ 0
3202	**1.3.4.9.1.11.**	**Zapatas**	**sáb 15/03/25**	**vie 4/04/25**	**15 d**	**$ 170.338.850**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3203	1.3.4.9.1.11.	Excavación y Solado	sáb 15/03/25	jue 20/03/25	4 d	$ 28.121.585	0,00%	0,00%	$ 0
3204	1.3.4.9.1.11.	Acero	jue 20/03/25	mar 1/04/25	8 d	$ 75.140.693	0,00%	0,00%	$ 0
3205	1.3.4.9.1.11.	Concreto	mar 1/04/25	vie 4/04/25	3 d	$ 67.076.572	0,00%	0,00%	$ 0
3206	**1.3.4.9.1.11.**	**Columnas**	**vie 11/04/25**	**mié 7/05/25**	**18 d**	**$ 96.760.603**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3207	1.3.4.9.1.11.	Acero	vie 11/04/25	mar 29/04/25	12 d	$ 76.117.481	0,00%	0,00%	$ 0
3208	1.3.4.9.1.11.	Concreto	mar 29/04/25	mié 7/05/25	6 d	$ 20.643.122	0,00%	0,00%	$ 0
3209	**1.3.4.9.1.11.**	**Viga Cabezal**	**mié 14/05/25**	**jue 29/05/25**	**12 d**	**$ 116.496.952**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3210	1.3.4.9.1.11.	Acero	mié 14/05/25	mar 27/05/25	10 d	$ 55.028.397	0,00%	0,00%	$ 0
3211	1.3.4.9.1.11.	Concreto	mar 27/05/25	jue 29/05/25	2 d	$ 61.468.555	0,00%	0,00%	$ 0
3212	*1.3.4.9.1.12*	*Fin de Eje 4*	*jue 29/05/25*	*jue 29/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3213	**1.3.4.9.1.13**	**EJE 5**	**sáb 1/07/23**	**jue 13/02/25**	**459,25 d**	**$ 2.014.403.328**	**30,14%**	**30,14%**	**$ 607.072.302**
3214	1.3.4.9.1.13.	Instrumentación para Red Matriz	sáb 1/07/23	mar 8/08/23	30 d	$ 71.648.954	100,00%	100,00%	$ 71.648.954
3215	1.3.4.9.1.13.	Protección de Red Matriz	vie 12/01/24	mar 30/01/24	16 d	$ 263.792.398	100,00%	100,00%	$ 263.792.398
3216	1.3.4.9.1.13.	Protección de Red Matriz 2	mié 24/07/24	mar 17/09/24	44 d	$ 65.948.099	0,00%	0,00%	$ 0
3217	**1.3.4.9.1.13.**	**Pilotes**	**vie 26/01/24**	**lun 18/11/24**	**229,5 d**	**$ 1.233.982.751**	**22,01%**	**22,01%**	**$ 271.630.950**
3218	1.3.4.9.1.13.	Acero	vie 26/01/24	mar 30/01/24	3 d	$ 271.630.950	100,00%	100,00%	$ 271.630.950
3219	1.3.4.9.1.13.	Acero 2	sáb 28/09/24	vie 18/10/24	15 d	$ 76.613.858	0,00%	0,00%	$ 0
3220	1.3.4.9.1.13.	Excavación y Fundida	jue 26/09/24	mié 6/11/24	32 d	$ 883.947.065	0,00%	0,00%	$ 0
3221	1.3.4.9.1.13.	Descabece	mié 6/11/24	lun 18/11/24	8 d	$ 1.790.878	0,00%	0,00%	$ 0
3222	**1.3.4.9.1.13.**	**Zapatas**	**mié 20/11/24**	**jue 5/12/24**	**13,25 d**	**$ 164.329.537**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3223	1.3.4.9.1.13.	Excavación y Solado	mié 20/11/24	lun 25/11/24	4 d	$ 25.828.284	0,00%	0,00%	$ 0
3224	1.3.4.9.1.13.	Acero	vie 22/11/24	lun 2/12/24	8 d	$ 75.140.693	0,00%	0,00%	$ 0
3225	1.3.4.9.1.13.	Concreto	lun 2/12/24	jue 5/12/24	3 d	$ 63.360.560	0,00%	0,00%	$ 0
3226	**1.3.4.9.1.13.**	**Columnas**	**vie 13/12/24**	**vie 10/01/25**	**21 d**	**$ 98.204.642**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3227	1.3.4.9.1.13.	Acero	vie 13/12/24	jue 2/01/25	15 d	$ 76.976.256	0,00%	0,00%	$ 0
3228	1.3.4.9.1.13.	Concreto	jue 2/01/25	vie 10/01/25	6 d	$ 21.228.386	0,00%	0,00%	$ 0
3229	**1.3.4.9.1.13.**	**Viga Cabezal**	**lun 20/01/25**	**jue 13/02/25**	**20 d**	**$ 116.496.947**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3230	1.3.4.9.1.13.	Acero	lun 20/01/25	mar 11/02/25	18 d	$ 55.028.397	0,00%	0,00%	$ 0
3231	1.3.4.9.1.13.	Concreto	mar 11/02/25	jue 13/02/25	2 d	$ 61.468.550	0,00%	0,00%	$ 0
3232	*1.3.4.9.1.14*	*Fin de Eje 5*	*jue 13/02/25*	*jue 13/02/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3233	**1.3.4.9.1.15**	**EJE 6**	**mar 28/11/23**	**lun 29/04/24**	**119 d**	**$ 1.608.705.265**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 1.608.705.265**
3234	**1.3.4.9.1.15.**	**Pilotes**	**mar 28/11/23**	**vie 23/02/24**	**68 d**	**$ 1.233.982.751**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 1.233.982.751**
3235	1.3.4.9.1.15.	Acero (Para pilotes que no requieren de maniobra de acueducto)	mar 28/11/23	mié 6/12/23	7 d	$ 174.122.404	100,00%	100,00%	$ 174.122.404
3236	1.3.4.9.1.15.	Acero (Para pilotes que requieren de maniobra de acueducto)	jue 11/01/24	vie 19/01/24	7 d	$ 174.122.404	100,00%	100,00%	$ 174.122.404
3237	1.3.4.9.1.15.	Excavación y Fundida (No requieren maniobra de acueducto)	sáb 2/12/23	mié 13/12/23	8 d	$ 441.973.532	100,00%	100,00%	$ 441.973.532
3238	1.3.4.9.1.15.	Excavación y Fundida (Requieren maniobra de acueducto)	sáb 20/01/24	mar 6/02/24	14 d	$ 441.973.533	100,00%	100,00%	$ 441.973.533
3239	1.3.4.9.1.15.	Descabece	mié 7/02/24	vie 23/02/24	14 d	$ 1.790.878	100,00%	100,00%	$ 1.790.878
3240	**1.3.4.9.1.15.**	**Zapatas**	**sáb 24/02/24**	**mar 12/03/24**	**13 d**	**$ 162.259.062**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 162.259.062**
3241	1.3.4.9.1.15.	Excavación y Solado	sáb 24/02/24	mié 28/02/24	3 d	$ 24.577.720	100,00%	100,00%	$ 24.577.720
3242	1.3.4.9.1.15.	Acero	jue 29/02/24	vie 8/03/24	7 d	$ 75.140.693	100,00%	100,00%	$ 75.140.693
3243	1.3.4.9.1.15.	Concreto	sáb 9/03/24	mar 12/03/24	2 d	$ 62.540.649	100,00%	100,00%	$ 62.540.649
3244	**1.3.4.9.1.15.**	**Columnas**	**sáb 9/03/24**	**vie 5/04/24**	**20 d**	**$ 95.966.500**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 95.966.500**
3245	1.3.4.9.1.15.	Acero	sáb 9/03/24	mié 27/03/24	14 d	$ 74.478.926	100,00%	100,00%	$ 74.478.926
3246	1.3.4.9.1.15.	Concreto	mié 27/03/24	vie 5/04/24	6 d	$ 21.487.574	100,00%	100,00%	$ 21.487.574
3247	**1.3.4.9.1.15.**	**Viga Cabezal**	**sáb 6/04/24**	**lun 29/04/24**	**19 d**	**$ 116.496.952**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 116.496.952**
3248	1.3.4.9.1.15.	Acero	sáb 6/04/24	vie 26/04/24	17 d	$ 55.028.397	100,00%	100,00%	$ 55.028.397
3249	1.3.4.9.1.15.	Concreto	vie 26/04/24	lun 29/04/24	2 d	$ 61.468.555	100,00%	100,00%	$ 61.468.555
3250	*1.3.4.9.1.16*	*Fin de Eje 6*	*lun 29/04/24*	*lun 29/04/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3251	**1.3.4.9.1.17**	**EJE 7**	**sáb 5/08/23**	**vie 9/02/24**	**146 d**	**$ 1.354.868.616**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 1.354.868.616**
3252	**1.3.4.9.1.17.**	**Pilotes**	**sáb 5/08/23**	**mié 20/12/23**	**106 d**	**$ 1.002.848.818**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 1.002.848.818**
3253	1.3.4.9.1.17.	Acero	sáb 5/08/23	mar 22/08/23	12 d	$ 476.181.250	100,00%	100,00%	$ 476.181.250

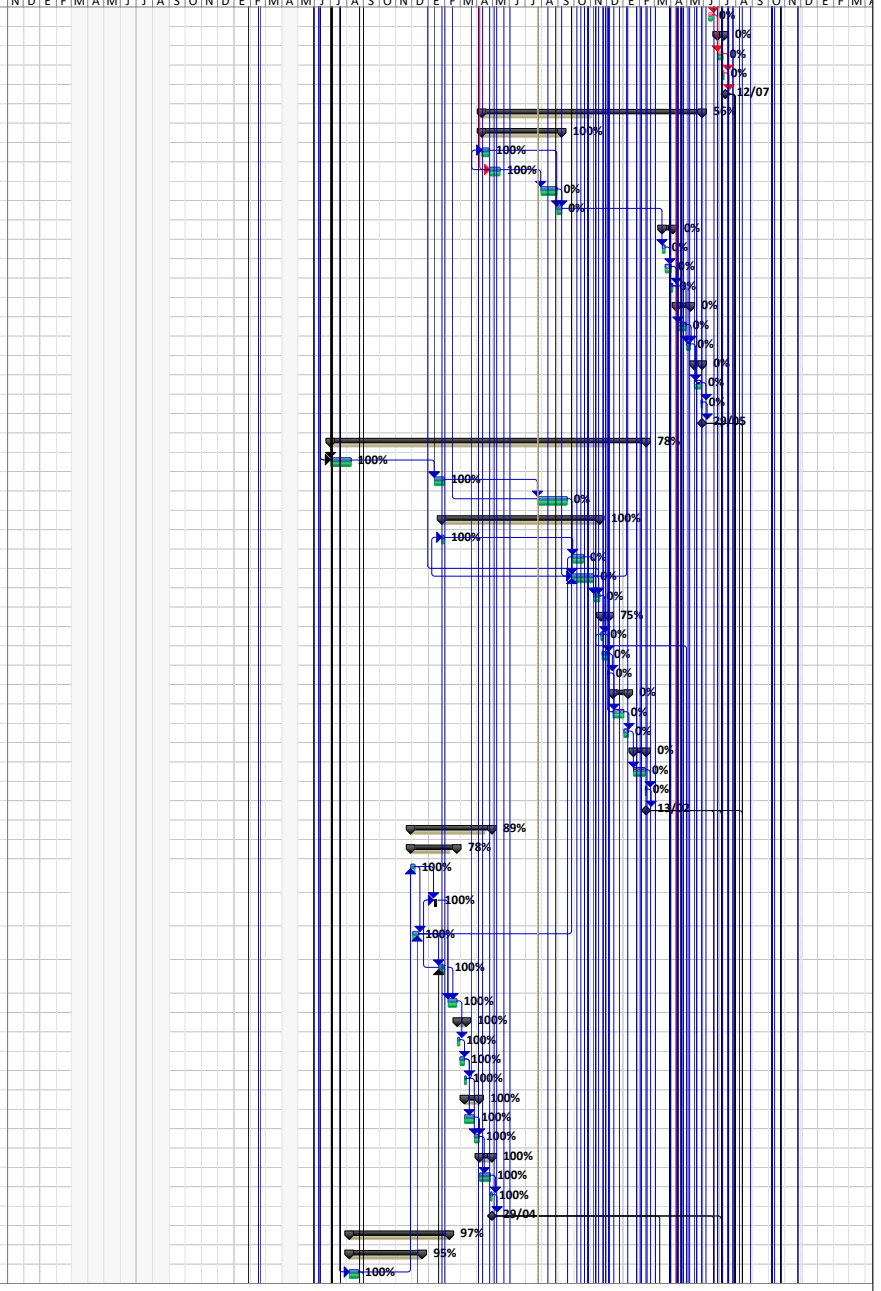


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
3254	1.3.4.9.1.17.	Excavación y Fundida (109,110,111,113,114,116,117,119,120,	mié 23/08/23	sáb 2/09/23	9 d	$ 443.040.000	100,00%	100,00%	$ 443.040.000
3255	1.3.4.9.1.17.	Excavación y Fundida (112,115,118,121)	lun 27/11/23	vie 1/12/23	4 d	$ 82.234.443	100,00%	100,00%	$ 82.234.443
3256	1.3.4.9.1.17.	Descabece	sáb 2/12/23	mié 20/12/23	13 d	$ 1.393.125	100,00%	100,00%	$ 1.393.125
3257	**1.3.4.9.1.17.**	**Zapatas**	**jue 21/12/23**	**mar 9/01/24**	**13 d**	**$ 159.905.321**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 159.905.321**
3258	1.3.4.9.1.17.	Excavación y Solado	jue 21/12/23	mar 26/12/23	3 d	$ 22.436.774	100,00%	100,00%	$ 22.436.774
3259	1.3.4.9.1.17.	Acero	mié 27/12/23	vie 5/01/24	7 d	$ 80.537.941	100,00%	100,00%	$ 80.537.941
3260	1.3.4.9.1.17.	Concreto	vie 5/01/24	mar 9/01/24	2 d	$ 56.930.606	100,00%	100,00%	$ 56.930.606
3261	**1.3.4.9.1.17.**	**Columnas**	**vie 5/01/24**	**mié 31/01/24**	**20 d**	**$ 92.977.382**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 92.977.382**
3262	1.3.4.9.1.17.	Acero	vie 5/01/24	mar 23/01/24	13 d	$ 72.660.336	100,00%	100,00%	$ 72.660.336
3263	1.3.4.9.1.17.	Concreto	jue 25/01/24	mié 31/01/24	5 d	$ 20.317.046	100,00%	100,00%	$ 20.317.046
3264	**1.3.4.9.1.17.**	**Viga Cabezal**	**jue 1/02/24**	**vie 9/02/24**	**7 d**	**$ 99.137.095**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 99.137.095**
3265	1.3.4.9.1.17.	Acero	jue 1/02/24	jue 8/02/24	6 d	$ 48.123.035	100,00%	100,00%	$ 48.123.035
3266	1.3.4.9.1.17.	Concreto	vie 9/02/24	vie 9/02/24	1 d	$ 51.014.060	100,00%	100,00%	$ 51.014.060
3267	*1.3.4.9.1.18*	*Fin de Eje 7*	*vie 9/02/24*	*vie 9/02/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3268	*1.3.4.9.2*	*Fin de Subestructura*	*sáb 12/07/25*	*sáb 12/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3269	**1.3.4.9.3**	**SUPERESTRUCTURA**	**sáb 2/09/23**	**vie 31/10/25**	**615,5 d**	**$ 6.863.370.006**	**19,78%**	**19,78%**	**$ 1.357.668.856**
3270	**1.3.4.9.3.1**	**LUZ 1 (EJE 1 Y 2)**	**jue 4/04/24**	**jue 15/05/25**	**316 d**	**$ 1.084.751.525**	**13,21%**	**13,21%**	**$ 143.342.950**
3271	**1.3.4.9.3.1.1**	**Vigas Postensadas**	**jue 4/04/24**	**jue 15/05/25**	**316 d**	**$ 593.131.410**	**24,17%**	**24,17%**	**$ 143.342.950**
3272	1.3.4.9.3.1.1	Acero	jue 4/04/24	lun 15/04/24	10 d	$ 80.622.950	100,00%	100,00%	$ 80.622.950
3273	1.3.4.9.3.1.1	Acero 2	lun 12/08/24	sáb 24/08/24	10 d	$ 80.622.950	0,00%	0,00%	$ 0
3274	1.3.4.9.3.1.1	Concreto	mar 16/04/24	mié 17/04/24	2 d	$ 62.720.000	100,00%	100,00%	$ 62.720.000
3275	1.3.4.9.3.1.1	Concreto 2	sáb 24/08/24	sáb 31/08/24	6 d	$ 62.720.000	0,00%	0,00%	$ 0
3276	**1.3.4.9.3.1.1**	**Tensionamiento**	**mar 10/09/24**	**jue 15/05/25**	**193,5 d**	**$ 239.083.222**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3277	1.3.4.9.3.1.1	Etapa 1	mar 10/09/24	mar 17/09/24	6 d	$ 159.388.205	0,00%	0,00%	$ 0
3278	1.3.4.9.3.1.1	Etapa 2	lun 12/05/25	jue 15/05/25	3 d	$ 79.695.017	0,00%	0,00%	$ 0
3279	1.3.4.9.3.1.1	Izaje de vigas	sáb 29/03/25	sáb 5/04/25	6 d	$ 67.362.288	0,00%	0,00%	$ 0
3280	**1.3.4.9.3.1.2**	**Losa Superior**	**lun 7/04/25**	**mié 23/04/25**	**12 d**	**$ 491.620.115**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3281	1.3.4.9.3.1.2	Obra Falsa	lun 7/04/25	lun 14/04/25	6 d	$ 31.609.799	0,00%	0,00%	$ 0
3282	1.3.4.9.3.1.2	Acero	lun 14/04/25	mar 22/04/25	5 d	$ 183.315.730	0,00%	0,00%	$ 0
3283	1.3.4.9.3.1.2	Concreto (2/3 tablero)	mar 22/04/25	mié 23/04/25	1 d	$ 276.694.586	0,00%	0,00%	$ 0
3284	*1.3.4.9.3.2*	*Fin Luz 1*	*jue 15/05/25*	*jue 15/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3285	**1.3.4.9.3.3**	**LUZ 2 (EJE 2 Y 3)**	**sáb 2/09/23**	**lun 1/09/25**	**566,5 d**	**$ 864.038.070**	**35,22%**	**35,22%**	**$ 304.318.488**
3286	**1.3.4.9.3.3.1**	**Vigas Postensadas**	**sáb 2/09/23**	**lun 1/09/25**	**566,5 d**	**$ 524.976.118**	**57,97%**	**57,97%**	**$ 304.318.488**
3287	1.3.4.9.3.3.1	Acero	sáb 2/09/23	vie 22/09/23	18 d	$ 135.204.250	100,00%	100,00%	$ 135.204.250
3288	1.3.4.9.3.3.1	Concreto	lun 25/09/23	jue 28/09/23	4 d	$ 112.000.000	100,00%	100,00%	$ 112.000.000
3289	1.3.4.9.3.3.1	Concreto 2	jue 29/08/24	vie 30/08/24	1 d	$ 22.400.000	0,00%	0,00%	$ 0
3290	**1.3.4.9.3.3.1**	**Tensionamiento**	**lun 9/10/23**	**lun 1/09/25**	**536,25 d**	**$ 199.236.628**	**28,67%**	**28,67%**	**$ 57.114.238**
3291	1.3.4.9.3.3.1	Etapa 1	lun 9/10/23	sáb 14/10/23	5 d	$ 57.114.238	100,00%	100,00%	$ 57.114.238
3292	1.3.4.9.3.3.1	Etapa 2 de 1	lun 30/09/24	vie 4/10/24	4 d	$ 75.709.571	0,00%	0,00%	$ 0
3293	1.3.4.9.3.3.1	Etapa 2	jue 28/08/25	lun 1/09/25	3 d	$ 66.412.819	0,00%	0,00%	$ 0
3294	1.3.4.9.3.3.1	Izaje de Vigas	vie 18/07/25	jue 24/07/25	5 d	$ 56.135.240	0,00%	0,00%	$ 0
3295	**1.3.4.9.3.3.2**	**Losa Superior**	**mié 23/07/25**	**sáb 9/08/25**	**14 d**	**$ 339.061.952**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3296	1.3.4.9.3.3.2	Obra Falsa	mié 23/07/25	jue 31/07/25	7 d	$ 31.609.799	0,00%	0,00%	$ 0
3297	1.3.4.9.3.3.2	Acero	jue 31/07/25	vie 8/08/25	6 d	$ 178.557.040	0,00%	0,00%	$ 0
3298	1.3.4.9.3.3.2	Concreto	vie 8/08/25	sáb 9/08/25	1 d	$ 128.895.113	0,00%	0,00%	$ 0
3299	*1.3.4.9.3.4*	*Fin Luz 2*	*lun 1/09/25*	*lun 1/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3300	**1.3.4.9.3.5**	**LUZ 3 (EJE 3 Y 4)**	**lun 25/09/23**	**vie 12/09/25**	**558,25 d**	**$ 900.466.690**	**22,81%**	**22,81%**	**$ 205.436.788**
3301	**1.3.4.9.3.5.1**	**Vigas Postensadas**	**lun 25/09/23**	**vie 12/09/25**	**558,25 d**	**$ 589.106.838**	**34,87%**	**34,87%**	**$ 205.436.788**
3302	1.3.4.9.3.5.1	Acero Etapa 1	lun 25/09/23	mar 17/10/23	18 d	$ 81.122.550	100,00%	100,00%	$ 81.122.550
3303	1.3.4.9.3.5.1	Acero Etapa 2 de 1	jue 5/09/24	vie 13/09/24	7 d	$ 43.265.360	0,00%	0,00%	$ 0
3304	1.3.4.9.3.5.1	Acero Etapa 2	mié 9/10/24	jue 17/10/24	6 d	$ 97.347.060	0,00%	0,00%	$ 0
3305	1.3.4.9.3.5.1	concreto -2	mar 17/10/23	lun 23/10/23	5 d	$ 67.200.000	100,00%	100,00%	$ 67.200.000
3306	1.3.4.9.3.5.1	Concreto	vie 18/10/24	mié 23/10/24	4 d	$ 44.800.000	0,00%	0,00%	$ 0
3307	**1.3.4.9.3.5.1**	**Tensionamiento**	**jue 14/12/23**	**vie 12/09/25**	**496,25 d**	**$ 199.236.628**	**28,67%**	**28,67%**	**$ 57.114.238**
3308	1.3.4.9.3.5.1	Etapa	jue 14/12/23	mar 19/12/23	5 d	$ 57.114.238	100,00%	100,00%	$ 57.114.238
3309	1.3.4.9.3.5.1	Etapa 1	jue 24/10/24	mié 30/10/24	5 d	$ 75.709.571	0,00%	0,00%	$ 0
3310	1.3.4.9.3.5.1	Etapa 2	mar 9/09/25	vie 12/09/25	3 d	$ 66.412.819	0,00%	0,00%	$ 0
3311	1.3.4.9.3.5.1	Izaje de Vigas	jue 31/07/25	mié 6/08/25	5 d	$ 56.135.240	0,00%	0,00%	$ 0
3312	**1.3.4.9.3.5.2**	**Losa Superior**	**vie 8/08/25**	**vie 22/08/25**	**11 d**	**$ 311.359.852**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3313	1.3.4.9.3.5.2	Obra Falsa	vie 8/08/25	jue 14/08/25	5 d	$ 31.609.799	0,00%	0,00%	$ 0
3314	1.3.4.9.3.5.2	Acero	jue 14/08/25	jue 21/08/25	5 d	$ 174.934.940	0,00%	0,00%	$ 0
3315	1.3.4.9.3.5.2	Concreto	vie 22/08/25	vie 22/08/25	1 d	$ 104.815.113	0,00%	0,00%	$ 0
3316	*1.3.4.9.3.6*	*Fin Luz 3*	*vie 12/09/25*	*vie 12/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3317	**1.3.4.9.3.7**	**LUZ 4 (EJE 4 Y 5)**	**mar 26/09/23**	**jue 25/09/25**	**567,25 d**	**$ 822.641.500**	**37,31%**	**37,31%**	**$ 306.935.143**
3318	**1.3.4.9.3.7.1**	**Vigas Postensadas**	**mar 26/09/23**	**jue 25/09/25**	**567,25 d**	**$ 505.192.773**	**60,76%**	**60,76%**	**$ 306.935.143**

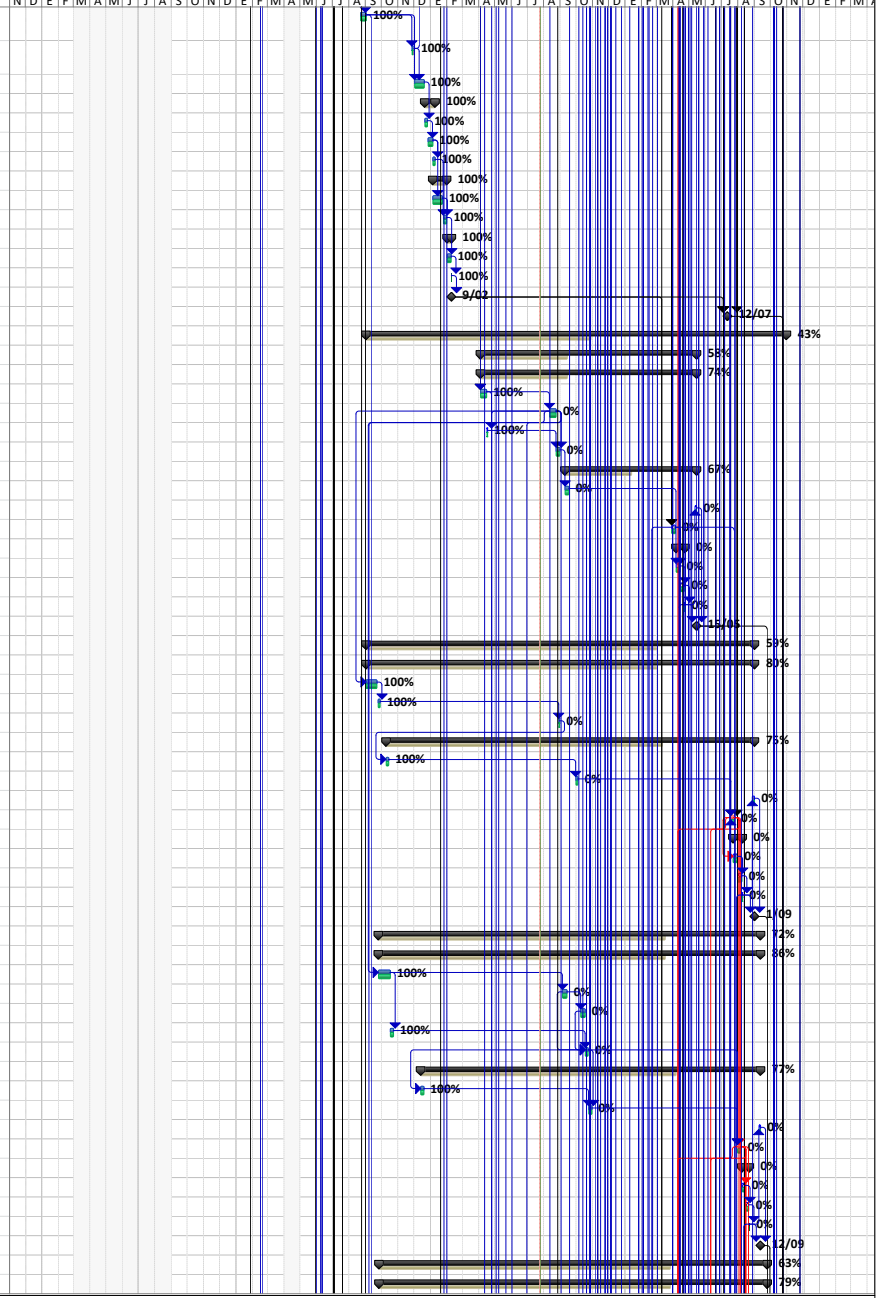

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Sólo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
3319	1.3.4.9.3.7.1	Acero	mar 26/09/23	mar 17/10/23	17 d	$ 137.820.905	100,00%	100,00%	$ 137.820.905
3320	1.3.4.9.3.7.1	Concreto	mié 18/10/23	lun 23/10/23	4 d	$ 112.000.000	100,00%	100,00%	$ 112.000.000
3321	**1.3.4.9.3.7.1**	**Tensionamiento**	**mié 18/10/23**	**jue 25/09/25**	**550 d**	**$ 199.236.628**	**28,67%**	**28,67%**	**$ 57.114.238**
3322	1.3.4.9.3.7.1	Etapa	mié 18/10/23	mar 24/10/23	5 d	$ 57.114.238	100,00%	100,00%	$ 57.114.238
3323	1.3.4.9.3.7.1	Etapa 1	mar 29/10/24	mar 5/11/24	5 d	$ 75.709.571	0,00%	0,00%	$ 0
3324	1.3.4.9.3.7.1	Etapa 2	lun 22/09/25	jue 25/09/25	3 d	$ 66.412.819	0,00%	0,00%	$ 0
3325	1.3.4.9.3.7.1	Izaje de Vigas	mié 13/08/25	mié 20/08/25	5 d	$ 56.135.240	0,00%	0,00%	$ 0
3326	**1.3.4.9.3.7.2**	**Losa Superior**	**mié 27/08/25**	**jue 4/09/25**	**7 d**	**$ 317.448.727**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3327	1.3.4.9.3.7.2	Obra Falsa	mié 27/08/25	mar 2/09/25	5 d	$ 31.609.799	0,00%	0,00%	$ 0
3328	1.3.4.9.3.7.2	Acero	sáb 30/08/25	jue 4/09/25	4 d	$ 181.023.815	0,00%	0,00%	$ 0
3329	1.3.4.9.3.7.2	Concreto (tablero 2/3)	mié 3/09/25	jue 4/09/25	1 d	$ 104.815.113	0,00%	0,00%	$ 0
3330	*1.3.4.9.3.8*	*Fin Luz 4*	*jue 25/09/25*	*jue 25/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3331	**1.3.4.9.3.9**	**LUZ 5 (EJE 5 Y 6)**	**lun 27/05/24**	**vie 15/08/25**	**347 d**	**$ 845.037.917**	**25,58%**	**25,58%**	**$ 216.201.947**
3332	**1.3.4.9.3.9.1**	**Vigas Postensadas**	**lun 27/05/24**	**vie 15/08/25**	**347 d**	**$ 510.228.830**	**42,37%**	**42,37%**	**$ 216.201.947**
3333	1.3.4.9.3.9.1	Acero	jue 6/06/24	mié 12/06/24	3 d	$ 114.288.496	100,00%	100,00%	$ 114.288.496
3334	1.3.4.9.3.9.1	Acero 2	sáb 24/08/24	sáb 14/09/24	18 d	$ 28.572.124	0,00%	0,00%	$ 0
3335	1.3.4.9.3.9.1	Concreto	jue 6/06/24	vie 7/06/24	1 d	$ 44.800.000	100,00%	100,00%	$ 44.800.000
3336	1.3.4.9.3.9.1	Concreto 2	sáb 14/09/24	vie 20/09/24	5 d	$ 67.200.000	0,00%	0,00%	$ 0
3337	**1.3.4.9.3.9.1**	**Tensionamiento**	**lun 27/05/24**	**vie 15/08/25**	**347 d**	**$ 199.232.970**	**28,67%**	**28,67%**	**$ 57.113.451**
3338	1.3.4.9.3.9.1	Etapa 1	lun 27/05/24	sáb 1/06/24	5 d	$ 57.113.451	100,00%	100,00%	$ 57.113.451
3339	1.3.4.9.3.9.1	Etapa 2 de 1	mié 28/05/25	mar 3/06/25	4 d	$ 75.708.529	0,00%	0,00%	$ 0
3340	1.3.4.9.3.9.1	Etapa 2	mar 12/08/25	vie 15/08/25	3 d	$ 66.410.990	0,00%	0,00%	$ 0
3341	1.3.4.9.3.9.1	Izaje de Vigas	vie 20/06/25	sáb 5/07/25	10 d	$ 56.135.240	0,00%	0,00%	$ 0
3342	**1.3.4.9.3.9.2**	**Losa Superior**	**lun 7/07/25**	**jue 24/07/25**	**15 d**	**$ 334.809.087**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3343	1.3.4.9.3.9.2	Obra Falsa	lun 7/07/25	lun 14/07/25	6 d	$ 29.750.399	0,00%	0,00%	$ 0
3344	1.3.4.9.3.9.2	Acero	lun 14/07/25	mié 23/07/25	8 d	$ 181.323.575	0,00%	0,00%	$ 0
3345	1.3.4.9.3.9.2	Concreto	jue 24/07/25	jue 24/07/25	1 d	$ 123.735.113	0,00%	0,00%	$ 0
3346	*1.3.4.9.3.10*	*Fin Luz 5*	*vie 15/08/25*	*vie 15/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3347	**1.3.4.9.3.11**	**LUZ 6 (EJE 6 Y 7)**	**mar 14/05/24**	**lun 21/04/25**	**266,5 d**	**$ 996.986.484**	**18,20%**	**18,20%**	**$ 181.433.540**
3348	**1.3.4.9.3.11.1**	**Vigas Postensadas**	**mar 14/05/24**	**lun 21/04/25**	**266,5 d**	**$ 532.560.135**	**34,07%**	**34,07%**	**$ 181.433.540**
3349	1.3.4.9.3.11.1	Acero	mar 14/05/24	jue 16/05/24	3 d	$ 114.233.540	100,00%	100,00%	$ 114.233.540
3350	1.3.4.9.3.11.1	Acero 2	sáb 27/07/24	jue 15/08/24	15 d	$ 28.558.385	0,00%	0,00%	$ 0
3351	1.3.4.9.3.11.1	Concreto	vie 17/05/24	vie 17/05/24	1 d	$ 67.200.000	100,00%	100,00%	$ 67.200.000
3352	1.3.4.9.3.11.1	Concreto 2	sáb 28/09/24	vie 4/10/24	5 d	$ 67.200.000	0,00%	0,00%	$ 0
3353	**1.3.4.9.3.11.2**	**Tensionamiento**	**vie 4/10/24**	**lun 21/04/25**	**153,5 d**	**$ 199.232.970**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3354	1.3.4.9.3.11.2	Etapa 1	vie 4/10/24	vie 11/10/24	6 d	$ 132.821.980	0,00%	0,00%	$ 0
3355	1.3.4.9.3.11.2	Etapa 2	mar 15/04/25	lun 21/04/25	3 d	$ 66.410.990	0,00%	0,00%	$ 0
3356	1.3.4.9.3.11.2	Izaje vigas	mar 11/03/25	lun 17/03/25	5 d	$ 56.135.240	0,00%	0,00%	$ 0
3357	**1.3.4.9.3.11.3**	**Losa Superior**	**lun 17/03/25**	**vie 28/03/25**	**9 d**	**$ 464.426.349**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3358	1.3.4.9.3.11.3	Obra Falsa	lun 17/03/25	vie 21/03/25	4 d	$ 29.750.399	0,00%	0,00%	$ 0
3359	1.3.4.9.3.11.3	Acero	vie 21/03/25	jue 27/03/25	4 d	$ 187.156.405	0,00%	0,00%	$ 0
3360	1.3.4.9.3.11.3	Concreto	jue 27/03/25	vie 28/03/25	1 d	$ 247.519.545	0,00%	0,00%	$ 0
3361	*1.3.4.9.3.12*	*Fin Luz 6*	*lun 21/04/25*	*lun 21/04/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3362	**1.3.4.9.3.13**	**VIGAS DIAFRAGMA O RIOSTRAS**	**sáb 5/07/25**	**lun 8/09/25**	**51 d**	**$ 94.405.795**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3363	1.3.4.9.3.13.1	Luces 1-2 y 3/3 tablero	vie 25/07/25	mié 13/08/25	15 d	$ 21.610.583	0,00%	0,00%	$ 0
3364	1.3.4.9.3.13.2	Luces 2-3	mié 6/08/25	mié 27/08/25	15 d	$ 17.061.543	0,00%	0,00%	$ 0
3365	1.3.4.9.3.13.3	Luces 3-4	jue 21/08/25	lun 8/09/25	15 d	$ 17.061.543	0,00%	0,00%	$ 0
3366	1.3.4.9.3.13.4	Luces 4-5 y 3/3 tablero	jue 21/08/25	lun 8/09/25	15 d	$ 21.610.583	0,00%	0,00%	$ 0
3367	1.3.4.9.3.13.5	Luces 5-6	sáb 5/07/25	mié 23/07/25	15 d	$ 17.061.543	0,00%	0,00%	$ 0
3368	1.3.4.9.3.14	Mezcla Asfaltica-MD12	jue 25/09/25	mar 7/10/25	10 d	$ 417.947.903	0,00%	0,00%	$ 0
3369	1.3.4.9.3.15	Junta de Expansión Eje 1 y eje 7	sáb 27/09/25	jue 9/10/25	10 d	$ 40.107.147	0,00%	0,00%	$ 0
3370	1.3.4.9.3.16	Baranda Vehicular	jue 9/10/25	vie 31/10/25	17 d	$ 481.111.621	0,00%	0,00%	$ 0
3371	1.3.4.9.3.17	Baranda peatonal	jue 9/10/25	vie 31/10/25	17 d	$ 315.875.355	0,00%	0,00%	$ 0
3372	*1.3.4.9.4*	*Fin de Super Estructura (Prueba de Carga)*	*vie 31/10/25*	*sáb 1/11/25*	*1 d*	*$ 138.462.868*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3373	1.3.4.10	Restitución separador Autopista Norte	mar 7/10/25	sáb 1/11/25	20 d	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0
3374	*1.3.4.11*	*Fin de Puente*	*sáb 1/11/25*	*sáb 1/11/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3375	**1.3.4.12**	**REDES HIDROSANITARIAS**	**mar 15/08/23**	**jue 18/09/25**	**595,25 d**	**$ 1.472.732.752**	**4,83%**	**4,83%**	**$ 71.084.373**
3376	**1.3.4.12.1**	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**mié 16/10/24**	**jue 18/09/25**	**263,25 d**	**$ 1.073.835.437**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3377	**1.3.4.12.1.1**	**CALLE 153 NE**	**jue 20/03/25**	**mié 23/04/25**	**25 d**	**$ 35.620.199**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3378	1.3.4.12.1.1.1	Excavación Boca Calle	vie 21/03/25	mar 25/03/25	2 d	$ 2.098.567	0,00%	0,00%	$ 0
3379	1.3.4.12.1.1.2	Instalación de Tubería (10"-sum) Boca Calle	mar 25/03/25	vie 28/03/25	3 d	$ 3.819.662	0,00%	0,00%	$ 0
3380	1.3.4.12.1.1.3	Sumideros - Anden Boca Calle	vie 28/03/25	mar 8/04/25	8 d	$ 5.422.617	0,00%	0,00%	$ 0
3381	1.3.4.12.1.1.4	Rellenos Boca Calle	vie 28/03/25	mar 1/04/25	3 d	$ 2.062.206	0,00%	0,00%	$ 0
3382	1.3.4.12.1.1.5	Excavación Cll 153	jue 20/03/25	sáb 22/03/25	2 d	$ 3.422.851	0,00%	0,00%	$ 0
3383	1.3.4.12.1.1.6	Instalación de Tubería (10"-sum) Cll 153	sáb 22/03/25	sáb 29/03/25	5 d	$ 5.819.662	0,00%	0,00%	$ 0

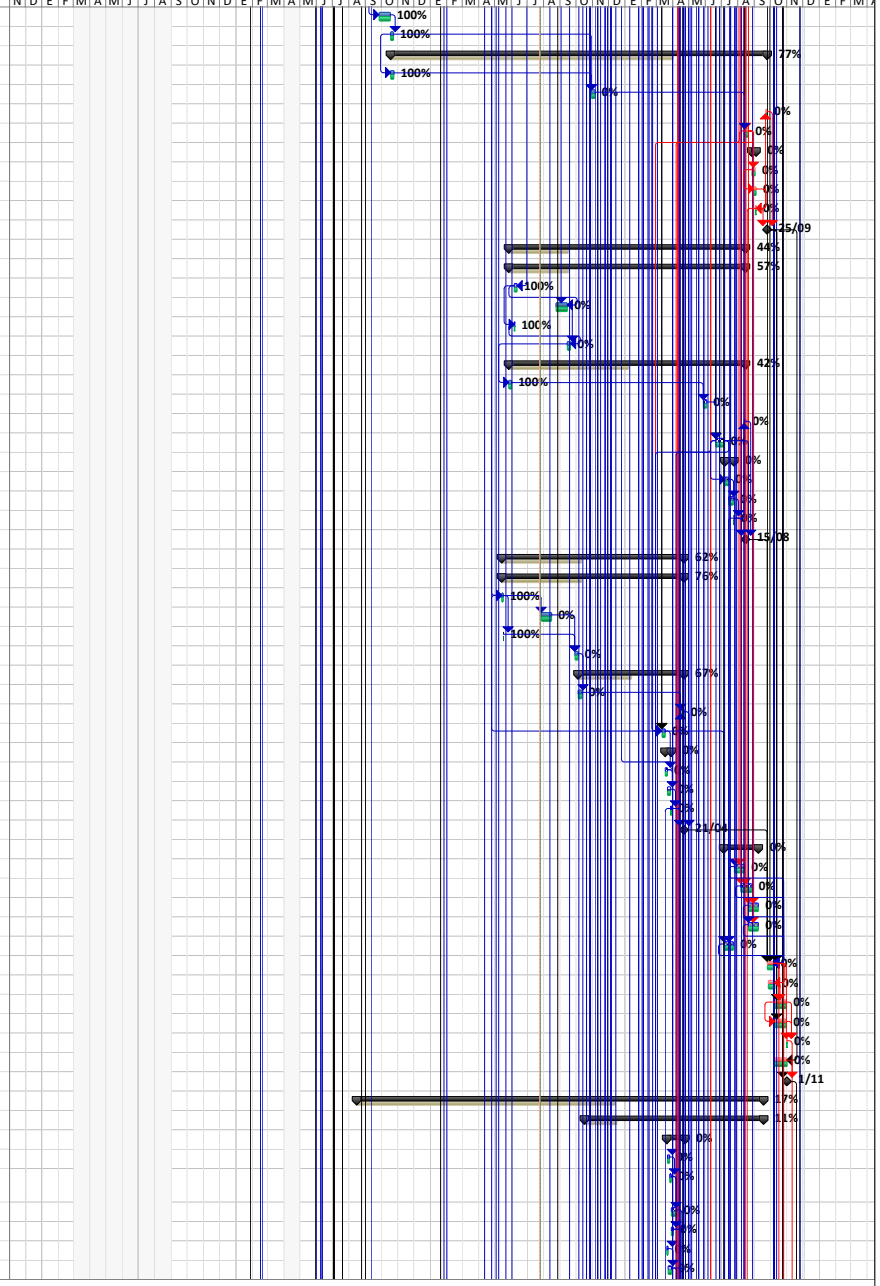


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
3384	1.3.4.12.1.1.	Sumideros - Anden Cll 153	lun 31/03/25	sáb 19/04/25	15 d	$ 5.303.250	0,00%	0,00%	$ 0
3385	1.3.4.12.1.1.	Rellenos Cll 153	sáb 19/04/25	mié 23/04/25	3 d	$ 7.671.384	0,00%	0,00%	$ 0
3386	*1.3.4.12.1.*	*Fin de Calle 153 NE*	*mié 23/04/25*	*mié 23/04/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3387	**1.3.4.12.1.3**	**CONECTANTE NE**	**vie 21/03/25**	**lun 19/05/25**	**44 d**	**$ 81.027.622**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3388	1.3.4.12.1.3.	Excavación	vie 21/03/25	lun 21/04/25	22 d	$ 13.166.371	0,00%	0,00%	$ 0
3389	1.3.4.12.1.3.	Instalación de Tubería (10"-sum)	sáb 22/03/25	lun 31/03/25	6 d	$ 7.339.922	0,00%	0,00%	$ 0
3390	1.3.4.12.1.3.	Sumideros - Anden	mar 25/03/25	sáb 12/04/25	15 d	$ 22.318.109	0,00%	0,00%	$ 0
3391	1.3.4.12.1.3.	Instalación de Tubería (20")	lun 31/03/25	lun 21/04/25	16 d	$ 11.562.921	0,00%	0,00%	$ 0
3392	1.3.4.12.1.3.	Pozo de Inspección	lun 21/04/25	vie 2/05/25	9 d	$ 17.313.483	0,00%	0,00%	$ 0
3393	1.3.4.12.1.3.	Rellenos	lun 21/04/25	lun 19/05/25	22 d	$ 9.326.816	0,00%	0,00%	$ 0
3394	*1.3.4.12.1.*	*Fin de Conectante NE*	*lun 19/05/25*	*lun 19/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3395	**1.3.4.12.1.5**	**CARRIL DE DESACELERACIÓN AUTONORTE NE**	**lun 5/05/25**	**mar 29/07/25**	**67 d**	**$ 179.726.561**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3396	1.3.4.12.1.5.	Excavación de 0-2m	lun 5/05/25	jue 22/05/25	15 d	$ 926.652	0,00%	0,00%	$ 0
3397	1.3.4.12.1.5.	Excavación mayor a 2 m	lun 26/05/25	mar 27/05/25	2 d	$ 5.349.030	0,00%	0,00%	$ 0
3398	1.3.4.12.1.5.	Instalación de Tubería (10"-sum)	jue 22/05/25	jue 5/06/25	10 d	$ 16.650.314	0,00%	0,00%	$ 0
3399	1.3.4.12.1.5.	Sumideros - Anden	jue 5/06/25	sáb 14/06/25	8 d	$ 20.773.887	0,00%	0,00%	$ 0
3400	1.3.4.12.1.5.	Instalación de Tubería (20")	mié 28/05/25	mié 4/06/25	5 d	$ 15.088.648	0,00%	0,00%	$ 0
3401	1.3.4.12.1.5.	Instalación de Tubería (18")	mié 4/06/25	mar 10/06/25	5 d	$ 50.256.418	0,00%	0,00%	$ 0
3402	1.3.4.12.1.5.	Instalación de Tubería (16")	mar 10/06/25	lun 16/06/25	5 d	$ 22.014.340	0,00%	0,00%	$ 0
3403	1.3.4.12.1.5.	Instalación de Tubería (12")	lun 16/06/25	sáb 21/06/25	5 d	$ 27.007.836	0,00%	0,00%	$ 0
3404	1.3.4.12.1.5.	Pozo de Inspección	mar 24/06/25	mié 9/07/25	12 d	$ 12.569.782	0,00%	0,00%	$ 0
3405	1.3.4.12.1.5.	Rellenos	mié 9/07/25	mar 29/07/25	16 d	$ 9.089.654	0,00%	0,00%	$ 0
3406	*1.3.4.12.1.6*	*Fin de Carril de Desaceleración*	*mar 29/07/25*	*mar 29/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3407	**1.3.4.12.1.7**	**OREJA ORIENTAL**	**mié 2/04/25**	**lun 28/04/25**	**20 d**	**$ 76.356.953**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3408	1.3.4.12.1.7.	Demolición Retiro de redes Existentes	mié 2/04/25	lun 14/04/25	10 d	$ 5.341.077	0,00%	0,00%	$ 0
3409	1.3.4.12.1.7.	Carcamo aguas lluvias	lun 14/04/25	lun 28/04/25	10 d	$ 71.015.876	0,00%	0,00%	$ 0
3410	*1.3.4.12.1.8*	*Fin de Oreja Oriental*	*lun 28/04/25*	*lun 28/04/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3411	**1.3.4.12.1.9**	**CALLE 153 NW**	**mié 16/10/24**	**mar 3/12/24**	**37 d**	**$ 50.406.377**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3412	1.3.4.12.1.9.	Excavación 0-2 m	mié 16/10/24	mié 30/10/24	11 d	$ 2.568.332	0,00%	0,00%	$ 0
3413	1.3.4.12.1.9.	Excavación mayor a 2 m	mié 6/11/24	vie 8/11/24	2 d	$ 2.635.868	0,00%	0,00%	$ 0
3414	1.3.4.12.1.9.	Instalación de Tubería (10"-sum)	mié 30/10/24	mié 6/11/24	5 d	$ 5.574.414	0,00%	0,00%	$ 0
3415	1.3.4.12.1.9.	Sumideros - Anden	vie 1/11/24	mié 13/11/24	8 d	$ 5.067.698	0,00%	0,00%	$ 0
3416	1.3.4.12.1.9.	Instalación de Tubería (16")	vie 8/11/24	vie 15/11/24	5 d	$ 15.797.888	0,00%	0,00%	$ 0
3417	1.3.4.12.1.9.	Pozo de Inspección	jue 14/11/24	mié 20/11/24	5 d	$ 8.130.686	0,00%	0,00%	$ 0
3418	1.3.4.12.1.9.	Rellenos	mié 20/11/24	mar 3/12/24	11 d	$ 10.631.491	0,00%	0,00%	$ 0
3419	*1.3.4.12.1.1*	*Fin de Calle 153 NW*	*mar 3/12/24*	*mar 3/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3420	**1.3.4.12.1.1**	**CONECTANTE NW**	**lun 18/11/24**	**jue 9/01/25**	**41 d**	**$ 166.908.496**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3421	1.3.4.12.1.1	Excavación 0-2 m	lun 18/11/24	mié 11/12/24	20 d	$ 2.755.194	0,00%	0,00%	$ 0
3422	1.3.4.12.1.1	Excavación mayor a 2 m	mié 11/12/24	jue 12/12/24	1 d	$ 41.363.942	0,00%	0,00%	$ 0
3423	1.3.4.12.1.1	Instalación de Tubería (10"-sum)	mié 11/12/24	mar 17/12/24	5 d	$ 10.846.744	0,00%	0,00%	$ 0
3424	1.3.4.12.1.1	Sumideros - Anden	jue 12/12/24	jue 9/01/25	20 d	$ 29.047.544	0,00%	0,00%	$ 0
3425	1.3.4.12.1.1	Instalación de Tubería (14")	jue 12/12/24	mar 24/12/24	9 d	$ 27.586.421	0,00%	0,00%	$ 0
3426	1.3.4.12.1.1	Instalación de Tubería (12")	mar 24/12/24	jue 2/01/25	6 d	$ 19.353.041	0,00%	0,00%	$ 0
3427	1.3.4.12.1.1	Pozo de Inspección	lun 16/12/24	vie 27/12/24	9 d	$ 18.971.602	0,00%	0,00%	$ 0
3428	1.3.4.12.1.1	Rellenos	mié 20/11/24	vie 13/12/24	20 d	$ 16.984.008	0,00%	0,00%	$ 0
3429	*1.3.4.12.1.*	*Fin de Conectante NW*	*jue 9/01/25*	*jue 9/01/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3430	**1.3.4.12.1.1**	**CARRIL DE DESACELERACIÓN AUTONORTE NW**	**mié 18/06/25**	**mié 16/07/25**	**21 d**	**$ 148.454.044**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3431	1.3.4.12.1.1	Excavación 0-2 m	mié 18/06/25	sáb 28/06/25	8 d	$ 3.474.451	0,00%	0,00%	$ 0
3432	1.3.4.12.1.1	Excavación mayor a 2 m	mar 1/07/25	mar 1/07/25	1 d	$ 21.411.977	0,00%	0,00%	$ 0
3433	1.3.4.12.1.1	Instalación de Tubería (10"-sum)	mar 1/07/25	lun 7/07/25	5 d	$ 13.251.330	0,00%	0,00%	$ 0
3434	1.3.4.12.1.1	Sumideros - Anden	lun 7/07/25	sáb 12/07/25	5 d	$ 10.652.221	0,00%	0,00%	$ 0
3435	1.3.4.12.1.1	Caja de Aguas Lluvias	lun 7/07/25	mié 16/07/25	8 d	$ 3.320.556	0,00%	0,00%	$ 0
3436	1.3.4.12.1.1	Carcamo de Aguas lluvias	lun 7/07/25	mié 16/07/25	8 d	$ 67.105.868	0,00%	0,00%	$ 0
3437	1.3.4.12.1.1	Instalación de Tubería (12")	mié 2/07/25	mar 8/07/25	5 d	$ 10.192.374	0,00%	0,00%	$ 0
3438	1.3.4.12.1.1	Pozo de Inspección	mié 2/07/25	mié 9/07/25	6 d	$ 13.703.345	0,00%	0,00%	$ 0
3439	1.3.4.12.1.1	Rellenos	mar 24/06/25	sáb 12/07/25	14 d	$ 5.341.922	0,00%	0,00%	$ 0
3440	*1.3.4.12.1.*	*Fin de Carril de Desaceleración*	*mié 16/07/25*	*mié 16/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3441	**1.3.4.12.1.1**	**PUENTE VEHICULAR - EJE 2**	**vie 29/08/25**	**mié 3/09/25**	**4 d**	**$ 5.215.404**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3442	1.3.4.12.1.1	Demolición Retiro de redes Existentes	vie 29/08/25	mié 3/09/25	4 d	$ 5.215.404	0,00%	0,00%	$ 0
3443	*1.3.4.12.1.1*	*Fin de Eje 2*	*mié 3/09/25*	*mié 3/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3444	**1.3.4.12.1.1**	**PUENTE VEHICULAR - EJE 3**	**mar 29/04/25**	**jue 18/09/25**	**112 d**	**$ 119.089.015**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3445	1.3.4.12.1.1	Demolición	mar 29/04/25	jue 29/05/25	25 d	$ 11.356.703	0,00%	0,00%	$ 0
3446	1.3.4.12.1.1	Excavación	vie 30/05/25	jue 3/07/25	25 d	$ 5.105.215	0,00%	0,00%	$ 0
3447	1.3.4.12.1.1	Entibado	jue 3/07/25	sáb 2/08/25	25 d	$ 25.678.234	0,00%	0,00%	$ 0
3448	1.3.4.12.1.1	Instalación de Tubería (24")	jue 3/07/25	sáb 2/08/25	25 d	$ 32.711.801	0,00%	0,00%	$ 0

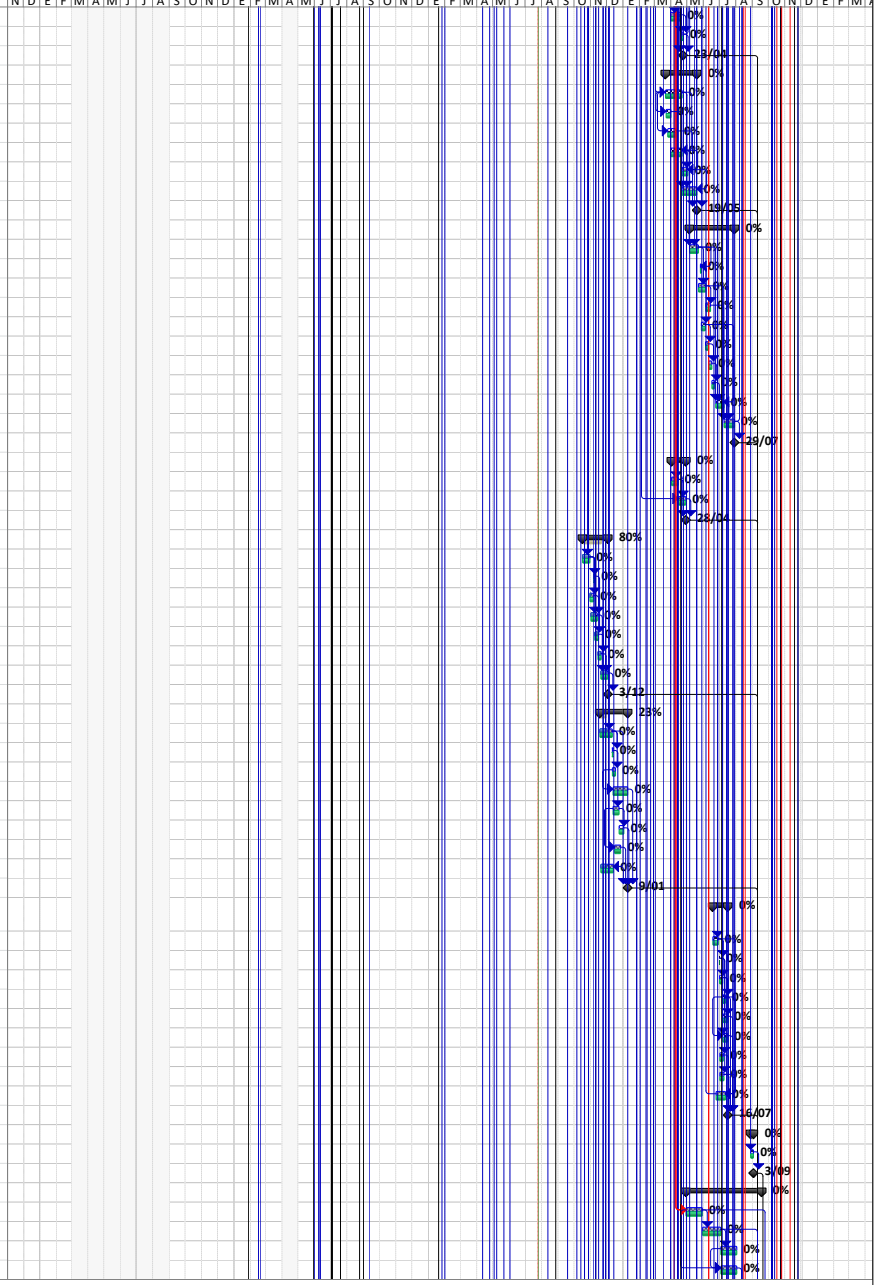

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
3449	1.3.4.12.1.1.7	Reposición lozas	mar 12/08/25	jue 18/09/25	30 d	$ 22.999.113	0,00%	0,00%	$ 0
3450	1.3.4.12.1.1.7	Pozo de Inspección	sáb 2/08/25	jue 4/09/25	25 d	$ 10.852.128	0,00%	0,00%	$ 0
3451	1.3.4.12.1.1.7	Rellenos	mar 5/08/25	sáb 6/09/25	25 d	$ 10.385.821	0,00%	0,00%	$ 0
3452	*1.3.4.12.1...*	*Fin de Eje 3*	*jue 18/09/25*	*jue 18/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3453	**1.3.4.12.1.1**	**PUENTE VEHICULAR - EJE 5**	**mar 18/03/25**	**vie 29/08/25**	**127 d**	**$ 211.030.766**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3454	1.3.4.12.1.1	Demolición	mar 18/03/25	vie 11/04/25	20 d	$ 3.679.659	0,00%	0,00%	$ 0
3455	1.3.4.12.1.1	Excavación	mar 1/04/25	sáb 10/05/25	30 d	$ 14.396.450	0,00%	0,00%	$ 0
3456	1.3.4.12.1.1	Entibado	sáb 10/05/25	mié 2/07/25	40 d	$ 45.259.779	0,00%	0,00%	$ 0
3457	1.3.4.12.1.1	Instalación de Tubería (36")	dom 13/04/25	jue 5/06/25	40 d	$ 91.698.735	0,00%	0,00%	$ 0
3458	1.3.4.12.1.1	Reposición de lozas	jue 5/06/25	sáb 26/07/25	40 d	$ 41.303.561	0,00%	0,00%	$ 0
3459	1.3.4.12.1.1	Pozo de Inspección	sáb 31/05/25	mié 23/07/25	40 d	$ 5.357.611	0,00%	0,00%	$ 0
3460	1.3.4.12.1.1	Rellenos	mar 22/07/25	vie 29/08/25	30 d	$ 9.334.971	0,00%	0,00%	$ 0
3461	*1.3.4.12.1...*	*Fin de Eje 5*	*vie 29/08/25*	*vie 29/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3462	*1.3.4.12.2*	*Fin de Alcantarillado Pluvial*	*jue 18/09/25*	*jue 18/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3463	**1.3.4.12.3**	**ALCANTARILLADO SANITARIO**	**mar 4/03/25**	**sáb 19/04/25**	**36 d**	**$ 57.941.424**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3464	**1.3.4.12.3.1**	**CALLE 153 NE**	**mar 4/03/25**	**mar 1/04/25**	**23 d**	**$ 39.407.925**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3465	1.3.4.12.3.1...	Excavación de 0-2 m Boca Calle	vie 21/03/25	mar 25/03/25	2 d	$ 2.054.800	0,00%	0,00%	$ 0
3466	1.3.4.12.3.1...	Demolición pozo existente	vie 21/03/25	mar 25/03/25	2 d	$ 756.850	0,00%	0,00%	$ 0
3467	1.3.4.12.3.1...	Demolición Red existente	vie 21/03/25	mar 25/03/25	2 d	$ 756.850	0,00%	0,00%	$ 0
3468	1.3.4.12.3.1...	Excavación mayor a 2 m Boca Calle	mar 25/03/25	jue 27/03/25	2 d	$ 1.513.700	0,00%	0,00%	$ 0
3469	1.3.4.12.3.1...	Instalación de Tubería (8") Boca Calle	jue 27/03/25	sáb 29/03/25	2 d	$ 3.104.536	0,00%	0,00%	$ 0
3470	1.3.4.12.3.1...	Rellenos Boca Calle	lun 31/03/25	mar 1/04/25	2 d	$ 1.803.417	0,00%	0,00%	$ 0
3471	1.3.4.12.3.1...	Excavación de 0-2 m Cll 153	mar 4/03/25	lun 10/03/25	5 d	$ 2.541.100	0,00%	0,00%	$ 0
3472	1.3.4.12.3.1...	Conexión a predio	vie 21/03/25	mié 26/03/25	3 d	$ 196.370	0,00%	0,00%	$ 0
3473	1.3.4.12.3.1...	Excavación mayor a 2 m Cll 153	lun 10/03/25	mié 12/03/25	2 d	$ 3.513.700	0,00%	0,00%	$ 0
3474	1.3.4.12.3.1...	Instalación de Tubería (8") Cll 153	mié 12/03/25	mar 18/03/25	5 d	$ 12.980.355	0,00%	0,00%	$ 0
3475	1.3.4.12.3.1...	Pozo de Inspección Cll 153	mié 12/03/25	sáb 15/03/25	3 d	$ 4.382.830	0,00%	0,00%	$ 0
3476	1.3.4.12.3.1...	Rellenos Cll 153	mar 18/03/25	vie 28/03/25	8 d	$ 5.803.417	0,00%	0,00%	$ 0
3477	*1.3.4.12.3...*	*Fin de Calle 153 NE*	*mar 1/04/25*	*mar 1/04/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3478	**1.3.4.12.3.3**	**CONECTANTE NE**	**vie 11/04/25**	**sáb 19/04/25**	**5 d**	**$ 18.533.499**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3479	1.3.4.12.3.3...	Excavación de 0-2 m	vie 11/04/25	mié 16/04/25	4 d	$ 3.730.564	0,00%	0,00%	$ 0
3480	1.3.4.12.3.3...	Excavación mayor a 2 m	sáb 12/04/25	sáb 19/04/25	4 d	$ 2.705.074	0,00%	0,00%	$ 0
3481	1.3.4.12.3.3...	Instalación de Tubería (8")	sáb 12/04/25	sáb 19/04/25	4 d	$ 6.902.846	0,00%	0,00%	$ 0
3482	1.3.4.12.3.3...	Rellenos	sáb 12/04/25	sáb 19/04/25	4 d	$ 5.195.015	0,00%	0,00%	$ 0
3483	*1.3.4.12.3.4*	*Fin de Conectante NE*	*sáb 19/04/25*	*sáb 19/04/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3484	*1.3.4.12.4*	*Fin de Alcantarillado Sanitario*	*sáb 19/04/25*	*sáb 19/04/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3485	**1.3.4.12.5**	**ACUEDUCTO**	**mar 15/08/23**	**vie 23/05/25**	**503,25 d**	**$ 340.955.891**	**20,85%**	**20,85%**	**$ 71.084.373**
3486	**1.3.4.12.5.1**	**CALLE 153 NE - INICIO CONECTANTE NW**	**vie 11/04/25**	**lun 19/05/25**	**28 d**	**$ 46.864.475**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3487	1.3.4.12.5.1...	Excavación	vie 11/04/25	mar 22/04/25	7 d	$ 9.176.772	0,00%	0,00%	$ 0
3488	1.3.4.12.5.1...	Instalación de Tubería (6")	mar 22/04/25	vie 25/04/25	3 d	$ 16.903.893	0,00%	0,00%	$ 0
3489	*1.3.4.12.5.1...*	*Solicitud de Empalme a EAAB*	*vie 9/05/25*	*vie 9/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3490	1.3.4.12.5.1...	Empalme de Tubería a existente (6")	vie 9/05/25	sáb 10/05/25	1 d	$ 1.696.685	0,00%	0,00%	$ 0
3491	1.3.4.12.5.1...	Rellenos	sáb 10/05/25	lun 19/05/25	7 d	$ 19.087.125	0,00%	0,00%	$ 0
3492	*1.3.4.12.5...*	*Fin Calle 153 NE - Conectante NW*	*lun 19/05/25*	*lun 19/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3493	**1.3.4.12.5.3**	**CONECTANTE NE - ESQUINA AUTONORTE**	**lun 28/04/25**	**vie 23/05/25**	**21 d**	**$ 19.737.014**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3494	1.3.4.12.5.3...	Excavación	lun 28/04/25	lun 28/04/25	1 d	$ 1.856.473	0,00%	0,00%	$ 0
3495	1.3.4.12.5.3...	Instalación de Tubería (6")	mar 29/04/25	mié 30/04/25	2 d	$ 7.327.322	0,00%	0,00%	$ 0
3496	*1.3.4.12.5.3...*	*Solicitud de Empalme a EAAB*	*mar 20/05/25*	*mar 20/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3497	1.3.4.12.5.3...	Empalme de Tubería a existente (6")	mar 20/05/25	mié 21/05/25	1 d	$ 5.090.055	0,00%	0,00%	$ 0
3498	1.3.4.12.5.3...	Rellenos	mié 21/05/25	vie 23/05/25	2 d	$ 5.463.164	0,00%	0,00%	$ 0
3499	*1.3.4.12.5.4*	*Fin Conectante NE*	*vie 23/05/25*	*vie 23/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3500	**1.3.4.12.5.5**	**CALLE 153 NW**	**vie 18/10/24**	**jue 21/11/24**	**26 d**	**$ 147.885.509**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3501	1.3.4.12.5.5...	Excavación	vie 18/10/24	mar 29/10/24	8 d	$ 15.327.898	0,00%	0,00%	$ 0
3502	1.3.4.12.5.5...	Instalación de Tubería (12"-PVC)	mar 29/10/24	mar 5/11/24	5 d	$ 79.715.117	0,00%	0,00%	$ 0
3503	1.3.4.12.5.5...	Instalación de Tubería (12"-HA)	mar 5/11/24	jue 7/11/24	2 d	$ 30.741.737	0,00%	0,00%	$ 0
3504	*1.3.4.12.5.5...*	*Solicitud de Empalme a EAAB*	*jue 14/11/24*	*jue 14/11/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3505	1.3.4.12.5.5...	Empalme de Tubería a existente (12")	jue 14/11/24	vie 15/11/24	1 d	$ 1.986.119	0,00%	0,00%	$ 0
3506	1.3.4.12.5.5...	Rellenos	vie 15/11/24	jue 21/11/24	5 d	$ 20.114.638	0,00%	0,00%	$ 0
3507	*1.3.4.12.5.6*	*Fin Conectante NE*	*jue 21/11/24*	*jue 21/11/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3508	**1.3.4.12.5.7**	**CONECTANTE NW - ESQUINA AUTONORTE**	**vie 15/11/24**	**lun 9/12/24**	**19 d**	**$ 31.192.260**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3509	1.3.4.12.5.7...	Excavación	vie 15/11/24	jue 21/11/24	5 d	$ 5.262.001	0,00%	0,00%	$ 0
3510	1.3.4.12.5.7...	Instalación de Tubería (12"-HA)	vie 22/11/24	lun 25/11/24	2 d	$ 10.185.894	0,00%	0,00%	$ 0
3511	*1.3.4.12.5.7...*	*Solicitud de Empalme a EAAB*	*sáb 30/11/24*	*sáb 30/11/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3512	1.3.4.12.5.7...	Empalme de Tubería a existente (12")	sáb 30/11/24	lun 2/12/24	1 d	$ 5.244.895	0,00%	0,00%	$ 0
3513	1.3.4.12.5.7...	Rellenos	lun 2/12/24	lun 9/12/24	6 d	$ 10.499.470	0,00%	0,00%	$ 0
3514	*1.3.4.12.5.8*	*Fin Conectante NW*	*lun 9/12/24*	*lun 9/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*

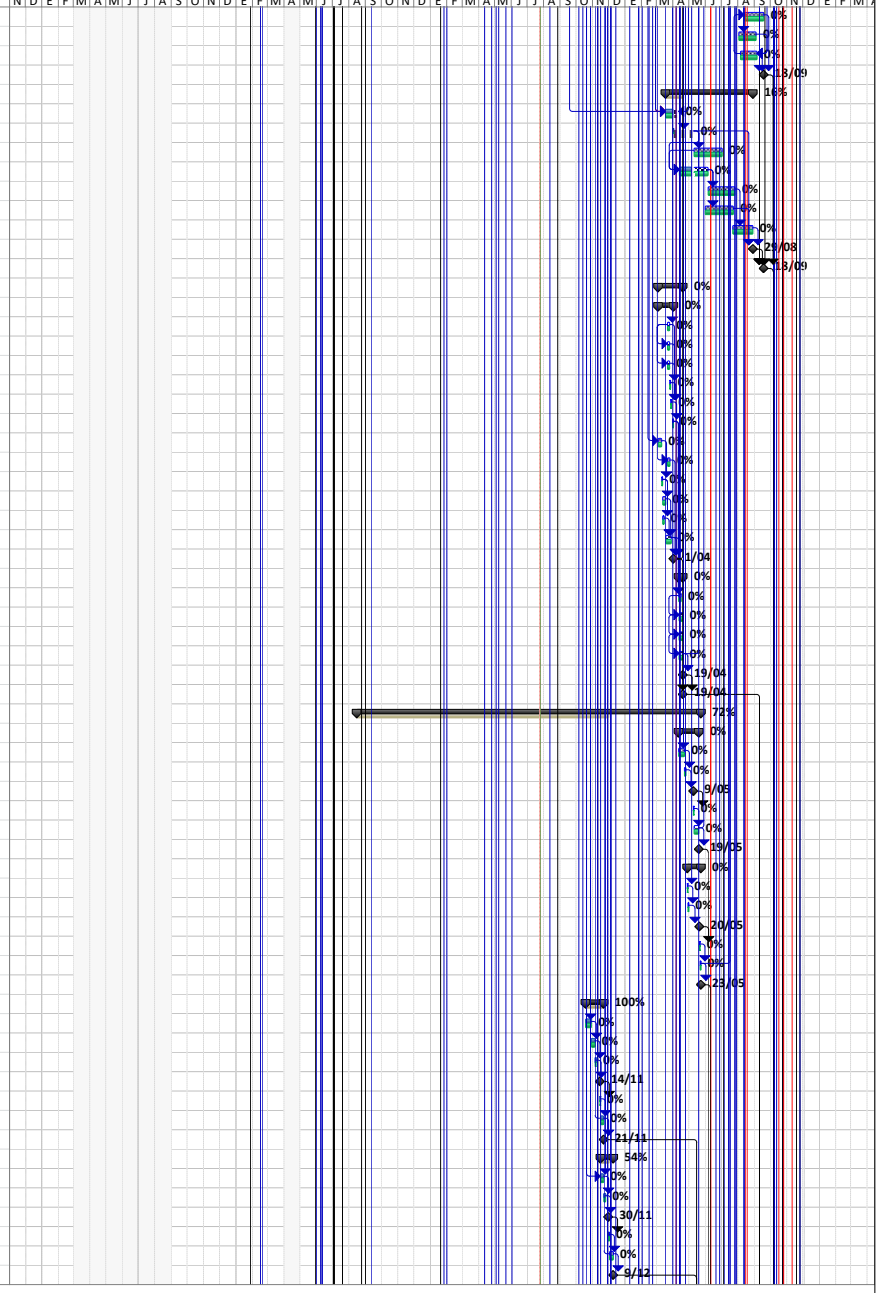


Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB9(V1 20240718)v2


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
3515	**1.3.4.12.5.9**	**RAMAL DE TRANSICIÓN NW**	**vie 27/09/24**	**jue 10/10/24**	**11 d**	**$ 24.192.260**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3516	1.3.4.12.5.9.	Excavación	vie 27/09/24	vie 27/09/24	1 d	$ 2.262.001	0,00%	0,00%	$ 0
3517	1.3.4.12.5.9.	Instalación de Tubería (12"-HA)	sáb 28/09/24	mar 1/10/24	2 d	$ 10.185.894	0,00%	0,00%	$ 0
3518	*1.3.4.12.5.9.*	*Solicitud de Empalme a EAAB*	*lun 7/10/24*	*lun 7/10/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3519	1.3.4.12.5.9.	Empalme de Tubería a existente (12")	lun 7/10/24	mar 8/10/24	1 d	$ 5.244.895	0,00%	0,00%	$ 0
3520	1.3.4.12.5.9.	Rellenos	mar 8/10/24	jue 10/10/24	2 d	$ 6.499.470	0,00%	0,00%	$ 0
3521	*1.3.4.12.5.*	*Fin Ramal Transición NW*	*jue 10/10/24*	*jue 10/10/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3522	**1.3.4.12.5.1**	**PUENTE VEHICULAR - EJE 6**	**mar 15/08/23**	**mié 25/10/23**	**56 d**	**$ 71.084.373**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 71.084.373**
3523	1.3.4.12.5.1	Excavación Bajo puente existente	mié 6/09/23	mié 13/09/23	6 d	$ 5.129.790	100,00%	100,00%	$ 5.129.790
3524	1.3.4.12.5.1	Excavación Paralela a cimentación nueva	mié 13/09/23	mié 20/09/23	6 d	$ 3.697.271	100,00%	100,00%	$ 3.697.271
3525	1.3.4.12.5.1	Instalación de Tubería (12")	mié 20/09/23	vie 22/09/23	3 d	$ 46.361.632	100,00%	100,00%	$ 46.361.632
3526	*1.3.4.12.5.1*	*Solicitud de Empalme a EAAB*	*vie 22/09/23*	*vie 22/09/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3527	1.3.4.12.5.1	Empalme de Tubería a existente (12")	sáb 23/09/23	lun 25/09/23	1 d	$ 5.180.146	100,00%	100,00%	$ 5.180.146
3528	1.3.4.12.5.1	Rellenos Según normal NP-040 EAAB Atraque	mar 15/08/23	mar 22/08/23	5 d	$ 3.404.532	100,00%	100,00%	$ 3.404.532
3529	1.3.4.12.5.1	Rellenos Según normal NP-040 EAAB Relleno	lun 25/09/23	mié 25/10/23	24 d	$ 7.311.002	100,00%	100,00%	$ 7.311.002
3530	*1.3.4.12.5.*	*Fin Calle 153 NE - Conectante NW*	*mié 25/10/23*	*mié 25/10/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3531	*1.3.4.12.6*	*Fin de Acueducto*	*vie 23/05/25*	*vie 23/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3532	*1.3.4.13*	*Fin de Redes Hidrosanitarias*	*jue 18/09/25*	*jue 18/09/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3533	**1.3.4.14**	**REDES SECAS**	**sáb 28/01/23**	**sáb 1/11/25**	**757 d**	**$ 1.272.949.507**	**17,54%**	**19,55%**	**$ 223.326.686**
3534	**1.3.4.14.1**	**GAS NATURAL (VANTI)**	**jue 16/02/23**	**sáb 10/05/25**	**603,75 d**	**$ 9.529.126**	**67,69%**	**67,69%**	**$ 6.450.661**
3535	**1.3.4.14.1.1**	**PUENTE VEHICULAR - EJE 2 (HASTA CONEXIÓN EN CONECTAN NE)**	**jue 16/02/23**	**sáb 10/05/25**	**603,75 d**	**$ 5.832.297**	**55,89%**	**55,89%**	**$ 3.259.933**
3536	1.3.4.14.1.1.	Excavación Bajo puente existente	jue 16/02/23	mar 28/02/23	11 d	$ 1.893.112	100,00%	100,00%	$ 1.893.112
3537	*1.3.4.14.1.1.*	*Maniobra de Instalación (PE-2") puente existente*	*mar 28/02/23*	*mar 28/02/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3538	1.3.4.14.1.1.	Relleno puente existente	mié 1/03/23	mié 1/03/23	1 d	$ 1.366.821	100,00%	100,00%	$ 1.366.821
3539	1.3.4.14.1.1.	Excavación Paso Bajo Oreja	lun 14/04/25	mar 29/04/25	11 d	$ 671.892	0,00%	0,00%	$ 0
3540	*1.3.4.14.1.1.*	*Maniobra de Instalación (PE-2") Paso Bajo Oreja*	*vie 9/05/25*	*vie 9/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3541	1.3.4.14.1.1.	Relleno Paso Bajo Oreja	vie 9/05/25	sáb 10/05/25	1 d	$ 1.900.472	0,00%	0,00%	$ 0
3542	*1.3.4.14.1.2*	*Fin de Eje 2*	*sáb 10/05/25*	*sáb 10/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3543	**1.3.4.14.1.3**	**PUENTE VEHICULAR - EJE 6**	**jue 9/03/23**	**mié 5/03/25**	**535,75 d**	**$ 3.696.829**	**86,31%**	**86,31%**	**$ 3.190.728**
3544	1.3.4.14.1.3.	Excavación Bajo puente existente	jue 9/03/23	jue 23/03/23	12 d	$ 1.889.742	100,00%	100,00%	$ 1.889.742
3545	*1.3.4.14.1.3.*	*Maniobra de Instalación (PE-3") Bajo puente existente*	*sáb 6/05/23*	*sáb 6/05/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3546	1.3.4.14.1.3.	Relleno Bajo puente existente	lun 8/05/23	mar 9/05/23	2 d	$ 1.300.986	100,00%	100,00%	$ 1.300.986
3547	*1.3.4.14.1.3.*	*Excavación Paso Bajo Oreja*	*lun 24/02/25*	*lun 24/02/25*	*0 d*	*$ 361.379*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3548	*1.3.4.14.1.3.*	*Maniobra de Instalación (PE-3") Paso Bajo Oreja*	*mié 5/03/25*	*mié 5/03/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3549	*1.3.4.14.1.3.*	*Relleno Paso Bajo Oreja*	*mié 5/03/25*	*mié 5/03/25*	*0 d*	*$ 144.722*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3550	*1.3.4.14.1.4*	*Fin de Eje 7*	*mié 5/03/25*	*mié 5/03/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3551	*1.3.4.14.2*	*Fin de Gas Natural*	*sáb 10/05/25*	*sáb 10/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3552	**1.3.4.14.3**	**ETB**	**sáb 28/01/23**	**vie 25/07/25**	**679 d**	**$ 372.924.741**	**12,59%**	**11,29%**	**$ 46.965.583**
3553	**1.3.4.14.3.1**	**CALLE 153 NE**	**vie 2/05/25**	**mar 20/05/25**	**15 d**	**$ 10.294.937**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3554	1.3.4.14.3.1.	Renivelación de Camaras	vie 2/05/25	mar 20/05/25	15 d	$ 10.294.937	0,00%	0,00%	$ 0
3555	*1.3.4.14.3.*	*Fin de Calle 153 NE*	*mar 20/05/25*	*mar 20/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3556	**1.3.4.14.3.3**	**CONECTANTE NE**	**mar 8/07/25**	**vie 25/07/25**	**15 d**	**$ 24.873.404**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3557	1.3.4.14.3.3.	Renivelación de Camaras	mar 8/07/25	vie 25/07/25	15 d	$ 24.873.404	0,00%	0,00%	$ 0
3558	*1.3.4.14.3.*	*Fin de Conectante NE*	*vie 25/07/25*	*vie 25/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3559	**1.3.4.14.3.5**	**OREJA ORIENTAL**	**vie 16/06/23**	**vie 9/05/25**	**535,75 d**	**$ 91.730.034**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3560	1.3.4.14.3.5.	Excavación	lun 14/04/25	mar 22/04/25	5 d	$ 13.081.489	0,00%	0,00%	$ 0
3561	1.3.4.14.3.5.	Demolición	mar 22/04/25	sáb 26/04/25	4 d	$ 1.027.371	0,00%	0,00%	$ 0
3562	1.3.4.14.3.5.	Instalación de Tubería (12d4")	mar 22/04/25	vie 2/05/25	8 d	$ 45.939.909	0,00%	0,00%	$ 0
3563	1.3.4.14.3.5.	Camaras	mar 22/04/25	mar 6/05/25	10 d	$ 4.268.210	0,00%	0,00%	$ 0
3564	*1.3.4.14.3.5.*	*Retiro de red existente-Maniobras ETB*	*vie 16/06/23*	*vie 16/06/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3565	1.3.4.14.3.5.	Rellenos	mar 6/05/25	vie 9/05/25	3 d	$ 27.413.055	0,00%	0,00%	$ 0
3566	*1.3.4.14.3.*	*Fin de Oreja Oriental*	*vie 9/05/25*	*vie 9/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3567	**1.3.4.14.3.7**	**PUENTE VEHICULAR EJE 2- ESPACIO PÚBLICO BAJO PUENTE**	**sáb 28/01/23**	**jue 6/02/25**	**547 d**	**$ 68.993.783**	**68,07%**	**61,01%**	**$ 46.965.583**
3568	1.3.4.14.3.7.	Excavación Bajo puente Existente	sáb 28/01/23	mié 1/02/23	4 d	$ 109.661	100,00%	100,00%	$ 109.661
3569	1.3.4.14.3.7.	Excavación Paralelo a cimentación nueva	mar 30/05/23	sáb 3/06/23	5 d	$ 118.799	100,00%	100,00%	$ 118.799
3570	1.3.4.14.3.7.	Demolición Bajo puente Existente	sáb 17/06/23	mié 21/06/23	3 d	$ 878.952	100,00%	100,00%	$ 878.952
3571	1.3.4.14.3.7.	Instalación de Tubería (12d4") Bajo puente Existente	lun 5/06/23	jue 8/06/23	4 d	$ 8.414.256	100,00%	100,00%	$ 8.414.256
3572	1.3.4.14.3.7.	Camaras Bajo puente Existente	lun 5/06/23	mié 14/06/23	8 d	$ 6.116.456	100,00%	100,00%	$ 6.116.456
3573	*1.3.4.14.3.7.*	*Retiro de red existente-Maniobras ETB Bajo puente Existente*	*vie 16/06/23*	*vie 16/06/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*

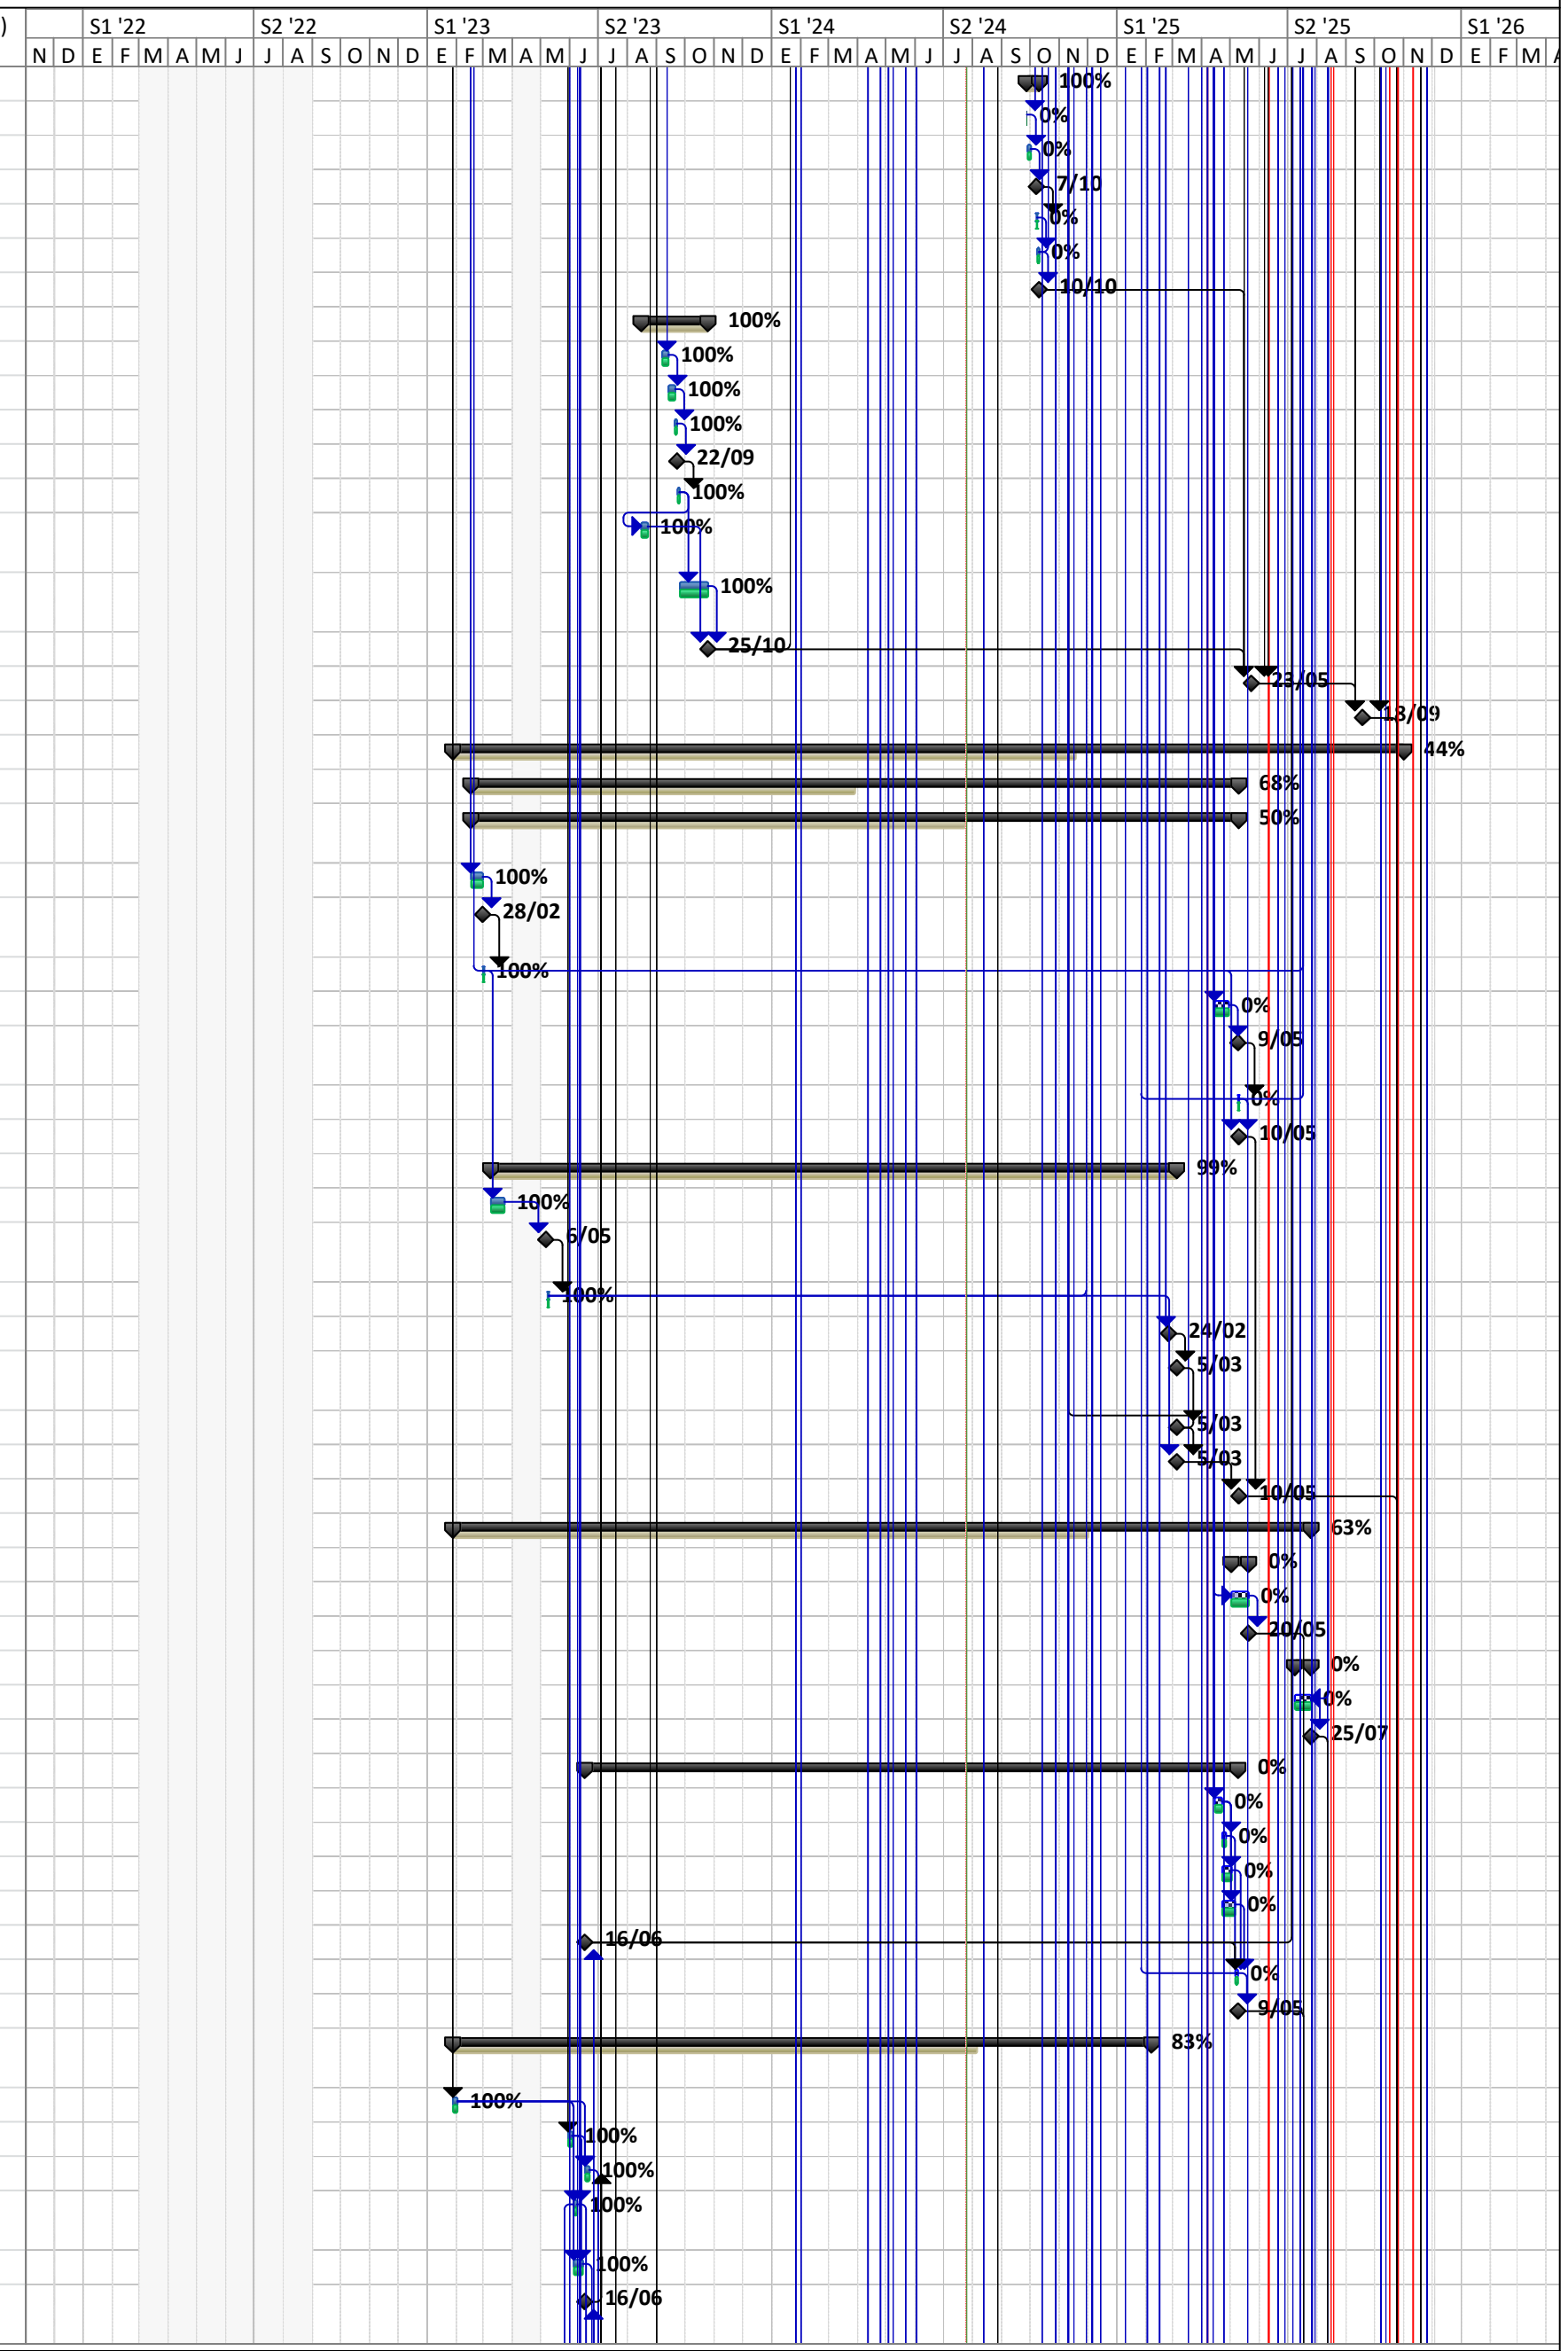

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas		División		Sólo fin		Hito de línea base		Resumen manual		Tarea inactiva	
División crítica		Progreso de tarea		Sólo duración		Hito		Resumen del proyecto		Hito inactivo	
Progreso de tarea crítica		Tarea manual		Línea base		Progreso del resumen		Tareas externas		Resumen inactivo	
Tarea		Sólo el comienzo		División de la línea base		Resumen		Hito externo		Fecha límite	


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
3574	1.3.4.14.3.7.	Rellenos Bajo puente Existente	jue 22/06/23	mar 27/06/23	5 d	$ 326.081	100,00%	100,00%	$ 326.081
3575	1.3.4.14.3.7.	Rellenos Paralelo a cimentación nueva	lun 10/06/24	lun 17/06/24	5 d	$ 10.802.228	100,00%	100,00%	$ 10.802.228
3576	*1.3.4.14.3.7.*	*Aprobación ampliación limite de intervención*	*jue 8/06/23*	*jue 8/06/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3577	1.3.4.14.3.7.	Excavación Paso bajo Oreja	vie 9/06/23	mar 13/06/23	3 d	$ 95.953	100,00%	0,00%	$ 95.953
3578	1.3.4.14.3.7.	Excavación Paso de via	lun 10/06/24	jue 13/06/24	3 d	$ 13.474.316	100,00%	100,00%	$ 13.474.316
3579	1.3.4.14.3.7.	Demolición Paso bajo Oreja	sáb 17/06/23	mar 20/06/23	2 d	$ 410.178	100,00%	0,00%	$ 410.178
3580	1.3.4.14.3.7.	Demolición Paso de via	mié 24/07/24	jue 25/07/24	2 d	$ 1.449.200	0,00%	100,00%	$ 0
3581	1.3.4.14.3.7.	Instalación de Tubería (12d4") Paso bajo Oreja	mié 14/06/23	vie 16/06/23	3 d	$ 4.417.484	100,00%	0,00%	$ 4.417.484
3582	1.3.4.14.3.7.	Instalación de Tubería (12d4") Paso de via	jue 30/01/25	lun 3/02/25	3 d	$ 1.192.700	0,00%	0,00%	$ 0
3583	1.3.4.14.3.7.	Camaras Paso bajo Oreja	mié 14/06/23	vie 16/06/23	3 d	$ 1.400.000	100,00%	0,00%	$ 1.400.000
3584	1.3.4.14.3.7.	Camaras Paso de via	mar 4/02/25	jue 6/02/25	3 d	$ 7.317.393	0,00%	0,00%	$ 0
3585	*1.3.4.14.3.7.*	*Retiro de red existente-Maniobras ETB Paso bajo Oreja*	*vie 16/06/23*	*vie 16/06/23*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3586	1.3.4.14.3.7.	Rellenos Paso bajo Oreja	mié 21/06/23	vie 23/06/23	3 d	$ 195.649	100,00%	100,00%	$ 195.649
3587	1.3.4.14.3.7.	Rellenos Paso de via	mar 4/02/25	jue 6/02/25	3 d	$ 10.802.228	0,00%	0,00%	$ 0
3588	1.3.4.14.3.7.	Reparación de muros de camaras Paso bajo Oreja	sáb 24/06/23	lun 26/06/23	2 d	$ 205.570	100,00%	100,00%	$ 205.570
3589	1.3.4.14.3.7.	Reparación de muros de camaras Paso de via	mar 4/02/25	mié 5/02/25	2 d	$ 1.266.680	0,00%	0,00%	$ 0
3590	*1.3.4.14.3.8*	*Fin de Eje 2*	*mié 5/02/25*	*mié 5/02/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3591	**1.3.4.14.3.9**	**CALLE 153 NW**	**vie 18/10/24**	**jue 5/12/24**	**37 d**	**$ 12.654.277**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3592	1.3.4.14.3.9.	Excavación	vie 18/10/24	jue 7/11/24	15 d	$ 1.281.746	0,00%	0,00%	$ 0
3593	1.3.4.14.3.9.	Demolición	jue 28/11/24	jue 5/12/24	6 d	$ 1.149.902	0,00%	0,00%	$ 0
3594	1.3.4.14.3.9.	Instalación de Tubería (8d4")	vie 25/10/24	mar 12/11/24	13 d	$ 886.676	0,00%	0,00%	$ 0
3595	1.3.4.14.3.9.	Construcción carcamos	lun 28/10/24	vie 1/11/24	4 d	$ 886.676	0,00%	0,00%	$ 0
3596	1.3.4.14.3.9.	Camaras	mar 12/11/24	mié 27/11/24	12 d	$ 7.594.713	0,00%	0,00%	$ 0
3597	1.3.4.14.3.9.	Retiro de red existente-Maniobras ETB	mié 27/11/24	jue 28/11/24	1 d	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0
3598	1.3.4.14.3.9.	Rellenos	jue 28/11/24	jue 5/12/24	6 d	$ 854.564	0,00%	0,00%	$ 0
3599	*1.3.4.14.3.1…*	*Fin de calle 153 NW*	*jue 5/12/24*	*jue 5/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3600	**1.3.4.14.3.1…**	**CALLE 153 NW-APROCHE OCCIDENTAL**	**jue 25/07/24**	**mié 11/09/24**	**37,25 d**	**$ 50.565.326**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3601	1.3.4.14.3.1…	Excavación	mar 13/08/24	lun 26/08/24	10 d	$ 11.262.984	0,00%	0,00%	$ 0
3602	1.3.4.14.3.1…	Demolición	mar 27/08/24	lun 2/09/24	5 d	$ 1.027.371	0,00%	0,00%	$ 0
3603	1.3.4.14.3.1…	Instalación de Tubería (8d4")	mié 28/08/24	lun 9/09/24	10 d	$ 16.274.276	0,00%	0,00%	$ 0
3604	1.3.4.14.3.1…	Camaras	mié 28/08/24	mar 3/09/24	5 d	$ 13.458.691	0,00%	0,00%	$ 0
3605	*1.3.4.14.3.1…*	*Retiro de red existente-Maniobras ETB*	*jue 25/07/24*	*jue 25/07/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3606	1.3.4.14.3.1…	Rellenos	vie 30/08/24	mié 11/09/24	10 d	$ 8.542.004	0,00%	0,00%	$ 0
3607	*1.3.4.14.3.…*	*Fin de calle 153 NW*	*mié 11/09/24*	*mié 11/09/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3608	**1.3.4.14.3.1…**	**CONECTANTE NW**	**lun 18/11/24**	**mar 14/01/25**	**45 d**	**$ 48.200.402**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3609	1.3.4.14.3.1…	Renivelación de Camaras	mar 7/01/25	mar 14/01/25	6 d	$ 10.323.184	0,00%	0,00%	$ 0
3610	1.3.4.14.3.1…	Carcamos de protección en vía	lun 18/11/24	lun 25/11/24	6 d	$ 37.877.218	0,00%	0,00%	$ 0
3611	*1.3.4.14.3.…*	*Fin de Conectante NW*	*mar 14/01/25*	*mar 14/01/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3612	**1.3.4.14.3.1…**	**OREJA OCCIDENTAL - CARRIL DE DESACELERACIÓN NW**	**mié 18/06/25**	**jue 17/07/25**	**22 d**	**$ 65.612.578**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3613	1.3.4.14.3.1…	Renivelación de Camaras	mié 16/07/25	jue 17/07/25	1 d	$ 38.923.060	0,00%	0,00%	$ 0
3614	1.3.4.14.3.1…	Carcamos de protección en vía	mié 18/06/25	mié 25/06/25	5 d	$ 26.689.518	0,00%	0,00%	$ 0
3615	*1.3.4.14.3.…*	*Fin de Oreja Occidental - Carril de Desaceleración NW*	*jue 17/07/25*	*jue 17/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3616	*1.3.4.14.4*	*Fin de ETB*	*vie 25/07/25*	*vie 25/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3617	**1.3.4.14.5**	**CODENSA**	**mié 1/05/24**	**sáb 1/11/25**	**428,25 d**	**$ 890.495.640**	**19,08%**	**22,50%**	**$ 169.910.442**
3618	**1.3.4.14.5.1**	**CALLE 153 NE**	**lun 27/05/24**	**sáb 3/08/24**	**53 d**	**$ 99.511.828**	**84,05%**	**90,86%**	**$ 83.635.431**
3619	1.3.4.14.5.1.	Excavación	lun 27/05/24	jue 13/06/24	13 d	$ 19.780.229	100,00%	100,00%	$ 19.780.229
3620	1.3.4.14.5.1.	Demoliciones	jue 13/06/24	lun 17/06/24	3 d	$ 3.240.773	100,00%	100,00%	$ 3.240.773
3621	1.3.4.14.5.1.	Instalación de tubería	jue 13/06/24	jue 4/07/24	16 d	$ 39.565.199	100,00%	100,00%	$ 39.565.199
3622	1.3.4.14.5.1.	Construcción de cajas -1	mar 18/06/24	jue 20/06/24	3 d	$ 4.897.569	100,00%	100,00%	$ 4.897.569
3623	1.3.4.14.5.1.	Construcción de Cajas	jue 4/07/24	jue 18/07/24	12 d	$ 9.095.485	100,00%	0,00%	$ 9.095.485
3624	1.3.4.14.5.1.	Rellenos	jue 18/07/24	sáb 3/08/24	13 d	$ 22.932.573	30,77%	100,00%	$ 7.056.176
3625	*1.3.4.14.5.…*	*Fin de Calle 153 NE*	*sáb 3/08/24*	*sáb 3/08/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3626	**1.3.4.14.5.3**	**CONECTANTE NE**	**lun 21/04/25**	**jue 17/07/25**	**68 d**	**$ 107.459.614**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3627	1.3.4.14.5.3.	Excavación	lun 21/04/25	lun 12/05/25	16 d	$ 19.780.229	0,00%	0,00%	$ 0
3628	1.3.4.14.5.3.	Demolición	lun 12/05/25	mié 21/05/25	8 d	$ 3.240.773	0,00%	0,00%	$ 0
3629	1.3.4.14.5.3.	Instalación de tubería	sáb 17/05/25	sáb 7/06/25	16 d	$ 47.512.983	0,00%	0,00%	$ 0
3630	1.3.4.14.5.3.	Construcción de Cajas	sáb 7/06/25	mié 25/06/25	14 d	$ 13.993.056	0,00%	0,00%	$ 0
3631	1.3.4.14.5.3.	Rellenos	jue 26/06/25	jue 17/07/25	17 d	$ 22.932.573	0,00%	0,00%	$ 0
3632	*1.3.4.14.5.…*	*Fin de Conectante NE*	*jue 17/07/25*	*jue 17/07/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3633	**1.3.4.14.5.5**	**APROCHE ORIENTAL**	**mar 28/01/25**	**mié 19/03/25**	**41 d**	**$ 105.137.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**

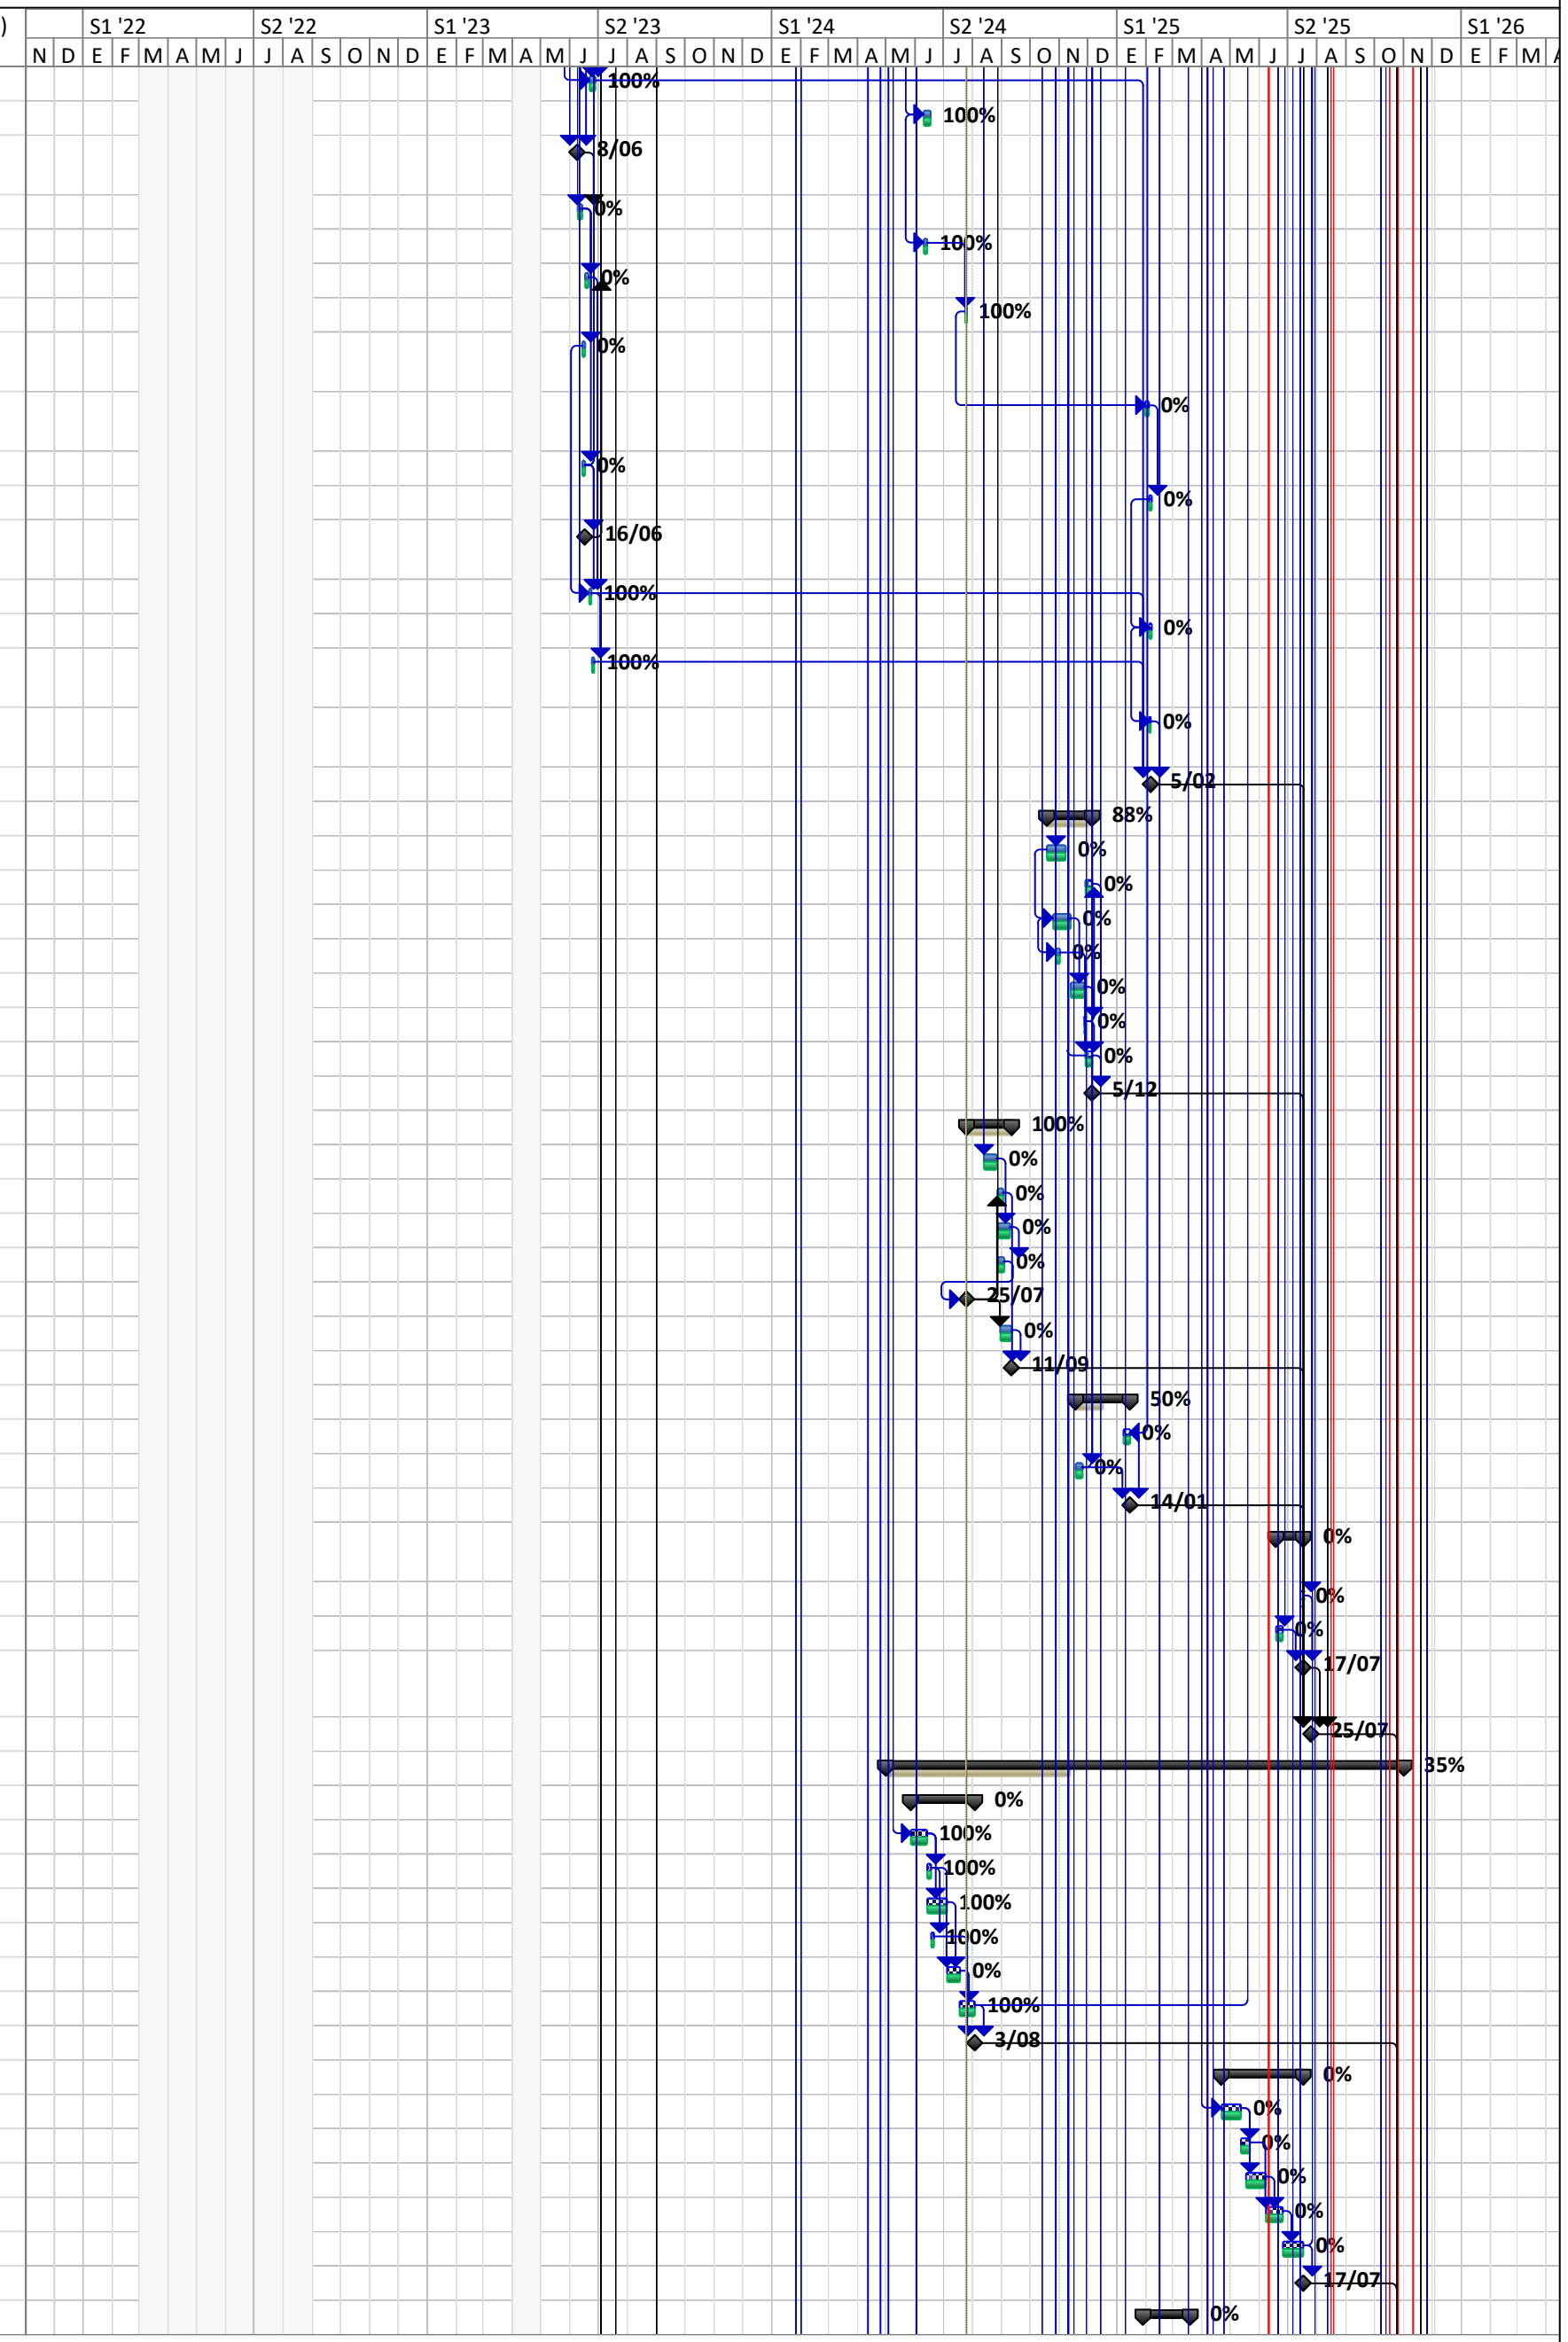

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Sólo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
3634	1.3.4.14.5.5.	Excavación	mar 28/01/25	mié 12/02/25	12 d	$ 19.780.229	0,00%	0,00%	$ 0
3635	1.3.4.14.5.5.	Instalación de tubería	mié 12/02/25	mié 26/02/25	12 d	$ 48.431.959	0,00%	0,00%	$ 0
3636	1.3.4.14.5.5.	Construcción de Cajas	mié 26/02/25	mar 4/03/25	5 d	$ 13.993.056	0,00%	0,00%	$ 0
3637	1.3.4.14.5.5.	Rellenos	mié 5/03/25	mié 19/03/25	12 d	$ 22.932.573	0,00%	0,00%	$ 0
3638	*1.3.4.14.5.(*	*Fin de Aproche Oriental*	*mié 19/03/25*	*mié 19/03/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3639	**1.3.4.14.5.7**	**OREJA ORIENTAL**	**jue 24/04/25**	**jue 26/06/25**	**49 d**	**$ 108.378.590**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3640	1.3.4.14.5.7.	Excavación	jue 24/04/25	mar 13/05/25	14 d	$ 13.446.829	0,00%	0,00%	$ 0
3641	1.3.4.14.5.7.	Demolición	mar 13/05/25	mar 20/05/25	6 d	$ 3.240.773	0,00%	0,00%	$ 0
3642	1.3.4.14.5.7.	Retiro de Infraestructura Existente	jue 19/06/25	jue 26/06/25	5 d	$ 6.333.400	0,00%	0,00%	$ 0
3643	*1.3.4.14.5.7.*	*Maniobras Codensa*	*jue 19/06/25*	*jue 19/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3644	1.3.4.14.5.7.	Instalación de tubería	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	8 d	$ 48.431.959	0,00%	0,00%	$ 0
3645	1.3.4.14.5.7.	Construcción de Cajas	mar 20/05/25	mar 27/05/25	6 d	$ 13.993.056	0,00%	0,00%	$ 0
3646	1.3.4.14.5.7.	Rellenos	mié 11/06/25	jue 19/06/25	7 d	$ 22.932.573	0,00%	0,00%	$ 0
3647	*1.3.4.14.5.8*	*Fin de Oreja Oriental*	*jue 26/06/25*	*jue 26/06/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3648	**1.3.4.14.5.9**	**ESPACIO PÚBLICO BAJO PUENTE ORIENTAL Enel**	**mar 14/05/24**	**sáb 16/11/24**	**145 d**	**$ 20.689.693**	**13,12%**	**16,70%**	**$ 2.715.282**
3649	1.3.4.14.5.9.	Excavación	mar 14/05/24	mar 21/05/24	6 d	$ 463.021	100,00%	100,00%	$ 463.021
3650	1.3.4.14.5.9.	Demolición	mar 21/05/24	mié 22/05/24	1 d	$ 474.731	100,00%	100,00%	$ 474.731
3651	1.3.4.14.5.9.	Demolición Segunda Etapa	mar 5/11/24	mar 5/11/24	1 d	$ 3.240.773	0,00%	0,00%	$ 0
3652	1.3.4.14.5.9.	Instalación de tubería	mar 21/05/24	jue 30/05/24	8 d	$ 510.850	100,00%	100,00%	$ 510.850
3653	1.3.4.14.5.9.	Construcción de Cajas	mié 22/05/24	lun 27/05/24	4 d	$ 1.266.680	100,00%	100,00%	$ 1.266.680
3654	1.3.4.14.5.9.	Renivelación de cajas	mié 6/11/24	mié 6/11/24	1 d	$ 13.993.056	0,00%	0,00%	$ 0
3655	1.3.4.14.5.9.	Rellenos	jue 7/11/24	sáb 16/11/24	7 d	$ 740.582	0,00%	100,00%	$ 0
3656	*1.3.4.14.5.*	*Fin de Espacio Público Enel*	*sáb 16/11/24*	*sáb 16/11/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3657	**1.3.4.14.5.1**	**CALLE 153 NW**	**mié 1/05/24**	**lun 16/12/24**	**178 d**	**$ 108.378.590**	**70,45%**	**91,61%**	**$ 76.350.531**
3658	1.3.4.14.5.1	Excavación	mié 1/05/24	lun 20/05/24	14 d	$ 19.780.229	100,00%	100,00%	$ 19.780.229
3659	1.3.4.14.5.1	Demolición	mar 21/05/24	jue 23/05/24	3 d	$ 3.240.773	100,00%	100,00%	$ 3.240.773
3660	1.3.4.14.5.1	Instalación de tubería	vie 24/05/24	jue 13/06/24	15 d	$ 48.431.959	100,00%	100,00%	$ 48.431.959
3661	1.3.4.14.5.1	Construccion de cajas 1	vie 24/05/24	lun 27/05/24	2 d	$ 4.897.570	100,00%	100,00%	$ 4.897.570
3662	1.3.4.14.5.1	Construcción de Cajas	vie 8/11/24	vie 29/11/24	16 d	$ 9.095.486	0,00%	0,00%	$ 0
3663	1.3.4.14.5.1	Rellenos	jue 28/11/24	lun 16/12/24	15 d	$ 22.932.573	0,00%	100,00%	$ 0
3664	*1.3.4.14.5.*	*Fin de Calle 153 NW*	*lun 16/12/24*	*lun 16/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3665	**1.3.4.14.5.1**	**CONECTANTE NW**	**vie 1/11/24**	**vie 10/01/25**	**53 d**	**$ 108.378.590**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3666	1.3.4.14.5.1	Excavación	vie 1/11/24	mié 20/11/24	14 d	$ 13.446.829	0,00%	0,00%	$ 0
3667	1.3.4.14.5.1	Demolición	jue 21/11/24	jue 5/12/24	12 d	$ 3.240.773	0,00%	0,00%	$ 0
3668	1.3.4.14.5.1	Instalación de tubería	jue 21/11/24	sáb 7/12/24	14 d	$ 48.431.959	0,00%	0,00%	$ 0
3669	1.3.4.14.5.1	Construcción de Cajas	jue 5/12/24	mar 24/12/24	15 d	$ 13.993.056	0,00%	0,00%	$ 0
3670	1.3.4.14.5.1	Retiro de Infraestructura Existente	vie 3/01/25	vie 10/01/25	5 d	$ 6.333.400	0,00%	0,00%	$ 0
3671	*1.3.4.14.5.1*	*Maniobras Codensa*	*vie 3/01/25*	*vie 3/01/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3672	1.3.4.14.5.1	Rellenos	mar 24/12/24	sáb 4/01/25	8 d	$ 22.932.573	0,00%	0,00%	$ 0
3673	*1.3.4.14.5.*	*Fin de Conectante NW*	*vie 10/01/25*	*vie 10/01/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3674	**1.3.4.14.5.1**	**APROCHE OCCIDENTAL-TRANSICIÓN**	**vie 4/10/24**	**jue 19/12/24**	**60 d**	**$ 105.137.817**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3675	1.3.4.14.5.1	Excavación	vie 4/10/24	sáb 26/10/24	18 d	$ 19.780.229	0,00%	0,00%	$ 0
3676	1.3.4.14.5.1	Instalación de tubería	lun 28/10/24	vie 15/11/24	14 d	$ 48.431.959	0,00%	0,00%	$ 0
3677	1.3.4.14.5.1	Construcción de Cajas	vie 15/11/24	mié 27/11/24	10 d	$ 13.993.056	0,00%	0,00%	$ 0
3678	1.3.4.14.5.1	Rellenos	jue 28/11/24	jue 19/12/24	18 d	$ 22.932.573	0,00%	0,00%	$ 0
3679	*1.3.4.14.5.*	*Fin de Aproche Occidental - Transición*	*jue 19/12/24*	*jue 19/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3680	**1.3.4.14.5.1**	**OREJA OCCIDENTAL**	**sáb 15/02/25**	**vie 4/04/25**	**38 d**	**$ 108.378.590**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3681	1.3.4.14.5.1	Excavación	sáb 15/02/25	jue 6/03/25	15 d	$ 13.446.829	0,00%	0,00%	$ 0
3682	1.3.4.14.5.1	Demolición	jue 6/03/25	mié 12/03/25	5 d	$ 3.240.773	0,00%	0,00%	$ 0
3683	1.3.4.14.5.1	Retiro de Infraestructura Existente	sáb 29/03/25	vie 4/04/25	5 d	$ 6.333.400	0,00%	0,00%	$ 0
3684	*1.3.4.14.5.1*	*Maniobras Codensa*	*vie 28/03/25*	*vie 28/03/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3685	1.3.4.14.5.1	Instalación de tubería	jue 6/03/25	sáb 15/03/25	8 d	$ 48.431.959	0,00%	0,00%	$ 0
3686	1.3.4.14.5.1	Construcción de Cajas	mié 12/03/25	mié 19/03/25	6 d	$ 13.993.056	0,00%	0,00%	$ 0
3687	1.3.4.14.5.1	Rellenos	mié 19/03/25	vie 28/03/25	7 d	$ 22.932.573	0,00%	0,00%	$ 0
3688	*1.3.4.14.5.*	*Fin de Oreja Occidental*	*vie 4/04/25*	*vie 4/04/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3689	**1.3.4.14.5.1**	**ESPACIO PÚBLICO BAJO PUENTE OCCIDENTAL**	**mié 22/05/24**	**vie 12/07/24**	**40 d**	**$ 7.209.198**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 7.209.198**
3690	1.3.4.14.5.1	Excavación	mié 22/05/24	sáb 1/06/24	9 d	$ 416.317	100,00%	100,00%	$ 416.317
3691	1.3.4.14.5.1	Demolición	mar 4/06/24	jue 6/06/24	2 d	$ 802.429	100,00%	100,00%	$ 802.429
3692	1.3.4.14.5.1	Instalación de tubería	mar 4/06/24	mar 18/06/24	10 d	$ 4.655.603	100,00%	100,00%	$ 4.655.603
3693	1.3.4.14.5.1	Construcción de Cajas	jue 6/06/24	mar 2/07/24	19 d	$ 761.052	100,00%	100,00%	$ 761.052
3694	1.3.4.14.5.1	Rellenos	mar 2/07/24	vie 12/07/24	9 d	$ 573.797	100,00%	100,00%	$ 573.797
3695	*1.3.4.14.5.*	*Fin de Espacio Público*	*vie 12/07/24*	*vie 12/07/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3696	**1.3.4.14.5.2**	**ALUMBRADO PÚBLICO**	**sáb 6/09/25**	**sáb 1/11/25**	**45 d**	**$ 11.835.313**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3697	1.3.4.14.5.2	Pedestales para postes	sáb 6/09/25	mar 7/10/25	25 d	$ 2.731.226	0,00%	0,00%	$ 0
3698	1.3.4.14.5.2	Instalación postes	mié 8/10/25	sáb 1/11/25	19 d	$ 9.104.087	0,00%	0,00%	$ 0

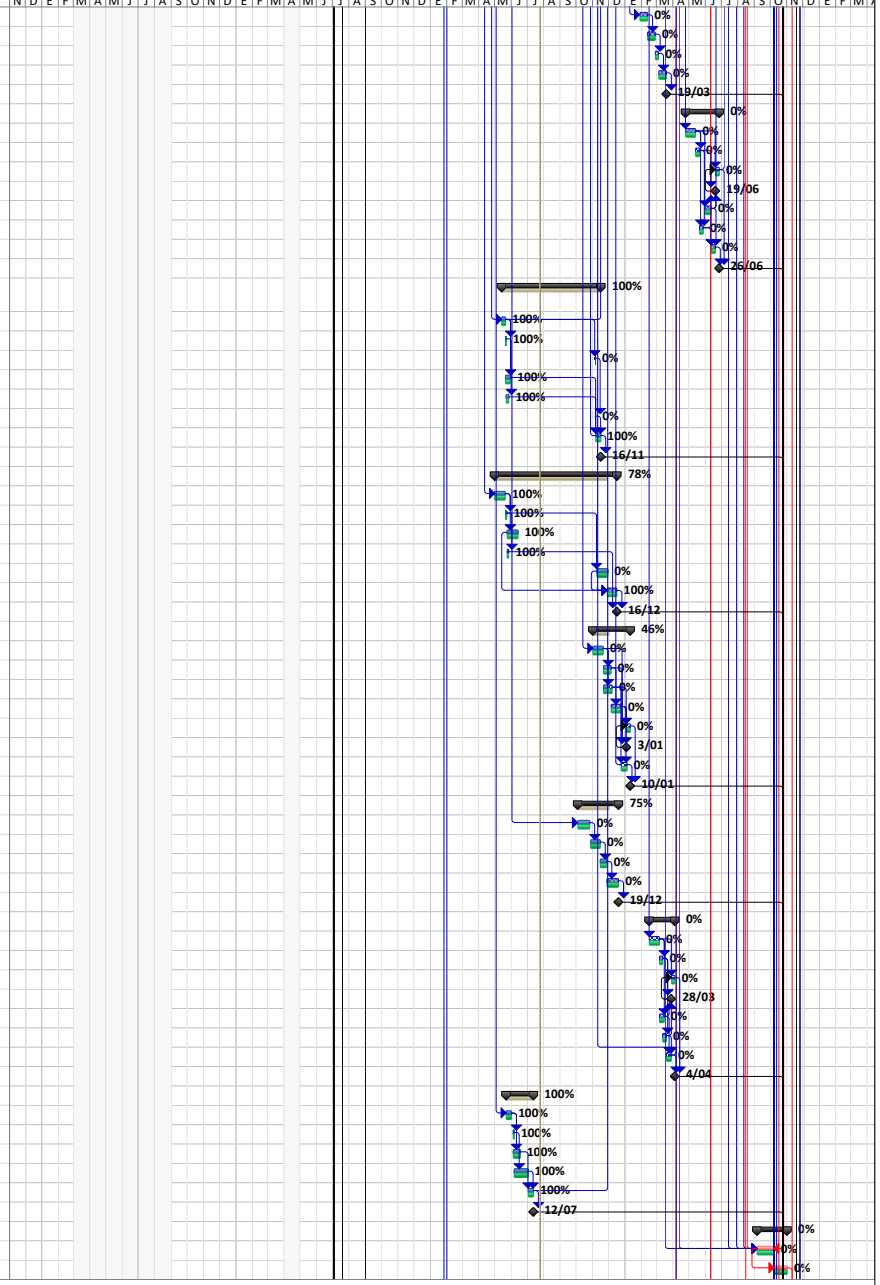

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
3699	**1.3.4.14.5.2**	**PUENTE (MANIOBRA)**	**mar 11/03/25**	**jue 15/05/25**	**50 d**	**$ 0**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3700	*1.3.4.14.5.2*	*Solicitud de suspensión Red de Alta Tensión Eje 3*	*jue 15/05/25*	*jue 15/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3701	*1.3.4.14.5.2*	*Solicitud de suspensión Red de Alta Tensión Eje 5*	*mar 11/03/25*	*mar 11/03/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3702	*1.3.4.14.5.*	*Fin de Puente*	*jue 15/05/25*	*jue 15/05/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3703	*1.3.4.14.6*	*Fin de CODENSA*	*sáb 1/11/25*	*sáb 1/11/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3704	*1.3.4.15*	*Fin de Redes Secas*	*sáb 1/11/25*	*sáb 1/11/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3705	**1.3.4.16**	**LA SIRENA**	**jue 1/02/24**	**jue 21/08/25**	**440,87 d**	**$ 1.280.670.766**	**24,21%**	**22,44%**	**$ 310.114.094**
3706	1.3.4.16.1	Intervensión silvicultural	jue 1/02/24	lun 18/03/24	39 d	$ 10.173.967	100,00%	100,00%	$ 10.173.967
3707	**1.3.4.16.2**	**Via**	**jue 15/02/24**	**vie 8/08/25**	**419,37 d**	**$ 603.273.289**	**37,59%**	**37,59%**	**$ 226.777.868**
3708	1.3.4.16.2.1	Excavación	jue 15/02/24	lun 18/03/24	27 d	$ 95.536.774	100,00%	100,00%	$ 95.536.774
3709	1.3.4.16.2.2	Excavación 2	mar 6/08/24	lun 12/08/24	3 d	$ 10.615.197	0,00%	0,00%	$ 0
3710	1.3.4.16.2.3	Rajon	jue 21/03/24	jue 25/04/24	27 d	$ 131.241.094	100,00%	100,00%	$ 131.241.094
3711	1.3.4.16.2.4	Rajon 2	lun 12/08/24	jue 15/08/24	3 d	$ 14.582.344	0,00%	0,00%	$ 0
3712	1.3.4.16.2.5	Subbase Granular	mié 14/08/24	vie 20/09/24	30 d	$ 105.620.423	0,00%	0,00%	$ 0
3713	1.3.4.16.2.6	Base Granular BGA	mar 21/01/25	jue 27/02/25	30 d	$ 44.287.469	0,00%	0,00%	$ 0
3714	1.3.4.16.2.7	Mezcla Asfaltica - asfalcaucho	jue 27/02/25	vie 28/02/25	1 d	$ 130.436.989	0,00%	0,00%	$ 0
3715	1.3.4.16.2.8	Mezcla Asfaltica - MD12	mié 6/08/25	vie 8/08/25	1 d	$ 70.952.999	0,00%	0,00%	$ 0
3716	*1.3.4.16.3*	*Fin Via*	*vie 8/08/25*	*vie 8/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3717	**1.3.4.16.4**	**Espacio Público**	**jue 5/09/24**	**sáb 8/02/25**	**122 d**	**$ 229.472.730**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3718	1.3.4.16.4.1	Excavación	jue 5/09/24	sáb 12/10/24	30 d	$ 37.286.008	0,00%	0,00%	$ 0
3719	1.3.4.16.4.2	Rellenos	sáb 12/10/24	mié 27/11/24	35 d	$ 91.687.539	0,00%	0,00%	$ 0
3720	1.3.4.16.4.3	Acabados	jue 21/11/24	sáb 8/02/25	62 d	$ 100.499.183	0,00%	0,00%	$ 0
3721	*1.3.4.16.5*	*Fin Espacio Publico*	*sáb 8/02/25*	*sáb 8/02/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3722	**1.3.4.16.6**	**Redes Secas**	**lun 29/04/24**	**mié 17/07/24**	**59,75 d**	**$ 73.162.259**	**100,00%**	**68,97%**	**$ 73.162.259**
3723	**1.3.4.16.6.1**	**ENEL**	**lun 29/04/24**	**mié 17/07/24**	**59,75 d**	**$ 73.162.259**	**100,00%**	**68,97%**	**$ 73.162.259**
3724	1.3.4.16.6.1.	Excavación	lun 29/04/24	sáb 18/05/24	15 d	$ 11.773.658	100,00%	100,00%	$ 11.773.658
3725	1.3.4.16.6.1.	Instalación de tubería	sáb 18/05/24	jue 6/06/24	15 d	$ 28.427.670	100,00%	100,00%	$ 28.427.670
3726	1.3.4.16.6.1.	Construcción de Cajas	sáb 18/05/24	mié 29/05/24	9 d	$ 10.258.919	100,00%	100,00%	$ 10.258.919
3727	1.3.4.16.6.1.	Construcción de Cajas 2	mié 29/05/24	jue 6/06/24	6 d	$ 6.839.280	100,00%	0,00%	$ 6.839.280
3728	1.3.4.16.6.1.	Rellenos	jue 27/06/24	mié 17/07/24	15 d	$ 15.862.732	100,00%	0,00%	$ 15.862.732
3729	*1.3.4.16.6.2*	*Fin de ENEL La Sirena*	*mié 17/07/24*	*mié 17/07/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3730	**1.3.4.16.7**	**Redes Humedas**	**lun 9/09/24**	**vie 7/02/25**	**119 d**	**$ 337.393.425**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3731	**1.3.4.16.7.1**	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**lun 9/09/24**	**mar 5/11/24**	**45 d**	**$ 183.135.250**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3732	1.3.4.16.7.1.	Excavación de 0-2 m	lun 9/09/24	vie 20/09/24	10 d	$ 2.028.984	0,00%	0,00%	$ 0
3733	1.3.4.16.7.1.	Excavación mayor a 2 m	jue 26/09/24	mié 9/10/24	10 d	$ 28.827.347	0,00%	0,00%	$ 0
3734	1.3.4.16.7.1.	Instalación de Tubería para colector	vie 20/09/24	mié 2/10/24	10 d	$ 109.705.902	0,00%	0,00%	$ 0
3735	1.3.4.16.7.1.	Sumideros	jue 26/09/24	mié 9/10/24	10 d	$ 14.099.173	0,00%	0,00%	$ 0
3736	1.3.4.16.7.1.	Pozo de Inspección placa de fondo y mamposteria	jue 26/09/24	mié 9/10/24	10 d	$ 4.222.686	0,00%	0,00%	$ 0
3737	1.3.4.16.7.1.	Pozo de Inspección cargue y acabados	mié 9/10/24	mar 22/10/24	10 d	$ 3.049.286	0,00%	0,00%	$ 0
3738	1.3.4.16.7.1.	Rellenos Atraque NP-040	mar 22/10/24	mar 5/11/24	10 d	$ 5.260.627	0,00%	0,00%	$ 0
3739	1.3.4.16.7.1.	Rellenos sobre tuberia NP-040	mar 22/10/24	mar 5/11/24	10 d	$ 15.941.245	0,00%	0,00%	$ 0
3740	*1.3.4.16.7.2*	*Fin Alcantarillado Pluvial*	*mar 5/11/24*	*mar 5/11/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3741	**1.3.4.16.7.3**	**ALCANTARILLADO SANITARIO**	**mar 31/12/24**	**lun 3/02/25**	**26 d**	**$ 99.446.477**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3742	1.3.4.16.7.3.	Excavación de 0-2 m	mar 31/12/24	mié 8/01/25	5 d	$ 9.327.427	0,00%	0,00%	$ 0
3743	1.3.4.16.7.3.	Excavación mayor a 2 m	jue 2/01/25	jue 9/01/25	5 d	$ 10.831.438	0,00%	0,00%	$ 0
3744	1.3.4.16.7.3.	Instalación de Tubería	jue 9/01/25	mar 21/01/25	10 d	$ 70.311.168	0,00%	0,00%	$ 0
3745	1.3.4.16.7.3.	Rellenos	mar 21/01/25	lun 3/02/25	10 d	$ 8.976.444	0,00%	0,00%	$ 0
3746	*1.3.4.16.7.4*	*Fin de Alcantarillado Sanitario*	*lun 3/02/25*	*lun 3/02/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3747	**1.3.4.16.7.5**	**ACUEDUCTO**	**sáb 12/10/24**	**vie 7/02/25**	**91 d**	**$ 54.811.698**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3748	1.3.4.16.7.5.	Excavación	sáb 12/10/24	vie 8/11/24	20 d	$ 7.961.981	0,00%	0,00%	$ 0
3749	1.3.4.16.7.5.	Instalación de Tubería	vie 8/11/24	mié 4/12/24	20 d	$ 40.136.554	0,00%	0,00%	$ 0
3750	*1.3.4.16.7.5.*	*Solicitud de Empalme a EAAB*	*mié 4/12/24*	*mié 4/12/24*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3751	1.3.4.16.7.5.	Empalme de Tubería a existente	mar 31/12/24	jue 2/01/25	1 d	$ 2.590.073	0,00%	0,00%	$ 0
3752	1.3.4.16.7.5.	Rellenos	mar 31/12/24	vie 7/02/25	30 d	$ 4.123.090	0,00%	0,00%	$ 0
3753	*1.3.4.16.7.6*	*Fin Acueducto*	*vie 7/02/25*	*vie 7/02/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3754	1.3.4.16.8	Señalización de la Sirena	sáb 26/07/25	jue 21/08/25	20 d	$ 27.195.096	0,00%	0,00%	$ 0
3755	*1.3.4.17*	*Fin La Sirena*	*jue 21/08/25*	*jue 21/08/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*
3756	1.3.4.18	SEÑALIZACIÓN	mar 7/10/25	sáb 1/11/25	20 d	$ 302.351.271	0,00%	0,00%	$ 0
3757	1.3.4.19	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO	vie 1/09/23	lun 18/09/23	15 d	$ 89.511.927	100,00%	100,00%	$ 89.511.927
3758	1.3.4.20	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO (SEGUNDA ETAPA)	mié 14/02/24	sáb 2/03/24	15 d	$ 24.639.884	100,00%	100,00%	$ 24.639.884
3759	1.3.4.21	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO (SEGUNDA ETAPA) 2	lun 5/08/24	jue 30/10/25	353 d	$ 386.024.851	0,00%	0,00%	$ 0
3760	*1.3.4.22*	*Fin de Actividades de Construcción*	*sáb 1/11/25*	*sáb 1/11/25*	*0 d*	*$ 0*	*0,00%*	*0,00%*	*$ 0*

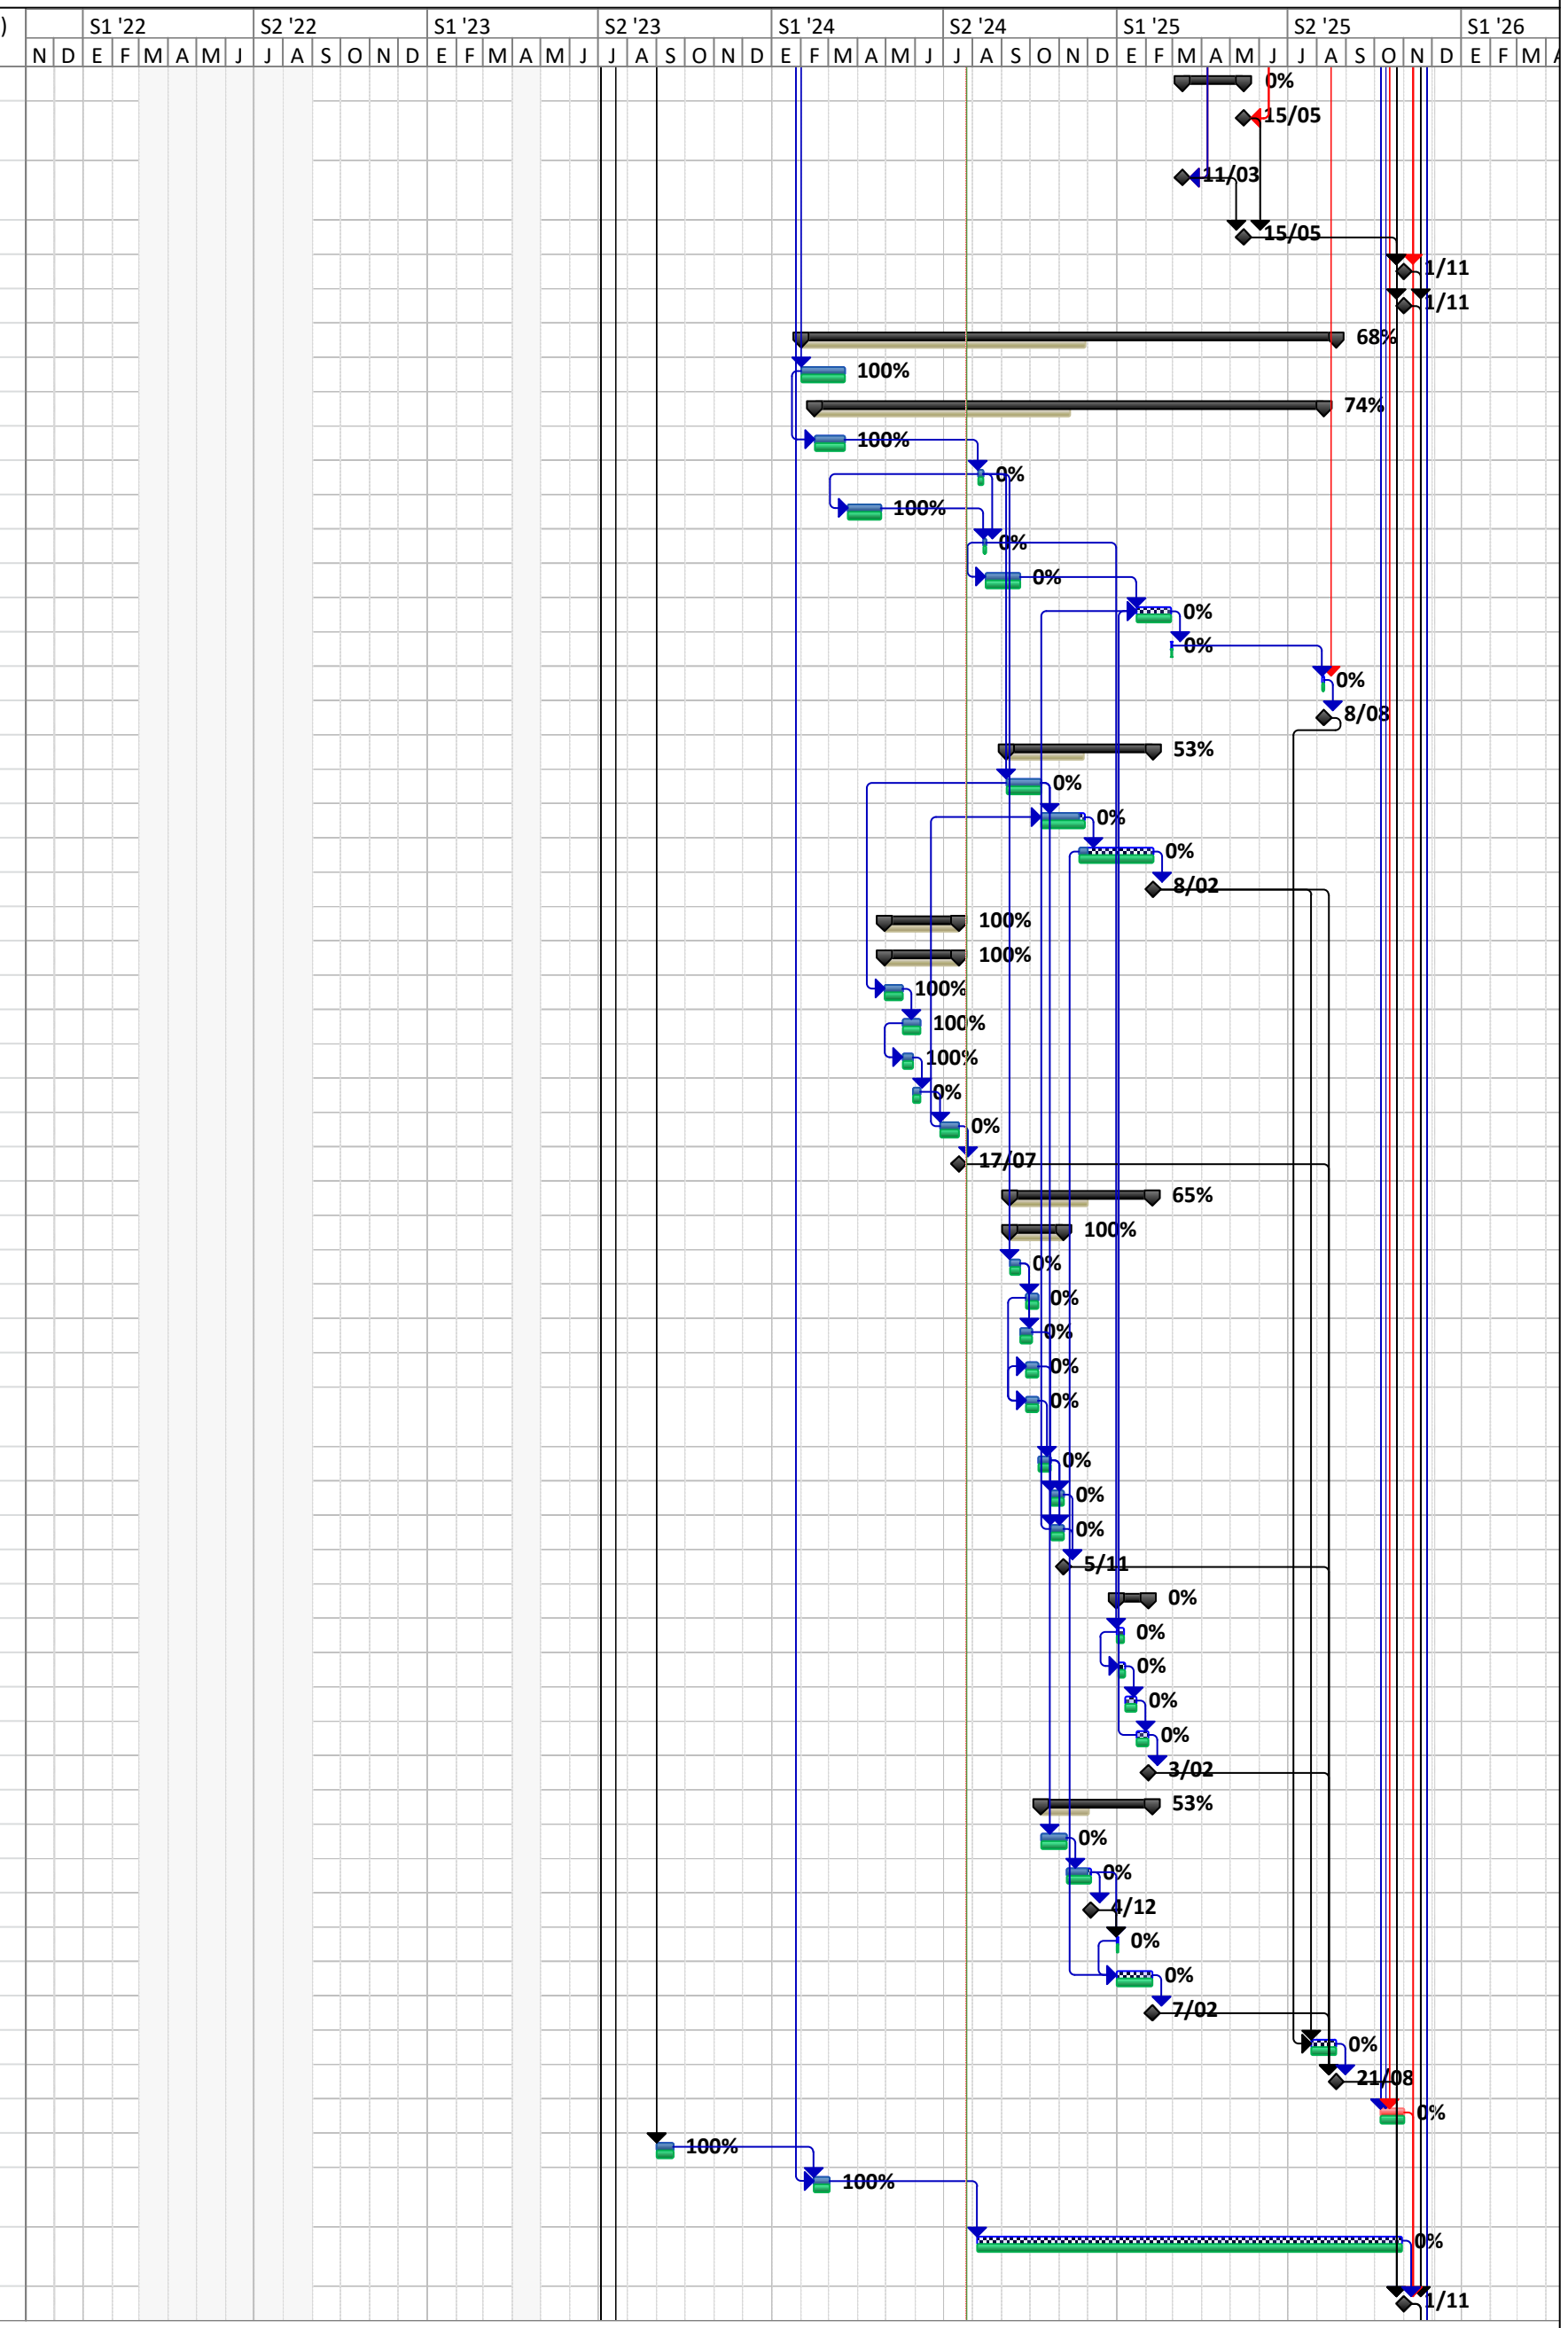

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	% Planeado	% A. Ejecutado	Costo Planeado (CPTP)
3761	**1.3.4.23**	**ENTREGA DEL PROYECTO**	**sáb 1/11/25**	**mié 3/12/25**	**24 d**	**$ 0**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0**
3762	1.3.4.24	Entrega Vanti	sáb 1/11/25	mié 3/12/25	24 d	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0
3763	1.3.4.25	Entrega ENEL AP	sáb 1/11/25	mié 3/12/25	24 d	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0
3764	1.3.4.26	Entrega ENEL MT y BT	sáb 1/11/25	mié 3/12/25	24 d	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0
3765	1.3.4.27	Entrega ENEL AT	sáb 1/11/25	mié 3/12/25	24 d	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0
3766	1.3.4.28	Entrega ETB	sáb 1/11/25	mié 3/12/25	24 d	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0
3767	1.3.4.29	Entrega EAAB	sáb 1/11/25	mié 3/12/25	24 d	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0
3768	**1.3.5**	**COMPONETES DEL PROYECTO**	**mar 4/07/23**	**vie 31/10/25**	**663 d**	**$ 5.104.752.057**	**27,01%**	**27,01%**	**$ 1.378.566.001**
3769	1.3.5.1	ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B)	mar 4/07/23	lun 18/09/23	63 d	$ 316.295.243	100,00%	100,00%	$ 316.295.243
3770	1.3.5.2	ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B) (SEGUNDA ETAPA)	lun 5/08/24	vie 31/10/25	371 d	$ 1.266.348.081	0,00%	0,00%	$ 0
3771	1.3.5.3	DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (C)	mar 4/07/23	lun 18/09/23	63 d	$ 127.674.345	100,00%	100,00%	$ 127.674.345
3772	1.3.5.4	DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (SEGUNDA ETAPA)	lun 5/08/24	vie 31/10/25	371 d	$ 279.459.241	0,00%	0,00%	$ 0
3773	1.3.5.5	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (D)	mar 4/07/23	lun 18/09/23	63 d	$ 182.571.415	100,00%	100,00%	$ 182.571.415
3774	1.3.5.6	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (D) (SEGUNDA PARTE)	lun 5/08/24	vie 31/10/25	371 d	$ 757.454.170	0,00%	0,00%	$ 0
3775	1.3.5.7	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (E)	mar 4/07/23	lun 18/09/23	63 d	$ 602.246.660	100,00%	100,00%	$ 602.246.660
3776	1.3.5.8	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (SEGUNDA ETAPA)	mié 14/02/24	mar 9/04/24	45 d	$ 78.771.192	100,00%	100,00%	$ 78.771.192
3777	1.3.5.9	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (SEGUNDA ETAPA) 2	vie 2/08/24	mar 28/10/25	353 d	$ 1.234.082.011	0,00%	0,00%	$ 0
3778	1.3.5.10	ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN (G)	mar 4/07/23	lun 18/09/23	63 d	$ 56.416.853	100,00%	100,00%	$ 56.416.853
3779	1.3.5.11	ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN (G) (SEGUNDA ETAPA)	jue 4/09/25	lun 20/10/25	37 d	$ 119.885.813	0,00%	0,00%	$ 0
3780	1.3.5.12	COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SDA (H)	jue 28/08/25	vie 31/10/25	52 d	$ 55.488.777	0,00%	0,00%	$ 0
3781	1.3.5.13	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (J)	mar 4/07/23	lun 18/09/23	63 d	$ 14.590.293	100,00%	100,00%	$ 14.590.293
3782	1.3.5.14	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (J) (SEGUNDA ETAPA)	jue 18/09/25	sáb 4/10/25	13 d	$ 13.467.963	0,00%	0,00%	$ 0
3783	***1.3.5.15***	***Fin de Componentes del proyecto***	***vie 31/10/25***	***vie 31/10/25***	***0 d***	***$ 0***	***0,00%***	***0,00%***	***$ 0***
3784	***1.4***	***Fin de Fase de Ejecución***	***mié 3/12/25***	***mié 3/12/25***	***0 d***	***$ 0***	***0,00%***	***0,00%***	***$ 0***
3785	***2***	***Finalización del proyecto***	***mié 3/12/25***	***mié 3/12/25***	***0 d***	***$ 0***	***0,00%***	***0,00%***	***$ 0***

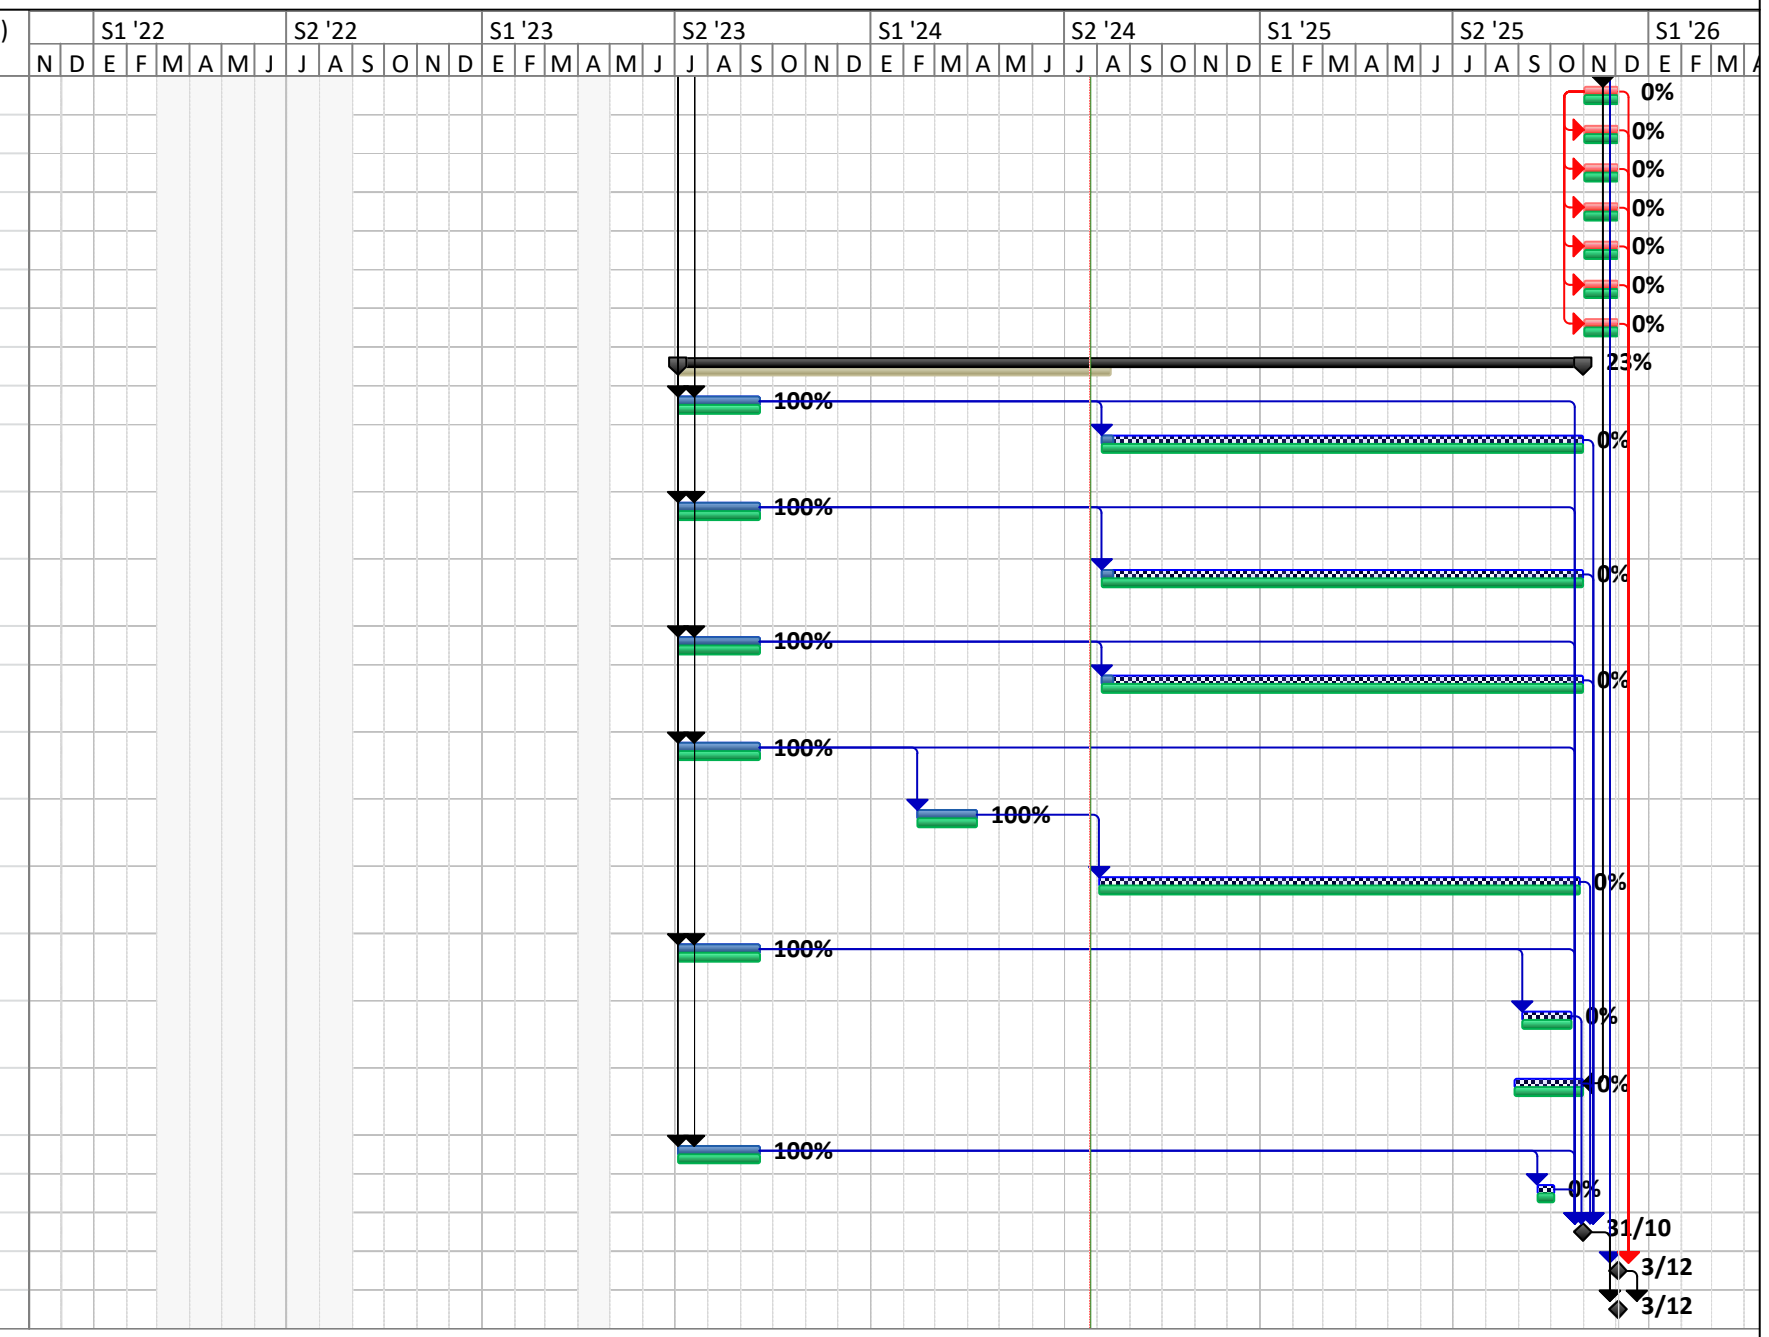

Este programa está sujeto a cambios por la definición de Diseños

Tareas críticas	División	Sólo fin	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
División crítica	Progreso de tarea	Sólo duración	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Tarea	Sólo el comienzo	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite
