INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA 1857 DE 2023

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INGESEC-1
CONTRATO 1039 DE 2022 – INVIAS



FEBRERO 2024

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1. ANTECEDENTES 4
2.2. LOCALIZACIÓN 5
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA. 6
2.4. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 7
3. INFORMACION DEL CONTRATO 9
3.1. DATOS DEL CONTRATO 9
3.2. GARANTÍAS 10
3.2.1. POLIZA DE CUMPLIMIENTO 10
3.2.2. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 11
4. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 12
4.1. ELABORACION Y ENTREGA DE DISEÑOS A INTERVENTORÍA 12
4.1.1. DISEÑO GEOMÉTRICO 12
4.1.2. ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGIA E HIDRÁULICA 13
4.1.3. ESTUDIOS ESTRUCTURAL, GEOLOGÍA, GEOTECNIA 14
4.1.4. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTO 15
4.1.5. ESTUDIOS Y DISEÑOS URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO 16
4.1.6. DISEÑOS DE CONCRETOS 16
4.2. ACTIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS 16
5. RECOMENDACIONES 19

1. INTRODUCCIÓN

Con la elaboración y entrega del presente documento, se pretende dar a conocer la información general del contrato, la descripción del alcance del contrato, mencionando la localización, el estado inicial de la vía, los tramos a intervenir, la descripción de las garantías y amparos legales y se mencionan las actividades realizadas durante el periodo para el cual tiene alcance el presente documento.

El presente documento da cumplimiento al compromiso contractual obligatorio, consistente específicamente la presentación de informe mensual de avance de ejecución.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. ANTECEDENTES

El proyecto tiene como objetivos fundamentales mejorar la infraestructura vial para incrementar la competitividad, promover el crecimiento económico, disminuir significativamente los costos de operación vehicular, mejorar la dinámica de comercialización de productos de la región, así como del turismo, desarrollo socioeconómico a nivel regional y nacional, con el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de los usuarios de la vía Coyaima - Ataco - Planadas.

El contrato de obra No. 1857 de 2023, contempla un plazo de 34 meses calendario, contados a partir de la fecha de acta de inicio, la cual fue suscrita por las partes el 18 de septiembre de 2023, de los cuales los cuatro primeros meses se realizarán las revisiones, ajustes y/o actualizaciones y/o complementaciones a los estudios y diseños que hacen parte integral del anexo técnico, del proceso licitatorio.

En los Municipios de Coyaima, Ataco y Planadas actualmente habitan alrededor de 74.000 personas, de igual forma hay una población flotante aledaña a las distintas veredas de este sector y otros, dado que son municipios de gran extensión territorial, Ataco con más de 100 veredas, Coyaima con aproximadamente 54 veredas y Planadas con aproximadamente 96 veredas, y con un gran potencial turístico que sigue aumentando día a día, por ejemplo, Coyaima al ser municipio con cultivos de arroz, algodón, maíz y hoja de cachaco. Igualmente, esta vía es la única vía de acceso hacia el municipio de

Planadas conocido por su principal cultivo El Café, en los últimos años se ha dado la llegada de visitantes extranjeros que transitan por esta vía Coyaima – Ataco – Las Señoritas, y luego dirigirse hacia Planadas para comprar variedades de café y visitar las diferentes veredas, que colocan a Planadas como líder nacional.

Por tanto, el departamento con el fin de atender las condiciones de transitabilidad que se vienen presentando en el corredor vial, busca evitar daños y efectos que afecten la buena convivencia de esta zona productiva del Departamento lo cual afectaría a unos 74.000 habitantes de los municipios de Coyaima, Ataco y Planadas, municipios que dependen económicamente del sector agrícola y ganadero.

Es importante mencionar que esta carretera conecta a la capital del Tolima, Ibagué, con estos municipios, única vía de acceso, lo cual hace este corredor de gran importancia, igualmente esta carretera hace parte del Anillo vial Sur del Tolima, y su intervención implica mejores condiciones de transitabilidad de los usuarios de la vía en contextos de confort, menores costos de operación, generación de empleo, regiones más competitivas, dinamización de la economía, valorización de predios, y muy importante, el trasporte de productos agrícolas y de conectividad con otras regiones; como también la construcción de un territorio uniforme y de igualdad de oportunidades con el acceso adecuado a la infraestructura vial.

Esta zona del departamento contiene aspectos topográficos importantes, al estar la vía cercana ala orilla del río Saldaña, en la cual se presentan varios puntos críticos que han conllevado a la perdida parcial de la banca en varios sitios, también aspectos climatológicos, que la hacen vulnerable, y en épocas de lluvias la vía, por la falta de estructuras u obras de contención, falta de pavimento, falta de obras de drenaje, en su totalidad se vea altamente afectada. Debido a riesgo alto de posibles pérdidas parciales o totales de banca, puntos críticos de transitabilidad al estar en material de afirmado de la zona y deterioro de la carpeta asfáltica, lo que ocasiona afectación en la economía local y a la población en general usuaria de la vía.

Por lo anterior, entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, y el CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025, se celebró el Contrato Interadministrativo No 1857 del 25 de mayo de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.

El presente documento se elabora para cumplir con el compromiso contractual obligatorio, consistente específicamente la presentación de informe mensual de avance de ejecución.

2.2. LOCALIZACIÓN

La vía de segundo orden que comunica el casco urbano de Coyaima con el municipio de Ataco en el departamento del Tolima y luego con Las Señoritas, cuenta con una longitud aproximada de 72,5 Km, transcurre en un alineamiento suroeste atravesando el flanco oriental de la cordillera central, sobre el cual transcurre una gran variedad de condiciones geológicas, litológicas, morfológicas y de drenaje, que plantean un gran número de procesos de inestabilidad en su transcurrir, que son producto de la variedad de terrenos, sobre los que se distingue, planicies aluviales, zonas de media ladera y piedemontes, en consonancia con las condiciones del entorno, vegetación sistema de drenaje e intervención antrópica.

El municipio de Coyaima, se encuentra localizado en el sur del Tolima, con coordenadas 3°47’51” Latitud Norte y 75°11’38” Longitud Este; Ataco igualmente localizado al sur del departamento del Tolima a 3°35’23” Latitud Norte y 75°22’56” Longitud Este y Planadas se encuentra localizado al suroccidente del departamento del Tolima a 3°11’47” Latitud Norte y 75°38’40” Longitud Este.

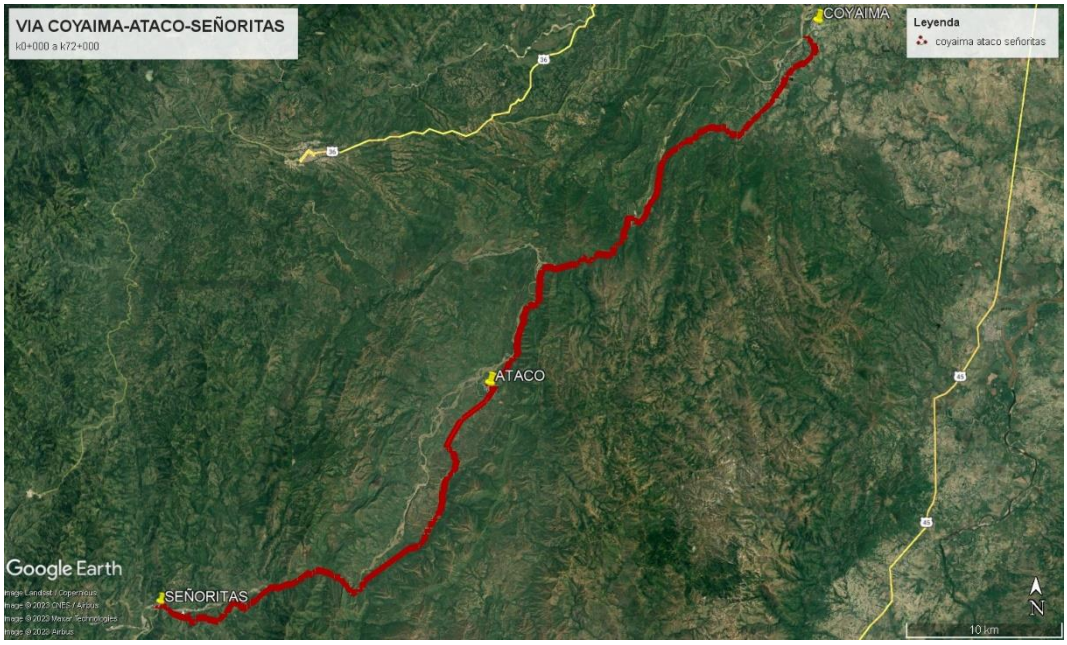


Figura 1. Localización general de la vía.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

La carretera Coyaima - Ataco – Las Señoritas posee una longitud total de 72,5 Km, de los cuales los sectores a intervenir poseen condiciones malas de transitabilidad, es decir, un requerimiento de construcción o reconstrucción completa de la estructura de pavimento, estabilización de taludes, obras hidráulicas, etc.

La no intervención oportuna a la situación existente acarrearía en un futuro inmediato, un problema de carácter socio-económico, ya que se verían afectados los usuarios que frecuentan este tramo de vía, así como posibles accidentes graves que puedan llegar a afectar su integridad física por la no intervención de la misma y el pésimo estado en el que se encuentra dicha vía.

Existen sectores que no han sido pavimentados y se encuentran en material de recebo de la zona, con condiciones de transitabilidad bastante inadecuadas, susceptibles a los factores climáticos y a la

afectación y erosión del Rio Saldaña; igualmente existe tramos pavimentados que requieren la construcción de muros de confinamiento que estabilicen la banca de la carretera.

2.4. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades a ejecutar y alcance del proyecto, está en realizar la intervención de vía COYAIMA – ATACO – LAS SEÑORITAS, mediante la intervención prioritaria en las siguientes abscisas, sectores priorizados inicialmente se presenta la intervención de los siguientes tramos: COYAIMA – ATACO K17+500 al K25+000, ATACO – LAS SEÑORITAS K38+900 al K72+500; teniendo un alcance total de 41,1 Km, y para un tramo de intervención inicial y prioritaria de mejoramiento de la vía mediante la construcción de pavimento nuevo del K17+500 al K21+500 y de construcción de obras de estabilización de la banca en puntos críticos en el tramo comprendido entre las abscisa K17+500 al K25+000 en diferentes puntos, y de mantenimiento y otras necesidades de intervención de la vía en todo el corredor vial por afectaciones de la ola invernal, siempre tomando como K0+000 el inicio de la vía en la salida de la zona urbana del municipio de Coyaima.

Existen las necesidades de intervención de la vía, con condiciones regulares de transitabilidad, y atención de puntos críticos, es decir un requerimiento de construcción o reconstrucción completa de la estructura de pavimento, estabilización de taludes, de mantenimiento y otras necesidades de intervención de la vía en todo el corredor vial por afectaciones de la ola invernal y construcción de obras hidráulicas para el adecuado manejo de aguas.

En los estudios y diseños existentes del corredor vial, los cuales hacen parte integral del anexo técnico, se encontraron consideraciones de mejoramiento de la carretera mediante la construcción de una nueva estructura de pavimento, obras de drenaje necesarias para un adecuado manejo de aguas tanto superficiales como subterráneas y estructuras para estabilización y recuperación de banca existente, De acuerdo a lo revisado se encontró que es necesario en el proyecto formulado realizar las revisiones, ajustes y/o actualizaciones y/o complementaciones a los estudios y diseños, por lo cual en el presupuesto contractual, se tienen provisiones presupuestales para esta actividad.

Por manifestación del INVIAS y la Gobernación del Tolima, se incluye en las obras a ejecutar, la construcción de un puente vehicular en el sector Las Señoritas, ubicado en el K74+500 lugar donde inicia un tramo de la vía denominado Los Espolones.

Actualizadas las actividades a ejecutar con el objeto del presente contrato, a continuación, se hace una relación de los sitios o tramos a intervenir:

- SECTOR 1: K17+770 al K25+140. Vía Coyaima – Ataco.
    - Sitio crítico 1: K18+400 al K18+900
    - Sitio critico 2: K20+850 al K21+350
    - Sitio critico 3: K21+835 al K21+890
    - Sitio critico 4: K22+820
- SECTOR 2: K37+500 al K38+400. Zona urbana municipio de Ataco.
- SECTOR 3: K42+075. Reposición obra de drenaje transversal.
- SECTOR 4: K71+850 al K72+050. Construcción obra de protección Caserío Las Señoritas.
- SECTOR 5: K74+390 al K74+570. Construcción puente vehicular Sector Las Señoritas.

3. INFORMACION DEL CONTRATO

3.1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No:	1857 DE 2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025. NIT: 901.705.719-1. Representante Legal CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA.
VALOR:	CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) MONEDA CORRIENTE.
PLAZO:	TREINTA Y CUATRO (34) MESES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION.
SUPERVISOR:	Ing. JULIO CESAR GALLO ORTIZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.
FECHA DE CONTRATO	25 de mayo de 2023
FECHA ACTA DE INICIO	18 de septiembre de 2023

3.2. GARANTÍAS

A continuación, se relacionan las pólizas de cumplimiento cuyos amparos se detallan en la siguiente tabla:

3.2.1. POLIZA DE CUMPLIMIENTO

SEGURO		CUMPLIMIENTO ESTATAL	
POLIZA No.		2047335	
FECHA DE EXPEDICION		02-06-2023	
TIPO DE MOVIMIENTO		EXPEDICION ANEXO: 0	
TOMADOR		CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025	
ASEGURADO		GOBERNACION DEL TOLIMA	
BENEFICIARIO		GOBERNACION DEL TOLIMA	
GARANTIAS OTORGADAS	**VALOR AFIANZADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$5.461.379.556	25/05/2023	25/09/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	$410.550.000	25/03/2026	25/032031
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$10.649.059.111	25/03/2026	25/03/2031
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	$10.972.759.111	25/05/2023	25/03/2029
TIPO DE MOVIMIENTO		MODIFICACION ANEXO: 1	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$5.461.379.556	18/08/2023	03/01/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$410.550.000	03/07/2026	03/07/2031
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$10.649.059.111	03/07/2026	03/07/2031
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	$10.972.759.111	18/08/2023	03/07/2029

3.2.2. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGURO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	
POLIZA No.		2047336	
FECHA DE EXPEDICION		02-06-2023	
TIPO DE MOVIMIENTO		EXPEDICION ANEXO: 0	
TOMADOR		CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025	
ASEGURADO		GOBERNACION DEL TOLIMA	
BENEFICIARIO		GOBERNACION DEL TOLIMA	
GARANTIAS OTORGADAS	**VALOR AFIANZADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PLO Predios Labores y operaciones	$2.730.689.778	25/05/2023	25/03/2026
Contratistas y subcontratistas	$2.730.689.778	25/05/2023	25/03/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$2.730.689.778	25/05/2023	25/03/2026
Responsabilidad civil patronal	$2.730.689.778	25/05/2023	25/03/2026
Vehículos propios y no propios	$2.184.551.822	25/05/2023	25/03/2026
TIPO DE MOVIMIENTO		MODIFICACION ANEXO: 1	
PLO Predios Labores y operaciones	$2.730.689.778	18/08/2023	03/07/2026
Contratistas y subcontratistas	$2.730.689.778	18/08/2023	03/07/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$2.730.689.778	18/08/2023	03/07/2026
Responsabilidad civil patronal	$2.730.689.778	18/08/2023	03/07/2026
Vehículos propios y no propios	$2.184.551.822	18/08/2023	03/07/2026

4. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Para el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2024 y el 29 de febrero de 2024, el CONTRATISTA, realizó las siguientes actividades:

4.1. ELABORACION Y ENTREGA DE DISEÑOS A INTERVENTORÍA

El Contratista ha enviado durante la duración del contrato, información relacionada con los estudios y diseños de las diferentes componentes o especialidades, para los sitios a intervenir, objeto del presente Contrato:

4.1.1. DISEÑO GEOMÉTRICO

~ Mediante comunicación CSCOY000238, de fecha 22 de noviembre de 2023, el Contratista envía versión para revisión, del Diseño Geométrico, para el SECTOR 1 K17+770 al K25+140, sector vía Coyaima – Ataco.

~ Mediante comunicación CSCOY000254, de fecha 01 de diciembre de 2023, el Contratista envía versión para revisión, del Informe de Topografía, para el SECTOR 1 K17+770 al K25+140, sector vía Coyaima – Ataco.

~ Mediante comunicación CSCOY000279, de fecha 05 de enero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, del Diseño Geométrico, para el SECTOR 2 K37+500 al K38+400, sector zona urbana del municipio de Ataco.

~ Mediante comunicación IYD001929, de fecha 31 de enero de 2024, el Contratista envía versión 2 para revisión, del Diseño Geométrico, para el SECTOR 2 K37+500 al K38+400, sector zona urbana del municipio de Ataco.

~ Mediante comunicación IYD001934, de fecha 02 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, del Diseño Geométrico, para el SECTOR 1 K17+770 al K25+140, sector vía Coyaima – Ataco.

~ Mediante comunicación CSCOY000314, de fecha 06 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, Estudio de trazado y diseño Geométrico K74+500, puente sector Las Señoritas.

~ Mediante comunicación CSCOY000316, de fecha 06 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, Estudio de trazado y diseño Geométrico Zona urbana de Ataco K37+500 al K38+400.

~ Mediante comunicación CSCOY000335, de fecha 29 de febrero de 2024, el Contratista envía versión conciliada con especialista de Interventoría, del Diseño Geométrico Zona urbana de Ataco K37+500 al K38+400.

~ Mediante comunicación CSCOY000336, de fecha 29 de febrero de 2024, el Contratista envía versión conciliada con especialista de Interventoría, del Diseño Geométrico K17+700 al K25+140, sector vía Coyaima – Ataco.

~ Mediante comunicación CSCOY000337, de fecha 29 de febrero de 2024, el Contratista envía versión conciliada con especialista de Interventoría, del Diseño Geométrico K74+500, sector puente Las Señoritas.

4.1.2. ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGIA E HIDRÁULICA

~ Mediante comunicación CSCOY000240, de fecha 24 de noviembre de 2023, el Contratista envía versión para revisión, concepto Hidráulico del Box Coulvert localizado en el K42+075, Ataco – Las Señoritas.

~ Mediante comunicación CSCOY000261, de fecha 13 de diciembre de 2023, el Contratista envía versión para revisión, Informe de análisis de Hidrología e Hidráulica rio Saldaña sector Las Señoritas K72+000.

~ Haciendo parte de la comunicación CSCOY000262, de fecha 14 de diciembre de 2023, el Contratista envía versión para revisión, Estudios y diseños para el puente K74+000, en el componente de Hidrología e Hidráulica.

~ Mediante comunicación CSCOY000288, de fecha 13 de enero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, atención observaciones especialista Hidráulica interventoría box Coulvert K42+075, del comunicado 2023121431061858.

~ Mediante comunicación CSCOY000298, de fecha 24 de enero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, atención observaciones del comunicado 2024010431061870, Anexo EVB-2023-328-HHS-01 revisión INFORME DE ANÁLISIS DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA RIO SALDAÑA SECTOR LAS SEÑORITAS K72+000.

~ Mediante comunicación CSCOY000305, de fecha 31 de enero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, el ANÁLISIS DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA K17+730 – K25+140 COYAIMA - ATACO.

~ Mediante comunicación CSCOY000323, de fecha 14 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, el INFORME DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA K37+400 – K38+900 ZONA URBANA ATACO, Versión 1.

~ Mediante comunicación CSCOY000328, de fecha 20 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, el documento para ATENCION COMUNICADO 20240216310618122, anexo EVB-2023-328-HHS-04. Revisión Informe de análisis de hidrología e hidráulica rio Saldaña sector Las Señoritas K72+000.

~ Mediante comunicación CSCOY000338, de fecha 29 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, los PLANOS HIDRAULICOS MURO K72+000. Versión 4, conciliada con especialista Hidráulico de interventoría.

4.1.3. ESTUDIOS ESTRUCTURAL, GEOLOGÍA, GEOTECNIA

~ Mediante comunicación CSCOY000262, de fecha 14 de diciembre de 2023, el Contratista envía versión para revisión, Estudios y diseños para el puente K74+000, en los componentes de Estructuras, Geología y Geotecnia.

~ Mediante comunicación IYD001932, de fecha 01 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, los documentos para atención de observaciones a los Estudios y diseños para el puente K74+000, en los componentes de Geología y Geotecnia.

~ Mediante comunicación IYD001940, de fecha 06 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, los planos estructurales para el puente K74+000.

~ Mediante comunicación CSCOY000312, de fecha 06 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, INFORME GEOTECNICO K72+000 MURO CASERÍO LAS SEÑORITAS.

~ Mediante comunicación CSCOY000322, de fecha 13 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, INFORME GEOTECNICO SITIO CRITICO K72+100, SECTOR CASERÍO LAS SEÑORITAS V0.

4.1.4. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTO

~ Mediante comunicación CSCOY000271, de fecha 26 de diciembre de 2023, el Contratista envía versión para revisión, Diseño de Pavimentos sector zona urbana de Ataco del K37+500 al K38+400.

~ Mediante comunicación CSCOY000278, de fecha 05 de enero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, Diseño de Pavimentos sector Coyaima - Ataco del K17+750 al K25+140.

~ Mediante comunicación CSCOY000294, de fecha 22 de enero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, atención observaciones Puente K74+500, Componente diseño de pavimentos, del comunicado 2024010431061870, anexo CCGC-CTOINVIAS-002-2023

~ Mediante comunicación CSCOY000299, de fecha 24 de enero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, atención observaciones del comunicado 2024011631061884, anexo CCGC-CTOINVIAS-003-2024, Diseño de pavimentos Zona urbana de Ataco K37+500 al K38+400.

~ Mediante comunicación CSCOY000321, de fecha 13 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, Diseño de pavimentos Zona urbana de Ataco K37+500 AL K38+400, Versión 3, atención observaciones de especialista de Diseño Geométrico.

4.1.5. ESTUDIOS Y DISEÑOS URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO

~ Mediante comunicación CSCOY000313, de fecha 06 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, Diseño espacio público Zona urbana de Ataco K37+500 al K38+400.

4.1.6. DISEÑOS DE CONCRETOS

~ Mediante comunicación CSCOY000308, de fecha 02 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, Diseño de concreto convencional de 2000 PSI, 3000 PSI, 4000 PSI y 5000 PSI.

~ Mediante comunicación CSCOY000319, de fecha 08 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, Diseño de concreto premezclado de 2000 PSI, 3000 PSI, 4000 PSI y MR-42.

4.2. ACTIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS

Para el periodo objeto y alcance del presente informe, el Contratista envió a la Interventoría, la siguiente documentación, perteneciente al campo documental técnico administrativo:

~ Mediante comunicación CSCOY000324, de fecha 14 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, el documento de Programa de Gerencia de Proyecto.

~ Mediante comunicación CSCOY000338, de fecha 28 de febrero de 2024, el Contratista envía versión para revisión, el documento para dar ATENCION COMUNICADO 202402133106181116, observaciones al Flujo de Caja; Discriminación de la administración del A.I.U.; Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.

En cuanto a las labores técnico-administrativas, se realizaron reuniones, mencionadas a continuación:

~ El 02 de febrero de 2024, en las instalaciones de la Gobernación del Tolima, se realizó reunión No. 13, con la participación de funcionarios de la Gobernación del Tolima – Secretaría de Infraestructura y Hábitat, INVIAS Supervisión Tolima, Interventoría y Contratista; con el objetivo de realizar seguimiento y verificación al estado del contrato de obra 1857 – 2023.

~ El 07 de c de 2024, se realizó reunión No. 14, conjunta entre profesionales especialistas del área de diseño geométrico, hidrología e hidráulica, también se tuvo la presencia de directores y residentes de obra e Interventoría; con el objetivo de realizar revisión al concepto de diseño geométrico para el sector 2 zona urbana del municipio de Ataco K37+500 al K38+400, así como revisiones a las obras hidráulicas complementarias del tramo.

~ El 13 de febrero de 2024, se realizó reunión No. 15, conjunta entre profesionales residentes del área social, de la Interventoría, el Contratista; con el objetivo de realizar seguimiento compromisos del acta de reunión No. 12.

~ El 23 de febrero de 2024, se realizó virtualmente, reunión No. 17, con la participación de funcionarios de INVIAS coordinación de vías regionales, Supervisor del Contrato de Interventoría; funcionarios de Interventoría y Contratista; con el objetivo de presentar al nuevo coordinador de vías regionales del INVIAS; además realizar seguimiento y verificación al estado del contrato de obra 1857 – 2023.

~ El 26 de febrero de 2024, se realizó reunión No. 18, conjunta entre profesionales especialistas del área de diseño geométrico, de la Interventoría, el Contratista; con el objetivo de dar definición de parámetros del componente de diseño geométrico, de todos los tramos objeto del contrato de obra 1857-2023.

~ El 26 de febrero de 2024, se realizó reunión No. 19, conjunta entre profesionales especialistas del área de geotecnia, de la Interventoría, el Contratista; con el objetivo de realizar mesa técnica de trabajo del área de geotecnia.

~ El 28 de febrero de 2024, se realizó reunión No. 20, conjunta entre profesionales especialistas del área de geotecnia, de la Interventoría, el Contratista; con el objetivo de dar definición de parámetros del componente de Hidráulica, de todos los tramos objeto del contrato de obra 1857-2023.

5. RECOMENDACIONES

~ La Gobernación del Tolima, en reunión del día 23 de octubre de 2023 y reuniones sucesivas; reitera la priorización de la intervención en el sector Las Señoritas, con la obra de protección marginal de la ribera derecha del rio Saldaña; así mismo, la intervención de la obra ubicada en el K42+075 y el mejoramiento de la vía en la zona urbana del municipio de Ataco desde el cementerio hasta el puente sobre la quebrada Paipa, en la vía que conduce hacia el municipio de Planadas.

~ Se recomienda realizar rocería y poda a lado y lado de la vía, en todo el corredor vial del alcance del Contrato.

~ Es de mencionar y reiterar que en la vía Coyaima – Ataco, el tramo comprendido entre el K25+100 (puente sobre la quebrada Chiparco) y el K37+000 (entrada a la zona urbana del municipio de Ataco – Batallón del ejército de Colombia), no hace parte del alcance e intervención del presente Contrato de obra 1857 – 2023.

~ Como recomendación se comparte lo manifestado por el coordinador de vías regionales del INVIAS para el presente contrato, en cuanto a "*unir esfuerzos y sacar adelante el proyecto, esto debido a la situación actual del país donde lo que se requiere es entregar al país y a las comunidades este tipo de obras*". (En cursiva texto tomado del acta de reunión No. 17).
