CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
CORPOGUAJIRA.

INFORME DE INTERVENTORIA MENSUAL N° 1

CONTRATO 069 de 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA.

CONTRATISTA PRIDA SAS

JULIO DE 2024

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. Descripción del proyecto

3. Contrato de Obra

3.1 Información general del contrato
3.2 Obras programadas y características técnicas del contrato
3.3 Obras programadas en el periodo respectivo
3.4 Obras ejecutadas acumuladas a partir de la iniciación del contrato
3.5 Control de programación de obra de acuerdo con la programación entregada por el contratista de obra.
3.6 Informe de inversión del anticipo.
3.6.1 personal
3.6.2 Equipo
3.7 Control de calidad
3.8 Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato.


4. Contrato de interventoría
4.1 Información general del contrato
4.2 Actividades desarrolladas por la interventoría
4.2.1 Actividades administrativas
4.2.1.1 Correspondencias enviadas y recibidas.
4.2.1.2 Actas generadas en el periodo del informe
4.2.1.3 Actas generadas en el desarrollo del contrato
4.2.1.4 Actas de Comité técnico
4.2.1.5 Sistema integral de seguridad social
4.2.1.6 Revisión de vigencia de las garantías
4.2.2 Actividades técnicas
4.2.3 Seguimiento de la interventoría a la construcción de las estufas ecoeficientes.
4.2.3.3 seguimiento de la interventoría a la divulgación del proyecto.
4.2.3.4 seguimiento de la interventoria a las actividades de socialización y sensibilización ambiental.
4.2.3.5 Avance físico de actividades
4.2.3.6 Actividades programadas y ejecutadas en el periodo
4.2.3.7 Cuadro control de personal y equipo
4.2.4 Actividades financieras

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades realizadas por responsable del Contrato de obra pública No. 0084 de 2023, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA"** en el periodo comprendido entre el 08 de Julio al 31 de Julio de 2024, de igual manera las actividades ejecutadas por la empresa interventora PRIDA S.A.S. responsable del contrato de consultoría N° 069 de 2024 el cual tiene por objeto **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA** el mismo periodo de tiempo, las cuales corresponden a los componente, técnicos, administrativo, financiero, contable, social y jurídico.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra 0084 de 2023 el cual tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA"**. Tiene varios componentes entre los cuales sobresalen la construcción de 150 estufas ecológicas en las comunidades de la zona rural del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha –LA GUAJIRA, como lo muestra en la siguiente ilustración

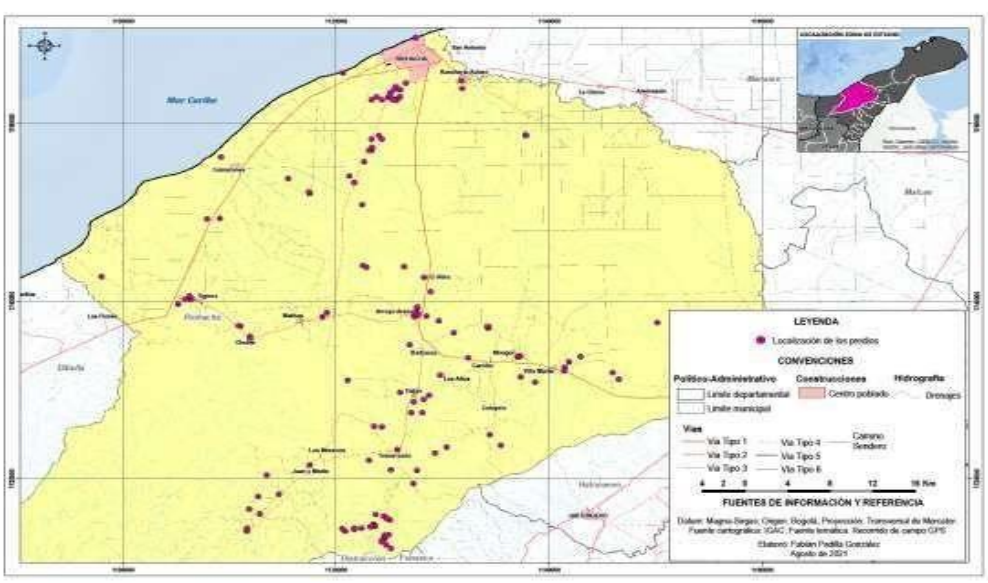

2.1. Características Del Proyecto

El proyecto involucra realizar:

1. Actividades preliminares donde se verificará el sitio donde se va a construir la estufa, se deberá colocar 4 estacas para formar una escuadra, dejando 10 centímetros en cada lado para colocar las hiladas de ladrillos y con ello, formar un perímetro interior de 95 cm de ancho por 63 cm de largo.
2. Construir estufas ecoeficientes con ladrillo normal, ladrillo refractario, mortero y partes metálicas que comprende un módulo de 105 cm de largo, 83 cm de altura y 73 cm de fondo, que cumplimiento a la Norma Técnica - Estufas de biomasa para cocción de alimentos (NTC 6358),
3. Realizar 2 talleres de socialización del proyecto y auditoria visible.
4. Realizar 2 talleres de capacitación para la operación y mantenimiento de la estufa ecoeficiente
5. Realizar divulgación del proyecto
6. Ejercer la interventoría sobre las actividades de implementación de estufas

3. CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General Del Contrato

NUMERO DE CONTRATO	0084 DE 2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	ASOCIACION ASOPAGUA
NIT	825003727-2
VALOR	$495.358.745
ANTICIPO 50%	0%
PLAZO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	8 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	7 DE NOVIEMBRE DEL 2024
SUSPENSION	N/A
PRORROGAS	N/A
ADICIONES	N/A
% OBRA PROGRAMADA	0
% OBRA EJECUTADA	0
% DE ATRASO	0
ACTAS PARCIALES	N/A

3.2. Obras Programadas Y Características Técnicas Del Contrato

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION																	
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA																	
1.ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
Ítem	Descripción	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
A	ACTIVIDADES PREVIAS																
	Verificación y Validación Información de Beneficiarios																
	Realización de Cotizaciones																
	Realización de Compras de Materiales e Insumos																
1	TALLERES SENSIBILIZACION Y DIVULGACION																
1.1	Taller de socialización del proyecto y auditoria visible																
1.2	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la estufa Ecoeficiente (Manual, carta de beneficio y otros)																
1.3	Divulgación del proyecto																
2	PRELIMINARES																
2.1	Localización y replanteo																
3	CONSTRUCCION ESTUFA ECO (0,73m*1,05m) h:0,83m																
3.1	Placa maciza en concreto 1.2:3 de 10 cm de espesor																
3.2	Mampostería ladrillo tipo bocadillo, macizo liviano de 6*12*24 cm																
3.3	Mampostería ladrillo adobe macizo de 5*10*20 cm																

3.4	Mampostería ladrillo tipo farol de 10*20*40 cm																
3.5	Suministro e instalación de STC vitrificado																
3.6	Suministro e instalación KIT de Herrajes																

Hasta la fecha de corte, el contratista en su informe presenta avances en verificación y validación de información de beneficiarios y la realización de convocatorias para la primera socialización de proyecto.

Así mismo, reportó la instalación de la valla, sin embargo, esta no se ha podido validar dado que el contratista de obra no ha aportado a esta interventoría las coordenadas y el sitio de ubicación.

3.3 Obras Ejecutadas En El Período Respectivo

Hasta la fecha se continua con el proceso de reconocimiento de las áreas donde se va a realizar la construcción de las estufas ecoeficientes, tal y como se proyecta en el cronograma.

3.3.1 Instalación Valla publicitaria

Hasta la fecha el contratista no ha presentado a esta interventoría información detallada de la instalación de la valla con su georreferenciación, por tanto, no se ha podido realizar la debida verificación para determinar si esta se encuentra en un lugar estratégico y visible para la comunidad.

3.4 Obras Ejecutadas Acumuladas A Partir De La Iniciación Del Contrato

A la fecha se avanza en el empalme diagnóstico de los beneficiarios del contrato previo a la entrega de materiales para la construcción de las estufas.

3.5 Control De Programación De Obra De Acuerdo Con La Programación Entregada Por El Contratista De Obra

Hasta la fecha el contratista ha reportado:

- Verificación y validación de información de beneficiarios.
- Realización de cotizaciones
- Instalación de valla
- Convocatoria para la primera socialización del proyecto

3.6 Informe de inversión del anticipo

Según el informe parcial N.º 1 del contratista en el ítem 7.1 ***resumen de avance financiero***, manifiesta que a la fecha la entidad no ha realizado el giro de los recursos correspondientes al anticipo

3.6.1 Personal

El contratista Asociación ASOPAGUA a través de su informe relaciona su equipo de trabajo profesional y técnico presentado para la ejecución del contrato de obras, está integrado por las siguientes personas:

ITEM	NOMBRE	PROFESION	DEDICACION
1	Alexander Arévalo Muñoz	Director de Proyecto	50%
2	Álvaro Fuad Raad Raad	Residente	100%
3	Noribeth Cúrvelo Ipuana	Profesional del área social	25%

3.6.2 Equipo

A la fecha no se ha utilizados equipos especializados para el desarrollo de las actividades.

3.7 Control de calidad

A la fecha de corte del presente informe, el contratista manifiesta que no ha realizado la compra de insumos

3.8 Dificultades Presentadas Durante El Desarrollo Del Contrato

Basados en el informe N° 1 sobre las actividades relacionadas por el contratista, no mencionan dificultades.

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. Información general del contrato

NUMERO DE CONTRATO	069 DE 2024
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	PRIDA SAS
NIT	900026388-1
VALOR	$ 55.131.702
ANTICIPO 50%	$ 27.565.851
PLAZO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	8 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	7 DE NOVIEMBREB DE 2024

SUSPENSION	N/A
PRORROGAS	N/A
ADICIONES	N/A
% OBRA PROGRAMADA	
% OBRA EJECUTADA	
% DE ATRASO	0
ACTAS PARCIALES	N/A

4.2. Actividades desarrolladas por la interventoría

Se realizó la verificación del cronograma de trabajo, el plan de inversión y el plan de trabajo

4.2.1 Actividades Administrativas

Se dio trámite a la solicitud de anticipo realizada por el contratista.

4.2.1.1. Correspondencia Enviada Y Recibida**:**

Se recibió las siguientes correspondencias:

- ✓ Ajuste al Plan de inversión Del Anticipo 11 de Julio de 2024 recibido por supervisión.
- ✓ Plan de inversión del anticipo 16 de julio de 2024 recibida por supervisión.
- ✓ FIRMA Formatos (Proyectos Integrales De Desarrollo Ambiental SAS) - PA Anticipo Asopagua 18 de Julio de 2024 recibido por supervisión
- ✓ Aprobación valla publicitaria 19 de Julio de 2024 recibido por supervisión
- ✓ Certificación bancaria para pagos recibida el 19 de Julio de 2024
- ✓ Estructura Modelo para entrega de Informes recibida el 23 de Julio de 2024 enviada por Supervisión
- ✓ Reiteración solicitud de programación semanal y otros 29 de Julio de 2024 recibido por supervisión.
- ✓ Solicitud de programación semanal de actividades recibida el 24 de Julio de 2024
- ✓ Invitación jornada de socialización del inicio del contrato de obras públicas 0084 de 2023 recibida el 30 de julio de 2024.
- ✓ Oficio cambio de personal y aprobación de hoja de vida recibida el 01 de Agosto de 2024. Enviada por el contratista.

4.2.1.2. Actas generadas en el periodo del informe

A la fecha no se han generado actas.

4.2.1.3. Actas generadas en el desarrollo del contrato

A la fecha no se han generado actas.

4.2.1.4. Actas de comité técnico

No se realizó comité en el mes de Julio.

4.2.1.5. Sistema Integral de seguridad social

El personal de interventoría se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social.

4.2.1.6. Revisión de Vigencia de las Garantías.

Las garantías fueron aprobadas por la oficina jurídica de la corporación.

4.2.2. Actividades técnicas.

No se han realizado actividades técnicas.

4.2.3. Seguimiento De La Interventoría a la construcción de las estufas ecoeficientes.

El contratista manifiesta que, a la fecha de corte del presente informe, no se ha iniciado compra de materiales para la construcción de las estufas ecoeficientes.

4.2.3.3. Seguimiento de la interventoría a la divulgación del proyecto

Según el informe parcial Nº 1 del contratista, en el ítem 8.1.2 taller de sensibilización y divulgación. Con relación a este componente se ha avanzado en la elaboración e instalación de la de la valla publicitaria. Sin embargo, Hasta la fecha el contratista no ha presentado a esta interventoría información detallada de la instalación con su respectiva georreferenciación, por tanto, no se ha podido realizar la debida verificación para determinar si esta se encuentra en un lugar estratégico y visible para la comunidad.

4.2.3.4. Seguimiento de la interventoría a las actividades de socialización y sensibilización ambiental

El contratista Asociación ASOPAGUA convocaron a la comunidad a la primera jornada de socialización la cual se llevó a cabo de acuerdo con lo siguiente:
Fecha: lunes 05 de Agosto de 2024
Hora: 08:30 a.m.
Lugar: Instalaciones de Corpoguajira Riohacha

4.2.3.5. Avance físico de actividades

Con respecto al avance físico de la interventoría, se presentan las actuaciones administrativas:

OFICIOS ENVIADOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATISTA		
OFICIO N°	**ASUNTO**	**FECHA**
1	Observaciones Iniciales	Julio 10 de 2024
2	Documentos Tramite Anticipo	Julio 10 de 2024
3	Solicitud De Plan de inversión Del anticipo y Otros	Julio 12 de 2024
4	Solicitud de cronograma semanal de actividades	Julio 16 de 2024
5	Solicitud de programación semanal de actividades	Julio 16 de 2024
6	Revisión Documentos Anticipo	Julio 18 de 2024
7	Respuesta a programación semanal de actividades	Julio 18 de 2024
8	Reiteración solicitud de programación semanal y otros	Julio 24 de 2024
9	Documentos Tramite Anticipo Asopagua	Julio 24 de 2024
10	Solicitud de informe de ejecución	Julio 29 de 2024

4.2.3.6. Actividades programadas y ejecutadas en el periodo

Hasta se trabaja en el empalme diagnóstico del periodo, a la espera de la entrega de las coordenadas y ubicación exacta de la valla. Por su parte se programa el acompañamiento con el contratista


4.2.3.7. Cuadros control de personal y equipo

ITEMS	CANTIDAD
Director de Interventoría Juan Carlos Amaya	1
Ingeniero Residente Heiser Rafael López Cuello	1
Profesional área social Yisrlen Cristina Fragoso Fuentes	1

4.2.4. Actividades Financieras

El contrato durante el periodo del presente informe realizó un avance físico del 25% y un avance financiero del 17.5%, equivalente a $9.648.047,85 del valor contratado, representado por el pago a proveedores, gastos de personal y oficina. Por su parte

4.2.4.1. Ejecución financiera programada Contrato de interventoría

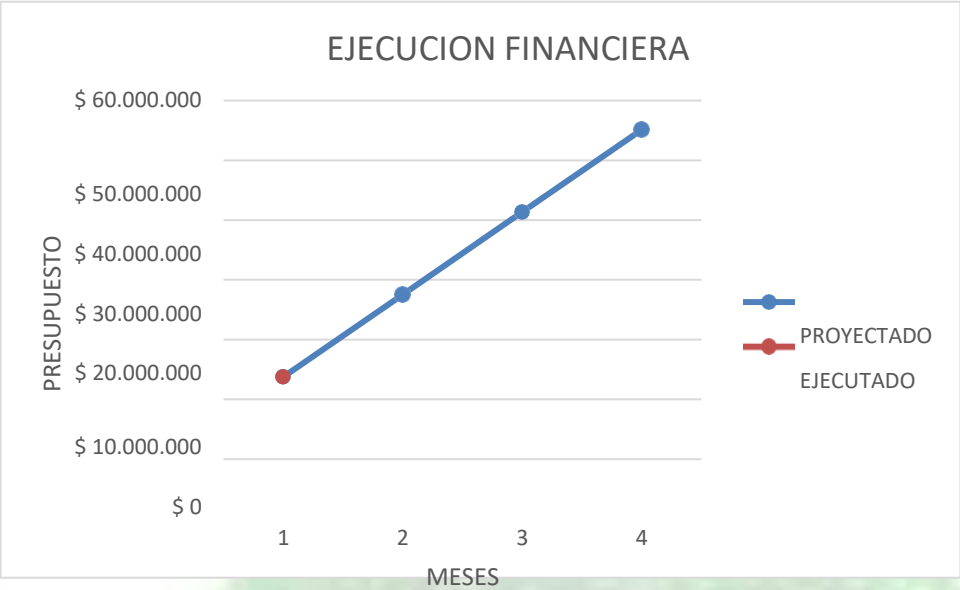

En la gráfica se observa la ejecución financiera proyectada y la ejecutada, por lotanto, la ejecución financiera está de acuerdo a lo planificado

4.2.4.2. Ejecución financiera del periodo Contrato de interventoría

El contrato financieramente se encuentra ejecutando de acuerdo a la programación, para el mes 1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA							
		A	B	C	D	F	
ITEM	ACTIVIDAD	SUELDO MES BÁSICO	CANT	% DEDICACIÓN	F.M.	N° MESES	TOTAL PARCIAL (E * F)
1	COSTOS DEL PERSONAL						
1.1	Personal de Supervisión						
1.1.1	Director de Interventoría	$ 5.000.000	1	50%	1,70	0.7	$ 2.975.000
1.1.2	Ingeniero Ambiental o civil	$ 3.200.000	1	100%	1,70	0.7	$ 3.808.000
1.1.3	Trabajadora Social	$ 2.226.224	1	50%	1,70	0.7	$ 1.324.603

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 8.107.603
RESUMEN GENERAL	
COSTO TOTAL	$ 8.107.603

IVA 19%	**$ 1.540.445**
VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**$ 9.648.048**

4.2.4.3. Ejecución financiera Acumulada Contrato de interventoría

En la actualidad se ha registrado el avance diagnóstico del proyecto.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA							
		A	**B**	**C**	**D**	**F**	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**CANT**	**% DEDICACIÓN**	**F.M.**	**N° MESES**	**TOTAL PARCIAL (E * F)**
1	**COSTOS DEL PERSONAL**						
1.1	**Personal de Supervisión**						
1.1.1	Director de Interventoría	$ 5.000.000	1	50%	1,70	0.7	$ 2.975.000
1.1.2	Ingeniero Ambiental o civil	$ 3.200.000	1	100%	1,70	0.7	$ 3.808.000
1.1.3	Trabajadora Social	$ 2.226.224	1	50%	1,70	0.7	$ 1.324.603

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 8.107.603**
RESUMEN GENERAL	
COSTO TOTAL	**$ 8.107.603**
IVA 19%	**$ 1.540.445**
VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**$ 9.648.048**

4.2.3.4 Manejo de anticipo

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO 069 DE 2024					
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	TOTAL
ITEM					
SALARIOS	$ 6.813.112	$ 6.813.112	$ 4.401.271		
GASTOS DE OFICINA Y VARIOS	$ 4.769.178	$ 4.769.178			
Total Mensual	$ 11.582.290	$ 11.582.290	$ 4.401.271	$ 0	$ 27.565.851

4.2.3.10 Aportes parafiscales

Ver anexo 1

4.2.3.11 Información financiera contrato de interventoría

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA								
		A	B	C	D	E	F	
ITEM	ACTIVIDAD	SUELDO MES BÁSICO	CANT	% DEDICACIÓN	F.M.	Valor Mes (A * B * C * D)	N° MESES	TOTAL PARCIAL (E * F)
1	COSTOS DEL PERSONAL							
1.1	Personal de Supervisión							
1.1.1	Director de Interventoría	$ 5.000.000	1	50%	1,70	$ 4.250.000	4	$ 17.000.000
1.1.2	Ingeniero Ambiental o civil	$ 3.200.000	1	100%	1,70	$ 5.440.000	4	$ 21.760.000
1.1.3	Trabajadora Social	$ 2.226.224	1	50%	1,70	$ 1.892.290	4	$ 7.569.161

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 46.329.161
RESUMEN GENERAL	
COSTO TOTAL	$ 46.329.161
IVA 19%	$ 8.802.541
VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 55.131.702

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIONES

5.1 OBSERVACIONES

A la fecha el contrato se desarrolla en base a la programación y plan de trabajo.
Por su parte se exhorta al contratista de obra la puntualidad en la entrega de la programación semanal para continuar con el desarrollo del proceso; así mismo, con cumplimiento de entrega de informe

5.2 RECOMENDACIONES

se le recomienda al contratista cumplir con la fecha estipulada para la entrega de los informes

5.3 CONCLUSIONES

Se concluye que el contrato avanza según al cronograma establecido

Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Prida Sas

ANEXOS
Anexo 1 parafiscales
Anexo 2 oficios proyectados por la interventoría

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-08-21, 04:47:48 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1065298474

Periodo Cotización 202407 **Periodo Servicio** 202408

PAGADA 2024-08-12 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PRIDA SAS				
Documento	NI 900026388	**Dirección**	CR 101 #73 - 02		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4454396		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 79555163		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79555163		**Residente**		**Exonerado**	**S**	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 2.300.000	230301		16 %	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 2.300.000	$ 56.100	CCF24	4 %	$ 2.300.000	$ 92.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 92.000	$ 56.100	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1119836743		FRAGOZO FUENTES YISRLEN CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ELANDRO DIAZ ETPA 1	VALLEDUPAR-CESAR	7778374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	803340587	9470580342	I	2024/08/13	2024/07/29	NEQUI	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1119836743	FRAGOZO YISRLEN	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/07/27 09:42 AM

Powered by CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122405578		HEISER RAFAEL LOPEZ CUELLO	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 17 numero 10 - 50	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3172873495	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	55452152	9471137921	I	2024/08/21	2024/08/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$246,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$693,334	$111,000			$693,334	$86,700			$0	$0			$693,334	$48,300		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$693,334	$111,000			$693,334	$86,700			$0	$0			$693,334	$48,300		$0	$0
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)					$693,334	$111,000			$693,334	$86,700			$0	$0			$693,334	$48,300		$0	$0
1	CC	1122405578	LOPEZ HEISER	230301	16	$693,334	$111,000	EPS005	16	$693,334	$86,700		0	$0	$0	14-23	16	$693,334	$48,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$693,334	$111,000			$693,334	$86,700			$0	$0			$693,334	$48,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122405578		HEISER RAFAEL LOPEZ CUELLO	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 17 numero 10 - 50	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3172873495	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	55452152	9471137921	I	2024/08/21	2024/08/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$246,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$111,000	$0	$0	$111,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$111,000	$0	$0	$111,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,300	$0	$0	$48,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,300	$0	$0	$48,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$86,700	$0	$0	$86,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$86,700	$0	$0	$86,700

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122405578		HEISER RAFAEL LOPEZ CUELLO	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 17 numero 10 - 50	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3172873495	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	868399598	9471759464	N	2024/08/21	2024/08/26	NEQUI	5	$108,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$303,333	$48,500			$303,333	$37,900			$0	$0			$303,333	$21,100		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$303,333	$48,500			$303,333	$37,900			$0	$0			$303,333	$21,100		$0	$0
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)					$303,333	$48,500			$303,333	$37,900			$0	$0			$303,333	$21,100		$0	$0
1	CC	1122405578	LOPEZ HEISER	230301	16	($693,334)	($111,000)	EPS005	16	($693,334)	($86,700)		0	$0	$0	14-23	16	($693,334)	($48,300)	0	$0	$0
2	CC	1122405578	LOPEZ HEISER	230301	23	$996,667	$159,500	EPS005	23	$996,667	$124,600		0	$0	$0	14-23	23	$996,667	$69,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$303,333	$48,500			$303,333	$37,900			$0	$0			$303,333	$21,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122405578		HEISER RAFAEL LOPEZ CUELLO	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 17 numero 10 - 50	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3172873495	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	868399598	9471759464	N	2024/08/21	2024/08/26	NEQUI	5	$108,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,500	$200	$0	$48,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$48,500	$200	$0	$48,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,100	$100	$0	$21,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$21,100	$100	$0	$21,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,900	$200	$0	$38,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$37,900	$200	$0	$38,100
TOTAL				1	$107,500	$500	$0	$108,000

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira Julio 10 de 2024

Oficio N° 01

Señor.
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua
Ciudad

REF: Observaciones iniciales

Cordial saludo, por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de precisar algunas generalidades abordadas en la reunión llevada a cabo el día 8 de Julio de 2024 en las instalaciones de Corpoguajira, en el marco del contrato 084 de 2024 el cual tiene por objeto '**CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA'.**

1. El correo oficial de la interventoria para recibir y enviar correspondencia es pridasas692024@gmail.com
2. Los dias viernes de cada semana el contratista remitirá tanto a interventoria como a la supervisión la programación de actividades a ejecutar la semana siguiente.
3. El día lunes de cada semana el contratista remitirá tanto a interventoria como a la supervisión el avance de obra de la semana anterior.

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Prida Sas

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira Julio 10 de 2024

Oficio N° 02

Ingeniera.
Angelica Mendoza
Supervisora Contrato 069 de 2024

REF: Documentos Tramite Anticipo

Cordial saludo, por medio de la presente remito a usted los documentos necesarios para tramitar el pago del anticipo correspondiente al contrato de Interventoria 069 de 2024 el cual tiene por objeto '**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA"**.

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Contrato 069 de 2024

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira Julio 12 de 2024

Oficio N° 03

Señor.
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua
Ciudad

REF: Solicitud De Plan de inversión Del anticipo y Otros

Cordial saludo, por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar de manera urgente el plan de inversión del anticipo y el cronograma de obra ajustado a la fecha de suscripción del acta de inicio, correspondiente al contrato 084 de 2024 el cual tiene por objeto '**CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA'.**

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Director de Interventoria

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar, La Guajira, 16 De Julio 2024

Oficio N° 05

Señor
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal
AsopaguaCiudad

Ref: Solicitud de programación semanal de actividades

Cordial Saludo

En relación de las actividades correspondientes al contrato **CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA** solicito a Asopagua como contratista la programación de actividades correspondientes a la semana del 15 al 19 de Julio del 2024 que nos permita hacer un seguimiento adecuado de desarrollo del proyecto la cual hasta la fecha no ha sido enviada a esta interventoría.

Por lo anterior, solicitamos que nos hagan llegar a la brevedad posible la programación semanal de actividades, lo cual quedo estipulada en la reunión llevada a cabo el día 8 de Julio de 2024 en las instalaciones de Corpoguajira y solicitada en el oficio N°1 emitido por esta interventoría con fecha Julio 10 de 2024.

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Prida Sas

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar, La Guajira, 18 De Julio 2024

Oficio N° 06

Señor
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal
AsopaguaCiudad

Ref: Revisión Documentos Anticipo

Cordial Saludo

En relación a los documentos remitidos a esta interventoría correspondientes al contrato 084 de 2023 el cual tiene por objeto la **CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA** solicito a Asopagua como contratista hacer las siguientes correcciones a dichos documentos, con el fin de dar tramite al anticipo a la mayor brevedad

1. En el encabezado del Oficio Remisorio se hace referencia que el contrato de obra al cual se le hace interventoria es el No. 0056 de 2023, corregir a contrato 084 de 2023 (Folio 1)
2. En el mismo oficio remisorio en el párrafo en el cual se describe la documentación aportada y solicitud a la interventoria se hace referencia al contrato de obra 084 de 2024, corregir a contrato 084 de 2023 (Folio 1)
3. En el plan de inversión del anticipo en el número de contrato hace referencia a contrato 0123 de 2023, Corregir a 084 de 2023 (Folio 3)

A la espera de las correcciones

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Prida Sas

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar, La Guajira, 18 De Julio 2024

Oficio N° 07

Señor
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua
Ciudad

Ref: Respuesta a programación semanal de actividades

Cordial Saludo,

En atención al correo enviado el 17 de julio del presente año por el contratista de obra ASOPAGUA en respuesta al oficio con consecutivo No. 5 sobre solicitud programación semanal de actividades emitida por esta interventoría el 16 de julio del mismo año, me permito informarles, que si bien, la semana pasada proporcionaron el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, no se está solicitando cronograma pues la información requerida no corresponde con lo solicitado en el oficio N° 1, teniendo en cuenta que no se detalla en cuanto a fecha, modo y lugar del desarrollo de las actividades que se están ejecutando, por consiguiente no aporta a esta interventoría información puntual y especifica con el fin de que se pueda identificar el avance en ejecución del contrato de obra 084 de 2023 el cual tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA"** por tanto, esta interventoria se ratifica en la solicitud de la programación semanal detallada de las actividades correspondientes de los días 15 al 19 de julio del 2024 y semanas posteriores. tal y como se acordó en la reunión llevada a cabo el lunes 8 de Julio del año en curso y solicitada mediante oficio No. 01 emitido el 10 de julio de 2024.

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Prida Sas

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar, La Guajira, 24 De Julio 2024

Oficio N° 08

Señor
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua
Ciudad

Ref: Reiteración solicitud de programación semanal y otros

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se reitera la solicitud de presentar la programación semanal los dias viernes correspondiente a la semana siguiente de ejecución y los dias lunes presentar los avances de obra de la semana anterior, dado que a la fecha esta interventoria no ha recibido ninguno de estos documentos, se reitera la solicitud de presentar dicha programación semanal y los reportes de avance semanal de ejecución del contrato de obra 084 de 2023 el cual tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA"** la no presentación de dichos reportes podría representar un posible incumplimiento a la cláusula 9 **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA** numeral 15 del contrato 084 de 2023 la cual transcribo a continuación **" *15. Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato,",*** con base en lo anteriormente expuesto se solicita al contratista ASOPAGUA presentar de manera inmediata los documentos solicitados mediante oficio N° 01 del 10 de julio y solicitados nuevamente mediante oficio N° 07 del 18 julio del 2024.

.

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director de Interventoria
Contrato de Obra 084 de 2023

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira Julio 24 de 2024

Oficio N° 09

Ingeniera.
YURI PAULIN HURTADO GARCÍA
Supervisora Contrato de Obra 084 de 2023

REF: Documentos Tramite Anticipo Asopagua

Cordial saludo, por medio de la presente remito a usted certificación de desembolso y plan de inversión del anticipo firmado documentos necesarios para tramitar el pago del anticipo correspondiente al contrato de obra 084 de 2023 el cual tiene por objeto '**CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA BPIN 20223218000002".**

Cordialmente,

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoria
Contrato de Obra 084 de 2023

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira Julio 29 de 2024

Oficio N° 10

Señor:
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua
Ciudad

REF: Solicitud de informe de ejecución

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitarle el informe de ejecución N° 1 en el marco del desarrollo del contrato N° 084 DE 2023 el cual tiene por objeto **CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA"** contrato suscrito entre CORPOGUAJIRA Y Asociación ASOPAGUA, lo cual quedo estipulado en la reunión llevada a cabo el día 8 de Julio de 2024 en las instalaciones de Corpoguajira, en donde la Asociación ASOPAGUA se comprometió a enviar los informes de ejecución los días 28 de cada mes y hasta la fecha esta interventoría no ha recibido dicho informe correspondiente al mes de Julio, le solicitamos a la Asociación Asopagua que dé cumplimiento a los compromisos adquiridos en el desarrollo del contrato.

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director Interventoria
Contrato de Obra 084 de 2023
