Alcaldía de Florencia

NIT: 800.095.728-2

HOJA DE RUTA No. 002

NOMBRE DE LA CUENTA: **FARID SILVA CULMA** CONTRATO 20240190

FECHA				OFICINA ORIGEN	DESTINO	OBJETO	OBSERVACIONES	RECIBIDO	HORA
DIA	MES	AÑO	HORA						
20	08	2024	10:00am	Secretaria Ambiente y Desarrollo Rural	Oficina Jurídica	SUPERVISIÓN			

	Informe de Avance y ejecución **Contrato prestación de servicios N° 20230892**	**Proyecto** **Entidad:** Alcaldía del Municipio de Florencia - Caquetá
		Cooperante: Corporación Educativa y Científica Cosmos

INFORME DE SUPERVISIÓN, CONTRATO No. 20230892 DE 26 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE FLORENCIA E HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.; PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE AMBIENTE EN LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "RESTAURACIÒN FORESTAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO HACHA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ"

Informe de Supervisión Avance y Ejecución
Convenio especial de cooperación No.20230024
De 09 de Octubre de 2023

PERIODO
01 de diciembre de 2023 – 31 de diciembre de 2023

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

Diciembre 31 de 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. Localización del proyecto. 7
2.2. El proyecto cuenta con justificación legal y normativa. 10
2.3. Características técnicas del proyecto. 11
2.4. Participantes del proyecto. 11
2.4.1. Análisis de los participantes. 12
2.4.2. Población afectada por el problema. 13
3. POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN 15
3.1. Características demográficas de la población objetivo. 16
4. ETAPAS DEL PROYECTO 20
5. INFORMACIÓN DEL CONVENIO 21
5.1. Información General del convenio. 21
5.2. Descripción de las actividades ejecutadas por la Corporación Educativa y Científica Cosmos. 21
5.3. Reporte administrativo. 22
5.3.1. Personal del Convenio. 22
5.4. Seguimiento actividades no previstas. 22
6. REPORTES DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 23
6.1. Informe financiero y presupuestal convenio. 23
6.2. Seguimiento Garantías y Seguros Convenio 23
6.3. Seguimiento a la inversión del Pago Anticipado. 24
6.4. Pagos realizados al Cooperante. 25
7. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN 26
7.1. Información general del contrato de supervisión. 26
7.2. Descripción de las actividades a realizar por el supervisor. 27

7.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Supervisión. 39
7.4. Informe de seguimiento al programa social. 39
7.5. Informe de seguimiento Jurídico 39
7.6. Información actividades no previstas 41
7.7. Suministro de insumos de bioseguridad COVID-19 41
8. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS 43
8.1. Certificación de pagos de seguridad social y parafiscales. 43
8.2. Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal Decreto 1082 de 2015. 43
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 44
9.1. Aspectos Técnicos y de avance 44
9.2. Reporte Técnico 45
9.3. Socialización con comunidades. 45
9.4. Visitas técnicas a participantes del convenio. 45
9.5. Comunidad interesada en participar en el convenio 46
9.6. Actividad de zonificación y levantamiento de información cartográfica 46
9.7. Modificaciones al vivero. 46
9.8. Material vegetal (semillas - plántulas). 47
10. ANEXOS .....
Anexo 1. Diarios de campo

1. INTRODUCCIÓN

La tala de los bosques amazónicos se ha venido intensificando en los últimos 20 años en el país, especialmente desde el año 2011, situación que tiene en riesgo los servicios ecosistémicos de la Amazonia, pues en las últimas dos décadas 2´567.326 hectáreas de bosque se han perdido como consecuencia de la tala indiscriminada (Determinantes y Asuntos Ambientales para el Ordenamiento Territorial en el departamento del Caquetá, 2014).
El departamento de Caquetá fue el que más aportó a esa pérdida con 209.336 hectáreas (30% del total), los municipios que tuvieron mayores áreas deforestadas fueron San Vicente del Caguán (35 %), Cartagena del Chaira (24 %), Solano (12%), Puerto Rico (7 %), y los demás municipios con porcentajes menores, reportado por SINCHI, 2014.

El municipio de Florencia cuenta con un área aproximada de 229.200 Has, de los cuales cerca del 40% se localizan en paisaje de Cordillera por encima de los 900 msnm, pertenece a la Reserva Forestal de la Amazonia creada por la Ley 2ª de 1959; el área restante, localizada en el Piedemonte y la Llanura Amazónica, fue sustraída de ésta reserva para propiciar el asentamiento de las poblaciones localizadas en el área, y para el establecimiento del Distrito de Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá.

La cuenca del río Hacha con un área de 50.030,17 ha, comprende el 21,8% del municipio de Florencia, el 89% de su territorio se encuentra en la cordillera Oriental (partes media y alta de la cuenca) y el 11% restante pertenece a la altiplanicie amazónica (parte baja), desempeñando una función estratégica como abastecedora de agua para la ciudad de Florencia además de ofrecer otros importantes bienes y servicios ambientales (POMCA del rio Hacha, 2018).

Sin embargo, la cuenca ha sufrido alteraciones en su ecosistema, principalmente en la cobertura arbórea causada por disturbios de origen natural como deslizamientos (movimientos de masa), inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales y humanos como la agricultura y praderización, minería ilegal (extracción de carbón forestal), quemas y contaminación. Dentro de los tensionantes generadores de los disturbios de origen humano sobresale la deforestación, reportándose en el municipio de Florencia entre el año 2.013 y 2.022, 3.964 hectáreas (has) deforestadas, con una tasa media de 396,4 has (IDEAM SIAT-AC, 2018), de las cuales el 60% ha sido en la cuenca del rio Hacha que para el mismo periodo reporta una pérdida de bosque de 237,9 has anuales en promedio, SADR,2022 y POMCA, 2018.

Por tal razón con el presente proyecto se pretende reforestar 80 has con especies maderables autóctonas que están en vía de extinción por la presión de la deforestación como lo son Achapo, Cedro Rosado, Abarco y Costillo.

El proyecto comprende en la (RESTAURACIÓN FORESTAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO HACHA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ). Esta es una alternativa para detener la deforestación e incrementar la protección de la cuenca del río Hacha.

Los objetivos específicos trazados en el proyecto son:

- Reducir la pérdida de cobertura vegetal natural en ecosistemas estratégicos de la cuenca del río Hacha.
- Disminuir la tasa de deforestación y degradación en la cuenca del río Hacha.
- Mejorar el uso de prácticas sostenibles en actividades agropecuarias en la cuenca del río Hacha.
- Elevar el conocimiento con estrategias sostenibles amigables con el medio ambiente.
- Elevar la capacidad institucional para realizar seguimiento y monitoreo a programas ambientales en la cuenca.
- Gestionar recursos para los entes territoriales.

En la cuenca del río Hacha se encuentran asentadas 12.552 personas de acuerdo con el diagnóstico reportado en la construcción del POMCA del río Hacha (2.018). Esta población se encuentra distribuida en los corregimientos El Caraño, Santo domingo, San Martín y Venecia que hacen parte de la cuenca.

La zona de influencia de este proyecto es el corregimiento El Caraño con el 82,64% de la población rural de la cuenca, donde la población afectada son 2.620 personas que habitan en las veredas priorizadas.

La población objetivo son los 80 participantes con sus familias que se encuentran asentados en las veredas priorizadas. En total son 296 personas de origen rural.

Para la ejecución del proyecto, se ha celebrado entre el municipio de Florencia - Caquetá y la Corporación Educativa y Científica Cosmos, el Convenio especial de cooperación No.20230024 de fecha 09 de octubre de 2023 y cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “RESTAURACIÒN FORESTAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO HACHA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ, con código BPIN 20233201010004”.

De la misma manera para la realización del debido seguimiento de la ejecución del proyecto, el Municipio ha contratado mediante contrato de Prestación de Servicios No. 20230892 de fecha 26 de octubre 2023 a la empresa HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

Basado en todo lo anterior, la programación del proyecto y las obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios No. 20230892, se elabora el presente documento, el cual corresponde al informe de Avance y Ejecución de la Supervisión del periodo comprendido entre el 01 diciembre del 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. **Localización del proyecto**.

El presente proyecto se encuentra focalizado en la cuenca del río Hacha, que nace en la Reserva Forestal de la amazonia a una altura aproximada de 2.400 msnm cerca del límite con el departamento del Huila, desde su nacimiento hasta su confluencia en el río Orteguaza tiene una longitud de 64,501 km y su curso lleva una dirección noroeste – sureste.

La cuenca del río Hacha se encuentra amparada por el instrumento de planificación de áreas ambientalmente estratégicas en las categorías de manejo de "Área de Especial Importancia Ambiental" contenida en el numeral 1 del artículo 1.2.6.1.1. del Decreto 1821 de 2020 y soportada por la Resolución 1662 del 10 de diciembre de 2018 por medio de la cual se aprueba el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Hacha, ubicada de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – CORPOAMAZONIA.

La cuenca del río Hacha con un área de 50.030,72 ha, comprende el 21,8% del municipio de Florencia, desempeñando una función estratégica como abastecedora de agua para la ciudad de Florencia además de ofrecer otros importantes bienes y servicios ambientales. Adicionalmente, por estar ubicada geográficamente en el sector centro - noroccidental del municipio de Florencia, el 89% de su territorio se encuentra en la cordillera Oriental (partes media y alta de la cuenca) y el 11% restante pertenece a la altiplanicie amazónica (parte baja), distribuyéndose de esta manera, en dos importantes regiones naturales del país: la región Andina y la región Amazónica. Particularmente del denominado Cinturón andino-amazónica de Suramérica, con alturas que van desde los 240 msnm hasta los 2.575 msnm, de acuerdo con el POMCA, 2018.

En este contexto, la Cuenca hidrográfica del río Hacha se encuentra conformada por cuatro de los siete corregimientos del municipio de Florencia y la totalidad del suelo urbano de la ciudad de Florencia, como se muestra en la siguiente figura.

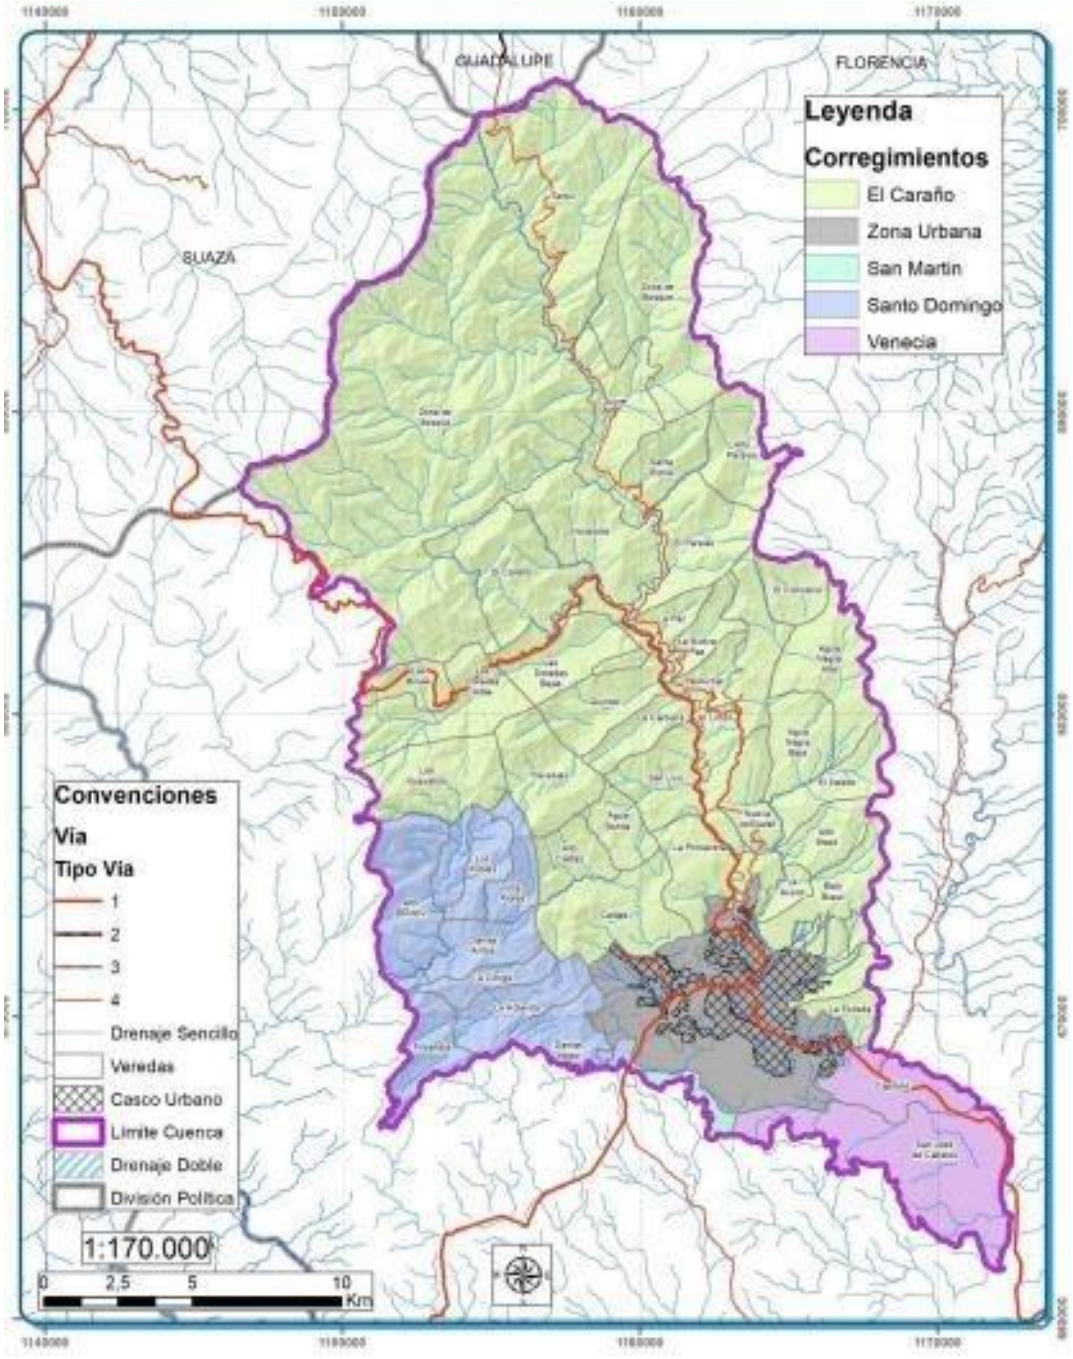


Imagen 1. Distribución de las veredas en el corregimiento el Caraño.
Fuente: Ecointegral ltda. Contrato 0390 de 2016.

En cuanto a la distribución política de la cuenca del río Hacha, esta se encuentra distribuida de la siguiente forma:

Tabla 1. Distribución política de la cuenca del río Hacha.

División territorial	Composición	Área (Has)	%
Corregimiento El Caraño	44 veredas y 6 parcelaciones	37.922,64	75,8%
Corregimiento Santo Domingo	9 veredas	5.081,5	10,2%
Corregimiento San Martín	2 veredas parciales	206,53	0,4%
Corregimiento Venecia	2 veredas parciales	3.016,76	6,0%
Zona Urbana	Casco urbano	1.597,76	7,6%
	Área de expansión	2.205,53	

Fuente: POMCA del río Hacha, 2018.

Los beneficiarios del presente proyecto se encuentran focalizados dentro de la zona de influencia de la cuenca del río Hacha, como se relaciona a continuación:

Tabla 2. Listado de veredas y participantes del proyecto.

VEREDA	BENEFICIARIOS
Aguas Negras	1
Alto Brasil	5
Alto Caldas	8
Alto Paraíso	5
Avenida Caraño	7
Doradas Bajas	1
El Caraño	12
El Convenio	4
El Horizonte	4
El Salado	9
La Nueva Paz	3

La Paz	6
Palmichal	8
San Francisco	7
Total:	80

Fuente: Este proyecto, 2023

Los 80 participantes del proyecto serán seleccionados bajo los siguientes criterios de focalización.

El proyecto se concertó y priorizó en las mesas de trabajo del Plan de Departamental “Pacto Social por el Desarrollo de Nuestra Región” y Municipal “Florencia Biodiversidad para Todos", en concordancia con los planes de orden Nacional acordes con el objetivo central del proyecto.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participa promoviendo estrategias de conservación y restauración de bosques mediante proyectos financiados con recursos de SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ASIGNACIÓN AMBIENTAL y 20% DEL MAYOR RECAUDO a través de convocatorias abiertas a nivel Nacional.

El municipio de Florencia a través de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural participó en la convocatoria de proyectos elegibles para la lucha nacional contra la deforestación, en el marco de la convocatoria del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS) con recursos del SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ASIGNACIÓN AMBIENTAL y 20% DEL MAYOR RECAUDO, formulando el proyecto RESTAURACIÓN FORESTAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO HACHA DEL MUNICIPIODE FLORENCIA, CAQUETÁ”

Igualmente, se realizó la concertación y socialización del proyecto con las comunidades de las áreas focalizadas, proceso liderado por CORCARAÑO, que viene realizando una labor social, económica y ambiental en el corregimiento El Caraño.

2.2. El proyecto cuenta con justificación legal y normativa.

La Resolución 01087 del 05 octubre 2023, ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA ESALOAJC 007-2023**.**

2.3. Características técnicas del proyecto.

En el desarrollo del presente proyecto, se plantea realizar las siguientes actividades:

1. Dotación del vivero municipal con el objetivo de producir el material vegetal que se requiere para la siembra de los árboles maderables en los predios de los beneficiarios priorizados. Por lo anterior, se suministrará la semilla de las especies seleccionadas (Achapo, Cedro Rosado, Abarco y Costillo), insumos (fertilizantes, abono orgánico, fungicidas e insecticidas), materiales (malla, ladrillo, cemento, varillas, entre otros), equipos (guadañadora), herramientas y demás que se requieren para la operatividad del vivero. Se contratará adicionalmente un viverista.

2. Se realizará la siembra de árboles maderables en áreas degradas de los predios de los beneficiarios priorizados en la cuenca del río Hacha, para lo cual se suministrará a cada beneficiario 312 árboles (130 de Achapo, 120 de Cedro Rosado/Abarco y 62 de costillo) para ser establecidos en una hectárea, previamente encerrada y aislada con cerca en alambre de púa, materiales y herramientas dotados por el proyecto. Adicionalmente, se les suministrará los fertilizantes, abono orgánico, fungicidas e insecticidas que se requieren para su sostenimiento. La mano de obra para la realización del cerramiento es aportada por el beneficiario, mientras que los jornales para la siembra son financiados por el proyecto con el objeto de cumplir con un papel social de reactivación económica en la zona.

3. Se brindará acompañamiento y seguimiento a las actividades del proyecto, cuyo objeto es fortalecer los procesos de establecimiento y sostenimiento de los arreglos forestales enfocados hacia la generación de ingresos futuros, prestando la asistencia técnica para tal fin. De igual manera, se requiere hacer seguimiento a los compromisos de sostenimiento de los sistemas forestales, para que el esfuerzo realizado no se pierda debido a la poca presencia y seguimiento.

2.4. Participantes del proyecto.

De acuerdo con el planteamiento del proyecto, los participantes son:

Tabla 3. Identificación de participantes.

Actores	Entidad	Roles	Interés de Participar en el Proyecto	Contribución o Beneficio
Público	Alcaldía de Florencia	Cooperante	Promover la conservación y recuperación de las zonas ambientalmente estratégicas, cumpliendo con la normatividad vigente.	Apoyo técnico (Bienes y servicios)
Publico	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cooperante	Promover acciones de recuperación de zonas degradadas mediante la reforestación.	Financiera
Privado	CORCARAÑO	Cooperante	Promover la conservación y recuperación de las zonas ambientalmente estratégicas, cumpliendo con la normatividad vigente.	Veeduría ciudadana.
Privado	Comunidad priorizada	Beneficiarios	Restauración, conservación y protección de zonas ambientalmente estratégicas.	Mano de obra en la realización de las actividades

Fuente: Este proyecto, 2023

2.4.1. Análisis de los participantes.

El proyecto se concertó y priorizó en las mesas de trabajo del Plan de Departamental “Pacto Social por el Desarrollo de Nuestra Región” y Municipal “Florencia Biodiversidad para Todos", en concordancia con los planes de orden Nacional acordes con el objetivo central del proyecto.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participa promoviendo estrategias de conservación y restauración de bosques mediante proyectos financiados con recursos de SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ASIGNACIÓN AMBIENTAL y 20% DEL MAYOR RECAUDO a través de convocatorias abiertas a nivel Nacional.

El municipio de Florencia a través de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural participó en la convocatoria de proyectos elegibles para la lucha nacional contra la deforestación, en el marco de la convocatoria del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS) con recursos del SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ASIGNACIÓN AMBIENTAL y 20% DEL MAYOR RECAUDO, formulando el proyecto RESTAURACIÒN FLORESTAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO HACHA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ" Igualmente, se realizó la concertación y socialización del proyecto con las comunidades de las áreas focalizadas, proceso liderado por CORCARAÑO, que viene realizando una labor social, económica y ambiental en el corregimiento El Caraño.

2.4.2. Población afectada por el problema.

En la cuenca del río Hacha se encuentran asentadas 12.552 personas de acuerdo con el diagnóstico reportado en la construcción del POMCA del río Hacha (2.018). Esta población se encuentra distribuida en los corregimientos El Caraño, Santo domingo, San Martín y Venecia que hacen parte de la cuenca.

La zona de influencia de este proyecto es el corregimiento El Caraño con el 82,64% de la población rural de la cuenca, donde la población afectada son 2.620 personas que habitan en las veredas priorizadas.

Tabla 4. Densidad poblacional de las veredas priorizadas en la cuenca del río Hacha.

Vereda	Densidad poblacional
Aguas Negras	477
Alto Brasil	70
Alto Caldas	60
Alto Paraíso	80
Avenida Caraño	300

Doradas Bajas	170
El Caraño	63
El Convenio	262
El Horizonte	60
El Salado	107
La Nueva Paz	146
La Paz	76
Palmichal	223
San Francisco	526
Total	**2.620**

Fuente: POMCA del río Hacha, 2018

Por lo tanto, la población afectada por el problema es la población rural asentada en las veredas priorizadas de la cuenca del río Hacha que corresponden a 2.620 personas, según la información recolectada en el POMCA del río Hacha, 2.018.

3. POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

La población objetivo son los 80 beneficiarios con sus familias que se encuentran asentados en las veredas priorizadas, así:

Tabla 5. Beneficiarios priorizados en las veredas participantes de la cuenca del río Hacha.

Vereda	Beneficiarios
Aguas Negras	1
Alto Brasil	5
Alto Caldas	8
Alto Paraíso	5
Avenida Caraño	7
Doradas Bajas	1
El Caraño	12
El Convenio	4
El Horizonte	4
El Salado	9
La Nueva Paz	3
La Paz	6
Palmichal	8
San Francisco	7
Total	80

Fuente: POMCA del río Hacha, 2018

En total son 296 personas de origen rural cuyas características demográficas se exponen a continuación.

3.1. Características demográficas de la población objetivo.

Tabla 6. Características demográficas de la población objetivo.

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información.
Etaria	0 a 14 años	80	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural-2022
	15 a 19 años	28	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural-2022
	20 a 59 años	157	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural-2022
	Mayor de 60 años	31	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural-2022
Grupos étnicos	Población indígena		
	Población Raizal		
	Población Mestiza	296	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural-2022
	Población Palenquera		
Género	Masculino	145	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural-2022
	Femenino	151	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural-2022
Población Vulnerable	Desplazados		
	Discapacitados		
	Victimas		

Fuente: POMCA del río Hacha, 2018

Así mismo los participantes beneficiarios priorizados del proyecto serian de acuerdo con el siguiente listado, el cual se encuentra registrado en documento técnico base del convenio:

Tabla 7. Participantes priorizados del proyecto.

Ítem	Nombre y Apellidos				Cedula	Vereda
1	Marco	Aurelio	Ariza	Devia	17639847	Aguas Negras
2	Jhovani		Cuenca		7694949	Alto Brasil
3	Vitelio		Calderón		4961085	Alto Brasil
4	José	Lizardo	Ramírez		17644554	Alto Brasil
5	Jaime		Murcia		14961069	Alto Brasil
6	Beatriz		Cano	Ramírez	40762699	Alto Brasil
7	Jaime		Robis	Penagos	17636762	Alto Caldas
8	Alfonso		Salinas	Romero	1117498793	Alto Caldas
9	Cenaida		Pérez	Herrera	28612750	Alto Caldas
10	Apolinar		Guilombo	Gutiérrez	14259143	Alto Caldas
11	Jenny		Mazabel	Diaz	40079222	Alto Caldas
12	Fernando		Segura	Murcia	17641871	Alto Caldas
13	Harrinson		Salas	Muñoz	1117551412	Alto Caldas
14	Johana		Lopez	Márquez	52430882	Alto Caldas
15	Ovidio		Yasno	Velasco	17623356	Alto Paraíso
16	Samuel		Rodríguez	Nasayo	17659263	Alto Paraíso
17	Luis	Santos	Sotto	Cabrera	83241100	Alto Paraíso
18	José	Ramon	Losada	Sarrias	17644476	Alto Paraíso
19	Ferney		Losada	Sarrias	1117509024	Alto Paraíso
20	Ricaurte		Bermúdez	Pérez	17621660	Av. Caraño
21	Rosa	Nidia	Isaza	Cubillos	43429505	Av. Caraño
22	Gladys		Gutiérrez		40625626	Av. Caraño
23	William		Molina	Clavijo	17636668	Av. Caraño
24	Virgelina		Mazabel	Álvarez	26616872	Av. Caraño
25	María	Omaira	Grajales	Quintero	26617612	Av. Caraño
26	Jair	Antonio	Rubiano	Ospina	17634302	Av. Caraño
27	José	Olivo	Bermúdez	Tapiero	17651922	Doradas Bajas
28	Isauro		Trujillo	Cuellar	17625942	El Caraño
29	Álvaro		Martínez	Salazar	96352045	El Caraño
30	Dionisio		Guzmán	Garzón	12189922	El Caraño
31	Joaquín	Darío	Molina	Castro	98504962	El Caraño
32	Juan	Nolberto	Montiel	Palma	16186657	El Caraño
33	Alexander		Caicedo	Muñoz	6803306	El Caraño
34	Miguel	Ángel	Trujillo	Cuellar	2356824	El Caraño
35	Pedro	Nel	Torres		17657021	El Caraño

36	Jaime	Eduardo	Zambrano	Morales	17177934	El Caraño
37	Dagoberto		Peña	Vargas	17637256	El Caraño
38	Anín		Mora	Erazo	4879198	El Caraño
39	Reinario		Fajardo		6804151	El Caraño
40	José	Lizandro	Culma	Trujillo	96341759	El Convenio
41	Edelmira		Luna	Reyes	40780348	El Convenio
42	Jesús	María	Castro	Cardozo	12315038	El Convenio
43	Fredy		Muñoz	Devia	12223845	El Convenio
44	José	Eusebio	Caicedo		4961085	El Horizonte
45	Javier		Velásquez		17643759	El Horizonte
46	Hernán		Buitrago	Corzuelo	17768045	El Horizonte
47	Jardany	Marlizafir	Núñez	San Juan	40781086	El Horizonte
48	Víctor	Ricardo	Almonacis		17635513	El salado
49	Ezequiel		Andrade	Cerquera	12080122	El salado
50	Julio	César	Sánchez	Aguirre	94262944	El salado
51	Luis	Alberto	Hurtatis	Cuellar	17631949	El salado
52	Fernando	Antonio	Hurtatis	Cuellar	1658918	El salado
53	Santiago		Hurtatis	Cuellar	96340635	El salado
54	Ancízar		Devia	Muñoz	1117489291	El salado
55	Nancy		Muñoz	Monroy	1117535278	El salado
56	Carlos	Julio	Cárdenas	Cardozo	17626041	El salado
57	Jorge		Vega	Iriarte	79485761	La Nueva Paz
58	José	Eladio	Parra	Trujillo	12223798	La Nueva Paz
59	Osmedo		Cardona	Montoya	16251829	La Nueva Paz
60	José	del Carmen	Muñoz	Moreno	6801603	La Paz
61	José	Elías	Imbachí	González	17624733	La Paz
62	Ramón		Caleño	Otavo	1117491986	La Paz
63	Julio		Betancourt	Rojas	17643438	La Paz
64	Walter		Montes	Hurtado	17645562	La Paz
65	Edgar		Sabí	Almario	17690473	La Paz
66	Nolberto		Vanegas	Enao	176582316	Palmichal
67	Uriel		Rodríguez	Rojas	17654889	Palmichal
68	Dorman		Dayro	Daza	5854651	Palmichal
69	Gildebrando		Torres	Rojas	94355641	Palmichal
70	Jacob		Córdoba		17627510	Palmichal
71	Rufino		Díaz	Hurtado	83055328	Palmichal
72	Olga	Beatriz	Bonilla	Castellanos	40756127	Palmichal
73	Luis	Horacio	Restrepo	Peralta	17658114	Palmichal
74	Matilde		Vargas	Vargas	30086196	San Francisco

75	Anoel		Díaz	Rivera	14935671	San Francisco
76	Benjamín		Rojas	Cuenca	17632789	San Francisco
77	José	Vidal	Culma		4949155	San Francisco
78	Willinton		Rondón		16187443	San Francisco
79	Luis	Horacio	Restrepo	Peralta	17658114	San Francisco
80	Luz	Marina	Pastrana	Cano	40775954	San Francisco

Fuente: Este proyecto, 2023

Nota: *la información de la tabla 7 será validada por el ejecutor y el supervisor de acuerdo con las actividades de ejecución, en caso de cambio debido a razones como muerte del beneficiario, cambio de domicilio o cualquier otra circunstancia, será debidamente documentada.*

4. ETAPAS DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en las siguientes etapas:

Etapa precontractual: Etapa en la cual se realiza la contratación del personal operativo y de supervisión del proyecto, con base en los requerimientos del mismo y del manual de contratación de la Alcaldía de Florencia, cuyo periodo de tiempo es de dos meses.

Etapa Operativa: Lapso de tiempo comprendido por 12 meses donde se desarrollan las actividades del proyecto. En esta fase se contratan los suministros para los beneficiarios.

Etapa de cierre: En esta etapa se realiza la liquidación del proyecto, reportando por parte de la coordinación operativa del proyecto y de la supervisión la ejecución presupuestal y cumplimiento de los productos y metas del mismo.

5. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

5.1. Información General del convenio.

Tabla 8. Información General del convenio.

CONVENIO	
NUMERO:	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN No.20230024
OBJETO:	"ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÈCNOLOGICOS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO DENOMINADO "RESTAURACIÒN FORESTAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÒN EN LA CUENCA DEL RIO HACHA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÀ", con BPIN 20233201010004"..
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN HENRY QUICENO GONZALEZ
NIT:	900.332.393-9
VALOR INICIAL:	$ 1.209.530,00 M/CTE.
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.209.530.500,00 M/CTE.
PLAZO INICIAL:	15 MESES
PLAZO ACTUALIZADO:	15 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE ENERO DE 2025
APORTE ANTICIPADO:	$ 483.812.200,00 (40% del aporte del municipio)

Fuente: Este proyecto, 2023

5.2. Descripción de las actividades ejecutadas por la Corporación Educativa y Científica Cosmos.

Se verificó y se realizó acompañamiento en el desarrollo de las actividades ejecutadas por la Corporación Educativa Y Científica Cosmos.

5.3. Reporte administrativo.

5.3.1. Personal del Convenio.

El contratista de obra realizó la vinculación del personal que participará en la ejecución del proyecto:

Tabla 9. Personal que participará en la ejecución del proyecto.

Nombre	Cargo
John Henry Quiceno González	Representante legal
Yeison Camilo Rojas Ortiz	Ingeniero Agro ecólogo
Leidy Marcela Reyes Parra	Ecóloga
Yina Paola Rodríguez Aguirre	Administradora ambiental
Cristian Camilo Moreno	Ingeniero de telecomunicaciones
Davinson Saavedra	Ingeniero Agroforestal
Oscar David Quintero F	Ingeniero ambiental

Fuente: Este proyecto, 2023

5.4. Seguimiento actividades no previstas.

No se adelantaron actividades no previstas en el periodo del presente informe.

6. REPORTES DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

6.1. Informe financiero y presupuestal convenio.

En el periodo del presente documento, se relacionan el informe de seguimiento financiero de la ejecución del informe por parte del convenio.

Tabla 10.. Seguimiento presupuestal.

Saldo Registro Presupuestal	**Valor del Contrato**	**Pago anticipado aporte del Municipio 40%**	**Saldo por pagar a la Corporación Educativa y Científica "COSMOS"**	
$ 1.209.530.500.00	$ 1.209.530.500.00	$ 483.812.200.00	$ 725.718.300.00	60%
TOTAL:				

Fuente: Este proyecto, 2023

6.2. Seguimiento Garantías y Seguros Convenio

En el periodo del presente documento, se relacionan el informe de seguimiento del estado de las garantías.

Tabla 11. Informe de seguimiento del estado de las garantías.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO PRINCIPAL									
Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**						
			Desde				**Hasta**		
Cumplimiento	10%	120,953,050.00	09	10	2023		09	07	2025
Devolución de pagos anticipados	40%	483,812,200.00	09	10	2023		09	07	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	60,476,525.00	09	10	2023		09	01	2028

Calidad de los elementos	10%	120,953,050.00	09	10	2023	09	07	2025
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	155292							
Razón Social Compañía Aseguradora:	CESCE							

Fuente: Este proyecto, 2023

6.3. Seguimiento a la inversión del Pago Anticipado.

Tabla 12. Presupuesto aprobado para el proyecto.

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (a)	%
1	**Reducir la perdida de cobertura vegetal natural en ecosistemas estratégicos de la cuenca del rio hacha.**		53,93
1.1.1	Realizar la siembra de material biofabricado para la restauración de áreas naturales en la cuenca del rio Hacha.	$ 612.842.400.00	50,67
1.1.2	Realizar acuerdos de conservación con los beneficiarios priorizados en el proyecto.	$ 39.500.000	3,27
2	**Mejorar el uso de prácticas sostenibles en actividades agropecuarias en la cuenca del río Hacha.**		30,71
2.1.1	Realizar la construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de la biofabrica para la producción del material vegetal en procesos innovadores.	$ 81.274.700.00	6,72
2.1.2	Realizar la transferencia de conocimiento en el uso de tecnologías y buenas prácticas para fortalecer las capacidades productivas y el cuidado del medio ambiente con los participantes del proyecto.	$ 290.231.000	24,00
3	**Elevar la capacidad institucional para realizar seguimiento y monitoreo a proyectos de conservación.**		14,91

3.1.1	Realizar un mapa georreferenciado satelital de la cobertura vegetal previo y posterior a la siembra del material biofabricado que permita realizar un estudio de impacto ambiental.	$ 180.376.000	14,91
	Suministro de insumos de bioseguridad COVID 19		0,44
4	Suministro de insumos de bioseguridad covid 19	$ 5.306.400	
TOTAL		**$ 1.209.530.500**	**100%**

Fuente: Este proyecto, 2023

6.4. Pagos realizados al Cooperante.

Tabla 13. Pagos realizados al Ejecutor.

Concepto	Soporte	Valor
Aporte No 1. Pago Anticipado	Acta de inicio 40%	$483.812.200.00
Total:	**40%**	$483.812.200.00

7. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

7.1. Información general del contrato de supervisión.

Tabla 14. Información general del contrato de supervisión.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
NUMERO:	20230892
OBJETO	REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE AMBIENTE EN LA SUPERVISIÒN DEL PROYECTO INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÈCNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "RESTAURACIÒN FORESTAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÒN EN LA CUENCA DEL RIO HACHA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÀ", Con código BPIN 20233201010004".
PROCESO DE SELECCIÓN:	DIRECTA
CONTRATISTA:	HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.
NIT:	900.431.848-2
VALOR INICIAL:	$ 168'376.000,00 M/CTE.
VALOR ACTUALIZADO:	$ 168'376.000,00 M/CTE.
PLAZO INICIAL:	12 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE 2024
VALOR ANTICIPO:	NA

Fuente: Este proyecto, 2023

7.2. Descripción de las actividades a realizar por el supervisor.

De acuerdo con las actividades generales inherentes a las labores de la supervisión, tenemos que en el periodo se tienen las siguientes funciones:

- Realizar el apoyo técnico de la supervisión en campo, para el eficiente y eficaz desarrollo del proyecto.
- Apoyar el seguimiento y control de la ejecución contable y financiera del contrato principal.
- Se realiza el control del cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del personal que labora en la ejecución del convenio.
- Acompañamiento a Corporación Educativa y Científica Cosmos ejecutor del convenio, a la totalidad de las reuniones de socialización, al igual que a la entrega de material, equipos etc., a partir de la fecha de acta de inicio de la Supervisión.
- Realizar un informe mensual de las actividades realizadas.
- Se realiza el seguimiento de la ejecución financiera del convenio – seguimiento al plan de inversiones del pago anticipado y el plan de inversiones de la ejecución total.
- Se realiza revisión y el seguimiento a las garantías del convenio aprobadas por el municipio.

De la misma manera, se presenta información al respecto de la ejecución de la supervisión mediante los siguientes registros:

- Informe financiero y presupuestal contrato de supervisión.
- Seguimiento garantías contrato de supervisión.

El 18 de diciembre de 2023 el apoyo a la supervisión verificó el primer encuentro con los participantes del convenio "*Restauración forestal para reducir la deforestación en la cuenca del río Hacha del Municipio de Florencia*". Durante esta reunión, hubo una disposición parcial por parte de la comunidad, ya que consideraban el proyecto como un enfoque de "Pago por servicios ambientales".

Como resultado de este encuentro, se acordó la realización de una mesa de concertación que involucraría a representantes de la comunidad, la Alcaldía municipal y el ejecutor del convenio. Esta mesa de concertación se programó para el día 20 de diciembre de 2023, con el objetivo de discutir y llegar a acuerdos sobre los compromisos y responsabilidades de cada una de las partes involucradas en el proyecto.



Imagen 2. Socialización del convenio. Fuente: Hidroambiental.



Imagen 3. Socialización del convenio. Fuente: Hidroambiental.

ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETA — FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA — CÓDIGO E1.F02 — VERSIÓN 1.0 — FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014 — FECHA DE ACTUALIZACIÓN — PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD, FECHA: Florencia - Caraño - 18 Dic 2023 HORA: 9:30 LUGAR: Caseta Comunal Caraño HOJA ___ de ___

ASUNTO: Socialización Proy. Restauración Forestal para reducir la deforestación en la cuenca del río Hacha del municipio de Florencia

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD y/o DEPENDENCIA	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Edward Porras R.	SADR	Prof. Universitario	3114598256	[illegible]	
2	Karen V. Collazos R.	Interventoria	Biologo	3112484189	Karencollazos988@gmail.com	Karen Collazos
3	Jesus Leon	Interventoria	Tecnico	3143763398	[illegible]	
4	Juan Carlos Rodriguez	COSMOS	Agroecologo	3214305407	[illegible]	
5	Luis oracio restrepo			3158754770	luis oracio restrepo	luis Restrepo
6	Millet muñoz G.			3188240959		Millet muñoz
7	Olga B. Bonilla Castellanos		Tesorera Junta Vereda Peñalosa	3208796849	olgabonillacastellanos@gmail.com	
8	Jose Lizardo Ramirez		Tirador Jabo	3124326630		
9	Guillermo Ramirez			3125869988	[illegible]	
10	Jose Lisandro culma			3188792575		Lisandro culma
11	Luz Marina Portela		ama de casa	3112540929		Luz Marina
12	Marco Aurelio Arias		CDMR	3177052257	[illegible]	Marco Arias
13	Maria Luz Devia		Delegada de la Junta Vereda Peñalosa	3195940960	[illegible]	Maria Luz
14	Luz Mery Culma		Ama de Casa	3202637494		Luz Mery Culma
15	Isauro Trujillo Cuellar		Presidente Junta	3187930262		
16	Ramon Cotes			3122320043		Ramon Cotes
17	Apolinar Guambo			3145616[illegible]	[illegible]	Apolinar Guambo
18	Julio Betancourt R.		Secretario	3107615784	[illegible]	

Imagen 4. Listado de participantes de la Socialización del convenio.

ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETA — FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA — CÓDIGO E1.F02 — VERSIÓN 1.0 — FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014 — FECHA DE ACTUALIZACIÓN — PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD, FECHA: Florencia - Caraño - 18 Dic 2023 HORA: 9:30 LUGAR: Caseta Comunal Caraño HOJA ___ de ___

ASUNTO: Socialización Proy. Restauración Forestal para reducir la deforestación en la cuenca del río Hacha del Municipio de Florencia

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD y/o DEPENDENCIA	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Walter Montes Hurtado		Fiscal	3017703743		Walter Montes
2	Luis Alberto Urtatis			3194358929		
3	uriel Rodriguez		DLASSI	3178725197		uriel Rodriguez
4	Ezequiel Andrade		Edil del corregimiento	3239317939		Ezequiel Andrade
5	Matilde Vargas		Secretaria S.	3156[illegible]		
6	Jesus Maria Cadavid		comite [illegible]	3[illegible]		
7	Rufina DIAZ			3115122915		Rufina DIAZ
8	Rosa Elena Pinzón			3115128915		Rosa Pinzón
9	miguel Angel Trujillo		Concejo	3186913858		miguel Trujillo
10	Yon hector llanegas		Junta de la	3223178062		Yon Hector
11	Dionisio Cuellar			3103832011		Dionisio
12	Clarena Diaz Godoy		Docente	3204899715	[illegible]	
13	Miguel A. Cordoba		Tra. Independiente	3127075984		Miguel
14	Miguel Antonio Olalvaro		Presidente Jun	3205703081		
15	Jose Pio Guevara		Presidente de Trabajo Junta	3186869384		Jose Pio G
16	Pedro Nel Tarros			3702097958		Pedro Nel Tarros
17	[illegible]			3014935[illegible]		
18	JUAN MONTIEL		Tesorero	3143114 6819		JUAN MONTIEL

Imagen 5. Listado de participantes de la Socialización del convenio.

ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.720-2	CÓDIGO E1.F02	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETA	FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014
	VERSIÓN 1.0	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD, FECHA: Florencia-Caraño- 18 Dic 2023 HORA: 9:30 LUGAR: Caseta Comunal Caraño

ASUNTO: Directiva. Restauracion Forestal para reducir la deforestacion en la cuenca del rio hacha del municipio de Florencia HOJA ___ de ___

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD y/o DEPENDENCIA	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	DAVID [illegible]			3238476[illegible]		
2	WILLIAM MOLINA C			3202726437		
3	Fernay Losada S.			3219582005		
4	Humberto Alejandro Perez			3009957220		
5	ELKIN VARGAS ATAY			3783747[illegible]		ELKIN
6	Arber Bermudez			3146290933		
7	Dely Andrea Yagues			3116259760		
8	Alfonso Castro			3133033974		
9	Joaquin D Moreno C			3227845866		
10	Samuel Rodriguez			3226052280		
11	Rosa Nidia Isaza		Vicepresi	3223130222		
12	Ricaurte Bermudez		Fiscal Junta	3222920459		
13	Jose Clivo Bermudez		Socio Junta	3152608169		
14	Jose Eusevio Caicedo			3186185949		Jose Caicedo
15	Hernan Buitrago		Presidente	3155268178		
16	Alexander Caicedo		Vicepresidente	3186185949		
17	Alfonso Salinas R.			3222128910		
18	Katherine Cepeda			3214479330		

Imagen 6. Listado de participantes de la Socialización del convenio.

ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.720-2	CÓDIGO E1.F02	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETA	FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014
	VERSIÓN 1.0	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD, FECHA: Florencia Caraño 18 Dic 2023 HORA: 9:30 LUGAR: Caseta Comunal Caraño

ASUNTO: Socializacion Proy Restauracion Forestal para reducir la deforestacion en la cuenca del rio hacha del Municipio de Florencia. HOJA ___ de ___


No.	NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD y/o DEPENDENCIA	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Reinero Fajardo		Residente Junta	3104049740		Reinero Fajardo
2	Yamilet Sagamoso		Delegada	3142847623		Yamilet Sagamoso
3	Alberto Ramos		Socio Junta	3107578899		Alberto Ramos
4	Angel Diaz Rivera		Socio	3163062525		Angel Diaz R.
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Imagen 7. Listado de participantes de la Socialización del convenio

El día 20 de diciembre de 2023 el apoyo a la supervisión verificó la concertación con representantes de los beneficiarios del convenio *"Restauración forestal para reducir la deforestación en la cuenca del río Hacha del Municipio de Florencia"* en las instalaciones de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural con el propósito de escuchar las propuestas e inquietudes de la comunidad.



Imagen 8. Concertación con representantes de los participantes del convenio.
Fuente: Hidroambiental.

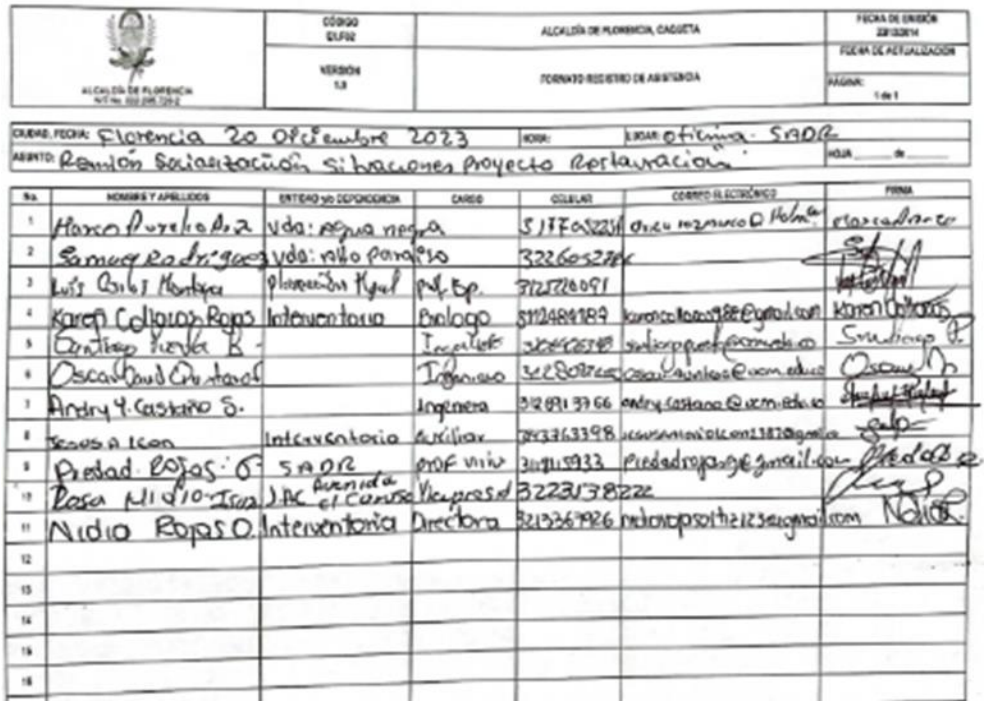

ALCALDÍA DE FLORENCIA

CÓDIGO	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN
VERSIÓN 1.0	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD, FECHA: Florencia 20 diciembre 2023 HORA: LUGAR: oficina SAGA

ASUNTO: Reunión Socialización Situaciones Proyecto Restauración

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD ó DEPENDENCIA	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Hanco Portela Diaz	vda: agua negra		3177052214		
2	Samuel Rodriguez	vda: nido paraiso		3226052786		
3	Luis Carlos Montoya	planeación Mpal	prof. Esp.	3127720091		
4	Karen Collazos Rojas	Interventoria	Biologo	3112489189		
5	Cristian Pineda R.		Ingeniero	3206625748		
6	Oscar David Castaño		Ingeniero	3128078		
7	Andry Y. Castaño S.		Ingeniera	3128133766		
8	Jesus A Leon	Interventoria	Auxiliar	3013763398		
9	Piedad Rojas G	SAGA	prof vivo	3112115933		
10	Rosa Nidia Ibarra	JAC Avenida el Cortijo	Vicepresid	3223138222		
11	Nidia Rojas O.	Interventoría	Directora	3213367826		
12						
13						
14						
15						
16						

Imagen 9. Concertación con la comunidad.

El día 21 de diciembre de 2023 el apoyo a la supervisión verificó el reconocimiento de la zona de influencia del convenio y el acercamiento con algunos beneficiarios a quienes les explicaron el objeto del mismo y se establecieron fechas para el inicio de las visitas técnicas.



Imagen 10. Acercamientos con la comunidad. Fuente: Hidroambiental.



Imagen 11. Socialización con la comunidad. Fuente: Hidroambiental.

El día 22 de diciembre de 2023 el apoyo a la supervisión verificó la reunión con representantes de ASOJUNTAS y grupos de turismo del Caquetá a los cuales se les socializó el convenio; estos recomendaron analizar la permanencia de algunos participantes por no estar dentro de la zona de influencia del rio Hacha.



Imagen 12. Socialización con asociaciones. Fuente: Hidroambiental.

El día 27 de diciembre de 2023 el apoyo a la supervisión verificó el segundo encuentro general con la comunidad beneficiada en la Avenida el Caraño la cual contó con la participación de la corregidora municipal, represente del comité de turismo, ediles, secretario administrativo de planeación municipal, representante de la secretaría de medio ambiente y comunidad en general, cada uno de ellos manifestaron inquietudes, recomendaciones y sugerencias al convenio.

La comunidad se comprometió a realizar el acompañamiento para la buena ejecución del convenio y la intención de continuar con las visitas técnicas a partir del 09 de enero.



Imagen 13. Socialización con la comunidad. Fuente: Hidroambiental.



Imagen 14. Socialización con la comunidad.

Es de destacar que en este mismo espacio se conformaron democráticamente (01) veeduría ciudadana la cual garantizará la correcta ejecución de las actividades y se comprometen a realizar los trámites necesarios ante la personería municipal para adquirir la resolución. La corporación se encuentra en espera para hacer llegar la documentación a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.

Se realizó acompañamiento por parte de la supervisión para la visita de la Corporación Cosmos al vivero del señor Elí Cuellar el cual tiene amplia experiencia en temas de reforestación en el departamento del Caquetá y con el cual se ha trabajado con el fin de identificar las especies que puedan potenciar el mejoramiento de la cobertura vegetal en la cuenca del río Hacha.



Imagen 15. Socialización con la comunidad. Fuente: Hidroambiental.

El apoyo a la supervisión verificó las visitas técnicas realizadas por la Corporación Cosmos la identificación y zonificación de los predios pertenecientes a los beneficiarios. Además, se identificó el área que se reforestará (01 hectárea) para cada predio, y se estableció las 05 hectáreas que serán destinadas a labores de conservación.

El 26 de diciembre del 2023 se verificó visita técnica al predio del señor Edgar Sabi en la vereda La Paz, con el fin de realizar acercamientos a las comunidades beneficiadas e iniciar con la zonificación del predio.



Imagen 16. Verificación de visita técnica. Fuente: Hidroambiental.



Imagen 17. Verificación de visita técnica. Fuente: Hidroambiental.

7.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Supervisión.

En referencia al contrato de prestación de servicios 20230892, el apoyo a la supervisión ha dado cumplimiento a la cláusula que se refiere a las "obligaciones del contratista relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual"

7.4. Informe de seguimiento al programa social.

En el presente periodo se presenta el informe de seguimiento al programa social:

Reuniones de socialización a la comunidad: Se verifico el desarrollo de las socializaciones del convenio realizadas con las comunidades participantes, organizaciones comunales, autoridades y funcionarios municipales.

Veedurías ciudadanas: En la cláusula (12) doce en los compromisos conjuntos refiere en el literal f: coordinar las convocatorias a las veedurías ciudadanas legalmente constituidas del área de influencia del proyecto, está pendiente la resolución por parte de la personería municipal.

De acuerdo a el compromiso adquirido en el convenio especial de cooperación, mencionado anteriormente en la cláusula (12) doce, desde la supervisión se realiza seguimiento a la ejecución de tal manera que se evidencia que el cooperante coordina con el ente territorial la conformación de las veedurías, realizando un proceso de convocatoria a partir de los medios de comunicación de la Alcaldía Municipal e invitando formalmente a los presidentes de juntas de acción comunal.

Por lo anterior, se conformaron tres veedurías, las cuales los participantes se comprometieron a radicar a personería para la respectiva resolución.

7.5. Informe de seguimiento Jurídico

En cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones a cargo de la Supervisión en examinar, analizar, evaluar, definir, realizar seguimiento y verificar la ejecución de las obligaciones y actividades establecidas y/o necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del convenio especial de cooperación No. 20230024 del 09/10/2023, se indica que al realizar la evaluación independiente de cada uno de los documentos estos cumplen, así:

Con relación al Convenio especial de Cooperación No. 20230024 celebrado entre el Municipio de Florencia y la Corporación Educativa y Científica Cosmos, este se efectuó conforme los requerimientos adelantados y especificados en los estudios y documentos previos para la celebración del convenio especial de cooperación, de acuerdo a las necesidades y la conveniencia de celebrar dicho convenio y cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÈCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÈCNOLOGICOS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO DENOMINADO "RESTAURACIÒN FORESTAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÒN EN LA CUENCA DEL RIO HACHA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÀ", con código BPIN 20233201010004.

Respecto de las garantías para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del cooperante en razón a la celebración y ejecución del convenio especial de cooperación, el cooperante presento póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal N° 155292 con fecha de expedición 10 de octubre de 2023 por Segurexpo de Colombia S.A. cuyo asegurado es el Municipio de Florencia – Caquetá y en el que se ampara:

cesce
Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.005.195-9

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT: 860.009.195-9
Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 18
segurexpo@segurexpo.com
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
10/10/2023	BOGOTA	10	155292	4110073844	EXPEDICIÓN	0	1/1

TOMADOR	CORPORACION EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS			**NIT**	9003323939
DIRECCIÓN	CARRERA 16 79 86 EDIFICIO LAGO CENTRO EMPRESARIAL (110121) BOGOTA, D.C. -	**TELÉFONO**	+57 3164725057	**CIUDAD**	BOGOTA, D.C.
GARANTIZADO	CORPORACION EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS			**NIT**	9003323939
DIRECCIÓN	CARRERA 16 79 86 EDIFICIO LAGO CENTRO EMPRESARIAL (110121) BOGOTA, D.C. -	**TELÉFONO**	+57 3164725057	**CIUDAD**	BOGOTA, D.C.
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FLORENCIA			**NIT**	8000957282
DIRECCIÓN	CARRERA 12 CALLE 15 ESQUINA - PISO 9 (180008) FLORENCIA -	**TELÉFONO**	+57 14358100	**CIUDAD**	FLORENCIA

OBJETO:
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nº 20230024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINSITRATIVOS FINANCIEROS Y TECONOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO RESTAURACION FORESTAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO HACHA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA ; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO ($-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	120,953,050.00	09/10/2023	09/07/2025
Devolución de pagos anticipados	483,812,200.00	09/10/2023	09/07/2025
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	60,476,525.00	09/10/2023	09/01/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	120,953,050.00	09/10/2023	09/07/2025

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	9	10	2023	Hasta las 24:00 Horas	9	1	2028
0.00	0.00	786,194,825.00								

TRM 1.00	Prima Neta: $ 4,589,919.71	Gastos Expedición: $ 10,000.00	IVA(19%): $ 873,984.74	Total a pagar: $ 5,473,904.45

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	2978	100.00			

Usuario Cargue	MCO9000426661	Usuario de Autorización	MCO9000426661	Usuario de Expedición	MCO9000426661

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

Imagen 18. Póliza de seguros.

Así también con póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento N° 155292 con fecha de expedición 10 de octubre de 2023 por Segurexpo de Colombia S.A. cuyo asegurado es el Municipio de Florencia – Caquetá y en el que se ampara con forme los posibles riesgos con relación al convenio de cooperación.

Del acta de Inicio del convenio especial de cooperación se efectuó como fecha de iniciación del convenio el veinticinco (25) de octubre de 2023, dando, así como fecha para la terminación del convenio el veinticuatro (24) de enero de 2025 y por lo tanto se verifico del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del convenio.

Que el acta de inicio se legalizo previa aprobación de las garantías presentadas por el ejecutor y antes mencionadas conforme los amparos previstos en los estudios previos, e igualmente con la verificación del certificado de disponibilidad presupuestal N° 723 de fecha 18 de septiembre de 2023 y del registro presupuestal N° 623 del 10 de octubre de 2023.

Por lo antes informado y de conformidad con el objeto el contrato de Supervisión No. 20230892, las obligaciones generadas del mismo para el supervisor y los documentos relacionados conforme la etapa de ejecución del Convenio Especial de Cooperación, los cuales se toman como evidencia para el control y vigilancia en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, y tecnológicos del contrato al cual se realiza la vigilancia, se informa que a partir de los soportes documentales se verifico el cumplimiento sin encontrarse ninguna irregularidad a los requisitos, obligaciones y requerimientos referenciados.

7.6. Información actividades no previstas

No se presentaron modificaciones al convenio en el periodo del presente informe.

7.7. Suministro de insumos de bioseguridad COVID-19

El presente proyecto estará regido por la Resolución No. 777 del 02 de junio 2021 por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención del Coronavirus COVID 19 en el sector agrícola.

De esta manera, la mencionada norma tiene por objeto orientar, en el marco de la pandemia por el Coronavirus COVID-19, las medidas generales de bioseguridad que deben adoptar los predios del sector agrícola, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de todas sus actividades, jornadas de concientización para las familias.

Para las jornadas de concientización se tiene previsto:

Medidas locativas, preventivas y de desinfección:

- Designar un encargado de velar por el cumplimiento de las medidas preventivas adoptadas en el marco del COVID-19, en cada instalación locativa donde se desarrollarán las jornadas.
- Establecer mecanismos y estrategias de información para trabajadores y visitantes en los que se recuerde la importancia del lavado de manos, el correcto uso de los elementos de protección personal y del distanciamiento físico.
- Promover el lavado de manos, uso de tapabocas, medidas de distanciamiento social y físico entre los participantes en cada jornada.
- Delimitar y señalizar las zonas de lavado y desinfección en las jornadas.
- Garantizar el distanciamiento físico de al menos 2 metros.
- Llenar formatos de validación de apertura de cada jornada con los datos del proyecto y datos de los participantes (nombre, cedula, dirección, teléfono).
- Encargar a un solo trabajador como responsable de la entrega del apoyo alimentario que se suministrara durante cada jornada.
- Reiterar la importancia de portar adecuadamente el tapabocas y los elementos de protección personal durante el desarrollo de las actividades y en las zonas de uso común.

8. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS

En el periodo del presente documento, se relacionan el informe de seguimiento del estado de las garantías Única de Cumplimiento.

Tabla 15. Informe de seguimiento del estado de las garantías.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO									
Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**						
			Desde			**Hasta**			
Cumplimiento	**10%**	**$ 16,837,600.00**	**26**	**10**	**2023**	**01**	**03**	**2025**
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	**5%**	**$ 8,418,800.00**	**26**	**10**	**2023**	**01**	**11**	**2027**
Calidad del servicio	**10%**	**$ 25,256,400.00**	**26**	**10**	**2023**	**01**	**03**	**2025**
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	**101055537**								
Razón Social Compañía Aseguradora:	**Seguros del estado S.A.**								

Fuente: Este proyecto, 2023

8.1. Certificación de pagos de seguridad social y parafiscales.

En referencia al contrato de prestación de servicios 20230892, el apoyo a la supervisión ha dado cumplimiento a la cláusula que se refiere a las “obligaciones del contratista relacionadas con el pago de la seguridad social y parafiscales para la ejecución del objeto contractual”

8.2. Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal Decreto 1082 de 2015.

En el periodo del presente documento, se relacionan las pólizas de seguro de cumplimiento. (ver anexo 2. Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal Decreto 1082 de 2015).

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. Aspectos Técnicos y de avance.

De acuerdo con las actividades programadas por el Convenio, el cual dio inicio el día 25 de octubre de 2023, se vienen adelantando conforme al convenio suscrito para los siguientes ítems:

Tabla 16. Actividades programadas conforme al Convenio.

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	Reducir la perdida de cobertura vegetal natural en ecosistemas estratégicos de la cuenca del río Hacha.
1.1.1	Realizar la siembra de material biofabricado para la restauración de áreas naturales en la cuenca del río Hacha.
1.1.2	Realizar acuerdos de conservación con los beneficiarios priorizados en el proyecto.
2	Mejorar el uso de prácticas sostenibles en actividades agropecuarias en la cuenca del río Hacha.
2.1.1	Realizar la construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de la biofabrica para la producción del material vegetal en procesos innovadores.
2.1.2	Realizar la transferencia de conocimiento en el uso de tecnologías y buenas prácticas para fortalecer las capacidades productivas y el cuidado del medio ambiente con los participantes del proyecto.
3	Elevar la capacidad institucional para realizar seguimiento y monitoreo a proyectos de conservación.
3.1.1	Realizar un mapa georreferenciado satelital de la cobertura vegetal previo y posterior a la siembra del material biofabricado que permita realizar un estudio de impacto ambiental.
4	Suministro de insumos de bioseguridad COVID 19.

Fuente: Este proyecto, 2023

La supervisión, realiza el seguimiento de la ejecución del convenio de la siguiente manera:

- Realizar el seguimiento de la ejecución del programa de ejecución del convenio.
- Realizar el seguimiento de la ejecución del programa de inversión del pago anticipado.

- Se realiza el seguimiento diario de las actividades desarrolladas en campo.
- Se realiza el control del cumplimiento de pagos a seguridades sociales y parafiscales del personal que labora en la ejecución del convenio.
- Se realiza el seguimiento de la ejecución financiera del convenio – seguimiento al plan de inversiones del pago anticipado y el plan de inversiones de la ejecución total.
- Se realiza revisión y el seguimiento a las garantías del convenio aprobadas por el municipio.
- Acompañamiento a Corporación Educativa Y Científica COSMOS ejecutor, a la totalidad de las reuniones de socialización, al igual que a la entrega de material, equipos etc., a partir de la fecha de acta de inicio de la Supervisión.

9.2. Reporte Técnico

En la ejecución del convenio, el ejecutor entrego todas las evidencias de las actividades realizadas hasta el 31 de enero 2024. Por parte de la supervisión se realizó la verificación de cada una de las actividades desarrolladas por el ejecutor.

9.3. Socialización con comunidades.

Se realizo la supervisión de las socializaciones del convenio a las comunidades beneficiarias. El ejecutor entrego la evidencia de las actividades desarrolladas.

9.4. Visitas técnicas a participantes del convenio.

El ejecutor realiza las visitas de asistencia técnica a los predios de los participantes, donde realizo la caracterización productiva y ambiental de la unidad Agropecuaria" en la cual el técnico junto con el propietario del predio realiza la caracterización productiva y ambiental del predio zonificando e identificando el uso del suelo a partir del sistema productivo establecido en él. Se georreferencia las zonas intra prediales para posteriormente realizar el levantamiento productivo del predio en un mapa. Estas actividades se supervisaron y aprobaron por parte de la supervisión.

9.5. Comunidad interesada en participar en el convenio

Durante el proceso de socialización del convenio con la comunidad en general y las visitas realizadas en las veredas del corregimiento El Caraño, se ha identificado un grupo de personas interesadas en participar como participantes en el convenio.

Tabla 17. Personas interesadas en participar en el convenio de reforestación de la cuenca del río Hacha.

N°	Aspirante	Vereda	N° de Celular
1	Luz Mery Betancourt	La Paz	3144333237
2	Flor Marina Noboa	El Paraíso	3144241140
3	Élber Barrera	Quindío	3013572228
4	Miguel Antonio Otalvaro Aguiar	El Paraíso	3505703031
5	Albaro Montealegre	La Paz	3012292264
6	Juan Araugo	Paraíso Bajo	3007203443
7	Humberto Alejandro Pérez	La Paz	3009957220
8	Arber Bermúdez	Av Caraño	3146290933
9	José Basto Varón	Doradas Altas	3232812533
10	Orlando Buitrago	Santa Elena	3115537821
11	Deily Andrea Víquez	Alto Paraíso	3116259760
12	Pedro Castellano	Agua negra	3183032307

9.6. Actividad de zonificación y levantamiento de información cartográfica

Al realizar el procesamiento de datos provenientes de la información oficial proporcionada por la alcaldía municipal no correspondían a la ubicación real de los predios de los participantes. De igual manera, se encontraron predios ubicados por fuera de la jurisdicción catastral del municipio y dos o más coordenadas en un mismo limite predial.

Con relación a lo anterior, se presenta tabla donde se comparan las coordenadas X y Y entregadas en el documento técnico y las obtenidas en campo por parte de los profesionales de la corporación.

9.7. Modificaciones al vivero.

En la supervisión de las actividades realizadas, el vivero municipal presenta inconsistencias en su diseño que impiden y limitan el adecuado proceso de germinación, disposición y posterior crecimiento de las plántulas a una altura adecuada para su traslado al sitio final de

plantación. Teniendo en cuenta que el lugar actual solo cuenta con eras para la germinación de las semillas, se interrumpe el proceso de crecimiento y disminuye la probabilidad de supervivencia de las especies arbóreas del proyecto.

En las visitas realizadas en los meses de octubre y diciembre del año 2023, se evidencia el mal estado de las eras, compactación excesiva en los sistemas de germinación y deterioro de los muros de contención (ladrillos).

9.8. Material vegetal (semillas - plántulas).

Para la obtención del material vegetal (semillas y/o plántulas), a utilizar en el convenio, las cuales corresponden a cuatro especies, cedro rosado *(Cedrela fissilis)*, abarco *(Cariniana pyriformis)*, costillo *(Aspidosperma excelsum)* y achapo *(Cedrelinga cateniformis)*, el vivero municipal será acondicionarlo, de tal manera que, reúna las condiciones para la germinación y cuidado de las plántulas.

Para este fin, se han llevado a cabo cotizaciones en diferentes viveros para la obtención de semillas, como primera opción se inició por los que, se encuentran ubicados en el departamento del Caquetá, en especial en el municipio de Florencia.

Para la ejecución del convenio, es de suma importancia obtener semillas de la región o plántulas en crecimiento y desarrollo, debido a que, su facilidad de adaptación al entorno es mayor, incluyendo las condiciones climáticas, suelos y ecosistemas. Con ello se asegura que, las plantas crezcan de manera saludable y sean capaces de sobrevivir en su entorno natural, sin requerir un cuidado excesivo.

Al utilizar estas semillas en la reforestación, se contribuye a conservar la diversidad genética de las especies vegetales y, se promueve la restauración de los ecosistemas naturales.

Es de anotar que, de las cuatro especies a reforestar la especie costillo *(Aspidosperma excelsum)*, su obtención ha sido muy difícil y los árboles que se encuentran en la región, no están en la etapa de madurez reproductiva. Donde el árbol desarrolla flores y luego produce frutos que contienen las semillas, por lo que se recomienda cambiar de especie por otra nativa, que sea de importancia ecológica y económica para la región.

Representante Legal
HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

10. ANEXOS

ANEXO 1. DIARIOS DE CAMPO

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 04 Mes 12 Año 23

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	x			x			
TARDE	x			x			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Jesus Leon	Hidroambiental	Revisión del vivero municipal
Ignacio Hoyos Rivera	Secretaria Ambiente y Desarrollo Rural	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	2	x			Registro fotografico
Motocicleta	1	x			Transporte Personal

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	x Se realizo visita al vivero Municipal para la revisión del estado de este	1
	x Se evaluaron condiciones de la infraestructura y capacidad del vivero municipal	

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO
MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS
PROGRAMA DIA SIGUIENTE
NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Oscar h	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 04 Mes 12 Año 23

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	x			x			
TARDE	x			x			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Santiago Puerta Bolivar	H. Droambiental	Estudio del
Karen Collazos	H. Droambiental	lugar de ejecución

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	2	x			Registro fotografico
Motocicleta	1	x			Transporte de personal
Computadoras	2	x			Investigación y alloyo de información

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	x Se realizo el reconocimiento del área de estudio, identificando condiciones generales del terreno y sus habitantes	1
	x Se realizo revision bibliografica en aras de ahondar en el conocimiento y contexto del territorio	

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE
Se seguirá avanzando con el reconocimiento del territorio

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Oscar	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 06 Mes 12 Año 23

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA		X			X		
TARDE	X			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Santiago Fuerte Bolivar	Hidroambiental	Estudio del
Kuvan Collazos	Hidroambiental	lugar de ejecución
		del Proyecto

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Camionetas	2	X			Ubicación del Personal y fotografia
Motocicleta	1	X			Transporte de Personal

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Se realizo el reconocimiento del	
	área de estudio, identificando	1
	Condiciones generales del tramo	
	y sus habitantes	

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO
Condiciones meteorologicas que dificultan el reconocimiento del personal
MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS
Reprogramacion de salidas
PROGRAMA DIA SIGUIENTE
NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Oscar	Karen Collazos

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 06 Mes 12 Año 23

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	X			X			
TARDE	X			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Karen Collazos	Hidroambiental	
Santiago Rueda Bolivar	Hidroambiental	
		Realizacion de trabajo administrativo

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Camionetas	1	X			Corroborar reconocimiento de
Computador	1	X			días anteriores
					Revisión de documentos

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Se realizaron trabajos administrativos	
	- Realizacion de informes	1
	- Organizacion de documentos	1

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE
- Realizar analisis de los participantes y su ubicacion en general

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Oscar R	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 11 Mes 12 Año 23

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	X			X			
TARDE	X			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Karen Collazos	Hidroambiental	Verificacion de los Preliminares para la Socializacion con los Participantes del Proyecto
Santiago Puerta Bolivar	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	2	X			Registro fotografico
Motocicleta	1	X			Transporte de personal

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Se realiza la verificacion de los Preliminares por parte de Cosmos para la reunion de socializacion	1

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE
Verificar la asistencia de los participantes que ~~se~~ a la socializacion proxima a realizar

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen Collazos

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 12 Mes 12 Año 23

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	x			x			
TARDE	x			x			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Karen Collazos	Hidroambiental	
Santiago Puerta Bolivar	Hidroambiental	
		Verificacion de la asistencia de los Participantes a la Socialización

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	2	x			Comunicación personal tecnico
Motocicleta	1	x			Transporte de personal

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	Se llevo a Cabo la verificacion de la asistencia de los Participantes	1

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO
MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS
PROGRAMA DIA SIGUIENTE
NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Oscar	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023

Día 15 Mes 12 Año 23

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE	4			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Kuver Collazos	Hidroambiental	
Santiago Puerta Bolivar	Hidroambiental	
		Revision y Consulta del lugar de reunión

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Caluturas	2				Comunicacion Personal tecnico
Motocicleta	1				Transporte de Personal

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Se Verifico y revisó el lugar de reunión, el cual se encuentra destinado Para la socialización con los Participantes	1

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO
MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS
PROGRAMA DIA SIGUIENTE
NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Oscar Q	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 16 Mes 12 Año 23

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE	4			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing Nidia Rojas,	Cosmos	Verificación de la socialización del proyecto. a los participantes de las veredas beneficiarias del Proyecto.
Juan Carlos Andrade	Cosmos	
Karen Collazos	Hidroambiental	
Jesus León	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	4	X			Registro fotografico
motocicleta	1	X			Transporte de personal
computadores	3	X			Apoyo de información.

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Se realizo la verificación de la socialización del proyecto, por parte de cosmos a los participantes. Lugar= Vereda Avenida el caraño, salón comunal.	1

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

- Realizar trabajo administrativo.
- Organización de documentos.
- Realizar cronogramas

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen C.

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 19 Mes 12 Año 2023

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE							
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Bióloga Karen collazos	Hidroambiental	Realización de Trabajo administrativo.

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	1	X			Registro fotografico.
Computador	1	X			Realización de Informe.

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Se realizaron trabajos administrativos.	
	- Realización de informes.	1
	- Organización de documentos	1

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE
* Reunión con la comunidad y
Visita de asistencia técnica.
Vereda: Avenida el cabaño.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Koren C.

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 20 Mes 12 Año 2023

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	X			X			
TARDE	X			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Santiago Puerta B	Cosmos	Reunion con la
Davinson Saqueda	Cosmos	Comunidad y
Camilo Ropas	Cosmos	asistencia tecnica
Karen Collazos	Hidroambiental	
desus Leon	Hidroambiental	
Oscar Quintero	Cosmos	
Andry Castaño	cosmos	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celular	2	X			Fotografia y video
Motocicleta	1	X			Transporte de personal

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1.	Concertacion con representantes de la comunidad. Convenio 0024 realizado en la caseta comunal de la Avenida el carmen.	1

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

La comunidad en general manifestó su inconformismo porque ellos creían que este convenio es "Pago por servicios ambientales".

De igual manera se pudo evidenciar que las personas que se oponían a la ejecución de este convenio son aquellas que no están en la lista de beneficiarios

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

Se verificará reunión de socialización programada en la "Avenida el Carmen"

NOTAS

En dicha actividad se escuchó a la comunidad, donde expresaron su inconformismo hacer el convenio.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Davinson Saavedra	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 21 Mes 11 Año 2023

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	X			X			
TARDE	X			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Oscar Quintero	Cosmos	
Santiago Puente B.	Cosmos	
Andry Cayetano	Cosmos	
Karen Collazos	Hidroambiental	
Jesus Leon	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	2	1			Registro fotografico, grabacion

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	Se verifico la socializacion realizada en la vereda "Avenida el corazon" sector la "Y" la cual buscaba identificar aforos de los beneficiarios de este sector	15

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO
No se registraron inconvenientes
MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS
PROGRAMA DIA SIGUIENTE
Visita al vivero municipal para identificar las modificaciones a realizar, de igual manera se pretende firmar dicha acta de modificación.
NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Jaumson Saavedra	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 22 Mes 12 Año 2023

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	X			4			
TARDE	X			4			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Andy Castaño Salazar	Cosmos	
Santiago Rueda Bolivar	Cosmos	
Oscar Quintero F.	Cosmos	
Karen Collazos	Hidroambiental	
Jesus Leon	Hidroambiental	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Se verifica las condiciones ecologicas del vivero municipal y se identifican las modificaciones, del mismo que serán realizados por hidroambiental.	1

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

Visita técnica en la vereda la Paz.

NOTAS

El ingeniero forestal recomendo realizar la poda de algunos arboles que se encuentran alrededor del vivero municipal, y que por su gran tamaño puede reducir la cantidad de luz solar que llega al material vegetal en crecimiento

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Jaimson Saavedra	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 23 Mes 12 Año 2023

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4						
TARDE							
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Bióloga Karen Collazos Rojas	Hidroambiental	Realización de trabajo administrativo.

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	1	X			Registro fotografico.
Computadores	1	X			Realización de informe.

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Se realiza trabajo administrativo:	
	- Organización de base de datos de los participantes.	1
	- Organización de documentos.	1

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE
✱ No hay actividades programadas.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen G.

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 26 Mes 12 Año 2023

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA		x	x			x	
TARDE							
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Andry Cantaño Salazar	Cosmos	
Santiago Rueda B	Cosmos	
Karen J Collazos	Hidroambiental	
Davinson Saavedra	Cosmos	
Camilo Rojas	Cosmos	

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Motocicleta	1	x			Transporte
Celular	2	x			Registro fotografico y grabacion

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Se verifica el sitio tecnico en predio de Señor Edgar Sabi en la vereda "La Paz" del corregimiento el Caraño	1

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

Por condiciones climaticas (altas presipitaciones de lluvia) solo se realizó la verificacion del predio del señor Edgar Sabi

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE

Socializacion general del convenio en la caseta comunal de la "Avenida el corazón"

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
Jhonson Sanchez	Karen Collazos

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 27 Mes 12 Año 2023

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			X			
TARDE	4			X			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Ing Nidia Rojas,		Verificación
Anayy, Davinson,	Cosmos	de la segunda
Camilo Rojas		Socialización
Luis Carlos.		del proyecto
		a las partici-
Karen Collazos	Hidroambiental	pantes del
Jesus León		proyecto.

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	7	x			Registro de las evidencias
Vehiculo	1	x			Tomadas en la socialización.
Motocicleta	1	x			Transporte de personal.

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	# Verificación de la segunda socializ-	
	ación del del proyecto a los	1
	participantes.	
	Lugar: Salón comunal de la vereda	
	Avenida el cayaño.	

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

PROGRAMA DIA SIGUIENTE
* Realizar trabajos administrativos como: - Organización de documentos e información correspondiente a las socializaciones.

NOTAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DEL CONVENIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE LA SUPERVISION
	Karen C.

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

INFORME DIARIO DE TRABAJO, **CONVENIO No 20230024 DE 09 DE OCTUBRE DE 2023**

Día 28 Mes 12 Año 2023

EJECUTOR: **CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS**
SUPERVISOR: **HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**
SITIO DE TRABAJO: **FLORENCIA CAQUETÁ**

I. ESTADO METEOROLOGICO

ESTADO PERIODO	SOL	NUBLADO	HORAS LLUVIA	ESTADO DEL SUELO			
				SECO	HUMEDO	SATURADO	OBSERVACION
MAÑANA	4			x			
TARDE	4			x			
NOCHE							

II. PERSONAL

NOMBRE	ENTIDAD	TRABAJOS EJECUTADOS
Bióloga Karen Collazos	Hidroambiental	Administración Realizacion de informes,
Rojas Jesu León		Organizacion de documentos.

III. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			TRABAJO EJECUTADO
		B	R	M	
Celulares	2	x			Transferencia de las
Computador	1	x			evidencias fotograficas.

IV. MATERIALES QUE INGRESAN/SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR	OBSERVACIONES

V. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	* Se realizo trabajo administra-	
	tivo como la organización de	1
	documentos y realizacion de informes.	

SEGURIDAD SOCIAL
DICIEMBRE DE 2023

ITEM	NOMBRE	APELLIDO	RECURSO HUMANO O PERFIL	NÚMERO DE PLANILLA
1	DAGO LEONARDO	FONSECA GARCIA	Director General (Ingeniero Ambiental)	9460795335
2	ENRIQUE	HERRERA LEÓN	Profesional Contable y Financiero (Contador Público)	9460795335
3	NIDIA	ROJAS ORTÍZ	Profesional de Apoyo (Ingeniera Agroecologa)	9460795335
4	KLEIVER DARIO	IBARGUEN PERLAZA	Profesional de Apoyo (Ingeniero Agroforestal)	9461401384

aportes en línea

Pla...la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900431848	2	HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	COFREM	CRA 19 N 11 64	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	6678967	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-12	365281491	9460795335	E	2023/12/13	2023/12/28	NEQUI	15	$1,164,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL CAQUETA (1 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: RIESGO II (1 Afiliados)																															
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																															
1	CC	80067374	FONSECA DAGO																		23020 1	30	EPS037	30	CCF68	30	14-23	30	1.044%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL BOGOTA (2 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: RIESGO I (1 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																															
2	CC	53166341	RODRIGUEZ ANGELICA																		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-23	30	0.522%	30	SI
Centro de Trabajo: RIESGO II (1 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																															
3	CC	79504843	HERRERA ENRIQUE																		25-14	30	EPS017	30	CCF19	30	14-23	30	1.044%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL FLORENCIA (1 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: TARIFA DE RIESGO 2 (1 Afiliados)																															
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																															
4	CC	25130688	ROJAS NIDIA		X																23030 3	29	ESS062	29	CCF13	29	14-23	29	1.044%	29	SI
Total		Afiliados(4)																													

2024/02/01 12:39 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900431848	2	HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	COFREM	CRA 19 N 11 64	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	6678967	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	365281491	9460795335	E	2023/12/13	2023/12/28	NEQUI	15	$1,164,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$736,300	$11,000	$0	$747,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$5,500	$0	$376,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$179,500	$2,700	$0	$182,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$2,800	$0	$188,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$42,300	$700	$0	$43,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$42,300	$700	$0	$43,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$184,100	$2,800	$0	$186,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$92,800	$1,400	$0	$94,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$46,400	$700	$0	$47,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$44,900	$700	$0	$45,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$184,100	$2,800	$0	$186,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$44,900	$700	$0	$45,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$700	$0	$47,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$700	$0	$47,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$700	$0	$47,100
TOTAL				4	$1,146,800	$17,100	$0	$1,164,100

2024/02/01 12:39 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1076381915		IBARGUEN PERLAZA KLEIVER DARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 14 N 27 79 B SANTA ANA	QUIBDO-CHOCO	6711093	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	385000202	94614013B4	I	2024/01/05	2024/01/09	BANCO DAVIVIENDA	4	$621,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1076381915	IBARGUEN PERLAZA KLEIVER DARIO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$48,800	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$1,200	$0	$321,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$1,200	$0	$321,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$200	$0	$49,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,800	$200	$0	$49,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$1,000	$0	$251,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$1,000	$0	$251,000
TOTAL				1	$618,800	$2,400	$0	$621,200

2024/01/08 09:18 PM

57
